	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 18 de agosto de 2025	**SEMANA No.**	**20**	DEL	**11-ago-25**	AL	**17-ago-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA.

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	138 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	138 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No se realizan actividades de obra por parte del contratista durante la semana 20

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	2-abr-25	22-jun-25	82	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	11,10%	6,22%	-4,88%
Durante el periodo	7,10%	0,11%	-6,99%
Acumulado Actual	18,21%	6,33%	11,87%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

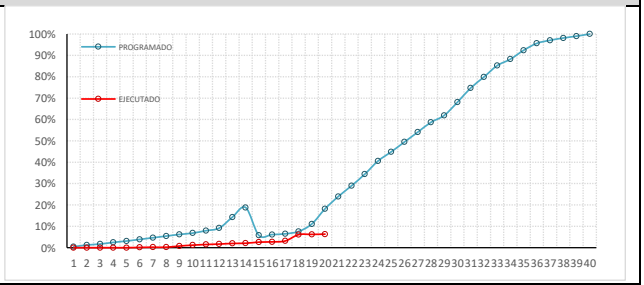

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	138,00	136,00	32,53

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 3.580.128.711	$ 2.027.642.640	56,64%
Durante el periodo	$ 2.290.921.948	$ 36.649.667	1,60%
Acumulado Actual	$ 5.871.050.659,00	$ 2.064.292.306,35	35,16%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

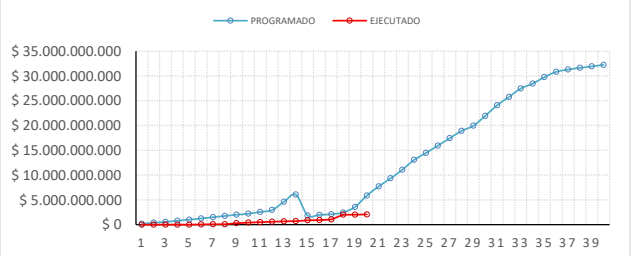


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 3.806.758.353

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

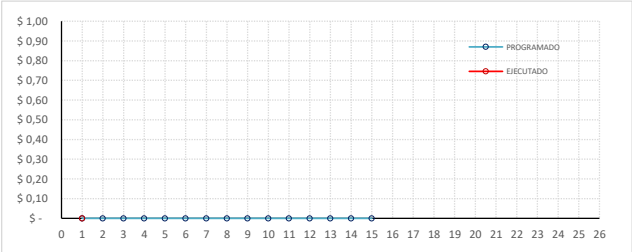

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana evaluada, desde el componente ambiental se realizaron las siguientes actividades:

1. Teniendo en cuenta que la aprobación del PAGA V5 se realizó el pasado 15 de julio de 2025 por medio del comunicado 25C02_DTO_031, se realizará el seguimiento correspondiente una vez inicien las actividades de obra.
2. Se presenta el informe semanal No. 19
3. Se realiza acompañamiento al Comité de Seguimiento de manera virtual a partir de las 10:30 am en compañía del ICCU, la Interventoría y el Contratista. Desde el componente ambiental de la Interventoría, se solicita nuevamente la presentación de la hoja de vida de la especialista ambiental, previo al inicio de las actividades de obra.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo reportado en el presente informe, la interventoría comunica que se llevó a cabo un comité de seguimiento social con la participación de las profesionales responsables del componente social, tanto por parte de la interventoría como del contratista de obra. En dicha sesión se realizó un barrido del estado actual de las gestiones sociales, se acordó notificar a las alcaldías municipales de San Bernardo y Venecia sobre el inicio de obra y los posibles cierres viales que puedan presentarse.
Así mismo, se estableció que el contratista compartirá la programación para el levantamiento de actas de vecindad en la provincia del Sumapaz, así como la logística correspondiente para la actividad de inventario predial y la notificación de visitas para la suscripción de actas de vecindad en la provincia del Alto Magdalena.
Como actividad pendiente, se encuentra la reunión de inicio en la provincia del Tequendama, la cual está sujeta a la definición de algunos aspectos técnicos.

Como actividad pendiente, se encuentra la reunión de inicio en la provincia del Tequendama, la cual está sujeta a la definición de algunos aspectos técni

En la semana en mencion se ejecuta las siguientes actividades:
1.Se participa en comite interno
2. Se participa en comite de obra dando a conocer al contratista la continuidad de la anomalia por la entrega de la seguridad social del mes de junio y julio.
3. Se realiza informe semanal.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista realiza reprogramación de obra para la semana 15, esto basado en las necesidades y eventualidades que se han presentado durante la fase de caracterización y laboratorios expuestas por el contratista según comité de obra con el ICCU.
* Para la semana 20 el contratista presenta un acumulado ejecutado del 6.33% vs un acumulado programado del 18,21%.
* Para la presente semana el contratista según programación debió entregar informes finales de la fase de caracterización vial y se debió comenzar con actividades de la fase de ejecución de obra, principalmente con el apartado de alcantarillas por la provincia de Sumapaz

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

* Se ha evidenciado que el contratista tiene disponibilidad y aplicación de recursos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que se han realizado las actividades de apiques, se han entregado resultados de ensayos de laboratorio, cuenta con personal profesional y de obra.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la semana 20 el contratista presenta un acumulado ejecutado de $2,064,292,306 vs un acumulado programado de $5,871,050,659 por lo que el avance financiero presenta un atraso de $3,806,758,353

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

No se han iniciado actividades de ejecucion de obra por parte del contratista

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de informes finales fase de caracterizacion vial y ensayos.	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato
Iniciar actividades de obra correspondientes a la fase 2	CONSORCIO VICGER 2021	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No se ha realizado entrega de presupuestos, planos y diseños finales

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Interventoria realiza actividades correspondientes a revision del estado actual de las obras de arte " alcantarillas de los municipios de Cabrera, Pandy, Tibacuy, Nariño, Nilo y Jerusalen. Tambien se realizan actividades de toma de muestra de sulo " apiques" en el Municipio de Cabrera Cundinamarca.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA














INSPECCION VISUAL OBRAS DE DRENAJE Y TOMA DE MUESTRAS DE SUELO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROJAS
