	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 8 de septiembre de 2025	**SEMANA No.**	**23**	DEL	**1-sep-25**	AL	**7-sep-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	159 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	159 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realizo actividades de reconocimiento predial en la provincia del Alto Magdalena (Jerusalen, Nariño, Nilo).

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	2-abr-25	22-jun-25	82	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	62,67%	11,61%	-51,06%
Durante el periodo	2,54%	0,00%	-2,54%
Acumulado Actual	65,20%	11,61%	-53,59%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	159,00	115,00	-146,84

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

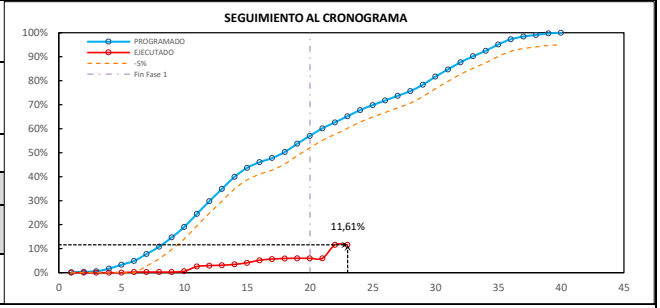

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.344.725.852,00	$ 942.796.666,67	10,09%
Durante el periodo	$ 1.746.789.587,00	$ 469.341.666,67	26,87%
Acumulado Actual	$ 11.091.515.439,00	$ 1.412.138.333,33	12,73%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 9.679.377.106


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

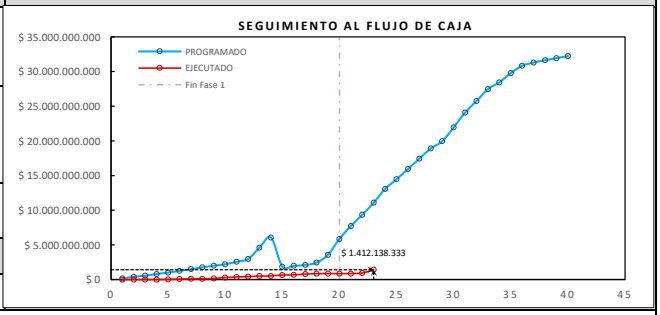

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza la revisión del PAGA V6 remitido por el Contratista el 1 de septiembre de 2025, por medio del comunicado CVG – ICCU –OF-0148.
- El 2 de septiembre de 2025, se realiza mesa de trabajo entre la Interventoría y el ICCU de manera virtual a las 4 pm con el propósito de verificar la atención de las observaciones del PAGA V6 remitido por el Contratista.
- Se desarrolla y presenta el informe mensual del componente ambiental del mes de agosto de 2025.
- El 5 de septiembre de 2025, se realiza mesa de trabajo entre la Interventoría, el Contratista y el ICCU de manera virtual a las 9 am, donde se verifica una a una las observaciones emitidas por el ICCU y los ajustes pendientes en el documento. El Contratista se compromete a ajustar el documento de acuerdo a lo solicitado por la Entidad y la Interventoría.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana del 01 al 07 de septiembre de 2025, el contratista de obra realizó con el acompañamiento de la interventoría (área técnica y social) el levantamiento del inventario predial y la notificación de la primera visita del levantamiento de actas de vecindad correspondientes a la provincia de Alto Magdalena (municipios de Nilo, Nariño y Jerusalén), lo anterior dando cumplimiento a la programación pactada. A continuación, se detalla el consolidado de los predios identificados y notificados:
•Nilo: 46 predios identificados y notificados.
•Nariño: 7 predios identificados y notificados.
•Jerusalén: 123 predios identificados y notificados.
La interventoría revisó y remitió al contratista de obra las observaciones de los informes sociales mensuales para su atención y subsanación. Asimismo, la interventoría solicitó iniciar el trámite de los volantes de notificación de la segunda visita de actas de vecindad en la provincia de Sumapaz e informar de la programación de dicha actividad.
Del mismo modo, la interventoría elaboró y compartió con la entidad el informe de las gestiones sociales realizadas durante el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025.
Por otro lado, se agendó para el 8 de septiembre de 2025, espacio de comité social para realizar el correspondiente seguimiento del estado y avance de las actividades efectuadas por el componente.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana en mencion se ejecutan las siguientes actividades:
- Se participa en comite interno de obra.
- Se realiza el informe mensual perteneciente al mes de agosto y se realiza el envio para validacion.
- Se elabora el MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGURIDAD SOCIAL del personal de interventoria y se envia la informacion para revision y firma.
- Continua la falta de respuesta por el contratista al oficio 250825_25C02_DTO_056_SolicitudEntregaPMT.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista realiza reprogramación de obra para la semana 15, esto basado en las necesidades y eventualidades que se han presentado durante la fase de caracterización y laboratorios expuestas por el contratista según comité de obra con el ICCU.
* Para la semana 23 el contratista presenta un avance fisico del contrato del 11.61% vs un programado fisico del 65.20%.
* Para la presente semana 23 segun programacion de obra el contratista debio iniciar actividades correspondientes la fase 2 de ejecucion de obra con actividades de (Preliminares, Explanacion y excavaciones replanteo de vias, Muros, PMT, PAGA)
* No se ha realizado entrega de informes finales correspondientes a la fase 1 de caracterizacion y diseños.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la semana 23 el contratista presenta un acumulado financiero programado de $11.091.515.439 vs un acumulado ejecutado de $1.462.027.733 por lo que se presenta un atraso de $9.629.487.706

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Realizar entrega informe final de pavimentos.	CONSORCIO VICGER 2021	9/09/2025
Iniciar Actividades de Obra provincia del Sumapaz.	CONSORCIO VICGER 2021	15/09/2025

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA













DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROJAS
