	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 15 de septiembre de 2025	**SEMANA No.**	**24**	DEL	**8-sep-25**	AL	**14-sep-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	166 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	166 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*No se realizaron actividades de obra.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	2-abr-25	22-jun-25	82	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	68,10%	11,61%	-56,49%
Durante el periodo	2,35%	0,00%	-2,35%
Acumulado Actual	70,46%	11,61%	-58,85%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	166,00	108,00	-161,24

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

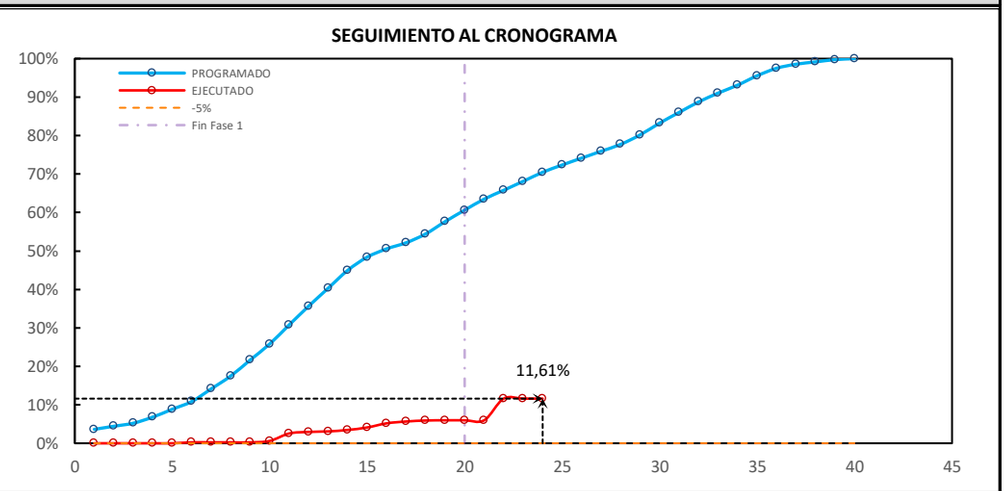

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 11.091.515.439,00	$ 1.412.138.333,33	12,73%
Durante el periodo	$ 1.987.640.085,00	$ 191.666,67	0,01%
Acumulado Actual	$ 13.079.155.524,00	$ 1.412.330.000,00	10,80%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO


-$ 11.666.825.524

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

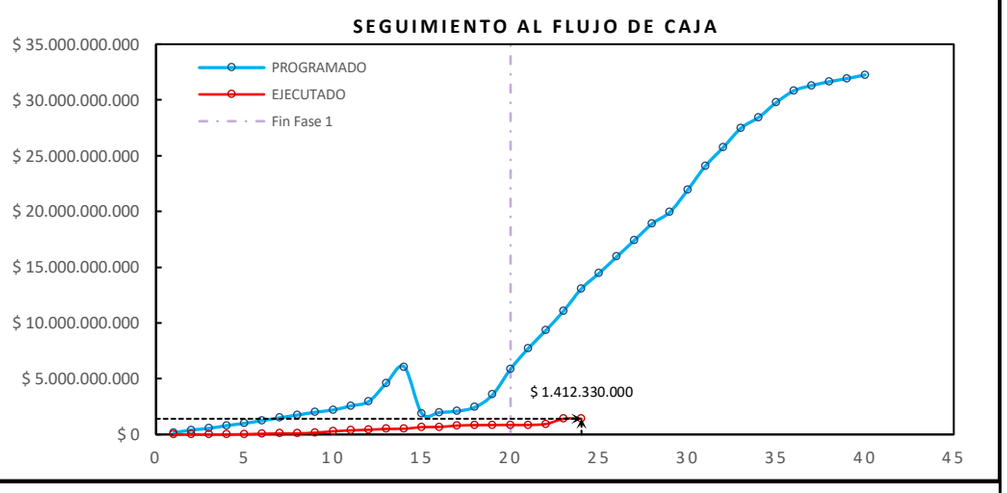

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

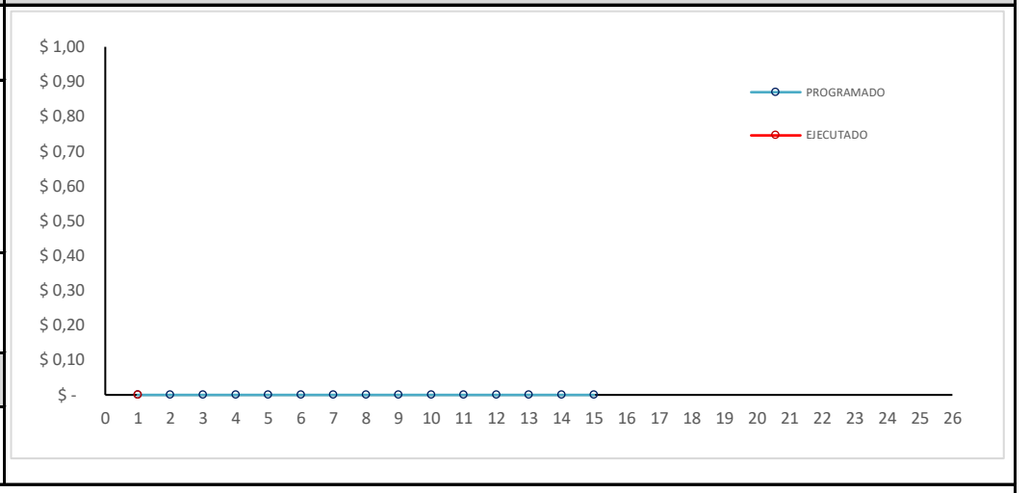

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

- Se brinda apoyo al Contratista para realizar los ajustes al Plan de Adaptaciòn de la Guìa Ambiental, de acuerdo a lo previsto en mesas de trabajo.
- El 10 de septiembre de 2025 se realiza acompañamiento en el Comitè de seguimiento de manera virtual en compañìa del ICCU, la Interventorìa y el Contratista. Desde el componente ambiental se informa que el Contratista presentò el PAGA V6, sin embargo, el Contratista debe presentar algunos ajustes pendientes los cuales se estàn trabajando conjuntamente con la Interventorìa.
- Se presenta el informe semanal

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Para el periodo comprendido entre el 08 y el 14 de septiembre de 2025, la interventoría se permite informar que el equipo social del contratista de obra se encuentra en el procesamiento y organización del consolidado de actas de vecindad realizadas en la provincia de Sumapaz. Dichos documentos serán remitidos para su revisión, verificación y firma por parte de la interventoría.
Durante esta semana también se adelantó la subsanación y atención a las observaciones realizadas por la interventoría a los informes mensuales. Asimismo, se llevó a cabo un comité de seguimiento social, en el cual, además de socializar el avance y estado del componente por parte de las profesionales, se acordó iniciar la logística requerida para la elaboración de los volantes de notificación de la segunda visita de actas de vecindad.
De igual manera, el contratista de obra reportó que se encuentra a la espera de la indicación del área técnica respecto a la confirmación del inicio del tramo piloto en el municipio de Cabrera, teniendo en cuenta que será necesario implementar cierres (PMT) y realizar socializaciones para mitigar las posibles afectaciones que puedan presentarse.
Finalmente, la interventoría se encuentra a la espera de la notificación de la programación de las actividades sociales, con el fin de brindar la respectiva asesoría y acompañamiento.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana en mencion se ejecutan las siguientes actividades:
- Se elabora el MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGURIDAD SOCIAL del personal de interventoria, segun indicaciones se adecuan archivos con los respectivos nombres para informe mensual y se organiza informacion en nube tanto de seguridad social de interventoria como hasta tanto la informacion enviada por el contratista.
- Se continua seguiimiento desde el area para la entrega del documento PMT.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista realiza reprogramación de obra para la semana 15, esto basado en las necesidades y eventualidades que se han presentado durante la fase de caracterización y laboratorios expuestas por el contratista según comité de obra con el ICCU.
* Para la semana 23 el contratista presenta un avance fisico del contrato del 11.61% vs un programado fisico del 70.46%.
* Para la presente semana 24 segun programacion de obra el contratista debio iniciar actividades correspondientes la fase 2 de ejecucion de obra con actividades de (Preliminares, Explanacion y excavaciones replanteo de vias, Muros, PMT, PAGA)

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la semana 24 el contratista presenta un acumulado financiero programado de $13.079.155.524 vs un acumulado ejecutado de $1.412.330.000 por lo que se presenta un atraso de $11.666.825.524

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Realizar entrega informe final de pavimentos.	CONSORCIO VICGER 2021	inmediato
Iniciar Actividades de Obra provincia del Sumapaz.	CONSORCIO VICGER 2021	inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









DIRECTOR DE INTERVENTORIA *

Nombre: LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROJAS
