
IN□ORME SEMANAL DE O□RA
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17

SEMANA N□	**5**	**DE**	**□□□□5 d□□□r.r.□d□2024**	**A**	**d□□ □□□□11 d□□□r.r.□d□2024**
□E□□A INI□IO□	16□12□2022	**□E□□A□ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O

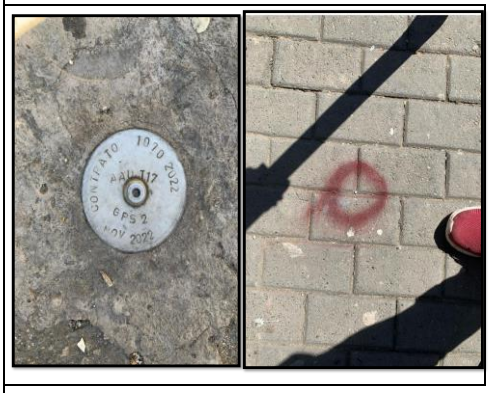

U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□LOCALI□ACIÓN Y REPLANTEO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□LOCALI□ACIÓN Y REPLANTEO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE





U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□DESCAPOTE A M□QUINA NIVEL 0.00 □INC. RETIRO□E□□1□40M SUDS





U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□DESCAPOTE A M□QUINA NIVEL 0.00 □INC. RETIRO□E□□1□40M **SUDS**

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.6		
										6
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00	270,00	$ 2.221.020,00	20,63%
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00	30,00	$ 818.190,00	14,26%
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00			
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	619,85	$ 1.636.404,00			
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00	670,00	$ 935.990,00	52,55%
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		204,48	$ 14.962.211,00	18,52	$ 1.355.145,44	9,06%
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	85,35	$ 9.380.306,40	,		
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	874,85	$ 9.759.827,00			
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	64,01	$ 10.023.518,00	,		
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	1176,65	$ 49.871.134,00			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	87,95	$ 14.637.519,00			
2,12	Relleno recebo comun	m3		$ 90.511,00	$ -	53,86	$ 4.874.922,00			
2,13	Relleno y comp.manual material comun sin sumin	m3		$ 39.283,00		362,20	$ 14.228.303,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**							,		
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	70,31	$ 72.268.485,00	,		
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,61	$ 4.882.103,00	,		
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00		69,30	$ 37.998.992,00			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00		84,00	$ 926.100,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00		71,60	$ 7.492.367,00			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00		$ -			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00	135,55	$ 776.159,00			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00			
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00		$ -			
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -			
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	25,04	$ 2.473.101,00			
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,76	$ 1.001.363,00			
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	53,86	$ 7.938.749,00			
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	53,86	$ 10.291.084,00			
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	43,40	$ 2.206.109,00			
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	14,00	$ 711.648,00			
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	2,00	$ 80.411,00	$ 160.822,00	31,15	$ 2.504.803,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	35,90	$ 6.120.986,00			
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00		$ -			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00		$ -			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00		$ -			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00		$ -			
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00		$ -			
5,22	Caja de Inspección100x100x100+Exca	un		$ 997.443,00	$ -	1,00	$ 997.443,00			
5,23	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV	un		$ 740.261,00	$ -	2,00	$ 1.480.522,00			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	21,00	$ 600.474,00			
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,81	$ 1.575.360,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	32,96	$ 2.851.007,00			
7,40	Tableta podotactil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	119,05	$ 10.297.706,00			
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	404,30	$ 36.726.612,00			
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	45,29	$ 4.827.371,00			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00	$ -	54,00	$ 6.265.404,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	68,95	$ 39.031.354,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	21,00	$ 31.319.505,00			
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	40,00	$ 14.588.280,00			
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00			
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00		$ -			
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS .DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	558,44	$ 5.820.062,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	89,76	$ 8.807.610,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	55,85	$ 3.654.321,00			
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00		$ -			
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00			
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00			
11,90	Árbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	5,00	$ 3.663.280,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00			
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	1,00	$ 569.478,00			
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	4,00	$ 1.818.808,00			
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1309,00	$ 9.750.741,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**					
					$ 483.169.772,00		**$ 601.863.869,00**		**$ 5.330.345,44**	**0,89%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 125.624.141,00**		**$ 156.484.606,00**		**$ 1.385.889,81**	**0,89%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 4.831.698,00**		**$ 6.018.639,00**		**$ 53.303,45**	**0,89%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 28.990.186,00**		**$ 36.111.832,00**		**$ 319.820,73**	**0,89%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 159.446.025,00**		**$ 198.615.077,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 642.615.797,00**		**$ 800.478.946,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 5.403.728,00**		**$ -**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ -**			
					$ 659.459.203,00		**$ 800.478.946,00**		**$ 7.089.359,43**	**0,89%**
										0,89%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□N□□□	Fecha de in□orme	del□	19 d□ □□r□r□ d□ 2024	al	25 d□ □□r□r□ d□ 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	436,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.□	0□48□	0□48□	0□40□	0□40□	□0□08□
SEMANA No.4	7□58□	8□06□	6□□7□	6□77□	□1□29□
SEMANA No.5	□26□	11□□2□	2□74□	9□51□	□1□81□
SEMANA No.6	1□06□	12□□8□	0□89□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.7	0□00□	12□□8□	0□00□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.8	0□00□	12□□8□	0□00□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.9	0□00□	12□□8□	0□00□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.10	0□00□	12□□8□	0□00□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.11	0□00□	12□□8□	0□00□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.12	0□00□	12□□8□	0□00□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.1□	0□00□	12□□8□	0□00□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.14	0□00□	12□□8□	0□00□	10□□9□	□1□99□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

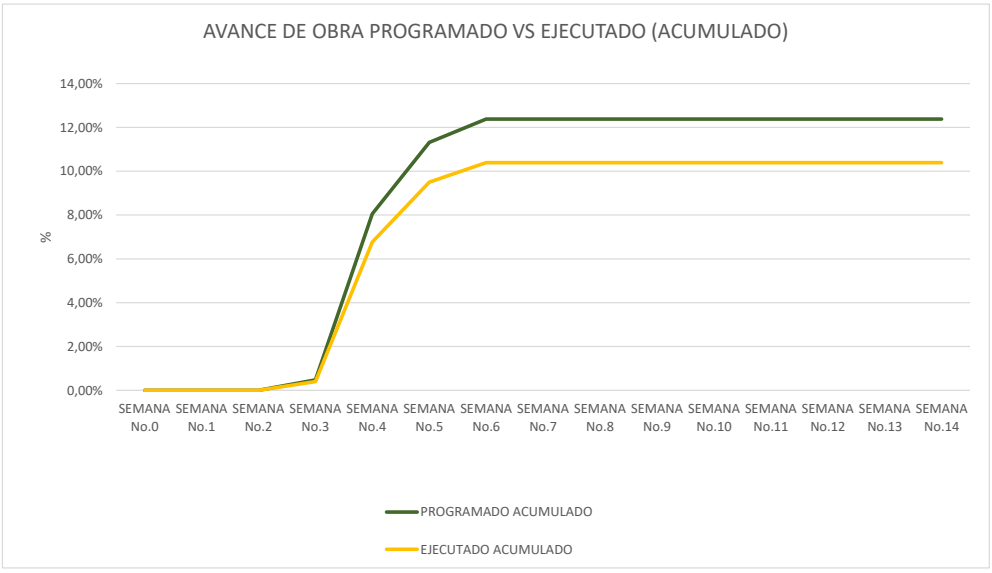


IN□ORME SEMANAL DE O□RA
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17

SEMANA N□	□	**DE**	□□□□□**19 d**□ □□**r r**□**d**□**2024**	**A**	**d**□□ □□□□**25 d**□ □□**r r**□**d**□**2024**
□E□□A INI□IO□	16□12□2022	**□E□□A□ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□□O

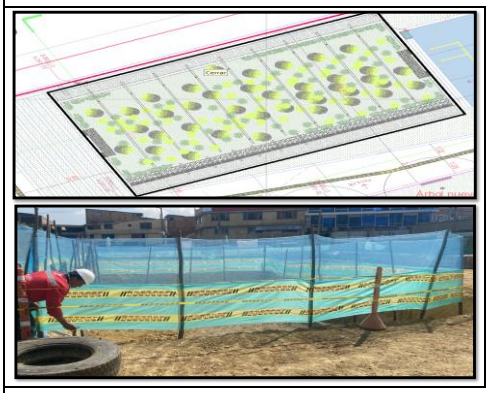

U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA □POLISOMBRA□**SUDS**□



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□LOCALI□ACIÓN Y REPLANTEO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□NIVELACIÓN Y PERFILADO DE TERRENO MANUAL□**SUDS**



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE **SUDS**



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE □□**ENERAL**□



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE □□**ENERAL**□

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.7		
										7
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00	389,00	$ 3.199.914,00	29,72%
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00	15,00	$ 409.095,00	7,13%
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00			
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	619,85	$ 1.636.404,00	80,91	$ 213.602,40	13,05%
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00	80,91	$ 113.031,27	6,35%
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		204,48	$ 14.962.211,00	2,76	$ 201.954,72	1,35%
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	85,35	$ 9.380.306,40			
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	874,85	$ 9.759.827,00			
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	64,01	$ 10.023.518,00			
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	1176,65	$ 49.871.134,00	294,23	$ 12.470.644,32	25,01%
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	87,95	$ 14.637.519,00			
2,12	Relleno recebo comun	m3		$ 90.511,00	$ -	53,86	$ 4.874.922,00			
2,13	Relleno y comp.manual material comun sin sumin	m3		$ 39.283,00		362,20	$ 14.228.303,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	70,31	$ 72.268.485,00			
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,61	$ 4.882.103,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00		69,30	$ 37.998.992,00	7,40	$ 4.057.612,40	10,68%
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00		84,00	$ 926.100,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00		71,60	$ 7.492.367,00			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00		$ -			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00	135,55	$ 776.159,00			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00	31,14	$ 1.563.944,22	13,08%
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00		$ -			
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -			
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	25,04	$ 2.473.101,00			
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,76	$ 1.001.363,00			
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	53,86	$ 7.938.749,00			
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	53,86	$ 10.291.084,00			
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	43,40	$ 2.206.109,00			
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	14,00	$ 711.648,00			
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	2,00	$ 80.411,00	$ 160.822,00	31,15	$ 2.504.803,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	35,90	$ 6.120.986,00			
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00		$ -			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00		$ -			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00		$ -			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00		$ -			
5,19	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00		$ -			
5,22	Caja de Inspección100x100x100+Exca	un		$ 997.443,00	$ -	1,00	$ 997.443,00			
5,23	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV	un		$ 740.261,00	$ -	2,00	$ 1.480.522,00			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	21,00	$ 600.474,00			
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,81	$ 1.575.360,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	32,96	$ 2.851.007,00			
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	119,05	$ 10.297.706,00			
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	404,30	$ 36.726.612,00			
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	45,29	$ 4.827.371,00			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00	$ -	54,00	$ 6.265.404,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	68,95	$ 39.031.354,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Careca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	21,00	$ 31.319.505,00			
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	40,00	$ 14.588.280,00			
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00			
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00		$ -			
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS .DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	558,44	$ 5.820.062,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	89,76	$ 8.807.610,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	55,85	$ 3.654.321,00			
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00		$ -			
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00			
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00			
11,90	Árbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	5,00	$ 3.663.280,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00			
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	1,00	$ 569.478,00			
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	4,00	$ 1.818.808,00			
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1309,00	$ 9.750.741,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**					
					$ 483.169.772,00		**$ 601.863.869,00**		**$ 22.229.798,33**	**3,69%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 125.624.141,00**		**$ 156.484.606,00**		**$ 5.779.747,57**	**3,69%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 4.831.698,00**		**$ 6.018.639,00**		**$ 222.297,98**	**3,69%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 28.990.186,00**		**$ 36.111.832,00**		**$ 1.333.787,90**	**3,69%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 159.446.025,00**		**$ 198.615.077,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 642.615.797,00**		**$ 800.478.946,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 5.403.728,00**		**$ -**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ -**			
					$ 659.459.203,00		**$ 800.478.946,00**		**$ 29.565.631,78**	**3,69%**
										3,69%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□N□7	Fecha de in□orme	del□	**2□d□ □□r□r□ d□2024**	al	**□d□ □ □r□□ d□2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	443,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□ d□ □□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.□	0□48□	0□48□	0□40□	0□40□	□0□08□
SEMANA No.4	7□58□	8□06□	6□□7□	6□77□	□1□29□
SEMANA No.5	□26□	11□□2□	2□74□	9□51□	□1□81□
SEMANA No.6	1□06□	12□□8□	0□89□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.7	4□40□	16□78□	□69□	14□08□	□2□70□
SEMANA No.8	0□00□	16□78□	0□00□	14□08□	□2□70□
SEMANA No.9	0□00□	16□78□	0□00□	14□08□	□2□70□
SEMANA No.10	0□00□	16□78□	0□00□	14□08□	□2□70□
SEMANA No.11	0□00□	16□78□	0□00□	14□08□	□2□70□
SEMANA No.12	0□00□	16□78□	0□00□	14□08□	□2□70□
SEMANA No.1□	0□00□	16□78□	0□00□	14□08□	□2□70□
SEMANA No.14	0□00□	16□78□	0□00□	14□08□	□2□70□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

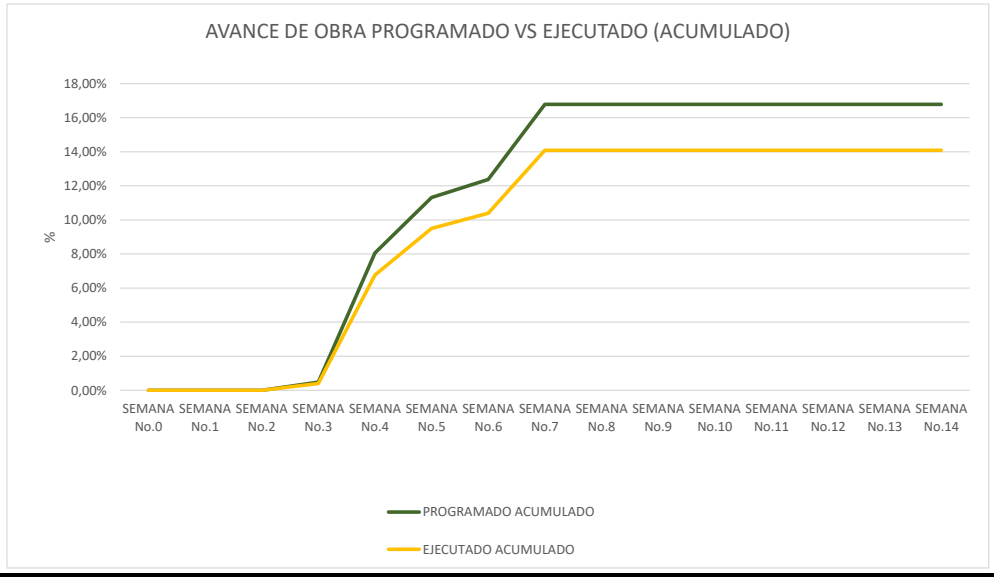

IN□ORME SEMANAL DE O□RA
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17

SEMANA N□	**7**	**DE**	**□□□□2□d□ □□r□r□d□2024**	**A**	**d□□ □□□□d□□ □r□□ d□2024**
□E□□A INI□IO□	16:12:2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19:04:2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022


□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□MATERIAL EN OBRA RAJON PARA CICLÓPEOS SUDS



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□PROTECCIÓN DE MATERIAL

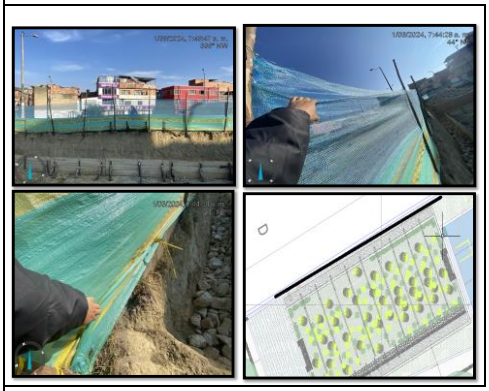

U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA □POLISOMBRA□ **RE□UER□O □OLINDAN□E SUDS**□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□ E□CAVACIÓN MEC□NICA □RETIRO □**50**



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□DESCAPOTE A M□QUINA NIVEL 0.00 □INC. RETIRO□E□□140M □E□CABACION SE AMPLIO POR CICLOPEOS Y MURO SUDS CON LOCALI□ACION Y REPLANTEO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□MATERIAL EN OBRA LADRILLO PARA MUROS SUDS

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.8		
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	8 PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00			
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00			
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	619,85	$ 1.636.404,00			
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00			
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		204,48	$ 14.962.211,00			
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	85,35	$ 9.380.306,40			
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	874,85	$ 9.759.827,00			
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	64,01	$ 10.023.518,00			
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	1176,65	$ 49.871.134,00			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	87,95	$ 14.637.519,00			
2,12	Relleno recebo comun	m3		$ 90.511,00	$ -	53,86	$ 4.874.922,00			
2,13	Relleno y comp.manual material comun sin sumin	m3		$ 39.283,00		362,20	$ 14.228.303,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso .3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	70,31	$ 72.268.485,00			
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,61	$ 4.882.103,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00		69,30	$ 37.998.992,00	10,40	$ 5.702.590,40	15,01%
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00		84,00	$ 926.100,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00		71,60	$ 7.492.367,00			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00		$ -			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00	135,55	$ 776.159,00			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00			
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00		$ -			
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -			
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	25,04	$ 2.473.101,00			
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,76	$ 1.001.363,00			
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	53,86	$ 7.938.749,00			
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	53,86	$ 10.291.084,00			
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	43,40	$ 2.206.109,00			
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	14,00	$ 711.648,00			
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	2,00	$ 80.411,00	$ 160.822,00	31,15	$ 2.504.803,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	35,90	$ 6.120.986,00			
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00		$ -			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00		$ -			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00		$ -			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00		$ -			
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00		$ -			
5,22	Caja de Inspección100x100x100+Exca	un		$ 997.443,00	$ -	1,00	$ 997.443,00			
5,23	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV	un		$ 740.261,00	$ -	2,00	$ 1.480.522,00			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	21,00	$ 600.474,00			
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,81	$ 1.575.360,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	32,96	$ 2.851.007,00			
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	119,05	$ 10.297.706,00			
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	404,30	$ 36.726.612,00			
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	45,29	$ 4.827.371,00			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00	$ -	54,00	$ 6.265.404,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	68,95	$ 39.031.354,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	21,00	$ 31.319.505,00			
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	40,00	$ 14.588.280,00			
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00			
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00		$ -			
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS .DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	558,44	$ 5.820.062,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	89,76	$ 8.807.610,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	55,85	$ 3.654.321,00			
11,50	Limo arolloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00		$ -			
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00			
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00			
11,90	Árbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	5,00	$ 3.663.280,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00			
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	1,00	$ 569.478,00			
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	4,00	$ 1.818.808,00			
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1309,00	$ 9.750.741,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**					
					$ 483.169.772,00		$ 601.863.869,00		$ 5.702.590,40	0,95%
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		$ 125.624.141,00		$ 156.484.606,00		$ 1.482.673,50	0,95%
	IMPREVISTOS		**1,00%**		$ 4.831.698,00		$ 6.018.639,00		$ 57.025,90	0,95%
	UTILIDAD		**6,00%**		$ 28.990.186,00		$ 36.111.832,00		$ 342.155,42	0,95%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 159.446.025,00		$ 198.615.077,00			
	COSTO TOTAL OBRA				$ 642.615.797,00		$ 800.478.946,00			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 5.403.728,00		$ -			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ -			
					$ 659.459.203,00		$ 800.478.946,00		$ 7.584.445,22	0,95%
										0,95%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□N□8	Fecha de in□orme	del□	**4 d□ □ □r□□ d□ 2024**	al	**10 d□ □ □r□□ d□ 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	450,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□ d□ □□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.□	0□48□	0□48□	0□40□	0□40□	□0□08□
SEMANA No.4	7□58□	8□06□	6□□7□	6□77□	□1□29□
SEMANA No.5	□26□	11□□2□	2□74□	9□51□	□1□81□
SEMANA No.6	1□06□	12□□8□	0□89□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.7	4□40□	16□78□	□69□	14□08□	□2□70□
SEMANA No.8	1□1□□	17□91□	0□95□	15□0□□	□2□88□
SEMANA No.9	0□00□	17□91□	0□00□	15□0□□	□2□88□
SEMANA No.10	0□00□	17□91□	0□00□	15□0□□	□2□88□
SEMANA No.11	0□00□	17□91□	0□00□	15□0□□	□2□88□
SEMANA No.12	0□00□	17□91□	0□00□	15□0□□	□2□88□
SEMANA No.1□	0□00□	17□91□	0□00□	15□0□□	□2□88□
SEMANA No.14	0□00□	17□91□	0□00□	15□0□□	□2□88□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

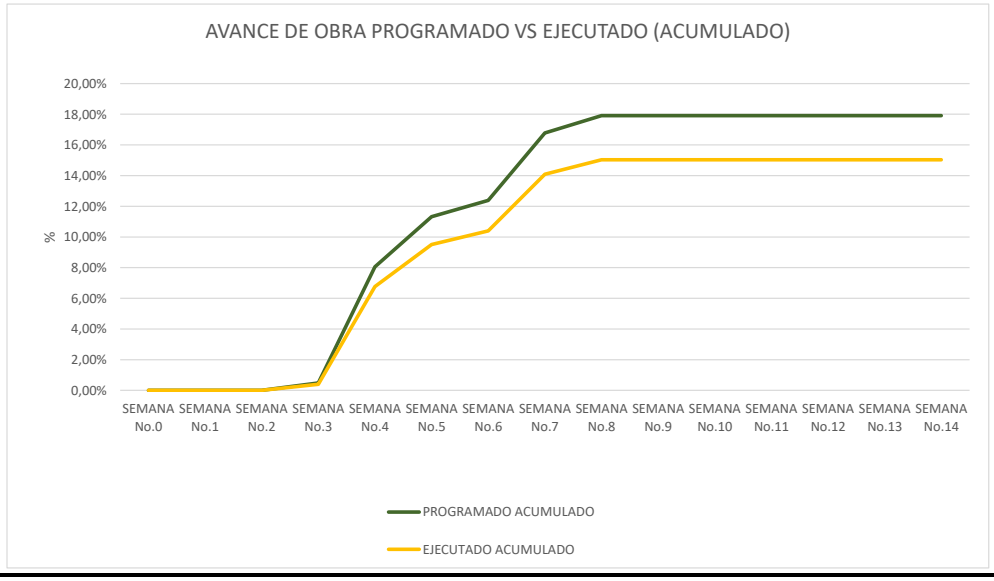

IN□ORME SEMANAL DE O□RA
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17

SEMANA N□	**8**	**DE**	**□□□□4 d□□ □r□□ d□2024**	**A**	**d□□ □□□□10 d□□ □r□□ d□2024**
□E□□A INI□IO□	16:12:2022	**□E□□A□ERMINA□ION□**	19:04:2024		

IDEN□I□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□TERRITORIO T17 – MATERIAL RAJON



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□FORMALETA PARA CICLÓPEO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□RIEGO DE RAJÓN CICLÓPEO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□□CONCRETO PARA CICLÓPEO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□CONCRETO PARA CICLÓPEO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□CONCRETO PARA CICLÓPEO

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.9		
										9
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00			
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00			
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	619,85	$ 1.636.404,00			
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00			
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		204,48	$ 14.962.211,00			
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	85,35	$ 9.380.306,40			
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	874,85	$ 9.759.827,00			
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	64,01	$ 10.023.518,00			
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	1176,65	$ 49.871.134,00			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	87,95	$ 14.637.519,00			
2,12	Relleno recebo comun	m3		$ 90.511,00	$ -	53,86	$ 4.874.922,00			
2,13	Relleno y comp.manual material comun sin sumin	m3		$ 39.283,00		362,20	$ 14.228.303,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	70,31	$ 72.268.485,00			
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,61	$ 4.882.103,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00		69,30	$ 37.998.992,00	28,40	$ 15.572.458,40	40,98%
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00		84,00	$ 926.100,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00		71,60	$ 7.492.367,00			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00		$ -			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00	135,55	$ 776.159,00			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00			
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00		$ -			
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -			
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	25,04	$ 2.473.101,00			
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,76	$ 1.001.363,00			
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	53,86	$ 7.938.749,00			
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	53,86	$ 10.291.084,00			
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	43,40	$ 2.206.109,00			
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	14,00	$ 711.648,00			
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	2,00	$ 80.411,00	$ 160.822,00	31,15	$ 2.504.803,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	35,90	$ 6.120.986,00			
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00		$ -			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00		$ -			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00		$ -			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00		$ -			
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00		$ -			
5,22	Caja de Inspección100x100x100+Exca	un		$ 997.443,00	$ -	1,00	$ 997.443,00			
5,23	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV	un		$ 740.261,00	$ -	2,00	$ 1.480.522,00			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	21,00	$ 600.474,00			
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,81	$ 1.575.360,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	32,96	$ 2.851.007,00			
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	119,05	$ 10.297.706,00			
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	404,30	$ 36.726.612,00			
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	45,29	$ 4.827.371,00			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00	$ -	54,00	$ 6.265.404,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	68,95	$ 39.031.354,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	21,00	$ 31.319.505,00			
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	40,00	$ 14.588.280,00			
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00			
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00		$ -			
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	558,44	$ 5.820.062,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	89,76	$ 8.807.610,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	55,85	$ 3.654.321,00			
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00		$ -			
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00			
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00			
11,90	Árbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	5,00	$ 3.663.280,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00			
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	1,00	$ 569.478,00			
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	4,00	$ 1.818.808,00			
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1309,00	$ 9.750.741,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**					
					$ 483.169.772,00		$ 601.863.869,00		$ 15.572.458,40	2,59%
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		$ 125.624.141,00		$ 156.484.606,00		$ 4.048.839,18	2,59%
	IMPREVISTOS		**1,00%**		$ 4.831.698,00		$ 6.018.639,00		$ 155.724,58	2,59%
	UTILIDAD		**6,00%**		$ 28.990.186,00		$ 36.111.832,00		$ 934.347,50	2,59%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 159.446.025,00		$ 198.615.077,00			
	COSTO TOTAL OBRA				$ 642.615.797,00		$ 800.478.946,00			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 5.403.728,00		$ -			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ -			
					$ 659.459.203,00		$ 800.478.946,00		$ 20.711.369,66	2,59%
										2,59%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□N□9	Fecha de in□orme	del□	**11 d□ □ □r□□ d□2024**	al	**17 d□ □ □r□□ d□2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	457,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□ d□ □□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.□	0□48□	0□48□	0□40□	0□40□	□0□08□
SEMANA No.4	7□58□	8□06□	6□□7□	6□77□	□1□29□
SEMANA No.5	□26□	11□□2□	2□74□	9□51□	□1□81□
SEMANA No.6	1□06□	12□□8□	0□89□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.7	4□40□	16□78□	□69□	14□08□	□2□70□
SEMANA No.8	1□1□□	17□91□	0□95□	15□0□□	□2□88□
SEMANA No.9	□08□	20□99□	2□59□	17□62□	□□□7□
SEMANA No.10	0□00□	20□99□	0□00□	17□62□	□□□7□
SEMANA No.11	0□00□	20□99□	0□00□	17□62□	□□□7□
SEMANA No.12	0□00□	20□99□	0□00□	17□62□	□□□7□
SEMANA No.1□	0□00□	20□99□	0□00□	17□62□	□□□7□
SEMANA No.14	0□00□	20□99□	0□00□	17□62□	□□□7□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

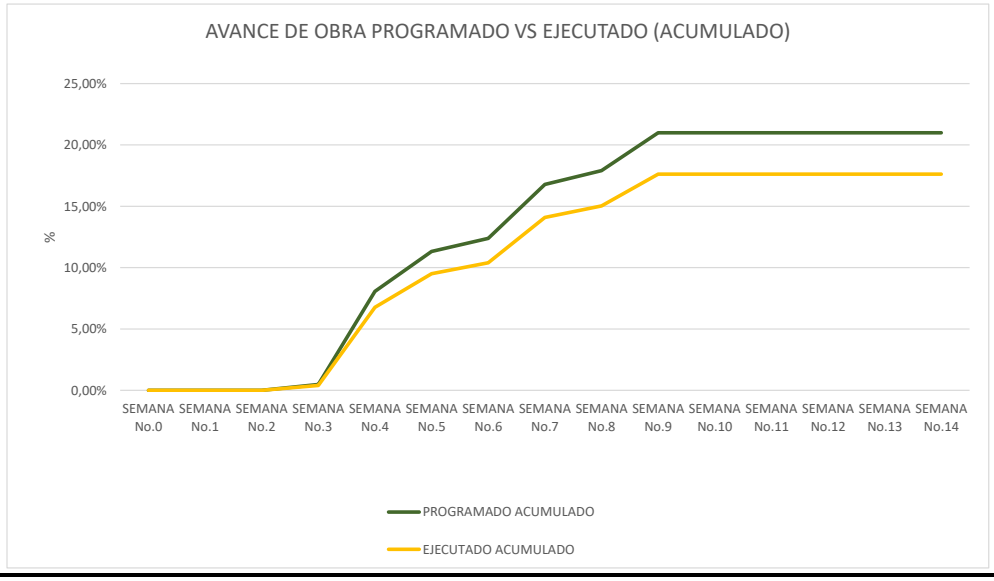

IN□ORME SEMANAL DE O□RA
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17


SEMANA N□	**9**	**DE**	□□□□□**11 d**□□ □r□□ **d□2024**	**A**	**d**□□ □□□□**17 d**□□ □r□□ **d□2024**
□E□□A INI□IO□	16□12□2022	**□E□□A□ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".

IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O

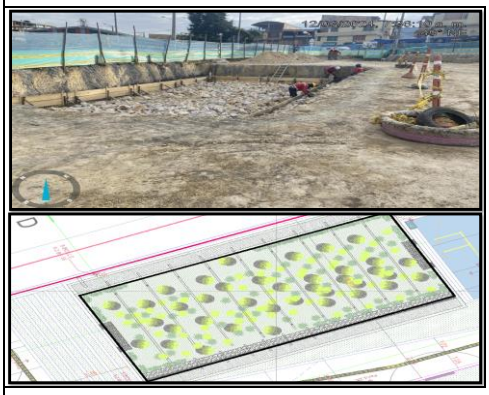

U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□RELLENO DE RAJÓN MANUAL



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□CONCRETO CICLOPEO □000 PSI CIMENTAC□FORMALETA□SUDS□



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□**MA□ERIAL EN O□RA**



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□**MA□ERIAL EN O□RA**



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□OBRA TERRITORIO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□TOMA DE MEDIDAS EN SITIO

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.10		
										10
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00			
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00			
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	619,85	$ 1.636.404,00			
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00			
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		204,48	$ 14.962.211,00			
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	85,35	$ 9.380.306,40			
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	874,85	$ 9.759.827,00			
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	64,01	$ 10.023.518,00			
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	1176,65	$ 49.871.134,00			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	87,95	$ 14.637.519,00	85,90	$ 14.296.337,00	97,67%
2,12	Relleno recebo comun	m3		$ 90.511,00	$ -	53,86	$ 4.874.922,00			
2,13	Relleno y comp.manual malerial comun sin sumin	m3		$ 39.283,00		362,20	$ 14.228.303,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	70,31	$ 72.268.485,00	3,12	$ 3.206.907,60	4,44%
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,61	$ 4.882.103,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00		69,30	$ 37.998.992,00			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00		84,00	$ 926.100,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00		71,60	$ 7.492.367,00			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00		$ -			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00	135,55	$ 776.159,00			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00			
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00		$ -			
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -			
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	25,04	$ 2.473.101,00			
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,76	$ 1.001.363,00			
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	53,86	$ 7.938.749,00			
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	53,86	$ 10.291.084,00			
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	43,40	$ 2.206.109,00			
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	14,00	$ 711.648,00			
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	2,00	$ 80.411,00	$ 160.822,00	31,15	$ 2.504.803,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	35,90	$ 6.120.986,00			
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00		$ -			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00		$ -			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00		$ -			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00		$ -			
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00		$ -			
5,22	Caja de Inspección100x100x100+Exca	un		$ 997.443,00	$ -	1,00	$ 997.443,00			
5,23	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV	un		$ 740.261,00	$ -	2,00	$ 1.480.522,00			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	21,00	$ 600.474,00			
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,81	$ 1.575.360,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	32,96	$ 2.851.007,00			
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	119,05	$ 10.297.706,00			
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	404,30	$ 36.726.612,00			
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	45,29	$ 4.827.371,00			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00	$ -	54,00	$ 6.265.404,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	68,95	$ 39.031.354,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	21,00	$ 31.319.505,00			
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	40,00	$ 14.588.280,00			
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00			
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00		$ -			
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS .DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	558,44	$ 5.820.062,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	89,76	$ 8.807.610,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	55,85	$ 3.654.321,00			
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00		$ -			
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00			
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00			
11,90	Árbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	5,00	$ 3.663.280,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00			
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	1,00	$ 569.478,00			
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	4,00	$ 1.818.808,00			
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1309,00	$ 9.750.741,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**					
					$ 483.169.772,00		**$ 601.863.869,00**		**$ 17.503.244,60**	**2,91%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 125.624.141,00**		**$ 156.484.606,00**		**$ 4.550.843,60**	**2,91%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 4.831.698,00**		**$ 6.018.639,00**		**$ 175.032,45**	**2,91%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 28.990.186,00**		**$ 36.111.832,00**		**$ 1.050.194,68**	**2,91%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 159.446.025,00**		**$ 198.615.077,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 642.615.797,00**		**$ 800.478.946,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 5.403.728,00**		**$ -**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ -**			
					$ 659.459.203,00		**$ 800.478.946,00**		**$ 23.279.315,33**	**2,91%**
										2,91%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□N□10	Fecha de in□orme	del□	**18 d□ □ □r□□ d□ 2024**	al	**24 d□ □ □r□□ d□ 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	464,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.□	0□48□	0□48□	0□40□	0□40□	□0□08□
SEMANA No.4	7□58□	8□06□	6□□7□	6□77□	□1□29□
SEMANA No.5	□□26□	11□□2□	2□74□	9□51□	□1□81□
SEMANA No.6	1□06□	12□□8□	0□89□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.7	4□40□	16□78□	□□69□	14□08□	□2□70□
SEMANA No.8	1□1□□	17□91□	0□95□	15□0□□	□2□88□
SEMANA No.9	□□08□	20□99□	2□59□	17□62□	□□□□7□
SEMANA No.10	□□65□	24□64□	2□91□	20□5□□	□4□11□
SEMANA No.11	0□00□	24□64□	0□00□	20□5□□	□4□11□
SEMANA No.12	0□00□	24□64□	0□00□	20□5□□	□4□11□
SEMANA No.1□	0□00□	24□64□	0□00□	20□5□□	□4□11□
SEMANA No.14	0□00□	24□64□	0□00□	20□5□□	□4□11□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

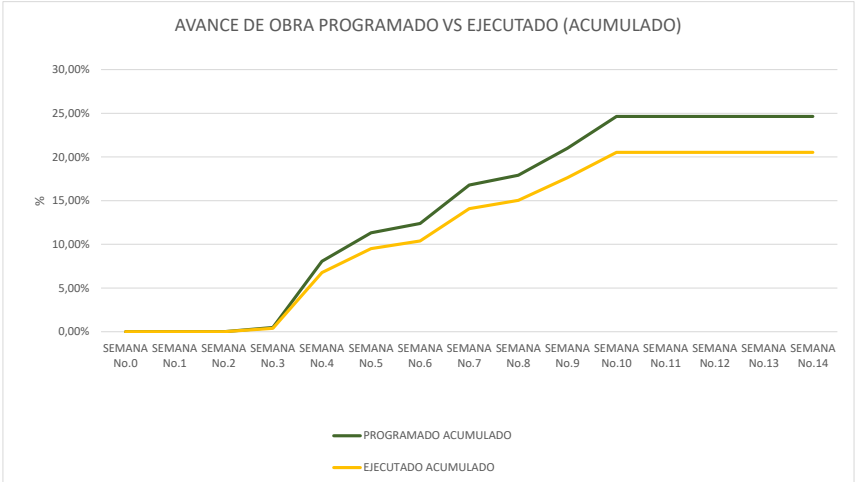

IN□ORME SEMANAL DE O□RA
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17


SEMANA N□	**10**	**DE**	**□□□□□18 d□ □ □r□□ d□2024**	**A**	**d□□ □□□□24 d□ □ □r□□ d□2024**
□E□□A INI□IO□	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".

IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O

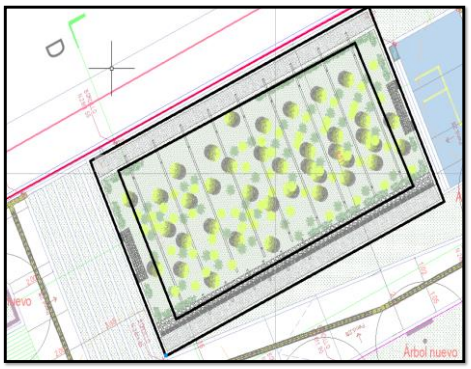

U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□**OMEN□□ARIOS**□PLACA CONTRAPISO □000 PSI 21MPA E□15 SUDS



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□**OMEN□□ARIOS**□PLACA CONTRAPISO □000 PSI 21MPA E□15 SUDS □**AMA DE MEDIDAS**



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□**OMEN□□ARIOS**□PLACA CONTRAPISO □000 PSI 21MPA E□15 SUDS



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□**OMEN□□ARIOS**□PLACA CONTRAPISO □000 PSI 21MPA E□15 SUDS□AMARRADO DE ACERO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□**OMEN□□ARIOS**□REPLANTEO □ONAS DURAS



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□**OMEN□□ARIOS**□REPLANTEO □ONAS DURAS

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.11		
										11
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00			
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00			
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	619,85	$ 1.636.404,00			
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00			
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		204,48	$ 14.962.211,00			
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	85,35	$ 9.380.306,40			
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	874,85	$ 9.759.827,00			
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	64,01	$ 10.023.518,00			
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	1176,65	$ 49.871.134,00			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	87,95	$ 14.637.519,00			
2,12	Relleno recebo comun	m3		$ 90.511,00	$ -	53,86	$ 4.874.922,00			
2,13	Relleno y comp.manual material comun sin sumin	m3		$ 39.283,00		362,20	$ 14.228.303,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	70,31	$ 72.268.485,00			
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,61	$ 4.882.103,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00		69,30	$ 37.998.992,00			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00		84,00	$ 926.100,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00		71,60	$ 7.492.367,00			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00		$ -			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00	135,55	$ 776.159,00			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00			
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00		$ -			
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -			
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	25,04	$ 2.473.101,00			
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,76	$ 1.001.363,00			
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	53,86	$ 7.938.749,00			
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	53,86	$ 10.291.084,00			
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	43,40	$ 2.206.109,00			
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	14,00	$ 711.648,00			
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	2,00	$ 80.411,00	$ 160.822,00	31,15	$ 2.504.803,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	35,90	$ 6.120.986,00			
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00		$ -			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00		$ -			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00		$ -			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00		$ -			
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00		$ -			
5,22	Caja de Inspección100x100x100+Exca	un		$ 997.443,00	$ -	1,00	$ 997.443,00			
5,23	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV	un		$ 740.261,00	$ -	2,00	$ 1.480.522,00			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	21,00	$ 600.474,00			
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,81	$ 1.575.360,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	32,96	$ 2.851.007,00			
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	119,05	$ 10.297.706,00			
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	404,30	$ 36.726.612,00	74,37	$ 6.755.697,02	18,39%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	45,29	$ 4.827.371,00			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00	$ -	54,00	$ 6.265.404,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	68,95	$ 39.031.354,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00	2,00	$ 1.259.220,00	50,00%
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	21,00	$ 31.319.505,00	10,00	$ 14.914.050,00	47,62%
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00	0,50	$ 17.237.500,00	50,00%
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	40,00	$ 14.588.280,00	14,50	$ 5.288.251,50	36,25%
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,50	$ 2.478.166,00	50,00%
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,50	$ 2.478.166,00	50,00%
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00	0,50	$ 1.516.166,00	50,00%
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00	0,50	$ 2.029.166,00	50,00%
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00	1,00	$ 1.541.585,00	50,00%
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00	2,00	$ 1.140.924,00	50,00%
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00		$ -		$ -	
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS .DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00	0,50	$ 6.825.840,00	50,00%
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	558,44	$ 5.820.062,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	89,76	$ 8.807.610,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	55,85	$ 3.654.321,00			
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00		$ -			
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00			
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00			
11,90	Árbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	5,00	$ 3.663.280,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	0,50	$ 148.387,00	50,00%
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00	1,00	$ 296.774,00	50,00%
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	1,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00	100,00%
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	4,00	$ 1.818.808,00	1,50	$ 682.053,00	37,50%
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1309,00	$ 9.750.741,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**					
					$ 483.169.772,00		**$ 601.863.869,00**		**$ 65.161.423,52**	**10,83%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 125.624.141,00**		**$ 156.484.606,00**		**$ 16.941.970,12**	**10,83%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 4.831.698,00**		**$ 6.018.639,00**		**$ 651.614,24**	**10,83%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 28.990.186,00**		**$ 36.111.832,00**		**$ 3.909.685,41**	**10,83%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 159.446.025,00**		**$ 198.615.077,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 642.615.797,00**		**$ 800.478.946,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 5.403.728,00**		**$ -**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ -**			
					$ 659.459.203,00		**$ 800.478.946,00**		**$ 86.664.693,29**	**10,83%**
										10,83%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□N□11	Fecha de in□orme	del□	**25 d□ □ □r□□ d□ 2024**	al	**□1 d□ □ □r□□ d□ 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	471,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.□	0□48□	0□48□	0□40□	0□40□	□0□08□
SEMANA No.4	7□58□	8□06□	6□□7□	6□77□	□1□29□
SEMANA No.5	□□26□	11□□2□	2□74□	9□51□	□1□81□
SEMANA No.6	1□06□	12□□8□	0□89□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.7	4□40□	16□78□	□□69□	14□08□	□2□70□
SEMANA No.8	1□1□□	17□91□	0□95□	15□0□□	□2□88□
SEMANA No.9	□□08□	20□99□	2□59□	17□62□	□□□□7□
SEMANA No.10	□□65□	24□64□	2□91□	20□5□□	□4□11□
SEMANA No.11	14□80□	□9□44□	10□8□□	□1□□5□	□8□09□
SEMANA No.12	0□00□	□9□44□	0□00□	□1□□5□	□8□09□
SEMANA No.1□	0□00□	□9□44□	0□00□	□1□□5□	□8□09□
SEMANA No.14	0□00□	□9□44□	0□00□	□1□□5□	□8□09□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

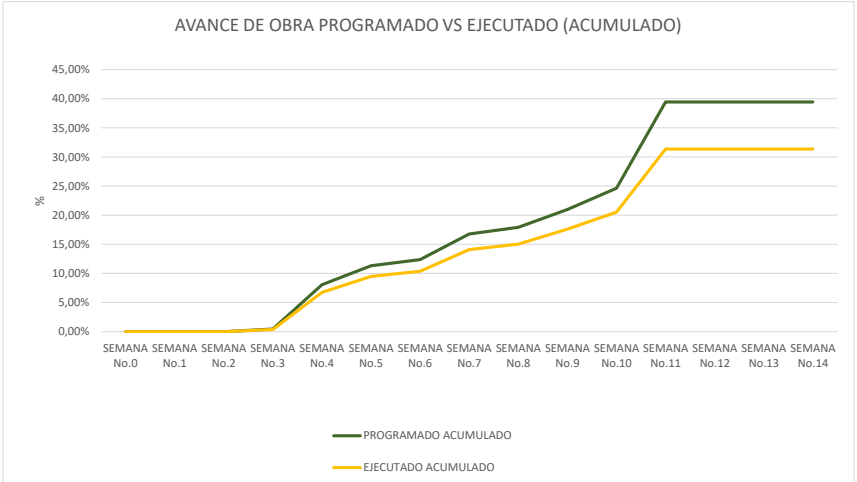

IN□ORME SEMANAL DE O□RA
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17

SEMANA N□	**11**	**DE**	**□□□□□ 25 d□ □ □r□□ d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□□1 d□ □ □r□□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□□N DE LA O□RA


O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□SUMINISTRO DE MOBILIARIO





U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□SUMINISTRO DE MOBILIARIO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□PLACA PARA INCIO DE MAMPOSTERIA



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□□SUMINITR DE BORDILLO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□INICIO DE MAMPOSTERIA



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□E□CAVACION TUBERIA □ONA SUDS□TUBO DE SALIDA

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.12		
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	12 PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00			
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00			
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	619,85	$ 1.636.404,00			
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00			
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		204,48	$ 14.962.211,00			
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	85,35	$ 9.380.306,40			
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	874,85	$ 9.759.827,00			
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	64,01	$ 10.023.518,00			
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	1176,65	$ 49.871.134,00			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	87,95	$ 14.637.519,00	2,05	$ 341.181,50	2,33%
2,12	Relleno recebo comun	m3		$ 90.511,00	$ -	53,86	$ 4.874.922,00			
2,13	Relleno y comp.manual material comun sin sumin	m3		$ 39.283,00		362,20	$ 14.228.303,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso .3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	70,31	$ 72.268.485,00	3,18	$ 3.268.578,90	4,52%
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,61	$ 4.882.103,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00		69,30	$ 37.998.992,00	4,62	$ 2.533.266,32	6,67%
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00		84,00	$ 926.100,00	72,00	$ 793.800,00	85,71%
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00		71,60	$ 7.492.367,00			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00		$ -			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00	135,55	$ 776.159,00	17,95	$ 102.782,20	13,24%
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00			
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00		$ -			
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -			
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	25,04	$ 2.473.101,00			
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,76	$ 1.001.363,00			
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	53,86	$ 7.938.749,00			
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	53,86	$ 10.291.084,00			
5,80	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	43,40	$ 2.206.109,00			
5,90	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	14,00	$ 711.648,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	2,00	$ 80.411,00	$ 160.822,00	31,15	$ 2.504.803,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	35,90	$ 6.120.986,00			
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00		$ -			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00		$ -			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00		$ -			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00		$ -			
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00		$ -			
5,22	Caja de Inspección100x100x100+Exca	un		$ 997.443,00	$ -	1,00	$ 997.443,00			
5,23	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV	un		$ 740.261,00	$ -	2,00	$ 1.480.522,00			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	21,00	$ 600.474,00			
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,81	$ 1.575.360,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	32,96	$ 2.851.007,00			
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	119,05	$ 10.297.706,00			
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	404,30	$ 36.726.612,00			
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	45,29	$ 4.827.371,00	45,29	$ 4.827.370,52	100,00%
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00	$ -	54,00	$ 6.265.404,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	68,95	$ 39.031.354,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00	1,60	$ 1.007.376,00	40,00%
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	21,00	$ 31.319.505,00	6,00	$ 8.948.430,00	28,57%
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00	0,40	$ 13.790.000,00	40,00%
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	40,00	$ 14.588.280,00	16,00	$ 5.835.312,00	40,00%
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,40	$ 1.982.532,80	40,00%
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,40	$ 1.982.532,80	40,00%
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00	0,40	$ 1.212.932,80	40,00%
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00	0,40	$ 1.623.332,80	40,00%
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00	0,70	$ 1.079.109,50	35,00%
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00	1,50	$ 855.693,00	37,50%
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00		$ -		$ -	
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS .DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00	0,04	$ 546.067,20	4,00%
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	558,44	$ 5.820.062,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	89,76	$ 8.807.610,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	55,85	$ 3.654.321,00			
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00		$ -			
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00			
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00			
11,90	Árbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	5,00	$ 3.663.280,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	0,40	$ 118.709,60	40,00%
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00	0,70	$ 207.741,80	35,00%
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	1,00	$ 569.478,00	0,70	$ 398.634,60	70,00%
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	4,00	$ 1.818.808,00	1,00	$ 454.702,00	25,00%
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1309,00	$ 9.750.741,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**					
					$ 483.169.772,00		**$ 601.863.869,00**		**$ 51.910.086,34**	**8,62%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 125.624.141,00**		**$ 156.484.606,00**		**$ 13.496.622,45**	**8,62%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 4.831.698,00**		**$ 6.018.639,00**		**$ 519.100,86**	**8,62%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 28.990.186,00**		**$ 36.111.832,00**		**$ 3.114.605,18**	**8,62%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 159.446.025,00**		**$ 198.615.077,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 642.615.797,00**		**$ 800.478.946,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 5.403.728,00**		**$ -**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ -**			
					$ 659.459.203,00		**$ 800.478.946,00**		**$ 69.040.414,83**	**8,62%**
										8,62%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□N□12	Fecha de in□orme	del□	**1 d□ □□r□□d□2024**	al	**7 d□ □□r□□d□2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	478,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.□	0□48□	0□48□	0□40□	0□40□	□0□08□
SEMANA No.4	7□58□	8□06□	6□□7□	6□77□	□1□29□
SEMANA No.5	□□26□	11□□2□	2□74□	9□51□	□1□81□
SEMANA No.6	1□06□	12□□8□	0□89□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.7	4□40□	16□78□	□69□	14□08□	□2□70□
SEMANA No.8	1□1□□	17□91□	0□95□	15□0□□	□2□88□
SEMANA No.9	□□08□	20□99□	2□59□	17□62□	□□□□7□
SEMANA No.10	□□65□	24□64□	2□91□	20□5□□	□4□11□
SEMANA No.11	14□80□	□9□44□	10□8□□	□1□□5□	□8□09□
SEMANA No.12	11□21□	50□65□	8□62□	□9□98□	□10□67□
SEMANA No.1□	0□00□	50□65□	0□00□	□9□98□	□10□67□
SEMANA No.14	0□00□	50□65□	0□00□	□9□98□	□10□67□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

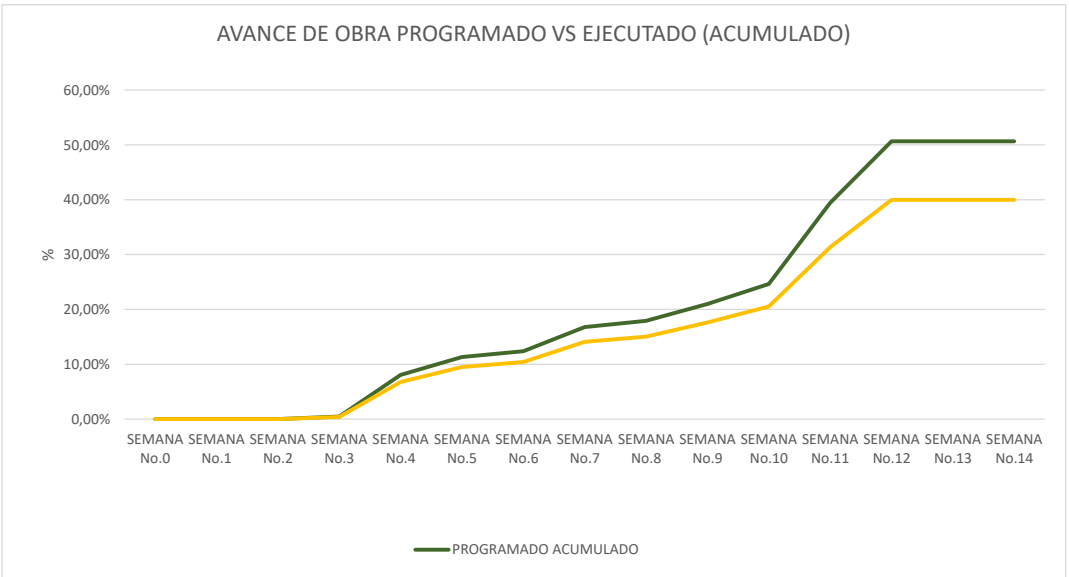


	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□ N□12	Fecha de in□orme	del□	**1 d□ □□r□d□ 2024**	al	**7 d□ □□r□d□ 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	478,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00

2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL



IN□ORME SEMANAL DE O□RA
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17

SEMANA N□	**12**	**DE**	**□□□□□1 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□7 d□ □□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9.2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4.0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□SUMINISTRO BORDILLO DEMARCADOR



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□CONSTRUCCION SODS



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□MURO EN BLOQUE Y PLACA CONTRAPISO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□ RELLENO RAJON MANUAL



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.13		
										13
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00			
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00			
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	619,85	$ 1.636.404,00			
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00			
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		204,48	$ 14.962.211,00			
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	85,35	$ 9.380.306,40	35,00	$ 3.846.640,00	41,01%
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	874,85	$ 9.759.827,00			
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	64,01	$ 10.023.518,00			
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	1176,65	$ 49.871.134,00			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	87,95	$ 14.637.519,00			
2,12	Relleno recebo comun	m3		$ 90.511,00	$ -	53,86	$ 4.874.922,00			
2,13	Relleno y comp.manual material comun sin sumin	m3		$ 39.283,00		362,20	$ 14.228.303,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	70,31	$ 72.268.485,00			
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,61	$ 4.882.103,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00		69,30	$ 37.998.992,00		$ -	
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00		84,00	$ 926.100,00		$ -	
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00		71,60	$ 7.492.367,00			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00		$ -		$ -	
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00	135,55	$ 776.159,00		$ -	
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00		$ -	
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00		$ -		$ -	
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -		$ -	
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	25,04	$ 2.473.101,00		$ -	
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,76	$ 1.001.363,00		$ -	
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	53,86	$ 7.938.749,00		$ -	
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	53,86	$ 10.291.084,00		$ -	
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	43,40	$ 2.206.109,00		$ -	
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	14,00	$ 711.648,00		$ -	
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	2,00	$ 80.411,00	$ 160.822,00	31,15	$ 2.504.803,00		$ -	
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	35,90	$ 6.120.986,00		$ -	
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00		$ -		$ -	
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -		$ -	
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00		$ -		$ -	
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00		$ -		$ -	
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -		$ -	
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -		$ -	
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00		$ -		$ -	
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00		$ -		$ -	
5,22	Caja de Inspección100x100x100+Exca	un		$ 997.443,00	$ -	1,00	$ 997.443,00		$ -	
5,23	Caja de inspecion .80x.80 h=1.0+ExcaV	un		$ 740.261,00	$ -	2,00	$ 1.480.522,00		$ -	
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	21,00	$ 600.474,00			
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,81	$ 1.575.360,00		$ -	
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	32,96	$ 2.851.007,00		$ -	
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	119,05	$ 10.297.706,00		$ -	
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	404,30	$ 36.726.612,00	65,00	$ 5.904.600,00	16,08%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	45,29	$ 4.827.371,00			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00	$ -	54,00	$ 6.265.404,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	68,95	$ 39.031.354,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	21,00	$ 31.319.505,00			
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	40,00	$ 14.588.280,00			
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00			
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00		$ -			
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS .DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	558,44	$ 5.820.062,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	89,76	$ 8.807.610,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	55,85	$ 3.654.321,00			
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00		$ -			
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00			
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00			
11,90	Árbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	5,00	$ 3.663.280,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00			
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	1,00	$ 569.478,00			
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	4,00	$ 1.818.808,00			
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1309,00	$ 9.750.741,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**					
					$ **483.169.772,00**		$ **601.863.869,00**		$ **9.751.240,00**	**1,62%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		$ **125.624.141,00**		$ **156.484.606,00**		$ **2.535.322,40**	**1,62%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		$ **4.831.698,00**		$ **6.018.639,00**		$ **97.512,40**	**1,62%**
	UTILIDAD		**6,00%**		$ **28.990.186,00**		$ **36.111.832,00**		$ **585.074,40**	**1,62%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ **159.446.025,00**		$ **198.615.077,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				$ **642.615.797,00**		$ **800.478.946,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ **5.403.728,00**		$ -			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ **11.439.678,00**		$ -			
					$ **659.459.203,00**		$ **800.478.946,00**		$ **12.969.149,20**	**1,62%**
										1,62%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□N□1□	Fecha de in□orme	del□	**8 d□ □□r□□d□2024**	al	**14 d□ □□r□d□2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	485,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.□	0□48□	0□48□	0□40□	0□40□	□0□08□
SEMANA No.4	7□58□	8□06□	6□□7□	6□77□	□1□29□
SEMANA No.5	□□26□	11□□2□	2□74□	9□51□	□1□81□
SEMANA No.6	1□06□	12□□8□	0□89□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.7	4□40□	16□78□	□69□	14□08□	□2□70□
SEMANA No.8	1□1□□	17□91□	0□95□	15□0□□	□2□88□
SEMANA No.9	□□08□	20□99□	2□59□	17□62□	□□□□7□
SEMANA No.10	□□65□	24□64□	2□91□	20□5□□	□4□11□
SEMANA No.11	14□80□	□9□44□	10□8□□	□1□□5□	□8□09□
SEMANA No.12	11□21□	50□65□	8□62□	□9□98□	□10□67□
SEMANA No.1□	1□9□□	52□58□	1□62□	41□60□	□10□98□
SEMANA No.14	0□00□	52□58□	0□00□	41□60□	□10□98□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

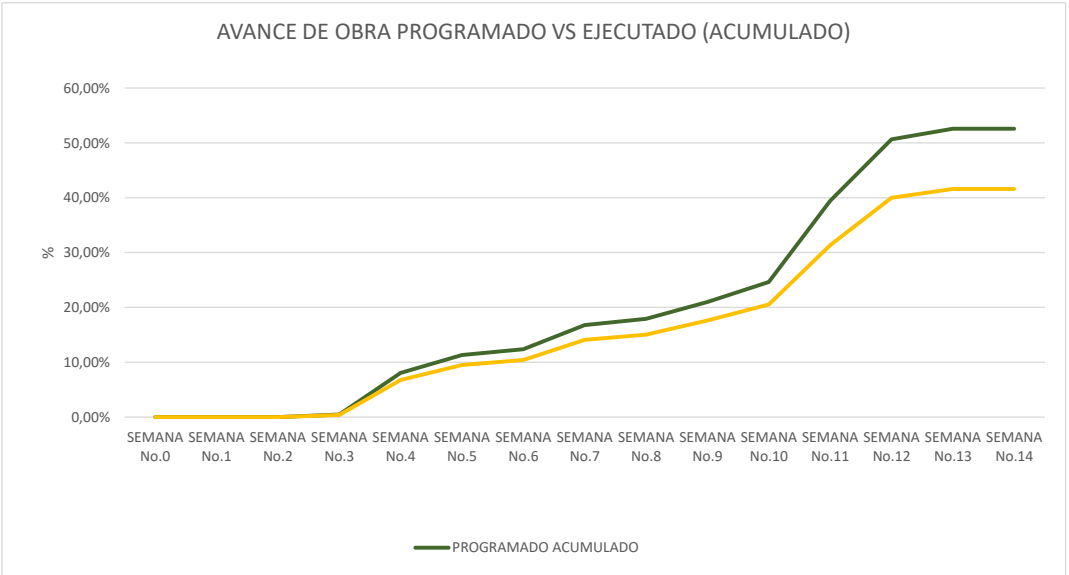

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□ N□1□	Fecha de in□orme	del□	**8 d□ □□r□d□ 2024**	al	**14 d□ □□r□d□ 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	485,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00

2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

EJECUTADO ACUMULADO


IN□ORME SEMANAL DE O□RA
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17

SEMANA N□	1□	**DE**	□□□□□8 d□ □□r□d□2024	**A**	d□□ □□□□□14 d□ □□r□d□2024
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA


O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O

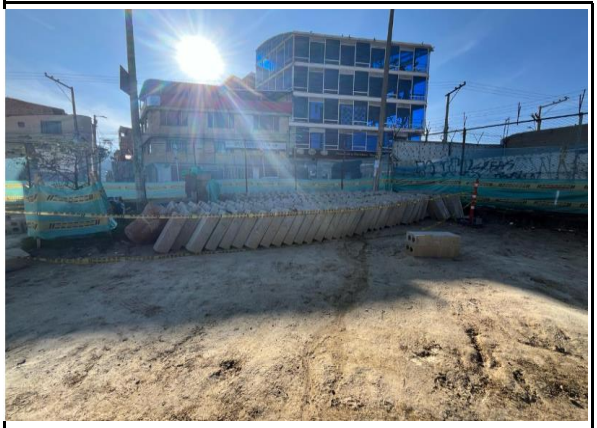

U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□SUMINISTRO BORDILLO DEMARCADOR

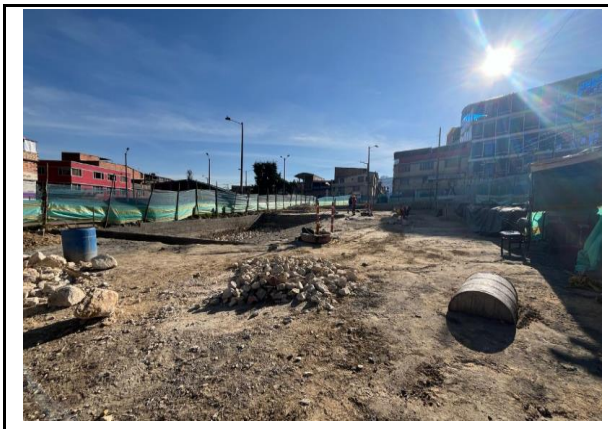


U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□CONSTRUCCION SODS




U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□RELLENO RAJON MANUAL

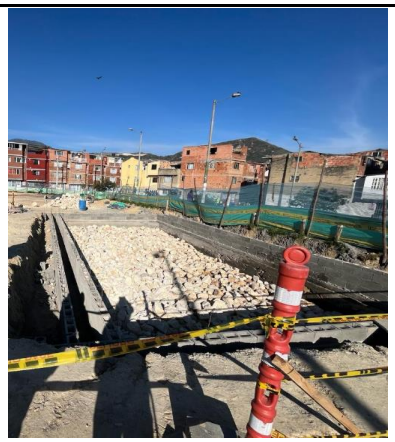

U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□ RELLENO RAJON MANUAL

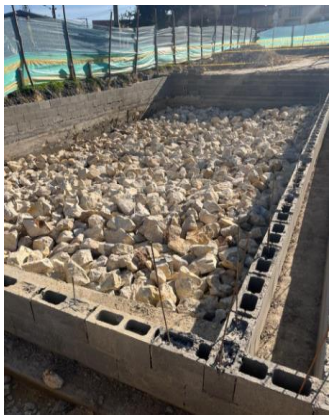

U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.14		
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	14 PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00			
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00			
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	619,85	$ 1.636.404,00			
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00			
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		204,48	$ 14.962.211,00	2,24	$ 163.905,28	1,10%
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	85,35	$ 9.380.306,40			
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	874,85	$ 9.759.827,00	400,00	$ 4.462.400,00	45,72%
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	64,01	$ 10.023.518,00	37,20	$ 5.825.259,60	58,12%
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	1176,65	$ 49.871.134,00			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	87,95	$ 14.637.519,00			
2,12	Relleno recebo comun	m3		$ 90.511,00	$ -	53,86	$ 4.874.922,00	29,62	$ 2.680.935,82	54,99%
2,13	Relleno y comp.manual material comun sin sumin	m3		$ 39.283,00		362,20	$ 14.228.303,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	70,31	$ 72.268.485,00			
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,61	$ 4.882.103,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00		69,30	$ 37.998.992,00			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00		84,00	$ 926.100,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00		71,60	$ 7.492.367,00	71,60	$ 7.492.367,20	100,00%
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00		$ -			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00	135,55	$ 776.159,00		$ -	
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00			
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00		$ -			
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -			
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	25,04	$ 2.473.101,00			
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,76	$ 1.001.363,00	89,76	$ 1.001.362,56	100,00%
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	53,86	$ 7.938.749,00	24,27	$ 3.577.300,92	45,06%
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	53,86	$ 10.291.084,00	4,05	$ 773.837,55	7,52%
5,80	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	43,40	$ 2.206.109,00	35,00	$ 1.779.120,00	80,65%
5,90	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	14,00	$ 711.648,00	15,00	$ 762.480,00	107,14%
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	2,00	$ 80.411,00	$ 160.822,00	31,15	$ 2.504.803,00	4,00	$ 321.644,00	12,84%
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	35,90	$ 6.120.986,00			
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00		$ -			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00		$ -			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00		$ -			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00		$ -			
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00		$ -		$ -	
5,22	Caja de Inspección100x100x100+Exca	un		$ 997.443,00	$ -	1,00	$ 997.443,00		$ -	
5,23	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV	un		$ 740.261,00	$ -	2,00	$ 1.480.522,00	2,00	$ 1.480.522,00	100,00%
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	21,00	$ 600.474,00			
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,81	$ 1.575.360,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	32,96	$ 2.851.007,00			
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	119,05	$ 10.297.706,00			
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	404,30	$ 36.726.612,00	56,00	$ 5.087.040,00	13,85%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	45,29	$ 4.827.371,00			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00	$ -	54,00	$ 6.265.404,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	68,95	$ 39.031.354,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	21,00	$ 31.319.505,00			
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	40,00	$ 14.588.280,00			
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00			
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00		$ -			
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS .DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	558,44	$ 5.820.062,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	89,76	$ 8.807.610,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	55,85	$ 3.654.321,00			
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00		$ -			
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00			
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00			
11,90	Árbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	5,00	$ 3.663.280,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00			
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	1,00	$ 569.478,00			
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	4,00	$ 1.818.808,00			
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1309,00	$ 9.750.741,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**					
					$ 483.169.772,00		$ 601.863.869,00		$ 35.408.174,93	5,88%
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 125.624.141,00**		**$ 156.484.606,00**		**$ 9.206.125,48**	**5,88%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 4.831.698,00**		**$ 6.018.639,00**		**$ 354.081,75**	**5,88%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 28.990.186,00**		**$ 36.111.832,00**		**$ 2.124.490,50**	**5,88%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 159.446.025,00**		**$ 198.615.077,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 642.615.797,00**		**$ 800.478.946,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 5.403.728,00**		**$ -**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ -**			
					$ 659.459.203,00		**$ 800.478.946,00**		**$ 47.092.872,66**	**5,88%**
										5,88%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□N□14	Fecha de in□orme	del□	14 d□ □□r□d□ 2024	al	20 d□ □□r□d□ 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN No.1	19 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No.2	19 de mayo de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	491,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.□	0□48□	0□48□	0□40□	0□40□	□0□08□
SEMANA No.4	7□58□	8□06□	6□□7□	6□77□	1□29□
SEMANA No.5	□26□	11□□2□	2□74□	9□51□	1□81□
SEMANA No.6	1□06□	12□□8□	0□89□	10□□9□	1□99□
SEMANA No.7	4□40□	16□78□	□69□	14□08□	2□70□
SEMANA No.8	1□1□□	17□91□	0□95□	15□0□□	2□88□
SEMANA No.9	□08□	20□99□	2□59□	17□62□	□□□7□
SEMANA No.10	□65□	24□64□	2□91□	20□5□□	4□11□
SEMANA No.11	14□80□	□9□44□	10□8□□	□1□□5□	8□09□
SEMANA No.12	11□21□	50□65□	8□62□	□9□98□	□10□67□
SEMANA No.1□	1□9□□	52□58□	1□62□	41□60□	□10□98□
SEMANA No.14	6□□6□	58□94□	5□88□	47□48□	□11□46□
SEMANA No.15	0□00□	58□94□	0□00□	47□48□	□11□46□
SEMANA No.16	0□00□	58□94□	0□00□	47□48□	□11□46□
SEMANA No.17	0□00□	58□94□	0□00□	47□48□	□11□46□
SEMANA No.18	0□00□	58□94□	0□00□	47□48□	□11□46□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

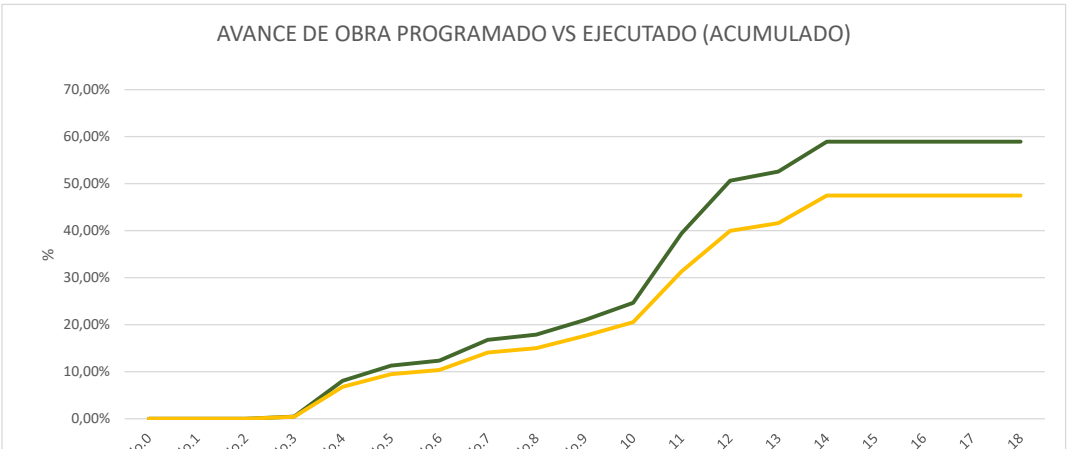


	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□ N□14	Fecha de in□orme	del□	**14 d□ □□r□□d□ 2024**	al	**20 d□ □□r□□d□ 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN No.1	19 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No.2	19 de mayo de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	491,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00

2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL




IN□ORME SEMANAL DE O□RA
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17

SEMANA N□	**14**	**DE**	**d□□ □□□□14 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**□□□□d□ 20 d□ □□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9.2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □□O□RA□□O

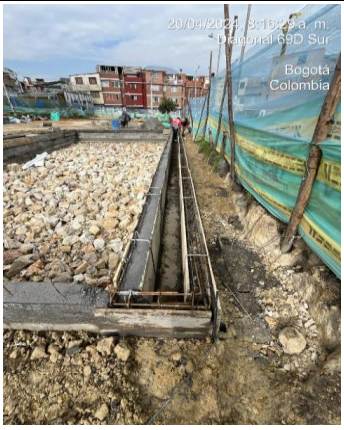



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□Vi□a de amarre en concreto





U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□Vi□a de amarre en concreto



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□Construccion SUDS



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□ E□ca□acion manula



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.15		
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	15 PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00			
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00			
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	619,85	$ 1.636.404,00			
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00			
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		204,48	$ 14.962.211,00	69,95	$ 5.118.381,40	34,21%
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	85,35	$ 9.380.306,40	15,00	$ 1.648.560,00	17,57%
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	874,85	$ 9.759.827,00			
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	64,01	$ 10.023.518,00	15,00	$ 2.348.895,00	23,43%
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	1176,65	$ 49.871.134,00			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	87,95	$ 14.637.519,00			
2,12	Relleno recebo comun	m3		$ 90.511,00	$ -	53,86	$ 4.874.922,00			
2,13	Relleno y comp.manual material comun sin sumin	m3		$ 39.283,00		362,20	$ 14.228.303,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	70,31	$ 72.268.485,00	7,00	$ 7.194.985,00	9,96%
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,61	$ 4.882.103,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00		69,30	$ 37.998.992,00			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00		84,00	$ 926.100,00	12,00	$ 132.300,00	14,29%
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00		71,60	$ 7.492.367,00			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00		$ -			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00	135,55	$ 776.159,00			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00			
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00		$ -			
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -			
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	25,04	$ 2.473.101,00	25,04	$ 2.473.100,64	100,00%
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,76	$ 1.001.363,00			
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	53,86	$ 7.938.749,00			
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	53,86	$ 10.291.084,00			
5,80	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	43,40	$ 2.206.109,00			
5,90	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	14,00	$ 711.648,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	2,00	$ 80.411,00	$ 160.822,00	31,15	$ 2.504.803,00	36,00	$ 2.894.796,00	115,57%
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	35,90	$ 6.120.986,00			
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00		$ -			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00		$ -			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00		$ -			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00		$ -			
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00		$ -			
5,22	Caja de Inspección100x100x100+Exca	un		$ 997.443,00	$ -	1,00	$ 997.443,00			
5,23	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV	un		$ 740.261,00	$ -	2,00	$ 1.480.522,00			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	21,00	$ 600.474,00			
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,81	$ 1.575.360,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	32,96	$ 2.851.007,00			
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	119,05	$ 10.297.706,00			
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	404,30	$ 36.726.612,00	90,00	$ 8.175.600,00	22,26%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	45,29	$ 4.827.371,00			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00	$ -	54,00	$ 6.265.404,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	68,95	$ 39.031.354,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00	0,20	$ 125.922,00	5,00%
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	21,00	$ 31.319.505,00	0,20	$ 298.281,00	0,95%
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00	0,05	$ 1.723.750,00	5,00%
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	40,00	$ 14.588.280,00	9,50	$ 3.464.716,50	23,75%
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,05	$ 247.816,60	5,00%
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,05	$ 247.816,60	5,00%
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00	0,05	$ 151.616,60	5,00%
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00	0,05	$ 202.916,60	5,00%
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00	0,19	$ 292.901,15	9,50%
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00	0,30	$ 171.138,60	7,50%
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00		$ -		$ -	
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS .DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00	0,41	$ 5.597.188,80	41,00%
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	558,44	$ 5.820.062,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	89,76	$ 8.807.610,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	55,85	$ 3.654.321,00			
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00		$ -			
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00			
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00			
11,90	Árbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	5,00	$ 3.663.280,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	0,05	$ 14.838,70	5,00%
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00	0,20	$ 59.354,80	10,00%
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	1,00	$ 569.478,00	-0,70	-$ 398.634,60	-70,00%
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	4,00	$ 1.818.808,00	0,40	$ 181.880,80	10,00%
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1309,00	$ 9.750.741,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**					
					$ 483.169.772,00		**$ 601.863.869,00**		**$ 42.368.122,19**	**7,04%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 125.624.141,00**		**$ 156.484.606,00**		**$ 11.015.711,77**	**7,04%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 4.831.698,00**		**$ 6.018.639,00**		**$ 423.681,22**	**7,04%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 28.990.186,00**		**$ 36.111.832,00**		**$ 2.542.087,33**	**7,04%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 159.446.025,00**		**$ 198.615.077,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 642.615.797,00**		**$ 800.478.946,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 5.403.728,00**		**$ -**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ -**			**#¡DIV/0!**
					$ 659.459.203,00		**$ 800.478.946,00**		**$ 56.349.602,51**	**7,04%**
										7,04%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□N□15	Fecha de in□orme	del□	22 d□ □□r□d□ 2024	al	28 d□ □□r□d□ 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN No.1	19 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No.2	19 de mayo de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	499,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.□	0□48□	0□48□	0□40□	0□40□	□0□08□
SEMANA No.4	7□58□	8□06□	6□□7□	6□77□	1□29□
SEMANA No.5	□26□	11□□2□	2□74□	9□51□	1□81□
SEMANA No.6	1□06□	12□□8□	0□89□	10□□9□	1□99□
SEMANA No.7	4□40□	16□78□	□69□	14□08□	2□70□
SEMANA No.8	1□1□□	17□91□	0□95□	15□0□□	2□88□
SEMANA No.9	□08□	20□99□	2□59□	17□62□	□□□7□
SEMANA No.10	□65□	24□64□	2□91□	20□5□□	4□11□
SEMANA No.11	14□80□	□9□44□	10□8□□	□1□□5□	8□09□
SEMANA No.12	11□21□	50□65□	8□62□	□9□98□	□10□67□
SEMANA No.1□	1□9□□	52□58□	1□62□	41□60□	□10□98□
SEMANA No.14	6□□6□	58□94□	5□88□	47□48□	□11□46□
SEMANA No.15	8□71□	67□65□	7□04□	54□52□	□1□□1□□
SEMANA No.16	0□00□	67□65□	0□00□	54□52□	□1□□1□□
SEMANA No.17	0□00□	67□65□	0□00□	54□52□	□1□□1□□
SEMANA No.18	0□00□	67□65□	0□00□	54□52□	□1□□1□□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

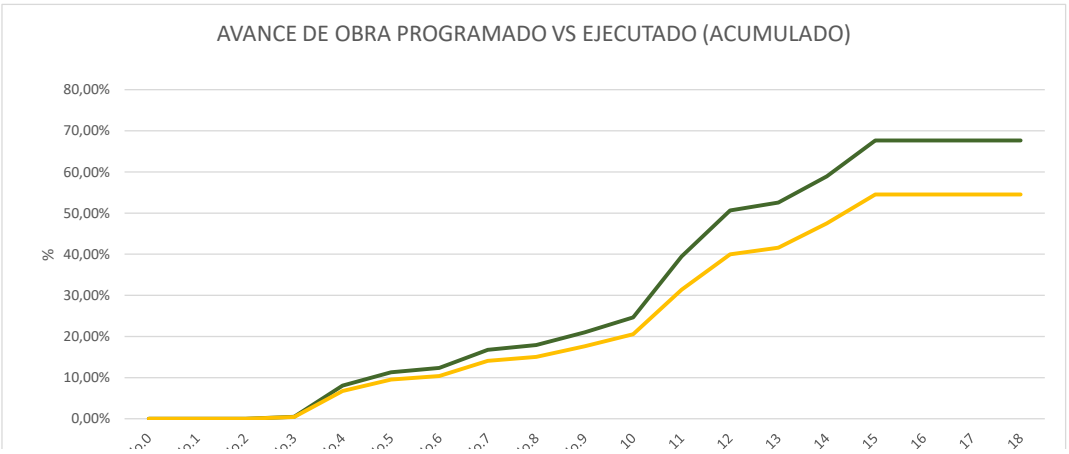


	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□ N□15	Fecha de in□orme	del□	**22 d□ □□r□d□ 2024**	al	**28 d□ □□r□d□ 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN No.1	19 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No.2	19 de mayo de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	499,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00

2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL



IN□ORME SEMANAL DE O□RA
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17

SEMANA N□	**15**	**DE**	**□□□□□22 d□ □□r□d□2024**	**A**	**d□□ □□□□□28 d□ □□r□d□2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9.2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4.0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□Intalacion tuberia PVC 6" desa□□e SUDS



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□Intalacion tuberia PVC 6" desa□□e SUDS



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS E□ca□ación manual sobre suelo blando



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□ E□ca□ación manual sobre suelo blando



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.16		
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	16 PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00			
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00			
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	619,85	$ 1.636.404,00			
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00			
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		204,48	$ 14.962.211,00	31,09	$ 2.274.917,48	15,20%
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	85,35	$ 9.380.306,40	12,24	$ 1.344.675,80	14,34%
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	874,85	$ 9.759.827,00	50,95	$ 568.342,60	5,82%
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	64,01	$ 10.023.518,00			
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	1176,65	$ 49.871.134,00			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	87,95	$ 14.637.519,00			
2,12	Relleno recebo comun	m3		$ 90.511,00	$ -	53,86	$ 4.874.922,00		$ -	
2,13	Relleno y comp.manual material comun sin sumin	m3		$ 39.283,00		362,20	$ 14.228.303,00			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	70,31	$ 72.268.485,00			
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,61	$ 4.882.103,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00		69,30	$ 37.998.992,00			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00		84,00	$ 926.100,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00		71,60	$ 7.492.367,00			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00		$ -			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00	135,55	$ 776.159,00			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00			
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00		$ -			
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -			
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	25,04	$ 2.473.101,00			
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,76	$ 1.001.363,00			
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	53,86	$ 7.938.749,00		$ -	
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	53,86	$ 10.291.084,00	20,00	$ 3.821.420,00	37,13%
5,80	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	43,40	$ 2.206.109,00	8,40	$ 426.988,80	19,35%
5,90	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	14,00	$ 711.648,00	1,50	$ 76.248,00	10,71%
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	2,00	$ 80.411,00	$ 160.822,00	31,15	$ 2.504.803,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	35,90	$ 6.120.986,00			
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00		$ -			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00		$ -			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00		$ -			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00		$ -			
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00		$ -			
5,22	Caja de Inspección100x100x100+Exca	un		$ 997.443,00	$ -	1,00	$ 997.443,00	1,00	$ 997.443,00	100,00%
5,23	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV	un		$ 740.261,00	$ -	2,00	$ 1.480.522,00			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	21,00	$ 600.474,00			
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,81	$ 1.575.360,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	32,96	$ 2.851.007,00			
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	119,05	$ 10.297.706,00			
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	404,30	$ 36.726.612,00	101,23	$ 9.195.733,20	25,04%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	45,29	$ 4.827.371,00			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00	$ -	54,00	$ 6.265.404,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	68,95	$ 39.031.354,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	21,00	$ 31.319.505,00			
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	40,00	$ 14.588.280,00			
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00			
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00		$ -			
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS .DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	558,44	$ 5.820.062,00			
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	89,76	$ 8.807.610,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	55,85	$ 3.654.321,00			
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00		$ -			
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00			
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00			
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00			
11,90	Árbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	5,00	$ 3.663.280,00	2,00	$ 1.465.312,00	40,00%
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00			
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	1,00	$ 569.478,00			
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	4,00	$ 1.818.808,00			
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1309,00	$ 9.750.741,00			
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**					
					$ 483.169.772,00		$ 601.863.869,00		$ 20.171.080,88	3,35%
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		$ 125.624.141,00		$ 156.484.606,00		$ 5.244.481,03	3,35%
	IMPREVISTOS		**1,00%**		$ 4.831.698,00		$ 6.018.639,00		$ 201.710,81	3,35%
	UTILIDAD		**6,00%**		$ 28.990.186,00		$ 36.111.832,00		$ 1.210.264,85	3,35%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 159.446.025,00		$ 198.615.077,00			
	COSTO TOTAL OBRA				$ 642.615.797,00		$ 800.478.946,00			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 5.403.728,00		$ -			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ -			
					$ 659.459.203,00		$ 800.478.946,00		$ 26.827.537,57	3,35%
										3,35%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□N□1□	Fecha de in□orme	del□	29 d□ □□r□d□ 2024	al	5 d□ □ □□□ d□ 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN No.1	19 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No.2	19 de mayo de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	506,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.□	0□48□	0□48□	0□40□	0□40□	□0□08□
SEMANA No.4	7□58□	8□06□	6□□7□	6□77□	1□29□
SEMANA No.5	□26□	11□□2□	2□74□	9□51□	1□81□
SEMANA No.6	1□06□	12□□8□	0□89□	10□□9□	1□99□
SEMANA No.7	4□40□	16□78□	□69□	14□08□	2□70□
SEMANA No.8	1□1□□	17□91□	0□95□	15□0□□	2□88□
SEMANA No.9	□08□	20□99□	2□59□	17□62□	□□□7□
SEMANA No.10	□65□	24□64□	2□91□	20□5□□	4□11□
SEMANA No.11	14□80□	□9□44□	10□8□□	□1□□5□	8□09□
SEMANA No.12	11□21□	50□65□	8□62□	□9□98□	□10□67□
SEMANA No.1□	1□9□□	52□58□	1□62□	41□60□	□10□98□
SEMANA No.14	6□□6□	58□94□	5□88□	47□48□	□11□46□
SEMANA No.15	8□71□	67□65□	7□04□	54□52□	□1□□1□□
SEMANA No.16	8□71□	76□□6□	□□□5□	57□87□	□18□48□
SEMANA No.17	0□00□	76□□6□	0□00□	57□87□	□18□48□
SEMANA No.18	0□00□	76□□6□	0□00□	57□87□	□18□48□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

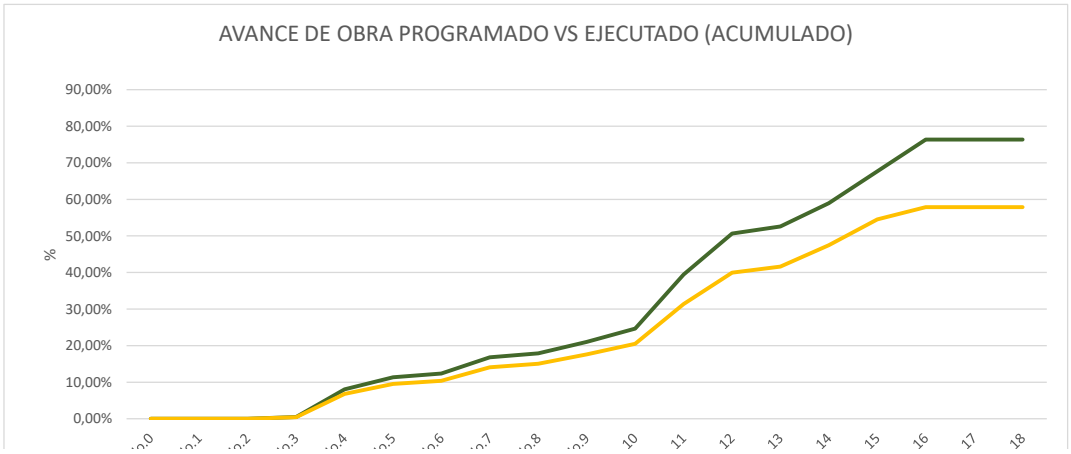


	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□ N□1□	Fecha de in□orme	del□	**29 d□ □□r□d□ 2024**	al	**5 d□ □ □□□ d□ 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN No.1	19 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No.2	19 de mayo de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	506,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00

2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL



IN□ORME SEMANAL DE O□RA
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17

SEMANA N□	**1□**	**DE**	**□□□□□29 d□ □□r□d□2024**	**A**	**d□□ □□□□5 d□ □ □□□ d□2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9.2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□Traslado arboles



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□Traslado arboles



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□Pa□ete im□ermeabili□ado ca□a de ins□eccion



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

□OMEN□ARIOS□ E□ca□ación manual sobre suelo blando



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□17

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.17		
										17
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00			
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00			
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	619,85	$ 1.636.404,00	269,47	$ 711.400,80	43,47%
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00		$ -	
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		204,48	$ 14.962.211,00	21,32	$ 1.560.027,04	10,43%
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	85,35	$ 9.380.306,40		$ -	
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	874,85	$ 9.759.827,00	211,95	$ 2.364.514,20	24,23%
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	64,01	$ 10.023.518,00		$ -	
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	1176,65	$ 49.871.134,00	205,49	$ 8.709.488,16	17,46%
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	87,95	$ 14.637.519,00		$ -	
2,12	Relleno recebo comun	m3		$ 90.511,00	$ -	53,86	$ 4.874.922,00		$ -	
2,13	Relleno y comp.manual material comun sin sumin	m3		$ 39.283,00		362,20	$ 14.228.303,00	164,63	$ 6.467.160,29	45,45%
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso .3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	70,31	$ 72.268.485,00			
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,61	$ 4.882.103,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00		69,30	$ 37.998.992,00			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00		84,00	$ 926.100,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00		71,60	$ 7.492.367,00			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00		$ -			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00	135,55	$ 776.159,00			
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00			
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00		$ -			
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -			
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	25,04	$ 2.473.101,00			
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,76	$ 1.001.363,00			
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	53,86	$ 7.938.749,00	11,63	$ 1.714.215,48	21,59%
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	53,86	$ 10.291.084,00	20,83	$ 3.980.008,93	38,67%
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	43,40	$ 2.206.109,00			
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	14,00	$ 711.648,00			
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	2,00	$ 80.411,00	$ 160.822,00	31,15	$ 2.504.803,00			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	35,90	$ 6.120.986,00			
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00		$ -			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00		$ -			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00		$ -			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00		$ -			
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00		$ -			
5,22	Caja de Inspección100x100x100+Exca	un		$ 997.443,00	$ -	1,00	$ 997.443,00			
5,23	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV	un		$ 740.261,00	$ -	2,00	$ 1.480.522,00			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	21,00	$ 600.474,00	21,00	$ 600.474,00	100,00%
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,81	$ 1.575.360,00			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	32,96	$ 2.851.007,00	2500,00%	$ 2.162.475,00	75,85%
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	119,05	$ 10.297.706,00	5500,00%	$ 4.757.445,00	46,20%
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	404,30	$ 36.726.612,00		$ -	
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	45,29	$ 4.827.371,00		$ -	
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00	$ -	54,00	$ 6.265.404,00	54,00	$ 6.265.404,00	100,00%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	68,95	$ 39.031.354,00			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00			
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	21,00	$ 31.319.505,00			
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00			
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	40,00	$ 14.588.280,00			
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,80	Equipo de GYM REF Eliptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00			
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00		$ -			
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS .DIMENSIONES:. 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	558,44	$ 5.820.062,00	279,22	2910030,84	0,50
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	89,76	$ 8.807.610,00			
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00			
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	55,85	$ 3.654.321,00	27,93	1827487,83	0,50
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00		$ -			
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00	1,00	299197,00	1,00
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00	2,00	582202,00	0,50
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00	1,00	306086,00	0,33
11,90	Árbol Calisterno	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	5,00	$ 3.663.280,00	2,00	$ 1.465.312,00	40,00%
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	0,05	$ 14.838,70	5,00%
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00		$ -	
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	1,00	$ 569.478,00		$ -	
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	4,00	$ 1.818.808,00		$ -	
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1309,00	$ 9.750.741,00	65450,00%	$ 4.875.370,50	50,00%
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**					
					$ 483.169.772,00		**$ 601.863.869,00**		**$ 51.573.137,77**	**8,57%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 125.624.141,00**		**$ 156.484.606,00**		**$ 13.409.015,82**	**8,57%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 4.831.698,00**		**$ 6.018.639,00**		**$ 515.731,38**	**8,57%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 28.990.186,00**		**$ 36.111.832,00**		**$ 3.094.388,27**	**8,57%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 159.446.025,00**		**$ 198.615.077,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 642.615.797,00**		**$ 800.478.946,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 5.403.728,00**		**$ -**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ -**			
					$ 659.459.203,00		**$ 800.478.946,00**		**$ 68.592.273,24**	**8,57%**
										8,57%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
S□□ □□□ N□17	Fecha de in□orme	del□	□d□ □ □□□ d□2024	al	12 d□ □ □□□ d□2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN No.1	19 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No.2	19 de mayo de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	513,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□ d□ □□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.□	0□48□	0□48□	0□40□	0□40□	□0□08□
SEMANA No.4	7□58□	8□06□	6□□7□	6□77□	□1□29□
SEMANA No.5	□□26□	11□□2□	2□74□	9□51□	□1□81□
SEMANA No.6	1□06□	12□□8□	0□89□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.7	4□40□	16□78□	□□69□	14□08□	□2□70□
SEMANA No.8	1□1□□	17□91□	0□95□	15□0□□	□2□88□
SEMANA No.9	□□08□	20□99□	2□59□	17□62□	□□□□7□
SEMANA No.10	□□65□	24□64□	2□91□	20□5□□	□4□11□
SEMANA No.11	14□80□	□9□44□	10□8□□	□1□□5□	□8□09□
SEMANA No.12	11□21□	50□65□	8□62□	□9□98□	□10□67□
SEMANA No.1□	1□9□□	52□58□	1□62□	41□60□	□10□98□
SEMANA No.14	6□□6□	58□94□	5□88□	47□48□	□11□46□
SEMANA No.15	8□71□	67□65□	7□04□	54□52□	□1□□1□□
SEMANA No.16	8□71□	76□□6□	□□□5□	57□87□	□18□48□
SEMANA No.17	11□81□	88□16□	8□57□	66□44□	□21□72□
SEMANA No.18	0□00□	88□16□	0□00□	66□44□	□21□72□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

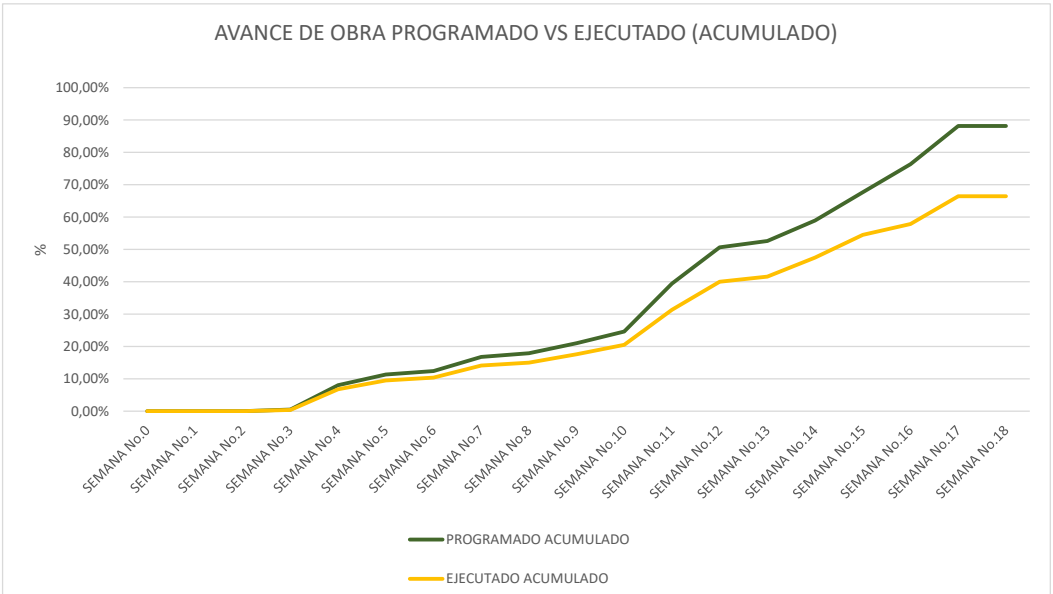

IN□ORME SEMANAL DE O□RA
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17

SEMANA N□	**17**	**DE**	**□□□□□□□ d□ □ □□□ d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□□12 d□ □ □□□ d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□	PUERTAS METALICAS PARA CERRAMIENTO



U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□	MESA DE AJEDRE□ EN CONCRETO



U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□	EQUIPO GYM GIRO CAMINADOR



U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□	SUMINISTRO BARANDA M□8□



U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□	INSTALACION REJILLA SUMIDERO



U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□	LOSETA PODOTACTIL

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFROME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.18		
										18
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,10	Localización y replanteo	m2	1204,00	$ 8.226,00	$ 9.904.104,00	1309,00	$ 10.767.834,00			
1,70	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	165,45	$ 27.273,00	$ 4.512.318,00	210,45	$ 5.739.603,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	9,00	$ 70.802,00	$ 637.218,00	9,00	$ 637.218,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00		3,00	$ 48.819,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	1204,00	$ 14.422,00	$ 17.364.088,00	1309,00	$ 18.878.398,00			
2,20	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	1204,00	$ 2.640,00	$ 3.178.560,00	619,85	$ 1.636.404,00	269,47	$ 711.400,80	43,47%
2,30	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	461,00	$ 1.397,00	$ 644.017,00	1274,91	$ 1.781.049,00			
2,40	Excavación manual suelo blando	m3		$ 73.172,00		204,48	$ 14.962.211,00	58,60	$ 4.287.879,20	28,66%
2,50	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	69,15	$ 109.904,00	$ 7.599.862,00	85,35	$ 9.380.306,40	23,11	$ 2.539.881,44	27,08%
2,60	Geotextil T-2400	m2	501,05	$ 11.156,00	$ 5.589.714,00	874,85	$ 9.759.827,00	211,95	$ 2.364.514,20	24,23%
2,70	Relleno compactado Base granular	m3	69,15	$ 156.593,00	$ 10.828.406,00	64,01	$ 10.023.518,00	11,81	$ 1.849.363,33	18,45%
2,90	Excavación mecanica+retiro	m3	138,30	$ 42.384,00	$ 5.861.707,00	1176,65	$ 49.871.134,00	283,93	$ 12.034.089,12	24,13%
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	87,95	$ 14.637.519,00		$ -	
2,12	Relleno recebo comun	m3		$ 90.511,00	$ -	53,86	$ 4.874.922,00	24,24	$ 2.193.986,64	45,01%
2,13	Relleno y comp.manual material comun sin sumin	m3		$ 39.283,00		362,20	$ 14.228.303,00	197,57	$ 7.761.142,31	54,55%
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,10	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	65,21	$ 1.027.855,00	$ 67.026.425,00	70,31	$ 72.268.485,00	57,01	58598013,55	0,81
3,30	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	5,06	$ 870.250,00	$ 4.403.465,00	5,61	$ 4.882.103,00	5,61	4882102,50	1,00
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00		69,30	$ 37.998.992,00	18,48	$ 10.133.064,48	26,67%
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00		84,00	$ 926.100,00		$ -	
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00		71,60	$ 7.492.367,00		$ -	
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,10	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	1392,60	$ 6.619,00	$ 9.217.619,00		$ -			
4,20	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	43,00	$ 5.726,00	$ 246.218,00	135,55	$ 776.159,00	117,60	$ 673.377,60	86,76%
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS**									
5,10	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1,40m	m3	160,64	$ 50.223,00	$ 8.067.823,00	238,14	$ 11.960.105,00			
5,20	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enObra	m3	1,33	$ 29.530,00	$ 39.275,00		$ -			
5,30	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	13,98	$ 570.017,00	$ 7.968.838,00		$ -			
5,40	Cañuela en concreto	ml	13,90	$ 98.766,00	$ 1.372.847,00	25,04	$ 2.473.101,00		$ -	
5,50	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	89,91	$ 11.156,00	$ 1.003.036,00	89,76	$ 1.001.363,00		$ -	
5,60	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	24,27	$ 147.396,00	$ 3.577.301,00	53,86	$ 7.938.749,00	17,96	$ 2.647.232,16	33,35%
5,70	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	4,05	$ 191.071,00	$ 773.838,00	53,86	$ 10.291.084,00	8,98	$ 1.715.817,58	16,67%
5,80	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	55,71	$ 50.832,00	$ 2.831.851,00	43,40	$ 2.206.109,00		$ -	
5,90	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	18,00	$ 50.832,00	$ 914.976,00	14,00	$ 711.648,00	-2,50	-$ 127.080,00	-17,86%
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	2,00	$ 80.411,00	$ 160.822,00	31,15	$ 2.504.803,00	-8,85	-$ 711.637,35	-28,41%
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	36,41	$ 170.501,00	$ 6.207.941,00	35,90	$ 6.120.986,00	35,90	$ 6.120.985,90	100,00%
5,12	Piedra bola	m2	7,38	$ 41.714,00	$ 307.849,00		$ -			
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	44,09	$ 6.619,00	$ 291.832,00		$ -			
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1654,00	$ 5.726,00	$ 9.470.804,00		$ -			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00		$ -			
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	80,91	$ 2.640,00	$ 213.602,00		$ -			
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	80,91	$ 1.397,00	$ 113.031,00		$ -			
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	44,00	$ 47.880,00	$ 2.106.720,00		$ -			
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	2,00	$ 545.257,00	$ 1.090.514,00		$ -			
5,22	Caja de Inspección100x100x100+Exca	un		$ 997.443,00	$ -	1,00	$ 997.443,00			
5,23	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV	un		$ 740.261,00	$ -	2,00	$ 1.480.522,00			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	21,00	$ 600.474,00			
6,00	**PINTURA PISO**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	45,74	$ 34.389,00	$ 1.572.953,00	45,81	$ 1.575.360,00	4581,00%	$ 1.575.360,09	100,00%
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,30	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	45,87	$ 86.499,00	$ 3.967.709,00	32,96	$ 2.851.007,00	7,96	$ 688.532,04	24,15%
7,40	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	109,34	$ 86.499,00	$ 9.457.801,00	119,05	$ 10.297.706,00	64,05	$ 5.540.260,95	53,80%
7,60	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	401,56	$ 90.840,00	$ 36.477.710,00	404,30	$ 36.726.612,00	17,70	$ 1.607.868,00	4,38%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	45,29	$ 4.827.371,00		$ -	
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00	$ -	54,00	$ 6.265.404,00		$ -	
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,10	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	63,69	$ 566.082,00	$ 36.053.763,00	68,95	$ 39.031.354,00	6895,00%	$ 39.031.353,90	100,00%
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,10	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	4,00	$ 629.610,00	$ 2.518.440,00	4,00	$ 2.518.440,00	0,20	$ 125.922,00	5,00%
10,20	Silla individual referencia M-01-A	un	17,00	$ 1.491.405,00	$ 25.353.885,00	21,00	$ 31.319.505,00	4,80	$ 7.158.744,00	22,86%
10,17	Torre Columpio Deslizadero	un	1,00	$ 34.475.000,00	$ 34.475.000,00	1,00	$ 34.475.000,00	0,05	$ 1.723.750,00	5,00%
10,60	Suministro baranda M-83	ml	63,69	$ 364.707,00	$ 23.228.189,00	40,00	$ 14.588.280,00		$ -	
10,70	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,05	$ 247.816,60	5,00%
10,80	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,05	$ 247.816,60	5,00%
10,90	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00	0,05	$ 151.616,60	5,00%
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00	0,05	$ 202.916,60	5,00%
10,50	Mesa de ajedrez en concreto	un	2,00	$ 1.541.585,00	$ 3.083.170,00	2,00	$ 3.083.170,00	0,11	$ 169.574,35	5,50%
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00	2,00	$ 2.117.526,00	100,00%
10,19	Ciclo parqueadero tipo M-22 acero inoxidable	un	19,00	$ 570.462,00	$ 10.838.778,00	4,00	$ 2.281.848,00	0,20	$ 114.092,40	5,00%
10,20	Bolardo en hierro	un	13,00	$ 214.013,00	$ 2.782.169,00		$ -		$ -	
10,31	Suministro e instalación de BARRAS COMBINADAS .DIMENSIONES:: 4.59 x 1.41 x 2.65 mts	un	1,00	$ 13.651.680,00	$ 13.651.680,00	1,00	$ 13.651.680,00	0,05	$ 682.584,00	5,00%
11,00	**VEGETACION**									
11,10	Cobertura tipo grama	m2	399,34	$ 10.422,00	$ 4.161.921,00	558,44	$ 5.820.062,00	279,22	$ 2.910.030,84	50,00%
11,20	Cobertura tipo floricultura	m2	48,08	$ 98.124,00	$ 4.717.802,00	89,76	$ 8.807.610,00	89,76	$ 8.807.610,24	100,00%
11,30	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	6,00	$ 291.101,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00	6,00	$ 1.746.606,00	100,00%
11,40	Relleno en tierra negra	m3	44,74	$ 65.431,00	$ 2.927.383,00	55,85	$ 3.654.321,00	27,92	$ 1.826.833,52	49,99%
11,50	Limo arcilloso	m3	26,48	$ 116.667,00	$ 3.089.342,00		$ -			
11,60	Árbol hayuelo	un	1,00	$ 299.197,00	$ 299.197,00	1,00	$ 299.197,00		$ -	
11,70	Árbol laurel hoja pequeña	un	4,00	$ 291.101,00	$ 1.164.404,00	4,00	$ 1.164.404,00	2,00	$ 582.202,00	50,00%
11,80	Árbol Carbonero Rojo	un	3,00	$ 306.086,00	$ 918.258,00	3,00	$ 918.258,00	2,00	$ 612.172,00	66,67%
11,90	Árbol Calistemo	un	1,00	$ 289.533,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00	1,00	$ 289.533,00	100,00%
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	5,00	$ 3.663.280,00	1,00	$ 732.656,00	20,00%
12,00	**SEÑALETICA**									
12,10	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,20	Señalética GYM parque	un	2,00	$ 296.774,00	$ 593.548,00	2,00	$ 593.548,00	0,10	$ 29.677,40	5,00%
12,30	Señalética identificador	un	2,00	$ 569.478,00	$ 1.138.956,00	1,00	$ 569.478,00		$ -	
12,40	Señalética SC-80	un	3,00	$ 454.702,00	$ 1.364.106,00	4,00	$ 1.818.808,00	1,10	$ 500.172,20	27,50%
13,00	**OTROS**									
13,10	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00		$ -			
13,20	Aseo general	m2	1204,00	$ 7.449,00	$ 8.968.596,00	1309,00	$ 9.750.741,00	654,50	$ 4.875.370,50	50,00%
14,01	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**29478330,00**	**29.478.330,00**					
					$ **483.169.772,00**		$ **601.863.869,00**		$ **201.972.731,29**	**33,56%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		$ **125.624.141,00**		$ **156.484.606,00**		$ **52.512.910,14**	**33,56%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		$ **4.831.698,00**		$ **6.018.639,00**		$ **2.019.727,31**	**33,56%**
	UTILIDAD		**6,00%**		$ **28.990.186,00**		$ **36.111.832,00**		$ **12.118.363,88**	**33,56%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ **159.446.025,00**		$ **198.615.077,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				$ **642.615.797,00**		$ **800.478.946,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ **5.403.728,00**		$ -			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ **11.439.678,00**		$ -			
					$ **659.459.203,00**		$ **800.478.946,00**		$ **268.623.732,62**	**33,56%**
										33,56%

S□□ □□□N□18	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II □REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17				
	Fecha de in□orme	del□	1□ d□ □ □□□ d□ 2024	al	19 d□ □ □□□ d□ 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN No.1	19 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No.2	19 de mayo de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	520,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.□	0□48□	0□48□	0□40□	0□40□	□0□08□
SEMANA No.4	7□58□	8□06□	6□□7□	6□77□	□1□29□
SEMANA No.5	□□26□	11□□2□	2□74□	9□51□	□1□81□
SEMANA No.6	1□06□	12□□8□	0□89□	10□□9□	□1□99□
SEMANA No.7	4□40□	16□78□	□□69□	14□08□	□2□70□
SEMANA No.8	1□1□□	17□91□	0□95□	15□0□□	□2□88□
SEMANA No.9	□□08□	20□99□	2□59□	17□62□	□□□7□
SEMANA No.10	□□65□	24□64□	2□91□	20□5□□	□4□11□
SEMANA No.11	14□80□	□9□44□	10□8□□	□1□□5□	□8□09□
SEMANA No.12	11□21□	50□65□	8□62□	□9□98□	□10□67□
SEMANA No.1□	1□9□□	52□58□	1□62□	41□60□	□10□98□
SEMANA No.14	6□□6□	58□94□	5□88□	47□48□	□11□46□
SEMANA No.15	8□71□	67□65□	7□04□	54□52□	□1□□1□□
SEMANA No.16	8□71□	76□□6□	□□□5□	57□87□	□18□48□
SEMANA No.17	11□81□	88□16□	8□57□	66□44□	□21□72□
SEMANA No.18	11□84□	100□00□	□□56□	100□00□	0□00□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

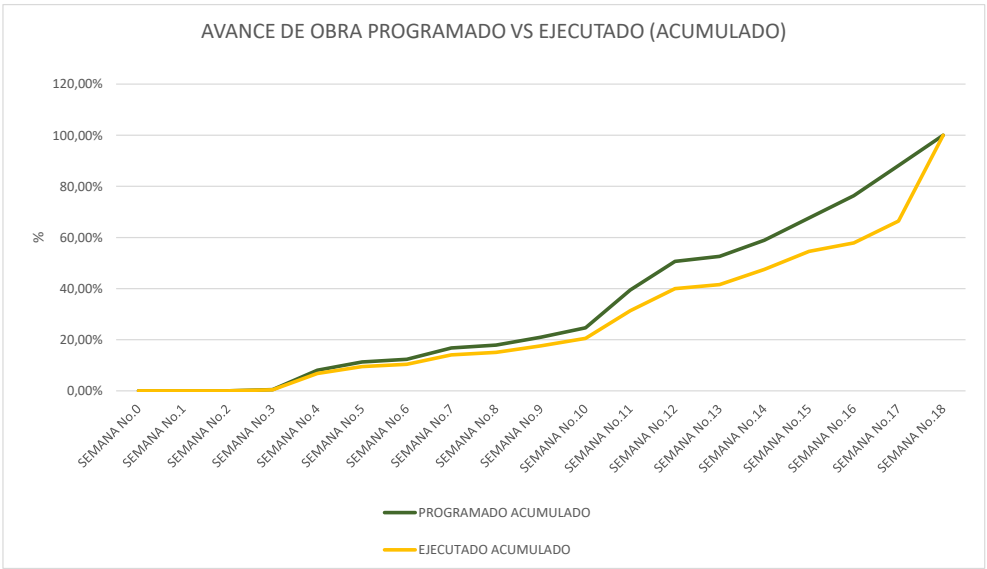

IN□ORME SEMANAL DE O□RA
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-17

SEMANA N□	**18**	**DE**	**□□□□□1□ d□ □ □□□ d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□19 d□ □ □□□ d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".

IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□	ASEO GENERAL DE OBRA



U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□	TRASLADO DE ARBOLES



U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□	TRASLADO DE ARBOLES



U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□	COBERTURA FLORICULTURAL



U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□	COBERTURA TIPO GRAMA



U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□17
□OMEN□ARIOS□	CICLOPARQUEADERO EN ACERO INO□IDABLE

Informes semanales AAU T20

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.1		
										1
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00		$ -	
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50		$ -	
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64		$ -	
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00		$ -	
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00		$ -	
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**								-	
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00			
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80			
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11			
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68			
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84			
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44			
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38			
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04			
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**								-	
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50			
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**								-	
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00					
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00					
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**								-	
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.859,42			
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05emObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00					
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00					
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12			
5,8	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00			
5,9	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,20			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00					
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00					
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00			
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.994,00	$ -	25,00	$ 714.850,00			
6,00	**PINTURA**								-	
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**								-	
7,1	Adoquín prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50			
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00					
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78			
7,4	Tableta podotactil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	35,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15			
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40			
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**								-	
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46			
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**								-	
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84			
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78			
11,7	Árbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**								-	
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00			
13,00	**OTROS**								-	
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00					
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**				-	
					$ 249.757.554,00		**$ 220.402.398,00**		$ -	
	AMMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 64.936.964,00**		**$ 57.304.623,00**		$ -	
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.497.576,00**		**$ 2.284.024,00**		$ -	
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 14.985.453,00**		**$ 13.224.144,00**		$ -	
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 82.419.993,00**		**$ 72.732.791,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 332.177.547,00**		**$ 293.135.189,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.988,00**		**$ 4.276.988,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 347.894.213,00		**$ 308.851.855,00**		$ -	

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20				
S□□ □□□ N□1	Fecha de in□orme	del□	**15 d□ □□□r□ d□ 2024**	al	**21 d□ □□□r□ d□ 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	401,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.4	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.5	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.6	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.7	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.8	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.9	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.10	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.11	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.12	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.14	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

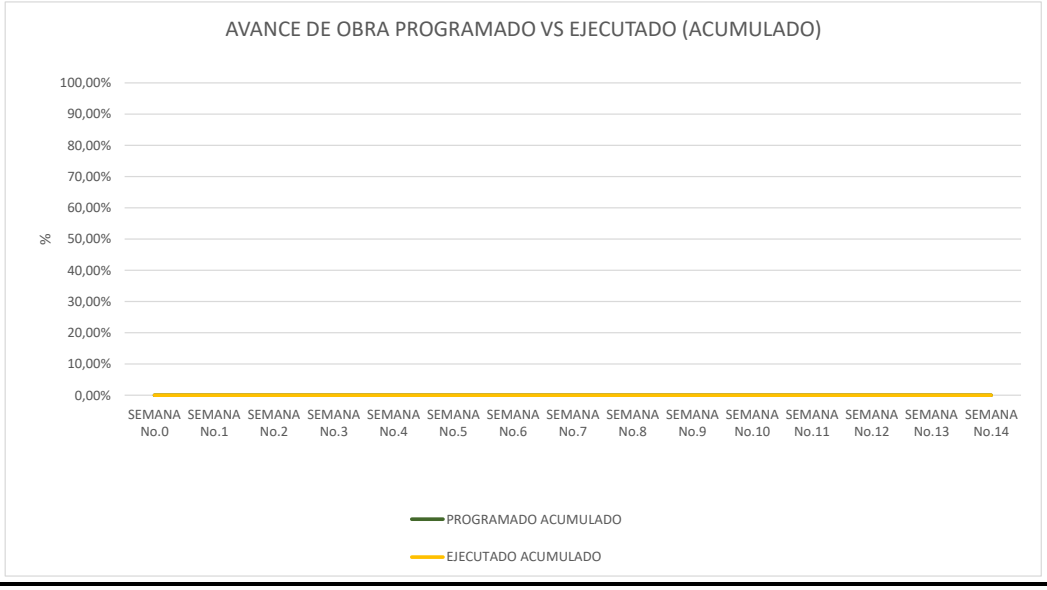

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20

SEMANA N□	1	**DE**	**□□□□15 d□ □□r□ d□2024**	**A**	**d□□ □□□21 d□ □□r□ d□2024**
□E□□A INI□IO□	16:12:2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19:04:2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".

IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□ACTUALI□ACIÓN INVENTARIO FORESTAL



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□ACTUALI□ACIÓN INVENTARIO FORESTAL



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□LOCALI□ACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□LOCALI□ACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□PANORAMICA TERRITORIO AAUT□20



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□UBICACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.2		
										2
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50	55,48	$ 1.513.147,03	50,21%
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64			
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00	100,00%
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**								-	
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00			
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80			
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11			
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68		$ -	
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84			
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44			
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38			
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04			
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**								-	
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50			
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00					
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00					
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**								-	
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.859,42			
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05emObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00					
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00					
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12			
5,8	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00			
5,9	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,20			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00					
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00					
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00			
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.994,00	$ -	25,00	$ 714.850,00			
6,00	**PINTURA**								-	
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquín prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50			
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00					
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78			
7,4	Tableta podotactil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	35,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15			
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40			
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**								-	
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46			
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84			
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78			
11,7	Árbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00			
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00					
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**				-	
					$ 249.757.554,00		$ 220.402.398,00		$ 2.858.385,03	1,30%
	ADMINISTRACIÓN		26,00%		$ 64.936.964,00		$ 57.304.623,00		$ 743.180,11	1,30%
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 2.497.576,00		$ 2.284.024,00		$ 29.583,85	1,30%
	UTILIDAD		6,00%		$ 14.985.453,00		$ 13.224.144,00		$ 171.503,10	1,30%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 82.419.993,00		$ 72.732.791,00			
	COSTO TOTAL OBRA				$ 332.177.547,00		$ 293.135.189,00			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 4.276.988,00		$ 4.276.988,00			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ 11.439.678,00			
					$ 347.894.213,00		$ 308.851.855,00		$ 3.801.652,09	1,23%
										1,23%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20				
S□□ □□□N□2	Fecha de in□orme	del□	**22 d□ □□□r□ d□ 2024**	al	**28 d□ □□□r□ d□ 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
	VALOR CONTRATO :

CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	408,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	1□26□	1□26□	1□□0□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.□	0□00□	1□26□	0□00□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.4	0□00□	1□26□	0□00□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.5	0□00□	1□26□	0□00□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.6	0□00□	1□26□	0□00□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.7	0□00□	1□26□	0□00□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.8	0□00□	1□26□	0□00□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.9	0□00□	1□26□	0□00□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.10	0□00□	1□26□	0□00□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.11	0□00□	1□26□	0□00□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.12	0□00□	1□26□	0□00□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.1□	0□00□	1□26□	0□00□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.14	0□00□	1□26□	0□00□	1□□0□	0□04□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

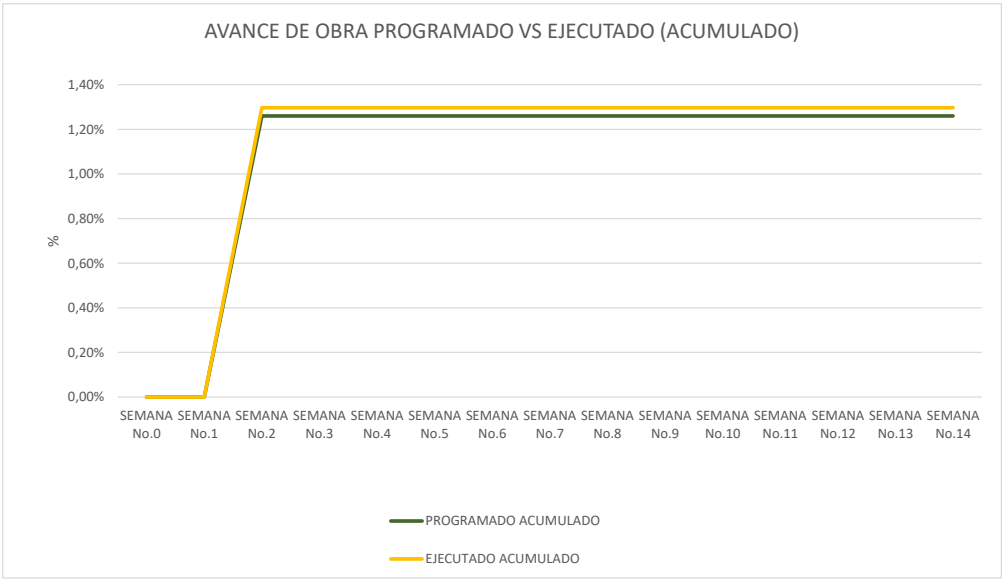

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20

SEMANA N□

□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**		1066□2022	
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	**□ON□RA□O N□**	1070□2022	

□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O





U□I□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□	CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVISIONAL

TERRITORIO AAUT□20	
□OMEN□ARIOS□	PROTECCIÓN ESPECIES ARBOREAS





U□I□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□	PANORAMICA CERRAMIENTO PERIMETRAL

TERRITORIO AAUT□20	
□OMEN□ARIOS□	PANORAMICA CERRAMIENTO PERIMETRAL

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.3		
										3
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00	517,00	$ 4.252.842,00	100,00%
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50	55,02	$ 1.500.560,46	100,00%
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64			
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00			
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80			
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11			
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68			
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84			
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44			
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38			
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04			
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50			
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00					
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00					
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.859,42			
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05emObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00					
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00					
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12			
5,8	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00			
5,9	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,20			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00					
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00					
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00			
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.994,00	$ -	25,00	$ 714.850,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquín prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50			
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00					
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78			
7,4	Tableta podotactil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	35,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15			
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40			
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46			
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84			
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78			
11,7	Árbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00			
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00					
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		**$ 220.402.398,00**		**$ 5.753.402,46**	**2,61%**
	ADMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 64.936.964,00**		**$ 57.304.623,00**		**$ 1.495.884,64**	**2,61%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.497.576,00**		**$ 2.284.024,00**		**$ 57.534,02**	**2,61%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 14.985.453,00**		**$ 13.224.144,00**		**$ 345.204,15**	**2,61%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 82.419.993,00**		**$ 72.732.791,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 332.177.547,00**		**$ 293.135.189,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.988,00**		**$ 4.276.988,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 347.894.213,00		**$ 308.851.855,00**		**$ 7.652.025,27**	**2,48%**
										3,71%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20				
S□□ □□□ N□□□	Fecha de in□orme	del□	**29 d□ □□□r□ d□ 202□**	al	**4 d□ □□□r□r□ d□ 202□**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL


OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	50,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00

2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	1□26□	1□26□	1□□0□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.□	2□5□□	□79□	2□61□	□91□	0□12□
SEMANA No.4	0□00□	□79□	0□00□	□91□	0□12□
SEMANA No.5	0□00□	□79□	0□00□	□91□	0□12□
SEMANA No.6	0□00□	□79□	0□00□	□91□	0□12□
SEMANA No.7	0□00□	□79□	0□00□	□91□	0□12□
SEMANA No.8	0□00□	□79□	0□00□	□91□	0□12□
SEMANA No.9	0□00□	□79□	0□00□	□91□	0□12□
SEMANA No.10	0□00□	□79□	0□00□	□91□	0□12□
SEMANA No.11	0□00□	□79□	0□00□	□91□	0□12□
SEMANA No.12	0□00□	□79□	0□00□	□91□	0□12□
SEMANA No.1□	0□00□	□79□	0□00□	□91□	0□12□
SEMANA No.14	0□00□	□79□	0□00□	□91□	0□12□

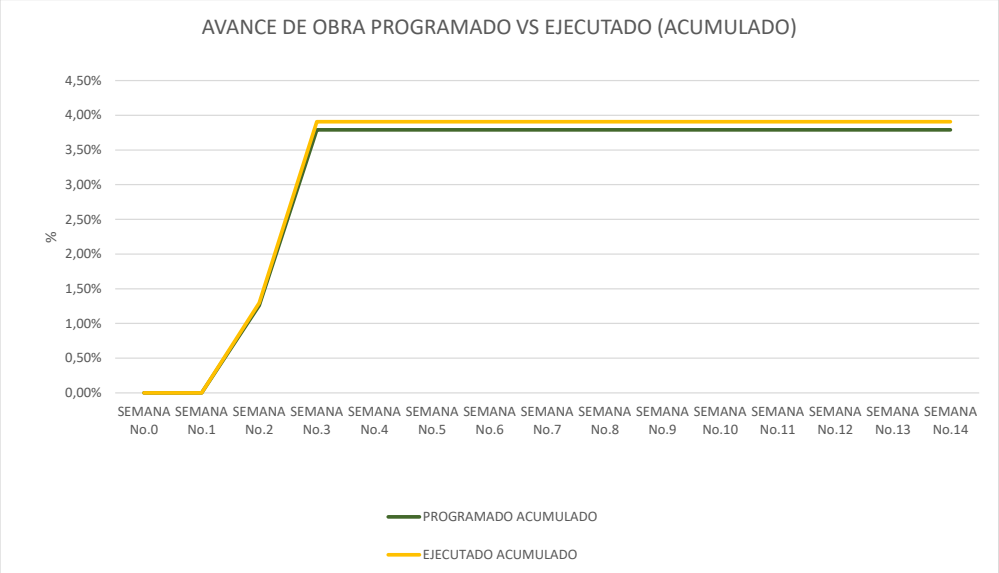□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO	

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20

SEMANA N□	□	**DE**	**d□□ □□□29 d□ □□□r□ d□202□**	**A**	**□□□d□4 d□ □□r□r□d□202□**
□E□□A INI□IO□	16□12□2022	**□E□□A□ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□LOCALI□ACIÓN Y REPLANTEO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□LOCALI□ACIÓN Y REPLANTEO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□LOCALI□ACIÓN Y REPLANTEO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□SUMINISTRO MATERIALES PREFABRICADOS



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□PROTECCIÓN ESPECIES ARBOREAS



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□E□CAVACIÓN MEC□NICA

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.4		
										4
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50			
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64			
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00	100,00%
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00	2,00	$ 32.546,00	100,00%
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00	71,00	$ 1.023.962,00	13,73%
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80			
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11			
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68		$ -	
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84			
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44			
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38			
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04			
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50			
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00					
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00					
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.859,42	74,28	$ 3.730.564,44	79,41%
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05emObra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00					
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00					
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12			
5,8	Tubería perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00			
5,9	Tubería de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tubería de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,20			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00					
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00					
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00			
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.994,00	$ -	25,00	$ 714.850,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquín prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50			
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00					
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78			
7,4	Tableta podotactil Guía 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	35,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15			
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40			
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46			
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84			
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78			
11,7	Árbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00			
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00					
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		**$ 220.402.398,00**		**$ 5.016.964,44**	**2,28%**
	ADMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 64.936.964,00**		**$ 57.304.623,00**		**$ 1.304.410,75**	**2,28%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.497.576,00**		**$ 2.284.024,00**		**$ 50.169,64**	**2,28%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 14.985.453,00**		**$ 13.224.144,00**		**$ 301.017,87**	**2,28%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 82.419.993,00**		**$ 72.732.791,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 332.177.547,00**		**$ 293.135.189,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.988,00**		**$ 4.276.988,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 347.894.213,00		**$ 308.851.855,00**		**$ 6.672.562,70**	**2,16%**
										5,87%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II					
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20					
S□□ □□□N□4	Fecha de in□orme	del□	**5 d□ □□r□r□ d□ 2024**	al	**11 d□ □□r□r□ d□ 2024**	

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL


OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	422,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00

2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	1□26□	1□26□	1□□0□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.□	2□5□□	□79□	2□61□	□91□	0□12□
SEMANA No.4	□5□□	7□□2□	2□28□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.5	0□00□	7□□2□	0□00□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.6	0□00□	7□□2□	0□00□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.7	0□00□	7□□2□	0□00□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.8	0□00□	7□□2□	0□00□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.9	0□00□	7□□2□	0□00□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.10	0□00□	7□□2□	0□00□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.11	0□00□	7□□2□	0□00□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.12	0□00□	7□□2□	0□00□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.1□	0□00□	7□□2□	0□00□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.14	0□00□	7□□2□	0□00□	6□18□	□1□14□

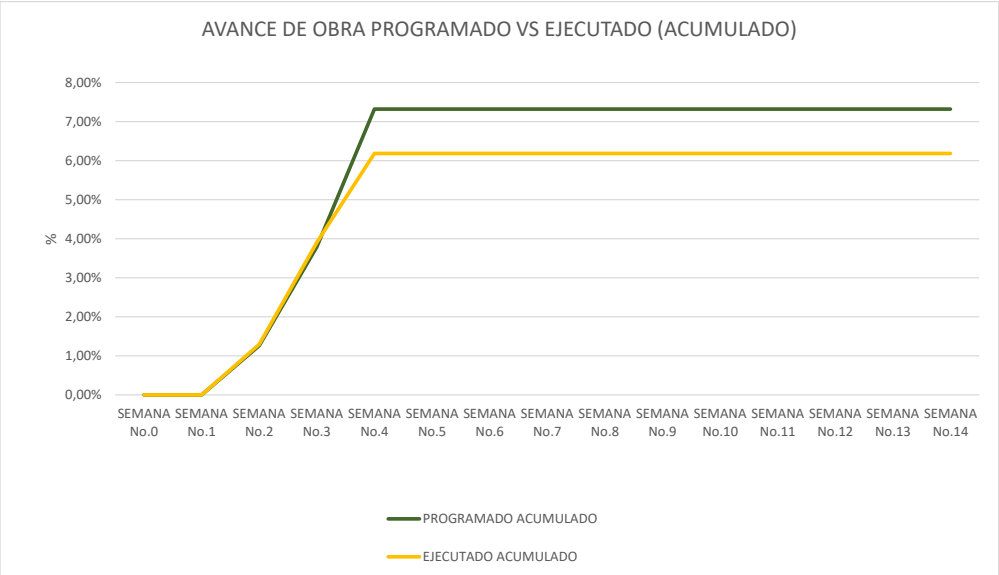□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO	

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20

SEMANA N□	**4**	**DE**	**□□□□5 d□□□r□r□d□2024**	**A**	**d□□ □□□□11 d□□□r□r□d□2024**
□E□□A INI□IO□	16□12□2022	**□E□□A□ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□DESMONTE Y RETIRO DE JUEGOS INFANTILES



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□DESCAPOTE A M□QUINA NIVEL 0.00 □INC. RETIRO□E□20 CM



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□E□CAVACIÓN MANUAL SUELO BLANDO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□DESCAPOTE A M□QUINA NIVEL 0.00 □INC. RETIRO□E□140M



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□PROTECCIÓN DE REJILLAS



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□E□CAVACIÓN MANUAL SUELO BLANDO □BORDILLO□

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.5		
										5
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50			
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64	65,00	$ 1.200.420,00	83,09%
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00	1,00	$ 732.656,00	100,00%
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00	136,00	$ 1.961.392,00	26,31%
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80			
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11			
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68		$ -	
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84			
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44			
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38			
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04	0,22	$ 16.097,84	68,75%
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50			
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00					
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00					
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.859,42	3,50	$ 175.780,50	3,74%
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05en20ra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00					
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00					
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12			
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00			
5,9	Tuberia de limpieza PVC 6 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,29			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00					
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00					
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00			
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20			
5,25	Accesorios PVC.S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	25,00	$ 714.850,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Bioseludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50			
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00					
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A67)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78			
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	35,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15	50,00	$ 4.270.250,00	63,91%
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40			
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46			
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF. Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84			
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78			
11,7	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00			
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00					
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		**$ 220.402.398,00**		**$ 8.356.596,34**	**3,79%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 64.936.964,00**		**$ 57.304.623,00**		**$ 2.172.715,05**	**3,79%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.497.576,00**		**$ 2.204.024,00**		**$ 83.565,96**	**3,79%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 14.985.453,00**		**$ 13.224.144,00**		**$ 501.395,78**	**3,79%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 82.419.993,00**		**$ 72.732.791,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 332.177.547,00**		**$ 293.135.189,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.988,00**		**$ 4.276.988,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 347.894.213,00		**$ 308.851.855,00**		**$ 11.114.273,13**	**3,60%**
										9,47%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II					
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20					
S□□ □□□N□5	Fecha de in□orme	del□	**12 d□ □□r□r□ d□ 2024**	al	**18 d□ □□r□r□ d□ 2024**	

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
	VALOR CONTRATO :

CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	429,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	1□26□	1□26□	1□□0□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.□	2□5□□	□79□	2□61□	□91□	0□12□
SEMANA No.4	□5□□	7□□2□	2□28□	6□18□	1□14□
SEMANA No.5	4□77□	12□09□	□79□	9□98□	2□11□
SEMANA No.6	0□00□	12□09□	0□00□	9□98□	2□11□
SEMANA No.7	0□00□	12□09□	0□00□	9□98□	2□11□
SEMANA No.8	0□00□	12□09□	0□00□	9□98□	2□11□
SEMANA No.9	0□00□	12□09□	0□00□	9□98□	2□11□
SEMANA No.10	0□00□	12□09□	0□00□	9□98□	2□11□
SEMANA No.11	0□00□	12□09□	0□00□	9□98□	2□11□
SEMANA No.12	0□00□	12□09□	0□00□	9□98□	2□11□
SEMANA No.1□	0□00□	12□09□	0□00□	9□98□	2□11□
SEMANA No.14	0□00□	12□09□	0□00□	9□98□	2□11□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

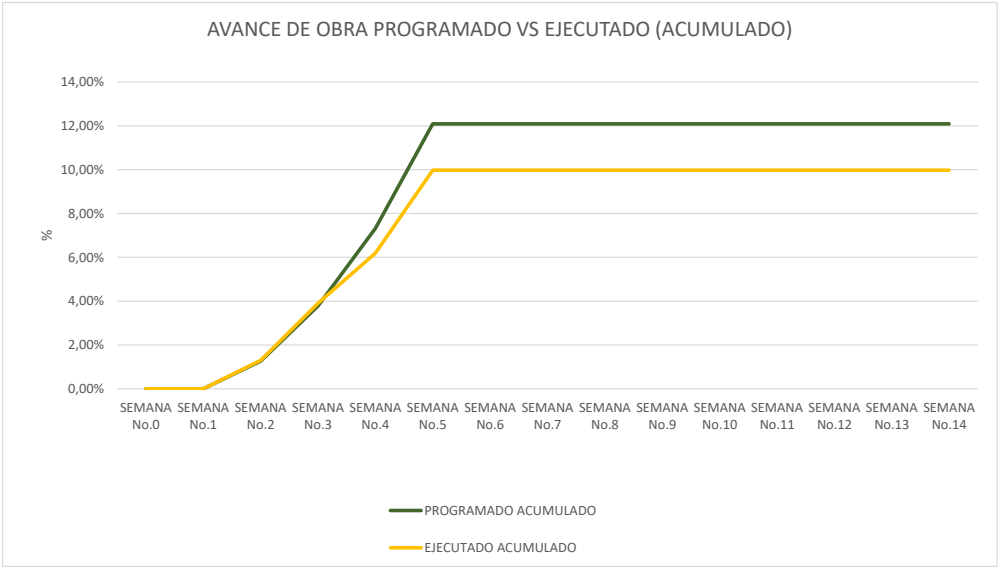

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□ E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□ -20

SEMANA N□	**5**	**DE**	**□□□□□12 d□□□r□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□18 d□□□r□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A□ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□I□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO□O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BORDILLO PREFABRICADO □



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□TRASLADO DE □RBOL PEQUEÑO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□DESCAPOTE A M□QUINA NIVEL 0.00 □INC. RETIRO□E□□20 CM



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□E□CAVACIÓN MANUAL SUELO BLANDO□**PARA**□**ORDILLO E□IS□EN□E**□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□E□CAVACIÓN MUROS Y HUELLAS VACIADAS EN CONCRETO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□DESCAPOTE A M□QUINA NIVEL 0.00 □INC. RETIRO□E□□140M □**SUDS**□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□BORDILLO DEMARCADO RECTO VIAL PREFABRICADO EN CONCRETO □A10□ **INS□ALA□ION**□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□DESCAPOTE A M□QUINA NIVEL 0.00 □INC. RETIRO□E□□20 CM

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.6		
										6
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50			
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64			
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00	185,00	$ 2.668.070,00	35,78%
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80	200,00	$ 528.000,00	59,90%
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11	200,00	$ 279.400,00	77,03%
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68			
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84	1,00	$ 109.904,00	3,31%
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44			
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38			
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04			
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50			
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00					
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00					
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.899,42			
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05en23cra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00					
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00					
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12			
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00			
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,20			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00					
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00					
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00			
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20			
5,25	Accesorios PVC.S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	25,00	$ 714.850,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Bioseludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquín prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50			
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00					
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A67)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78			
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	36,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15			
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40	10,00	$ 908.400,00	9,21%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46			
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF. Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84			
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78			
11,7	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00			
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00					
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		**$ 220.402.398,00**		**$ 4.493.774,00**	**2,04%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 64.936.964,00**		**$ 57.304.623,00**		**$ 1.168.381,24**	**2,04%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.497.576,00**		**$ 2.204.024,00**		**$ 44.937,74**	**2,04%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 14.985.453,00**		**$ 13.224.144,00**		**$ 269.626,44**	**2,04%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 82.419.993,00**		**$ 72.732.791,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 332.177.547,00**		**$ 293.135.189,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.988,00**		**$ 4.276.988,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 347.894.213,00		**$ 308.851.855,00**		**$ 5.976.719,42**	**1,94%**
										11,40%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20				
S□□ □□□N□□	Fecha de in□orme	del□	**19 d□ □□r□r□ d□2024**	al	**25 d□ □□r□r□ d□2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022

VALOR C

CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	436,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	1□26□	1□26□	1□□0□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.□	2□5□□	□79□	2□61□	□91□	0□12□
SEMANA No.4	□5□□	7□□2□	2□28□	6□18□	1□14□
SEMANA No.5	4□77□	12□09□	□79□	9□98□	2□11□
SEMANA No.6	1□98□	14□07□	2□04□	12□01□	2□06□
SEMANA No.7	0□00□	14□07□	0□00□	12□01□	2□06□
SEMANA No.8	0□00□	14□07□	0□00□	12□01□	2□06□
SEMANA No.9	0□00□	14□07□	0□00□	12□01□	2□06□
SEMANA No.10	0□00□	14□07□	0□00□	12□01□	2□06□
SEMANA No.11	0□00□	14□07□	0□00□	12□01□	2□06□
SEMANA No.12	0□00□	14□07□	0□00□	12□01□	2□06□
SEMANA No.1□	0□00□	14□07□	0□00□	12□01□	2□06□
SEMANA No.14	0□00□	14□07□	0□00□	12□01□	2□06□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

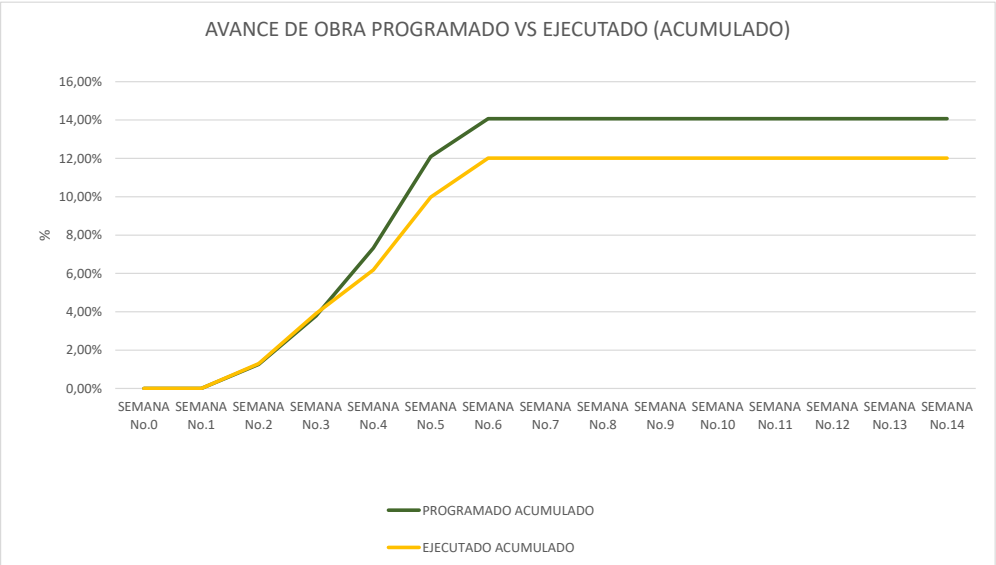

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20

SEMANA N□

□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A□ERMINA□ION□**	19□04□2024

IDEN□I□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".

IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERIA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□DESCAPOTE A M□QUINA NIVEL 0.00 □INC. RETIRO□E□□20 CM



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□NIVELACIÓN Y PERFILADO DE TERRENO MANUAL



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□BORDILLO DEMARCADO RECTO INTERNO PREFABRICADO EN CONCRETO □A80□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□BORDILLO DEMARCADO RECTO INTERNO PREFABRICADO EN CONCRETO □A80□

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.7		
										7
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50			
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64	13,23	$ 244.331,64	16,91%
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00	125,00	$ 1.802.750,00	24,18%
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80	133,87	$ 353.416,80	40,10%
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11	59,63	$ 83.303,11	22,97%
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68		$ -	
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84	24,46	$ 2.688.251,84	80,97%
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44	73,25	$ 817.177,00	21,50%
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38		$ -	
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04	0,10	$ 7.317,20	31,25%
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50			
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00					
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00					
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.859,42	15,76	$ 791.514,48	16,85%
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05en20ra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00					
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00					
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12			
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00			
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,29			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00					
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00					
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00			
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20			
5,25	Accesorios PVC.S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	25,00	$ 714.850,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Bioseludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50			
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00					
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78			
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	36,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15	36,30	$ 3.100.201,50	46,40%
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40	31,00	$ 2.816.040,00	28,56%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46			
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,9	Equipo de GYM REF. Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF. Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84			
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78			
11,7	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00			
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00					
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		$ 220.402.398,00		$ 12.704.303,57	5,76%
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		$ 64.936.964,00		$ 57.304.623,00		$ 3.303.118,93	5,76%
	IMPREVISTOS		**1,00%**		$ 2.497.576,00		$ 2.204.024,00		$ 127.043,04	5,76%
	UTILIDAD		**6,00%**		$ 14.985.453,00		$ 13.224.144,00		$ 762.258,21	5,76%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 82.419.993,00		$ 72.732.791,00			
	COSTO TOTAL OBRA				$ 332.177.547,00		$ 293.135.189,00			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 4.276.988,00		$ 4.276.988,00			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ 11.439.678,00			
					$ 347.894.213,00		$ 308.851.855,00		$ 16.896.723,75	5,47%
										16,87%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20				
S□□ □□□N□7	Fecha de in□orme	del□	**2□d□ □□r□r□ d□2024**	al	**□d□ □ r□□ d□2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	443,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	1□26□	1□26□	1□□0□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.□	2□5□□	□79□	2□61□	□91□	0□12□
SEMANA No.4	□5□□	7□□2□	2□28□	6□18□	1□14□
SEMANA No.5	4□77□	12□09□	□79□	9□98□	2□11□
SEMANA No.6	1□98□	14□07□	2□04□	12□01□	2□06□
SEMANA No.7	7□15□	21□22□	5□76□	17□78□	□□44□
SEMANA No.8	0□00□	21□22□	0□00□	17□78□	□□44□
SEMANA No.9	0□00□	21□22□	0□00□	17□78□	□□44□
SEMANA No.10	0□00□	21□22□	0□00□	17□78□	□□44□
SEMANA No.11	0□00□	21□22□	0□00□	17□78□	□□44□
SEMANA No.12	0□00□	21□22□	0□00□	17□78□	□□44□
SEMANA No.1□	0□00□	21□22□	0□00□	17□78□	□□44□
SEMANA No.14	0□00□	21□22□	0□00□	17□78□	□□44□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

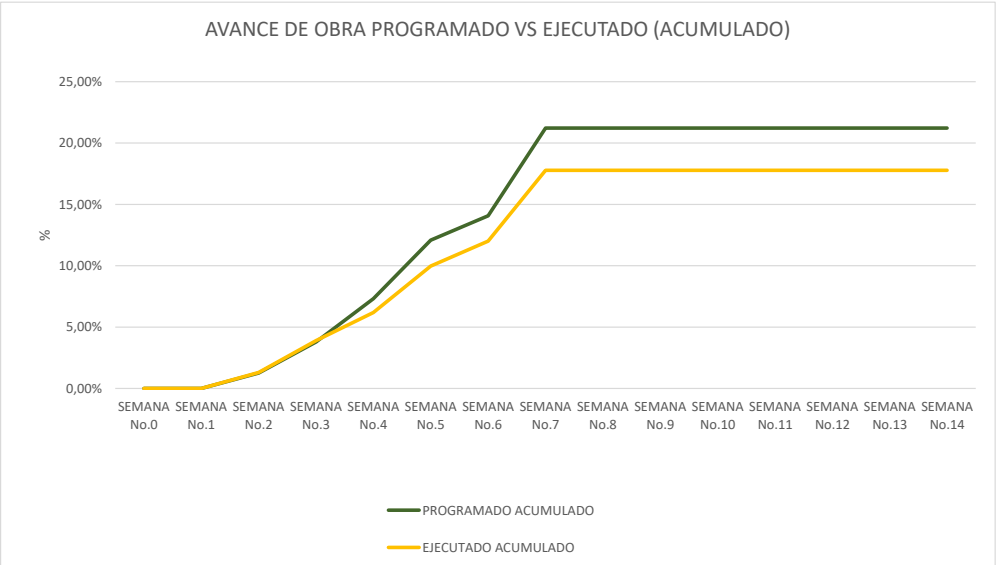

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20


SEMANA N□	**7**	**DE**	**□□□□2□d□□□r□d□2024**	**A**	**d□□ □□□□d□□ □r□□ d□2024**
□E□□A INI□IO□	16:12:2022	**□E□□A□ERMINA□ION□**	19:04:2024		

IDEN□I□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".

IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□□O

U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BORDILLO PREFABRICADO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ DESCAPOTE A M□QUINA NIVEL 0.00 □INC. RETIRO□E□20 CM



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ NIVELACIÓN Y PERFILADO DE TERRENO MANUAL□NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ E□CAVACIÓN MANUAL SUELO BLANDO




U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD□GEOTE□TIL T□ 2400



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ DESCAPOTE A M□QUINA NIVEL 0.00 □INC. RETIRO□E□140M

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.8		
										8
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50			
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64		$ -	
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00		$ -	
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80		$ -	
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11		$ -	
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68		$ -	
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84		$ -	
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44	85,00	$ 948.260,00	24,96%
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38		$ -	
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04		$ -	
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50			
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72		$ -	
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00					
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00					
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.899,42			
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enCbra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00					
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00					
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12			
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00			
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,20			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00					
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00					
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00			
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	25,00	$ 714.850,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosolutable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50			
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00					
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A67)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78			
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	36,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15			
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40	28,06	$ 2.548.970,40	25,85%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46			
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,9	Equipo de GYM REF. Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF. Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84			
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78			
11,7	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00			
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00					
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		$ 220.402.398,00		$ 3.497.230,40	1,59%
	AMINISTRACIÓN		26,00%		$ 64.936.964,00		$ 57.304.623,00		$ 909.279,90	1,59%
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 2.497.576,00		$ 2.204.024,00		$ 34.972,30	1,59%
	UTILIDAD		6,00%		$ 14.985.453,00		$ 13.224.144,00		$ 209.833,82	1,59%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD		-		$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 82.419.993,00		$ 72.732.791,00			
	COSTO TOTAL OBRA				$ 332.177.547,00		$ 293.135.189,00			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 4.276.988,00		$ 4.276.988,00			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ 11.439.678,00			
					$ 347.894.213,00		$ 308.851.855,00		$ 4.651.316,42	1,51%
										18,38%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20				
S□□ □□□N□8	Fecha de in□orme	del□	**4 d□ □ □r□□ d□ 2024**	al	**10 d□ □ □r□□ d□ 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	450,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	1□26□	1□26□	1□□0□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.□	2□5□□	□79□	2□61□	□91□	0□12□
SEMANA No.4	□5□□	7□□2□	2□28□	6□18□	1□14□
SEMANA No.5	4□77□	12□09□	□79□	9□98□	2□11□
SEMANA No.6	1□98□	14□07□	2□04□	12□01□	2□06□
SEMANA No.7	7□15□	21□22□	5□76□	17□78□	□□44□
SEMANA No.8	2□06□	2□□28□	1□59□	19□□6□	□□92□
SEMANA No.9	0□00□	2□□28□	0□00□	19□□6□	□□92□
SEMANA No.10	0□00□	2□□28□	0□00□	19□□6□	□□92□
SEMANA No.11	0□00□	2□□28□	0□00□	19□□6□	□□92□
SEMANA No.12	0□00□	2□□28□	0□00□	19□□6□	□□92□
SEMANA No.1□	0□00□	2□□28□	0□00□	19□□6□	□□92□
SEMANA No.14	0□00□	2□□28□	0□00□	19□□6□	□□92□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

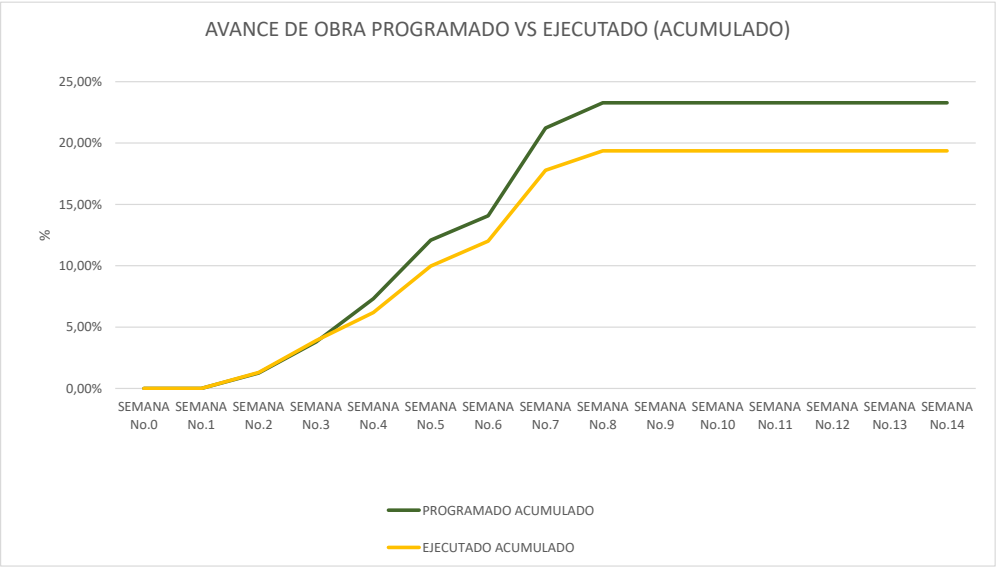


IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20

SEMANA N□	**8**	**DE**	**□□□□□4 d□□ □r□□ d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□10 d□□ □□r□□ d□ 2024**
□E□□A INI□IO□	16□12□2022	**□E□□A□ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□□O

U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BORDILLO PREFABRICADO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ DESCAPOTE A M□QUINA NIVEL 0.00 □INC. RETIRO□E□20 CM



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ NIVELACIÓN Y PERFILADO DE TERRENO MANUAL□NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ E□CAVACIÓN MANUAL SUELO BLANDO




U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD□GEOTE□TIL T□ 2400



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ DESCAPOTE A M□QUINA NIVEL 0.00 □INC. RETIRO□E□140M

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.9		
										9
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50			
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64		$ -	
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00		$ -	
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80		$ -	
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11		$ -	
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68		$ -	
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84	3,21	$ 352.791,84	10,63%
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44		$ -	
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38		$ -	
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04		$ -	
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50	2,24	$ 2.302.395,20	12,24%
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72	7,59	$ 4.161.794,34	98,32%
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00					
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00					
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.859,42			
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enCbra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00					
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00					
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12			
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00			
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,20			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00					
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00					
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00			
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20			
5,25	Accesorios PVC.S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	25,00	$ 714.850,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Bioselutable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50			
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00					
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A67)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78			
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	36,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15			
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40	23,00	$ 2.089.320,00	21,19%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46			
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF. Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84			
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78			
11,7	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00			
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00					
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		$ 220.402.398,00		$ 8.906.301,38	4,04%
	AMINISTRACIÓN		26,00%		$ 64.936.964,00		$ 57.304.623,00		$ 2.315.638,36	4,04%
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 2.497.576,00		$ 2.204.024,00		$ 89.063,01	4,04%
	UTILIDAD		6,00%		$ 14.985.453,00		$ 13.224.144,00		$ 534.378,08	4,04%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 82.419.993,00**		**$ 72.732.791,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 332.177.547,00**		**$ 293.135.189,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.988,00**		**$ 4.276.988,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 347.894.213,00		**$ 308.851.855,00**		**$ 11.845.380,83**	**3,84%**
										22,21%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20				
S□□ □□□N□9	Fecha de in□orme	del□	**11 d□ □ □r□□ d□2024**	al	**17 d□ □ □r□□ d□2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022

CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	457,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	1□26□	1□26□	1□□0□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.□	2□5□□	□79□	2□61□	□91□	0□12□
SEMANA No.4	□5□□	7□□2□	2□28□	6□18□	1□14□
SEMANA No.5	4□77□	12□09□	□79□	9□98□	2□11□
SEMANA No.6	1□98□	14□07□	2□04□	12□01□	2□06□
SEMANA No.7	7□15□	21□22□	5□76□	17□78□	□□44□
SEMANA No.8	2□06□	2□□28□	1□59□	19□□6□	□□92□
SEMANA No.9	4□6□□	27□91□	4□04□	2□□41□	4□50□
SEMANA No.10	0□00□	27□91□	0□00□	2□□41□	4□50□
SEMANA No.11	0□00□	27□91□	0□00□	2□□41□	4□50□
SEMANA No.12	0□00□	27□91□	0□00□	2□□41□	4□50□
SEMANA No.1□	0□00□	27□91□	0□00□	2□□41□	4□50□
SEMANA No.14	0□00□	27□91□	0□00□	2□□41□	4□50□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

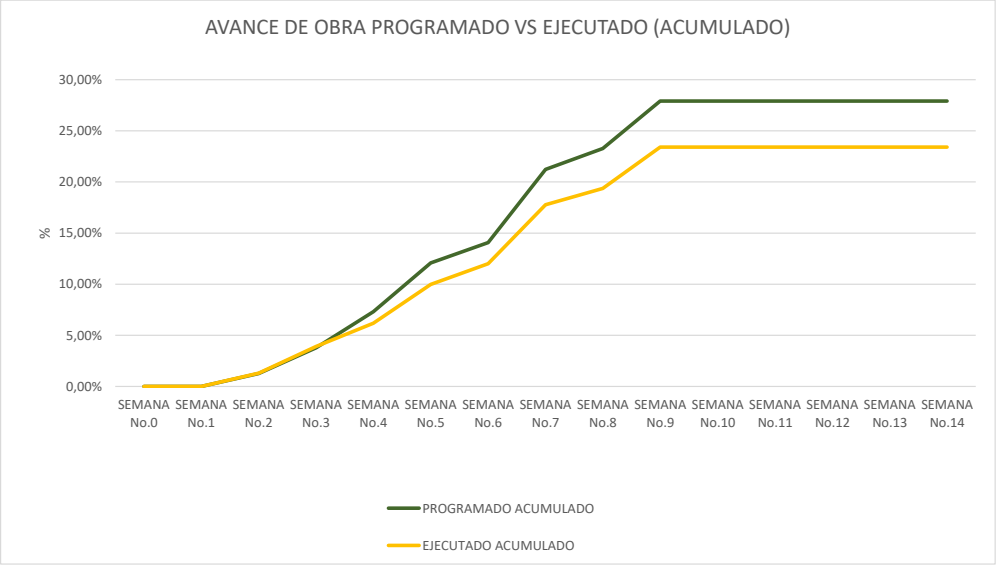

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20

□E□□A INI□IO□	16:12:2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19:04:2024

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □Ó□O□RA□□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ PLACA CONTRAPISO □000 PSI 21MPA E□15



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ CONCRETO CICLÓPEO □000 PSI CIMENTAC□FORMALETA□SUDS□



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ CONCRETO CICLÓPEO TOMA DE MEDIDAS



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ BORDILLO DEMARCADO RECTO INTERNO PREFABRICADO EN CONCRETO □A80□



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ BORDILLO DEMARCADO RECTO INTERNO PREFABRICADO EN CONCRETO □A80□

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.10		
										10
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50		$ -	
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64		$ -	
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00		$ -	
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80		$ -	
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11		$ -	
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68		$ -	
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84	1,54	$ 169.252,16	5,10%
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44	110,00	$ 1.227.160,00	32,28%
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38		$ -	
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04		$ -	
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40	13,61	$ 2.265.112,30	50,26%
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50		$ -	
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72		$ -	
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00	65,00	$ 716.625,00	72,22%
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00					
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00					
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.899,42			
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05m/2bra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00					
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00					
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12			
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00			
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,20			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68	85,47	$ 489.401,22	99,75%
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00					
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00					
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00			
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	25,00	$ 714.850,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Bioseludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50			
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00					
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A67)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78			
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	36,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15		$ -	
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40	6,00	$ 545.040,00	5,53%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80	48,00	$ 5.116.224,00	94,86%
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46			
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF. Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84			
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78			
11,7	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00			
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00					
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		$ 220.402.398,00		$ 10.528.814,68	4,78%
	ADMINISTRACIÓN		26,00%		$ 64.936.964,00		$ 57.304.623,00		$ 2.737.491,82	4,78%
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 2.497.576,00		$ 2.204.024,00		$ 105.288,15	4,78%
	UTILIDAD		6,00%		$ 14.985.453,00		$ 13.224.144,00		$ 631.728,88	4,78%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 82.419.993,00		$ 72.732.791,00			
	COSTO TOTAL OBRA				$ 332.177.547,00		$ 293.135.189,00			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 4.276.988,00		$ 4.276.988,00			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ 11.439.678,00			
					$ 347.894.213,00		$ 308.851.855,00		$ 14.003.323,53	4,53%
										26,75%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20				
S□□ □□□N□10	Fecha de in□orme	del□	**18 d□ □ □r□□ d□ 2024**	al	**24 d□ □ □r□□ d□ 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
	VALOR CONTRATO :
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	464,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□ d□ □□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	1□26□	1□26□	1□□0□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.□	2□5□□	□79□	2□61□	□91□	0□12□
SEMANA No.4	□5□□	7□□2□	2□28□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.5	4□77□	12□09□	□79□	9□98□	□2□11□
SEMANA No.6	1□98□	14□07□	2□04□	12□01□	□2□06□
SEMANA No.7	7□15□	21□22□	5□76□	17□78□	□□44□
SEMANA No.8	2□06□	2□□28□	1□59□	19□□6□	□□92□
SEMANA No.9	4□6□□	27□91□	4□04□	2□□41□	□4□50□
SEMANA No.10	5□□2□	□□□2□□	4□78□	28□18□	□5□05□
SEMANA No.11	0□00□	□□□2□□	0□00□	28□18□	□5□05□
SEMANA No.12	0□00□	□□□2□□	0□00□	28□18□	□5□05□
SEMANA No.1□	0□00□	□□□2□□	0□00□	28□18□	□5□05□
SEMANA No.14	0□00□	□□□2□□	0□00□	28□18□	□5□05□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

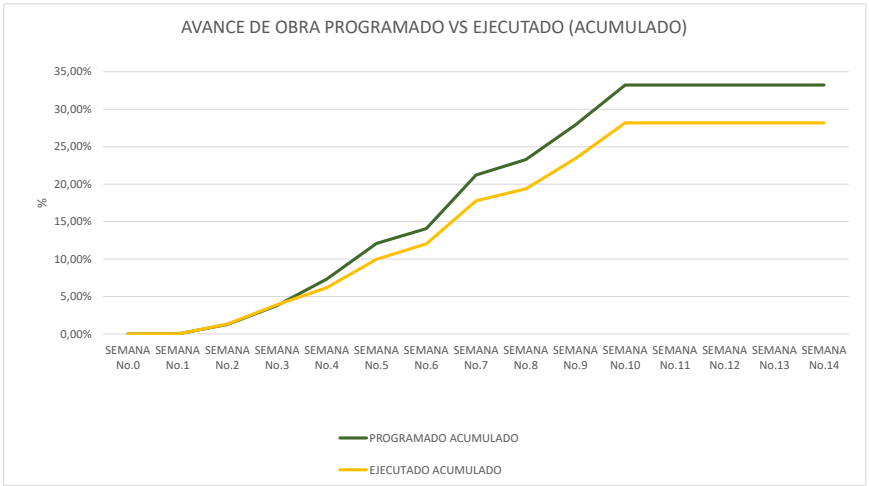

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20

SEMANA N□	**10**	**DE**	**□□□□18 d□ □ □r□□ d□2024**	**A**	**d□□ □□□□24 d□ □ □r□□d□2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA □POLISOMBRA□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD□GEOTE□TIL T□2400



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□RELLENO DE RAJON MANUAL



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□DOVELAS □REFUER□O ACERO FY□60000PSI



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□BORDILLO DEMARCADO RECTO VIAL PREFABRICADO EN CONCRETO □A10□□BORDILLO DEMARCADO RECTO INTERNO PREFABRICADO EN CONCRETO □A80□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□MURO BLOQUE EN CONCRETO

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.11		
										11
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50			
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64		$ -	
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00		$ -	
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80		$ -	
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11		$ -	
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68		$ -	
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84			
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44			
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38		$ -	
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04		$ -	
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50		$ -	
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72		$ -	
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00					
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00					
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.899,42			
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05m/2bra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00					
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00					
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12			
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00			
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,29			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00					
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00					
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00			
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20			
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	25,00	$ 714.850,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50			
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00					
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A67)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78			
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	36,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15			
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40			
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00	1,00	$ 629.610,00	50,00%
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00	2,00	$ 2.982.810,00	50,00%
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00	0,50	$ 13.479.884,50	50,00%
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00	0,50	$ 770.792,50	50,00%
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46	12,00	$ 4.376.484,00	67,49%
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,50	$ 2.478.166,00	50,00%
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,50	$ 2.478.166,00	50,00%
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00	0,50	$ 1.516.166,00	50,00%
10,10	Equipo de GYM REF. Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00	0,50	$ 2.029.166,00	50,00%
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84			
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78			
11,7	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	0,50	$ 148.387,00	50,00%
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	0,50	$ 148.387,00	50,00%
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00	0,50	$ 284.739,00	50,00%
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00	0,50	$ 227.351,00	25,00%
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00					
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		$ 220.402.398,00		$ 31.550.109,00	14,31%
	AMINISTRACIÓN		26,00%		$ 64.936.964,00		$ 57.304.623,00		$ 8.203.028,34	14,31%
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 2.497.576,00		$ 2.204.024,00		$ 315.501,09	14,31%
	UTILIDAD		6,00%		$ 14.985.453,00		$ 13.224.144,00		$ 1.893.006,54	14,31%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 82.419.993,00		$ 72.732.791,00			
	COSTO TOTAL OBRA				$ 332.177.547,00		$ 293.135.189,00			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 4.276.988,00		$ 4.276.988,00			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ 11.439.678,00			
					$ 347.894.213,00		$ 308.851.855,00		$ 41.961.644,97	13,59%
										40,34%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II					
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20					
S□□ □□□ N□11	Fecha de in□orme	del□	**25 d□ □ □r□□ d□ 2024**	al	**□1 d□ □ □r□□ d□ 2024**	

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022

CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	471,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	1□26□	1□26□	1□□0□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.□	2□5□□	□79□	2□61□	□91□	0□12□
SEMANA No.4	□5□□	7□□2□	2□28□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.5	4□77□	12□09□	□79□	9□98□	□2□11□
SEMANA No.6	1□98□	14□07□	2□04□	12□01□	□2□06□
SEMANA No.7	7□15□	21□22□	5□76□	17□78□	□□44□
SEMANA No.8	2□06□	2□□28□	1□59□	19□□6□	□□92□
SEMANA No.9	4□6□□	27□91□	4□04□	2□□41□	□4□50□
SEMANA No.10	5□□2□	□□2□□	4□78□	28□18□	□5□05□
SEMANA No.11	1□88□	47□11□	14□□1□	42□50□	□4□61□
SEMANA No.12	0□00□	47□11□	0□00□	42□50□	□4□61□
SEMANA No.1□	0□00□	47□11□	0□00□	42□50□	□4□61□
SEMANA No.14	0□00□	47□11□	0□00□	42□50□	□4□61□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

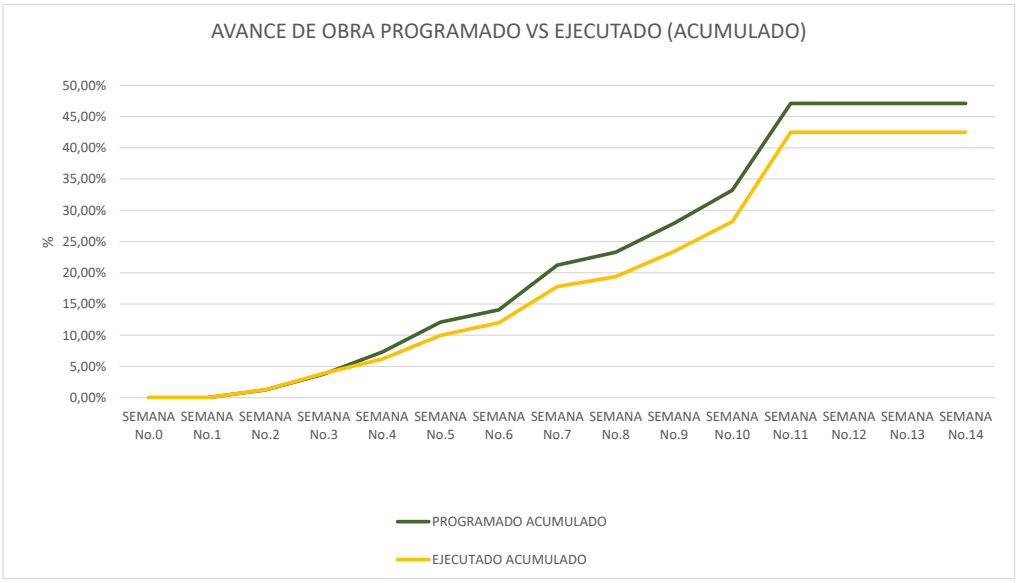

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20

□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ SUMINISTRO DE MOBILIARIO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□SUMINISTRO DE MOBILIARIO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□RETIRO RCD



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□DESCAPOTE PARA □ONA VERDE



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ACOPIO DE RCD



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□SUDS

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.12		
										12
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50			
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64		$ -	
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00		$ -	
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80		$ -	
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11		$ -	
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68		$ -	
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84			
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44		$ -	
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38		$ -	
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04		$ -	
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40	9,07	$ 1.509.519,70	33,49%
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50		$ -	
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72	0,01	$ 5.483,66	0,13%
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00	25,00	$ 275.625,00	27,78%
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00					
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00					
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.899,42			
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enC2ca	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00					
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00					
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12			
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00			
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,29			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68	0,21	$ 1.202,19	0,25%
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00					
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00					
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00			
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20	43,62	$ 1.854.111,72	117,26%
5,25	Accesorios PVC S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	25,00	$ 714.850,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Bioselutable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50			
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00					
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78			
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	35,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15			
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40	11,70	$ 1.062.828,00	10,78%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80	3,80	$ 405.033,99	7,51%
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00	0,90	$ 566.649,00	45,00%
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00	1,80	$ 2.684.529,00	45,00%
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00	0,40	$ 10.783.907,60	40,00%
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00	0,40	$ 616.634,00	40,00%
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46	3,78	$ 1.378.592,46	21,26%
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,40	$ 1.982.532,80	40,00%
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,40	$ 1.982.532,80	40,00%
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00	0,40	$ 1.212.932,80	40,00%
10,10	Equipo de GYM REF. Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00	0,40	$ 1.623.332,80	40,00%
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84			
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78			
11,7	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	0,40	$ 118.709,60	40,00%
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	0,40	$ 118.709,60	40,00%
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00	0,40	$ 227.791,20	40,00%
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00	0,40	$ 181.880,80	20,00%
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00					
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		**$ 220.402.398,00**		**$ 28.592.538,72**	**12,97%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 64.936.964,00**		**$ 57.304.623,00**		**$ 7.434.060,07**	**12,97%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.497.576,00**		**$ 2.204.024,00**		**$ 285.925,39**	**12,97%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 14.985.453,00**		**$ 13.224.144,00**		**$ 1.715.552,32**	**12,97%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 82.419.993,00**		**$ 72.732.791,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 332.177.547,00**		**$ 293.135.189,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.988,00**		**$ 4.276.988,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 347.894.213,00		**$ 308.851.855,00**		**$ 38.028.076,50**	**12,31%**
										52,65%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II					
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20					
S□□ □□□ N□12	Fecha de in□orme	del□	**1 d□ □□r□d□ 2024**	al	**7 d□ □□r□d□ 2024**	

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	478,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	1□26□	1□26□	1□□0□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.□	2□5□□	□79□	2□61□	□91□	0□12□
SEMANA No.4	□5□□	7□□2□	2□28□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.5	4□77□	12□09□	□79□	9□98□	□2□11□
SEMANA No.6	1□98□	14□07□	2□04□	12□01□	□2□06□
SEMANA No.7	7□15□	21□22□	5□76□	17□78□	□□44□
SEMANA No.8	2□06□	2□□28□	1□59□	19□□6□	□□92□
SEMANA No.9	4□6□□	27□91□	4□04□	2□□41□	□4□50□
SEMANA No.10	5□□2□	□□□2□□	4□78□	28□18□	□5□05□
SEMANA No.11	1□□88□	47□11□	14□□1□	42□50□	□4□61□
SEMANA No.12	1□□42□	60□5□□	12□97□	55□47□	□5□06□
SEMANA No.1□	0□00□	60□5□□	0□00□	55□47□	□5□06□
SEMANA No.14	0□00□	60□5□□	0□00□	55□47□	□5□06□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

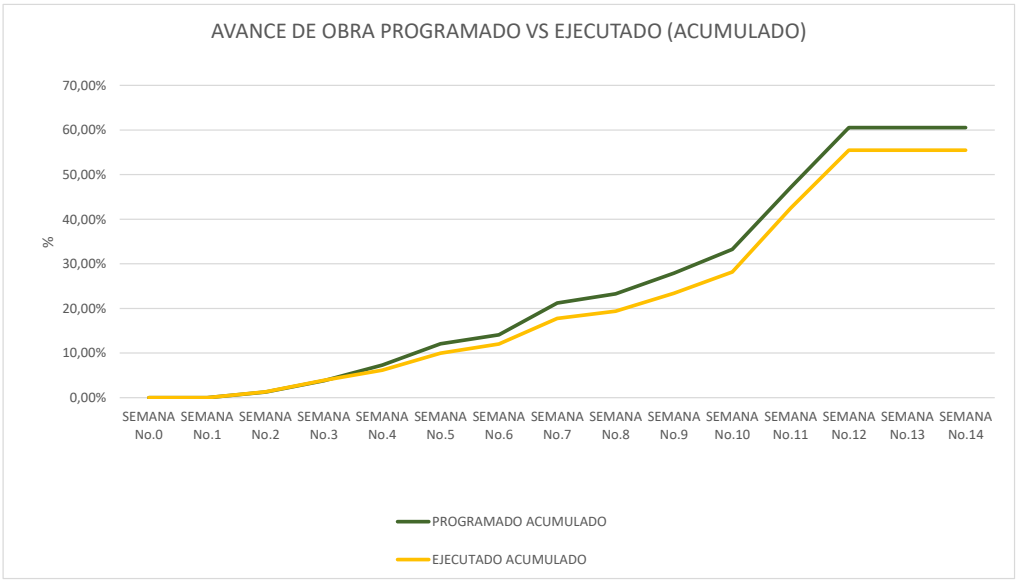

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20

SEMANA N□	**12**	**DE**	**□□□□□1 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□7 d□ □□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".					
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022	
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022	

□□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□ SUMINISTRO DE MOBILIARIO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□SUMINISTRO DE MOBILIARIO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□RETIRO RCD



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□DESCAPOTE PARA □ONA VERDE



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□ACOPIO DE RCD



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□SUDS

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.13		
										13
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00		$ -	
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50		$ -	
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64		$ -	
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00		$ -	
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00		$ -	
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00		$ -	
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00		$ -	
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00		$ -	
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80		$ -	
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11		$ -	
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68		$ -	
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84		$ -	
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44		$ -	
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38	23,00	$ 3.601.639,00	101,50%
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04		$ -	
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40		$ -	
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50	2,00	$ 2.055.710,00	10,93%
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60		$ -	
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00		$ -	
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72		$ -	
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00		$ -	
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00				$ -	
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00				$ -	
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00				$ -	
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.899,42		$ -	
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05en20ra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00				$ -	
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00				$ -	
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80		$ -	
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44	35,00	$ 390.460,00	59,58%
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28	6,00	$ 884.376,00	24,56%
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12	1,00	$ 191.071,00	4,60%
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00	15,00	$ 762.480,00	48,78%
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00		$ -	
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,29		$ -	
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14		$ -	
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00				$ -	
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00				$ -	
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68		$ -	
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00				$ -	
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00				$ -	
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00				$ -	
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00				$ -	
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00		$ -	
5,201	Parhete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20		$ -	
5,25	Accesorios PVC.S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	25,00	$ 714.850,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Biosolutable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91		$ -	
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50		$ -	
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00				$ -	
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78		$ -	
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	36,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36		$ -	
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15		$ -	
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40		$ -	
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80		$ -	
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08		$ -	
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00		$ -	
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00		$ -	
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00		$ -	
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00		$ -	
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46		$ -	
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00		$ -	
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00		$ -	
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00		$ -	
10,10	Equipo de GYM REF. Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00		$ -	
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30		$ -	
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84		$ -	
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00		$ -	
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78		$ -	
11,7	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00		$ -	
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00		$ -	
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00		$ -	
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00		$ -	
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00		$ -	
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00				$ -	
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76		$ -	
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		$ 220.402.398,00		$ 7.885.736,00	3,58%
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		$ 64.936.964,00		$ 57.304.623,00		$ 2.050.291,36	3,58%
	IMPREVISTOS		**1,00%**		$ 2.497.576,00		$ 2.204.024,00		$ 78.857,36	3,58%
	UTILIDAD		**6,00%**		$ 14.985.453,00		$ 13.224.144,00		$ 473.144,16	3,58%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD		-		$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 82.419.993,00		$ 72.732.791,00			
	COSTO TOTAL OBRA				$ 332.177.547,00		$ 293.135.189,00			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 4.276.988,00		$ 4.276.988,00			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ 11.439.678,00			
					$ 347.894.213,00		$ 308.851.855,00		$ 10.488.028,88	3,40%
										56,04%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II					
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20					
S□□ □□□ N□1□	Fecha de in□orme	del□	**8 d□ □□r□□d□ 2024**	al	**14 d□ □□r□□d□ 2024**	

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DIAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	485,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	1□26□	1□26□	1□□0□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.□	2□5□□	□79□	2□61□	□91□	0□12□
SEMANA No.4	□5□□	7□□2□	2□28□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.5	4□77□	12□09□	□79□	9□98□	□2□11□
SEMANA No.6	1□98□	14□07□	2□04□	12□01□	□2□06□
SEMANA No.7	7□15□	21□22□	5□76□	17□78□	□□44□
SEMANA No.8	2□06□	2□□28□	1□59□	19□□6□	□□92□
SEMANA No.9	4□6□□	27□91□	4□04□	2□□41□	□4□50□
SEMANA No.10	5□□2□	□□2□□	4□78□	28□18□	□5□05□
SEMANA No.11	1□88□	47□11□	14□□1□	42□50□	□4□61□
SEMANA No.12	1□42□	60□5□□	12□97□	55□47□	□5□06□
SEMANA No.1□	□47□	64□00□	□58□	59□05□	□4□95□
SEMANA No.14	0□00□	64□00□	0□00□	59□05□	□4□95□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

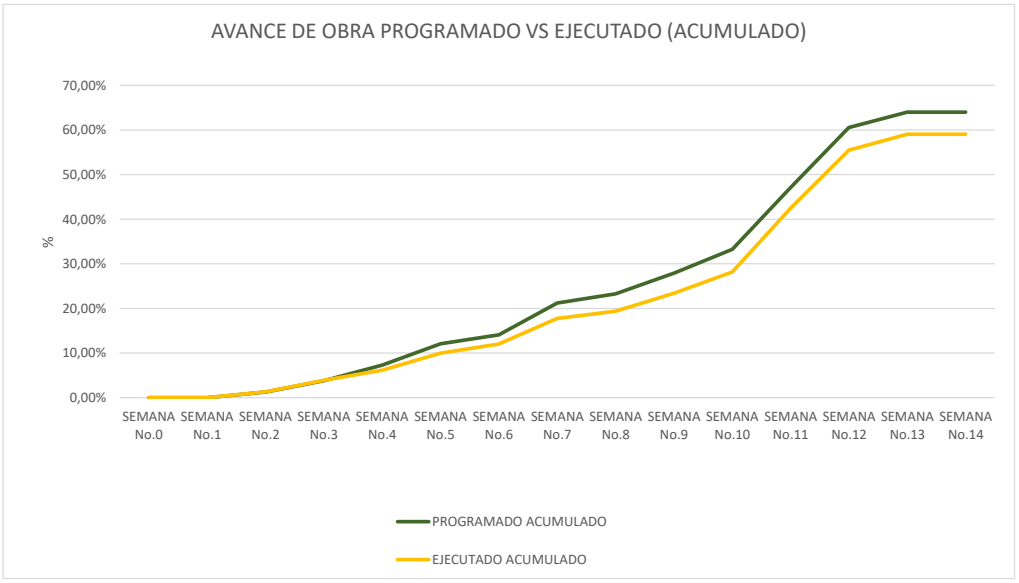

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20

SEMANA N□	**1□**	**DE**	**□□□□8 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□14 d□ □□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA


O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ Base □ltrante SUDS

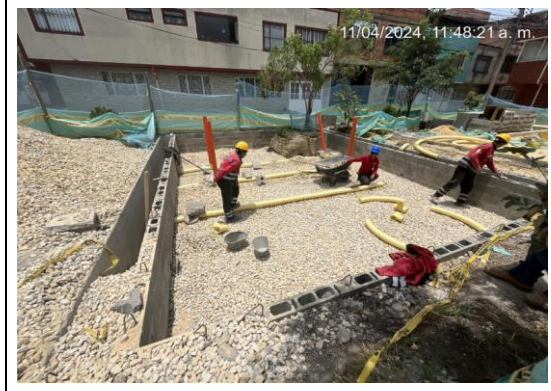

U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□TUBERIA PERFORADA Y DE LIMPIE□A SUDS



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□TUBERIA PERFORADA Y DE LIMPIE□A SUDS



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□BASE COMPACTA



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□BASE COMPACTA



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□BASE COMPACTA

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.14		
										14
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50			
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64			
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00			
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80			
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11			
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68			
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84			
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44			
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38			
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04			
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50	9,85	$ 10.124.371,75	53,83%
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00					
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00				$ -	
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.859,42			
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05en23cra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00					
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00					
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44	21,28	$ 237.399,68	36,23%
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28	10,00	$ 1.473.960,00	40,93%
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12	2,00	$ 382.142,00	9,21%
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00	12,00	$ 609.984,00	39,02%
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00	100,00%
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,29	6,00	$ 482.466,00	187,50%
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00					
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00					
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00			
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20			
5,25	Accesorios PVC.S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	25,00	$ 714.850,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Bioseludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquín prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50			
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00					
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A67)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78	1,20	$ 103.798,80	2,98%
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	36,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36	1,80	$ 155.698,20	5,35%
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15			
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40			
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00			
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00			
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46			
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,9	Equipo de GYM REF. Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF. Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84			
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78			
11,7	Arbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00			
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00					
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		$ 220.402.398,00		$ 14.078.140,43	6,39%
	AMINISTRACIÓN		26,00%		$ 64.936.964,00		$ 57.304.623,00		$ 3.660.316,51	6,39%
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 2.497.576,00		$ 2.204.024,00		$ 140.781,40	6,39%
	UTILIDAD		6,00%		$ 14.985.453,00		$ 13.224.144,00		$ 844.688,43	6,39%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 82.419.993,00		$ 72.732.791,00			
	COSTO TOTAL OBRA				$ 332.177.547,00		$ 293.135.189,00			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 4.276.988,00		$ 4.276.988,00			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ 11.439.678,00			
					$ 347.894.213,00		$ 308.851.855,00		$ 18.723.926,77	6,06%
										62,11%

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20				
S□□ □□□N□14	Fecha de in□orme	del□	**15 d□ □□r□d□ 2024**	al	**21 d□ □□r□d□ 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022
VALOR CONTRATO :	$ 2.550.000.000
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2	19 de mayo de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	492,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□ d□ □□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	1□26□	1□26□	1□□0□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.□	2□5□□	□79□	2□61□	□91□	0□12□
SEMANA No.4	□5□□	7□□2□	2□28□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.5	4□77□	12□09□	□79□	9□98□	□2□11□
SEMANA No.6	1□98□	14□07□	2□04□	12□01□	□2□06□
SEMANA No.7	7□15□	21□22□	5□76□	17□78□	□□44□
SEMANA No.8	2□06□	2□□28□	1□59□	19□□6□	□□92□
SEMANA No.9	4□6□□	27□91□	4□04□	2□□41□	□4□50□
SEMANA No.10	5□□2□	□□2□□	4□78□	28□18□	□5□05□
SEMANA No.11	1□□88□	47□11□	14□□1□	42□50□	□4□61□
SEMANA No.12	1□□42□	60□5□□	12□97□	55□47□	□5□06□
SEMANA No.1□	□□47□	64□00□	□□58□	59□05□	□4□95□
SEMANA No.14	4□40□	68□40□	6□□9□	65□44□	□2□96□
SEMANA No.15	0□00□	68□40□	0□00□	65□44□	□2□96□
SEMANA No.16	0□00□	68□40□	0□00□	65□44□	□2□96□
SEMANA No.17	0□00□	68□40□	0□00□	65□44□	□2□96□
SEMANA No.18	0□00□	68□40□	0□00□	65□44□	□2□96□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

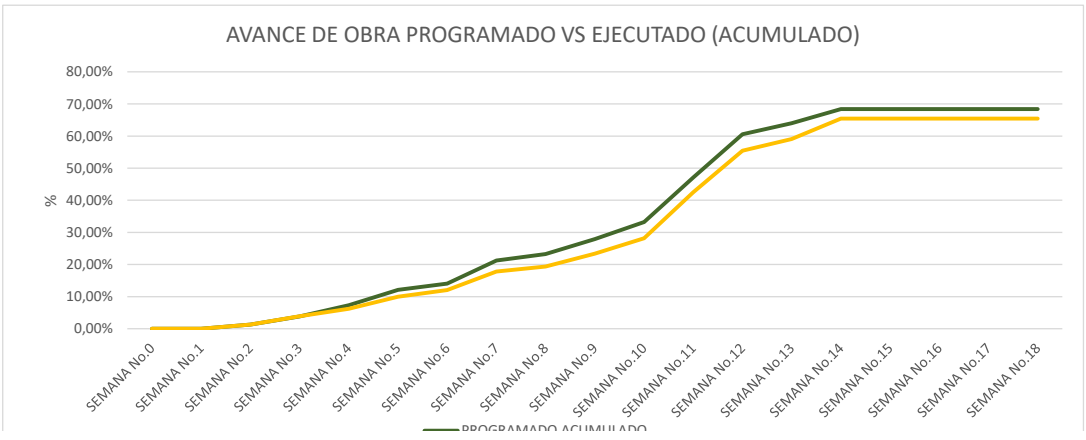

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20

SEMANA N□	**14**	**DE**	**d□□ □□□□14 d□ □□r□d□2024**	**A**	**□□□□d□20 d□ □□r□d□2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".					
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9.2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022	
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4.0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022	

□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ Ca□a □ltrante SUDS




U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□Malla electrosoldada □ona de □e□os



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□Malla electrosoldada □ona biosaludables

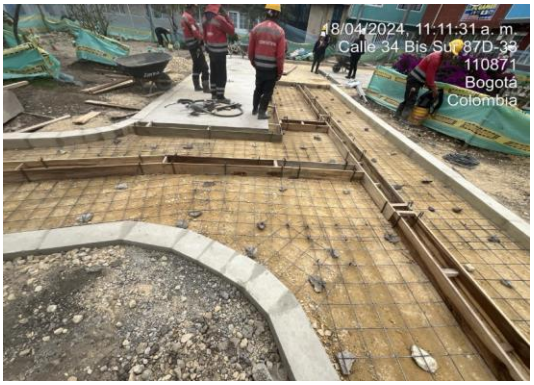

U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□Malla electrosoldada senderos □eatonales



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□Malla electrosoldada senderos □eatonales





U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□Placas en concreto □000 □si□total □onas duras

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.15		
										15
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50			
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64			
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00			
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80			
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11			
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68		$ -	
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84			
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44			
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38			
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04			
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50	1,00	$ 1.027.855,00	5,46%
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20	50,60	$ 5.294.885,20	100,00%
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00					
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00				$ -	#¡DIV/0!
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.859,42			
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enCbra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00					
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00					
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12			
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00			
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,20			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00					
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00					
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00			
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20			
5,25	Accesorios PVC.S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	25,00	$ 714.850,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Bioselutable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loosema-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50	4,20	$ 293.055,00	20,21%
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00					
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78	22,11	$ 1.912.493,20	54,97%
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	36,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36	33,53	$ 2.900.311,80	99,67%
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15			
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40			
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08		$ -	
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00		$ -	
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00		$ -	
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00		$ -	
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00		$ -	
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46		$ -	
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00		$ -	
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00		$ -	
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00		$ -	
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00		$ -	
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30		$ -	
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84			
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78		$ -	
11,7	Árbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00		$ -	
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00		$ -	
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00		$ -	
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00		$ -	
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00					
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		$ 220.462.398,00		$ 11.428.600,20	5,19%
	ADMINISTRACIÓN		26,00%		$ 64.936.964,00		$ 57.304.623,48		$ 2.971.436,05	5,19%
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 2.497.576,00		$ 2.204.024,00		$ 114.286,00	5,19%
	UTILIDAD		6,00%		$ 14.985.453,00		$ 13.224.144,00		$ 685.716,01	5,19%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 82.419.993,00		$ 72.732.791,00			
	COSTO TOTAL OBRA				$ 332.177.547,00		$ 293.135.189,00			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 4.276.598,00		$ 4.276.598,00			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ 11.439.678,00			
					$ 347.894.213,00		$ 308.851.855,00		$ 15.200.038,26	4,92%
										#¡REF!

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20				
S□□ □□□N□15	Fecha de in□orme	del□	**22 d□ □□r□d□ 2024**	al	**28 d□ □□r□d□ 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022

CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2	19 de mayo de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	499,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	1□26□	1□26□	1□□0□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.□	2□5□□	□79□	2□61□	□91□	0□12□
SEMANA No.4	□5□□	7□□2□	2□28□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.5	4□77□	12□09□	□79□	9□98□	□2□11□
SEMANA No.6	1□98□	14□07□	2□04□	12□01□	□2□06□
SEMANA No.7	7□15□	21□22□	5□76□	17□78□	□□44□
SEMANA No.8	2□06□	2□□28□	1□59□	19□□6□	□□92□
SEMANA No.9	4□6□□	27□91□	4□04□	2□41□	□4□50□
SEMANA No.10	5□□2□	□□2□□	4□78□	28□18□	□5□05□
SEMANA No.11	1□88□	47□11□	14□□1□	42□50□	□4□61□
SEMANA No.12	1□42□	60□5□□	12□97□	55□47□	□5□06□
SEMANA No.1□	□47□	64□00□	□58□	59□05□	□4□95□
SEMANA No.14	4□40□	68□40□	VERIFICAR	□VALOR□	□VALOR□
SEMANA No.15	0□00□	68□40□	5□19□	□VALOR□	□VALOR□
SEMANA No.16	0□00□	68□40□	0□00□	□VALOR□	□VALOR□
SEMANA No.17	0□00□	68□40□	0□00□	□VALOR□	□VALOR□
SEMANA No.18	0□00□	68□40□	0□00□	□VALOR□	□VALOR□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

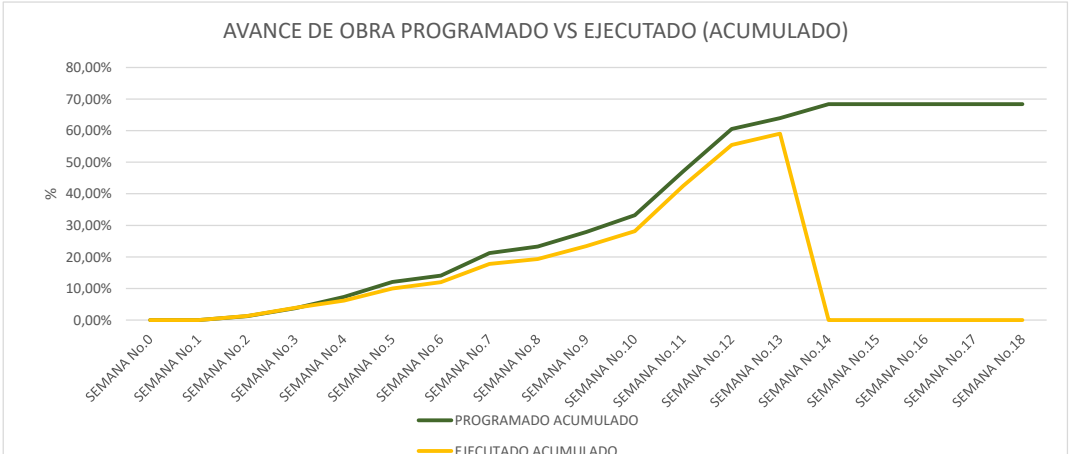

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20

SEMANA N□	**15**	**DE**	**□□□□□ 22 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□□ 28 d□ □□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ E□ca□acion manual contenedor de rai□



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□Acero de re□uer□o contenedor de rai□



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□Concreto □000 □si □ara contenedor de rai□



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□Arena □ara base ado□uin



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□Instalación tableta tactil □□uia □re□abricada



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□Instalación tableta tactil □□uia □re□abricada

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.16		
										16
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00			
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50			
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64			
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00			
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00			
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00			
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00			
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00			
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80			
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11			
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68		$ -	
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84			
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44			
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38			
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04			
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40			
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50			
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60			
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00			
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72			
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00			
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20			
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00					
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00					
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00					
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.859,42			
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enCbra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00					
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00					
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80			
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44			
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28			
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12			
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00			
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00			
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,20			
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14			
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00					
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00					
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68			
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00					
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00					
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00					
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00					
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00			
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20			
5,25	Accesorios PVC.S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	25,00	$ 714.850,00			
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Bioselutable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91			
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50	16,80	$ 1.172.220,00	80,86%
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00					
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78			
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	36,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36			
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15			
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40			
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80			
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08			
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00			
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00	0,20	$ 298.281,00	5,00%
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00			
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00	0,05	$ 77.079,25	5,00%
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46	2,00	$ 729.414,00	11,25%
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00			
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00			
10,10	Equipo de GYM REF. Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00			
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30			
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84			
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78			
11,7	Árbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00			
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00			
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00			
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00			
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00					
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76			
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		**$ 220.402.398,00**		**$ 2.276.994,25**	**1,03%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 64.936.964,00**		**$ 57.304.623,48**		**$ 592.018,51**	**1,03%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.497.576,00**		**$ 2.204.024,00**		**$ 22.769,94**	**1,03%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 14.985.453,00**		**$ 13.224.144,00**		**$ 136.619,66**	**1,03%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 82.419.993,00**		**$ 72.732.791,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 332.177.547,00**		**$ 293.135.189,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.598,00**		**$ 4.276.598,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 347.894.213,00		**$ 308.851.855,00**		**$ 3.028.402,36**	**0,98%**
										#¡REF!

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20				
S□□ □□□N□1□	Fecha de in□orme	del□	**29 d□ □□r□d□ 2024**	al	**5 d□ □ □□□ d□ 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022

CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2	19 de mayo de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	506,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□□ d□ □□□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	1□26□	1□26□	1□□0□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.□	2□5□□	□79□	2□61□	□91□	0□12□
SEMANA No.4	□5□□	7□□2□	2□28□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.5	4□77□	12□09□	□79□	9□98□	□2□11□
SEMANA No.6	1□98□	14□07□	2□04□	12□01□	□2□06□
SEMANA No.7	7□15□	21□22□	5□76□	17□78□	□□44□
SEMANA No.8	2□06□	2□□28□	1□59□	19□□6□	□□92□
SEMANA No.9	4□6□□	27□91□	4□04□	2□41□	□4□50□
SEMANA No.10	5□□2□	□□2□□	4□78□	28□18□	□5□05□
SEMANA No.11	1□88□	47□11□	14□□1□	42□50□	□4□61□
SEMANA No.12	1□42□	60□5□□	12□97□	55□47□	□5□06□
SEMANA No.1□	□47□	64□00□	□58□	59□05□	□4□95□
SEMANA No.14	4□40□	68□40□	VERIFICAR	□VALOR□	□VALOR□
SEMANA No.15	0□00□	68□40□	5□19□	□VALOR□	□VALOR□
SEMANA No.16	10□□2□	78□72□	1□0□□	□VALOR□	□VALOR□
SEMANA No.17	0□00□	78□72□	0□00□	□VALOR□	□VALOR□
SEMANA No.18	0□00□	78□72□	0□00□	□VALOR□	□VALOR□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

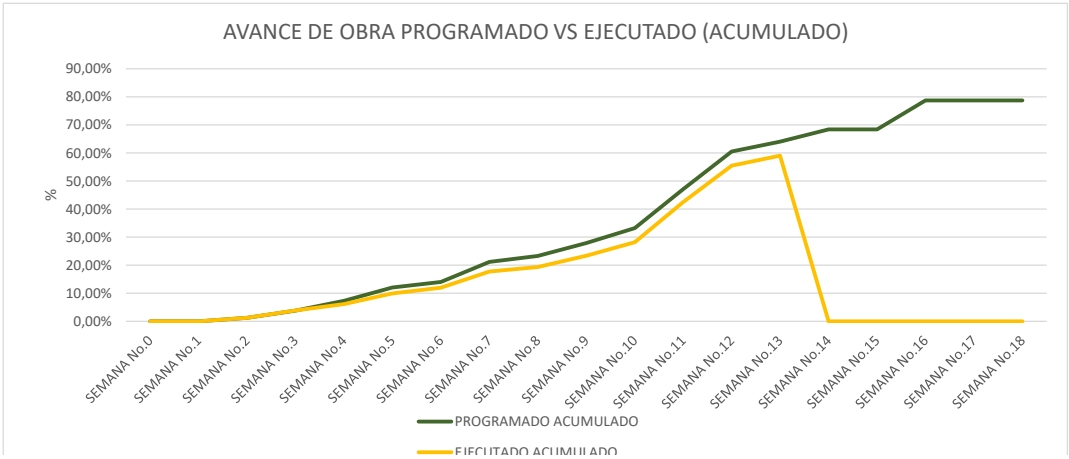

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20

□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9:2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4.0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□ Arena □ara instalacion de ado□uin



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□Ado□uin □re□abricado □instalacion de bancas



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□Demolicion de anden



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□Instalacion de barandas □ona de □ue□os □base tierra ne□ra □onas □erdes



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□base tierra ne□ra □onas □erdes



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□20

□OMEN□ARIOS□Per□lada de terreno □base tierra ne□ra □onas □erdes

CONSORCIO INGENIERÍA I

Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.17		
										17
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00		$ -	
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50		$ -	
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64		$ -	
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00		$ -	
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00		$ -	
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00		$ -	
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00		$ -	
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00		$ -	
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80		$ -	
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11		$ -	
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68		$ -	
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84		$ -	
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44	-63,31	-$ 706.286,36	-18,58%
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38	-4,49	-$ 703.102,57	-19,81%
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04		$ -	
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00		45,32	$ 1.920.842,88			
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40		$ -	
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50	3,21	$ 3.299.414,55	17,54%
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60		$ -	
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00	0,94	$ 818.035,00	100,00%
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72		$ -	
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00		$ -	
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20		$ -	
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00				$ -	
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00				$ -	
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00				$ -	
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.859,42		$ -	
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enCbra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00				$ -	
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00				$ -	
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80	-0,24	-$ 23.703,84	-1,35%
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44	2,46	$ 27.443,76	4,19%
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28	9,33	$ 1.375.204,68	38,19%
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12	19,52	$ 3.729.705,92	89,87%
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00	4,20	$ 213.494,40	13,66%
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00		$ -	
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,29	0,70	$ 56.287,70	21,88%
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14	-0,30	-$ 51.150,30	-3,69%
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00				$ -	
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00				$ -	
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68		$ -	
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00				$ -	
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00				$ -	
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00				$ -	
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00				$ -	
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00		$ -	
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20		$ -	
5,25	Accesorios PVC.S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	25,00	$ 714.850,00	15,00	$ 428.910,00	60,00%
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Bioseludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91		$ -	
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50		$ -	
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00				$ -	
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78	16,91	$ 1.462.698,09	42,04%
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	36,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36	-3,54	-$ 306.206,46	-10,52%
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15	-8,07	-$ 689.218,35	-10,32%
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40	-1,20	-$ 109.008,00	-1,11%
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80		$ -	
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00			
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**									
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08	25,00	$ 14.152.050,00	98,27%
10,00	**MOBILIARIO URBANO**									
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00		$ -	
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00		$ -	
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00		$ -	
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00		$ -	
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46		$ -	
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,10	$ 495.633,20	10,00%
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00	0,10	$ 495.633,20	10,00%
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00	0,10	$ 303.233,20	10,00%
10,10	Equipo de GYM REF Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00	0,10	$ 405.833,20	10,00%
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00			
11,00	**VEGETACION**									
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30	191,15	$ 1.992.165,30	100,00%
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84		$ -	
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00		$ -	
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78	24,38	$ 1.595.207,78	100,00%
11,7	Árbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00		$ -	
12,00	**SEÑALETICA**									
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00		$ -	
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00		$ -	
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00		$ -	
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00		$ -	
13,00	**OTROS**									
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00				$ -	
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76		$ -	
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		$ 220.402.398,00		$ 28.262.274,10	12,82%
	ADMINISTRACIÓN		26,00%		$ 64.936.964,00		$ 57.304.623,48		$ 7.348.191,27	12,82%
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 2.497.576,00		$ 2.204.024,00		$ 282.622,74	12,82%
	UTILIDAD		6,00%		$ 14.985.453,60		$ 13.224.144,00		$ 1.695.736,45	12,82%
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				$ 82.419.993,60		$ 72.732.791,00			
	COSTO TOTAL OBRA				$ 332.177.547,60		$ 293.135.189,00			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 4.276.598,00		$ 4.276.598,00			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 11.439.678,00		$ 11.439.678,00			
					$ 347.894.213,00		$ 308.851.855,00		$ 37.588.824,56	12,17%
										#¡REF!

	IN□ORME SEMANAL DE O□RA - E□APA II				
	□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20				
S□□ □□□ N□17	Fecha de in□orme	del□	**□ d□ □ □□□ d□ 2024**	al	**12 d□ □ □□□ d□ 2024**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".**
CONTRATO DE OBRA No:	1070-2022

CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA I
PLAZO:	16 MESES Y TRES DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	20 de marzo de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	5 de mayo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	26 de julio de 2023
FECHA DE REINICIO No. 2:	14 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3	12 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO No. 3:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN No. 2	19 de mayo de 2024
PLAZO TRANSCURRIDO	513,00 DÍAS
VALOR INICIAL	$ 2.550.000.000,00
ADICIÓN	$ 0,00
VALOR ACTULIZADO	$ 2.550.000.000,00


2□ SE□UIMIEN□O DE O□RA □IVIL

RESUMEN DE AVA□E DE EJE□U□ION DE O□RA□

Pr□□□□□□□ d□ □□□□□□□□

SEMANA	PRO□RAMADO SEMANA	PRO□RAMADO A□UMULADO	EJE□U□ADO SEMANA	EJE□U□ADO A□UMULADO	A□RASO
SEMANA No.0	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.1	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□	0□00□
SEMANA No.2	1□26□	1□26□	1□□0□	1□□0□	0□04□
SEMANA No.□	2□5□□	□79□	2□61□	□91□	0□12□
SEMANA No.4	□5□□	7□□2□	2□28□	6□18□	□1□14□
SEMANA No.5	4□77□	12□09□	□79□	9□98□	□2□11□
SEMANA No.6	1□98□	14□07□	2□04□	12□01□	□2□06□
SEMANA No.7	7□15□	21□22□	5□76□	17□78□	□□44□
SEMANA No.8	2□06□	2□□28□	1□59□	19□□6□	□□92□
SEMANA No.9	4□6□□	27□91□	4□04□	2□41□	□4□50□
SEMANA No.10	5□□2□	□□2□□	4□78□	28□18□	□5□05□
SEMANA No.11	1□□88□	47□11□	14□□1□	42□50□	□4□61□
SEMANA No.12	1□□42□	60□5□□	12□97□	55□47□	□5□06□
SEMANA No.1□	□□47□	64□00□	□□58□	59□05□	□4□95□
SEMANA No.14	4□40□	68□40□	VERIFICAR	□□VALOR□	□□VALOR□
SEMANA No.15	0□00□	68□40□	5□19□	□□VALOR□	□□VALOR□
SEMANA No.16	10□□2□	78□72□	1□0□□	□□VALOR□	□□VALOR□
SEMANA No.17	10□□2□	89□04□	12□82□	□□VALOR□	□□VALOR□
SEMANA No.18	0□00□	89□04□	0□00□	□□VALOR□	□□VALOR□

□URVA DE AVAN□E DE A□□IVIDADES EJE□U□ADO VS PRO□RAMADO

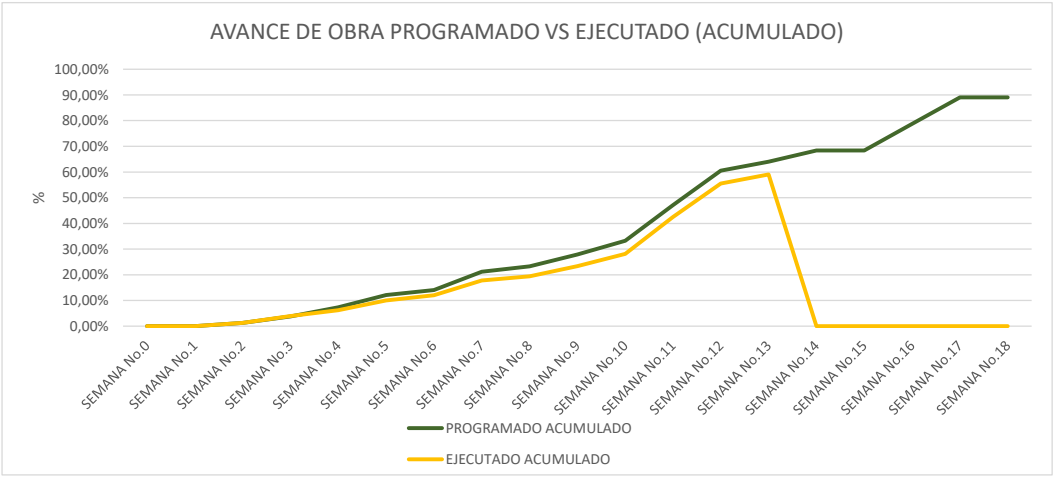

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-20

□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024


IDEN□I□I□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022


□□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□	SUMINISTRO BARANDA M□8□

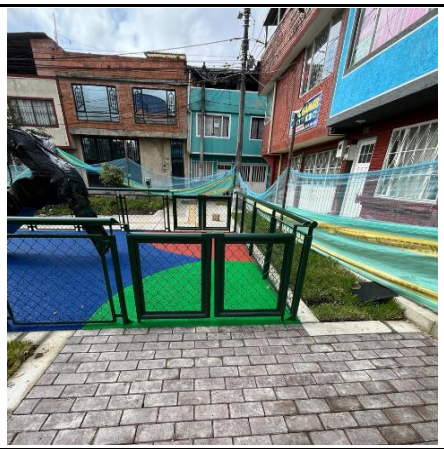

U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□	PUERTAS CERRAMIENTO

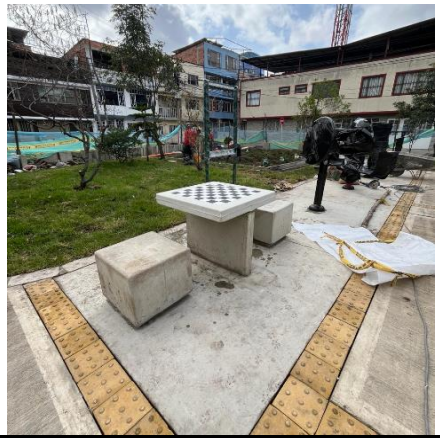

U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□	MESA DE AJEDRE□ EN CONCRETO



U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□	SILLA INDIVIDUAL M□01



U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□	PISO EN CAUCHO RECICLADO



U□□A□□N□	TERRITORIO AAUT□20
□OMEN□ARIOS□	CANECA METALICA M□120

CONSORCIO INGENIERÍA I
Nit. 901.639.134 - 0

AVANCE INFORME SEMANALES

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		SEMANA No.18		
										18
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR	PROCENTAJE
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,1	Localización y replanteo	m2	512,00	$ 8.226,00	$ 4.211.712,00	517,00	$ 4.252.842,00		$ -	
1,7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	ml	93,00	$ 27.273,00	$ 2.536.389,00	110,50	$ 3.013.666,50		$ -	
1,8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	ml	65,00	$ 18.468,00	$ 1.200.420,00	78,23	$ 1.444.751,64		$ -	
1,9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	un	2,00	$ 114.946,00	$ 229.892,00	2,00	$ 229.892,00		$ -	
1,10	Protección de árbol de existente	un	19,00	$ 70.802,00	$ 1.345.238,00	19,00	$ 1.345.238,00		$ -	
1,13	Protección de rejillas	un		$ 16.273,00	$ -	2,00	$ 32.546,00		$ -	
11,11	Traslado de árbol pequeño	un		$ 732.656,00	$ -	1,00	$ 732.656,00		$ -	
2,00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-20 cm	m2	512,00	$ 14.422,00	$ 7.384.064,00	517,00	$ 7.456.174,00		$ -	
2,2	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	512,00	$ 2.640,00	$ 1.351.680,00	333,87	$ 881.416,80		$ -	
2,3	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	512,00	$ 1.397,00	$ 715.264,00	259,63	$ 362.703,11		$ -	
2,4	Excavación manual suelo blando	m3	47,00	$ 73.172,00	$ 3.439.084,00	0,94	$ 68.781,68	0,94	$ 68.781,68	100,00%
2,5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	m3	23,00	$ 109.904,00	$ 2.527.792,00	30,21	$ 3.320.199,84		$ -	
2,6	Geotextil T-2400	m2	329,00	$ 11.156,00	$ 3.670.324,00	340,74	$ 3.801.295,44	135,80	$ 1.514.585,00	39,85%
2,7	Relleno compactado Base granular	m3	23,00	$ 156.593,00	$ 3.601.639,00	22,66	$ 3.548.397,38	4,16	$ 649.861,00	18,31%
2,8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	m3	2,00	$ 73.172,00	$ 146.344,00	0,32	$ 23.415,04		$ -	
2,9	Excavación mecanica+retiro	m3		$ 42.384,00	$ -	45,32	$ 1.920.842,88	45,32	$ 1.920.842,88	100,00%
2,11	Relleno de rajon manual	m3		$ 166.430,00	$ -	27,08	$ 4.506.924,40	4,40	$ 732.292,00	16,25%
3,00	**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**									
3,1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	m3	19,00	$ 1.027.855,00	$ 19.529.245,00	18,30	$ 18.809.746,50		$ -	
3,2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	m3	1,00	$ 1.027.855,00	$ 1.027.855,00	0,32	$ 328.913,60	0,32	$ 333.025,02	101,25%
3,3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	m3	1,00	$ 870.250,00	$ 870.250,00	0,94	$ 818.035,00		$ -	
3,12	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta(SUDS)	m3		$ 548.326,00	$ -	7,72	$ 4.233.076,72	0,12	$ 65.799,12	1,55%
3,13	Dovelas	ml		$ 11.025,00	$ -	90,00	$ 992.250,00		$ -	
3,14	Viga de amarre en concreto	ml		$ 104.642,00	$ -	50,60	$ 5.294.885,20		$ -	
4,00	**ACERO DE REFUERZO**									
4,1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (área 6x2.35)	kg	530,00	$ 6.619,00	$ 3.508.070,00				$ -	
4,2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	kg	44,00	$ 5.726,00	$ 251.944,00				$ -	
4,3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	kg	127,00	$ 5.726,00	$ 727.202,00				$ -	
5,00	**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**									
5,1	Descapote a máquina nivel 0.00 (inc. retiro) e=-1.40m	m3	97,00	$ 50.223,00	$ 4.871.631,00	93,54	$ 4.697.899,42		$ -	
5,2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05enCbra	m3	1,00	$ 29.530,00	$ 29.530,00				$ -	
5,3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	m3	12,00	$ 570.017,00	$ 6.840.204,00				$ -	
5,4	Cañuela en concreto	ml	9,00	$ 98.766,00	$ 888.894,00	17,80	$ 1.758.034,80	18,04	$ 1.781.738,64	101,35%
5,5	Geotextil (NORMA) NS-088	m2	69,00	$ 11.156,00	$ 769.764,00	58,74	$ 655.303,44		$ -	
5,6	Capa drenaje (agregado Grueso)	m3	16,00	$ 147.396,00	$ 2.358.336,00	24,43	$ 3.600.884,28	-0,90	$ 132.656,40	-3,68%
5,7	Capa filtrante (agregado Fino)	m3	3,00	$ 191.071,00	$ 573.213,00	21,72	$ 4.150.062,12	-0,80	$ 152.856,80	-3,68%
5,8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	ml	27,00	$ 50.832,00	$ 1.372.464,00	30,75	$ 1.563.084,00	-0,45	$ 22.874,40	-1,46%
5,9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	ml	10,00	$ 50.832,00	$ 508.320,00	10,00	$ 508.320,00		$ -	
5,10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	ml	6,00	$ 80.411,00	$ 482.466,00	3,20	$ 257.315,29	-3,50	$ 281.438,00	-109,37%
5,11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	m3	23,00	$ 170.501,00	$ 3.921.523,00	8,14	$ 1.387.878,14	8,44	$ 1.439.028,44	103,69%
5,12	Piedra bola	m2	5,00	$ 41.714,00	$ 208.570,00				$ -	
5,13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	kg	68,00	$ 6.619,00	$ 450.092,00				$ -	
5,14	Refuerzo acero fy=60000psi	kg	1512,00	$ 5.726,00	$ 8.657.712,00	85,68	$ 490.603,68		$ -	
5,15	Reja sumidero	un	22,00	$ 292.310,00	$ 6.430.820,00				$ -	
5,16	Nivelación y perfilado de terreno manual	m2	69,00	$ 2.640,00	$ 182.160,00				$ -	
5,17	Nivelación y Compactación de Subrasante	m2	54,00	$ 1.397,00	$ 75.438,00				$ -	
5,18	Cerramiento reja pequeña	ml	33,00	$ 47.880,00	$ 1.580.040,00				$ -	
5,19	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	un	34,00	$ 545.257,00	$ 18.538.738,00	1,00	$ 545.257,00	1,00	$ 545.257,00	100,00%
5,201	Pañete impermeab. Muro	m2		$ 42.506,00	$ -	37,20	$ 1.581.223,20	-6,42	$ 272.888,52	-17,26%
5,25	Accesorios PVC.S (4") **	un		$ 28.594,00	$ -	25,00	$ 714.850,00	10,00	$ 285.940,00	40,00%
6,00	**PINTURA**									
6,10	Pintura a color espacio de GYM Bioseludable	m2	21,00	$ 34.389,00	$ 722.169,00	21,19	$ 728.702,91	21,19	$ 728.702,91	100,00%
7,00	**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**									
7,1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 06*15*21 (ref.Loserna-Adoquinar)	m2	21,00	$ 69.775,00	$ 1.465.275,00	20,78	$ 1.449.924,50	-0,22	$ 15.350,50	-1,06%
7,2	Adoquín rectangular plano demarcador visual	m2	0,57	$ 137.201,00	$ 78.589,00				$ -	
7,3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (A57)	ml	23,31	$ 86.499,00	$ 2.016.292,00	40,22	$ 3.478.989,78		$ -	
7,4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (A58)	ml	36,33	$ 86.499,00	$ 3.056.010,00	33,64	$ 2.909.826,36	1,85	$ 160.023,15	5,50%
7,5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	ml	65,00	$ 85.405,00	$ 5.551.325,00	78,23	$ 6.681.233,15		$ -	
7,6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A80)	ml	116,00	$ 90.840,00	$ 10.537.440,00	108,56	$ 9.861.590,40		$ -	
7,11	Muro bloque en concreto	m2		$ 106.588,00	$ -	50,60	$ 5.393.352,80	-1,20	$ 127.905,60	-2,37%
7,13	Rejilla sumidero Continuo 46cm	UN		$ 116.026,00		36,00	$ 4.176.936,00	36,00	$ 4.176.936,00	100,00%
8,00	**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**								-	
8,1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	m2	31,00	$ 566.082,00	$ 17.548.542,00	25,44	$ 14.401.126,08	0,44	$ 249.076,08	1,73%
10,00	**MOBILIARIO URBANO**								-	
10,1	Caneca metálica referencia M120 o M121.	un	2,00	$ 629.610,00	$ 1.259.220,00	2,00	$ 1.259.220,00	0,10	$ 62.961,00	5,00%
10,2	Silla individual referencia M-01-A	un	4,00	$ 1.491.405,00	$ 5.965.620,00	4,00	$ 5.965.620,00		$ -	
10,4	Deslizadero	un	1,00	$ 26.959.769,00	$ 26.959.769,00	1,00	$ 26.959.769,00	0,10	$ 2.695.976,90	10,00%
10,5	Mesa de ajedrez en concreto	un	1,00	$ 1.541.585,00	$ 1.541.585,00	1,00	$ 1.541.585,00	0,05	$ 77.079,25	5,00%
10,6	Suministro baranda M-83	ml	23,00	$ 364.707,00	$ 8.388.261,00	17,78	$ 6.484.490,46		$ -	
10,7	Equipo de GYM REF flexión pierna	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00		$ -	
10,8	Equipo de GYM REF Elíptica	un	1,00	$ 4.956.332,00	$ 4.956.332,00	1,00	$ 4.956.332,00		$ -	
10,9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	un	1,00	$ 3.032.332,00	$ 3.032.332,00	1,00	$ 3.032.332,00		$ -	
10,10	Equipo de GYM REF. Giro caminador	un	1,00	$ 4.058.332,00	$ 4.058.332,00	1,00	$ 4.058.332,00		$ -	
10,14	Puerta metálica para cerramiento parque M80A	un		$ 1.058.763,00	$ -	2,00	$ 2.117.526,00	2,00	$ 2.117.526,00	100,00%
11,00	**VEGETACION**								-	
11,1	Cobertura tipo grama	m2	247,00	$ 10.422,00	$ 2.574.234,00	191,15	$ 1.992.165,30		$ -	
11,2	Cobertura tipo floricultura	m2	47,00	$ 98.124,00	$ 4.611.828,00	106,91	$ 10.490.436,84	106,91	$ 10.490.436,84	100,00%
11,3	Siembra de árbol (Según propuesta paisajismo)	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00	100,00%
11,4	Relleno en tierra negra	m3	29,00	$ 65.431,00	$ 1.897.499,00	24,38	$ 1.595.207,78		$ -	
11,7	Árbol laurel hoja pequeña	un	1,00	$ 291.101,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00	1,00	$ 291.101,00	100,00%
12,00	**SEÑALETICA**								-	
12,1	Señalética identificador zona de juegos infantiles	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	0,10	$ 29.677,40	10,00%
12,2	Señalética GYM parque	un	1,00	$ 296.774,00	$ 296.774,00	1,00	$ 296.774,00	0,10	$ 29.677,40	10,00%
12,3	Señalética identificador	un	1,00	$ 569.478,00	$ 569.478,00	1,00	$ 569.478,00	0,10	$ 56.947,80	10,00%
12,4	Señalética SC-80	un	1,00	$ 454.702,00	$ 454.702,00	2,00	$ 909.404,00	1,10	$ 500.172,20	55,00%
13,00	**OTROS**								-	
13,1	Baño portátil Alquiler	mes	4,00	$ 398.250,00	$ 1.593.000,00				$ -	
13,2	Aseo general	m2	512,00	$ 7.449,00	$ 3.813.888,00	527,24	$ 3.927.410,76	527,24	$ 3.927.410,76	100,00%
14,10	**PROVISIÓN DE OBRAS ADICIONALES**			**$ 13.959.427,00**	**$ 13.959.427,00**					
					$ 249.757.554,00		**$ 220.402.398,00**		**$ 34.216.386,25**	**15,52%**
	AMINISTRACIÓN		**26,00%**		**$ 64.936.964,00**		**$ 57.304.623,48**		**$ 8.896.260,43**	**15,52%**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 2.497.576,00**		**$ 2.204.024,00**		**$ 342.163,86**	**15,52%**
	UTILIDAD		**6,00%**		**$ 14.985.453,00**		**$ 13.224.144,00**		**$ 2.052.983,18**	**15,52%**
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -		$ -	
	VALORES COSTOS INDIRECTOS				**$ 82.419.993,00**		**$ 72.732.791,00**			
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 332.177.547,00**		**$ 293.135.189,00**			
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 4.276.598,00**		**$ 4.276.598,00**			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 11.439.678,00**		**$ 11.439.678,00**			
					$ 347.894.213,00		**$ 308.851.855,00**		**$ 45.507.793,72**	**14,73%**
										#¡REF!
