AAU T21

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-21

SEMANA N□	**1**	**DE**	**□□□□□15 d□ □□□r□ d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□21 d□ □□□r□ d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".					
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□□□A□□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□ VISITA DE RECONOCIMIENTO



U□□□A□□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□ INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS CONTRATO DE OBRA No. 1070 □2022



U□□□A□□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□ PROTECCIÓN DE ESPECIES ARBOREAS



U□□□A□□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□ RETIRO DE ADOQUIN INTERNO Y CERRAMIENTO



U□□□A□□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□ PROTECCIÓN SUMIDEROS



U□□□A□□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□ LOCALI□ACIÓN Y REPLANTEO

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	**2**	**DE**	**□□□□□22 d□ □□□r□ d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□ 28 d□ □□□r□ d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022		**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024	

IDEN□I□I□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".					
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□ CERRAMIENTO PROVICIONAL DE OBRA □POLISOMBRA□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□ DEMOLICION Y RETIRO DE BORDILLO PEFABRICADO **□IN□ERNO□**



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□ PROTECCION DE ARBOL E□ISTENTE



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□ RETIRO DE ADOQUIN INTERNO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□ PROTECCION SUMIDEROS



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□ DESCAPOTE A MAQUINA NIVEL 00 A □20 □□ONA TRANSITO□

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	□	**DE**	□□□□ **29 d**□ □□r□ **d**□ **2024**	**A**	**d**□□ □□□□ **4 d**□ □□r□r□ **d**□ **2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022		**□E□□A □ERMINA□ION**□	19□04□2024	

IDEN□I□I□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI**□	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N**□	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI**□	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N**□	1070□2022

RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□ DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□ DESMONTE Y RETIRO DE BARANDA



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□ DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO □ASFALTO□



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□ DESCAPOTE A M□QUINA NIVEL 0.00 □INC. RETIRO□E□□20 CM



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□ E□CAVACIÓN MANUAL SUELO BLANDO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□ DESCAPOTE A M□QUINA NIVEL 0.00 □INC. RETIRO□E□□140M SUDS

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	4	**DE**	□□□□5 d□ □□r□r□ d□2024	**A**	d□□ □□□□11 d□ □□r□r□d□ 2024
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□I□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

RE□IS□RO □O□O□RA□□O






U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BORDILLO PREFABRICADO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BORDILLO PREFABRICADO

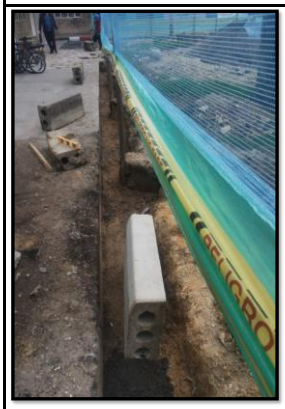



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□E□CAVACIÓN MANUAL SUELO BLANDO BORDILLO





U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□ E□CAVACIÓN MANUAL SUELO BLANDO BORDILLO



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□BORDILLO DEMARCADO RECTO VIAL □A10□**INS□ALA□ION□**



U□□A□□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□BORDILLO DEMARCADO RECTO VIAL □A10□INSTALACION□

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	**5**	**DE**	**□□□□□12 d□ □□□r□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□□18 d□ □□□r□r□d□2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".					
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

RE□IS□RO□O□RA□I□O




U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS E□CAVACIÓN MUROS Y HUELLAS VACIADAS EN CONCRETO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS □CAJA DE INSPECCIÓN .60□.60 H□1.0 □□

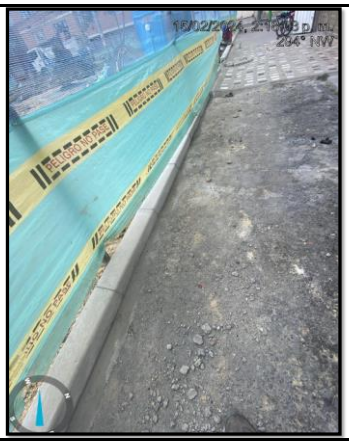

U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS BORDILLO DEMARCADO RECTO VIAL PREFABRICADO EN CONCRETO □A10□ □INSTALACION□




U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS BORDILLO DEMARCADO RECTO VIAL PREFABRICADO EN CONCRETO □A10□ □INSTALACION□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS BORDILLO DEMARCADO RECTO VIAL PREFABRICADO EN CONCRETO □A10□ □INSTALACION□

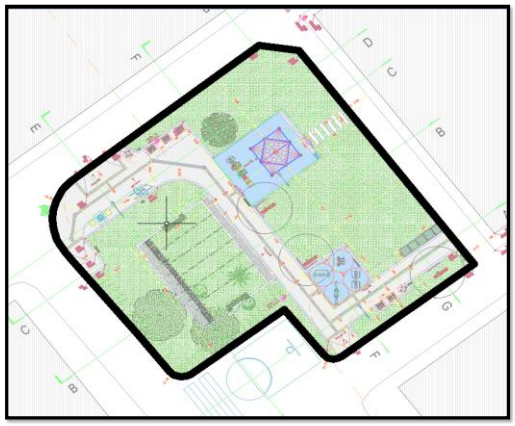

U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS BORDILLO DEMARCADO RECTO VIAL PREFABRICADO EN CONCRETO □A10□ □INSTALACION□


IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	□	**DE**	□□□□□**19 d**□ □□□**r**□**r**□**d**□**2024**	**A**	**d**□□ □□□□**25 d**□ □□□**r**□**r**□**d**□**2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□I□A□I□N DE LA O□RA


O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

RE□IS□RO□O□RA□I□O

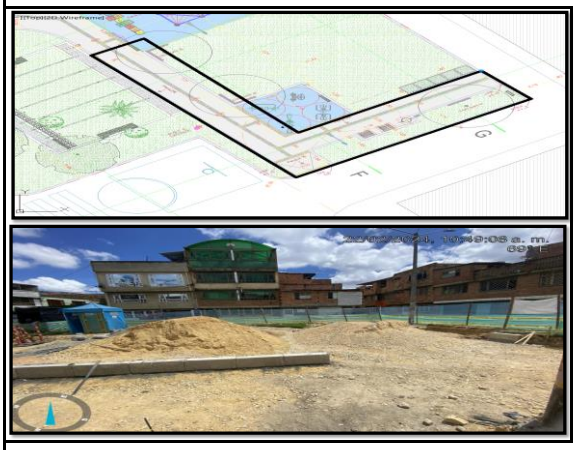

U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□**OMEN□ARIOS**□NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

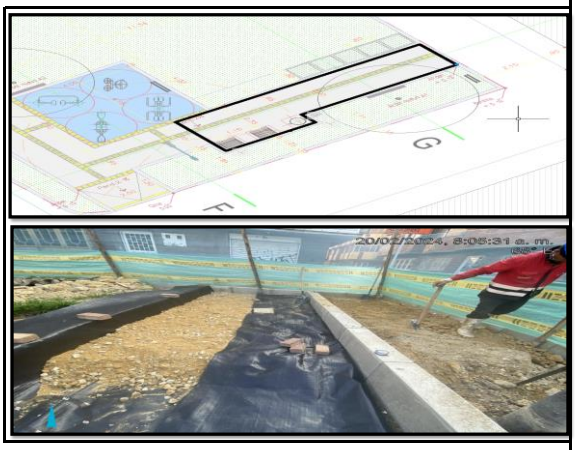

U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□**OMEN□ARIOS**□RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□**OMEN□ARIOS**□DEMOLICIÓN MUROS DE CONCRETO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□**OMEN□ARIOS**□E□CAVACIÓN MANUAL SUELO BLANDO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□**OMEN□ARIOS**□BORDILLO DEMARCADO RECTO INTERNO PREFABRICADO EN CONCRETO □A80□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□**OMEN□ARIOS**□GEOTE□TIL T□2400

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	7	**DE**	**□□□□□2□d□ □□r□r□d□2024**	**A**	**d□□ □□□□□d□ □ □r□□ d□2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□I□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".					
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□□EO□E□□IL □-2400 -RELLENO □□OMPA□□ADO SU□□ASE □□RANULAR □IPO IDRD-MA□ERIAL RAJON



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□RE□IRO DE MA□ERIAL R□D SUDS



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□□ORDILLO DEMAR□ADO RE□□O IN□ERNO PRE□A□RI□ADO EN □ON□RE□O A80□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□RE□IRO DE MA□ERIAL R□D





U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□□EO□E□□IL □-2400 -RELLENO □□OMPA□□ADO SU□□ASE □□RANULAR □IPO IDRD



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□MATERIAL SUBBASE

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	8	**DE**	□□□□□**4 d**□ □ **□r**□ **d**□ **2024**	**A**	**d**□□ □□□□**10 d**□ □ **□r**□ **d**□ **2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION**□	19□04□2024		

IDEN□I□I□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".					
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI**□	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N**□	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI**□	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N**□	1070□2022

RE□IS□RO□O□O□RA□I□O





U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	**9**	**DE**	**□□□□□11 d□ □ □r□□ d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□□17 d□ □ □r□□ d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□I□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".					
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

RE□IS□RO□O□RA□I□O




U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□RELLENO DE RAJON MANUAL



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□CONCRETO CICLOPEO □000 PSI CIMENTAC□FORMALETA□SUDS□

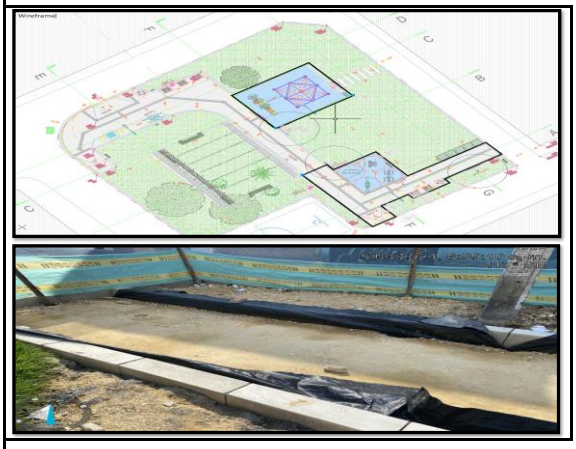

U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□PLACA CONTRAPISO □000 PSI 21MPA E□15□SUDS□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□PLACA CONTRAPISO □000 PSI 21MPA E□15 □SUDS□

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	**10**	**DE**	**□□□□□11 d□ □ □r□□ d□2024**	**A**	**d□□ □□□□17 d□ □ □r□□ d□2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA □POLISOMBRA□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□E□CAVACIÓN MANUAL SUELO BLANDO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD□GEOTE□TIL T□2400



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□MURO BLOQUE EN CONCRETO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□DOVELAS□REFUER□O ACERO FY□60000PSI



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□BORDILLO DEMARCADO RECTO VIAL PREFABRICADO EN CONCRETO □A10□ BORDILLO DEMARCADO RECTO INTERNO PREFABRICADO EN CONCRETO □A80□

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	**11**	**DE**	**□□□□□25 d□ □ □r□□ d□2024**	**A**	**d□□ □□□□□1 d□ □ □r□□ d□2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□I□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□SUMINISTRO DE MOBILIARIO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□E□CAVACIÓN MANUAL SUELO BLANDO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□PANORAMICA DEL TERRITORIO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□MATERIAL



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□SST



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□PANORAMICA DEL TERRITORIO

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	**12**	**DE**	**□□□□□1 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□7 d□ □□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□I□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".					
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□**OMEN□ARIOS**□SUMINISTRO DE MOBILIARIO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□**OMEN□ARIOS**□E□CAVACIÓN MANUAL SUELO BLANDO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□**OMEN□ARIOS**□PANORAMICA DEL TERRITORIO



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□**OMEN□ARIOS**□MATERIAL



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□**OMEN□ARIOS**□SST



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□**OMEN□ARIOS**□PANORAMICA DEL TERRITORIO

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	**1□**	**DE**	**□□□□□8 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□□14 d□ □□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□I□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".					
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□Ca□as □iltrantes SUDS



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□Ca□as □iltrantes SUDS



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□Base com□actada



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□Base com□actada



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□Ca□as □iltrantes SUDS



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□Tuberia □er□orada □de lim□le□a SUDS

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	**14**	**DE**	**□□□□□15 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□ 21 d□ □□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□I□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".					
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

RE□IS□RO□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□ Ca□a drenante □tuberia de lim□ie□a SUDS



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□Ca□a drenante □tuberia de lim□ie□a SUDS



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□Relleno con base com□actada



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□Placa concreto □000 □si □ona biosaludables



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□Placa concreto □000 □si □ona □ie□os in□antiles



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□Placa concreto □000 □si

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	**15**	**DE**	**□□□□□22 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□ 28 d□ □□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□I□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□ Malla electrosoldada □aca de contra□iso



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□ Malla electrosoldada □aca de contra□iso




U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□ Placa de contra□iso concreto □000 □si



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□ Placa de contra□iso concreto □000 □si

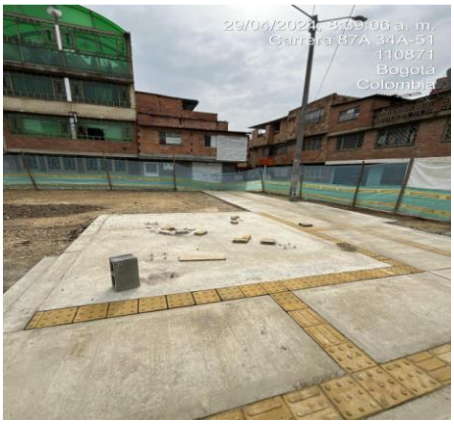

U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□ Instalacion tableta □uia □alerta □re□abricada





U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□ Instalacion tableta □uia □alerta □re□abricada

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	**1□**	**DE**	**□□□□□29 d□ □ □r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□5 d□ □ □□□ d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□ Instalacion de baranda □□uertas □ona de □ue□os



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□Armado de acero □instalacion □rmaleta en madera □□as SUDS




U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□Armado de acero □instalacion □rmaleta en madera □□as SUDS




U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□Concreto im□ermeabili□ado □ara □□as SUDS

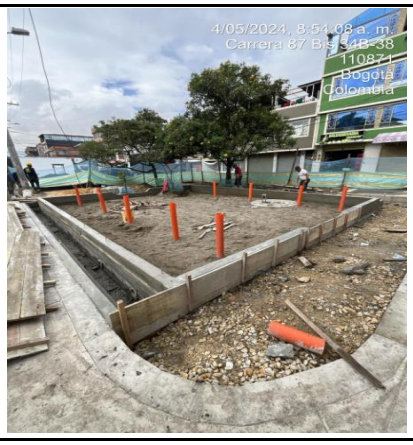

U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□Concreto im□ermeabili□ado □ara □□as SUDS

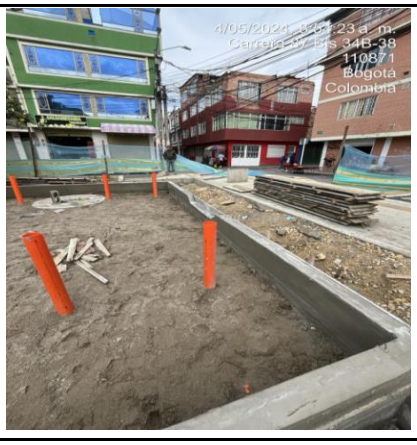

U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□21

□OMEN□ARIOS□Concreto im□ermeabili□ado □ara □□as SUDS

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	**17**	**DE**	**□□□□□8 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□□14 d□ □□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□I□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".					
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

RE□IS□RO□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□	BORDILLO



U□I□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□	REJILLA CONTINUA



U□I□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□	SILLA INDIVIUAL M□01



U□I□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□	JUEGO CUERDAS PIRAMIDAL



U□I□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□	PUERTA METALICA PARA CERRAMIENTO



U□I□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□	CICLOPARQUEADERO

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU 21

SEMANA N□	18	**DE**	□□□□□**8 d**□ □□**r**□**d**□**2024**	**A**	**d**□□ □□□□**14 d**□ □□**r**□**d**□**2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION**□	19□04□2024		

IDEN□I□I□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".					
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI**□	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N**□	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI**□	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N**□	1070□2022

RE□IS□RO□O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□	ASEO DE OBRA



U□I□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□	SEÑALETICA SC□80



U□I□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□	ARBOL CALISTENIA



U□I□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□	RELLENO EN TIERRA NEGRA



U□I□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□	COBERTURA FLORICULTURAL



U□I□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□21
□OMEN□ARIOS□	COBERTURA TIPO GRAMA

AAU T22

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-22

SEMANA N□	**5**	**DE**	**□□□□□12 d□ □□r□r□d□2024**	**A**	**d□□ □□□□□18 d□ □□r□r□d□2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O





U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ LOCALI□ACIÓN Y REPLANTEO





U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA □POLISOMBRA□



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ DESMONTE DE BANCAS EN CONCRETO E□ISTENTE









U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ PROTECCIÓN DE □RBOL DE E□ISTENTE



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ COSTADO ORIENTE DEL TERRITORIO



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ SEÑALI□ACIÓN PTM

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-22

SEMANA N□	□	**DE**	□□□□□ **19 d**□ **□□r□r□d□ 2024**	**A**	**d**□□ **□□□□ 25 d**□ **□□r□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O




U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□ DEMOLICIÓN ANDEN □Cicloruta



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□ DEMOLICIÓN ANDEN □Cicloruta




U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□ DEMOLICIÓN ANDEN □ Area de □e□os



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□ DEMOLICIÓN ANDEN □ Escaleras



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□ DESMONTE PISO CAUCHO □Area □ona de □e□os




U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□ DESMONTE DE ADOQUIN □Area circun□erencia □ □ona circulación

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-22

SEMANA N□	**7**	**DE**	**□□□□□ 2□d□□□r□r□d□2024**	**A**	**d□□ □□□□□d□□ □r□□ d□2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**			

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□ Estabili□ación de base □ranular



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□ Intalación de ca□uela Ti□o CU



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□ Estabili□ación de base □ranular



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□ Intalación de ca□uela Ti□o CU



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□ Desmonte de ado□uín



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□ Desmonte □retiro de bordillo

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-22

SEMANA N□	**8**	**DE**	**□□□□□ 4 d□ □ □r□□ d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□□10 d□ □ □r□□ d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Intalación de ca□uela Ti□o CU



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Intalación de ca□uela Ti□o CU



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Intalación de ca□uela Ti□o CU



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Intalación de ca□uela Ti□o CU



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Intalación de ca□uela Ti□o CU



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Mallas electrosoldadas □ara □iso en concreto

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-22

SEMANA N□	**9**	**DE**	□□□□□**11 d**□□ □**r**□□ **d**□**2024**	**A**	**d**□□ □□□□□**17 d**□□ □**r**□□ **d**□**2024**
□**E**□□**A INI**□**IO** □	16□12□2022	□**E**□□**A** □**ERMINA**□**ION**□	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□**OMEN□ARIOS**□ Intalación de Bordillo A80



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□**OMEN□ARIOS**□Intalación de ca□uela Ti□o CU



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□**OMEN□ARIOS**□ Intalación de ca□uela Ti□o CU □bordillo A80



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□**OMEN□ARIOS**□ Mallas electrosoldadas □ara □iso en concreto



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□**OMEN□ARIOS**□ Relleno com□actado Base □ranular

U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□**OMEN□ARIOS**□


IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-22

SEMANA N□	**10**	**DE**	**d□□ □□□□17 d□ □ □r□□ d□ 2024**	**A**	**□□□□d□□2□d□ □ □r□□ d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA


O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022


□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O

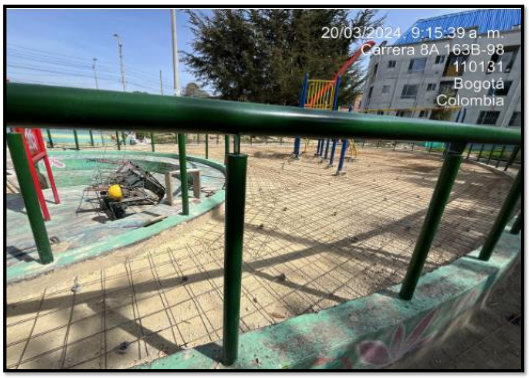

U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Com□actación Base □Mallas electrosoldadas

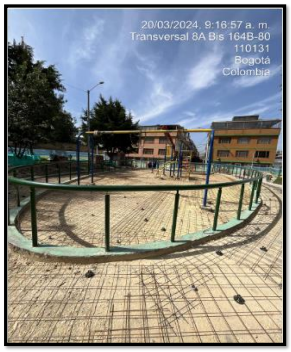

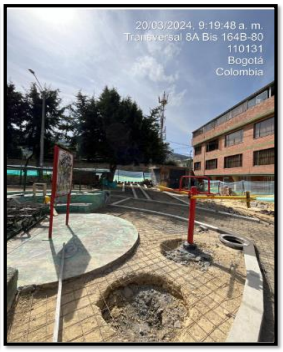

U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Com□actación Base□Mallas electrosoldadas □desmonte biosaludables



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Placa contra□iso □000 □si 21m□a e□15



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□Placa contra□iso □000 □si 21m□a e□15



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ A□licación de □□mento □ara acabado concreto



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ A□licación de □□mento □ara acabado concreto

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-22

SEMANA N□	**11**	**DE**	**d□□ □□□□24 d□ □ □r□□ d□2024**	**A**	**□□□□d□□□0 d□ □ □r□□ d□2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Placa de contra□iso □000 □si



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Placa de contra□iso □000 □si



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Placa de contra□iso □000 □si



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ A□licación de □□mento □ara acabado concreto



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ A□licación de □□mento □ara acabado concreto



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ A□licación de □□mento □ara acabado concreto


IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-22

SEMANA N□	**12**	**DE**	**□□□□□1 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□□7 d□□□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O

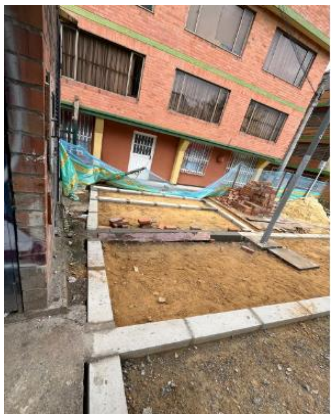

U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Bordillo A80 □Ca□uela □Relleno com□actado



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Bordillo A80 □Ca□uela □Relleno com□actado



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Mantenimiento □e□os in□antiles e□istentes



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Suministro baranda M□8□



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Mantenimiento □e□os in□antiles e□istentes



U□I□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Suministro baranda M□8□

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-22

SEMANA N□	**1□**	**DE**	**□□□□□ 8 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□□14 d□ □□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	Placa contra□iso □□000 □si



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	Placa contra□iso □□000 □si



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	Pi□mento □ara concreto



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	Suministro baranda M□8□ □mantenimiento □e□os



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	Mantenimiento □e□os in□antiles e□istentes □biosaludables



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	Suministro baranda M□8□

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-22

SEMANA N□	**14**	**DE**	**□□□□□15 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□21 d□ □□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O




U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Placa de contra□iso con □□mento



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Placa de contra□iso con □□mento

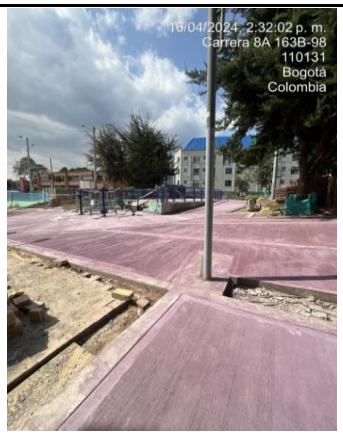

U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Placa de contra□iso con □□mento



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ E□ca□acion manual □ara construccion de huellas en concreto



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Construccion de muro en concreto re□or□ado



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Banca en sitio armado de acero

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-22

SEMANA N□	**15**	**DE**	**□□□□□ 22 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□ 28 d□ □□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Construcción banca en sitio



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ E□ca□acion manual suelo blando



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ E□ca□acion manual suelo blando




U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Cone□ión carcamos a□uas llu□las



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Lim□e□a su□er□cie □lacas de concreto □□mentado

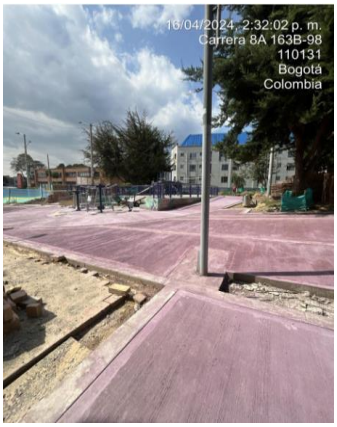

U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Lim□e□a su□er□cie □lacas de concreto □□mentado

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-22

SEMANA N□	**1□**	**DE**	**□□□□□ 29 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□□ 5 d□ □ □□□ d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA


O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Es□alera en concreto con □□mento

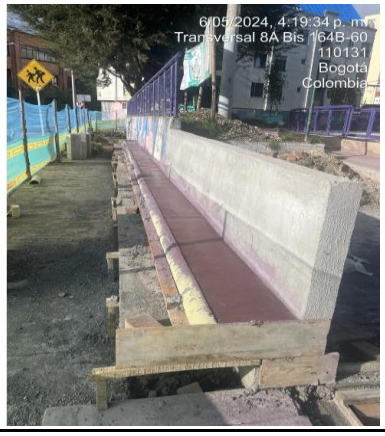

U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Banca □undida en sitio con □□mento



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Construccion de carcamos



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Construccion □lacas en concreto □ara instalacion de bancas



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Construccion □lacas en concreto □ara instalacion de bancas



U□□A□I□N□ TERRITORIO AAUT□22

□OMEN□ARIOS□ Reinstalacion de ado□uin

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-22

SEMANA N□	**17**	**DE**	**□□□□□□□d□ □ □□□ d□2024**	**A**	**d□□ □□□□□12 d□ □ □□□ d□2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	COBERTURA TIPO GRAMA



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	RODADERO LARGO EN ACERO



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	MANTENIMIENTO DE BIOSALUDABLE



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES E□ISTENTES



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	BANCA EN CONCRETO



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	REJILLA PARA SUMIDERO

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO AAU□-22

SEMANA N□	**18**	**DE**	**d□□ □□□□12 d□ □ □□□ d□2024**	**A**	**d□□ □□□□19 d□ □ □□□ d□2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□I□□A□I□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□I□O



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	APLICACIÓN DE PIGMENTO



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	ASEO DE OBRA



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	ARREGLO DE GRADERIAS



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	SEÑALETICA SC□80



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	SEÑALETICA DE IDENTIFICACION



U□□A□I□N□	TERRITORIO AAUT□22
□OMEN□ARIOS□	RELLENO CON TIERRA NEGRA

Manzana del Cuidado

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO-M□

SEMANA N□	□	**DE**	□□□□□**29 d**□ □□□r□ **d**□ **2024**	**A**	**d**□□ □□□□**4 d**□ □□r□r□ **d**□**2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□**OMEN□ARIOS**□ REUNIÓN CON LOS COLECTIVOS Y LIDERES



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□**OMEN□ARIOS**□ REUNIÓN CON LOS COLECTIVOS Y LIDERES



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□**OMEN□ARIOS**□ REUNIÓN CON LOS COLECTIVOS Y LIDERES



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□**OMEN□ARIOS**□ REUNIÓN CON LOS COLECTIVOS Y LIDERES



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□**OMEN□ARIOS**□ REUNIÓN CON LOS COLECTIVOS Y LIDERES



IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO-M□

SEMANA N□	**4**	**DE**	**□□□□□5 d□ □□□r□r□ d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□□11 d□ □□□r□r□ d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022



□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O




U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS□ MOBILIARIO URBANO □M□□




U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS□ MOBILIARIO URBANO □M□□

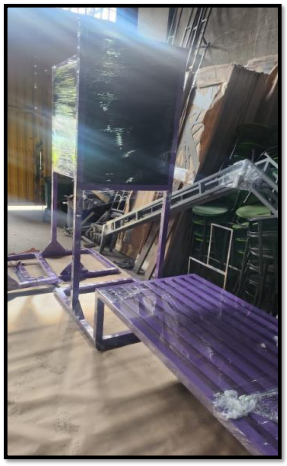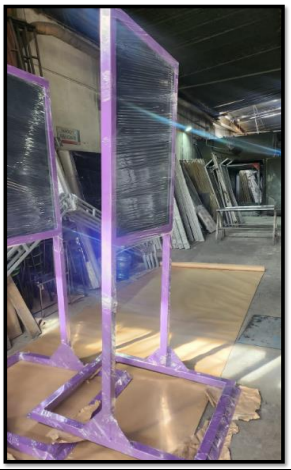U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS□ MOBILIARIO URBANO □M□□




U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS□ REUNIÓN CON LOS COLECTIVOS Y LIDERES



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS□ MOBILIARIO URBANO □M□□



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS□ MOBILIARIO URBANO □M□□

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO-M□

SEMANA N□	**5**	**DE**	**□□□□□5 d□ □□r□r□ d□2024**	**A**	**d□□ □□□□11 d□ □□r□r□ d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA


O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ LOCALI□ACIÓN Y REPLANTEO

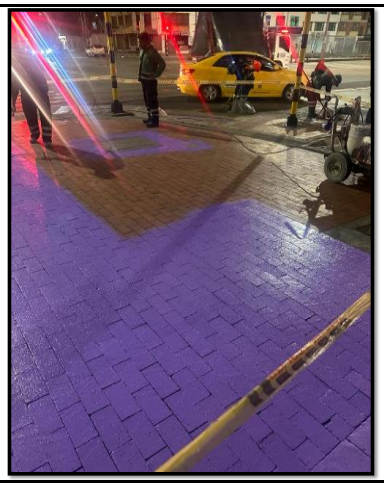

U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ MOBILIARIO URBANO □M□□





U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ SUPERFICIES MORADAS ESQUINERAS





U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ SUPERFICIES MORADAS ESQUINERAS







U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ BORDILLO SUPERFICIE MORADO □A□0.6M□





U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ MOBILIARIO VERTICAL MET□LICO CON MATERA EN CONCRETO □BANCA

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO-M□

SEMANA N□	□	**DE**	□□□□□**19 d**□ □□□r□r□ **d**□**2024**	**A**	**d**□□ □□□□**25 d**□ □□□r□r□ **d**□ **2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □□O□RA□□O




U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS□ LOCALI□ACIÓN Y REPLANTEO





U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS□ SUPERFICIES MORADAS ESQUINERAS



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS□ SUPERFICIES MORADAS ESQUINERAS



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS BORDILLO SUPERFICIE MORADO □A□0.6M□

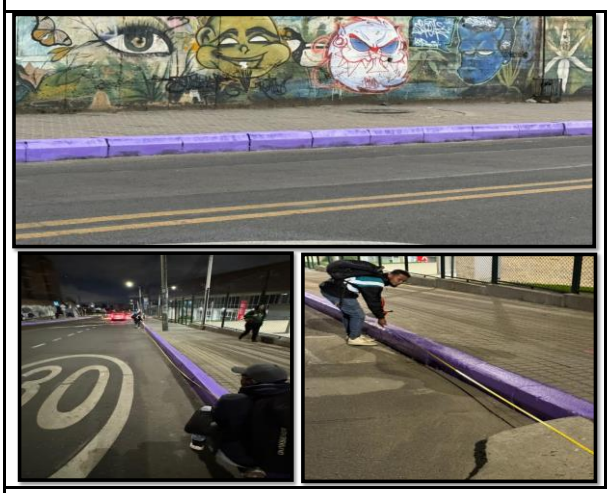

U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS□ BORDILLO SUPERFICIE MORADO □A□0.6M□




U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS□ MOBILIARIO VERTICAL MET□LICO CON MATERA EN CONCRETO □ BANCA

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO-M□

SEMANA N□	**7**	**DE**	**□□□□□2□ d□ □□□r□r□ d□2024**	**A**	**d□□ □□□□□ d□ □ □r□□ d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ LOCALI□ACIÓN Y REPLANTEO



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ SUPERFICIES MORADAS ESQUINERAS



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ SUPERFICIES MORADAS ESQUINERAS




U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS BORDILLO SUPERFICIE MORADO □A□0.6M□



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ BORDILLO SUPERFICIE MORADO □A□0.6M□

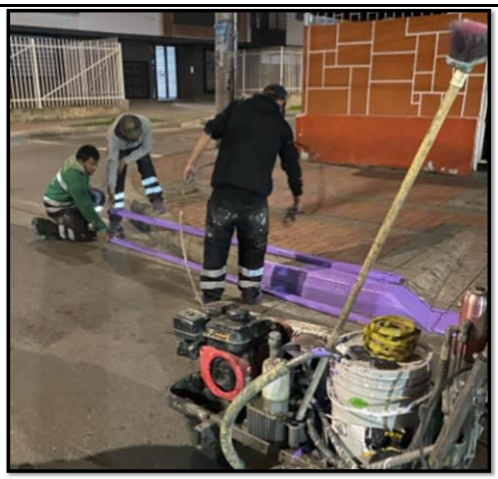

U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ MOBILIARIO VERTICAL MET□LICO CON MATERA EN CONCRETO □BANCA

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO-M□

SEMANA N□	**8**	**DE**	**□□□□□4 d□ □ □r□□ d□2024**	**A**	**d□□ □□□□10 d□ □ □r□□ d□2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □□O□RA□□O





U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ SUPERFICIES MORADAS ESQUINERAS





U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ BORDILLO SUPERFICIE MORADO □A□0.6M□



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ CINTAS DE BANDERINES EN CRUCES VEHICULARES



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS SUPERFICIES MORADAS ESQUINERAS



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ BORDILLO SUPERFICIE MORADO □A□0.6M□



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ BORDILLO SUPERFICIE MORADO □A□0.6M□

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO-M□

SEMANA N□	**9**	**DE**	**□□□□□11 d□ □ □r□□ d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□17 d□ □ □r□□ d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS□ SUPERFICIES MORADAS ESQUINERAS



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS□BORDILLO SUPERFICIE MORADO □A□0.6M□



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS SUPER□□IES MORADAS ES□UINERAS



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS□SUPERFICIES MORADAS ESQUINERAS



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS□BORDILLO SUPERFICIE MORADO □A□0.6M□



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□
□OMEN□ARIOS□ BORDILLO SUPERFICIE MORADO □A□0.6M□

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO-M□

SEMANA N□	**10**	**DE**	**□□□□□18 d□ □ □r□□ d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□24 d□ □ □r□□ d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO-M□

SEMANA N□	**11**	**DE**	**□□□□□25 d□ □ □r□□ d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□□1 d□ □ □r□□ d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA


O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ Muro No 1 □No 10

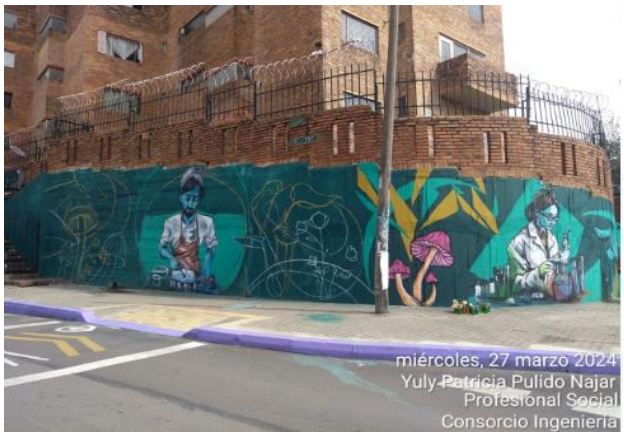

U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ Muro No 1 □No 10



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ Muro No 1 □No 10




U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ Muro No 1 □No 10



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ Muro No 1 □No 10

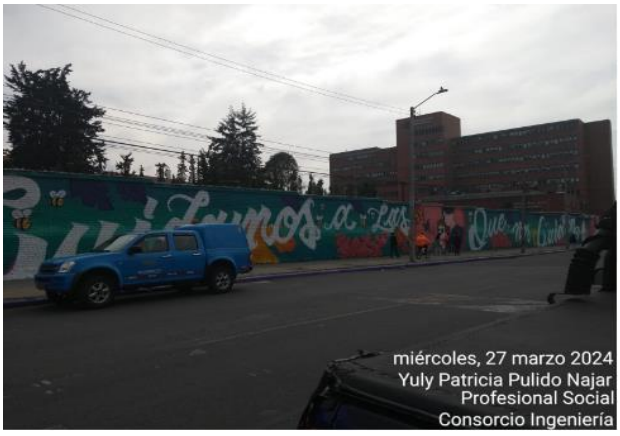

U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ Muro No 1 □No 10

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO-M□

SEMANA N□	**12**	**DE**	**□□□□□1 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□7 d□ □□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10




U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10




U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10

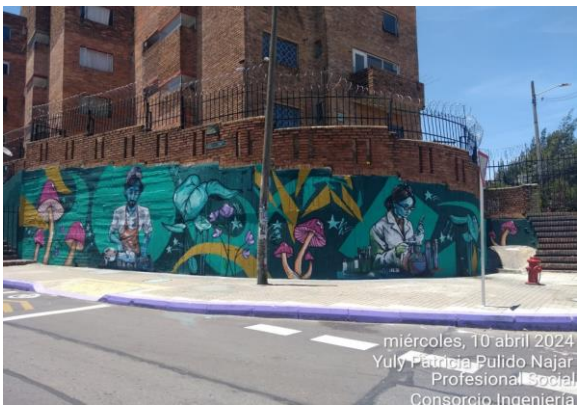

U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10

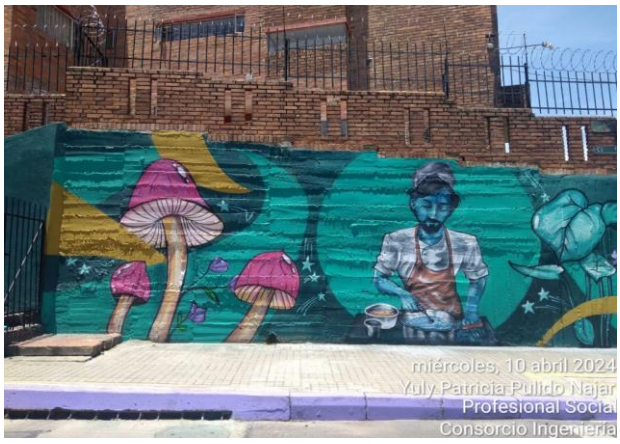

U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10


IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO-M□

SEMANA N□	**1□**	**DE**	**□□□□8 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□14 d□ □□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O

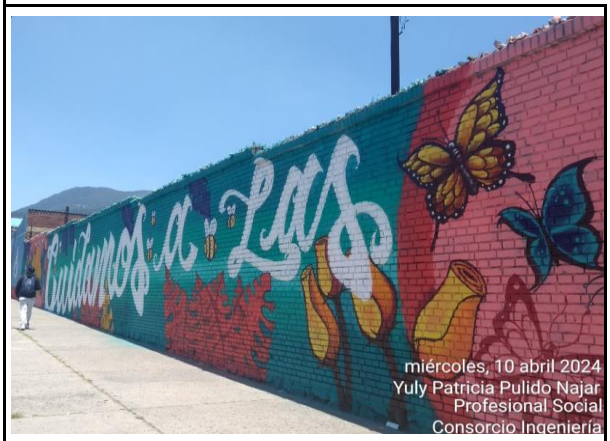

U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ Muro No 1 □No 10

IN□ORME SEMANAL DE O□RA -E□APA II
□REN□E DE O□RA□ □ERRI□ORIO-M□

SEMANA N□	**14**	**DE**	**□□□□□15 d□ □□r□d□ 2024**	**A**	**d□□ □□□□21 d□ □□r□d□ 2024**
□E□□A INI□IO □	16□12□2022	**□E□□A □ERMINA□ION□**	19□04□2024		

IDEN□□□A□□N DE LA O□RA

O□JE□O DEL □ON□RA□O	REALI□AR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION E INTERVENCION DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORI□ADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT".				
IN□ERVEN□OR	CONSORCIO PROSPERAR BETHEL	**NI□**	NIT.901.6□4.2□9□2	**□ON□RA□O N□**	1066□2022
□ON□RA□IS□A	CONSORCIO INGENIERÍA I	**NI□**	NIT. 901.6□9.1□4□0	**□ON□RA□O N□**	1070□2022

□□RE□IS□RO □O□O□RA□□O



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Mobiliario Man□ana del cuidado



U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Mobiliario Man□ana del cuidado




U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Mobiliario Man□ana del cuidado




U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Lo□o man□ana del cuidado

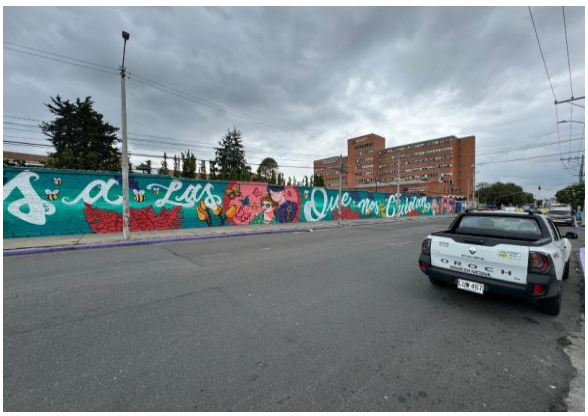

U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□Muro No 1 □No 10

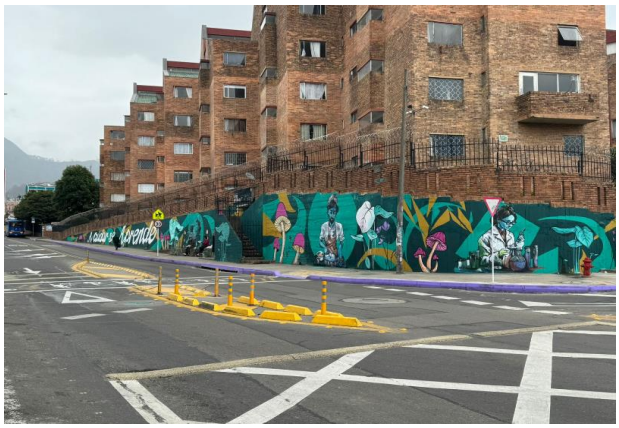

U□□A□□N□ TERRITORIO □M□

□OMEN□ARIOS□ Muro No 1 □No 10

Anexo 11. Cronograma

AAU T17


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022

PROGRAMACION PRELIMINAR AAUTI 7 AURORA II

CONSORCIO INGENIERÍA I
NIt. 901.639.134 - 0

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**PROYECTO TERRITORIO T17**	**82 días**	**lun 29/01/24**	**vie 19/04/24**
2		INICIO	0 días	lun 29/01/24	lun 29/01/24
3		**PRELIMINARES**	**10 días**	**lun 29/01/24**	**mié 7/02/24**
4	1.7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	6 días	lun 29/01/24	sáb 3/02/24
5	1.101	Proteccion de arbol de existente	3 días	jue 1/02/24	sáb 3/02/24
6	13.1	Baño portatil Alquiler	1 día	jue 1/02/24	jue 1/02/24
7	1.1	Localización y replanteo	4 días	dom 4/02/24	mié 7/02/24
8		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**26 días**	**jue 8/02/24**	**lun 4/03/24**
9	2.1	Descapote a máquina nivel 0.00 (ocu. retiro) e=.20 cm	3 días	jue 8/02/24	sáb 10/02/24
10	2.9	Excavacion mecanica+retiro	4 días	dom 11/02/24	mié 14/02/24
11	2.6	Geotextil T-2600	2 días	jue 15/02/24	vie 16/02/24
12	2.7	Relleno compactado Base granular	5 días	sáb 17/02/24	mié 21/02/24
13	2.5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	5 días	jue 22/02/24	lun 26/02/24
14	2.2	Nivelación y perfilado de terreno manual	4 días	mar 27/02/24	vie 1/03/24
15	2.3	Nivelación y Compactación de Subrasante	3 días	sáb 2/03/24	lun 4/03/24
16		**CONCRETOS Y ACEROS DE REFUERZO**	**19 días**	**mar 5/03/24**	**sáb 23/03/24**
17	5.1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	19 días	mar 5/03/24	sáb 23/03/24
18	5.1	Malla Electrosoldada d=6mm@0.15 (ancho 6x2.35)	19 días	mar 5/03/24	sáb 23/03/24
19	5.3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	19 días	mar 5/03/24	sáb 23/03/24
20	5.2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	10 días	mar 5/03/24	jue 14/03/24
21		**REDES HIDROLANTARIAS**	**54 días**	**jue 8/02/24**	**lun 1/04/24**
22	6.1	Descapote a máquina nivel 0.00 (ocu. retiro) e=.1,40m	3 días	jue 8/02/24	sáb 10/02/24
23	6.3	Tetuve perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	5 días	jue 15/02/24	lun 19/02/24
24	6.2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05emObra	3 días	mar 20/02/24	jue 22/02/24
25	6.4	Cañuela en concreto	5 días	mar 20/02/24	dom 25/02/24
26	6.13	Malla Electro soldada d=6mm@0.15	5 días	mar 20/02/24	dom 25/02/24
27	6.14	Refuerzo acero fy=60000psi	5 días	mar 20/02/24	dom 25/02/24
28	6.5	Geotextil (NORMA) NE-088	3 días	lun 26/02/24	mié 28/02/24
29	6.12	Piedra bola	4 días	jue 29/02/24	dom 3/03/24
30	6.6	Capa drenaje (agregado Grueso)	4 días	lun 4/03/24	jue 7/03/24
31	6.7	Capa filtrante (agregado Fino)	4 días	lun 4/03/24	jue 7/03/24
32	6.8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	5 días	vie 8/03/24	mar 12/03/24
33	6.9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	5 días	vie 8/03/24	mar 12/03/24
34	6.10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	5 días	vie 8/03/24	mar 12/03/24
35	6.11	Suministo (TIERRA NEGRA+ ARENA)	4 días	mié 13/03/24	sáb 16/03/24
36	6.16	Nivelación y perfilado de terreno manual	3 días	dom 17/03/24	mar 19/03/24
37	6.17	Nivelación y Compactación de Subrasante	3 días	mié 20/03/24	vie 22/03/24
38	6.15	Reja sumidero	7 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24
39	6.18	Cerramiento reja pequeña	7 días	mié 13/03/24	mar 19/03/24
40	6.19	Caja de inspeccion dibu.60 l=1.0 **	20 días	mié 13/03/24	lun 1/04/24
41		**ADOQUÍN, TABLETA, Y BORDILLOS**	**10 días**	**dom 24/03/24**	**mar 2/04/24**
42	7.3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricad o en concreto color amarillo (INST)	10 días	dom 24/03/24	mar 2/04/24
43	7.4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (KAB)	10 días	dom 24/03/24	mar 2/04/24
44	7.6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto	10 días	dom 24/03/24	mar 2/04/24
45		**PISOS EN MATERIAL RECICLADO**	**6 días**	**mié 3/04/24**	**lun 8/04/24**
46	8.1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	6 días	mié 3/04/24	lun 8/04/24
47		**PINTURA PISO**	**8 días**	**mar 9/04/24**	**mar 16/04/24**
48	8.1	Pintura a color espacio de GYM biosaturable	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
49		**MOBILIARIO URBANO**	**9 días**	**mar 9/04/24**	**mié 17/04/24**
50	10.1	Caneca metalica referencia M120 o M1.21.	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
51	10.2	Silla individual referencia M-01-A	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
52	10.17	Torre Columpio Deslizadero	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
53	10.6	Suministo baranda M-83	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
54	10.7	Equipo de GYM REF Resor pierna	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
55	10.8	Equipo de GYM REF Elptica	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
56	10.9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
57	10.10	Equipo de GYM REF Giro caminador	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
58	10.5	Mesa de ajedrez en concreto	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
59	10.19	Cicloparqueadero tipo M-22 acero inoxidable	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
60	10.201	Bolardo en Nieto	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
61	10.31	Suministo e instalación de BARRAS COMBINADAS DIMENSIONES: 4.38 x 1.41 x 2.60 mts	9 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24
62		**VEGETACIÓN**	**24 días**	**dom 24/03/24**	**mar 16/04/24**
63	11.4	Relleno en tierra negra	8 días	dom 24/03/24	dom 31/03/24
64	11.1	Cobertura tipo grama	8 días	lun 1/04/24	lun 8/04/24
65	11.2	Cobertura tipo floricultura	8 días	lun 1/04/24	lun 8/04/24
66	11.3	Siembra de arbol (Segun propuesta paisajismo)	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
67	11.5	Lirio arcilloso	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
68	11.6	Arbol taqueto	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
69	11.7	Arbol laurel hoja pequeña	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
70	11.8	Arbol Carbonero Rojo	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
71	11.9	Arbol Calistemo	8 días	mar 9/04/24	mar 16/04/24
72		**SEÑALETICA**	**8 días**	**vie 12/04/24**	**vie 19/04/24**
73	12.1	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	6 días	vie 12/04/24	mié 17/04/24
74	12.2	Señaletica GYM parque	6 días	vie 12/04/24	mié 17/04/24
75	12.3	Señaletica identificador	8 días	vie 12/04/24	vie 19/04/24
76	12.4	Señaltica SC-60	6 días	vie 12/04/24	mié 17/04/24
77		**OTROS**	**2 días**	**jue 18/04/24**	**vie 19/04/24**
78	13.2	Aseo general	2 días	jue 18/04/24	vie 19/04/24
79		FIN	0 días	vie 19/04/24	vie 19/04/24

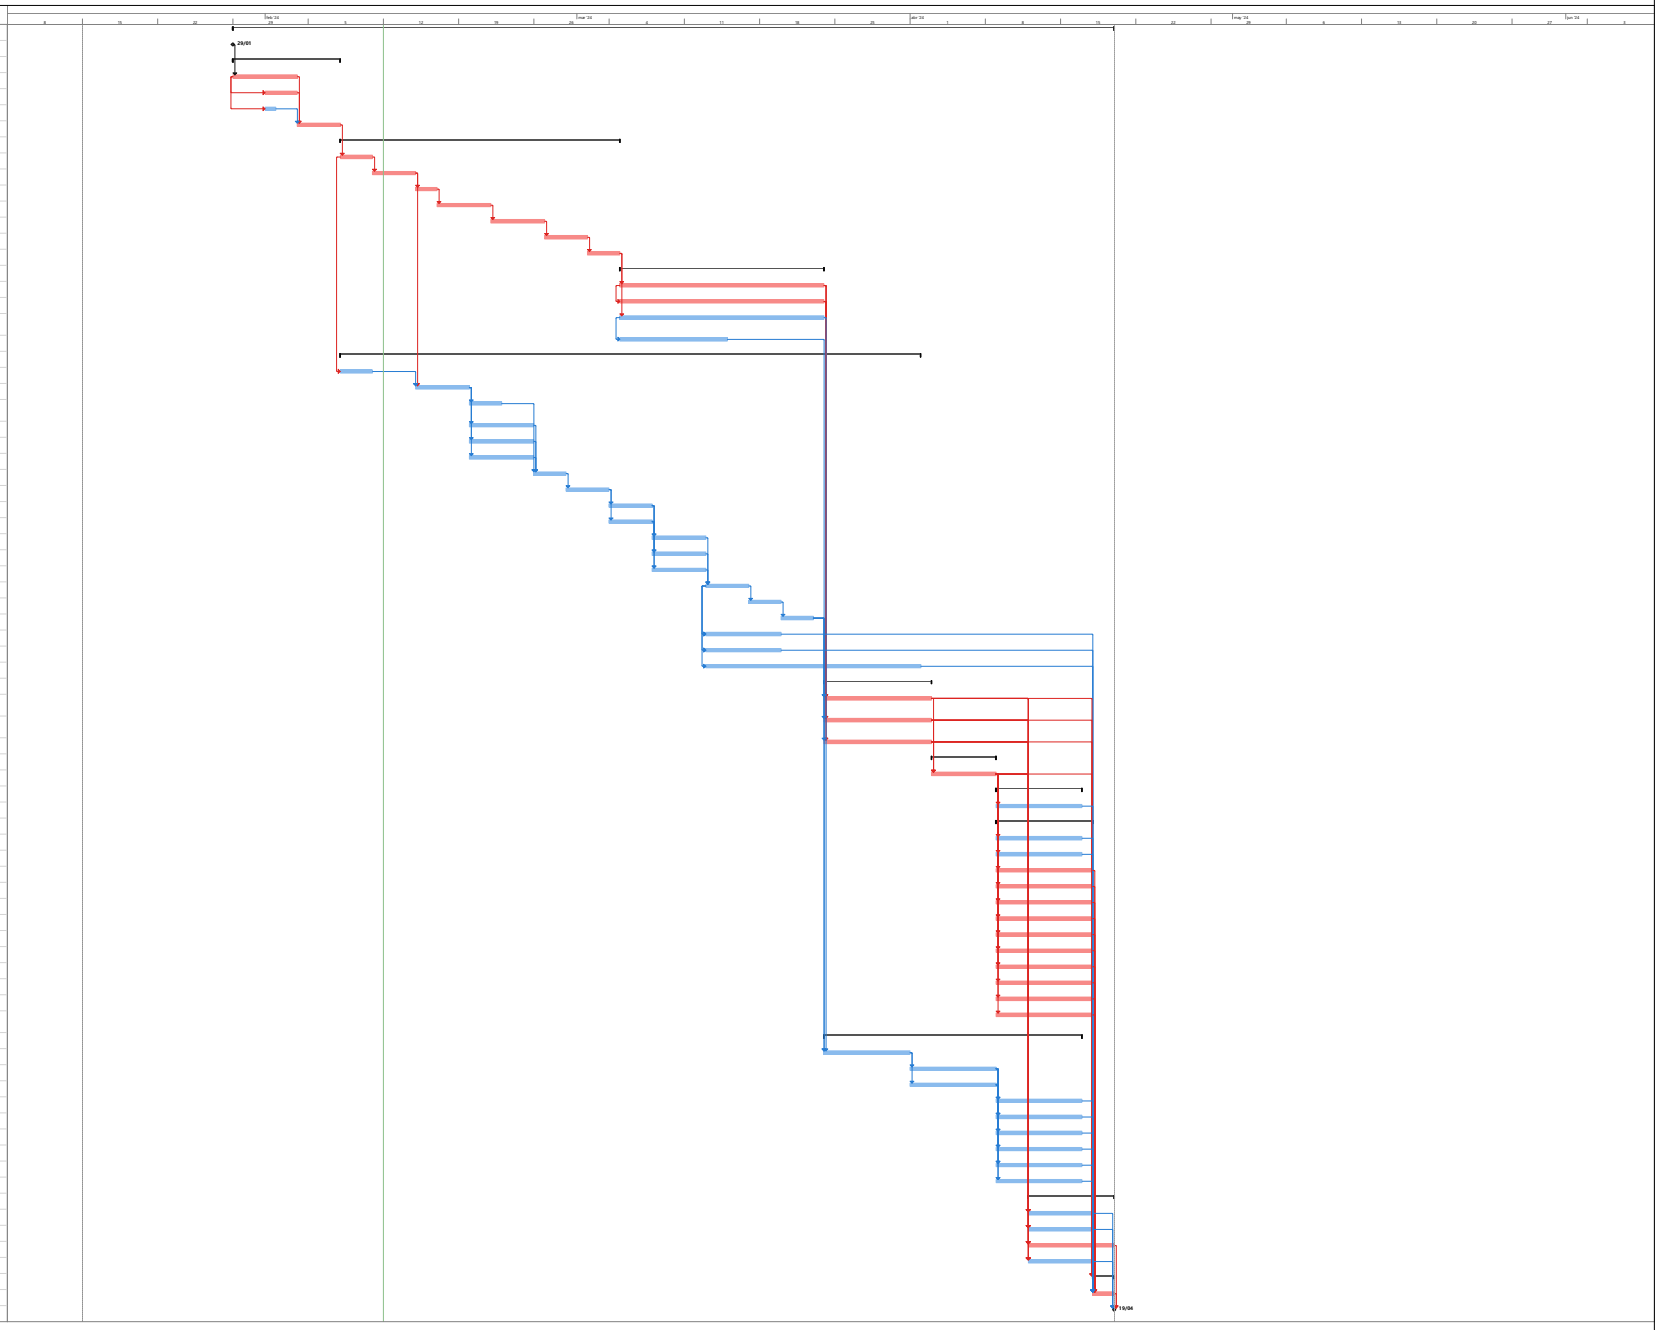

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR

Página 1

FIRMA

DIRECTOR DE OBRA: JAIME HERRERA OSORIO

FIRMA


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA : MAURICIO HERNANDEZ

AAU T20

CONTRATO DE OBRA No 1070-2022

PROGRAMACION PRELIMINAR AAUT20 PATIO BONITO SECTOR A

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**PROYECTO TERRITORIO T 20**	**96 días**	**lun 15/01/24**	**vie 19/04/24**	
2		INICIO	0 días	lun 15/01/24	lun 15/01/24	
3		**PRELIMINARES**	**20 días**	**lun 15/01/24**	**sáb 3/02/24**	
4	1.7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	10 días	lun 15/01/24	mié 24/01/24	2
5	1.10	Proteccion de arbol de existente	3 días	sáb 20/01/24	lun 22/01/24	4CC+50%
6	13.1	Baño portatil Alquiler	1 día	sáb 20/01/24	sáb 20/01/24	4CC+50%
7	1.8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	6 días	jue 25/01/24	mar 30/01/24	4;5;6
8	1.9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	6 días	jue 25/01/24	mar 30/01/24	4;5;6
9	1.1	Localización y replanteo	4 días	mié 31/01/24	sáb 3/02/24	7;8
10		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**22 días**	**dom 4/02/24**	**dom 25/02/24**	
11	2.1	Descapote a máquina nivel 0.00 (no. retiro) e=.20 cm	4 días	dom 4/02/24	mié 7/02/24	9
12	2.4	Excavación manual suelo blanco	5 días	jue 8/02/24	lun 12/02/24	11
13	2.8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	5 días	jue 8/02/24	lun 12/02/24	11
14	2.6	Geotextil T-2400	3 días	mar 13/02/24	jue 15/02/24	12;13
15	2.5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	4 días	vie 16/02/24	lun 19/02/24	14
16	2.2	Nivelación y perfilado de terreno manual	3 días	mar 20/02/24	jue 22/02/24	15
17	2.3	Nivelación y Compactación de Subrasante	3 días	vie 23/02/24	dom 25/02/24	16
18		**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS Y ACEROS DE REFUERZO**	**21 días**	**lun 26/02/24**	**dom 17/03/24**	
19	3.1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	21 días	lun 26/02/24	dom 17/03/24	17
20	4.1	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)	21 días	lun 26/02/24	dom 17/03/24	19CC
21	3.2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	10 días	lun 26/02/24	mié 6/03/24	17
22	4.3	Refuerzo acero fy=60000psi huellas de concreto	10 días	lun 26/02/24	mié 6/03/24	21CC
23	3.3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Contenedores de raiz)	10 días	lun 26/02/24	mié 6/03/24	17
24	4.2	Refuerzo acero fy=60000psi muro	10 días	lun 26/02/24	mié 6/03/24	23CC
25		**REDES HIDROSANITARIAS SUDS**	**45 días**	**dom 4/02/24**	**mar 19/03/24**	
26	5.1	Descapote a máquina nivel 0.00 (no. retiro) e=.1.40m	5 días	dom 4/02/24	jue 8/02/24	11CC
27	5.3	Taludes perimetrales en concreto fc 21 3000 psi .15	5 días	vie 9/02/24	mar 13/02/24	26
28	5.2	Concreto limpieza (alistado de terreno) e=0.05emObra	2 días	mié 14/02/24	jue 15/02/24	12;27
29	5.4	Cañuela en concreto	5 días	mié 14/02/24	dom 18/02/24	28CC
30	5.13	Malla Electro soldada d=5mm@0.15	5 días	mié 14/02/24	dom 18/02/24	28CC
31	5.14	Refuerzo acero fy=60000psi	5 días	mié 14/02/24	dom 18/02/24	28CC
32	5.5	Geotextil (NORMA) NS-088	2 días	lun 19/02/24	mar 20/02/24	31;30;29;2
33	5.12	Piedra bola	3 días	mié 21/02/24	vie 23/02/24	32
34	5.6	Capa drenaje (agregado Grueso)	5 días	mié 21/02/24	dom 25/02/24	33CC
35	5.7	Capa filtrante (agregado Fino)	5 días	mié 21/02/24	dom 25/02/24	33CC
36	5.8	Tuberia perforada PVC DE 4 PUL	5 días	lun 26/02/24	vie 1/03/24	33;34;35
37	5.9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	5 días	lun 26/02/24	vie 1/03/24	33;34;35
38	5.10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	5 días	lun 26/02/24	vie 1/03/24	33;34;35
39	5.11	Sustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	3 días	sáb 2/03/24	lun 4/03/24	36;37;38
40	5.16	Nivelación y perfilado de terreno manual	5 días	mar 5/03/24	sáb 9/03/24	39
41	5.17	Nivelación y Compactación de Subrasante	3 días	dom 10/03/24	mar 12/03/24	40
42	5.15	Reja sumidero	3 días	mar 5/03/24	jue 7/03/24	40CC
43	5.18	Cerramiento reja pequeña	3 días	mar 5/03/24	jue 7/03/24	40CC
44	5.19	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 m	15 días	mar 5/03/24	mar 19/03/24	40CC
45		**ADOQUÍN, TABLETA Y BORDILLOS**	**12 días**	**lun 18/03/24**	**vie 29/03/24**	
46	7.1	Adoquin prefabricados en concreto a color, de 60*15*21 (teCLosseria-Adoquines)	12 días	lun 18/03/24	vie 29/03/24	19;21;20;2
47	7.2	Adoquin rectangular plano demarcador visual	12 días	lun 18/03/24	vie 29/03/24	46CC
48	7.3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (AD7)	12 días	lun 18/03/24	vie 29/03/24	46CC
49	7.4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (AD8)	12 días	lun 18/03/24	vie 29/03/24	46CC
50	7.5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	12 días	lun 18/03/24	vie 29/03/24	46CC
51	7.6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (A60)	12 días	lun 18/03/24	vie 29/03/24	46CC
52		**PISOS EN MATERIAL RECICLADO**	**8 días**	**sáb 30/03/24**	**sáb 6/04/24**	
53	8.1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	8 días	sáb 30/03/24	sáb 6/04/24	46;47;48;4
54		**PINTURA**	**8 días**	**dom 7/04/24**	**dom 14/04/24**	
55	9.1	Pintura a color especio de GYM Biosaludable	8 días	dom 7/04/24	dom 14/04/24	53
56		**MOBILIARIO URBANO**	**17 días**	**sáb 30/03/24**	**lun 15/04/24**	
57	10.1	Canieca metalica referencia M-120 o M121.	5 días	sáb 30/03/24	mié 3/04/24	46;47;48;4
58	10.2	Silla individual referencia M-01-A	5 días	sáb 30/03/24	mié 3/04/24	46;47;48;4
59	10.4	Deslizadero	5 días	sáb 30/03/24	mié 3/04/24	46;47;48;4
60	10.5	Mesa de ajedrez en concreto	5 días	sáb 30/03/24	mié 3/04/24	46;47;48;4
61	10.6	Suministro baranda M-83	5 días	sáb 30/03/24	mié 3/04/24	46;47;48;4
62	10.7	Equipo de GYM REF flexion pierna	9 días	dom 7/04/24	lun 15/04/24	53
63	10.8	Equipo de GYM REF Elíptica	9 días	dom 7/04/24	lun 15/04/24	53
64	10.9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	9 días	dom 7/04/24	lun 15/04/24	53
65	10.10	Equipo de GYM REF Giro caminador	9 días	dom 7/04/24	lun 15/04/24	53
66		**VEGETACIÓN**	**34 días**	**mié 13/03/24**	**lun 15/04/24**	
67	11.4	Relleno en tierra negra	16 días	mié 13/03/24	jue 28/03/24	41;23;24
68	11.1	Cobertura tipo grama	12 días	vie 29/03/24	mar 9/04/24	67
69	11.2	Cobertura tipo floricultura	12 días	vie 29/03/24	mar 9/04/24	67
70	11.3	Siembra de arbol (Según propuesta paisajismo)	6 días	mié 10/04/24	lun 15/04/24	68;69
71	11.7	Arbol laurel hoja pequeña	6 días	mié 10/04/24	lun 15/04/24	70CC
72		**SEÑALIZACIÓN**	**5 días**	**lun 15/04/24**	**vie 19/04/24**	
73	12.1	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	4 días	lun 15/04/24	jue 18/04/24	53;55
74	12.2	Señaletica GYM parque	4 días	lun 15/04/24	jue 18/04/24	73CC
75	12.3	Señaletica identificador	5 días	lun 15/04/24	vie 19/04/24	73CC
76	12.4	Señaletica SC-80	4 días	lun 15/04/24	jue 18/04/24	73CC
77		**OTROS**	**3 días**	**mar 16/04/24**	**jue 18/04/24**	
78	13.2	Aseo general	3 días	mar 16/04/24	jue 18/04/24	42;43;44;5
79		FIN	0 días	vie 19/04/24	vie 19/04/24	73;74;75;7

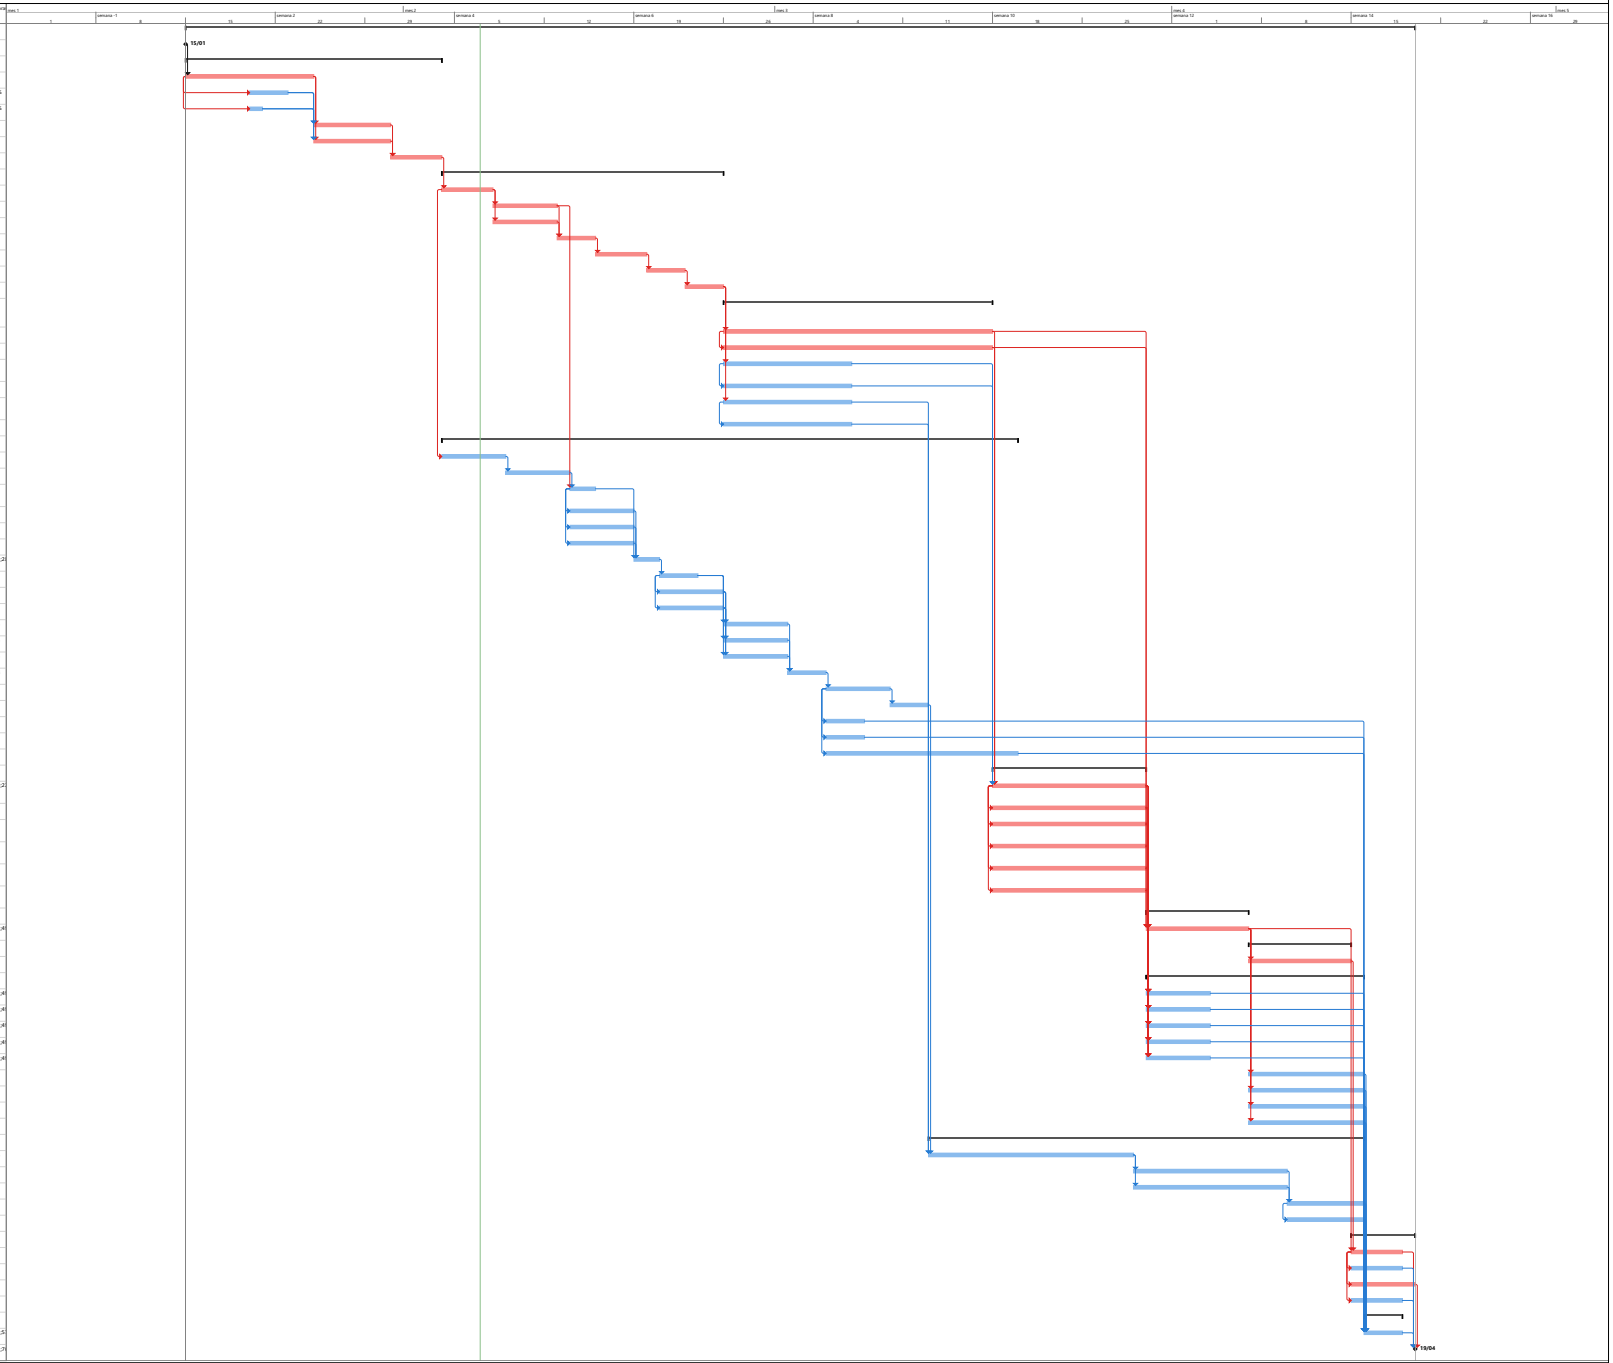

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR

Página 1

Firma:_____
Director de obra: Ing. Jaime Herrera Osorio


Fima:_____
Director Interventoria: Ing. Mauricio Hernandez

AAU T21

CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022

PROGRAMACION PRELIMINAR AAUT21 PATIO BONITO SETOR C

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**PROYECTO TERRITORIO T21**	**96 días**	**lun 15/01/24**	**vie 19/04/24**	
2		INICIO	0 días	lun 15/01/24	lun 15/01/24	
3		**PRELIMINARES**	**25 días**	**lun 15/01/24**	**jue 8/02/24**	
4	1.7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	10 días	lun 15/01/24	mié 24/01/24	2
5	1.101	Proteccion de arbol de existente	3 días	lúb 20/01/24	lun 22/01/24	4CC+50%
6	1.13	Proteccion de rejillas	3 días	lúb 20/01/24	lun 22/01/24	4CC+50%
7	1.8	Demolición y retiro de Bordillo prefabricado	10 días	jue 25/01/24	sáb 3/02/24	4,5,6
8	1.9	Desmonte y retiro de juegos infantiles	10 días	jue 25/01/24	sáb 3/02/24	4,5,6
9	1.11	Desmonte y retiro de balanda	10 días	jue 25/01/24	sáb 3/02/24	4,5,6
10	1.12	Desmonte de adoquin	10 días	jue 25/01/24	sáb 3/02/24	4,5,6
11	1.1	Baño portatil Alquiler	1 día	jue 25/01/24	jue 25/01/24	4
12	1.1	Localización y replanteo	5 días	dom 4/02/24	jue 8/02/24	7,8,9,10,1
13		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**29 días**	**vie 9/02/24**	**vie 8/03/24**	
14	2.1	Descapote a máquina nivel 0.00 (no. retiro) e=-20 cm	5 días	vie 9/02/24	mar 13/02/24	12
15	2.4	Excavación manual suelo blanco	10 días	vie 9/02/24	dom 18/02/24	14CC
16	2.8	Excavación muros y huellas vaciadas en concreto	10 días	vie 9/02/24	dom 18/02/24	12
17	2.6	Geotextil T-2400	3 días	lun 19/02/24	mié 21/02/24	15,16;14
18	2.7	Relleno compactado Base granular	8 días	jue 22/02/24	jue 29/02/24	17
19	2.5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	8 días	jue 22/02/24	jue 29/02/24	17
20	2.2	Nivelacion y perfilado de terreno manual	4 días	vie 1/03/24	lun 4/03/24	18,19
21	2.3	Nivelación y Compactación de Subrasante	4 días	mar 5/03/24	vie 8/03/24	20
22		**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**	**18 días**	**sáb 9/03/24**	**mar 26/03/24**	
23	3.1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	18 días	sáb 9/03/24	mar 26/03/24	21
24	3.2	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa para huellas en concreto	8 días	sáb 9/03/24	sáb 16/03/24	21
25	3.3	Concreto 3000 psi 21mpa para muros (Cortineadores de sol)	8 días	sáb 9/03/24	sáb 16/03/24	21
26		**ACERO DE REFUERZO**	**18 días**	**sáb 9/03/24**	**mar 26/03/24**	
27	4.1	Malla Electrosoldada d=9mm@0.15 (area 6x2.35)	18 días	sáb 9/03/24	mar 26/03/24	23CC
28	4.2	Refuerzo acero fy=4000Kg/e muro	8 días	sáb 9/03/24	sáb 16/03/24	25CC
29	4.3	Refuerzo acero fy=4000Kg/e huellas de concreto	8 días	sáb 9/03/24	sáb 16/03/24	24CC
30		**REDES HIDROSANITARIAS**	**59 días**	**vie 9/02/24**	**dom 7/04/24**	
31	5.1	Descapote a máquina nivel 0.00 (no. retiro) e=-1.40m	5 días	vie 9/02/24	mar 13/02/24	14CC
32	5.3	Tulues perimetrales en concreto fc 21 3000 psi -70	7 días	lun 19/02/24	dom 25/02/24	16,15;31
33	5.2	Concreto limpieza (pisitado de terreno) e=0.05mm25mx	2 días	lun 26/02/24	mar 27/02/24	32
34	5.4	Cañuela en concreto	15 días	mié 28/02/24	mié 13/03/24	33
35	5.13	Malla Electro soldada d=9mm@0.15	15 días	mié 28/02/24	mié 13/03/24	33
36	5.14	Refuerzo acero fy=4000Kg/e	15 días	mié 28/02/24	mié 13/03/24	33
37	5.5	Geotextil (NORMA) NS-088	2 días	jue 14/03/24	vie 15/03/24	34,35;36
38	5.12	Piedra bola	2 días	jue 14/03/24	vie 15/03/24	37CC
39	5.6	Capa drenaje (agregado Grueso)	3 días	sáb 16/03/24	lun 18/03/24	38,37
40	5.7	Capa filtrante (agregado Fino)	3 días	sáb 16/03/24	lun 18/03/24	38
41	5.8	Tuberia perforada PVC D6 4 PUL	3 días	mar 19/03/24	jue 21/03/24	39,40
42	5.9	Tuberia de limpieza PVC 4 PUL	3 días	mar 19/03/24	jue 21/03/24	39,40
43	5.10	Tuberia de salida PVC 6 PUL	3 días	mar 19/03/24	jue 21/03/24	39,40
44	5.11	Ilustrato (TIERRA NEGRA+ ARENA)	4 días	vie 22/03/24	lun 25/03/24	41,42;43
45	5.16	Nivelacion y perfilado de terreno manual	3 días	mar 26/03/24	jue 28/03/24	44
46	5.17	Nivelación y Compactación de Subrasante	4 días	vie 29/03/24	lun 1/04/24	45
47	5.15	Reja sumidero	4 días	mar 2/04/24	vie 5/04/24	46
48	5.18	Cerramiento reja pequeña	4 días	mar 2/04/24	vie 5/04/24	47CC
49	5.19	Caja de inspeccion 40x 40 h=1.0 **	10 días	vie 29/03/24	dom 7/04/24	46CC
50		**ADOQUIN, TABLETA Y BORDILLOS**	**10 días**	**mié 27/03/24**	**vie 5/04/24**	
51	7.2	Adoquin rectangular plano demarcador visual	10 días	mié 27/03/24	vie 5/04/24	23,27
52	7.3	Tableta podotactil alerta 20*20 cm. Prefabricado en concreto color amarillo (AM7)	10 días	mié 27/03/24	vie 5/04/24	23,27
53	7.4	Tableta podotactil Guia 20*20 cm. Prefabricado en concreto, color amarillo (AM8)	10 días	mié 27/03/24	vie 5/04/24	23,27
54	7.5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (AV5)	10 días	mié 27/03/24	vie 5/04/24	23,27
55	7.6	Bordillo demarcado recto interno prefabricado en concreto (AM4)	10 días	mié 27/03/24	vie 5/04/24	23,27
56		**PISOS EN MATERIAL RECICLADO TIPO CAUCHO**	**15 días**	**lun 1/04/24**	**lun 15/04/24**	
57	8.1	Piso caucho reciclado en color ,para juegos infantiles	15 días	lun 1/04/24	lun 15/04/24	52CC+50%
58		**PINTURA PISO**	**15 días**	**dom 31/03/24**	**dom 14/04/24**	
59	8.1	Pintura acolor espacio de GYM Biosaludable	15 días	dom 31/03/24	dom 14/04/24	52CC+50%
60		**MOBILIARIO URBANO**	**12 días**	**sáb 6/04/24**	**mié 17/04/24**	
61	10.1	Canecu metalica referencia M120 o M121.	8 días	sáb 6/04/24	sáb 13/04/24	52,53;54,5
62	10.2	Silla individual referencia M-01-A	8 días	sáb 6/04/24	sáb 13/04/24	52,53;54,5
63	10.3	Juego cuerdas piramidal	12 días	sáb 6/04/24	mié 17/04/24	52,53;54,5
64	10.6	Suministro balanda M-83	8 días	sáb 6/04/24	sáb 13/04/24	52,53;54,5
65	10.7	Equipo de GYM REF Sexo prensa	8 días	sáb 6/04/24	sáb 13/04/24	52,53;54,5
66	10.8	Equipo de GYM REF Elíptica	8 días	sáb 6/04/24	sáb 13/04/24	52,53;54,5
67	10.9	Equipo de GYM REF Giro de hombros	8 días	sáb 6/04/24	sáb 13/04/24	52,53;54,5
68	10.10	Equipo de GYM REF Giro caminador	8 días	sáb 6/04/24	sáb 13/04/24	52,53;54,5
69		**VEGETACIÓN**	**21 días**	**mié 27/03/24**	**mar 16/04/24**	
70	11.1	Cobertura tipo grama	15 días	mié 27/03/24	mié 10/04/24	23,27;24,
71	11.2	Cobertura tipo floricultura	15 días	mié 27/03/24	mié 10/04/24	70CC
72	11.4	Relleno en tierra negra	6 días	jue 11/04/24	mar 16/04/24	71,70
73	11.3	Siembra de arbol (Segun propuesta paisajismo)	6 días	jue 11/04/24	mar 16/04/24	72CC
74	11.7	Arbol ilusrel hoja pequeña	6 días	jue 11/04/24	mar 16/04/24	72CC
75	11.9	Arbol Calistemo	6 días	jue 11/04/24	mar 16/04/24	72CC
76		**SEÑALÍTICA**	**3 días**	**lun 15/04/24**	**mié 17/04/24**	
77	12.1	Señaletica identificador zona de juegos infantiles	2 días	lun 15/04/24	mar 16/04/24	59
78	12.2	Señaletica GYM parque	2 días	lun 15/04/24	mar 16/04/24	59
79	12.3	Señaletica identificador	3 días	lun 15/04/24	mié 17/04/24	59
80	12.4	Señaletica SC-80	2 días	lun 15/04/24	mar 16/04/24	59
81		**OTROS**	**2 días**	**jue 18/04/24**	**vie 19/04/24**	
82	13.2	Aseo general	2 días	jue 18/04/24	vie 19/04/24	65,66;67,7
83		FIN	0 días	vie 19/04/24	vie 19/04/24	82,77;78,

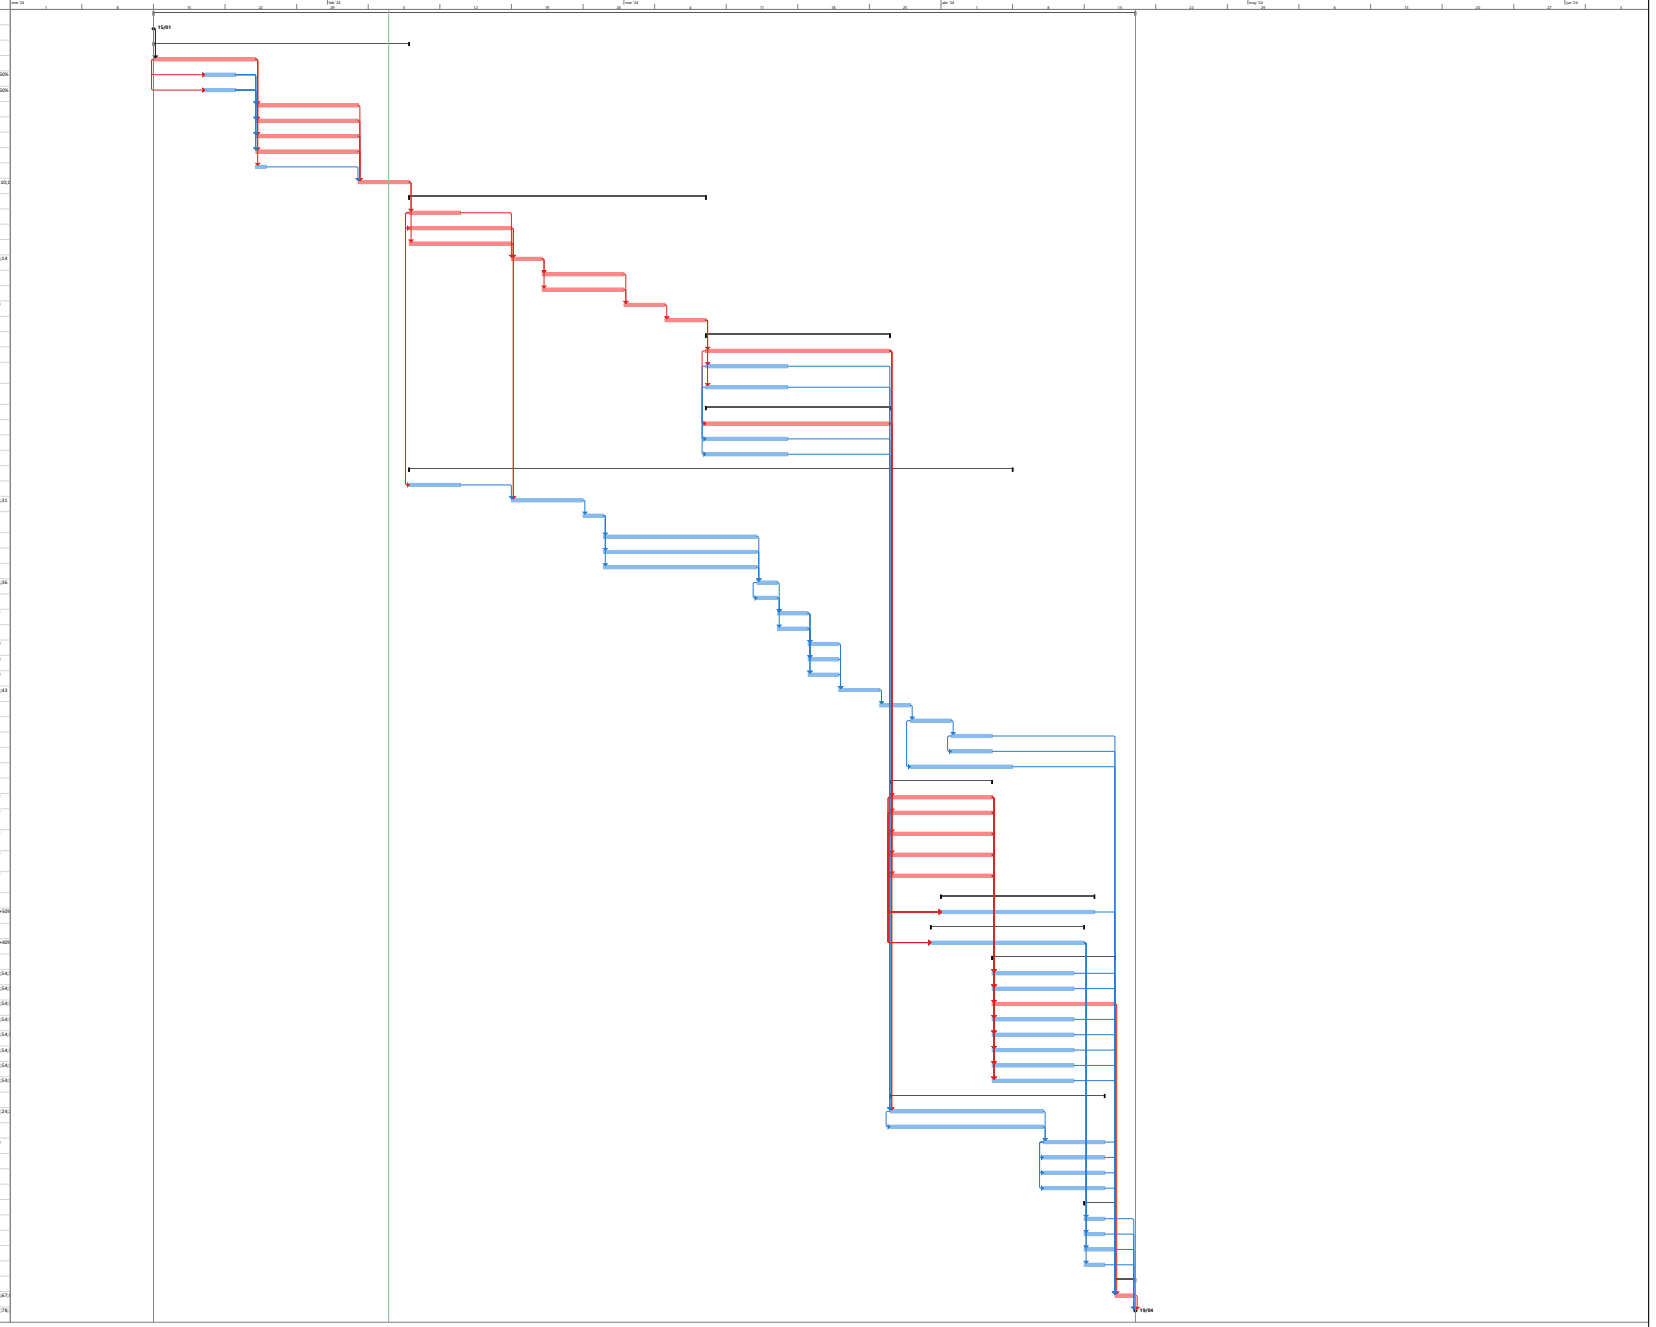

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR

Página 1

Firma:_____
Director de obra: Ing. Jaime Herrera Osorio

Fima:_____
Director Interventoria: Ing. Mauricio Hernandez


AAU T22

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

CONTRATO DE OBRA No 1070-2022

PROGRAMACION PRELIMINAR AAUT22 LOS OLIVOS

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**PROYECTO TERRITORIO T22**	**68 días**	**lun 12/02/24**	**vie 19/04/24**	
2		INICIO	0 días	lun 12/02/24	lun 12/02/24	
3		**PRELIMINARES**	**21 días**	**lun 12/02/24**	**dom 3/03/24**	
4	1.7	Cerramiento provisional de obra (Polisombra)	10 días	lun 12/02/24	mié 21/02/24	2
5	13.1	Baño portatil Alquiler	1 día	jue 15/02/24	jue 15/02/24	2FC+3 días
6	1.10	Proteccion de arbol de existente	5 días	sáb 17/02/24	mié 21/02/24	2FC+5 días
7	1.1	Localización y replanteo	3 días	jue 22/02/24	sáb 24/02/24	4;5;6
8	1.12	Desmonte de adoquín	8 días	dom 25/02/24	dom 3/03/24	7
9	1.14	Demolicion anden	8 días	dom 25/02/24	dom 3/03/24	7
10	1.15	Desmonte de bancas en concreto existente	3 días	jue 29/02/24	sáb 2/03/24	8CC+50%;9CC
11	1.11	Desmonte y retiro de baranda	3 días	jue 29/02/24	sáb 2/03/24	8CC+50%;9CC
12		**EXCAVACIONES**	**16 días**	**lun 4/03/24**	**mar 19/03/24**	
13	2.4	Excavación manual suelo blanco	8 días	lun 4/03/24	lun 11/03/24	8;9;10;11
14	2.5	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	8 días	mar 12/03/24	mar 19/03/24	13
15		**CONCRETOS BASES Y ESTRUCTURAS**	**16 días**	**mié 20/03/24**	**jue 4/04/24**	
16	3.101	Zapata corrida	6 días	mié 20/03/24	lun 25/03/24	14
17	3.11	Muro contenc concr 21 MPA 3000	6 días	mié 20/03/24	lun 25/03/24	14
18	3.1	Placa contrapiso 3000 psi 21mpa e=15	8 días	mar 26/03/24	mar 2/04/24	16;17
19	3.9	Escalera en concreto 3000 psi	4 días	sáb 30/03/24	mié 3/04/24	18CC+60%
20	3.8	Pdv01_piso duro vaciado. Construcción de piso duro en concreto de 21mpa	15 días	mié 20/03/24	mié 3/04/24	14
21	3.4	Cp02_conexiones peatonales livianas.	10 días	mar 26/03/24	jue 4/04/24	20CC+40%
22	3.5	Cp02_a_conexiones peatonales livianas.	10 días	mar 26/03/24	jue 4/04/24	20CC+40%
23	3.6	Cp02_b_conexiones peatonales livianas.	10 días	mar 26/03/24	jue 4/04/24	20CC+40%
24	3.7	Suministro, transporte e instalación de elemento en concreto pigmentado vaciado in situ.	10 días	mar 26/03/24	jue 4/04/24	20CC+40%
25		**PREFABRICADOS**	**25 días**	**mar 26/03/24**	**vie 19/04/24**	
26	7.5	Bordillo demarcado recto vial prefabricado en concreto (A10)	10 días	mar 26/03/24	jue 4/04/24	18CC;20CC
27	7.8	Adoquín de arcilla	10 días	mar 26/03/24	jue 4/04/24	20CC+40%
28	7.7	Rejilla sobre cañuela	5 días	lun 15/04/24	vie 19/04/24	26FC+10 días
29		**PISOS EN MATERIAL RECICLADO**	**5 días**	**mié 3/04/24**	**lun 8/04/24**	
30	8.1	Piso caucho reciclado en color, para juegos infantiles	5 días	mié 3/04/24	lun 8/04/24	18;19
31		**PINTURA**	**10 días**	**mié 3/04/24**	**sáb 13/04/24**	
32	6.1	Pintura a color espacio de GYM Biosaludable	10 días	mié 3/04/24	sáb 13/04/24	30CC
33		**MOBILIARIO URBANO**	**9 días**	**lun 8/04/24**	**mié 17/04/24**	
34	10.11	Banca prefabricada en concreto referencia dime 1.70*0.60*0.45 M13-A	8 días	lun 8/04/24	mar 16/04/24	20;18;30
35	10.12	Banca prefabricada en concreto referencia dime 0.80*0.60*0.45 M13-A	8 días	lun 8/04/24	mar 16/04/24	20;18;30
36	10.6	Suministro baranda M-83	8 días	lun 8/04/24	mar 16/04/24	20;18;30
37	10.14	Puerta metalica para cerramiento parque M80A	8 días	lun 8/04/24	mar 16/04/24	20;18;30
38	10.13	Banca de concreto vaciada en SITU.	8 días	lun 8/04/24	mar 16/04/24	20;18;30
39	10.15	Mantenimiento juegos infantiles existentes	9 días	lun 8/04/24	mié 17/04/24	20;18;30
40	10.16	Mantenimiento de GYM biosaludable	9 días	lun 8/04/24	mié 17/04/24	20;18;30
41		**VEGETACIÓN**	**15 días**	**vie 5/04/24**	**vie 19/04/24**	
42	11.1	Cobertura tipo grama	8 días	vie 5/04/24	vie 12/04/24	20;21;22;23;2
43	11.4	Relleno en tierra negra	7 días	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	42
44	11.3	Siembra de arbol (Según propuesta paisajismo)	7 días	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	43CC
45	11.5	Limo arcilloso	7 días	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	43CC
46	11.6	Arbol hayuelo	7 días	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	43CC
47	11.101	Arbol Chicala	7 días	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	43CC
48		**SEÑALETICA**	**5 días**	**lun 8/04/24**	**sáb 13/04/24**	
49	12.5	Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRC 000 ó SRG 000	5 días	lun 8/04/24	sáb 13/04/24	39CC;40CC
50	12.6	Suministro, transporte e instalación de valla tipo SRV 000	5 días	lun 8/04/24	sáb 13/04/24	39CC;40CC
51		**OTROS**	**4.8 días**	**lun 15/04/24**	**vie 19/04/24**	
52	13.3	Limpieza Carcamo	2 días	lun 15/04/24	mar 16/04/24	28CC
53	13.2	Aseo general	2 días	mié 17/04/24	vie 19/04/24	43CC;44CC;4
54		FIN	0 días	vie 19/04/24	vie 19/04/24	53;49;50;52;4

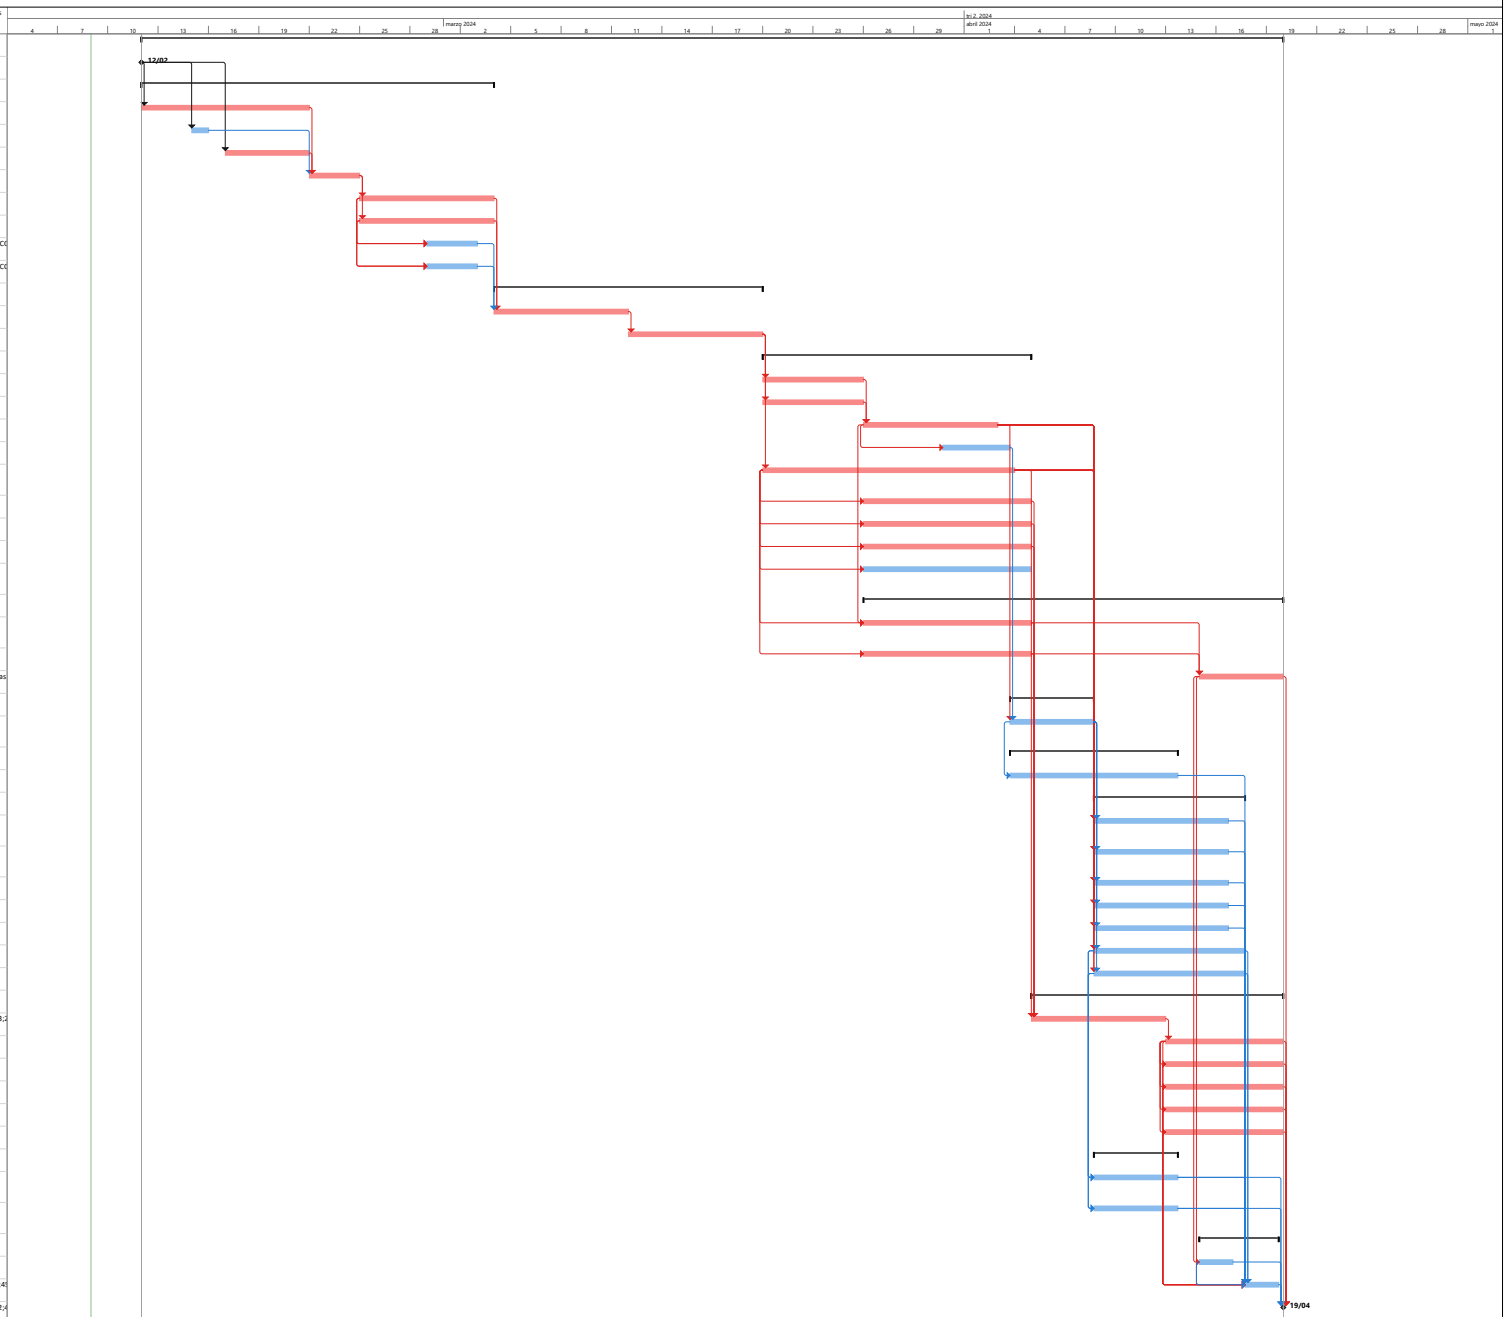

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

Firma:_____
Director de obra: Ing. Jaime Herrera Osorio

Fima:_____
Director Interventoria: Ing. Mauricio Hernandez

MANZANA DEL CUIDADO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1	**PROYECTO MANZANA DEL CUIDADO**	**81 días**	**mar 30/01/24**	**vie 19/04/24**		
2	INICIO	0 días	mar 30/01/24	mar 30/01/24		4CC;27CC;30CC;31CC
3	**PRELIMINARES**	**81 días**	**mar 30/01/24**	**vie 19/04/24**		
4	Localización y replanteo	10 días	mar 30/01/24	jue 8/02/24	2CC	5;6CC+29 días;13;14;
5	Limpieza, retiro de publicidad (stickers y adhesivos) y alistamiento de superficies de pintura en postes y bolardos	8 días	vie 9/02/24	vie 16/02/24	4	15CC+50%
6	Limpieza y alistamiento de superficies para murales (grafitis)	4 días	mié 28/02/24	sáb 2/03/24	4CC+29 días	10;11
7	Anclaje a zona dura(incluye demolición zona dura, excavación manual en material común, pedestal en concreto 3500 psi y suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 psi)	8 días	vie 5/04/24	vie 12/04/24	21CC+56 días	28;29;8
8	Relleno a tierra negra	7 días	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	7	32
9	**PINTURA (Muralismo - Superficie blanca base)**		**mar 30/01/24**	**jue 14/03/24**		
10	Muro No.1	48 días	dom 3/03/24	vie 19/04/24	6	24CC;32
11	Muro No.10	48 días	dom 3/03/24	vie 19/04/24	6	24CC;32
12	**MOBILIARIO UBANO**	**81 días**	**mar 30/01/24**	**vie 19/04/24**		
13	Pintura de Postes	44 días	vie 9/02/24	sáb 23/03/24	4	32
14	Adhesivos "sistema distrital del cuidado y manzana del cuidado"	44 días	vie 9/02/24	sáb 23/03/24	4	32
15	Pintura Bolardos	36 días	mar 13/02/24	mar 19/03/24	5CC+50%	32
16	Logo manzana del cuidado Tipo 1 (Medidas: 1,6mx1,10m / Pintura de piso)	40 días	vie 9/02/24	mar 19/03/24	4	32
17	Logo manzana del cuidado Tipo 2 (Medidas: 1,2mx0,8m / Pintura de piso)	40 días	vie 9/02/24	mar 19/03/24	4	32
18	Eslogan (Sistema distrital del Cuidado) Tipo 1 (Medidas: 5.20 mx2.4m / Pintura de piso)	40 días	vie 9/02/24	mar 19/03/24	4	32
19	Eslogan (Sistema distrital del Cuidado) Tipo 2 (Medidas: 2,0mx1,2m / Pintura de piso)	40 días	vie 9/02/24	mar 19/03/24	4	32
20	Planos indicativos de localización (Tamaño vari	40 días	vie 9/02/24	mar 19/03/24	4	32
21	Superficies moradas esquineras	40 días	vie 9/02/24	mar 19/03/24	4	32;7CC+56 días
22	Bordillo superficie morado (A=0.6m)	50 días	vie 9/02/24	vie 29/03/24	4	32
23	**MURALISMO**	**81 días**	**mar 30/01/24**	**vie 19/04/24**		
24	Intervención artistica (Tejidos) sobre rejas	48 días	dom 3/03/24	vie 19/04/24	10CC;11CC	32
25	Cintas de banderines en cruces vehiculares	40 días	vie 9/02/24	mar 19/03/24	4	32
26	Suministro e instalación de señalización metálica informativa para postes (Tamaño 0,5m x 0,1m) incluye abrazadera tipo cinta bandit.	30 días	vie 9/02/24	sáb 9/03/24	4	32
27	Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts	81 días	mar 30/01/24	vie 19/04/24	2CC	32
28	Mobiliario vertical Metálico con matera en concreto	7 días	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	7	32
29	Mobiliario vertical Metálico con matera en concreto + Banca	7 días	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	7	32
30	Suministro y aplicación de helio para Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts	81 días	mar 30/01/24	vie 19/04/24	2CC	32
31	Suministro Contrapeso movil Globo Esfera publicitario de 2.8 Mts incluye sistema de sujeción	81 días	mar 30/01/24	vie 19/04/24	2CC	32
32	FIN	0 días	vie 19/04/24	vie 19/04/24	24;10;11;15;16	

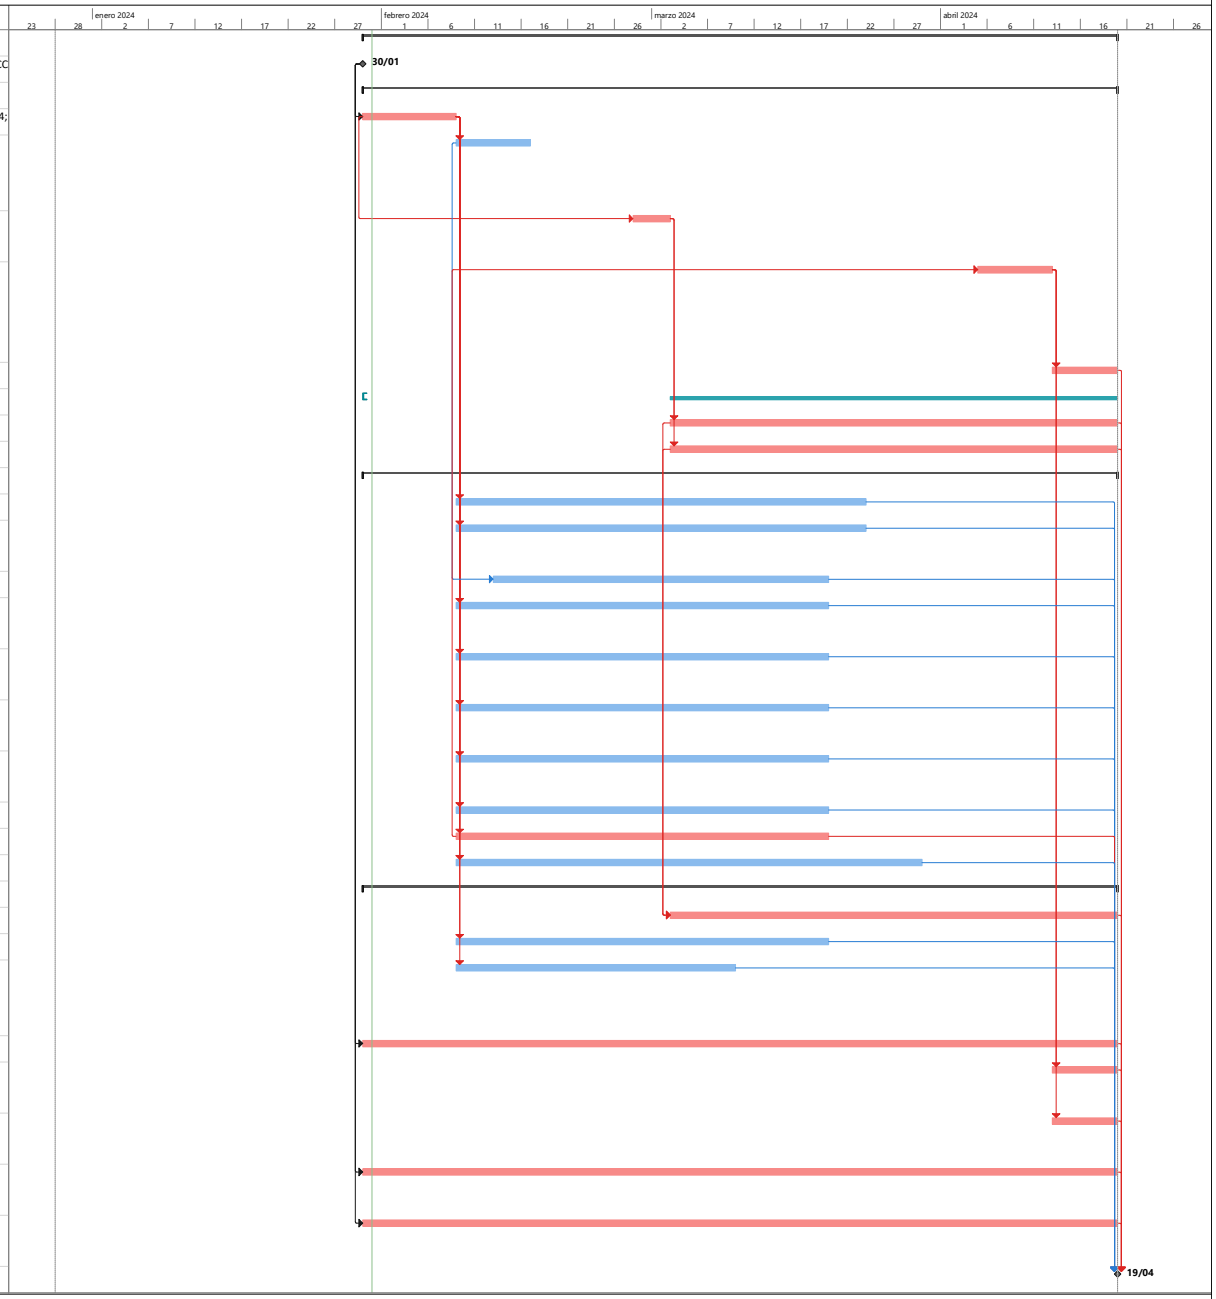

Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: mié 31/01/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

FIRMA

DIRECTOR DE OBRA: JAIME HERRERA OSORIO

FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA : MAURICIO HERNANDEZ

Anexo 12. Informe SST Final

INFORME COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA 1070-2022



INFORME FINAL

CONTRATISTA:

	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA
ELABORÓ:	Prof. Tatiana Rocha M.	Profesional SST	
APROBÓ:	Ing. Jaime Herrera Osorio	Representante Legal	

INTERVENTORÍA:

	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA
APROBÓ:	Ing. Felipe Marín	Especialista SST	
REVISÓ:			

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2. ALCANCE 5
3. ADEFINICIONES 5
4. NORMATIVIDAD 7
5. ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 7
6. GESTIÓN DE PERSONAL 7
7. INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS 16
8. ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EL TRABAJO. 16
9. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 20
10. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 21
11. COMITÉ DE CONVIVENVIA LABORAL 21
12. INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN OBRA. 21
Tabla 5: inspecciones de obra 22
13. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO 22
14. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 22
15. ATENCION DE EMERGENCIAS MÉDICAS. 23
16. SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 24
17. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. 25
18. MAQUINARIA Y/O VOLQUETAS- VEHICULOS 25
19. CONCLUSIONES 26

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Información contractual del proyecto

Tabla 2: Relación de personal durante la ejecución de obra

Tabla 3: relación de personal retirado durante la ejecución del proyecto

Tabla 4: Relación de exámenes médicos. Fuente: Elaboración propia

Tabla 5: inspecciones de obra

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene una descripción de todas las actividades realizadas en la ejecución del proyecto desde el área de (seguridad y salud en el trabajo) SST en el tiempo comprendido entre el 28 de diciembre de 2023 al 18 de mayo de 2024, lo anterior dando cumplimiento a los compromisos legales contractuales del CONSORCIO INGENIERÍA I identificado con NIT.901.639.134-0, en los cuales se establece la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de velar y preservar por la salud y la seguridad e incentivar a cada uno de sus colaboradores a cumplir las buenas prácticas de autocuidado durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 1070-2022, el cual tiene como objeto **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS PORLA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT"**.

Razón Social	CONSORCIO INGENIERÍA I
NIT	901.639.134-0
Representante legal	Jaime Herrera Osorio
CC	79.655.971
Domicilio	Avenida Carrera 15 No 100 – 69 OFC. 508
Teléfono	(601) 755 09 85
Entidad Contratante	Secretaría Distrital Del Hábitat – Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Contratista	Consorcio Ingeniería I
Número del Contrato	1070-2022
Plazo de ejecución	Siete (7) meses
Objeto del Contrato	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ACUPUNTURA URBANA EN TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Valor del Contrato:	$ 2.550.000.000
Fecha de Inicio	16 de noviembre de 2023
Fecha de terminación inicial	15 de junio de 2023

Suspensión No. 1	Cuarenta y cinco (45) días - desde el 21/03/2023 hasta el 04/05/2023.
Suspensión No. 2	Treinta (30) días - desde el 26/07/2023 hasta el 24/08/2023.
Ampliación No. 1 Suspensión No. 2	Un (1) mes (desde el 25/08/2023 hasta el 24/09/2023.
Ampliación No. 2 Suspensión No. 2	Un (1) mes (desde el 25/09/2023 hasta el 24/10/2023.
Ampliación No. 3 Suspensión No. 2	Veinte (20) días (desde el 25/10/2023 hasta el 13/11/2023.
Suspensión No. 3	Diecies (16) días (desde el 12/12/2023 hasta el 27/12/2023)
Prorroga No. 1	Cuatro (4) meses y quince (15) Días
Prorroga No. 2	Treinta (30) días.
Fecha de Terminación actual	19 de mayo de 2024

Tabla 1. Información contractual del proyecto

2. ALCANCE

El presente informe recopila las actividades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo realizadas durante la ejecución del proyecto.

3. ADEFINICIONES

- **Accidente de trabajo:** Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo
- **Bioseguridad:** es un conjunto de protocolos, normas, tecnologías y prácticas que se implementan para evitar el riesgo para la salud y medio ambiente que proviene de la exposición de gentes biológicos causante de enfermedades infecciosas, toxicas o alérgicas.
- **Consecuencias:** Resultado más probable (lesiones en las personas, daños a los equipos, al proceso o a la propiedad) como resultado de la exposición a un factor de riesgo determinado.
- **Enfermedad general:** es toda lesión física o mental en el individuo, provocada por una lesión orgánica o funcional, permanente o transitoria, causa por trastornos metabólicos, agentes físicos, químicos, biológicos o psicosociales, que puede o no imposibilitarle para el desempeño general o

laboral.

- **Enfermedad profesional:** estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional.
- **Expuestos:** Se refiere al número de personas que se ven afectadas en forma directa o indirecta por el factor de riesgo durante la realización del trabajo.
- **Extintor:** Aparato autónomo, diseñado como un cilindro, que puede ser desplazado por una sola persona y que, usando un mecanismo de impulsión bajo presión de un gas o presión mecánica, lanza un agente extintor hacia la base del fuego, para lograr extinguirlo.
- **Factor de riesgo:** Se refiere a la existencia de fenómenos, condiciones, circunstancias, y acciones humanas que encierran la capacidad potencial de producir lesiones.
- **Fuente generadora del factor de riesgo**: Identifica el proceso, objetos, instrumentos y condiciones físicas y psicológicas de las personas que generan el factor de riesgo.
- **Grado de Peligrosidad:** Indicador de la gravedad de un riesgo reconocido, calculado con base en sus consecuencias ante la probabilidad de ocurrencia y en función del tiempo o la frecuencia de exposición al mismo.
- **Higiene industrial:** Es la disciplina dedicada al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y agentes ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que puedan causar enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad
- **Horas de Exposición - Día:** Es el tiempo real o promedio durante el cual la población en estudio está en contacto con el factor de riesgo, en su jornada laboral.
- **Incidente de trabajo:** Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos
- **Plan Hospitalario para emergencias:** Es el documento en el que se establecen los objetivos, las acciones y la organización del hospital y sus servicios, así como las responsabilidades del personal frente a situaciones de emergencia o desastre, a fin de controlar sus efectos adversos y/o atender los daños a la salud que se puedan presentar
- **Seguridad industrial:** Comprende el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de las causas de los accidentes de trabajo
- **Panorama de factores de riesgo Ocupacionales:** Es el reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que están expuestos los distintos grupos de trabajadores en una empresa específica, determinando en éste los efectos que pueden ocasionar a la salud de los trabajadores y la

estructura organizacional y productiva de la empresa

- **Probabilidad:** Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas.

4. NORMATIVIDAD

Durante la ejecución del contrato fue responsabilidad del **CONSORCIO INGENIERIA I**, aplicar la normatividad de seguridad y salud en el trabajo dando cumplimiento a la misma en cada una de las actividades de los diferentes territorios.

5. ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Todas las actividades reportadas en este informe final de Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo fueron ejecutadas durante el CONTRATO DE OBRA No. 1070–2022 y fueron reportadas mensualmente en los informes, por lo cual este presenta los consolidados de dichas acciones y sus respectivos soportes los cuales dieron cumplimiento contractual a este contrato, y cuentan con la recisión y aprobación de la Interventoría Consorcio Prosperar Bethel

Durante la ejecución del proyecto, se gestionó las diferentes actividades que abarcan el sistema de gestión de la seguridad y el trabajo, dando cumplimiento a los diferentes procesos y procedimientos en las diferentes áreas.

Con base en lo anterior, se dio cumplimiento a:

Políticas y objetivos SST, afiliaciones a seguridad social del personal administrativo y operativo, elaboración de exámenes médicos ocupacionales, inducciones, capacitaciones, charlas de promoción y prevención, entregas de elementos de protección personal, instalación de señalización y delimitación de áreas, reglamento de higiene y seguridad industrial; también protocolos de bioseguridad, esto con el fin de evitar y mitigar cualquier tipo de incidente, accidente y enfermedad.

6. GESTIÓN DE PERSONAL

6.1. Afiliaciones y pagos al sistema general de seguridad social

La documentación fue validada con base en los lineamientos de las obligaciones contractuales como normativas; posteriormente fue radicada a la interventoría para su aprobación.

Los documentos radicados a la interventoría por trabajador fueron: afiliación ARL, EPS, caja de compensación, fondo de pensiones, examen médico ocupacional y planilla de trabajadores. **(Anexo 1)**

También se radicaron los documentos de los operarios de vehículos de volquetas, retroexcavadora.

A continuación, se relaciona el listado de los profesionales que han estado haciendo el acompañamiento y reconocimiento del sitio:

En el **(Anexo 2),** se encuentra el listado del personal y los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social

6.2. Ingresos y retiros

A continuación, se relaciona el personal administrativo y operativo de los diferentes territorios

INFORME N°1 PERIDO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONSORCIO INGENIERIA I				
1	Gracia Juan	19196565	Residente de obras	24/01/2024
2	Herrera Jaime	79655971	Director - R.L.	1/11/2023
3	Lozada David	1,02E+09	Ing. Ambiental	1/11/2023
4	Niño Willintong	79904525	Ing. Residente de obra	24/01/2024
5	Penagos Edwin	1,03E+09	Inspector técnico	1/11/2023
6	Pulido Yuli	1,03E+09	Profesional Social	1/11/2023
7	Rocha Tatiana	1,02E+09	Profesional SST	1/11/2023
PERSONAL PARQUE T20 Y T21				
8	Barahona William Ricardo	79794584	Ayudante	16/05/2024
9	Higuera Bernal José David	1123566945	Ayudante	15/01/2024
10	Lemus Bernal Manuel Alejandro	1020715677	Encargado	15/01/2024
11	Lemus Bernal Jefferson Steven	1013036337	Ayudante 1	8/01/2024
12	Lemus Bernal Miguel Ángel	1020715676	Ayudante	15/01/2024
13	Lemus Vanegas Manuel Salvador	79157947	Oficial de obra	23/01/2024
14	Montaño Ballen Jairo	3120997	Oficial	26/01/2024
15	Pachón Torres Diego Alejandro	3121681	Oficial	26/01/2024
16	Pallares Barlanoa Luis José	1052999971	Operario de maquina	22/01/2024
17	Pérez Guatibonza Carlos Alberto	1020712879	Oficial de obra	15/01/2024

INFORME N°2 PERIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

PERSONAL TERRITORIO LA MANZANA			
ITEM	**PERSONAL TERRITOTIO - MANZANA DEL CIUDADO**	**CEDULA**	**CARGO**

1	Arrollo Mosquera Luilly Daniel	1006196141	Pintor
2	Franco Galvis Andrés Giovanny	80033516	Pintor
3	Narciso González Jhonathan	1012439947	Pintor
4	Rivera Romero Miguel Ángel	1000287310	Pintor
5	Rodríguez Zabala Johan Sebastian	1007297993	Pintor

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONSORCIO INGENIERIA I				
1	Castro Paula	1000686563	Apoyo social	26/02/2024
2	David Lozada	1022372831	Ing. Ambiental	1/11/2023
3	Edwin Penagos	1031155174	Inspector técnico	1/11/2023
4	Jaime Herrera	79655971	Director - R.L.	1/11/2023
5	Juan Gracia	19196565	Residente de obras	24/01/2024
6	Pulido Yuli	1030557560	Profesional Social	1/11/2023
7	Tatiana Rocha	1023897317	Profesional SST	1/11/2023
8	Willintong Niño	79904525	Ing. Residente de obra	24/01/2024
PERSONAL PARQUE LOS OLIVOS				
1	Correa Marin Jesús Miguel	1126249042	Ayudante	12/02/2024
2	Lugo Oviedo Julio Cesar	79965990	Oficial	12/02/2024
3	Lugo Oviedo Wilber Enrique	80227761	Oficial	12/02/2024
4	Osorio Lozano Jairo	10177596	Ayudante	12/02/2024
5	Suarez Cardona Jober	79613898	Ayudante	12/02/2024
6	Suarez Mahecha Enio	80356887	Maestro	12/02/2024
PERSONAL PARQUES T20 Y T21				
1	Lemus Bernal Jeferson Steven	1013036337	Ayudante	18/01/2024
2	Lemus Bernal Manuel Alejandro	1020715677	Encargado	15/01/2024
3	Lemus Vanegas Manuel Salvador	79157947	Oficial de obra	23/2/01/2024
4	Martínez Mendoza Jaime Armando	7160887	Ayudante	26/02/2024
5	Barahona William Ricardo	79794584	Ayudante	16/05/2024
6	Lemus Bernal Miguel Ángel	1020715676	Ayudante	15/01/2024
7	Martínez Urrego Alexander	80371923	Ayudante	26/02/2024
8	Loaiza Vera Arnobel	5973059	Ayudante	9/02/2024
PERSONAL WNM PARQUES - USME C17				
1	Barios Luis Gabriel	5506745	Ayudante	29/02/2024
2	Lagos Bolívar Luis Yuber	9636476	Oficial	12/02/2024
3	León Barreto Enrique Sabino	19213493	Ayudante	21/02/2024
4	Montaño Ballen Jairo	3120997	OFICIAL	26/01/2024
5	Moreno Gutiérrez Facundo	9635751	Ayudante	23/02/2024
6	Pachón torres Diego Alejandro	3121681	OFICIAL	26/01/2024
7	Sepúlveda Posada Yhonatan Mateo	1001450330	Ayudante	14/02/2024

INFORME N°3 PERIDO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONSORCIO INGENIERIA I				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	Castro Paula	1000686563	Apoyo social	26/02/2024
2	Gracia Juan	19196565	Residente de obras	24/01/2024
3	Herrera Jaime	79655971	Director - R.L.	45231
4	Lozada David	1022372831	Ing. Ambiental	1/11/2023
5	Niño Willintong	79904525	Ing. Resid. de obra	24/01/2024
6	Penagos Edwin	1031155174	Inspector técnico	1/11/2023
7	Pulido Yuli	1030557560	Profesional Social	1/11/2023
8	Rocha Tatiana	1023897317	Profesional SST	1/11/2023

PERSONAL WNM PARQUES - USME C17				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	Moreno Gutiérrez Facundo	9635751	Ayudante	23/02/2024
2	León Barreto Enrique Sabino	19213493	Ayudante	21/02/2024
3	Barios Luis Gabriel	5506745	Ayudante	29/02/2024
4	Jonathan Michel Gómez Miranda	1069129017	Ayudante	19/03/2024

PERSONAL PARQUE PATIO BONITO - T20				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	Arquerque Jimenez Luis Fernando	1102230014	Ayudante	4/03/2024
2	Barahona Wiliam Ricardo	79794584	Ayudante	16/05/2024
3	Barragan Farfan Ramiro	80793468	Oficial de obra	4/03/2024
4	Ferreira centeno Ermides	5021151	Ayudante	14/02/2024
5	Lemus Bernal Jeferson Steven	1013036337	Ayudante	18/01/2024
6	Lemus Bernal Manuel Alejandro	1020715677	Encargado	15/01/2024
1	Lemus Vanegas Manuel Salvador	79157947	Oficial de obra	23/2/01/2024
2	Martinez Mendoza Jaime Armando	7160887	Ayudante	26/02/2024
3	Martinez Urrego Alexander	80371923	Ayudante	26/02/2024
4	Noble Lares Jan Pier	1104865280	Ayudante	8/03/2024
5	Torres Mazurco Jorge Hernan	79769207	Maestro	6/03/2024

PERSONAL PARQUE LOS OLIVOS				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	Leal Cacoma Eduin Yovani	17689592	Ayudante	29/02/2024

2	Lugo Oviedo Julio Cesar	79965990	Oficial	12/02/2024
3	Lugo Oviedo Wilber Enrique	80227761	Oficial	12/02/2024
4	Suarez Mahecha Enio	80356887	Maestro	12/02/2024
PERSONAL MURALES - MANZANA DEL CUIDADO - UVJMM				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	Aleman Martinez Cristhian Andres	1023862957	PINTOR	20/03/2024
2	Candamil Rodriguez Angela Maria	52425363	PINTOR	20/03/2024
3	Cavieles Michael Esneyder	1014223904	PINTOR	20/03/2024
4	Molano Quedevo Nelson Edgardo	1023880622	PINTOR	20/03/2024
5	Varona Coronado Ivan Dario	80093944	PINTOR	20/03/2024
PERSONAL MANZANA DEL CUIDADO - OHSJD				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	Bernal Mendez Andres Leonardo	1013615999	PINTOR	21/03/2024
2	Castañeda Lozano Dabian Gionnardy	1024584727	PINTOR	21/03/2024
3	Gutierrez Rico Jorge Andres	1023902724	PINTOR	21/03/2024
4	Martinez Forero Brayan Alexis	1013628274	PINTOR	21/03/2024
5	Monroy Garcia Yeferson Alejandro	1023937363	PINTOR	21/03/2024
6	Palacios Moya Johan Steven	1033800378	PINTOR	21/03/2024
7	Robayo Pedreros Lina Veromy	1000782286	PINTOR	21/03/2024
8	Tovar Oviedo Nicolas Camilo	1023954821	PINTOR	21/03/2024
9	Valencia Echeverria Juan Carlos	1026571795	PINTOR	21/03/2024
10	Villamil Farfan Edward	80807687	PINTOR	21/03/2024

INFORME N°4 PERIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024

INFORME N° 4 PERIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024				
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONSORCIO INGENIERIA I				
1	Castañeda Paula	1000686563	Apoyo social	26/02/2024
2	Herrera Jaime	79655971	Director - R.L.	1/11/2023
3	Lozada David	1022372831	Ing. Ambiental	1/11/2023
4	Rocha Tatiana	1023897317	Profesional SST	1/11/2023
5	Sanchez Maria	1031161731	Residente de obra	8/04/2024
6	Willintong Niño	79904525	Ing. Resid. de obra	24/01/2024
PERSONAL WNM PARQUES - USME C17				
1	Barios Luis Gabriel	5506745	Ayudante	29/02/2024
2	Gomez M. Jonathan Michael	1069129017	Ayudante b	18/05/2024
3	Lagos Bolivar Luis Yuber	9636476	Oficial	12/02/2024
4	Leon Barreto Enrique Sabino	19213493	Ayudante	21/02/2024
5	Montaño Ballen Jairo	3120997	OFICIAL	26/01/2024
6	Moreno Gutierrez Facundo	9635751	Ayudante	23/02/2024
7	Pachon torres Diego Alejandro	3121681	OFICIAL	26/01/2024
8	Sepulveda P. Yhonatan Mateo	1001450330	Ayudante	14/02/2024

PERSONAL PARQUES T20				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	Arquerque Jimenez Luis Fernando	1102230014	Ayudante	4/03/2024
2	Barragan Farfan Ramiro	80793468	Oficial de obra	4/03/2024
3	Martinez Mendoza Jaime Armando	7160887	Ayudante	26/02/2024
4	Noble Lares Jan Pier	1104865280	Ayudante	8/03/2024
5	Torres Mazurco Jorge Hernan	79769207	Maestro	6/03/2024
PERSONAL PARQUES T21				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	Lemus Bernal Jeferson Steven	1013036337	Ayudante	18/01/2024
2	Lemus Bernal Manuel Alejandro	1020715677	Encargado	15/01/2024
3	Lemus Vanegas Manuel Salvador	79157947	Oficial de obra	23/2/01/2024
PERSONAL PARQUE LOS OLIVOS T 22				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	Gonzalez Piña Juanklin	1148,94743	Ayudante	26/04/2024
2	Ramirez Laguna Yoiner Jose	1050399728	Ayudante	24/04/2024
3	Ramos Olaya Carlos Andres	1007712696	Maestro	22/04/2024
4	Rivera Gutierrez Oscar Mesias	14139186	Ayudante	6/04/2024
5	Rodriguez Gonzalez Luis Eduardo	5679807	Ayudante	4/04/2024
6	Suarez Cardona Jober	79613898	Ayudante	12/02/2024
7	Suarez Mahecha Enio	80356887	Maestro	12/02/2024
PERSONAL ORNAMENTACIÓN				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	Cuenca Johan	1031155301	Ornamentador	3/04/2024
2	Maximo Mena Jose	12020799	Ornamentador	3/04/2024
3	Sambrano Henrry	27273460	Ornamentador	3/04/2024
4	Valencia David Esteven	1150937623	Ornamentador	3/04/2024
PERSONAL MURALES - MANZANA DEL CUIDADO - UVJMM				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	Aleman Martinez Cristhian Andres	1023862957	Pintor	20/03/2024
2	Candamil Rodriguez Angela Maria	52425363	Pintor	20/03/2024
3	Cavieles Michael Esneyder	1014223904	Pintor	20/03/2024
4	Molano Quedevo Nelson Edgardo	1023880622	Pintor	20/03/2024
5	Varona Coronado Ivan Dario	80093944	Pintor	20/03/2024

PERSONAL MANZANA DEL CUIDADO				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	Bernal Mendez Andres Leonardo	1013615999	Pintor	21/03/2024
2	Castañeda L. Dabian Gionnardy	1024584727	Pintor	21/03/2024
3	Gutierrez Rico Jorge Andres	1023902724	Pintor	21/03/2024
4	Martinez Forero Brayan Alexis	1013628274	Pintor	21/03/2024
5	Monroy Garcia Yeferson Alejandro	1023937363	Pintor	21/03/2024
6	Palacios Moya Johan Steven	1033800378	Pintor	21/03/2024
7	Robayo Pedreros Lina Veromy	1000782286	Pintor	21/03/2024
8	Tovar Oviedo Nicolas Camilo	1023954821	Pintor	21/03/2024
9	Valencia Echeverria Juan Carlos	1026571795	Pintor	21/03/2024
10	Villamil Farfan Edward	80807687	Pintor	21/03/2024

INFORME N°5 PERIDO DEL 01 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2024

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONSORCIO INGENIERIA I				
1	Castañeda Paula	1000686563	Apoyo social	26/02/2024
2	Herrera Jaime	79655971	Director - R.L.	1/11/2023
3	Lozada David	1022372831	Ing. Ambiental	1/11/2023
4	Niño Willintong	79904525	Ing. Resid. de obra	24/01/2024
5	Pulido Yuli	1030557560	Profesional Social	1/11/2023
6	Rocha Tatiana	1023897317	Profesional SST	1/11/2023
7	Sánchez Maria	1031161731	Residente de obra	8/04/2024
PERSONAL WNM PARQUES - USME C17				
1	Barios Luis Gabriel	5506745	Ayudante	29/02/2024
2	Gómez M. Jonathan Michael	1069129017	Ayudante	19/03/2024
3	González Guerrero Pedro Pablo	80469632	Ayudante	11/04/2024
4	León Barreto Enrique Sabino	19213493	Ayudante	21/02/2024
5	Moreno Gutiérrez Facundo	9635751	Ayudante	23/02/2024
6	Pachón torres Diego Alejandro	3121681	Oficial	26/01/2024
7	Barios Luis Gabriel	5506745	Ayudante	29/02/2024
PERSONAL ORNAMENTACIÓN				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	Mena José Maximo	12020799	Ornamentador	3/04/2024
2	Sambrano Henrry	27273460	Ornamentador	3/04/2024
3	Cuenca Johan	1031155301	Ornamentador	3/04/2024
4	Valencia David Esteben	1150937623	Ornamentador	3/04/2024

Tabla 2: Relación de personal durante la ejecución de obra

6.5. Relación de personal retirado durante la ejecución del proyecto

A continuación, se relaciona el personal administrativo y operativo de los diferentes territorios**. (Anexo 3)** paz y salvos.

INFORME N°2 PERIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

PERSONAL WNM - TERRITORIO 17				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE RETIRO**
1	Montaño Ballen Jairo	3120997	OFICIAL	26/01/2024
2	Pachón torres Diego Alejandro	3121681	OFICIAL	26/01/2024
3	Sepúlveda Posada Yhonatan Mateo	1001450330	Ayudante	14/02/2024
PERSONAL RETIRADO – AMBAR – T20 y T21				
1	Páez Fonseca Alvaro	79375332	Ayudante	14/02/2024
2	Páez Sanabria Robinson Alejandro	1092386581	Ayudante	14/02/2024
3	Castiblanco Piñeros Jaime	79858419	Ayudante	22/02/2024

INFORME N°3 PERIDO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2024

PERSONAL WNM - TERRITORIO 17				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE RETIRO**
1	Lagos Bolívar Luis Yuber	9636476	Oficial	15/03/2024
PERSONAL RETIRADO – AMBAR – T20 y T21				
1	Lemus Bernal Miguel Ángel	1020715676	Oficial	18/03/2024

INFORME N°4 PERIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024

PERSONAL ADMINISTRATIVO CONSORCIO INGENIERIA I				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE RETIRO**
1	Gracia Juan	19196565	Residente de obras	1/04/2024
2	Penagos Edwin	1031155174	Inspector técnico	8/04/2024
ITEM	**PERSONAL TERRITOTIO - MANZANA DEL CIUDADO**	**CEDUKLA**	**CARGO**	**FECHA DE RETIRO**
1	Arrollo Mosquera Luilly Daniel	1006196141	Pintor	23/04/2024
2	Franco Galvis Andrés Giovanny	80033516	Pintor	23/04/2024
3	Narciso González Jhonathan	1012439947	Pintor	23/04/2024
4	Rivera Romero Miguel Ángel	1000287310	Pintor	23/04/2024
5	Rodríguez Johan Sebastián	1007297993	Pintor	23/04/2024

PERSONAL MANZANA DEL CUIDADO				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE RETIRO**
1	Bernal Méndez Andres Leonardo	1013615999	Pintor	23/04/2024
2	Castañeda Lozano Dabian Gionnardy	1024584727	Pintor	23/04/2024
3	Gutiérrez Rico Jorge Andres	1023902724	Pintor	23/04/2024
4	Martínez Forero Brayan Alexis	1013628274	Pintor	23/04/2024
5	Monroy García Yeferson Alejandro	1023937363	Pintor	23/04/2024
6	Palacios Moya Johan Steven	1033800378	Pintor	23/04/2024
7	Robayo Pedreros Lina Veromy	1000782286	Pintor	23/04/2024
8	Tovar Oviedo Nicolas Camilo	1023954821	Pintor	23/04/2024
9	Valencia E. Juan Carlos	1026571795	Pintor	23/04/2024
10	Villamil Farfán Edward	80807687	Pintor	23/04/2024
PERSONAL MURALES – MANZANA DEL CUIDADO				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE RETIRO**
1	Alemán M. Cristhian Andrés	1023862957	PINTOR	23/04/2024
2	Candamil R. Angela María	52425363	PINTOR	23/04/2024
3	Cavieles Michael Esneyder	1014223904	PINTOR	23/04/2024
4	Molano Q. Nelson Edgardo	1023880622	PINTOR	23/04/2024
5	Varona Coronado Iván Dario	80093944	PINTOR	23/04/2024

INFORME N°5 PERIDO DEL 01 DE MAYO AL 18 DE MAYO DE 2024

PERSONAL PARQUE T20				
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE RETIRO**
1	Arquerque J. Luis Fernando	1102230014	Ayudante	18/05/2024
2	Barragán Farfan Ramiro	80793468	Oficial de obra	18/05/2024
3	Martínez M. Jaime Armando	7160887	Ayudante	18/05/2024
4	Noble Lares Jan Pier	1104865280	Ayudante	18/05/2024
5	Torres Mazurca Jorge Hernan	79769207	Maestro	18/05/2024
PERSONAL PARQUE T21				
1	Lemus Bernal Jefferson Steven	1013036337	Ayudante 1	18/05/2024
2	Lemus Bernal Manuel Alejandro	1020715677	Encargado	18/05/2024
3	Lemus Vanegas Manuel Salvador	79157947	Oficial de obra	18/05/2024

PERSONAL PARQUE LOS OLIVOS				
1	González Piña Juanklin	1148,947434	Ayudante	26/04/2024
2	Rodríguez G. Luis Eduardo	5679807	Ayudante	4/04/2024
3	Suarez Cardona Jober	79613898	Ayudante	12/02/2024
4	Suarez Mahecha Enio	80356887	Maestro	12/02/2024

Tabla 3: relación de personal retirado durante la ejecución del proyecto

7. INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Consorcio ingeniería I, a través del área de seguridad y salud en el trabajo, realizo para todo el ingreso del personal de los diferentes territorios tanto administrativo como operativo, las respectivas inducciones de notificación del riesgo, **(Anexo 6)**, donde se exponen diferentes temas como:

- Definición de accidente de trabajo
- Entidades que conforman el sistema general de seguridad y salud en el trabajo
- Prestaciones a las cuales tiene derecho un trabajador en caso de accidente
- Tiempo mínimo en el que se deben reportar los accidentes de trabajo
- Definición de enfermedad laboral
- Normas laborales aplicables
- Políticas de seguridad y salud en el trabajo
- Definición del COPASST
- Los diferentes riesgos a los que están expuestos en obra
- Promoción y prevención
- Uso adecuado de los EPP y dotación
- Autocuidado
- Respuesta ante emergencias
- Uso adecuado de equipos y herramientas
- Participación en charlas y capacitaciones

8. ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EL TRABAJO.

8.1. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo

Dentro de las actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo, se realizaron las siguientes:

- **EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO.**

Durante la ejecución del proyecto a todos los trabajadores que ingresaron a laborar para el contrato, se les practico los correspondientes exámenes médicos,

que tienen como finalidad evaluar el estado de salud en el momento que se vinculan al proyecto, para detectar posibles sintomatologías o enfermedades de base, que puedan agravarse con las condiciones laborales.
Así mismo el contratista verificó que se encontraran firmados por médicos con su respectiva Licencia en Salud Ocupacional y las IPS debidamente aprobadas por las autoridades competentes (secretaria Distrital de Salud) como Prestadores de Servicios Médicos especializados en Salud Ocupacional. La toma de los certificados médicos de los trabajadores se realiza dando cumplimiento a la Resolución 1016/89 y 2346 de 2007.

MATRIZ SEGUIMIENTO EXÁMENES MÉDICOS									CÓDIGO: VERSIÓN: 1 Página 1 de 1
#	FECHA EXAMEN	TIPO DE EXAMEN	NUMERO DE IDENTIFICACIÓ	NOMBRES Y APELLIDOS	RECOMENDACIONES LABORALES	RECOMENDACIONES SST	SVE	RECOMENDACIONES MEDICAS	ACCIÓN
1	11/01/2024	Ingreso con enfasis en alturas	79794584	Barahona Wiliam Ricardo	Realizar control de optometria en su EPS Realizar pausas activas Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Uso de proteccion auditiva Valoracion por nutricionista en su EPS	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Programa SVE visual Participación pausas activas Participación charlas estilo de vida saludable Uso adecuado de los epp	Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Valoracion por nutricionista en su EPS	N/A
2	11/01/2024	Ingreso con enfasis en alturas	1123566945	Higuera Bernal Jose David	Realizar control de optometria en su EPS Realizar pausas activas Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Uso de proteccion auditiva Valoracion por nutricionista en su EPS	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Programa SVE visual Participación pausas activas Participación charlas estilo de vida saludable Uso adecuado de los epp	Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Valoracion por nutricionista en su EPS	N/A
3	18/01/2024	Ingreso con enfasis en alturas	1013036337	Lemus Bernal Jeferson Steven	Realizar control por optometriRealizar pausas activas Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas. Ejercicio fisico Uso de protección auditoria Realizar valoración por nutrición en su EPS	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Programa SVE visual Participación pausas activas Participación charlas estilo de vida saludable Uso adecuado de los epp	Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Valoracion por nutricionista en su EPS	N/A
4	15/11/2023	Ingreso con enfasis en alturas	1020715677	Lemus Bernal Manuel Alejandro	Realizar control por optometriRealizar pausas activas Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas. Ejercicio fisico Uso de protección auditoria Realizar valoración por nutrición en su EPS	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Programa SVE visual Participación pausas activas Participación charlas estilo de vida saludable Uso adecuado de los epp	Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Valoracion por nutricionista en su EPS	N/A
5	11/01/2024	Ingreso con enfasis en alturas	1020715676	Lemus Bernal Miguel Angel	Realizar control por optometriRealizar pausas activas Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas. Ejercicio fisico Uso de protección auditoria Realizar valoración por nutrición en su EPS	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Programa SVE visual Participación pausas activas Participación charlas estilo de vida saludable Uso adecuado de los epp	Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Valoracion por nutricionista en su EPS	N/A

6	26/01/2024	Ingreso con enfasis en osteomuscular	79157947	Lemus Vanegas Manuel Salvador	Usar correccion visual Valoración por EPS: nutrición y diabetica uso de EPP Pausas activas e higiene postural Habitos de estilo de vida saludable	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Programa SVE visual Participación pausas activas Participación charlas estilo de vida saludable Uso adecuado de los epp	Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Valoracion por nutricionista en su EPS Ejercicioas de piernas para favorecer erl retorno venoso/vcumplir con el programa de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, se recomienda bajar de peso, bajar el consumo de grasa, azucar y harinas Realizar actividad fisica vigorosa al menos 20 minutos diarios 3 dias a la semana Se recomienda realizar ejercicios cardiovasculares	N/A
7	11/01/2024	Ingreso con enfasis en alturas	1020712879	Perez Guatibonza Carlos Alberto	Realizar control por optometriRealizar pausas activas Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas. Ejercicio fisico Uso de protección auditoria Realizar valoración por nutrición en su EPS	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Programa SVE visual Participación pausas activas Participación charlas estilo de vida saludable Uso adecuado de los epp	Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas Ejercicio basico Valoracion por nutricionista en su EPS	N/A
8	21/01/2024	Ingreso	3120997	Montaño Ballen Jairo	Puede realizar labores en alturas control de optometria por la EPS Uso de lentes para laborar permanentes Control medico de rutinba EPS Higiene postural Realizar pausas activas Uso de EPP Uso obligatorio de proteccion auditiva	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Ingresar al SVE Auditivo	Uso de medias antivarice preventivo Cuidado auditivo Control de Otorrinolalingologia y audiometria	Dar cumplimiento a la Resolución 692 dek 29 de abril de 2022
9	18/12/2023	Ingreso	3121681	Pachon Torres Diego Alexander	Puede realizar labores en alturas control de optometria por la EPS Uso de lentes Control medico de rutinba EPS Uso de medias antivarices Higiene postural Realizar pausas activas Uso de EPP Uso obligatorio de proteccion auditiva	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Programa SVE visual Participación pausas activas Participación charlas estilo de vida saludable Uso adecuado de los epp	Valoración cirucia vascular	Dar cumplimiento a la Resolución 692 dek 29 de abril de 2022

MATRIZ EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES								CODIGO VERSIÓN PAGINA 1 DE 1
ITEM	**FECHA DE EXAMEN**	**NUMERO DE IDENTIFICACION**	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**RECOMENDACIONES LABORALES**	**RECOMENDACIONES SST**	**SVE**	**RECOMENDACIONES MEDICAS**	**ACCIÓN**
1	25/07/2023	9636476	Lagos Bolivar Luis Yuber	Puede realizar labores en alturas Control medico rutina por EPS Uso de lentes para laborar Control adecuado de peso corporal Nutricion EPS Seguimiento de EPS por alteriación en laboratorios	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Realizar pausas activas Uso adecuado de EPP en funcion del peligro para el trabajador	N/A	N/A
2	23/03/2023	80371923	Martinez Urrego Alexander	Realizar control por optomeria en su EPS. Realizar valoracion por nutricion en su EPS.	Realizar pausas activas. Estilos de vida saludable	Evitar posturas prolongadas. Ejercicio fisico. Uso de proteccion auditiva.	N/A	N/A
3	5/01/2024	5973059	Loaiza Vera Amabel	Realizar control por optomeria en su EPS. Realizar valoracion por nutricion en su EPS. Uso de proteccion auditiva.	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Realizar pausas activas. Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas. Ejercicio fisico.	N/A	N/A
4	18/01/2024	80356887	Suarez Merchan Enio	Control EPS Inicio de actividades fisica Uso de EPP medidas de seguridad y proteccion Covid 19	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Uso de EPP Habitos de vida saludable Pausas activas	N/A	N/A
5	9/02/2024	79965990	Lugo Oviedo Julio Cesar	Seguir las recomendaciones escrictas de medicina ocupacional Hacer periodicamente los exmanes de ,medicina ocupacional El paciente no manifiesta signos ni sintomas relacionados con el sindroma respiratorio agudo severo (asrs cov2) no presenta morbilidades identofocadas como factores de riesgo COVID 19 según circular 030 del 2020	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Usar los EPP Usar protección visual durante la jornada laboral	N/A	N/A
6	9/02/2024	80227761	Lugo Oviedo Wilber Enrique	Seguir las recomendaciones escrictas de medicina ocupacional Hacer periodicamente los exmanes de ,medicina ocupacional El paciente no manifiesta signos ni sintomas relacionados con el sindroma respiratorio agudo severo (asrs cov2) no presenta morbilidades identofocadas como factores de riesgo COVID 19 según circular 030 del 2020	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Usar los EPP Usar protección visual durante la jornada laboral	N/A	N/A
7	9/02/2024	101177596	Osorio Lozano Jairo	Seguir las recomendaciones escrictas de medicina ocupacional Hacer periodicamente los exmanes de ,medicina ocupacional El paciente no manifiesta signos ni sintomas relacionados con el sindroma respiratorio agudo severo (asrs cov2) no presenta morbilidades identofocadas como factores de riesgo COVID 19 según circular 030 del 2020	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Usar los EPP Usar protección visual durante la jornada laboral	N/A	N/A
8	20/02/2024	7160887	Martinez Mendoza Jaime Armando	Realizar control por optomeria en su EPS Realizar valoracion por nutricion en su EPS. . Uso de proteccion auditiva.	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Realizar pausas activas. Estilos de vida saludable Evitar posturas prolongadas. Ejercicio fisico	N/A	N/A

9	21/02/2024	19213493	Leon Barreto Enrique Sabino	Control medico de rutina Ortopedia por EPS Uso de medias antivarice preventivo Se sugiere realizar audiometria y visiometriaocupacional	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Realizar pausas activas Uso adecuado de EPP en funcion del peligro para eñ trabajador	N/A	N/A
10	29/02/2024	17689592	Eduin Yovani Leal Cacoma	Seguir las recomendaciones escrictas de medicina ocupacional Hacer periodicamente los exmanes de ,medicina ocupacional El paciente no manifiesta signos ni sintomas relacionados con el sindroma respiratorio agudo severo (asrs cov2) no presenta morbilidades identofocadas como factores de riesgo COVID 19 según circular 030 del 2020	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Usar los EPP Usar protección visual durante la jornada laboral	N/A	N/A
11	29/02/2024	5506745	Barros Luis Gabriel	Puede laborar en alturas Control medico rutina por EPS	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Realizar pausas activas Uso adeuado de EPP en funcion del peligro para trabajar	N/A	N/A
12	20/02/2024	9635751	Moreno Gutierrez Facundo	Puede realizar labores en alturas Control optometria por EPS Uso de lentes para laborar Control medico de rutina EPS Control adecuado de peso corporal Nutricion EPS Seguimiento de EPS por alteriación en laboratorios	Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas, solicitar cita medica general por EPS	Realizar pausas activas Uso adecuado de EPP en funcion del peligro para el trabajador	N/A	N/A

MATRIZ EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES

ITEM	FECHA DE EXAMEN	NUMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE Y APELLIDOS	RECOMENDACIONES LABORALES	RECOMENDACIONES SST	SVE	RECOMENDACIONES MEDICAS
1	18/12/2023	3121681	Pachon Torres Diego Alexander	Puede realizar labores en alturas Control optometria por EPS Uso de lentes Control medico de rutina EPS Uso de medias antivarice Valoración cirujia vascular	Uso de EPP en funcion del peligro para el trabajador Participar en las capacitaciones: estilos de vida saludable, pausas activas	Realizar pausas activas	N/A
2	26/09/2023	80469632	Gonzalez Guerrero Pedro Pablo	Puede laborar en alturas Controles de salud medico EPS	Uso adecuado de EPP en funcion del peligro para el trabajador Realizar pausas activas	Realizar pausas activas	N/A
3	7/02/2022	11306780	Romero Camacho Jose German	Control optpmetria EPS Oftamologia EPS Uso de medias antivarice Control medico rutina EPS Nutricion EPS Psicologia EPS	Uso adecuado de EPP en funcion del peligro para el trabajador Realizar pausas activas	Uso de lentes para laborar Higiene postural Realizar pausas activas Uso de EPP frente a la pandemia de Covid -19 seleccionados en funcion del peligro para el trabajador No manifiesta signos noi sintomas relacionados con el sindrome respiratorio agudo severo (sars-cov-2) No presenta morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para covid 19.	N/A
4	7/12/2023	5679807	Luis Eduardo Rodriguez Gonzalez	Control optometria por EPS Uso de lentes Control medico de rutina EPS	Uso de los EPP en funcion del peligro para el trabajador	Realizar pausas activas	N/A
5	30/11/2023	1050065723	Nieto Jimenez Alvaro Javier	Puede realizar labores en alturas Control medico de rutana por EPS Se sugiere Valoracion por cirugia general EPS	Uso adecuado de EPP en funcion del peligro para el trabajador	Realizar pausas activas	N/A

Tabla 4: Relación de exámenes médicos. Fuente: Elaboración propia

9. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, se hizo necesaria la implementación de los protocolos de bioseguridad PAPSO para garantizar la minimización de exposición a los riesgos inherentes al virus COVID-19. La empresa conto con un campamento el cual cuenta con una unidad de baño sanitaria un lavamanos para realizar el lavado de manos. se generó una estrategia de implementación de protocolos, así:

- Solicitud de elementos necesarios para la implementación de estos, tales como: mascarilla, jabón, gel.
- Procesos de capacitación para la implementación y cumplimiento del PAPSO.
- Distribución de elementos.
- Inducción y capacitación al personal para la correcta ejecución del protocolo COVID-19.

Nota: NO SE PRESENTARON CASOS

10. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Se realizaron las respectivas reuniones mes a mes conforme al Decreto Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1443 de 2014; durante el periodo comprendido del proyecto desde inicio hasta su finalización; verificando su eficacia mediante los indicadores de accidentalidad que, a la fecha de finalización del proyecto, se mantuvieron en un 0% de accidentes.

Por otro lado, se llevó a cabo el desarrollo del cronograma de charlas y capacitaciones presentado para este año, no obstante, se realiza seguimiento a los subcontratistas sobre la entrega de dotaciones y elementos de protección personal para todos los colaboradores de los diferentes territorios de obra. **(Anexo 7)**

11. COMITÉ DE CONVIVENVIA LABORAL

El comité como órgano promotor de actividades que fomenta un ambiente armónico ha sido la consigna para el proyecto Consorcio Ingeniería I , por ende, se realizaron reuniones con el fin de generar y promover algunas acciones de formación para generar ambientes que promuevan los escenarios de tolerancia y respeto por la diferencia, se coordinaron procesos de coordinación orientado al resultado y lograr advertir sobre la necesidad de ver el conflicto como un proceso que se puede anticipar y mitigar.

12. INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN OBRA.

Durante el desarrollo de la obra, se realizaron inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, **(Anexo 5)** tales como:

INSPECCIÓN	FRECUENCIA	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	RESPONSABLE
Recursos de emergencia (Extintores, botiquín, camilla)	Mensual	X	X	SST
Inspecciones de áreas de trabajo, orden y aseo, locativas	Semanal	X	X	SST

Inspecciones preoperacionales de herramientas manuales y Herramientas eléctricas	Diario	X	X	SST
Inspecciones a vehículos	De acuerdo a fechas programas para las actividades a realizar	x	x	SST
Inspecciones a baños.	Semanal	x	x	SST

Tabla 5: inspecciones de obra

13. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

Durante la ejecución del proyecto, no se realizaron actividades de alto riesgo.

14. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

Durante la ejecución del proyecto, se presentó un (1) accidente de trabajo, el cual fue atendido y reportado a la administradora de riesgo labores y tramitada la asistencia médica mediante la EPS asignada para el trabajador, Así mismo, se realizó la respectiva investigación del accidente y seguimiento al trabajador durante y después del suceso, llegando así al cierre del caso.

Narración del accidente.

El día 25 de marzo del presente año, siendo aproximadamente las 7:00 de la mañana, en el Territorio 22 (Parque los Olivos), se realizó la actividad de trasiego de concreto hidráulico para fundir el sendero peatonal de dicho parque.

Este día, el colaborador Eduin Leal, identificado con numero de cedula 17.689.592, se encontraba realizando el trasiego del concreto en una carretilla asignada para dicha actividad; la cantidad de concreto era 35 metros cúbicos los cuales fueron puestos en sitio por todo el personal de obra (ayudantes y oficiales del territorio 22) a través de carretillas; debido a la cantidad de concreto hidráulico, el trabajador Eduin Leal, tuvo que pasar (pisar) el concreto que se ponía en sitio para poder llevar a los espacios asignados para los senderos a elaborar.

En medio de la actividad se evidencio al trabajador incomodo con el calzado que llevaba puesto ese día, ya que el jefe inmediato no asigno el calzado adecuado (botas de caucho caña alta) para la elaboración de la actividad; por ende, el concreto alcanzo a ingresar por sus botas generando contacto directo con la piel ocasionando inicialmente irritación.

Al finalizar la jornada laboral, el señor Eduin Leal no informo al profesional SST sobre lo sucedido en su pie derecho a causa del contacto con el concreto, informo únicamente al jefe inmediato (Enio Suarez), quien tampoco informo al área SST sobre lo sucedido ni realizo el respectivo reporte ante la ARL.

El día 3 de abril del presente año la profesional SST Tatiana Rocha, al presentarse nuevamente al territorio 22, evidencia al colaborador laborando en tenis y se acerca a preguntar y solicitar el uso adecuado de la dotación, teniendo como respuesta por parte del colaborador Eduin Leal, que no es posible ponerse las botas de trabajo ya que le dolía el pie porque se generó una quemadura en su debido a la exposición del contacto directo con el concreto hidráulico; posterior a la respuesta procede a mostrar la herida, evidenciándose la quemadura infectada.
La profesional SST, de inmediato solicita al Subcontratista Enio Sánchez, elaborar el reporte de ARL por el accidente ocurrido al colaborador; también se solicita al señor Eduin Leal retirarse del sitio de trabajo y dirigirse al campamento para cambiarse e ir de inmediato al centro médico asignado para que lo valore el medico según reporte elaborado ante la ARL.

Debido a lo anterior, se socializo con todo el personal de la obra el accidente del trabajador y se tomaron medidas de eliminación y mitigación de los riesgos para futuras actividades. (**Anexo 12)**

15. ATENCION DE EMERGENCIAS MÉDICAS.

Con el objeto de atender cualquier emergencia que se presentara en el desarrollo de las actividades se dotaron los frentes de obra con los siguientes elementos de primeros auxilios:

- **Botiquín**

Se cuenta con botiquines dotados con implementos básicos de:

- ✓ Limpieza y desinfección.
- ✓ Protección de tejidos.
- ✓ Materiales de inmovilización.
- ✓ Material de apoyo.
- ✓ Condiciones de Uso.

- **Extintor.**

En los diferentes territorios, se ubicaron extintores multipropósitos, para extinguir fuego de:

- ✓ TIPO A: solidos, madera, telas y papel.

- **Camilla de primeros auxilios.**

Se contó con una camilla rígida por territorio.

Así mismo en los diferentes territorios, se publicó y divulgo los numero en caso de emergencia, al igual que el MEDEVAC.

16. SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

16.1. Dotación EPP

Durante todo el proyecto se hizo la entrega de elementos de protección personal a quienes ingresan por primera vez, de igual forma se hizo reposición de los EPP por deterioro y perdida de acuerdo a la actividad que se ejecutó. **(Anexo 12)**

16.2. Capacitación según cronograma

De igual forma, se desarrolló un plan de capacitaciones, tratando temas contemplados en el cronograma durante la ejecución del contrato**. (Anexos 6)**

16.3. Cerramiento y señalización de la obra

Durante el inicio de cada uno de los territorios asignados para la ejecución de actividades según el contrato obra N° 1072-2022, se implementaron las medidas preventivas desde la instalación de cerramientos, señalización, cumplimiento del PMT, puntos ecológicos y elementos como cinta de seguridad para delimitar y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los peatones y comunidad en general. **(Anexo 8)**

16.4. Campamentos provisionales y unidades de baños sanitarias

Cada uno de los territorios contaban con unidades sanitarias fijas que cumplían con el numero adecuado para el respectivo uso de acuerdo con la cantidad de personal asignado por cada frente de trabajo.
A cada unidad sanitaria, se le realizaba su inspección de orden y aseo, se suministraba un kit de aseo (jabón para lavado de manos) y papeleras.
EL lavado de cada unidad sanitaria se realizaba semanalmente en los diferentes territorios. **(Anexo 9)**

17. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.

En todos los frentes de trabajo se instalaron y se mantuvieron las diferentes señales preventivas, reglamentarias e informativas las cuales estaban orientadas a:

a. **indicar la obligatoriedad del uso de EPP.**

- Use casco
- Use bota de seguridad
- Use guantes
- Use protección auditiva.
- Use tapabocas

b**. señales informativas.**

- Botiquín
- Extintor
- Baños
- Camillas
- Puntos ecológicos
- Centro de acopio
- Punto de encuentro

c. **Señales de prohibición:**

- No fume
- Prohibido el ingreso de personal no autorizado.
- Prohibido el uso de celular.

18. MAQUINARIA Y/O VOLQUETAS- VEHICULOS

Para la maquinaria y equipos que ingresaron a la obra, se efectuó la revisión por parte de área SST y área ambiental, cumpliendo con las condiciones mecánicas para garantizar una operación segura y adecuada. Se realizó registro pre operacional, así mismo se le solicito al propietario la documentación tanto de la maquinaria como del personal operativo encargado de la manipulación para la ejecución de las actividades programadas.
Para el caso de los operadores de la maquinaria o equipos se requirieron las planillas de seguridad social periódicamente y estas fueron remitidas en los correspondientes informes a la interventoría.

En cuanto a las volquetas que ingresaron se requirió a sus propietarios los soportes del SOAT y Revisión tecno-mecánica.

Así mismo se verificaron los Kit de carretera de los vehículos a cargo del contrato.

La maquinaria que ingreso al proyecto fue aprobada por la interventoría

19. CONCLUSIONES

Dentro de las actividades más relevantes de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Ocupacional en el **CONTRATO DE OBRA N° 1070-2022**, se realizaron las siguientes actividades:

- Se hizo entrega y reposición oportuna de dotación y elementos de protección personal a todo el personal de la empresa Consorcio Ingeniería I y de los subcontratistas que hicieron parte del proyecto.
- Se hizo seguimiento al uso de los EPP, mediante inspecciones a EPP y toma de correctivos como lo son memorandos, comparendos y llamados de atención, de acuerdo al incumplimiento realizado por el trabajador.
- Inspecciones diarias de verificación en la señalización y delimitación de las diferentes áreas de trabajo, con el objetivo de mantener los agentes de riesgo controlados, esta información se tuvo en cuenta en el momento de toma de medidas correctivas por parte del área de gestión SST, de tráfico, ambiental y del área técnica.
- A lo largo del proyecto se realizó una labor permanente y constante en cuanto a la señalización preventiva interna (señalización de excavaciones, materiales, pozos, sumideros), senderos peatonales, cerramiento perimetral, todo lo anterior enfocado a la prevención del riesgo para personal de la empresa Consorcio Ingeniería I y personas que hacen parte de la comunidad del sector donde se desarrolló el proyecto.
- Se dispuso durante el proyecto de campamentos para el personal de obra y estos a su vez estuvieron provistos de un kit de emergencia (camilla, botiquín de primeros auxilios y extintor) elementos a los que se hizo periódicamente inspección y mantenimiento de acuerdo a los requerimientos.
- Teniendo en cuenta los requerimientos contractuales del proyecto, se mantuvo a lo largo del mismo la identidad visual, como con la dotación del personal.
- Teniendo en cuenta la normatividad para el traslado de maquinaria, este procedimiento se realizó adecuadamente durante el proyecto, este se realizó en camabaja y contaba con el acompañamiento de auxiliares de

tráfico Y SST para el ingreso y salida de los diferentes territorios, con el fin de prevenir cualquier tipo de accidente.

- En el proyecto se contó con 72 trabajadores, incluida mano de obra no calificada, personal administrativo, profesionales, personal de subcontratistas, personal rotativo, de quienes se verifico el pago de seguridad social, se les realizo inducción general al cargo y examen médico ocupacional de ingreso y periódico.
- Durante la ejecución del proyecto se dispone del número de baños requerido por número de trabajadores en obra periodo a periodo, y de estos se supervisa el aseo realizado por las empresas contratadas como proveedores del servicio.
- Se dio cumplimiento a las actividades programadas y aprobadas en cronograma de actividades del área de gestión SST, por parte del residente encargado de esta área.
- La brigada integral de emergencias se conformó, capacitó y estuvo activa a lo largo de todo el proyecto, esta brigada recibió un programa completo de capacitación por parte del área, en temas de primeros auxilios, control del fugo y evacuación.

ANEXOS

1. DOCUMETNOS DE PERSONAL DE INGRESO.

2. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

3. PAZ Y SALVOS

4. ENTREGA E INSPECCIÓN DE DOTACIÓN

5. INSPECCIONES

6. INDUCCIONES Y CHARLAS

7. COPASST

8. REGISTROS FOTOGRAFICOS


9. INSPECCIONES DE BAÑOS

10. PERMISOS DE TRABAJO

11. DOCUMENTOS VEHICULOS

12. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

DOCUMENTOS PERSONAL DE INGRESO

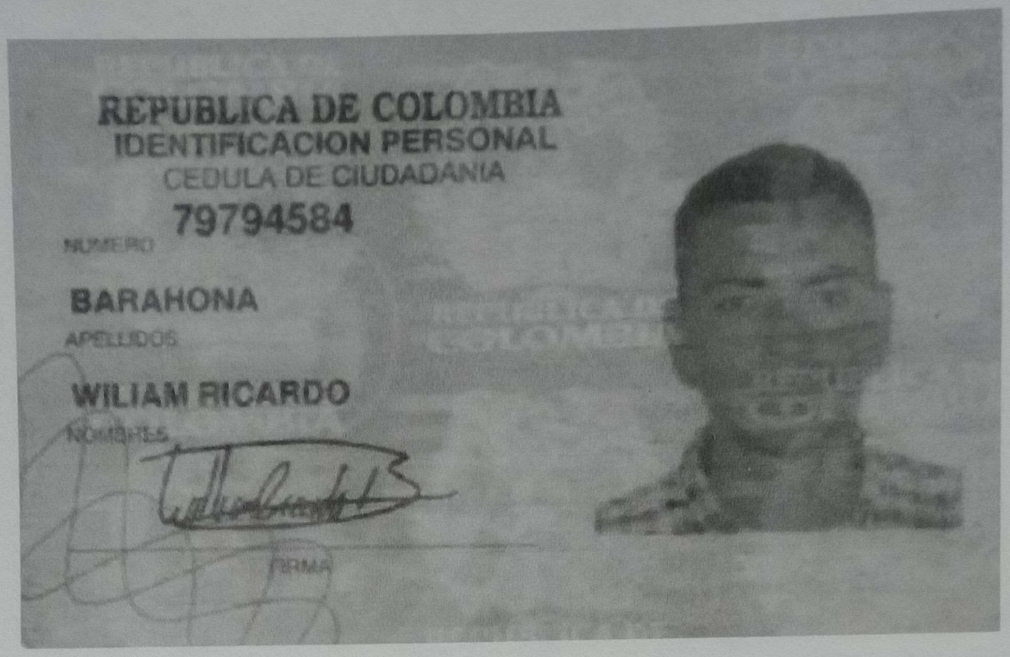



Dirección Cr 1C 162A 64
TL. 3123002050-
3178294930
EPS. famisanar
FPC. Porvenir
Esposa. Tatiana Perez
TL. 3204173939

capturada en moto g31
William barahona

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901401153
Número Afiliación:	419657
Razón social:	CONSTRUCCIONES AMBAR SAS

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	79794584
Nombre:	WILIAM RICARDO BARAHONA
Fecha Ingreso:	11/01/2024
Salario básico:	1,300,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	10/1/2024 10:37:55 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

9010708910

9010708910

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante
A. Afiliación [ ]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X]	A. Contributivo [X]	A. Cotizante [X]	A. Dependiente [X]
B. Reporte de Novedades [X]	• Beneficiario o afiliado adicional [ ]	B. Subsidiado [ ]	B. Cabeza de familia [ ]	B. Independiente [ ]
	B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]		C. Beneficiario [ ]	C. Pensionado [ ]

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: BARAHONA	Segundo Apellido:	Primer Nombre: WILIAM	

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	79794584	Femenino [ ] Masculino [X]	D 25 D M 0

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16
	Tipo F N M Condición T P			AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia	
$1.300.000	Dirección	Teléfono fijo

Correo electrónico	Municipio / Distrito	Zona Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad / Comuna

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) perm

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres		
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento	Dato 29. Parentesco
B1					D D M M A A A A	
B2					D D M M A A A A	
B3					D D M M A A A A	
B4					D D M M A A A A	
B5					D D M M A A A A	

	31. Discapacidad					32. Datos de residencia				
	Tipo			Condición			Zona			
	F	N	M	T	P	Municipio / Distrito	Urbana	Rural	Departamento	Teléfono
B1										
B2										
B3										
B4										
B5										

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS
C	
B	
B	
B	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTIT

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o p
CONSTRUCCIONES AMBAR SAS	NT	901401153	

39. Ubicación			
CRA 95 68 A 24 Dirección	4063033 Teléfono	Correo electrónico	BOGOTA Municipio / Dis

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de dato
inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [
de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliacione
entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Rég
16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

WILIAM RICARDO BARAHONA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **79.794.584**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 10 de Enero del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **BARAHONA WILIAM RICARDO, CC - 79794584**, está afiliado(a) desde **12/01/2024**, como trabajador(a) de **CONSTRUCCIONES AMBAR SAS**, con NIT: **9014011538.**

Estado civil: **Soltero**
Cónyuge/Compañero(a): **NO REPORTA**
Categoría: **A**
Fecha de Ingreso a la Empresa: **11/01/2024**

Grupo familiar conformado por:

NOMBRE	No. Identificación	Parentesco
NO EXISTE REGISTRO	-	-

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los **13 de enero de 2024** a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio

MEDIC EXPERT

Siempre Pensando en tú Salud y en la de los Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO. ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	**2024-01-11**	**EXAMEN:**	**INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA**		
NOMBRE DEL PACIENTE:		**BARAHONA WILIAM RICARDO**			
IDENTIFICACION:	**79794584**	**RH:**	**O+**	**EDAD:**	**46**
FECHA DE NACIMIENTO:	**1978-02-25**	**TELEFONO DE CONTACTO:**		**GENERO:**	**M**
					3123002050

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	**CONSTRUCCIONES AMBARA SAS**	**NIT:**	**901401153-8**
ESCOLARIDAD:	**BACHILLER**	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	**OFICIAL**

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Opiometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia [X] Triglicéridos [X] Colesterol [X] Otros: [X]

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar: NINGUNA

Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272: SI [X] NO [ ] N/A [ ]

Apto para laborar en Espacios Confinados: SI [X] NO [ ] N/A [ ]

Apto para el cargo SI [X] NO [ ] N/A [ ]

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO	FIRMA:	HUELLA
NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	NOMBRE: BARAHONA WILIAM RICARDO DOCUMENTO: 79794584	


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.123.566.945

HIGUERA BERNAL

APELLIDOS

JOSE DAVID

NOMBRES

Jose David Higuera B.

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 17-ENE-1998

FUENTE DE ORO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

26-ENE-2016 VISTA HERMOSA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-5208000-00799422 M-1123566945-20160309 0046884160A 1 46044411

Dirección = Carrera 3 # 166-08 Barrio Soratama

Cel = 3204505754

Eps = Nueva Eps

ARL = Porvenir

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901401153
Número Afiliación:	419657
Razón social:	CONSTRUCCIONES AMBAR SAS

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1123566945
Nombre:	JOSE DAVID HIGUERA BERNAL
Fecha Ingreso:	11/01/2024
Salario básico:	1,300,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	10/1/2024 10:04:49 PM

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

O.P. 280235 04/16

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

"Código Únicamente para dependientes y afiliaciones al Régimen Subsidiado"

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

FORMULARIO VÍA WEB

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [X]

2. TIPO DE AFILIACIÓN: A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [X] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]

3. RÉGIMEN: C. Contributivo [X] S. Subsidiado [ ]

4. TIPO DE AFILIADO: CO Cotizante [X] CF Cabeza de Familia [ ] BE Beneficiario [ ]

5. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

CÓDIGO:

FECHA DE LA SOLICITUD: DÍA MES AÑO

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
HIGUERA	BERNAL	JOSE	DAVID

7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: R.C. [ ] T.I. [X] C.C. [ ] C.E. [ ] P.A. [ ] C.D. [ ] S.C. [ ]

8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1123566945

9. SEXO: F [X] M [ ]

10. FECHA NACIMIENTO: DÍA 17 MES 01 AÑO 1998

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. ORIGEN ETNICO: Código [ ]

12. DISCAPACIDAD: Tipo F [ ] N [ ] M [ ] Condición T [ ] P [ ]

13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN:

14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL:

15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: COLPATRIA

16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES: PORVENIR

17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC: 1300000

18. UBICACIÓN O DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Carrera 3 # 166 -08

ZONA U. [ ] R. [ ]

LOCALIDAD / COMUNA:

BARRIO:

CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO FIJO	TELÉFONO MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	CÓDIGO IPS
BOGOTA	BOGOTA		3204505754	josehiguera@gmail.com	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos de identificación del beneficiario *(Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)*

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

20. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I. [ ] C.C. [ ] C.E. [ ] P.A. [ ] C.D. [ ]

21. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

22. SEXO: F [ ] M [ ]

23. FECHA NACIMIENTO: DÍA MES AÑO

CÓDIGO IPS:

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	26. NÚMERO DE IDENTIDAD	27. SEXO F	27. SEXO M	28. FECHA DE NACIMIENTO DÍA MES AÑO	29. PARENTESCO	30. ETNIA	31. DISCAPACIDAD Tipo	31. DISCAPACIDAD Condición
1		CN RC TI CC CE PA SC							F. N. M.	T. P.
2		CN RC TI CC CE PA SC							F. N. M.	T. P.
3		CN RC TI CC CE PA SC							F. N. M.	T. P.
4		CN RC TI CC CE PA SC							F. N. M.	T. P.

	32. DATOS DE RESIDENCIA Ciudad / Mpio.	Departamento	Zona	Teléfono Fijo	Teléfono Móvil	33. VALOR UPC AFILIADO ADICIONAL (Lo diligencia la EPS)	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud (IPS)	NIVEL DE SISBÉN	GRUPO POBLACIONAL
1			R. U.					I. II.	
2			R. U.					I. II.	
3			R. U.					I. II.	
4			R. U.					I. II.	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o Razón Social: CONSTRUCCIONES AMBAR S.A.S

36. Tipo documento de identidad: C.C. [ ] C.E. [ ] P.A. [ ] C.D. [ ] N.I. [X]

37. Número documento de identidad: 901401153

DV:

38. Tipo de aportante o pagador de pensiones:

39. DIRECCIÓN: CL 116 15 36

MUNICIPIO: BOGOTA

DEPARTAMENTO: BOGOTA

TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MÓVIL: 3017844934

CORREO ELECTRÓNICO: jdgomezc94@gmail.com

FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL: DÍA 11 MES 01 AÑO 2024

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

SALARIO: 1300000

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. TIPO DE NOVEDAD

1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD [ ]
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS [ ]
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS [ ] Código [ ]
6. REINSCRIPCIÓN EN LA EPS [ ]
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [ ]
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO [ ]
11. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
12. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
13. MOVILIDAD [ ]
14. TRASLADO [ ]
15. [ ]
16. [ ]
17. [ ]
18. [ ]

nueva eps
RECIBIDO PARA ESTUDIO EN LA EPS
NOMBRE:
CLAVE ASESOR:
FECHA:

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: R.C. [ ] T.I. [ ] C.C. [ ] C.E. [ ] P.A. [ ] C.D. [ ] S.C. [ ]

NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

SEXO: F [ ] M [ ]

FECHA NACIMIENTO: DÍA MES AÑO

42. FECHA (a partir de): DÍA MES AÑO

43. EPS ANTERIOR Código:

44. MOTIVO DE TRASLADO Código:

45. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES:

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaración Juramentada de convivencia: Declaro que convivo con el(la) Señor(a) _____ Identificado(a) con _____ No. _____ desde el día _____ del mes _____ del año _____ [ ]

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mí. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad
49. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

54. Firma de cotizante, cabeza de familia o beneficiario: JOSE HIGUERA

55. Firma y sello del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio: MARTHA ESPITIA

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
Cantidad: Total

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio [ ] Código del departamento [ ]

67. Datos del SISBÉN: Número de ficha [ ] Puntaje [ ] Nivel [ ]

68. Fecha de radicación: DÍA MES AÑO

69. Fecha de validación: DÍA MES AÑO

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad [ ] Número del documento de identidad

71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

VIGILADO SUPERSALUD

6007000 ENERO / 2016

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

01-01-F-009

- 2a. COPIA: AFILIADO -

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JOSE DAVID HIGUERA BERNAL, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.123.566.945**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 10 de Enero del 2024.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

CERTIFICACIÓN

La Caja de Compensación Familiar Cafam certifica que el (la) señor(a) **HIGUERA BERNAL JOSE DAVID, CC - 1123566945**, está afiliado(a) desde **12/01/2024**, como trabajador(a) de **CONSTRUCCIONES AMBAR SAS**, con NIT: **9014011538**.

Estado civil: **Soltero**
Cónyuge/Compañero(a): **NO REPORTA**
Categoría: **A**
Fecha de Ingreso a la Empresa: **11/01/2024**

Grupo familiar conformado por:

NOMBRE	No. Identificación	Parentesco
NO EXISTE REGISTRO	-	-

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los **13 de enero de 2024** a solicitud del interesado

Cordialmente,

Luz Marina Teuta Ríos
Jefe Departamento Subsidio

MEDIC EXPERT

Siempre Pensado en tú Salud y en la de los Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	**2024-01-11**	**EXAMEN:**	**INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA**		
NOMBRE DEL PACIENTE:	**HIGUERA BERNAL JOSE DAVID**				
IDENTIFICACION:	**1123566945**	**RH:**	**O+**	**EDAD:**	**26**
FECHA DE NACIMIENTO:	**1998-01-17**	**TELEFONO DE CONTACTO:**	**3204505754**		

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	**CONSTRUCCIONES AMBARA SAS**	**NIT:**	**901401153-8**
ESCOLARIDAD:	**PRIMARIA**	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	**OFICIAL**

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia [X] Triglicéridos [X] Colesterol [X] Otros: [X]

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar: NINGUNA

Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272: SI [X] NO [ ] N/A [ ]

Apto para laborar en Espacios Confinados: SI [X] NO [ ] N/A [ ]

Apto para el cargo SI [X] NO [ ] N/A [ ]

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO Dra. Gloria L. Vega Médico Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	FIRMA: Jose David Higuera B. NOMBRE: HIGUERA BERNAL JOSE DAVID DOCUMENTO: 1123566945	HUELLA
