República de Colombia – Departamento de Boyacá
Municipio de Otanche
PROCESO: CONTRATACION
NIT 891.801.362-1

CODIGO: SG210-03	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA	11/03/2024	VERSION: 1

CIUDAD Y FECHA	25 DE JUNIO DEL 2025						
CONTRATISTA:	DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES			C.C. O NIT:	1014215841 DE BOGOTÁ D.C.		
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES						
RÉGIMEN DEL IMPUESTO DE VENTAS	RESP. IVA		SIMPLIFICADO		TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA	
N° CONTRATO: MC-017-2025	AÑO CONTRATO:	2025	VIGENCIA DESDE:	21 de marzo de 2025	HASTA:	25 de junio de 2025	
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ – 2025.						
	DESDE	21 DE MARZO 2025	HASTA	25 DE JUNIO DEL 2025	PAGO No.	PAGO 1	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ						

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 37.245.610,00	
(+) Valor adiciones	$ 18.622.805,00	
(=) Valor total contrato	**$ 55.868.415,00**	
(-) Anticipo		
(-) Valor Pagos Realizados		$ -
(-)Valor a pagar		**$ 55.868.415,00**
(-) Valor pendiente de ejecución		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 55.868.415,00**	**$ 55.868.415,00**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ($ 55.868.415,00).

República de Colombia – Departamento de Boyacá
Municipio de Otanche
PROCESO: CONTRATACIÓN
NIT: 891.801.362-1

CODIGO: SG210-03	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA	11/03/2024	VERSION: 1

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados, en ningun caso puede ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente.. (**)Todos los empleadores, persona natural o jurídica, público o privado que empleen uno o más trabajadores permanentes, están obligados a pagar aportes parafiscales a la Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF. (***) Sujetos pasivos del impuesto para la equidad CREE

NUMERO PLANILLA DE APORTES		79398720	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):	$	157.500,00	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	$	201.600,00	APORTES ARL (*):	$	87.700,00
VALOR APORTES SENA(**)	$ -	VALOR APORTES ICBF (**)	$ -	VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)	$ -	AUTORRETENEDOR CREE (***)	$ -				
NUMERO PLANILLA DE APORTES		79398532	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):	$	225.000,00	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	$	125.300,00	APORTES ARL (*):	$	125.300,00
VALOR APORTES SENA(**)	$ -	VALOR APORTES ICBF (**)	$ -	VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)	$ -	AUTORRETENEDOR CREE (***)	$ -				
NUMERO PLANILLA DE APORTES		79398454	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):	$	225.000,00	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	$	288.000,00	APORTES ARL (*):	$	125.300,00
VALOR APORTES SENA(**)	$ -	VALOR APORTES ICBF (**)	$ -	VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)	$ -	AUTORRETENEDOR CREE (***)	$ -				
NUMERO PLANILLA DE APORTES		79398187	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):	$	82.500,00	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	$	105.600,00	APORTES ARL (*):	$	45.000,00
VALOR APORTES SENA(**)	$ -	VALOR APORTES ICBF (**)	$ -	VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)	$ -	AUTORRETENEDOR CREE (***)	$ -				

ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES	SI	X	NO		TOTAL ANEXOS	No. FOLIOS		CD	100%

NOTA: LOS ANEXOS MENCIONADOS REPOSAN EN LA CARPETA CONTRACTUAL, EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO.

En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, artículo 4, parágrafo 1.

FIRMA DEL CONTRATISTA
Ing. DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato de Interventoría No. MC-017-2025 arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas segun las evidencias verificadas, para el periodo del informe.

ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ	**ASTRID KARINA HERNANDEZ PAEZ**
SUPERVISOR	**ALCALDESA MUNICIPAL**

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MC-017-2025

CONTRATO	:	**MC-017-2025**
CONTRATANTE	:	**MUNICIPIO DE OTANCHE** NIT. 891801362-1
CONTRATISTA	:	DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES
NIT/CC	:	C.C. 1.014.215.941 DE BOGOTÁ D.C.
OBJETO	:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ – 2025".
VALOR INICIAL	:	TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($37.245.610.00) M/TCE.
VALOR A ADICIONAR	:	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS ($18.622.805.00) M/TCE.
VALOR TOTAL CON ADICION	:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ($55.868.415,00) M/TCE.
VALOR ACTAS ANTERIORES	:	($ 0,00)
VALOR PRESENTE ACTA	:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ($55.868.415,00) M/TCE.
VALOR POR EJECUTAR	:	($ 0,00)
SUPERVISOR	:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
FECHA DE INICIACIÓN	:	21 DE MARZO DEL 2025
DURACION INICIAL	:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	:	20 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	:	N/A
FECHA DE REINICIO No. 1	:	N/A
PRORROGA No. 1	:	UN (01) MES
OTRO SI No. 1	:	15 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	:	20 DE JUNIO DEL 2025
FECHA PRESENTE ACTA	:	23 DE JUNIO DEL 2025

Durante el desarrollo de las actividades se evidencio la ejecución de actividades iniciales del contrato inicial, esto, bajo la supervisión del contrato, verificación y aprobación de las actividades que fueron suscitas inicialmente.

De acuerdo con la presente acta de inicio del 21 de marzo del 2025, realizándose prorroga No. 001 de tiempo por un término de Un (01) mes de su terminación inicial, quedando así, como fecha de terminación final el día veinte (20) de junio del presente año, como consecuencia de la temporada de lluvias y dificultad en traslado de materiales teniendo en cuenta sus dimensiones e ida de la bancada al ingreso del polideportivo Villa Olímpica.

El día veinticinco (25) de junio del 2025, se realiza el Acta de Recibo Final.

POLIZAS RECIBO FINAL

GARANTÍAS OTORGADAS				
Número de Póliza	**39-44-101170961**			
TIPO DE AMPARO	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	20	$ 11.173.683,00	21/03/2025	25/10/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	20	$ 11.173.683,00	21/03/2025	25/06/2030
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20	$ 2.793.420,75	21/03/2025	25/06/2028

LOCALIZACIÓN

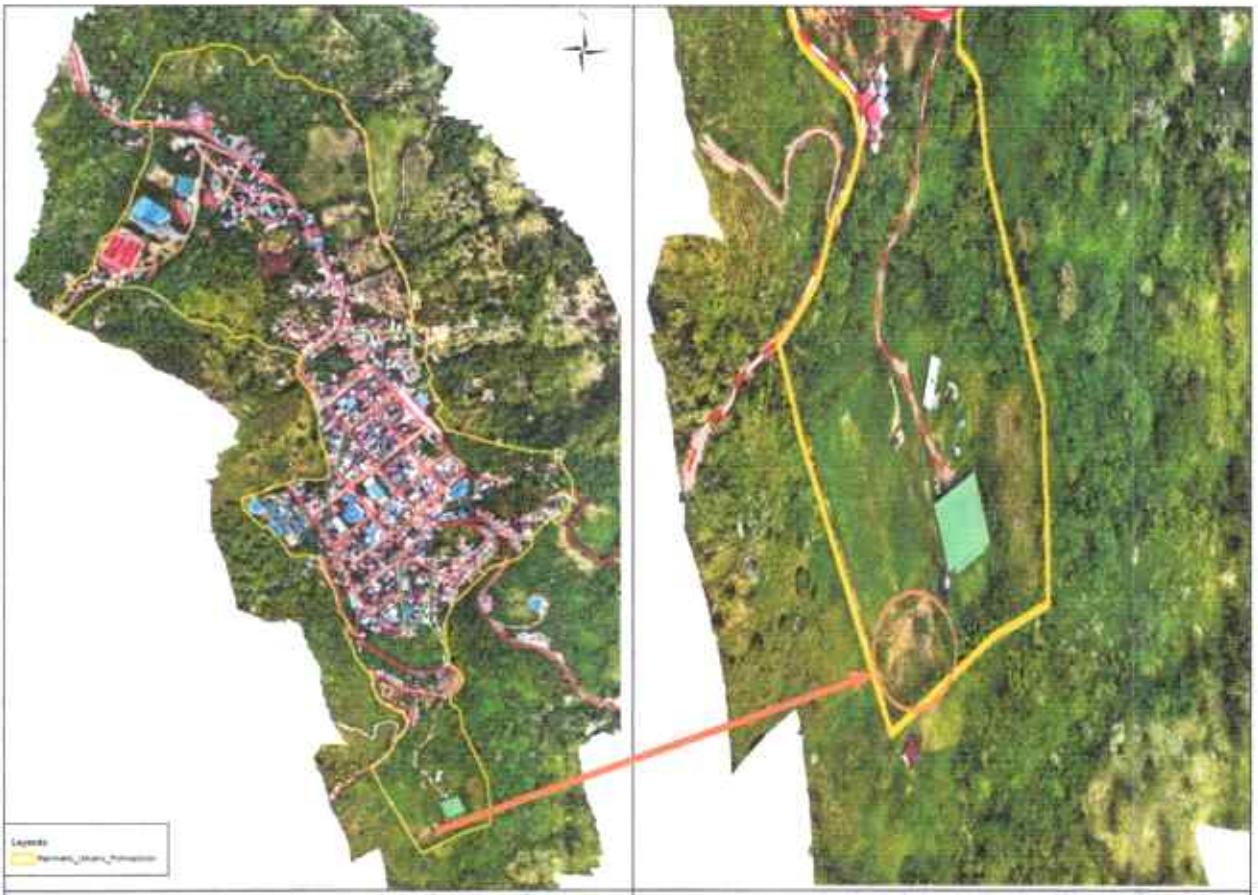


Imagen No. 1. Casco Urbano Municipio de Otanche – Boyacá.

Imagen No. 2. Localización Cubierta Equina Municipio de Otanche – Boyacá.

BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MC-017-2025

El día 15 de mayo del 2025, se realiza el adicional equivalente al **50,00%** restante, acta por un valor de **DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS ($18.622.805,00) M/CTE,** como se estableció en la forma de pago del contrato de Interventoría No. **MC-017-2025**, **CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.**

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	($ 37.245.610.00)	
(+) Valor Adición	($ 18.622.805.00)	
(=) Valor total contrato	**($ 55.868.415.00)**	
(-) Anticipo		
(-) Valor actas parciales		($)
(-) Valor a pagar presente acta		**($55.868.415.00)**
(-) Valor pendiente de ejecución		($ 0,00)
SUMAS IGUALES	**($55.868.415.00)**	**($55.868.415.00)**

SE REALIZA UN PAGO TOTAL POR EL VALOR DE: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ($ 55.868.415,00) M/TCE.


Se anexa registro fotográfico de las actividades realizadas.







ANEXOS

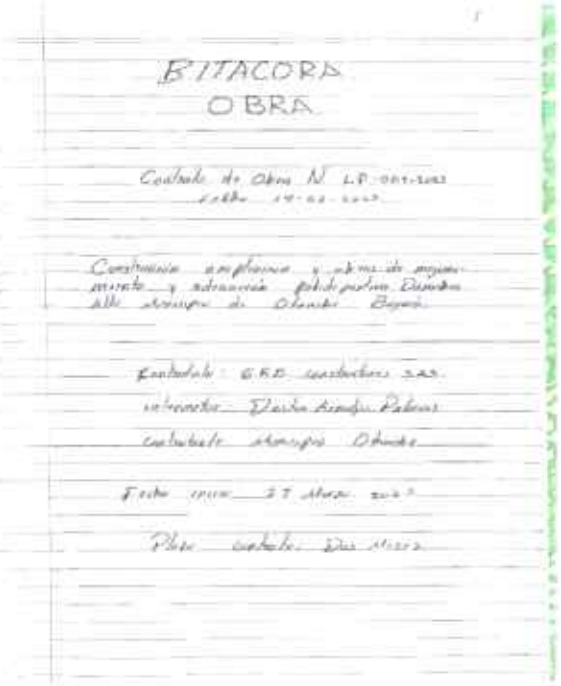

BITACORA
OBRA

Contrato de Obra N° L.P. 001-2023
Fecha 14-02-2023

Construcción ampliación y adecuación mejoramiento y adecuación polideportivo Divino Niño del municipio de Otanche Boyacá.

Contratista: G.R.D. constructores S.A.S.
Interventor: Diego Ricardo Palacios
Contratante: Municipio Otanche

Fecha inicio 27 Marzo 2023
Plazo contrato Dos (2) meses

BITACORA DE ACTIVIDADES DIARIAS



INFORME MENSUAL 1

No CONTRATO: MC-027-2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ – 2023."

SUPERVISOR:
ING. ANDRY FABIAN JIMENEZ
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA

INTERVENTORIA:
ING. DIDIER ARNULFO PALACIOS CORTES

MUNICIPIO DE OTANCHE (BOYACA)
ABRIL 2023

Informes de actividades

Ing. DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES

Otanche, 23 de junio del 2025

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente, la interventoría ejercida por parte del Ing. **DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES** identificado con C.C. 1.014.215.941 de Bogotá, con contrato **No. MC-017-2025** que tiene por objeto **"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION AMPLIACION Y OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES POLIDEPORTIVO DANUBIO ALTO MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA-2025"** declara y certifica que el Contrato **LP-001-2025** que tiene por objeto **"CONSTRUCCION AMPLIACION Y OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES POLIDEPORTIVO DANUBIO ALTO MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA"** ha sido revisada detalladamente en todos sus aspectos técnico, administrativo y financiero y se encuentra en conformidad, dando cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el objeto del contrato de obra.

Detalles y aspectos revisados:

1. **Aspecto técnico:** Se ha verificado que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativas vigentes establecidas en el contrato de Obra Pública **No. LP-001-2025** se ha constatado la calidad de los materiales utilizados, así como la correcta ejecución de la obra.
2. **Aspecto administrativo:** Se ha revisado la documentación relacionada con el desarrollo de las actividades, incluyendo contratos, actas de inicio, estado inicial y final de las pólizas de cumplimiento y fin de obra, certificaciones de avance y balance de cantidades finales para la suscripción del acta de recibo, entre otros documentos verificando su integridad y correcta validez.
3. **Aspecto financiero:** se han revisado los estados financieros y contables relacionados con la obra, constando que los pagos han sido realizados de acuerdo con lo establecido en el contrato, y que no existen saldos pendientes por parte del contratante a trabajadores o proveedores de bienes y servicios.

En cuanto a la actualización final de la póliza de cumplimiento, se ha realizado la verificación siendo aprobada bajo las condiciones establecidas en el contrato de obra pública **No. LP-001-2025** celebrado durante la vigencia 2025.

En virtud de lo anterior, Interventoría procede a otorgar el **PAZ Y SALVO** y certifica que se da el cumplimiento en su totalidad de las obligaciones contractuales técnicas, administrativas y financieras a favor del contratista **GBR CONSTRUCTORES.**

Ing. DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES

Paz y Salvo Interventoría contrato de Obra No. LP-001-2025

ANDRY FABIAN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyectó: Ing. Adrián Garzón.
Revisó: Fabián Jiménez.
Archivado: Contrato de Obra No. LP-001-2025

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE - BOYACA

C E R T I F I C A:

Que, **Ing. DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES** identificada con C.C. 1.014.215.941 expedida en Bogotá D.C, cumplió con el objeto del contrato de interventoria No. **MC-017-2025**, el cual tiene como objetivo principal: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, BOYACÁ – 2025**. periodo correspondiente del 21 de marzo del 2025 al 23 de junio del 2025, de acuerdo a las especificaciones descritas en el contrato:

CONTRATO No:	**MC-017-2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	($ 37.245.610.00)
OTRO SI	($ 18.622.805.00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**($ 55.868.415.00)**
VALOR ACTAS PARCIALES	($ 0,00)
VALOR PRESENTE ACTA	**($ 55.868.415.00)**
VALOR PENDIENTE POR EJECUCION	($ 0,00)

Que, el **Ing. DOSTIN ARNULFO PALACIOS CORTES** identificada con C.C. 1.014.215.941 expedida en Bogotá D.C, ha cumplido con el pago de seguridad social.

Para constancia se firma a los veintitrés (23) día del mes de junio del 2025, para los fines pertinentes.

23/06/2025

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyectó: Ing. Wilson Parra.
Revisó: Fabián Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MC-017-2025.
