ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

ECOVIAS SAS



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°29

01 - 30 DE JUNIO- DE 2025

Versión 01
Bogotá, D.C. 15 julio de 2025

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		N°. DE COPIAS
Copia N°.1	Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	1 (Original)
Copia N°.2	Biblioteca del Proyecto	1 (Copia)

CONTROL DE VERSIONES

ÍNDICE VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	FOLIOS

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN




TITULO DOCUMENTO:		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 29		
PERIODO:		**1 al 30 de junio de 2025**		
NUMERO DE REVISIÓN			1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN	Nombre:	José Luis Usuga Gómez		
	Firma:			
	Fecha:	15/07/2025		
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Ermy A. Hurtado R.		
	Firma:			
	Fecha:	15/07/2025		
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
				
	Fecha:	15/07/2025		

TABLA CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 10

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 13

2.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 13
2.1.1 Descripción / alcance y meta física inicial 13
2.1.2 Descripción / Alcance y meta física actualizada 15
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 16
2.2.1 Localización de las obras 16
2.2.2 Localización del campamento y/o oficinas 21
2.3 ANTECEDENTES 22
2.4 ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS 23
2.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 24

3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 28

4 CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95 29

4.1 GENERALIDADES 29
4.1.1 Datos del contrato 478 del 10/02/2022. 29
4.1.2 Pólizas o garantías del contrato de obra. 30
4.1.3 Otrosí, Adición y Prórroga 33
4.1.4 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra 34
4.1.5 Actas De Modificaciones De Cantidades De Obras 36
4.1.6 ítems o precios no previstos 36
4.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO 37
4.2.1 Etapa de Pre-construcción 37
4.2.2 Etapa de construcción 37
4.2.3 Valores ejecutados 39
4.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 45
4.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA 45
4.4.1 Control de personal de obra 45
4.4.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra 46
4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 46
4.5.1 Informe financiero y presupuestal 46
4.5.2 Forma de pago del contrato 47
4.5.3 Actas de recibo parcial de obra 47
4.6 ANTICIPO DE OBRA 48
4.6.1 Datos generales del anticipo de obra 48
4.6.2 Órdenes de pago o de giro 48
4.6.3 Plan de inversión del anticipo vs inversión del anticipo 51
4.6.4 Reintegro de rendimientos financieros 51
4.6.5 Amortización del anticipo 52
4.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 52
4.8 FUENTE DE MATERIALES 52
4.9 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO 53
4.10 SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO 53
4.11 PROGRAMA DE OBRA Y DE INVERSIONES 53
4.12 ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y DE INVERSIONES 54
4.13 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA 54
4.13.1 Actas de comité de obra o actas de reunión 54
4.13.2 Bitácora de obra 55
4.14 GESTIÓN AMBIENTAL 55
4.15 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST) 55
4.16 GESTIÓN SOCIAL 55
4.17 ESTADO DEL CONTRATO 55

5 CONTRATO DE OBRA Nº. 479 DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL. 56

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 56
5.1.1 Datos del contrato 479 del 10/02/2022. 56
5.1.2 Pólizas o garantías del contrato de obra 57
5.1.3 Otrosí, Adición y prórroga 59
5.1.4 Suspensiones y reinicios al contrato de obra 60
5.1.5 Actas de Modificaciones de Cantidades de obra 62
5.1.6 Ítems o precios no previstos 63
5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO Y ACUMULADAS 64
5.2.1 Etapa de Preconstrucción 64
5.2.2 Etapa de construcción 64
5.2.3 Valores ejecutados 69
5.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 76
5.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA 76
5.4.1 Control de personal de obra 76
5.4.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra 77
5.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 77
5.5.1 Informe financiero y presupuestal 77
5.5.2 Forma de pago del contrato 78
5.5.3 Actas de recibo parcial de obra 78
5.6 ANTICIPO DE OBRA 79
5.6.1 Datos generales del anticipo de obra 79
5.6.2 Órdenes de pago o de giro 80
5.6.3 Plan de inversión anticipo vs inversión del anticipo 83
5.6.4 Reintegro de rendimientos financieros 84
5.6.5 Amortización del anticipo 85
5.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 85
5.8 FUENTE DE MATERIALES 85
5.9 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO 86
5.10 SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO 87
5.11 PROGRAMA DE OBRA Y DE INVERSIONES 87
5.12 ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y DE INVERSIONES 87
5.13 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA 88
5.13.1 Actas de comité de obra o actas de reunión 88
5.13.2 Bitácora de obra 89
5.14 GESTIÓN AMBIENTAL 89
5.15 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST) 89
5.16 GESTIÓN SOCIAL 89
5.17 ESTADO DEL CONTRATO 89

6 CONTRATO DE SERVICIOS - 480 DEL 22/02/2022 SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S. 90

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 90
6.1.1 Datos del contrato 480 del 22/02/2022. 90
6.1.2 Pólizas o garantías contrato de servicios 91
6.2 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 92
6.2.1 Otrosí, Adición y Prórroga 92
6.2.2 Suspensión y Reinicio al Contrato de servicios 92
6.2.3 Ítems o Precios No Previstos 92
6.3 CONTROL DE EQUIPOS 92
6.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA 92
6.4.1 Personal contratista 92
6.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 92
6.5.1 Forma de pago del contrato 92
6.5.2 Actas parciales 93
6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA 93

6.6.1 Reuniones realizadas 93
6.7 REVISIÓN DOCUMENTACIÓN INICIAL 93
6.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS 93
6.9 GESTIÓN AMBIENTAL 94
6.10 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST) 94
6.11 GESTIÓN SOCIAL 94
6.12 ANOTACIONES DE LA INTERVENTORÍA 94
6.13 ESTADO DEL CONTRATO 97

7 PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ). 98

7.1 INFORMACIÓN GENERAL 98
7.1.1 DATOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ) 98
7.2 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 98
7.2.1 Etapa de Preconstrucción 98
7.2.2 Etapa de construcción 99
7.2.3 Valores ejecutados 101
7.2.4 Maquinaria y equipo de obra 103
7.2.5 Personal y control de aportes 105
7.3 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 105
7.4 FUENTE DE MTERIALES 107
7.5 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO 107
7.5.2 Estado de avance de obra 107
7.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA 110
7.6.1 Actas de comité de obra o actas de reunión 110
7.6.2 Bitácora de obra 111
7.7 GESTIÓN AMBIENTAL 112
7.8 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST) 112
7.9 GESTIÓN SOCIAL 113
7.10 ESTADO DEL PROYECTO 114

8 CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022 114

8.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 114
8.1.1 Datos del contrato de interventoría 114
8.2 PÓLIZAS O GARANTÍA CONTRATO INTERVENTORÍA 115
8.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 118
8.3.1 Otrosíes. Adiciones y Prórrogas 118
8.3.2 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoría 119
8.3.3 Actas modificativas al contrato de interventoría 119
8.4 SEGUIMIENTO REALIZADO POR INTERVENTORÍA 120
8.5 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 120
8.5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 120
8.6 CONTROL DE CORRESPONDENCIA 124
8.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO 132
8.8 EQUIPO Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA 132
8.8.1 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA 133
8.9 PERSONAL INTERVENTORÍA 133
8.10 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA. 135
8.10.1 Forma de pago del contrato. 135
8.10.2 Actas de costos / Recibos parcial de Interventoría 135
8.11 OTROS COMPONENTES 137
8.11.1 Gestión ambiental 137
8.11.2 Salud ocupacional y seguridad en el trabajo (SST) 138
8.11.3 Gestión social 139

8.11.4 Estado del contrato 139

9 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA 140

10 CONCLUSIONES 141

11 RECOMENDACIONES 143

12 ANEXOS 144

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 CIV Del Proyecto 13
Tabla 2 Alcance Del Proyecto 15
Tabla 3 Vereda de la Cuenca del Rio Sumapaz 15
Tabla 4 Vereda de la Cuenca del Rio Blanco 15
Tabla 5 Localización De Los Tramos 20
Tabla 6 Estado Inicial De Las Vías De La Localidad De Sumapaz 23
Tabla 7 Ficha técnica del proyecto 24
Tabla 8 Estado De Los Contratos 28
Tabla 9 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor CTO 478 29
Tabla 10 Datos Póliza 30
Tabla 11 Pólizas actualizadas a la fecha. 33
Tabla 12 Otrosí y Adición - Contrato de Obra 478 33
Tabla 13 Suspensiones y Reinicios Contrato de Obra 478 34
Tabla 14 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obra contrato 478 36
Tabla 15 Ítems No previstos contrato 478 36
Tabla 16 Actividades de Construcción contrato 478 37
Tabla 17 Valores Ejecutados Contrato 478 39
Tabla 18 Maquinaria y Equipo Contrato 478 45
Tabla 19 Control Personal en Obra Contrato 478 45
Tabla 20 Vigencias del Contrato 47
Tabla 21 Actas de Recibo Parcial de Obras 47
Tabla 22 Generales del Anticipo de Obra 48
Tabla 23 Órdenes de Pago o de Giro 49
Tabla 24 Plan de Inversión del Anticipo VS Inversión Anticipo 51
Tabla 25 Rendimientos financieros Anticipo de Obra 51
Tabla 26 Amortización Anticipo Contrato de Obra 478 52
Tabla 27 Avance del Contrato 478 54
Tabla 28 Actas de Comité de Obra y Reuniones 54
Tabla 29 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor CTO 479 56
Tabla 30 Datos de las Pólizas Contrato 479 57
Tabla 31 Pólizas Actualizadas a la Fecha Contrato 479 58
Tabla 32 Otrosíes y Adiciones Contrato de Obra 479 59
Tabla 33 Suspensiones y Reinicios Contrato de Obra 479 60
Tabla 34 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obra 62
Tabla 35 Ítem o Precios No Previstos 63
Tabla 36 Documentación Organizativa Inicial 64
Tabla 37 Actividades de Construcción Contrato 479 64
Tabla 38 Valores Ejecutados Contrato 479 70
Tabla 39 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 479 76

Tabla 40 Control de Personal de Obra 76
Tabla 41 Vigencias del Contrato de Obra 78
Tabla 42 Actas de Recibo Parcial de Obras 78
Tabla 43 Datos Generales del Anticipo 79
Tabla 44 Órdenes de Pago o Giro 80
Tabla 45 Plan de Inversión del Anticipo VS Inversión Anticipo 83
Tabla 46 Rendimientos Financieros Anticipo de Obra 84
Tabla 47 Amortización Anticipo Contrato de Obra 85
Tabla 48 Fuente materiales CEV 85
Tabla 49 Avance del Contrato 479 87
Tabla 50 Actas de Comité de Obra 88
Tabla 51 Contrato de Prestación de Servicios - SOLGEO S.A.S 90
Tabla 52 Datos de las Pólizas Contrato 480 91
Tabla 53 Pólizas Actualizadas del Contrato 91
Tabla 54 Relación de Actas Pagadas 93
Tabla 55 Actas de Comité de Obra y Reuniones 93
Tabla 56 Entrega de Productos Contrato de Servicios 480 94
Tabla 57 Suscripción, Legalización, Plazo Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá 98
Tabla 58 Actividades ejecutadas. 99
Tabla 59 Valores ejecutados 101
Tabla 60 Maquinaria y Equipo UAERMV 103
Tabla 61 Tabla Relación de lluvias 105
Tabla 62 Cantidades ejecutados en el periodo 109
Tabla 63 Actas de Comité de Obra 110
Tabla 64 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor 114
Tabla 65 Datos pólizas contrato interventoría 115
Tabla 66 Pólizas del contrato de interventoría 117
Tabla 67 Otrosíes, Adiciones y Prórrogas Contrato 161 - Interventoría 118
Tabla 68 Suspensiones y Reinicios al Contrato 161 - Interventoría. 119
Tabla 69 Actas de Modificaciones Costos de Interventoría 119
Tabla 71 Correspondencia enviada a contrato 478 125
Tabla 72 Correspondencia enviada a Contrato 479 125
Tabla 73 Correspondencia enviada a UAERMV 126
Tabla 74 Correspondencia enviada a FDRS 127
Tabla 75 Correspondencia recibida Contrato 478 128
Tabla 76 Correspondencia recibida Contrato 479 128
Tabla 77 Correspondencia recibida UAERMV 129
Tabla 78 Correspondencia recibida FDRS 131
Tabla 79 Certificados calibración Topografía 133
Tabla 80 Personal Contrato 161 ECOVIAS S.A.S - Interventoría 133
Tabla 81 Plan de cargas Interventoría 134
Tabla 82 Relación Actas parciales Contrato 161- Interventoría 136

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización general del proyecto (Localidad de Sumapaz) 17
Ilustración 2 Localización del proyecto 17
Ilustración 3 Localización CIV – 20036004, 20076282, 20036002, 20036005, 20076283 y 20036001 Las Animas (Cuenca Río Blanco – UPR4) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022 18
Ilustración 4 Localización CIV – 20076251, 20042003, 20042001, 20076258, 20042002, 20076254, 20076256, 20076255, 20076257, 20076259, 20076253, 20076252, 20076250 y 20042004 El Toldo – San Antonio (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022 18
Ilustración 5 Ilustración 5 Localización CIV – 20047005, 20047001, 20047002 y 20076233 Santo Domingo – Capitolio (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022 19
Ilustración 6 Localización CIV – 20025003, 20023004, 20023002, 20023003, 20076242, 20025001, 20025002 y 20023001 Tunal Bajo – Tunal Alto (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022 19
Ilustración 7 Ubicación Oficina – Campamento Consorcio Gaviones 95 21
Ilustración 8 Ubicación Oficina – Campamento Consorcio Estabilización Vial . 22
Ilustración 9 Ubicación Oficina - Campamento UAERMV 22

ANEXOS

ANEXO Nº. 01 DOCUMENTACIÓN CONTRATO 478 DEL 10/02/2022
1.A BITÁCORA PERIODO

ANEXO Nº. 02 DOCUMENTACIÓN CONTRATO 479 DEL 10/02/2022
2.A PRÓRROGA N°3 CONTRATO DE OBRA
2.B BITÁCORA DEL PERIODO

ANEXO N°. 03 DOCUMENTACIÓN ENTIDAD EJECUTORA UAERMV
3.A BITÁCORA DE OBRA DEL PERIODO.

ANEXO Nº. 04 DOCUMENTACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022
4.A CERTIFICADOS CALIBRACIÓN EQUIPOS TOPOGRAFÍA
4.B INFORME COMPONENTE AMBIENTAL
4.C INFORME COMPONENTE SST
4.D INFORME GESTIÓN SOCIAL
4.E INFORMES SEMANALES

1 INTRODUCCIÓN

La localidad de Sumapaz tiene una red vial rural en regulares condiciones con superficie de afirmado en igual estado, sus anchos viales varían entre los 4,50 metros más hasta 7 metros más en promedio y con mínimas obras de arte, por lo cual es pertinente adelantar intervenciones a nivel de mantenimiento vial, con lo cual se pretende mejorar las condiciones de transporte de productos agrícolas generados en la región, transporte de comunidad en general y una fácil accesibilidad escolar.

En septiembre del 2019, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), presento la formulación para la implementación del proyecto de mejoramiento de vías terciarias en la localidad del Sumapaz, Bogotá D.C. con la intervención aproximadamente de 33.08 kilómetros de vía, con el propósito de solucionar la ineficiencia en la conectividad vial rural de Bogotá D.C. hacia el sector urbano y los municipios aledaños, la cual dificulta la intercomunicación terrestre de los habitantes rurales y con ello, aportar de manera significativa al desarrollo de las áreas rurales y a la mejora de la calidad de vida de la población de la ruralidad del Distrito Capital y en consecuencia de sus municipios colindantes. Teniendo en cuenta lo descrito en la ficha técnica de MGA del 29 de diciembre de 2019 según el código del proyecto BPIN 2018000050020, se tiene proyectado una población beneficiada de 8.281.030 personas.

Mediante este informe, se ofrece al lector un contexto más amplio en el desarrollo de las actividades NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL DE SUMAPAZ, desde el punto de vista técnico, administrativo, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo - SST de los sectores Animas Bajas, Capitolio, Laguna Verde, San Antonio y Tunales de la localidad de Sumapaz durante el periodo comprendido del **1 al 30 de junio de 2025**, con el fin del cumplimiento del Plan de Desarrollo Local "Sumapaz en paz, más productiva y ambiental para todos" 2017- 2020.

A fin de ejecutar las actividades de interventoría, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz convocó el Concurso de Méritos Ni FDRS-CMA-182-2021, cuyo objeto es la REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR., mediante la Resolución Nº 008 del 04 de febrero de 2022.

Este proceso de Concurso de Méritos le fue adjudicado a **ECOVÍAS S.A.S**, mediante la Resolución NI. 008 del 04 de febrero de 2022 por un valor inicial del contrato de $3.104.380.144,00**,** en un plazo inicialmente establecido de quince (15) meses.

La entidad contratante frente a las necesidades de la región por mejorar las vías de acceso, adelanto el proceso de licitación púbica Nº LP-006-2021 con el fin de contratar lo que se requiere para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" y la ejecución de las obras viales por parte de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para el proyecto del Sistema General de Regalías – SGR identificado con código BPIN 2018000050020, El cual va a ser ejecutado por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV, mediante un modelo de ejecución mixta, que contempla dos procesos de obra independientes, los cuales se describen a continuación:

Obras hidráulicas (Subdrenes, Berma-cunetas, box culvert) y muros en gavión los cuales se ejecutarán mediante el contrato que surja de la Licitación pública Nº LP-006-2021, cuyo objeto es " CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁHULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO" MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020", Publicado por UAERMV el 5 de octubre de 2021, en la plataforma SECOP II, por un valor estimado de 24.641.217.103, es importante mencionar que dicho proceso licitatorio se adelantara por lotes, teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y se distribuirá de la siguiente manera: Lote 1- San Antonio I (K13 +820- K6+910), Capitolio y Laguna Verde, (Valor estimado de $12.013.390,090) y Lote 2 – San Antonio II (K6+910+K0+00), Unión Tunales y Animas Bajas (Valor estimado de 12.627.827.013)

Instalación de material granular y del fresado estabilizado en las vías, serán ejecutadas directamente por la UAERMV, por un valor aproximado de $32.927.529.354
El CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº. 478 DEL 10/02/2022 fue adjudicado al Consorcio Gaviones 95. "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON

CÓDIGOBPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.) el cual tendrá a cargo las obras hidráulicas (Subdrenes, Berma-cunetas, box culvert) y muros en gavión mencionadas en el objeto del contrato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº. 479 DEL 10/02/2022 fue adjudicado al Consorcio Estabilización Vial. "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") el cual tendrá a cargo las obras hidráulicas (Subdrenes, Berma- cunetas, box culvert) y muros en gavión mencionadas en el objeto del contrato.

Instalación del material granular y del fresado estabilizado en las vías, serán ejecutadas directamente por la UAERMV, el CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 deberá supervisar las actividades ejecutadas por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, conforme al proyecto Código BPIN 2018000050020 cuyo objeto es "Mejoramiento de las Vías Terciarías en Bogotá"

Respecto a los contratos de prestación de servicios mediante la comunicación 189-1-389 del 29 de noviembre de 2023 se hace entrega de contratos según Modificatorio N°. 2 del contrato CIN REGALIAS-161-2022, y se da respuesta a los comunicados 20237020009711 y 20237010010252.

El presente informe mensual de interventoría a cargo de **ECOVIAS S.A.S.,** describe el proyecto, la información de los contratos de ejecución y las actividades sobre su correspondiente contrato de interventoría, el avance de las obras ejecutadas y la gestión de interventoría para llevar a cabo el seguimiento técnico, administrativo, financiero hasta el período correspondiente al presente informe mensual.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1 Descripción / alcance y meta física inicial

El alcance de las obras a ejecutar para el Contrato de obra se encuentra definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico, en su numeral "*ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE*".

Actividades de pre-construcción

Como parte de esta etapa, se debe realizar la verificación técnica y revisión de los diseños entregados, el contratista de obra tendrá la obligación de validar, revisar y apropiarse de los Estudios, diseños y cantidades de obra entregados por el Fondo de Desarrollo Local FDL de Sumapaz, todas las observaciones que surtan a partir de la revisión por parte del contratista de obra deberán ser solicitadas al FDL (Fondo de Desarrollo Local del Sumapaz) a través de la Interventoría.

Etapa de Construcción

Se llevará a cabo la construcción de vías en aproximadamente 33,08 km lineales en la localidad de Sumapaz, los cuales se dividen TREINTA Y CINCO (35) segmentos viales pre – seleccionados divididos entre la Cuenca Rio Blanco y Cuenca Rio Sumapaz.

- Tramo Animas Bajas: Longitud 4280 m
- Tramo Laguna Verde: Longitud 2958.7 m
- Tramo San Antonio: Longitud 13820 m
- Tramo Capitolio: Longitud 4555.5 m
- Tramo Unión-Tunales: Longitud 7465,8 m

Relación de CIV del Proyecto

Tabla 1 CIV Del Proyecto

CIV CONTRATO		
N°.	**TRAMO**	**CIV**
1	LAGUNA VERDE (CUENCA RIO BLANCO – UPR4)	2003900
2		20039002
3		20039003
4	LAS ANIMAS (CUENCA RIO BLANCO – UPR4)	20036004
5		20076282
6		20036002

CIV CONTRATO		
N°.	**TRAMO**	**CIV**
7		20036005
8		20076283
9		20036001
10	SAN ANTONIO (CUENCA RIO SUMAPAZ – UPR5)	20076251
11		20042003
12		20042001
13		20076258
14		20042002
15		20042002
16		20076256
17		20076257
18		20076255
19		20076259
20		20076253
21		20076252
22		20076250
23		20042004
24	CAPITOLIO (CUENCA RIO SUMAPAZ – UPR5)	20047005
25		20047001
26		20047002
27		20076233
28	TUNAL ALTO (CUENCA RIO SUMAPAZ – UPR5)	20025003
29		20023004
30		20023002
31		20023003
32		20076242
33		20025001
34		20025002
35		20023001

Construcción de obras hidráulicas y gaviones

Se ejecutarán Obras hidráulicas y muros gaviones PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020" el cual se establece en dos grupos (GRUPO 1 y GRUPO 2), es importante tener en cuenta que durante la etapa de ejecución del contrato es posible identificar necesidades de intervención vial las cuales se pueden intervenir previa aprobación de la gerencia del proyecto. dichas acciones deberán estar en el marco de la cadena de valor validada por el SGR, en la etapa de aprobación del proyecto.

- Construcción / ampliación de alcantarillas
- Construcción de cunetas, sub-drenes y muros en gaviones
- Instalación de material granular
- Instalación de rodadura en fresado estabilizado.

Se estableció la intervención de 33,08 kilómetros de vías terciarias, distribuidos en los siguientes tramos de la localidad:

Tabla 2 Alcance Del Proyecto

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVO	CARACTERISTICAS
San Antonio I	Construcción de obras hidráulicas, Gaviones, y Estabilización con fresado.	Longitud 6910 m (K6 + 911 - K 13 + 820)
Capitolio		Longitud 4555.5 m (K0 +00 – K4 + 555.48)
Laguna verde		Longitud 2958.70 m (K0 +00 – K2 + 958.65)
San Antonio II	Construcción de obras hidráulicas, Gaviones, y Estabilización con fresado.	Longitud 6910 m (K0 +00 - K6 + 910)
Animas Bajas		Longitud 4280 m (K0 +00 – K4 + 281.94)
Unión Tunales		Longitud 7465,8 m (K0 +00 – K7 + 465.8)

Los tramos del proyecto están ubicados en las dos cuencas del municipio de Sumapaz como se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 3 Vereda de la Cuenca del Rio Sumapaz

N° TRAMO	NOMBRE DE TRAMO	NOMBRE DE CUENCA	LONGITUD TRAMO
9	San Antonio I	Río Sumapaz	6.910,00 m
6	Capitolio	Río Sumapaz	4.555,50 m
7	Laguna verde	Río Blanco	2.958,70 m
LONGITUD TOTAL			**14.424,20 m**

Tabla 4 Vereda de la Cuenca del Rio Blanco

N° TRAMO	NOMBRE DE TRAMO	NOMBRE DE CUENCA	LONGITUD TRAMO
9	San Antonio II	Río Sumapaz	6.910,00 m
5	Unión Tunales	Río Sumapaz	7.465,80 m
8	Animas Bajas	Río Blanco	4.280.00 m
LONGITUD TOTAL			**18.655.80 m**

2.1.2 Descripción / Alcance y meta física actualizada

A la fecha de corte del presente informe, el alcance inicialmente establecido y descrito en el numeral anterior no ha tenido modificaciones.

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.2.1 Localización de las obras

El proyecto está ubicado en Sumapaz la cual es la localidad número 20 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada sobre un macizo de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, al extremo sur del casco urbano de Bogotá.

La localidad de Sumapaz tiene los siguientes límites, según el Acuerdo 9 de 1986 del Concejo de Bogotá:

Noroeste: Pasca

Norte: Localidad de Usme

Noreste: Une

Oeste: Arbeláez, San Bernardo

Este: Gutiérrez

Suroeste: Cabrera

Sur: Colombia (Huila)

Sureste: Cubarral, Guamal (Meta)

La Localidad 20 lindera en sentido contrario a las manecillas del reloj, como sigue: partiendo al norte de la Laguna de Chisacá, en dirección sur por el divorcio de aguas hasta el nacimiento del río Pilar y por este aguas abajo hasta encontrar el río Sumapaz; se remonta dicho curso de agua hasta su nacimiento en el Alto de las Oseras, límite con el departamento del Huila; a continuación en dirección nordeste se sigue por la cumbre de la cordillera para encontrar el cerro Nevado del Sumapaz y luego al norte hallar el nacimiento del río Chochal en el alto de Torquita; se gira luego al oriente para encontrar la Sierra Leona de Santa Bárbara y posteriormente el Páramo del Gallo, sector del nacimiento del río del mismo nombre; por dicho río aguas abajo hasta la confluencia de la quebrada Tanques y por ella hasta su nacimiento; en dirección norte se encuentra el río Blanco y buscando el nacimiento de este último se llega al Portezuela; aguas arriba al río Portezuela confluye el río Pozo, por el que se sigue hasta su nacimiento en el sitio denominado Boca grande en la Cuchilla de Cauquillos; a continuación hacia el oeste y por el divorcio de aguas se arrima a la Laguna de Chizacá, punto de partida.

La Localidad 20 de Sumapaz se localiza sobre la cordillera Oriental, entre los 2.700 y 4.100 m s. n. m., donde se encuentra el Páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo. Una extensión del territorio es considerada como área de reserva natural desde el año 1977 por resolución del INDERENA.

En el Sumapaz se genera uno de los más importantes recursos hídricos de Colombia que forman parte de las cuencas de los ríos Magdalena y Orinoco.



Ilustración 1 Localización general del proyecto (Localidad de Sumapaz)

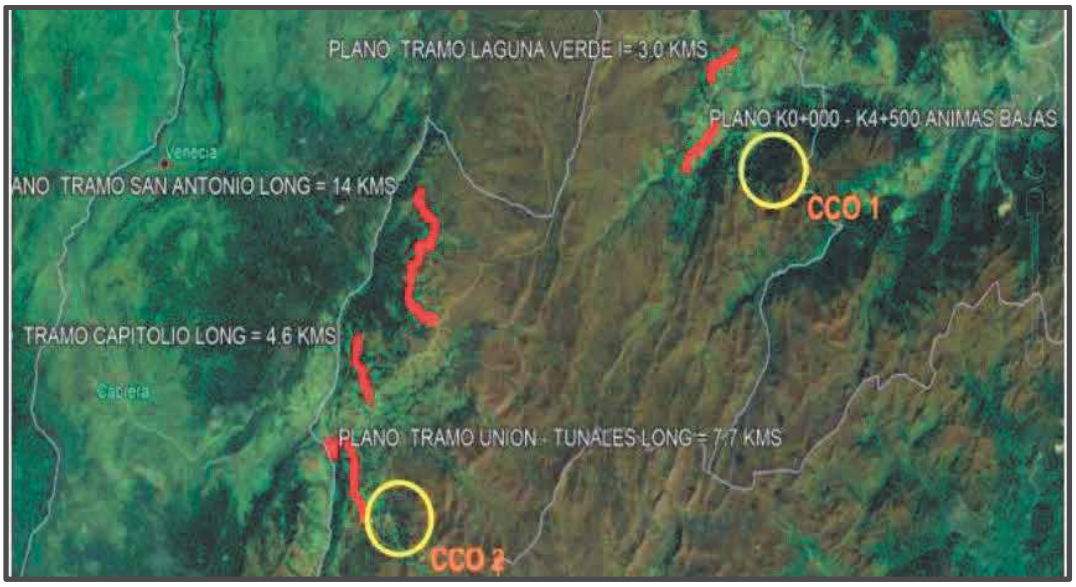


Ilustración 2 Localización del proyecto

Sumapaz produce también parte de los depósitos de agua que abastecerán a la Bogotá del futuro. Las 75.756 ha de la Localidad de Sumapaz con sus 35.928 ha de pajonal, 25.017 de frailejón y pajonal, 5.402 de bosque natural, 1856 de turbera y 106 de lagunas, además de sus 1.128 km de ríos y quebradas, conforman un conjunto natural que cumple un importante papel en el ciclo del agua, tanto regulando los flujos desde la montaña, como alimentando los depósitos subterráneos.

Acorde con el anexo técnico del contrato los segmentos a intervenir en el desarrollo del contrato serían los siguientes:

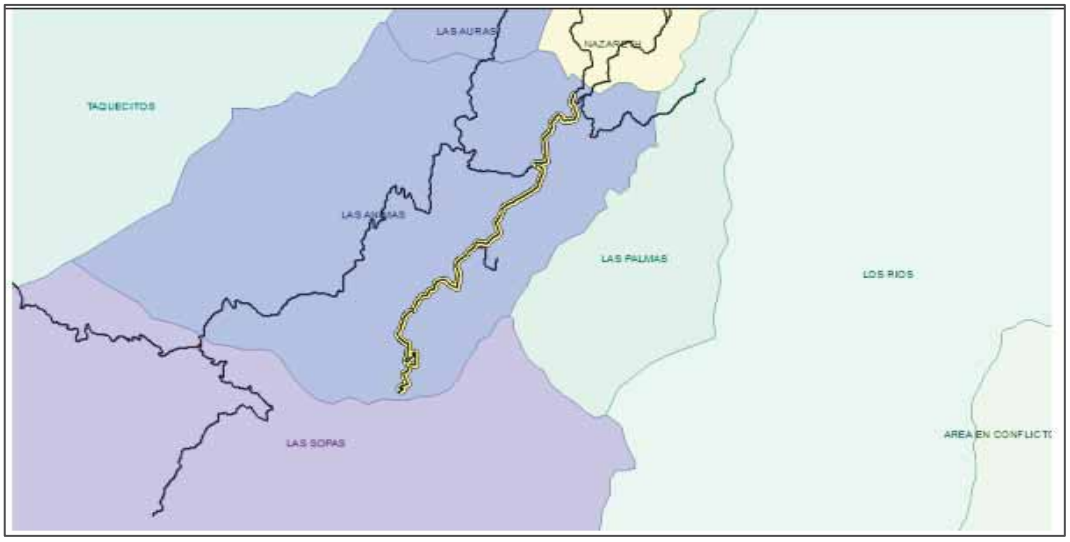


Ilustración 3 Localización CIV – 20036004, 20076282, 20036002, 20036005, 20076283 y 20036001 Las Animas (Cuenca Río Blanco – UPR4) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022



Ilustración 4 Localización CIV – 20076251, 20042003, 20042001, 20076258, 20042002, 20076254, 20076256, 20076255, 20076257, 20076259, 20076253, 20076252, 20076250 y 20042004 El Toldo – San Antonio (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022

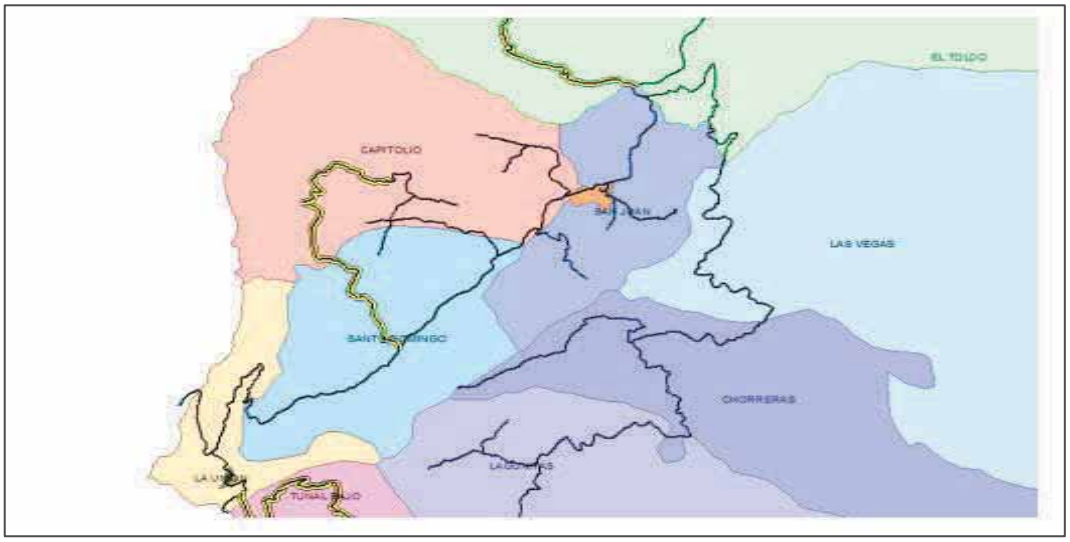


Ilustración 5 Ilustración 5 Localización CIV – 20047005, 20047001, 20047002 y 20076233 Santo Domingo – Capitolio (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022

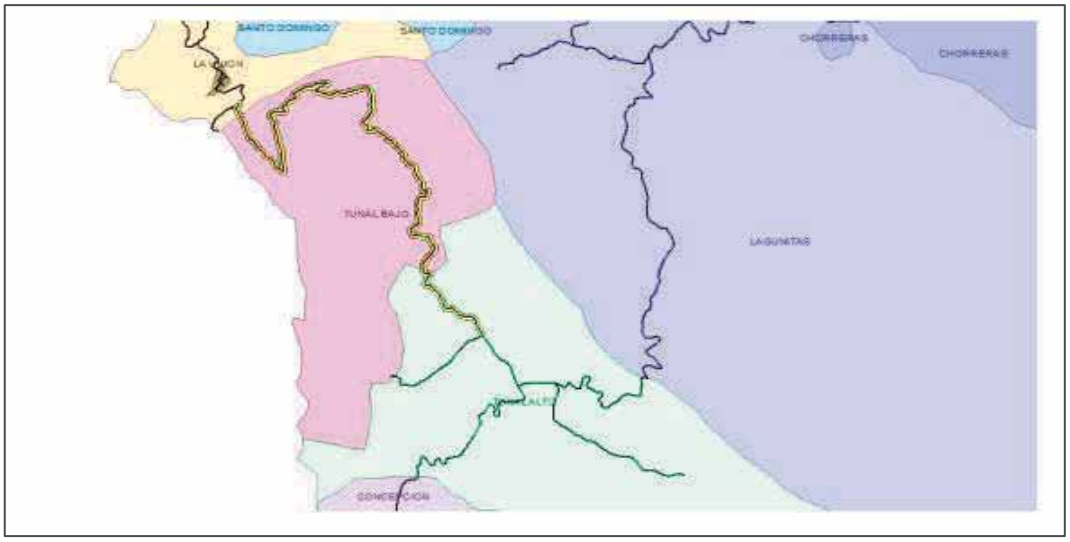


Ilustración 6 Localización CIV – 20025003, 20023004, 20023002, 20023003, 20076242, 20025001, 20025002 y 20023001 Tunal Bajo – Tunal Alto (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022

A continuación, se describe los frentes de trabajo acorde al Contrato de interventoría N°. CIN-REGALÍAS-161-2022 del 14/02/2022 para el presente periodo:

En la siguiente tabla se observa la localización por tramos:

Tabla 5 Localización De Los Tramos

TRAMO	VEREDA	PUNTO	ABCISA	ELIPSOIDALES		MAGNA_SIRGAS	
				LATITUD	LONGITUD	ESTE	NORTE
1	UNION-TUNALES	INICIO	K0+000	3°57'15,00413"	74°20'8,57726"	971324,288	929008,196
		FIN	K2+951,39	3°58'23,66157"	74°20'42,79571"	970269,355	932117,473
2	UNION-TUNALES	INICIO	K0+000	3°58'23,61470"	74°20'42,80898"	970268,945	931116,034
		FIN	K2+042,66	3°59'4,70976"	74°21'6,42207"	969540,933	932378,586
3	UNION-TUNALES	INICIO	K0+000	3°59'4,0245"	74°21'9,49511"	969446,128	932357,568
		FIN	K0+254,009	3°59'4,58649"	74°21'17,20487"	969208,302	932374,911
4	UNION-TUNALES	INICIO	K0+000	3°59'7,92971"	74°21'14,40663"	969294,657	932477,575
		FIN	K0+703,08	3°58'57,13488"	74°21'31,70969"	968760,777	932146,172
5	UNION-TUNALES	INICIO	K0+000	3°58'53,67945"	74°21'32,09895"	968748,732	932040,035
		FIN	K1+667,17	3°59'2,91601"	74°21'42,23541"	968436,137	932323,861
6	CAPITOLIO	INICIO	K0+000	4°0'17,92877"	74°20'29,73087"	970673,512	934627,277
		FIN	K4+555,48	4°1'55,53772"	74°21'3,49074"	969633,11	937625,867
7	LAGUNA VERDE	INICIO	K0+000	4°10'20,84222"	74°10'31,40611"	989132,433	953142,71
		FIN	K2+958,65	4°11'14,85303"	74°9'45,72219"	990541,537	954801,583
8	ANIMAS BAJAS	INICIO	K0+000	4°9'23,50798"	74°10'6,34926"	989905,001	951381,497
		FIN	K4+281,94	4°7'54,78787"	74°10'56,89428"	988345,765	948656,498
9	SAN ANTONIO	INICIO	K0+000	4°2'40,85478"	74°18'37,77219"	974128,395	939016,468
		FIN	K13+823,50	4°6'28,27641"	74°19'50,76241"	971879,144	946002,837

2.2.2 Localización del campamento y/o oficinas

A la fecha de corte del presente informe, se cuentan con las siguientes oficinas para el proyecto:

Contratista Gaviones 95: Av. carrera 19 N° 95-12/20 – TEL 6014327903 BOGOTA D.C

Contratista Estabilización vial: Carrera 17 N° 142–25 – TEL: 6017023060, BOGOTA D.C.

UAERMV: Calle 26 N° 69-76 piso Torre aire piso 3 - TEL: 6013779555 EXT 1001, BOGOTA D.C.

A continuación, se presenta la ubicación de las oficinas y campamentos de cada uno de los contratistas:

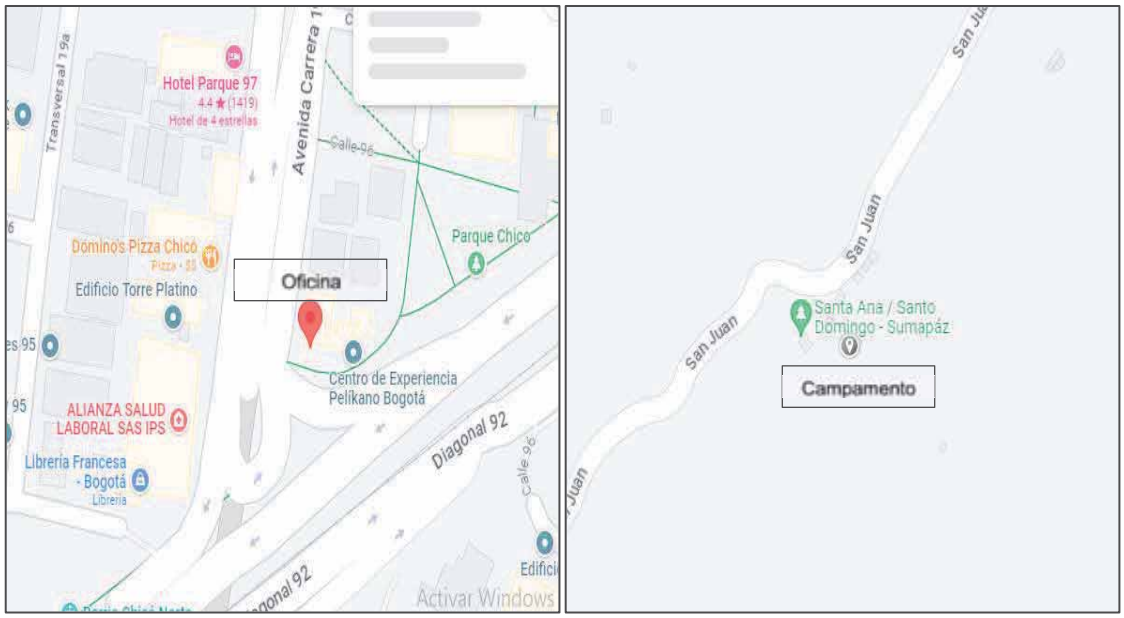


Ilustración 7 Ubicación Oficina – Campamento Consorcio Gaviones 95

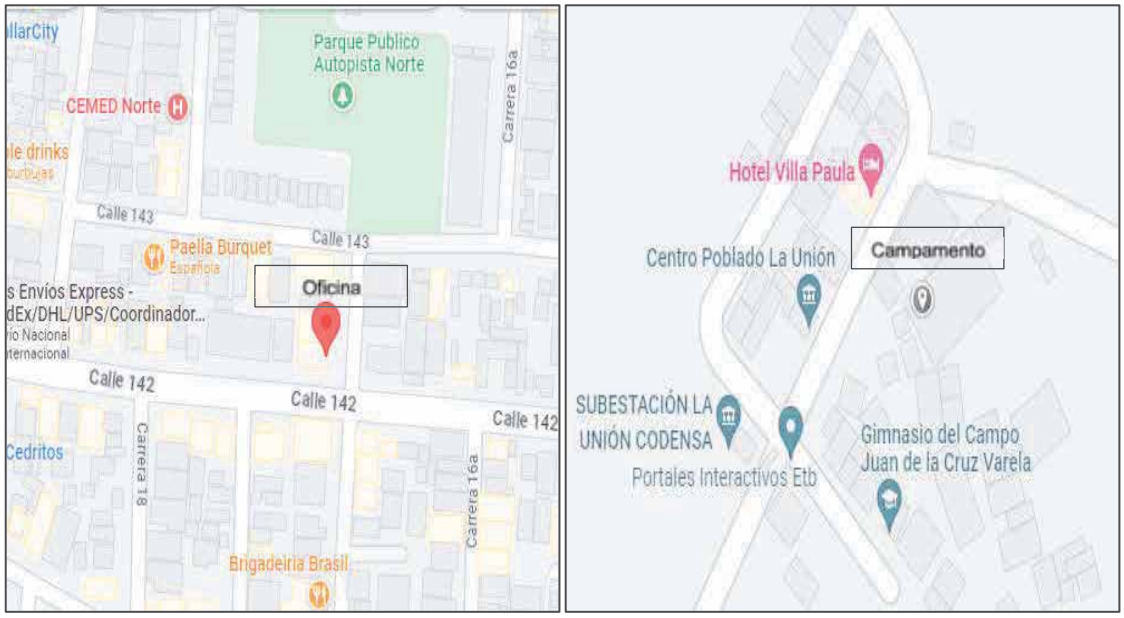


Ilustración 8 Ubicación Oficina – Campamento Consorcio Estabilización Vial

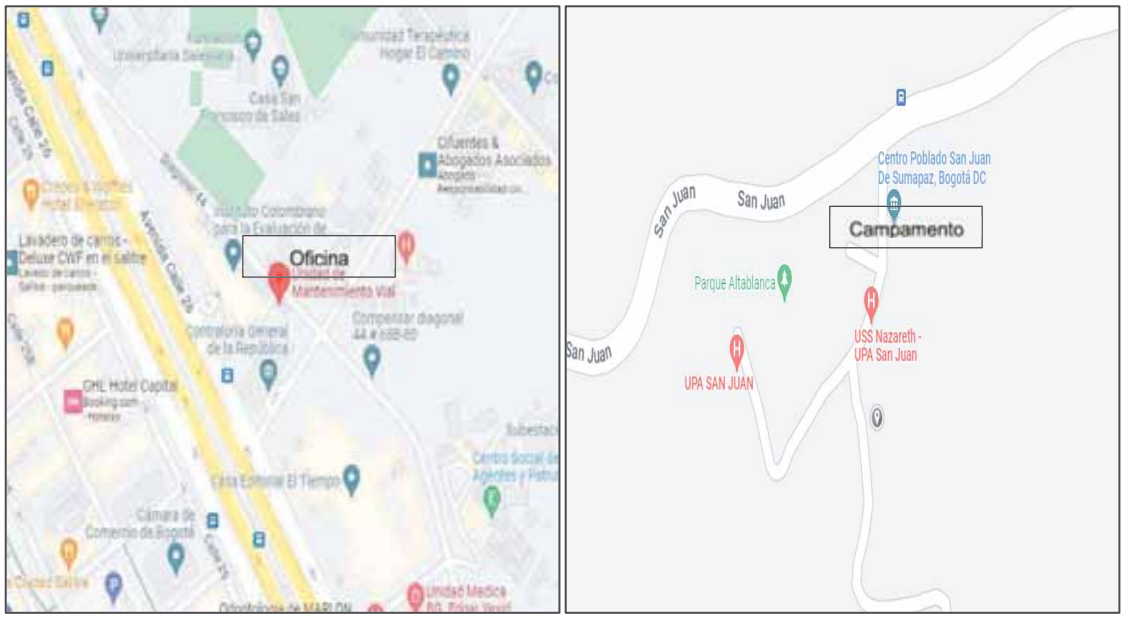


Ilustración 9 Ubicación Oficina - Campamento UAERMV

2.3 ANTECEDENTES

Las vías de la localidad de Sumapaz se caracterizan por su fácil deterioro físico, originado en los problemas de humedad ambiental y en el hecho de ser solamente recebadas, es decir que, aproximadamente 360,94 kilómetros de las vías existentes, no tienen estructura de pavimento, a excepción de las calles de los centros poblados, lo cual hace que las velocidades de desplazamiento sean menores y por ende los tiempos de un punto a otro sean mayores, lo que muchas

veces se traduce en la no prestación del servicio integrado de transporte dentro de la localidad o en trayectos de hasta 6 horas.

Adicionalmente, vale la pena aclarar que en los estudios previos del contrato de obra, la Entidad Contratante informa que en épocas de lluvias las vías pueden quedar inservibles para la circulación de vehículos, esto debido a la alta pluviosidad que caracteriza la región y demás factores climáticos, situaciones que genera que algunas veredas queden incomunicadas y dificulte el transporte y comercialización de los productos agropecuarios que se producen en la región, cuya economía gira en torno a la agricultura y la ganadería, las actividades escolares, la atención médica, la provisión de bienes y servicios, procedentes tanto del centro urbano de Bogotá como de los municipios vecinos.

Por lo anterior, se presenta la necesidad de intervenir la malla vial de la Localidad de Sumapaz por medio de reconstrucción y/o rehabilitación de las vías acorde con el Plan de Desarrollo Local 2017-2020 "SUMAPAZ EN PAZ, MÁS PRODUCTIVA Y AMBIENTAL PARA TODOS".

2.4 ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS

En la actualidad las vías a intervenir en Sumapaz para el presente contrato, en gran porcentaje se encuentran únicamente en afirmado, no cuentan con una estructura de pavimento, por esto presentan un fuerte deterioro, lo cual hace necesario una intervención para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región

La extensión de la malla vial de la localidad a intervenir es de 33.08 km-carril (Incluye vía rural principal y no principal), la cual se categoriza de la siguiente manera:

Tabla 6 Estado Inicial De Las Vías De La Localidad De Sumapaz

Tramo	Longitud (m)	Fresado Estabilizado Mal Estado (m)	Recebo en Mal estado (m)
Ánimas Bajas	4280	0	4280
Laguna Verde	2958,7	0	2958,7
San Antonio	13820	1000	12820
Capitolio	4555,5	0	4555,5
Unión - Tunales	7465,8	2000	5465,8
Total	33080,0	3000	30080

De igual forma, se evidencia existen tramos viales cuya superficie es en afirmado, esto se da debido a que en ciertos sectores se restringen las intervenciones al ser consideradas zonas de protección ambiental.

2.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla las siguientes características técnicas:

Tabla 7 Ficha técnica del proyecto

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS
LOTE N° 1 **CAPITOLIO**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 4555.50 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 9 alcantarillas. En concreto de 3500 PSI, diámetro Ø 34" 36". ✓ Construcción de Filtro: Dimensiones 0.60mx0.67m, material drenante 1" y 3", tubería perforada de 6" y geotextil NT 2500 con longitud aproximada de 5209 m ✓ Construcción de Cuneta: de 0.60Mx0.45mx 0.15m y una sección transversal de 0.14 m^2 longitud de 5209 m
LOTE N° 1 **LAGUNA VERDE**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 2958.70 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 9 alcantarillas: En concreto de 3500 PSI, diámetro Ø 34" 36". ✓ Construcción de Filtro: 3435 m, Dimensiones 0.60mx0.67m, material drenante 1" y 3", tubería perforada de 6" y geotextil NT 2500. ✓ Construcción de Cuneta: 3435 m, 0.60Mx0.45mx 0.15m y una sección transversal de 0.14 $m^{2.}$
LOTE N° 1 **SAN ANTONIO 1**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 6910 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 32 alcantarillas: En concreto de 3500 PSI, diámetro Ø 34" 36". ✓ Construcción de Filtro: 7160 m, Dimensiones 0.60mx0.67m, material

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS
		drenante 1" y 3", tubería perforada de 6" y geotextil NT 2500. ✓ Construcción de Cuneta: 7160 m, 0.60Mx0.45mx 0.15m y una sección transversal de 0.14 $m^{2.}$
LOTE N° 2 **LA UNION TUNALES SECTOR 1**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 1380 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 6 alcantarillas, en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: longitud 1380 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de Berma/ Cuneta: longitud con 1380 m, tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m)
LOTE N° 2 **LA UNION TUNALES SECTOR 2**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 3002,48 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 4 alcantarillas: en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: 3002,48 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar ✓ Construcción de Berma/ Cuneta: tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 3002,48 m.
LOTE N° 2	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 260 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS
LA UNION TUNALES SECTOR 3		✓ Construcción de Filtro: 260 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 260 m.
LOTE N° 2 **LA UNION TUNALES SECTOR 4**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 1640 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 2 alcantarillas: en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: 200 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 200 m.
LOTE N° 2 **LA UNION TUNALES SECTOR 5**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 1640 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 3 alcantarillas: en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: 1640 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 1640 m.
LOTE N° 2	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 4280 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS
ANIMAS BAJAS SECTOR 8		✓ Construcción de 3 alcantarillas, en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: 1640 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 1640 m.
LOTE N° 2 **SAN ANTONIO II SECTOR 9**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 6910 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 38 alcantarillas. en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: 7159,90 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 7159,90 m.

3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

A continuación, se hace un recuento del estado de los contratos de Obra:

Tabla 8 Estado De Los Contratos

N°	CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PROCESO DE SELECCIÓN	ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL	PLAZO INICIAL (Meses)	PLAZO ACTUALIZADO (MESES)	% DE AVANCE DEL CONTRATO	FIN	ESTADO
1	478 DEL 10/02/2022	Contrato De Obra Publica	CONSORCIO GAVIONES 95	10/02/2022	LP – 006 – 2021	03 de marzo de 2022 nota 1: etapa pre-construcción 08 de agosto de 2022 nota 2: etapa construcción	07 de mayo de 2023, fecha terminación acta de inicio etapa 2 construcción	11	VEINTIDOS (22) MESES Y VEINTIDOS (22) DÍAS	27.91 %	25-10-2025	En ejecución
2	479 DEL 10/02/2022	Contrato De Obra Publica	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	10 /02/2022	LP – 006 – 2021	03 de marzo de 2022 nota 1: etapa pre-construcción 18 de Julio de 2022 nota 2: etapa construcción	17 de abril de 2023 modificatorio 1 nota: esta fecha es actualizada prorroga 01	11	VEINTIDOS (22) MESES	71,2 %	1-08-2025	En ejecución
3	480 DEL 22/02/2022	Contrato De Prestación De Servicios	SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S.	03/03/2022	LP–011–2021	3 de marzo de 2022	02/06/2023	15	QUINCE (15) MESES	33%	2/06/2023	FINALIZO TIEMPO CONTRACTUAL

Nota: de fecha 1 de abril de 2025 y una vez superadas todas las causales que dieron motivos a la suspensión del contrato 478, 479 y contrato de interventoría 161 de 2022, se da reinicio de actividades de obra.

4 CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95

4.1 GENERALIDADES

4.1.1 Datos del contrato 478 del 10/02/2022.

A continuación, se describen los aspectos contractuales del contrato de obra

Tabla 9 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor CTO 478

ENTIDAD CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
CONTRATO DE OBRA N°:	COP-478 del 10/02/2022
OBJETO:	"Contrato para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá", del sistema general de regalías - SGR identificado con código BPIN 2018000050020". contrato para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto " mejoramiento de vidas terciarias en Bogotá", del sistema general de regalías - SGR identificado con código BPIN 2018000050020. (san Antonio i (k13+820-k6+910), capitolio y laguna verde.)
PROCESO DE SELECCIÓN N°:	LP-006-2021
DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GAVIONES 95
NIT:	901.563.341-0
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	- PROMCIVILES (70%) S.A.S NIT 901.001.320-5
	- PROMOTORA PUGA LTDA (30%) NIT 830.024.796-9
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	Av. Carrera 19 número 95-12/20- BOGOTA D.C
TELÉFONO:	601-4327903
MODIFICATORIO N°.1	"El contrato consta de dos (2) tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, las cuales podrán realizarse de manera simultánea. Parágrafo 1. Los tramos o kilómetros que pasen a etapa de obra deberán contar con las respectiva apropiación y validación propia de las actividades de pre-construcción".
OTROS DATOS DEL CONTRATO	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10 de febrero de 2022
FECHA DE INICIO ETAPA PRECONSTRUCCION	3 de marzo de 2022
VALOR INICIAL:	$ 11.624.693.181,00 Incluido IVA sobre utilidad
VALOR ACTUALIZADO:	$ 11.624.693.181,00 Incluido IVA sobre utilidad
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	02 DE FEBRERO DE 2023
FECHA INICIO CONTRUCCIÓN	8 DE AGOSTO DE 2022
PRORROGA N°. 1	DOS (2) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS
SUSPENSIÓN N°. 1	21 DE ABRIL DE 2023 (DOS 02 MESES)
AMPLIACIÓN 1 – SUSPENSIÓN 1	UN (01) MES

AMPLIACIÓN 2 – SUSPENSIÓN 1	ONCE (11) DÍAS
AMPLIACIÓN 3 – SUSPENSIÓN 1	UN (1) MES
AMPLIACIÓN 4 – SUSPENSIÓN 1	UN (1) MES
AMPLIACIÓN 5 – SUSPENSIÓN 1	VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 6 – SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 7 – SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 8 – SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 9 – SUSPENSIÓN 1	DOS (2) MESES CALENDARIO
REINICIO 1	5 DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA 2.	NUEVE (9) MESES
SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2024
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE AGOSTO DE 2024
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES Y DIECISÉIS (16) DIAS PARTIR DEL 17 DE AGOSTO AL 1 DE OCTUBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ENERO DE 2025
AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES A PARTIR DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2025
AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 2	1 MES Y 10 DÍAS A PARTIR DEL 21 DE FEBRERO AL 1 DE ABRIL DE 2025
REINICIO N°2	1 DE ABRIL DE 2025
PLAZO TOTAL ACTUALIZADO PRORROGA 2.	VEINTIDÓS (22) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	25 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR ANTICIPO:	$ 2.324.938.636
INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S
SUPERVISOR:	UAERMV

4.1.2 Pólizas o garantías del contrato de obra.

El contratista otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:

Tabla 10 Datos Póliza

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
AMPARO	**PÓLIZA N°**	**CERTIFICADO O ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**EXPEDIDA / MODIFICADA SEGÚN**
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	0	22-FEB-2022	CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	0	22-FEB-2022	CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	3	01-ABR-2022	ACTA DE INICIO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	3	31-MAR-2022	ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	4	27-JUL-22	MODIFICACIÓN Nº. 1 y PRÓRROGA Nº. 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	4	27-jul-22	MODIFICACIÓN N°. 1 y PRÓRROGA Nº. 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	6	8-may-2023	SUSPENSIÓN N° 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	5	8-may-2023	SUSPENSIÓN N° 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	9	31-jul-2023	AMPLIACIÓN 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	6	28-jul-2023	AMPLIACIÓN 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	11	4-ago-2023	AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	7	2-ago-2023	AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1.
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	12	6-sep-2023	AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	8	6-sep-2023	AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	19	27-nov-2023	AMPLIACIÓN 9 SUSPENSIÓN 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	12	27-nov-2023	AMPLIACIÓN 9 SUSPENSIÓN 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	21	13-dic-2023	AMPLIACIÓN 10 SUSPENSIÓN 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	13	13-dic-2023	AMPLIACIÓN 10 SUSPENSIÓN 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	23	12-feb-2024	MODIFICACIÓN 2 PRÓRROGA 2

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	14	9-feb-2024	MODIFICACIÓN 2 PRÓRROGA 2
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	24	26-abr-2024	SUSPENSIÓN CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	15	26-abr-2024	SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	25	17-julio 2024	AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	16	17-julio 2024	AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	26	22-ago-2024	AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	17	22-ago-2024	AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	28	11-dic-2024	AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	19	11-dic-2024	AMPLIACIÓN 3 y 4 SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	29	12-feb-2025	AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	20	12-feb-2025	AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	30	23-may-2025	AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 2 Y REINICIO CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	21	23-may-2025	AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 2 Y REINICIO CONTRATO

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados según contrato de obra:

Tabla 11 Pólizas actualizadas a la fecha.

AMPARO	REQUISITOS CONTRACTUALES		DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA		
	Vigencia contractual	% contractual	Desde	Hasta	Valor asegurado
CUMPLIMIENTO					
a). Cumplimiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	10%	3-mar-22	10-may-25	$ 1.162.469.319,00
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	100%	3-mar-22	10-may-25	$ 2.324.938.637,00
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Plazo del contrato y tres (3) años más.	5%	3-mar-22	10-nov-27	$ 581.234.660,00
d). Estabilidad y calidad de las obras.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.	20%	5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DIAS		$ 2.324.938.637,00
RESPONSABILIDAD CIVIL					
a). Predios labores y operaciones	Igual al período de ejecución del contrato.	5%	3-mar-22	10-nov-24	$ 581.234.660,00
b). Daño emergente y lucro cesante	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			$ 290.617.330,00
c) Perjuicios extrapatrimoniales	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			$ 290.617.330,00

4.1.3 Otrosí, Adición y Prórroga

En la siguiente tabla se muestra el otrosí o Modificatorio al contrato.

Tabla 12 Otrosí y Adición - Contrato de Obra 478

DOCUMENTO	FECHA	PRORROGA	VALOR	MOTIVO
MODIFICACIÓN Nº 1 y PRORROGA Nº 1	25/07/2022	2 meses y 22 días	N/A	Modificar el párrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato prorrogar el plazo del contrato.

DOCUMENTO	FECHA	PRORROGA	VALOR	MOTIVO
MODIFICACIÓN Nº 2 y PRORROGA Nº 2	8/02/2024	9 meses	N/A	Modificar el párrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato prorrogar el plazo del contrato.

En el presente periodo no se presentaron Otrosíes y/o modificaciones al contrato de obra 478.

4.1.4 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las suspensiones y/o reinicios al contrato de obra 478:

Tabla 13 Suspensiones y Reinicios Contrato de Obra 478

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento	Suspensión	Suspensión			
Suspensión N°. 1	-	21-abr-23	21-abr-23	20-jun-23	DOS (2) MESES	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 1	20-jun-23	21-jun-23	20-jul-23	UN (1) MES	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 2	19-jul-23	21-jul-23	31-jul-23	ONCE (11) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 3	1-ago-23	1-ago-23	31-ago-23	TREINTA Y UN (31) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 4	30-ago-23	1-sep-23	1-oct-23	TREINTA Y UN (31) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico.
Suspensión N°. 1	Ampliación 5	29-sep-23	2-oct-23	23-oct-23	VEINTIDÓS (22) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico.
Suspensión N°. 1	Ampliación 6	23-oct-23	24-oct-23	6-nov-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento	Suspensión	Suspensión			
Suspensión N°. 1	Ampliación 7	03-nov-23	7-nov-23	20-nov-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 8	20-nov-23	21-nov-23	4-dic-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 9	4-dic-23	5-dic-23	4-feb-24	DOS (2) MESES		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Reinicio	N/A	5-Feb-24	N/A	N/A	N/A	5-Feb-2024	Se superan las causales que dieron lugar a la suspensión N° 1.
Suspensión 2	N/A	17-abr-24	17-Abr-24	16-Jun-24	DOS (2) MESES	17-jun-2024	Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión 2	Ampliación 1	17-jun-24	17-jun-24	17-ago-24	DOS (2) MESES		No se superan los motivos que motivaron la suspensión del contrato
Suspensión 2	Ampliación 2	1-ago-24	17-ago-24	1-oct-24	UN (1) MES Y DIECISÉIS DÍAS		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión 2	Ampliación 3	1-oct-24	1-oct-24	1-nov-24	UN (1) MES		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión 2	Ampliación 4	1-nov-24	1-nov-24	21-ene-25	DOS (2) MESES y VEITE (20) DÍAS		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión 2	Ampliación 5	24-ene-25	21-ene-25	21-feb-25	UN (1) MES		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión 2	Ampliación 6	22-feb-25	21-feb-25	1-abr-25	UN (1) MES Y DIEZ DÍAS	1-abr-2025	Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Reinicio 1	N/A	1-abr-25				1-abr-25	Se superan las causales que motivaron la suspensión.

4.1.5 Actas De Modificaciones De Cantidades De Obras

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a las cantidades de obra del presupuesto contractual del contrato de obra 478:

Tabla 14 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obra contrato 478

ACTA MODIFICATIVA Nº	FECHA	MOTIVO			
		AJUSTE MAYORES Y MENORES COSTOS	PRORROGA	ADICIÓN EN VALOR	COMENTARIOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.1.6 ítems o precios no previstos

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a la incorporación de ítems o precios no previstos inicialmente en la propuesta económica precontractual del contrato de obra 478:

Tabla 15 Ítems No previstos contrato 478

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (mar/2022)
NP-01	Construcción de berma cuneta de 0,60m de ancho y sección transversal de 0,16 m2, en concreto de 3500 PSI; (Incluye corte de dilatación cada 2,0m, curado e impermeabilización. No incluye acero de refuerzo	ML	$ 135.463,00
NP-03	Excavación manual en material común (incluye cargue)	M3	$ 31.915,00
NP-04	Construcción de filtro de drenaje. Dimensiones 060mX0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 3", tubería perforada de 6"y geotextil NT 2500 o similar.	ML	$ 176.724,00
NP-05	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a Ø= 36"; Incluye limpieza de descoles hasta 5,0m y cargue. No incluye retiro de sobrantes ni disposición final.	UND	$ 71.495,00
NP-06	Limpieza y rocería de cunetas en tierra.	M2	$ 1.966,00
NP-07	Traslado de cerca en alambre de púas; (Incluye remoción de cerca e instalación definitiva).	ML	$ 8.801,00
NP-08	Protección de taludes tipo 1 con producto enrollado para control de erosión de tipo agro manto temporal. (Mezcla fértil)	M2	$ 34.891,00
NP-09	Descapote a máquina en material común (E=0,10m incluye cargue, no incluye disposición final de sobrantes).	M2	$ 2.394,00
NP-10	Conformación de taludes existentes (Incluye acarreo a acopio interno en el tramo)	M2	$ 1.395,00
NP-11	Construcción de filtro de drenaje. Dimensiones 0,60mX0,67m; incluye material granular drenante de 1" a 3", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar.	ML	$ 153.399,00
NP-12	Excavaciones varias en roca	M3	$ 67.754,00
NP-13	Protección de taludes tipo 2 con producto enrollado para control de erosión de tipo manto temporal. (Semilla)	M2	$ 25.408,00

Se dio aval a los ítems no previstos mediante comunicación 186-1-205 del 1 de marzo de 2024, para incluirlos dentro de la modificación N°3 al contrato de obra 478-2022, para el presente periodo no se tramitaron ítems no previstos.

4.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO

4.2.1 Etapa de Pre-construcción

En la siguiente tabla se mencionan actividades realizadas en la etapa de pre-construcción.

Tabla Documentación Organizativa Inicial Contrato 478

REQUERIMIENTO	REFERENCIA CONTRACTUAL	ESTADO DEL DOCUMENTO
D-27-2022-25	Comunicación apropiación parcial de estudios y diseños.	El día 9 de agosto de 2022 el contratista realiza la apropiación parcial mediante comunicación D-27-2022-25 a pesar de las entregas de los levantamientos topográficos y diseño geométrico realizados por parte de la entidad y revisados por la interventoría, se continuo con las actividades de obra con el único propósito de no suspender la ejecución del contrato, quedado pendiente por recibir la información definitiva de los estudios y diseños revisados y aprobados por la UAERMV y/o la interventoría.

4.2.2 Etapa de construcción

En la siguiente tabla se registran las actividades de obra de construcción del CONTRATO DE OBRA 478.

Tabla 16 Actividades de Construcción contrato 478

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
TRAMO CAPITOLIO	Sin actividades debido a reinicio del contrato	- Se hicieron actividades de rocería o limpieza en el tramo se realiza traslado de cercas en los predios adyacentes a la vía descapote de material común - Conformación, corte y perfilado de taludes. - Excavación y construcción de filtros: se realiza la actividad de excavación y construcción de filtros; el cual es tipo francés de medidas 0.67m de profundo y 0.6m de ancho con material drenante de 1" a 3", y con tubería perforada de 4", lo anterior recubierto de geotextil no tejido calibre 2500 - Actividades de filtro
TRAMO CAPITOLIO K1+000.00 - K0+690.00	Sin actividades	- Excavación y construcción de filtros: se realiza la actividad de excavación y construcción de filtros; el cual es tipo francés de medidas 0.67m de profundo y 0.6m de ancho con material drenante de 1" a 3", y con tubería perforada de 4", lo anterior recubierto de geotextil no tejido calibre 2500

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
LAGUNA VERDE	Instalación de Cerramiento para delimitación y proyección Replanteo del tramo	- Sin actividades previas

Durante el presente periodo, el contratista de obra adelantó actividades correspondientes a la instalación del cerramiento provisional, con el fin de delimitar y facilitar el replanteo del tramo correspondiente a Laguna Verde. Estas labores hacen parte de las actividades preliminares requeridas para la correcta ejecución del proyecto.

Se prevé que, para el siguiente periodo, el contratista inicie la ejecución de actividades de mayor representatividad presupuestal dentro del contrato, asociadas a componentes estructurales hidráulicos y de avance físico significativo.

4.2.3 Valores ejecutados

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los valores contractuales actualizados, valores ejecutados en el período, valores acumulados y los saldos:

Tabla 17 Valores Ejecutados Contrato 478

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
1	**ALCANTARILLAS**		**$ 6.053.645,00**		$ 3.667.900.766,43				**$ 0,00**		**$ 3.667.900.766,43**
1,01	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	M3	$ 8.744,00	1302,24	$ 11.386.786,56	0	$ 0,00	0	$ 0,00	1302,24	$ 11.386.786,56
1,02	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado. (Distancia de transporte aprox. 85 Km. Aprox.) A distancia mayor del acarreo libre (90 m), en sitio autorizado por la entidad ambiental competente	M3	$ 153.629,00	1302,24	$ 200.061.828,96	0	$ 0,00	0	$ 0,00	1302,24	$ 200.061.828,96
1,03	Retiro de tubería. Incluye cargue, retiro y disposición en sitio autorizado.	M	$ 582.150,00	67,77	$ 39.452.305,50	0	$ 0,00	0	$ 0,00	67,77	$ 39.452.305,50
1,04	Relleno en recebo común. (Suministro e instalación. Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	M3	$ 240.042,00	2035,54	$ 488.615.092,68	0	$ 0,00	0	$ 0,00	2035,54	$ 488.615.092,68
1,05	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado D=36" (900 mm)	M	$ 1.733.590,00	412,27	$ 714.707.149,30	0	$ 0,00	0	$ 0,00	412,27	$ 714.707.149,30

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
1,06	Demolición de estructuras en concreto reforzado. Incluye cargue y retiro a sitio autorizado	M3	$ 278.216,00	152,37	$ 42.391.771,92	0	$ 0,00	0	$ 0,00	152,37	$ 42.391.771,92
1,07	Concreto de limpieza grava común. Resistencia 2000 PSI (14 Mpa). Incluye transporte, suministro, colocación y curado.	M3	$ 704.070,00	83,67	$ 58.909.536,90	0	$ 0,00	0	$ 0,00	83,67	$ 58.909.536,90
1,08	Concreto. Resistencia 14 Mpa. (G) (Ciclópeo)	M3	$ 546.701,00	539,41	$ 294.895.986,41	0	$ 0,00	0	$ 0,00	539,41	$ 294.895.986,41
1,09	Acero de refuerzo: Incluye Suministro, Figurado y Fijación	KG	$ 7.632,00	108793,1	$ 830.308.939,20	0	$ 0,00	0	$ 0,00	108793,	$ 830.308.939,20
1,1	Junta fría en estructuras de concreto. e= 25 cm. Incluye adhesivo epóxido para pegar concreto fresco con endurecido y la instalación de cinta PVC para sellar e impermeabilizar juntas frías en estructuras de concreto.	M	$ 49.907,00	1164,6	$ 58.121.692,20	0	$ 0,00	0	$ 0,00	1164,6	$ 58.121.692,20
1,11	Concreto para Alcantarilla. Resistencia 24,5 Mpa hasta 28 Mpa. (3500 PSI - 4000 PSI)	M3	$ 874.482,00	991,38	$ 866.943.965,16	0	$ 0,00	0	$ 0,00	991,38	$ 866.943.965,16
1,12	Concreto para Box. Resistencia 24,5 Mpa hasta 28 Mpa. (3500 PSI - 4000 PSI)	M3	$ 874.482,00	71,02	$ 62.105.711,64	0	$ 0,00	0	$ 0,00	71,02	$ 62.105.711,64
2	**CUNETAS**		**$ 699.513,72**		$ 4.078.708.030,98				**$ 297.708.225,00**		**$ 3.780.999.805,20**

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
2,01	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	M3	$ 8.744,00	5180,7	$ 45.300.040,80	0	$ 0,00	1416,08	$ 12.382.238,00	3764,61	$ 32.917.802,30
2,02	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado. (Distancia de transporte aprox. 85 Km. Aprox.) A distancia mayor del acarreo libre (90 m), en sitio autorizado por la entidad ambiental competente	M3	$ 153.629,00	5180,7	$ 795.905.760,30	0	$ 0,00	1416,08	$ 217.551.569,00	3764,61	$ 578.354.191,46
2,03	Relleno en recebo común. (Suministro e instalación. Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	M3	$ 240.042,00	1552,03	$ 372.552.385,26	0	$ 0,00	282,34	$ 67.774.418,00	1269,68	$ 304.777.966,81
2,04	Acero de refuerzo: Incluye Suministro, Figurado y Fijación	KG	$ 7.632,00	81044,16	$ 618.529.029,12	0	$ 0,00	0	$ 0,00	81044,1	$ 618.529.029,12
2,05	Construcción de Berma / Cuneta, de 0,70 m de ancho y espesor 0,20 m. en Concreto reforzado de 3500 PSI. No incluye acero de refuerzo. Incluye corte de dilatación cada 2,0 m. suministro, instalación y conformación de la superficie de apoyo.	M	$ 149.245,00	15051,9	$ 2.246.420.815,50	0	$ 0,00	0	$ 0,00	15051,9	$ 2.246.420.815,50

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
2,06	Construcción de berma/cuneta de 0,60 m de ancho y espesor 0,15 m. En concreto reforzado de 3000 PSI No incluye acero de refuerzo. Incluye corte de dilatación cada 2 m.	M	$ 140.221,72		$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
3	**SUBDRENES**		**$ 474.667,00**		**$ 3.402.237.579,65**				**$ 94.033.451,00**		**$ 3.308.204.127,89**
3,01	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	M3	$ 8.744,00	6208,1	$ 54.283.626,40	0	$ 0,00	579,12	$ 5.063.825,00	5628,98	$ 49.219.801,12
3,02	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado. (Distancia de transporte aprox. 85 Km. Aprox.) A distancia mayor del acarreo libre (90 m), en sitio autorizado por la entidad ambiental competente	M3	$ 153.629,00	6208,1	$ 953.744.194,90	0	$ 0,00	579,12	$ 88.969.626,00	5628,98	$ 864.774.568,42
3,03	Construcción de filtro de Drenaje. Dimensiones 0,50 m x 1,0 m. Incluye material granular drenante entre 1" y 3", tubería perforada de 4" y geotextil NT 3000 o similar.	M	$ 156.147,00	15333,05	$ 2.394.209.758,35	0	$ 0,00	0	$ 0,00	15333,0	$ 2.394.209.758,35
3,04	Construcción de filtro de Drenaje. Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 3", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar	M	$ 156.147,00	15333,05		0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
4	**MURO GAVIONES**		**$ 1.616.114,65**		**$ 160.321.032,72**				**$ 0,00**		**$ 160.321.032,72**
4,01	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	M3	$ 8.744,00	338,24	$ 2.957.570,56	0	$ 0,00	0	$ 0,00	338,24	$ 2.957.570,56
4,02	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado. (Distancia de transporte aprox. 85 Km. Aprox.) A distancia mayor del acarreo libre (90 m), en sitio autorizado por la entidad ambiental competente	M3	$ 153.629,00	133,54	$ 20.515.616,66	0	$ 0,00	0	$ 0,00	133,54	$ 20.515.616,66
4,03	Relleno en recebo común. (Suministro e instalación. Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	M3	$ 240.042,00	75	$ 18.003.150,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	75	$ 18.003.150,00
4,04	Concreto. Resistencia 14 Mpa. (G) (Ciclópeo)	M3	$ 546.701,00	25,5	$ 13.940.875,50	0	$ 0,00	0	$ 0,00	25,5	$ 13.940.875,50
4,05	Gaviones de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1. Recubrimiento de Zinc. (galvanizado).	M3	$ 333.028,00	315	$ 104.903.820,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	315	$ 104.903.820,00
4,06	Conformación de Muro con Geocontainer - Geotextil 2,20 x 1,10 x 0,60 = 1,45 m³ (HYDROBLOCK o equivalente). Incluye lleno con material de sitio, compactación manual y cierre.	M	$ 333.970,65			0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
SUBTOTAL DE OBRA					**$ 11.309.167.409,78**		**$ 0,00**		**$ 391.741.676,00**		**$ 10.917.425.732,24**
	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y SST	1,81%			**$ 204.695.930,00**		**$ 0,00**		**$ 7.090.524,00**		**$ 197.605.406,00**
	IMPLEMENTACIÓN DE PMT	0,78%			**$ 88.211.506,00**		**$ 0,00**		**$ 3.055.585,00**		**$ 85.155.921,00**
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19	0,20%			**$ 22.618.335,00**		**$ 0,00**		**$ 783.483,00**		**$ 21.834.851,00**
TOTALES					**$ 11.624.693.181,00**		**$ 0,00**		**$ 402.671.268,00**		**$ 11.222.021.910,24**
PORCENTAJE EJECUCIÓN ACUMULADA							**0,00%**		**3,46%**		**96,54%**
AMORTIZACION ANTICIPO		20%	$ 2.324.938.636,00				**$ 0,00**		**$ 80.534.254,00**		**$ 2.244.404.382,00**
AMORTIZACION EN GARANTÍA (NO APLICA)											
TOTAL, NETO A PAGAR									**$ 322.137.014,00**		**$ 8.977.617.528,24**

Para el presente periodo, se encuentra en revisión el acta parcial N°3 , se espera se revise en su totalidad y se valide en campo.

4.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria y equipo destinados a la ejecución de las obras:

Tabla 18 Maquinaria y Equipo Contrato 478

N°	TIPO DE EQUIPO	EQUIPO MÍN. REQUERIDO	CANT.	MARCA	MODELO	CAPACIDAD	COMENTARIOS
	EQUIPO PARA ACTIVIDADES EN OBRA						
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Para el presente periodo no se evidenció maquinaria, dado que el contratista no realzó actividades de obra

4.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA

4.4.1 Control de personal de obra

En la siguiente tabla se registran los datos del personal mínimo requerido y el personal dispuesto para el desarrollo del contrato de obra:

Tabla 19 Control Personal en Obra Contrato 478

LISTADO PERSONAL EN OBRA					
No.	**NOMBRE**	**CC**	**CARGO**	**INGRESO**	**RETIRO**
1	Luis Orlando Pulido	79,554,518	Director	5/04/2025	No Aplica
2	Paul Alberto Rangel Páez	88,002,563	Residente SST	5/04/2025	No Aplica
3	Cesar Augusto Delgado	1,022,324,860	Residente Ambiental	5/04/2025	No Aplica
4	Jhon Gabriel Yate Botache	1,098,648,719	Residente Técnico	12/05/2025	No Aplica
5	Maximino Becerra Yacumal	4,743,041	Topógrafo	9/04/2025	No Aplica
6	Andrés Alberto García Posada	79,756,111	Residente Social	12/05/2025	No Aplica
7	Wilson Orlando Rodríguez Sanabria	74,334,263	Cadenero	5/04/2025	No Aplica
8	Arístires Pardo Niño	13,526,015	Oficial de Obra	6/04/2025	No Aplica
9	John Jairo Guerrero Cabrera	79,183,755	Conductor	12/05/2025	No Aplica
10	William Hernández Ortega	1,000,464,177	Ayudante de Obra	5/05/2025	No Aplica
11	Katherine Tovar	1,010,220,888	Talento Humano	5/05/2025	No Aplica

LISTADO PERSONAL EN OBRA					
No.	**NOMBRE**	**CC**	**CARGO**	**INGRESO**	**RETIRO**
12	Leidy Johana Bastidas Arévalo	1,016,078,304	Secretaria	5/05/2025	No Aplica
13	Walter Andrés Albino Beltrán	1.013.627.988	Conductor	10/06/2025	No Aplica
14	Liz Maribel Murillo Naranjo	1.054.709.749	Profesional SISOMA	10/06/2025	No Aplica
15	Junior Yesid Rodríguez Jiménez	1.192.924.869	Conductor	24/06/2025	No Aplica
16	Osman Andrés Camacho González	14.327.218	Conductor	24/06/2025	No Aplica

Durante el presente periodo, el contratista de obra adelantó actividades correspondientes a la instalación del cerramiento provisional, con el fin de delimitar y facilitar el replanteo del tramo correspondiente a Laguna Verde. Estas labores hacen parte de las actividades preliminares requeridas para la correcta ejecución del proyecto.

Se prevé que, para el siguiente periodo, el contratista inicie la ejecución de actividades de mayor representatividad presupuestal dentro del contrato, asociadas a componentes estructurales hidráulicos y de avance físico significativo.

4.4.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra

Lo relacionado al control de aportes legales y de seguridad social se encuentra en el anexo N°4 .C informe SST de interventoría.

4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

4.5.1 Informe financiero y presupuestal

Para respaldar las obligaciones contraídas, la entidad contratante cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 921 del 17 de septiembre de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, del cual se reservará la suma de $ 11.624.693.181,00, del rubro 00AR-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ.

Lo anterior según lo estipulado en el Contrato de obra N° 478. de 2021 en el parágrafo primero de la cláusula séptima.

Tabla 20 Vigencias del Contrato

VIGENCIA	VALOR
2022	11.624.693.181,00
Valor Contrato	11.624.693.181,00

4.5.2 Forma de pago del contrato

Conforme con lo establecido en el Contrato de Obra, en su Cláusula octava – Forma de Pago, el valor del contrato se pagará así:

"*El proceso de selección es a precios unitarios sin formula de reajuste, teniendo en cuenta que, las cantidades de obra pueden variar de acuerdo con las intervenciones requeridas en cada tramo vial establecido de acuerdo al grupo, según sea determinado en la revisión a los diseños entregados, producto realizado previo al inicio de la ejecución de las obras.".*
Se pagarán al contratista las sumas a las que se refiere el valor del contrato así:

A.) Etapa de Construcción: *"Se ordenará el pago al contratista hasta el 95% del valor total de la etapa de construcción del contrato, pago que se hará mediante acta parciales de obra mensualmente; el saldo del 5% del valor total de la etapa de construcción será pagado contra la suscripción del acta de liquidación del contrato.".*

"Parágrafo 1: Por ser la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, designada como ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías, en función del Acuerdo 099 de 31 de diciembre de 2019, expedido por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la Región Centro Oriente, deberá hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR, para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas, directamente desde la cuenta única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales.".

4.5.3 Actas de recibo parcial de obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las actas de recibo parcial de obras:

Tabla 21 Actas de Recibo Parcial de Obras

N°	FECHA	PERÍODO	COSTO DIRECTO	VALOR COMPONENTES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL PAGADO
1	14/12/2022	AGOSTO A OCTUBRE 2022	$ 391.741.676,00	$ 10.929.592,00	$ 402.671.268,00	$ 80.534.254,00	$ 322.137.014,00

N°	FECHA	PERÍODO	COSTO DIRECTO	VALOR COMPONENTES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL PAGADO
2	14/12/2022	ENERO A 21 ABRIL 2023	$ 571.370.780,00	$ 0,00	$ 571.370.780,00	$ 114.274.156,00	$ 457.096.624,00
TOTAL			**$ 963.112.456,00**	**$ 10.929.592,00**	**$ 974.042.048,00**	**$ 194.808.410,00**	**$ 779.233.638,00**

Mediante oficio 186-1-162, del 22 de diciembre de 2022, la interventoría dio concepto favorable al Acta parcial 1 de obra presentada por el consorcio Gaviones 95, por un valor de $ 402.671.268. (periodo de agosto a octubre de 2022).

El día 27 de septiembre de 2024, se firmó el acta N°14 donde se da aval para el pago del acta de recibo parcial N°2 donde se reconocen las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 1de enero al 21 de abril del año 2024, por un valor de $ 457.096.624,00.

4.6 ANTICIPO DE OBRA

4.6.1 Datos generales del anticipo de obra

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de obra otorgado:

Tabla 22 Generales del Anticipo de Obra

ANTICIPO CONTRATO INICIAL	
Valor total anticipo	$ 2.324.938.636
Valor retenido por la entidad	$ 211.569.146,00
Valor ingresado al Fideicomiso	$ 2.113.369.220,00
Porcentaje	20%
Entidad Fiduciaria	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S. A
Nombre del Fideicomiso	Consorcio Gaviones 95
Fecha desembolso anticipo	Septiembre de 2022
Fecha de cierre del Fideicomiso	Aún está abierto

4.6.2 Órdenes de pago o de giro

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las órdenes de pago o de giro aprobadas:

Tabla 23 Órdenes de Pago o de Giro

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
ORDEN DE OPERACIÓN No 1	25/10/2022	RENTAL EP SAS	$ 303,530,069.00	1	No de Factura y fecha: Factura de venta 132 del 29/09/2023 y Factura de venta 133 del 29/09/2023. Factura de compra P001-81 del 30/09/2022 y factura de compra P001-80 del 30-09-2023 del consorcio Gaviones 95. Factura relacionada a orden de pago 288448-1 de Alianza fiduciaria. Concepto: Transporte y alquiler de maquinaria	En revisión mediante ofidio 186-0-16 del 18/10/2022.
ORDEN DE OPERACIÓN No 2	25/10/2022	CONSORCIO GAVIONES 95	$ 295,930,079.00	2	No de Factura y fecha: Factura de venta N°. 415 del 28/09/2022 de OMR Ingeniería y comercia y Factura de compra P-001-45 del Consorcio Gaviones 95 el 28/09/2022. Factura relacionada a orden de pago 288448-2 de Alianza fiduciaria. Concepto: Reembolso- Material hidráulico Geotextil y tubería	Aprobado mediante ofidio 186-0-16 del 18/10/2022.
ORDEN DE OPERACIÓN No 3	25/10/2022	CEMEX COLOMBIA	$ 100,000,000.00	2	No de Factura y fecha: Factura proforma 80029369625-6825445224 del 27/09/2022 de CEMEX Factura relacionada a orden de pago 288448-5 de Alianza fiduciaria. Concepto: Reembolso- Anticipo concreto y cemento	Aprobado mediante ofidio 186-0-16 del 18/10/2022.
ORDEN DE OPERACIÓN No 4	28/10/2022	CANTERA VILLA PAULA	$ 50,000,000.00	2	No de Factura y fecha: Factura proforma FPF-RC-93 del 26/09/2022 Factura relacionada a orden de pago 289948 de Alianza Concepto: Materiales- Anticipo triturado.	Aprobado mediante ofidio 186-0-16 del 18/10/2022.
ORDEN DE OPERACIÓN No 5	25/10/2022	CONSTRITURAR SAS	$ 10,000,000.00	2	No de Factura y fecha: Factura proforma N°. 198 de 2022 de 09/09/2022, Factura relacionada a orden de pago 289448-3 de Alianza Concepto: Materiales-anticipo granulares. (suministro de agregados pétreos)	Aprobado mediante ofidio 186-0-16 del 18/10/2022.
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	28/10/2022	CONSORCIO GAVIONES 95	$ 304,084,508.00	2	No de Factura y fecha: Orden de compra N°. 2. del 02/06/2022 de ALR Group SAS, Concepto: Tubería de 36" No de Factura y fecha: FPF-RC-88 del 19/06/2022 de Cantera Villa Paula SAS, Concepto: Triturado. No de Factura y fecha: FPF-RC-93 del 09/09/2022 de Cantera Villa Paula SAS, Concepto: Triturado. No de Factura y fecha: FPF-RC-93 del 28/09/2022 de Cantera Villa Paula SAS, Concepto: Triturado. No de Factura y fecha: FPF-RC-93 del 30/09/2022 de Cantera Villa Paula SAS, Concepto: Triturado. No de Factura y fecha: FPF-RC-107 del 10/10/2022 de Cantera Villa Paula	

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
					SAS, Concepto: Triturado. No de Factura y fecha: ODC 022 del 23/09/2022 de Cemex de Colombia SA Concepto: Concreto y cemento. No de Factura y fecha: ODC 025 del 10/10/2022 de Cemex de Colombia SA Concepto: Concreto y cemento. No de Factura y fecha: ODC 027 del 27/10/2022 de Tecnología de polietileno de Colombia SA. Concepto: Tubo alcantarillado 36" Factura relacionada a orden de pago 28102022 del 28/10/2022 de Alianza	
ORDEN DE OPERACIÓN No 7	28/10/2022	CEMEX COLOMBIA	$ 100,000,000.00	2	No de Factura y fecha: Proforma 80030488536-6926843674 del 28/10/2022, Factura relacionada a orden de pago 28102022 del 28/10/2022 de Alianza Concepto: Materiales-anticipo concreto y cemento. (cemento súper resistente y derecho a escombreras).	
ORDEN DE OPERACIÓN No 8	28/10/2022	CONSTRITURAR SAS	$ 10,000,000.00	2	No de Factura y fecha: Factura proforma N°. 207 de 2022 del 01/10/2022. Factura relacionada a orden de pago 28102022 del 28/10/2022 de Alianza Concepto: Materiales-anticipo granulares (Agregados pétreos)	
TOTAL			**$ 1,173,544.656,00**			

La interventoría realizará el seguimiento a los desembolsos del anticipo solicitados por el contratista firmando las órdenes de pago que estén acordes con el plan de inversión actualizado y aprobado, y con el lleno de los requisitos de los soportes correspondientes.

4.6.3 Plan de inversión del anticipo vs inversión del anticipo

A continuación, se relaciona el plan de inversión del anticipo del contra Nº 478:

Tabla 24 Plan de Inversión del Anticipo VS Inversión Anticipo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO 21 de octubre de 2022. 186-0-006		ACUMULADO TOTAL INVERSIÓN	SALDO
		%	Valor		
1	**Transporte y alquiler de maquinaria**	30.9	$ 718,406,039.00	$ 303.530.069,00	$ 414.875.970,00
2	**Materiales**	60	$ 1,394,963,181.00	$ 870.014.587,00	$ 524.948.594,00
	SUBTOTAL		**$ 2,113,369,220.00**	**$ 1,173.544.656,00**	**$ 939.824.564,00**
	Descuento entidad por contribución especial y estampillas	9.1	$ 211,569,416.00		
	TOTAL	100	**$ 2,324,938,636.00**		

4.6.4 Reintegro de rendimientos financieros

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses financieros generados y su respectiva devolución o reintegro a la entidad:

Tabla 25 Rendimientos financieros Anticipo de Obra

N°	PERIODO CAUSADO	CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA Nº04000003568	VALOR GIRO REALIZADO	FECHA DE GIRO
1	sep-22	$ 938.188,27	$ 938.188,27	11-oct-22
2	oct-22	$ 1.027.591,05	$ 1.027.591,05	9-nov-22
3	nov-22	$ 385.777,52	$ 385.777,52	7-dic-22
4	dic-22	$ 326.776,52	$ 326.776,52	10-ene-23
5	ene-23	$ 150.365,96	$ 150.365,96	7-feb-23
6	feb-23	$ 135.854,95	$ 135.854,95	8-mar-23
7	mar-23	$ 150.435,49	$ 150.435,49	12-abr-23
8	abr-23	$ 145.589,59	$ 145.589,59	11-may-23
9	may-23	$ 150.438,15	$ 150.438,15	16-jun-23
10	jun-23	$ 145.599,88	$ 145.599,88	24-jul-23
11	jul-23	$ 150.459,33	$ 150.459,33	31-ago-23
12	ago-23	$ 150.471,58	$ 150.471,58	29-sep-23
13	sep-23	$ 145.612,84	$ 145.612,84	17-oct-23
14	oct-23	$ 150.444,28	$ 150.444,28	22-nov-23
15	nov-23	$ 145.599,80	$ 145.599,80	19-feb-24
16	dic-23	$ 150.467,08	$ 150.467,08	19-feb-24
17	ene-24	$ 150.518,10	$ 150.518,10	19-feb-24

N°	PERIODO CAUSADO	CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA Nº04000003568	VALOR GIRO REALIZADO	FECHA DE GIRO
18	abr-24	$ 72.969,90	N/A	30-abr-24
19	may-24	$ 75.414,84	N/A	31-may-24
20	jun-24	$ 72.994,30	N/A	30-jun-24
21	jul-24	$ 77.413,33	$ 296.780,00	31-jul-24
22	ago-24	$ 78.152,14	$ 75.413,00	31-ago-24
23	sep-24	$ 72.968,70	N/A	N/A
24	oct-24	$ 75.394,43	$ 148.365,00	31-oct-24
25	nov-24	$ 72.963,02	$ 77.332,02	30-nov-24
26	dic-24	$ 75.389,19	$ 74.891,30	31-dic-24
27	ene-25	$ 75.394,84	$ 77.420,07	31-ene-25
28	feb-25	$ 68.095,48	$ 77.426,10	28-feb-25
29	mar-25	$ 75.393,78	$ 70.096,90	31-mar-25
	Total	**$ 5.492.734,34**	**$ 5.497.914,78**	
		Total, rendimiento	**$ 5.497.914,78**	

4.6.5 Amortización del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones de anticipo deducidas de las actas de recibo parcial de obras:

Tabla 26 Amortización Anticipo Contrato de Obra 478

VALOR CONTRATO	VALOR ANTICIPO	VALOR ACTA PARCIAL Nº 1	VALOR AMORTIZACIÓN
$11.624.693.108.51	$ 2,324,938,636.00	$ 402.671.268	$ 80.534.254
TOTAL			**$ 80.534.254**

4.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El reporte del estado del tiempo se encuentra de manera general para los frentes de obra en el numeral 7.3 del presente informe.

4.8 FUENTE DE MATERIALES

Durante el presente periodo, el contratista de obra adelantó actividades correspondientes a la instalación del cerramiento provisional, con el fin de delimitar y facilitar el replanteo del tramo correspondiente a Laguna Verde. Estas labores hacen parte de las actividades preliminares requeridas para la correcta ejecución del proyecto.

Se prevé que, para el siguiente periodo, el contratista inicie la ejecución de actividades de mayor representatividad presupuestal dentro del contrato,

asociadas a componentes estructurales hidráulicos y de avance físico significativo.

4.9 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el presente periodo, el contratista de obra adelantó actividades correspondientes a la instalación del cerramiento provisional, con el fin de delimitar y facilitar el replanteo del tramo correspondiente a Laguna Verde. Estas labores hacen parte de las actividades preliminares requeridas para la correcta ejecución del proyecto.

Se prevé que, para el siguiente periodo, el contratista inicie la ejecución de actividades de mayor representatividad presupuestal dentro del contrato, asociadas a componentes estructurales hidráulicos y de avance físico significativo.

4.10 SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente periodo y con fecha de corte del 30 de junio de 2025, el contrato 478 de 2022, el contratista de obra adelantó actividades correspondientes a la instalación del cerramiento provisional, con el fin de delimitar y facilitar el replanteo del tramo correspondiente a Laguna Verde. Estas labores hacen parte de las actividades preliminares requeridas para la correcta ejecución del proyecto.

Se prevé que, para el siguiente periodo, el contratista inicie la ejecución de actividades de mayor representatividad presupuestal dentro del contrato, asociadas a componentes estructurales hidráulicos y de avance físico significativo.

4.11 PROGRAMA DE OBRA Y DE INVERSIONES

Con fecha 1 de abril de 2025, se reanudó el contrato de obra No. 478-2022, una vez superadas las causales que motivaron su suspensión. En dicha fecha, la interventoría remitió al contratista el Acta de Reinicio del contrato mediante la comunicación No. 186-1-638, en la cual se le solicitó retomar las actividades contractuales y allegar documentos esenciales para la ejecución, tales como la programación actualizada de obra, los documentos de ingreso del personal, y la actualización de pólizas y vigencias, entre otros.

Durante el periodo evaluado, el Consorcio Gaviones 95 ha realizado únicamente actividades preliminares, sin dar inicio a las actividades principales de obra, a pesar de no existir impedimentos para su ejecución. En consecuencia, mediante comunicación No. 186-1-687 del 3 de junio de 2025, la interventoría reiteró la importancia de remitir la documentación requerida y de avanzar con la ejecución contractual. Hasta la fecha del presente informe, el contratista no ha cumplido con el envío de la documentación solicitada ni ha iniciado las actividades de obra previstas.

4.12 ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y DE INVERSIONES

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes al resumen del avance financiero de las obras ejecutadas a la fecha:

Tabla 27 Avance del Contrato 478

Valor total del contrato:	$ 11.624.693.181,00	Programado o ejecutado MES	Programado o ejecutado ACUMULADO
Fecha de corte datos:	No aplica a la fecha		
PROGRAMADO / EJECUTADO			
Obra Programada	**Porcentaje**	No aplica a la fecha	91%
	Valor		$ 10.597.511.958,83
Obra Ejecutada	**Porcentaje**		8,84%
	Valor		$ 1.027.181.221,68
		Adelanto / Atraso	82,16% Atraso

El atraso que presenta contrato 478, es imputable al contratista dado que se reinició el contrato de obra el día 1 de abril de 2025, a la fecha del presente informe no ejecuto ni realizó actividades durante el periodo.

4.13 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA

4.13.1 Actas de comité de obra o actas de reunión

En la siguiente tabla se registran las diferentes reuniones y comités llevados a cabo durante el período:

Tabla 28 Actas de Comité de Obra y Reuniones

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTA N°	**FECHA**	**TEMAS TRATADOS**
N/A	N/A	– N/A

Para el presente periodo, no se presentaron actividades de obra, por esto, no se realizaron comités de obra.

4.13.2 Bitácora de obra

Durante el presente periodo, el contratista de obra adelantó actividades correspondientes a la instalación del cerramiento provisional, con el fin de delimitar y facilitar el replanteo del tramo correspondiente a Laguna Verde. Estas labores hacen parte de las actividades preliminares requeridas para la correcta ejecución del proyecto.

Se prevé que, para el siguiente periodo, el contratista inicie la ejecución de actividades de mayor representatividad presupuestal dentro del contrato, asociadas a componentes estructurales hidráulicos y de avance físico significativo.

Bitácora de obra Anexo 1.A

4.14 GESTIÓN AMBIENTAL

El seguimiento a la gestión ambiental se encuentra anexa al numeral N°.4A

4.15 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)

El seguimiento a la gestión ocupacional se encuentra anexa al numeral N°.4B

4.16 GESTIÓN SOCIAL

El seguimiento a la gestión social se encuentra anexa al numeral N°.4C

4.17 ESTADO DEL CONTRATO

Estado del contrato 478 del 20/05/2022: Para el presente periodo y con fecha de corte del 30 de junio de 2025, el contrato 478 de 2022,el contratista de obra adelantó actividades correspondientes a la instalación del cerramiento provisional, con el fin de delimitar y facilitar el replanteo del tramo correspondiente a Laguna Verde. Estas labores hacen parte de las actividades preliminares requeridas para la correcta ejecución del proyecto.

Se prevé que, para el siguiente periodo, el contratista inicie la ejecución de actividades de mayor representatividad presupuestal dentro del contrato, asociadas a componentes estructurales hidráulicos y de avance físico significativo.

5 CONTRATO DE OBRA Nº. 479 DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Datos del contrato 479 del 10/02/2022.

A continuación, se observan las generalidades del contrato 479 Consorcio Estabilización Vial:

Tabla Suscripción, Legalización, Plazo y Valor CTO 479

ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
CONTRATO DE OBRA N°:	**COP- 479 del 10/02/2022**
OBJETO:	"Contrato para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto " mejoramiento de vías terciarias en Bogotá", del sistema general de regalías - SGR identificado con código BPIN 2018000050020 (san Antonio ii (k6+910-k0+000), unión tunales y animas bajas.").
PROCESO DE SELECCIÓN N°:	LP – 006 – 2021
DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL**
NIT:	**901.563.835-7**
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	- MAQUINAS AMARILLAS S.A.S (70%) NIT 901.460.130-0
	- TERRABLANCA S.A.S (30%) NIT 900.459.311-1
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	Carrera 17 N° 142 – 25 BOGOTA D.C.
TELÉFONO:	601-7023060
MODIFICATORIO N°.1	El párrafo segundo de la Cláusula Cuarta del Contrato 479 de 2022 - Plazo del Contrato y se adiciona un parágrafo más, estableciéndose de la siguiente manera:
	"El contrato consta de dos (2) tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, las cuales podrán realizarse de manera simultánea. Parágrafo 1. Los tramos o kilómetros que pasen a etapa de obra deberán contar con las respectiva apropiación y validación propia de las actividades de preconstrucción".
OTROS DATOS DEL CONTRATO	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/02/2022
FECHA DE INICIO ETAPA PRECONSTRUCCION	3 de marzo de 2022
VALOR INICIAL:	$ 12.494.588.139,00 Incluido IVA sobre utilidad
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 12.494.588.139,00 Incluido IVA sobre utilidad
PLAZO INICIAL:	Once (11) meses
PRORROGA Nº. 1	Dos (2) meses y quince (15) días
PLAZO TOTAL ACTUALIZADO PORROGA 1.	Trece (13) meses y quince (15) días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 de febrero de 2023

FECHA INICIO CONTRUCCIÓN	18 de julio de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	14 de abril de 2023 dos (02) mes.
AMPLIACIÓN 1 - SUSPENSIÓN 1	UN (01) MES
AMPLIACIÓN 2- SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS
AMPLIACIÓN 3- SUSPENSIÓN 1	TREINTA Y DOS (32) DÍAS
AMPLIACIÓN 4- SUSPENSIÓN 1	DIECISÉIS (16) DÍAS
AMPLIACIÓN 5- SUSPENSIÓN 1	SIETE (7) DÍAS
AMPLIACIÓN 6- SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS
REINICIO N° 1	10 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA N°. 2	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2024
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE AGOSTO DE 2024
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES Y DIECISÉIS (16) DIAS PARTIR DEL 17 DE AGOSTO AL 2 DE OCTUBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES Y VEINTICINICO (25) DIAS A PARTIR DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE ENERO DE 2025
AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES A PARTIR DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2025
AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE ABRIL DE 2025
REINICIO N° 2	1 DE ABRIL DE 2025
PRÓRROGA N° 3	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO ACTUALIZADO	VEINICUATRO (24) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	9 DE COTUBRE DE 2025
VALOR ANTICIPO:	Hasta un 20% del valor básico del contrato
INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S
SUPERVISOR:	UAERMV

5.1.2 Pólizas o garantías del contrato de obra

El contratista otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:

Tabla 29 Datos de las Pólizas Contrato 479

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**NACIONAL DE SEGUROS**			
AMPARO	**PÓLIZA N°**	**CERTIFICADO O ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**EXPEDIDA / MODIFICADA SEGÚN**
CUMPLIMIENTO	400038644	0	23-feb-22	Contrato

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**NACIONAL DE SEGUROS**			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	0	23-feb-22	Contrato
CUMPLIMIENTO	400038644	2	26-abr-22	Acta inicio
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	2	26-abr-22	Acta inicio
CUMPLIMIENTO	400038644	3	21-jul-22	Modificación N°. 1 y prórroga N°. 1 13/07/2022
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	3	21-jul-22	Modificación N°. 1 y prórroga N°. 1 13/07/2022
CUMPLIMIENTO	400038644	4	27-abr-23	Suspensión N°. 1 - 14/04/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	4	27-abr-23	Suspensión N°. 1 - 14/04/2023
CUMPLIMIENTO	400038644	5	18-ago-23	Ampliación 1,2 ,3 y 4 a la suspensión
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	5	22-ago-23	Ampliación 1,2 ,3 y 4 a la suspensión
CUMPLIMIENTO	400038644	7	13-oct-23	Prorroga N°. 2
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	7	13-oct-23	Prorroga N°. 2
CUMPLIMIENTO	400038644	11	4-abr-25	Reinicio 2
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	400038646	10	4-abr-25	Reinicio 2
CUMPLIMIENTO	400038644	15	12-jun.25	Prórroga N°3
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	11	12-jun.25	Prórroga N°3

Las pólizas actualizadas de acuerdo al reinicio del contrato se encuentran en el anexo 2.A

Tabla 30 Pólizas Actualizadas a la Fecha Contrato 479

AMPARO	**REQUISITOS CONTRACTUALES**		**DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA**		
	Vigencia contractual	**% contra**	**Desde**	**Hasta**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO					
a). Cumplimiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	10%	3-mar-22	9-feb-26	$ 1.249.458.813,90
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	100%	3-mar-22	9-feb-26	$ 2.498.917.627,80

AMPARO	REQUISITOS CONTRACTUALES		DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA		
	Vigencia contractual	% contra	Desde	Hasta	Valor asegurado
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Plazo del contrato y tres (3) años más.	5%	3-mar-22	9-ago-26	$ 624.729.406,95
d). Estabilidad y calidad de las obras.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.	20%	26-jun-24	9-ago-30	$ 2.498.917.627,80
RESPONSABILIDAD CIVIL					
a). Predios labores y operaciones	Igual al período de ejecución del contrato.	5%	15-sep-23	9-ago-28	624,729,407.00
b). Contratistas y subcontratistas	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			312,364,703.00
c) Perjuicios extrapatrimoniales	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			312,364,703.00
d) Responsabilidad civil patronal	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			312,364,703.00
e) Vehículos propios y no propios	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			312,364,703.00

5.1.3 Otrosí, Adición y prórroga

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosíes, adiciones en valor y prórrogas al contrato de Obra 479:

Tabla 31 Otrosíes y Adiciones Contrato de Obra 479

DOCUMENTO	FECHA	PRORROGA	VALOR	MOTIVO
MODIFICACIÓN Nº 1 y PRORROGA Nº 1 de 2022	13/07/2022	2 meses y 15 días	N/A	Modificar el párrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato prorrogar el plazo del contrato
MODIFICACIÓN Nº 2 y PRORROGA Nº 2 de 2022	10/10/2023	8 meses y 15 días	N/A	Modificar el párrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato prorrogar el plazo del contrato

MODIFICACIÓN N°3	30/11/2023	N/A	N/A	Modificar el formulario 1. Propuesta Económica Grupo 2.
PRÓRROGA N°3	09/06/2025	2 meses	N/A	Modificar el párrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato prorrogar el plazo del contrato

El día 9 de junio de 2025, se dio aprobación a la prórroga del contrato N°3 por un plazo de 2 meses, anexo 2.A

5.1.4 Suspensiones y reinicios al contrato de obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las suspensiones y/o reinicios al CONTRATO DE OBRA 479:

Tabla 32 Suspensiones y Reinicios Contrato de Obra 479

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión / Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento	Suspensión	Suspensión			
Suspensión N°.1	-	21-abr-23	21-abr-23	20-jun-23	DOS (2) MESES	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°1	20-jun-23	21-jun-23	20-jul-23	UN (1) MES	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°2	19-jul-23	21-jul-23	31-jul-23	ONCE (11) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°3	1-ago-23	1-ago-23	31-ago-23	TREINTA Y UN (31) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°4	30-ago-23	1-sep-23	1-oct-23	TREINTA Y UN (31) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico.
Suspensión N°.1	Ampliación N°5	29-sep-23	2-oct-23	23-oct-23	VEINTIDÓS (22) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico.

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión / Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento	Suspensión	Suspensión			
Suspensión N°.1	Ampliación N°6	23-oct-23	24-oct-23	6-nov-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°7	3-nov-23	7-nov-23	20-nov-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°8	20-nov-23	21-nov-23	4-dic-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°9	4-dic-23	5-dic-23	4-feb-24	DOS (2) MESES		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Reinicio N°1	N/A	5-feb-24	N/A	N/A	N/A	5-feb-24	Se superan las causales que dieron lugar a la suspensión N° 1.
Suspensión N°2	-	17-abr-24	17-abr-24	17-jun-24	DOS (2) MESES	17/06/2024	Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión N°2	Ampliación N°1	17-jun-24	17-jun-24	17-ago-24	DOS (2) MESES		No se superan los motivos que motivaron la suspensión del contrato
Suspensión N°2	Ampliación N°2	1-ago-24	17-ago-24	1-oct-24	UN (1) MES Y DIECISÉIS DÍAS		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión N°2	Ampliación N°3	1-oct-24	1-oct-24	1-nov-24	UN (1) MES		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión N°2	Ampliación N°4	1-nov-24	1-nov-24	21-ene-25	DOS (2) MESES y VEITE (20) DÍAS		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión / Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento	Suspensión	Suspensión			
Suspensión N°2	Ampliación N°5	24-ene-25	21-ene-25	21-feb-25	UN (1) MES		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión N°2	Ampliación N°6	22-feb-25	21-feb-25	1-abr-25	UN (1) MES Y DIEZ DÍAS	1-abr-25	Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Reinicio N°2	N/A	1-abr-24	N/A	N/A	N/A	1-abr-24	Se superan las causales que dieron lugar a la suspensión N°.2

5.1.5 Actas de Modificaciones de Cantidades de obra

Durante el desarrollo del contrato no se realizaron modificaciones de cantidades de obra al contrato Nº. 479.

Tabla 33 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obra

ACTA MODIFICATIVA N°	FECHA	MOTIVO			
		AJUSTE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	ÍTEMS NO PREVISTOS	ADICIONAL EN VALOR	COMENTARIOS
Balance N°1 cantidades	17-oct-23	Se realiza ajuste de las cantidades de acuerdo a la inclusión de ítems no previstos	Se realiza inclusión de ítems no previstos dado que se presentaron actividades en obra no contempladas	N/A	Se realiza inclusión de ítems no previstos, se realiza el balance de obra N° 1 dada la necesidad del ajuste a los precios de acuerdo con el índice de costos de la construcción de obras civiles esta actualización se realiza cada mes calendario

5.1.6 Ítems o precios no previstos

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a la incorporación de ítems o precios no previstos inicialmente en la propuesta económica precontractual del contrato de obra 479:

Tabla 34 Ítem o Precios No Previstos

Acta de precios no previstos						
Ítem	**Descripción**	**Un**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Valor total**	**Acta de modificación N°.**
NP-2	Construcción de filtro de Drenaje. Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar.	ml	11.215,22	$ 206.609,00	$ 2.317.165.389,00	N° 1
NP-3	Excavación Manual Zanjas (Incluye acarreo al acopio)	m3	417,56	$ 42.380,00	$ 17.696.193,00	N° 1
NP-4	Excavaciones varias en roca. Incluye cargue	m3	388,53	$ 89.661,00	$ 34.835.988,00	N° 1
NP-5	Limpieza de alcantarillas (incluye limpieza de tubería de 24", limpieza de descoles en una longitud de máximo 5 metros, incluye cargue de material) (No incluye transporte ni disposición en sitio autorizado).	UND.	59	$ 65.709,00	$ 3.876.831,00	N° 1
NP-6	Limpieza de alcantarillas (incluye limpieza de tubería de 36", limpieza de descoles en una longitud de máximo 5 metros, incluye cargue de material) (No incluye transporte ni disposición en sitio autorizado).	UND.	41	$ 148.414,00	$ 6.084.974,00	N° 1
NP-7	Limpieza y rocería de cunetas en tierra	m2	10.983,00	$ 2.612,00	$ 28.687.596,00	N° 1
NP-8	Traslado de cerca en alambre púas, incluye remoción de cerca, instalación parcial e instalación definitiva.	ml	14.704,19	$ 9.809,00	$ 144.233.430,00	N° 1
NP-9	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión de tipo manto temporal	m2	756,5	$ 33.808,00	$ 25.575.752,00	N° 1
NP-10	Disposición de escombros (RCD) en sitio autorizado	Viaje (12m3)	Por definir en Obra	$ 115.577,00	Por definir en Obra	N° 1
NP-11	Construcción para Berma/Cuenta tipo 1. Área transversal 0,14m2. Resistencia concreto 3500psi	ml	9.049,12	$ 155.086,00	$ 1.403.391.824,00	N° 1
NP-12	Construcción para Berma/Cuenta tipo 2. Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi	ml	1.476,00	$ 180.584,00	$ 266.542.524,00	N° 1

Para el presente periodo se tiene pendiente la aprobación de los ítems no previstos por parte de la Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación Y Mantenimiento Vial.

5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO Y ACUMULADAS

5.2.1 Etapa de Preconstrucción

En la siguiente tabla se mencionan actividades realizadas en la etapa de preconstrucción.

Tabla 35 Documentación Organizativa Inicial

REQUERIMIENTO	**REFERENCIA CONTRACTUAL**	**ESTADO DEL DOCUMENTO**
CEV/22-143	INFORME DEFINITIVO D6E APROPIACION DE DISEÑOS N°. 03 TRAMOS 1,2,3,4,5,8 Y 9	El 12 enero de 2023, hacen entrega del informe definitivo de apropiación de los diseños de los tramos No 1 al 5 Sector Tunales, 8 y 9 San Antonio y Animas Bajas. Teniendo en cuenta los diseños suministrados por la UAERMV. En el cual el Consorcio describe el resultado de la revisión de los diseños, los ajustes propuestos y los anexos correspondientes

5.2.2 Etapa de construcción

En la siguiente tabla se registran las actividades de obra de construcción del CONTRATO DE OBRA 479.

Tabla 36 Actividades de Construcción Contrato 479

UBICACIÓN / ABCISADO	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS**
San Antonio, vereda El Toldo	K4+828 a K4+852 Alistamiento nivelación y compactación de B-200 en Berma- Cuneta. K4+585 a K4+564 Alistamiento nivelación y compactación en Berma-cuneta. K2+239 Limpieza de encole por lluvias en izaje de acero de refuerzo. K1+550 Disposición y acopio de acero para armado de estructura de encole * Se realiza alistamiento de 5 módulos intermedios en ingreso a finca. . K0+850 a k0+865.	Se realizan construcción de filtro con instalación de geotextil NT 2500, tubería perforada 4", relleno con material drenante 1"-3". Se realizó excavación mecánica para filtros Se realiza replanteo, excavaciones para filtros de las abscisas hasta, Se realizó excavación y retiro de material para la construcción de cunetas. Excavación para filtro 48*1,24*0,60 desde la abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde izquierdo. Instalación de geotextil, tubo perforado, material pétreo filtrante para filtro 48*1,24*0,60 desde la

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	* Se realiza el alistamiento y nivelación del área para los módulos de las cunetas. Esta actividad se realizó entre k1+175 a k1+200. Se arma un total de 14 módulos. * Se realiza lijado y resane de frontales en hombros de cunetas k1+020 a k1+050. K4+529 a K4+563 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en berma-cuneta. K4+525 a K4+500 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta K2+150 Instalación de formaleta K2+150 Armado de acero depara encole. K2+239 Instalación de concreto In situ para base de estructura de encole.(La actividad no se pudo ejecutar el 02-07 se funde el 03-07) K2+831 Limpieza y aseo de encole. K4+634 a K4+592 Instalación de concreto en sitio para 9 módulos de cuneta. K4+741 a K4+677 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en berma-cuneta. K1+550 Revoque de porosidad en alcantarilla. K4+644 a K4+638 Instalación de concreto en sitio para 2 módulos de cuneta. K4+884 a K4+898 Instalación de concreto en sitio para 4 módulos de cuneta. K4+722 a K4+741 Instalación de concreto en sitio para 5 módulos de cuneta. K4+679 a K4+681 Instalación en sitio para 1 módulo de cuneta. K2+150 Reparación tabla-estacado y desarme de acero. K1+550 Revoque de porosidad en alcantarilla K4+860 a K4+815 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en berma cuneta K2+150 Amado de acero en encole. K1+550 Revoque de porosidad en alcantarilla. K0+020 Figurado de acero para encoles.	abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde izquierdo. Sello de filtro con b-200 88*0,60*0,20 desde la abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde izquierdo. Excavación para filtro 48*1,24*0,60 desde la abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde izquierdo. Instalación de geotextil, tubo perforado, material pétreo filtrante para filtro 48*1,24*0,60 desde la abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde borde izquierdo. Sello de filtro con b-200 88*0,60*0,20 desde la abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde izquierdo. instalación de geotextil, tubo perforado, material pétreo filtrante para filtro 48*1,24*0,60 desde la abscisa K1+400 a la abscisa K1+335 borde izquierdo. Perfilación de Berna-Cuneta, retiro de remanente de fresado estabilizado de la abscisa K4+800 a la K4+680 , conformación de rasante. Extendido y compactación material de relleno B - 200 para conformación de cuneta de la abscisa K5+410 a la K+340. Se realizan trabajos de mejoramiento al material granular instalado de B-200 con el fin de alistar segmento libre para fundir cunetas. Sobre el K2+150 donde está ubicada la alcantarilla se trabajó en la protección de entibados de laterales, Se fundió placa de descarga en la alcantarilla . Se realizan trabajos de instalación de formaleta para fundir cunetas, limpieza de formaletas. Instalación de concreto reforzado para cuneta en concreto de 3.000 psi en sitio sobre el K+238, K5+225,K5+216. Sobre la abscisa K2+150 en la alcantarilla descole costado derecho de la vía continúan trabajos de figuración y amarre de acero para aletas.

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
Unión Tunales K0+150 a K2+271 y K2+270 a K2+395		Se hizo excavación para filtro y Se inició lleno del filtro. Se realiza instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k0+120 al k0+250 costado izquierdo. Se realiza instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k0+110 al k2+270 costado derecho.
Unión Tunales K1+554	* Se realiza alistamiento de 5 módulos intermedios en ingreso a finca. . K0+850 a k0+865. * Se realiza el alistamiento y nivelación del área para los módulos de las cunetas. Esta actividad se realizó entre k1+175 a k1+200. Se arma un total de 14 módulos. * Se realiza lijado y resane de frontales en hombros de cunetas k1+020 a k1+050. * Se realiza fundida de 5 módulos intermedios en ingreso a finca. . K0+850 a k0+865. * Se realiza la fundida de 5 módulos entre k1+175 a k1+195. Se revisa el alistado, acero y espesor de concreto. * Se realiza el alistado de 13 módulos entre k1+205 a k1+255. Se revisa el alistado, acero y espesor de concreto y alineación.	Se realizó figurado del acero para la estructura del encole y descole de la alcantarilla ubicada en la abscisa. Se funde la estructura del encole de la alcantarilla ubicada en la abscisa k1+554 Se realiza revisión de excavación para construcción de filtro desde la abscisa K1+165-k1+285 Se realiza revisión de excavación para construcción de filtro desde la abscisa K1 +355-k1+290 costado izquierdo Instalación de geotextil, tubo perforado y material pétreo desde la abscisa k1+200 a la abscisa k1+155. Instalación de geotextil, tubo perforado y material pétreo para construcción de filtro desde la abscisa k1+155 a la abscisa k1+100.
Unión Tunales K2+395		Se realizó armado y figurado de acero de la alcantarilla. Se fundió la zapata de la estructura del encole de la alcantarilla ubicada en la alcantarilla de la abscisa k2+395. Se termina con la instalación de la formaleta de aletas de descole de la alcantarilla k2+395 del tramo 1 y se funde en concreto de 3500 psi Excavación en borde de vía para la construcción de cuneta desde la abscisa K2+290 hasta la abscisa K2+330 Instalación de acero y formaleta desde la abscisa K2+205 a la K2+270, instalación de concreto borde derecho. Vaciado de concreto para construcción de cuneta desde la abscisa k2+395 hasta la abscisa k2+360 borde izquierdo. Perfilado y compactación para construcción de cunetas desde la abscisa k2+390 hasta la abscisa k2+435 borde izquierdo y derecho. Vaciado de concreto para construcción de cunetas en intermedios de la abscisa k2+390 a la abscisa k2+420 costado derecho.

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
		Vaciado de concreto para construcción de cunetas intercaladas desde la abscisa k2+390 hasta la abscisa k2+420 costado derecho. Desencofrado de formaleta para construcción de cuneta desde la abscisa k2+530 a la abscisa k2+545 borde izquierdo. Desencofrado de formaleta para construcción de cuneta desde la abscisa k2+530 a la abscisa k2+579 borde derecho. Excavación y replanteo para construcción de cunetas desde la abscisa k2+590 hasta la abscisa k2+620 Instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k2+576 al k2+590 costado izquierdo. Instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k2+580 al k2+590 costado derecho. Tramo 2: * se instalan formaletas de los módulos de cunetas(12 und). Se recomienda realizar buen manejo de aguas para evitar pérdida de finos en módulos ya compactados. K0+800-k0+880. * Se realiza alistamiento de intermedios para posterior fundida. * K0+800-k0+880. * Después de la inspección realizada en campo, se aprueban 12 cunetas(módulos), para su vaciado de concreto. * Se realiza el vaciado con concreto de 12 módulos de cunetas. * Se realiza alistamiento de 10 módulos para vaciado de concreto desde K0+800 hasta K0+870. * Se realiza el vaciado con concreto a 16 módulos de cunetas. * Se realiza el retiro de 9 módulos ya fundidos y se realiza aplicación de antisol para su curado. K0+750 a k0+780. * Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos del k0+800 al K0+880 * Se lleva a cabo compactación de base mejorada, según recomendación de interventoría Tramo 1 instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k2+735 al k2+775 costado izquierdo. instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k2+742 al k2+775 costado derecho.
Unión Tunales T1	* Se realiza corte de carpeta de fresado para instalación de módulos.	Se realiza instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
K0+000 a K2+951.39 T2 K0+000 a K2+042,66 T3 K0+000 a K0+254,009 T4 K0+000 a K0+703,08 T5 K0+000 a K1+667,17	Esta actividad se realiza con ayuda del minicargador. De k1+265 a k1+300. * Se realiza fundida de 13 módulos entre k1+205 a k1+255. Se revisa el alistado, acero, espesor de concreto y alineación. * Se realiza corte de carpeta de fresado para instalación de módulos. Esta actividad se realiza con ayuda del minicargador. De k1+295 a k1+320.	berma cuneta intercalada desde el k0+120 al k0+250 costado izquierdo. Se realiza instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k0+110 al k2+270 costado derecho. Se realiza excavación, instalación de geotextil, instalación de tubo perforado e instalación de material pétreo filtrante para construcción de filtro desde la abscisa k0840 a la abscisa k0+920 costado izquierdo. Se realiza excavación, instalación de geotextil, instalación de tubo perforado e instalación de material pétreo filtrante para construcción de filtro desde la abscisa k0+920 a la abscisa k0+950 costado izquierdo. Se realiza revisión de nivelación de material pétreo para construcción de filtro desde la abscisa K0+735-k0+860 lado izquierdo. Se realiza revisión por parte de topografía de nivelación de material pétreo para construcción de filtro desde la abscisa K0+000-k0+045 costado izquierdo. Se realiza revisión por parte de topografía de nivelación de material pétreo para construcción de filtro desde la abscisa K0+860-k0+980 costado izquierdo. Se realizó armado y figurado de acero de la alcantarilla. Se fundió la zapata de la estructura del encole de la alcantarilla ubicada en la alcantarilla de la abscisa K2+395. Se termina con la instalación de la formaleta de aletas de descole de la alcantarilla K2+395 del tramo 1 y se funde en concreto de 3500 PSI Se realizo levantamiento topográfico para verificación de la adaptación del diseño geométrico K0+ 890, realizando limpieza y alistando pista para la construcción de cunetas. Limpieza, excavación y compactación con apisonador desde K2+145 hasta K2+160 Excavación desde la abscisa K0+160 hasta la abscisa K0+240 Excavación y replanteo para cuneta desde la abscisa K2+175 hasta la abscisa K2+205 borde Izquierdo, Se dejó una ventana desde la abscisa K2+165 hasta la abscisa K2+175 Vaciado de concreta cuneta borde derecho desde la abscisa K0+065 hacia mayores intercalado cada dos metros. Excavación desde la abscisa K0+340 hasta la abscisa K0+365 Este tramo se realizó con martillo neumático. Y pasando el puente desde la abscisa K0+380 hasta la abscisa K0+420

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
		Excavación para construcción de filtro desde la abscisa k0+950 hasta la abscisa k0+895. Instalación Geotextil, Instalación tubo perforado, instalación Material pétreo filtrante desde la abscisa K0+740 a la K0+765. Construcción de filtro, excavación, instalación de geotextil, instalación de tubo perforado e instalación de material pétreo desde la abscisa k1+400 a la abscisa k1+345 costado derecho. Limpieza de alcantarilla en la abscisa k0+130.

5.2.3 Valores ejecutados

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los valores contractuales actualizados, valores ejecutados en el período, valores acumulados y los saldos:

Tabla 37 Valores Ejecutados Contrato 479

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	$ 8.948,00	432,07	$ 3.866.162,36	524,74	$ 4.695.373,52	956,81	$ 8.561.535,88
A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	$ 157.212,00	432,07	$ 67.926.588,84	524,74	$ 82.495.424,88	956,81	$ 150.422.013,72
A29	Retiro de tubería. Incluye cargue, retiro y disposición en sitio autorizado.	m	$ 595.728,00	16,5	$ 9.829.512,00		$ 0,00	16,5	$ 9.829.512,00
A27	Relleno en recebo común (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	m3	$ 245.641,00	163,273	$ 40.106.739,53	89,74	$ 22.043.823,34	253,0138001	$ 62.150.562,87
A10	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado D=36" (900mm).	m	$ 1.774.025,00	59	$ 104.667.475,00	39	$ 69.186.975,00	98	$ 173.854.450,00
A14	Demolición de estructuras en concreto reforzado. Incluye cargue y retiro a sitio autorizado.	m3	$ 284.706,00	27,11	$ 7.718.379,66		$ 0,00	27,11	$ 7.718.379,66
A18	Concreto de limpieza grava común. Resistencia 2000 PSI (14 Mpa). Incluye transporte, suministro, colocación y curado.	m3	$ 720.491,00		$ 0,00	1,12	$ 806.949,92	1,12	$ 806.949,92
A20	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)	m3	$ 559.452,00	41,93	$ 23.457.822,36		$ 0,00	41,93	$ 23.457.822,36

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
A16	Acero de refuerzo; incluye Suministro, Figurado y Fijación.	Kg	$ 7.811,00	9179,19	$ 71.698.653,09	1576,4	$ 12.313.260,40	10755,59	$ 84.011.913,49
A02	Junta fría en estructuras de concreto e=25cm. Incluye adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido y la instalación de cinta PVC para sellar e impermeabilizar juntas frías en estructuras de concreto.	m	$ 51.072,00	105,9	$ 5.408.524,80	4	$ 204.288,00	109,9	$ 5.612.812,80
A01	Concreto para Alcantarilla. Resistencia 24,5Mpa hasta 28Mpa (3500psi - 4000psi).	m3	$ 894.878,00	85,33	$ 76.359.939,74	54,97	$ 49.191.443,66	140,3	$ 125.551.383,40
	CUNETAS								
A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	$ 8.948,00	3851,48	$ 34.463.043,04	498,45	$ 4.460.130,60	4349,93	$ 38.923.173,64
A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	$ 157.212,00	5103,35	$ 802.307.860,20	782,07	$ 122.950.788,84	5885,42	$ 925.258.649,04
A27	Relleno en recebo común (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	m3	$ 245.641,00	3477,19	$ 854.140.428,79	1166,29	$ 286.488.641,89	4643,48	$ 1.140.629.070,68
A16	Acero de refuerzo; incluye Suministro, Figurado y Fijación.	Kg	$ 7.811,00	8052,46	$ 62.897.765,06	10070,6	$ 78.661.456,60	18123,06	$ 141.559.221,66

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
A03	Construcción de Berma/Cuneta de 0,70m de ancho y espesor 0,20m, en Concreto reforzado de 3500 psi; no incluye acero de refuerzo, incluye corte de dilatación cada 2,00m, suministro, instalación y conformación de la superficie de apoyo.	m	$ 152.726,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
	SUBDRENES								
A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	$ 8.948,00	2056,58	$ 18.402.277,84	315,91	$ 2.826.762,68	2372,49	$ 21.229.040,52
A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	$ 157.212,00	4441,43364	$ 698.246.665,41	753,87	$ 118.517.410,44	5195,30364	$ 816.764.075,85
A03	Construcción de filtro de Drenaje. Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 3", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar.	m	$ 159.789,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
	MURO GAVIONES								
A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	$ 8.948,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	$ 157.212,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
A27	Relleno en recebo común (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	m3	$ 245.641,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
A20	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)	m3	$ 559.452,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
A19	Gaviones de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	$ 340.796,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS								
NP-2	Construcción de filtro de Drenaje. Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar.	ml	$ 206.609,00	9328,4	$ 1.927.331.395,60	1875,28	$ 387.449.725,52	11203,68	$ 2.314.781.121,12
NP-3	Excavación Manual Zanjas (Incluye acarreo al acopio)	m3	$ 42.380,00	343,06	$ 14.538.882,80	329,47	$ 13.962.938,60	672,53	$ 28.501.821,40
NP-4	Excavaciones varias en roca. Incluye cargue	m3	$ 89.661,00	3636,72	$ 326.071.951,92	721,58	$ 64.697.584,38	4358,3	$ 390.769.536,30

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NP-5	Limpieza de alcantarillas (incluye limpieza de tubería de 24", limpieza de descoles en una longitud de máximo 5 metros, incluye cargue de material) (No incluye transporte ni disposición en sitio autorizado).	UND.	$ 65.709,00	12	$ 788.508,00		$ 0,00	12	$ 788.508,00
NP-6	Limpieza de alcantarillas (incluye limpieza de tubería de 36", limpieza de descoles en una longitud de máximo 5 metros, incluye cargue de material) (No incluye transporte ni disposición en sitio autorizado).	UND.	$ 148.414,00	2	$ 296.828,00		$ 0,00	2	$ 296.828,00
NP-7	Limpieza y rocería de cunetas en tierra	m2	$ 2.612,00	7058,26	$ 18.436.175,12		$ 0,00	7058,26	$ 18.436.175,12
NP-8	Traslado de cerca en alambre púas, incluye remoción de cerca, instalación parcial e instalación definitiva.	ml	$ 9.809,00	2578,64	$ 25.293.879,76		$ 0,00	2578,64	$ 25.293.879,76
NP-9	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión de tipo manto temporal	m2	$ 33.808,00	100	$ 3.380.800,00	1850	$ 62.544.800,00	1950	$ 65.925.600,00
NP-10	Disposición de escombros (RCD) en sitio autorizado	Viaje	$ 115.577,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
NP-11	Construcción para Berma/Cuenta tipo 1. Área transversal 0,14m2. Resistencia concreto 3500psi	ml	$ 155.086,00	1396,6	$ 216.593.107,60	2231,86	$ 346.130.239,96	3628,46	$ 562.723.347,56
NP-12	Construcción para Berma/Cuenta tipo 2. Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi	ml	$ 180.584,00	466	$ 84.152.144,00		$ 0,00	466	$ 84.152.144,00

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
SUBTOTAL DE OBRA		**$ 12.155.451.055,00**			$ 5.498.381.510,52		$ 1.729.628.018,23		$ 7.228.009.528,75
	GESTION AMBIENTAL	1,81%	$ 220.013.664,10		$ 63.200.303,44		$ 31.306.267,13		$ 94.506.570,57
	IMPLEMENTACIÓN DE PMT	0,78%	$ 94.812.518,23		$ 27.235.489,89		$ 13.491.098,54		$ 40.726.588,43
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19	0,20%	$ 24.310.902,11		$ 2.770.973,56				$ 2.770.973,56
TOTALES		**$ 12.494.588.139,43**			**$ 5.591.588.277,00**		**$ 1.774.425.384,00**		**$ 7.366.013.661,00**
PORCENTAJE EJECUCIÓN ACUMULADA					**44,75%**		**14,20%**		**58,95%**
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR									**41,05%**
AMORTIZACION ANTICIPO		20%	$ 2.498.917.627,89		$ 1.118.317.655,00		$ 354.885.077,00		$ 1.473.202.732,00
Total pagado después de amortización					$ 4.473.270.622,00		$ 1.419.540.307,00		$ 5.892.810.929,00

Para el presente periodo se presenta un avance financiero acumulado del 58,95%, se encuentra en revisión el acta N°7 y se vienen llevando a cabo mesas de trabajo entre CEV , UAERMV y la Interventoría .

5.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria y equipo destinados a la ejecución de las obras:

Tabla 38 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 479

N°	TIPO DE EQUIPO	Equipo mín. requerido	CANT.	MARCA	MODELO	CAPACIDAD	COMENTARIOS
1	ESTACIÓN TOTAL	SI	1	HITARGET	HTS-420R S/N: H232590	N/A	CALIBRACIÓN VIGENTE HASTA 3-09-2025
2	NIVEL AUTOMÁTICO	SI	1	TOPCON	AT-B4A S/N: JY5238	N/A	CALIBRACIÓN VIGENTE HASTA 23-10-2025

5.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA

5.4.1 Control de personal de obra

En la siguiente tabla se relaciona el personal que se presentó cambio o modificación para el reinicio de actividades de obra:

Tabla 39 Control de Personal de Obra

Personal CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL			
N°	**NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA**	**N° IDENTIFICACION**	**CARGO**
1	Ing. Hernando Laverde	1,032,362,624	Director de obra
2	Ing. Alejandra Cangrejo	1.020.732.799	Coordinadora de proyectos
3	Ing. Richard Betancourt Rodríguez	1.069.751.169	Residente técnico
4	Gloria Liliana Sepúlveda Garzón	52.499.577	Coordinadora HSEQ
5	Elvia Alejandra Limas Plazas	11.022.351.286	Profesional Social
6	Lorena Andrea Gómez Ramírez	1.032.388.748	Profesional ambiental
7	Luis David Franco Muñoz	1.010.233.913	Ing. Topógrafo
8	Francisco Javier Molina Rey	1.003.486.864	Aux. cadenero
9	Francy Yolima Sanabria Penagos	1.001.170.073	Aux. de operaciones
10	Diana Cristina Avellaneda Hernández	1.002.548.039	Aux. de operaciones
11	Marly Yudeyby Cruz Guzmán	1.003.671.153	Aux. de operaciones
12	Elvia María Camargo López	1.023.029.173	Aux. de operaciones
13	Hermes Guerrero Vargas	79.815.760	Operario de minicargador
14	Ferney Castro	12.277.155	Operario de minicargador

Personal CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL			
N°	**NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA**	**N° IDENTIFICACION**	**CARGO**
15	Jorge Leonardo Tejedor Aguilar	1.055.552.094	conductor de volqueta
16	Rafael Niño Galindo	3125436	conductor de volqueta
17	Pablo David Plazas Novoa	79.583.074	conductor de volqueta
18	Julián Mauricio Preciado Mosos	1110466774	Supervisor de obra
19	Sebastián Perilla Castiblanco	1007912209	Supervisor de obra
20	Cesar Agusto Moscote Polo	1079934649	Maestro de obra
21	Luis Alfredo Moscote Polo	1079937109	Oficial
22	Leonel Saavedra Reyes	13959536	Oficial
23	Duván Alexander Peñaloza Valbuena	10075190465	Ayudante de obra
24	Manuel Darío Saumeth Pardo	1120738400	Ayudante de obra
25	Samuel Delgado Naranjo	1.007.297.818	Ayudante de obra
26	Yulian David Romero Poveda	1022946347	Ayudante de obra
27	Edison Ancizar Díñate Susa	1023036214	Ayudante de obra
28	Habiasney Pineda Cruz	1069230764	Ayudante de obra
29	Lenin José Moscote Polo	1128178531	Ayudante de obra
30	Libier Duván Ramírez Robayo	1022925239	Ayudante de obra
31	Luis Hernando Ramirez Peñaloza	3125436	Ayudante de obra
32	Anderson Fabian Runza Susa	1069751058	Ayudante de obra
33	Miller Andrés Ramírez Peñaloza	3125370	Ayudante de obra
34	José Yeferson Viuche Viuche	1006093160	Ayudante de obra
35	Julián Manuel Quiroga Palacios	1001287552	Ayudante de obra
36	Elkin Steven Caro Peñaloza	1032656213	Ayudante de obra
37	Edgar Mancilla Salas	91447428	Laboratorista
38	Luis Fernando Acevedo Pulido	1031170075	Operario

5.4.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra

Para el presente periodo, el contratista remitió las planillas de seguridad social, esta se encuentra en revisión

5.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

5.5.1 Informe financiero y presupuestal

Para respaldar las obligaciones contraídas, la entidad contratante cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 921 del 17 de septiembre de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, del cual se reservará la suma de $12.494.588.139, del rubro 00AR-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ.

Lo anterior según lo estipulado en el Contrato de obra No 479 de 2021 en el parágrafo primero de la cláusula séptima.

Tabla 40 Vigencias del Contrato de Obra

VIGENCIA	VALOR
2022	12.494.588.139,00
Valor Contrato	12.494.588.139,00

5.5.2 Forma de pago del contrato

Conforme con lo establecido en el Contrato de Obra, en su Cláusula OCTAVA – Forma de Pago, el valor del contrato se pagará así:

"El presente proceso de selección es a precios unitarios sin formula de reajuste, teniendo en cuenta que, las cantidades de obra pueden variar de acuerdo con las intervenciones requeridas en cada tramo vial establecido de acuerdo al grupo, según sea determinado en la revisión a los diseños entregados, producto realizado previo al inicio de la ejecución de las obras.".

"Se pagarán al contratista las sumas a las que se refiere el valor del contrato así: A.) Etapa de Construcción: Se ordenará el pago al contratista hasta el 95% del valor total de la etapa de construcción del contrato, pago que se hará mediante acta parciales de obra mensualmente; el saldo del 5% del valor total de la etapa de construcción será pagado contra la suscripción del acta de liquidación del contrato.".

"Parágrafo 1: Por ser la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, designada como ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías, en función del Acuerdo 099 de 31 de diciembre de 2019, expedido por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la Región Centro Oriente, deberá hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR, para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas, directamente desde la cuenta única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales.".

5.5.3 Actas de recibo parcial de obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las actas de recibo parcial de obras.

Tabla 41 Actas de Recibo Parcial de Obras

ACTA N°	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO ACTA
Nº.1	$ 524.185.578,30	$ 104.837.115,66	$ 419.348.462,64
Nº.2	$ 597.781.674,00	$ 119.556.335,00	$ 478.225.339,00

ACTA N°	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO ACTA
Nº.3	$ 302.174.608,00	$ 60.434.922,00	$ 241.739.686,00
Nº.4	$ 2.006.652.038,00	$ 401.330.408,00	$ 1.605.321.630,00
Nº.5	$ 257.878.866,00	-	$ 257.878.866,00
Nº.6	$ 2.160.794.379,00	$ 432.158.876,00	$ 1.728.635.503,00
Nº.7	$ 336.780.963,00	-	$ 336.780.963,00
Nº.8	$ 1.743.119.117,00	$ 348.623.823,00	$ 1.394.495.294,00
Nº.9	$ 286.398.725,00	-	$ 286.398.725,00
Nº.10	$ 572.278.107,00	$ 114.455.621,00	$ 457.822.486,00
TOTAL	**$ 8.788.044.055,30**	**$ 1.581.397.100,00**	**$ 7.206.646.954,64**

Para el presente periodo se presenta un avance financiero acumulado del 58,95%, se encuentra en revisión el acta N°7 y se vienen llevando a cabo mesas de trabajo entre CEV , UAERMV y la Interventoría .

5.6 ANTICIPO DE OBRA

5.6.1 Datos generales del anticipo de obra

En la siguiente tabla se muestra los datos del anticipo:

Tabla 42 Datos Generales del Anticipo

ANTICIPO CONTRATO INICIAL	
Valor total anticipo	$ 2.498.917.628
Valor retenido por la entidad	$ 227.516.124
Valor ingresado al Fideicomiso	$ 2.271.516.124
Porcentaje	20%
Entidad Fiduciaria	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S. A
Nombre del Fideicomiso	15192
Fecha desembolso anticipo	21 ABRIL DE 2021
Fecha de cierre del Fideicomiso	Cerrado

5.6.2 Órdenes de pago o de giro

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las órdenes de pago o de giro aprobadas:

Tabla 43 Órdenes de Pago o Giro

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	19/10/2022	MEXICHEM COLOMBIA SAS	$ 45,981,600.00	3	No de Factura y fecha: WBG14415 de 29/07/2022 Concepto: Geotextil no tejido 2500 3.5	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	19/10/2022	MEXICHEM COLOMBIA SAS	$ 16,553,376.00	3	No de Factura y fecha: WBG14522 de 03/08/2022 Concepto: Geotextil no tejido 2500 3.5	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	19/10/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 519,022,906.45	3	No de Factura y fecha: Cuenta de cobro 01/08/2022 Concepto: FC FEFB20936 HIERRO FIGURADO 3/8348939FC FEFB20960 HIERRO FIGURADO 3/81724846701FC NAC007001 DRAINPIPE 4"HD/2LARGO (m):50/100ALTO FC FEFB21149 HIERRO RECTO 1/22022-0998 OC MAQ2804	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	19/10/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 68,421,000.00	1	No de Factura y fecha: 3584 de 05/09/2022 Concepto: Servicio de transporte por carretera Bogotá anticipo del 20% transporte de material y escombro contrato N°. 479.	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	19/10/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 43,337,711.00	2	No de Factura y fecha: 3584 de 05/09/2022 Concepto: Servicio	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
					de alquiler de maquinaria y equipo.	octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 7	18/10/2022	TERRABLANCA S.A.S	$ 27,455,185.00	3	No de Factura y fecha: Factura 1464 de 10/05/2022 Concepto: Tubo alcantarillado 900mm SN-4 HEDPE	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 8	19/10/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 104,124,125.00	3	No de Factura y fecha: Factura de venta 1472 del 31/05/2022, TECNOLOGÍA DE POLIETILENO DE COLOMBIA. No de Factura y fecha: Factura de venta 1471 del 26 de mayo de 2022, TECNOLOGÍA DE POLIETILENO DE COLOMBIA. No de Factura y fecha: FACTURA ELECTRÓNICA 2028143881 de 03/08/2022 Concepto: Reembolso tubería alcantarillado, y cemento.	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 8	19/10/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 12,000,000.00	4	No de Factura y fecha: Cuenta de cobro del 18/07/2022 Concepto: ANTICIPO AL SUBCONTRATO DE OBRA No SCO-007-2022, EL CUAL TIENE COMO OBJETO MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS TALES COMO ALCATARILLAS, CUNETAS Y SUBDRENES PARA LOS TRAMOS 1 AL 3 PARA EL	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
					DESARROLLO DEL CONTRATO No 479 de 2022 Contrato proveedor: SCO 007-2022	
ORDEN DE OPERACIÓN No 9	25/11/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 309,301,480.00	2	No de Factura y fecha: 3727 del 04/11/2022 Concepto: Alquiler de maquinaria y equipo para el contrato 479 de 2022. Contrato proveedor: SCO 008-2022, SCO 010-2022	APROBADA - oficio 186-0-019 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 9	25/11/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 572,269,480.00	1	No de Factura y fecha: 3730 del 08/11/2022 Concepto: Transporte de material de construcción y excavación contrato No 479 de 2022. Contrato proveedor: SCO 009-2022	APROBADA - oficio 186-0-019 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 9	25/11/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 198,833,171.00	3	No de Factura y fecha: Factura 3729 del 04 de noviembre de 2022. Concepto: Suministro de materiales para el contrato 479	APROBADA - oficio 186-0-019 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 9	25/11/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 137,077,400.00	3	No de Factura y fecha: Cuenta de cobro del 09/09/2022, Factura E56657 del 23/09/2022 Concepto: Reembolso de costos/gastos correspondientes	APROBADA - oficio 186-0-019 - 11 de octubre del 2022

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
					al periodo de agosto de 2022, concepto: SISMO R 1/2 x 12 m (Varillas de 7" pulgada)	
ORDEN DE OPERACIÓN No 9	25/11/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 75,153,376.00	3	No de Factura y fecha: Cuenta de cobro 10 de octubre de 2022, factures 2116 del 12/09/2022, 2153 del 22/09/2022 y 2217 del 13/10/2022 Construtriturar SAS Concepto: Reembolso de material Triturado de 1.5" y de 2"a 3"	APROBADA - oficio 186-0-019 - 11 de octubre del 2022
TOTAL			**$2.129.530.810,45**			

La interventoría realizará el seguimiento a los desembolsos del anticipo solicitados por el contratista firmando las órdenes de pago que estén acordes con el plan de inversión actualizado y aprobado, y con el cumplimiento de los requisitos de los soportes correspondientes.

5.6.3 Plan de inversión anticipo vs inversión del anticipo

Se relaciona en la siguiente tabla la inversión y saldos que quedan del anticipo a corte del presente Informe:

Tabla 44 Plan de Inversión del Anticipo VS Inversión Anticipo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN APROBADO 04 DE ENERO DE 2023 186-0-026		ACUMULADO TOTAL INVERSIÓN	SALDO
		%	VALOR		
1	**Transporte de material**	28.2	$ 640.690.480	$ 640.690.480	$ 0
2	**Alquiler de maquinaria y equipos**	15.5	$ 352.639.191	$ 352.639.191	$ 0
3	**Compra de materiales y accesorios**	50.3	$ 1.143.651.595	$ 1.124.201.139,45	$ 19.450.455,55
4	**Pago de salarios y jornales**	6	$ 134.534.858	$ 12.000.000	$ 122.534.858

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN APROBADO 04 DE ENERO DE 2023 186-0-026		ACUMULADO TOTAL INVERSIÓN	SALDO
		%	VALOR		
	SUB TOTAL	**N/A**	**$ 2.271.516.124**	**$ 2.129.530.810**	**$ 141.985.314**
	Descuento entidad por contribución especial y estampillas	**N/A**	**$ 227.401.504**	**$ 227.401.504**	**$ 0**
	TOTAL		**$ 2.498.917.628**	**$ 2.356.932.314**	**$ 141.985.314**

5.6.4 Reintegro de rendimientos financieros

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses financieros generados y su respectiva devolución o reintegro a la entidad:

Tabla 45 Rendimientos Financieros Anticipo de Obra

PERIODO CAUSADO	CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA Nº04000003568	VALOR GIRO REALIZADO	FECHA DE GIRO
ago-22	$ 1.129.431,87	$ 1.129.431,87	7-sep-22
sep-22	$ 1.210.245,49	$ 1.210.245,49	7-oct-22
oct-22	$ 1.057.632,62	$ 1.057.632,62	4–nov-22
nov-22	$ 618.912,62	$ 618.912,62	13-dic-22
dic-22	$ 37.556,13	$ 37.556,13	6-ene-23
ene-23	$ 37.496,36	$ 37.496,36	6-feb-23
feb-23	$ 33.867,41	$ 33.867,41	3-mar.23
mar-23	$ 37.495,37	$ 37.495,37	4-abr-23
abr-23	$ 36.286,08	$ 36.286,08	5-may-23
may-23	$ 37.496,01	$ 37.496,01	6-jun-23
jun-23	$ 36.286,56	$ 36.286,56	5-jul-23
jul-23	$ 37.495,70	$ 37.495,70	8-ago-23
ago-23	$ 37.496,67	$ 37.496,67	5-sep-23
sep-23	$ 36.286,09	$ 36.286,09	9-oct-23
oct-23	$ 37.496,90	$ 37.496,90	3-nov-23
nov-23	$ 36.285,47	$ 36.285,47	4-dic-23
dic-23	$ 31.482,75	$ 31.482,75	24-ene-24
ene-24	$ 7,90	$ 7,90	31-ene-24
TOTAL	$ 4.489.258,00	$ 4.489.258,00	
TOTAL RENDIMIENTO		$ 4.489.258,00	

5.6.5 Amortización del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones de anticipo deducidas de las actas de recibo parcial de obras:

Tabla 46 Amortización Anticipo Contrato de Obra

ACTA N°	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO ACTA
Nº.1	$ 524.185.578,30	$ 104.837.115,66	$ 419.348.462,64
Nº.2	$ 597.781.674,00	$ 119.556.335,00	$ 478.225.339,00
Nº.3	$ 302.174.608,00	$ 60.434.922,00	$ 241.739.686,00
Nº.4	$ 2.006.652.038,00	$ 401.330.408,00	$ 1.605.321.630,00
Nº.5	$ 257.878.866,00	-	$ 257.878.866,00
Nº.6	$ 2.160.794.379,00	$ 432.158.876,00	$ 1.728.635.503,00
Nº.7	$ 336.780.963,00	-	$ 336.780.963,00
Nº.8	$ 1.743.119.117,00	$ 348.623.823,00	$ 1.394.495.294,00
Nº.9	$ 286.398.725,00	-	$ 286.398.725,00
Nº.10	$ 572.278.107,00	$ 114.455.621,00	$ 457.822.486,00
TOTAL	**$ 8.788.044.055,30**	**$ 1.581.397.100,00**	**$ 7.206.646.954,64**

5.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El reporte del estado del tiempo se encuentra de manera general para los frentes de obra en el numeral 7.3 del presente informe.

5.8 FUENTE DE MATERIALES

Las fuentes de los materiales dispuestos en obra por el CEV, son de proveedores y escombreras que figuran en el directorio de proveedores de materiales de construcción, por lo anterior cuentan con la respectiva Licencia Ambiental y Permiso Minero para desarrollar la actividad.

Para el presente periodo ingresaron los siguientes materiales en el desarrollo del contrato de la obra:

Tabla 47 Fuente materiales CEV

CONSOLIDADO DE MATERIAL USADO EN OBRA						
ITEM	**RAZON SOCIAL**	**CATEGORIA**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25						
1	AGREGADOS DE ORIENTE SAS	**Agregados pétreos**	Arena	30	49,466	RES 500.41-17-0120 Corporinoquia de 26/01/2017 Registro Minero: EXP:IGJ-08051X hasta 02/02/2045
2		**Agregados pétreos**	Grava	30	49,466	

CONSOLIDADO DE MATERIAL USADO EN OBRA						
ITEM	**RAZON SOCIAL**	**CATEGORIA**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
TOTAL				**60**	**98,931**	
may-25						
1	AGREGADOS DE ORIENTE SAS	**Agregados pétreos**	Arena	30	49,466	RES 500.41-17-0120 Corporinoquia de 26/01/2017 Registro Minero: EXP:IGJ-08051X hasta 02/02/2045
2		**Agregados pétreos**	Grava	30	49,466	
3	MAQUINAS AMARILLAS	**Agregados pétreos**	Recebo	60	98,931	Informe Técnico 00259 de 2022 Rad.2022IE24021 Informe Técnico 00876 de 2025 Rad 2025IE59007. Rad 2019EE100840
TOTAL				**180**	**296,793**	
jun-25						
1	AGREGADOS DE ORIENTE SAS	**Agregados pétreos**	Arena	60	98,931	RES 500.41-17-0120 Corporinoquia de 26/01/2017 Registro Minero: EXP:IGJ-08051X hasta 02/02/2045
2		**Agregados pétreos**	Grava	60	98,931	
3	MAQUINAS AMARILLAS	**Agregados pétreos**	Recebo	15	24,733	Informe Técnico 00259 de 2022 Rad.2022IE24021 Informe Técnico 00876 de 2025 Rad 2025IE59007. Rad 2019EE100840
TOTAL				**150**	**247,328**	

De la tabla anterior se actualizan los datos faltantes a cerca del material usado en obra.

5.9 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el presente periodo y en vista del reinicio del contrato, Consorcio Estabilización Vial viene llevando a cabo actividades de construcción de cunetas y de excavaciones para filtros, estos documentos serán remitidos y plasmados para el siguiente informe.

Los ensayos tomados en el presente periodo son:

Resultados de las tomas de densidades de campo por medio del método cono y arena en el Tramo 2 unión tunales y en el tramo 9 san Antonio el toldo. Durante este periodo se realizaron pruebas de densidades en tramo 2 por el método de cono y arena en el tramo comprendido desde la abscisa K0+705 hasta la abscisa K0+942 por el borde Izquierdo, ubicado en el tramo 2 Unión Tunales.

También se realizaron pruebas de densidades en tramo 9 por el método de cono y arena en el tramo comprendido desde la abscisa K5+145 hasta la abscisa K5+410 por el borde Derecho, ubicado en el tramo 9 San Antonio el toldo.

5.10 SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente periodo se vienen realizando actividades para el tramo de san Antonio y Unión tunales de los cuales se indica el % de ejecución:

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A
TRAMO SAN ANTONIO	71,00%	51,08%	-19,92%
TRAMO UNIÓN-TUNALES	71,00%	51,08%	-19,92%

5.11 PROGRAMA DE OBRA Y DE INVERSIONES

Al corte del presente informe se viene haciendo seguimiento al cronograma de obra de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico, para el presente periodo se actualiza el programa de obra e inversiones adaptado para la terminación de obra con fecha del 9 de agosto del año 2025.

5.12 ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y DE INVERSIONES

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes al resumen del avance financiero de las obras ejecutadas a la fecha:

Tabla 48 Avance del Contrato 479

Valor total del contrato:	$ 12.494.588.139,00		
Fecha de corte datos:	31-may-2025	Programado o ejecutado	Programado o ejecutado
PROGRAMADO / EJECUTADO		MES	ACUMULADO
Obra Programada	Porcentaje		71,2%
	Valor		$ 8.896.146.754,97
Obra Ejecutada	Porcentaje		96,8%
	Valor		$ 12.091.012.942,11
		Adelanto / Atraso	25,6%

El atraso presentado a la anterior tabla obedece a la necesidad de implementar ítems no previstos para la culminación de las obras por parte del consorcio Estabilización Vial.

5.13 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA

5.13.1 Actas de comité de obra o actas de reunión

En la siguiente tabla se registran las diferentes reuniones y comités llevados a cabo durante el período:

Tabla 49 Actas de Comité de Obra

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
N°	**FECHA**	**TEMAS TRATADOS**
68	5-jun-25	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes - Estado actas parciales del contrato
69	13-jun-25	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes
70	19-jun-25	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes - Estado actas parciales del contrato
71	27-jun-25	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes - Estado actas parciales del contrato

5.13.2 Bitácora de obra

La bitácora de obra para el contrato 479 de 2022, se encuentra anexa en el numeral 2.B

5.14 GESTIÓN AMBIENTAL

El seguimiento a la gestión ambiental se encuentra anexa al numeral N°. 4A

5.15 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)

El seguimiento a la salud ocupacional y seguridad en el trabajo se encuentra anexa al numeral N°. 4B

5.16 GESTIÓN SOCIAL

El seguimiento a la gestión social se encuentra anexa al numeral N°. 4B

5.17 ESTADO DEL CONTRATO

Para el presente periodo el contrato 479 de 2022, el contratista Consorcio estabilización Vial realizó actividades de topografía, excavación, perfilación, instalación geotextil y de tubería perforada para filtro e instalación de material drenante.

6 CONTRATO DE SERVICIOS - 480 DEL 22/02/2022 SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S.

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

6.1.1 Datos del contrato 480 del 22/02/2022.

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato de Servicios N° 480 del 10/02/2022.

Tabla 50 Contrato de Prestación de Servicios - SOLGEO S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
CONTRATO N°.	**480 DEL 10/02/2022**
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE DOS (2) COMISIÓN DE TOPOGRÁFICAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO, CONTROL, MEDICIÓN, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S – SOLGEO S.A.S
NIT	900.087.400-1
REPRESENTANTE LEGAL	ANDREA SABOGAL GUERRERO
DIRECCIÓN - CIUDAD	Cl 42 27 A 6 1, oficina 403 Bogotá.
TEELEONO	601-660 92 10
CORREO	solgeosas@gmail.com
DATOS DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 639.793.440,00 Incluido IVA sobre utilidad
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 639.793.440,00 Incluido IVA sobre utilidad
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) MESES
PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	03 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE JUNIO DE 2023
INTERVENTORIA	ECOVIAS S.A.S

6.1.2 Pólizas o garantías contrato de servicios

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato:

Tabla 51 Datos de las Pólizas Contrato 480

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS EQUIDAD			
AMPARO	PÓLIZA N°	CERTIFICADO O ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	EXPEDIDA / MODIFICADA SEGÚN
CUMPLIMIENTO	63-44-101012306	0	24- FEB-2022	CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	63-40-101022720	0	24- FEB-2022	CONTRATO

Tabla 52 Pólizas Actualizadas del Contrato

AMPARO	**REQUISITOS CONTRACTUALES**		**DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA**		
	Vigencia contractual	**% contractual**	**Desde**	**Hasta**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO					
a). Cumplimiento del contrato	A partir de la suscripción del contrato, el plazo del contrato y seis meses mas	10%	22/02/2022	9/12/2023	$ 63.979.344,00
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Plazo del contrato y 3 años mas	5%	22/02/2022	9/06/2026	$ 31.989.672,00
d). Calidad del Servicio	Suscripción del contrato y un año más partir de la entrega final del servicio	20%	22/02/2022	9/06/2024	$ 127.958.699,00
RESPONSABILIDAD CIVIL					
a). Predios labores y operaciones	Igual al periodo de ejecución y cuatro	200 SMMLV	22/02/2022	9/06/2023	$ 200.000.000,00

6.2 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

6.2.1 Otrosí, Adición y Prórroga

Durante el desarrollo del contrato no se presentaron otrosí, adición o prorrogas al contrato de prestación de servicios.

6.2.2 Suspensión y Reinicio al Contrato de servicios

Durante el desarrollo del contrato no se presentaron suspensiones y reinicios al contrato de prestación de servicios.

6.2.3 Ítems o Precios No Previstos

El contrato 480 de 2022 no contó con ítem no previstos, teniendo en cuenta que es un contrato de prestación de servicios, el cual se denomina *"CONTRATAR EL SERVICIO DE DOS (2) COMISIONES TOPOGRÁFICAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO, CONTROL, MEDICIÓN, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020"* **(Tomado del contrato 480 entre SOLGEO S.A.S y la UAERMV)**

6.3 CONTROL DE EQUIPOS

Contrato terminado el 2 de junio de 2023.

6.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA

6.4.1 Personal contratista

Contrato terminado el 2 de junio de 2023.

6.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

6.5.1 Forma de pago del contrato

Del contrato 480 entre SOLGEO S.A.S y la UAERMV se establece la siguiente forma de pago:

> *"La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, ordenará el pago al CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades vencidas por el valor*

adjudicado de las dos (2) comisiones topográficas por periodo de mes vencido, previa verificación a satisfacción por el Interventor del contrato de la siguiente manera" **(Tomado del contrato 480 entre SOLGEO S.A.S y la UAERMV)**

6.5.2 Actas parciales

A continuación, se describe lo pagado en actas para el contrato 480 de 2022

Tabla 53 Relación de Actas Pagadas

ACTA PARCIAL	PERIODO	VALOR	APROBADO COMUNICADO
1	3-mar-22 AL 2-abr-22	$42.652.896,00	186-1-056 del 23-mayo-22
2	3-abr-22 al 2-may-22	$42.652.896,00	186-1-056del 23-mayo-22
3	3 may-22 al 2jun-22	$42.652.896,00	186-1-061 del 6-junio-22
4	3-jun-22 al 2-jul-22	$42.652.896,00	186-1-71 del 7-julio-22
5	3-jul-22 al 2-ago-22	$42.652.896,00	186-1-093 del 19-agosto-22
TOTAL		$ 213.264.480,00	

6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA

6.6.1 Reuniones realizadas

En la siguiente tabla se registran las diferentes reuniones y comités llevados a cabo durante el período:

Tabla 54 Actas de Comité de Obra y Reuniones

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTA N°	**FECHA**	**TEMAS TRATADOS**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

No se realizaron reuniones para el presente periodo.

6.7 REVISIÓN DOCUMENTACIÓN INICIAL

Se llevó a cabo la revisión de la documentación inicial del contrato de prestación de servicios 480 del 10/02/2022, correspondiente a la documentación previa a la firma del acta de inicio y con la firma de esta.

6.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS

No se realizaron actividades en el presente periodo, contrato terminado el 2 de junio de 2023

A continuación, se relaciona la entrega de productos a la fecha del presente informe por parte del contratista de topografía a la interventoría:

Tabla 55 Entrega de Productos Contrato de Servicios 480

FECHA RECIBIDO	PRODUCTO
17/05/2023	Entrega radiación Km 1 Ánimas Bajas
19/05/2023	Entrega radiación Km 2 Ánimas Bajas
23/05/2023	Entrega radiación Km 3 Ánimas Bajas
25/05/2023	Entrega radiación Km 4 Ánimas Bajas

6.9 GESTIÓN AMBIENTAL

Durante la ejecución del contrato, SOLGEO S.A.S hizo uso adecuado y eficiente de los recursos, dando cumplimiento al PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental), documento interno de la UAERMV

6.10 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)

Contrato terminado el 2 de junio de 2023.

6.11 GESTIÓN SOCIAL

No aplica, dado que es un contrato de prestación de servicios.

6.12 ANOTACIONES DE LA INTERVENTORÍA

- Soluciones Geoespaciales SAS al momento de realizar las actividades de topografía, no se percató que había colocado los deltas con referencias temporales (estacas), esa actividad de referenciación y amojonamiento ha debido ejecutarse con suficientes referencias de control (permanentes y suplementarias) al momento de realizar la poligonal y nivelación de los tramos a intervenir. La problemática derivada de esto se evidencia al momento que inician las actividades de localización y replanteo los contratistas hidráulicos, al no encontrar las referencias que permitan el amarre correspondiente.

- Soluciones Geoespaciales SAS, debe garantizar que los productos elaborados por el personal (comisiones de topografía) cumplan con el objetivo para el cual fueron contratados, no siendo otro que la información topográfica requerida para la ejecución de la totalidad de las obras

contempladas en el alcance del proyecto de regalías, de tal forma que esta debe ser consistente y permanente en el tiempo.

- Las diferencias encontradas en la topografía al momento de realizar la localización y replanteo deben ser corregidas por la firma Soluciones Geoespaciales SAS sin costo adicional al contrato.

- El plazo transcurrido en la ejecución de actividades correctivas no puede ser contabilizado para reconocimiento económico, toda vez que es obligación del contratista Soluciones Geoespaciales SAS atender estos requerimientos, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

- Los atrasos de los contratos 478 y 479 de 10/02/2022 por repetición de actividades de topografía, son totalmente atribuibles a la firma Soluciones Geoespaciales SAS

- La interventoría en comité de seguimiento semanal de obra N°. 3 del contrato de obra pública 479 de 10/02/2022, celebrado el 11 de agosto de 2022 informó a la UAERMV y a los demás asistentes, la necesidad de suspender el contrato de prestación de servicios 480 de 22/02/2022, solicitud que se hace teniendo en cuenta la entrega y terminación de los levantamientos de topografía programados (última entrega 29 de julio de 2022). La UAERMV no atendió lo solicitado por la interventoría.

- La información cargada en el drive no evidencia el seguimiento diario a los contratos de obra 478 y 479 de 10/02/2022.

- Los trabajos que se vienen realizando desde el mes de agosto de 2022, corresponden a correcciones del levantamiento inicial.

- Importante aclarar que, las certificaciones para liberación de pago que fueron remitidos mediante oficios con consecutivo que se relacionan a continuación:

  - ✔ 186-1-056 de fecha 23 de mayo de 2022 (actas parciales 1 y 2).
  - ✔ 186-1-061 de fecha 06 de junio de 2022 (acta parcial 3).
  - ✔ 186-1-071 de fecha 07 de julio de 2022 (acta parcial 4).
  - ✔ 186-1-093 de fecha 19 de agosto de 2022 (acta parcial 5).

Se expidieron de conformidad a la revisión que consistió básicamente en comprobar la información del levantamiento, debidamente organizado y con los datos o información requerida (carteras de campo, datos crudos, Rinex,

coordenadas, descripciones, esquemas, formatos, hojas de campo, imágenes y la revisión de parámetros a partir de la estructura digital y teniendo en cuenta la información entregada, error angular, error en distancia, error permitido, precisión etc..) ejecutada en oficina por las comisiones de topografía de la interventoría a los productos parciales y finales que, en cada una de las entregas realizadas por parte de SOLGEO S.A.S., se incluyeron en el link o drive colocado.

Dando respuesta al oficio 20230428 de 28 de abril de 2023, La topografía de la interventoría reviso los documentos entregados por el Contratista Soluciones Geoespaciales de los tramos San Antonio I y II en campo, del tramo San Antonio reviso 6 km dando concepto favorable a las observaciones hechas el 24 de abril 2023, a la revisión documental.

Dando respuesta al comunicado 20230428 recibido el 28 de abril de 2023, la topografía de la interventoría revisa el producto 20230327 donde el contratista SOLUCIONES GEOESPACIALES SAS Entrega 5 km San Antonio 1, dando visto bueno a las observaciones remitidas el pasado de 24 abril de 2023, con respeto a lo documental.

La topografía de la interventoría reviso el producto 20230317 Entrega 4 km San Antonio 1 del contratista SOLUCIONES GEOESPACIALES SAS, Recibido el 28/04/2023 mediante documento "20230428 Respuesta a Interventoría Entrega km 4, 5 y 6" donde da respuesta a las observaciones enviadas por la interventoría mediante correo electrónico el 25/04/2023, siendo atendidas y subsanadas de manera correcta, las observaciones remitidas por la interventoría el pasado 24 de abril de 2023, en el campo documental.

Lo anterior en cumplimiento a lo señalado en la CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO del contrato de prestación de servicios N°. 480 del 22 de febrero de 2022, que indica lo siguiente:

"CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, ordenará el pago al CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades vencidas por el valor adjudicado de las dos (2) comisiones topográficas por periodo de mes vencido, previa verificación a satisfacción por el Interventor del contrato de la siguiente manera:
PARÁGRAFO PRIMERO: Por ser la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, designada como ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías, en función del Acuerdo 099 de 31 de diciembre de 2019, expedido por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la Región Centro Oriente, deberá hacer uso del Sistema de

Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR, para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas, directamente desde la cuenta única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales, de esta manera, la UAERMV realizará la gestiones de ordenación del gasto, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realice el giro final".

De esta manera corresponde al representante legal de la UAERMV o a su delegado del nivel directivo, ordenar el gasto sobre las apropiaciones que se hayan incorporado al presupuesto de la Entidad en su capítulo independiente para regalías. Esto en función de la Circular Externa 023 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con lo anterior, la UAERMV gestionará el giro a través del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando mensualmente el pago al CONTRATISTA del servicio prestado de las dos (2) comisiones topográficas; verificados a satisfacción por el Interventor del contrato, y, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el gerente del proyecto de la UAERMV.

Se cancelará mensualmente por periodo de mes vencido el servicio, con la presentación de la factura; se requerirá para el pago de la factura, Certificación de cumplimiento de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003. Previa suscripción de preacta y acta por parte del contratista y el Interventor del contrato en los formatos establecidos por la entidad, la cual exige, además, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría de la UAERMV.

Las facturas deberán ser presentadas por el valor mensual de servicio prestado, y verificados a satisfacción por el Interventor del contrato.
Posteriormente, y verificando el cumplimiento de los requerimientos descritos, el Interventor del contrato efectuará la correspondiente certificación para que se proceda a la orden de transferencia realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, previos los descuentos de ley; dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega por parte del contratista de los requisitos ya mencionados.

6.13 ESTADO DEL CONTRATO

Estado del contrato 480 del 10/02/2022**: Finalizado tiempo contractual, sin recibo de los productos a satisfacción.**

7 PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

7.1 INFORMACIÓN GENERAL

7.1.1 DATOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

A continuación, se observan las generalidades del Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá a cargo de la UAERMV:

Tabla 56 Suscripción, Legalización, Plazo Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá

NOMBRE PROYECTO	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).
DATOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA	
ENTIDAD EJECUTORA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV**
NIT:	**900127032**
GERENTE DEL PROYECTO	JULIO CESAR PINZÓN REYES
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	CALLE 26 N°. 69-76 BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO:	601-3779555
OTROS DATOS DEL PROYECTO	
VALOR INICIAL DEL PROYECTO:	$ 76.864.101.256
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO:	$ 80.542.350.280
FECHA INICIO ETAPA CONSTRUCCIÓN	17 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA DE EJECUCIÓN DE OBRA ACTUALIZADA:	30 DE DICIEMBRE DE 2026
INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S

7.2 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

7.2.1 Etapa de Preconstrucción

El proyecto con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL a la fecha se encuentra haciendo

ajustes a la implantación del diseño geométrico para implementar en la ejecución de las obras, validando el componente topográfico, la no entrega de estos productos ha derivado en la demora el inicio de actividades por parte de los contratistas hidráulicos, así como para la UAERMV.

A corte del presente informe falta la adaptación del diseño geométrico de San Antonio, Laguna verde y Animas Bajas.

7.2.2 Etapa de construcción

Para el presente periodo se registran las actividades de obra realizadas a los tramos viales por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIA en la siguiente tabla:

Tabla 57 Actividades ejecutadas.

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
TRAMO UNIÓN TUNALES	Actividades realizadas * Se realiza manejo de aguas escorrentías en el K0+605 a K0+630. * Se recomienda realizar una excavación más profunda debido a que el relleno de los hombros es superior al nivel de la subrasante, esto genera que el agua se filtre a la carpeta de base granular. * Se realiza perfilación de subrasante a nivel de cota desde k0+710 a k0+740. * Se realiza extendida de base granular con cereo aproximado 0.08 entre K0+710 a k0+740. * Se realiza compactación de base granular. * Se realiza perfilación de subrasante a nivel de cota desde k0+715 a k0+860. * Se realiza extendida de base granular con cereo aproximado 0.08 entre K0+715 a k0+850. * Se realiza compactación de base granular * Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+625 a k0+720. Se revisan cortes y rellenos de vía. * Se realiza compactación de base granular. * Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+720 a k0+790. Se	- Localización y replanteo del terreno (K2+030 a K0+120) - Apiques para filtro cada 10m (K2+030 a K0+120) - Corte y nivelación de subrasante (K2+060 a K2+120) Nivelación de la subrasante del tramo 02, se está trabajando desde el k0+000 hasta k0+230, k0+250 hasta k0+410 del tramo 02. - Instalación de base granular (K2+030 a K2+170) - K2+240 – K2+360, k0+110 a k0+140, k0+110 a k0+140, k0+120 a k0+140 del ramo 02, k0+105 hasta k0+220, k0+100 y k0+300 del tramo 02. k0+147 y k0+258 tramo 2, k0+258 hacia mayores, k0+280 y k0+370 tramo 2, k0+250 y k0+370 Nivelación de la subrasante (Corte de subrasante y relleno con material RAP) - Extendida y compactación de base granular tipo B (e=15cm) - Extendida y compactación de Fresado estabilizado "MBR" (e=15cm) - Fresado estabilizado instalado hasta la abscisa K2+310, k2+670 – k2+780, k2+050 tramo 01 y k0+120 tramo 02, k2+950 del tramo 01 y k0+105 del tramo 02, 0+160 y k0+210 tramo 2 - Se extiende material RAP desde k0+000 hasta k0+160 del tramo 02, k0+300 y k0+400 - - Céreo de nivel de subrasante desde k0+190 hacia mayores - - Se realiza recorrido del segmento 2 en conjunto entre las comisiones de topografía de la UAERMV y la interventoría donde se evidencia en campo los deltas y placas topográficas, k0+250 y k0+370 del tramo 02 - - Se corrige base granular desde k0+000 hasta k0+110, tramo 02. - - Instalación y compactación de base granular entre abscisas k0+110 a k0+140, k0+110 a k0+140, k0+120 a k0+140 del ramo 02, k0+105 hasta k0+220, k0+100 y k0+300 del tramo 02.

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	revisan cortes y rellenos de vía. * Se realiza manejo de aguas escorrentías y retiro de talud que se desprende en el k0+480 a k0+500. Está actividad se realiza manualmente para evitar que la actividad mecánica afecte el desplazamiento. * Se realiza intervención de hombro izquierdo del k0+650 a k0+670, donde se escarificación y remplazo del material saturado. 20x.80x0.15 * Se realiza compactación de base granular. * Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+705 a k0+770. esto teniendo en cuenta la modificación del hombro. * Se realiza manejo de aguas escorrentías y retiro de talud que se desprende en el k0+705 a k0+710. Está actividad se realiza manualmente para evitar que la actividad mecánica afecte el desplazamiento. * Se realiza excavación mecánica para conformar la zanja-cuneta en el tramo k0+001 a k0+015. * Se realiza mezcla heterogénea (cemento, grava, recebo y agua). Para realizar cuneta de conducción de agua escorrentías. * Se realiza compactación de base granular.	k0+147 y k0+258 tramo 2, k0+258 hacia mayores, k0+280 y k0+370 tramo 2, k0+250 y k0+370 - - Imprimación entre abscisask2+950 del tramo 01 y k0+120 del tramo 02, k0+110 y k0+160, k0+110 y k0+0+168 del tramo 02 - - Se realiza céreo de MBR instalado el día anterior entre abscisas k2+670 – k2+780, - Extendido, compactación y céreo base granular entre k2+905 y k0+110 (tramo 2), k2+050 tramo 01 y k0+120 tramo 02, k2+950 del tramo 01 y k0+105 del tramo 02, 0+160 y k0+210 tramo 2, - - Compactación de MBR con compactador sobre neumáticos entre abscisas k2+670 y k2+780, entre abscisas k2+670 y k2+770, k2+780 del tramo 01 hacia mayores y k2+780 y k2+950 del tramo 01, k2+155 hasta k2+250. - - Se extiende material RAP desde k0+000 hasta k0+160 del tramo 02, k0+300 y k0+400 - - Se realiza nivelación de la subrasante del tramo 02, se está trabajando desde el k0+000 hasta k0+230, k0+250 hasta k0+410 del tramo 02. - - Realiza replanteo de vía sobre el k0+300 del tramo 2. - - Humectación y compactación de fresado estabilizado entre abscisas k2+780 y k2+950 - - Se realizan ensayos de densidades entre abscisas k0+110 y k0+250 del tramo 02, k0+250 y k0+400 del tramo 02.
TRAMO CAPITOLIO	Actividades realizadas * Perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k2+200 al k3+150. * Conformación con piedra reutilizada (rajón) entre las abscisas del K2+1600 al K2+170, costado izquierdo a mayores * Instalación de material RAP, entre las abscisas del k2+200 al k2+260. * Remocion de material de escombro (limpieza de cunetas) entre las abscisas del K2+150 al K2+260, en ambos costados *. Perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k3+180 al k3+230. *. Retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+345 al K3+325 y k3+213 al k3+205. *. Remocion de material de escombro	- Limpieza de alcantarillas en abscisa k0+790 hacia menores. - Reparación de "fallos" de forma manual con ayuda del minicargador en k4+080, k4+100, k3+740, k3+570, k3+500, k3+765 - Conformación de subrasante entre k1+435 a k1+470. - Replanteo del diseño geométrico de k1+635 hacia menores, k1+500 hacia menores. Así mismo, replantea niveles de rasante de vía de k1+635 – k1+500, k1+120 hacia menores, k1+100 – k1+070, k1+300 y k1+400, - Relleno y nivelación de subrasante con material seleccionado B200 entre abscisas k1+525 y k1+635 - Humectación de base granular entre abscisas k1+525 y k1+635, k1+525 y k1+635 - Conformación y nivelación de la subrasante con material seleccionado desde k1+254 hasta k1+330. - Jueves 26 de octubre: - Limpieza de vía y manejo de aguas en k3+500

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	(limpieza de cunetas) entre las abscisas del K2+080 al K2+105, en ambos costados * Perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k3+280 al k3+385. * . Se realiza extendida de base granular y cerró a nivel entre k3+280 a k3+385. *. Retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+320 al K3+350. *Perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k3+400 al k3+405. *.Se realiza extendida de base granular y cerró a nivel entre k3+320 a k3+340. *. Retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+400 al K3+405 4.6 x.60.	- Limpieza de alcantarillas en abscisa k0+790 hacia menores. - Reparación de "fallos" de forma manual con ayuda del minicargador en k4+080, k4+100, k3+740, k3+570, k3+500, k3+765 - Conformación de subrasante entre k1+435 a k1+470. - Replanteo del diseño geométrico de k1+635 hacia menores, k1+500 hacia menores. Asi mismo, replantea niveles de rasante de vía de k1+635 – k1+500, k1+120 hacia menores, k1+100 – k1+070, k1+300 y k1+400, Relleno y nivelación de subrasante con material seleccionado B200 entre abscisas k1+525 y k1+635 - Humectación de base granular entre abscisas k1+525 y k1+635, k1+525 y k1+635 - Conformación y nivelación de la subrasante con material seleccionado desde k1+254 hasta k1+330.
SAN ANTONIO	Actividades realizadas K3+090 a K6+980 a K9+230 Traslado de Campamento y unidades sanitarias portátiles. K9+100 a K9+071 (ancho 4,60m) Perfilación de material saturado. Conformación de piedra Rajón existente entre reutilizada. Sello de Rajón con material Arcilloso existente. K9+071 a K9+100 Manejo de aguas lluvias. Identificación de puntos críticos para la movilidad. K6+950 Instalación de campamento K8+640 a K8+630 izq Manejo de aguas lluvias. K2+860 a K2+740 Acción de movilidad apoyo el toldo	- Humectación y compactación de base granular entre abscisas k0+410 y k0+600. - Corte de subrasante realizado el día anterior entre abscisas k6+370 y k6+250. Aunque el personal de obra recibió el diseño geométrico ajustado, topógrafo de la UMV tuvo que realizar ajustes que deben ser enviados al diseñador geométrico para que quede en planos récord. - Reparación de fallo en abscisa k6+100 con medidas 11m x 2.5m x 0.45m. Comisión de topografía de interventoría realiza revisión de subrasante entre abscisas k6+250 y k6+110. Se replantea borde de vía y niveles entre abscisas k6+150 y k6+080.

7.2.3 Valores ejecutados

Para el periodo del presente informe se cuenta con los siguientes valores ejecutados de obra:

Tabla 58 Valores ejecutados

ITEM	CÓDIGO ACTIVIDAD UMV	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1		**BASES**				
1,1	A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	1803,63	$ 7.396	$ 13.339.647

ITEM	CÓDIGO ACTIVIDAD UMV	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1		**BASES**				
1,2	A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	1803,63	$ 190.164	$ 342.985.495
1,3	A27-A	Nivelación y Mejoramiento de subrasante con material seleccionado. No incluye transporte.	m3	0	$ 245.717	$ 0
1,4	A15-A	Base granular clase B (BG_B). Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación.	m3	3869,25	$ 363.096	$ 1.404.909.198
1,5	A34	Recuperación de subrasante con material pétreo en puntos de baja o nula capacidad portante. Incluye sello con material seleccionado.	m3	0	$ 340.820	$ 0
2		**RODADURA EN FRESADO**				
2,1	A24-A	Acopio, mezclado, extendida, compactación y nivelación de material fresado (RAP). Incluye estabilización con emulsión CRL-1 al 2,4% y cemento al 2%. (Incluye transporte y trasiegos)	m3	3738,63	$ 460.657	$ 1.722.226.080
	TOTAL, COSTO DIRECTO					**$ 3.483.460.421**
				Administración	27,87%	$ 970.840.419
				Imprevistos	5,00%	$ 174.173.021
				TOTAL, AI	**32,87%**	**$ 1.145.013.440**
		TOTAL, OBRA				**$ 4.628.473.861**
	P01	**VALOR PARA LA GESTION AMBIENTAL PAGA**				$ 136.323.523,11
	T01	**VALOR PARA PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - PMT**				$ 39.734.397,70
	S01	**VALOR GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**				$ 34.698.958,27

ITEM	CÓDIGO ACTIVIDAD UMV	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1		BASES				
	VALOR MES OBRA + COMPONENTES					$ 4.839.230.740,08

Las cantidades de obra relacionadas en la tabla anterior corresponde a los frentes de obra de Unión Tunales y Capitolio para el periodo de junio 2025.

7.2.4 Maquinaria y equipo de obra

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria y equipo destinados a la ejecución de las obras viales:

Tabla 59 Maquinaria y Equipo UAERMV

MAQUINARIA UAERMV JUNIO 2025				
EQUIPO/ VEHICULO	MARCA	FIJA EN OBRA	INTERMITENTE EN OBRA	UBICACIÓN
Retroexcavadora	John Deere	X		TUNALES
Motoniveladora	Caterpillar	X		TUNALES
Vibro compactador 8 ton.	Ingersoll Rand	X		TUNALES
Carro Tanque para humedecimiento	JBC	X		TUNALES
Minicargador con martillo	Bob Cat	X		TUNALES
Retroexcavadora	Terex	X		CAPITOLIO
Motoniveladora	Rhino	X		CAPITOLIO
Vibro compactador 8 ton.	Ingersoll Rand	X		CAPITOLIO
Carro Tanque para humedecimiento	Chevrolet	X		CAPITOLIO
Vibro compactador doble rodillo tandem 4ton.	Hamm	X		CAPITOLIO
Minicargador con martillo	Mactrack	X		CAPITOLIO
Volqueta sencilla	Fotón	X		CAPITOLIO

MAQUINARIA UAERMV JUNIO 2025				
EQUIPO/ VEHICULO	**MARCA**	**FIJA EN OBRA**	**INTERMITENTE EN OBRA**	**UBICACIÓN**
Motoniveladora	Caterpillar	X		SAN ANTONIO
Vibro compactador 8 ton.	Caterpillar	X		SAN ANTONIO
Vibro compactador	Amman	X		SAN ANTONIO
Retroexcavadora	Caterpillar	X		SAN ANTONIO
Retroexcavadora	Loking	X		SAN ANTONIO
Minicargador con martillo	Bob Cat	X		SAN ANTONIO
Minicargador con martillo	Bob Cat	X		SAN ANTONIO
Volqueta sencilla	Fotón	X		SAN ANTONIO
Camioneta Placa JOU555	Ford	X		**TODOS**
Camioneta Placa KRL416	Renault	X		**TODOS**
Camioneta Placa GET696	SSANGYONG	X		**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**

7.2.5 Personal y control de aportes

7.2.5.1 Control personal obra

Durante el presente periodo la UAERMV, realizó el reporte del personal de la UMV, SINTRAUNIOBRAS, contrato 936 (maquinaria), conductores camioneta y vigilancia, para un total de 111 trabajadores, anexo numeral 4B

7.2.5.2 Control de aportes legales y seguridad social

Durante el presente periodo la UAERMV realiza la entrega de las planillas de Seguridad Social, estas se encuentran en revisión dado que se reciben de manera tardía.

7.3 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se presenta el estado del tiempo en la siguiente tabla:

Tabla 60 Tabla Relación de lluvias

FECHA	U. TUNALES	CAPITOLIO	SAN ANTONIO	ESTADO DEL CLIMA
3/06/2025	11:00 pm – 11:30 pm	11:00 pm – 11:30 pm	11:00 pm – 11:30 pm	Lluvias
4/06/2025	1:30 pm – 3:00 pm	1:30 pm – 3:00 pm	1:30 pm – 3:00 pm	Lluvias
5/06/2025	8:00 am – 11:00 am 1:45 pm – 3:00 pm	8:00 am – 11:00 am 1:45 pm – 3:00 pm	8:00 am – 11:00 am 1:45 pm – 3:00 pm	Lluvias
6/06/2025	10:00 am – 1:00 pm	10:00 am – 1:00 pm	10:00 am – 1:00 pm	Lluvias
7/06/2025	4:00 pm – 6:00 pm	4:00 pm – 6:00 pm	4:00 pm – 6:00 pm	Lluvias
8/06/2025	11:40 am – 1:30 pm	11:40 am – 1:30 pm	11:40 am – 1:30 pm	Lluvias
9/06/2025	7:30 am – 8:40 am 12:30 pm – 1:45 pm 2:00 pm – 3:30 pm	7:30 am – 8:40 am 12:30 pm – 1:45 pm 2:00 pm – 3:30 pm	7:30 am – 8:40 am 12:30 pm – 1:45 pm 2:00 pm – 3:30 pm	Lluvias

FECHA	U. TUNALES	CAPITOLIO	SAN ANTONIO	ESTADO DEL CLIMA
10/06/2025	8:30 am – 11:00 am 1:00 pm – 4:00 pm	8:30 am – 11:00 am 1:00 pm – 4:00 pm	8:30 am – 11:00 am 1:00 pm – 4:00 pm	Lluvias
11/06/2025	9:00 am – 3:30 pm	9:00 am – 3:30 pm	9:00 am – 3:30 pm	Lluvias
12/06/2025	11:00 am – 2:00 pm	11:00 am – 2:00 pm	11:00 am – 2:00 pm	Lluvias
13/06/2025	1:30 pm – 4:30 pm	1:30 pm – 4:30 pm	1:30 pm – 4:30 pm	Lluvias
14/06/2025	8:30 am – 11:00 am	8:30 am – 11:00 am	8:30 am – 11:00 am	Lluvias
15/06/2025	11:00 am – 2:30 pm	11:00 am – 2:30 pm	11:00 am – 2:30 pm	Lluvias
16/06/2025	12:00 am – 2:40 pm	12:00 am – 2:40 pm	12:00 am – 2:40 pm	Lluvias
17/06/2025	2:00 pm – 3:40 pm	2:00 pm – 3:40 pm	2:00 pm – 3:40 pm	Lluvias
18/06/2025	11:00 am – 1:00 pm	11:00 am – 1:00 pm	11:00 am – 1:00 pm	Lluvias
19/06/2025	3:00 pm – 4:20 pm	3:00 pm – 4:20 pm	3:00 pm – 4:20 pm	Lluvias
20/06/2025	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	Soleado
21/06/2025	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	Soleado
22/06/2025	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	Soleado
23/06/2025	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	Soleado
24/06/2025	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	Soleado
25/06/2025	7:00 am – 12:40 pm	7:00 am – 12:40 pm	7:00 am – 12:40 pm	Lluvias
26/06/2025	8:00 am – 10:00 am	8:00 am – 10:00 am	8:00 am – 10:00 am	Lluvias
27/06/2025	3:00 pm – 4:30 pm	3:00 pm – 4:30 pm	3:00 pm – 4:30 pm	Lluvias
28/06/2025	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	Lluvias
29/06/2025	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	Lluvias

FECHA	U. TUNALES	CAPITOLIO	SAN ANTONIO	ESTADO DEL CLIMA
30/06/2025	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	7:00 am – 5:00 pm	Lluvias

7.4 FUENTE DE MTERIALES

La entidad ejecutora cuenta con suministro de material por parte de las INVESASKK SAS de las canteras de Monteolivo e Incomineria, se solicitaron los certificados de material en los comités de seguimiento realizados en el presente mes, los comités de seguimiento se relacionan en el numeral 7.6.1.

7.5 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO

La Unidad de Mantenimiento Vial no ha entregado la documentación correspondiente a los ensayos de laboratorio dado que la entrega del informe mensual del componente técnico se encuentra pendiente, se espera que para el siguiente periodo entregue la totalidad de la documentación.

7.5.1.1 Cronograma del Obra

Para el presente periodo se tiene que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL presenta un atraso al cronograma de obra, del cual se tiene que para el tramo Unión Tunales se tiene un avance programado de 100%, una ejecución del 42% para un atraso del 58%; Para el tramo Capitolio se tiene un avance programado de 54%, una ejecución de 62% para un atraso del 8%, para el tramo San Antonio un avance programado del 21%, una ejecución del 10.81%, para un atraso del 10.19%.

7.5.2 Estado de avance de obra

Durante el presente periodo la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL ejecuto las siguientes actividades:

TRAMO UNION TUNALES
Actividades:

- Se realiza el perfilamiento subrasante entre k0+625 a k0+700.
- Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante k0+625 a k0+680. 55x4.6x.10.
- Se realiza aproximación de base del k0+665 a k0+700. (35×4.6×0.08)m
- Se lleva a cabo replanteo de borde de vía para cunetas
- Se realiza manejo de aguas escorrentías en k0+550 costado izquierdo.

- Se lleva a cabo replanteo de borde de vía para cunetas k+205 a k0+400.
- Se lleva a cabo aproximación de base granular en K0+455 - K0+510
- Se lleva a cabo replanteo de borde de vía para cunetas k+280 a k0+415

TRAMO CAPITOLIO

Actividades:

- Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+590 a K3+440.
- Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+590 a K3+440.
- Se realiza cereo aproximado de fresado 0.08mts.
- Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante entre K3+400 a K3+370. Se realiza cerro aproximado.
- Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+590 a K3+440.
- Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+590 a K3+440.
- Se realiza cereo a nivel de fresado 0.07mts.
- Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+540 a K3+490.
- Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+540 a K3+490.
- Se realiza cereo a nivel de fresado 0.08mts.
- Se realiza corte de junta para base estabilizada en k3+550.
- Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+490 a K3+475.
- Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+490 a K3+475.
- Se realiza cereo a nivel de fresado 0.08mts.

TRAMO SAN ANTONIO - TOLDO

Actividades:

- K3+150 a K3+130 Perfilacion subrasante. K3+150 a K3+130 Extendida de base. K3+130 a K3+115 Trasiego de RCD. K3+120 y K3+335 Limpieza de Alcantarillas
- K3+130 a K3+120 Perfilacion subrasante K3+130 a K3+120
- K1+420 a K1+390
- Perfilacion de exceso de material saturado y barro.
- K3+130 a K3+120
- Conformación con Rajón. (para habilitar paso en vía y retomar actividad el día siguiente)

- K1+100 a K1+180 Perfilación de exceso de material saturado y barro.
- K1+180 a K1+170 Excavación de fallo e:0.40 Instalación de Rajón e:0.30 Sello con RAP e:0.18 (se instala este espesor para proteger vía.)
- K1+400 a K1+390 Reproceso excavación de fallo para recuperación de movilidad. Excavación e:0.60 Mejoramiento con Rajón e:0.40 Sello con RAP e:0.20
- K1+400 a K1+415 Reproceso excavación de fallo. Excavación e= 0,60
- Mejoramiento Rajón en=0,50 Sello B-200 e= 0,10
- Instalación de Base Granular e=0,15 K2+800 a K2+793
- Acción de movilidad instalación de Rajón e: 0,20.
- K2+330 a K2+340 A: 4,00 Acción de movilidad Excavación e:0,40 Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15
- K2+600-K2+400-K2+250 Aseo orden y limpieza de acopios
- K2+620 a K2+610 A: 4,60 Acción de movilidad Excavación e:0,40
- Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15
- K9+500 a K9+400 der
- Manejo de aguas lluvias.
- K2+870 a K2+720 Perfilacion de material saturado (queda acopiado en vía)
- K3+148 a K3+138 A: 3,50 Acción de movilidad Excavación e:0,40 Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15

Tabla 61 Cantidades ejecutados en el periodo

ITEM	CÓDIGO ACTIVIDAD UMV	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
1		**BASES**		
1,1	A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	158,46
1,2	A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	126,19
1,3	A27-A	Nivelación y Mejoramiento de subrasante con material seleccionado. No incluye transporte.	m3	121,02
1,4	A15-A	Base granular clase B (BG_B). Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación.	m3	168,71
1,5	A34	Recuperación de subrasante con material pétreo en puntos de baja o nula capacidad portante. Incluye sello con material seleccionado.	m3	
2		**RODADURA EN FRESADO**		
2,1	A24-A	Acopio, mezclado, extendida, compactación y nivelación de material fresado (RAP). Incluye estabilización con emulsión CRL-1 al 2,4% y cemento al 2%. (Incluye transporte y trasiegos)	m3	306,46

7.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA

7.6.1 Actas de comité de obra o actas de reunión

En la siguiente tabla se registran las diferentes reuniones y comités llevados a cabo durante el período:

Tabla 62 Actas de Comité de Obra

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTA N°	**FECHA**	**TEMAS TRATADOS**
42	5/06/2025	- Avance de obra - Documentación y acciones faltantes UAERMV para inicio y continuidad de las obras - Informes mensuales pendientes - Entregar hojas de vida de maquinaria - Actividades obra - Seguimiento a cronograma obra
43	13/06/2025	- Avance de obra - Documentación y acciones faltantes UAERMV para inicio y continuidad de las obras - Informes mensuales pendientes - Entregar hojas de vida de maquinaria - Actividades obra - Seguimiento a cronograma obra
44	19/06/2025	- Avance de obra - Documentación y acciones faltantes UAERMV para inicio y continuidad de las obras - Informes mensuales pendientes - Entregar hojas de vida de maquinaria - Actividades obra - Seguimiento a cronograma obra
45	27/06/2025	- Avance de obra - Documentación y acciones faltantes UAERMV para inicio y continuidad de las obras - Informes mensuales pendientes - Entregar hojas de vida de maquinaria - Actividades obra - Seguimiento a cronograma obra

Las actas de reunión antes mencionadas se anexarán en el informe mensual del siguiente periodo, ya que, se encuentran en revisión y firmas por las partes que intervinieron.

7.6.2 Bitácora de obra

Se anexa copia de la bitácora de obra de fecha de inicio de labores de obra del 1 al 30 de junio del 2025 donde se indican las labores realizadas y las indicaciones dadas por la interventoría. Anexo bitácora de obra 3.A

7.7 GESTIÓN AMBIENTAL

- Se requiere que la UAERMV atienda con prontitud las observaciones/requerimientos de la interventoría, especialmente en lo concerniente al manejo del líquido para imprimación asfáltica, solicitud realizada durante el comité de seguimiento semanal

- En lo concerniente al manejo del material resultante de excavaciones, se hace necesario que el material sea retirado a la mayor brevedad (sin superar las 72 horas), debido a que se presentan obstrucciones para el tránsito de los habitantes del sector, solicitud dada en el comité de seguimiento semanal

- Es necesario que la UAERMV retire el material de RCD que se encuentra en los bordes de la vía, como también en la limpieza de los encoles y descoles en las alcantarillas, solicitud dada en el comité de seguimiento semanal

- Se requiere la protección y cubrimientos del material acopiado para evitar pérdidas por material debido a las altas lluvias

- No se realizaron hallazgos de elementos arqueológicos que se tuvieran que reportas ante el ICANH.

El informe Ambiental se encuentra anexo al numeral 4A

7.8 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)

Para el presente periodo la UAERMV, presentó el 06 de julio de 2025, el informe mensual del mes de junio de 2025, el cual tiene fecha límite hasta el 05 de mayo de 2025, este se encuentra en revisión.

Durante el presente periodo la UAERMV, realizó el reporte del personal de la UMV, SINTRAUNIOBRAS, contrato 936 (maquinaria), conductores camioneta y vigilancia, para un total de 111 trabajadores.

La interventoría, en su labor de verificación y aprobación de la maquinaria, equipos y vehículos que presenta la UAERMV, para la operación en el proyecto, efectúa una comprobación de los documentos legales de cada uno, para determinar su operatividad en el frente de trabajo, para el presente periodo la UAERMV, presenta documentos del contrato 936, y documentación de

maquinaria de misionalidad, esta debe ir adjunta en el informe del periodo reportado.

En conjunto con la revisión realizada por la parte técnica de la maquinaria, equipos y vehículos, el componente SST, deberá realizar la verificación de las afiliaciones y pagos de planillas de seguridad social integral que esté vigente, con afiliación a ARL, con el riesgo correspondiente al nivel de riesgo expuesto, exámenes médicos ocupacionales vigentes y sin restricciones al cargo de los operadores de estos.

El informe SST se encuentra anexo al numeral 4.B

7.9 GESTIÓN SOCIAL

Para el periodo del presente informe, se realiza las siguientes actividades representativas:

Tramo Unión Tunales

A la fecha de cierre del presente informe la profesional social de la entidad ejecutora continua en la implementación del punto de atención al usuario como lo establece el PAGA (Plan de acción de la guía ambiental -PAGA). No se evidencia aviso informativo, Cuenta con los volantes informativos, el PMT, y el afiche informativo. Así mismo realiza atención móvil, con el fin de recepcionar en el frente de obra todas las inquietudes de la comunidad.

Frente de Capitolio

En el tramo de Capitolio, la interventoría da aval para que se implemente el punto de atención a la comunidad móvil, por cuanto que no se evidencia un predio cercano donde realizará atención en una carpa móvil de la UAERMV, cuenta con los volantes informativos, el PMT, y el afiche informativo.

Frente San Antonio El Toldo

En el tramo de San Antonio, la interventoría da aval para que se implemente el punto de atención a la comunidad móvil, por cuanto que no se evidencia un predio cercano donde realizará atención en una carpa móvil de la UAERMV, cuenta con los volantes informativos, el PMT, y el afiche informativo. La interventoría solicita un oficio donde se justifique su ubicación, dando alcance a lo establecido en el Plan de gestión social.
El informe de gestión social se encuentra en el anexo 4.C

7.10 ESTADO DEL PROYECTO

A la fecha el ejecutor UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, se encuentra activo y en ejecución.

8 CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022

8.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

8.1.1 Datos del contrato de interventoría

En la siguiente tabla se muestran las generalidades del Contrato 161 del 14 de febrero de 2022:

Tabla 63 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor

ENTIDAD CONTRATANTE:	**FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ**
CONTRATO DE OBRA N°:	CIN-REGALIAS-161-2022 del 14/02/2022
OBJETO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, social y jurídica, a la ejecución del proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" con código BPIN "2018000050020" financiado con recursos del sistema general de regalías SGR.
PROCESO DE SELECCIÓN N°:	FDRS-CMA-182-2021
DATOS DEL INTERVENTOR:	
CONTRATISTA INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S
NIT:	890.104.625-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	CARRERA 45 N° 85-50 - BARRANQUILLA
TELÉFONO:	3126700442
CORREO	Intersumapaz.ecovias@gmail.com
MODIFICATORIO Nº.1	MODIFICAR EL ANEXO Nº1 ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA DE OBRA, MODIFICACIÓN ALCANCE DEL CONTRATO.
OTROS DATOS DEL CONTRATO	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE INICIO	03 DE MARZO DE 2022
VALOR INICIAL:	$ 3.104.380.144,00 Incluido IVA.
ADICION N°. 1	$ 66.865.059, 00 Incluido IVA
ADICION N°. 2	$ 119.900.452,00 Incluido IVA
ADICION N°. 3	$ 3.682.565.081,00 Incluido IVA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 6.973.710.736,00 Incluido IVA.
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 DE JUNIO DE 2023
PRÓRROGA Nº. 1 y MODIFICACIÓN N°. 2	2 MESES
PRÓRROGA N°. 2 Y MODIFICATORIO N°. 3	4 MESES Y 29 DÍAS
PRÓRROGA N°. 3	2 MESES
PRÓRROGA N°. 4	1 MES
PRÓRROGA N°. 5	20 DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN 1	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2024
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1	Dos (2) meses a partir del 17 de junio al 16 de agosto de 2024
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1	Un (1) mes y quince (15) días partir del 17 de agosto al 2 de octubre de 2024
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1	Dos (2) meses a partir del 2 de octubre al 2 de diciembre de 2024
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 1	Un (1) mes y veinticinco (25) días a partir del 2 de diciembre de 2024 al 26 de enero de 2025
AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 1	Un (1) mes a partir del 27 de enero al 27 de febrero de 2025
AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 1	Dos (2) meses a partir del 27 de febrero al 26 de abril de 2025
REINICIO N°1	1 de abril de 2025
PRÓRROGA N°. 6 ADICIÓN N° .3	NUEVE (9) MESES DESDE EL 4 DE ABRIL DE 2025 AL 4 DE ENERO DE 2026
PLAZO ACTUALIZADO	TREINTA Y CUATRO(4) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	4 DE ENERO DE 2026
VALOR ANTICIPO:	N/A
SUPERVISOR:	DIEGO GARCIA BEJARANO

8.2 PÓLIZAS O GARANTÍA CONTRATO INTERVENTORÍA

El contratista otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:

Tabla 64 Datos pólizas contrato interventoría

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
AMPARO	**PÓLIZA N°**	**CERTIFICADO O ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**EXPEDIDA / MODIFICADA SEGÚN**
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	0	21-feb-22	CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	0	21-feb-22	CONTRATO
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	1	7-mar-22	MODIFICACIÓN N°.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	1	7-mar-22	MODIFICACIÓN N°.
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	2	7-mar-22	ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	2	7-mar-22	ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	6	28-jul-23	MODIFICACIÓN N°. 2 y PRÓRROGA N°. 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	7	28-jul-23	MODIFICACIÓN N°. 2 y PRÓRROGA N°. 1
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	7	23-08-23	MODIFICACIÓN N° 4 Y PRÓRROGA N° 2
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	8	22-08-23	MODIFICACIÓN N° 4 Y PRÓRROGA N° 2
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	10	17-01-2024	PRÓRROGA N° 3
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	9	29-12-23	PRÓRROGA N° 3
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	11	5-03-24	PRÓRROGA N° 4 ADICIÓN N° 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	11	5-03-24	PRÓRROGA N° 4 ADICIÓN N° 1
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	14	1-04-2024	PRÓRROGA N° 5 ADICIÓN N° 2
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	12	1-04-2024	PRÓRROGA N° 5 ADICIÓN N° 2
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	15	14-04-2025	REINICIO N°1
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	16	14-04-2025	REINICIO N°1
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	17	23-04-2025	PRÓRROGA N° 6 ADICIÓN N° 3
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	18	23-04-2025	PRÓRROGA N° 6 ADICIÓN N° 3
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	13	23-04-2025	REINICIO N°1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	14	23-04-2025	PRÓRROGA N° 6 ADICIÓN N° 3

A través de la comunicación 186-0-072 se enviaron las pólizas actualizadas, y se está a la espera de la aprobación por parte de la entidad. Hasta la fecha de este informe, no se ha otorgado el aval, a pesar de las solicitudes y aclaraciones realizadas por la interventoría.

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados de conformidad con la Cláusula Décima séptima del contrato de interventoría:

Tabla 65 Pólizas del contrato de interventoría

AMPARO	REQUISITOS CONTRACTUALES		DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA		
	Vigencia contractual	% contractual	Desde	Hasta	Valor asegurado
CUMPLIMIENTO					
a). Cumplimiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	10%	3-mar-22	04-feb-26	$ 697.371.073,60
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Plazo del contrato y tres (3) años más.	5%	3-mar-22	04-ene-29	$ 348.685536,60
c). Calidad del servicio	Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.	30%	2-ago-23	21-abr-2029	$ 2.092.113.220,80
RESPONSABILIDAD CIVIL					
a). Predios labores y operaciones	Igual al período de ejecución del contrato.	No debe ser inferior a Trescientos (300) SMMLV.	3-mar-22	4-ene-26	$ 427.050.000,00

8.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.3.1 Otrosíes. Adiciones y Prórrogas

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosíes, adiciones en valor y prórrogas al contrato de interventoría:

Tabla 66 Otrosíes, Adiciones y Prórrogas Contrato 161 - Interventoría

DOCUMENTO	FECHA	PRORROGA	VALOR	MOTIVO
Modificatorio Nº 1	27-diciembre-2022	—	—	*(…) El alcance de la interventoría objeto del presente proceso, no incluye Contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, los cuales serán supervisadas directamente por la UAERMV. (Tomado de acta de modificatorio N° 1 contrato CIN-REGALÍAS-161-2022)*
Prórroga N°. 1 y modificación N°. 2	2-junio-2023	2 meses	—	Prórroga 2 meses y modificación forma de pago como se indica a continuación: *(…) Prorrogar el contrato por un plazo de 2 meses, tiempo en el cual se continuará con la revisión, verificación en campo y aprobación de los productos del Contrato No. 480 de 2022, correspondiente a la topografía, así como la revisión y aprobación de la documentación previa al inicio de actividades de Obra de la UAERMV, relativas a las obras hidráulicas que actualmente se encuentran suspendidas (Tomado de acta de modificatorio N° 2 contrato CIN-REGALÍAS-161-2022)*
Modificación N°3	14-jul-2023	-	—	Modificar el formulario electrónico de la plataforma SECOP de la cláusula 17 del contrato garantías.
Prórroga N°. 2 y Modificación N°. 4	2-ago-2023	4 meses 29 días	—	Prorrogar el contrato por un término de 4 meses y 29 días a partir del día 3 de agosto del año 2023.
Prórroga N°. 3	29-dic-2023	2 meses	—	Prorrogar el contrato por un término de 2 meses.
Prórroga N°. 4 y Adición N° 1	20-feb-2024	1 meses	$66.865.059	Prorrogar el contrato por un término de 1 mes, adicionar al contrato el valor de $66.865.059
Prórroga N°.5 y Adición N° 2	26-mar-2024	20 días	$119.900.452,00	Prorrogar el contrato por un término de 20 días, adicionar al contrato el valor de $119.900.452,00

DOCUMENTO	FECHA	PRORROGA	VALOR	MOTIVO
Prórroga N°.6 y Adición N° 3	2-abr-2025	9 meses	$ 3.682.565.08,00	Prorrogar el contrato por un término de 9 meses, adicionar al contrato el valor de $ 3.682.565.08,00

8.3.2 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoría

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las suspensiones y reinicios del contrato de interventoría:

Tabla 67 Suspensiones y Reinicios al Contrato 161 - Interventoría.

Documento Acta			Fecha inicio Suspensión	Fecha fin Suspensión	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio Suspensión Reinicio	Motivo Ampliación o prórroga
Suspensión Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento					
Suspensión N°.1	-	17-abr-24	17-abr-24	15-jun-24	Dos (2) meses	16-06-24	Búsqueda de recursos para ejecución contrato interventoría
Reinicio N°1	-	1-abr-25	-	-	-	1-abr-25	-

Para el presente periodo no se realizaron modificaciones contractuales.

8.3.3 Actas modificativas al contrato de interventoría

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a los costos del presupuesto contractual del contrato de interventoría:

Tabla 68 Actas de Modificaciones Costos de Interventoría

ACTA MODIFICATIVA N°	FECHA	MOTIVO			
		AJUSTE MAYORES Y MENORES COSTOS	PRÓRROGA	ADICIONAL EN VALOR	COMENTARIOS
MODIFICACIÓN N°. 2	26 de mayo de 2023	N/A	1	N/A	Se ajustan las tarifas de los profesionales de acuerdo con la lista de precios de referencia del IDU, adicionalmente se ajustan la dedicación de los profesionales dadas las necesidades en campo.
MODIFICACIÓN N°. 4	2 de agosto de 2023	N/A	2	N/A	Se ajusta la cantidad de personal de acuerdo a simultaneidad de los tres ejecutores de obra.

8.4 SEGUIMIENTO REALIZADO POR INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona los contratos y proyectos a los cuales la interventoría realiza control y seguimiento en el presente informe:

- CONTRATO DE OBRA PUBLICA 478 DEL 10/02/2022 Consorcio Gaviones 95 En ejecución.

- CONTRATO DE OBRA PUBLICA 479 DEL 10/02/2022 Consorcio Estabilización Vial, En ejecución.

- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 480 DEL 22/02/2022 Soluciones Geoespaciales S.A.S, finalizado tiempo contractual.

- Proyecto de la entidad ejecutora UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL para el PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ), se realiza seguimiento de actividades de obra iniciadas desde el 17 de julio de 2023. En ejecución.

8.5 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

8.5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contrato de interventoría Nº. CIN-161 del 14/02/2022, en el periodo comprendido entre 1 de 30 de junio de 2025, se realiza el seguimiento a los contratos activos indicados en el informe mensual,

A continuación, se describen las actividades realizadas por el personal de la interventoría:

8.5.1.1 Actividades realizadas componente Topográfico.

El componente topográfico realiza las siguientes actividades durante el periodo del presente informe:

8.5.1.1.1 Actividades en campo y oficina

TRAMO UNIÓN TUNALES

- Control y revisión: Perfilamiento de la subrasante entre las progresivas K0+625 a K0+700.
- Control y revisión: Extendida de base granular como protección de subrasante entre K0+625 a K0+680 (dimensiones: 55×4.6×0.10 m).
- Control y revisión: Aproximación de base granular desde K0+665 hasta K0+700 (35×4.6×0.08 m).
- Control y revisión: Replanteo de borde de vía para ejecución de cunetas.
- Control y revisión: Manejo de aguas por escorrentía en el costado izquierdo de la progresiva K0+550.
- Control y revisión: Replanteo de borde de vía para cunetas entre K0+205 a K0+400.
- Control y revisión: Aproximación de base granular en el tramo comprendido entre K0+455 y K0+510.
- Control y revisión: Replanteo de borde de vía para cunetas entre K0+280 a K0+415.

TRAMO CAPITOLIO

- Control y revisión: Extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica entre K3+590 y K3+440.
- Control y revisión: Imprimación mecánica sobre fresado entre K3+590 y K3+440.
- Control y revisión: Cereo aproximado del fresado con espesor de 0.08 m.
- Control y revisión: Extendida de base granular como protección de subrasante entre K3+400 a K3+370 y conformación del cerro.
- Control y revisión: Extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica entre K3+540 a K3+490.
- Control y revisión: Imprimación mecánica sobre fresado entre K3+540 y K3+490.
- Control y revisión: Cereo a nivel de fresado con espesor de 0.07 m.
- Control y revisión: Extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica entre K3+490 a K3+475.
- Control y revisión: Imprimación mecánica sobre fresado entre K3+490 y K3+475.
- Control y revisión: Cereo a nivel de fresado con espesor de 0.08 m.
- Control y revisión: Corte de junta para base estabilizada en la progresiva K3+550.

TRAMO SAN ANTONIO – TOLDO

- Control y revisión: Perfilación de subrasante entre K3+150 a K3+130 y extendida de base en el mismo tramo.
- Control y revisión: Trasiego de RCD entre K3+130 y K3+115.
- Control y revisión: Limpieza de alcantarillas en las progresivas K3+120 y K3+335.
- Control y revisión: Perfilación de subrasante entre K3+130 a K3+120.
- Control y revisión: Perfilación de exceso de material saturado y barro entre K1+420 a K1+390.
- Control y revisión: Conformación con rajón entre K3+130 a K3+120 para habilitar el paso y retomar labores al día siguiente.
- Control y revisión: Perfilación de material saturado entre K1+100 a K1+180.
- Control y revisión: Excavación de fallo entre K1+180 a K1+170 (e=0.40 m), instalación de rajón (e=0.30 m) y sello con RAP (e=0.18 m) para protección de vía.
- Control y revisión: Reproceso de excavación de fallo entre K1+400 a K1+390 para recuperación de movilidad. Excavación (e=0.60 m), mejoramiento con rajón (e=0.40 m), y sello con RAP (e=0.20 m).
- Control y revisión: Reproceso de excavación de fallo entre K1+400 a K1+415. Excavación (e=0.60 m), mejoramiento con rajón (e=0.50 m), sello con B-200 (e=0.10 m).
- Control y revisión: Instalación de base granular (e=0.15 m) entre K2+800 a K2+793.
- Control y revisión: Acción de movilidad mediante instalación de rajón (e=0.20 m).
- Control y revisión: Excavación de movilidad entre K2+330 a K2+340 (A=4.00 m), excavación (e=0.40 m), mejoramiento con rajón (e=0.25 m), sello con RAP (e=0.15 m).
- Control y revisión: Aseo, orden y limpieza de acopios entre K2+600, K2+400 y K2+250.
- Control y revisión: Acción de movilidad entre K2+620 a K2+610 (A=4.60 m), excavación (e=0.40 m), mejoramiento con rajón (e=0.25 m), y sello con RAP (e=0.15 m).
- Control y revisión: Manejo de aguas lluvias entre K9+500 a K9+400 costado derecho.
- Control y revisión: Perfilación de material saturado entre K2+870 a K2+720 (material queda acopiado en vía).
- Control y revisión: Acción de movilidad entre K3+148 a K3+138 (A=3.50 m), excavación (e=0.40 m), mejoramiento con rajón (e=0.25 m), y sello con RAP (e=0.15 m).

8.5.1.1.2 Observaciones realizadas durante el periodo

Debido a que se evidencia diferencias en la información de altimetría que genera el equipo de topografía de la UAERMV en campo con respectos a la información entregada por el contratista soluciones geoespaciales sas de los deltas del tramo san antonio 2, se realiza la recomendación y se resalta la importancia de realizar procedimientos topograficos manteniendo precisiones mínimas, lo anterior para evitar reprocesos y cambios en las obras que ejecutan el consorcio estabilización y la UAERMV.

Para el tramo 4 el consorcio estabilización vial realizó el precedimiento de poligonal abierta con puntos de control, lo anterior con el fin de generar información X, Y para los deltas de este tramo, para lo cual se logró evidenciar fallas en el procedimiento realizado, por parte de la interventoría se hacen la respectivas observaciones para que se implementes buenas practicas para el desarrollo de estas actividades.

8.5.1.1.3 Observaciones Especialista diseño Geométrico y de tráfico.

Para el presente periodo el especialista de diseño geométrico y de gráfico realizó la revisión del PMT presentado para el contratista Gaviones 95 para el contrato de obra 478-2022, del cual se emite informe avalando y revisando los documentos para la remisión del PMT.

8.5.1.2 Profesional Residente Técnico y Director.

Para el presente periodo, el director y residente de obra realizaron el debido acompañamiento a las actividades de obra, así como también el acompañamiento a las diferentes mesas técnicas y comités de seguimiento semanal realizados en el los numerales 4.13.1 para Gaviones 95, 5.13.1 para Consorcio estabilización Vial y 7.6.1 para la entidad ejecutora UAERMV.

Se presenta el avance y actividades realizadas semanalmente, prueba de esto se encuentran los informes semanales en el numeral 4.D.

Adicionalmente se realizan las siguientes actividades

- Respuesta a los requerimientos de los ejecutores del proyecto.
- Recorridos de obra.
- Asistencia comités de obra .
- Elaboración de comunicaciones.

8.5.1.3 Profesional de calidad:

El profesional de calidad para el periodo del presente informe realizó el acompañamiento en la elaboración de informes mensuales.

8.5.1.4 Especialista en Geotecnia y Pavimentos

Para el presente periodo el especialista de Geotecnia y Pavimentos realizó la revisión del informe de apropiación a los diseños N°.9, remitido por el Consorcio Estabilización Vial para el contrato de obra 479-2022, del cual se emite informe revisando y avalando los documentos para su implementación en campo.

8.5.1.5 Especialista Estructural

El profesional no desempeño labores en el presente periodo.

8.5.1.6 Especialista Hidráulico

Para el presente periodo, el especialista hidráulico mediante comunicación 186-1- 684 del 29 de mayo de 2025, emite concepto a la comunicación remitida por el contratista Consorcio Gaviones 95 donde remiten el ajuste a la geometría de la cuneta.

8.5.1.1 Profesional Jurídico

Para el presente periodo el profesional jurídico de la interventoría realizo el acompañamiento correspondiente a los conceptos emitidos hacia las diferentes entidades y/o contratistas, así como la verificación jurídica a los documentos suscritos, suspensiones, reinicios y demás.

8.6 CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Para el manejo y control de correspondencia acorde con el sistema de gestión de calidad, se han establecido consecutivos independientes para los oficios que se emiten y reciben en la oficina o campamento del proyecto cercana a las obras y para los oficios que se emiten y reciben en la oficina central en Barranquilla, por lo que se diferencia con el número central del código consecutivo de correspondencia:

Correspondencia enviada y recibida por:

Contrato 478

Contrato 479

Entidad ejecutora UAERMV

Fondo Desarrollo Local de Sumapaz.

A continuación, se relaciona la correspondencia generada por la interventoría para el presente periodo y recibida por parte de los contratistas.

Tabla 69 Correspondencia enviada a contrato 478

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-687	3-jun.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Solicitud de inicio actividades de obra frente Laguna Verde.
186-1-688	3-jun.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta comunicación CEV/22-406 "Hojas de vida"
186-1-691	6-jun.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta comunicación D-23-2025-37 HOJA DE VIDA PROFESIONAL SST
186-1-698	12-jun.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta a correo electrónico del 9-06-25 "Informes semanales SST, correspondientes a abril, mayo y junio de 2025.
186-1-705	16-jun.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta comunicado D-26- 2025-37. Plan Adaptación Guía Manejo Ambiental PAGA V3 -Ava
186-1-714	24-jun.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta comunicado D-29- 2025-37. Entrega informe ambiental No. 13 abrilde 2025 V2.
186-1-715	24-jun.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta comunicado D-31- 2025-37. Entrega informe ambiental No. 14 mayo de 2025 V1.
186-1-716	24-jun.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta al comunicado D-3 del 3 de marzo del 2025 y D 19 del 28 de mayo del 2025.
186-1-718	24-jun.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta al correo electrónico del 16 de junio del 2025. Informe mensual social N°14 – mayo – 2025. Consorcio Gaviones 95.
186-1-719	25-jun.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta a comunicado con asunto entrega acta de cobro No. 3
186-1-724	26-jun.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Solicitud de documentación y actividades pendiente componente social Consorcios Gaviones 95
186-1-726	27-jun.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta comunicado D-32- 2025-37. Entrega de informes mensuales ambiental No.1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10. (Avalados), y Solicitud de ajustes a los informes No. 6, 7, 8, 11 y 12

Tabla 70 Correspondencia enviada a Contrato 479

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-692	9-jun.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta comunicado CEV/22-407.Observaciones informe ambiental No 19 V1
186-1-695	11-jun.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Concepto favorable Acta Parcial de obra N.°7. Remitida mediante comunicado CEV/22-405 del 27-may-25.

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-703	13-jun.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta comunicación CEV/22-412 "Observaciones hojas de vida" reiteración observaciones.
186-1-707	16-jun.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Llamado de atención por transporte indebido de personal en obra CEV
186-1-709	18-jun.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta a comunicado CEV/22-417 Informe del componente Ambiental No.15 V02
186-1-710	18-jun.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta al comunicado CEV/22-408 del 5 de junio del 2025 "Informe mensual social No 19"
186-1-711	18-jun.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta al correo electrónico del 5 de junio del 2025, Informe mensual Social No 14 V4,15 V4,16 V3,17V2. CEV
186-1-712	24-jun.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta a comunicado CEV/22-416 Informe del componente Ambiental No.19 V-2.
186-1-717	24-jun.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta al comunicado CEV/22- 409, del 5 de junio del 2025, Actas de vecindad deapertura de los tramos viales de Unión Tunales y San Antonio El Toldo. CEV.
186-1-720	25-jun.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Llamado de atención por omisión a sistemas de seguridad en Taludes - Frente de obra San Antonio
186-1-723	25-jun.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Rta. comunicados CEV22-390 - Informe mensual SST No. 18 y CEV-22-410 -Informe mensual SST No 19.
186-1-725	27-jun.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta a comunicado CEV/22-422 Informes del componente Ambiental No.1, No 2 y del No 4 al No.10

Tabla 71 Correspondencia enviada a UAERMV

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-690	5-jun.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta a correo electrónico 21-05-2025. "Frente 08 – Animas Bajas – segmento 02 (final del tramo), 649 m.
186-1-693	9-jun.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Rta. Correo electrónico el día 07/06/2025, Observaciones informe ambiental No. 12.
186-1-694	10-jun.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Llamado de atención del componente ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo SST
186-1-696	12-jun.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta comunicado 20251920066591 Subsanación de las observaciones del Informe Ambiental No. 11.

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-697	12-jun.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta a correo enviado por la UAERMV, el 06-05-2025, "Informe SST, No. 11."., correspondiente a abril de 2025.
186-1-699	12-jun.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta a Radicado: 20251920072261 Fecha: 10-06-2025, recibido el 11 – 06 - 2025. Solicitud entrega de consolidado de actas de reuniones con la comunidad realizadas en el frente de obra de Capitolio.
186-1-704	16-jun.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta comunicado 20251920066631. Actualización Plan de adaptación guía de manejo ambiental PAGA V4 - Ava
186-1-706	16-jun.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Llamado de atención por transporte indebido de personal en obra
186-1-708	18-jun.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Envío certificados disposición RCD Contrato 478 de 2022 y Contrato 479 de 2022.
186-1-713	24-jun.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta al correo electrónico recibido el 14 de junio del 2025 informe mensual social N° 12 mes de mayo del 2025.
186-1-721	25-jun.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta a comunicado 20251920072021, del 10-06-25, Rta. consecutivo Ecovias 186-1-674 "Solicitud de entrega de cronograma."
186-1-722	25-jun.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta al Radicado 20241920010231 del 31 de enero del 2024, UAERMV
186-1-727	11-jun.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Llamado de atención por funcionamiento defectuoso en maquinaria

Tabla 72 Correspondencia enviada a FDRS

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-689	4-jun.-2025	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	Hojas de vida residente técnico N°.3, cadenero N°.1 y cambio Topógrafo

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por destinatario

Tabla 73 Correspondencia recibida Contrato 478

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1188	3-jun-25	Consorcio Gaviones 95	Hoja de vida Profesional SST	D-23-2025-37
186-3-1196	5-jun-25	Consorcio Gaviones 95	Informes mensuales SST # 14 abril y # 15 mayo del 2025 - Cto. 478 del 2022 Gaviones 95".	D-24-2025-37
186-3-1207	12-jun-25	Consorcio Gaviones 95	Alcance comunicado D-22-2025-37 de fecha 29 de mayo de 2025	D-25-2025-37
186-3-1208	12-jun-25	Consorcio Gaviones 95	Entrega de plan de adaptación de la guía ambiental PAGA -V3 2025	D-26-2025-37
186-3-1209	13-jun-25	Consorcio Gaviones 95	Respuesta Oficio 186-1-698 "Informes Semanales SST correspondientes al mes de abril y mayo de 2025"	D-27-2025-37
186-3-1213	16-jun-25	Consorcio Gaviones 95	Respuesta Oficio 186-1-702 "Informes Mensuales SST correspondientes al mes de abril y mayo de 2025".	D-28-2025-37
186-3-1215	17-jun-25	Consorcio Gaviones 95	Respuesta comunicado 186-1-637. Entrega de informe ambiental N°13 abril del 2025 V2.	D-29-2025-37
186-3-1216	17-jun-25	Consorcio Gaviones 95	Respuesta Oficio 186-1-663 "Informes Mensuales Componente SST".	D-30-2025-37
186-3-1219	17-jun-25	Consorcio Gaviones 95	Entrega de informe ambiental N°14 V1, mayo del 2025,	D-31-2025-37
186-3-1224	20-jun-25	Consorcio Gaviones 95	Respuesta oficio 186-1-663 "Informes mensuales componente ambiental".	D-32-2025-37
186-3-1233	28-jun-25	Consorcio Gaviones 95	Respuesta al radicado No. 20251920081791 de fec ha 27,06,2025 ccuyo aunto es "Visita tramo del proyecto próximo 2 julio de 2025"	D-33-2025-37

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por parte del contratista Estabilización vial para el presente periodo.

Tabla 74 Correspondencia recibida Contrato 479

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1192	5-jun-25	Consorcio Estabilización Vial	Informe mensual ambiental No 19	CEV/22-407
186-3-1193	5-jun-25	Consorcio Estabilización Vial	Informe mensual social No 19	CEV/22-408

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1195	5-jun-25	Consorcio Estabilización Vial	Radicación de actas de vecindad	CEV/22-409
186-3-1197	6-jun-25	Consorcio Estabilización Vial	In,forme mensual SST No 19	CEV/22-410
186-3-1199	10-jun-25	Consorcio Estabilización Vial	Respuesta oficio 186-1-688 Observaciones hojas de vida	CEV/22-412
186-3-1199	10-jun-25	Consorcio Estabilización Vial	Concepto de geotecnia para el tratamiento de taludes	CEV/22-099
186-3-1202	10-jun-25	Consorcio Estabilización Vial	Informe mensual Técnico No 19	CEV/22-411
186-3-1203	11-jun-25	Consorcio Estabilización Vial	Preacta de obra No 8 – V1	CEV/22-413
186-3-1206	12-jun-25	Consorcio Estabilización Vial	Acta de ajuste de precios No 4 de la preacta de corte No 7	CEV/22-414
186-3-1210	13-jun-25	Consorcio Estabilización Vial	Respuesta oficio 186-1- 692 Iinforme mensual ambiental No 19 V2	CEV/22-416
186-3-1214	16-jun-25	Consorcio Estabilización Vial	Respuesta oficio 186-1-703 Observaciones hojas de vida	CEV/22-418
186-3-1217	17-jun-25	Consorcio Estabilización Vial	REPORTE DE LLUVIAS MAYO Y JUNIO DE 2025	CEV/22-421
186-3-1218	17-jun-25	Consorcio Estabilización Vial	Actualización de pólizas de acuerdo a la prorroga No 3	CEV/22-421
186-3-1221	19-jun-25	Consorcio Estabilización Vial	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	CEV/22-419
186-3-1222	20-jun-25	Consorcio Estabilización Vial	Respuesta oficio 186-1-264 Informes Ambientales	CEV/22-422
186-3-1223	20-jun-25	Consorcio Estabilización Vial	Respuesta oficio 186-1-707 Llamado de atención por transporte de persona en obra	CEV/22-423

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por parte del contratista UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL para el presente periodo:

Tabla 75 Correspondencia recibida UAERMV

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1189	3-jun-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Actualización del documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA 2025 V4	20251920066631

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1190	3-jun-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Subsanación de las observaciones del Informe Ambiental No. 11. (Respuesta a oficio No. 186-1-655 – Ecovias SAS - Radicado UMV No. 20251120071202)	20251920066591
186-3-1191	4-jun-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Respuesta a radicado No. 20251120071002, Oficio No. 186-1-654, de Ecovias SAS. "Incumplimientos del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo"	20251180068451
186-3-1194	5-jun-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Respuesta a comunicados con radicado UAERMV No. 20251120069492 del CEV 2022 y 20251120074932 de ECOVIAS referentes a la solicitud de modificación No. 4 del contrato 479 de 2022 para la inclusión de ítems no previstos APU's-NP	20251920069801
186-3-1200	10-jun-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Respuesta radicado UMV 20251120084022, consecutivo ECOVIAS 186-1-674, con asunto: solicitud entrega de cronograma	20251920072021
186-3-1204	11-jun-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	: Respuesta radicado UAERMV No 20251120077682- solicitud entrega de consolidado de actas de reuniones con la comunidad realizadas en el frente de obra de Capitolio.	20251920072261
186-3-1205	11-jun-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Solicitud actas de comité de seguimiento de obra.	20251920072381
186-3-1211	16-jun-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Respuesta comunicado 20251120088292 y 20251120092962 UAERMV, Consecutivo interno 186-1-690 ECOVIAS. Adaptación diseño geométrico frente 08 – ANIMAS BAJAS – Segmento 02	20251920074971
186-3-1225	24-jun-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Solicitud de información sobre actas parciales de obra del Consorcio Gaviones 95 y reiteración a comunicados UAERMV 20251900061731 y 20251900064861.	20251920078421
186-3-1226	25-jun-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Respuesta radicado UAERMV No 20251120082962 - remisión Informe visita Intervenciones donde se utilizó material fresado estabilizado en Bogotá Urbana".	20251920078791
186-3-1227	25-jun-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Solicitud revisión y verificación de las garantías allegadas por los contratistas Consorcio Gaviones 95 y Consorcio Estabilización Vial (Contratos No. 478 y 479 de 2022)	20251920079341
186-3-1228	27-jun-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Respuesta radicado UAERMV No 20251120082962 - remisión Informe visita Intervenciones donde se utilizó material fresado estabilizado en Bogotá Urbana".	20251900081531

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1229	27-jun-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Respuesta a observaciones realizadas en el oficio 186-1-664 con radicado UAERMV No 20251120077662, respecto al Informe Mensual Social No. 11 V1 – Proyecto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ – SGR-BPIN 2018000050020" – Localidad 20 de Sumapaz.	20251920081301
186-3-1230	27-jun-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Comunicación oficial - Respuesta radicado UAERMV 20251120093842 con asunto radicación de Acta No 18 de la preacta de corte No 7	20251920081471
186-3-1231	27-jun-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Respuesta oficio No. 186-1-696 – Ecovias SAS - Radicado UMV No. 20251120094262	20251920081391
186-3-1232	27-jun-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Visita tramos del proyecto próximo 2 julio de 2025	20251920081791

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por parte del contratista Fondo de Desarrollo Local para el presente periodo:

Tabla 76 Correspondencia recibida FDRS

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1198	9-jun-25	Alcaldia Rural de Sumapaz	Respuesta Rad 186-1- 640 Hojas de vida reinicio CIN-REGALÍAS-161-2022	20257020007461
186-3-1212	16-jun-25	Alcaldia Rural de Sumapaz	Solicitud de entrega oportuna de información	20257020010301
186-3-1220	18-jun-25	Alcaldia Rural de Sumapaz	Seguimiento contratista Gaviones 95 (Contarto 478-2022)	20257020010441

8.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

El registro fotográfico de las actividades realizadas para el periodo, anexo 4.D

8.8 EQUIPO Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA

El equipo disponible de la interventoría se describe a continuación:

Equipo de oficina:

- ✓ Equipos de Computación de Escritorio y Portátiles
- ✓ Equipos de Escáner e Impresión.
- ✓ Dotación de oficina
- ✓ Alquiler de camioneta
    - o Alquiler camioneta incluye conductor 3
- ✓ Alquiler campamento
    - o Oficina 3
- ✓ Alquiler equipos de computo
    - o Portátil 8 unidades
- ✓ Alquiler de impresora
    - o Impresora 2
- ✓ Servicios públicos
    - o Energía y aseo
- ✓ Alquiler de equipo topografía
    - o Estación mira y nivel (2)

Sede de la interventoría:

Oficina como sede de la interventoría Bogotá Urbana y Rural Sumapaz.

8.8.1 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

Tabla 77 Certificados calibración Topografía

EQUIPO	MODELO	SERIE
Nivel electrónico marca HI TARGET	HT-32	331090106
Nivel automático marca KOLIDA	KL-32	1205599
Estación Total HI TARGET	HTS-420R	H236518
Estación Total KOLIDA	KTS442UT	K156143

8.9 PERSONAL INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona el personal que participo para el presente periodo.

Tabla 78 Personal Contrato 161 ECOVIAS S.A.S - Interventoría

N°	PROFESIONAL	NOMBRE
1	Directora de Interventoría	Ermy Alcier Hurtado Romero
2	Residente de interventoría	José Luis Usuga Gómez
3	Residente de interventoría	José Antonio Plata Giraldo
4	Residente de interventoría	Luiggi Alberto Pugliese Mercado
5	Residente social	Eva Isabel Bernal Yasso
6	Residente SST	Jesús Antonio Rincón Benavides
7	Profesional Ambiental	Yesenia Hernández Ramírez
8	Ingeniero Auxiliar	David Leonardo Ochoa Vanegas
9	Secretaria	Leydi Lorena Terreros Larrota
10	Topógrafo	Julián David Ortiz Henao
11	Topógrafo	Cesar Ali Martínez Barón
12	Cadenero 1	Jhon Jaider Hernández Crúzate
13	Cadenero 1	Neley Isabel Alcalá Molina
14	Cadenero 1	Orlando Sandoval Pavon
15	Cadenero 2	Roger Antonio Orellano Cuberos
16	Cadenero 2	Diego Segundo Fontalvo Conde
17	Cadenero 2	Magaly Yulieth Lasso Cerón
18	Inspector	Brayan Geovanny Mendoza Diaz
19	Inspector	Jeisy Loana Altamar Rodríguez
20	Inspector	Carlos Julio Macana Sechagua
21	Abogada	Eliana Melissa Gil Vega
22	Especialista En Geotecnia	Dani Ricardo Acevedo Vergara
23	Especialista En Pavimentos	Dani Ricardo Acevedo Vergara
24	Especialista En Diseño Geométrico	Walter Alfonso Pautt Torres
25	Especialista En Trafico	Walter Alfonso Pautt Torres
26	Especialista Hidráulico	Ignacio Segundo De La Hoz De Castro
27	Especialista Estructural	Manuel De Jesús Alarcón Badillo

Tabla 79 Plan de cargas Interventoría

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR"					
CARGO / OFICIO	**CANT.**	**SALARIO BASE AJUSTADO**	**DEDICACION (%)**	**DEDICACION (MESES)**	**VALOR TOTAL**
PERSONAL PROFESIONAL					
Director de Interventoría	1	$ 10.640.000,00	100%	1,00	$ 10.640.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	3	$ 9.060.000,00	100%	1,00	$ 27.180.000,00
Profesional Ambiental	1	$ 8.172.000,00	90%	1,00	$ 7.354.800,00
Profesional Social	1	$ 7.287.000,00	100%	1,00	$ 7.287.000,00
Profesional SST	1	$ 7.287.000,00	100%	1,00	$ 7.287.000,00
Especialista en Geotécnia	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Especialista en Pavimentos	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Especialista Hidraúlico	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Especialista Estructural	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Especialista en Tráfico	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Especialista en diseño Geométrico	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Abogado	1	$ 7.287.000,00	20%	1,00	$ 1.457.400,00
PERSONAL TÉCNICO					
Topógrafo	2	$ 3.555.000,00	100%	1,00	$ 7.110.000,00
Laboratorista	0	$ 3.149.000,00	50%	1,00	$ 0,00
Inspector	3	$ 3.555.000,00	100%	1,00	$ 10.665.000,00
Tecnico auxiliar de Ingenieria	1	$ 3.410.000,00	100%	1,00	$ 3.410.000,00
Secretaria	1	$ 1.920.000,00	100%	1,00	$ 1.920.000,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
Cadenero I	3	$ 2.204.000,00	100%	1,00	$ 6.612.000,00
Cadenero II	3	$ 1.920.000,00	100%	1,00	$ 5.760.000,00
					$ 107.555.200,00
FACTOR MULTILICADOR				**2,36**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 253.830.272,00
OTROS COSTOS DIRECTOS					
Alquiler de Camioneta (Incluye conductor) Código IDU 9165	4	$ 8.352.000,00	100%	1,00	$ 33.408.000,00
Alquiler de oficinas (Sumapaz)	2	$ 2.470.867,00	100%	1,00	$ 4.941.734,00
Alquiler de equipos de computo	8	$ 198.320,00	100%	1,00	$ 1.586.560,00
Alquiler de impresora	2	$ 390.137,00	100%	1,00	$ 780.274,00
Papeleria	1	$ 650.229,00	100%	1,00	$ 650.229,00
Caja menor	2	$ 390.137,00	100%	1,00	$ 780.274,00
Laboratorios y pruebas	0	$ 19.506.847,00	45%	1,00	$ 0,00
Alquiler de equipo de topografía (estación, mira y nivel) Código IDU 9115	2	$ 4.716.913,00	100%	1,00	$ 9.433.826,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 51.580.897,00
FACTOR MULTILICADOR				**1,15**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 59.318.033,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA					313.148.305,00
IVA SOBRE EL VALOR BASE DE LA INTERVENTORIA				19,00%	59.498.178,00
Periodo del 1 al 30 de junio de 2025					**372.646.483,00**

8.10 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA.

8.10.1 Forma de pago del contrato.

Teniendo en cuenta la **Prorroga N°.1 y Modificación N°2**, al contrato de interventoría donde se estipulo:

***"CLÁUSULA SEGUNDA**. Modificar la **CLÁUSULA 8** del contrato "FORMA DE PAGO", la cual quedará de la siguiente manera: 1**. 90% DEL VALOR DEL CONTRATO ASÍ**: El FDRS pagará al INTERVENTOR, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el FDRS y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, probados por el contratista y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. La cuenta de Cobro debe ser refrendada por el representante del interventor y el Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el FDRS a través del Supervisor. La cuenta deberá presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos*".

1. 10% DEL VALOR DEL CONTRATO DISTRIBUIDOS ASÍ:

A. UN PAGO DEL 5% CON:

• Recibo a satisfacción de las obras de malla vial, obras hidráulicas y demás que sean requeridas. • Entrega de informe final de interventoría.
• Entrega de planos récord al momento del pago. Conforme lo mencionado en los estudios previos y anexo 1 – anexo técnico.

B. EL 5% RESTANTE CON: • Suscripción acta de liquidación contrato de obra e interventoría.

8.10.2 Actas de costos / Recibos parcial de Interventoría

La siguiente tabla contiene la relación de actas parciales de la interventoría.

Tabla 80 Relación Actas parciales Contrato 161- Interventoría

ACTA	FECHA	PERÍODO	VALOR BÁSICO	I.V.A.	VALOR TOTAL ACTA	Estado
N°			($)	($)	($)	
1	24/06/2022	3 al 31 mar 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
2	24/06/2022	01 al 30 abr de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
3	10/08/2022	01 al 31 May de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
4	10/08/2022	01 al 30 jun de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
5	26/06/2023	01 al 31 jul de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
6	26/06/2023	01 al 30 ago. de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
7	26/06/2023	01 al 30 sep de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
8	28/06/2023	01 al 30 oct de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
9	28/06/2023	01 al 30 nov de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
10	28/06/2023	01 al 30 dic de 2022	$ 95.866.838	$ 18.214.699	$ 114.081.537	Pagada
11	28/06/2023	01 al 31 ene de 2023	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
12	5/07/2023	01 al 28 feb de 2023	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
13	5/07/2023	01 al 31 mar de 2023	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
14	5/07/2023	01 al 30 abr de 2023	$ 55.901.199	$ 10.621.228	$ 66.522.427	Pagada
15	23/08/2023	3 jun al 2 de jul de 2023	$ 120.484.194,12	$ 22.891.997	$ 143.376.191	Pagada
16	8/09/2023	3 jul al 2 de ago de 2023	$ 124.655.621,01	$ 23.684.568	$ 148.340.189	Pagada
17	25/09/2023	3 al 31 de ago de 2023	$ 152.297.324,10	$ 28.936.492	$ 181.233.815	Pagada
18	13/10/2023	1 al 30 de sep de 2023	$ 163.938.636,00	$ 31.148.341	$ 195.086.977	Pagada
19	29/11/2023	1 al 31 de oct de 2023	$ 163.938.636,00	$ 31.148.341	$ 195.086.977	Pagada
20	7/12/2023	1 al 30 de nov de 2023	$ 163.938.636,00	$ 31.148.341	$ 195.086.977	Pagada
21	18/01/2024	1 al 31 de dic de 2023	$ 163.938.636,00	$ 31.148.341	$ 195.086.977	Pagada
22	28/02/2024	1 al 31 de enero de 2024	$ 178.574.851,26	$ 33.929.222	$ 212.504.073	Pagada
23	22/02/2024	1 al 29 de febrero de 2024	$ 191.812.047,06	$ 36.444.289	$ 228.256.336	Pagada
24	22/02/2024	1 al 31 de marzo de 2024	$ 195.036.915,13	$ 37.057.014	$ 232.093.929	Pagada
25	22/02/2024	1 al 16 de abril de 2024	$ 104.013.185,71	$ 19.762.505	$ 123.775.691	Pagada
26	15/05/2025	1 al 30 de abril de 2025	$ 239.497.906,72	$ 45.504.602	$ 285.002.509	Pendiente
27	15/06/2025	1 al 31 de mayo de 2025	$ 281.833.474,79	$ 53.548.360	$ 335.381.835	Pendiente
28	16/07/2025	1 al 30 de junio de 2025	$ 281.833.474,79	$ 53.548.360	$ 335.381.835	Pendiente
Total			$ 2.784.709.062	$ 529.094.728	$ 3.984.567.459	
Total, Facturas Pagadas					**$ 3.028.801.280**	
Total, Facturas Pendiente Pago					**$ 955.766.179**	

8.11 OTROS COMPONENTES

8.11.1 Gestión ambiental

Para el presente se precisa lo siguiente A continuación, se hace una relación de los productos que están pendientes por entregar por parte de la UAERMV así:

Tramo CAPITOLIO

- Acopio de combustible no tiene identificación ni señalización según SGA.
- Falta orden y aseo en tramo
- Alcantarilla K4+456 con acumulación de material.
- Material base granular y MBR no lo están cubriendo en su totalidad.
- Una de las unidades sanitarias sin agua para el lavado de manos.
- Punto ecológico en orden.
- Se observan señales verticales tiradas a un lado de la vía en K4+260.

Solicitud:

- Se le reitera la importancia del agua potable para el lavado de manos y así evitar focos de contaminación en los trabajadores.
- Se le solicita a la UAERMV, exigir al contratista que realiza el aseo a las unidades sanitarias realizar el mantenimiento y reparación de las mismas en los tiempos acordados.
- Se solicita a la UAERMV, realizar permanentemente limpieza y retiro de material y RCD en alcantarillas y en vía.

Tramo UNIÓN TUNALES

- Material RCD en K0+150 y 200, sin retirar.
- Se observa señales transito verticales a un lado de la vía en tramo 5
- Alcantarilla K2+390 con acumulación de material instalado en la vía
- Se observa de RCD, en K2+623 producto de la limpieza de zanja descole alcantarilla
- RCD al lado de la vía sin señalización adecuada
- Material base granular cubierto en acopio
- Unidades sanitarias sin agua para el lavado de manos.
- Acopio de combustible de la AUERMV, en orden y etiquetado.

Solicitud:

- Se solicita a la UAERMV, el retiro de material RCD, y material retirado de alcantarillas que hay a lo largo del tramo.

- Se solicita el retiro de restos de MBR del canal descole de alcantarilla en K2+623

SAN ANTONIO TOLDO

- Se observa derrame de emulsión asfáltica en K5+490.
- Canecas de emulsión vacías en vía.
- Una de las dos unidades sanitarias sin agua para el lavado de manos
- Retroexcavadora marca DEERE, presenta escape de hidráulico en brazo de uña
- Se observa RCD sin señalizar en K5+,840,400,965

Solicitud:

- Se solicita a la UAERMV, mantener debidamente etiquetado el acopio de sustancias químicas según SGA.
- Dotar de agua a las unidades sanitarias para el lavado de manos
- Se solicita el retiro de RCD del tramo y/o la señalización del mismo.
- Se solicita el retiro de inmediato de canecas y no dejarlas al lado de las cantarillas donde posiblemente genere contaminación y exponiendo a que los lugareños puedan tomar estas canecas las cuales necesitan un manejo ambiental adecuado.
- Se solicita la limpieza de emulsión asfáltica en el punto observado

El informe del componente ambiental se encuentra anexo al numeral 4.A

8.11.2 Salud ocupacional y seguridad en el trabajo (SST)

- Se realiza mesas de trabajo con la UAERMV y el CEV, para acordar temas relacionados con requerimientos pendientes de comités y en los comunicados, enviados.

- Seguimiento de las actividades en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantados por la UAERMV y de acuerdo con su plan de trabajo de la Etapa de Construcción.

- Durante el periodo objeto del presente informe se dio seguimiento a la accidentalidad para el contrato de obra, no se presentaron accidentes o incidentes en el periodo, según lo reportado por la parte de la UAERMV y el CEV.

- Seguimiento al suministro de elementos de protección personal de la UAERMV, reposición por deterioro, inspección y entrega oportuna.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el COPASST, conformación y actas de reuniones.

- Revisión de las planillas de pago de Seguridad Social, donde se refleje el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las obligaciones de Seguridad Social del contrato de obra.

- El Residente SST de la Interventoría intervino en los comités integrales y en aquellos espacios donde se solicitó su participación.

- La interventoría lleva control en la bitácora del componente SST, en la cual se realiza las anotaciones de novedades en terreno, con el fin de socializarlas con la profesional SST de la UAERMV y CEV.

- La Interventoría reporta el uso de dos vehículos tipo camioneta durante el periodo reportado, los cuales realizan el transporte de los profesionales de la interventoría para las actividades de recorridos a obra y asistencia a comités.

Adicionalmente se anexa el informe del componente SST en el numeral 4.B

8.11.3 Gestión social

El área social de la Interventoría realizó las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por la entidad ejecutora, en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico. Mediante:

- Recorridos
- Comités de seguimiento integral
- Comités de seguimiento social
- Verificación de documentación.
- Llamados de atención
- Bitácora social
- Lista de chequeo.

Se anexa el informe social de interventoría en el numeral 4.C

8.11.4 Estado del contrato

Estado del contrato N°. 161 del 14/02/2022. **En ejecución de actividades de obra a contratos 478, 479 y seguimiento actividades de obra a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.**

9 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA

Para el presente periodo, la interventoría realizo el seguimiento y control de los contratos relacionados en el informe, así mismo se realizó a través de la correspondencia el control y seguimiento a las observaciones presentadas por los contratistas, a partir del 1 de abril de 2025 los contratos 478, 479 y 161.

El presente documento corresponde a la versión V1, del informe mensual Nº. 28, en este informe se tomaron en consideración las observaciones realizadas por la supervisión del FDRS a los informes anteriores.

Se continua con los requerimientos por parte del componente SST, a la UAERMV en cuanto a la entrega de la documentación referente a la afiliación del personal de obra, así como las hojas de vida de la maquinaria que se encuentra en obra, adicional de los productos entregados para la adaptación de los diseños, todo esto en vista del reinicio del contrato.

El contrato 478 de 2022, Consorcio Gaviones 95 para el presente periodo reinicio el día 1 de abril de 2025, sin embargo, se evidencia en campo que no realizó actividades de obra.

Se el contrato 479 de 2022, Consorcio Estabilización Vial, para el presente reinicia actividades de obra el día 1 de abril de 2025, se realizaron actividades de excavación, perfilación, instalación geotextil y de tubería perforada para filtro e instalación de material drenante.

10 CONCLUSIONES

- El contrato 478 de 2022, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025 el contratista de obra no realizó actividades de obra, presenta un avance ejecutado del 17.91%.

- El contrato 479 de 2022 para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025, realizó actividades de excavación, perfilación, instalación geotextil y de tubería perforada para filtro e instalación de material drenante, se presenta un avance general ejecutado del 71,2% y programado del 96,8, de lo anterior se evidencia un atraso del 25.6% el cual se ha informado en los diferentes comités de seguimiento semanal.

- Para la ejecución por parte de la UAERMV presenta un atraso al cronograma de obra, del cual se tiene que para el tramo Unión Tunales se tiene un avance programado de 100%, una ejecución del 42% para un atraso del 58%; Para el tramo Capitolio se tiene un avance programado de 54%, una ejecución de 62% para un atraso del 8%, para el tramo San Antonio un avance programado del 21%, una ejecución del 10.81%, para un atraso del 10.19%.

- La interventoría da respuesta y realizó observaciones a los documentos enviados por el contratista hidráulico y la UAERMV, donde se revisó y se emitió observaciones a los productos como lo fueron informes mensuales, adaptación de los diseños geométricos, revisión de adaptación, de ítems no previstos y de actas parciales.

- Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025, se realizaron comités de obra con los ejecutores, donde se realizaron observaciones y precisiones tales como:

    - Caracterización de los materiales
    - Documentación y acciones faltantes UAERMV para inicio y continuidad de las obras
    - Avance de obra
    - Coordinación de personal, maquinaria y comisión de topografía.
    - Implementación laboratorio 100%
    - Programación semanal de actividades por componente
    - Entrega del plan de inspección de ensayos.
    - Documentación de las canteras que están suministrando el material pétreo.
    - Entrega de los informes mensuales de cada componente.

- Con el inicio de obras del 17 de julio de 2023 por parte de UAERMV la interventoría mediante múltiples comunicaciones solicita al contratista para que entregue la documentación referente al ingreso de personal, hoja de vida de la maquinaria empleada para la ejecución de las obras, dicho requerimiento a fecha de corte del presente informe sigue sin ser atendido en su totalidad.

- La UAERMV con los inconvenientes que ha tenido en cuanto al suministro de la maquinaria y materiales pétreos, no ha podido avanzar en la ejecución por los bajos rendimientos que se están presentando lo que posiblemente ocasionara que no se culmine a tiempo todas las actividades contempladas de obra

- Por otra parte, se le ha reiterado a la UAERMV que las demoras en la entrega de las adaptaciones de los diseños geométricos están repercutiendo en el avance de la ejecución de las obras hidráulicas en los diferentes tramos, y que si los atrasos relacionados en el presente comunicado llegan afectar la terminación de las obras hidráulicas y la terminación de la ejecución de obra a cargo de la UAERMV los tiempos adicionales que se tomen y afecten el cronograma deberán ser asumidos por la UAERMV.

11 RECOMENDACIONES

- Se sugiere a la entidad FDRS, comunicar a la UAERMV que es urgente que entregue los conceptos hidráulicos para dar celeridad a la continuación de las obras, estos se vienen reiterando en cada comité de seguimiento realizado semanalmente.

- Se sugiere nuevamente a la entidad hacer saber a la UAERMV sobre la recomendación hecha, de dar mayor celeridad a la realización de ajustes a los diseños geométricos de los tramos viales. De igual manera, tener mayor responsabilidad con el cumplimiento de los compromisos establecidos en los comités de seguimiento, así como también el cumplimiento de los cronogramas remitidos, dado que al evaluar el avance de obra se evidencia un claro atraso en la ejecución de obra.

- Se sugiere a la entidad informar a la UAERMV y a su diseñador geométrico realizar visitas a campo con el fin de evidenciar de primera mano las observaciones realizadas por contratistas de obra e interventoría a fin de poder realizar los respectivos ajustes de manera eficaz y eficientemente. Lo anterior, evitando así los constantes reprocesos en la obtención de diseños geométricos definitivos para los tramos viales del proyecto.

12 ANEXOS

ANEXO NO. 01
DOCUMENTACION CONTRATO 478
DEL 10/02/2022

1.A BITÁCORA DE OBRA

Bitacora De Obra.

Tramo Capitolio Vol 2.

Contratista

Consorcio Gaviones 95

Contratante

U.A.E.R.M.V.

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Interventoria

Ecovios SAS

Objeto contrato de obra: Contrato para la ejecución de obras hidraulicas y muros gaviones para el proyecto "Mejoramiento de vias terciarias en Bogotá", Del sistema general de regalías - SGR identificado con código BPIN 20180000500020 Grupo 1, Contrato para la ejecución de obras hidraulicas y muros gaviones para el proyecto "Mejoramiento de vias terciarias en Bogotá" Del sistema general de regalías. - SGR Identificado con código BPIN 20180000500020 (San Antonio 1 CK13+820 - K6+910), Capitolio y Laguna Verde)

Luis Orlando Polido G.
Director de Obra

Director de Interventoria

Juan Camilo Tuta S.
Residente de Obra

Residente de Interventoria

Viernes 30 de mayo de 2025
Personal Interventoría: 1 Res. Técnico, 1 Res. Ambiental,
1 Inspector, 1 Res SST., 1 profesional social
Actividades
Edgar Solarte
Ecovan SAS

Sábado 31 de Mayo de 2025
Personal Interventoría: 1 Res. Técnico, 1 Res. Ambiental.
1. Inspector, 1 Res. SST. 1 prof. Ambiental social
Actividades
Edgar Solarte
Ecovan SAS

Domingo 1 Junio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res. Técnico. 1 Res Ambiental. 1 Inspector
1 Res SST. 1 profesional social
Actividades
Edgar Solarte

Lunes 2 Junio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res Técnico. 1 Res. Ambiental. 1 Inspector
1 Res SST, 1 profesional social
Actividades
Edgar
Ecovan SAS

Martes 3 Junio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res Técnico, 1 Res. Ambiental, 1 Inspector
1 Res. SST, 1 profesional social
Actividades
Edgar Solarte

Miércoles 4 Junio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res Técnico, 1 Res Ambiental, 1 Inspector
1 Res. SST. 1 profesional social
Actividades
Edgar
Ecovan SAS

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 5 Junio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res. Técnico, 1 Res Ambiental
1 Inspector, 1 Res SST, 1 profesional social
Actividades
Ecovias SAS

Viernes 6 Junio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res. Técnico, 1 Res. Ambiental, 1 Inspector
1 Res SST. 1 Profesional Social.
Actividades
Ecovias SAS

Sábado 7 Junio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res Técnico. 1 Res Ambiental, 1 Inspector
1 Res. SST. 1 Profesional social
Actividades
Ecovias S.A.S

Domingo 8 Junio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res Técnico, 1 Res Ambiental, 1 Inspector
1 Res SST. 1 profesional social
Actividad
Ecovias S.A.S

Lunes 9 Junio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res. Técnico, 1 Res Ambiental, 1 Inspector
1 Res. SST, 1 Profesional Social
Actividades
Ecovias S.A.S

Martes 10 Junio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res Técnico, 1 Res Ambiental. 1 Inspector
1 Res. SST. 1 profesional Ambiental
Actividades
Ecovias S.A.S

Powered by CamScanner

Miércoles 11 de junio de 2025
Personal Interventoría: Res. Técnico, Res. Ambiental, 1 Inspector
1 Res. SST, 1 Profesional social
Actividades
Cobras S.A.S

Jueves 12 de junio de 2025
Personal Interventoría: Res. Técnico, Res Ambiental, 1 Inspector
1 Res. SST, 1 profesional Ambiental Social
Actividades

Viernes 13 de junio de 2025
Personal Interventoría: Res. Técnico, Res. Ambiental, 1 Inspector
1 Res. SST, 1 Profesional social
Actividades

Sábado 14 de junio de 2025
Personal Interventoría: Res. Técnico, 1 Res Ambiental, 1 Inspector
1 Res. SST. 1 Profesional Social
Actividades
Cobras S.A.S

Domingo 15 de junio de 2025
Personal Interventoría: Res. Técnico, 1 Res Ambiental, 1 Inspector
1 Res. SST, 1 Profesional social
Actividades

Lunes 16 de junio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res. Técnico, 1 Res. Ambiental
1 Inspector, 1 Res SST, 1 Profesional Social

Martes 17 de junio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res. Técnico, 1 Res Ambiental
1 Inspector, 1 Res. SST 1 profesional social

Powered by CamScanner

Miércoles 18 de junio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res. Técnico, 1 Res Ambiental,
1 Inspector, 1 Res. SST, 1 Profesional social
Actividades
Firma

Jueves 19 de Junio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res Técnico, 1 Res Ambiental, 1 Inspector
1 Res. SST., 1 profesional Social
Actividades
Firma

Viernes 20 de Junio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res Técnico, 1 Res Ambiental, 1 Inspector
1 Res. SST, 1 Profesional Social
Actividades
Firma

Sábado 21 de Junio de 2025
Personal de Interventoría: 1 Res-Técnico: 1 Res Ambiental
1 Inspector, 1 Res. SST, 1 Profesional Social
Actividades
Firma

Domingo 22 de junio de 2025.
Personal de Interventoría: 1.
Festivo
Firma

Lunes 23 de junio de 2025
Festivo
Firma

Martes 24 de junio de 2025
Personal de Interventoría - 1 Res. Técnico, 1 Res. Ambiental,
1 Inspector, 1 Res. SST, 1 Profesional Social
Actividades
Firma

Miércoles 25 de junio de 2025
Personal de Interventoría: 1 Res Técnico, 1 Res Ambiental,
1 Inspector, 1 Res. SST, 1 Profesional social
Firma

Powered by CamScanner

Jueves 26 de junio de 2025
Personal de Interventoría: 1 Res. Técnico, 1 Res. Ambiental
1 Inspector, 1 Res. SST, 1 Profesional Social
Actividad
Firma

Viernes 27 de junio de 2025
Personal de Interventoría: 1 Res Técnico, 1 Res Ambiental
1 Inspector, 1 Res SST, 1 Profesional Social
Actividad
Firma

Sabado 28 de junio de 2025
Personal de Interventoría: 1 Res Técnico, 1 Res Ambiental
1 Inspector, 1 Res SST, 1 Profesional Social
Actividad
Firma

Domingo 29 de junio de 2025
Festivo
Firma

Lunes 30 de junio de 2025
Festivo

Martes 1 de julio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res Técnico, 1 Res Ambiental
1 Inspector, 1 Res SST, 1 Profesional Social
Actividad
Firma

Miercoles 2 de julio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res. Técnico, 1 Res Ambiental
1 Inspector, 1 Res. SST, 1 Profesional social
Actividades
Firma

Jueves 3 de julio de 2025
Personal Interventoría: 1 Res. Técnico, 1 Res. Ambiental
1 Inspector, 1 Res SST, 1 Profesional Social
Actividad
Firma

Norma

Powered by CamScanner

ANEXO NO. 02
DOCUMENTACION CONTRATO 479
DEL 10/02/2022

2.A ACTA PRÓRROGA N° 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Unidad Administrativa Especial
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

PRÓRROGA 3 AL CONTRATO NO. 479 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV Y CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

Entre el *Ordenador del Gasto delegado de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, JULIO CESAR PINZÓN REYES,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.578.511, actuando como Gerente del proyecto "Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" de conformidad a lo dispuesto en la Resolución 602 del 14 de julio de 2023, desempeñando el cargo de Subdirector de Intervención de la Infraestructura de la Entidad, según Resolución No. 456 de fecha 21 de junio de 2023, proferido por el Director General, y Acta de posesión 036 de fecha 22 de junio de 2023, quien en adelante y para efectos del presente acto se denominará la **UAERMV**, Entidad descentralizada del orden Distrital adscrita a la Secretaría de Movilidad, identificada con el NIT. No. 900.127.032-7, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, de una parte, y, por la otra **CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL identificado con NIT N° 901.563.835-7** y representada legalmente por **HERNANDO LAVERDE MANJARRES,** con cédula de ciudadanía **1.032.362.624**, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará genéricamente **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente Prórroga No. 3 al Contrato de Obra Pública No. 479 de 2022, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que la UAERMV y CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL suscribieron el contrato No. 479 el 10 de febrero de 2022, con el objeto "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020") GRUPO 2: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.")., por un valor de DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($12.494.588.139).

1. Que en el contrato se pactó un plazo de ejecución de ONCE (11) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, es decir, desde el desde el 03 de marzo de 2022 hasta 02 de febrero de 2023.

2. Que el 14 de julio de 2022, las Partes suscribieron Modificación No. 1 y Prórroga No. 1 al Contrato de Obra Pública No. 479 de 2022.

3. Que el 10 de octubre de 2023, las Partes suscribieron Modificación No. 2 y Prórroga No. 2 al Contrato de Obra Pública No. 479 de 2022, junto con documentos de justificación que formaron parte integral de la mencionada modificación.

4. Que el 20 de noviembre de 2023, las Partes suscribieron Modificación No. 3 al Contrato de Obra Pública No. 479 de 2022, junto con documentos de justificación que formaron parte integral de la mencionada modificación.

5. Que el Contrato de obra Pública No. 479 de 2022 ha sido suspendido de mutuo acuerdo por las partes conforme la siguiente relación:

PRÓRROGA 3 AL CONTRATO NO. 479 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV Y CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

ACTAS No.	TIEMPO (Días calendario)	FECHA
1	60 DÍAS	14/04/2023
2	30 DÍAS	15/06/2023
3	15 DÍAS	14/072023
4	32 DÍAS	28/07/2023
5	16 DÍAS	29/08/2023
6	7 DÍAS	14/09/2023
8	15 DÍAS	25/09/2023
9	ACTA REINICIO	10/10/2023
10	2 MESES	17/04/2024
11	2 MESES	17/06/2024
12	1 MES Y 16 DIAS	16/08/2024
13	1 MES	01/10/2024
14	2 MESES y 20 DIAS	01/11/2024
15	1 MES	21/01/2025
16	1 MES Y 10 DÍAS	21/02/2025
17	ACTA REINICIO	01/04/2025

6. Que conforme el acta No. 17 de reiniciación del contrato, suscrita el 01 de abril de 2025, se consignó que la fecha actual de terminación contractual es el 09 de junio de 2025.

7. Que el supervisor del contrato, mediante radicado No. 20251120082602, remitió a la Gerencia de Contratación la solicitud de Prórroga No. 3 al Contrato No. 479 de 2022, junto con documentos de justificación que forman parte integral del presente documento.

8. Que en virtud del Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales al celebrar contratos buscan el cumplimiento de los fines estatales consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los

derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

9. Que el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, contempla que en virtud del principio de responsabilidad "Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato."

10. Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en relación con el contenido del contrato estatal dispone: "(…) En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.

11. Que la solicitud de Prórroga fue aprobada en la Sesión No. 19 del Comité de Contratación extraordinaria.

12. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a prorrogar el Contrato No. 479 de 2022, con base en las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: PLAZO DE EJECUCIÓN: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 479 de 2022 por el término de DOS (2) MESES, contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo pactado; es decir, hasta el 09 de agosto de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS: El contratista deberá ampliar la vigencia de los amparos contenidos en la Garantía de Cumplimiento, de acuerdo con la presente prórroga, y cargarlas en la plataforma Secop II para su aprobación.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones no modificadas a través del presente documento continúan vigentes.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., en la fecha indicada por medio de la plataforma Secop II.

Firmado Electrónicamente
JULIO CESAR PINZÓN REYES
Subdirector de Intervención de la Infraestructura

Firmado Electrónicamente
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Contratista

Aplica Resolución No. 602 del 14 de julio de 2023

2.B BITÁCORA DE OBRA

Norma

100 - 0F

Actas, anotaciones varias.

100 hojas rayadas - 200 folios.

CIN-REGALIAS-
161 - 2022

CEV UNIÓN
TUNALES

TÉCNICO



PAPEL BLANCO

Maquinaria en obra: 1 Retroexcavadora, 1 Motoniveladora, 1 placa vibratoria, 1 vibrador de concreto, 1 generador de energía.
Actividades: Replanteo, abastecimiento y Nivelación de área para módulos intermedios del K0+940 - K0+990.
16 Modulos * Se lleva a cabo arreglo y pulido de parte frontal de modulos debido a porosidades en los tambores de concreto.

Rel. Eroviar

CGV

Sábado 31 Mayo de 2025
No se reportan actividades

Rel. Eroviar

CGV

Domingo 1 Junio de 2025
Festivo No se reportan actividades

Rel. Eroviar

CGV

Lunes 2 Junio de 2025
Festivo No se reportan actividades

Rel. Eroviar

CGV

Martes 3 Junio de 2025 Clima: Seco
Personal CGV: 1 Inspector, 2 Aux Tráfico, 4 Ayudantes, 1 Oficial 1 operador Retroexcavadora
Maquinaria y equipo en obra: 1 Retroexcavadora, 1 Motoniveladora, 1 placa vibratoria, 1 vibrador de concreto, 1 generador energía.
Personal Interventoría: 1 Residente Técnico, 1 Inspector, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental
Actividades de obra: Se realiza replanteo, abastecimiento y nivelación de sitios para modulos K0+970 - K1+060. Total 11 modulos. Se lleva a cabo perfilado de 13 modulos previamente aprobados por interventoría. Se solicita mayor vibrado en el concreto para evitar porosidad y presencia de vacios K0+015 - K0+970.

Rel. Eroviar

CGV

Miércoles 04 Junio de 2025 Clima: Seco

Personal CCV: Personal CCV: 1 Residente Técnico, 1 Inspector, 1 Oficial, 4 ayudantes, 1 operador Minicargador

Maquinaria y Equipo en obra: 1 Minicargador, 1 Mezcladora, 1 Placa vibratoria, 1 vibrador de concreto, 1 generador eléctrico

Personal Interventoría: 1 Residente Técnico, 1 Residente SST, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST

Actividad de obra: Se lleva a cabo replanteo, alistamiento y nivelación para módulos Km0+990 - Km1+060. Total 11 módulos - Km0+995 - Km1+010: Se realiza fundida de 10 módulos aprobados previamente por la interventoría.

Observaciones: Se sigue observando porosidad en los tambores de la cuneta anterior. Se recomienda mejor vibrado

Jueves 05 Junio - 2025

Se inician Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm., Se realizo corte de Fresado Abscisas Km1+030 A la Km1+130 borde requerido. Se excavo manual para alistar terreno para cunetas. Km0+975 A la Km1+020 borde derecho. Se ubico formaleta para cunetas modulos intermedios 20 metros, Se realizo orden y aseo. Se dejo todo señalizado.

* Personal: (5) Ayudantes, (1) oficial, (1) Inspector, (3) Aux de operación, (1) residente de obra, (1) topografo, (1) Prof. SST, (1) Prof Soc. (1) operador.
* Personal interventoria: (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) Prof. Ambiental, (1) Inspector, (1) conductor, (1) topografo, (1) residente.
* Maquinaria y Equipos: (1) Minicargador, (1) Estacion total, (1) mezcladora, (1) Canguro, (1) Pisona, (1) Vibrador concreto.
* Clima: Fuertes lluvias de 10:30Am A 1:00pm. Afectando las Actividades.

VIERNES 6 DE JUNIO DEL 2025

*Inicias Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm. Se realizo corte de Fresado de la Abscisas K1+130 a la K1+180 borde derecho, se excavo manual para alistar terreno para Cuneta K1+020 a la K1+180 borde derecho. Se Fundio Cuneta tipo 10 con concreto 3500PSI 24 metros.

*Personal: (5) Ayudantes, (1) Oficial, (1) Inspector, (1) operador, (3) Aux de operacion, (1) topografo, (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST. (1) Prof Social.

*Personal Interventoria: (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social (1) Prof. Ambiental. (1) Inspector, (1) topografo, (1) Cadenero, (1) Conductor

*Maquinaria y Equipos: (1) Minicargador, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) Canguro, (1) vibrador de concreto, (1) Estacion total.

*Clima: Lluvias de 2:00Pm. A 3:30Pm. presentando Afectacion en las Actividades.

ZZ CGV.

SABADO 7 DE JUNIO DEL 2025

*Inician Actividades a las 7:00Am. A 2:00Pm.. Se realiza corte de Fresado de la Abscisas K1+180 a la K1+195 borde izquierdo, se excavo manual para alistar terreno para Cunetas izquierdo. borde. se atraco con material seleccionado detras de las cunetas. Se realizo orden y aseo. Se dejo todo señalizado.

*Personal: (5) Ayudantes, (1) Oficial, (1) Inspector, (1) operador, (3) Aux de operacion, (1) topografo, (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST. (1) Prof. Social.

*Personal Interventoria: (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Ambiental (1) Inspector, (1) topografo, (1) Cadenero, (1) Prof. Social, (1) conductor

*Maquinaria y equipos: (1) Minicargador, (1) mezcladora, (1) Rana, (1) Canguro, (1) vibro para concreto, (1) Estacion total.

*Clima: Lluvias de 8:00Am. A 11:30Am. Afectando las Actividades

DOMINGO 8 DE JUNIO DEL 2025

* Iniciar Actividades a las 7:00Am. A 2:00Pm. Se realizo perfilado de terreno para cunetas y se realizo trasiego de material y se cuadro PMT y Puntos de Acopio. Se dejo todo señalizado y organizado.
* Personal = (2) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) operador, (2) Aux de operacion, (1) Residente tecnico, (1) Prof social, (1) Prof. SST.
* Personal de interventoria = Residente tecnico, (1) inspector, (1) conductor.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) mezcladora, (1) vibro concreto, (1) Pana.
* Clima: Lluvias de 2:00pm. A 4:30Am. Afectando las Actividades.

Rodrigo Rivera

CEV

LUNES 9 DE JUNIO DEL 2025.

* Iniciar Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm. Se realizo corte de Fresado de la Abscisa K1+195 a la K1+245 lado izquierdo, se cuadro terreno, compacto para cunetas 450mts; se realizo orden y Aseo, Se dejo todo señalizado.
* Personal: (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) operador, (3) Aux de operaciones, (1) topografo, (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social.
* Personal Interventoria: (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Ambiental, (1) Prof. social, (1) inspector, (1) topografo, (1) cadenero, (1) conductor.
* Maquinaria y Equipos = (1) minicargador, (1) Mezcladora, (1) compactador, (1) Pana, (1) Vibro para concreto, (1) Estacion total.
* Clima: Lluvias 8:00am. A 1:30 Pm. Afectando las actividades.

- Se recomienda compactacion de base negada con cemento en prox. o rana del K1+015 al K1+055, con el proposito de que no comprometa la instalacion de cuneta.

Rodrigo Rivera

CEV

MARTES 10 DE JUNIO DEL 2025

* Iniciar Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm. Se Fundio con concreto de 3500PSI cuneta tipo 1B 32 metros en trapezo

y se realizo orden y Aseo. Se dejo todo señalizado.
* Personal: (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) Inspector, (3) Aux de operacion, (1) topografo, (1) operador, (1) Residente tecnico, (1) Prof SST (1) Prof. Social.
* Personal interventoria: Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social, (1) Prof. Ambiental, (1) Inspector, (1) Topografo, (1) conductor.
* Maquinas y Equipos: (1) mini cargador, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) canguro, (1) Vibro para concreto, Estacion total.
* clima: lluvia 11:00Am a 2:30pm. Afectando las Actividades
NOTA: se presenta la Renuncia de 1 obrero.
Se recomienda hacer aseo y limpieza en áreas donde se ha fundido cunetas con el fin de que el desperdicio no se sume al desprendimiento del pavimento y aumente su abrasion

Ing. Residente

Dunn CEV

MIERCOLES 11 DE JUNIO DEL 2025
* Se inician Actividades a las 7:00 Am. A 5:00pm. Se realiza compactacion para toma de densidades. Se Armo 32 metros de cuneta, se instalo el Acero y se nivelo. Se rompio piedra con rotomartillo para poder continuar con las cunetas. Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.
* Personal: (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) Inspector, (1) operador, (3) Aux de operacion, (1) topografo, (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social
* Personal interventoria: (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Ambiental, (1) Prof. social, (1) Inspector, (1) conductor.
* Maquinaria y Equipos: (1) mini cargador, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) canguro, (1) vibro para concreto, (1) Estacion total.
* clima: Lluvias 7:30Am. A 9:00Am. Afectando las Actividades
NOTA: En el punto K0+980 se evidencia que hay un modulo que no tiene la alineacion con referencia al cabezal de la alcantarilla.

Ing. Residente

Dunn CEV

JUEVES 12 DE JUNIO DEL 2025
* Se inician Actividades a las 7:00 Am. A 5:00pm. Se realiza 32m Fundida de cunetas tipo 1B con concreto 3500PSI se

dio terminado, se saco muestras de concreto. se dejo todo señalizado y organizado.

* Personal: (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) operador, (2) Aux. de operacion, (1) Residente de obra, (1) Prof. social, (1) Prof. SST.
* Personal interventoria: (1) Residente tecnico, (1) (1) inspector, (1) Prof. SST. (1) Prof. Ambiental, (1) conductor, (1) Prof. Social.
* Maquinaria y Equipos: (1) minicargador, (1) Mezcladora, (1) Rana (1) Vibro para concreto.
* Clima soleado.

No se evidencia la llegada de herramientas y materiales para preliminares y anclajes de revoque de alcantarilla

Firma
Res-Ejecutor

Firma
CEV

VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025

* Se inician actividades a las 7:00Am A 5:00p.m. Se realiza Concreto Fundida de cunetas tipo 1B con concreto 3500PSI, se dio terminado se saco muestras de concreto. se dejo todo señalizado y organizado.
* Personal: (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) operador, (2) Aux. de operacion, (1) Residente de obra, (1) Prof Social, (1) Prof. SST
* Personal Interventoria: (1) Residente Tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Ambiental (1) Prof. Social, (1) inspector, (1) conductor.
* Maquinaria y Equipos: (1) minicargador, (1) Mezcladora, (1) Rana (1) Vibro para concreto.
* clima soleado.

En el punto K0+980 se evidencia que hay un modulo que no tiene la alineacion con referencia al cabezal de la alcantarilla

Firma
Res-Ejecutor

Firma
CEV

SABADO 14 DE JUNIO DEL 2025

* Se inicia Actividades 7:00 Am. A 11:00 Am. se realizo replanteo para cunetas y alistamiento de terreno para cunetas tramo 2. se realizo riegos de material acopios. Se realizo orden y Aseo. se dejo todo señalizado y ordenado.
* Personal: (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) operador, (2) Aux. de operacion (1) Residente Tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social, (1) Prof. Ambiental.

* Personal Interventoria: (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Ambien
(1) Prof. social, (1) inspector, (1) conductor.
* Maquinaria y Equipos: (1) Minicargador, (1) Mezcladora, (1) Canguro,
(1) Rana, (1) vibro para concreto.
* clima: lluvias de 9:30 Am. A 12:00 Am. Afectando las Activid

DOMINGO 15 DE JUNIO DEL 2025
* No se realizo Actividades en el tramo

LUNES 16 DE JUNIO DEL 2025
* Se inician Actividades a las 7:00 Am. A 5:00 Pm. se realizo compactacion de terreno y alistamiento de Formaletas para Fundir 24 metros de cuneta tipo 1B en tramo 2. se atraco la parte de atras de las cunetas con material seleccionado. Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.
* Personal: (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) operador, (2) Aux. de operacion, (1) Residente de obra, (1) Prof. social, (1) Prof. SST.
* Personal Interventoria: (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Soc
(1) Prof. Ambiental, (1) inspector, (1) conductor.
* Maquinaria y Equipos: (1) Minicargador, (1) Mezcladora, (1) Canguro, (1)
Rana, (1) vibro para concreto.
* clima: llovia 12:00 Am. A 2:30 pm. Afectando Actividades.
Se solicito al componente social realizar acercamiento con el dueño del predio del Kot 840 del Kot 860 esto con el fin de retirar lo lote de cerco.

MARTES 17 DE JUNIO DEL 2025
* Se inicio Actividades a las 7:00 Am. A 5:00 Pm. Se realizo compactacion de terreno y armado de Formaletas para Fundir 24 metros de cuneta 1B con concreto 3500 PSI en tramo 2. se realizo Aseo y se dejo todo señalizado y ordenado.

*Personal = (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) operador, (2) Aux. de operacion, (1) Residente de obra, (1) Prof. SST, (1) Prof. social.
* Personal Interventoria = (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof Ambiental (1) Prof. Social. (1) inspector, (1) conductor.
* Maquinas y Equipos = (1) minicargador, (1) Mezcladora, (1) canguro, (1) Rana (1) Vibro para concreto.
* clima = lluvias de 6:30 Am. A 9:00Am. Afectando las Actividades
✓ Se recibe ficha de 3 modulos previamente aprobados por Interventoria

Ros Ecovias SAS

MIERCOLES 18 DE JUNIO DEL 2025

* Se inicio Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm. Se compacto terreno y se alisto terreno para sacar desechables para poder Fundir cunetas. Se armo 10 modulos de cuneta en tramo 2 de tipo 1B. llego cemento y se descargo 500 bultos. Se realizo Aseo y se dejo todo senalizado.
* Personal: (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) operador, (2) Aux de operacion, (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social.
* Personal Interventoria: (1) Residente tecnico, (1) Prof Ambiental, (1) Prof SST (1) Prof. social, (1) inspector, (1) conductor.
* Maquinaria y Equipos = (1) Minicargador, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) Canguro (1) vibro para concreto.
* clima = lluvias de 4:00Pm. A 6:00Am. Afectando Actividades para realizar.

Ros Ecovias SAS.

JUEVES 19 DE JUNIO DEL 2025 - clima seco

Se inicio Actividade a las 7:00 Am A 5:00Pm. Se realizo Armado de Formaleta para cunetas y se Fundio 24 metros de cuneta Tipo 1B con concreto de 3500 PSI en tramo 2. se realizo Orden y Aseo, Se dejo todo senalizado.
* Personal = (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) operador, (2) Aux de operacion, (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. social.
* Personal Interventoria = (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social

NOTA: 18/06/2025: Se realizo la visita Tramo 5 Tural bajo relacionada con la posible necesidad de un aprovechamiento forestal de 7 individuos arboreos, los cuales luego de verificacion, se corrobora que se requeriria solicitar permiso de aprovechamiento forestal frente a la CAR, por lo cual se recomienda volver actividades que no requieran aprovechamiento forestal.

Gestion en Terreno. P-22 CEV

VIERNES 20 DE JUNIO DEL 2025

* Se inicio Actividades de 7:00Am. A 5:00pm. , se realizo compactacion para sacar densidades, se perfilo para cuadrar Formaleta en tramo 2, se realizo orden y Aseo se dejo todo señalizado.
* Personal = (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (2) Aux. de operario, (1) operador, (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social.
* Personal interventoria = (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof Social (1) Prof. Ambiental, (1) inspector, (1) conductor.
* Maquinas y Equipos = (1) mini cargador, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) canguro, (1) tubo para concreto.
* Clima = lluvioso de 9:00Am. A 1:00pm. Afectando las Actividades a realizar.
* Se realiza alistamiento y encofrado de 4 modulos previamente aprobados por la interventoria Kit 195 al 198

Ros Obras SAS

SABADO 21 DE JUNIO DEL 2025 P-22 CEV

* Se inicio Actividades de 7:00Am. A 11:00AM. Se realizo Armado de Formaleta para cunetas tipo 1B en tramo 2 y se realizo trasiego de material Acopios. Se realizo orden y Aseo se dejo todo señalizado.
* Personal = (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) operador, (2) Aux. de operacion, (1) Residente de obra, (1) Prof. SST, (1) Prof. social.
* Personal interventoria = (1) Residente Tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social (1) Prof. Ambiental, (1) inspector, (1) conductor.
* Maquinaria y Equipos = (1) mini cargador, (1) Mezcladora, (1) canguro

(1) Rana, (1) vibro para concreto.
Clima Soleado.

Res. Obras S.A.S

Ing. CEV

DOMINGO 22 DE JUNIO DEL 2025
* No se realizo actividades en el tramo

Res. Obras S.A.S

Ing. CEV

LUNES 23 DE JUNIO DEL 2025
* No se realizo Actividades en el tramo

Res. Obras S.A.S

Ing. CEV

MARTES 24 DE JUNIO DEL 2025
* Se inicio Actividades de 7:00Am. A 5:00Pm. Se realiza armado de formaleta para cunetas tipo 1B se nivela y ajusta modulos en tramo 2, se Fundio 18 metros de cunetas intermedias de K0+705 a K0+720 y K0+850 a K0+875 borde izquierdo tramo 2 con concreto 3500 PSI. Se realizo orden y Aseo. y se dejo todo señalizado.
* Personal: (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) operador, (2) Aux de operacion, (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof social.
* Personal Interventoria: (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof Social Prof. Ambiental, (1) inspector, (1) cadetes.
* Maquinaria y Equipos: (1) mini cargador, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) canguro, (1) vibro para concreto.
* Clima: lluvias de 3:00p.m. A 4:30p.m. Afectando Actividades.
* El componente social realizo acercamiento con el dueño del predio del K0+810 al K0+850 este no el fin de realizar todas el ingreso. El dueño manifiesta que hoy solo 4 mts no garantiza el ingreso

Res. Obras S.A.S

Ing. CEV

MIERCOLES 25 DE JUNIO DEL 2025
* Se inicio Actividades de 7:00AM. A 5:00Pm. se realizo Fundida de cunetas en tramo 2 con concreto 3500 PSI.

de 20metros modulos intermedios de la K1+160 en adelante. se realizo atraque, detras de las cunetas con material seleccionado. Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado
* Personal = (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) operador, (2) Ay de operacion, (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social.
* Personal Interventoria = (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social, (1) Prof Ambiental, (1) inspector, (1) conductor.
* Maquinaria y Equipos = (1) Minicargador, (1) Mezcladora, (1) Rana, (1) canguro, (1) vibro de concreto.
* Clima = lluvias de 9:00Am. a 11:00Am. Afectando las Actividades.
* No se evidencia llegada de herramientas ni materiales para proximos dias y dichas de realce de alcantarilla

Pedro Cabrera S.A.S

Pedro CEV

JUEVES 26 DE JUNIO DEL 2025
* Se Inician Actividades en tramo 2 a las 7:00Am. A 5:00Pm. se realizo Armado de modulos con Formaleta para cunetas tipo 1B en tramo 2, Intermedios y Independientes. Se realizo Corte de Fundado de la K1+250 a K1+430 en tramo 2 borde . Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.
* Personal = (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) operador, (2) Ay de operacion, (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Social.
* Personal Interventoria = (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof Social (1) Prof. Ambiental. (1) inspector, (1) conductor.
* Maquinaria y Equipos = (1) Minicargador, (1) Mezcladora, (1) Rana (1) canguro, (1) vibro para concreto.
* Clima = se presento lluvias de 2:30Pm. a 4:30Pm. Afectando las Actividades. NOTA: se evidencia que se esta creando una junta fria a raiz de la dinamica de la fundida de los modulos. se realiza fundida del pozo y ala hora se funde el hombro. se recomienda mas celeridad y mayor vibrado del concreto

Pedro Cabrera S.A.S

Pedro CEV

VIERNES 27 DE JUNIO DEL 2025
* Se Inician Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm. se realiza Compactacion y Perfilado para Cuneta tipo 1B, se toma

desidades y se comienza armar formaleta para cunetas - se nivela y realiza trasiego de material de acopios. se realiza Aseo y orden en el punto de trabajo todo se deja realizado.

* Personal = (4) Ayudantes, (1) oficial, (1) inspector, (1) operador, (2) Aux. de operación, (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST. (1) Prof. social.
* Personal interventoria = (1) Residente tecnico, (1) Prof. SST, (1) Prof. Ambiental, (1) Prof. Social, (1) inspector, (1) conductor.
* Maquinaria y Equipos = (1) Minicargador, (1) Mezcladora, (1) Bara, (1) canguro, (1) vibro para concreto.
* clima = llu durante el dia Afectando las Actividades.
* Se crea junta fria y forma de fundir modulos. se llena a cabo pendida del paño de la cuneta y a la hora se funde el hombro de la misma se debe dar celeridad y mayor vibrado

Rut Eduar SAS CEL

SABADO 28 DE JUNIO DEL 2025

* NO se realizaron Actividades en el tramo

Rut Eduar SAS CEL

DOMINGO 29 DE JUNIO DEL 2025

* NO se realizaron Actividades en el tramo

Rut Eduar SAS CEL

LUNES 30 DE JUNIO DEL 2025

* NO se realizaron Actividades en el tramo

Rut Eduar S.A.S CEL

MARTES 1 DE JULIO DEL 2025

Se Inician Actividades en tramo 2 a las 7:00Am. a 5:00pm. Se realizo trasladu carpa del Punt, Se realizo atraque detras de las cunetas con material seleccionado. Se cambio 12 modulos de cunetas saturacion de agua por lluvias del Fin de Semana. Se realiza orden y Aseo. Se deja todo realizado.

* Personal = (4) Ayudantes, (1) Oficial, (1) inspector, (1) operador, (2) Aux. de operacion, (1) Residente tecnico, (1) Prof SST, (1) Prof. Social.
* Personal Interventoria = (1) Residente tecnico, (1) Prof SST. (1) Prof Soc

ANEXO NO. 03 DOCUMENTACIÓN ENTIDAD EJECUTORA UAERMV

3.A BITÁCORA DE OBRA DEL PERIODO.

BITACORA DE OBRA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

UAERMV

Objeto Contrato de Obra

Interventoria:

ECOVIAS S.A.S

RAFAEL D. PEÑA
DIRECTOR DE OBRA

ERMY A. HURTADO R
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

UNIÓN TUNALES

Powered by CamScanner

Martes 3 de junio de 2025

Tramo 5 inicio de labores 7:00 Am a 5:00 pm

Clima: Seco

Personal Operativo: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 auxiliar de trafico, 1 Boal, 1 Tecnologo SST, 2

Personal contrato 936: 2 operario vibrocompactador, 1 operador Retro cargador 1 operador Motoniveladora, 2 conductores carro tanque.

Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 comisión Topografica

Equipos de maquinaria: 2 Vibrocompactadores, 1 Retro cargador, 1 Motoniveladora 1 carro tanque, 1 carro emulsión, 1 mini cargador

Actividades de obra: • Se Realiza el perfilamiento subrazante entre Pot 665 a Pot 700 • Se Realiza extendido de base granular para la protección de subrazante Pot 625 a Pot 680 $55 \times 1,6 \times 10$

Edwin Salamanca
Obras SAS

Rafael D. Peña F.
U.M.V.

Miercoles 4 de junio 2025.

Tramo 5 inicio de labores 7:00 Am a 5:00 pm

Clima: Seco

Personal UMV: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 Auxiliares de trafico, 1 Boal, 1 Techologo SST, 2 operarios de vibrocompactador, 1 operador Retro cargador, 1 operador Motoniveladora, 2 conductores carros tanques, 1 operador mini cargador

Personal interventoria: 1 Residente Tecnico, 1 profesional Social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 comision Topografica

Maquinaria y equipos de obra: 2 vibrocompactador, 1 Retro cargador, 1 motoniveladora, 1 carro tanque, 1 carro emulsion, 1 mini cargador.

Actividades de obra: Se lleva a cabo aproximacion de base granular en Pot 655 a Pot 510, Se lleva a cabo replanteo de borde de via para cunetas, Pot 205 a Pot 40

Edwin Salamanca
Obras SAS

Rafael D. Peña F.
U.M.V.

Powered by CamScanner

Jueves 5 de junio 2025

- Tramo 5 inicio labores 7:00 pm a 5:00 pm
- Clima: Seco
- Personal UMV: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 Auxiliares de trafico, 1 Boal 1 Techologo SST, 2 operarios de Vibrocompactador, 1 Operador Retro cargador 1 Operador Motoniveladora, 2 conductores de carro tanque, 1 operario Minicargador.
- Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional sst, 1 inspector, 1 comision Topografica,
- Maquinaria y equipo de obra: 2 vibrocompactador, 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora, 1 carro tanque, 1 carro emulsion, 1 mini cargador.
* Actividades de obra: Se realiza aproximacion de base del Km 665 a 150+700 (35x9.6x0.08) m, Se llera a cabo replanteo de borde de via para cunetas.

Edgar Salamanca
Ecovias S.A.S.

RAFAEL D. PEÑA F
U.M.V.

Viernes 6 de junio 2025

Tramo 5 inicio labores 7:00pm a 5:00pm

Clima: Seco

* Personal UMV: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal 1 Techologo SST, 2 operarios de vibrocompactador, 1 Operador Retro cargador 1 Operador Motoniveladora, 2 conductores de carro tanque, 1 operario minicargador
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional Social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 comision topografica
* Maquinaria y equipo de obra: 2 vibrocompactador, 1 Retro cargador 1 motoniveladora, 1 carro tanque, 1 carro emulsion, 1 minicargador
* Actividades de obra: Se llera acabo aproximacion de base granular en Km 655 a Km 510, Se llera a cabo replanteo de borde de via para cunetas Km 280 a Km 415

Edgar Salamanca
Ecovias S.A.S

RAFAEL D. PEÑA F
U.M.V.

Sabado 7 de junio 2025

No se reportan actividades

Edgar Salamanca
Edvias S.A.S

Rafael D. Peña F.
U.M.V.

lunes 9 de junio 2025

Tunal Tramo 5 inicio labores 7:00 Am a 5:00 pm

Clima: lluvia

* Personal UMV: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal, 1 tecnologa sst, 2 operarios de vibrocompactador, 1 operador Retro cargador.
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional Social, 1 profesional ambiental 1 profesional sst, 1 inspector, 1 comisión topografica.
* Maquinaria y equipos de obra: 2 vibrocompactados, 1 Retro cargador, 1 Motoniveladora (sin operador), 1 Minicargador (sin operador)
* Actividades de obra: Se lleva a cabo chequeo de niveles de diseño Km 4+550 a Km 5+600

Edgar Salamanca
Edvias SAS

Rafael D. Peña F
U.M.V.

Martes 10 de junio 2025

Tunal Tramo 5 inicio labores 7:00 Am a 5:00 pm

Clima: lluvia moderada 11:00 - 12:30

* Personal UMV: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal 1 tecnologa SST, 2 operarios de vibrocompactador, 1 operador retro cargador.
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional Social, 1 profesional ambiental 1 profesional sst, 1 inspector, 1 comisión topografica.
* Maquinaria y equipos de obra: 2 vibrocompactador, 1 Retro cargador 1 motoniveladora (sin operador), 1 minicargador (sin operador)
* Actividades de obra: Se lleva a cabo Chequeo de medición de anchos y revisión de alcantarillas para realce de cabezales (Desde Tramo 1 hasta el tramo 3) Se evidencia la limpieza de 3 alcantarillas y la demarcación de la misma. Km 4+950, Km 5+500, Km 5+570, Se Realiza manejo de aguas escorrentias en el Km 5+540 a Km 5+560

Edgar Salamanca
Edvias S.A.S

Rafael D. Peña F
U.M.V.

Powered by CamScanner

Miercoles 11 de junio 2025

Tunal Tramo 5 inicio de labores 7:00 am

Clima: Seco

* Personal UMV: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 Auxiliares de trafico, 1 Boal. 1 tecnologa sst, 2 operarios de vibrocompactador, 1 operador Retro cargador
* Personal interventoria: 1 Residente terreno, 1 profesional Social, 1 profesional ambiental, 1 profesional sst, 1 inspector, 1 comision topografica.
* Maquinaria de obra: 2 vibrocompactador, 1 Retro cargador, 1 motoniveladora 1 minicargador (sin operario)
* Actividades de obra: * Se lleva a cabo chequeo de medicion de anchos, revision de alcantarillas para realce de cabezales (dede el tramo 3 hasta tramo 5 * Se realiza manejo de aguas escorrentias en el K0+540 a K0+560 * Se Recomienda realizar una excavacion mas profunda debido a que el relleno de los hombros es superior al nivel de la subrasante, esto genera que alla filtraciones a la carpeta granular. * Se realiza puntos de control de desplazamiento de puntos bio, ingenieria y alcantarilla, se marcan un total de 14 puntos. * Se realiza demarcacion y levantamiento de anchos de via entre K0+380 y K0+430. Se evidencia segun anchos de via se debe retirar parte del talud para la instalacion de cunetas costado izquierdo.

Edgar Salamanca
Civiles SAS

RAFAEL D. PEÑA F.
U.M.V.

Jueves 12 de junio 2025

Tunal Tramo 5 inicio de labores 7:00 Am

Clima: Seco

* Personal UMV: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal 1 tecnologa SST, 2 operarios de vibrocompactador, 1 operador Retro cargador
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 comision topografica.
* Maquinaria y equipo de obra: 2 Vibrocompactador, 1 Retro cargador 1 motoniveladora, 1 minicargador (sin operador)
* Actividades de obra: * Se Realiza manejo de aguas escorrentias en el K0+540 K0+560. * Se Recomienda realizar una excavacion mas profunda para mitigar la filtracion a la carpeta de base granular. * Se realiza extendido de base granular con cerco a niveles entre K0+570 a K0+620. * Se Realiza nivelacion de nivele y verificacion de los mismos K0+570 y K0+620.

RAFAEL D. PEÑA F. UMV.

Viernes 13 de Junio 2025

Tunales tramo 5 inicio de labores 7:00 Am

Clima: lluvias moderados 9:30 am a 11:30 am - 1:00 pm a 3:30 pm

* Personal UMV: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 Auxiliares de trafico, 1 Boal 1 tecnologo SST, 2 operadores de vibrocompactador, 1 operador Retro cargador
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental 1 profesional SST, 1 inspector, 1 comision topografica
* Maquinaria y equipos de obra: 2 vibrocompactadores, 1 Retro cargador, 1 Motoniveladora 1 mini cargador (sin operador)
* Actividad de obra: * Se Realiza manejo de aguas escorrentias en el Kot 605 a Kot 630
* Se realiza extension de base granular con carro a nivel entre Kot 630 a Kot 660
* Se Realiza compactacion de base granular.

Edgar Salamanca
Ecovias SAS

RAFAEL D. PEÑA F.
U.M.V.

Sabado 14 de Junio 2025

No se Reportan actividades.

Edgar Salamanca
Ecovias SAS

RAFAEL D. PEÑA F.
U.M.V.

Lunes 16 de Junio 2025

Tunal Tramo 5 inicio labores 7:00 Am

Clima: Seco

* Personal UMV: 1 oficial, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal 1 tecnologa SST, 2 operarios de vibrocompactador, 1 operador de Retro cargador 1 operario de motoniveladora, 1 operador de minicargador, 1 operario de carro Tanque
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental 1 profesional SST, 1 inspector, 1 comision topografica.
* Maquinaria y equipos de obra: 2 vibrocompactadores, 1 Retro cargador 1 moto niveladora, 1 minicargador, 1 carro tanque
* Actividad de obra: Se realiza manejo de aguas escorrentias en el Kot 605 a Kot 630 * Se realiza perfilacion a subrasante a nivel de cota desde Kot 710 a Kot 740 * Se Realiza extendida de base granular con carro aproximado 908 entre Kot 710 a Kot 740 * Se Realiza compactacion de base granular.

Edgar Salamanca
Ecovias. SAS.

RAFAEL D. PEÑA F
U.M.V.

Powered by CamScanner

Martes 17 de junio 2025

Tunal Tramo 5 inicio labores 7:00 am

Clima: lluvias moderadas 1:00 pm - 3:30 pm

* Personal UMV: 1 Oficial, 1 Agutante, 2 auxiliares de trafico, 1 Bal, 1 Tecnologa SST 2 operarios de vibrocompactador, 1 operador Retro cargador, 1 operador Motoniveladora 1 operario minicargador, 1 operario carro tanque.
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental 1 profesional sst, 1 inspector, 1 comision topografica.
* Maquinaria y equipo de obra: 2 vibro compactadores, 1 Retro cargador, 1 Motoniveladora 1 minicargador (varado), 1 carro tanque.
* Actividades de obra: * Se realiza perfilacion de subrasante a nivel de cota desde KO+715 a KO+880 * Se Realiza extendido de base granular con espesor aproximado de 0,08 m entre abscisa KO+715 a KO+880. * Se Realiza compactacion de base granular.

Edwin Salamanca
Edovias S.A.S

RAFAEL D PEÑA F.
U.M.V.

Miercoles 18 de Junio 2025

Tunal Tramo 5 inicio labores 7:00 am

Clima: Soleado

* Personal UMV: 1 Oficial, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Bal, 1 Tecnologa SST 2 operarios de vibrocompactador, 1 operador Retro cargador, 1 operador motoniveladora 1 operador minicargador, 1 operador carro tanque.
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional sst, 1 inspector, 1 comisión topografica.
* Maquinaria y equipos de obra: 2 vibro compactador, 1 Retro cargador, 1 1 motoniveladora, 1 minicargador (varado), 1 carro tanque.
* Actividades de obra: * Se realiza replanteo y materializacion de niveles entre KO+625 a KO+770, Se revisan cotas y Rasantes de via * Se Realiza compactacion de base granular.

Edwin Salamanca
Edovias S.A.S.

RAFAEL D PEÑA F.
U.M.V.

Powered by CamScanner

Jueves 19 de Junio 2025

Tunal Tramo 5 inicio de labores 7:00 Am

Clima: Soleado

* Personal UMV: 1 oficial, 1 ayudante, 2 auxiliares de tratrio, 1 Boal 1 Tecnologo SST 2 operarios de vibrocompactador, 1 operador Retro cargador, 1 operador motoniveladora, 1 operador minicargador, 1 operario carro tanque.
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental 1 profesional sst, 1 inspector, 1 comisión topografica.
* Maquinaria y equipos de obra: 2 Vibrocompactadores, 1 Retro cargador, 1 motoniveladora, 1 minicargador (varado), 1 carro tanque.
* Actividades de obra: * Se Realiza replanteo y materialización de niveles entre Kot 730 a Kot 790. Se revisan cortes y rellenos de via. * Se realiza manejo de aguas escorrentia y retiro de talud que se desprende en el Kot 780 a Kot 800, esta actividad se realiza manual para evitar afectación mecanica en el desplazamiento del talud * Se realiza intervención de hombro izquierdo del Kot 650 a Kot 670, donde se descalifica y Remplaza material saturado, 20 x 0.8 x 0.15 * Se realiza compactación de base granular.

Edgar Salamanca
Obras S.A.S

Rafael D. Peña F.
U.M.V.

Viernes 20 de junio 2025

Tunal tramo 5 inicio de labores 7:00 Am

Clima: Soleado.

* Personal UMV: 1 oficial, 1 ayudante, 2 auxiliares de tratrio, 1 Boal, 1 tecnologo SST 2 operadores vibrocompactador, 1 opeador Retro cargador, 1 operador motoniveladora 1 Operador minicargador, 1 operador carro tanque.
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional Social, 1 profesional ambiental 1 profesional sst, 1 inspector, 1 comisión topografica.
* Maquinaria y equipos de obra: 2 vibrocompactador, 1 Retro cargador 1 motoniveladora, 1 minicargador (varado), 1 carro tanque.
* Actividades de obra: *Se realiza replanteo y materialización de niveles entre Kot 705 a Kot 770. esto teniendo en cuenta la modificación del hombre. * Se realiza manejo de aguas escorrentias y retiro de talud que se desprende en el Kot 705 a Kot 770 actividad realizada manualmente * Se realiza excavación mecanica para conformar la zanja-cuneta en el tramo Kot 665 a Kot 615 * Se realiza mezcla heterogenea (concreto, grava, Recebo y agua) para realizar cuneta de conducción de aguas escorrentias. * Se realiza compactación base granular.

Edgar Salamanca
Obras S.A.S

Rafael D. Peña F. U.M.V.

Sabado 21 de junio 2025

No se reportan actividades.

Edgar Salamanca
Ecovias S.A.S

RAFAEL D. PEÑA F.

Martes 24 de junio 2025

Tunal tramo 5 inicio de actividades 7:00 am

Clima: lluvias moderadas 02:00 pm a 9:00 pm.

* Personal UMV: 1 oficial, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal, 1 tecnologo SST, 2 operadores: vibrocompactador, 1 operador Retro cargador, 1 operador motoniv, 1 operador mini cargador, 1 operador carro tanque
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambient 1 profesional SST, 1 inspector, 1 comisión topografica.
* Maquinaria y equipos de obra: 2 vibrocompactadores, 1 Motoniveladora, 1 Retro cargador, 1 mini cargador (varado), 1 carro tanque.
* Actividades de obra: * Se realiza replanteo y materialización de niveles entre Kot 705 a Kot 770, esto teniendo en cuenta la modificación del hombro. * Se realiza manejo de aguas escorrentias y retiro de talud que se desprende en el Kot 760 a Kot 7 actividad realizada manualmente * Se realiza compactación de base granular.

Edgar Salamanca
Ecovias SAS

RAFAEL D. PEÑA F.
U.M.V.

Miercoles 25 de junio 2025

Tunal tramo 5 inicio actividad 7:00 Am

Clima: Seco

* Personal UMV: 1 oficial, 1 Ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal, 1 tecnologo SST 2 operarios de vibrocompactadores, 1 operador Retro cargador, 1 operador motoniveladora 1 operador mini cargador, 1 operador carro tanque
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambient 1 profesional SST, 1 inspector, 1 comisión topografica.
* Maquinaria y equipos de obra: 2 Vibrocompactadores, 1 Retro cargador, 1 motoniveladora, 1 mini cargador (varado), 1 carro tanque.
* Actividades de obra: * Se Realiza Replanteo y materialización de niveles entre Kot 760 a Kot 810. esto teniendo en cuenta la modificación del hombro. * Se Realiza manejo de Aguas escorrentias y retiro de talud entre Kot 760 a Kot 790 actividad Realizada con maquinaria por el volumen de escombro a Retirar, Donde se afecta Kilto * Se Realiza compactación de base granular.

Edgar Salamanca
Ecovias SAS

RAFAEL D. PEÑA F. U.M.V.

Powered by CamScanner

Jueves 26 de junio 2025

Tunal Tramo 5 inicio labores 7:00 Am

Clima: Seco

* Personal U&V: 1 oficial, 1 Ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Baul, 1 tecnologo SST, 1 comisión topografica, 2 operadores vibrocompactadores, 1 operador Retro cargador, 1 operador motoniveladora, 1 operador mini cargador, 1 operador carro tanque
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental 1 profesional sst, 1 inspector, 1 comisión topografica.
* Maquinaria y equipos de obra: 2 vibrocompactadores, 1 Retro cargador, 1 motoniveladora 1 mini cargador (varado), 1 carro tanque
* Actividades de obra: * Se realiza replanteo y materialización de niveles entre Km0+760 a Km0+820. esto teniendo en cuenta la modificación del hombro. * Se mantiene en observación el tramo Km0+760 a Km0+820, por afectación del geotextil de revestimiento para el filtro drenante * Se realiza extendido de base granular y corte aproximado de subrasante del Km0+760 a Km0+780 * Se realiza compactación base granular

Edgar Salamanca
Edgar S.A.S

Rafael D. Peña F.
U.n.v.

Viernes 27 de junio 2025.

Tunal tramo 5 inicio labores 7:00 Am

Clima: Seco

* Personal U&V: 1 oficial, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Baul, 1 Tecnologo SST 1 comisión topografica, 2 operadores de vibrocompactador, 1 operador Retro cargador, 1 operador motoniveladora, 1 operador mini cargador, 1 operador carro tanque.
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental. 1 profesional SST, 1 inspector, 1 comisión topografica.
* Maquinaria y equipos de obra: 2 vibrocompactadores, 1 Retro cargador, 1 motoniveladora 1 mini cargador (varado), 1 carro tanque.
* Actividades de obra: * Se realiza replanteo y materialización de niveles entre Km0+740 a Km0+850. Esto teniendo en cuenta la modificación del hombro. * Se mantiene en observación el tramo Km0+760 a Km0+740 por afectaciones del geotextil de revestimiento para el filtro drenante * Se realiza extendido de base granular y corte aproximado de sub rasante del Km0+765 a Km0+820 * Se realiza compactación de base granular

Edgar Salamanca
Edgar S.A.S

Rafael D. Peña F.
U.n.v.

Sabado 28 de junio 2025

Tunal Tramo 5 No se Reportan actividades.

Rafael D. Peña F. U.n.v.

Powered by CamScanner

Bitacora de obra

Tramo: CAPITOLIO

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y mantenimiento vial - UAERMV

Objeto contrato de obra

Interventoría:

ECOVIAS SAS

RAFAEL D. PEÑA
Director de obra

ERMY A. HURTADO R.
Director de interventoría

ORLANDO JIMENEZ
Residente de obra

MAURICIO WILCHES
Residente de interventoría

Norma

Powered by CamScanner

1 conductor de volqueta sencilla.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 conductor.
Maquinaria suministrada: 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 vibrocompactador 8 tn, 1 vibrocompactador 4 tn y 1 volqueta sencilla.
Actividades realizadas: Se realiza conformacion con base granular para proteger la subrasante.
Se realiza cerco aproximado en base granular 0.10 mts
Observaciones: Se evidencia que el personal BOAL de la UMV realiza cierre y demarcacion de alcantarilla K3+413 afectada por la remocion de masas y falta de apuntalamiento en area de encole y descole.

Edgar Solamarca
Res Civiles

Rafael Peña
U.M.V.

Sábado 31 de mayo de 2025 Clima: Seco Vigilancia: SI/24h
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV debido a receso por fin de semana.

Edgar Solamarca
Res Civiles

Rafael Peña
U.M.V.

Domingo 01 de junio de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia: SI/24
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV debido a receso por fin de semana

Edgar Solamarca
Res Civiles

Rafael Peña
U.M.V.

Lunes 02 de junio de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia SI/24
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV debido a receso por fin de semana puente festivo

Edgar Solamarca
Res Civiles

Rafael Peña
U.M.V.

Norma

Powered by CamScanner

Martes 03 de junio de 2025 Clima: Seco Vigilancia si/24h
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 Ayudantes, 1 BOAL, 1 comisión topográfica y 2 Auxiliares de tráfico
Personal contrato 936: 1 operador de retrocargador, 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador 1 operador de vibrocompactador 8tn, 1 operador de vibrocompactador 4tn y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal de interventoría, 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector. y 1 conductor.
Maquinaria evidenciada: 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 vibrocompactador 8tn, 1 vibrocompactador 4tn y 1 volqueta sencilla.
Actividades realizadas: Se realiza extendida de presado estabelizado en K3+590 al K3+440.
Se realiza impremacion mecanica sobre presado en K3+590 al K3+440. Se realiza cerco aproximado de presado 0.08 mts. Se realiza extendida de base granular para proteccion de sobrasante entre K3+400 al K3+370. Se realiza cerco aproximado.
Observaciones: se evidencia la mayoria del KIT asignado de maquinaria usado, se realizan actividades importantes que requieron del equipo completo de maquinaria. En el punto K3+415, se evidencia que la tuberia instalada previamente por gaviones 95, esta presentando falta de apuntalamiento en el encole y descole de la alcantarilla. Se realizo prueba de densidades con 5 puntos de referencia dando como resultado promedio 99.5%. Se evidencia la falta de un (1) operario para el vibrocompactador de 4tn.

Ing. Edgar Salamanca
Ing. Residente

Ing. Rafael D. Peña F.
U.H.V.

Miercoles 04 de Junio de 2025 Clima: lluvias Moderadas 02:00-0300 pm.
PERSONAL UAERMV: 1 Residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental.
PERSONAL CONTRATO 609.: 1 Inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 Boal, 2 auxiliares de trafico, 1 comisión topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario Retrocargador, 1 operario motoniveladora, 2 operarios vibrocompactador, 1 operario minicargador, 1 operario Volqueta. sencilla.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST, 1 Inspector.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador 4 Tn, 1 vibrocompactador 8 Tn, 1 Retrocargador (varado), 1 Volqueta sencilla (varada), 1 minicargador (varado).
ACTIVIDADES: Se realiza extendida de carpeta de Fresado sobre emulsión asfaltica entre K3+590 a K3+440. Se realizo imprimación mecanica sobre carpeta, se cerca a nivel de Fresado de 0,07 mts.
OBSERVACIONES: Se evidencia que la mayoria de la maquinaria presenta Fallos mecanicos. VIGILANCIA: Si/24 hrs.

Ing. Salamanca
Residente UAERMV

Ing. Rafael D. Acuña F.
Fe

Jueves 05 de Junio de 2025 CLIMA: lluvia Moderada: 10:00-12:00 pm.
PERSONAL UAERMV: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental.
PERSONAL CONTRATO 609: 1 Inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 Boal, 2 auxiliares de trafico, 1 comisión topografico.
PERSONAL CONTRATO 936.: 1 operario Retrocargador, 1 operario de motoniveladora, 2 operarios de vibrocompactador, 1 operario minicargador, 1 operario volqueta sencilla.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST, 1 Inspector.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador 4 Tn, 1 vibrocompactador 8 Tn, 1 Retrocargador (varado), 1 volqueta sencilla, (varada), 1 minicargador (varado)
ACTIVIDADES: Se realiza extendida de carpeta de Fresado

Norma

Powered by CamScanner

sobre emolsión asfaltica en K3+540 a K3+490. de Igual manera se realiza imprimación mecanica y cereo de 0,02m
Adicionalmente en el punto K3+550, se realiza corte de Junta para base estabilizada.
NOTA: se evidencia una mayoria de maquinaria varado, adicionalmente el minicargador tiene una cabina que no encaja con el chasis de la misma. VIGILANCIA: Si / 24h

Edwin Salamanca
Eovias S.A.S

Rafael D. Peña F.
U.M.V.

Viernes 06 de Junio de 2025 - CLIMA: lluvias Moderadas 09:30-02:00
PERSONAL UAERMV: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST.
PERSONAL CONTRATO 609: 1 Inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 comisión topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario motoniveladora, 2 operarios vibrocompactador, 1 operario volqueta sencilla 1 operario minicargador, 1 operario retrocargador.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST. 1 Inspector.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador 8 Tn, 1 vibrocompactador 4 Tn, 1 volqueta sencilla, 1 minicargador, 1 retrocargador (varado)
ACTIVIDADES: se realiza extendida de material MUR para conformación de carpeta de Fresado sobre emolsión asfaltica en K3+490 a K3+175. se realiza imprimación mecanica. y cereo aproximado 0,08mts.
NOTA: se evidencia descordinación en el PMT, ingresan 2 volquetas las cuales no pueden dar vuelta y se entran se evidencia 1 ponto para accion de movilidad K3+480.

Edwin Salamanca
Eovias S.A.S

Rafael D. Peña F.
U.M.V.

Sabado. 07 de Junio de 2025
NO se desarrollan actividades en el Frente de Obra.

Edwin Salamanca
Eovias S.A.S

Rafael D. Peña F
U.M.V.

Norma

Powered by CamScanner

Domingo 08 de Junio de 2025.
No se desarrollan actividades en el frente de obra.

Salamanca
Ecovras S.A.S

Rafael D. Peñ. F. U.M.V.

Lunes 09 de Junio de 2025. CLIMA: lluvias Moderadas 08:30-04:30
PERSONAL UAERMU: 1 residente tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 profesional social
PERSONAL CONTRATO 609: 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal, 1 comision topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario motoniveladora, 2 operarias vibrocompactador, 1 minicargador, 1 volqueta sencilla (varada) 1 Retrocargador (varada).
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST, 1 Inspector, 1 comision topografica.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador 4 Tn, 1 vibrocompactador 8 Tn, 1 minicargador, 1 volqueta sencilla (varada), 1 retrocargador (varado).
ACTIVIDADES: se realiza imprimación mecanica sobre carpeta de Fresado estabilizado. de K3+475 a K3+940.
NOTA: se evidencia el traslado de un operario del vibrocompactador del tramo 9 a tramo 6 debido a que los operarios de los equipos renunciaron. se evidencian 3 puntos para acciones de movilidad K2+980, K2+080 y K1+500.
Adicionalmente se evidencia que se realizan mantenimiento de maquinaria sobre la via. alli se evidencia que una volqueta por orillarse genero una accion de peligro para el operario. VIGILANCIA: 02/24 hrs.

Salamanca
Ecovras S.A.S

Rafael D. Peñ. F. U.M.V.

Martes 10 de Junio de 2025 CLIMA: lluvias Moderadas 01:30-03:00.
PERSONAL UAERMU: 1 Residente tecnico, 1 profesional Ambiental, 1 profesional social, 1 profesional SST.
PERSONAL CONTRATO 609: 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal, 1 comision topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario motoniveladora,

Powered by CamScanner

1 operario retrocargador, 2 operarios vibrocompactador, 1 operario volqueta sencilla, 1 operario minicargador.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST, 1 Inspector, 1 comision topografica.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 motoniveladora (varada), 1 retrocargador, 1 vibrocompactador 4 Tn, 1 vibrocompactador 8 Tn, 1 volqueta sencillo, 1 minicargador.
ACTIVIDADES: se realiza extendida de material MVE para carpeta de fresado sobre emulsion asfaltica en K3+570 a K3+450, de igual manera se realiza imprimacion mecanica y cereo a nivel de via.
NOTAS: se evidencian 9 puntos para la accion de movilidad K2+480, K2+080, K3+330 y K1+500. se evidencia. que al momento de la visita por porte de interventoria, solo se encuentra el operario del vibrocompactador.

Edgar Salamanca
Civiles SAS

Rafael D. Acuña F. U.M.V.

Miercoles 11 de Junio de 2025 CLIMA: seco. VIGILANCIA: SI/24
PERSONAL UAERMV: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental.
PERSONAL CONTRATO 609: 1 Inspector, 1 OFICIAL, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal,
PERSONAL CONTRATO 936: 2 operarios vibrocompactador, 1 operario retrocargador.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 2 vibro compactador 9 Tn, 1 vibrocompactador 8 Tn, 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 minicargador(sin operario).
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST, 1 Inspector, 1 comision topografica.
ACTIVIDADES: se realita imprimacion mecanica. sobre carpeta de fresado estabilizado K3+570-K3+450. Adicionalmente se extiende base granular para proteccion de subrasante K3+245 a K3+275.

Edgar Salamanca
Civiles SAS

Rafael D. Acuña F. U.M.V.

Powered by CamScanner

Jueves 12 de Junio de 2025 CLIMA: lluvias Moderadas 01:30-05:00
PERSONAL UAERMV: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST.
PERSONAL CONTRATO 609: 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal, 1 comision topografica
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 operario minicargador, 1 operario motoniveladora, 1 operario retrocargador, 1 operario volqueta sencilla
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST., 1 Inspector, 1 comision topografica.
ACTIVIDADES: se realiza conformacion con rajon y sello con RAP en el punto K3+300 a K3+390. Adicionalmente se extiende base granular. Esta actividad se acompaña con la imprimación mecanica sobre carpeta de base granular.
NOTA: Se evidencia el retiro del frano la motoniveladora Galion ya que se encuentra varada. Por otra parte no se evidencia la asistencia del residente de obra. Se evidencia 6 puntos para accion de movilidad. K2+480 - K2+080, K3+330, K5+040, K3+120 y K1+500. VIGILANCIA: Si (24hrs)

Salmora
Ecovias SAS

Ing. Fisi. D. Peña F. U.AV.

Viernes 13 de Junio de 2025 CLIMA: lluvias Moderadas 11:30-02:00
PERSONAL UAERMV: 1 residente tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental.
PERSONAL CONTRATO 609: 1 Inspector., 1 oficial, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal, 1 comision topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 operario retrocargador, 1 conductor volqueta sencilla, 1 operario motoniveladora, 1 operario minicargador.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST, 1 residente tecnico, 1 comision topografica.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador 9Tn, 1 vibrocompactador 8Tn, volqueta sencillo, 1 minicargador.

Norma

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: se realiza perfilación de subrasante y retiro de material remanente saturado por lluvias entre K2+500 a K3+440 y K2+220 a K2+250. Adicionalmente se conforma con piedra reutilizada (rajon) entre las abscisas del K2+450 a K2+455. costado izquierdo menores. Por otra parte se instala BAP entre las abscisas del K2+500 al K2+440 y de K2+220 a K2+250 Por ultimo se realiza remoción de escombro y limpieza de cunetas. entre K2+540 a K2+580. en ambos costados VIGILANCIA: Si / 24 hrs.

Ecalras SAS
Edgar Salamanca

Rafael D. Peña F.
U.M.V.

SABADO 14 de Junio de 2025.
No se realizan actividades. en el Frente de obra

Edgar Salamanca
Ecalras SAS

Rafael D. Peña F.
U.M.V.

Domingo 15 de Junio de 2025.
No se realizan actividades en el Frente de obra.

Edgar Salamanca
Ecalras SAS

Lunes. 16 de Junio de 2025. CLIMA: lluvias Moderadas 11:00
PERSONAL UAERMV: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST
PERSONAL CONTRATO 609: 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal, 1 comisión topografica
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 operario retrocargador, 1 operario, motoniveladora, 1 operario minicargador, 1 conductor volqueta sencilla.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 inspector, 1 comisión topografica.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador 4 Tn, 1 vibrocompactador 8 Tn, 1 volqueta sencilla, 1 minicargador.
ACTIVIDADES: se realiza retiro de material remanente saturado por lluvias, producto de la perfilación

Powered by CamScanner

de subrasante. entre Kz+200 a Kz+150. Adicionalmente se conforma con piedra reutilizada (rajon) entre. Kz+160 a Kz+170. Por otra parte se sella con rap algunos puntos para proteccion de la subrasante Kz+200 a Kz+260. se retira material por limpieza de cunetas.
NOTA: No se evidencia visitas del residente de obra. Por otra parte se recomienda mayor manejo de aguas Escorrenti

Edgar Salamanca
Ecovias SAS

Rafael D. Peña F. U.A.V.

MARTES. 17 de Junio de 2025 CLIMA: Lluvias Moderadas: 01:30 - 03:30
PERSONAL UAERMU: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST.
PERSONAL CONTRATO 609: 1 Inspector, 1 oficial, 2 auxiliares de trafico, 1 ayudante, 1 Bcal, 1 comision topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario Retrocargador, 2 operarios Vibrocompactador, 1 operario motoniveladora, 1 operario minicargador, 1 volqueta sencilla, 1 carro tanque.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 Inspector, 1 comision topografica.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 retrocargador, 1 motoniveladoral, 1 carro tanque, 1 volqueta sencilla, 1 minicargador (varado), 2 vibrocompactador (4 Tn, 8 Tn)
ACTIVIDADES: se realiza perfilacion de subrasante. a nivel de cota desde Kz+200 a Kz+260. se conforma. con piedra entre Kz+080 a Kz+100. se instala material RAP entre las abscisas del Kz+200 al Kz+230. Por ultimo se realiza la remocion de escombro derivado de la limpieza de cunetas entre Kz+080 a Kz+105. VIGILANCIA: 5i/24h
NOTA: se evidencia que en el punto Kz+115 se vara sobre la via el retrocargador terex, esto debido a la ruptura del cardan de transferencia. se cierra la via por un periodo de 2 horas mientras se realiza dicha reparacion.

Edgar Salamanca
Ecovias SAS

Rafael D. Peña F.
U.A.V.

Norma

Powered by CamScanner

Miercoles 18 de Junio de 2025 CLIMA: SECO VIGILANCIA: SI/24hrs.
PERSONAL UAERMV: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST.
PERSONAL CONTRATO 609: 1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal, 1 comisión topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 operario Retrocargador, 1 conductor volqueta, 1 operario motoniveladora, 1 operario minicargador.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST, 1 Inspector, 1 comisión topografica.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 2 vibrocompactador (4 Tn, 8 Tn) 1 volqueta sencilla, 1 mini cargador.
ACTIVIDADES: Se realiza perfilación de subrasante y retiro de material remanente saturado por lluvias entre K3+180 al K3+220. Adicionalmente se retiran fallos y se conforma con rajon entre K3+345 a K3+325 y K3+213 a K3+208. Se retira material producto del manejo de Aguas escorrentias. entre K2+080 a K2+105.
NOTA: No se evidencia visita por parte del residente de obra, por otra parte se es necesario volver a intervenir un fallo que por tercera vez se retira. K3+180 a K3+105

E. F. Sabana
Clarco SAS

Rafael Peña F. U.A.V.

Veves. 19 de Junio de 2025 CLIMA: SECO VIGILANCIA: SI/24hrs.
PERSONAL UAERMV: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental.
PERSONAL CONTRATO 609: 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Boal, 2 auxiliares de trafico, 1 comisión topografico
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 operario motoniveladora, 1 operario Retrocargador, 1 Operario minicargador, 1 conductor volqueta. sencilla.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 profesional social, 1 Inspector, 1 comisión topografica.

Norma

Powered by CamScanner

MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 volqueta sencilla, 1 minicargador, 2 vibrocompactador (9Tn, 8Tn)
ACTIVIDADES: se realiza perfilación de subrasante y retiro de material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del K3+280 al K3+385. Adicionalmente se extiende base granular y cereo a nivel entre K3+280 a K3+385. Por otra parte se retiran fallas realizando retiro de material saturado y conformación con rajon en K3+320 al K3+350.
NOTA: se realiza cambio del retrocargador Terex por un Jhon Deere. No se evidencia en tramo al residente de obra

Edgar Salamanca
Crovtu S.A.S

Rafael D. Peña F. U.M.V.

Viernes. 20 de Julio de 2025 CLIMA: SECO VIGILANCIA: Si/24 hrs.
PERSONAL UAERMU: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental.
PERSONAL CONTRATO 609: 1 Inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Boal, 2 auxiliares de trafico, 1 comision topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 operario, motoniveladora, 1 operario Retrocargador, 1 volqueta sencilla, 1 minicargador, 2 vibrocompactador. (9Tn, 8Tn)
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST., 1 Inspector, 1 comision topografica.
EQUIPOS Y MAQUINARIA: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador. (8Tn, 9Tn), 1 volqueta sencilla, 1 minicarg
ACTIVIDADES: Perfilación de subrasante y retiro de material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del K3+400 al K3+405. Adicionalmente se realiza extendida de base granular y cereo a nivel entre K3+320 a K3+390. Por otra parte se retira fallo y se conforma rajon entre K3+400 al K3+405.
NOTA: No se evidencia la visita del residente de obra.

Edgar Salamanca
Crovtu S.A.S

El ing. Residente de este frente de obra no pasado el día de hoy!

Rafael D. Peña F.
U.M.V.

Norma

sabado 21 de Junio de 2025.
No se desarrollan actividades en el tramo.

Edgar Salamanca
Ecovias S.A.S.

Rafael D. Peña F.
U.M.V.

Domingo 22 de Junio de 2025
No se desarrollan actividades en el tramo.

Edgar Salamanca
Ecovias S.A.S.

Rafael D. Peña F.
U.M.V.

Lunes. 23 de Junio de 2025.
festivo. No se desarrollan actividades en el tramo.

Edgar Salamanca
Ecovias S.A.S

Rafael D. Peña F. U.M.V.

Martes. 24 de Junio de 2025 CLIMA: 01:00-03:30 VIGILANCIA: SI/
PERSONAL UAERMU: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST.
PERSONAL CONTRATO 609: 1 Inspector, 1 OFICIAL, 1 Boal 1 auxiliar de trafico, 1 comision topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 operario retrocargador, 1 conductor volqueta, 1 operador motoniveladora, 1 operario minicargador.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 Inspector, 1 comision topografica.
EQUIPOS Y MAQUINARIA: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 2 vibrocompactador (4Tn, 8Tn), 1 volqueta sencilla, 1 minicargador.
ACTIVIDADES: se realiza extendida de base granular y cereo aproximado entre K3+425 a K3+255
Adicionalmente se retira por tercera vez un fallo y se conforma con rajon entre K3+435 a K3+428 x.70mts
NOTA: se recibe información de la renuncia de los 2 ayudantes y la ausencia de 1 auxiliar de trafico. se evidencia que los radios de la auxiliares no sirven.

Edgar Salamanca
Ecovias S.A.S

Rafael D. Peña F.
U.M.V.

Powered by CamScanner

Miercoles 25 de Junio de 2025 CLIMA: Seco VIGILANCIA: Si/24 hrs)
PERSONAL UAERMU: 1 residente tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental.
PERSONAL CONTRATO 609: 1 Inspector, 1 oficial, 1 Boal, 2 auxiliares de trafico, 1 comision topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 operario motoniveladora, 1 operario retrocargador, 1 operario minicargador, 1 conductor volqueta sencilla
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST, 1 Inspector, 1 comision topografica.
EQUIPOS Y MAQUINARIA: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 volqueta sencilla, 2 vibrocompactador (4 Tn, 8 Tn), 1 minicargador.
ACTIVIDADES: Se realiza extendida de Base granular y se realiza cereo aproximado entre K3+300 a K3+315 y K3+210 a K3+220. Adicionalmente se retira fallo entre K3+315 a K3+300 y K3+210 a K3+220 x. 70 mts.
NOTA: Se evidencia que los volquetas de regalias. los estan devoluiendo con RCD y con solo la mitad de capacidad de carga de la misma.

Edwin Salmeron
Edwin S.I.S

Daniel D. Peña F. U.A.V.

Jueves. 26 de Junio de 2025 CLIMA: Seco VIGILANCIA: Si/24 hr
PERSONAL UAERMU: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental 1 profesional SST.
PERSONAL CONTRATO 609: 1 oficial, 1 Inspector, 1 Boal, 2 auxiliares de trafico, 1 comision topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 operario motoniveladoro, 1 operario retrocargador, 1 operario minicargadbr, 1 conductor volqueta sencilla.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST, 1 Inspector, 1 comision topografica.
EQUIPOS Y MAQUINARIA: 1 motoniveladora, 1 retrocarggdor, 2 vibrocompactador, 1 minicargador, 1 volqueta sencilla.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: se realiza extendida de base granular. De igual manera se realiza cereo a nivel entre K3+345 a K3+375.

NOTA: se presenta la renuncia del topografo. se evidencia una señalitación con afectación y caida de material sobre cuerpo de Agua. (K2+730) K3+215. Adicionalmente se evidencia que el retiro de fallos no se retira el material saturado, por lo cual vuelve a aparecer.

Edwin Salamanca Edwins SAS

Rafael D. Peña F. U.N.V.

Viernes 27 de Junio de 2025 CLIMA: SECO VIGILANCIA: Si 24hrs

PERSONAL UAERMV: 1 residente tecnica, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST.

PERSONAL CONTRATO 609: 1 oficial, 1 Inspector, 1 Boal, 1 ayudante, 1 comisión topografica.

PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 operario motoniveladora, 1 operario minicargador, 1 conducto volqueta sencilla, 1 operario retrocargador.

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST, 1 Inspector, 1 comisión topografica.

EQUIPOS Y MAQUINARIA: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 minicargador, 2 vibrocompactador (4 Tn, 8 Tn), 1 volqueta sencilla.

ACTIVIDADES: se realiza extendido de base Granular y cereo a nivel entre K3+400 + K3+930. Se realiza manejo de Aguas lluvias en este mismo tramo.

Edwin Salamanca Edwins SAS

Rafael D. Peña F. U.N.V.

Sabado 28 de Junio de 2025

No se desarrollan actividades en el tramo.

Edwin Salamanca Edwins SAS

Rafael Peña F. U.N.V.

Domingo 29 de Junio de 2025

No se desarrollan actividades en el tramo.

Edwin Salamanca

Rafael Peña F. U.N.V.

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV

Interventoria:

ECOVIAS SAS

TRAMO 09: SAN ANTONIO

RAFAEL D PEÑA
Director de obra

ERMY A. HURTADO R.
Director de interventoria

OSCAR F. SAENZ P.
Residente de interventoria

Norma

Powered by CamScanner

ambiental y 1 profesional SST
Maquinaria de obra: 2 motoniveladoras, 1 minicargador, 3 Vibro-compactador, 2 retrocargadores y 1 Volqueta doble.
Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador, 2 operadores de vibrocompactador, 1 operador de retrocargador
Personal contrato 609: 1 Inspector, 1 opical, 1 inspector SST, 2 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topográfica y 1 conductor de volqueta - doble.
Personal interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector y 1 conductor.
Actividades: K3+540 a K3+470 Reproceso corco presado estabilizado, K3+290 a K3+240 Extendida de presado estabilizado. K3+540 a K3+470 Reproceso imprimacion por irrigacion CRL-1.
Observaciones: En apoyo unidad ejecutora San Antonio 1.

Ecovias S.A.S

Zorayda Peña F.
U.E.M.V.

Domingo 01 de Junio de 2025 Clima: Seco Vigilancia SI /24h
Ingreso del personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST.
Maquinaria en obra: 2 motoniveladoras, 1 minicargador, 3 Vibro-compactadores, 2 retrocargadores y 1 Volqueta doble
Personal contrato 936: 2 motoniveladora operadores, 1 operador minicargador, 2 operadores de vibrocompactador. y 2 operadores de retro cargador.
Personal contrato 609: 2 Inspectores, 2 opicialos, 1 inspector SS 4 Ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topográfica, y 1 conductor de Volqueta doble.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector y 1 Conductor.
Actividades: K3+230 a K3+200 perfilacion de sobrasante por saturación, K3+290 a K3+240 Extendida de presado estabilizado K3+430 a K3+470 Cerco de presado estabilizado.
Observacion: En apoyo unidad ejecutora San antonio 1.

Ecovias SAS

Zorayda P. Peña F.
U.M.V.

Lunes 02 de junio de 2025 Clima: seco Vigilancia: si/24h
Ingreso del personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesiona ambiental, 1 profesional SST
Maquinaria en Obra: 2 motoniveladoras, 1 minicargador, 3 Vibrocompacta dores, 2 retrocargadores y 1 Volqueta doble del proyecto.
Personal contrato 936: 2 operadores de motoniveladora, 1 operador d minicargador, 2 operadores de vibrocompactador y 2 conductor de retrocargador.
Personal contrato 609: 2 inspectores, 2 oficiales, 1 inspector SST, 4 Ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topográfica y 1 conductor de volqueta doble.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector y 1 conductor.
Actividades: K3+170 a K3+200 perfilación de sobrasante por saturacion K3+430 a K3+310 Cereo de fresado estabilizado.
Observaciones: Sin novedad.

Salamanca
Grupo S.A.S

Rafael D. Peña F.
V.M.V.

Martes 03 de junio de 2025 Clima: Seco Vigilancia si/24h
Ingreso del personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesion ambiental y 1 profesional SST.
Maquinaria en Obra: 2 motoniveladoras, 1 minicargador, 3 vibrocompacta dores, 1 retrocargador, 1 carrotanque y 1 volqueta sencilla 1 volqueta doble.
Personal contrato 936: 2 operadores de motoniveladora, 1 operador de minicargador, 2 operadores de vibrocompactador, 1 operador de retrocargador y 1 conductor de volqueta sencilla
Personal contrato 609: 2 inspectores, 2 oficiales, 1 inspector SST, 4 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de Tráfico, 1 comisión topográfica y 1 conductor de volqueta doble, 1 operador de vibrocompactador.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector y 1 conducto

Norma

Powered by CamScanner

Actividades: K3+310 a K3+240 Cerco fresado estabilizado, K3+410 a K3+300 Sello con material pino cernido para fresado estabilizado.
Observaciones: En tramo 1 vibrocompactador Amarann varado desde 02-06-25, Retrocargadora John Deere sin operador, minicargador Mactrack sin llaves, vibrocompactador CAT inoperatividad varado en V. desde 01-06-25, Volqueta sencilla varada desde 30-05-25. Se evidencian trece pasos criticos para la movilidad en abscisas K6+870, K2+800, K2+600, K3+350, K2+150, K2+000, K1+925, K1+700, K1+400, K1+240, K0+300, K0+250 y K0+050 la normalidad en los pasos esta condicionada por el factor climático, pueden verse afectados los pasos por las fuertes lluvias. El material fresado estabilizado presenta saturación en la parte superior se requiere orear el material y compactarlo sin embargo el área queda en observación por su ahoellamiento.

Ing. Residente Salamanca Ecovias S.A.S

Rafael A. Peñuela F.
U.M.V.

Miercoles 04 de junio de 2025 Clima: Lluvia moderada Viga Larga: S: 14th
Ingreso del personal a obra: 7:00 am
Personal UAE RMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST
Maquinaria en obra: 2 motoniveladoras, 3 vibrocompactadores, 2 minicargadores 1 retrocargador, 1 carrotanque y 1 volqueta sencilla, 1 volqueta doble
Personal contrato 936: 2 operadores de motoniveladora, 3 operadores de vibrocompactador, 2 operador de minicargador y Retrocargador, 1 conductor de carrotanque y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 2 inspectores, 2 oficiales, 1 inspector SST, 3 Ayudantes, 1 Boal, 2 auxiliares de tráfico, 1 comision topografica 1 conductor de volqueta doble y 1 operador de vibrocompactador.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental y 1 profesional SST, 1 inspector y 1 conductor.
Actividades: K3+200 a K3+213 Excavación, mejoramiento con rajon y sello de base. K3+176 a K3+184 Excavacion de pallo mejoramiento con rajon y sello con base granular.

Norma

Powered by CamScanner

Observaciones: Se retira de frente retrocargador CAT por falla mecánica, Retrocargador Jhon Deere varado, Minicargador Mactrac sin llaves y sin operador. Volqueta sencilla varada desde 30-05-25, el operador de retrocargador es el mismo del minicargad Se evidencia material fresado crudo sin cubrir en abscisa K6+410 El dia de ayer 03-06-25 no se termina actividad de cerco fresado estabilizado en abscisas K3+310 a K3+240.

Edgar Solarte Ecovias SAS

Rafael D. Reis F. U.M.V.

Jueves 05 de junio de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia: si/es

Ingreso del personal a obra: 7:00 am

Personal UAE RMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 pro fesional ambiental, 1 profesional SST.

Maquinaria en obra: 2 motoniveladoras, 2 minicargadores, 3 vibrocomp tadores, 1 retrocargador, 1 carrotanque, 1 volqueta sencilla y 1 volquet doble

Personal contrato 936: 2 operadores de motoniveladora, 2 operadores de vibrocompactador, 1 operador para minicargador y retrocargador, 1 conductor de carrotanque y 1 conductor de volqueta sencilla.

Personal contrato 609: 2 inspectores, 2 oficiales, 1 inspector SST, 3 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de topógrafo, 1 comisión topográ fica, 1 conductor de volqueta doble y 1 operador de vibrocompactado.

Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 pr fesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector y 1 conductor.

Actividades: K8+100 a K3+000 Manejo de aguas lluvias, K3+365 a K3+330 reproceso cerco estabilizado, K3+170 a K3+240 Manejo de aguas lluvias.

Observaciones: Retrocargador Jhon Deere varado. Volqueta sencilla varada desde 30-05-25 en frente. Se evidencia material base granular desperdiciada en acopio K2+900.

Edgar Solarte Ecovias SAS

Rafael D. Reis F. U.M.V.

Viernes 06 de junio de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia: si/es

Ingreso del personal a obra: 7:00 am

Norma

Powered by CamScanner

Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST.
Maquinaria en obra: 2 motoniveladoras, 2 minicargadores, 3 vibrocompactadores, 1 retrocargador, 1 carrotanque y 1 volqueta sencilla y 1 Volqueta doble.
Personal contrato 936: 2 operadores de motoniveladora, 1 operador de minicargador y retrocargador, 2 operadores de vibrocompactador, 1 conductor de carrotanque y 1 conductor de volqueta sencilla
Personal contrato 609: 2 inspectores, 2 oficiales, 1 inspector SST, 3 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topográfica, 1 conductor de volqueta doble y 1 operador de vibrocompactador
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector y 1 conductor
Actividades: K3+150 a K3+170 Perfilacion subrasante, K3+150 a K3+170 Extendida de base granular,
Observaciones: A la fecha vibrocompactador Ammann se encuentra varado, sin horometro y sin potencia. En los catorce (14) puntos criticos evidenciados a principio de semana afectan la movilidad debido a fuertes lluvias. Volqueta sencilla operativa en frente. Se evidencia material base granular desperdiciada en acopio K2+900.

Edy Salamanca
Eduvias SAS

Rafael D. Peña F.
U.M.V.

Sábado 07 de Junio de 2025 clima: seco Vigilancia 5:/24h
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV.

Edy Salamanca
Eduvias SAS

Rafael D. Peña F.
U.M.V.

Domingo 08 de Junio de 2025 clima: seco Vigilancia: 5:/24h
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV.

Edy Salamanca
Eduvias SAS

Rafael D. Peña F.
UMV.

Norma

Powered by CamScanner

Lunes 09 de Junio de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia: Si/24
Ingreso del personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector y 1 conductor.
Maquinaria en obra: 2 Motoniveladoras, 2 minicargadores, 3 Vibrocompactadores, 2 retrocargadores, 1 carrotanque, 1 volque sencilla y 1 volqueta doble.
Personal contrato 936: 2 operadores de motoniveladora, 1 operador de minicargador, 2 operadores de vibrocompactador, 1 conductor de carrotanque, 1 conductor de volqueta sencilla, el operador de minicargador opera tambien el retrocargador.
Personal contrato 609: 2 inspectores, 2 oficiales, 1 inspector SST, 3 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comision topográfica, 1 conductor de volqueta doble y 1 operador de vibrocompactador.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector y 1 conductor.
Actividades: K3+150 a K3+130 Perfilacion Subrasante, K3+150 a K3+130 Extendida de base, K3+130 a K3+115 Trasiego de RCD, K3+120 K3+335 limpieza de alcantarillas.
Observaciones: Gran afectación en sector del toldo, en abscisas K2+850 a K2+740, K2+630, K1+995, K1+725, K1+420 a K1+370, K1+200, K0+790, K0+200, K0+020 y K6+850 a K6+918, Se requiere intervención inmediata para evitar los cierres en via por vehiculos atrapados en las zonas afectadas. Afectación de geotextil en filtro abscisas K3+020, K3+015 y K3+010. Se requiere retirar el material RCD en acopio pues afecta el desarrollo de actividades y contaminan la instalación de base.

Ing. Residente S.I.S
Ingeniero Residente
U.A.E.M.V.

Martes 10 de Junio de 2025 Clima: lluvia Moderada Vigilancia: Si/24
Ingreso del personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST
Maquinaria en obra: 2 motoniveladoras, 2 minicargadore(s), 3 Vibrocompactadores, 1 retrocargador, 1 carrotanque, 1 volqueta sencilla y

1 volqueta doble.
Personal contrato 936: 2 operadores de motoniveladora, 1 op. dor de minicargador, 2 operadores de vibrocompactador, 1 operador retrocargador, 1 conductor de carrotanque, y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 2 inspectores, 2 oficiales, 1 inspector SS 3 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topográf 1 conductor de volqueta doble y 1 operador de vibrocompactador.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspec 1 topógrafo, 1 cadenero y 1 conductor.
Actividades: K3+130 a K3+120 perfilacion subrasante, K3+1 K3+120 Extendida de base.
Observaciones: Se requiere retirar material RCD en acopio pues afecta el desarrollo de actividades y contamina la instalacion de base, el material RCD se esta acopiando en el campamento cuestion que afecta la vegetacion circundante.

Miercoles 11 de junio de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia SI/
Ingreso del personal a obra: 7:00 am
Personal UNE RMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, profesional ambiental, 1 profesional SST.
Maquinaria en obra: 2 motoniveladoras, 1 minicargador, 3 Vibrocompactadores, 1 retrocargador, 1 Carrotanque, 1 volqueta sencilla 1 volqueta doble
Personal contrato 936: 2 operadores de motoniveladora, 1 operad de minicargador, 2 operadores de vibrocompactador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor de carrotanque y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 2 inspectores, 2 oficiales, 1 inspector SS 3 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topográfica, 1 conductor de volqueta doble y 1 operador de vibrocompactad
Personal de interventoria: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 Inspector,

Norma

Powered by CamScanner

topógrafo, 1 cadenero y 1 conductor.
Actividades: K1+420 a K1+390 perfilacion de exceso de material saturado y barro. K3+130 a K3+120 Conformación con rajon. (para habilitar paso en via y retomar actividad el dia siguiente.)
Observaciones: Debido a condiciones climáticas y deterioro de afirmado, las volquetas de contrato descargan material B-200 en vía, en esta actividad se contamina arena de rio acopiada por el contratista CEV. Durante recorrido diario de interventoria se observa carro-tanque de contrato atascado en paso vial afectado K1+400, generando concentracion de tráfico en los cierres viales por la imposibilidad del paso. Afectación de geotextil en filtro; el cual se retira es su totalidad en abscisas K1+400 lugar de intervención que provoca que las aguas sob-superficiales permeen en la sobrasante y deterore las intervenciones previas en este punto, se requiere reparar el geotextil para evitar reprocesos y condiciones desfavorables para la intervención. Se requiere retirar el material RCD en acopio pues afecta el desarrollo de actividades y contamina la instalacion de base, el material RCD se esta acopiando en el campamento cuestión que afecta la vegetación circundante. ingresan auxiliares de tráfico para unidad ejecutora de San Antonio 1.

Edwin Sabmara
Conras SAS

Patricia Reis F.
U.M.V.

Jueves 12 de junio de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia: Si
Ingreso del personal a obra: 7:00am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST.
Maquinaria en obra: 2 motoniveladoras, 1 minicargador, 3 vibrocompactadores, 2 retrocargadores, 1 carrotanque, 1 volqueta sencilla y 2 volquetas dobles.
Personal contrato 936: 2 operadores de motoniveladora, 1 operador de minicargador, 2 operadores de vibrocompactador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor de carrotanque y 1 conductor de volqueta sencilla

Personal contrato 609: 2 inspectores, 2 oficiales, 1 inspector SST, 5 ayudantes, 1 BOAL, 4 auxiliares de tráfico, 1 comisión topográfica, 1 conductor operador de vibrocompactador y 2 conductores de volqueta una de proyecto y la otra de misional
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector topógrafo, 1 cadenero y 1 conductor.
Actividades: K1+100 a K1+180 Perfilacion de exceso de material saturado y barro. K1+180 a K1+170 Excavacion de fallo, Instalacion de ragon, Sello con RAP, K1+400 a K1+390 Reperfilacion excavación de fallo para recuperacion de movilidad, Excavacion mejoramiento con ragon. y sello con rap.
Observaciones: Se realiza cierre de via definitivo para recuperación de puntos críticos. El contratista CEV apoya en punto critico K2+800, con retrocargador para perfilacion de material saturado y barro el cual queda en via, Para recuperación de puntos críticos la UMV retira la máquinaria y el personal asignado para conformación de estructura de via.

Edwin Solarte
Ecovias SAS

Rafael A. Peña F.
U.M.V.

Viernes 13 de junio de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia: Si/
Ingreso del personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST
Maquinaria en obra: 1 motoniveladoras, 2 minicargadores, 3 Vibrocompactadores, 2 retrocargadores, 1 carrotanque, 1 volqueta sencilla y 2 volquetas dobles
Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 2 operadores de minicargador, 2 Vibrocompactadores operadores, 2 operadores de retrocargador, 1 conductor de carrotanque y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 2 inspectores, 2 oficiales, 1 inspector SST, 6 ayudantes, 2 BOAL, 1 comisión topográfica, 4 auxiliares de tráfico, 1 operador de vibrocompactador y 2

Norma

Powered by CamScanner

conductores de volqueta doble una del proyecto y la otra de misionalidad.
Personal de interventoria: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 topógrafo, 1 cadenero y 1 conductor.
Actividades: K1+400 a K1+415 Reproceso excavación de falla excavacion, mejoramiento con rajon y sello con B-200, Conformacion con base granular. K2+800 a K2+793 Accion de movilidad instalación de rajon, solo rajon por saturacion de material.
Observaciones: Se generan reprocesos continuos en abscisas K1+420 a K1+370 se sugiere al constructor verificar el funcionamiento del filtro y determinar la afectación debido a deterioro o daño de geotextil que provocan infiltraciones en el area de intervención.

Sábado 14 de junio de 2025 Clima: Seco Vigilancia: Si/24h
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV.

Domingo 15 de junio de 2025 clima Seco Vigilancia Si/24h
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV.

Lunes 16 de junio de 2025 clima: Seco Vigilancia Si/24h
Ingreso del personal a obra: 7:00 am.
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST.
Maquinaria en obra: 1 motoniveladora, 2 minicargadores, 3 Vibrocompactadores, 2 retrocargadores, 1 carrotanque, 1 volqueta sencilla 2 volquetas dobles.

Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 2 operadores de minicargador, 2 operadores de vibrocompactador, operadores de retrocargador, 1 conductor de carrotanque y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 2 inspectores, 2 oficiales, 1 inspector SST, 6 Ayudantes, 2 BOAL, 4 Auxiliares de tráfico, 1 comisión topográfica, 1 operador de vibrocompactador y 2 conductores de volqueta doble.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector 1 Topógrafo, 1 cadenero y 1 conductor.
Actividades: K1+646 a K1+720 Replanteo de bordes de K1+20 a K1+208 Excavacion de fallo, Mejoramiento con rajon, sello con RAP K1+400 a K1+370 reproceso retiro de base granular satura y rajon contaminado.
Observaciones: La acción de movilidad en abscisas K1+400 a K1+370 no estabiliza el área no se sella el material, el cual el dia de hoy se evidencia saturado por lluvias.
La UMV realiza recorridos he identifica 14 puntos críticos para la movilidad en abscisas K3+125, K2+[illegible] K2+660, K2+330, K1+910, K1+860, K1+815, K1+705, K1+690, [illegible] 202, K0+730, K0+320, K0+200 y K0+050 actualmente se encuentra en intervención K1+400.

Edgar Salamanca
Eduvial SAS

Rafael D. Peña F.
Dinav.

Martes 17 de junio de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia: SI/24
Ingreso del personal a obra: 7:00 am
Personal UAEEMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST.
Maquinaria en obra: 1 motoniveladora, 2 minicargadores, 3 Vibrocompactadores, 2 retrocargadores, 1 carrotanque, 1 volqueta sencilla, 2 Volquetas dobles del proyecto y 1 Volqueta doble de musioralidad.
Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 2 operadores de minicargador, 2 operadores de vibrocompactador, 2

Powered by CamScanner

operadores de retrocargador, 1 conductor de carrotanque, 1 volqueta sencilla conductor.
Personal contrato 609: 2 inspectores, 2 oficiales, 1 inspector SST, 4 auxiliares de tráfico, 6 ayudantes, 2 BOAL, 1 comisión topográfica, 2 conductores de Volqueta proyecto, 1 conductor volqueta misionalidad y 1 operador de vibrocompactador.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 Topógrafo 1 cadenero y 1 conductor.
Actividades: K1+397 a K1+390 Reproceso accion de movilidad excavacion de fallo, Mejoramiento con rajon. y sello con RAP.
Observaciones: En area de intervención K1+400 en horas de la tarde queda volqueta doble de la UMV enterrada. los cierres viales superan los 30 min debido a trabajos de reproceso en via abscisa K1+420. Se indica al encargado de obra que la instalacion de rajon debe realizarse en capas selladas y compactadas para evitar fallos internos.

Edgar Salamanca
Eavras S.A.S.

Ing. Jhon J. Jaen F.
UMV.

Miercoles 18 de junio de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia: SI/24h
Ingreso del personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional social.
Maquinaria en obra: 1 motoniveladora, 2 minicargadores, 3 Vibrocompactador, 2 retrocargadores, 1 carrotanque, 1 volqueta sencilla y 2 volquetas dobles.
Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 2 operadores de minicargador, 2 operadores de vibrocompactador, 2 operadores de retrocargador, 1 conductor de carrotanque y 1 conductor de volqueta sencilla, 2 volquetas dobles.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 1 inspector SST, 5 ayudantes, 2 BOAL, 4 auxiliar de tráfico, 1 comisión topográfica 1 Operador de vibrocompactador, 2 conductores de volqueta doble.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional (social

1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 Topog
1 cadenero y 1 conductor.
Actividades: K1+390 a K1+400 Reproceso accion de movilec
excavacion de falla, mejoramiento con rajon y sello con RA
Observaciones: las unidades sanitarias no se emplean en
ningún frente pues se ubican en el campamento a di
tancia considerables de desplazamiento. Los cierres viales
superan 1 hora debido a trabajos de reproceso en vía
abscisa K1+420. Se indica al encargado de obra que las
instalacion de rajon debe realizarse en capas selladas
compactadas, para evitar fallos internos.

SST

Zorsa D. Peña F.
Ver.

Jueves 19 de junio de 2025 Clima: Seco Vigilancia: 8 1/24h
Ingreso del personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1
profesional ambiental, 1 profesional SST.
Maquinaria en obra: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 3
minicargadores, 1 retrocargador, 1 carrotanque, 1 volgueta sen-
cilla, 3 volguetas dobles.
Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 1 op-
rador de vibrocompactador, 2 operadores de minicargador, 1
operador de retrocargador, 1 carrotanque conductor y 1 con
tor de volgueta sencilla.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 1 inspector
SST, 4 ayudantes, 4 auxiliar de tráfico, 1 comisión topográfi
3 conductores de volgueta doble.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional soc
1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 Topó
grafo, 1 cadenero y 1 conductor
Actividades: K1+390 a K1+400 129 reproceso acción de movilidad
excavación, mejoramiento con rajon y sello con RAP.
Observaciones: Se separan las unidades ejecutoras. Se interviene
la parte izquierda del fallo en abscisas K1+400. Se retira
del frente de obra las maquinas y vehiculos de

Norma

Powered by CamScanner

misionalidad.

Viernes 20 de junio de 2025 Clima: Seco Vigilancia: Si/24h
Ingreso del personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST.
Maquinaria en obra: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador, 1 mini cargador, 1 retrocargador (varado), 1 carrotanque, 1 volqueta sencilla y 3 volquetas dobles.
Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 1 operador de vibrocompactador, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor de carrotanque y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 1 inspector SST, 3 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, 1 comision topografica y 3 conductores de volqueta.
Personal de interventoria: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 topógrafo, 1 cadenero y 1 conductor.
Actividades: K1+402 a K1+409 der reproceso accion de movilidad excavacion de falla, Mejoramiento con rajon y Sello con RAP. K1+380 a K1+400 Conformación con base granular, K1+390 a K1+350 manejo de aguas lluvias en ambos costados.
Observaciones: Se evidencia material de mejoramiento rajon contaminado desde el acopio. Debido a avería en retrocargador CAT se ve afectado el normal avance de obra.

Sábado 21 de junio de 2025 Clima: Seco Vigilancia: Si/24h
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV.

Domingo 22 de junio de 2025 Clima: Seco Vigilancia: Si/24h
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV.

Solarana Ecovias SAS

Zaffel D. Peña F.

Lunes 23 de junio de 2025 Clima: seco Vigilancia Si/24h
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV.

Solarana Ecovias SAS

Zaffel D. Peña F. U.M.V.

Martes 24 de junio de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia Si
Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST
Maquinaria en obra: 1 motoniveladora, 2 vibrocompactadores, 3 retrocargadores, 1 carrotanque, 2 minicargadores y 1 volqueta sencilla, 2 volquetas dobles.
Personal contrato 936: 2 operadores de vibrocompactador, 1 operador de motoniveladora, 3 operadores de retrocargador, 2 operadores de minicargador y 1 conductor de carrotanque y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 2 inspectores, 2 oficiales, 1 inspector, 6 ayudantes, 2 BOAL, 4 Auxiliares de tráfico, 2 Comisiones topográficas y 2 conductores de volqueta doble.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 topógrafo, 1 cadenero y 1 conductor.
Actividades: K1+670 a K1+680 accion de movilidad excavacion mejoramiento con rajon, sello con rap. K2+850 a K2+740 perfilacion de material saturado (el cual queda en via) K0+2[illegible] y K3+130 Asistencia con maquinaria para percances en via
Observaciones: En abscisa K0+200 en borde izquierdo vibrocompactador Bomag recien descargado y asignado a San

Norma

Powered by CamScanner

Antonio 1 se queda sin frenos en vía y se precipita a Alcantarilla, cabe aclarar que la maquina no tiene cabina para resguardar al operador, una vez se retira de la alcantarilla se procede a maniobrar de esta forma el vibrocompactador queda en via en abscisa K1+010 sin posibilidad de acomodarlo y con la gravedad que no le funcionan los frenos en pendientes inclinadas, se hace hincapié en la situación debido al peligro que representa para todos los actores viales esta maquina en sus condiciones operativas actuales. La volqueta SRN-910 de CEY se entierra en fallo en abscisas K3+310 lo cual obstruye la via en horas de la tarde, se requiere acciones en conjunto para sortear los percances en via con maquinaria CEY y VMV, cada vez se hace más clara la necesidad de una unidad de ejecucion que atienda los problemas de movilidad en el tramo y otra que adelante la construccion de vía, pues avanzar en una actividad implica desatender la otra.

Ing. Salamanca
Cerros S.A.S

Ing. Jaime D. Peña F.
V.M.V.

Miercoles 25 de junio de 2025 clima: Seco Vigilancia si / 24h
Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal VAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST.
Maquinaria en obra: 1 motoniveladora, 2 Vibrocompactadores, 2 retrocargadores 2 minicargadores, 1 carrotanque y 1 volqueta sencilla.
Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 2 operadores de vibrocompactador, 2 operadores de retrocargador, 2 operadores de minicargador, 1 conductor de carrotanque y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topográfica y 2 conductores de volqueta doble.
Personal de interventoría: 1 inspector, 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 topógrafo,

Powered by CamScanner

1 caderero y 1 conductor.
Actividades: K1+409 a K1+415 Accion de movilidad; excavacion fallo, mejoramiento con rajon, sello con rap K1+715 a K17 manejo de aguas lluvias en ambos lados, K1+820 a K1+830 excavacion, mejoramiento con rajon, sello con base granular Conformacion con RAP K1+871 a K1+874 Excavacion, Mejoramiento con Rajon, sello con B-200, Conformacion con RAP, K1+866 a K1+868 Excavacion. de fallo, mejoramiento con rajon sello con B-200, Conformacion con rap
Observaciones: En operacion se evidencian 4 Volquetas dobles del proyecto en este tramo transportando material, Pendiente por retiro del frente vibrocompactador Bomag.

Rafael D. Peña F.

Jueves 26 de Junio de 2025 Clima: Seco Vigilancia: Si/24
Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST
Maquinaria en obra: 1 motoniveladora, 2 vibrocompactadores, 2 minicargadores, 2 retrocargadores, 1 carrotanque, 1 volqueta sencilla y 2 volquetas dobles
Personal contrato 936: 1 motoniveladora, Operador, 2 operadores de vibrocompactador, 2 operadores de minicargador, 2 operadores de retrocargador, 1 conductor de carrotanque y 1 Conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 opicial, 1 inspector SST, 3 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topográfica y 2 conductores de volqueta doble
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 topógrafo, 1 caderero y 1 conductor.
Actividades: KZ+810 a KZ+794 perfilacion de material saturado. KZ+808 a KZ+797 accion de movilidad; excavacion, mejoramiento con rajon (se reutiliza rajon, sello con RAP KZ+820 a KZ+760 manejo de aguas lluvias en ambos costados

Norma

Powered by CamScanner

y retiro de material de perfilacion en vía.
Observaciones: En operación se evidencian 4 volquetas dobles del proyecto en este tramo transportando material. Pendiente, por retiró del frente vibrocompactador Bomag.

Edgar Sabrana
Eroiva S.A.S

RAFAEL D. PEÑA F.
U.T.V.

Viernes 27 de Junio de 2025 Clima: lluvia moderada Vigilancia: SI/CMH
Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST.
Maquinaria de obra: 1 motoniveladora, 2 (ope) vibrocompactadores, 2 minicargadores, 2 retrocargador, 1 carrotanque y 1 Volqueta sencilla, 2 Volquetas dobles.
Personal contrato 936:: 1 operador de motoniveladora, 2 operadores de vibrocompactador, 2 minicargadores operadores, 2 operadores de retrocargador, 1 conductor de carrotanque y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 1 inspector SST, 3 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comision topográfica, 2 conductores de volqueta doble.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 topógrafo, 1 cadenero y 1 conductor.
Actividades: Acciones de movilidad en abscesas K1+800 a K1+820 excavacion de fallo, mejoramiento con rajon, sello con RAP. y manejo de aguas lluvias en ambas costados. K1+865 a K1+875 excavación mejoramiento con rajon, sello con rap, K1+900 a K1+910 Excavacion mejoramiento con rajon, sello con RAP. K2+815 a K2+820 Perfilacion de material saturado. excavacion de fallo, mejoramiento con Rajon (Se reutiliza rajon) Sello con RAP.
Observaciones: Se observa vibrocompactador Ammann encendido en obra sin operador. En K1+100 se afecta cercado de propiedad privada debido a acopio de fresado. El trabajo de reparacion de puntos críticos requiere una atención constante, se requiere unidad de ejecucion para atenderlos.

Edgar Sabrana
Eroiva S.A.S

RAFAEL D. PEÑA F.
U.T.V.

Norma

Powered by CamScanner

Sábado 28 de junio de 2025 Clima: Seco Vigilancia: 5 1/24h
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV

Edgar Salamanca
Erovias S.A.S

RAFAEL D. PEÑA F.
U.M.V.

Domingo 29 de junio de 2025 Clima: Seco Vigilancia 5 1/24h
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV.

Edgar Salamanca
Erovias S.A.S

RAFAEL D. PEÑA F.
U.M.V.

Lunes 30 de junio de 2025 Clima: seco Vigilancia: 5 1/24h
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV

Edgar Salamanca
Erovias S.A.S

RAFAEL D. PEÑA F.
U.M.V.

Powered by CamScanner

ANEXO NO. 04 DOCUMENTACION CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022

4.A INFORME COMPONENTE AMBIENTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

ECOVIAS SAS



INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA N° 29

DEL 01 al 30 DE JUNIO - DE 2025

Versión 01
Bogotá, D.C. junio 2025

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		N°. DE COPIAS
Copia N°.1	Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	1 (Original)
Copia N°.2	Biblioteca del Proyecto	1 (Copia)

CONTROL DE VERSIONES

ÍNDICE VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFCACIÓN	FOLIOS
01		Emisión del documento	116

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN



TITULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 29			
PERIODO:	**01 al 30 de junio de 2025**			
NUMERO DE REVISIÓN			1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN Profesional Ambiental	Nombre:	Yesenia Hernández Ramirez		
	Firma:			
	Fecha:	09/07/2025		
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Ermy A. Hurtado R.		
	Firma:			
	Fecha:	09/07/2025		
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
	Firma:			
	Fecha:	09/07/2025		

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....8
2. Objeto del proyecto....9
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....10
4. OBJETIVOS....12
4.1 General....12
4.2 Específicos....12
5. GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA:....13
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV....13
5.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental....13
5.2 Capacitación ambiental al personal de obra....14
5.3 Cumplimiento de los requerimientos legales....16
5.4 Manejo Integral de materiales de construcción....19
5.5 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales....23
5.6 Manejo y disposición final de escombros y RCD....27
5.7 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos....31
5.8 Manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales....35
5.9 Control de emisiones atmosféricas....35
5.10 Manejo de aguas superficiales....37
5.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales....39
5.12 Protección de ecosistemas sensibles....43
5.13 Protección de fauna en obra....43
5.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio....44
5.15 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo....48
5.16 Manejo del descapote y cobertura vegetal....53
5.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural....53
6. CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL CTO. 479 DE 2022....54
6.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental....54
6.2 Capacitación ambiental al personal de obra....55

6.3 Cumplimiento de los requerimientos legales 57
6.4 Manejo Integral de materiales de construcción 59
6.5 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales 62
6.6 Manejo y disposición final de escombros y RCD 65
6.7 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos. 68
6.8 Manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales 71
6.9 Control de emisiones atmosféricas. 72
6.10 Manejo de aguas superficiales 74
6.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales 76
6.12 Protección de ecosistemas sensibles 78
6.13 Protección de fauna en obra 78
6.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio 78
6.15 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo 81
6.16 Manejo del descapote y cobertura vegetal. 83
6.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural. 83
7. CONSORCIO GAVIONES 95 CTO. 478 DE 2022 84
7.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental. 84
7.2 Capacitación y concienciación para el personal de obra 85
7.3 Cumplimiento de los requerimientos legales 86
7.4 Manejo Integral de materiales de construcción 88
7.5 Explotación de fuentes de materiales 90
7.6 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales 91
7.7 Manejo y disposición final de escombros y RCD 93
7.8 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y peligrosos. 96
7.9 Manejo de aguas superficiales 99
7.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales 101
7.12 Manejo del descapote y cobertura vegetal. 103
7.13 Protección de fauna en obra 104
7.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio 104
7.16 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo 106
6.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural. 108

8. gestion realizada por la interventoria.....109
9. CONCLUSIONES.....113

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas ubicación de los tramos del proyecto. 11
Tabla 2. Estado actual de la malla vial. 11
Tabla 3 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV 13
Tabla 4. Conformación del grupo Socioambiental UMV.....14
Tabla 5 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV 14
Tabla 6 Capacitaciones realizadas UMV.....15
Tabla 7 Permisos de ocupación de cauce otorgados por la CAR.....17
Tabla 8 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV 18
Tabla 9 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción UMV.....20
Tabla 10 Relación de Proveedores y cantidades UMV 21
Tabla 11 Verificación cumplimiento ficha de señalización UMV.....23
Tabla 12 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD UMV 27
Tabla 13. Relación de material RCD evacuado UMV 29
Tabla 14 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV.....32
Tabla 15 Reporte de residuos generados UMV 34
Tabla 16 Cumplimiento general medida de manejo UMV.....36
Tabla 17 Cumplimiento general medida de manejo UMV.....38
Tabla 18 Cumplimiento general medida de manejo UMV.....40
Tabla 19 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio UMV.....44
Tabla 20 Ubicación de acopios Tunales.....46
Tabla 21 Ubicación acopios San Antonio-Toldo.....47
Tabla 22 Ubicación acopios Capitolio.....47
Tabla 23 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo UMV.....48
Tabla 24 Relación de vehículos UMV.....49
Tabla 25 Relación de maquinaria UMV 50
Tabla 26 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV.....54
Tabla 27 Conformación del grupo socioambiental CEV.....54
Tabla 28 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV.....55
Tabla 29 Capacitaciones realizadas CEV.....56
Tabla 30 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV.....58
Tabla 31 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción CEV 59

Tabla 32 Relación de Proveedores y cantidades CEV....60
Tabla 33 Verificación cumplimiento ficha de señalización CEV....62
Tabla 34 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD CEV....66
Tabla 35 Relación de material RCD dispuesto CEV....67
Tabla 36 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV....68
Tabla 37 Reporte de residuos generados CEV....71
Tabla 38 Cumplimiento general medida de manejo CEV....72
Tabla 39 Cumplimiento general medida de manejo CEV....74
Tabla 40 Cumplimiento general medida de manejo CEV....76
Tabla 41 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio CEV....79
Tabla 42 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo CEV....81
Tabla 43 Relación de vehículos CEV....82
Tabla 44 Relación de maquinaria CEV....82
Tabla 45 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95....84
Tabla 46 Conformación del grupo socioambiental Gaviones 95....84
Tabla 47 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95....85
Tabla 48 Capacitaciones realizadas Gaviones 95....85
Tabla 49 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95....87
Tabla 50 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción Gaviones 95....88
Tabla 51 Relación de Proveedores y cantidades Gaviones 95....89
Tabla 52 Verificación cumplimiento ficha de señalización Gaviones 95....91
Tabla 53 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD Gaviones 95....94
Tabla 54 Relación de material RCD dispuesto Gaviones 95....95
Tabla 55 Verificación cumplimiento ficha manejo de residuos sólidos convencionales Gaviones 95....96
Tabla 56 Reporte de residuos generados Gaviones 95....99
Tabla 57 Verificación cumplimiento ficha manejo de aguas superficiales Gaviones 95....100
Tabla 58 Verificación cumplimiento ficha manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales Gaviones 95....101
Tabla 59 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio Gaviones 95....104
Tabla 60 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo Gaviones 95....106
Tabla 61 Relación de vehículos Gaviones 95....107
Tabla 62 Relación de maquinaria Gaviones 95....107
Tabla 63 Relación de correspondencia enviada y recibida....111

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Ubicación de los tramos del proyecto. 10
Imagen 2. Jurisdicción el territorio CAR-Municipios de Cundinamarca y Bogotá rural 11
Imagen 3 Plano de PMT aprobado UMV 26
Imagen 4 Plano de PMT aprobado CEV 65
Imagen 4 Plano de PMT aprobado Consorcio Gaviones 93

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Capacitación Ambiental UMV 16
Ilustración 2 Manejo de materiales de Construction Capitolio UMV 22
Ilustración 3 Manejo de materiales de Construction Tunales UMV 22
Ilustración 4 Manejo de materiales de Construction San Antonio UMV 23
Ilustración 5 Señalización campamentos UMV 24
Ilustración 6 Señalización emergencia en frente de obra UMV 25
Ilustración 7 PMT implementado Tunales UMV 25
Ilustración 8 PMT implementado Capitolio UMV 26
Ilustración 9 PMT implementado San Antonio UMV 26
Ilustración 10 Acopios de RCD San Antonio UMV 30
Ilustración 11 Acopios de RCD Capitolio UMV 31
Ilustración 12 Acopios de RCD Tunales UMV 31
Ilustración 13 Puntos ecológicos San Antonio / Tunales UMV 33
Ilustración 14 Centro de acopio temporal de Respel San Antonio/ Tunales UMV 34
Ilustración 15 cubrimiento de materiales Capitolio / Tunales UMV 37
Ilustración 16 manejo aguas superficiales Tunales/Capitolio UMV 39
Ilustración 17 Unidades Sanitarias Capitolio / San Antonio UMV 41
Ilustración 18 Unidades Sanitarias Tunales UMV 42
Ilustración 19 Kit atención derrames San Antonio / Capitolio UMV 42
Ilustración 20 Campamentos Tunales UMV 45
Ilustración 21 Campamentos Capitolio UMV 45
Ilustración 22 Campamentos San Antonio UMV 46
Ilustración 23 Equipos en obra Tunales UMV 51
Ilustración 24 Equipos en obra Capitolio UMV 51
Ilustración 25 Equipos en obra San Antonio UMV 52
Ilustración 26 Capacitación Ambiental CEV 57
Ilustración 27 Manejo de materiales de Construction Tunales / San Antonio CEV 62
Ilustración 28 Señalización en obra CEV 63
Ilustración 29 PMT Implementado San Antonio CEV 64

Ilustración 30 PMT Implementado Tunales CEV 64
Ilustración 31 Acopios de RCD San Antonio/Tunales CEV 68
Ilustración 32 Puntos ecológicos San Antonio / Tunales CEV 70
Ilustración 33 Cubrimiento de materiales CEV 73
Ilustración 34 delimitación de alcantarillas CEV 75
Ilustración 35 Kit Control de derrames CEV 77
Ilustración 36 Campamentos Tunales CEV 80
Ilustración 37 Campamentos San Antonio CEV 80
Ilustración 38 Equipos en obra CEV 83
Ilustración 39 Capacitación Ambiental Gaviones 95 86
Ilustración 40 Manejo de materiales de Construction Gaviones 95 predio identificado como acopio 90
Ilustración 41 Actividades en obra Gaviones 95 92
Ilustración 42 PMT Implementado Laguna Verde Gaviones 95 92
Ilustración 43 Acopios de RCD Gaviones 95 96
Ilustración 44 Puntos ecológicos Gaviones 95 98
Ilustración 45 Unidades Sanitarias Gaviones 95 102
Ilustración 46 Kit control de derrames Gaviones 95 102
Ilustración 47 Campamento Gaviones 95 106
Ilustración 48 Equipos en obra Gaviones 95 108
Ilustración 49 participación en comités integrales 110
Ilustración 50 participación en comités integrales 110

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes.

La localidad de Sumapaz está ubicada sobre la Cordillera Oriental, allí tiene lugar el Parque Nacional Natural Sumapaz, su extensión es de 154.000 hectáreas con alturas sobre el nivel del mar que oscilan entre 1.500 y 4.360 metros y temperaturas entre 2 y 19 grados centígrados, las veredas de la localidad se intercomunican entre sí y con la zona urbana de Bogotá mediante una red de vías carreteables y peatonales. El transporte de los productos de la región se realiza a lomo de mula, salvando grandes distancias hasta donde pueden ser embarcados en vehículos. La localidad está ubicada en zona del páramo más grande del mundo lo que hace que la pluviosidad sea alta en gran parte del año y esto influye en la disminución de visibilidad y exige precaución en la conducción de vehículos, las alturas de la localidad sobre el nivel del mar varían entre 2200msnm y 3900msnm en las vías de la localidad.

La Localidad de Sumapaz tienen una red vial rural en regulares condiciones con superficie de afirmado en regular estado, las vías de la localidad cuentan con anchos variables de 4,50 hasta 7mts en promedio y con mínimas obras de arte que considerando que el mantenimiento de vías es altamente oneroso, frente a los presupuestos locales, la SDP-IDU consideran que es pertinente adelantar intervenciones a nivel de mantenimiento vial, con lo cual se pretende mejorar las condiciones de transporte de productos agrícolas generados en la región, trasporte de comunidad en general y una fácil accesibilidad escolar.

2. OBJETO DEL PROYECTO.

El desarrollo del proyecto busca mejorar la infraestructura de la red vial terciaria, con el fin de optimizar la intercomunicación, movilidad y el tránsito al interior de la localidad, hacia los centros poblados y la zona urbana con el fin de impulsar y fortalecer el concepto de ciudad región, mediante el mantenimiento y rehabilitación de la red vial terciaria en mal estado de la ruralidad de Bogotá D.C, en la localidad de Sumapaz, La implementación de las soluciones planteadas permitirá mejorar la intercomunicación terrestre en la población rural al disponer de infraestructura mejorada para tal fin.

El proyecto cuyo objeto es "MEJORAR LA INTERCOMUNICACION Y ACCESIBILIDAD TERRESTRE DE LOS HABITANTES RURALES DE LA LOCALIDAD DEL SUMAPAZ".


Las obras buscan lograr beneficios económicos y sociales, originados en los ahorros en tiempo para los usuarios, en costos de operación de los vehículos y mayor oportunidad y calidad de los productos agrícolas y agroindustriales de dichos municipios.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El lugar de ejecución del contrato es en la ciudad de Bogotá D.C., localidad 20 (Sumapaz). La localidad de Sumapaz se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, con los siguientes límites:

- *Por el Norte*: con la localidad de Usme, Bogotá D.C.
- *Por el Sur*: con el Departamento de Huila.
- *Por el Oriente*: con los municipios de Chipaque, Une, Gutiérrez del departamento de Cundinamarca y San Juan de Cubarral en el departamento del Meta.
- *Por el Occidente*: con los municipios de Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera del departamento de Cundinamarca.

Imagen 1. Ubicación de los tramos del proyecto.

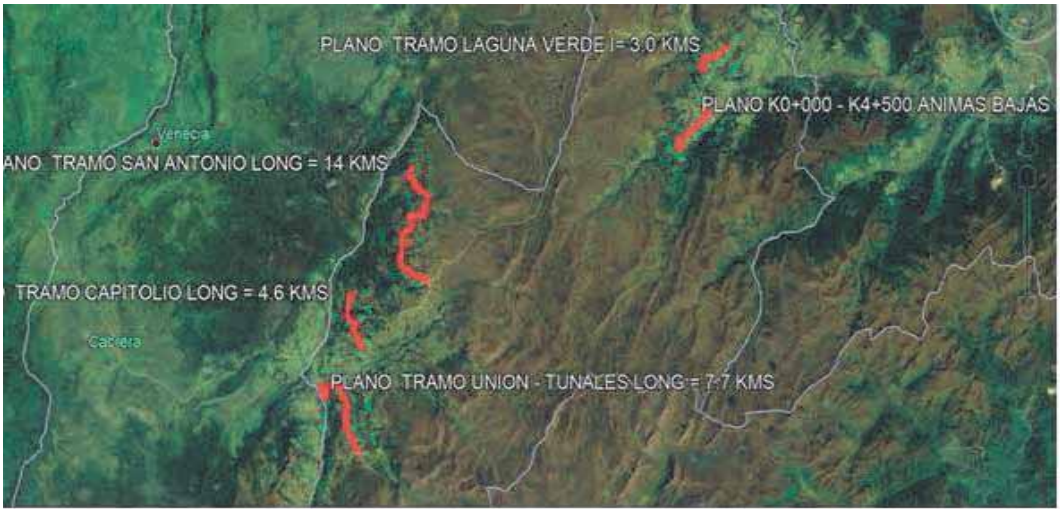

Fuente: Anexo Técnico.

Imagen 2. Jurisdicción el territorio CAR-Municipios de Cundinamarca y Bogotá rural



Fuente: https://www.car.gov.co/vercontenido/2430

Tabla 1. Coordenadas ubicación de los tramos del proyecto.

TRAMO	LONGITUD (m)	Coordenadas eje inicio		Coordenadas eje fin	
		ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
1. Unión Tunales	940	71.323,05	28.973,98	70.263,94	31.071,71
2. Unión Tunales	2042,66	70.267,12	31.082,64	69.538,72	32.345,68
3. Unión Tunales	250	69.443,88	32.324,65	69.209,96	32.342,85
4. Unión Tunales	703,8	69.292,34	32.444,70	68.757,63	32.113,11
5. Unión Tunales	1530	68.746,24	32.006,96	68.433,47	32.290,91
8. Animas bajas	1870	89.909,19	51.357,74	88.350,20	48.633,31
9. San Antonio II K6+910 - K0+000	6910	74.127,41	38.986,50	71.879,91	45.974,27

Fuente: Anexo Técnico.

La extensión total de la malla vial de la localidad es de 357,25 km-carril (incluye rural principal y no principal), la cual se categoriza de la siguiente manera.

Tabla 2. Estado actual de la malla vial.

Bueno Km-Carril	Regular Km-Carril	Malo Km-Carril	Total Km-Carril
28.32	113.02	215.92	357.25

Fuente: Anexo Técnico

Malla vial rural principal cuenta con una extensión total de 222,96 km-carril donde solo 18,94 km-carril, se encuentran en buenas condiciones, lo cual corresponde al 9% del estado total de la malla vial.

4. OBJETIVOS.

4.1 General

Presentar el informe de gestión ambiental correspondiente a las actividades constructivas ejecutadas en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2025 por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV, CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL y CONSORCIO GAVIONES 95. en el desarrollo del contrato de interventoría No. 161 de 2022, por medio de la descripción de las actividades ejecutadas desde el componente ambiental con el fin de evidenciar el cumplimiento a satisfacción del seguimiento, control y verificación a la ejecución de los contratos de obra No. 479 de 2022, 478 de 2022 y UAERMV.

4.2 Específicos

- Supervisar las actividades ambientales ejecutadas por los contratistas de obra y entidad ejecutora en desarrollo de los programas del PAGA.
- Revisar y dar concepto a los informes ambientales remitidos por los contratistas de obra y entidad ejecutora.
- Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente por parte de los contratistas de obra y entidad ejecutora.
- Presentar el informe de cumplimiento a los programas ambientales implementados por los contratistas de obra y entidad ejecutora.
- Especificar y detallar el seguimiento ejecutado por la interventoría de las actividades realizadas por los contratistas de obra y entidad ejecutora dentro del componente ambiental durante el periodo del presente informe.

5. GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA:

A continuación, se hará una descripción de las actividades realizadas propias de interventoría y del seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista de obra durante el transcurso que abarca este informe mensual de actividades de Interventoría, es decir, del 01 al 30 de junio de 2025. Lo anterior de acuerdo a las fichas presentadas en el PAGA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV

5.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental.

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 3 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con el grupo de gestión socioambiental conformado.				
El personal socioambiental se encuentra en el lugar donde se desarrollan las actividades de obra.				

Fuente: Ecovias SAS

La interventoría realizó requerimiento de actualización al documento PAGA, debido a que es necesario incluir las resoluciones de permisos de ocupación de cauce POC expedidas por la CAR en la ficha PGH-3.1-10, así mismo se requirió la actualización de la ficha PAC 2.5-08 con respecto al código de colores descritos en la misma ya que se debe implementar el mencionado en la resolución 2184 de 2019, este documento en el periodo fue entregado por parte de la UAERMV y avalado por la interventoría mediante el oficio 186-1-704. A continuación, se presenta la conformación del grupo de gestión Socioambiental (véase tabla No4).

Tabla 4. Conformación del grupo Socioambiental UMV

NOMBRE	CARGO
Rafael Darío Peña	Director de obra
Camilo Rojas	Coordinador de obra
Jorge Luis Aldana	Coordinador de obra
Ruby Ruiz	Residente social
Paola Vidal	Profesional ambiental
Jhoanna Ortiz	Profesional en seguridad y salud en el trabajo

Fuente: Ecovias

De acuerdo con la anterior tabla se evidencia que la entidad ejecutora cumple con el personal requerido socioambiental, el cual se encuentra en obra realizando las funciones asignadas. En el informe de la entidad ejecutora se encuentra como soporte el acta de conformación del grupo socioambiental.

Indicador:
Número de profesionales contratados x100% 6 / 6 * 100 = 100%
Número total de profesionales propuestos

Número de capacitaciones Ejecutadas x100% 0 / 0 * 100 = 100 %
Número de Capacitaciones programadas

Número de requerimientos ambientales cumplidos x100% 0 / 0 * 100 = 0 %
Número de requerimientos ambientales generados

5.2 Capacitación ambiental al personal de obra.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la capacitación y educación ambiental del personal vinculado al proyecto**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 5 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza la jornada de capacitación mensual programada.				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.				

Fuente: Ecovias SAS

De igual manera se verificó el cumplimiento según el cronograma de capacitaciones desde el componente ambiental, que se realizaron las siguientes capacitaciones al personal:

Tabla 6 Capacitaciones realizadas UMV

COMPONENTE	TEMA	TIPO	FECHA
Ambiental	Protección de arbolado público, zonas verdes y sumideros. Manejo de flora y fauna silvestre	Capacitación	19/06/2025 Unión Tunales, 16/06//2025 Capitolio 25/06/2025 San Antonio Toldo
Ambiental	Uso correcto y responsable de las unidades sanitarias	Charla	19/06/2025 Capitolio 26/06/2025 San Antonio Toldo
Ambiental / Conductores	Proceso de cargue y descargue de RCD – proyecto Regalías Sumapaz"	Charla	12/06/2025 San Juan

Fuente: Cronograma de capacitaciones UAERMV.

La UAERMV se encargó de realizar la capacitación ambiental los días 12, 16, 19, 25 y 26 de junio de 2025 al personal, abarcando los temas mencionados en la tabla anterior y fueron dictadas por la profesional ambiental de la UAERMV, con el fin de generar conciencia a los trabajadores. Adicionalmente, el componente ambiental realiza diariamente recomendaciones relacionadas con la adecuada clasificación de residuos sólidos y el orden y aseo.

Ilustración 1 Capacitación Ambiental UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicador:

Número de capacitaciones Ejecutadas x 100% 4 / 2 * 100 = 200 %
Número de Capacitaciones programadas

Número de personas capacitadas x 100% 31 / 31 * 100 = 100 %
Número de personas laborando

5.3 Cumplimiento de los requerimientos legales

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA.** "Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental". Para este período no se gestionaron licencias y/o permisos ambientales para el proyecto.

Cabe resaltar que, para la ejecución de la obra de acuerdo al tipo de intervención a realizar, se contempla conservar el ancho de vía existente, lo cual indica que no se requiere de aprovechamiento forestal, por ende, no se hace necesario tramitar permiso de aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR.

En cuanto a los proveedores de materiales cuentan con los permisos y licencias ambientales vigentes aplicables para esta actividad al igual que los sitios destinados para la disposición final de materiales generados en obra.

De igual manera para la disposición final de residuos peligrosos RESPEL, se realiza con gestores autorizados que cuentan con los permisos ambientales respectivos para este tipo de disposición final. En el periodo no se realizó disposición al respecto.

Respecto al proveedor de unidades sanitarias móviles, cuenta con permisos de vertimientos de residuos líquidos conforme la legislación ambiental aplicable.

Se cuenta con los permisos de ocupación de cause para las actividades de obra que así lo requieren los cuales fueron tramitados por la UMV ante la autoridad ambiental competente CAR y se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, a continuación, se presenta una relación de los 26 permisos.

Tabla 7 Permisos de ocupación de cauce otorgados por la CAR

Ítem	Tramo - Eje	Resolución DJUR No.	No obra	X	Y	Tipo de estructura
1	6	DJUR No. 50217000407	9	69832.2633	36041.6394	Alcantarilla
2	7	DJUR No. 50207101514	1	89036.9370	53545.9021	Alcantarilla
3	7	DJUR No. 50207101619	5	89626.2609	54058.6332	Alcantarilla
4	7	DJUR No. 50207101516	4	893.950.076	539.639.805	Alcantarilla
5	7	DJUR No. 50207101593	7	90157.8506	54548.8398	Alcantarilla
6	7	DJUR No. 50207101511	11	89121.4578	53145.7027	Alcantarilla
7	7	DJUR No. 50207101472	12	88969.1424	53639.6127	Alcantarilla
8	7	DJUR No. 50207101513	13	90060,359	54353.3766	Alcantarilla
9	7	DJUR No. 50207101510	1	89146.9021	53294.6516	Box Culvert
10	8	DJUR No. 50207101805	3	88437.0723	49357.8023	Alcantarilla
11	9	DJUR No. 50207101708	1	73975.3255	39031.5353	Alcantarilla
12	9	DJUR No. 50217000280	2	73878.5675	39095.0290	Alcantarilla
13	9	DJUR No. 50217000382	3	73789.2318	39088.8337	Alcantarilla
14	9	DJUR No. 50217000346	4	73620.8499	39054.7930	Alcantarilla
15	9	DJUR No. 50217000300	14	72819.9388	39345.5892	Alcantarilla

Ítem	Tramo - Eje	Resolución DJUR No.	No obra	X	Y	Tipo de estructura
16	9	DJUR No. 50217000400	28	72110.4257	41229.3950	Alcantarilla
17	9	DJUR No. 50217000405	30	72215.5387	41396.2893	Alcantarilla
18	9	DJUR No. 50217000404	31	72320.0143	41389.3555	Alcantarilla
19	9	DJUR No. 50217000301	50	73217.5781	43664.2644	Alcantarilla
20	9	DJUR No. 50217000282	51	73088.1471	43736.1109	Alcantarilla
21	9	DJUR No. 50217000291	52	72863.0448	43836.3417	Alcantarilla
22	9	DJUR No. 50217000290	54	72576.6176	43942.3628	Alcantarilla
23	9	DJUR No. 50217000285	57	72342.2990	44308.9482	Alcantarilla
24	9	DJUR No. 50217000284	60	72007.3719	44556.6936	Alcantarilla
25	9	DJUR No. 50217000292	62	72130.0204	44757.7796	Alcantarilla
26	9	DJUR No. 50217000318	1	72475.2651	44264.1579	Box Culvert

Fuente: UMV

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 8 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con los permisos de ocupación de cauce vigentes				
Los proveedores de materiales cuentan con las licencias ambientales y títulos mineros respectivos vigentes				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los sitios de disposición final de RCD cuentan con los permisos ambientales respectivos vigentes				
El proveedor de unidades sanitarias móviles, cuenta con permisos de vertimientos de residuos líquidos conforme la legislación ambiental aplicable.				
En el periodo del presente informe se realizaron requerimientos por parte de la autoridad ambiental competente.				

Indicadores:

Número de Permisos obtenidos / *100% = 26/26 * 100 = 100%
Número de permisos requeridos

N° requerimientos cumplidos/ x 100% = 0 / 0 * 100 = 0%
Total de Requerimientos generados por la autoridad ambiental

N° de fuentes de materiales utilizadas para el proyecto /* 100 = 1 / 1 * 100 = 100%
N°de fuentes con permisos ambientales al día

5.4 Manejo Integral de materiales de construcción

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de materiales de construcción en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 9 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios delimitados				
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Todos los vehículos de transporte de materiales cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.				
Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos de los proveedores autorizados.				

Fuente: Ecovias SAS

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"*Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra*".

Todos los materiales provienen de fuentes legales, es decir, que cuentan con permisos ambientales y/o mineros, aspecto que es verificado por la interventoría.

Durante el período se realizaron las siguientes actividades:

- Cubrimiento de materiales pétreos en el frente de obra Tunales, Capitolio y San Antonio, con el fin de evitar la dispersión de materiales y aumento de la concentración de material particulado en el área de influencia directa. Al respecto cabe mencionar que no todos los acopios RCD y pétreos se encuentran cubiertos, señalizados y demarcados. Algunos cumplen parcialmente con las medidas descritas en las fichas PAC-2.1-04 y PAC-2.4-07.
- Se verifico que los vehículos para el transporte de estos materiales cuentan con los documentos vigentes y realizan el cubrimiento de la carga al transportarla para evitar dispersión de materiales en las vías.

- Se evidencia que se mantienen las puertas de descarga de materiales herméticamente cerradas durante el trasporte.
- Se sugiere a la UMV que no se almacenen materiales cerca de cuerpos de agua o zonas verdes, según se describen en las fichas de manejo ambiental y permisos de ocupación de cauce POC. En el periodo se solicito colocar contención para algunos acopios y evitar aporte de materiales a cauces o zonas verdes.
- En el periodo se envió comunicado 186-1-694 cuyo asunto fue observaciones al componente ambiental para todos los frentes, donde se describen las condiciones de los acopios y se solicita adecuarlos.
- En bitácora del componente se encuentran las anotaciones realizadas al respecto.

A continuación, se relacionan los proveedores de materiales en el periodo con las respectivas cantidades:

Tabla 10 Relación de Proveedores y cantidades UMV

CONSOLIDADO DE MATERIAL USADO EN OBRA						
ITEM	**RAZON SOCIAL**	**CATEGORIA**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25						
1	CANTERA MONTEOLIVOJULIA GOMEZ INVERSIONES Y EXPLOTACIONES MERKAKI SAS.	**Agregados petreos**	PE-BGB-SA-SGR BASE GRANULAR CLASE B (BG-B).	166	273,709	RESOLUCION DGEN No 20237000215 CAR de 30/03/2023. CONTRATO DE CONCESION MINERA EXP GKA-081 hasta 05/05/2039
2	UMV MISIONALIDAD	**Agregados petreos**	FRESADO	36,78	60,645	MATERIAL SUMINISTRADO PORLA ENTIDAD EJECUTORA A TRAVEZ DEL CONTRATO DE MISIONALIDAD
			MBR	344,86	568,622	
			BASE TIPO B	85,42	140,845	
			RAJON	22,3	36,769	
			RETAL DE CONCRETO	90,92	149,913	
TOTAL				**746,28**	**1230,50**	
may-25						
1	PARA EL PERIODO LA UMV NO HA CONSOLIDADO LAS CANTIDADES RAZON PORLA CUAL ESTE REPORTE SE REALIZARA MES VENCIDO.					

Fuente: Informe UMV

Nota: debido a que la entidad ejecutora UMV no ha realizado la consolidación de materiales empleados y no se cuenta con el certificado respectivo el reporte de estas cantidades se realizará mes vencido, de igual manera en el informe entregado de junio, no se encuentran cantidades de mayo, lo cual fue solicitado a la UMV.

Indicador:

N de proveedores que cumplan la normatividad / No. de proveedores empleados x100% 1 / 1 *100= 100 %

No. De requerimientos atendidos x100% 0 / 1*100 = 0 %
No requerimientos reportados por la interventoría

Volumen material certificado x100% 0 / 0 *100 = 0 %
Volumen material usado en el mes

Nota: No se cuenta con información suministrada por la UMV para el calculo de este indicador.

Ilustración 2 Manejo de materiales de Construction Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 3 Manejo de materiales de Construction Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 4 Manejo de materiales de Construction San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

5.5 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la implementación de señalización en los frentes de trabajo y en el campamento de obra**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 11 Verificación cumplimiento ficha de señalización UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con el respectivo PMT aprobado e implementado				
Los frentes de trabajo cuentan con la señalización preventiva, informativa y de emergencia correspondiente y en buen estado.				
Los elementos de atención de emergencia y control de derrame se encuentran señalizados				
Los acopios de materiales se encuentran señalizados				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con las vallas informativas en obra				

Fuente: Ecovias SAS

A la fecha por parte del contratista de obra se cuenta con la instalación de un campamento de obra adecuado, por lo que se ha implementado a la fecha la señalización preventiva, informativa y de emergencia necesaria; se contempla un plan de manejo de tránsito típico con un total de 8 señales por frente de obra.

Durante las jornadas de inspección y seguimiento realizadas en el mes de junio de 2025 por parte del componente Ambiental de la interventoría se pudo evidenciar la señalización que se mantiene instalada hasta la fecha y se tomó el respectivo registro fotográfico, el cual es presentado a continuación:

Ilustración 5 Señalización campamentos UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 6 Señalización emergencia en frente de obra UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- ✓ **PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**

La entidad ejecutora cuenta con la aprobación de los Planes de Manejo de Tránsito para la ejecución de las actividades de obra, de acuerdo con los seguimientos realizados, se evidenció que cuentan con señalización vertical móvil instalada en cada uno de los frentes activos la cual costa de 8 señales (señales de via cerrada a 200 mts y 100mts, banderero, 30, barricada y 2 auxiliares de tráfico) los auxiliares cuentan con los elementos necesarios en cuanto a dotación y EPP además radios de comunicación y chalecos reflectivos.

Ilustración 7 PMT implementado Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 8 PMT implementado Capitolio UMV




Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 9 PMT implementado San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Imagen 3 Plano de PMT aprobado UMV

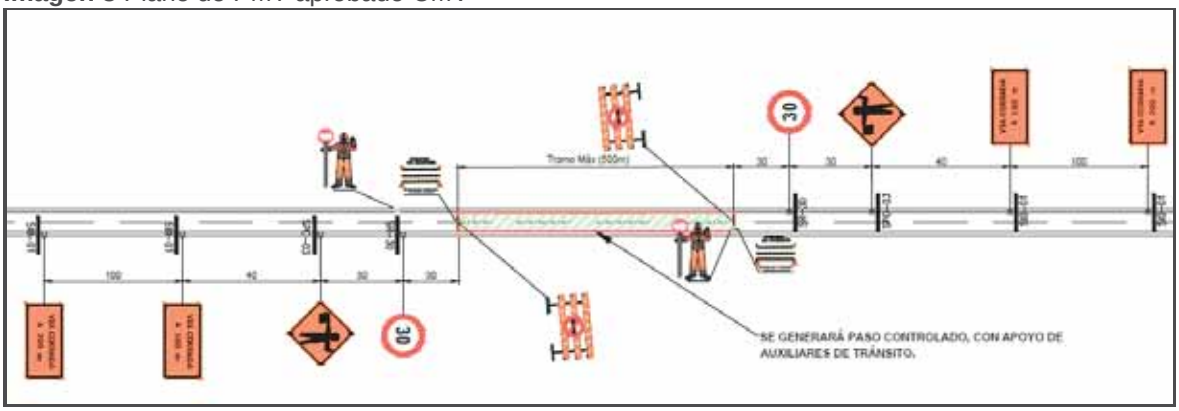

Fuente: Ecovias

Indicador:

No de Frentes de obra señalizados adecuadamente x100 = 3 / 3 * 100 = 100 %
No total de Frentes de obra

No de Señales instaladas x100% = 24 / 24 * 100 = 100 %
No de Señales requeridas en el PMT

5.6 Manejo y disposición final de escombros y RCD

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición de residuos de construcción y demolición RCD en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 12 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios RCD delimitados				
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los RCD se evacuan hacia sitio de disposición en el tiempo indicado en el PAGA				
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los sitios de disposición cuentan con permisos ambientales vigentes				
Se cuenta con todos los certificados disposición de residuos de construcción y demolición RCD				

Fuente: Ecovias SAS

A continuación, se hace una descripción del manejo y disposición final de los escombros realizado por la UAERMV y se presenta como soporte el registro fotográfico levantado en el mes de junio de 2025 por esta interventoría en las actividades de seguimiento de los diferentes componentes.

Para la disposición de RCD se emplea un sitio de disposición final que cuenta con los debidos permisos ambientales vigentes, quien emite el certificado respectivo por las cantidades gestionadas en este sitio. La UAERMV lleva un registro de las cantidades generadas y dispuestas en el periodo, sin embargo, este consolidado no fue presentado en la primera versión entregada a la interventoría por lo cual se procedió a realizar dicha solicitud. Al respecto es importante mencionar que se cuenta con el certificado de disposición de RCD del mes de abril, mayo y junio no han sido presentados.

Para el periodo del presente informe el contratista de obra continuó la remoción del material de excavación proveniente de los sitios de intervención, mediante excavadoras, transportando el material retirado hasta los acopios temporales y posteriormente al sitio de disposición final. Durante la verificación realizada por la interventoría se evidencia que los vehículos empleados para el transporte son los aprobados, cuentan con los documentos vigentes completos y durante el procedimiento de transporte al salir del frente de obra cubren los volcos de las volquetas para evitar la dispersión de los materiales transportados y posibles regueros en las vías circundantes. Al respecto se realizaron observaciones al componente ambiental para realizar seguimiento al cumplimiento de esta medida. De igual manera se solicitó mejorar los

acopios en cuanto a cubrimiento, señalización y delimitación, además de solicitar retiro de materiales hacia sitio de disposición final de lo cual se tiene evidencia mediante comités de obra desarrollados y anotaciones en bitácora del componente ambiental. De igual manera se solicitó en comités de obra el retiro hacia sitio de disposición final autorizado los RCD acopiados en los frentes de obra y que superan el tiempo máximo permitido.

En cumplimiento de la Resolución 1257 de 2021, la entidad ejecutora remitió los soportes (certificados) de disposición final de RCD; el residuo producto de la excavación es entregado a la empresa máquinas amarillas identificado con NIT 900.459.311-1, la cual cuenta con autorización ambiental; durante el período se realizó disposición de material al sitio autorizado, en un volumen de 490 m3 que fueron llevados al lugar de disposición final. El número de PIN asignado para la obra es 22183.

A continuación, se presenta la relación de material dispuesto en el periodo.

Tabla 13. Relación de material RCD evacuado UMV

CONSOLIDADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION					
ITEM	**SITIO DE DISPOSICION**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	Excavacion	168	227,18	Resolución número 1480 de 2014 ANLA
2	GENERADO EN EL PERIODO	Excavacion	350	577,098	Pendiente por evacuar. 350-168= 182 m3
may-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	Excavacion	406	669,433	Resolución número 1480 de 2014 ANLA
2	GENERADO EN EL PERIODO	Excavacion	706,44	1164,814	Pendiente por evacuar. 706-406= 300 m3
TOTAL			706,44	1164,814	
jun-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	Excavacion	490	807,937	Resolución número 1480 de 2014 ANLA
2	GENERADO EN EL PERIODO	Excavacion	No se cuenta con informacion		
TOTAL			490	807,937	
Nota: El valor en toneladas que se relaciona es el que aparece en el certificado de el sitio de disposicion final y el otro se toma del cuadro de conversion de la SDA					
	PENDIENTE POR CERTIFICADO				

Fuente: Ecovias SAS /Informe UMV

NOTA: de acuerdo a la tabla anterior en el periodo se dispusieron 490 m3 en máquinas amarillas, quedando el restante almacenado en obra en los acopios temporales.

Indicador:

$$\%\ Disposicion\ de\ RCD = \frac{\text{M3 } de\ RCD\ dispuestos\ durante\ el\ periodo \times 100}{\text{M3 } de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo}$$

$$\frac{490}{} \times 100\% = 0\%$$

$$\%\ Disposición\ de\ RCD = \frac{\text{M3 } de\ RCD \text{ aprovechado } el\ periodo \times 100}{\text{M3 } de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo}$$

$$\times 100\% = 0\%$$

Requerimientos respondidos/ *100 = 0 / 0 * 100 = 0 %
requerimientos emitidos por autoridades, Interventoría y entidad contratante)

NOTA: Con respecto al calculo de los indicadores es necesario mencionar que no se cuenta con la cantidad total de material RCD generado en el periodo por la UMV, razón por la cual no se logra realizar el calculo de los mismos.

Ilustración 10 Acopios de RCD San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 11 Acopios de RCD Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 12 Acopios de RCD Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

5.7 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición final de residuos sólidos, convencionales, especiales y peligrosos**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que se cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 14 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con puntos ecológicos en sitio y en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO no aprovechables.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO aprovechables.				
Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición final de los RESPEL gestionados en el presente mes.				

Fuente: Ecovias

Desde la interventoría se realiza un seguimiento específico a la gestión ambiental realizada por parte de la entidad ejecutora de obra, abarcando de esta manera el manejo de residuos sólidos no aprovechables, aprovechables y de residuos peligrosos durante el periodo que correspondiente a cada uno de los informes mensuales.

Es importante mencionar que durante el presente periodo por parte de la interventoría se realiza una revisión y/o seguimiento de la generación de residuos (aprovechables, no aprovechables, peligrosos) a través de la verificación del formato de registro diligenciado por la entidad ejecutora y de la jornada de inspección y seguimiento ejecutada en el mes de junio de 2025.

- **Residuos sólidos Convencionales**

Durante el periodo del presente informe por parte de la entidad ejecutora de obra se informa que se generaron residuos ordinarios ya que se cuenta a la fecha con tres campamentos de obra, los cuales fueron dispuestos y recolectados por el prestador de servicio de aseo de la localidad del Sumapaz (Empresa de Servicios Públicos PROMOAMBIENTAL – E.S.P), servicio de recolección prestado los días miércoles.

Por parte de Interventoría, con el fin de realizar un seguimiento a la generación de residuos se solicitó a la entidad ejecutora la planilla de generación de residuos en el presente mes el cual se encuentra adjunto en el informe respectivo.

- ✓ **Puntos Ecológicos**

Durante los recorridos del presente mes realizados por parte de Interventoría se identificó que los puntos ecológicos instalados en los campamentos se encontraran en condiciones adecuadas, como se puede evidenciar a continuación:

Ilustración 13 Puntos ecológicos San Antonio / Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- **Residuos peligrosos**

Durante el periodo del presente informe se generaron Residuos Peligrosos - RESPEL los cuales fueron almacenados temporalmente para su disposición final. Se presenta la planilla de generación de residuos peligrosos**,** diligenciada por el contratista de obra donde reporta la cantidad de residuos peligrosos generados en el mes de junio de 2025.

Es importante mencionar que las empresas encargadas de realizar la gestión de los Residuos Peligrosos generados en el frente de trabajo cuentan con los documentos ambientales vigentes, para el periodo la UMV no entrego ningún volumen para certificar.

- ✓ **Centro de acopio temporal de residuos peligrosos - respel**

Durante las jornadas de inspección se verificó la instalación y mantenimiento del centro de acopio temporal de Residuos Peligrosos y combustibles y de la zona en la que se establecieron estibas plásticas y las canecas para abastecimiento de combustible los cuales se encontraban

en buenas condiciones, en sitio se verifico la permanencia de las hojas de seguridad de los productos químicos y los rótulos según el SGA.

A continuación, se presenta el registro fotográfico del centro de acopio temporal de Residuos Peligrosos – RESPEL / combustibles.

Ilustración 14 Centro de acopio temporal de Respel San Antonio/ Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- **Reporte de Residuos Generados**

En la siguiente tabla a modo de seguimiento se presenta el tipo y la cantidad de residuos generados por la UAERMV de obra durante el mes de junio de 2025. El reporte de los residuos generados es reportado y verificado durante este mes específicamente a través de las planillas de generación de residuos diligenciadas a manera de control por parte de la entidad ejecutora.

Tabla 15 Reporte de residuos generados UMV

CONSOLIDADO RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS					
PERIODO Mes/Año	**Tipo Residuo/ Cantidad / Unidad de medida**				
	Aprovechables (kg)	**No Aprovechables (Kg)**	**Orgánicos (kg)**	**RESPEL (Kg)**	**TOTAL**
Abril/2025	48	53,3	0	17	118,33
Mayo/2025	45,5	59,9	0	12,3	117,7
Junio/2025	34,3	55,5	0	6,40	96.2
TOTAL	**127,8**	**168,7**	**0**	**37,5**	**332,23**

*Como residuos peligrosos en esta tabla se presenta la cantidad de elementos contaminados por RESPEL

Fuente: Ecovias

Con respecto a los respel durante el periodo se generaron 6,40 Kg de recipientes contaminados, los cuales también se mantienen almacenados hasta que se cuente con una cantidad suficiente para su recolección.

Volumen de residuos aprovechables x 100 = 34,3 / 96,2 * 100 =35,65 %
Volumen total de residuos generados

Volumen de residuos No aprovechables x 100 = 55,5 / 96,2 * 100 =57,69 %
Volumen total de residuos generados

Volumen de residuos peligrosos certificados x 100% = 6,40/ 96,2 * 100 = 6,65 %
Volumen total de residuos peligrosos generados

5.8 Manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales

Durante el periodo de ejecución de actividades, no se realizaron actividades de obra que afecten taludes.

Indicador:

N.º de derrumbes presentados para el periodo / x100% = 0 / 0 * 100 = 0%
Total, de derrumbes que requieren intervención.

5.9 Control de emisiones atmosféricas

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el control de emisiones atmosféricas. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 16 Cumplimiento general medida de manejo UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Los vehículos respetan los límites de velocidad para la circulación en los frentes de obra				
Para el presente mes se realizó humectación de via, se presenta la certificación del agua suministrada por proveedor autorizado,				

Durante el periodo la interventoría procedió a realizar seguimiento al cubrimiento de materiales pétreos empleados en los frentes de obra, con el fin de evitar al aumento de material particulado en el área de influencia de la obra. Para el control/prevención de dispersión de material particulado, para el periodo no se realizó humectaciones en diferentes tramos de las vías, debido a las constantes precipitaciones registradas en la zona, lo que ha contribuido a la disminución del material particulado generado por el tránsito de vehículos aledaños.

Igualmente, se verifica que los puntos de acopio de materiales pétreos se mantengan separados, cubiertos con plásticos, debidamente demarcados y señalizados, cumpliendo con lo establecido en la ficha PAC 2.1.04, con el propósito de prevenir afectaciones a los ecosistemas cercanos y a la población flotante del sector. Cabe mencionar al respecto que se solicitó adecuación de acopios con el fin de que permanezcan cubiertos.

La interventoría sugiere a la UAERMV que cuando circulen vehículos por las áreas de influencia indirecta de construcción, se deberá realizar a velocidades moderadas para que no se levanten en exceso partículas de polvo, de igual manera realizar los mantenimientos periódicos requeridos del equipo empleado en obra.

Se verifico que los vehículos cuentan con los certificados de revisión técnico mecánica vigente. Se evidencio que los vehículos destinados al transporte de materiales cuentan con carpas con el fin de evitar emisión de partículas por acción del viento, al respecto se realizó observación en el frente de obra capitolio debido a que se evidencio vehículos cargados sin la correcta implementación de la carpa. Es importante mencionar que no todos los acopios se encuentran cubiertos, lo cual fue comunicado a la entidad ejecutora quien genero acciones para subsanar

dichas observaciones en todos los frentes de obra, realizando jordanas de mantenimiento de acopios de manera semanal.

De igual manera se implementan las acciones respectivas en cuanto al manejo ambiental del ruido.

Indicador:

No de frentes humectados x100% = 2 / 3 * 100 = 66,7 %
No de frentes de obra

Volumen de agua utilizada al mes para humectación de vía = 0 M3
Volumen de agua utilizada al mes para actividades constructivas = 20 M3

N acopio de material adecuadamente cubiertos / x 100% = 16 / 22 * 100 = 72,72%
Total de puntos de acopio de material

Ilustración 15 cubrimiento de materiales Capitolio / Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

5.10 Manejo de aguas superficiales

De acuerdo al desarrollo de las obras fue necesario tramitar ante la autoridad ambiental los permisos de ocupación de cauce que se relacionan a continuación, los cuales fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2025 como último plazo otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante **AUTO DRBC No. 01256000051 de 6**

FEB. 2025 y según lo estipulado en la misma Resolución, no se contemplan nuevas ampliaciones.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de aguas superficiales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que la entidad ejecutora de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 17 Cumplimiento general medida de manejo UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención.				
Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.				
Se cuenta en obra con punto de lavado de manos.				
Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra por parte de proveedor autorizado.				

Fuente: Ecovias SAS

Durante el período no se generaron afectaciones por actividades constructivas a los cuerpos de agua presentes en la zona de influencia del proyecto.

En los recorridos realizados por Interventoría, se evidenció que el lavado de manos se realiza en la zona de baños portátiles donde se encuentra gel antibacterial en cada una de las unidades sanitarias.

En el seguimiento realizado por la interventoría en el periodo a la UAERMV se evidencio el cumplimiento de las medidas de manejo indicadas en la ficha como es, disposición final adecuada de RCD en sitios autorizados, acopio temporal de los mismos cumpliendo con las distancias establecidas en el PAGA para cuerpos de agua, quebradas,etc., sin embargo, debido a las condiciones particulares del área de intervención (zona rural de paramo) no es posible cumplir estrictamente con la distancia mínima de 30 metros establecida por la normatividad ambiental vigente. Por lo tanto, se han implementado medidas de manejo y control para minimizar el riesgo de afectación a las fuentes hídricas como es el aislamiento de las alcantarillas por medo de polisombra, contención con polisombra en acopios para evitar

caída de material en los cauces, respecto al lavado y mantenimiento de equipos se realiza en lugares adecuados para tal fin.

Por otro lado, durante el mes de junio, se ha realizado la limpieza de algunas alcantarillas y limpieza de la zona del cauce de la quebrada en el tramo capitolio, de parte de interventoría se ha solicitado manejo de aguas para evitar el aporte de sedimentos y materiales pétreos que por escorrentía son arrastrados hacia las alcantarillas con el fin de prevenir la colmatación de las mismas. Se evidencia polisombras desgastadas las cuales se solicitó realizar ajustes y cambios, actividad que ha iniciado la entidad ejecutora.

Ilustración 16 manejo aguas superficiales Tunales/Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicador:

No de requerimientos cumplidos / x 100% = 0 / 0 * 100 = 0 %
No de requerimientos establecidos por la interventoría

N de monitoreos ejecutados x100% = 0 / 0 * 100 = 0 %
N monitoreos programados

5.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que la entidad ejecutora cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 18 Cumplimiento general medida de manejo UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.				
Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.				
Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.				
Se realizan los mantenimientos de manera semanal los requeridos				
Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.				

Fuente: Ecovias

Como parte del cumplimiento a la Resolución 2400 de 1979, se tiene instalado en cada frente de obra unidades sanitarias portátiles (USP) para uso del personal en campo, distribuidas por género, al respecto la UMV cumple con la distribución de estas USP en cantidad por frente, se evidencia realización de mantenimientos una vez por semana, es necesario mencionar que en el periodo por condiciones de la via en el tramo san Antonio en una oportunidad no fue posible acceder el camión para la limpieza respectiva. Se solicito a la entidad el cumplimiento con la frecuencia de mantenimientos descritos en el artículo 17 de la resolución 2400 de 1979, el cual establece que debe realizarse dos veces por semana.

Se realizó una revisión de las unidades sanitarias ubicadas en los campamentos de obra a continuación se menciona lo encontrado durante estas inspecciones.

El contratista cuenta con unidades sanitarias portátiles (Baño Flushing) en el campamento de obra.

Las unidades sanitarias son del proveedor Bamocol. Por parte de la interventoría se solicitó la documentación de la empresa proveedora y dicha documentación fue entregada en el informe de mayo de 2025.

La entidad ejecutora cuenta con 8 unidades sanitarias, distribuidas de la siguiente forma:

- 2 baños en el frente de obra tunales

- 2 baños en el frente de obra San Antonio – Toldo
- 2 baños en el frente de obra San Antonio
- 2 baños en el frente de obra Capitolio

Por parte de Interventoría a modo de seguimiento y control para la disposición final de los lodos generados en el campamento de obra se realiza la verificación del certificado entregado por la empresa Bamocol a la UMV, en el que se soporte que se realizó la disposición final a cada una de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP instaladas a la fecha en el frente de trabajo. En cuanto a este certificado aún no ha sido aportado por parte de la UMV, para el periodo se adjunta el correo soporte donde se solicita el certificado respectivo.

Al respecto en las jornadas de verificación se identificó que en el periodo el proveedor realizó mantenimiento a dichas unidades sanitarias de manera semanal.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las unidades sanitarias portátiles instaladas en obra.

Ilustración 17 Unidades Sanitarias Capitolio / San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 18 Unidades Sanitarias Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- ✓ **KIT DE CONTROL DE DERRAMES**

Durante la jornada de inspección ejecutada en junio de 2025 se realizó la verificación al kit de derrames presente en el frente de trabajo específicamente en el sitio de acopio temporal de RESPEL ubicado en las carpas móviles de Capitolio, San Antonio y Unión Tunales, evidenciando que este se encuentra en sitio y en condiciones adecuadas.

Ilustración 19 Kit atención derrames San Antonio / Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicador:

N total de baños reportados en obra x100% 8 / 7 * 100 = 114 %

N de Baños requeridos

Volumen de la disposición de los lodos de los baños portátiles certificados = No se cuenta con información, puesto que la UMV no ha presentado soporte

N° de mantenimientos realizados x 100% 2 / 4 * 100 = 50 %
N° de mantenimientos programados

5.12 Protección de ecosistemas sensibles

Según la caracterización ambiental del área del proyecto no se ve afectado ningún ecosistema sensible, sin embargo, por su cercanía a la zona del páramo de Sumapaz y el paso por áreas consideradas sensibles como son cuerpos de agua, se realizan actividades que conlleven a la minimización, control y mitigación de posibles impactos por las actividades del proyecto, lo cual es verificado por la interventoría. En las inducciones al personal se socializa que se encuentra prohibido que los trabajadores extraigan de estos ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales.

Indicador:
No. áreas sensibles protegidas x100% 0 / 0 * 100 = 0 %
No total de áreas sensibles identificadas

5.13 Protección de fauna en obra

Una de las medidas de manejo implementadas por la UAERMV para este componente es la sensibilización a los trabajadores lo cual se realiza inicialmente en el proceso de inducción y capacitaciones programadas de manera periódica. De igual manera se implementa en obra para conductores de vehículos respetar los límites de velocidad para disminuir el riesgo de atropellamiento de fauna silvestre. Se socializa que está completamente prohibido la caza o comercialización de especies.

Para el periodo se procedió a realizar la siguiente capacitación con el personal, Manejo de flora y fauna silvestre en el área de influencia del proyecto.

Indicador:

N° de capacitaciones programadas x 100% 1 / 1 * 100 = 100 %
N° Capacitaciones ejecutadas

5.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para las actividades de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de instalaciones temporales y sitios de acopio. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que la entidad ejecutora de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 19 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio UMV


CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.				
Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal, ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).			8 baños	
El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias.				
El campamento cuenta con punto ecológico.				
El campamento se encuentra en condiciones adecuadas de aseo y orden.				
El campamento cuenta con señalización respectiva				

La entidad ejecutora en obra cuenta con un campamento de obra en cada uno de los frentes de trabajo (Unión-tunales, Capitolio, San Antonio Toldo y San Antonio) el cual consta de una carpa móvil en la zona cercana a las áreas de intervención, adecuados con los elementos necesarios para la atención de emergencias y elementos para los trabajadores. Durante las jornadas de seguimiento e inspección realizadas por la interventoría en el mes de junio de

2025, se realizó una verificación de los aspectos del área ambiental en cada uno de los campamentos.


Es importante mencionar que durante el recorrido por los campamentos se pudo evidenciar que cuenta con: punto ecológico, kit de emergencia, kit de derrames, unidades sanitarias en buenas condiciones y en sitio, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico.

Ilustración 20 Campamentos Tunales UMV

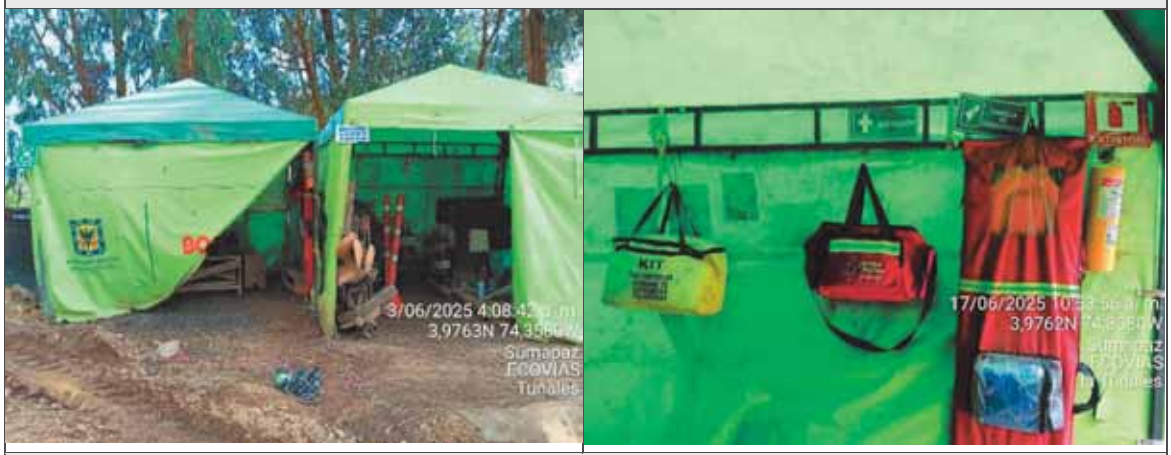

Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 21 Campamentos Capitolio UMV

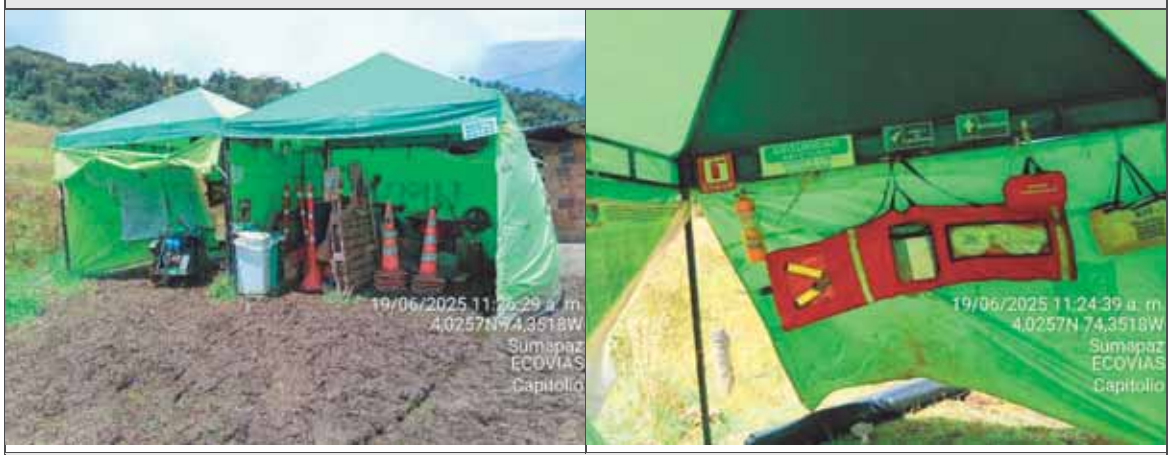

Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 22 Campamentos San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

De acuerdo a las inspecciones de campo, se tienen instalados tres campamentos temporales móviles tipo carpa, los cuales de acuerdo a las necesidades y avances de actividades constructivas van cambiando de ubicación. A continuación, se presenta una relación de los campamentos y acopios por frente de obra.

Tabla 20 Ubicación de acopios Tunales

ACOPIOS UNION TUNALES						
ITEM	TIPO DE MATERIAL	ABSCISA	REQUIERE PERMISO		NOMBRE DEL PROPIETARIO	ESTADO
			SI	NO		
1	Pétreos	K2+623	x		Arnidia Runza	Activo
2	RCD	K2+623	x		Arnidia Runza	Activo
3	Pétreos	K0+470	x		Yesid Susa	Activo
4	Pétreos	K0+760	x		Pablo Melo	Activo
5	Pétreos	K1+615	x		JAC	Activo
6	Pétreos	K0+470		x	Via	Activo
7	RCD	K0+590	x		Abiesnei Pineda	Activo
8	Pétreos	K1+130	x		Evangelino Mora	Activo
9	Pétreos	La Unión	x		Milena Susa	Activo

Fuente: Ecovias / Informe UMV

Tabla 21 Ubicación acopios San Antonio-Toldo

ACOPIOS SAN ANTONIO TOLDO						
ITEM	TIPO DE MATERIAL	ABSCISA	REQUIERE PERMISO		NOMBRE DEL PROPIETARIO	ESTADO
			SI	NO		
1	RCD	k0+690	x		Audel Tautiva	Activo
2	Pétreos	k2+620	x		Albino Torres	Activo
3	Pétreos-Campamento	k3+100	x		Luis Bustos	Activo
4	Pétreos	k3+890	x		Luis Bustos	Activo
5	Pétreos	k4+200	x		Nidia Hernández	Activo
6	RCD	K 0+280		x	Via	Activo
7	RCD y pétreo	K 0+700		x	Via	Activo
8	Pétreos	K 1+060		x	Via	Activo
9	RCD y pétreo	K 1+270		x	Via	Activo
10	RCD y pétreo	K 1+350		x	Via	Activo
11	RCD	K 1+370		x	Via	Activo
12	RCD y pétreo	K 1+700		x	Via	Activo
13	RCD	K 2+290		x	Via	Activo
14	RCD	K 2+400		x	Via	Activo
15	RCD	K 2+600		x	Via	Activo
16	RCD y pétreo	K 2+700		x	Via	Activo
17	RCD	K 2+800		x	Via	Activo
18	RCD	K 2+850		x	Via	Activo
19	RCD	K 2+900		x	Via	Activo
20	RCD y pétreo	K 3+100		x	Via	Activo
21	RCD	K 3+120		x	Via	Activo
22	RCD	K 3+220		x	Via	Activo
23	RCD	K 5+240		x	Via	Activo
24	Pétreos	K 6+910		x	Via	Activo
25	RCD	K 9+100		x	Via	Activo

Fuente: Ecovias / Informe UMV

Tabla 22 Ubicación acopios Capitolio

ACOPIOS CAPITOLIO						
ITEM	TIPO DE MATERIAL	ABSCISA	REQUIERE PERMISO		NOMBRE DEL PROPIETARIO	ESTADO
			SI	NO		
1	Pétreos	k1+525	x		Emiro Poveda	Activo
2	Pétreos	k2+150	x		Jhon Peñaloza	Activo
3	Pétreos	k3+420	x		Gustavo Castaño	Activo
4	Campamento	k3+310	x		Adelmo Mora	Activo
5	RCD	k3+450	x		Gustavo Castaño	Activo
6	Pétreos	k3+610	x		Sadi Melo	Activo

Fuente: Ecovias / Informe UMV

Indicadores:

No. Campamentos manejados x 100% 3 / 3 * 100 =100 %
No. Campamentos establecidos

No actividades ejecutadas x 100% 5 / 5 * 100 =100 %
No de actividades programadas

No de requerimientos atendidos x 100% 0 / 0 * 100 =0 %
No total de requerimientos realizados por la interventoría

5.15 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo

Dentro de la revisión que realiza el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 23 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con Plan de Manejo de Tránsito.				
Cuenta con el diligenciamiento de las fichas pre – operacionales de cada uno de los equipos.				
Cuenta con Stiker de identificación				
Se cuenta con certificado de revisión tecnicomecanica de los vehículos según aplique.				
No se evidencia lavado de vehículos en cuerpos de agua.				

Fuente: Ecovias

Dentro del informe de seguridad y salud en el trabajo se encuentran los soportes de los preoperacionales de los equipos empleados y activos en campo.

✓ RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Durante el presente periodo por parte del componente ambiental de la interventoría se hace la respectiva revisión de algunos de los preoperacionales de los vehículos y maquinaria presentes en obra.

Para el periodo de junio se evidenciaron dos (2) derrames por parte de los contratistas de la maquinaria generalmente por el uso inadecuado del combustible para el abastecimiento de la maquinaria en el frente Capitolio y San Antonio, lo cual fue informado a la profesional ambiental de la UMV con el fin de tomar las medidas correctivas necesarias, en cada uno de los tramos intervenidos se cuenta con áreas para el almacenamiento temporal de combustibles, canecas rotuladas, hojas de seguridad de los productos químicos y estibas plásticas. Para el periodo se solicitó adecuación del punto de almacenamiento de los frentes de obra. De igual manera en el periodo se remitió oficio 186-1-694 cuyo asunto fue llamado de atención con respecto al contratista de maquinaria para que implemente las medidas requeridas en cuanto al procedimiento de tanqueo de equipos en obra y evitar derrames de combustibles.

Se identificó que, en el presente periodo, la entidad ejecutora cuenta con los equipos presentes en campo los cuales se listan a continuación:

Tabla 24 Relación de vehículos UMV

EQUIPO	MARCA	PLACA	MODELO	PIN	VENCIMIENTO TECNICOMECANICA
VEHICULOS					
CAMIONETA	FORD	JOU555	2020	N/A	13/05/2025
CAMIONETA	RENAULT	LUM416	2023	N/A	22/02/2026
CAMIONETA	RENAULT	KRL939	2024	N/A	N/A
CAMIONETA	MITSUBISHI	OKZ958	2018	N/A	15/11/2025
CAMIONETA	JAC	VAK540	2023	N/A	29/10/2025
CARROTANQUE	CHEVROLET	JTR530	2018	N/A	28/10/2025
CARROTANQUE	CHEVROLET	XCV275	2018	N/A	13/11/2025
VOLQUETA SENCILLA	FOTON	EQP440	2019	N/A	15/11/2025
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	LIS842	2023	22230	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	LIS843	2023	22229	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	LIS844	2023	22228	N/A

EQUIPO	MARCA	PLACA	MODELO	PIN	VENCIMIENTO TECNICOMECANICA
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	LIS845	2023	22227	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	LIS846	2023	22226	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	JQV208	2022	22222	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	JQV209	2022	22223	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	JQV210	2022	22224	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	JQV211	2022	22225	N/A

Fuente: Ecovias SAS

Tabla 25 Relación de maquinaria UMV

MAQUINARIA		
No.	**EQUIPO**	**MARCA/REFERENCIA**
UNION TUNALES		
1	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR
2	VIBROCOMPACTADOR 8 TON	INGERSOL RAND
3	RETROCARGADOR	JHON DEERE
4	MINICARGADOR (CON MARTILLO)	BOB CAT
5	CARROTANQUE AGUA	JBC
CAPITOLIO		
1	MOTONIVELADORA	RHINO
2	VIBROCOMPACTADOR 4 TON	HAMM
3	VIBROCOMPACTADOR 8 TON	DYNAPAC
4	RETROCARGADOR	TEREX
5	MINICARGADOR	MACTRACK
6	CARROTANQUE	CHEVROLET
7	VOLQUETA SENCILLA	FOTON
SAN ANTONIO TOLDO		
1	MOTONIVELADORA ARTICULADA	CATERPILLAR
2	VIBROCOMPACTADOR 8 TON	CATERPILLAR
3	VIBROCOMPACTADOR	AMMANN
4	RETROCARGADOR	CATERPILLAR
5	RETROEXCAVADORA	LONKING
6	MINICARGADOR	BOBCAT
7	MINICARGADOR	BOBCAT
8	VOLQUETA SENCILLA	FOTON

Fuente: Informe UAERMV

A continuación, se presenta un registro fotográfico de los equipos empleados:

Ilustración 23 Equipos en obra Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 24 Equipos en obra Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 25 Equipos en obra San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- ✓ **MANTENIMIENTO**

Se realiza seguimiento y verificación del mantenimiento de vehículos, equipos o maquinaria mediante la revisión de los certificados correspondientes a las actividades realizadas durante el mes de junio; estos certificados según informa la entidad ejecutora UMV serán adjuntados en el informe del próximo mes (julio 2025), dado que la información debe ser consolidada con base en las reparaciones efectuadas durante junio de 2025. Al respecto la UMV adjunta soporte de correo remitido al contratista de maquinaria donde se solicitan los certificados de los mantenimientos realizados.

Indicadores:

No de vehículos con revisión técnico-mecánica/ *100% 6 / 12 * 100 =50 %
No de vehículos utilizados en el proyecto

Nota: *Actualmente solo 3 vehículos cuentan con la revisión de la técnica mecánica; los otros 9 vehículos restantes son modelo 2022 y 2023 por lo tanto todavía no aplica.*

N de derrames atendidos *100% 2 / 2 * 100 =100 %
N de derrames presentados

5.16 Manejo del descapote y cobertura vegetal.

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"Manejo de vegetación, no aplica para el contrato"

Para el presente período, no se realizaron actividades de remoción de cobertura vegetal, descapote, ni aprovechamiento forestal. Cabe mencionar que para el contrato no se cuenta con ningún tipo de permiso para realizar aprovechamiento forestal.

5.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural.

Durante el período no se realizaron hallazgos de elementos arqueológicos que se tuvieran que reportar ante el ICANH. A la fecha en el área de influencia del contratista de obra, no se presenta ningún hallazgo arqueológico fortuito, por lo que no se ha hecho necesario implementar esta medida de manejo ambiental. En el momento en el que se genere un hallazgo se reportará en el informe respectivo tanto de obra como de interventoría y se hará el seguimiento correspondiente.

6. CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL CTO. 479 DE 2022.

Durante el período, se realizó el seguimiento a las siguientes actividades.

6.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental.

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 26 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con el grupo de gestión socioambiental conformado.				
El personal socioambiental se encuentra en el lugar donde se desarrollan las actividades de obra.				

Fuente: Ecovias SAS

La interventoría realizó aval del documento PAGA, el cual se encuentra aprobado mediante oficio 186-1-679. A continuación, se presenta la conformación del grupo de gestión Socioambiental (véase tabla No27).

Tabla 27 Conformación del grupo socioambiental CEV

NOMBRE	CARGO
Hernando Laverde Manjarres	Director de obra
Alejandra Limas Plazas	Residente social
Lorena Andrea Gómez Ramirez	Profesional ambiental
Gloria Sepúlveda	Profesional en seguridad y salud en el trabajo

Fuente: Consorcio Estabilización Vial

De acuerdo con la anterior tabla se evidencia que el contratista cumple con el personal requerido socioambiental, el cual se encuentra en obra realizando las funciones asignadas.

Indicador:
Número de profesionales contratados x100% 4 / 4 * 100 = 100%
Número total de profesionales propuestos

Número de capacitaciones Ejecutadas x100% 1 / 1 * 100 = 100 %
Número de Capacitaciones programadas

Número de requerimientos ambientales cumplidos x100 1 / 1 * 100 = 100 %
Número de requerimientos ambientales generados

6.2 Capacitación ambiental al personal de obra.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la capacitación y educación ambiental del personal vinculado al proyecto**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 28 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza la jornada de capacitación mensual programada.				
Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.				

Fuente: Ecovias SAS

De igual manera se verificó el cumplimiento según el cronograma de capacitaciones desde el componente ambiental, que se realizaron las siguientes capacitaciones al personal:

Tabla 29 Capacitaciones realizadas CEV

COMPONENTE	TEMA	TIPO	FECHA
Ambiental	Manejo Ambiental de Campamentos fijos y/o Temporales y centros de acopio.	Capacitación	12/06/2025 Tunales San Antonio Toldo
Ambiental	Manejo RESPEL	Capacitación	17/06/2025 Unión oficina principal 19/06/2025 San Antonio Toldo
Ambiental	Conservación de fauna y flora	Capacitación	19/06/2025 Tunales San Antonio Toldo
Ambiental	Manejo de Recursos Naturales	Capacitación	20/06/2025 San Antonio Toldo
Ambiental	Manejo de residuos sólidos y clasificación adecuada en punto ecológico	Capacitación	20/06/2025 Tunales
Ambiental	Socialización de PMT	Charla	25/06/2025 San Antonio Toldo
Ambiental	Inducción medio ambiente	Inducción	05/06/2026 18/06/2025
Ambiental	Funciones de la Brigada BOAL	Inducción	05/06/2025 Tunales San Antonio Toldo

Fuente: Cronograma de capacitaciones Estabilización.

El Contratista se encargó de realizar la capacitación ambiental los días 12, 19, 21 y 28 de junio de 2025 al personal, abarcando los temas mencionados en la tabla anterior y fueron dictadas por la profesional Ambiental y SST del Consorcio Estabilización vial, con el fin de generar conciencia a los trabajadores.

Ilustración 26 Capacitación Ambiental CEV



Fuente: Componente Ambiental CEV

Indicador:

Número de capacitaciones Ejecutadas x100% 6 / 6 * 100 = 100 %
Número de Capacitaciones programadas

Número de personas capacitadas x 100% 23 / 23 * 100 = 100 %
Número de personas laborando

6.3 Cumplimiento de los requerimientos legales

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA.** "Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental". Para este período no se gestionaron licencias y/o permisos ambientales para el proyecto.

Cabe resaltar que, para la ejecución de la obra de acuerdo al tipo de intervención a realizar, se contempla conservar el ancho de vía existente, lo cual indica que no se requiere de aprovechamiento forestal, por ende, no se hace necesario tramitar permiso de aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR.

En cuanto a los proveedores de materiales cuentan con los permisos y licencias ambientales vigentes aplicables para esta actividad al igual que los sitios destinados para la disposición final de materiales generados en obra.

De igual manera para la disposición final de residuos peligrosos RESPEL, se realiza con gestores autorizados que cuentan con los permisos ambientales respectivos para este tipo de disposición final. En el periodo no se realizó disposición al respecto.

Respecto al proveedor de unidades sanitarias móviles, cuenta con permisos de vertimientos de residuos líquidos conforme la legislación ambiental aplicable.

Se cuenta con los permisos de ocupación de cause para las actividades de obra que así lo requieren los cuales fueron tramitados ante la autoridad ambiental competente CAR y se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 30 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con los permisos de ocupación de cauce vigentes				
Los proveedores de materiales cuentan con las licencias ambientales y títulos mineros respectivos vigentes				
Los sitios de disposición final de RCD cuentan con los permisos ambientales respectivos vigentes				
El proveedor de unidades sanitarias móviles, cuenta con permisos de vertimientos de residuos líquidos conforme la legislación ambiental aplicable.				
En el periodo del presente informe se realizaron requerimientos por parte de la autoridad ambiental competente.				

Fuente: Ecovias SAS

Indicadores:

Número de Permisos obtenidos /*100% = 0 / 0 * 100% = 0 %
Número de permisos requeridos

N° requerimientos cumplidos/ x 100% = 0 / 0 * 100% = 0 %
Total de Requerimientos generados por la autoridad ambiental

N° de fuentes de materiales utilizadas para el proyecto / * 100 = 2 / 2 * 100% = 100 %
N°de fuentes con permisos ambientales al día

6.4 Manejo Integral de materiales de construcción

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de materiales de construcción en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 31 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios delimitados				
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Todos los vehículos de transporte de materiales cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.				
Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos de los proveedores autorizados.				

Fuente: Ecovias SAS

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"*Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra*".

Todos los materiales provienen de fuentes legales, es decir, que cuentan con permisos ambientales y/o mineros, aspecto que es verificado por la interventoría.

Durante el período se realizaron las siguientes actividades:

- Cubrimiento de materiales pétreos en el frente de obra Tunales y San Antonio, con el fin de evitar la dispersión de materiales y aumento de la concentración de material particulado en el área de influencia directa. Al respecto cabe mencionar que no todos los acopios RCD y pétreos se encuentran cubiertos, señalizados y demarcados. Algunos cumplen parcialmente con las medidas descritas en las fichas PAC-2.1-04 y PAC-2.4-07. Por lo cual en el periodo se solicito adecuación de estos.
- Se verifico que los vehículos para el transporte de estos materiales cuentan con los documentos vigentes y realizan el cubrimiento de la carga al transportarla para evitar dispersión de materiales en las vías.
- Se evidencia que se mantienen las puertas de descarga de materiales herméticamente cerradas durante el trasporte.
- Se sugiere al contratista que no se almacenen materiales cerca de cuerpos de agua o zonas verdes, según se describen en las fichas de manejo ambiental y permisos de ocupación de cauce POC.
- En el periodo se realizó solicitudes de adecuación de acopios de materiales pétreos y RCD durante los comités integrales realizados al igual que se dejó consignado en bitácora e informes semanales respectivos.

A continuación, se relacionan los proveedores de materiales en el periodo con las respectivas cantidades:

Tabla 32 Relación de Proveedores y cantidades CEV

CONSOLIDADO DE MATERIAL USADO EN OBRA						
ITEM	RAZON SOCIAL	CATEGORIA	MATERIAL	CANTIDAD (M3)	CANTIDAD (TON)	PERMISO AMBIENTAL
abr-25						
1	AGREGADOS DE ORIENTE SAS	**Agregados petreo**	Arena	30	49,466	RES 500.41-17-0120 Corporinoquia de 26/01/2017 Registro Minero: EXP:IGJ-08051X hasta 02/02/2045
2		**Agregados petreo**	Grava	30	49,466	
TOTAL				**60**	**98,931**	
may-25						
1	AGREGADOS DE ORIENTE SAS	**Agregados petreo**	Arena	30	49,466	RES 500.41-17-0120 Corporinoquia de 26/01/2017 Registro Minero: EXP:IGJ-08051X hasta 02/02/2045
2		**Agregados petreo**	Grava	30	49,466	
3	MAQUINAS AMARILLAS	**Agregados petreo**	Recebo	60	98,931	Informe Técnico 00259 de 2022 Rad.2022IE24021 Informe Técnico 00876 de 2025 Rad.2025IE59007
TOTAL				**180**	**296,793**	
jun-25						
1	AGREGADOS DE ORIENTE SAS	**Agregados petreo**	Arena	60	98,931	RES 500.41-17-0120 Corporinoquia de 26/01/2017 Registro Minero: EXP:IGJ-08051X hasta 02/02/2045
2		**Agregados petreo**	Grava	60	98,931	
3	MAQUINAS AMARILLAS	**Agregados petreo**	Recebo	15	24,733	Informe Técnico 00259 de 2022 Rad.2022IE24021 Informe Técnico 00876 de 2025 Rad.2025IE59007
TOTAL				**150**	**247,328**	
Nota: El valor en toneladas que se relaciona se toma del cuadro de conversion de la SDA						
PENDIENTE POR CERTIFICADO						

Fuente: Ecovias SAS

Indicador:

No. de proveedores empleados x100% 2 / 2 *100= 100 %
N de proveedores que cumplan la normatividad

Volumen material certificado x100% 135 / 135 *100 = 100 %
Volumen material usado en el mes

Ilustración 27 Manejo de materiales de Construction Tunales / San Antonio CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

6.5 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la implementación de señalización en los frentes de trabajo y en el campamento de obra**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 33 Verificación cumplimiento ficha de señalización CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con el respectivo PMT aprobado e implementado				
Los frentes de trabajo cuentan con la señalización preventiva, informativa y de emergencia correspondiente y en buen estado.				
Los elementos de atención de emergencia y control de derrame se encuentran señalizados				
Los acopios de materiales se encuentran señalizados				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con las vallas informativas en obra				

Fuente: Ecovias SAS

A la fecha por parte del contratista de obra se cuenta con la instalación de un campamento de obra adecuado en cada uno de los tramos en intervención, por lo que se ha implementado a la fecha la señalización preventiva, informativa y de emergencia necesaria, se contempla un plan de manejo de tránsito con un total de 10 señales por frente de obra.

Durante las jornadas de inspección y seguimiento realizadas en el mes de junio de 2025 por parte del componente Ambiental de la interventoría se pudo evidenciar la señalización que se mantiene instalada hasta la fecha y se tomó el respectivo registro fotográfico, el cual es presentado a continuación:

Ilustración 28 Señalización en obra CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- ✓ **PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**

El Contratista cuenta con la aprobación de los Planes de Manejo de Tránsito para la ejecución de las actividades de obra, de acuerdo con los seguimientos realizados, se evidenció que cuentan con señalización vertical móvil instalada en cada uno de los frentes activos la cual costa de 10 por tramo como se muestra en la imagen 4, los auxiliares cuentan con los elementos necesarios en cuento a dotación y EPP además radios de comunicación y chalecos reflectivos.

Ilustración 29 PMT Implementado San Antonio CEV




Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 30 PMT Implementado Tunales CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Imagen 4 Plano de PMT aprobado CEV

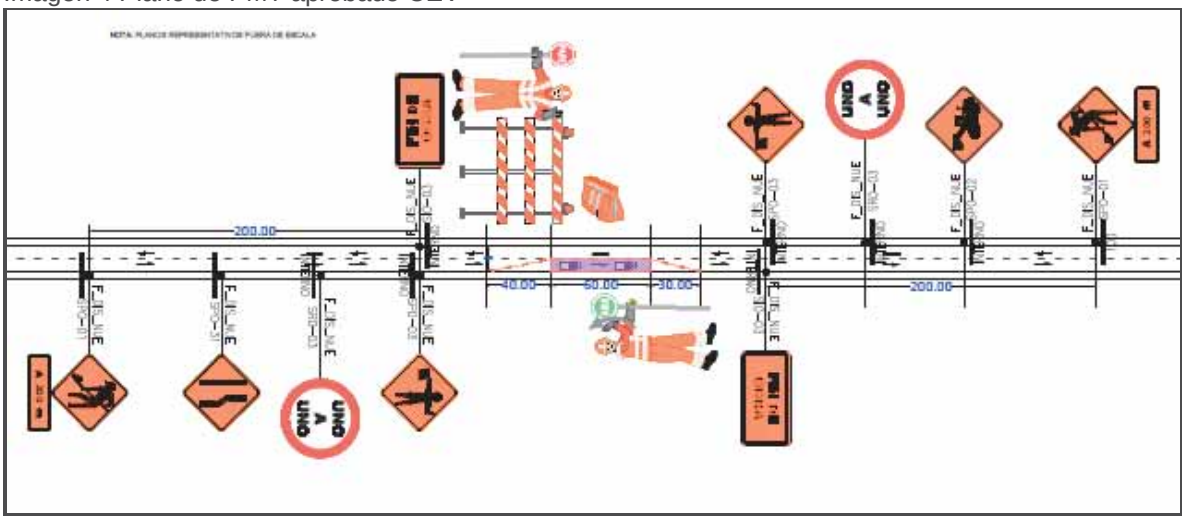

Fuente Ecovias

Indicador:

No de Frentes de obra señalizados adecuadamente x100 2 / 2 = 0 %
No total de Frentes de obra

No de Señales instaladas x100% 30 / 30 = 100 %
No de Señales requeridas en el PMT

6.6 Manejo y disposición final de escombros y RCD

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición de residuos de construcción y demolición RCD en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 34 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios RCD delimitados				
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Los RCD se evacuan hacia sitio de disposición en el tiempo indicado en el PAGA				
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los sitios de disposición cuentan con permisos ambientales vigentes				
Se cuenta con todos los certificados disposición de residuos de construcción y demolición RCD				

Fuente: Ecovias SAS

A continuación, se hace una descripción del manejo y disposición final de los escombros realizado por el Contratista y se presenta como soporte el registro fotográfico levantado en el mes de junio de 2025 por esta interventoría en las actividades de seguimiento de los diferentes componentes.

Para la disposición de RCD se emplea un sitio de disposición que cuenta con los debidos permisos ambientales vigentes, quien emite el certificado respectivo por las cantidades gestionadas en este sitio. El contratista lleva un registro de las cantidades generadas y dispuestas en el periodo.

Para el periodo del presente informe el contratista de obra no realizo disposición de materiales de RCD en sitio autorizado debido a que la cantidad generada fue mínima y permanecen acopiados en obra para su retiro posteriormente. En cumplimiento de la Resolución 1257 de 2021, el contratista remite los soportes (certificados) de disposición final de RCD cuando se disponen; el material producto de la excavación es entregado a la empresa maquinas amarillas

identificada con NIT 900.459.311-1, la cual cuenta con autorización ambiental para hacer el manejo y disposición final de RCD.

A continuación, se presenta la relación de material dispuesto en el periodo.

Tabla 35 Relación de material RCD dispuesto CEV

CONSOLIDADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION					
ITEM	**SITIO DE DISPOSICION**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	No aplica para el periodo	0	0	Resolución número 1480 de 2014 ANLA
may-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	No aplica para el periodo	0	0	Resolución número 1480 de 2014 ANLA
TOTAL			**0**	**0,00**	
jun-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	No aplica para el periodo	0	0	Resolución número 1480 de 2014 ANLA
TOTAL			**0**	**0,00**	

Fuente: Ecovias SAS

Indicadores:

$$\%\ Disposicion\ de\ RCD = \frac{\text{M3 } de\ RCD\ dispuestos\ durante\ el\ periodo \times 100}{\text{M3 } de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo}$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$\%\ Disposicion\ de\ RCD = \frac{\text{M3 } de\ RCD \text{ aprovechado } el\ periodo \times 100}{\text{M3 } de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo}$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Ilustración 31 Acopios de RCD San Antonio/Tunales CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

6.7 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición final de residuos sólidos, convencionales, especiales y peligrosos**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que se cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 36 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con puntos ecológicos en sitio y en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO no aprovechables.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO aprovechables.				
Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición final de los RESPEL gestionados en el presente mes.				

Fuente: Ecovias

Desde la interventoría se realiza un seguimiento específico a la gestión ambiental realizada por parte del contratista de obra, abarcando de esta manera el manejo de residuos sólidos no aprovechables, aprovechables y de residuos peligrosos durante el periodo correspondiente al informe presentado.

Es importante mencionar que durante el presente periodo por parte de la interventoría se realiza una revisión y/o seguimiento de la generación de residuos (aprovechables, no aprovechables, peligrosos) a través de la verificación en campo mediante la jornada de inspección y seguimiento ejecutada en el mes de junio de 2025.

- **Residuos sólidos Convencionales**

Durante el periodo del presente informe por parte del contratista de obra se informa que se generaron residuos ordinarios ya que se cuenta a la fecha con dos campamentos de obra, los cuales fueron dispuestos y recolectados por el prestador de servicio de aseo de la localidad del Sumapaz (Empresa de Servicios Públicos PROMOAMBIENTAL – E.S.P), servicio de recolección prestado los días miércoles.

Por parte de Interventoría, con el fin de realizar un seguimiento a la generación de residuos se solicitó al contratista la planilla de generación de residuos en el presente mes lo cual se presenta en la tabla 37 del presente informe.

- ✓ **Puntos Ecológicos**

Durante los recorridos del presente mes realizados por parte de Interventoría se identificó que los puntos ecológicos instalados en los campamentos se encontraban en condiciones adecuadas, al punto ecológico de Toldo le hace falta la tapa para la caneca blanca y se solicitó que estos permanezcan despejados, organizados y requieren mantenerlos con las bolsas respectivas, como se puede evidenciar a continuación:

Ilustración 32 Puntos ecológicos San Antonio / Tunales CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- **Residuos peligrosos**

Durante el periodo del presente informe no se entregaron Residuos Peligrosos - RESPEL al respectivo gestor para su disposición final. Se presenta la tabla 37 donde se relaciona la generación de residuos peligrosos**,** donde reporta la cantidad de residuos peligrosos generados en el mes de junio de 2025. El gestor encargado de realizar la disposición final de estos residuos es RECIPROIL empresa aprobada por la SDA con la resolución 190 de 2011.

- ✓ **Centro de acopio temporal de residuos peligrosos - respel**

En el periodo se evidenció un área destinada al acopio de RESPEL puesto que se generó este residuo por parte del consorcio, específicamente bolsas de cemento. Estas se mantienen acopiadas para su entrega a gestor autorizado.

- **Reporte de Residuos Generados**

En la siguiente tabla a modo de seguimiento se presenta el tipo y la cantidad de residuos generados por el contratista de obra durante el mes de junio de 2025. El reporte de los residuos generados es verificado durante este mes específicamente a través de las inspecciones realizadas en obra.

.

Tabla 37 Reporte de residuos generados CEV

CONSOLIDADO RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS					
PERIODO Mes/Año	**Tipo Residuo/ Cantidad / Unidad de medida**				
	Aprovechables (kg)	**No Aprovechables (Kg)**	**Orgánicos (kg)**	**RESPEL (Kg)**	**TOTAL**
Abril/2025	0	5	0	0	5
Mayo/2025	0	6	0	7	13
Junio/2025	0	5	0	8	13
TOTAL	**0**	**16**	**0**	**18**	**31**

Como residuos peligrosos en esta tabla se presenta la cantidad de bolsas de cemento y elementos contaminados por RESPEL

Fuente: Ecovias

Indicadores:

Volumen de residuos Aprovechables x 100 = 0 / 0 * 100 = 0 %
Volumen total de residuos generados

Volumen de residuos No aprovechables x 100 = 5 / 13 * 100 =38,46 %
Volumen total de residuos generados

Volumen de residuos peligrosos certificados x 100% = 0 / 8 * 100 =0 %
Volumen total de residuos peligrosos generados

6.8 Manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales

Durante el periodo de ejecución de actividades, no se realizaron actividades de obra que afecten taludes.

Indicador:

N.º de derrumbes presentados para el periodo / x100% = 0 / 0 * 100 = 0%
Total, de derrumbes que requieren intervención.

6.9 Control de emisiones atmosféricas.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el control de emisiones atmosféricas. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 38 Cumplimiento general medida de manejo CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Los vehículos respetan los límites de velocidad para la circulación en los frentes de obra				
Para el presente mes se realizó humectación de via, se presenta la certificación del agua suministrada por proveedor autorizado,				

Fuente: Ecovias SAS

Durante el periodo la interventoría procedió a realizar seguimiento al cubrimiento de materiales pétreos empleados en los frentes de obra, con el fin de evitar al aumento de material particulado en el área de influencia de la obra. Para el control/prevención de dispersión de material particulado, para el periodo no se realizó humectaciones en diferentes tramos de las vías, debido a las constantes precipitaciones registradas en la zona, lo que ha contribuido a la disminución del material particulado generado por el tránsito de vehículos aledaños.

Igualmente, se verifica que los puntos de acopio de materiales pétreos se mantengan separados, cubiertos con plásticos, debidamente demarcados y señalizados, cumpliendo con lo establecido en la ficha PAC 2.1.04, con el propósito de prevenir afectaciones a los ecosistemas cercanos y a la población flotante del sector**.**

La interventoría sugiere al consorcio que cuando circulen vehículos por las áreas de influencia indirecta de construcción, se deberá realizar a velocidades moderadas para que no se levanten

en exceso partículas de polvo, de igual manera realizar los mantenimientos periódicos requeridos del equipo empleado en obra.

Se verifico que los vehículos cuentan con los certificados de revisión técnico mecánica vigente. Se evidencio que los vehículos destinados al transporte de materiales cuentan con carpas con el fin de evitar emisión de partículas por acción del viento. Cabe mencionar que no todos los acopios se encuentran cubiertos, lo cual fue comunicado al contratista quien genero acciones para subsanar dichas observaciones en todos los frentes de obra.

De igual manera se implementan las acciones respectivas en cuanto al manejo ambiental del ruido.

Indicador:

No de frentes humectados x100% = 0 / 0*100%= 0 %
No de frentes de obra

Volumen de agua utilizada al mes para humectación de vía = 0

N acopio de material adecuadamente cubiertos x 100% =6 / 7*100%= 80 %
total de puntos de acopio de material

Ilustración 33 Cubrimiento de materiales CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

6.10 Manejo de aguas superficiales

De acuerdo al desarrollo de las obras fue necesario tramitar ante la autoridad ambiental los permisos de ocupación de cauce, los cuales fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2025 como último plazo otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante **AUTO DRBC No. 01256000051 de 6 FEB. 2025.**

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de aguas superficiales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 39 Cumplimiento general medida de manejo CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención.				
Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.				
Se cuenta en obra con punto de lavado de manos.				
Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra por parte de proveedor autorizado.				

Fuente: Ecovias SAS

Durante el período no se generaron afectaciones por actividades constructivas a los cuerpos de agua presentes en la zona de influencia del proyecto.

En el seguimiento realizado por la interventoría en el periodo al Consorcio se evidencio el cumplimiento de las medidas de manejo indicadas en la ficha como es, disposición final adecuada de RCD en sitios autorizados, acopio temporal de los mismos cumpliendo con las distancias establecidas en el PAGA para cuerpos de agua, quebradas,etc., sin embargo, debido a las condiciones particulares del área de intervención (zona rural de paramo) no es posible cumplir estrictamente con la distancia mínima de 30 metros establecida por la normatividad ambiental vigente. Por lo tanto, se han implementado medidas de manejo y control para minimizar el riesgo de afectación a las fuentes hídricas como es el aislamiento de

las alcantarillas por medo de polisombra, respecto al lavado y mantenimiento de equipos se realiza en lugares adecuados para tal fin.

Por otro lado, durante el mes de junio, no se ha realizado la limpieza de las alcantarillas, de parte de interventoría se ha solicitado manejo de aguas para evitar el aporte de sedimentos y materiales pétreos que por escorrentía son arrastrados hacia las alcantarillas con el fin de prevenir la colmatación de las mismas.

El agua para actividades de obra es suministrada a través de canecas y llevadas al frente de obra de predios cercanos que cuentan con autorización y de los cuales se procedió a levantar acta de autorización con los propietarios de los predios de acuerdo a la siguiente relación:

- En el frente Unión Tunales predio del señor Rafael Romero Km 1+860
- En el frente San Antonio-Toldo predio de la señora María Chavarro Km 3+850

Indicador:

No de requerimientos cumplidos / x 100% = 0 / 0 * 100 = 0 %
No de requerimientos establecidos por la interventoría

N de monitoreos ejecutados /x100% = 0 / 0 * 100 = 0 %
N monitoreos programados

Volumen de agua utilizada al mes para actividades constructivas = 2M3

Ilustración 34 delimitación de alcantarillas CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

6.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 40 Cumplimiento general medida de manejo CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.				
Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.				
Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.				
Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.				

Fuente: Ecovias

Como parte del cumplimiento a la Resolución 2400 de 1979, según los acuerdos realizados desde el área social del proyecto actualmente se hace uso de los baños aledaños a las zonas de intervención de la obra, de acuerdo a ello se realiza verificación y seguimiento al buen uso y correcto funcionamiento de las unidades sanitarias con el fin de reforzar el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico.

El Contratista de obra cuenta con 2 unidades sanitarias para el servicio de los trabajadores alquiladas en viviendas cercanas a la obra, distribuidas de la siguiente forma:

- 1 baño en el frente de obra tunales predio de la señora Diana Cifuentes k1+790
- 1 baño en el frente de obra San Antonio- Toldo predio de la señora María Chavarro k3+850.

De estos dos lugares se cuenta con las actas de autorización respectivas.

- ✓ **KIT DE CONTROL DE DERRAMES**

Durante la jornada de inspección ejecutada en junio de 2025 se realizó la verificación al kit de derrames presente en el frente de trabajo específicamente ubicado en las carpas, evidenciando que este se encuentra en sitio y en condiciones adecuadas. Además, se realiza la verificación de los elementos del kit de derrames en medio de los recorridos realizados por el Componente ambiental de Interventoría.

Ilustración 35 Kit Control de derrames CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicador:
N total de baños reportados en obra x100% = 2 / 2 * 100 = 100 %
N de Baños requeridos

Volumen de la disposición de los lodos de los baños portátiles certificados = 0

N° de mantenimientos realizados x100% = 3 / 3 * 100 = 0 %
N° de mantenimientos programados

El contratista no conto con USP en el periodo.

6.12 Protección de ecosistemas sensibles

Según la caracterización ambiental del área del proyecto no se ve afectado ningún ecosistema sensible, sin embargo, por su cercanía a la zona del páramo de Sumapaz y el paso por áreas consideradas sensibles como son cuerpos de agua, se realizan actividades que conlleven a la minimización, control y mitigación de posibles impactos por las actividades del proyecto, lo cual es verificado por la interventoría. En las inducciones al personal se socializa que se encuentra prohibido que los trabajadores extraigan de estos ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales.

Indicador:
No. áreas sensibles protegidas/ x100% = 0 / 0 * 100 = 0 %
No total de áreas sensibles identificadas

6.13 Protección de fauna en obra

Una de las medidas de manejo implementadas por el contratista para este componente es la sensibilización a los trabajadores lo cual se realiza inicialmente en el proceso de inducción y capacitaciones programadas de manera periódica. De igual manera se implementa en obra para conductores de vehículos respetar los límites de velocidad para disminuir el riesgo de atropellamiento de fauna silvestre. Se socializa que está completamente prohibido la caza o comercialización de especies. Para el periodo el contratista realizo capacitaciones al respecto en conservación recursos naturales, fauna y flora.

Indicador:
N° de capacitaciones programadas x 100% = 2 / 2 * 100 = 100 %
N° Capacitaciones ejecutadas

6.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para las actividades de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de instalaciones temporales y sitios de acopio. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 41 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.				
Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal, ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).				
El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias.				
El campamento cuenta con punto ecológico.				
El campamento se encuentra en condiciones adecuadas de aseo y orden.				
El campamento cuenta con señalización respectiva.				

Fuente: Ecovias

El contratista de obra cuenta con un campamento de obra en cada uno de los frentes de trabajo el cual consta de una carpa móvil en la zona cercana a las áreas de intervención, adecuados con los elementos necesarios para la atención de emergencias y elementos para los trabajadores. Durante las jornadas de seguimiento e inspección realizadas por la interventoría en el mes de junio de 2025, se realizó una verificación de los aspectos del área ambiental en cada uno de los campamentos.

Es importante mencionar que durante el recorrido por los campamentos se pudo evidenciar que cuenta con: punto ecológico, kit de emergencia, kit de derrames, al respecto se solicitó una jornada de orden y aseo en los mismos; como se evidencia en el siguiente registro fotográfico.

Ilustración 36 Campamentos Tunales CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 37 Campamentos San Antonio CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

De acuerdo a las inspecciones de campo, se tiene instalado dos campamentos temporales móviles tipo carpa.

Indicadores:

No. Campamentos manejados x 100% = 2 / 2 * 100 =100 %
No. Campamentos establecidos

No actividades ejecutadas x 100% = 33 / 33 * 100 =100 %
No de actividades programadas

No de requerimientos atendidos x 100% = 2 / 3 * 100 =66 %
No total de requerimientos realizados por la interventoría

6.15 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo

Dentro de la revisión que realiza el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 42 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con Plan de Manejo de Tránsito.				
Cuenta con el diligenciamiento de las fichas pre – operacionales de cada uno de los equipos.				
Cuenta con Stiker de identificación				
Se cuenta con certificado de revisión tecnicomecanica de los vehículos según aplique.				
No se evidencia lavado de vehículos en cuerpos de agua.				

Fuente: Ecovias

Dentro del informe de seguridad y salud en el trabajo se encuentran los soportes de los preoperacionales de los equipos empleados y activos en campo.

- ✓ **RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA**

Durante el presente periodo por parte del componente ambiental de la interventoría se hace la respectiva revisión de algunos de los preoperacionales de los vehículos y maquinaria presentes en obra.

Se identificó que, en el presente periodo, el contratista cuenta con los equipos presentes en campo los cuales se listan a continuación:

Tabla 43 Relación de vehículos CEV

EQUIPO	MARCA	PLACA	MODELO	PIN	VENCIMIENTO TECNICOMECANICA
VEHICULOS					
VOLQUETA DOBLETROQUE	FOTON	GUV203	2021	18772	25/12/2025
VOLQUETA DOBLETROQUE	FOTON	LPY886	2023	22029	14/09/2025
VOLQUETA DOBLETROQUE	KENWORTH	SKX047	2008	6828	26/02/2026
VOLQUETA DOBLETROQUE	KENWORTH	SKX048	2008	6829	20/03/2026
VOLQUETA	CHEVROLET	SRN910	2008	6399	02/08/2025
VOLQUETA	CHEVROLET	SRN912	2008	6573	02/10/2025
CAMIONETA	FORD	KXY360	2023	N/A	N/A
CAMIONETA	FORD	GPY162	2020	N/A	21/01/2026

Fuente: Informe Consorcio Estabilización vial y Ecovias SAS

Tabla 44 Relación de maquinaria CEV

MAQUINARIA			
No.	**EQUIPO**	**MARCA/REFERENCIA**	**MODELO**
1	MINICARGADOR	CASE E200	2018
2	MINICARGADOR	CASES SR200B	2024
3	RETROCARGADOR	JHON DEERE 310SJ	2011

Fuente: Informe Consorcio Estabilización vial

A continuación, se presenta un registro fotográfico de los equipos empleados:

Ilustración 38 Equipos en obra CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicadores:

No de vehículos con revisión técnico-mecánica/ *100% 5 / 5 * 100 = 100 %
No de vehículos utilizados en el proyecto

N de derrames atendidos *100% 0 / 0 * 100 = 0 %
N de derrames presentados

6.16 Manejo del descapote y cobertura vegetal.

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"Manejo de vegetación, no aplica para el contrato"

Para el presente período, no se realizaron actividades de remoción de cobertura vegetal, descapote, ni aprovechamiento forestal. Cabe mencionar que para el contrato no se cuenta con ningún tipo de permiso para realizar aprovechamiento forestal.

6.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural.

Durante el período no se realizaron hallazgos de elementos arqueológicos que se tuvieran que reportar ante el ICANH. A la fecha en el área de influencia del contratista de obra, no se presenta ningún hallazgo arqueológico fortuito, por lo que no se ha hecho necesario implementar esta medida de manejo ambiental. En el momento en el que se genere un hallazgo se reportará en el informe respectivo tanto de obra como de interventoría y se hará el seguimiento correspondiente.

7. CONSORCIO GAVIONES 95 CTO. 478 DE 2022

Durante el período, El consorcio realizo actividades de localización y replanteo básicamente.

7.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental.

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 45 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con el grupo de gestión socioambiental conformado.				
El personal socioambiental se encuentra en el lugar donde se desarrollan las actividades de obra.				

Fuente: Ecovias SAS

La interventoría realizó aval del documento PAGA, el cual se encuentra aprobado mediante oficio 186-1-705. A continuación, se presenta la conformación del grupo de gestión Socioambiental (véase tabla No 46).

Tabla 46 Conformación del grupo socioambiental Gaviones 95

NOMBRE	CARGO
Andrés García Posada	Residente social
Cesar Augusto Delgado Avellaneda	Profesional ambiental
Paul Rangel Páez	Profesional en seguridad y salud en el trabajo
Liz Maribel Murillo Naranjo	Profesional en seguridad y salud en el trabajo

Fuente: Consorcio Gaviones 95

Indicador:

Número de profesionales contratados x100% 4 / 4 * 100 = 100%
Número total de profesionales propuestos

Número de requerimientos ambientales cumplidos x100% 0 / 0 * 100 = 0 %
Total de requerimientos ambientales generados

7.2 Capacitación y concienciación para el personal de obra

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la capacitación y educación ambiental del personal vinculado al proyecto**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 47 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza la jornada de capacitación mensual programada.				
Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.				

Fuente: Ecovias SAS

De igual manera se verificó el cumplimiento según el cronograma de capacitaciones desde el componente ambiental, que se realizaron las siguientes capacitaciones al personal:

Tabla 48 Capacitaciones realizadas Gaviones 95

COMPONENTE	TEMA	TIPO	FECHA
Ambiental	Clasificación de sustancias químicas	Capacitación	23/06/2025
Ambiental	Manejo adecuado de sustancias químicas	Capacitación	26/06/2025

Fuente: Informe mensual Gaviones 95

El Contratista se encargó de realizar la capacitación ambiental los días 23 y 26 de junio de 2025 al personal, abarcando los temas mencionados en la tabla anterior y fueron dictadas

por el profesional ambiental del Consorcio Gaviones 95, con el fin de generar conciencia a los trabajadores.

Ilustración 39 Capacitación Ambiental Gaviones 95



Fuente: Componente Ambiental Gaviones95

Indicador:
Número de capacitaciones Ejecutadas x100% 2 / 2 * 100 = 100 %
Número de Capacitaciones programadas

Número de personas capacitadas / x 100% 7 / 7 * 100 = 100%
Número de personas en el frente de obra.

7.3 Cumplimiento de los requerimientos legales

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA.** "Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental". Para este período no se gestionaron licencias y/o permisos ambientales para el proyecto.

Cabe resaltar que, para la ejecución de la obra de acuerdo al tipo de intervención a realizar, se contempla conservar el ancho de vía existente, lo cual indica que no se requiere de aprovechamiento forestal, por ende, no se hace necesario tramitar permiso de aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR.

En cuanto a los proveedores de materiales cuentan con los permisos y licencias ambientales vigentes aplicables para esta actividad al igual que los sitios destinados para la disposición final de materiales generados en obra.

De igual manera para la disposición final de residuos peligrosos RESPEL, se realiza con gestores autorizados que cuentan con los permisos ambientales respectivos para este tipo de disposición final. En el periodo no se realizó disposición al respecto.

Se cuenta con los permisos de ocupación de cause para las actividades de obra que así lo requieren los cuales fueron tramitados ante la autoridad ambiental competente CAR y se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 49 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con los permisos de ocupación de cauce vigentes				
Los proveedores de materiales cuentan con las licencias ambientales y títulos mineros respectivos vigentes				
Los sitios de disposición final de RCD cuentan con los permisos ambientales respectivos vigentes				
El proveedor de unidades sanitarias móviles, cuenta con permisos de vertimientos de residuos líquidos conforme la legislación ambiental aplicable.				
En el periodo del presente informe se realizaron requerimientos por parte de la autoridad ambiental competente.				

Fuente: Ecovias SAS

Indicadores:

Número de Permisos obtenidos / *100% = 0 / 0 * 100 = 0%
Número de permisos requeridos

N° requerimientos cumplidos/ x 100% = 0 / 0 * 100 = 0%
Total de Requerimientos generados por la autoridad ambiental

N° de fuentes de materiales utilizadas para el proyecto /* 100 = 1 / 1 * 100 = 0%
N°de fuentes con permisos ambientales al día

7.4 Manejo Integral de materiales de construcción

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo materiales de construcción en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 50 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios delimitados				
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Todos los vehículos de transporte de materiales cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.				
Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos de los proveedores autorizados.				

Fuente: Ecovias SAS

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"*Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra*".

Todos los materiales provienen de fuentes legales, es decir, que cuentan con permisos ambientales y/o mineros, aspecto que es verificado por la interventoría.

Durante el período se realizaron las siguientes actividades:

- Cubrimiento de materiales pétreos en el frente de obra laguna verde, con el fin de evitar la dispersión de materiales y aumento de la concentración de material particulado en el área de influencia directa. Al respecto cabe mencionar que no todos los acopios de pétreos se encuentran cubiertos, señalizados y demarcados. Algunos cumplen parcialmente con las medidas descritas en las fichas PAC-2.1-04 y PAC-2.4-07.
- Se verifico que los vehículos para el transporte de estos materiales cuentan con los documentos vigentes y realizan el cubrimiento de la carga al transportarla para evitar dispersión de materiales en las vías.
- Se evidencia que se mantienen las puertas de descarga de materiales herméticamente cerradas durante el trasporte.
- Se sugiere al contratista que no se almacenen materiales cerca de cuerpos de agua o zonas verdes, según se describen en las fichas de manejo ambiental y permisos de ocupación de cauce POC.
- En el periodo se contó con 1 acopio de triturado.

A continuación, se relacionan los proveedores de materiales en el periodo con las respectivas cantidades:

Tabla 51 Relación de Proveedores y cantidades Gaviones 95

CONSOLIDADO DE MATERIAL USADO EN OBRA						
ITEM	**RAZON SOCIAL**	**CATEGORIA**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25						
1	No aplica para el periodo	**Agregados petreo**	No aplica	0	0,000	No aplica para el periodo
TOTAL				**0**	**0**	
may-25						
1	CONSTRITURAR	**Agregados petreo**	Triturado	50	82,44	Res CAR 0407/2022
TOTAL				**50**	**82,44**	
jun-25						
1	No aplica para el periodo	**Agregados petreo**	No aplica	0	0,000	No aplica para el periodo
TOTAL				**0**	**0**	

Fuente: Ecovias SAS / Informe Consorcio Gaviones 95

Indicadores:

Volumen de insumos utilizados / *100= 0 / 0 * 100 = 0%
volumen de insumos proyectados

Planes de acción implementadas en el periodo / x 100= 0 / 0 * 100 = 0%
planes de acción programados)

Ilustración 40 Manejo de materiales de Construction Gaviones 95 predio identificado como acopio



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

7.5 Explotación de fuentes de materiales

El Consorcio cuenta con proveedores autorizados y todos los materiales provienen de fuentes legales, es decir, que cuentan con permisos ambientales y/o mineros, aspecto que es verificado por la interventoría.

Indicadores:

No. de proveedores que cumplan la normatividad / x 100 = 1/1 * 100= 100 %
No requerimientos reportados por la interventoría

Número de requerimientos por actividades de explotación x 100= 0 / 0 * 100 = 0%
Número de requerimientos presentados

7.6 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la implementación de señalización en los frentes de trabajo y en el campamento de obra**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 52 Verificación cumplimiento ficha de señalización Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con el respectivo PMT aprobado e implementado				
Los frentes de trabajo cuentan con la señalización preventiva, informativa y de emergencia correspondiente y en buen estado.				
Los elementos de atención de emergencia y control de derrame se encuentran señalizados				
Los acopios de materiales se encuentran señalizados				
Se cuenta con las vallas informativas en obra				

Fuente: Ecovias SAS

A la fecha por parte del contratista de obra se cuenta con la instalación de campamento de obra, se evidencio que no se ha implementado a la fecha la señalización preventiva, informativa y de emergencia necesaria, se contempla un plan de manejo de tránsito con un total de 10 señales por frente de obra, el contratista informa que se realizó solicitud de señales respectivas una vez lleguen a obra serán implementadas.

Durante las jornadas de inspección y seguimiento realizadas en el mes de junio de 2025 por parte del componente Ambiental de la interventoría se pudo evidenciar que no se ha implementado señalización en campamentos móviles en el área. Las actividades ejecutadas en el periodo básicamente corresponden a replanteo topográfico, excavación para filtro y descargue de materiales, se tomó el respectivo registro fotográfico, el cual es presentado a continuación:

Ilustración 41 Actividades en obra Gaviones 95



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- ✓ **PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**


El Contratista cuenta con la aprobación de los Planes de Manejo de Tránsito para la ejecución de las actividades de obra, de acuerdo con los seguimientos realizados, a la fecha no se realizó implementación de señales verticales móviles ya que según informa que contratista se encuentran solicitadas, una vez lleguen a obra se procederá con su implementación.

Ilustración 42 PMT Implementado Laguna Verde Gaviones 95

No se cuenta con implementación	No se cuenta con implementación

Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Imagen 5 Plano de PMT aportado Consorcio Gaviones

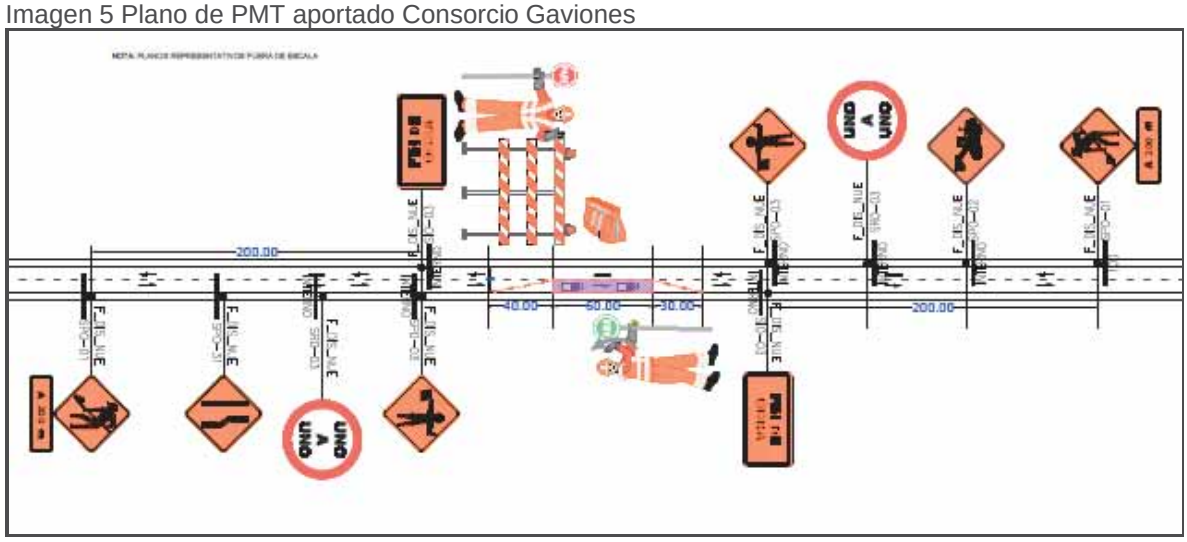

Fuente Ecovias

Indicadores:

No de Frentes de obra señalizados adecuadamente x100= 0 / 1 * 100 = 0%
No total de Frentes de obra

No de Señales instaladas x100%= 0 / 0 * 100 = 0%
No de Señales requeridas en el pmt

7.7 Manejo y disposición final de escombros y RCD

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición de residuos de construcción y demolición RCD en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 53 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios RCD delimitados				
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Los RCD se evacuan hacia sitio de disposición en el tiempo indicado en el PAGA				
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los sitios de disposición cuentan con permisos ambientales vigentes				
Se cuenta con todos los certificados disposición de residuos de construcción y demolición RCD				

Fuente: Ecovias SAS

En cumplimiento de la Resolución 1257 de 2021, el contratista en el periodo no realizo disposición de residuos de construcción y demolición RCD en el periodo. Procedió a adecuar los acopios respectivos y acopiar los RCD en estos lugares, al respecto se solicitó que estos deben permanecer con las medidas de manejo ambiental respectivas y que estos lugares deben emplearse exclusivamente para acopio de CRD mas no para conformación de estos residuos en estas áreas, todos los residuos de excavación deben ser llevados a sitio de disposición final autorizado.

Para la disposición de escombros se emplea un sitio de disposición que cuenta con los debidos permisos ambientales vigentes, quien emite el certificado respectivo por las cantidades gestionadas en este sitio. El contratista lleva un registro de las cantidades generadas y dispuestas en el periodo.

Para el periodo del presente informe el contratista de obra no realizo disposición de materiales de RCD en sitio autorizado debido a que la cantidad generada fue mínima y permanecen acopiados en obra para su retiro posteriormente. En cumplimiento de la Resolución 1257 de

2021, el contratista remite los soportes (certificados) de disposición final de RCD cuando se disponen; el material producto de la excavación es entregado a la empresa Cemex, la cual cuenta con autorización ambiental para hacer el manejo y disposición final de RCD.

A continuación, se presenta la relación de material dispuesto en el periodo con el fin de llevar la trazabilidad respectiva.

Tabla 54 Relación de material RCD dispuesto Gaviones 95

CONSOLIDADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION					
ITEM	**SITIO DE DISPOSICION**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25					
1	CEMEX	No aplica para el periodo	0	0	Resolucion SDA No 1280 – 2017. Resolucion ANLA No 1506 – 2006 y No 1480 – 2014
may-25					
1	CEMEX	No aplica para el periodo	0	0	Resolucion SDA No 1280 – 2017. Resolucion ANLA No 1506 – 2006 y No 1480 – 2014
TOTAL			**0**	**0,00**	
jun-25					
1	CEMEX	No aplica para el periodo	0	0	Resolucion SDA No 1280 – 2017. Resolucion ANLA No 1506 – 2006 y No 1480 – 2014
TOTAL			**0**	**0,00**	

Fuente: Ecovias SAS /Informe Gaviones 95

Indicadores:

$$\%\ Disposicion\ de\ RCD = \frac{\text{volumen}\ de\ RCD\ dispuestos\ durante\ el\ periodo}{\text{volumen}\ de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo} \times 100$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$\%\ Disposición\ de\ RCD = \frac{\text{volumen}\ de\ RCD\ \text{aprovechado}\ el\ periodo}{\text{volumen}\ de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo} \times 100$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Inspecciones realizadas x 100= 1 / 1 * 100 = 100%
Inspecciones programadas

Requerimientos respondidos x100= 0/0 *100= 0%
requerimientos emitidos por autoridades, Interventoría y entidad contratante

Ilustración 43 Acopios de RCD Gaviones 95



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

7.8 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y peligrosos.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición final de residuos sólidos, convencionales, especiales y peligrosos**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que se cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 55 Verificación cumplimiento ficha manejo de residuos sólidos convencionales Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con puntos ecológicos en sitio y en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el registro de la cantidad				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
y tipo de residuos generados en el mes.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO no aprovechables.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO aprovechables.				
Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición final de los RESPEL gestionados en el presente mes.				

Fuente: Ecovias SAS

Desde la interventoría se realiza un seguimiento específico a la gestión ambiental realizada por parte del contratista de obra, abarcando de esta manera el manejo de residuos sólidos no aprovechables, aprovechables y de residuos peligrosos durante el periodo correspondiente a cada uno de los informes mensuales

Es importante mencionar que durante el presente periodo por parte de la interventoría se realiza una revisión y/o seguimiento de la generación de residuos (aprovechables, no aprovechables, peligrosos) a través de la verificación en campo y de la jornada de inspección y seguimiento ejecutada en el mes de junio de 2025.

- **Residuos sólidos Convencionales**

Durante el periodo del presente informe por parte del contratista de obra se informa que se generaron residuos ordinarios ya que se cuenta a la fecha un campamento que funciona como oficina, estos residuos fueron dispuestos y recolectados por el prestador de servicio de aseo de la localidad del Sumapaz (Empresa de Servicios Públicos PROMOAMBIENTAL – E.S.P), servicio de recolección prestado los días miércoles.

Por parte de Interventoría, con el fin de realizar un seguimiento a la generación de residuos se solicitó al contratista la planilla de generación de residuos en el presente mes lo cual se presenta en la tabla 56 del presente informe.

- ✓ **Puntos Ecológicos**

Durante los recorridos del presente mes realizados por parte de Interventoría se identificó que no se cuenta con puntos ecológicos instalados en el periodo.

Ilustración 44 Puntos ecológicos Gaviones 95	
No aplica para el periodo	No aplica para el periodo
Fuente: Componente Ambiental Ecovias	

- **Residuos peligrosos**

Durante el periodo del presente informe no se entregaron Residuos Peligrosos - RESPEL al respectivo gestor para su disposición final. Se presenta la tabla 56 donde se relaciona la generación de residuos peligrosos**,** diligenciada por el contratista de obra donde reporta la cantidad de residuos peligrosos generados en el mes de junio de 2025.

- ✓ **Centro de acopio temporal de residuos peligrosos - respel**

En el periodo no se evidenció un área destinada al acopio de RESPEL ni tampoco se generó este residuo por parte del consorcio.

- **Reporte de Residuos Generados**

En la siguiente tabla a modo de seguimiento se presenta el tipo y la cantidad de residuos generados por el contratista de obra durante el mes de junio de 2025. El reporte de los residuos generados es verificado durante este mes específicamente a través de las inspecciones realizadas en obra.

Tabla 56 Reporte de residuos generados Gaviones 95

CONSOLIDADO RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS					
PERIODO Mes/Año	**Tipo Residuo/ Cantidad / Unidad de medida**				
	Aprovechables (kg)	**No Aprovechables (Kg)**	**Orgánicos (kg)**	**RESPEL (Kg)**	**TOTAL**
Abril/2025	0	2	0	0	2
Mayo/2025	0	4	0	0	4
Junio/2025	0	6	0	0	6
TOTAL	**0**	**12**	**0**	**0**	**12**

Como residuos peligrosos en esta tabla se presenta la cantidad de filtros y elementos contaminados por RESPEL
Fuente: Ecovias

Indicador:
Cantidad de residuos recolectados, separados y dispuestos / x 100= 6/ 6 * 100 = 100%
cantidad de residuos generados (kg/mes).

Volumen de residuos peligrosos certificados / x 100%= 0 / 0 * 100 = 0%
Volumen total de residuos peligrosos generados

7.9 Manejo de aguas superficiales

De acuerdo al desarrollo de las obras fue necesario tramitar ante la autoridad ambiental los permisos de ocupación de cauce que se relacionan a continuación, los cuales fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2025 como último plazo otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante **AUTO DRBC No. 01256000051 de 6 FEB. 2025** y según lo estipulado en la misma Resolución, no se contemplan nuevas ampliaciones.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de aguas superficiales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 57 Verificación cumplimiento ficha manejo de aguas superficiales Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención.				
Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.				
Se cuenta en obra con punto de lavado de manos.				
Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra por parte de proveedor autorizado.				

Fuente: Ecovias SAS

Por otro lado, durante el mes de junio, se evidencio aislamiento con polisombra de las alcantarillas que se encuentran ubicadas en el tramo en intervención laguna verde.

Durante el período no se generaron afectaciones por actividades constructivas a los cuerpos de agua presentes en la zona de influencia del proyecto, y de acuerdo a las actividades de obra realizadas no se requirió agua para las mismas. Sin embargo, se contó con punto de hidratación para el personal, cuyo volumen se reporta a continuación.

Indicador:

Personal:

Volumen de agua suministrado / *100= 40lts / 40 lts* 100 = 100%
Volumen de agua requerido

Actividades de obra:

Volumen de agua suministrado / *100= 0 / 0 * 100 = 0%
Volumen de agua requerido

7.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 58 Verificación cumplimiento ficha manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.				
Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.				
Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.				
Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.				

Fuente: Ecovias

Como parte del cumplimiento a la Resolución 2400 de 1979, se tiene concertado con personal de la comunidad el alquiler de baños de casas cercanas, de lo cual se cuenta con las actas respectivas desarrolladas por el componente social.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las unidades sanitarias usada en obra.

Ilustración 45 Unidades Sanitarias Gaviones 95





Fuente: Componente Ambiental Gaviones 95

- ✓ **KIT DE CONTROL DE DERRAMES**

Durante la jornada de inspección ejecutada en junio de 2025 se realizó la verificación al kit de derrames presente en el frente de trabajo específicamente ubicado en las carpas, evidenciando que este se encuentra en sitio y en condiciones adecuadas. Además, se realiza la verificación de los elementos del kit de derrames en medio de los recorridos realizados por el Componente ambiental de Interventoría.

Ilustración 46 Kit control de derrames Gaviones 95





Fuente: Componente Ambiental Ecovias /Gaviones 95

Indicador:
N total de baños disponibles x100% = 1 / 1 * 100 = 100%
N de baños requeridos

Volumen de la disposición de los lodos de los baños portátiles certificados: No aplica

N° de mantenimientos realizados / *100= 3 / 3 * 100 = 100%
N° de mantenimientos programados

7.12 Manejo del descapote y cobertura vegetal.

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"Manejo de vegetación, no aplica para el contrato"

Para el presente período, no se realizaron actividades de descapote de maleza, ni aprovechamiento forestal. Cabe mencionar que para el contrato no se cuenta con ningún tipo de permiso para realizar aprovechamiento forestal.

Según la caracterización ambiental del área del proyecto no se ve afectado ningún ecosistema sensible, sin embargo, por su cercanía a la zona del páramo de Sumapaz y el paso por áreas consideradas sensibles como son cuerpos de agua, se realizan actividades que conlleven a la minimización, control y mitigación de posibles impactos por las actividades del proyecto, lo cual es verificado por la interventoría. En las inducciones al personal se socializa que se encuentra prohibido que los trabajadores extraigan de estos ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales.

Indicador:

Volumen de material aprovechado / *100= 0 / 0 * 100 = 0%
volumen de material retirado

No. áreas sensibles protegidas / *100= 0 / 0 * 100 = 0%
No total de áreas sensibles identificadas

7.13 Protección de fauna en obra

Una de las medidas de manejo implementadas por el contratista para este componente es la sensibilización a los trabajadores lo cual se realiza inicialmente en el proceso de inducción y capacitaciones programadas de manera periódica. De igual manera se implementa en obra para conductores de vehículos respetar los límites de velocidad para disminuir el riesgo de atropellamiento de fauna silvestre. Se socializa que está completamente prohibido la caza o comercialización de especies.

Indicadores:

N° de individuos afectados= 0
N° de individuos rescatados= 0
N° de individuos relocalizados= 0

N° de capacitaciones programadas / *100%= 0 / 0 * 100 = 0%
N° Capacitaciones ejecutadas

7.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para las actividades de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de instalaciones temporales y sitios de acopio. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 59 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.				
Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal,	1 baños			

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).				
El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias.				
El campamento cuenta con punto ecológico.				
El campamento se encuentra en condiciones adecuadas de aseo y orden.				
El campamento cuenta con señalización respectiva				

Fuente: Ecovias

El contratista de obra cuenta con un campamento de obra en el frente de trabajo Laguna Verde el cual consta de una carpa móvil en la zona cercana a las áreas de intervención, adecuados con los elementos necesarios para la atención de emergencias y elementos para los trabajadores. Durante las jornadas de seguimiento e inspección realizadas por la interventoría en el mes de junio de 2025, se realizó una verificación de los aspectos del área ambiental en el campamento campamentos.

Es importante mencionar que durante el recorrido por el campamento se pudo evidenciar que cuenta con: punto ecológico en oficina, kit de emergencia, kit de derrames; como se evidencia en el siguiente registro fotográfico.

Ilustración 47 Campamento Gaviones 95



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

De acuerdo a las inspecciones de campo, se tiene instalado un campamento temporal móvil tipo carpa.

Indicadores:
Inspecciones realizadas / x 100= 1 / 1 * 100 = 100%
Inspecciones programadas

No de requerimientos atendidos x 100%= 0 / 0 * 100 = 0%
No total de requerimientos realizados por la interventoría

7.16 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo

Dentro de la revisión que realiza el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 60 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con Plan de Manejo de Tránsito implementado				
Cuenta con el diligenciamiento de las fichas pre – operacionales de cada uno de los equipos.				
Cuenta con Stiker de identificación				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con certificado de revisión tecnicomecanica de los vehículos según aplique.				
No se evidencia lavado de vehículos en cuerpos de agua.				

Fuente: Ecovias

Dentro del informe de seguridad y salud en el trabajo se encuentran los soportes de los preoperacionales de los equipos empleados y activos en campo.

- ✓ **RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA**

Durante el presente periodo por parte del componente SST y ambiental de la interventoría se hace la respectiva revisión de algunos de los preoperacionales de los vehículos presentes en obra.

Se identificó que, en el presente periodo, el contratista cuenta con los equipos disponibles los cuales se listan a continuación:

Tabla 61 Relación de vehículos Gaviones 95

EQUIPO	PLACA	PIN	Vencimiento Tecnicomecanica
DOBLETROQUE	ETM925	18203	19/02/2026

Fuente: Informe Consorcio Gaviones 95

Tabla 62 Relación de maquinaria Gaviones 95

MAQUINARIA			
No.	**EQUIPO**	**MARCA/REFERENCIA**	**MODELO**
1	Minicargador	Caterpillar 236D EGP030	2014
2	Retrocargador	Caterpillar 428F – EGP016	2014
3	Excavadora	Caterpillar	2019

Fuente: Informe Consorcio Gaviones 95

A continuación, se presenta un registro fotográfico de los equipos disponibles:

Ilustración 48 Equipos en obra Gaviones 95



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicadores:

N° equipos con certificación técnico mecánico /x 100= 1 / 1* 100 = 0%
Número de equipos empleados

Número de accidentes por causa de equipo o maquinaria/ x 100 = 0 / 0 * 100 = 0%
Número de accidentes en el periodo

No de derrames atendidos/ *100= 0 / 0 * 100 = 0%
No de derrames presentados

6.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural.

Durante el período no se realizaron hallazgos de elementos arqueológicos que se tuvieran que reportar ante el ICANH. A la fecha en el área de influencia del contratista de obra, no se presenta ningún hallazgo arqueológico fortuito, por lo que no se ha hecho necesario implementar esta medida de manejo ambiental. En el momento en el que se genere un hallazgo se reportará en el informe respectivo tanto de obra como de interventoría y se hará el seguimiento correspondiente.

8. GESTION REALIZADA POR LA INTERVENTORIA

A continuación, se describen las actividades desarrolladas por la interventoría en desarrollo del contrato 161 de 2022 durante el periodo de informe con el fin de verificar y realizar seguimiento a las actividades propuestas y ejecutadas por los contratistas.

- Recorridos de obra a cada uno de los tramos en intervención
- Seguimiento a actividades realizadas por el componente ambiental de la entidad ejecutora.
- Seguimiento a actividades desarrolladas por el componente ambiental del Consorcio Estabilización Vial.
- Seguimiento a actividades desarrolladas por el componente ambiental del Consorcio Gaviones 95
- Solicitud y Revisión de informes mensuales contratistas y entidad ejecutora
- Verificación correcta implementación y cumplimiento de las medidas de manejo ambiental propuestas en el PAGA.
- Revisión documentos de vehículos (tecnicomecanica).
- Verificación de orden y aseo en el campamento y frentes de obra
- Verificación permanencia en campamento y frentes de obra del kit de atención de emergencias (camilla, botiquín, extintor y kit de atención de derrames).
- Seguimiento en obra de permanencia y mantenimiento de puntos ecológicos en los frentes de obra.
- Verificación en obra mediante los recorridos realizados del cumplimiento de las medidas de manejo ambiental para los acopios de RCD y materiales pétreos en cada uno de los frentes de obra.
- Verificación de la permanencia en cada frente de obra de unidades sanitarias necesarias para el personal de obra.
- Verificación permanencia en obra de la señalización preventiva, informativa y reglamentaria necesaria.
- Inspecciones de áreas en campo
- Revisión de registros de capacitación
- Revisión de certificaciones de proveedores de materiales
- Revisión de certificaciones de disposición de residuos de construcción y demolición RCD.
- Acompañamiento a capacitaciones en sitio.
- Verificación de la correcta disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos.
- La interventoría realizo un registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el periodo con el fin de evidenciar la gestión, avances, desarrollo e implementación del Cronograma de actividades y manejo ambiental en obra.
- Estructuración de oficios para la entidad ejecutora, Consorcio Estabilización y Consorcio Gaviones 95
- Participación en comités integrales de seguimiento

- Acompañamiento a reuniones con la comunidad
- Desarrollo de recorridos y mesas de trabajo con los profesionales ambientales de la entidad ejecutora y contratistas.
- Elaboración de informes semanales y revisión de los informes entregados por los contratistas.
- Elaboración de informes mensuales de gestión del componente ambiental
- Diligenciamiento de bitácoras
- Realización de la Calificación mensual a los contratistas

Ilustración 49 participación en comités integrales



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 50 participación en comités integrales



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Tabla 63 Relación de correspondencia enviada y recibida

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITIDA A**
10/06/2025	186-1-694	Llamado de atención del componente ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo SST	Entidad Ejecutora UMV
09/06/2025	186-1-693	Respuesta correo electrónico del 07/06/2025, observaciones informe ambiental No 12.	Entidad Ejecutora UMV
12/06/2025	186-1-696	Respuesta comunicado 20251920066591 Subsanación de las observaciones del Informe Ambiental No. 11.	Entidad Ejecutora UMV
16/06/2025	186-1-704	Respuesta comunicado 20251920066631. Actualización Plan de adaptación guía de maneo ambiental PAGA V4 - Aval	Entidad Ejecutora UMV
18/06/2025	186-1-708	Envío certificados disposición RCD Contrato 478 de 2022 y Contrato 479 de 2022	Entidad Ejecutora UMV
09/06/2025	186-1-692	Respuesta comunicado CEV/22-407. Observaciones informe ambiental No 19 V1	Consorcio Estabilización Vial.
18/06/2025	186-1-709	Respuesta a comunicado CEV/22-417 Informe del componente Ambiental No.15 V02	Consorcio Estabilización Vial.
24/06/2025	186-1-712	Respuesta a comunicado CEV/22-416 Informe del componente Ambiental No.19 V02	Consorcio Estabilización Vial.
27/06/2025	186-1-725	Respuesta a comunicado CEV/22-422 Informes del componente Ambiental No 1, No 2 y del No 4 al 10. Aval	Consorcio Estabilización Vial.
16/06/2025	186-1-705	Respuesta comunicado D-26- 2025-37. Plan Adaptación Guía Manejo Ambiental PAGA V3 -Aval	Consorcio Gaviones 95

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITIDA A**
24/06/2025	186-1-714	Respuesta comunicado D-29- 2025-37. Entrega informe ambiental No 13 abril de 2025 V2	Consorcio Gaviones 95
24/06/2025	186-1-715	Respuesta comunicado D-31- 2025-37. Entrega informe ambiental No 14 mayo de 2025 V1	Consorcio Gaviones 95
27/06/2025	186-1-726	Respuesta comunicado D-32- 2025-37. Entrega de informes mensuales ambiental No 1,2,3,4,5,9,10 (avalados) y solicitud de ajustes a los informes No 6,7,8,11 y 12	Consorcio Gaviones 95
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITIDA POR**
12/06/2025	20251920066591	Subsanación de observaciones del informe mensual No 11 (respuesta oficio No 186-1-655 Ecovias SAS).	Entidad Ejecutora UMV
12/06/2025	20251920066631	Actualización documento Plan de Adaptación Guía Manejo Ambiental PAGA -2025 V4	Entidad Ejecutora UMV
27/06/2025	20251920081391	Respuesta oficio 186-1-696 Ecovias SAS. Radicado UMV No 20251120094262	Entidad Ejecutora UMV
04/06/2025	CEV/22-407	Informe Mensual Ambiental No 19 – V1	Consorcio Estabilización Vial
13/06/2025	CEV/22-417	Respuesta oficio 186-1-520 Informe mensual ambiental No 15 V2	Consorcio Estabilización Vial
13/06/2025	CEV/22-416	Respuesta oficio 186-1- 692 Informe mensual ambiental No 19 V2	Consorcio Estabilización Vial
20/06/2025	CEV/22-422	Respuesta oficio 186-1-264 Informes Ambientales	Consorcio Estabilización Vial
10/06/2025	D-26-2025-37	Entrega del Plan de Adaptación de la guía ambiental PAGA v3-2025	Consorcio Gaviones 95
17/06/2025	D-29-2025-37	Respuesta comunicado 186-1-637, entrega de informe ambiental No 13 abril 2025 V2	Consorcio Gaviones 95
17/06/2025	D-31-2025-37	Entrega de informe ambiental No 14 V1, mayo d e2024	Consorcio Gaviones 95

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITIDA A**
18/06/2025	D-32-2025-37	Respuesta comunicado 186-1-663, informes mensuales componente ambiental	Consorcio Gaviones 95

Fuente: Ecovias

A continuación, se presenta un listado de todos los anexos que hacen parte del informe mensual No. 29 de actividades de interventoría para dar cumplimiento a satisfacción del seguimiento, control y verificación a la ejecución de los contratos de obra 478/479 de 2022 y el de la Entidad Ejecutora UAERMV.

Anexo No 1 Registro de Bitácora

Anexo No 2 Calificaciones mensuales (listas de chequeo)

Anexo No 3 Actas componente ambiental

Anexo No 4 Correspondencia enviada / Correspondencia Recibida

9. CONCLUSIONES

- Durante el periodo de este informe, la UMV cuenta con tres campamentos de obra ubicados en cada uno de los frentes de intervención: La unión-tunales; Capitolio y San Antonio.
- Durante el periodo de este informe, el Consorcio Estabilización vial cuenta con dos campamentos de obra ubicados en cada uno de los frentes de intervención: La unión-tunales y San Antonio.
- Durante el periodo de este informe, el Consorcio Gaviones 95 cuenta con un campamento de obra ubicado en el frente de intervención laguna Verde.
- En el periodo no se realizó disposición de Residuos Peligrosos de parte de ningún contratista ni entidad Ejecutora UMV.
- Interventoría llevó a cabo jornadas de inspección y seguimiento en el frente de obra y campamentos de la UMV, Consorcio Estabilización vial y consorcio Gaviones 95 con el fin de verificar las actividades del componente ambiental.
- Interventoría realiza la verificación de los vehículos y maquinaria presentes en obra y el diligenciamiento de los preoperacionales de estos equipos, junto con el componente SST.
- Se realiza el seguimiento y acompañamiento a diferentes actividades realizadas por la entidad ejecutora y Contratistas en cada uno de los frentes de obra activos en el periodo.
- Se requirió a la Entidad Ejecutora para que implemente todas las medidas de manejo

ambiental descritas en las fichas PAGA en cuanto a acopios de materiales pétreos y RCD.

- Se solicito a la Entidad ejecutora evacuar los residuos de excavación depositados en acopios temporales hacia sitios de disposición final autorizados en el menor tiempo posible con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la ficha de manejo respectiva, lo anterior debido a que en el periodo se evidencio acopios en obra que superaban el tiempo máximo permitido que son 72 horas.
- Se requirió al Consorcio Estabilización vial para que implemente todas las medidas de manejo ambiental descritas en las fichas PAGA en cuanto a acopios de materiales pétreos y RCD.
- Se verifico el diligenciamiento de la planilla de control de residuos sólidos, registro que es fundamental para el cálculo de los indicadores de cumplimiento descritos en la ficha de manejo ambiental respectiva de parte de la entidad ejecutora, respecto a los contratistas se genera una tabla dentro del informe donde se discrimina las cantidades de residuos generados.
- La Entidad ejecutora y Contratistas entregaron la actualización del Plan de adaptación de la guía ambiental PAGA conforme a los nuevos tiempos establecidos para terminación de los contratos y nueva ampliación de los permisos de ocupación de cause.
- Interventoría llevó a cabo jornadas de inspección y seguimiento en los frentes de obra y campamentos de la UMV, Consorcio Estabilización Vial y Consorcio Gaviones con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas de manejo del componente ambiental.
- Durante el periodo del presente informe, Interventoría se encargó de verificar la gestión de los residuos sólidos generados en el frente de obra y el campamento de los contratistas y entidad ejecutora.
- Para el periodo se requirió a la entidad ejecutora mejorar en cuanto a las medidas de manejo ambiental que se toman durante la actividad de suministro de combustible ya que se evidenciaron derrames en los frentes San Antonio y Capitolio.
- Durante el periodo se evidencio implementación de PMT de parte de la entidad ejecutora UMV y Consorcio Estabilización vial en los tramos en intervención a su cargo, respecto al Consorcio Gaviones 95 no se evidencio implementación de PMT aprobado por SDM en el tramo en intervención Laguna verde, lo cual fue solicitado en recorrido de inspección por el frente de obra.
- En el periodo se registraron derrames de combustibles en el tramo Capitolio y San Antonio a cargo de la entidad ejecutora UMV una vez informados se tomaron las medias respectivas necesarias para recolectar por medio de material absorbente y retiro del terreno contaminado, almacenando los RESPEL para realizar la disposición final por medio de gestor autorizado, en cuanto a los contratistas no se evidenciaron derrames en el periodo.

- Se evidencio el cumplimiento de los cronogramas de capacitación presentados, los soportes de esta actividad se encuentran en el informe de la entidad ejecutora y cada uno de los contratistas del presente periodo.
- Respecto al estado de los informes de la entidad ejecutora UMV el informe No 12 de mayo de 2025 se encuentra con observaciones comunicado 186-1-693, este no ha sido entregado con los ajustes requeridos. El informe No 13 de junio de 2025 fue entregado el día 05 de julio, se encuentra en revisión por parte de interventoría y se emitirán las observaciones respectivas.
- En cuanto a los informes del Consorcio estabilización vial, el informe No 19 de mayo de 2025 se encuentra aprobado por parte de interventoría mediante oficio 186-1-712. El informe No 20 de junio de 2025 fue remitido el día 08 de julio, se encuentra en revisión por parte de interventoría y se realizaran las observaciones respectivas.
- En relación a los informes del Consorcio Gaviones 95, el informe No 14 de mayo de 2025 se encuentra aprobado por parte de interventoría mediante oficio 186-1-715. El informe No 15 de junio de 2025 no ha sido entregado por parte del consorcio.

ANEXOS COMPONENTE AMBIENTAL

A. 1

REGISTRO DE BITACORA

BITACORA ENTIDAD EJECUTORA UMV

01-06-2025 Toldo:

Se realizan actividades constructivas, se evidencia implementacion de PMT, campamento completo, acopio de Respel organizado con sus respectivos rotulos. Al finalizar jornada se deja encaurana señalizada.

Yesenia H R Jessica Pada Vidal P.

02-06-2025 Toldo:

Se realizan actividades de instalación de fresado estabilizado, PMT implementado correctamente. Se evidencia carpa dotada con Kit antiderrame, Punto ecologico organizado, Señalización en sitio. Se indica dejar cubiertos y señalizados los acopios de RCDs.

Yesenia H R. Jessica Pada Vidal P.

03-06-2025 Capitolio:

Se realiza acompañamiento en la aplicación de emulsión asfaltica implementando plasticos en los laterales con el fin de evitar salpicaduras a la cobertura vegetal. Se realizo jornada de orden y aseo. Se evidencia Punto ecologico organizado y dique con sus respectivos rotulos, campamento dotado. Hoy se les realiza mantenimiento a los baterias Sanitarias. Implementación del PMT. Al Finalizar la jornada se realiza la protección de los acopios.

Yesenia HR Jessica Pada Vidal R.

Powered by CamScanner

04-06-2025 Toldo:
En el Frente de obra se evidencia la implementación de PMT con sus respectivas auxiliares de trafico. Se indica al inspector realizar jornada de orden y aseo. Limpieza de la alcantarilla ubicada en el K3+100 para Posterior Colocar la Polisombra con el fin de evitar el arrastre de Material. los Residuos Solidos fueron entregados a la empresa recolectora para la disposición final; Punto ecologico ordenado. Es necesario continuar con la evacuación de RCD hacia sitio de disposición final y mantener acopios con medidas de manejo
Yerenica HR Jessica Pabo Vidal P.

05-06-2025
se realiza recorrido a los frentes de obra San Antonio y Union tunales, donde se evidencia en San Antonio en el acopio del Km 3+100 se requiere recolectar el material petreo y retirar el RCD que procedieron a paisajear o conformar, Es necesario retirar EL RCD ubicado al costado de la via en este mismo Km, en sitio se evidencia 3 USP, 2 caipas, 1 punto ecologico y 1 Kit contra 2 de derrames. Se realiza participacion en comite integral con el fin de realizar seguimiento a las actividades realizadas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva.
Yerenica HR Jessica Pabo Vidal P.

06-06-2025 tunales
En recorrido se evidencia material de excavación RCD acopiado en el Km 1+300 aguas abajo de la via, se solicita para el fin de semana dejarlo en adecuadas condiciones de señalización, delimitación y cubrimiento, adicional que se solicita evacuar este residuo hacia sitio de disposición final en el menor tiempo posible y dejar el area en adecuadas condiciones de orden, aseo y conformación.

Powered by CamScanner

Capitolio: Se realiza lavanda de limpieza del cauce de la fuente hídrica. Según informa la profesional Ambiental de la UMV, se deja registro fotográfico de evidencia. En el área cuentan con un campamento temporal y USP (2) identificada por sexo, PMT correctamente implementado.
Novedad HSE. Jessica Paola Vidal P.

07-06-2025
La entidad Ejecutor no realizo actividades constructivas
Novedad HSE Jessica Paola Vidal P.

08-06-2025
La entidad Ejecutor no realizo actividades constructivas
Novedad HSE. Jessica Paola Vidal P.

09-06-2025 Capitolio
En recorrido de obra se evidencia PMT correctamente implementado con Auxiliar trafico, barricada y señales Verticales. Se requiere al contratista de maquinaria quien se encontraba haciendo arreglos de máquina Vaiada (Retro y Volqueta) para que coloque plástico debajo del (equipo) para evitar contaminación del suelo y agua superficial por derrame de (combustibles y aceite), ya que se encontraban realizando estos arreglos muy cerca de un cuerpo de agua; Se coordina con la profesional para realizar una verificación en sitio de la limpieza del cauce realizado a la fuente hídrica del Km 1+800. Se cuentan con 2 USP en el frente activas, se evidencian acopio cubiertos y delimitado Km 3+550; se requiere adelantar la señalización de la alcantarilla del Km 0+800 y evacuar el RCD que se encuentra allí desde el día que realizaron la acción de movilidad. Se evidencia que colocaron aislamiento de alcantarilla con polisombra en el Km 3+500, es necesario que se continue con esta actividad en el resto de alcantarilla que se encuentran en el frente
Novedad HSE. Jessica Paola Vidal P.

Powered by CamScanner

10-06-2025 · Jueves ·
En recorrido se evidencia limpieza de alcantarilla colmatado aún permanece acopio de RCD sobre la vía en K1+150. esta parcialmente cubierto y señalización en el piso, por lo cual se requiere adecuación y evacuación de estos residuos hacia sitio de disposición final autorizado.
Acopio de Unión cubierto y señalizado. Se requiere generar una jornada para evacuar el RCD que se encuentra en diferentes puntos e ir limpiando acopios para proceder con la entrega. En el tramo se evidencia punto ecológico organizado y 2 USP.
Yorenia HR. Jessica Paola Vidal P.

11-06-2025 Sun Antero
Se realiza recorrido con el fin de identificar las alcantarilla que aún cuentan con permiso de ocupacion de cauce se inicia desde el tramo abscisa K61900, donde se alcanzan a identificar 2 con POC. 1) K4+302 Se evidencia que no para una fuente hídrica, es una alcantarilla existente que requiere recalce; 2) K3+842 se evidencia que para una fuente hídrica innominada, es una estructura existente que requiere recalce en ambos costados. el recorrido llego hasta este punto y se continuara la proxima semana. Se realiza participación en reunión con comunidad, UMV, alcalde, supervisor del fondo de desarrollo rural del Sumapaz.
Yorenia HR. Jessica Paola Vidal P.

12-06-2025 · Jueves
Se realiza recorrido de obra donde se evidencian acopios de RCD sin medidas de manejo, se solicita a la residente el retiro de estos residuos ya que estan en sectores donde la UMV ya realizo la actividades constructivas. Se evidencia retiro de RCD del acopio ubicado en el K1+150 tramo 5, Se evidencia PMT correctamente implementado.

con auxiliares de trafico en sitio y señales verticales instaladas. campamento con elementos necesarios Kit control de derrames Kit de emergencias, punto ecologico y cartelera informativa en sitio.
Yerenia HR. Jessica Pada Vidal P.

13-06-2025
Se realiza participacion en comite integral con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva.
Se lleva a cabo la revision por parte de interventoria del oficio 20251920066631 donde la UTM realiza la entrega del PAGA actualizado.
Yerenia HR. Jessica Pada Vidal P.

14-06-2025
La Entidad Ejecutora no realizo actividades Constructivas
Yerenia HR. Jessica Pada Vidal P.

15-06-2025
La Entidad Ejecutora no realizo actividades Constructivas.
Yerenia HR. Jessica Pada Vidal P.

16-06-2025 Capitolio.
Se realiza revisión del frente de obra donde se evidencia señalización de acceso deteriorada, USP en sitio con mantenimiento periodico, se procede a realizar verificación de campamento movil donde se encuentra Kit control de derrames en sitio y punto ecologico Organizados se evidencia etiquetado de canecas de productos quimicos. La interventoria desarrolla revisión de la actualización del PAGA V4. del cual se procede a emitir oficio de aval.
Yerenia HR. Jessica Pada Vidal P.

Powered by CamScanner

17/06/2025 Tunales
se realiza recorrido donde se evidencia PMT correctamente implementado, con auxiliares de trafico en sitio, se identifican dos acopios uno en tramo 2 y otro en tramo 3 sin medidas de manejo, lo anterior fue comunicado a la profesional de la UMT para que se tomen las medidas correctivas pertinentes, en el tramo se mantiene punto ecologico Organizado, kit control de derrames completo, 2 unidades Sanitarias portatiles USP y campamento movil.
Yerenia HR. Jessica Peña Vidal P.

18-06-2025 San Antonio
Se realiza recorrido de obra con el fin de identificar estructura (alcantarilla) con permiso de ocupación de cauce POC, en total se verifican 7 estructura existente en el tramo todo a Cargo del Contratista Estabilización Viab. Con respecto al tramo San Antonio no se logro realizar la identificación debido a que aún en este frente no se ha realizado el abscisado respectivo.
de la actividad anterior se procede a levanta acta respectiva. Se solicita retiro de PCD del tramo.
Yerenia HR. Jessica Peña Vidal P.

19-06-2024. Tunales
Se realiza recorrido donde se evidencia protección de alcantarilla ubicada en el tramo 5 al igual que ejemplar de limpieza, caipa Organizado, punto ecologico ubicado correctamente, 2 unidades Sanitarias activas, se evidencia que fue evaluado completamente el PCD acopiado en la parte baja sobre la via, acopio de tramo 3 permanece con medidas de manejo.
Capatolio: Se evidencia jornada de adecuación de acopios, señalización y cubrimiento, PMT correctamente implementado con señales verticales y auxiliares de trafico ejecutando sus funciones, caipa en sitio

dotada con elementos necesarios.
Se realiza participación en comité integral con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se dexiben los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva
Yerenia HR. Jessica Paola Vidal P.

20-06-2025 Capitolio
Se realiza recorrido de obra, donde se evidencia 2 USP en sitio, personal de manejo de tráfico con elementos necesarios y en el lugar de labores, señalización vertical instalada, alcapios de petreos con medida de manejo, se requiere adecuación de ajustes alcapios ubicados a lo largo del tramo, durante el recorrido se evidencio una motocicleta realizando señalización y cubrimiento de alcapios, se solicita no colocar alcapios de RCD donde se obstruya el drenaje natural del agua (invadiendo la cuneta) o adecuar la zona para evitar que el agua se conduzca hacia la vía, se requiere mejorar señalización de alcantarilla del km 0+480.
Yerenia HR. Jessica Paola Vidal P

21-06-2025
La Entidad ejecutora no realizo actividades constructivas
Yerenia HR Jessica Paola Vidal P.

22-06-2025 23-06-2025
La Entidad Ejecutora no realizo actividades Constructivas.
Yerenia HR. Jessica Paola Vidal P

24-06-2025 San Antonio
Se evidencia alcapios que requieren adecuación, de igual manera se recomienda evacuar el RCD acopiado en diferentes puntos y que superan los tiempos maximos de permanencia en sitio, no han adecuado el area de

acopio ubicado en el K 3+200 donde se encuentra el campamento, se espera la fecha en la cual se pueda hacer el acompañamiento al proceso de suministro de combustible. en el sitio permanece campamento instalado con los elementos requeridos.
Yerenia tlk Jessica Pada Vidal P.

25-06-2025 tunales
En recorrido realizado se evidencia PMT correctamente implementado con señales verticales y auxiliares de trafico, se evidencia acopio ubicado en el Colegio señalizado, 2 USP en sitio, Campamento movil con elementos necesarios, delimitación de alguna alcantarillas.
Capitolio: se requiere adecuación de acopio ubicado en el K3+900, se evidencia RCD evacuando del tramo, de igual manera se solicita de inspector dejar los acopios correctamente delimitados y cubiertos, carpa en adecuadas condiciones de Orden y aseo, con punto ecologico, kit control de derrames y 2 USP; PMT implementado.
Yerenia tlk Jessica Pada Vidal P.

26-06-2025.
Se evidencia mantenimiento a las baterias sanitarias en los tres frentes de obra activos
Unión Tunales: Limpieza de alcantarilla y brinzales de eucalipto. Se evidencia que los acopios de materiales granulares cumplen con las medidas de manejo Ambiental, instalación de PMT y tramo en orden y aseo. —
Tolda: Se inicia actividad de cubrimiento y demarcación de acopios de material granular y RCDs. Se realiza atención inmediato de derrame ocasionado por volqueta sencilla del contratista de maquinaria haciendo uso de paños absorbentes y retiro de material contaminado depositado en bolsa roja. Asi mismo se indica realizar jornada de orden y aseo al interior.
Yerenia tlk Jessica Pada Vidal P.

Powered by CamScanner

27-06-2025 Capitolo.
Se realiza cubrimiento y demarcacion de acopios de materiales Petreos y RCDs., Campamento en Orden y Kit de derrames en sitio San Antonio: Se evidencian varios acopios de RCD ubicados al costado de via los cuales requieren adecuacion y evacuacion hacia sitio de disposicion autorizado y a que en su mayoria supera el tiempo maximo de permanencia en obra, de igual manera se solicita la adecuacion de acopios de petreos.
Yerenia HR Jessica Paola Vidal P.

28-06-2025
La entidad ejecutora no realizo actividades constructivas.
Yerenia HR Jessica Paola Vidal P.

29-06-2025
La entidad ejecutora no realizo actividades constructivas.
Yerenia HR Jessica Paola Vidal P.

30-06-2025
La entidad ejecutora no realizo actividades constructivas.
Yerenia HR Jessica Paola Vidal P.

Powered by CamScanner

BITACORA
CONSORCIO
ESTABILIZACION VIAL

01-06-2025

No se desarrollan actividades por parte del contratista de obra

Jornada HR.

02-06-2025

No se desarrollan actividades por parte del contratista de obra

Jornada HR

03-06-2025 turno 01.
En recorrido de obra se evidencia personal desarrollando actividades en sitio. Permanece campamento con los elementos requeridos kit control de derrames, punto ecológico que requiere organización, kit de emergencia y cartelera informativa, el PMT se encuentra correctamente implementado con las señales verticales según planos aprobados por SDM y auxiliares de tráfico ejerciendo su función. los residuos de alcantarilla no han sido evacuados. Se recomienda colocar el material producto de las excavaciones en el ataque de las cunetas fundidas con el fin de ir limpiando los predios privados.
Yerenia HR Ruiz CEV Lorena Gomez

04-06-2025 San Antonio
Se verifica permanencia en frente de obra de campamento temporal, con elementos como kit control de derrames, kit de emergencia, punto ecológico. Se evidencia PMT correctamente implementado con dos aux tráfico en sitio, señalización vertical movil en el área, se recomienda mantener orden y aseo en el área de campamento y frente de trabajo de igual manera que las vías permanezcan cubiertas señalizadas y delimitadas.
Yerenia HR. Ruiz CEV Lorena Gomez

05-06-2025
Se realiza recorrido a los frentes de obra San Antonio y Unión turnales como parte integral del desarrollo del Comité, en donde se evidencia personal de tráfico en sitio y campamento con elementos adecuados. Se realiza participación en Comité integral con el fin de realizar seguimiento a las actividades realizadas, por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva
Yerenia HR. Ruiz CEV Lorena Gomez

Powered by CamScanner

06-06-2025 Tunales.
En recorrido se recomienda al inspector utilizar el material producto de la excavaciones en los llenos detras de la cuneta, con el fin de ir limpiando las areas donde se ha colocado este material. Se evidencia acopio de material sin señalizar e invadiendo parte de la via. Se solicita jornada de Orden y aseo ya que se evidencian bolsa de cemento inadecuadamente dispuestas. Lorena Gómez
Yerenia HR. CGV

07-06-2025 San Antonio
Se realizan trabajos de adecuaciones de cunetas y en alcantarilla del K1+150 en armado de hierros y formaletas. Se evidencia un campamento movil implementado con los elementos necesarios.
Yerenia HR CGV Lorena Gómez

08-06-2025 San Antonio
El Contratista continua con la actividad de instalación de formaleta en el Km 1+150 para la posterior fundida de la alcantarillas, se evidencia acopio de arena y grava que requiere adecuación de la delimitación y cubrir al terminar la jornada.
Yerenia HR. CGV Lorena Gómez

09-06-2025 Tunales.
Se realiza recorrido donde se evidencia un acopio de postes que requiere adecuación, mejorar delimitación con cinta y cubrimiento con material impermeable. se evidencia que el acopio ubicado en el Km 4+710 sin la adecuación requerida en comite de obra, es necesario implemetar las medidas de manejo ambiental requeridas para los acopios, de igual forma en sitio se evidencia PMT correctamente implementado con la señalización y personal de manejo de transito en sitio.
Yerenia HR. CGV Lorena Gómez

Powered by CamScanner

10-06-2025 · San Antonio
En recorrido de obra se evidencia campamento movil implementado con kit control de derrames organizado, punto ecologico con bolsas, se requiere la tapa de la caneca blanca, se evidencia señalizacion instalada en esta area. los acopios que se encuentran al lado de la calpa requieren adecuacion de delimitacion y cubrimiento. PMT correctamente implementado. se requiere colocar contencion en abajo del Km 4+740.
Jesenia HR. [signature] [signature] [signature]

11-06-2025 · tunales.
aun se evidencia residuos de alcantarilla sin evacuar. se reitera la necesidad de emplear el material de excavacion ubicado en los predios para el lleno de las cunetas, el contratista remite el informe No 15 para revision, se responde correo indicando que es necesario que adjunten oficio remisorio para proceder a dar respuesta con el concepto respectivo. Es necesario que se proceda con el aislamiento de la alcantarilla que se encuentra a cargo del consorcio. se requiere que se efectue la adecuacion de los acopios implementados en el tramo.
Jesenia HR. [signature] [signature] [signature]

12-06-2025 San Antonio
se realiza recorrido donde se evidencia que el acopio del K 4+800 continua sin adecuar, se solicita cubrir los RCD que se encuentran al lado del campamento movil, es necesario mantener organizado el punto ecologico, kit control de derrames en sitio, señalizacion de acopios instalada, no se evidencia PMT con controladores de trafico, respecto a los informes semanales se encuentran enviados a la fecha todos, del informe mensual de mayo se realizo entrega y se remitieron observaciones
Jesenia HR. [signature] [signature] [signature]

13-06-2025 +
Se desarrolla mesa de trabajo con la profesional Ambiental de la Consorcio con el fin de Verificar estado de informes mensuales y establecer fechas de entrega., inicialmente se revisan los informes del 3 al 9 Segun requerimiento de oficio 186-1-264 del 9 de agosto.
se lleva a cabo participación en el comite integral con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrollada por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas. los cuales quedan registrados en el acta respectiva
Jerenia HR. [signature] [signature] Lorena Gómez

14-06-2025
Se evidencia desarrollo de actividades en los dos frentes de obra, donde se encuentra campamento movil con elementos requeridos desde el area ambiental.
Jerenia HR. [signature] [signature] Lorena Gomez

15-06-2025 tunala
Se Verifica la permanencia en sitio de Kit control de derrames, Kit de Emergencia, punto Ecologico, area de almacenamiento de RESPEL organizada en general se recomienda al termino la jornada laboral deja adecuadas condiciones de Orden y aseo del frente de obra, materiales cubiertos y señalizados.
Jerenia HR [signature] [signature] Lorena Gómez

16-06-2025 San Antonio.
En recorrido de obra se evidencia la Calpa movil implementada, con Kit control de derrame completo, punto Ecologico que requiere Organizacion, aun falta la tapa de la caneca de color blanco. Kit control de Emergencia en sitio se requiere la adecuacion de ampliar ubicacion al costado de la Calpa, Cubiles

y delimitarlo, organizar acopio de petreos, el cual debe permanecer con medidas de manejo ambiental
Gerencia HA Lorena Gomez

17-06-2015 · Tunales ·
En recorrido de obra se evidencia lo siguiente: Se sugiere almacenar de manera correcta las bolsas de cemento, llevarlas al acopio mientras proceden con la recolección, adecuar punto ecologico, material RCD acopiado en el tramo 2 Km 1+320 se recomienda implementar medida de manejo y retirar que se se caya al cauce. Los demas acopios se evidencian delimitados, señalizados y cubiertos
Gerencia HR. Lorena Gomez

18-06-2025 San Antonio
En el tramo se evidencia que no han recolectado las bolsas de cemento y se mantienen en bolsa roja y otras resultan una correcta almacenamiento. No se ha adecuado el area donde se encontraba el campamento movil, retiro de petreos, el RCD acopiado en el K4+400 no se ha evacuado, se requiere una jornada de orden y aseo general, el punto ecologico no cuenta con tapa para la caneca blanca, no se encuentran auxiliares de trafico, señales verticales instaladas, se requiere incluir medida de manejo para acopio de RCD y petreos.
Gerencia HA Lorena Gomez

19-06-2025 · Tunales ·
En recorrido de verificacion se evidencia PMT correctamente implementado, con auxiliares de trafico y señales verticales el acopio ubicado en el tram 2 K 1+320 aun no ha sido adecuado, en sitio permanece caipa movil con elementos necesarios, las bolsas de cemento fueron acopiadas correctamente
San Antonio: El contratista envio evidencia de delimitacion de acopios, limpieza del area donde desarrollan la fundida, adecuacion de cinchera, señalizacion, limpieza

de alcantarilla y delimitacion de acero.
Participacion en comite integral con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas. por el componente se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva.
Yerenia HR. Lorena Gomez

20-06-2025 San Antonio.
En tramo se evidencia - Campamento movil implementado con punto ecologico, Kit control de derrames, Kit de Emergencias y señalizacion del area. Se solicita adecuar los dos acopios que se encuentran al lado del Campamento. Se evidencia aun el acopio del K5+200 sin retirar ni conformar el area, se requiere organizar el acopio que mantienen activo donde realizan la actividad de fundida, PMT con señales instaladas verticales moviles. Lorena Gomez
Yerenia HR.

21-06-2025 San Antonio
Se requiere adecuacion de acopios que se encuentran al costado de via (cubrimiento y delimitacion)
Yerenia HR Lorena Gomez

22-06-2025.
No se desarrollan actividades por parte del Contratista de obra
Yerenia HR Lorena Gomez

23-06-2025
No se desarrollan actividades por parte del Contratista de obra
Yerenia HR. Lorena Gomez

24-06-2025 San Antonio
En recorrido de obra se evidencian acopios ubicados en el

K 21500 y 11500 sin medids de manejo, se solicita cubrir y delimitar; es necesario generar una jornada de orden y aseo en el area para recolectar residuos abandonados en el sitio, se tiene el PMT con señales verticales moviles instaladas en sitio. Es necesario adecuar acopios ubicados en el K 4+900 y 5+100.
Gerencia HSE. Lorena Gomez

25-06-2025 Tunales
En recorrido de obra se evidencian acopios señalizados se recomienda adecuar acopio de tramo 2 K 8+900 cubrirlo y señalizarlo, es necesario emplear los materiales producto de excavación en relleno de cunetas. En campamento movil permanece Kit control de derrames, punto ecologico y Kit de emergencia. PMT correctamente implementado con señales verticales moviles y 2 auxiliares de trafico en sitio ejerciendo sus funciones.
Gerencia HSE Lorena Gomez

26-06-2025 San Antonio
Se realiza recorrido conjunto con la profesional ambiental del Consorcio Estabilizacion vial, donde se encuentra lo siguiente: K 5+100 se solicita retiro de RCD y conformación del sitio, en este mismo punto adecuar area que fue empleada como campamento movil, adecuar acopio de K 4+900 donde se encuentran materiales petreos y RCD. se sugiere organizar el acero que se encuentra en diferentes puntos y señalizarlo. De igual manera adecuar acopios de K 21500 y 11500 cubrir-señalizar y jornada de Orden y aseo en el sitio
Tunales: se realizo recorrido con el acompañamiento del area social del Consorcio donde se levanto acta con el señor Luis Alberto Rey propietario del predio donde disponen un RCD que requiere adecuacion, se recomendo emplear el materal producto de los

Excavacion en el ataque de la cuneta, se solicito adava acopo de petreo tramo 2 K 01800.
Yerenia HR. Lorena Gomez

27-06-2025
Se realiza revisu por parte de interventoria de la informes mensuales remitidos por el contratista No 1 al No 10, donde de evidencia que fueron subsanadas la observacions. sin embargo solo queda pendiente la entrega del informe No 3 con el ajuste solicitado. de acuerdo a lo anterior la interventoria procede a realiza el oficio rapectivo de concepto de los informs entregados.
Se realiza participain en comite integral con el fin de realiza seguimiento a la actividades desarrolladas por el componente se describen los compromisos y se desarrolla otros temas los cuales queden registrados en el acta respectiva.
Yerenia HR. Lorena Gomez

28-06-2025 San Antonio - toralej.
En recorrido se evidencia campamento movil en sito con elementa necesarios, kit control de derrames y punto ecologico Organizado
Yerenia HR Lorena Gomez

29-06-2025.
No se desarrollan actividades por parte del Contratista de Obra
Yerenia HR. Lorena Gomez

30-06-2025
No se desarrollan actividades por parte del contratista de obra
Yerenia HR. Lorena Gomez

Powered by CamScanner

BITACORA
CONSORCIO GAVIONES
95

01-06-2025

No se desarrollaron actividades constructivas por parte del Contratista de obra

Yeremia HR. CesarDelgado

02-06-2025

No se desarrollaron actividades constructivas por parte del Contratista de obra.

Yeremia HR. CesarDelgado.

03-06-2025

Se realizan actividades de replanteo topografico en el frente de obra laguna Verde.

Yeremia HR CesarDelgado

Powered by CamScanner

04-06-2025
Se realiza recorrido por los tramos Laguna Verde y Capitolio con el fin de verificar el inicio de las actividades en el tramo Capitolio, se identifica el estado actual de alcantarilla intervenida para proceder con las actividades constructivas.
Yerenia HR. Cesar Delgado

05-06-2026.
Se realizan actividades de replanteo topografico en el frente de obra laguna Verde.
Yerenia HR Cesar Delgado

06-06-2026.
Se realizan actividades de replanteo topografico en el frente de obra laguna Verde: Participacion en comite integral.
Yerenia HR Cesar Delgado

07-06-2026.
Se realizan actividades de replanteo topografico en el frente de obra laguna Verde
Yerenia HR. Cesar Delgado

08-06-2026
Se realizan actividades de replanteo topografico en el frente laguna Verde.
Yerenia HR Cesar Delgado.

09-06-2026.
Se realiza mesa de trabajo con el profesional ambiental del Consorcio Gaviones, donde se realiza revision de los ajustes de los informes mensuales del 01 al 12. se verifica el informe No 13 con los ajustes solicitados. el contratista informa que fueron enviados los informes semanales pendientes, de esta revision se procedio a levantar acta
Yerenia HR Cesar Delgado

A.

10-06-2025
Se realiza revisión de informe semanal enviado por el contratista, se requiere que este sean generado desde la primer semana de abril. En el frente de obra laguna Verde se continua con actividades de replanteo topografico De igual manera el profesional del Contratista trabajo en la entrega de informe mensual Mayo 2025 y ajuste del mensual de abril de 2025
Yerenia HR. Coor Delgado

11-06-2025
En el frente laguna Verde se continua con actividades de replanteo topografico.
Yerenia HR. Coor Delgado

12-06-2025
En el frente laguna Verde se realizan actividades de replanteo topografico
Yerenia HR. Coor Delgado

13-06-2025
El contratista realize adecuacion de acopio de materiales petreos, replanteo topografico.
Yerenia HR Coor Delgado.

14-06-2025
No se desarrollan actividades constructivas por parte del contratista de obra.
Yerenia HR. Coor Delgado

15-06-2025
No se desarrollan actividades constructivas por parte del contratista de obra
Yerenia HR. Coor Delgado

Powered by CamScanner

16-06-2025 Laguna Verde
El Contratista realiza la entrega del informe semanal y la interventora desarrolla la revisión respectiva, igualmente se realiza la revisión del PAGA 13 remitido del cual se procede a emitir oficio de aval al mismo
Yerenia HR Coordinador.

17-06-2025 Laguna Verde
En el frente de obra laguna Verde se continua con actividades de replanteo topografico, adecuación de acopio.
Yerenia HR Coordinador.

18-06-2025 Laguna Verde
El Contratista realize delimtación de alcantarilla que se encuentran en el tramo en intervención, y adecuación de acopio.
Yerenia HR Coordinador

19-06-2025 Laguna Verde
El Contratista continua con el proceso de delimtación de alcantarilla, y realiza delimitación de materiales en el frente de obra
Yerenia HR Coordinador.

20-06-2025 Laguna Verde
adecuación de caipa movil, donde se ubican los elementos de emergencia, camilla, botiquin, extintor, se continua con labores de replanteo de obra hidraulica proyectadas de igual manera se realiza tratamiento de materiales petreos en el frente obra.
Yerenia trabajando Coordinador

21-06 2025 · Laguna Verde
se realiza actividad de replanteo de obra hidraulica, señalizacion de materiales en el frente de obra. (y orden y aseo en el area de trabajo.
Yenia HR. Cesar Delgado.

22-06-2025 Laguna Verde
El contratista realiza adecuacion de acopio de materiales petreos, se continua con la actividad de replanteo de obra hidraulica proyectada.
Yenia HR Cesar Delgado

23-06-2025 Laguna Verde
El contratista realiza capacitacion en dosificacion de sustancias quimicas, se mantiene la señalizacion de acopio de petreos (triturados), capa movil en sitio con kit control de emergencia, se continua con la actividad de replanteo de obra hidraulica proyectada.
Yenia HR Cesar Delgado

24-06-2025 · Laguna Verde
Se mantiene campamento movil en sitio con elementos necesarios, se evidencia alcantarilla delimitada con polisombra y señalizacion del area de intervencion con fertro.
Yenia HR Cesar Delgado

25-06-2025 Laguna Verde
Se evidencia adecuacion de acopio de materiales petreos, se continua con transiego de materiales para relleno de filtro, se continua con la actividad de replanteo de estructura Hidraulica,
Yenia HR Cesar Delgado.

26-06-2025 · Laguna Verde
En recorrido de obra realizado se evidencia adecuacion de area para acopio de RCD,

se evidencian 2 equipos en el frente de obra, Retrocargador y retroexcavadora, continuan con actividad de riego de material fluidado, campamento movil en sitio con Kit de emergencia, el Kit control de derrame se encuentra en la oficina de obra, se encuentra delimitada la excavación y se solicita la instalación de señales informativas. en Caipal y acopios, se evidencian todas las alcantarillas protegidas y aisladas con polisombra.
Yerenia HR. Cesar Delgado

27-06-2025
Se realiza participación en comite integral con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente y se describen los compromisos y se desarrollan otros temas, los cuales quedan registrados en el acta respectiva.
En el frente se mantiene la delimitación de alcantarilla. informes semanales han sido entregados de manera periodica y el contratista se encuentra al dia en la generación y entrega de estos productos.
Yerenia HA Cesar Delgado

28-06-2025
No se desarrollan actividades constructivas por parte del contratista de obra
Yerenia HR. Cesar Delgado

29-06-2025
No se desarrollan actividades constructiva por parte del Contratista de obra.
Yerenia HR Cesar Delgado

30-06-2025
No se desarrollan actividades constructiva por parte del contratista de obra
Yerenia HR. Cesar Delgado

Powered by CamScanner

A. 2

REGISTROS CALIFICACION MENSUAL AMBIENTAL

CALIFICACION MENSUAL ENTIDAD EJECUTORA UMV

BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ	**CONTRATO DE OBRA 479 DE 2022 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.) suscrito con la UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022**	ECOVIAS SAS

FECHA ELABORACION: 01/07/2025 CALIFICACION COMPONENTE AMBIENTAL

PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 ENTIDAD EJECUTORA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CALIFICACION
		100%	50%	0,0%	N/A	
Programa 1 Gestión del proyecto						
1	El personal ambiental permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal ambiental cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional ambiental asistió a los comités de seguimiento integral y social a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
5	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecida en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
6	Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
7	Se cuenta con los permisos ambientales requeridos para la realización de las actividades en obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 2 Manejo de actividades constructivas						
8	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
9	Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
10	Los RCD se evacuan hacia sitio de disposicion en el tiempo indicado en el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
11	El campamento de obra y sitios temporales cuentan con la señalizacion, preventiva, informativa y de emergencia de acuerdo a lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
12	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
13	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
14	Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
15	Se cuenta con todos los certificados de disposición de escombros RCD.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
16	Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO Aprovechables, no aprovechables y reciclables.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

17	Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
18	Se cuenta con puntos ecológicos organizados, limpios, señalizados, cubiertos y en adecuadas condiciones.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
19	Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
20	Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición final de los RESPEL gestionados en el presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
21	Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
22	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
Programa 3 Gestión hídrica						
23	Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal, ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
24	Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
25	Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
26	Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
27	Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
28	Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
29	Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
30	Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
Programa 4 Biodiversidad y servicios ecosistémicos						
31	Se respeta el 100% de las rondas de protección de fuentes hídricas	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
32	La instalación de infraestructura como campamentos, equipos, maquinaria o materiales no se realiza cerca a los cuerpos de agua superficiales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
33	Los vehículos respetan los limites de velocidad en zonas identificadas como mayor probabilidad de atropellar fauna silvestre.	3	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
34	Ningún trabajador del proyecto atenta contra la integridad física de los individuos de fauna encontrados en el área de influencia de la obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 5 Manejo de instalaciones temporales						
35	El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

36	El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias como: Extintores, botiquines, camillas, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
37	El campamento se encuentra debidamente señalizado y ordenado	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
38	El campamento cuenta con punto ecológico.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
39	Se cuenta con los registros de preoperacionales de vehículos y maquinaria correctamente diligenciados	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
40	Se cuenta con los documentos de los equipos que se encuentran en obra y los listados completos de los mismos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
41	Los vehiculos que tranmsportan RCD cuentan con el PIN respectivo	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Reportes						
42	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz, la información del PAGA .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
43	Tiene disponibilidad el Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría de todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
44	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
45	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
46	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	50%
TOTAL CALIFICACIÓN MES DE MAYO						83%

OBSERVACIONES	No aplica para el periodo

	Jessica Hernández Ramírez.
	Profesional Ambiental de Interventoría ECOVIAS SAS
ACEPTÓ	Jessica Paola Uribe P.
	Profesional Ambiental de LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

CALIFICACION MENSUAL

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ	**CONTRATO DE OBRA 479 DE 2022 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.) suscrito con la UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022**	ECOVIAS SAS

FECHA DE ELABORACION: 01/07/2025 CALIFICACION COMPONENTE AMBIENTAL

PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CALIFICACION
		100%	50%	0,0%	N/A	
Programa 1 Gestión del proyecto						
1	El personal ambiental permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal ambiental cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional ambiental asistió a los comités de seguimiento integral y social a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
4	El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
5	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecida en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
6	Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
7	Se cuenta con los permisos ambientales requeridos para la realización de las actividades en obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 2 Manejo de actividades constructivas						
8	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
9	Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
10	Los RCD se evacuan hacia sitio de disposicion en el el tiempo indicado en el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
11	El campamento de obra y sitios temporales cuentan con la señalizacion, preveniva, informativa y de emergencia de acuerdo a lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
12	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
13	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
14	Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
15	Se cuenta con todos los certificados de disposición de escombros RCD.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
16	Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO Aprovechables, no aprovechables y reciclables.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
17	Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
18	Se cuenta con puntos ecológicos organizados, limpios, señalizados, cubiertos y en adecuadas condiciones.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

19	Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
20	Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición final de los RESPEL gestionados en el presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
21	Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
22	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 3 Gestión hídrica						
23	Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal, ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
24	Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
25	Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
26	Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
27	Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
28	Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
29	Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
30	Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 4 Biodiversidad y servicios ecosistémicos						
31	Se respeta el 100% de las rondas de protección de fuentes hídricas	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
32	La instalación de infraestructura como campamentos, equipos, maquinaria o materiales no se realiza cerca a los cuerpos de agua superficiales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
33	Los vehículos respetan los limites de velocidad en zonas identificadas como mayor probabilidad de atropellar fauna silvestre.	3	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
34	Ningún trabajador del proyecto atenta contra la integridad física de los individuos de fauna encontrados en el área de influencia de la obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 5 Manejo de instalaciones temporales						
35	El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
36	El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias como: Extintores, botiquines, camillas, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
37	El campamento se encuentra debidamente señalizado y ordenado	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
38	El campamento cuenta con punto ecológico.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
39	Se cuenta con los registros de preoperacionales de vehículos y maquinaria correctamente diligenciados	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

40	Se cuenta con los documentos de los equipos que se encuentran en obra y los listados completos de los mismos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
41	Los vehiculos que tranmsportan RCD cuentan con el PIN respectivo	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Reportes						
42	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz, la información del PAGA .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
43	Tiene disponibilidad el Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría de todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
44	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
45	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
46	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	100%
TOTAL CALIFICACIÓN MES DE MAYO						96%

OBSERVACIONES	No aplica para el periodo
ELABORÓ	
	Profesional Ambiental de Interventoría ECOVIAS SAS
ACEPTÓ	
	Profesional Ambiental del CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

CALIFICACION MENSUAL CONSORCIO GAVIONES 95

BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ	**CONTRATO DE OBRA 479 DE 2022 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.) suscrito con la UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022**	ECOVIAS SAS

FECHA DE ELABORACION: 01/07/2025 CALIFICACION COMPONENTE AMBIENTAL

PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CONSORCIO GAVIONES 95

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CALIFICACION
		100%	50%	0,0%	N/A	
Programa 1 Gestión del proyecto						
1	El personal ambiental permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal ambiental cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional ambiental asistió a los comités de seguimiento integral y social a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
5	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecida en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
6	Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
7	Se cuenta con los permisos ambientales requeridos para la realización de las actividades en obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 2 Manejo de actividades constructivas						
8	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
9	Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
10	Los RCD se evacuan hacia sitio de disposicion en el tiempo indicado en el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
11	El campamento de obra y sitios temporales cuentan con la señalizacion, preveniva, informativa y de emergencia de acuerdo a lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
12	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
13	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
14	Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
15	Se cuenta con todos los certificados de disposición de escombros RCD.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
15	Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO Aprovechables, no aprovechables y reciclables.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
17	Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
18	Se cuenta con puntos ecológicos organizados, limpios, señalizados, cubiertos y en adecuadas condiciones.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

19	Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
20	Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición final de los RESPEL gestionados en el presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
21	Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
22	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 3 Gestión hídrica						
23	Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal, ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
24	Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
25	Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
26	Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
27	Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
28	Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
29	Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
30	Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
Programa 4 Biodiversidad y servicios ecosistémicos						
31	Se respeta el 100% de las rondas de protección de fuentes hídricas	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
32	La instalación de infraestructura como campamentos, equipos, maquinaria o materiales no se realiza cerca a los cuerpos de agua superficiales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
33	Los vehículos respetan los limites de velocidad en zonas identificadas como mayor probabilidad de atropellar fauna silvestre.	3	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
34	Ningún trabajador del proyecto atenta contra la integridad física de los individuos de fauna encontrados en el área de influencia de la obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 5 Manejo de instalaciones temporales						
35	El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
36	El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias como: Extintores, botiquines, camillas, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
37	El campamento se encuentra debidamente señalizado y ordenado	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
38	El campamento cuenta con punto ecológico.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
39	Se cuenta con los registros de preoperacionales de vehículos y maquinaria correctamente diligenciados	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

40	Se cuenta con los documentos de los equipos que se encuentran en obra y los listados completos de los mismos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
41	Los vehiculos que tranmsportan RCD cuentan con el PIN respectivo	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Reportes						
42	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz, la información del PAGA .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
43	Tiene disponibilidad el Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría de todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
44	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
45	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
46	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	100%
TOTAL CALIFICACIÓN MES DE MAYO						99%

OBSERVACIONES	No aplica para el periodo
ELABORÓ	
	Profesional Ambiental de Interventoría ECOVIAS SAS
ACEPTÓ	
	Profesional Ambiental del CONSORCIO GAVIONES 95

A. 3

ACTAS COMPONENTE AMBIENTAL

ACTAS COMPONENTE AMBIENTAL ENTIDAD EJECUTORA UMV

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-1029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Mesa de trabajo Componente ambiental Ecovias - UMV.		
Fecha:	06 de Junio de 2025	Hora de inicio: 10:00	Modalidad: X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	Oficina Santana Interventoría	Hora de finalización: 11:00	
Dependencia:	Componente Ambiental	Nombre del Responsable: Yerena Heinanden Ecovias SAS.	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	52784808	Yerena Hernandez R	Prof Ambiental	Interventoría Ecovias SAS			✓							sumapaz.ambiental61@gmail.com - 3...	Yerena H R
CC	1030669188	Jessica Paola Vidal P	Prof Ambiental	UAERMV			x						x	Jessica.vidal@umv.gov.co	Jessica Paola Vidal P.

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y otorga que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3813000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SIVI-3002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/recurso/sistema-integrado-de-gestion-sig

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

se desarrolla mesa de trabajo con la profesional ambiental de la UMV. donde se tratan los siguientes temas).

1. se desarrolla Calificación mensual del componente del periodo del 01 al 31 de Mayo de 2025 donde se obtiene un resultado del ... de cumplimiento. La Lista aplicada contiene los programas descritos en el PAGA. La anterior calificación es aceptada por la UMV quien procede a firmar el registro.

2. La UMV remitio el informe mensual N/o 12 del periodo del 1 - al 31 Mayo del 2025; la interventoria realizara la revisión del documento, una vez se cuente con el concepto este sera remitido a la entidad ejecutora. para los fines respectivos.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Remitir soporte de calificación firmado por todas las partes.	Interventoria-UMV	07-06-2025
2.	Remitir observación informe Mayo	Interventoria	09-06-2025

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el registro de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen trazabilidad.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los avances y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-1029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Mesa de trabajo componente ambiental Ecovig - UMV.		
Fecha:	18 de Junio de 2025.	Hora de inicio: 3:00 pm	Modalidad: X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	Oficina interventoria Santana	Hora de finalización: 4:00 pm	
Dependencia:	Componente ambiental	Nombre del Responsable: Yyenia HR. Ecovig SAS.	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	52784808	Yeienia Hernández M.	Profesional Ambiental	Ecovig SAS			✓						✓	Sumapaz-ambiental. 16@gmail.com	Yyenia HR
CC	1030669188	Jessica Paola Uribe P	Profesional Amb	UAERMV			x						x	Jessica-uribe@umv.gov.co	Jessica Paola Uribe P.

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Renuncia a cualquier reclamación o reclamo que emanado con el tratamiento de sus datos personales pueda ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/temas/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se desarrolla reunión presencial con la profesional ambiental de la UMV donde se tratan los siguientes temas:

1. La interventoría informa que a partir del informe No 12 de Mayo del 2025 para el reporte de RCD, se debe anexar al informe los soportes de vale de entrega a sitio de disposición final, el certificado respectivo y formato que se va a enviar de parte de interventoría.

2. En cuanto a la fecha de manejo de residuos líquidos, Unidades sanitarias Portátiles. La interventoría solicita adjuntar en los informes mensuales los soportes de cumplo de los mantenimientos y el certificado de los mantenimientos y disposición final de los lodos (residuos líquidos)

3. Se requiere que el certificado del proveedor Monte Olivo incluya el periodo de suministro de los materiales.

4. El certificado de la compra de agua para actividades de obra por parte de proveedor autorizado debe adjuntarse en todos los informes.

5. Al verificar los informes mensuales la entidad ejecutora UMV inicio a disponer RCD en sitio autorizado a partir de enero de 2024 informe 7, de lo cual se cuenta con vales de entrega, se recomienda que es importante solicitar y tener los certificados mensuales de disposición emitidos por el sitio autorizado este con ninguna amarillas.

6. Se solicito por parte de interventoría remitir soporte de creación de PIN ambiental

7. Se solicito a UMV, remitir informes mensuales en correos independientes)

8. Algunos soportes de informe se van a manejar más vencido (Soporte de mantenimiento de baños, certificado de proveedores de materiales pétreos, certificado de RCD, certificado de adquisición de agua para actividades de obra)

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Remitir soporte de creación de PIN ambiental	UMV.	19-06-2025

NOTA 1: En caso de no ser una reunión virtual, se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Recorrido de Obra identificación de Estructuras con Permiso de Ocupación cruce PDC.		
Fecha:	18 de Junio de 2025.	Hora de inicio: 7:30	Modalidad: X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	San Antonio - toldo	Hora de finalización: 11:30	
Dependencia:	Componente ambiental	Nombre del Responsable: Yesenia Hernandez - Ecovias SAS.	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1022981808	Yesenia Hernandez A	Profesional Ambiental	Ecovias SAS			-						-	Sumapaz-ambiental. 161@gmail.com	Yesenia HA
CC	1012400416	Brayan Mendoza Diaz	Inspector	Ecovias SAS			X							brayan9306@hotmail	BRAYAN MEN
CC	1030669198	Jessica Paola Vidal P	Profesional Amb	UAESMV			x						a	Jessica.vidal@umv.gov.co	Jessica Paola Vidal P.

CONSENTIMIENTO. Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-SIG-C Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaa.gobiernodigital.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza recorrido con el fin de identificar las estructuras (alcantarillas) que cuentan con permiso de ocupación de cauce en el Tramo San Antonio - Toldo.

1. K 0+100 Estructura existente, no pasa ninguna fuente hídrica, se evidencia que requiere recalce en ambos costados.
2. K 0+196 Estructura existente, se identifica que pasa una fuente hídrica innominada requiere recalce en ambos costados.
3. K 0+285 Estructura existente no se evidencia ninguna fuente hídrica, requiere recalce en ambos costados.
4. K 0+331 Estructura existente no se evidencia ningun cuerpo de agua, requiere recalce en ambos costados.
5. K 1+263. Estructura existente no se evidencia ninguna fuente hídrica, requiere recalce en el costado derecho, se encuentra totalmente colmatada.
6. K 3+842 Estructura existente, se evidencia que pasa una fuente hídrica innominada requiere recalce en ambos costados.
7. K 4+302 Estructura existente no se evidencia ninguna fuente hídrica, requiere recalce en ambos costados.

En total se realizo revision de 7 estructuras segun lo descrito anteriormente, que se encuentran localizadas en el tramo en intervención a cargo del consorcio Estabilización Vial. Es de aclarar que los permisos de ocupación estan vigentes hasta el dia 31 de Diciembre de 2025 sin posibilidad de mas prorrogas.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de no ser esta reunión virtual se puede anexar el registro de asistencia generado por los planillamos de asistencia o planillamos que generen formularios.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

ACTAS COMPONENTE AMBIENTAL CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-FO29
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 76014

Objeto de la reunión:	Mesa de trabajo Componente ambiental Ecovias - Consorcio Estabilización Vial CEV.
Fecha:	06-06-2025
Hora de inicio:	9:00 a m
Hora de finalización:	10:00 am
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	Virtual oficina interventoria Suntona
Dependencia:	Componente Ambiental
Nombre del Responsable:	Yerenia Hernandez Ramirez.

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS (fondico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TECNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	52784808	Yerenia Hernandez	Prof Ambiental	Interventoria Ecovias SAS		.	/							sumapaz.ambiental.161@gmail.com	Yerenia HR
CC	1032388318	Jorge A Gomez P	Prof Ambiental	consorcio Estabilizacion vial			/						/	cnorte@gmail.com	Jorge Gomez

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. Reconoce y acepta que realizar cualquier reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada voluntariamente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, a esta página web en www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver 3(3) - MMO Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/content-integrated-cle-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se desarrolla mesa de trabajo con la profesional ambiental del CEY donde se tratan los siguientes temas:

1. Se desarrolla la calificación mensual del componente del periodo del 01 al 30 de Mayo de 2025, donde se obtiene un resultado del cumplimiento, la lista aplicada contiene los programas descritos en el PAGA, lo anterior calificación es aceptado por el CEY quien procede a firmar el registro.

2. El consorcio remitio el informe mensual No 19 del periodo del 07 al 31 de Mayo de 2025, la interventoría realizara la revisión del mismo una vez se cuente con un concepto sera remitido al contratista. para los fines respectivos.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Remitir calificación con todos los registros de firmas	Interventoría-CEY	06-06-2025
2	Remitir resultado del proceso de Verificación del informe No 19	Interventoría-CEY	09-06-2025

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-029
Versión: 6
Vigencia: 23 de agosto de 2024
Clave: HOLA-30105

Objeto de la reunión:	Mesa de trabajo Componente ambiental Ecovia 7 - Consorcio Estabilización Vial CFV.		
Fecha:	12 de Junio de 2025.	Hora de inicio: 3:00 pm	Modalidad: Presencial / X Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	Virtual Oficina Interventoria Santana	Hora de finalización: 4:00 pm	
Dependencia:	Componente ambiental	Nombre del Responsable: Yelenis Heinahden Ramirez	

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	52784808	Yelenis Heinahden R.	Profesional Ambiental	Interventoria Ecovia SAS			—						—	somapat.ambiental.161@gmail.com	Yelenis HR
CC	1032388748	Lorena AGomez R	Profesional	consorcio Estabilizacion vial			1						1	[illegible] gmail.ms	Lorena Gómez

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, en la página web en www.gobiernobogota.gov.co y en teléfono de atención en 3308330. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sig

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se desarrolla mesa de trabajo con la profesional ambiental del CEV donde se tratan los siguientes temas.

1. Estado de los informes:

se procede a realizar la revisión de la (correcciones) de los informes mensuales del 03 al 09 basada en el oficio 186-1-264.

- Informe No 3 periodo septiembre de 2022 se requiere incluir la certificación del proveedor constituir
- Informe No 2 periodo del 01 al 31 de agosto de 2022 Verificar si el proveedor constituir suministro material en dado caso adjuntar la certificación respectiva.
- Informe No 4 periodo de 01 al 31 octubre de 2022 ajustar el mes reportado en portada y No de informe consecutivo
- Informe No 10 abril de 2023 ajustar el mes reportado en portada e incluir la foto del periodo reportado
- Informes del 03-09 remitidos de manera unificada
- Del informe No 15 y 2 periodo de febrero de 2024, se requiere remitir oficio indicando, que se realizaron los ajustes solicitados mediante oficio 186-1-520 i con el fin de proceder a dar respuesta con el concepto respectivo

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Remitir informes del 01- al 10 ajustados	Contratista	20-06-2025
2	Remitir oficio de respuesta informe No 15 y 2 186-1-520.	Contratista	16-06-2025

NOTA 1: En caso de no ser posible anexar el soporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen certificado.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 23 de agosto de 2024
Cód. TRD/CCA: 7000

Objeto de la reunión:	Recorrido identificacion individuos Arboreo
Fecha:	18 de Junio de 2025
Hora de inicio:	10:30
Hora de finalización:	1:30
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	Tramo 5 Union Torales
Dependencia:	Tecnica - ambiental - forestal.
Nombre del Responsable:	Ecovias – Condicio Estabilización Vial

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1069731169	Richard Betancourt	Ingeniero Residente CEV	CEV			X						X	richardbetancourt-118@gmail.com.	
CC	1022359286	Alejandra Cuasp	Profesional social CEV	CEV			X						X	socialcerrito EVO cevvias	
CC	1026269815	Cristian Camilo Hurtado	Profesional Forestal CEV.	CEV			X						X	Cristian.hurtado@ecovias.com	
CC	79369733	Edgar Solorzano	Ing Residente Ecovias	Ecovias			X						X	ecovias.residente1@gmail.com	
CC	52284808	Jasenia Hernandez A.	Profesional Ambiental	Ecovias SAS										sumapaz.ambiental161@gmail.com	
CC	79962654	Jesús Antonio Pinzón	Residente SST	Ecovias SAS			X							sumapaz.sst.161@gmail.com	
CC	1023019741	Carlos Julio Macana	Inspector Interventoria	Ecovias SAS			X							vacan-642@hotmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Así mismo, acepta que cualquier consulta o reclamo relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevado verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3813000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el mal tratamiento de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para: toma, evidencias, de intervención pedagógica; en determinados casos para el ejercicio de la misión institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver la M. 3869 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en: https://gobiernobogota.gov.co/transparencia/gestion-integridad/atencion-ciudadano

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza recorrido en tramo 5 funcional bajo Abscisa K 01360 a K 01+410 con el profesional forestal del consorcio estabilizacion vial, con el fin de tener un concepto relacionado con la situación que se presenta en este punto con algunos arboles y la posibilidad de un aprovechamiento forestal de individuos arboreos, los cuales luego de verificacion en sitio, se corrobora que se requerira solicitar permiso de aprovechamiento forestal, de individuos aislados frente a la autoridad ambiental competente en este caso la CAR (aproximadamente son 7 individuos), de igual manera el profesional forestal indica que todo arbol que tenga un DAP mayor de 10 cm debe tramitar este permiso, en caso de individuos con menor DAP (Brinsales), se puede dar manejo a través de la ficha de manejo de Vegetacion establecida en el PAGA, lo anterior basado en el Decreto 1076 de 2015, De acuerdo a lo anterior el profesional recomienda Valorar actividades que no requieran aprovechamiento forestal, puesto que el tramite de este tipo de permisos puede tardar entre 6-8 meses.

El profesional forestal de igual manera describe que si se llegara a presentar una Emergencia o contingencia por deslizamiento, caida, derrumbe, etc en este sector y ponga en peligro los arboles, se debe reportar ante la plataforma VITAL en la pagina del ministerio de ambiente. Una vez reportada dicha contingencia se puede entrar a intervenir y talar dichos individuos arboreos, para este reporte se tiene un tiempo maximo de reporte de 24 horas. Es importante mencionar que el anterior reporte debe hacerlo el Titular del proyecto.

El area social realizo acompañamiento a este recorrido, con el fin de realizar gestiones en caso de requerir permiso de aprovechamiento forestal, sin embargo como se expuso anteriormente por el tiempo que tarda este tramite no es viable realizar solicitud.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Recorrido de obra del Componente ambiental Ecovias - Consorcio Estabilización Vial.
Fecha:	26 de Junio de 2025
Hora de inicio:	8:00am
Hora de finalización:	2:00 pm
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	San Antonio - Tunales
Dependencia:	Componente ambiental
Nombre del Responsable:	Yerenia Hernández Ecovia SAS

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	52754808	Yerenia Hernández A	Profesional Ambiental	Ecovias SAS			-						-	ambientalsomapat.1617@gmail.com	Yerenia HA
CC	1032388746	Jorge Andres G	Profesional Amb	Consorcio Estabilización Vial			/						/	andresgpro@gmail	Jorge Andres
CC	1069751169	Richard Betancourt	Residente Amb	CEV			X						X	richardbetancourt11@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAL-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/somma-integrado-de-gestion-sdg


DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza recorrido de obra donde se evidencia lo sgt:

San Antonio: se requiere retirar el RCD del acopio K 5+100 y conformar el sitio
- Es necesario conformar y recoger el material petreo ubicado en K 5+100 donde se encontraba el campamento movil, dejar el area correctamente organizada.
- K 4+900 acopio de petreos y RCD: adecuar el area, organizar materiales
- Se evidencia acopio de RCD ubicado en el actual campamento movil, señalizado y delimitado
- K 2+500 mantener acopio señalizado, delimitado y cubierto. (Se encuentra costado de via)
- K 1+500 mantener acopio señalizado, delimitado y cubierto (Se encuentra costado de via)
- En campamento se encuentra Kit control de derrames y punto ecologico organizado.
- K 2+500 se requiere orden y aseo

Tunales

- Adecuar el acopio ubicado en el predio del Señor Luis Alberto Rey, el area sera del consorcio acompaño el recorrido y procedio a levantar acta con el señor, donde se acordo limpiar o recoger el material y dejarlo correctamente conformado de igual manera informa al propietario que no es posible dejar mas material en el sitio
- Proceder con el relleno de las cunetas con el material acopiado producto de la excavacion en el tramo intervenido
- Se requiere trasladar la bolsa de cemento al acopio temporal.
- Señalizar y cubrir el acopio de petreos que se encuentra a la Entrada del predio donde esta ubicada la Cuba movil de almacenamiento de R-peligrosos.
- Se mantiene en campamento movil Kit control de derrame, punto ecologico y area organizada.

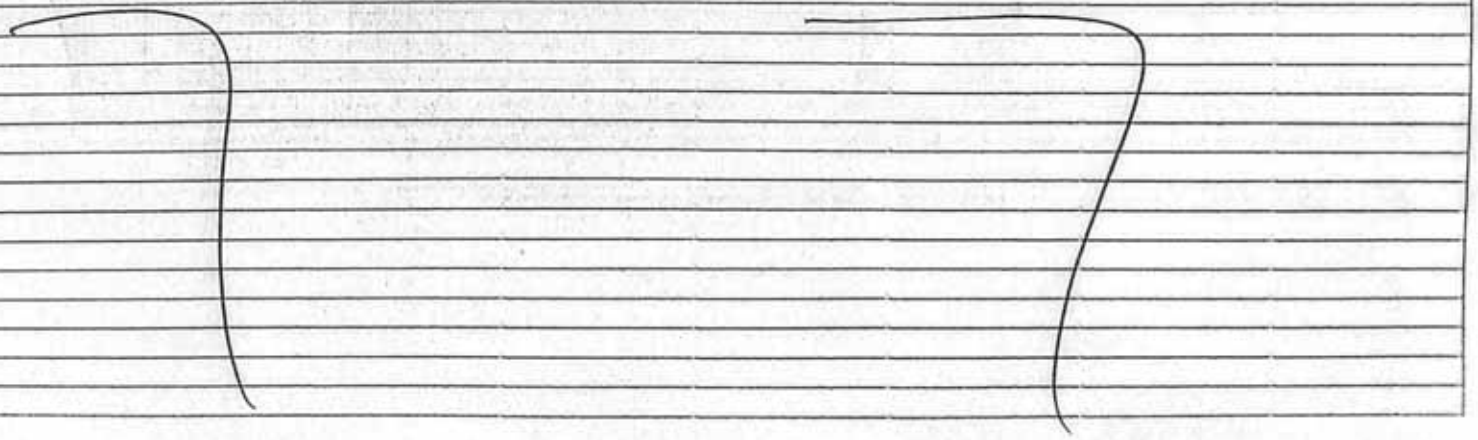

Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Retirar RCD y conformar acopio K 5+100 S. A	Contratista	03/07/2025
2	Adecuar area de campamento movil Clausurado S. A	contratista	03/07/2025
3	Adecuar Acopio de K 4+900 S. A.	Contratista	03/07/2025.
4	Acopios K 7+500 y K 7+500 mantener Organizados S. A.	Contratista	03/07/2025
5	Adecuar Acopio predio Luis Alberto Rey tunal 1	Contratista	03/07/2025
6	Proceder a Rellenar de cuneta tunal 1	Contratista	03/07/2025
7	Señalizar y Subir Acopio tramo 2 K 0+860 tunal 1.	Contratista	03/07/2025

NOTA 1: En caso de no ser una reunión virtual se puede anexar el registro de asistencia generado por las plataformas de teleconos o plataformas que generen formulario.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

ACTAS COMPONENTE AMBIENTAL CONSORCIO GAVIONES 95

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-1020
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso: 69 ILA 70103

Objeto de la reunión: Mesa de trabajo Componente ambiental Ecovig - Consorcio Bariloche 95.

Fecha: 09 de Junio de 2025

Hora de inicio: 9:00 am

Hora de finalización: 10:20am

Modalidad: X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

Lugar: Oficina interventoria Santana.

Dependencia: Componente Ambiental.

Nombre del Responsable: Yesenia Hernandez Ecovig SAS.

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	52784808	Yesenia Hernandez R	Prof Ambiental	Ecovig SAS			✓						✓	Sumgio7.ambiental.161@gmail.com	Yesenia HR.
CC	1022324860	Cesar A. Delgado Avellaneda	Prof. Ambiental	C. Bariloche 95.			✓						✓	cesardelgadoavellaneda@gmail.com	Cesar Delgado.

CONSENTIMIENTO: [illegible] conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3307000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para tomas estadísticas, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver [illegible] Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sig

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se desarrolla mesa de trabajo con el profesional ambiental del Consorcio Gaviona 9J donde se tratan los Sgt temas:

1. Se desarrolla la calificación mensual del componente del periodo del 01 al 31 de Mayo de 2025 donde se obtiene un resultado del 94% de cumplimiento la lista aplicada contiene los programas ejecutados en el PAGA, es claro que esta calificación se desarrolla dado dar cumplimiento al anexo técnico de la interventoría, la anterior calificación es aceptada por el consorcio quien procede a firmar el registro.

2. Se realiza la revisión de los ajustes solicitados de los informes del No 1 al No 12, donde se solicita retirar los datos de la interventoría de la tabla de trazabilidad, de igual manera como soporte del aprobado se emitirá el oficio respectivo una vez realicen la entrega con los ajustes.
del informe del No 01 al 05 no se tienen observaciones solo retirar datos de interventoría
De los informes 06 al 09 se requiere adjuntar los certificados de adquisición de materiales pétreos.
Informe 11 del mes de marzo de 2024. falta la certificación de pétreos
Informe 12 del mes de abril de 2024 falta la certificación de pétreos.

3. El contratista procedio a realizar la entrega de los informes semanales del mes de abril a la fecha.

4. Se realizo la revisión de las observaciones realizadas al informe de Abril de 2025 donde se evidencia fueron atendidas, el contratista procederá a realizar la entrega de manera oficial para remitir concepto.

5. El contratista informa que ya cuenta con el informe de Mayo de 2025 de igual manera se solicito realizar la entrega formal para emitir el concepto respectivo.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Remitir Soporte de calificación firmado por todas las partes	Interventoría	09/06/2025
2	Entrega de informes mensuales 01 al 12	contratista	16/06/2025
3.	Entrega informe No 13 Abril de 2025	Contratista	10/06/2025.
4	Entrega informe No 14. Mayo de 2025	Contratista.	10/06/2025.

NOTA 1: En caso de ser necesario ampliar el espacio de asistentes, emplear las planillas de asistencia o planillas que genere la entidad.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

A. 4
CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

ENTIDAD EJECUTORA

UMV

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-694

Bogotá D.C. 10 de junio de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.
correspondencia@umv.gov.co

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Llamado de atención del componente ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo SST

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud e el trabajo (SST) de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, SGSST y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría realiza las siguientes observaciones que requieren de la atención inmediata por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial UMV y reitera lo mencionado en oficio 186-1-650 de 05 de mayo de 2025:

1. Se solicita a la Entidad ejecutora hacer seguimiento y llamado de atención al contratista de maquinaria con el fin de que cumpla con las medidas de manejo ambiental durante el transporte y suministro de combustible a los equipos en obra, lo anterior basados en los derrames de combustible que se han evidenciado durante el periodo y los cuales se citan a continuación: * *

    - Frente de obra Unión Tunales abscisa K0+020, derrame evidenciado el 07 de abril de 2025, adicional a este se evidenciaron dos derrames más, uno en el área donde inicia la placa huella y el otro en el K0+10 causado por la ruptura de una manguera del minicargador.

    - Frente San Antonio Abscisa K3+500, derrame evidenciado el día 22 de abril de 2025 en el área del campamento. El día 29 de abril de 2025 en la via principal Troncal Bolivariana a la altura de la vivienda de la señora Balbina Peñaloza se evidencio un derrame considerable

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

de combustible, el cual no fue atendido de manera inmediata por el contratista generando riesgo vial en el área principalmente a los actores de la via.

Frente San Antonio Abscisa K3+100 y Capitolio K2+290 derrames evidenciados el día 26 de mayo de 2025. El día 28 de mayo de 2025 en la via principal Troncal Bolivariana a la altura de la vivienda de la señora Balbina Peñaloza se evidencio nuevamente un derrame de combustible y adicionalmente se ejecutan mantenimientos en esta área la cual no cuenta con los elementos requeridos para el desarrollo de este tipo de actividades. Se recuerda que no es viable realizar mantenimientos, arreglos mecánicos o emplear como zona de parqueo áreas públicas como andenes, parques, zonas verdes o vías. Lo anterior ocasiona un incumplimiento de las medidas de manejo ambiental además de que se configura en un riesgo vial para los actores de la via. Como soporte de lo descrito se presenta el registro fotográfico respectivo (foto 1 a foto 10).

Se reitera que el contratista para el transporte y abastecimiento seguro de combustible debe cumplir con la siguiente normativa:

- Todos los recipientes o envases deberán tener sus etiquetas que identifiquen claramente el producto que contiene, cumpliendo las recomendaciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 "Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado". Decreto 1496 de 2018 tiene por objeto adoptar el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

- Para el almacenamiento, uso y manejo de los residuos, de estas sustancias se deberán seguir las instrucciones de sus respectivas hojas de seguridad, y aplicar las normas que regulan esta actividad, dentro de las cuales se citan:

  - La ley 55 de julio 2 de 1993, por medio de la cual se aprobó el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.
  - El Decreto 1609 de julio 31 de 2002, por medio del cual se reglamentó el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Compilado por el decreto 1079 de 2015.
  - Decreto 1076 de 2015 y decreto 1630 de 2021.
  - El Decreto 4741 de diciembre 30 de 2005, por medio del cual se reglamentó parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
  - Ley 9 de 1979 código sanitario

- Para el conductor de vehículo se requiere que tenga competencia de manejo de sustancias peligrosas.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-694

- El vehículo debe contar con kit control de derrames, extintor de 20 libras, hojas de seguridad de los productos químicos transportados, y los demás documentos aplicables para el trasporte seguro y legal.
- Se ha solicitado en comités de obra No 42,43 y 44 que se informe una fecha para realizar el acompañamiento por parte de interventoría al procedimiento empleado para ejecutar los tanqueos de maquinaria en sitio y a la fecha no ha sido posible realizar esta verificación en sitio puesto que no se ha logrado una coordinación por parte de la UMV con el contratista de maquinaria.

2. Se reitera a la entidad ejecutora que en cuanto a los formatos de preoperacionales suministrados por el contratista de maquinaria amarilla y vehículos se requiere que el formato sea acorde a la maquina o vehículo inspeccionado por lo cual se sugiere individualizar los registros de tal manera que sean aplicables a la inspección detallada que se debe ejecutar a cada equipo. Lo anterior ha sido solicitado en comités integrales No 41, 42, 43 y 44 y mediante oficio 186-1-650 de 05 de mayo de 2025 del cual a la fecha no se ha tenido respuesta alguna. (foto 11 a foto 14).

3. Es necesario que la Entidad Ejecutora UMV realice una verificación previa por parte de un profesional idóneo y competente a los equipos, maquinaria y vehículos suministrados por el contratista de maquinaria los cuales son llevados a cada uno de los tramos en ejecución, puesto que los equipos están llegando en inadecuadas condiciones de funcionamiento, algunos funcionan durante la jornada laboral y quedan varados por fallas mecánicas, otros llegan y no funcionan y algunos no llegan en condiciones optimas de operatividad lo que genera condiciones inseguras en obra. Lo anterior genera retrocesos en el desarrollo de las actividades constructivas e inconvenientes en obra ya que no es permitido la realización de mantenimientos o ajustes mecánicos en obra o espacios públicos (vías, andenes, parques, zonas verdes), por lo cual se solicita al contratista contar con un área correctamente adecuada para desarrollar arreglos puntuales con la maquinaria, parqueo y almacenamiento temporal de los mismos mientras se evacuan hacia el sitio respectivo, adicionalmente se debe realizar una correcta gestión (manejo, almacenamiento y disposición final) de los residuos sólidos y líquidos (RESPEL), generados durante este proceso cuyos soportes deben ser entregados en los informes mensuales respectivos.

Se hace un llamado a la entidad ejecutora UMV y director de obra para que sean garantes del cumplimiento de las condiciones de manejo ambiental y SST según la normatividad colombiana en términos de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-694

	
Foto 1: derrame de combustible Unión Tunales 07/04/2025	Foto 2: derrame de combustible 08/04/2025
	
Foto 3: derrame de combustible San Antonio 22/04/2025	Foto 4: derrame de combustible en via principal San Juan 29/04/2025.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-694

	
Foto 5: derrame de combustible Capitolio 26/05/2025	Foto 6: derrame de combustible San Antonio 26/05/2025
	
Foto 7: derrame de combustible San Antonio 26/05/2025	Foto 8: derrame de combustible San Antonio 30/05/2025
	
Foto 9: derrame de combustible via principal Troncal Bolivariana 28/05/2025	Foto 10: Mantenimientos de equipos en via principal Troncal Bolivariana 28/05/2025

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-694



Foto 11: Preoperacional estándar registro tramo Unión Tunales



Foto 12: Preoperacional estándar registro tramo Capitolio

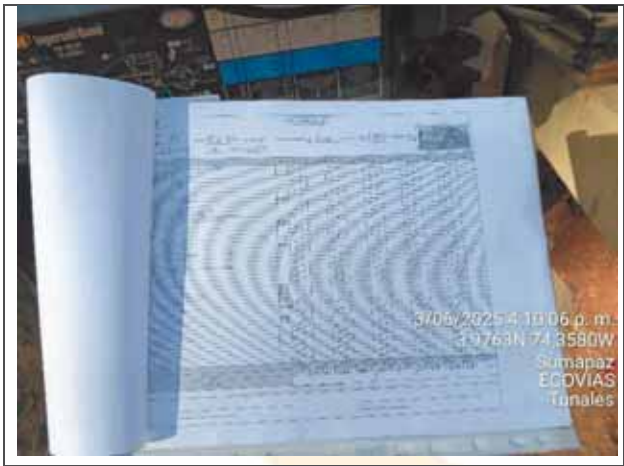


Foto 13: Preoperacional estándar registro tramo Unión Tunales



Foto 14: Preoperacional estándar registro tramo San Antonio

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-694

De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita a la entidad ejecutora tomar las medidas correctivas necesarias para subsanar los hallazgos descritos y remitir evidencias de la subsanación de manera inmediata.

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co , jose.donoso@gobiernobogota.gov.co
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto. correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: YHR/JARB
Elaboro: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-693

Bogotá D.C. 09 de junio de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Rta. Correo electrónico el día 07/06/2025, Observaciones informe ambiental No. 12.

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

De acuerdo a lo anterior una vez revisada la información remitida concerniente al informe mensual No 12 del periodo del 01 al 31 de mayo de 2025 se tienen los siguientes comentarios por parte de interventoría que requieren de la atención por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial UMV:

1. Informe Ejecutivo ficha capacitación y concientización, se sugiere incluir una tabla donde se relacionen las capacitaciones realizadas, con fecha, tema y tipo (capacitación, inducción, charla).

2. Informe Ejecutivo pagina 12, ajustar el resultado del indicador reportado para operadores de maquinaria.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-693

3. Informe Ejecutivo tabla No 2 verificar el número de título minero reportado para el proveedor Monteolivo y en la columna proveedor relacionar a Monteolivo.

4. Respecto al otro proveedor que relacionan misionalidad colocar UMV, ya que el material es suministrado por UMV. De igual manera aclarar por qué el rajón y la base tipo B lo colocan suministrado por la UMV ya que este es un material que se explota de cantera.

5. Informe Ejecutivo tabla No 2, verificar si la UMV cuenta con documentos ambientales que validen el procesamiento de los materiales reciclados y relacionarlos en la tabla.

6. Informe Ejecutivo pagina 16, mencionar que el reporte de cantidades se realizara mes vencido debido a la conciliación que debe realizar la entidad ejecutora y en la tabla 2 generar la fila para reportar mayo y hacer la misma aclaración.

7. Informe Ejecutivo pagina 23 tabal 3, se recomienda que el título de la tabla aparezca en la siguiente hoja cuando se realiza un salto de página.

8. Informe Ejecutivo ficha manejo y disposición final de escombros, no se evidencia el soporte o certificación de los 406 m3 llevados a sitios de disposición en el periodo, se requiere adjuntar dicho soporte.

9. Informe Ejecutivo pagina 23 tabal 3, es necesario relacionar la cantidad de RCD que quedo pendiente por retirar y reportado en el mes de abril, con el fin de llevar un control del acumulado.

10. Anexo No 7 verificar ya que se reporto residuos peligrosos en el frente de obra Unión Tunales y esa cantidad debe ser reportada es en el frente de Capitolio. Revisar y ajustar la información reportada.

11. Informe Ejecutivo ficha emisiones atmosféricas y ruido, se relaciona un consumo de 25 m3 de agua para actividades de obra, por lo cual se requiere adjuntar el certificado de la empresa encargada de suministrar dicha agua.

12. Anexo No 9 se realiza solicitud del certificado de vertimiento del mes de abril y se requiere el soporte del mes de mayo, de igual manera aún no se ha remitido el soporte de los mantenimientos realizados en el mes de mayo de 2025.

13. Anexo No 10, se evidencia soporte de sensibilización cuyo tema fue: Especies de flora, la fauna silvestre y recursos hidrobiológicos en la zona del proyecto y su función en el

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

ecosistema. Este soporte se puede incluir para próximos informes en el anexo de capacitaciones, con el fin de generar un solo anexo con este tipo de soportes.

14. Tabla No12, se requiere discriminar equipos según el tramo como fue presentado en el informe de abril, lo anterior se puede hacer en una sola tabla.

Generales

1. Para la entrega de la siguiente versión, se requiere consolidar el informe en un solo PDF.

2. Se sugiere colocar numeración a los títulos.

3. Cuando se remita el informe por correo, ser solicita crear un nuevo correo indicando en el asunto el número y periodo de informe remitido.

De acuerdo a lo anterior lo anterior, se solicita su colaboración para la realización de la corrección, ajuste y/o complementación de la información requerida, relacionando en el comunicado de remisión cada una de las observaciones con la justificación, aclaración o indicación de la acción ejecutada y el lugar en el cual se localiza la evidencia según corresponda (anexo, documento, pagina, numeral), lo anterior en un período no mayor a (3) tres días calendario posterior al recibido del presente comunicado.

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS-UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-696

Bogotá D.C.12 de junio de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Respuesta comunicado 20251920066591 Subsanación de las observaciones del Informe Ambiental No. 11.

Respetados señores:

Cordial saludo,

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

De acuerdo con lo anterior una vez revisada la información remitida mediante comunicado relacionado en el asunto, al ingresar al link se evidencia que no trae adjunta la información relacionada en el oficio. De acuerdo con lo anterior se solicita su colaboración para la realización del envío de la información respectiva de manera inmediata puesto que las observaciones del informe No 11 de periodo de abril se realizaron el día 08 de mayo de 20254.

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: YHR
Elaboro: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-704

Bogotá D.C.16 de junio de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Respuesta comunicado 20251920066631. Actualización Plan de adaptación guía de manejo ambiental PAGA V4 - Aval

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde la Unidad de Mantenimiento Vial, remite el Plan de adaptación de la guía ambiental PAGA en versión 4 V4 se tienen los siguientes comentarios:

- Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Ambiental realizados mediante mesa de trabajo soportada mediante acta realizada el día 09 de abril de 2025, donde se solicitó actualización del PAGA, se evidencia que fueron atendidas las observaciones realizadas por lo tanto se da aval al mismo puesto que cumple con los requerimientos mínimos del anexo técnico del componente ambiental.

De igual manera se aclara a la entidad ejecutora que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por la entidad ejecutora UMV.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-704

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-708

Bogotá D.C.18 de junio de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
JULIO CESAR PINZÓN REYES
Gerente de Proyecto
Bogotá D.C**.**

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Envío certificados disposición RCD Contrato 478 de 2022 y Contrato 479 de 2022.

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que los Contratistas realicen la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV. De acuerdo a lo anterior la interventoría procede a remitir todos los certificados de disposición final de RCD emitidos por gestores autorizados como constancia de entrega de los residuos de construcción y demolición por parte de los contratistas Consorcio Estabilización Vial y Consorcio Gaviones 95 a sitios autorizados.

Consorcio Estabilización Vial Cto. 479-22: Cuenta con un total de 13 certificados que corresponden a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022; enero, febrero, marzo y diciembre de 2023; enero, febrero, marzo y abril de 2024; Abril y mayo de 2025.

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL		
PERIODO	**CANTIDAD M3**	**SITIO DE DISPOSICION**
Julio 2022	0	No aplica para el periodo

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-708

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL		
PERIODO	**CANTIDAD M3**	**SITIO DE DISPOSICION**
Agosto 2022	1065	Maquinas Amarillas
Septiembre 2022	2250	Maquinas Amarillas
Octubre 2022	1200	Maquinas Amarillas
Noviembre 2022	780	Maquinas Amarillas
Diciembre 2022	1010	Maquinas Amarillas
Enero 2023	585	Maquinas Amarillas
Febrero 2023	735	Maquinas Amarillas
Marzo 2023	105	Maquinas Amarillas
Abril 2023	0	No aplica para el periodo
Octubre 2023	0	No aplica para el periodo
Noviembre 2023	0	No aplica para el periodo
Diciembre 2023	105	Maquinas Amarillas
Enero 2024	630	Maquinas Amarillas
Febrero 2024	1665	Maquinas Amarillas
Marzo 2024	2925	Maquinas Amarillas
Abril 2024	3285	Maquinas Amarillas
Abril 2025	0	No aplica para el periodo
Mayo 2025	0	No aplica para el periodo

Consorcio Gaviones 95: Un total de 15 certificados que corresponden a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2023; marzo y abril de 2024; Abril y mayo de 2025

CONSORCIO GAVIONES 95		
PERIODO	**CANTIDAD M3**	**SITIO DE DISPOSICION**
Agosto 2022	248	Cemex
Septiembre 2022	713	Cemex
Septiembre 2022	553	Agencia Nacional

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-708

CONSORCIO GAVIONES 95		
PERIODO	**CANTIDAD M3**	**SITIO DE DISPOSICION**
Octubre 2022	589	Cemex
Octubre 2022	251	Agencia Nacional
Noviembre 2022	421	Cemex
Diciembre 2022	162	Cemex
Enero 2023	403	Cemex
Febrero 2023	397	Cemex
Marzo 2023	269	Cemex
Abril 2023	246	Cemex
Mayo 2023	420	Cemex
Junio 2023	225	Cemex
Marzo 2024	30	Cemex
Abril 2024	750	Cemex
Abril 2025	0	No aplica para el periodo
Mayo 2025	0	No aplica para el periodo

Los meses que no se relacionan certificados es debido a que no se realizó disposición por parte de los contratistas o el contrato estaba suspendido.

La anterior información es remitida con el fin de dar cumplimiento a la resolución 1257 de 2021, así mismo como parte del proceso de cargue de información ante la autoridad ambiental respectiva del PIN 22183 y para los fines respectivos por parte de la entidad Ejecutora UMV.

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: En (1) una carpeta

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

CONSORCIO
ESTABILIZACION VIAL

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-692

Bogotá D.C. 09 de junio de 2025

Señores.
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.
Atn: Dr. HERNAN LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO No. 479 de 2022, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020").

Asunto: Respuesta comunicado CEV/22-407.Observaciones informe ambiental No 19 V1

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del consorcio Estabilización Vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del contratista.

De acuerdo a lo anterior una vez revisada la información remitida concerniente al informe mensual No 19 V1 del periodo del 01 al 31 de mayo de 2025 se tienen los siguientes comentarios por parte de interventoría que requieren de la atención por parte del Consorcio Estabilización vial:

1. Informe Ejecutivo pagina 7 ajustar el mes reportado y mencionar que el PAGA fue aprobado.

2. Informe Ejecutivo pagina 9, se sugiere incluir una tabla donde se relacionen las capacitaciones realizadas, con fecha, tema y tipo (capacitación, inducción, charla).

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-692

3. Verificar y unificar temas descritos en el informe en las páginas 9 y 10 según los anexos reportados.

4. Informe Ejecutivo pagina 11 ajustar el mes reportado en el indicador No 1.

5. Informe Ejecutivo pagina 11 organizar el indicador No 2 de tal manera que no se corte el indicador reportado.

6. Informe Ejecutivo pagina 12 ajustar el mes reportado en el indicador No 2.

7. Informe Ejecutivo pagina 14 indicador No 1, verificar ya que del material relacionado solo se cuenta con la certificación de máquinas amarillas el otro no cuenta con la certificación aún.

8. Informe Ejecutivo página 17 ajustar lo descrito en el párrafo ya que se realiza la aclaración de que no se realizó disposición en el periodo e RCD.

9. Informe Ejecutivo página 17 incluir registro fotográfico del RCD acopiado en el periodo.

10. Informe Ejecutivo página 17 ajustar el mes reportado en la tabla 5.

11. Informe Ejecutivo página 20, tabla 4 es necesario reportar la cantidad de residuos peligrosos generados en el periodo.

12. Informe Ejecutivo página 20, el resultado del indicador reportado para la ficha de manejo de taludes debe ser 0, revisar y ajustar.

13. Informe Ejecutivo página 22 ajustar lo descrito que los acopios se mantienen a distancias de 30 mts de fuentes hídricas ya que esta medida no se está cumpliendo en todos los acopios.

14. Informe Ejecutivo página 23 verificar los indicadores reportados ya que deben ser los mismos aprobados en la ficha PAGA respectiva.

15. Informe Ejecutivo página 23, para el programa de manejo de aguas superficiales es necesario incluir el indicador de cantidad de agua suministrada para actividades de obra.

16. Informe Ejecutivo página 23 incluir registro fotográfico de Los baños.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-692

17. Informe Ejecutivo página 24 verificar los indicadores reportados ya que deben ser los mismos aprobados en la ficha PAGA respectiva.

18. Informe Ejecutivo página 24, colocar datos en el indicador de unidades sanitarias ya que si se tiene así sean fijas.

19. Informe Ejecutivo página 25 ampliar las medidas para la ficha manejo de fauna.

20. Informe Ejecutivo página 27 verificar el cálculo del último indicador reportado para la ficha de campamentos.

21. Informe Ejecutivo página 27, indicador de derrames, verificar ya que la interventoría reporto un derrame en el periodo.

22. Anexo No 12 no cuenta con las firmas de la profesional de la interventoría.

23. Anexo No 6 no cuenta con las firmas de la profesional de la interventoría

Generales

1. Verificar la numeración de las tablas en todo el documento, puesto que la numero 4 se repite.

2. Revisar y ajustar todos los indicadores donde se reporten en cero ya que el resultado no debe ser 100% sino 0%.

3. Unificar tipo, tamaño y formato de letra para el reporte de indicadores.

4. Incluir un listado de anexos.

5. Mantener un mismo tipo, tamaño y formato de letra para relacionar los anexos dentro del documento.

6. No se evidencia donde se relaciona el anexo No 9 dentro del informe ejecutivo.

7. Colocar numeración de los encabezados de las fichas y actualizar la tabla de contenido.

De acuerdo a lo anterior lo anterior, se solicita su colaboración para la realización de la corrección, ajuste y/o complementación de la información requerida, relacionando en el comunicado de remisión cada una de las observaciones con la justificación, aclaración o

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

indicación de la acción ejecutada y el lugar en el cual se localiza la evidencia según corresponda (anexo, documento, pagina, numeral), lo anterior en un período no mayor a (3) tres días calendario posterior al recibido del presente comunicado.

Atentamente,



ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: YHR
Recibió: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 709

Bogotá D.C. 18 de junio de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túneles y Animas Bajas.") GRUPO 2

Asunto: Respuesta a comunicado CEV/22-417 Informe del componente Ambiental No.15 V02

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del Consorcio. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Estabilización Vial, remite el Informe Mensual ambiental No 15 V2 se tienen los siguientes comentarios:

- Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Ambiental realizados mediante el comunicado 186-1-520 del 19 de marzo de 2024 al informe mensual No. 15 V1 que comprende el periodo de 01 al 29 de febrero de 2024, se evidencia que fueron atendidas las observaciones realizadas por lo tanto se da aprobación al mismo puesto que cumple con los requerimientos mínimos del anexo técnico del componente ambiental.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 709

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Sin otro particular

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: N/A

C.C: Julio Cesar Pinzón Reyes - Gerente De Proyecto - UAERMV
José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 712

Bogotá D.C. 24 de junio de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túneles y Animas Bajas.") GRUPO 2

Asunto: Respuesta a comunicado CEV/22-416 Informe del componente Ambiental No.19 V-2.

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del Consorcio. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Estabilización Vial, remite el Informe Mensual ambiental No.19 V2, del cual se tienen los siguientes comentarios:

- Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Ambiental realizados mediante el comunicado 186-1-692 del 09 de junio de 2025 al informe mensual No. 19 V1 que comprende el periodo de 01 al 31 de mayo de 2025, se evidencia que fueron atendidas las observaciones realizadas por lo tanto se da aval al mismo en versión 2 puesto que cumple con los requerimientos mínimos del anexo técnico del componente ambiental.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 712

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Sin otro particular

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: N/A

C.C: Julio Cesar Pinzón Reyes - Gerente De Proyecto - UAERMV
José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 725

Bogotá D.C. 27 de junio de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túneles y Animas Bajas.") GRUPO 2

Asunto: Respuesta a comunicado CEV/22-422 Informes del componente Ambiental No.1, No 2 y del No 4 al No.10.

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del Consorcio. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Estabilización Vial, remite los Informes mensuales se procede a realizar la revisión verificando que una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Ambiental realizados mediante el comunicado 186-1-264 del 09 de agosto de 2023 y mesa de trabajo realizada el día 12 de junio de 2025 se evidencia que fueron atendidas las observaciones realizadas por lo tanto se da aval a los mismos, puesto que cumplen con los requerimientos mínimos del anexo técnico del componente ambiental de acuerdo a lo siguiente:

- Informe No 1 versión 02 que comprende el periodo del 18 al 31 de julio de 2022
- Informe No 2 versión 3 que comprende el periodo del 01 al 31 de agosto de 2022
- Informe No 4 versión 2 que comprende el periodo del 01 al 31 de octubre de 2022
- Informe No 5 versión 2 que comprende el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2022

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 725

- Informe No 6 versión 2 que comprende el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022
- Informe No 7 versión 2 que comprende el periodo del 01 al 31 de enero de 2023
- Informe No 8 versión 2 que comprende el periodo del 01 al 28 de febrero de 2023
- Informe No 9 versión 2 que comprende el periodo del 01 al 31 de marzo de 2023
- Informe No 10 versión 2 que comprende el periodo del 01 al 13 de abril de 2023

De acuerdo a lo anterior se encuentra pendiente por entregar la subsanación el informe No 3 versión 2 que comprende el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2022 de acuerdo a lo acordado en mesa de trabajo del día 12 de junio de 2025.

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Sin otro particular

Atentamente,



ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: Una (1) Carpeta - informes No. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

C.C: Julio Cesar Pinzón Reyes - Gerente De Proyecto - UAERMV
José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

CONSORCIO GAVIONES 95

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-705

Bogotá D.C. 16 de junio de 2025

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95.
Atn: Dr. LUIS HERNANDO PULIDO
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO No. 478 de 2022, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020").

GRUPO 1: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K13+820-K6+910), San Antonio I, Capitolio y Laguna Verde.").

Asunto: Respuesta comunicado D-26- 2025-37. Plan Adaptación Guía Manejo Ambiental PAGA V3 -Aval

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del contratista. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Gaviones 95, remite el Plan de adaptación de la guía ambiental PAGA en versión 3 V3 se tienen los siguientes comentarios:

- Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Ambiental realizados mediante mesa de trabajo soportada mediante acta realizada el día 20 de mayo de 2025, donde se solicitó actualización del PAGA y correo electrónico enviado el día 28 de mayo de 2025, se evidencia que fueron atendidas las observaciones realizadas por lo tanto se da aval al mismo puesto que cumple con los requerimientos mínimos del anexo técnico del componente ambiental.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-705

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Sin otro particular

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: YHR
Elaboro: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-714

Bogotá D.C. 24 de junio de 2025

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95.
Atn: Dr. LUIS HERNANDO PULIDO
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO No. 478 de 2022, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020"). (San Antonio II (K13+820-K6+910), San Antonio I, Capitolio y Laguna Verde."). GRUPO 1.

Asunto: Respuesta comunicado D-29- 2025-37. Entrega informe ambiental No. 13 abril de 2025 V2.

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del contratista. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Gaviones 95, remite el Informe Mensual ambiental No 13 V2 se tienen los siguientes comentarios:

- Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Ambiental realizados mediante el comunicado 186-1-637 del 29 de mayo de 2025 al informe mensual No. 13 V1 que comprende el periodo de 01 al 30 de abril de 2025, se evidencia que fueron atendidas las observaciones realizadas por lo tanto se da aval al mismo en versión 2 puesto que cumple con los requerimientos mínimos del anexo técnico del componente ambiental.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-714

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Sin otro particular

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: N/A

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: YHR
Elaboro: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-715

Bogotá D.C. 24 de junio de 2025

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95.
Atn: Dr. LUIS HERNANDO PULIDO
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO No. 478 de 2022, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020"). (San Antonio II (K13+820-K6+910), San Antonio I, Capitolio y Laguna Verde."), GRUPO 1.

Asunto: Respuesta comunicado D-31- 2025-37. Entrega informe ambiental No. 14 mayo de 2025 V1.

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del contratista. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Gaviones 95, remite el Informe Mensual ambiental No 14 V1 se tienen los siguientes comentarios;

- Una vez desarrollada la revisión documental del producto entregado informe mensual No. 14 V1 que comprende el periodo de 01 al 31 de mayo de 2025, se evidencia que cumple con los requerimientos mínimos del anexo técnico del componente ambiental, por lo tanto, se da aval al mismo en versión 1.

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-715

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Sin otro particular

Atentamente,



ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: YHR
Elaboro: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-726

Bogotá D.C. 27 de junio de 2025

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95.
Atn: Dr. LUIS HERNANDO PULIDO
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO No. 478 de 2022, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020"). 2018000050020 (San Antonio II (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna Verde."), GRUPO 1.

Asunto: Respuesta comunicado D-32- 2025-37. Entrega de informes mensuales ambiental No.1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10. (Avalados), y Solicitud de ajustes a los informes No. 6, 7, 8, 11 y 12.

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del contratista. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Gaviones 95, remite los Informes mensuales del componente, se procede a realizar la revisión verificando que una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Ambiental realizados mediante el comunicado 186-1-663 del 26 de mayo de 2025 y mesa de trabajo realizada el día 09 de junio de 2025, se evidencia que fueron atendidas las observaciones realizadas por lo tanto se da aval a los mismos de acuerdo a la siguiente relación, puesto que cumplen con los requerimientos mínimos del anexo técnico del componente ambiental.

- Informe No. 1, versión 1 que comprende el periodo del 01 al 31 de agosto de 2022
- Informe No. 2, versión 1 que comprende el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2022
- Informe No. 3, versión 1 que comprende el periodo del 01 al 31 de octubre de 2022
- Informe No. 4, versión 1 que comprende el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2022
- Informe No. 5, versión 1 que comprende el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022
- Informe No. 9, versión 1 que comprende el periodo del 01 al 30 de abril de 2023
- Informe No. 10, versión 2 que comprende el periodo del 01 al 29 de febrero de 2024

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-726

Así mismo dentro de esta revisión se evidencia que no se encuentra anexo los certificados de adquisición de materiales pétreos generada por parte de los proveedores, según las cantidades relacionadas en los siguientes informes:

- Informe No. 6 V2, que comprende el periodo del 01 al 31 de enero de 2023
- Informe No. 7 V2, que comprende el periodo del 01 al 28 de febrero de 2023
- Informe No. 8 V2, que comprende el periodo del 01 al 31 de marzo de 2023
- Informe No. 11, V2, que comprende el periodo del 01 al 31 de marzo de 2024
- Informe No. 12, V2 que comprende el periodo del 01 al 30 de abril de 2024

De acuerdo a lo anterior se solicita la entrega de estos soportes con el fin de subsanar los ajustes solicitados en mesa de trabajo del día 09 de junio de 2025 y proceder con el concepto respectivo de los informes mencionados.

De igual manera se aclara al contratista que la documentación de la cual se da aval, podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Sin otro particular

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Una (1) Carpeta informes aprobados (No. 1, 2, 3, 4, 5, 9, y 10)

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: YHR
Elaboro: EHR

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

ENTIDAD EJECUTORA

UMV

Bogotá D.C.,

Señores
ECOVÍAS S.A.S.
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla (Atl)

Atn. **Ing. LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO**
Representante Legal
intersumapaz.ecovias@gmail.com

Referencia: Proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá, del Sistema General de Regalías -SGR- identificado con código BPIN 2018000050020. (Localidad 20 de Sumapaz).”.

Asunto: Subsanación de las observaciones del Informe Ambiental No. 11. (Respuesta a oficio No. 186-1-655 – Ecovias SAS - Radicado UMV No. 20251120071202)

Cordial saludo,

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y de Mantenimiento Vial – UAERMV, adjunta el Informe Ambiental No. 11 correspondiente al mes de abril 2025, en el cual se encuentran las subsanaciones a las observaciones presentadas al contenido del documento.

No obstante, se informa que quedan pendientes los siguientes documentos, los cuales serán adjuntados en el próximo informe correspondiente al mes de mayo de 2025.

- Certificado de adquisición de materiales pétreos en el periodo de abril-2025.
- Certificado disposición final de residuos peligrosos generados en el periodo de abril-2025.
- Certificado emitido por la empresa encarga de suministrar el agua para actividades de obra, en el periodo abril-2025.
- Soporte del mantenimiento de USP realizado el día 8 de abril de 2025.

Quedamos atentos a cualquier inquietud que se presente al respecto

Cordialmente,

Documento 20251920066591 firmado electrónicamente por:	
JULIO CESAR PINZÓN REYES	Subdirector de Intervención de la Infraestructura SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA julio.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 03-06-2025 12:05:18
Revisó:	GLORIA ROCIO BOTERO SANCHEZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - gloria.botero@umv.gov.co
	RAFAEL DARÍO PEÑA FLÓREZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - rafael.pena@umv.gov.co
Proyectó:	JESSICA PAOLA VIDAL POLOCHE - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - jessica.vidal@umv.gov.co

8febab63664f40c3ca9657a707b67cac2f4a7e3847206b5fd0e76b2f40ee5e75
Codigo de Verificación CV: 8d74c Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

Bogotá D.C.,
ECOVÍAS S.A.S.
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla (Atl)

Atn. Ing. **LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO**
Representante Legal
intersumapaz.ecovias@gmail.com

Ciudad

Referencia: Proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”, del Sistema General de Regalías -SGR- identificado con código BPIN 2018000050020. (Localidad 20 de Sumapaz)

Asunto: Actualización del documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA 2025 V4

Cordial saludo,

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y de Mantenimiento Vial “UAERMV”, adjunta actualización realizada del documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) para el proyecto indicado en la referencia.

Lo anterior para su respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente,

Documento 20251920066631 firmado electrónicamente por:	
JULIO CESAR PINZÓN REYES	Subdirector de Intervención de la Infraestructura SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA julio.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 03-06-2025 10:12:07

Revisó:	RAFAEL DARÍO PEÑA FLÓREZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - rafael.pena@umv.gov.co
Proyectó:	JESSICA PAOLA VIDAL POLOCHE - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - jessica.vidal@umv.gov.co

9b59adcf666d046a8e29e2b99ccbdfa5dee4d5bdb495c7879f7d1f3bac8f07ed
Codigo de Verificación CV: f5d1d Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

Bogotá D.C.,

Ing. LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal ECOVÍAS S.A.S.
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla (Atl)
intersumapaz.ecovias@gmail.com
Ciudad

Referencia: Proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”, del Sistema General de Regalías -SGR- identificado con código BPIN 2018000050020. (Localidad 20 de Sumapaz)

Asunto: Respuesta oficio No. 186-1-696 – Ecovias SAS - Radicado UMV No. 20251120094262

Cordial saludo.

En atención al radicado del asunto, se remite nuevamente la respuesta relacionada con el Informe Ambiental N.º 11, el cual fue remitido el día 3 de junio de 2025, como se evidencia en acuse de recibido con fecha del 5 de junio de 2025.



De acuerdo con su solicitud, se anexa link donde se encuentra el informe ambiental No 11 ajustado, https://uaermv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jessica_vidal_umv_gov_co/Es7Rq-JWOdtGoYc3gPJfMucBFWGX6xEcdVszmda4yXGN5A?e=wJr6z9

Cordialmente,

Con copia: sumapaz.ambiental.161@gmail.com

Documento 20251920081391 firmado electrónicamente por:	
JULIO CESAR PINZÓN REYES	Subdirector de Intervención de la Infraestructura SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA julio.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 27-06-2025 15:29:11
Proyectó:	JESSICA PAOLA VIDAL POLOCHE - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - jessica.vidal@umv.gov.co

5c01a36ccbd8454cfdd1e7e0c51a1d07d745e7bcf8dcc54abd9b1611be0e0a27
Codigo de Verificación CV: 2d18a Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

CONSORCIO
ESTABILIZACION VIAL

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-407

Bogotá D.C., 5 de junio de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Informe mensual ambiental No 19

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del informe mensual del componente ambiental No 19, correspondiente al periodo del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Un documento en PDF
HLM/ac

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-417

Bogotá D.C., 13 de junio de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Respuesta oficio 186-1-520 Informe mensual ambiental No 15 V2

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del informe mensual del componente ambiental No 15 versión 2, de las actividadesejecutadas en el mes de febrero de 2024 atendiendo las observaciones dadas por la interventoría por medio del oficio 186-1-520.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Un documento en PDF
HLM/ac

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-416

Bogotá D.C., 13 de junio de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Respuesta oficio 186-1- 692 Iinforme mensual ambiental No 19 V2

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del informe mensual del componente ambiental No 19 versión 2 atendiendo las observaciones dadas por la interventoría por medio del oficio 186-1- 692.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Un documento en PDF
HLM/ac

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-422

Bogotá D.C., 20 de junio de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Respuesta oficio 186-1-264 Informes Ambientales

Respetados señores,

De acuerdo la mesa de trabajo realizada el pasado 12 de junio de 2025 entre la profesional ambiental del contratista e interventoría, en la cual se revisaron las observaciones dadas por medio del oficio 186-1-264 a los informes mensuales del componente ambiental del No. 1 al No. 10, se atendieron las observaciones a los siguientes informes, los cuales se adjuntan a la presente

1. Informe ambiental No 2 V3. Correspondiente al mes de agosto de 2022
2. Informe ambiental No 4 V2. Correspondiente al mes de octubre de 2022
3. Informe ambiental No 8 V2. Correspondiente al mes de febrero de 2023
4. Informe ambiental No 9 V2. Correspondiente al mes de marzo de 2023
5. Informe ambiental No 10 V2. Correspondiente al mes de abril de 2023

En cuanto al informe ambiental No 3, aún se encuentra en atender una observación por lo que este se radicara posteriormente.

Los informes ambientales No 1,5,6 y 7 están cumpliendo con lo solicitado.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Anexo: Cinco archivos en PDF
HLM/ac

CONSORCIO GAVIONES 95

CONSORCIO GAVIONES 95
901.563.341-0

Correspondencia Despachada

Consecutivo:	D-26
Vigencia:	2025
Sede:	CONSORCIO GAVIONES 95
Fecha de Radicación:	12/06/2025-04:51 PM
Asunto:	ENTREGA DEL PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL PAGA V3-2025
Anexos:	DIGITAL
Documento:	AMBIENTAL
Destinatarios Externos:	ECOVIAS S.A.S-(BARRANQUILLA),UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y

D-26-2025-37

Bogotá D.C. 10 de junio de 2025.

Señor:
UAERM
Atn.: Giacomo Marcenaro Jiménez
Ordenador del Gasto
Calle 26 No. 69 – 76
Bogotá D.C.

Señores
ECOVIAS SAS
Atn.: Luiggi Pugliese Mercado
intersumapaz@ecoviasas.com
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla, Atlántico

Referencia: Contrato No. 478-2022 cuyo objeto es, *"GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)"*

Asunto: Entrega del plan de adaptación de la guía ambiental PAGA -V3 2025.

Respetados señores,

En cumplimiento de lo acordado en la mesa de trabajo celebrada el 09 de junio de 2025 entre los profesionales del área ambiental de Ecovías S.A.S. y el Consorcio Gaviones 95, me permito presentar el **Plan de Adaptación a la Guía Ambiental V3 2025**. Este plan ha sido formulado conforme a los lineamientos técnicos establecidos por la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – MODO CARRETERO, y en concordancia con la normativa ambiental vigente. Las correcciones y ajustes realizados en el documento se llevaron a cabo en estricto cumplimiento de las observaciones y recomendaciones planteadas por la interventoría de Ecovías S.A.S., asegurando así la alineación con los estándares técnicos y ambientales requeridos para el adecuado desarrollo del proyecto.
El plan incluye:

Adjunto a este oficio se encuentran los documentos complementarios que respaldan la formulación del plan, incluyendo:

- Acta de la mesa de trabajo del 09 de junio de 2025.
- Plan de adaptación de la guía ambiental PAGA v3 2025 consorcio Gaviones 95.
- Anexos

Quedamos atentos a cualquier comentario o requerimiento adicional que se considere pertinente para avanzar en la implementación de las acciones propuestas.

Afentamente,

LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
Representante
CONSORCIO GAVIONES 95

CC: Ing. José David Donoso – Apoyo a la supervisión FDRS

CONSORCIO GAVIONES 95

901.563.341-0

Correspondencia Despachada	
Consecutivo:	D-31
Vigencia:	2025
Sede:	CONSORCIO GAVIONES 95
Fecha de Radicación:	17/06/2025-03:46 PM
Asunto:	ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL No.14 MAYO DE 2025
Anexos:	DIGITAL
Documento:	AMBIENTAL
Destinatarios Externos:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL- (BOGOTÁ).

D-31-2025-37

Bogotá D.C. 17 de junio de 2025.

Señor:
UAERM
Atn.: Giacomo Marcenaro Jiménez
Ordenador del Gasto
Calle 26 No. 69 – 76
Bogotá D.C.

Señores
ECOVIAS SAS
Atn.: Luiggi Pugliese Mercado
intersumapaz@ecoviasas.com
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla, Atlántico

Referencia: Contrato No. 478-2022 cuyo objeto es, *"GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)"*

Asunto: Entrega de informe ambiental N° 14 V1, mayo del 2025.

Respetados señores,

De conformidad con lo establecido en el contrato de obra [Número del Contrato] y en cumplimiento con la línea base definida en las mesas de trabajo del componente ambiental de la interventoría y el Consorcio Gaviones 95, me permito remitir a ustedes el Informe Ambiental N° 14 V1, correspondiente al mes de mayo de 2025.

Este informe detalla las actividades ambientales ejecutadas durante el periodo mencionado.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que puedan tener respecto a la información entregada.

Atentamente,

LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
Representante
CONSORCIO GAVIONES 95
CC: Ing. José David Donoso – Apoyo a la supervisión FDRS

CONSORCIO GAVIONES 95

901.563.341-0

Correspondencia Despachada

Consecutivo:	D-29
Vigencia:	2025
Sede:	CONSORCIO GAVIONES 95
Fecha de Radicación:	17/06/2025-07:52 AM
Asunto:	RESPUESTA COMUNICDAO 186-1-637 ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL No.13 ABRIL
Anexos:	DIGITAL
Documento:	AMBIENTAL
Destinatarios Externos:	ECOVIAS S.A.S-(BARRANQUILLA),UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y

D-29-2025-37

Bogotá D.C. 17 de junio de 2025.

Señor:
UAERM
Atn.: Giacomo Marcenaro Jiménez
Ordenador del Gasto
Calle 26 No. 69 – 76
Bogotá D.C.

Señores
ECOVIAS SAS
Atn.: Luiggi Pugliese Mercado
intersumapaz@ecoviasas.com
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla, Atlántico

Referencia: Contrato No. 478-2022 cuyo objeto es, *"GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)"*

Asunto: Respuesta comunicado 186-1-637. Entrega de informe ambiental N°13 abril del 2025 v2.

Respetados señores,
En atención al oficio **186-1-637** del 29 de mayo del año en curso, emitido por la interventoría Ecovias S.A.S., nos permitimos informar que hemos subsanado todas las observaciones señaladas en el mencionado documento. Las acciones correctivas y ajustes pertinentes se han llevado a cabo conforme a lo acordado en la mesa de trabajo realizada el **9 de junio de 2025**, en la cual se analizaron y discutieron cada uno de los puntos planteados.

Adjunto a este oficio, encontrarán la documentación del informe ambiental N° 13 V2 del consorcio gaviones 95, que respalda las acciones y la subsanación de las observaciones.

Quedamos atentos a cualquier comentario adicional o requerimiento que consideren pertinente.

Agradecemos la colaboración y el compromiso conjunto en la gestión ambiental de nuestras actividades.

Atentamente,

LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
Representante
CONSORCIO GAVIONES 95
CC: Ing. José David Donoso – Apoyo a la supervisión FDRS

CONSORCIO GAVIONES 95
901.563.341-0

Bogotá D.C. 18 de junio de 2025.

Correspondencia Despachada
Consecutivo: D-32
Vigencia: 2025
Sede: CONSORCIO GAVIONES 95
Fecha de Radicación: 18/06/2025-05:49 PM
Asunto: RESPUESTA OFICIO 186-1-663 INFORMES MENSUALES AMBIENTAL
Anexos: DIGITAL
Documento: AMBIENTAL
Destinatarios Externos: ECOVIAS S.A.S-(BARRANQUILLA),UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y
D-32-2025-37

Señores
ECOVIAS SAS
Atn.: Luiggi Pugliese Mercado
intersumapaz@ecoviasas.com
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla, Atlántico

Referencia: Contrato No. 478-2022 cuyo objeto es, *"GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)"*

Asunto: Respuesta oficio 186-1-663 "Informes mensuales componente ambiental".

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos remitir para su revisión y aprobación los informes mensuales correspondientes a los periodos comprendidos entre **agosto de 2022 y abril de 2023**, así como de **febrero a abril de 2024**, según lo planteado en la mesa de trabajo del 09 de junio de 2025 entre las partes interesadas de la interventoría Ecovias SAS y el Consorcio Gaviones 95.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que puedan tener respecto a la información entregada.

Atentamente,

LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
Representante
CONSORCIO GAVIONES 95

CC: Ing. José David Donoso – Apoyo a la supervisión FDRS

4.B INFORME COMPONENTE SST


CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

ECOVIAS SAS

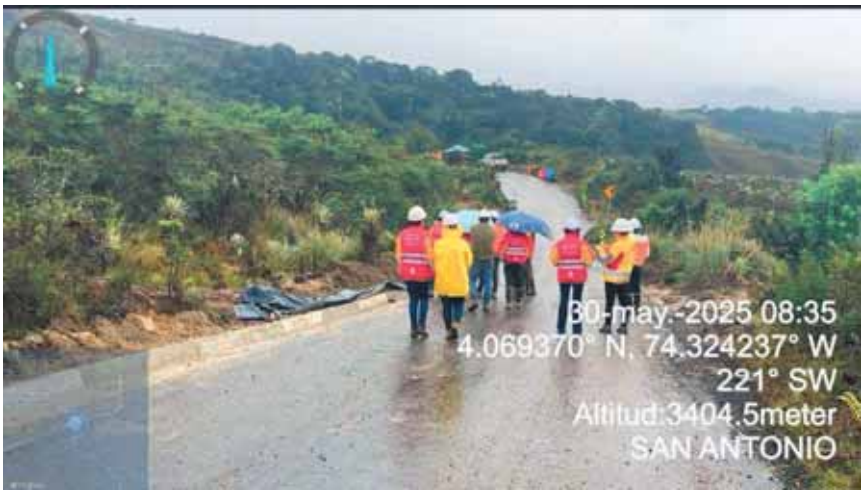

INFORME MENSUAL SST DE INTERVENTORÍA N° 29

DEL 01 al 30 DE JUNIO - DE 2025

Versión 01
Bogotá, D.C. 10 de julio de 2025

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1975 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN




Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		N°. DE COPIAS
Copia N°.1	Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	1 (Original)
Copia N°.2	Biblioteca del Proyecto	1 (Copia)

CONTROL DE VERSIONES

ÍNDICE VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFCACIÓN	FOLIOS

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 29			
PERIODO:	**01 al 30 de junio de 2025**			
NUMERO DE REVISIÓN			1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN Residente de Interventoría	Nombre:	Jesús Antonio Rincón Benavides		
	Firma:			
	Fecha:	10/07/2025		
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Ermy A. Hurtado R.		
	Firma:			
	Fecha:	10/07/2025		
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
				
	Fecha:	10/07/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

TABLA CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 8

2 OBJETIVOS 11

2.1 OBJETIVO GENERAL 11

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11

3 CONTRATO DE OBRA N^{0}. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95 12

3.1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA 12

3.2 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN SGSST Y SUS PROGRAMAS 12

3.2.1 Informes semanales SST del contratista contrato 478 12

3.2.2 Informe mensual SST del contratista contrato 478 13

3.2.3 Personal 13

3.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social 14

3.2.5 COPASST 14

3.2.6 Comité de convivencia Laboral 14

3.2.7 Inspecciones de Seguridad 14

3.2.8 Acciones Preventivas 14

3.2.9 Rotación de personal 15

3.2.10 Medicina Preventiva y del Trabajo 15

3.2.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos 15

3.2.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias 15

3.2.13 Accidentalidad 15

3.3 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 15

3.3.1 Manejo de Baños 15

3.3.2 Punto de hidratación 15

3.3.3 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros 16

3.3.4 Plan de acción 16

3.3.5 Manejo de campamentos y almacenes 16

3.3.6 Permisos de trabajo para actividades especificas 17

3.3.7 Registro de maquinaria del contratista 17

3.3.8 Investigación de accidentes 18

3.3.9 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST del contratista 18

4 CONTRATO DE OBRA N^{0}. 479 DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL. 19

4.1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA 19

4.2 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN SGSST Y SUS PROGRAMAS 19
4.2.1 Informe mensual SST 20
4.2.2 Informes semanales SST. 21
4.2.3 Personal 21
4.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social 23
4.2.5 COPASST 23
4.2.6 Comité de convivencia Laboral 23
4.2.7 Inspecciones de Seguridad 23
4.2.8 Acciones Preventivas 24
4.2.9 Rotación de personal 25
4.2.10 Medicina Preventiva y del Trabajo 25
4.2.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos 25
4.2.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias 25
4.2.13 Accidentalidad 25
4.3 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 26
4.3.1 Manejo de Baños 26
4.3.2 Punto de hidratación 26
4.3.3 Elementos de protección personal 26
4.3.4 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros 27
4.3.5 Plan de acción 27
4.3.6 Manejo de campamentos y almacenes 27
4.3.7 Registro de maquinaria del contratista 28
4.3.8 Registro de maquinaria, vehículos y equipos del CEV 28
4.3.9 Permisos de trabajo para actividades especificas 29
4.3.10 Investigación de accidentes 29
4.3.11 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST del contratista 29

5 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV 30

5.1 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN SGSST Y SUS PROGRAMAS 30
5.1.1 Informes semanales SST de la UAERMV 32
5.1.2 Informe mensual SST 32
5.1.3 Personal 33
5.1.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social 33
5.1.5 COPASST 33
5.1.6 Comité de Convivencia Laboral 33
5.1.7 Inspecciones de Seguridad 33
5.1.8 Acciones Preventivas 33

5.1.9 Rotación de personal 35
5.1.10 Medicina Preventiva y del Trabajo 35
5.1.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos 35
5.1.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias 35
5.1.13 Accidentalidad 35
5.2 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 36
5.2.1 Manejo de Baños 36
5.2.2 Punto de hidratación 37
5.2.3 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros 37
5.2.4 Plan de acción 37
5.2.5 Manejo de campamentos y almacenes 37
5.2.6 Permisos y Análisis de trabajo para actividades especificas 39
5.2.7 Registro de maquinaria, vehículos y equipos de la UAERMV 39
5.2.8 Investigación de accidentes e incidentes 40
5.2.9 Plan Estratégico de Seguridad Vial 40
5.2.10 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST de la UAERMV 40

6 CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022 41

6.1 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA 41
6.2 AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 41
6.3 CAPACITACIONES, CHARLAS E INDUCCIONES INTERVENTORÍA 41
6.4 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN SG-SST 42
6.5 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 43
6.6 PERSONAL INTERVENTORÍA 44
6.7 ACCIDENTALIDAD 44
6.8 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN 44
6.9 COMITÉS DE SEGUIMIENTO 45

7 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SST DE LA INTERVENTORIA Y LA UAERMV 45

8 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA 46

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 46

10 DOCUMENTOS SOPORTE 47

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Comités de seguimiento de obra contrato 12
Tabla 2 Relación informes semanales entregados 13
Tabla 3 Relación de personal C. Gaviones 95 - junio 2025 13
Tabla 4 Comités de seguimiento de obra contrato 479 19
Tabla 4 Relación informes semanales entregados 21
Tabla 6 Relación de personal CEV 21
Tabla 7 Maquinaria Contrato 479 Consorcio Estabilización Vial 29
Tabla 8 Comités de seguimiento de obra contrato 479 30
Tabla 9 Relación informes semanales entregados 32
Tabla 10 Maquinaria y Equipo Contrato 936 39
Tabla 11 Vehículos del contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte cin-regalías-161-2022 43
Tabla 12 Personal Contrato 161 ECOVIAS S.A.S – Interventoría 44
Tabla 13 Comités de seguimiento de obra UAERMV 45
Tabla 14 Comités de seguimiento de obra CEV 45
Tabla 15 Comités de seguimiento de obra Gaviones 95 45

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Kit de seguridad en campamento oficina 14
Ilustración 2 Campamento oficina 16
Ilustración 3 Campamento en terreno 16
Ilustración 4 Señalización de seguridad en excavación 17
Ilustración 5 Maquinaria en campo en orden 17
Ilustración 6 Kit de emergencias Tramo San Antonio 24
Ilustración 7 Kit de emergencias Tramo Tunales 24
Ilustración 8 PMT en obra, Tramo Tunales 25
Ilustración 9 Punto de hidratación campamento Tunales 26
Ilustración 10 campamento San Antonio 27
Ilustración 11 campamento San Antonio 28
Ilustración 12 Publicación políticas SST 33
Ilustración 13 Verificación PMT tramo San Antonio 34
Ilustración 14 Verificación PMT Tramo Tunales 34
Ilustración 15 Verificación PMT Tramo Capitolio 34
Ilustración 16 Elementos disponibles en caso de emergencia 35

Ilustración 17 Unidades sanitarias portátiles - Tramo Tunales 36
Ilustración 18 Unidades sanitarias portátiles – Tramo Capitolio 36
Ilustración 19 Unidades sanitarias portátiles - Tramo San Antonio..... 37
Ilustración 20 Campamento Capitolio..... 38
Ilustración 21 Campamento San Antonio 2 38
Ilustración 22 Campamento Unión Tunales..... 38

DOCUMENTOS SOPORTE

ANEXO Nº. 1. DOCUMENTACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MANTENIMIENTO VIAL
1C. LISTADO DE PERSONAL UAERMV

ANEXO Nº. 2. DOCUMENTACION CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14-02-2022
1D. CAPACITACIONES, CHARLAS E INDUCCIONES SST – INTERVENTORIA
2D. BITACORAS
3D. PREOPERACIONALES VEHÍCULOS INTERVENTORIA
4D. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES INTERVENTORIA
5D. COMUNICADOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2025.

1 INTRODUCCIÓN

Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la seguridad de la población en general que deben ser regulados a través del sistema de gestión integrado de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad. Por otro lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador el desarrollo personal y social, son promovidas a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra, de igual forma, las prácticas de control, prevención, mitigación y/o compensación de los múltiples impactos ambientales y de seguridad generados, durante los procesos constructivos. Los cuales deben ser generados y ejecutados por el contratista mediante el plan de seguridad y medio ambiente.

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratista, subcontratista, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de construcción, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto relacionado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se pude generar como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto grado de influencia de un proyecto constructivo en zonas urbanas. Por lo anterior, es de gran importancia tomar las medidas preventivas que ayuden a la integridad de la comunidad, dar cumplimiento a las buenas prácticas en obra, generar consciencia en el trabajador y la comunidad sobre el autocuidado.

En septiembre del 2019, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), presento la formulación para la implementación del proyecto de mejoramiento de vías terciarias en la localidad del Sumapaz, Bogotá D.C. con la intervención aproximadamente de 33.08 kilómetros de vía, con el propósito de solucionar la ineficiencia en la conectividad vial rural de Bogotá D.C. hacia el sector urbano y los municipios aledaños, la cual dificulta la intercomunicación terrestre de los habitantes rurales y con ello, aportar de manera significativa al desarrollo de las áreas rurales y a la mejora de la calidad de vida de la población de la ruralidad del Distrito Capital y en consecuencia de sus municipios colindantes. Teniendo en cuenta lo descrito en la ficha técnica de MGA del 29 de diciembre de 2019 según el código del proyecto BPIN 2018000050020, se tiene proyectado una población beneficiada de 8.281.030 personas.

Mediante este informe, se ofrece al lector un contexto más amplio en el desarrollo de las actividades NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL DE SUMAPAZ, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo - SST de los sectores Capitolio, y Tunales de la localidad de Sumapaz durante el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2025, con el fin del cumplimiento del Plan de Desarrollo Local "Sumapaz en paz, más productiva y ambiental para todos" 2017- 2020. A fin de ejecutar las actividades de interventoría, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz convocó el Concurso de Méritos Ni FDRS-CMA-182-2021, cuyo objeto es la

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR., mediante la Resolución Nº 008 del 04 de febrero de 2022.

Este proceso de Concurso de Méritos le fue adjudicado a **ECOVÍAS S.A.S**, mediante la Resolución NI. 008 del 04 de febrero de 2022 por un valor inicial del contrato de $3.104.380.144,00**,** en un plazo inicialmente establecido de quince (15) meses.

La entidad contratante frente a las necesidades de la región por mejorar las vías de acceso, adelanto el proceso de licitación púbica Nº LP-006-2021 con el fin de contratar lo que se requiere para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" y la ejecución de las obras viales por parte de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para el proyecto del Sistema General de Regalías – SGR identificado con código BPIN 2018000050020, El cual va a ser ejecutado por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV, mediante un modelo de ejecución mixta, que contempla dos procesos de obra independientes, los cuales se describen a continuación:

Obras hidráulicas (Subdrenes, Berma-cunetas, box culvert) y muros en gavión los cuales se ejecutarán mediante el contrato que surja de la Licitación pública Nº LP-006-2021, cuyo objeto es " CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁHULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO" MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020", Publicado por UAERMV el 5 de octubre de 2021, en la plataforma SECOP II, por un valor estimado de 24.641.217.103, es importante mencionar que dicho proceso licitatorio se adelantara por lotes, teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y se distribuirá de la siguiente manera: Lote 1- San Antonio I (K13 +820- K6+910), Capitolio y Laguna Verde, (Valor estimado de $12.013.390,090) y Lote 2 – San Antonio II (K6+910+K0+00), Unión Tunales y Animas Bajas (Valor estimado de 12.627.827.013)

Instalación de material granular y del fresado estabilizado en las vías, serán ejecutadas directamente por la UAERMV, por un valor aproximado de $32.927.529.354

El CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº. 478 DEL 10/02/2022 fue adjudicado al Consorcio Gaviones 95. "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGOBPIN 2018000050020. (San Antonio

I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.) el cual tendrá a cargo las obras hidráulicas (Subdrenes, Berma- cunetas, box culvert) y muros en gavión mencionadas en el objeto del contrato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº. 479 DEL 10/02/2022 fue adjudicado al Consorcio Estabilización Vial. "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") el cual tendrá a cargo las obras hidráulicas (Subdrenes, Berma- cunetas, box culvert) y muros en gavión mencionadas en el objeto del contrato.

Instalación del material granular y del fresado estabilizado en las vías, serán ejecutadas directamente por la UAERMV, el CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 deberá supervisar las actividades ejecutadas por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, conforme al proyecto Código BPIN 2018000050020 cuyo objeto es "Mejoramiento de las Vías Terciarías en Bogotá"

Respecto a los contratos de prestación de servicios se está preparando oficio para entrega de contratos según Modificatorio N°. 2 del contrato CIN REGALIAS-161-2022, y para dar respuesta a los comunicados 20237020009711 y 20237010010252.

El presente informe mensual de interventoría a cargo de **ECOVIAS S.A.S.,** describe el seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se relacionan las actividades que se han desarrollado como parte de los controles y seguimientos que efectúa la interventoría a la seguridad y salud en el trabajo en la obra. El informe tiene como objetivo presentar el trabajo conjunto del contratista y la interventoría en pro del manejo de la seguridad en obra y de la conservación del medio ambiente laboral del período que corresponde del 1 al 30 de junio de 2025.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El presente informe expone, la gestión en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo del PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR., mediante la Resolución Nº 008 del 04 de febrero de 2022., también lo relacionado con la gestión de la Interventoría CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022, adjudicado a **ECOVÍAS S.A.S**, mediante la Resolución NI. 008 del 04 de febrero de 2022 por un valor inicial del contrato de $3.104.380.144,00**,** en un plazo inicialmente establecido de quince (15) meses, y con un plazo final de (23) meses y (29) días, el presente informe que corresponde al periodo transcurrido entre el 01 al 30 de junio de 2025, busca además, identificar de manera oportuna, hallazgos y/o inconvenientes asociados, haciendo seguimiento de las rutas críticas en el avance de los contratos para dar una solución a cada situación que lo amerite para la Etapa de Construcción.

2.2 Objetivos específicos

- Realizar seguimiento continuo a lo largo del proyecto y reportar sobre los avances y los resultados de la aplicación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

- Seguimiento a la UAERMV y contratistas hidráulicos, sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley.

- Verificar que se mantengan o mejoren las condiciones laborales para los trabajadores de la obra.

3 CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95

3.1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA

A continuación, la Interventoría presenta un resumen de la supervisión a las actividades adelantadas por el contratista Consorcio GAVIONES 95, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con la Etapa de Construcción, para el periodo de 01 al 30 de junio de 2025, conforme a los compromisos contractuales.

3.2 Verificación de las actividades según SGSST y sus programas

Durante el presente periodo, la contratista realiza actividades de replanteo y construcción de filtros en tramo de Laguna Verde.

En visitas a obra no se evidencia profesional SST en campo, de parte del contratista.

Tabla 1 Comités de seguimiento de obra contrato

COMITÉS DE OBRA JUNIO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
46	06 de junio de 2025	Se solicita la presencia en campo del profesional SST, para supervisión y guía de actividades en campo. Se crea compromiso de entrega informes semanales de abril y mayo subsanados para el 08 de junio de 2025 entregan informe SST mensual de abril y mayo de 2025 el 05-06-2025, los cuales están en revisión Se subsana observación de uso de unidades sanitarias con la presentación de acta de uso de unidades sanitarias en casas aledañas a la obra
	Del 09 al 21 de junio de 2025	Por solicitud del contratista, no se realizó comité
47	27 de junio de 2025	Se solicita la presencia en campo del profesional SST, para supervisión y guía de actividades en campo. No se ha entregado informe SST mensual de abril, se deja compromiso de entrega para el 02-06-2025 Se realizó actas de uso de unidades sanitarias por parte del componente social. Se acuerda para 4 de junio, realizar mesa de trabajo con el profesional SST y tratar temas sobre el componente.

3.2.1 Informes semanales SST del contratista contrato 478

Durante el presente periodo el contratista, presenta informes del periodo correspondiente, los cuales están en observación.

Tabla 2 Relación informes semanales entregados

INFORMES SEMANALES SST ENTREGADOS DE JUNIO DE 2025			
FECHA DE 1ra ENTREGA	**FECHA DE 2da ENTREGA**	**PERIODO**	**RESPONSABLE DE ENTREGA**
		Del 02 al 07 de junio de 2025	Paul Alberto Rangel Páez
		Del 09 al 14 de junio de 2025	Paul Alberto Rangel Páez
24-07-2025		Del 16 al 21 de junio de 2025	Paul Alberto Rangel Páez
01-07-2025		Del 24 al 28 de junio de 2025	Paul Alberto Rangel Páez

3.2.2 Informe mensual SST del contratista contrato 478

Durante el presente periodo el contratista, presenta informe SST de junio de 2025, el 07 de junio de 2025, el cual está en revisión.

3.2.3 Personal

Durante el presente periodo el contratista, entregó reporte de personal.

Tabla 3 Relación de personal C. Gaviones 95 - junio 2025

LISTADO PERSONAL EN OBRA					
No.	NOMBRE	CC	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	Luis Orlando Pulido	79,554,518	Director	05/04/2025	No Aplica
2	Paul Alberto Rangel Páez	88,002,563	Residente SST	05/04/2025	No Aplica
3	Cesar Augusto Delgado	1,022,324,860	Residente Ambiental	05/04/2025	No Aplica
4	Jhon Gabriel Yate Botache	1,098,648,719	Residente Técnico	12/05/2025	No Aplica
5	Maximino Becerra Yacumal	4,743,041	Topógrafo	09/04/2025	No Aplica
6	Andrés Alberto García Posada	79,756,111	Residente Social	12/05/2025	No Aplica
7	Wilson Orlando Rodríguez Sanabria	74,334,263	Cadenero	05/04/2025	No Aplica
8	Arístires Pardo Niño	13,526,015	Oficial de Obra	06/04/2025	No Aplica
9	John Jairo Guerrero Cabrera	79,183,755	Conductor	12/05/2025	No Aplica
10	William Hernández Ortega	1,000,464,177	Ayudante de Obra	05/05/2025	No Aplica
11	Katherine Tovar	1,010,220,888	Talento Humano	05/05/2025	No Aplica
12	Leidy Johana Bastidas Arévalo	1,016,078,304	Secretaria	05/05/2025	No Aplica
13	Walter Andrés Albino Beltrán	1.013.627.988	Conductor	10/06/2025	No Aplica
14	Liz Maribel Murillo Naranjo	1.054.709.749	Profesional SISOMA	10/06/2025	No Aplica
15	Junior Yesid Rodríguez Jiménez	1.192.924.869	Conductor	24/06/2025	No Aplica
16	Osman Andrés Camacho González	14.327.218	Conductor	24/06/2025	No Aplica

3.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social

Durante el presente periodo el contratista, presentó las planillas de seguridad social, en el informe mensual, el cual está en revisión.

3.2.5 COPASST

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado información acerca del COPASST, esta se solicitará junto con el informe mensual SST.

3.2.6 Comité de convivencia Laboral

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado información acerca del Comité de Convivencia Laboral, esta acta se solicitará junto con el informe mensual SST.

3.2.7 Inspecciones de Seguridad

Durante el presente periodo el contratista, presenta soporte de Inspecciones de Seguridad, estas van adjuntas en el informe del periodo correspondiente.

3.2.8 Acciones Preventivas

Durante el presente periodo el contrato 478, presentó información acerca de acciones preventivas SST, como lo son capacitaciones e inspecciones de seguridad.



Ilustración 1 Kit de seguridad en campamento oficina

3.2.9 Rotación de personal

Durante el presente periodo el contratista, no reporto rotación de personal.

3.2.10 Medicina Preventiva y del Trabajo

Durante el presente periodo el contratista, presenta documentación al respecto, junto con el informe SST del periodo el cual está en revisión.

3.2.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos

Durante el presente periodo el contratista, presenta información acerca de Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos SST, el cual va en el informe del periodo correspondiente.

3.2.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado información acerca de Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias, al respecto el contratista deberá presentar en el informe SST dicha información.

3.2.13 Accidentalidad

Durante el presente periodo el contratista, no ha reportado accidentes en su equipo de trabajo.

3.3 Actividades de Seguridad Industrial

Las actividades de higiene industrial se encuentran ligadas a medir y controlar todos aquellos factores ambientales implícitos de cada labor, ya que estas características pueden generar en el trabajador algún efecto negativo ligado con el nivel de exposición a corto, mediano o largo plazo. Con el fin de prevenir esta afectación a la población trabajadora, se dio verificación y atención a los siguientes elementos por parte de la Interventoría:

3.3.1 Manejo de Baños

Durante el presente periodo el contratista, presenta acta de uso de baños, en casas de la zona donde realizan obra, esta fue gestionada por el componente social.

3.3.2 Punto de hidratación

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado evidencia de puntos de hidratación en obra.

3.3.3 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros

Durante el presente periodo el contratista, presenta Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros, la cual va adjunta en el informe del periodo presentado.

3.3.4 Plan de acción

Durante el presente periodo el Consorcio, no tiene planes de acción relacionadas a la matriz de riesgos, debido a que no hubo cambios en la misma.

3.3.5 Manejo de campamentos y almacenes

Durante el presente periodo el contratista, reportó dos campamentos en obra para el personal permanente en obra, de los cuales uno es una carpa en terreno y el campamento que a la vez es oficina.

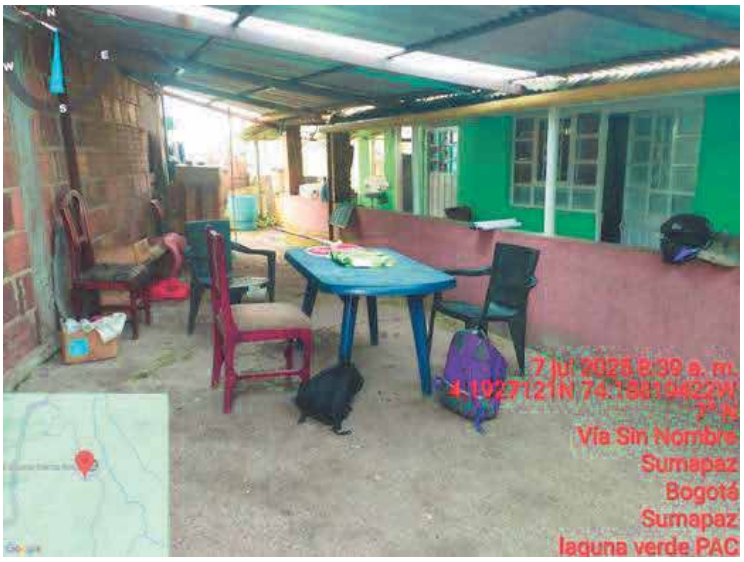


Ilustración 2 Campamento oficina



Ilustración 3 Campamento en terreno



Ilustración 4 Señalización de seguridad en excavación

3.3.6 Permisos de trabajo para actividades especificas

Durante el presente periodo el contratista, no ha realizado actividades en campo que requieran permisos de trabajo.

3.3.7 Registro de maquinaria del contratista

Para el presente periodo el contratista no reporta maquinaria ni vehículos, sin embargo la interventoría observa: 01 mini excavadora de oruga, marca Caterpillar, una Retro excavadora, marca Caterpillar, 01 Minicargador, marca Caterpillar, 01 Volqueta doble cabina, placa TSR567 y 01 volqueta sencilla marca FORD, placa SBA805, de esta última no se evidenció documento preoperacional, para lo cual esta información se solicitará junto con el informe SST del periodo correspondiente.



Ilustración 5 Maquinaria en campo en orden

3.3.8 Investigación de accidentes

Durante el presente periodo el contratista, no ha tenido accidentes laborales, por ello no hay reporte.

3.3.9 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST del contratista

El contratista no ha presentado información acerca de Indicadores SST.

4 CONTRATO DE OBRA Nº. 479 DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.

4.1 Gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista

A continuación, la Interventoría presenta un resumen de la supervisión a las actividades adelantadas por el contratista Consorcio Estabilización Vial (CEV), en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con la Etapa de Construcción, para el periodo de 01 al 30 de junio de 2025, conforme a las obligaciones contractuales.

4.2 Verificación de las actividades según SGSST y sus programas

Durante el presente periodo el contratista, adelanta labores en el tramo 4 Unión tunales de (levantamiento de detalles, construcción de cunetas), y Toldo - San Antonio 2, tramo 9 (levantamiento de detalles, construcción de cunetas).

Tabla 4 Comités de seguimiento de obra contrato 479

COMITÉS DE OBRA JUNIO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
68	05 de junio de 2025	Retiro de varillas en tramo 2 tunales Esta pendiente Tramo 1, K2+090 y 623 Organización de EPPs no dejarlos botados Se solicita entibar excavación de alcantarillas en San Antonio (se está realizando, por temas u de lluvia se paró la labor) 10 de junio Se solicitó el segundo SST en terreno está en revisión Pendiente entrega de informes semanales de mayo 05 06 2025 Compromiso En San Antonio se solicita mantener despejado el kit de emergencia ya que están colocando dotación encima Señalización en alcantarillas al derredor 1 metro a la redonda próximo 09-06-2025 Socializar el uso de guarda de seguridad de las mezcladoras No dejar el botellón de agua en el piso, buscar un sitio adecuado y señalizarlo Extintor no dejarlo puesto directamente en el piso ya que se despresuriza. Se evidencia acopio de gravilla sin señalizar Se solicita al CEV, si se realiza contratación de terceros contratistas, estos deben ser aprobados tanto por la entidad contratante que es la UMV e interventoría.
69	13 de junio de 2025	Retiro de varillas en tramo 2 tunales Esta pendiente Tramo 1, K2+090 y 623 Organización de EPPs no dejarlos botados Se solicita entibar excavación de alcantarillas en San Antonio compromiso para el 10 de junio, lo cual no se cumplió Se solicitó el segundo SST en terreno está en revisión hoja de vida por la interventoría Señalización en alcantarillas al derredor 1 metro a la redonda, compromiso para 09-06-2025, no se cumplió Socializar el uso de guarda de seguridad de las mezcladoras
70	19 de junio de 2025	Compromisos: Retiro de varillas en tramo 1 en Tunales (Hay dos varillas en Tramo 1, K2+090 y 623) se crea compromiso para el 13-06-2025 (se cumplió) Se solicita entibar excavación de alcantarillas en San Antonio, compromiso para el 10 de junio (no se cumplió) Segundo SST está pendiente de aprobación de parte de la interventoría

COMITÉS DE OBRA JUNIO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
		Señalización en alcantarillas al derredor 1 metro a la redonda (compromiso para 09-06-2025) No se ha cumplido 24-06-2025 Se solicitó no dejar el botellón de agua en el piso y señalizarlo por temas de higiene (Se cumplió) Extintor no dejarlo puesto directamente en el piso ya que se despresuriza. (Se cumplió) Se solicita orden y aseo en campamentos y zona de mezclado (No se ha cumplido) Se observan trabajadores sin overol identitario en tramo San Antonio, (No se ha cumplido) Trabajadores en San Antonio, argumentan que las casas que tienen como permiso de uso sanitario es muy lejos, a lo cual la resolución indica que desde el lugar de trabajo a las unidades debe haber máximo 100 metros, por lo tanto, se solicita ver la posibilidad de contratar unidades sanitarias móviles (No se ha cumplido) Temas a tratar: Pendiente entrega de informes semanales de mayo (Compromiso para el 05-06-2025, se cumplió el 06-06-2025) se realizaron observaciones a los informes semanales presentados los cuales deben ir en formatos PDF En San Antonio se solicita mantener despejado el kit de emergencia ya que están colocando dotación encima (No se ha cumplido) No se evidencian auxiliares de tráfico, se propone la no contratación por termino de mes y medio a dos meses, para crear fidelidad en los trabajadores. De este tema el director de la UMV, dijo que pasará un comunicado para evitar la contratación del personal de forma inmediata. Se solicita socializar con el personal el orden y aseo ya que se evidencia material de construcción en vía. Se solicita subsanar el tema de overoles en los trabajadores
71	27 de junio de 2025	Compromisos: Se solicita entibar excavación de alcantarillas en San Antonio, compromiso para el 10 de junio (no se cumplió) Segundo SST está pendiente de aprobación de parte de la interventoría Señalización en alcantarillas al derredor 1 metro a la redonda (compromiso para 09-06-2025) No se ha cumplido 24-06-2025 Se solicitó no dejar el botellón de agua en el piso y señalizarlo por temas de higiene (No se cumplió) Se solicita orden y aseo en campamentos y zona de mezclado Se observan trabajadores sin overol identitario en tramo San Antonio, (No se ha cumplido) Unidades sanitarias móviles (No se ha cumplido) Temas a tratar: Ya se revisó informes 18 y 19 de abril y mayo de los cuales se emitió comunicado Pendiente entrega de informes semanales de junio (Compromiso para el 05-06-2025, se cumplió el 06-06-2025) se realizaron observaciones a los informes semanales presentados los cuales deben ir en formatos PDF 24 jun enviado kit de emergencia en orden Se solicita socializar con el personal el orden y aseo ya que se evidencia material de construcción en vía. Se solicita subsanar el tema de overoles en los trabajadores Cerca afectada en el K1+550 Orden y aseo en carpa blanca de tunales

4.2.1 Informe mensual SST

Para el presente periodo el contratista realiza entrega de informe mensual SST correspondiente al mes de junio de 2025, el día 07 de julio de 2025, este se encuentra en revisión.

4.2.2 Informes semanales SST.

Durante el presente periodo el contratista, presentó informes de la semana 1, 2, 3 y 4 de junio de 2025, mediante correo electrónico.

Tabla 5 Relación informes semanales entregados

INFORMES SEMANALES SST ENTREGADOS DE JUNIO DE 2025			
FECHA DE 1ra ENTREGA	**FECHA DE 2da ENTREGA**	**PERIODO**	**RESPONSABLE DE ENTREGA**
27-06-2025		Del 02 al 07 de junio de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda
27-06-2025		Del 09 al 14 de junio de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda
27-06-2025		Del 16 al 21 de junio de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda
02-07-2025		Del 24 al 28 de junio de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda

4.2.3 Personal

Durante el presente periodo el contrato 479, presenta listado de personal, en total reportan 38 trabajadores.

Tabla 6 Relación de personal CEV

Consorcio Estabilización Vial

ITEM	NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA	No. IDENTIFICACION	CARGO	TELEFONO/ CORREO
1	Ing. Hernando Laverde	1,032,362,624	Director de obra	consorcioestabilizavionvial@gmail.com
2	Ing. Alejandra Cangrejo	1.020.732.799	Coordinadora de proyectos	cevsumapaz@gmail.com
3	Ing. Richard Betancourt Rodríguez	1.069.751.169	Residente técnico	cevsumapaz@gmail.com
4	Gloria Liliana Sepúlveda Garzón	52.499.577	Coordinadora HSEQ	cevsumapaz@gmail.com
5	Elvia Alejandra Limas Plazas	11.022.351.286	Profesional Social	cevsumapaz@gmail.com
6	Lorena Andrea Gómez Ramírez	1.032.388.748	Profesional ambiental	cevsumapaz@gmail.com
7	Luis David Franco Muñoz	1.010.233.913	Ing. Topógrafo	cevsumapaz@gmail.com
8	Francisco Javier Molina Rey	1.003.486.864	Aux. cadenero	cevsumapaz@gmail.com
9	Francy Yolima Sanabria Penagos	1.001.170.073	Aux. de operaciones	cevsumapaz@gmail.com
10	Diana Cristina Avellaneda Hernández	1.002.548.039	Aux. de operaciones	cevsumapaz@gmail.com
11	Marly Yudeyby Cruz Guzmán	1.003.671.153	Aux. de operaciones	cevsumapaz@gmail.com
12	Elvia María Camargo López	1.023.029.173	Aux. de operaciones	cevsumapaz@gmail.com

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

ITEM	NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA	No. IDENTIFICACION	CARGO	TELEFONO/ CORREO
Maquinas Amarillas S.A.S				
ITEM	**NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA**	**No. IDENTIFICACION**	**CARGO**	**TELEFONO/ CORREO**
1	Hermes Guerrero Vargas	79.815.760	Operario de minicargador	7023060 consorcioestabilizavionvial@gmail.com
2	Ferney Castro	12.277.155	Operario de minicargador	7023060 cevsumapaz@gmail.com
3	Jorge Leonardo Tejedor Aguilar	1.055.552.094	conductor de volqueta	7023060 cevsumapaz@gmail.com
4	Rafael Niño Galindo	79.420.343	conductor de volqueta	7023060 cevsumapaz@gmail.com
5	Pablo David Plazas Novoa	79.583.074	conductor de volqueta	7023060 cevsumapaz@gmail.com
L&D Ingeniería, Construcción y Consultoría S.A.S. con NIT. 901.695.388				
ITEM	**NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA**	**No. IDENTIFICACION**	**CARGO**	**TELEFONO/ CORREO**
1	Julián Mauricio Preciado Mosos	1110466774,00	Supervisor de obra	julianproyectosldingenieria@gmail.com
2	Sebastián Perilla Castiblanco	1007912209,00	Supervisor de obra	sebastianproyectosldingenieria@gmail.com
3	Cesar Agusto Moscote Polo	1079934649,00	Maestro de obra	cesaragustomoscotepolo@gmail.com
4	Luis Alfredo Moscote Polo	1079937109,00	Oficial	saavedraleonel162@gmail.com
5	Leonel Saavedra Reyes	13959536,00	Oficial	saavedraleonel162@gmail.com
6	Duván Alexander Peñaloza Valbuena	10075190465,00	Ayudante de obra	alexduvan65@gmail.com
7	Manuel Darío Saumeth Pardo	1120738400,00	Ayudante de obra	smanueldariosaumeth@gmail.com
8	Samuel Delgado Naranjo	1.007.297.818	Ayudante de obra	samueldelgadonaranjo@gmail.com
9	Yulian David Romero Poveda	1022946347,00	Ayudante de obra	yuliandavidromeropoveda@gmail.com
10	Edison Ancizar Díñate Susa	1023036214,00	Ayudante de obra	acizarsusa23082019@gmail.com
11	Habiasney Pineda Cruz	1069230764,00	Ayudante de obra	habiasneypa@gmail.com
12	Lenin José Moscote Polo	1128178531,00	Ayudante de obra	licethperea2018@gmail.com
13	Libier Duván Ramírez Robayo	1022925239,00	Ayudante de obra	duvanramirez293@gmail.com
14	Luis Hernando Ramírez Peñaloza	3125436	Ayudante de obra	lucltoramirezpeñalosa@gmail.com
15	Anderson Fabian Runza Susa	1069751058	Ayudante de obra	licethperea2018@gmail.com
16	Miller Andrés Ramírez Peñaloza	3125370	Ayudante de obra	millerramirez188@gmail.com

ITEM	NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA	No. IDENTIFICACION	CARGO	TELEFONO/ CORREO
17	José Yeferson Viuche Viuche	1006093160	Ayudante de obra	joseviuche2014@gmail.com
18	Julián Manuel Quiroga Palacios	1001287552	Ayudante de obra	palaciosjulian135@gmail.com
19	Elkin Steven Caro Peñaloza	1032656213	Ayudante de obra	elkin2006aro@gmail.com
Geocretos Ingeniería. S.A.S				
ITEM	**NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA**	**No. IDENTIFICACION**	**CARGO**	**TELEFONO/ CORREO**
1	Edgar Mancilla Salas	91.447.428	Laboratorista	info@geocretos.com
Maquiservicios Pérez, con NIT 900.667.937				
ITEM	**NOMBRE DEL PESONAL DE OBRA**	**No. IDENTIFICACION**	**CARGO**	**TELEFONO/ CORREO**
1	Luis Fernando Acevedo Pulido	1031170075	OPERARIO DE RETRO EXCAVADORA	3885231 maquiservicioperez@hotmail.com

4.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social

Durante el presente periodo el contratista, presenta planillas de seguridad social las cuales están en revisión.

4.2.5 COPASST

Durante el presente periodo el contratista no presenta acta de reunión del COPASST, correspondiente al mes de junio de 2025, debido a que hubo rotación de personal que estaban como representantes, el contratista argumenta para el próximo periodo realizar nuevamente la conformación del COPASST.

4.2.6 Comité de convivencia Laboral

Durante el presente periodo el contratista, no presenta información del Comité de Convivencia Laboral, debido a que hubo rotación de personal que estaban como representantes, el contratista argumenta para el próximo periodo realizar nuevamente la conformación del CCL.

4.2.7 Inspecciones de Seguridad

Durante el presente periodo el contratista presenta soportes de inspecciones de seguridad, las cuales van en el informe presentado.

4.2.8 Acciones Preventivas

Durante el presente periodo, la interventoría ha evidenciado visualmente que el CEV, ha realizado entrega, reposición y uso adecuado de EPP, se mantiene la correcta implementación de PMT y puntos ecológicos como se evidencia en el registro fotográfico



Ilustración 6 Kit de emergencias Tramo San Antonio



Ilustración 7 Kit de emergencias Tramo Tunales



Ilustración 8 PMT en obra, Tramo Tunales

4.2.9 Rotación de personal

Durante el presente periodo el CEV, reporta rotación de ocho trabajadores.

4.2.10 Medicina Preventiva y del Trabajo

El contratista deberá entregar en el informe del mes de mayo los soportes correspondientes a exámenes ocupacionales de trabajadores nuevos y demás actividades que se hayan hecho al respecto dentro de los 5 primeros días del mes.

4.2.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos

Durante el presente periodo el contratista, presenta soportes de capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos, las cuales van adjuntos en el informe SST del periodo reportado.

4.2.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias

Para el presente periodo el contratista, reporta elementos completos de kit de emergencias, el cual va en el informe del periodo reportado.

4.2.13 Accidentalidad

Durante el presente periodo el contratista no presentó accidentes en su grupo de trabajo, por lo tanto, no hay reporte en cuanto al tema.

4.3 Actividades de Seguridad Industrial

Las actividades de higiene industrial se encuentran ligadas a medir y controlar todos aquellos factores ambientales implícitos de cada labor, ya que estas características pueden generar en el trabajador algún efecto negativo ligado con el nivel de exposición a corto, mediano o largo plazo. Con el fin de prevenir esta afectación a la población trabajadora, se dio verificación y atención a los siguientes elementos por parte de la Interventoría:

4.3.1 Manejo de Baños

Durante el presente periodo el contratista reporta uso de unidades sanitarias en los diferentes tramos "Tunales y San Antonio", estas unidades fueron solicitadas en préstamo en las casas contiguas a los tramos en obra.

4.3.2 Punto de hidratación

Durante el presente periodo la interventoría, observa puntos de hidratación en obra.



Ilustración 9 Punto de hidratación campamento Tunales

4.3.3 Elementos de protección personal

La Interventoría observa la entrega de dotación y EPP a personal nuevo y la reposición de EPP por deterioro al personal antiguo, en el informe del periodo correspondiente se deberán adjuntar los soportes correspondientes.

4.3.4 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros

Durante el presente periodo el contratista no presenta cambios en su matriz de riesgos y valoración de peligros, por lo tanto, no se solicita.

4.3.5 Plan de acción

Durante este periodo no se reportaron o evidenciaron hallazgos derivados de auditorías o inspecciones externas, por lo que no fue necesario realizar plan de acción.

4.3.6 Manejo de campamentos y almacenes

La interventoría verifica en este periodo la instalación de campamento administrativo, en el caserío de la Unión y dentro del mismo un almacén general para la operación del proyecto.

Se observa campamentos en los tramos Tunales y San Antonio, para resguardo de los trabajadores en caso de lluvias y lugar para instalación de kits de emergencias.



Ilustración 10 campamento San Antonio



Ilustración 11 campamento San Antonio

4.3.7 Registro de maquinaria del contratista

Para el presente periodo el contratista, presenta reporte de formatos de mantenimiento de máquinas y vehículos en terreno, estos van adjuntos al informe del periodo reportado.

4.3.8 Registro de maquinaria, vehículos y equipos del CEV

La interventoría, en su labor de verificación y aprobación de la maquinaria, equipos y vehículos que presenta el CEV, para la operación en el proyecto, efectúa una comprobación de los documentos legales de cada uno, para determinar su operatividad en el frente de trabajo, para el presente periodo el CEV, presentó documentos de maquinaria y vehículos que están utilizando en el proyecto los cuales deberán ir adjuntos en el informe del correspondiente periodo.

En conjunto con la revisión realizada por la parte técnica de la maquinaria, equipos y vehículos, el componente SST, deberá realizar la verificación de las afiliaciones y pagos de planillas de seguridad social integral que estén vigente, con afiliación ARL en riesgo correspondiente al nivel de riesgo expuesto, exámenes médicos ocupacionales vigentes y sin restricciones al cargo de los operadores de estos.

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria, vehículos y equipo, destinados a la ejecución de la obra, del CEV.

Tabla 7 Maquinaria Contrato 479 Consorcio Estabilización Vial

MAQUINARIA CEV/ JUNIO 2025						
EQUIPO/ VEHICULO	**MARCA**	**SERIE/PLACA**	**MODELO**	**FIJA EN OBRA**	**INTERMITENTE EN OBRA**	**UBICACIÓN**
Retroexcavadora	JOHN DEERE	310SJ-KC368132	2019	X		El Toldo
Volqueta	CHEVROLET	SRN910	2008		X	Tunales / El Toldo
Volqueta	CHEVROLET	SRN912	2008		X	Tunales / El Toldo
Minicargador	CASE	SR200B	2024	X		Tunales
Minicargador	CASE	SR200	2018	X		Toldo
Camioneta	FORD	KXY 360	2022	X		Tunales/ El Toldo
Camioneta	FORD	KXT 299	2023	X		Tunales/ El Toldo
Camioneta	NISSAN FRONTIER	FSW675	2019	X		Tunales/ El Toldo
Camioneta	FORD	GPY162	2020	X		Tunales/ El Toldo

4.3.9 Permisos de trabajo para actividades especificas

Durante el presente periodo el CEV, no requirió diligenciamiento de permisos de trabajo, ya que las actividades que se están realizando no lo requieren.

4.3.10 Investigación de accidentes

Durante el presente periodo el CEV, no reporto accidentes laborales debido a la ausencia de los mismos.

4.3.11 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST del contratista

Durante el presente periodo el contratista, presentó reporte de los indicadores, los cuales van en el informe mensual SST.

5 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV

A continuación, la Interventoría presenta un resumen de la supervisión a las actividades adelantadas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con la Etapa de Construcción, para el periodo del 1 al 30 de junio de 2025, conforme a los compromisos contractuales.

5.1 Verificación de las actividades según SGSST y sus programas

Durante el presente periodo la UAERMV, tiene las siguientes actividades SST.

Tabla 8 Comités de seguimiento de obra contrato 479

COMITÉS DE OBRA JUNIO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
46	05 de junio de 2025	Por ausencia del director de la UAERMV, no se realiza comité
47	13 de junio de 2025	Compromiso para el 6 de junio de 2025, revisión de informes octubre, noviembre y diciembre de 2023, de parte de la interventoría Compromiso de la UMV para solicitar los uniformes identitarios al personal de maquinaria se generó oficio Preoperacionales de maquinaria amarilla, se solicita que cada máquina tenga su preoperacional acorde a la máquina, ya que cada una es distinta y el preoperacional que se viene manejando es general. Ya se solicitó de parte de la UMV se espera respuesta. Retroexcavadoras y vibrocompactador varadas en San Antonio Realizar retiro o señalización visible de hister en San Antonio En Tunales operadores sin preoperacionales minicargador y carrotanques En tramo Tunales, se evidencia Motoniveladora parqueada al borde del talud de la vía Informes semanales al día.
48	19 de junio de 2025	Compromisos Compromiso de la UMV para solicitar los uniformes identitarios al personal de maquinaria (se subsanó parcialmente ya que se evidencia personal en tramo Tunales sin el overol correspondiente) Preoperacionales de maquinaria amarilla, se solicita que cada máquina tenga su preoperacional acorde a la máquina (se cumplió). Realizar retiro o señalización visible de hister en San Antonio (no se ha cumplido) Se observa volqueta en Capitolio, la cual, no le funcionan luces de parqueo, direccionales, no tiene kit de carretera adecuado, ya que tiene un extintor de 5 lib. Y para este tipo de vehículo debería ser de 10 libras como mínimo. El kit que tiene en el momento es dos tacos de plástico una bolsa plástica

COMITÉS DE OBRA JUNIO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
		con 4 elementos de botiquín (se debe tener un botiquín completo mínimo tipo A) (no se cumplió) Temas a tratar Se observa volqueta en Capitolio, la cual, no le funcionan luces de parqueo, direccionales, no tiene kit de carretera adecuado, ya que tiene un extintor de 5 lib. Y para este tipo de vehículo debería ser de 10 libras como mínimo. El kit que tiene en el momento es dos tacos de plástico una bolsa plástica con 4 elementos de botiquín (se debe tener un botiquín completo mínimo tipo A) Se evidencia dos de los minicargadores con llantas lisas, Tramos Capitolio y Tunales Realizar retiro o señalización visible de hister en San Antonio Minicargador Bobcat varado desde el viernes en tramo Tunales Operadores de maquinaria en tramo Tunales no les han suministrado overol Paleta de auxiliar de tráfico de tunales está deteriorada Vibrocompactador doble rodillo no le funciona la alarma de reversa En mayo se evidencio vibrocompactador de 12 ton. Y en el reporte no lo tienen en cuenta Una persona de la zona de Capitolio abordó a la interventoría y dijo que vio al operador del retrocargador sacando combustible de la maquina en una pimpina y dejando la misma escondida en el monte, a lo cual esta persona fue y tomo este galón y lo guardó en la casa, después de esto vio en la noche personas buscando algo en esta misma área y al día siguiente el operador del minicargardor le dijo al inspector que él había dejado dicha pimpina. El día 18 de junio de 2025 la interventoría subió al tramo Tunales tramo 4 a las 12.00, ya no había auxiliares
49	30 de junio de 2025	Compromisos Compromiso de la UMV para solicitar los uniformes identitarios al personal de maquinaria se observó uno de los trabajadores con ropa de diario encima del uniforme, se solicita socializarle a este trabajador el uso adecuado del overol (operador de retroexcavadora de Tunales) Preoperacionales de maquinaria amarilla, se evidencia que algunos de los operadores y conductores no están realizando el diligenciamiento de los mismos a primera hora de la jornada Se observa volqueta en Capitolio, la cual, no le funcionan luces de parqueo, direccionales, no tiene kit de carretera adecuado, ya que tiene un extintor de 5 lib. Y para este tipo de vehículo debería ser de 10 libras como mínimo. El kit que tiene en el momento es dos tacos de plástico una bolsa plástica con 4 elementos de botiquín (se debe tener un botiquín completo mínimo tipo A) (no se cumplió) Temas a tratar Se observa volqueta en Capitolio, la cual, no le funcionan luces de parqueo, direccionales, no tiene kit de carretera adecuado, ya que tiene un extintor de 5 lib. Y para este tipo de vehículo debería ser de 10 libras como mínimo. El kit que tiene en el momento es dos tacos de plástico una

COMITÉS DE OBRA JUNIO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
		bolsa plástica con 4 elementos de botiquín (se debe tener un botiquín completo mínimo tipo A) compromiso para el 01 o 02 de julio Paleta de auxiliar de tráfico de tunales está deteriorada (No se ha cumplido) 02 de julio Unidades sanitarias de San Antonio en el K9 no tienen gel antibacterial, compromiso para ya se hizo Está pendiente la subsanación a observaciones del informe de abril de 2025, 04 de julio Minicargador Bobcat varado desde el viernes 14 de junio, en tramo Tunales, y con el operador en sitio. Minicargador Bobcat de San Antonio, no le funciona la alarma de reversa Vibro compactador doble rodillo de San Antonio, no tiene fuerza en la operación el cual si lo colocan en una pendiente este no tendría la garantía de sostenerse pudiendo ocasionar accidentes fatales En la semana pasada en San Antonio, se presentó un incidente, casi accidente fatal a causa de vibrocompactador con falla en frenos el cual terminó en una alcantarilla Vibro Compactador Hamm de Capitolio no le funciona la alarma de reversa ni las luminarias en su totalidad Vibro compactador Dynapac, de Capitolio, no le funciona la alarma de reversa ni las luces, este en días pasados tubo que quedarse hasta las 8 pm trabajando, a lo cual es una actividad de alto riesgo de accidente a causa de esta falla. Se solicita que todas las máquinas contratadas les sea instalados los sticker de identificación. Se le sugiere a la UMV, tener una persona idónea como un ingeniero mecánico que apoye y supervise la llegada de maquinaria a la obra y no se siga presentando este tipo de fallas en la maquinaria.

5.1.1 Informes semanales SST de la UAERMV

Durante el presente periodo la UAERMV, presentó informes semanales correspondientes a la 1ra, 2da, 3ra y 4ta semana de junio de 2025, estos están en revisión.

Tabla 9 Relación informes semanales entregados

INFORMES SEMANALES SST ENTREGADOS		
FECHA DE ENTREGA	**PERIODO**	**RESPONSABLE DE ENTREGA**
10-06-2025	Del 03 al 0 de junio de 2025	LEIDY YOHANA ORTIZ
19-06-2025	Del 09 al 13 de junio de 2025	LEIDY YOHANA ORTIZ
03-06-2025	Del 16 al 20 de junio de 2025	LEIDY YOHANA ORTIZ
03-06-2025	Del 24 al 27 de junio de 2025	LEIDY YOHANA ORTIZ

5.1.2 Informe mensual SST

Para el presente periodo la UAERMV, presentó el 06 de julio de 2025, el informe mensual del mes de junio de 2025, el cual tiene fecha límite hasta el 05 de mayo de 2025, este se encuentra en revisión.

5.1.3 Personal

Durante el presente periodo la UAERMV, realizó el reporte del personal de la UMV, SINTRAUNIOBRAS, contrato 936 (maquinaria), conductores camioneta y vigilancia, para un total de 111 trabajadores, se adjunta documento soporte C1.

5.1.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social

Durante el presente periodo la UAERMV, realiza entrega planillas de Seguridad Social, estas están en revisión.

5.1.5 COPASST

Durante el presente periodo la UAERMV, entrega acta de COPASST, esta se debe adjuntar en el informe SST, del periodo reportado.

5.1.6 Comité de Convivencia Laboral

Para el presente periodo la UAERMV presenta acta de Comité de Convivencia Laboral, la cual está en revisión.

5.1.7 Inspecciones de Seguridad

Durante el presente periodo la UAERMV, presenta soportes de inspecciones de seguridad, las cuales deben ir en el informe mensual SST de junio de 2025.

5.1.8 Acciones Preventivas

Durante el presente periodo, la interventoría ha evidenciado visualmente que la UAERMV ha realizado entrega, reposición y uso adecuado de EPP, se mantiene la correcta implementación de PMT y señalización en obra, como se evidencia en el registro fotográfico.



Ilustración 12 Publicación políticas SST



Ilustración 13 Verificación PMT tramo San Antonio



Ilustración 14 Verificación PMT Tramo Tunales



Ilustración 15 Verificación PMT Tramo Capitolio

5.1.9 Rotación de personal

Durante el periodo del presente informe la UAERMV, no presentó rotación personal.

5.1.10 Medicina Preventiva y del Trabajo

Durante el presente periodo la UAERMV, hizo entrega de soportes de actividades en medicina preventiva, estas actividades van en el informe mensual del componente SST.

5.1.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos

Durante el presente periodo la UAERMV, hizo entrega de los soportes de las capacitaciones, inducciones, reinducciones y/o entrenamientos, correspondientes al mes de junio de 2025, el cual va en el informe mensual SST.

5.1.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias

Durante el presente periodo la UAERMV, realiza entrega de evidencia de actividades relacionadas con el Plan de Emergencias, como lo es, charlas y equipamiento de elementos necesarios ante una emergencia.

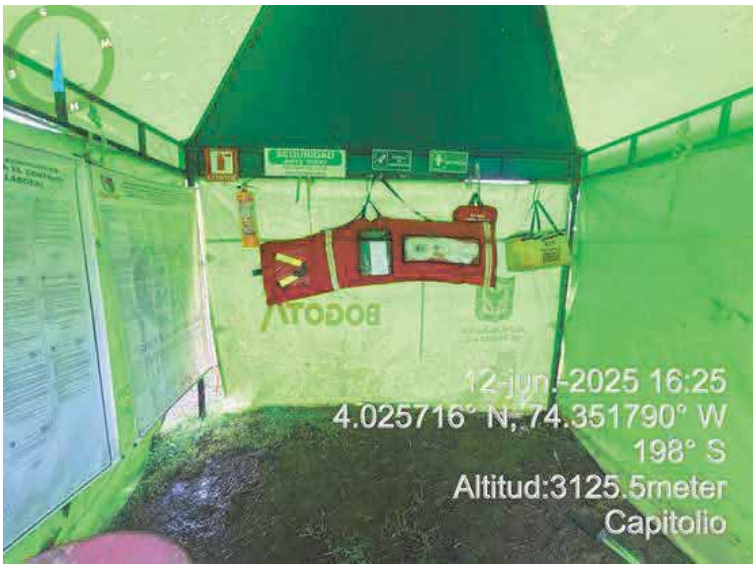


Ilustración 16 Elementos disponibles en caso de emergencia

5.1.13 Accidentalidad

Durante el presente periodo hubo dos incidentes laborales, estos se reportan dentro del informe.

5.2 Actividades de Seguridad Industrial

Las actividades de higiene industrial se encuentran ligadas a medir y controlar todos aquellos factores ambientales implícitos de cada labor, ya que estas características pueden generar en el trabajador algún efecto negativo ligado con el nivel de exposición a corto, mediano o largo plazo. Con el fin de prevenir esta afectación a la población trabajadora, se dio verificación y atención a los siguientes elementos por parte de la Interventoría:

5.2.1 Manejo de Baños

La Interventoría ha verificado la disponibilidad de 08 baterías sanitarias portátiles a disposición del personal operativo en tramo, las cuales están distribuidas así: 2 baterías sanitarias portátiles en Unión Tunales, 2 baterías sanitarias portátiles en tramo Capitolio y 4 baterías sanitarias en el Tramo San Antonio; dando cumplimiento a la Ley 09 del 1979 y la resolución 2400 de 1979, como se muestra en las ilustraciones a continuación.



Ilustración 17 Unidades sanitarias portátiles - Tramo Tunales



Ilustración 18 Unidades sanitarias portátiles – Tramo Capitolio



Ilustración 19 Unidades sanitarias portátiles - Tramo San Antonio

5.2.2 Punto de hidratación

Durante el presente periodo la UAERMV, no se evidencia puntos de hidratación para los trabajadores en obra, yendo contra la reglamentación Resolución 2400, Artículo 23º. *"El agua para consumo humano debe ser potable, es decir, libre de contaminaciones físicas y bacteriológicas. Para la provisión de agua para beber se deben instalar fuentes de agua con vasos individuales, o instalarse surtidores mecánicos."*

5.2.3 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros

.

Durante el presente periodo a la UAERMV, tiene pendiente la entrega de la matriz de riesgos actualizada, ya que presenta una nueva tarea en sus actividades y es la de corte de asfalto, la cual no está descrita en la matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros, por lo cual se solicitó en comité integral la actualización de la misma y mediante comunicado No. 186-1-453 del 23/01/2024.

5.2.4 Plan de acción

Durante este periodo no se reportaron o evidenciaron hallazgos derivados de auditorías o inspecciones externas, por lo que no fue necesario realizar plan de acción.

5.2.5 Manejo de campamentos y almacenes

Durante el presente periodo la UAERMV, tiene en los tramos de trabajo, 4 carpas, utilizadas como campamento y almacén auxiliar, distribuidas así: dos carpas en el tramo Unión – Tunales, una carpa para el tramo Capitolio y una carpa para el Tramo San Antonio.

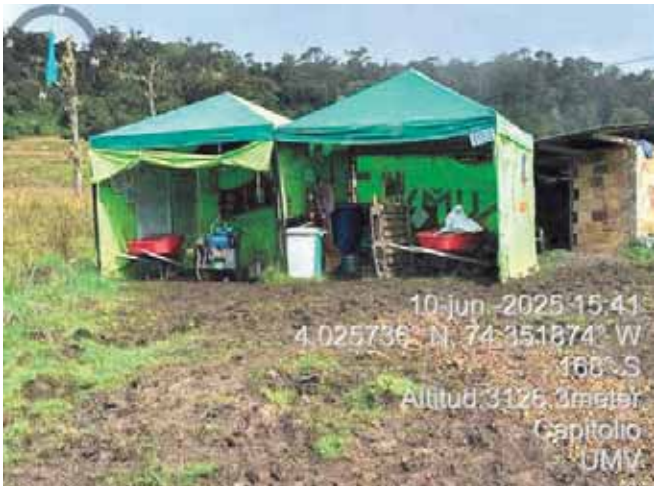


Ilustración 20 Campamento Capitolio

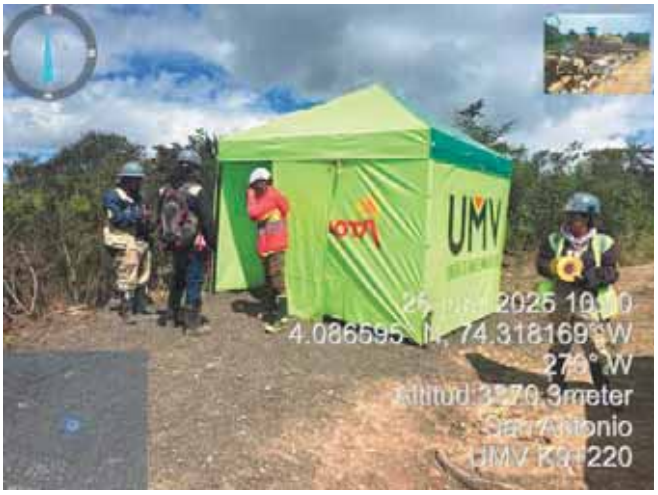


Ilustración 21 Campamento San Antonio 2



Ilustración 22 Campamento Unión Tunales

5.2.6 Permisos y Análisis de trabajo para actividades especificas

Durante el presente periodo la UAERMV, No presentó permisos de trabajo debido a que las tareas que se realizan son rutinarias.

5.2.7 Registro de maquinaria, vehículos y equipos de la UAERMV

La interventoría, en su labor de verificación y aprobación de la maquinaria, equipos y vehículos que presenta la UAERMV, para la operación en el proyecto, efectúa una comprobación de los documentos legales de cada uno, para determinar su operatividad en el frente de trabajo, para el presente periodo la UAERMV, presenta documentos del contrato 936, y documentación de maquinaria de misionalidad, esta debe ir adjunta en el informe del periodo reportado.

En conjunto con la revisión realizada por la parte técnica de la maquinaria, equipos y vehículos, el componente SST, deberá realizar la verificación de las afiliaciones y pagos de planillas de seguridad social integral que esté vigente, con afiliación a ARL, con el riesgo correspondiente al nivel de riesgo expuesto, exámenes médicos ocupacionales vigentes y sin restricciones al cargo de los operadores de estos.

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria, vehículos y equipo, destinados a la ejecución de la obra, subcontrato 936 y de la UAERMV.

Tabla 10 Maquinaria y Equipo Contrato 936

MAQUINARIA UAERMV JUNIO 2025				
EQUIPO/ VEHICULO	**MARCA**	**FIJA EN OBRA**	**INTERMITENTE EN OBRA**	**UBICACIÓN**
Retroexcavadora	John Deere	X		TUNALES
Motoniveladora	Caterpillar	X		TUNALES
Vibro compactador 8 ton.	Ingersoll Rand	X		TUNALES
Carro Tanque para humedecimiento	JBC	X		TUNALES
Minicargador con martillo	Bob Cat	X		TUNALES
Retroexcavadora	Terex	X		CAPITOLIO
Motoniveladora	Rhino	X		CAPITOLIO
Vibro compactador 8 ton.	Ingersoll Rand	X		CAPITOLIO
Carro Tanque para humedecimiento	Chevrolet	X		CAPITOLIO
Vibro compactador doble rodillo tandem 4ton.	Hamm	X		CAPITOLIO
Minicargador con martillo	Mactrack	X		CAPITOLIO
Volqueta sencilla	Fotón	X		CAPITOLIO
Motoniveladora	Caterpillar	X		SAN ANTONIO
Vibro compactador 8 ton.	Caterpillar	X		SAN ANTONIO
Vibro compactador	Amman	X		SAN ANTONIO
Retroexcavadora	Caterpillar	X		SAN ANTONIO
Retroexcavadora	Loking	X		SAN ANTONIO
Minicargador con martillo	Bob Cat	X		SAN ANTONIO
Minicargador con martillo	Bob Cat	X		SAN ANTONIO
Volqueta sencilla	Fotón	X		SAN ANTONIO

MAQUINARIA UAERMV JUNIO 2025				
EQUIPO/ VEHICULO	**MARCA**	**FIJA EN OBRA**	**INTERMITENTE EN OBRA**	**UBICACIÓN**
Camioneta Placa JOU555	Ford	X		**TODOS**
Camioneta Placa KRL416	Renault	X		**TODOS**
Camioneta Placa GET696	SSANGYONG	X		**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**

5.2.8 Investigación de accidentes e incidentes

Durante el presente periodo la UAERMV, SE presentó 2 investigaciones de incidentes.

5.2.9 Plan Estratégico de Seguridad Vial

Durante el presente periodo la UAERMV, presentó evidencia de conformación de PESV, carta emitida por SITRAUNIOBRAS esta evidencia se debe adjuntar en el informe mensual SST.

5.2.10 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST de la UAERMV

Durante el presente periodo la UAERMV, presentó indicadores de Gestión en SST, los cuales van adjuntos con el informe mensual SST.

6 CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022

6.1 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA.

A continuación, se hará una descripción de las actividades adelantadas por la Interventoría en cuanto a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022, para el periodo del 01 al 30 de junio de 2025, durante este periodo objeto del informe se dio continuidad a las capacitaciones relacionadas en el cronograma de trabajo.

No se presentaron accidentes de trabajo por parte del personal de la Interventoría.

6.2 Afiliación al sistema general de Seguridad Social

La descripción del personal de ECOVIAS S.A.S. firma interventora, presenta los soportes de afiliación al sistema de seguridad social, de los trabajadores directos, correspondiente a las afiliaciones y cotizaciones a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y Administradora de Riesgos Laborales (ARL), se adjunta copia de planillas de Seguridad Social correspondientes al mes de mayo de 2025, en los documentos de soporte de factura de junio de 2025, en el numeral 9 del cobro mensual de la interventoría.

6.3 Capacitaciones, charlas e inducciones Interventoría

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2025, se dio continuidad a las capacitaciones, charlas e inducciones, relacionadas con el cronograma de trabajo SST, a todo el personal contratado a la fecha por parte de ECOVIAS S.A.S. del contrato *"interventoría de obra pública de infraestructura de transporte cin-regalías-161-2022 fondo de desarrollo rural de Sumapaz y Ecovías S.A.S."*. Se adjuntan soportes No.1D.

Los temas tratados en las charlas de 5 minutos y capacitaciones fueron:

- Capacitación en:
    - Manejo de extintores.
    - Estilos de vida saludable.
    - Factores de riesgos y peligros en obras

- Charlas de 5 minutos:

1ra Semana: Aspectos generales del riesgo público, Consumo responsable en casa, Lavado de manos, Un estilo de vida y trabajo saludable en 7 pasos.

2da semana: Accidentes y enfermedades laborales, Normas básicas en el levantamiento de cargas, Pausa activa ejercicio visual, Cuida el agua.

3ra semana: Instrucciones para la colocación de orejeras, Aislación, bloqueo y permiso de trabajo, Peligros e la conducción, Barandas y protecciones.

4ta semana: Identificación de peligros, Línea de fuego, Protección ocular, cuidado de la vista, Auto cuidado, una actitud.

Teniendo en cuenta que un grupo de la interventoría está en oficina y otro en campo, se remite las capacitaciones al correo electrónico y/o vía WhatsApp, de cada profesional.

6.4 Verificación de actividades según SG-SST

- Seguimiento de las actividades en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantados por la UAERMV y contratistas, de acuerdo con su plan de trabajo de la Etapa de Construcción.

- Durante el periodo objeto del presente informe se dio seguimiento a la accidentalidad para el contrato de obra, no se presentaron accidentes o incidentes en el periodo, según lo reportado por la parte de la UAERMV y contratistas.

- Seguimiento al suministro de elementos de protección personal, reposición por deterioro, inspección y entrega oportuna de la UAERMV y contratistas.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el COPASST, conformación y actas de reuniones.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el Comité de Convivencia Laboral, conformación y actas de reuniones.

- Revisión de las planillas de pago de Seguridad Social, donde se refleje el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las obligaciones de Seguridad Social del contrato de obra.

- El Residente SST de la Interventoría intervino en los comités integrales y en aquellos espacios donde se solicitó su participación.

- La interventoría lleva control en la bitácora del componente SST, en la cual se realiza las anotaciones de novedades en terreno, con el fin de socializarlas con la profesional SST de la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, de este último se entregó la bitácora correspondiente, al residente técnico para que realizaran las observaciones y firma, según comentarios de parte de la interventoría, pero a causa de no estar el profesional SST obra, y no recibir la autorización de parte del director de parte del contratista Gaviones 95, la bitácora no ha sido firmada, por lo cual se entiende como aceptada todas las observaciones que hay en su contenido, se adjunta documentos soporte 2D.

- La Interventoría reporta el uso de dos vehículos tipo camioneta durante el periodo reportado, los cuales realizan el transporte de los profesionales de la interventoría para las actividades de recorridos a obra y asistencia a comités.

  Se adjunta preoperacionales de los vehículos en el documento soporte No.3D.

Tabla 11 Vehículos del contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte cin-regalías-161-2022

N°	TIPO DE EQUIPO	EQUIPO MÍN. REQUERIDO	CANT	MARCA	MODELO	CAPACIDAD
1	**VEHÍCULO PARA ACTIVIDADES EN OBRA**	**SI**	**1**	**CHEVROLET DIMAX**	**2007**	**5 pasajeros**
2	**VEHÍCULO PARA ACTIVIDADES EN OBRA**	**SI**	**1**	**RENAULT DUSTER OROCH**	**2022**	**5 pasajeros**

6.5 Cronograma de Capacitaciones

Se realiza actualización y programación de temas SST del mes de junio de año 2025, Se adjunta documento en el documento soporte No. 4D.

6.6 Personal Interventoría

Durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2025 se reportan veinticinco (25) trabajadores y veintisiete (27) cargos activos en total.

Tabla 12 Personal Contrato 161 ECOVIAS S.A.S – Interventoría

N°	PROFESIONAL	NOMBRE
1	Director De Interventoría	Ermy Alcier Hurtado R.
2	Residente De Interventoría 1	José Antonio Plata Giraldo
3	Residente De Interventoría 2	José Luis Úsuga Gómez
4	Residente De Interventoría 3	Luiggi Pugliese Mercado
5	Profesional Social	Eva Isabel Bernal
6	Profesional SST	Jesús Antonio Rincón B.
7	Profesional Ambiental	Yesenia Hernández Ramírez
8	Especialista en Geotecnia	Dani Ricardo Acevedo Vergara
9	Especialista en Pavimentos	Dani Ricardo Acevedo Vergara
10	Especialista Hidráulico	Ignacio Segundo De La Hoz
11	Especialista Estructural	Manuel de Jesús Alarcón
12	Especialista en Tráfico	Walter Alfonso Pautt
13	Especialista en diseño Geométrico	Walter Alfonso Pautt
14	Abogado	Eliana Melissa Gil
15	Topógrafo 1	Cesar Ali Martínez
16	Topógrafo 2	Edwin Andrés Alvear Ortega
17	Inspector 1	Brayan Geovanny Mendoza Diaz
18	Inspector 2	Jeisy Lorena Altamar
19	Inspector 3	Carlos Julio Macana
20	Técnico Auxiliar De Ingeniería	David Leonardo Ochoa Vanegas
21	Secretaria	Leidy Lorena Terreros
22	Cadenero 1	Jhon Jaider Hernández
23	Cadenero 1	Neley Isabel Alcalá
24	Cadenero 1	Herson Smith Roa Linares
25	Cadenero 2	Diego Segundo Fontalvo
26	Cadenero 2	Roger Antonio Orellano
27	Cadenero 2	Magaly Yulieth Lasso Cerón

6.7 Accidentalidad

No se presentaron incidentes o accidentes en el equipo de trabajo de la Interventoría.

6.8 Elementos de Protección Personal (EPP) y Dotación

Para el periodo del 01 al 30 de junio de 2025, no se realizó entrega de EPP en obra.

6.9 Comités de seguimiento

Durante el periodo evaluado del 01 al 30 de junio de 2025, se realizaron cuatro (04) comités de seguimiento de obra integrales, con la UAERMV, con el CEV y con el Consorcio Gaviones 95, donde se trataron temas relacionados con los compromisos del componente SST, Social y Técnico.

Tabla 13 Comités de seguimiento de obra UAERMV

COMITÉS SEGUIMIENTO DE OBRA CON LA UAERMV	
Comité No. 46	05 de junio de 2025
Comité No. 47	13 de junio de 2025
Comité No. 48	19 de junio de 2025
Comité No. 49	30 de junio de 2025

Tabla 14 Comités de seguimiento de obra CEV

COMITÉS SEGUIMIENTO DE OBRA CON LA CEV	
Comité No. 64	05 de junio de 2025
Comité No. 65	13 de junio de 2025
Comité No. 66	19 de junio de 2025
Comité No. 67	27 de junio de 2025

Tabla 15 Comités de seguimiento de obra Gaviones 95

COMITÉS SEGUIMIENTO DE OBRA CON C. GAVIONES 95	
Comité No. 46	05 de junio de 2025
Comité No. 47	13 de junio de 2025
Comité No. 48	19 de junio de 2025
Comité No. 49	27 de junio de 2025

7 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SST DE LA INTERVENTORIA Y LA UAERMV

Queda programado a partir de avance de obra realizar:

- Seguimiento de las actividades en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantados por la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, de acuerdo con su plan de trabajo de la Etapa de Construcción.

- Seguimiento a la accidentalidad de la obra.

- Seguimiento al suministro, inspección y reposición de elementos de protección personal de la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, y personal subcontratado.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el COPASST, conformación, acta de reunión de acuerdo con el plan de trabajo presentado por la UAREMV, CEV y Consorcio Gaviones 95.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el Comité de Convivencia Laboral, conformación, acta de reunión de acuerdo con el plan de trabajo

presentado por la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95.

- Se realizará seguimiento de cumplimiento de los pagos de seguridad social del personal de la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, y subcontratistas, además de personal directo de la Interventoría en el periodo, de acuerdo con la fecha de corte.

- Elaboración de los informes semanales a entregar cada lunes con el resumen de actividades adelantadas por la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, a la interventoría.

- Elaboración de los informes mensuales a entregar los cinco primeros días de cada mes, incluyendo todas las actividades referentes al Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantadas por la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, a la interventoría.

8 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA

- Para el presente periodo, la interventoría realizó el seguimiento y control de temas acorde al componente SST en el informe, así mismo se realizó a través de la correspondencia el control y seguimiento a las observaciones presentadas por la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95.

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En cuanto a novedades de personal, la Interventoría recibió reportes de ingreso y de retiro de parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV, del Consorcio Gaviones 95 y del Consorcio Estabilización Vial, esta documentación debe ser entregado en el informe mensual.

- La interventoría realizó en el mes de junio de 2025 los siguientes requerimientos los cuales van adjuntos en el documento 5D:

  Comunicados a la Unidad de Mantenimiento Vial:

  186-1-694 Llamado de atención componente Ambiental y SST_UMV

  186-1-697 Rta. correo enviado el 06-05-2025 Informe SST No. 11 de abril 2025.-1

  186-1-702 Rta comunicado D-24-2025-37 Informes SST No. 14 abril - 25 y No. 15 mayo - 25 V1

  186-1-706 Llamado de atención por transporte indebido de personal en obra

186-1-727 Llamado de atención por funcionamiento defectuoso en maquinaria

186-1-728 Rta. correo del 09-06-25, enviado por la UAERMV, Informe mensual SST, No. 12 may-25

Comunicados al Consorcio Estabilización Vial:

186-1-707 Llamado de atención por transporte indebido de personal en obra CEV

186-1-720 Llamado de atención por omisión a sistemas de seguridad en Taludes- Frente San Antonio

186-1-723 Rta. comunicados CEV22-390 - INF MEN SST No. 18 y CEV-22-410 -INF MEN SST No 19.

Comunicados al Consorcio Gaviones 95:

186-1-663 Rta. Comunicado G95 con fecha 19-03-25, Entrega de informes mensuales 1 al 12 de los componentes social, ambiental, SST y técnico.

186-1-698 Rta. correo electrónico del 9-06-25 Informes semanales SST, abril, mayo y junio de 2025-1

186-1-702 Rta comunicado D-24-2025-37 Informes SST No. 14, abril - 25 y No. 15, mayo - 25 V1

10 DOCUMENTOS SOPORTE

1C.
LISTADO DE PERSONAL
UAERMV

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE JUNIO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

UNIDADES EJECUTORAS Y OPERATIVAS VINCULADAS - CONTRATO 609 DE 2023 - PROYECTO REGALIAS SUMAPAZ

No. de Orden	NOMBRE DE LA UNIDAD	DENOMINACIÓN	COMPOSICION	CANTIDAD PERSONAS	FECHA DE INGRESO
1	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1**	**UEMRD1-REG-01**	1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes	**4 personas**	**16-dic-24**
	CARLOS HERNAN RAMOS ERAZO	1087784620	INSPECTOR OBRA	1 personas	##########
	JOSE YECID HERNANDEZ GUTIERREZ	80235605	OFICIAL I	1 personas	16-dic-24
	YEISON MAURICIO CASTELLANOS	1003670730	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
	ALFREDO ARNULFO DIMATE GONZALEZ	1032656546	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	16-dic-24
2	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1**	**UEMRD1-REG-02**	1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes	**4 personas**	**13-ene-25**
	FIDEL DIAZ ZULUAGA	9807823	INSPECTOR OBRA	1 personas	13-ene-25
	RUBEN PEÑALOZA VALBUENA	1022979320	OFICIAL I	1 personas	13-ene-25
				1 personas	
	IVAN ANDRES PEÑALOZA VALBUENA	1032656001	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
3	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1**	**UEMRD1-REG-03**	1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes	**4 personas**	**13-ene-25**
	LUIS ANIBAL DURAN MONTERO	80434593	INSPECTOR OBRA	1 personas	13-ene-25
	ONOLASCO DELGADO VERGARA	80745216	OFICIAL I	1 personas	13-ene-25
	JUAN DAVID PENAGOS PABON	1069231247	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
	FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ	349277	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	9-jun-25
4	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1**	**UEMRD1-REG-04**	**1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**4 personas**	##########
	OSCAR LEONARDO CAÑON MOJICA	80755852	INSPECTOR OBRA	1 personas	##########
	ESTEBAN YOJANY MONTAÑA AMAYA	1070947389	OFICIAL I	1 personas	##########
	BRAYAN ALECIX PEÑALOZA CORTES	1022979929	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	##########
	ELKIN ESTIVEN CARO PEÑALOZA	1032656213	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	##########
5	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 2**	**UEMRD2-REG-01**	2 Ayudantes	**2 personas**	**13-ene-25**
	JONATHAN ARVEY TORRES RODRIGUEZ	1069717922	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
	RICARDO HERNANDEZ TORRES	1024512837	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
	UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 2	**UEMRD2-REG-02**	2 Ayudantes	**2 personas**	11-jun-26
	IVAN ARLEY TORRES LARA	1032656076	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	11-jun-26
	ANDRES FELIPE GONZALEZ PRIETO	1072894591	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	11-jun-25
6	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO AYUDANTE - BOAL**	**UEMRDAB-REG-01**	**2 Boal´s**	**2 personas**	##########
	BRAYAN STIVEN PORRAS PALACIOS	1022997635	AYUDANTE BOAL	1 personas	##########
	LUIS HERNANDO RAMIREZ PEÑALOZA	3125436	AYUDANTE BOAL	1 personas	##########
7	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3**	**UEMRD3-REG-01**	2 Auxiliares de control de trafico	**2 personas**	**16-dic-24**
	DORA EUNICES PEREZ BUSTOS	1072894823	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	16-dic-24
	JOHANNA CELEMIN NARANJO	1106949475	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	16-dic-24
8	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3**	**UEMRD3-REG-02**	2 Auxiliares de control trafico	**2 personas**	**13-ene-25**
	BLANCA ISABEL CASTELLANOS MORALES	1069231364	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
	LINA MARCELA PARADA PEÑALOZA	1022936290	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
9	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3**	**UEMRD3-REG-03**	2 Auxiliares de control trafico	**2 personas**	**13-ene-25**
	JESLY JULIANA GUZMAN MORA	1003486609	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
	CAREN VANESSA GUZMAN MORA	1069230250	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
	UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3	**UEMRD3-REG-04**	2 Auxiliares de control trafico	**2 personas**	11-jun-25
	ELVIA MARIA CAMARGO LOPEZ	1032029173	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	11-jun-25
	DIANA CRISTINAAVELLANEDA HERNANDEZ	1002548039	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	11-jun-25
10	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS DIURNA SGR**	**UELTD-REG-01**	1 Topografo, 1 cadenero 1° y 1 cadenero 2°	**3 personas**	**16-dic-24**
	JOSE DAVID LOPEZ BOBADILLA	80810144	TOPOGRAFO	1 personas	16-dic-24
	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	1003486903	CADENERO I	1 personas	16-dic-24
	GERBER ANDRES AGUDELO BARBOSA	1022984996	CADENERO I	1 personas	16-dic-24
11	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS DIURNA SGR**	**UELTD-REG-02**	1 Topografo, 1 cadenero 1° y 1 cadenero 2°	**3 personas**	**9-ene-25**
	GIOVANNY ALFREDO GIRALDO NAVARRO	79839669	TOPOGRAFO	1 personas	9-ene-25
	NEYER IVAN AGUDELO BARBOSA	80127396	CADENERO I	1 personas	9-ene-25
	JULIO ESNEYDER RAMIREZ GIL	1000454144	CADENERO II	1 personas	9-ene-25
12	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS DIURNA SGR**	**UELTD-REG-03**	1 Topografo, 1 cadenero 1° y 1 cadenero 2°	**3 personas**	##########
	NELSON RUBIEL GARCIA FUENTES	80512590	TOPOGRAFO	1 personas	##########
	SERGIO STIVEN ROZO BERNAL	1013104274	CADENERO I	1 personas	##########
	DILAN ANDRES CANO ROMERO	1007101606	CADENERO II	1 personas	##########
13	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS DIURNA SGR**	**UELTD-REG-04**	1 Topografo, 1 cadenero 1° y 1 cadenero 2°	**2 personas**	3-jun-25
	JEISSON ORLANDO FONSECA TAMI	1030662359	TOPOGRAFO	1 personas	3-jun-25
	CRISTIAN ZAIMIR MOLINA LOZANO	1030562124	TOPOGRAFO	1 personas	16-jun-25
	JUAN DAVID DELGADO VERGARA	1032656043	CADENERO II	1 personas	3-jun-25
14	**UNIDAD DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - DIURNA**	**UGSTD-REG-01**	2 Tecnologos SST con curso de alturas	**2 personas**	**16-dic-24**
	NEIDI JHOANNA NOVA BERMUDEZ	53049895	TECNOLOGO SST - CON CURSO DE ALTURAS	1 personas	16-dic-24
	JOSE RICARDO BUITRAGO LADINO	80129274	TECNOLOGO SST - CON CURSO DE ALTURAS	1 personas	16-dic-24
15	**UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A _Modificacion 02**	**UOTVHD-10A-Rur-M2**	2 Conductores volqueta doble-troque _ Aliment. y Alojamiento	**2 personas**	**16-dic-24**
	WILLIAN NEIRA MORENO	79816036	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	5-feb-25
	HERNAN DARIO HERRERA MORALES	80747512	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
16	**UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A**	**UOTVHD-10A**	2 Conductores volqueta doble-troque.	**2 personas**	**16-dic-24**
	WILMAN ALONSO MUÑOZ BAUTISTA	1022994231	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
	JAIRO ALBERTO ROZO HERNANDEZ	79801113	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
17	**UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A**	**UOTVHD-10A**	2 Conductores volqueta doble-troque	**2 personas**	**16-dic-24**
	RICARDO ALBA NIÑO	79363456	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
	RICAUTE CARDONA AGUIRRE	18222467	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
18	**UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A**	**UOTVHD-10A**	**2 Conductores volqueta doble-troque**	**2 personas**	26-feb-25
	JOHN FERNAN RODRIGUEZ ZAMORA	80350271	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	27-feb-25
	JUAN GABRIEL MORENO HERNANDEZ	1033731171	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	28-feb-25
				51 personas	

INGENIERO SUPERVISOR ZONAL - CONTRATO 609 DEL 2023

1	**INGENIERO SUPERVISOR ZONAL**	**ING-IZ**	**1 Ingeniero inspector de zona**	**1 persona**	**16/12/2024**
	JULIO ALBEIRO HERNANDEZ CALDERON	1013662369	INGENIERO INSPECTOR ZONAL	1 personas	16-dic-24
				1 personas	

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE JUNIO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

CONTRATO No. 936 del 2024 CONSORCIO H Y C SERVICIOS DE MAQUINARIA					
FRENTE DE OBRA UNION-TUNALES					
1	**OPERADORES DE MAQUINAS Y CONDUCTOR DE VEHICULOS**	**GO-01_HYC**		**7 Personas**	
	BRAYAN CAMILO TOVAR TORRES	1003775492	OPERADOR RETROCARGADOR	1 persona	15-ene.-25
	WILLIAN BARACALDO	18235992	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	16-ene.-25
	EDGAR RAUL ESPITIA RODRIGUEZ	1106482733	OPERADOR CARRO TANQUE	1 persona	16-ene.-25
	JUAN FRANCISCO CORTES CAMARGO	79248746	OPERADOR MOTONIVELADORA	1 persona	22-ene.-25
	CRISTIAN CAMILO HURTADO GRAJALES	1053607177	OPERADOR MINICARGADOR	1 persona	16-jun.-25
	ISMAEL OLMOS DIMATE	80269138	OPERADOR CARRO TANQUE	1 persona	21-abr.-25
	SEBASTIAN BLANCO SANCHEZ	1025322582	SUPERVISOR MAQUINARIA	1 persona	15-ene.-25
				7 personas	

CONTRATO No. 936 del 2024 CONSORCIO H Y C SERVICIOS DE MAQUINARIA					
FRENTE DE OBRA SANTO DOMINGO/CAPITOLIO					
1	**OPERADORES DE MAQUINAS Y CONDUCTOR DE VEHICULOS**	**GO-02_HYC**		**7 Personas**	
	NILSON LOPEZ BURGOS	11435690	OPERADOR VOLQUETA SENCILLA	1 persona	14-abr.-25
	ARNULFO LOPEZ BURGOS	11435690	OPERADOR RETROESCAVADORA	1 persona	30-mar.-25
	LUIS GABRIEL PEREZ CASTRILLO	1064786137	OPERADOR MINICARGADOR	1 persona	31-mar.-25
	ALONSO VARGAS PLAZAS	3232285	OPERADOR MOTONIVELADORA	1 persona	22-may.-25
	OCTAVIO ALFONZO MENDEZ	3214253	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	19-may.-25
	LEONARDO ENRIQUE MARTINEZ CUEVAS	79777521	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	1 persona	10-mar.-25
	HENRY RUA	1067593903	OPERADOR RETROESCAVADORA	1 persona	10-mar.-25
				7 persona	

CONTRATO No. 936 del 2024 CONSORCIO H Y C SERVICIOS DE MAQUINARIA					
FRENTE DE OBRA TOLDO/SAN ANTONIO					
1	**OPERADORES DE MAQUINAS Y CONDUCTOR DE VEHICULOS**	**GO-03_HYC**		**7 Personas**	
	ERIBERTO JIMENEZ FERNANDEZ	3166130	OPERADOR MOTONIVELADORA	1 persona	5-feb.-25
	ERNESTO MEDINA MELO	11251471	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	21-abr.-25
	JUAN CARLOS SILVA	1032400140	OPERADOR RETROESCAVADORA	1 persona	16-jun.-25
	LUIS EMIRO TORRES PADILLA	7308755	CONDUCTOR VOLQUETA SENCILLA	1 persona	16-jun.-25
	WILMER YOANY PEREZ CASTRO	1069231015	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	16-jun.-25
	LUIS HOYOS	1003501103	OPERADOR MINICARGADOR	1 persona	16-jun.-25
	LUIS EDUARDO LOPEZ GUERRERO	79249265	OPERADOR MINICARGADOR	1 persona	20-ene.-25
				7 personas	

CONTRATO No. 485 del 2022 MEGASEGURIDAD LTDA. SERVICIOS DE VIGILANCIA					
FRENTE DE OBRA UNION-TUNALES					
2	**GUARDAS DE SEGURIDAD - VIGILANTES**	**GO-04_MEG-SEG**		**3 Personas**	**15-ene-25**
	LEIDY BAQUERO ORJUELA	1069740888	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
	ALBERTO VILLALBA VERGARA	79632496	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
	DANIEL OCTAVIO GONZALEZ	1033793787	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
				3 personas	

CONTRATO No. 485 del 2022 MEGASEGURIDAD LTDA. SERVICIOS DE VIGILANCIA					
FRENTE DE OBRA SANTO DOMINGO / CAPITOLIO					
2	**GUARDAS DE SEGURIDAD - VIGILANTES**	**GO-04_MEG-SEG**		**3 Personas**	**15-ene-25**
	MAICOL ALEJANDRO PEÑALOZA MUÑOZ	1069231461	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
	YAQUELIN LOPEZ MENESES	1032656446	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
	ALCY PAIPA CUBILLOS	79726810	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
				3 personas	

CONTRATO No. 485 del 2022 MEGASEGURIDAD LTDA. SERVICIOS DE VIGILANCIA					
FRENTE DE OBRA EL TOLDO / SAN ANTONIO					
2	**GUARDAS DE SEGURIDAD - VIGILANTES**	**GO-04_MEG-SEG**		**3 Personas**	**15-ene-25**
	DUBER JULIO SANCHEZ VILLALBA	3171163	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
	NIDIA HERNANDEZ PENAGOS	20824393	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
	ADRIANA LUCIA MARTIN PALACIOS	1007297824	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
				3 personas	

CONTRATO No. 485 del 2022 MEGASEGURIDAD LTDA. SERVICIOS DE VIGILANCIA					
ALMACEN CENTRO POBLADO SAN JUAN					
2	**GUARDAS DE SEGURIDAD - VIGILANTES**	**GO-04_MEG-SEG**		**3 Personas**	**15-ene-25**
	ADRIANA POVEDA DELGADO	1003652964	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
	VIVIAN STEYSI CANO ROMERO	1001061206	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
	BALBINA PEÑALOZA VALBUENA	1022956902	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
				3 personas	

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE JUNIO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

CONTRATISTAS UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL						
3	RAFAEL DARIO PEÑA FLORES	79105538	DIRECTOR DE OBRA	1	persona	28-nov.-24
	CAMILO ERNESTO ROJAS GARCIA	1010162306	RESIDENTE DE OBRA	1	persona	29-nov.-24
	JORGE LUIS ALDANA PERDOMO	79958784	RESIDENTE DE OBRA	1	persona	14-abr.-25
	KARINA ISBELIA PRIETO RIAÑO	1049633079	RESIDENTE DE DISEÑOS TOPOGRAFICOS	1	persona	27-dic.-24
	JESICA PAOLA VIDAL POLOCHE	1030669188	RESIDENTE AMBIENTAL	1	persona	7-abr.-25
	RUBY DEL CARMEN RUIZ ARRIETA	1005551124	RESIDENTE SOCIAL	1	persona	4-abr.-25
	LEIDY YOHANA ORTIZ URREA	1069764358	RESIDENTE SST	1	persona	4-abr.-25
	JENNIFER CAROLINA VELA PAIVA	1018482183	PROFESIONAL ENCARGADO DE TRAZABILIDAS Y SEGUIMIENTO TECNICO	1	persona	2-dic.-24
	OMAR FERNEY PATIÑO TORRES	80197609	PROFESIONAL TRAZABILIDAD Y MAQUINARIA	1	persona	13-dic.-24
	YINA RUTH FONSECA ACOSTA	1069744056	APOYO ADMINISTRATIVO	1	persona	2-dic.-24
				10	**persona**	
CONTRATO CAMIONETAS 4*4						
4	NORBEY PALACIOS HURTADO	1000691962	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	01-04-2'25
	GONZALO RIOS MURCIA	80070964	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	01-04-2'26
	ELMER USECHE MOLINA	79596077	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	24-jun.-25
				3	persona	

TOTAL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO	**98**

Profesional SST LEIDY YOHANNA ORTIZ URREA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

PERSONAL RETIRADO DURANTE EL PERIODO REPORTADO	FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE JUNIO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

UNIDADES EJECUTORAS Y OPERATIVAS VINCULADAS - CONTRATO 609 DE 2023 - PROYECTO REGALIAS SUMAPAZ						
No. de Orden	NOMBRE DE LA UNIDAD	DENOMINACIÓN	COMPOSICION	CANTIDAD PERSONAS		FECHA DE RETIRO
	JOHN ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	80765369	AYUDANTE DE OBRA	1	personas	24-jun-25
	IVAN IGNACIO BRICEÑO VARGAS	1015399293	OPERADOR DE MAQUINAS VIBROCOMPACTADORES	1	personas	18-jun-25
	JUAN PABLO ROJAS CASTRO	1033683032	OPERADOR DE MAQUINAS VIBROCOMPACTADORES	1	personas	18-jun-25
	JUAN JOSE RAMIREZ LOPEZ	1072447616	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	1	personas	18-jun-25
	JUAN GABRIEL CABALLERO DELGADO	1023023297	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	1	personas	18-jun-25
				5	personas	

CONTRATO No. 936 del 2024 CONSORCIO H Y C SERVICIOS DE MAQUINARIA						
1	OPERADORES DE MAQUINAS Y CONDUCTOR DE VEHICULOS	GO-01_HYC		6	Personas	
	DILAN AUGUSTO PINILLA	1000003107	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	9-jun.-25
	JOSE MIGUEL ROMERO ALMONACID	79869713	OPERADOR MOTONIVELADORA	1	persona	9-jun.-25
	CARLOS JULIO ANDRADE	1115740486	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	9-jun.-25
	CESAR AUGUSTO VARGAS ANDRADE	1022974026	OPERADOR RETROESCAVADORA	1	persona	3-jun.-25
	BRAYER YAMIR PRIETO PENAGOS	1072895049	OPERADOR VOLQUETA SENCILLA	1	persona	20-jun.-25
	LEONIDAS RICARDO HERNANDEZ ALVAREZ	1022927194	OPERADOR RETROESCAVADORA	1	persona	3-jun.-25
				6	persona	

CONTRATO CAMIONETAS 4*4						
	OSMEL DUVAN TAUTIVA BELTRAN	1069757593	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	20-jun.-25
	LIDER YOANE JIMENEZ ALONSO	11382383	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	13/06/2025
				2	persona	

TOTAL PERSONAL RETIRADO	13

TOTAL DE PERSONAL QUE ESTUVO VINCULADO AL PROYECTO	111

1D.
CAPACITACIONES, CHARLAS E INDUCCIONES SST INTERVENTORIA

ORGANIZACIÓN BASE [ ] PROYECTO [X]

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 Código de proyecto: CIN-REGALÍAS-161-2022

Fecha: Del 01 al 30 de junio de 2025 Sitio: BOGOTÁ - SUMAPAZ

Tema: CAPACITACIÓN EN: Manejo de extintores - Estilos de vida saludable - Factores de riesgos y peligros en obras

Presentador del tema: Jesús Antonio Rincón Benavides

Objetivo de la capacitación: Dar a los trabajadores el conocimiento en cuanto a los diferentes temas SST.

ITEM Asistentes:

	Nombre	Cargo	Firma	Observaciones / Comentarios sobre la capacitación
1	Ermy Alcer Hurtado Romero	Directora Interventoría		
2	David Leonardo Ochoa	Técnico Auxiliar De Ingeniería		
3	Yesenia Hernandez Ramirez	Profesional Ambiental		
4	Eva Isabel Bernal Yasso	Profesional Social		
5	José Luis Úsuga Gómez	Residente técnico		
6	José Antonio Plata Giraldo	Residente técnico		
7	Luiggi Pugliese Mercado	Residente técnico		
8	Dani Ricardo Acevedo Vergara	Especialista en Geotecnia		
9	Dani Ricardo Acevedo Vergara	Especialista en Pavimentos		
10	Ignacio De La Hoz	Especialista Hidráulico		
11	Manuel Alarcón	Especialista Estructural		
12	Walter Pautt	Especialista en Tráfico		
13	Walter Pautt	Especialista en diseño Geométrico		
14	Eliana Gil	Abogada		
15	Brayan Geovanny Mendoza Diaz	Inspector 1		
16	Jeisy Altamar	Inspector 2		
17	Carlos Julio Macana sechagua	Inspector 3		
18	Lorena Terreros	Secretaria		
19	Cesar Ali Martínez	Topógrafo		
20	Julian David Ortiz	Topógrafo		
21	Jhon Jaider Hernández	Cadenero 1		
22	Neley Isabel Alcalá	Cadenero 1		
23	Orlando Sandoval	Cadenero 1		
24	Roger Antonio Orellano	Cadenero 2		
25	Diego Segundo Fontalvo	Cadenero 2		
26	Magaly Yulieth Lasso Cerón	Cadenero 2		

Firma presentador del tema

Scanned with CamScanner

2D. BITACORAS

Bitácora CEV

observación de uso de guarda de seguridad en mezcladora de concreto. PERSONAL: 1 inspector, 1 topografo, 1 Cadenero, 2 oficiales, 2 aux. tránsito, 5 ayudantes 1 conductor de camioneta, 1 operador de minicargador 1 Mezcladora, 1 operador de minicargador, 1 cortadora 2 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 generador electrico 1 vibrador de concreto, 1 volqueta doble.

Ing. Residente CEV Contratista / CEV / 30/05/2025

30-05-2025 TRAMO 7 TUNALES

Se observa Kit de emergencias en orden PMT en orden personal con overol y EPP en orden, se recomienda mantener barriendo restos de mezcla en construcción de cuneta.

Ing. Residente CEV Contratista / CEV / 30/05/2025

31-05-2025

La entidad ejecutora no realizó actividades constructivas

Ing. Residente CEV Contratista 31-05-2025

01-06-2025

No se desarrollaron actividades constructivas por parte del contratista de obra.

Ing. Residente CEV Contratista 01-06-2025

02-06-2025

No se desarrollan actividades constructivas por parte del contratista de obra.

Ing. Residente CEV Contratista 02-06-2025

03-06-2025 Tramo 5 Tunales.

En recorrido de obra se evidencia Kit control de derrames en sitio y Kit de emergencia, se sugiere ubicar el extintor sobre una base para evitar que se despresure, de igual manera no dejar el agua para hidratación del personal en el suelo. PMT correctamente implementado. Personal en obra. 1 inspector, 2 auxiliares de tráfico, 3 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador, equipo en obra; 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 placa vibratoria, 1 vibro

PMT correctamente implementado con señales Verticales y auxiliares de tráfico, se requiere delimitar acopio de pétreos.

CEV Empalme 09/06/2025

10-06-2025 San Antonio.
En recorrido de obra se evidencia permanencia de kit control de Emergencia en sitio, se sugiere colocar el extintor sobre soporte para evitar desprensurización, de igual manera el punto de hidratación no dejarlo directamente sobre el suelo, mantener los elementos de Emergencia despejados.
Personal en obra: 1 inspector, 2 auxiliares tráfico, 4 ayudantes, 2 oficial, 1 operador de minicargador. 1 Retro.
Equipos en obra: 1 minicargador, 1 Retrocargador, 1 motoniveladora, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 generador eléctrico, 1 vibrador de concreto, 1 Volquete doble

CEV / Empalme 10/06/2025

11-06-2025 Túneles.
En recorrido se recomienda suministrar hidratación al personal, PMT correctamente implementado con señales, Verticales, preoperacional diligenciado, Kit de emergencia en campamento movil, aún no le han colocado el soporte al extintor; Personal en obra 1 inspector, 2 aux tráfico 4 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador.
Equipos en obra: 1 minicargador, 1 motoniveladora, 1 placa vibratoria, 1 vibrador de Concreto, 1 generador de energía.

CEV Empalme - 11-06-2025

12-06-2026 San Antonio
Se solicita proveer de overoles a los trabajadores, Km 2+270 se evidencia acopio sin señalizar, en calzada se sugiere aislar el punto de hidratación y área donde se

encuentra el extintor, se evidencia señalización de Emergencia. personal en obra: 1 inspector, 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficiales, 6 ayudantes, 1 conductor camioneta, 1 operador de minicargador y 1 retrocargador: Equipos en obra: 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 compactador, 1 placa Vibratoria, 1 generador electrico, 1 Vibrador de concreto, 1 Volqueta doble.

CER Empalme 12/06/2025

13-06-2025

se lleva acabo participacion en el comite integral con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas, los cuales quedan registrados en el acta respectiva.

CER Empalme 13/06/2025

14-06-2025

Se evidencia que se desarrollo actividades en los tramos de tunales y San Antonio, en los cuales se evidencia permanencia de Campamento movil con elementos de Emergencia, camilla, botiquin y extintor, se sugiere que permanezca hidratacion al personal en el frente de obra.

CER Empalme 14/06/2025

15-06-2025 tunales.

se verifica la permanencia en sitio de Kit de Emergencia, PMT correctamente implementado con señalitica vertical y auxiliares de trafico., se recomienda al terminar la jornada laboral dejar areas organizadas, acopios señalizados, recolectar residuos.

CER Empalme 15/06/2025

16-06-2025 San Antonio

Personal en obra: 1 inspector, 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficiales, 6 ayudantes, 1 conductor camioneta, 1 operador de

Scanned with CamScanner

minicargador, 1 operador de retrocargador: Equipos en obra: 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa Vibratoria, 1 generador eléctrico, 1 Vibrador de Concreto, 1 Volqueta doble troque; se informe que renuncieron los auxiliares de tráfico ya que no se evidencian en sitio, se sugiere al Contratista realizar la gestión pertinente para contar con este personal en el menor tiempo posible.

CER - Grafting 16-06-2025

17-06-2025 Tunales:
En recorrido de obra se evidencia que no se cuenta con hidratación para el personal; personal en obra hace uso correcto de la dotación y EPP respectivos para las actividades en ejecución, operador de minicargador con EPP requeridos, se verifica preoperacional el cual se encuentra correctamente diligenciado. Personal en obra: 1 inspector, 2 auxiliares tráfico, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de mini, Equipos en obra: 1 mini-1 mezcladora, 1 placa Vibratoria, 1 vibrador de concreto, 1 generador de energía.

CER Grafting A-06-2025

18-06-2025 · San Antonio
En recorrido se evidencia punto de hidratación activo, se requiere mejorar señalización de alcantarillas, recolectar acero armado abandonado en varios tramos y madera, se solicita una jornada de orden y aseo general en el tramo y campamento. Minicargador con preoperacional activo. Personal en obra: 1 inspectores, 6 ayudantes, 2 oficiales, 1 operador de mini, 1 operador de retrocargador, 1 topógrafo, 1 cadenero, Equipos: 1 mini, 1 Retrocargador, 1 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 Volqueta, 1 mezcladora

CER 18/06/2025 Grafting

19-06 2025 Tunales.
se realiza recorrido de obra donde se evidencia auxiliares de tráfico en sitio, señales verticales implementadas, Caipa movil con elementos de emergencia (camilla, botiquin y extintor) area Organizada, hidratación en obra.
Se lleva a cabo participación en comite integral con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente y se describen los compromisos y se desarrollan otros temas, los cuales quedan registrados en el acta respectiva.
Personal en obra en tunales: 1 inspector, 2 auxiliares de trafico, 1 oficial. 4 ayudantes, 1 operada de mini maquinaria y equipo: 1 Minicargador, 1 mezcladora, 1 placa vibratoria, 1 Vibrador de concreta, 1 generador de energia
CER 19/06/2025 -

20-06-2025 San Antonio
Personal en obra: 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficiales, 6 ayudantes, 1 conducta camioneta, 1 operada de minicargador, 1 operada de retroexcavadora; Grupo encoles, 2 oficiales, 2 ayudantes; Maquinaria y equipos en obra: 1 Retrocargador, 1 Minicargador, 1 mezcladora 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 generador electrico, 1 Vibrador de concreto, 1 Volqueta doble.
En recorrido realizado se evidencia que realizaron jornada de orden y aseo en el frente, organizacion de caipa, ubicacion de extintor, y señalizan del mismo, limpieza de alcantarilla, recolección de residuos, adecuacion de señalizacion en general (informativa, emergencia), el dia 19 se realizo charla de concientizacion, delimitacion de alcantarilla, señalizacion de acceso de tramento, se evidencia punto de Hidratacion activo y señalizado, personal en obra en el punto de Cuneta hace uso correcto de dotacion
CER 20/06/2025 -

21-06-2025 San Antonio
Se evidencia que permanece campamento movil en sitio con los elementos necesarios, personal haciendo uso de dotacion respectiva.
Personal en obra: 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 conductor camioneta, 1 operario de mini, 1 operario de retrocargador. Grupo encofrador, 2 oficiales, 2 ayudantes. Equipos en obra: 1 Retrocargador, 1 Minicargador, 1 mezcladora, 1 compactador, 1 apisonador 1 placa vibratoria, 1 generador electrico. 1 Vibrador de concreto, 1 Volqueta doble.
[signature] [signature] Cer - 21-06-2025 [signature]

22-06-2025
No se desarrollan actividades por parte del contratista de obra
[signature] [signature] Cer 22/6/2025 [signature]

23-06-2025
No se desarrollaron actividades por parte del contratista de obra.
[signature] [signature] Cer / 23/06/2025 [signature]

24-06-2025 Tunales.
Se evidencia en sitio Caipe movil con elementos de Emergencia (camilla, botiquin, extintor) señalizados, punto de hidratacion activo y señalizado, se solicita ampliar la zona de valla. ubicar en lugar adecuado. Personal hace uso correcto de dotacion y EPP apropiados para la labor, se hace enfasis que cuando realicen fundida el personal que se encuentre en el trompo o mezcladora use permanentemente los tapa oidos y tapa bocas. Personal en obra: 1 inspector auxiliar, 2 auxiliares de trabajo, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador, Maquinaria y equipos: 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 placa vibratoria,

1 Vibrador de concreto, 1 generador de energia.
Arthur Diaz CER Enfasco - 24/06/2025

25-06-2025 San Antonio.
En recorrido se evidencia que la profesional SST del contratista realiza jornada de orden y aseo en campamento movil, algunos equipos de emergencia y señalizacion de los mismos, algunos de los materiales acopiados y herramientas, señales de PMT correctamente implementadas, personal hace uso de dotacion y EPP respectivos para la actividad, se realiza llamado de atencion al Contratista por medio de oficio donde se solicita implementar de manera inmediata el entibado en la construccion de obras hidraulicas (encole y descole) ya que el terreno es inestable y puede ocacionar accidentes (ademas de que es un requisito normativo y se encuentra en el anexo tecnico del Contrato.
Personal en obra: 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficiales, 6 ayudantes, 1 conductor de Camioneta, 1 operador de minicargador, 1 Retrocargador, 6 grupo encola, 2 oficiales 2 ayudantes, Maquinaria y Equipo: 1 Retrocargador, 1 Minicargada, 1 Mezcladora, 1 rotadora, 1 apisonador, 1 placa Vibratoria, 1 generador electrico, 1 vibrador de concreto, 1 Volquete doble troque
Arthur Diaz CER 25/06/2025 Enfasco

26-06-2025: tunales.
Personal en obra: inspector ausente, 2 auxiliares de topico, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador, Maquinaria y Equipos: 1 minicargada, 1 Mezcladora, 1 placa Vibratoria, 1 Vibrador de concreto, 1 generador de energia. En sitio se evidencia personal haciendo uso correcto de dotacion y EPP respectivos para la actividad punto de hidratacion activo y cuipo movil en sitio con elementos requeridos.
Arthur Diaz CER 26/06/2025 Enfasco

Scanned with CamScanner

27-06-2025 San Antonio.
Participación en comité integral con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollen otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva.
En el frente se evidencia campamento movil organizado, punto hidratación activo, acopio señalizado y personal en obra con EPP requeridos, PMT con señales verticales moviles instaladas, Personal en obra!
Anexo R. Vial CER-Emp-6-27/06/2025
28-06-2025
Entidad no realiza actividades constructivas
Anexo R. Vial CER Emp-6-28/06/2025
29-06-2025
Entidad Contratista no realiza actividades constructivas
Anexo R. Vial CER/Emp-6-29-06/2025
30-06-2025
Contratista no realiza actividades constructivas
Anexo R. Vial CER Emp-6/30-06-2025

01-07-2025 San Antonio
Se evidencia jornada de Orden y aseo en el frente y señalización de acopio y tubería, la profesional SST realiza sensibilización al respecto con el personal, se señalizan las alcantarillas en intervención, Personal de obra: Grupo civiles 1 topógrafo, 1 cadenero, 2 oficiales, 6 ayudantes, 1 auxiliar de topico, 1 Conductor Camioneta, 1 operador de minicargador, 1 operador de Retrocargador, Grupo civiles 2 oficiales, 2 ayudantes, maquinaria y equipo: 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 generador electrico, 1 vibrador de concreto, 1 Volqueta doble, Falta 1 auxiliar trafico

Bitácora UMV

Observaciones SST OMV.

- Por terminación de contrato se realiza retiro de las unidades sanitarias de cada uno de los frentes de obra y el día 16 de mayo se realiza instalación de las nuevas unidades sanitarias con el nuevo contratista.
- El día 8 y 19 de mayo se realiza la entrega por parte del contratista de maquinaria extintores y botiquines que hacen falta a los equipos.
- Se realiza recomendación al contratista de maquinaria de realizar la entrega apertura de los preoperacionales a cada uno de los operadores de igual manera en los recorridos en obra se realiza seguimiento de este diligenciamiento.
- En el frente de obra Cañón Tunales se realiza jornada de orden y aseo después de la terminación de instalación de campamento donde se organiza depósito de sustancias químicas, kit de emergencia, señalización y recolección de residuos en obra.
- Se solicita al supervisor de maquinaria requerir al contratista para que suministre la dotación adecuada a cada uno de los operadores.
- En los acompañamientos realizados en obra se realiza en compañía con la unidad Bonl's señalización y protección de acopios.
- En respuesta a la solicitud realiza por intervinientes en cuanto a personalizar los preoperacionales en cada uno de los equipos dispuestos en los frentes de obra, se realiza esta solicitud al supervisor de maquinaria para requerir al contratista frente a este tema.
- Se retira material dejado por la unidad de bioingeniería según solicitud y se envía evidencia de esta actividad.

De igual manera a medida que se presentes observaciones en obra se adjunta registro fotográfico de la subsanación de estas.

31-05-2025

La entidad ejecutora no realizó actividades constructivas

01-06-2025 : todo

se realizan actividades constructivas, se evidencia PMT correctamente implementado con señales verticales y auxiliares de tráfico en sitio en elementos reflectivos, bolardos instalada, algunas acopios requieren mejorar cinta de

señalización instalada, Campamento en sitio con elementos necesarios

02-06-2025 Toldo

Se evidencia campamento dotado con elementos de atención de Emergencias, camilla, botiquín y extintor, Hoja de seguridad en sitio, se desarrollan actividades de instalación de tresado estabilizado, PMT implementado correctamente.

03-06-2025 Capitolio

En recorrido de obra se evidencia lo siguiente:
2 Unidades Sanitarias portatil en sitio, el proveedor realiza un mantenimiento semanal, se evidencia que al finalizar la jornada laboral se realiza jornada de señalización de cuspos y de Orden y aseo.
Personal en obra: 1 inspector, 1 oficial, 2 BOAL, 3 ayudantes, 2 auxi trafico, 1 topografia 1 operador de mini, Vibro, retrocargador, Volqueta, motoniveladora; equipos y maquinaria: 1 Motoniveladora 1 retrocargador (Varado), 1 Vibro Btn, 1 Vibro 4 ton (Varado) 1 Volqueta sencilla (Varada), 1 minicargador. Personal hace uso de EPP respectivo.

04-06-2025 Jueves.

En recorrido realizado se sugiere purgear otro lugar segun la motoniveladora, ya que se encuentra en terreno inestable, se evidencia Vehiculo Camioteange sin propiedad, al igual que el minicargador y Camion irrigador. Personal en obra: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 auxi trafico, 1 Boal, 1 Reg. Sst, 2 operadores de Vibro, 1 de Rebol 1 Motoniveladora, 2 conductores de Camioteange, 1 operador de mini; Equipos en obra: 2 Vibros, 1 Retrocargador

1 motoniveladora, 1 carrotanque, 1 carro emulsion, 1 mini-cargador.

05-06-2025 Se
se realiza recorrido a los frentes de obra San Antonio y Union tunales donde se evidencia PMT correctamente implementado con señales Verticales y auxiliares de trafico, campamentos con elementos de emergencia respectivos; Se realiza participación en comite integral, con el fin de realizar seguimiento a las actividades realizadas por el Componente, se desarrollan los compromisos, y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en acta.

06-06-2025 Capitolio.
En recorrido de obra se evidencia maquinas y Volquetas sin preoperacional, el extintor con el cual fueron dotados es de 5 lbs, se considera demasiado pequeño para este tipo de Vehiculos., se observa en mal estado luminaria frontal izquierda y puerta de Volqueta. Personal con EPP en uso, Personal en obra: 1 inspector, 2 oficiales, 1 Boss, 3 ayudantes, 2 aux trafico, 1 Comisión de topografia, 2 operarios de Vibrocompactadora, 1 operador de Retrocargador, 1 Conductor Volqueta, 1 operador de motoniveladora, 1 Operador de minicargador. Equipos en obra: 1 Motoniveladora, 1 Retro (Varada), 1 Vibro (Stn), 1 Vibro Utn, 1 Volqueta sencilla (Varada), 1 minicargador Varado.

07-06-2025.
La Entidad Ejecutora no realiza actividades constructivas.

08-06-2025
La Entidad Ejecutora no realizo actividades constructivas

09-06-2025 San Antonio.
En recorrido se evidencia: Motoniveladora PMS 10004 marca RHINO presenta extintor Vencido, no cuenta con stike del contrato, Vibrocompactador mixto le falta vidrio derecho, y tiene panoramico frontal fisurado, no cuenta con stike del contrato, no se evidencia controlada de trafico, Personal en obra: 1 Residente, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 2 inspectores, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliar trafico, 1 comision topografia, 1 operador minicargador, 2 operadores de motoniveladora, 1 operador de retrocargador, 3 operadores de Vibro. 1 conductor de camioneta, 1 conductor de Volqueta, 1 conductor de Carrotanque, 1 Conductor de Volqueta sencilla. Equipos en obra: 2 motoniveladora, 1 Vibrocompactadora, 1 Vibro (Varado sin horometro) 1 Cargamanguera 1 Minicargador (1 operador para mini y retrocargadora). 1 Retrocargador John Deere (Varado), 1 Retrocargador Loding, 1 Carrotanque, 1 Volqueta sencilla (operativa) Maquinaria de Misionalidad 1 Vibrocompactador mixto.

10-06-2025 Jurales
Personal en obra: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal, 1 Ing SST, 2 operarios de Vibro, 1 operador de Retro Cargadora; Maquinaria y equipos en obra: 2 Vibrocompactadores, 1 Retrocargadora, 1 motoniveladora sin operador, 1 minicargador sin operador; en recorrido se evidencia que la caseta para control de topografia se mantienen señalizadas, 2 unidades sanitarias en sitio, con

mantenimiento semanal, permanencia en sitio de elementos de emergencia, Personal empleando dotación y EPP respectivos; PMT correctamente implementado con señales verticales, banderas y auxiliares de tráfico. hojas de seguridad en sitio y conos con rotulos.

14-06-2025 Capitolio.

En recorrido de obra se evidencia la permanencia en obra de campamento movil con elementos de emergencia Organizados y completos, Cartelera informativa; 2 unidades Sanitarias en sitio con mantenimiento semanales., Personal con dotación y EPP respectivo para la actividad.

Personal en obra: 1 inspector, 1 oficial, 1 Boal, 2 ayudantes 2 aux tráfico, 1 comisión de topografía, 1 operador de Vibrocompactador, 1 operador de retro, 1 Conductor de Volqueta, 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador, Maquinaria y equipos: 1 Motoniveladora (Varado), 1 Motoniveladora trasladada a tramo San Antonio, 1 retrocargador, 1 Vibro de 8tn, 1 Vibro de 4 tn, 1 Volqueta sencilla, 1 minicargador.

12-06-2025 : San Antonio

En recorrido se evidencian alcoyes sin señalizar, Retroexcavadora sin preoperacional y operador no le han entregado casco ni protección auditiva, Personal de manejo de tráfico en sitio y PMT implementado correctamente, dos ESP en sitio operativas, un campamento movil con Kit de Emergencia completo. personal se evidencia que hace uso de dotación respectiva Personal en obra: 1 residente tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 profesional Social, 2 inspectores, 2 oficiales, 5 ayudantes. 1 Boal, 4 auxiliares tráfico, 1 comisión topografía, 1 operador de mini, 2 operadores de motoniveladora. 1 operador retrocargador, 3 operadores de vibrocompactador, 1 Conductor de camioneta. 1 Volqueta, 1 carrotanque, 1 conductor Volqueta sencilla.

Scanned with CamScanner

Maquinaria y equipos en obra: 1 motoniveladora (se retira del frente) 1 otra motoniveladora con destino frente capitolio marca RHINO, 1 Vibro, 1 Vibro sin potencia y sin horometro, 2 minicargadores, 1 retrocargador ent. ingresa al frente, 1 Retrocargador Luding, 1 carrotanque 1 Volqueta doble (1 del proyecto y otra de misionalidad. 1 Volqueta Sencilla (operativa).

13-06-2025

Se realiza participacion en comite integral con el fin de desarrollar seguimiento a las actividades ejecutadas por el componente, se desarrollan los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva. Se realiza revision por parte de interventoria de informe mensual.

14-06-2025

La Entidad ejecutora no realiza actividades Constructivas

15-06-2025

La Entidad ejecutora no realiza actividades Constructivas

16-06-2025 Tunales.

Personal en obra: 1 oficial, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal, 1 teg SST, 2 operarios de vibrocompactador. 1 operador de Retrocargador, 1 operador de motoniveladora. 1 operador de minicargador, 1 conductor de carrotanque. maquinaria y equipos en obra: 2 vibrocompactadores, 1 Retrocargador, 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 carrotanque. en el sitio se evidencian 2 unidades sanitarias LOP con mantenimiento semanal, campamento movil con elementos de emergencia en sitio (camilla, Botiquin y

Scanned with CamScanner

extintor), se evidencia que se procede a entregar nuevo formato de preoperacional a los operadores y conductores, PMT con señales verticales implementadas.

Estiven Peña

17-06-2025 Capitolio

En recorrido se evidencia vibrocompactador sin preoperacional y no le funciona la alarma de reversa, los dos Vibros tienen un extintor de 5 lbs, se requiere validar información y suministrar uno con mas capacidad, de igual manera se sugiere validar estado de llantas de minicargador y proceder con cambio. Personal de manejo de trafico en sitio y PMT con señales verticales implementadas. Personal en obra: 1 inspector, 1 oficial, 1 Boss, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 comisión de topografía, 1 operador de Vibrocompactador, 1 operador de retrocargador, 1 Conductor de Volqueta, 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador; Maquinaria y equipo en obra: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 Vibro de 8tn, 1 Vibro 4tn, 1 Volqueta Sencilla, 1 minicargador.

Estiven Peña

18-06-2025 San Antonio

En recorrido de obra se evidencia que se realizo jornada de señalización de acopios, se mantiene un campamento movil dotado con elementos necesarios, y unidades sanitarias, personal de trafico en sitio y PMT con señales implementadas correctamente, bascula instalada se identifica personal haciendo uso de la dotacion respectiva Personal en obra: 1 residente tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 profesional Social, 1 inspector, 1 oficial, 5 ayudantes, 2 Boss, 4 auxiliares de trafico, 1 comision de topografia, 2 operadores de minicargador, 1 operador de motoniveladora, 2 operadores Retrocargador, 3 operadores de Vibrocompactador, 1 conductor de camioneta, 1 conductor de Volqueta, 1 conductor de

carrotanque, 1 Conductor de Volqueta; 1 Maquinera y equipo 1 motoniveladora, 1 Vibrocompactador, 1 Vibro Vaiado sin bateria sin potencia y sin horometro. 2 minicargador, 1 Retrocargador CAT Vaiado, 1 Retrocargador Luding, 1 carrotanque, 1 Volqueta doble, 1 Volqueta sencilla operativa, 2 volqueta doble, maquinaria de misionalidad 1 vibrocompactador mixto.

19-06-2025 Tunales.
En recorrido se evidencia: personal de manejo de trafico en sitio, señales verticales instaladas, barricada, cono Organizada con elementos necesarios, de evidencia area organizada, se solicita señalizar una curva de topografia. Se realiza participacion en comite integral con el fin de desarrollar seguimiento a las actividades ejecutadas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en acta respectiva. Personal en obra: 1oficial, 1 ayudante, 2auxiliares de trafico, 1 Boss, 1 tegnologa SST, 2 operadores de Vibro, 1 operador de Retro, 1 operada de motoniveladora, 1 minicargador (Vaiado), 1 carrotanque., equipos y maquinaria en obra: 2 vibrocompactador, 1 Retro cargador, 1 Motoniveladora, 1 mini (Vaiado), 1 carrotanque

20-06-2025 San Antonio
Personal turno 9:2: 1 residente tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudante), 2 auxiliares de trafico, 1 comisión de topografia, 1 operador de mini, 1 operador de minicargador, motoniveladora, 2 operadores de retrocargador, 1 operador de Vibrocompactador, 1 conductor de Camioneta, 1 conductor de Volqueta, 1 Conductor de carrotanque, 1 Conductor de Volqueta sencilla, Maquinaria y equipos

en obra Contrato 936, 1 Motoniveladora, 1 Vibrocompactador, 1 minicargador, 1 Retrocargada CAT (Vacios) 1 carrotanque 1 Volqueta sencilla, Maquinaria y equipos del proyecto, 3 Volqueta dobles. En el sitio se evidencia campamento movil implementado con elementos de emergencia, camilla, botiquin y extintor, personal haciendo uso de EPP y dotación

22-06-2025 Capitolio

No se evidencia que la entidad ejecutora no realizo actividades constructivas.

22-06-2025

La entidad Ejecutora no realizo actividades constructivas.

23-06-2025

La entidad Ejecutora no realizo actividades constructivas.

24-06-2025 Capitolio

En recorrido realizado se evidencia lo siguiente: Vibrocompactador no le funciona alarma de reversa y no le funciona las luces, Vibrocompactador Hamm, presenta falla de luces, y no le funciona la alarma de reversa, no se evidencia Auxiliar de trafico en uno de los costados, en el sitio se evidencia campamento movil con elementos necesarios. Kit de emergencia, canecas de combustible rotulados, 2 Unidades Sanitarias en sitio con mantenimiento realizado. Personal en obra: 1 inspector, 1 Topografo, 1 Boal, 2 auxiliar trafico, 1 comision topografica, 1 operario Vibrocompactador, 1 operador retrocargador, 1 conductor de Volqueta, 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador, Maquinaria 1 equipo; 1 motoniveladora, 1 Retrocargador Jhon Deere 1 Vibrocompactador de 8 ton, 1 Vibrocompactador de 4 ton, 1 Volqueta sencilla, 1 minicargador.

Scanned with CamScanner

San Antonio. Se evidencia un vibrocompactador con falla de frenos, se solicita la investigación y reparación inmediata o retiro de este equipo del tramo el Ing Oma responde que se procederá a realizar la investigación respectiva y se harán las reparaciones pertinentes.

25-06-2025 Tunal

Personal en obra: 1 oficial, 1 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, 1 SOAL, 1 tecnóloga SST, 2 operarios de vibrocompactador, 1 operador de retrocargador, 1 operador de motoniveladora, 1 operario minicargador, 1 operario carrotanque; Maquinaria y equipos en obra; 2 Vibrocompactadores, 1 Retrocargador, 1 Motoniveladora, 1 minicargador (Varado), 1 carrotanque, En sitio se evidencian 2 unidades sanitarias con aseo semanal, campamento movil en sitio con elementos de emergencia completos. PMT correctamente implementado con señales Verticales, moviles y auxiliares de tráfico en sitio, equipos en sitio con preoperacionales activos y vigentes.

26-06-2025 San Antonio

En recorrido realizado se evidencia minicargador no le funciona pito de reversa y sin preoperacional, se recibe queja de la señora Eva Sanchez, de La Comunidad donde manifiesta que no le solicitaron permiso para el acopio, de igual manera dice que el personal esta haciendo sus necesidades fisiologicas en el potrero revisar el tema, de igual manera manifiesta daño en la cerca.

Se evidencia volqueta sencilla varada por tema hidraulico del Volco, Retrocargadora varada, Unidades Sanitarias Sin gel y no le han realizado aseo X no haber pago para el carrotanque que realiza el mantenimiento, por lo cual la Ing ambiental contesta que este mismo

dia realizaron el mantenimiento respectivo, Vibrocompactador Vaiado, sin fuerza, sin horometro. Km 3+200
Personal en obra: 1 residente tecnico, 1 profesional SST, ambiental y Social, 2 inspectores, 2 oficiales, 6 ayudantes, 2 Boal, 4 auxiliar tecnico, 2 comision topografia, 2 operadores de minicargador, 1 operador de motoniveladora, 2 operadores de retrocargador, 3 operadores de Vibrocompactador, 1 Conductor camioneta, 1 conductor de Volqueta, 1 conductor de Cairotanque, 1 Conductor de Volqueta sencilla, Maquinaria (contrato 936.), 1 Motoniveladora, 1 Vibrocompactador, 1 Vibrocompactador, 2 minicargador, 1 Retrocargador (CAT Vaiado). 1 Retrocargador terex (Vaiado), 1 Retrocargador Luding, 1 Cairotanque, 1 Volqueta sencilla, Maquinaria del proyecto, 2 Volqueta doble.

27-06-2025
Participacion en comite integral con el fin de desarrollar seguimiento a las actividades ejecutadas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva.

28-06-2025
La entidad ejecutora no realiza actividades constructivas

29-06-2025
La entidad ejecutora no realiza actividades constructivas

30-06-2025
La entidad ejecutora no realiza actividades constructivas

01-07-2025 PREDIO SAN ANTONIO
Personal: 1 inspector - 1 oficial, - 1 ayudante - 1 comision de topografia 1 conductor de camioneta, - 1 operador de minicargador 1 operador de retroexcavadora. Maquinaria: 1 Retroexcavadora Luding. - 1 Vibrocompactador doble tandem Dynapac, esta maquina

Bitácora C. Gaviones 95

replanteo topografico y adecuaciones generales.

Paul Rangel

28-05-2025

En el tramo laguna verde se evidencia actividades de replanteo topografico

Paul Rangel

29-05-2025

Participacion en comite No 45 integral de obra, con el fin de realizar seguimiento a actividades desarrolladas por el componente, se describen compromisos adquiridos en el comite anterior y se tratan otros temas, los cuales quedan registrados en el acta respectiva.

Paul Rangel

30-05-2025

se realizan actividades de replanteo topografico en el frente de obra laguna Verde.

Paul Rangel

31-05-2025

No se desarrollan actividades constructivas por parte del contratista de obra.

Paul Rangel

01-06-2025

No se desarrollan actividades constructivas por parte del contratista de obra.

Paul Rangel

02-06-2025

No se desarrollan actividades constructivas por parte del contratista de obra.

Paul Rangel

03-06-2025
Se realizan actividads de replanteo topograficco en el frente de obra laguna Verde
Paul Pagel

04-06-2025
Se realiza recoindo en el tramo laguna Verde donde se identifica personal realizando actividads de replanteo. recoindo en tramo Capitolio con el fin de verificar estado para inicio de actividads en el tramo.
Paul Pagel

05-06-2025
Se desarrollan actividads de replanteo topograficco en el frente de obra laguna Verde.
Paul Pangel

06-06-2025
Se realizan actividads de replanteo topograficco en el frent laguna Verde. Participain en comite integral, donde se desarrolla seguimiento al componente, se dexriben Compromisy y se tratan tems varios los cuals quedan registrads en el acta respetiva.
Paul Pangel

07-06-2025
el contratista realize actividads de replanteo topograficco en el frente de obra laguna Verde.
Paul Pangel

08-06-2025
se realizan actividads de replanteo topograficco en el tramo laguna verde por parte del contratista, de igual manera se verifica por parte de interventoric personal en obra que requiere que remitan los documentos de ingreso
Paul Pagel

09-06-2025
El Contratista continua con actividads de replanteo topograficos en el frente laguna Verde.
Paul Rangel

10-06-2025
Se realiza revisión de informs semanals enviads por el contratista, estos informs deben ser generads desde la primer semana de abril, el profesional del Contratista trabaje en la elaboración de los informs mensuals respectivos.
Paul Rangel

11-06-2025
El contratista continua con actividads de replanteo topograficos en el frente laguna Verde.
Paul Rangel

12-06-2025
El contratista continua con actividads de replante topograficos en el frente de obra laguna Verde.
Paul Rangel

13-06-2025
El contratista realiza adecuación señalización de acopio de materials petreos y continua con la actividad de replanteo topográfico
Paul Rangel

14-06-2025
No se desarrollan actividads constructivas por parte del Contratista de obra
Paul Rangel

15-06-2025
No se desarrollan actividads constructivas por parte del Contratista de obra
Paul Rangel

16-06-2025
El contratista realiza entrega de informs semanals la cual se encuentran en revisión por parte de interventoria, de igual manera se hace entrega del informe de Abril y Mayo
Paul Rangel

17-06-2025
En el frente de obra laguna verde el contratista de obra continua con actividades de replanteo topografico y señalización de acopio de postes ubicado en el predio de santa rosa. Contratista entrega informs mensuales de Agosto 2022 a abril 2023. - febrero a abril de 2024.
Paul Rangel

18-06-2025
El Contratista en el tramo laguna Verde realiza o inica actividad de delimitación de alcantarilla con polisombra, continua con actividades de replanteo topografico, personal en sitio con dotación y EPP respectivos.
Paul Rangel

19-06-2025
Tramo laguna Verde se continua con la actividad de delimitación de alcantarilla con polisombra, se evidencia personal realizando actividades con dotación y EPP respectivos, de igual manera se realiza delimitación de materiales en el frente de obra
Paul Rangel

20-06-2025
tramo laguna Verde, se evidencia adecuación de Campamento movil, donde se ubican elementos de Emergencia, camilla, botiquin, extintor, se continua con actividad de replante topografico de obras hidraulicas proyectadas, se evidencia personal con dotación respectiva.
Paul Rangel

21-06-2025
tramo laguna Verde, el Contratista continua con la actividad de replanteo de obras hidraulicas, señalitacion de materiales en el frente de obra y se realiza jornada de orden y aseo en el frente de obra.
Paul Rangel

22-06-2025
tramo laguna Verde, se realiza actividad de replanteo de obras hidraulicas, personal haciendo uso de dotacion y EPP respectivo para las actividades desarrolladas, se mantiene en el area el campamento movil con los elementos necesarios (camilla, botiquin, extintor).
Paul Rangel

23-06-2025
tramo laguna Verde, se continua con actividad de replanteo topografico, personal haciendo uso de dotacion y EPP respectivo campamento en sitio.
Paul Rangel

24-06-2025
La interventoria realiza revision de informs mensuales remitidos del mes de mayo y abril de 2025, una vez se termine el proceso de verificacion esta interventoria procedera con el concepto respectivo, en el tramo laguna Verde se evidencia personal haciendo uso de dotacion y EPP respectivo para la actividades desarrollada se mantiene en sitio elementos de emergencia (camilla botiquin y extintor, personal haciendo uso de dotacion y EPP respectivos.
Paul Rangel

25-06-2025
La interventoria inicia revision de informes mensuales remitidos el 17 de junio, una vez se termine el

proceso de Verificación, se realizara el Concepto respectivo y remitirlo al Consorcio. En el sitio se evidencia 1 Retrocargadora y 1 Excavadora, 1 Volqueta sencilla haciendo tiraje de material triturado, se evidencia excavación delimitada, personal haciendo uso de dotación respectiva.

Paul Pargel

26-06-2025

en el tramo laguna Verde en recorrido realizado se evidencia Campamento movil instalado, con elementos de Emergencia en sitio, se realizo revisión de preoperacional de la Excavadora Cat 305.5E2 el cual se encuentra correctamente diligenciado y operador haciendo uso de dotación respectiva, el personal que se evidencia en el frente de obra hace uso correcto de EPP y dotación respectiva, se mantiene excavación para filtro delimitada, alcantarillas con polisombra de delimitación.

Paul Pargel

27-06-2025

Se observa trabajadores con EPP en orden, no se evidencia instalación de PMT, se observa carpa con kit de emergencia maquina con preoperacional en orden, se observa señalización en excavación, no hay presencia de profesional SST en obra.

Paul Pargel

28-06-2025

Se observa trabajadores con EPP y overol en orden - no se observa PMT instalado - excavación de filtro señalizado kit de emergencias en orden.

Paul Pargel

29-06-2025

Se observa trabajadores con EPP y overol en orden señalizacion en excavación en orden - carpa con

kit de emergencia en orden. - No se observa PMT instalado
Paul Rangel
30-06-2025
No hay PMT instalado. kit de emergencias en orden señalización en excavación en orden. trabajadores con EPP y overol en orden. preoperacional de máquina en orden.
Paul Rangel
01-07-2025 laguna Verde.
Kit de Emergencia, camilla botiquin y extinter en sitio. ausencia de personal de manejo de trafico, No se evidencia PMT instalado, señalizacion de excavacion. equipo en preoperacionales diligenciados, no se evidencia stiker de identificacion de la maquinaria. trabajadores con EPP y dotacion respectiva.
Paul Rangel
02-07-2025 Laguna Verde.
Se evidencia que se encuentran desarrollando actividades constructiva son la implementacion de PMT respectivo ausencia de personal de manejo de trafico, Caipa movil en sitio, kit de Emergencia completo, no se evidencia presencia de profesional SST, se verifica permanencia de señalizacion en excavacion, preoperacionales diligenciados, personal haciendo uso de EPP y dotacion requerida, no se evidencia stiker de identificacion en equipos.
Paul Rangel
03-07-2025. Laguna Verde.
Se observa trabajadores empleando EPP y dotacion respectiva, se desarrollan actividades en implementacion de PMT, no se encuentran auxiliares de trafico, Excavacion señalizada, preoperacionales diligenciados, kit de Emagencia en caipa movil, por parte de interventoria se desarrolla revision de informes semanales remitidos por el contratista
Paul Rangel

3D.
PREOPERACIONALES
VEHÍCULOS INTERVENTORIA

ECOVÍAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Pre operacional para equipo liviano SG-SST de ECOVIAS S.A.S.
Documento 014 / Versión 03/

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 03 al: 06 del mes de: Junio del año: 2025
CONDUCTOR: Cristian Rios C.C. 1001060636 N° LICENCIA: 1001060636 FECHA VENCIMIENTO 22-03-2028
TIPO DE VEHICULO: Camioneta PLACA: UPA 609
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
SEGURO OBLIGATORIO: 27-10-2025 TECNOMECANICA: 05-11-2025 POLIZAS:

LEYENDA: **B: BUENO M: MALO**

RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO			✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LA COJINERIA			✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO			✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO			✓		✓		✓		✓						
VIDRIOS LATERALES			✓		✓		✓		✓						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO			✓		✓		✓		✓						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO			✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS RETROVISOR			✓		✓		✓		✓						
LUCES PRINCIPALES			✓		✓		✓		✓						
LUCES DE PARQUEO			✓		✓		✓		✓						
DIRECCIONALES			✓		✓		✓		✓						**FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE**
LUCES DE FRENO / REVERSA			✓		✓		✓		✓						
ALARMA DE RETROCESO			✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO			✓		✓		✓		✓						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE			✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE			✓		✓		✓		✓						**PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE**
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES ALTAS			✓		✓		✓		✓						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR			✓		✓		✓		✓						300.000 Km
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR			✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO			✓		✓		✓		✓						**MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA**
TACOMETRO (R.P.M.)			✓		✓		✓		✓						
VELOCIMETRO			✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE			✓		✓		✓		✓						
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS			✓		✓		✓		✓						Mantenimiento preventivo
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE			✓		✓		✓		✓						graduación de frenos
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS			✓		✓		✓		✓						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA			✓		✓		✓		✓						
FRENO DE SERVICIO			✓		✓		✓		✓						
FRENO DE PARQUEO			✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LAS LLANTAS			✓		✓		✓		✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD			✓		✓		✓		✓						**PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
AIRE ACONDICIONADO															
EXTINTOR DE INCENDIOS			✓		✓		✓		✓						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA			✓		✓		✓		✓						**FECHA DE CAMBIO (llantas,bateria, entre otros) lugar**
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO			✓		✓		✓		✓						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS			✓		✓		✓		✓						
KIT DE HERRAIENTAS BASICAS			✓		✓		✓		✓						
KILOMETRAJE INICIAL			298328		298498		298563		298629						
KILOMETRAJE FINAL			298498		298560		298616		298772						

ECOVIAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Pre operacional para equipo liviano SG-SST de ECOVIAS S.A.S.
Documento 014 / Versión 03/

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 09 al: 13 del mes de: Junio del año: 2025
CONDUCTOR: Cristian Rios C.C. 1001060636 N° LICENCIA: 1001060636 FECHA VENCIMIENTO 22-03-2028
TIPO DE VEHICULO: Camioneta PLACA: DPQ 609
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
SEGURO OBLIGATORIO: 27-10-2025 TECNOMECANICA: 05-11-2025 POLIZAS:

LEYENDA: **B: BUENO M: MALO**

RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO	/		/		/		/		/						
ESTADO DE LA COJINERIA	/		/		/		/		/						
VIDRIO PANORAMICO	/		/		/		/		/						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO	/		/		/		/		/						
VIDRIOS LATERALES	/		/		/		/		/						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO	/		/		/		/		/						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO	/		/		/		/		/						
ESPEJOS RETROVISOR	/		/		/		/		/						
LUCES PRINCIPALES	/		/		/		/		/						
LUCES DE PARQUEO	/		/		/		/		/						
DIRECCIONALES	/		/		/		/		/						
LUCES DE FRENO / REVERSA	/		/		/		/		/						FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
ALARMA DE RETROCESO	/		/		/		/		/						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO	/		/		/		/		/						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE	/		/		/		/		/						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	/		/		/		/		/						PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	/		/		/		/		/						
INDICADOR LUCES ALTAS	/		/		/		/		/						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	/		/		/		/		/						300.000 Km
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	/		/		/		/		/						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO	/		/		/		/		/						MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA
TACOMETRO (R.P.M.)	/		/		/		/		/						
VELOCIMETRO	/		/		/		/		/						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE	/		/		/		/		/						Mantenimiento Preventivo graduación de frenos
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS	/		/		/		/		/						
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE	/		/		/		/		/						
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS	/		/		/		/		/						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	/		/		/		/		/						
FRENO DE SERVICIO	/		/		/		/		/						
FRENO DE PARQUEO	/		/		/		/		/						
ESTADO DE LAS LLANTAS	/		/		/		/		/						
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		/		/		/		/						PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO															
EXTINTOR DE INCENDIOS	/		/		/		/		/						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA	/		/		/		/		/						FECHA DE CAMBIO (llantas,bateria, entre otros) lugar
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	/		/		/		/		/						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	/		/		/		/		/						
KIT DE HERRAIENTAS BASICAS	/		/		/		/		/						
KILOMETRAJE INICIAL	298895		299035		299778		299363		299411						
KILOMETRAJE FINAL	299035		299763		299340		299411		299525						

ECOVIAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Pre opcracional para equipo liviano SG-SST de ECOVIAS S.A.S.
Documento 014 / Versión 03/

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del : 16 al : 20 del mes de : Junio del año : 2025
CONDUCTOR: Cristian Rios C.C. 1001060636 N° LICENCIA: 1001060636 FECHA VENCIMIENTO 22-07-2028
TIPO DE VEHICULO: Camioneta PLACA: UDQ 609
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
SEGURO OBLIGATORIO : 27-10-2025 TECNOMECANICA : 05-11-2025 POLIZAS:

LEYENDA: **B: BUENO M: MALO**

RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINDO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO	/		/		/		/		/						
ESTADO DE LA COJINERIA	/		/		/		/		/						
VIDRIO PANORAMICO	/		/		/		/		/						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO	/		/		/		/		/						
VIDRIOS LATERALES	/		/		/		/		/						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO	/		/		/		/		/						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO	/		/		/		/		/						
ESPEJOS RETROVISOR	/		/		/		/		/						
LUCES PRINCIPALES	/		/		/		/		/						
LUCES DE PARQUEO	/		/		/		/		/						
DIRECCIONALES	/		/		/		/		/						**FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE**
LUCES DE FRENO / REVERSA	/		/		/		/		/						
ALARMA DE RETROCESO	/		/		/		/		/						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO	/		/		/		/		/						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE	/		/		/		/		/						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	/		/		/		/		/						**PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE**
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	/		/		/		/		/						
INDICADOR LUCES ALTAS	/		/		/		/		/						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	/		/		/		/		/						300.000
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	/		/		/		/		/						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO	/		/		/		/		/						**MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA**
TACOMETRO (R.P.M.)	/		/		/		/		/						
VELOCIMETRO	/		/		/		/		/						Mantenimiento Preventivo
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE	/		/		/		/		/						Graduación de frenos
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS	/		/		/		/		/						
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE	/		/		/		/		/						
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS	/		/		/		/		/						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	/		/		/		/		/						
FRENO DE SERVICIO	/		/		/		/		/						
FRENO DE PARQUEO	/		/		/		/		/						
ESTADO DE LAS LLANTAS	/		/		/		/		/						
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		/		/		/		/						**PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
AIRE ACONDICIONADO															
EXTINTOR DE INCENDIOS	/		/		/		/		/						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA	/		/		/		/		/						**FECHA DE CAMBIO (llantas,bateria, entre otros) lugar**
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	/		/		/		/		/						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	/		/		/		/		/						
KIT DE HERRAIENTAS BASICAS	/		/		/		/		/						
KILOMETRAJE INICIAL	299582		299725		299773		299817		299857						
KILOMETRAJE FINAL	299725		299773		299817		299857		299985						

ECOVÍAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Pre operacional para equipo liviano SG-SST de ECOVIAS S.A.S.
Documento 014 / Versión 03/

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 24 al: 27 del mes de: Julio del año: 2025
CONDUCTOR: Cristian Rios C.C. 1001060636 N° LICENCIA: 1001060636 FECHA VENCIMIENTO 22-07-2028
TIPO DE VEHICULO: camioneta PLACA: UPQ 609
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
SEGURO OBLIGATORIO: 27-10-2025 TECNOMECANICA: 05-11-2025 POLIZAS:

LEYENDA: **B: BUENO M: MALO**

RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST: J. Arturo R.

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO			✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LA COJINERIA			✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO			✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO			✓		✓		✓		✓						
VIDRIOS LATERALES			✓		✓		✓		✓						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO			✓		✓		✓		✓						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO			✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS RETROVISOR			✓		✓		✓		✓						
LUCES PRINCIPALES			✓		✓		✓		✓						
LUCES DE PARQUEO			✓		✓		✓		✓						
DIRECCIONALES			✓		✓		✓		✓						**FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE**
LUCES DE FRENO / REVERSA			✓		✓		✓		✓						
ALARMA DE RETROCESO			✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO			✓		✓		✓		✓						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE			✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE			✓		✓		✓		✓						**PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE**
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES ALTAS			✓		✓		✓		✓						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR			✓		✓		✓		✓						305.000 Km
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR			✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO			✓		✓		✓		✓						**MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA**
TACOMETRO (R.P.M.)			✓		✓		✓		✓						
VELOCIMETRO			✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE			✓		✓		✓		✓						Mantenimiento Preventivo
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS			✓		✓		✓		✓						graduacion de frenos
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE			✓		✓		✓		✓						
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS			✓		✓		✓		✓						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA			✓		✓		✓		✓						
FRENO DE SERVICIO			✓		✓		✓		✓						
FRENO DE PARQUEO			✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LAS LLANTAS			✓		✓		✓		✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD			✓		✓		✓		✓						**PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
AIRE ACONDICIONADO															
EXTINTOR DE INCENDIOS			✓		✓		✓		✓						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA			✓		✓		✓		✓						**FECHA DE CAMBIO (llantas, bateria, entre otros) lugar**
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO			✓		✓		✓		✓						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS			✓		✓		✓		✓						
KIT DE HERRAIENTAS BASICAS			✓		✓		✓		✓						
KILOMETRAJE INICIAL			300255		300397		300450		300504						
KILOMETRAJE FINAL			300397		300450		300504		300645						

ECOVÍAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Pre operacional para equipo liviano SG-SST de ECOVIAS S.A.S.
Documento 014 / Versión 03/

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 03 al: 06 del mes de: Junio del año: 2025
CONDUCTOR: Donnay Pinto C.C. 1000251330 N° LICENCIA: 1000251330 FECHA VENCIMIENTO 16-11-2025
TIPO DE VEHICULO: Camioneta PLACA: JxK361
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
SEGURO OBLIGATORIO : SOAT 21-07-2025 TECNOMECANICA : N/A POLIZAS:

LEYENDA: **B: BUENO M: MALO**

RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO						✓		✓		✓						
ESTADO DE LA COJINERIA						✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO						✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO						✓		✓		✓						
VIDRIOS LATERALES						✓		✓		✓						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO						✓		✓		✓						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO						✓		✓		✓						
ESPEJOS RETROVISOR						✓		✓		✓						
LUCES PRINCIPALES						✓		✓		✓						
LUCES DE PARQUEO						✓		✓		✓						
DIRECCIONALES						✓		✓		✓						
LUCES DE FRENO / REVERSA						✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
ALARMA DE RETROCESO						✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO						✓		✓		✓						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE						✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE						✓		✓		✓						
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE						✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR LUCES ALTAS						✓		✓		✓						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR						✓		✓		✓						
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR						✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO						✓		✓		✓						MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO
TACOMETRO (R.P.M.)						✓		✓		✓						INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA
VELOCIMETRO						✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE						✓		✓		✓						
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS						✓		✓		✓						
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE						✓		✓		✓						
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS						✓		✓		✓						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA						✓		✓		✓						
FRENO DE SERVICIO						✓		✓		✓						
FRENO DE PARQUEO						✓		✓		✓						
ESTADO DE LAS LLANTAS						✓		✓		✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD						✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO						✓		✓		✓						
EXTINTOR DE INCENDIOS						✓		✓		✓						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA						✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO						✓		✓		✓						(llantas, bateria, centro diesel, lugar
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS						✓		✓		✓						
KIT DE HERRAIENTAS BASICAS						✓		✓		✓						
KILOMETRAJE	INICIAL					93791		93927		94032						
	FINAL					93927		94032		94138						

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 09 al: 14 del mes de: JUNIO del año: 2025
CONDUCTOR: Danna V. Pinzón C.C. 1000251330 N° LICENCIA: 1000251330 FECHA VENCIMIENTO 16-11-2033
TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA PLACA: JXK361
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
SEGURO OBLIGATORIO : SOAT 21-07-2025 TECNOMECANICA : N/A POLIZAS:

LEYENDA: **B: BUENO M: MALO**

RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINDO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LA COJINERIA	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS RETROVISOR	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES PRINCIPALES	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
LUCES DE FRENO / REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓						
ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	✓		✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES ALTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO	✓		✓		✓		✓		✓						MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA
TACOMETRO (R.P.M.)	✓		✓		✓		✓		✓						
VELOCIMETRO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE	✓		✓		✓		✓		✓						
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE SERVICIO	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LAS LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO	✓		✓		✓		✓		✓						
EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA	✓		✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO Llantas, bateria, aceite cada lugar
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
KIT DE HERRAIENTAS BASICAS	✓		✓		✓		✓		✓						
KILOMETRAJE INICIAL	94192		94274		94349		94502		94630						
KILOMETRAJE FINAL	94274		94349		94502		94630		94737						

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 16 al: 20 del mes de: Junio del año: 2025
CONDUCTOR: Fanny V. Rincón C.C. 1000251330 N° LICENCIA: 1000251330 FECHA VENCIMIENTO 16-11-2025
TIPO DE VEHICULO: Camioneta PLACA: JXK 361
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
SEGURO OBLIGATORIO : SOAT 21-07-2025 TECNOMECANICA : N/A POLIZAS:

LEYENDA: **B: BUENO M: MALO**

RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LA COJINERIA	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS RETROVISOR	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES PRINCIPALES	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
LUCES DE FRENO / REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓						
ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	✓		✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES ALTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO	✓		✓		✓		✓		✓						MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO (INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA
TACOMETRO (R.P.M.)	✓		✓		✓		✓		✓						
VELOCIMETRO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE	✓		✓		✓		✓		✓						
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE SERVICIO	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LAS LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO	✓		✓		✓		✓		✓						
EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA	✓		✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO (Batería, llantas, aceite otros) lugar
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
KIT DE HERRAIENTAS BASICAS	✓		✓		✓		✓		✓						
KILOMETRAJE INICIAL	94766		94887		94926		94967		95004						
KILOMETRAJE FINAL	94887		94926		94967		95004		95129						

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 24 al: 27 del mes de: Junio del año: 2025
CONDUCTOR: Danna V. Pinzón C.C. 1000251330 N° LICENCIA: 1000251330 FECHA VENCIMIENTO 16-11-2033
TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA PLACA: JXK361
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
SEGURO OBLIGATORIO : SOAT 21-07-2025 TECNOMECANICA : N/A POLIZAS:

LEYENDA: **B: BUENO M: MALO**

RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO			✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LA COJINERIA			✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO			✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO			✓		✓		✓		✓						
VIDRIOS LATERALES			✓		✓		✓		✓						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO			✓		✓		✓		✓						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO			✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS RETROVISOR			✓		✓		✓		✓						
LUCES PRINCIPALES			✓		✓		✓		✓						
LUCES DE PARQUEO			✓		✓		✓		✓						
DIRECCIONALES			✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
LUCES DE FRENO / REVERSA			✓		✓		✓		✓						
ALARMA DE RETROCESO			✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO			✓		✓		✓		✓						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE			✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE			✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES ALTAS			✓		✓		✓		✓						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR			✓		✓		✓		✓						
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR			✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO			✓		✓		✓		✓						MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA
TACOMETRO (R.P.M.)			✓		✓		✓		✓						
VELOCIMETRO			✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE			✓		✓		✓		✓						
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS			✓		✓		✓		✓						
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE			✓		✓		✓		✓						
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS			✓		✓		✓		✓						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA			✓		✓		✓		✓						
FRENO DE SERVICIO			✓		✓		✓		✓						
FRENO DE PARQUEO			✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LAS LLANTAS			✓		✓		✓		✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD			✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO			✓		✓		✓		✓						
EXTINTOR DE INCENDIOS			✓		✓		✓		✓						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA			✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO (Llantas, Bateria, Aceite motor) lugar
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO			✓		✓		✓		✓						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS			✓		✓		✓		✓						
KIT DE HERRAIENTAS BASICAS			✓		✓		✓		✓						
KILOMETRAJE INICIAL			95137		95256		95296		95410						
KILOMETRAJE FINAL			95256		95296		95410		95532						

4D.
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES INTERVENTORIA

ECOVÍAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Cronograma de Capacitaciones SST.
Registro SG-SST 009 / Versión 01

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE PREVENCION SST 2025

ACTIVIDADES	Dirigido a	Ejecutada / Reprogramada	2025 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Plan de emergencias y simulacros	Administrativa- proyectos													
Primeros auxilios	Administrativa- proyectos													
respeto entre compañeros de trabajo	Administrativa- proyectos													
cumplimiento politicas de la empresa.	Administrativa- proyectos													
Manejo de extintores.	Administrativa- proyectos													
Reportes de accidente laborales.	Administrativa- proyectos	se debe indicar durante la induccion y reinduccion al personal												
Sismos y terremotos	Administrativa- proyectos													
manejo defensivo en Normas de transito	Administrativa- proyectos													
Estilo de vida saludable	Administrativa- proyectos													
Actos y Condiciones subestandar	Administrativa- proyectos	se deben registrar durante la induccion y reinduccion												
Divulgacion reglamento de higiene	Administrativa- proyectos													
programas de prevencion vehicular(no uso de dispositos moviles, respeto exceso de velocidad, prevencion de no consumo de alcohol, no distraccion en las vias)	Administrativa- proyectos													
Factores de riesgos y peligros en obras	proyectos - oficinas													
respeto normas de transito	Administrativa- proyectos													
Riesgo biomecanico y sus consecuencias	Administrativa- proyectos													
Uso adecuado de epp	Administrativa- proyectos	se deben registrar durante la induccion y reinduccion												
Trabajo seguro en excavaciones, confinados y alturas	proyectos	se deben registrar durante la induccion y reinduccion												
Exposicion a picaduras y mordeduras de insectos y animales.	Administrativa- proyectos													
Jornadas de Salud (semana de la salud)	Administrativa- proyectos													
programas de promocion y prevencion (visual,cardiovascular,auditivo)	Administrativa- proyectos													
Riesgo publico (factor externo)	Administrativa- proyectos	se deben registrar durante la induccion y reinduccion												
Riesgo biologico	Administrativa- proyectos													
Manejo del estrés laboral	Administrativa- proyectos													
importancia de las pausas activas	Administrativa- proyectos													
Actuacion en caso de tormentas electricas,huracanes entre otros fenomenos naturales	Administrativa- proyectos													
Importancia de conocer al copasst y comité de convivencia de la empresa.	Administrativa- proyectos	se deben registrar durante la induccion y reinduccion												
Seguridad de trabajos en oficina	Administrativa- proyectos													
Importancia del cuidado del sistema cardio vascular	Administrativa- proyectos													
prevencion factores de riesgos en oficinas	Administrativa- proyectos													
Higiene postural	Administrativa- proyectos													
Mes / **Número de capacitaciones programadas** / **Número de capacitaciones ejecutadas**	**Porcentaje de cumplimiento (%)**		-			100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0

5D.
COMUNICADOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2025

COMUNICADOS JUNIO 2025 UMV

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-694

Bogotá D.C. 10 de junio de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.
correspondencia@umv.gov.co

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Llamado de atención del componente ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo SST

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud e el trabajo (SST) de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, SGSST y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría realiza las siguientes observaciones que requieren de la atención inmediata por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial UMV y reitera lo mencionado en oficio 186-1-650 de 05 de mayo de 2025:

1. Se solicita a la Entidad ejecutora hacer seguimiento y llamado de atención al contratista de maquinaria con el fin de que cumpla con las medidas de manejo ambiental durante el transporte y suministro de combustible a los equipos en obra, lo anterior basados en los derrames de combustible que se han evidenciado durante el periodo y los cuales se citan a continuación: * *

    - Frente de obra Unión Tunales abscisa K0+020, derrame evidenciado el 07 de abril de 2025, adicional a este se evidenciaron dos derrames más, uno en el área donde inicia la placa huella y el otro en el K0+10 causado por la ruptura de una manguera del minicargador.

    - Frente San Antonio Abscisa K3+500, derrame evidenciado el día 22 de abril de 2025 en el área del campamento. El día 29 de abril de 2025 en la via principal Troncal Bolivariana a la altura de la vivienda de la señora Balbina Peñaloza se evidencio un derrame considerable

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

de combustible, el cual no fue atendido de manera inmediata por el contratista generando riesgo vial en el área principalmente a los actores de la via.

Frente San Antonio Abscisa K3+100 y Capitolio K2+290 derrames evidenciados el día 26 de mayo de 2025. El día 28 de mayo de 2025 en la via principal Troncal Bolivariana a la altura de la vivienda de la señora Balbina Peñaloza se evidencio nuevamente un derrame de combustible y adicionalmente se ejecutan mantenimientos en esta área la cual no cuenta con los elementos requeridos para el desarrollo de este tipo de actividades. Se recuerda que no es viable realizar mantenimientos, arreglos mecánicos o emplear como zona de parqueo áreas públicas como andenes, parques, zonas verdes o vías. Lo anterior ocasiona un incumplimiento de las medidas de manejo ambiental además de que se configura en un riesgo vial para los actores de la via. Como soporte de lo descrito se presenta el registro fotográfico respectivo (foto 1 a foto 10).

Se reitera que el contratista para el transporte y abastecimiento seguro de combustible debe cumplir con la siguiente normativa:

- Todos los recipientes o envases deberán tener sus etiquetas que identifiquen claramente el producto que contiene, cumpliendo las recomendaciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 "Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado". Decreto 1496 de 2018 tiene por objeto adoptar el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

- Para el almacenamiento, uso y manejo de los residuos, de estas sustancias se deberán seguir las instrucciones de sus respectivas hojas de seguridad, y aplicar las normas que regulan esta actividad, dentro de las cuales se citan:

  - La ley 55 de julio 2 de 1993, por medio de la cual se aprobó el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.
  - El Decreto 1609 de julio 31 de 2002, por medio del cual se reglamentó el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Compilado por el decreto 1079 de 2015.
  - Decreto 1076 de 2015 y decreto 1630 de 2021.
  - El Decreto 4741 de diciembre 30 de 2005, por medio del cual se reglamentó parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
  - Ley 9 de 1979 código sanitario

- Para el conductor de vehículo se requiere que tenga competencia de manejo de sustancias peligrosas.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-694

- El vehículo debe contar con kit control de derrames, extintor de 20 libras, hojas de seguridad de los productos químicos transportados, y los demás documentos aplicables para el trasporte seguro y legal.
- Se ha solicitado en comités de obra No 42,43 y 44 que se informe una fecha para realizar el acompañamiento por parte de interventoría al procedimiento empleado para ejecutar los tanqueos de maquinaria en sitio y a la fecha no ha sido posible realizar esta verificación en sitio puesto que no se ha logrado una coordinación por parte de la UMV con el contratista de maquinaria.

2. Se reitera a la entidad ejecutora que en cuanto a los formatos de preoperacionales suministrados por el contratista de maquinaria amarilla y vehículos se requiere que el formato sea acorde a la maquina o vehículo inspeccionado por lo cual se sugiere individualizar los registros de tal manera que sean aplicables a la inspección detallada que se debe ejecutar a cada equipo. Lo anterior ha sido solicitado en comités integrales No 41, 42, 43 y 44 y mediante oficio 186-1-650 de 05 de mayo de 2025 del cual a la fecha no se ha tenido respuesta alguna. (foto 11 a foto 14).

3. Es necesario que la Entidad Ejecutora UMV realice una verificación previa por parte de un profesional idóneo y competente a los equipos, maquinaria y vehículos suministrados por el contratista de maquinaria los cuales son llevados a cada uno de los tramos en ejecución, puesto que los equipos están llegando en inadecuadas condiciones de funcionamiento, algunos funcionan durante la jornada laboral y quedan varados por fallas mecánicas, otros llegan y no funcionan y algunos no llegan en condiciones optimas de operatividad lo que genera condiciones inseguras en obra. Lo anterior genera retrocesos en el desarrollo de las actividades constructivas e inconvenientes en obra ya que no es permitido la realización de mantenimientos o ajustes mecánicos en obra o espacios públicos (vías, andenes, parques, zonas verdes), por lo cual se solicita al contratista contar con un área correctamente adecuada para desarrollar arreglos puntuales con la maquinaria, parqueo y almacenamiento temporal de los mismos mientras se evacuan hacia el sitio respectivo, adicionalmente se debe realizar una correcta gestión (manejo, almacenamiento y disposición final) de los residuos sólidos y líquidos (RESPEL), generados durante este proceso cuyos soportes deben ser entregados en los informes mensuales respectivos.

Se hace un llamado a la entidad ejecutora UMV y director de obra para que sean garantes del cumplimiento de las condiciones de manejo ambiental y SST según la normatividad colombiana en términos de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-694

	
Foto 1: derrame de combustible Unión Tunales 07/04/2025	Foto 2: derrame de combustible 08/04/2025
	
Foto 3: derrame de combustible San Antonio 22/04/2025	Foto 4: derrame de combustible en via principal San Juan 29/04/2025.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-694

	
Foto 5: derrame de combustible Capitolio 26/05/2025	Foto 6: derrame de combustible San Antonio 26/05/2025
	
Foto 7: derrame de combustible San Antonio 26/05/2025	Foto 8: derrame de combustible San Antonio 30/05/2025
	
Foto 9: derrame de combustible via principal Troncal Bolivariana 28/05/2025	Foto 10: Mantenimientos de equipos en via principal Troncal Bolivariana 28/05/2025

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-694



Foto 11: Preoperacional estándar registro tramo Unión Tunales



Foto 12: Preoperacional estándar registro tramo Capitolio

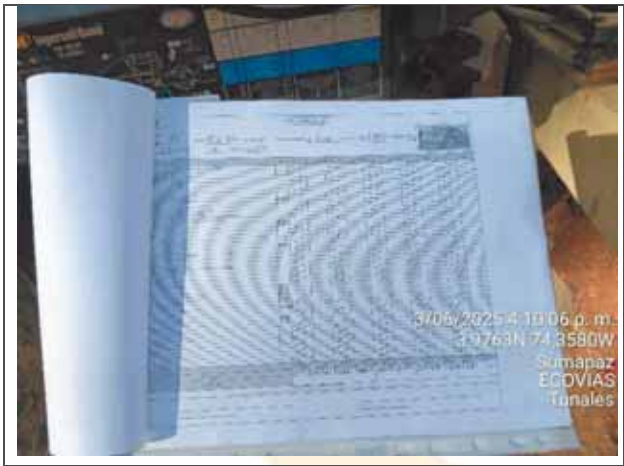


Foto 13: Preoperacional estándar registro tramo Unión Tunales



Foto 14: Preoperacional estándar registro tramo San Antonio

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-694

De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita a la entidad ejecutora tomar las medidas correctivas necesarias para subsanar los hallazgos descritos y remitir evidencias de la subsanación de manera inmediata.

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co , jose.donoso@gobiernobogota.gov.co
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto. correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: YHR/JARB
Elaboro: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-697

Bogotá D.C. 12 de junio de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: JULIO CESAR PINZÓN REYES
Gerente de proyecto.
Bogotá D.C.

Referencia: PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

Asunto: Respuesta a correo enviado por la UAERMV, el 06-05-2025, *"Informe SST, No. 11."*., correspondiente a abril de 2025.

Respetados señores,

Cordial saludo,

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar las actividades y cumplimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. En respuesta al correo enviado y relacionado en el asunto, donde la **UAERMV**, remite el Informe Mensual SST No 11, se tienen los siguientes comentarios:

1. En la tabla de contenido los anexos no deben estar paginados.

2. Revisar ortografía en la página 20.

3. Los indicadores colocar formula, para saber como se saca la información suministrada, página 20 y 21.

4. Pagina 48, listado de personal no coincide el número de trabajadores con la información descrita ya que dicen en la página 49 que hay 34 y el conteo arroja 37.

5. **FORMATO INSPECCIÓN GENERAL DE SST EN FRENTES DE OBRA – UAERMV** página 55, 57, 59, 61, 63, 65, deben ir con las firmas respectivas.

6. Página 75, inspección con fecha diferente al periodo reportado.

7. Página 123, ¿hay alguna camioneta 4x5?

8. Se solicita documentación completa de los dos carrotanques y volqueta del contrato 936 (Licencia de tránsito, SOAT, Revisión tecno mecánica, y mantenimientos respectivos).

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-697

9. Se solicita los preoperacionales realizados durante el periodo de la maquinaria y volquetas que están al servicio del proyecto.

10. Se solicita los mantenimientos respectivos de la maquinaria amarilla en obra.

11. Se solicita documentación completa de las camionetas contratadas y de misionalidad (Licencia de tránsito, SOAT, Revisión tecno mecánica (si aplica), y mantenimientos respectivos).

12. Se solicita el soporte de inspecciones preoperacionales de las 5 camionetas que están en servicio, ya que solo se evidencian dos preoperacionales.

13. Se solicita reporte de mantenimientos realizados a volquetas de regalías.

14. Planilla de seguridad social del conductor Norvey Palacios Hurtado, no cumple con la clasificación de riesgo laboral, ya que este debe ser como mínimo, riesgo clase 4 y se evidencia que está pagando como riesgo 1.

15. Planilla de seguridad social de operadores de maquinaria, no cumple con la clasificación de riesgo laboral, ya que este debe ser como mínimo, riesgo clase 4 y se evidencia que están pagando como riesgo 1.

16. Planilla de pago de seguridad social de William Baracaldo con C.C. No. 18.235.992, solo se evidencia pago de EPS, Pensión y Caja de Compensación, no se observa el aporte a pago de Riesgos Laborales.

17. Planilla reportada de operadores de maquinaria, en la página 215 no cumplen con el porcentaje de pago de cotización a riesgos laborales, se evidencia el pago por riesgo 3 y este debe ser riesgo 4.

18. Planilla de pago de seguridad social de Alexander Bustos Chavarro, con C.C. No. 1.022.938.049 solo se evidencia pago de EPS y Pensión, no se observa el aporte a pago de Riesgos Laborales.

19. Planilla de seguridad social de operadores de maquinaria, razón social COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO APORTE Y CREDITO IMPACTO COLOMBIA no cumple con la clasificación de riesgo laboral, ya que este debe ser como mínimo, riesgo clase 4 y se evidencia que están pagando como riesgo 1 y 3.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-697

20. En el anexo de planillas de seguridad social de la UMV, página 245, relacionan una planilla de la empresa SUMIMAQ S.A.S. ¿los trabajadores relacionados están contratados directamente con la UMV o a qué contrato están ligados?

21. No hay evidencia de planilla de seguridad social de Jennifer Carolina Vela.

22. No se evidencia planilla de pago de ARL de la profesional Karina Isabelia Prieto.

23. No se evidencia planilla de pago de ARL del profesional Omar Ferney Patiño.

24. No se evidencia planilla de pago de ARL de la profesional Rubys del Carmen Ruiz.

25. No se evidencia planilla de pago de ARL de la profesional Leidy Yohana Ortiz.

26. No se evidencia planilla de pago de ARL de la profesional Yina Ruth Fonseca.

27. No se evidencia planilla de pago de ARL del Ingeniero Rafael Darío Peña

Con lo relacionado anteriormente se solicita a la **UAERMV,** subsane y allegue a la interventoría lo requerido, en un máximo de 3 días calendario al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

ANEXO: N/A

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: JARB
Revisado: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-702

Bogotá D.C. 12 de junio de 2025.

Señor
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO García
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: *"CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 478 DE 2022 CONTRATO LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna Verde.)*

Asunto: Respuesta a comunicado: D-24-2025-37 *"Informes SST # 14 abril 2025 y # 15 mayo 2025 V1.*

Respetado señor,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra Consorcio Gaviones 95.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión SST, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

De acuerdo a lo anterior una vez revisada la información remitida concerniente a los informes semanales se tienen los siguientes comentarios por parte de interventoría que requieren de la atención por parte del Consorcio Gaviones 95:

1. Informe mensual SST No. 14 correspondiente a abril 2025

    1.1. Página 5, titulo 3, se refieren a "**GENERALIDADES DEL CONTRATO 335-2022"** lo cual no es correcto el número de contrato, se solicita corregir este título".

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-702

1.2. Según se evidencia, los trabajadores:

- Paul Alberto Rangel Páez, ingresó a la empresa, según soporte de ARL, el 01 de agosto de 2024.
- Maximinio Becerra Yacumal, ingresó a la empresa, según soporte de ARL, el 28 de octubre de 2024.
- Wilson Orlando Rodríguez, ingresó a la empresa, según soporte de ARL, el 01 de agosto de 2024.
- Aristires Pardo Niño, ingresó a la empresa, según soporte de ARL, el 25 de enero de 2023.

Por lo tanto, se solicita la planilla de pago de seguridad social del periodo reportado de los trabajadores en mención.

1.3. Se evidencia un vehículo tipo camioneta en uso para traslado de personal, se solicita documentación respectiva (preoperacionales, tarjeta de propiedad, SOAT, revisión tecno mecánica si aplica y mantenimientos realizados en el periodo reportado)

2. Informe No. 15, correspondiente a mayo de 2025

2.1. Página 5, titulo 3, se refieren a "**GENERALIDADES DEL CONTRATO 335-2022"** lo cual no es correcto el número de contrato, se solicita corregir este título".

2.2. Según se evidencia, el trabajador:

John Jairo Guerrero Cabrera, ingresó a la empresa, según soporte de ARL, el 11 de febrero de 2025, por lo tanto, se solicita la planilla de pago de seguridad social acorde al periodo reportado del presente informe.

2.3. Se solicita el nombramiento del vigía SST, ya que se evidencia que se cumple con el número de personal para la asignación y también se observa que no hay retiro ni rotación de personal en los periodos de abril y mayo de 2025.

2.4. Se solicita la conformación del Comité de Convivencia Laboral, teniendo en cuenta que se cumple con el número de trabajadores según Resolución 1356 de 2012.

2.5. Se evidencia un vehículo tipo camioneta en uso para traslado de personal, se solicita documentación respectiva (preoperacionales, tarjeta de propiedad, SOAT, revisión tecno mecánica si aplica y mantenimientos realizados en el periodo reportado)


ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-702

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al consorcio Gaviones 95, allegue a la interventoría los requerimientos, según observaciones de los informes, en un máximo de 3 días calendario al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,



ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: JAR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-706

Bogotá D.C. 16 de junio de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. -JULIO CESAR PINZÓN-GERENTE DEL PROYECTO
Gerente del proyecto
Bogotá D.C.

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Llamado de atención por transporte indebido de personal en obra

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SST, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y SGSST aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría emite un **llamado de atención formal** respecto a una conducta insegura observada durante la ejecución de las actividades constructivas, el día 09 de junio de 2025 se evidenció personal vinculado a la entidad ejecutora UMV siendo transportado en el platón de una camioneta de placa OKZ958 (contrato misionalidad), práctica que pone en riesgo la vida e integridad de los trabajadores y contraviene las normas de tránsito y las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes.

Cabe recordar que dicha conducta infringe lo establecido en el **Código Nacional de Tránsito – Ley 769 de 2002**, artículo 82, que señala:

"En ningún caso podrán viajar personas en la parte exterior de los vehículos, salvo los casos expresamente autorizados por las autoridades competentes."


Además, el artículo 3° de la **Ley 1562 de 2012**, que modifica el Sistema General de Riesgos Laborales, impone la obligación de garantizar condiciones seguras en el desarrollo de actividades laborales, incluyendo el transporte del personal. Este tipo de prácticas también podría derivar en responsabilidades civiles, administrativas o incluso penales, en caso de un accidente.

Le recordamos que como contratista es su responsabilidad garantizar que todo el personal a su cargo actúe conforme a las leyes y reglamentos vigentes.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-706

Por tanto, solicitamos que de manera inmediata tome las acciones correctivas necesarias para evitar la repetición de esta conducta, y que se garantice el transporte seguro del personal de acuerdo con las normas vigentes. En caso de reincidencia, esta situación podrá ser considerada como un incumplimiento contractual, con las consecuencias legales correspondientes. A continuación, se presenta un registro fotográfico de la situación evidenciada.

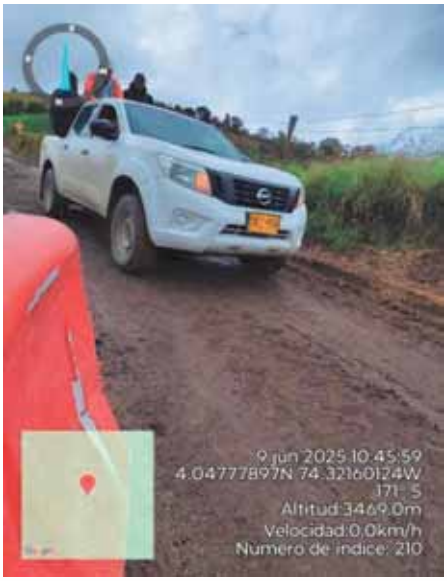	
Foto 1: Transporte inseguro en platón de camioneta	Foto 2: Transporte inseguro en platón de camioneta

De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita a la Entidad Ejecutora UMV tomar las medidas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de la corrección en un término no mayor a tres días calendarios posterior al recibo del comunicado

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: JAR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-727

Bogotá D.C. 11 de junio de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: JULIO CESAR PINZÓN REYES
Gerente de proyecto.
Bogotá D.C.

Referencia: PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

Asunto: Llamado de atención por funcionamiento defectuoso en maquinaria.

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es “Verificar que el Contratista realice la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SST, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y SGSST aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría emite un **llamado de atención formal** respecto al mal estado y fallas mecánicas, que están presentando algunas de las maquinas contratadas, las cuales ponen en riesgo a operadores, trabajadores y comunidad en general, a continuación, se detalla las fallas que se han venido evidenciando en algunas de las máquinas en obra:

1. El día 02 de junio de 2025, la volqueta placas EQP440, del contrato de maquinaria de la **UAERMV**, tuvo un choque contra otro vehículo en el caserío de La Unión – Sumapaz, el día 06 de junio de 2025, la interventoría se manifestó con las profesionales SST y Ambiental de la **UAERMV**, sobre el mal estado de la misma, la cual presenta daño en bómper delantero falla en luminarias delanteras, direccionales y estacionarias, además de la puerta que no ajusta bien, según conductor de la volqueta y lo que se evidencia en la inspección realizada.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1


186-1-727

A la fecha, esta falla reportada sigue sin ser subsanada, generando una condición insegura además de contravenir con la normativa colombiana ley 762 del 2002.





2. Vibro compactador HAMM, este equipo llegó a obra sin que le funcionara la alarma de reversa, además de no contar con la totalidad de luminarias funcionales, la interventoría solicitó la corrección de este hallazgo el día 16 de junio de 2025, en las observaciones que se realizan a diario en el grupo de Whats App del componente SST y ambiental, y reiterado en comité, a la fecha sigue sin ser atendida esta solicitud.

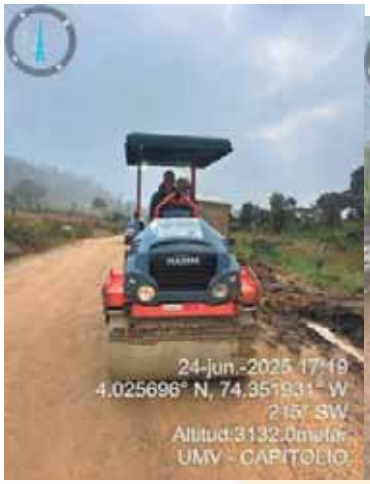



3. Vibro compactador marca DYNAPAC, desde su ingreso a obra y a la fecha, no le funciona la alarma de reversa y tampoco le funciona las luminarias.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-727





4. Minicargador marca Bobcat, ubicado en tramo 5 de Tunales, desde el día 14 de junio de 2025 a la presente fecha, ha estado sin funcionar a causa de un daño mecánico, el día 18 de junio de 2025, se realiza inspección del mismo, realizando observación por desgaste de llantas delanteras, se solicita aportar ficha técnica de llantas, ya que se evidencia que la guía de desgaste en la parte media de la llanta no se ve, a lo que argumenta el ingeniero de trazabilidad de la **UAERMV**, que estas llantas aún tienen vida útil.





5. Minicargador Bobcat ubicado en Tramo San Antonio, se evidenció el 26 de junio de 2025 el mal funcionamiento de la alarma de reversa, a la fecha sigue sin ser corregida esta falla.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-727



6. Vibro compactador doble rodillo presenta falla en fuerza y sin horómetro, según operador del equipo, es un riesgo trabajarlo en una pendiente ya que no se sostiene.



7. Vibro compactador marca BOMAG, por falla en frenos sufre incidente en tramo San Antonio el día 24 de junio de 2025.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-727





8. Se solicita que todas las máquinas que lleguen a obra, les sea instalados los sticker de identificación del contrato, ya que hay algunas que no cuentan con este sticker.

Con lo relacionado anteriormente se solicita a la **UAERMV,** informe a la interventoría qué medidas correctivas se va a realizar, para evitar que siga llegando maquinaria con mal funcionamiento y qué se va a hacer con las reportadas anteriormente, ya que son un riesgo latente dentro de la obra, adicional a esto se responsabiliza a la **UAERMV,** de cualquier incidente o accidente que pueda suceder por permitir la presencia de estos equipos con las fallas mencionadas.

Con lo anterior se solicita a la **UAERMV**, allegue a la interventoría en un máximo de 3 días calendario al recibo de la presente comunicación el informe con el manejo de lo evidenciado en obra.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

ANEXO: N/A
C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Elaboro: JARB
Revisado: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-728

Bogotá D.C. 1 de julio de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: JULIO CESAR PINZÓN REYES
Gerente de proyecto.
Bogotá D.C.

Referencia: PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

Asunto: Respuesta a correo del 09-06-25, enviado por la UAERMV, Informe mensual SST, No. 12, periodo mayo de 2025.

Respetados señores,

Cordial saludo,

Una de las obligaciones de la Interventoría es “Verificar las actividades y cumplimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. En respuesta al correo enviado y relacionado en el asunto, donde la **UAERMV**, remite el Informe Mensual SST No 12, se tienen los siguientes comentarios:

1. En la tabla de contenido los anexos no deben estar paginados, ya que el vínculo no lleva al lector al documento directamente.

2. Página 9, mencionan abril, cuando el informe es de mayo, corregir lo observado.

3. Los indicadores colocar formula, para saber de dónde se saca la información suministrada, página 20 y 21.

4. Página 45, listado de personal no coincide el último reporte enviado.

5. **FORMATO INSPECCIÓN GENERAL DE SST EN FRENTES DE OBRA – UAERMV** página 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 y 72, deben ir con las firmas respectivas.

6. Se solicita suministrar los mantenimientos preventivos y correctivos hechos en el periodo a maquinaria y vehículos, (maquinaria amarilla, volquetas, camionetas y carrotanques).

7. Se solicita la firma de los responsables de supervisión de la UAERM y contratista en los soportes de preoperacionales.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-728

8. Se solicita los preoperacionales realizados durante el periodo de las volquetas, camionetas, maquinaria amarilla y carrotanques, que están al servicio del proyecto.

9. Planilla de seguridad social del conductor Norvey Palacios Hurtado, no cumple con la clasificación de riesgo laboral, ya que este debe ser como mínimo, riesgo clase 4 y se evidencia que está pagando como riesgo 1.

10. Página 218, Planilla de seguridad social de operadores de maquinaria, no cumple con la clasificación de riesgo laboral, ya que este debe ser como mínimo, riesgo clase 4 y se evidencia que están pagando riesgo 1.

11. Planilla reportada de operadores de maquinaria, en la página 225, 226,227 no cumplen con el porcentaje de pago de cotización a riesgos laborales, se evidencia el pago por riesgo 3 y este debe ser como mínimo, riesgo 4.

Con lo relacionado anteriormente se solicita a la **UAERMV,** subsane y allegue ala interventoría lo requerido, en un máximo de 3 días calendario al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

ANEXO: N/A

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: JARB
Revisado: EHR

COMUNICADOS JUNIO 2025 CEV

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-707

Bogotá D.C. 16 de junio de 2025

Señores.
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.
Atn: Dr. HERNAN LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO No. 479 de 2022, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020"). (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas."). GRUPO 2

Asunto: Llamado de atención por transporte indebido de personal en obra CEV

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SST, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y SGSST aportado por parte del Consorcio.

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría emite un **llamado de atención formal** respecto a una conducta insegura observada durante la ejecución de las actividades constructivas, El día 12 de junio del 2025 se evidenció personal siendo transportado en el minicargador encima de materiales de obra y este mismo día se evidenció que personal vinculado al Consorcio Estabilización Vial, era transportado en el platón de la camioneta placa FSW675, práctica que pone en riesgo la vida e integridad de los trabajadores y contraviene las normas de tránsito y las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes.

Cabe recordar que dicha conducta infringe lo establecido en el **Código Nacional de Tránsito – Ley 769 de 2002**, artículo 82, que señala:

"En ningún caso podrán viajar personas en la parte exterior de los vehículos, salvo los casos expresamente autorizados por las autoridades competentes."

Además, el artículo 3° de la **Ley 1562 de 2012**, que modifica el Sistema General de Riesgos Laborales, impone la obligación de garantizar condiciones seguras en el desarrollo de actividades laborales, incluyendo el transporte del personal. Este tipo de prácticas también podría derivar en responsabilidades civiles, administrativas o incluso penales, en caso de un accidente.


ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-707

Le recordamos que como contratista es su responsabilidad garantizar que todo el personal a su cargo actúe conforme a las leyes y reglamentos vigentes.

Por tanto, solicitamos que de manera inmediata tome las acciones correctivas necesarias para evitar la repetición de esta conducta, y que se garantice el transporte seguro del personal de acuerdo con las normas vigentes. En caso de reincidencia, esta situación podrá ser considerada como un incumplimiento contractual, con las consecuencias legales correspondientes. A continuación, se presenta un registro fotográfico de la situación evidenciada.

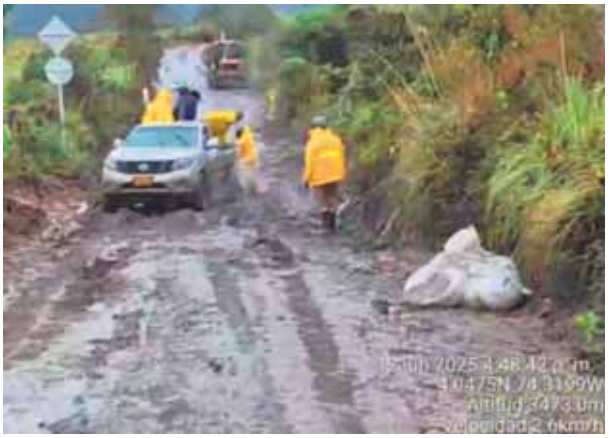	
Foto 1: Transporte inseguro en Minicargador	Foto 2: Transporte inseguro en platón de camioneta

De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita al Consorcio Estabilización Vial, tomar las medidas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de la corrección en un término no mayor a tres (03) días calendario posterior al recibo del comunicado

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: JAR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-720

Bogotá D.C. 25 de junio de 2025

Señores.
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.
Atn: Dr. HERNAN LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO No. 479 de 2022, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020"). (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.), GRUPO 2:

Asunto: Llamado de atención por omisión a sistemas de seguridad en Taludes - Frente de obra San Antonio.

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SST, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y SGSST aportado por parte del Consorcio Estabilización Vial.

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría emite un **llamado de atención formal** respecto a una conducta insegura observada durante la ejecución de las actividades constructivas en Tramo San Antonio, según lo evidenciado en las abscisas K1+550, K2+150, K2+231 y K2+839, donde están realizando labores de alistamiento de construcción de alcantarillas y con lo cual **están omitiendo asegurar el área mediante entibado**, es evidente que el terreno es inestable y la banca se está derrumbando, lo que genera situaciones de inseguridad al personal que desarrolla actividades de obra al interior de la excavación, con lo cual se solicita brindar condiciones seguras de trabajo al personal.

Es de recalcar que esta solicitud ya se ha hecho en comités integrales y mediante comunicado No. 186-1-667, a lo cual el contratista ha hecho caso omiso a la solicitud realizada y contraviniendo lo estipulado en el anexo técnico páginas 88, 89, 90, 91, 97, *"Exigencia de sistemas de entibación y protección de las superficies excavadas.":*

Con lo anterior se solicita realizar los correctivos solicitados o en su defecto detener las actividades en estos puntos hasta que se garantice un entono seguro para los trabajadores

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-720

	
Foto 1: Talud evidentemente inestable	Foto 2: Riesgo al que está expuesto los trabajadores

De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita al Consorcio Estabilización tomar las medidas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de la subsanación en un término no mayor a tres días calendarios posterior al recibo del comunicado

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: JARB
Elaboro: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-723

Bogotá D.C. 25 de junio de 2025

Señores.
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.
Atn: Dr. HERNAN LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO No. 479 de 2022, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020"). (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas."). GRUPO 2:

Asunto: Rta. comunicados CEV22-390 - Informe mensual SST No. 18 y CEV-22-410 -Informe mensual SST No 19.

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra Consorcio Estabilización Vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión SST, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

De acuerdo con lo anterior una vez revisada la información remitida concerniente al informe No. 18 del mes de abril de 2025, se tienen los siguientes comentarios por parte de interventoría que requieren de la atención por parte del Consorcio Estabilización Vial:

Informe SST No. 18.

1. Tabla 4. Listado de personal, se solicita ajustar tabla copiando el encabezado cuando se cambie de página.

2. En la tabla de personal no esta relacionado el personal especialista en Geotecnia y estabilización de taludes, Hidráulico, Forestal y profesional de presupuesto y programación, lo cual es parte de los requisitos según anexo técnico, página 107.

3. Página 14, mencionan haber realizado 14 inducciones a personal nuevo y en la tabla 9, mencionan un total de 27 inducciones, se solicita unificar información.

4. Tabla 10, con título: Charla y socializaciones, se sugiere separar los temas de inducción SST y ambiental, ya que estas no son parte de charlas ni socializaciones, además describen 16 inducciones cuando en la tabla No. 9 notifican 27 inducciones.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-723

5. Se solicita colocar en el informe los indicadores de capacitaciones y entrenamientos
6. Plan de acción ante hallazgos del SG-SST.
7. Actividades referentes al plan de emergencias.
8. Si hubo personal especialista en el periodo reportado, falta anexar las planillas de pago de seguridad social.

Informe SST No. 19

1. Tabla 4. Listado de personal, se solicita ajustar tabla copiando el encabezado cuando se cambie de página.
2. En la tabla de personal no está relacionado el personal especialista en Geotecnia y estabilización de taludes, Hidráulico, Forestal y profesional de presupuesto y programación, lo cual es parte de los requisitos según anexo técnico, página 107.
3. Página 14, tabla 9, mencionan haber realizado 07 inducciones a personal nuevo y en la tabla 10, mencionan un total de 08 inducciones, se solicita unificar información.
4. Tabla 10, con título: Charla y socializaciones, se sugiere separar los temas de inducción SST y ambiental, ya que estas no son parte de charlas ni socializaciones, además describen 16 inducciones cuando en la tabla No. 9 notifican 27 inducciones.
5. Encabezado de tabla 11, aparece en una página diferente al contenido que se está dando.
6. En la nota de la página 13, mencionan que el personal nuevo va en color azul, lo cual solo se evidencia un solo trabajador nuevo, pero en la tabla 9, describen que hubo 7 ingresos, se solicita ajustar la información.
7. Pagina 15, corregir el párrafo donde mencionan abril, ya que el reporte es de mayo.
8. Tabla 10, relacionan 13 charlas y en el párrafo mencionan que se hicieron 8, igualmente con las capacitaciones, en el párrafo mencionan 6 y en la tabla hay solo 2, se solicita corregir esta información.
9. Se observa fotos sin información, estas deben estar numeradas y amarradas a la tabla de contenido.
10. Tabla No. 12, mencionan 33 trabajadores en total y en la base de datos el reporte es 38 trabajadores.
11. Se solicita colocar en el informe los indicadores de capacitaciones y entrenamientos
12. Describir en el informe qué planes de acción se han hecho ante hallazgos del SG-SST.
13. Actividades referentes al plan de emergencias.
14. Falta afiliación a CCF de Miller Andrés Ramírez.
15. Falta afiliación a EPS de Luis Fernando Acevedo Pulido

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-723

16. Si hubo personal especialista en el periodo reportado, falta anexar las planillas de pago de seguridad social.

17. En el informe, informan el ingreso de 7 trabajadores, pero solo hay soporte de 4, se solicita la documentación del personal restante.

18. Están adjuntando doble vez la misma planilla en las páginas 50 y 58 planilla

19. Adjuntan solo 5 exámenes ocupacionales de ingreso, aún cuan do en el informe mencionan el ingreso de 7 trabajadores, se solicita adjuntar completa la documentación de los trabajadores nuevos.

20. Presentan 6 soportes de inducción, teniendo en cuenta que fueron 7 los ingresos.

21. Anexo de la página 129, 131, 136, 150, 160, 161, 166, 170, 178, 182, 190, 192, 193, 203, 205, 206, 210, 213, 214, 216, 218, 221, 224, 226, 227, 253, 254, 256, 261, 262, no es clara la información, se solicita colocar en el informe anexos que sean legibles.

22. Falta documentación de volquetas, de una de la camionetas relacionadas y minicargadores y si hubo mantenimientos preventivos o correctivos de maquinaria o vehículos, se deben relacionar también.

De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita al Consorcio Estabilización Vial, tomar las medidas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de la corrección en un término no mayor a tres (03) días calendario posterior al recibo del comunicado

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto

Elaboro: JARB
Revisado: EHR

COMUNICADOS JUNIO 2025
CONSORCIO GAVIONES 95

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

Bogotá D.C. 26 de mayo de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: **"**CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)*

Asunto: Rta. Comunicado G95 con fecha 19-03-25, *"Entrega de informes mensuales 1 al 12 de lo componentes social, ambiental, SST y técnico. (…).*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría CIN-REGALIAS-161-22. Teniendo en cuenta el comunicado relacionado en el asunto donde el contratista de obra GACIONES 95, radica los informes relacionados en el asunto una vez revisados nuevamente se tienen las siguientes observaciones:

Compontes Social:

Una vez revisada la información concerniente a la documentación a los informes mensuales sociales, correspondientes del 1 al 9. Los cuales se racionan a continuación:

- Informe N°1. Del 2 al 31 de agosto de 2022.
- Informe N°2. Del 1 al 30 de septiembre de 2022
- Informe N°3. Del 1 al 31 de octubre de 2022
- Informe N°4. Del 1 al 30 de noviembre de 2022
- Informe N°5. Del 1 al 31 de diciembre de 2022
- Informe N°6. Del 1 al 31 de enero de 2023
- Informe N°7. Del 1 al 28 de febrero de 2023
- Informe N°8. Del 1 al 31 de marzo de 2023
- Informe N°9. Del 1 al 22 de abril de 2023.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente social, en los informes mensuales correspondiente del 1 al 9, se da aval a los mimos ya que cumplen con los requerimientos mínimos.

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

- Informe N°10. Del 5 al 29 de febrero del 2024.

1. Verificar y subsanar la versión del control de versiones, por cuanto que la tabla indica versión 6 y en el pie de página indican versión 5 en la primera página y en las páginas de los anexos indican versión 4.

2. Los anexos están poco legibles subsanar, diapositivas, fotos, volantes a color.

3. Los separadores de los informes no presentan numeración.

4. Página 59. Informes de gestión social, indicar en qué estado están los informes.

5. El anexo 4. El título del separador no corresponde, es correspondencia enviada y recibida.

6. En la tabla 26 se relacionan varios comunicados, en anexo no se evidencia completar. Así mismo separar, una tabla para correspondencia enviada y otra tabla para correspondencia recibida.

7. Cerrar la planilla de control de asistencia Página 85.

- Informe N°. 11. Del 1 al 31 de marzo del 2024.

1. Verificar y subsanar la versión del control de versiones, por cuanto que la tabla indica versión 4 y en el pie de página indican versión 3.

2. Página 47, describir por qué no se entregaron volantes durante el periodo del presente informe.

3. Página 49, justificar por qué no se realiza la instalación de las vallas móviles.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

4. Página 41. “Durante este periodo no fueron reuniones iniciales de obra” completar la frase.

5. Página 93, la certificación de mano de obra no calificada no es legible. Subsanar.

- Informe N°12. Del 1 al 31 de marzo del 2024.

    1. Verificar y subsanar la versión del control de versiones, por cuanto que la tabla indica versión 1 y en el pie de página indican versión 2 y en las páginas de los anexos indican versión 0.

    2. Los anexos están poco legibles subsanar volantes a color, modelo valla informativa.

    3. Página 82, la certificación de mano de obra no calificada no es legible. Subsanar.

Componente Ambiental:

Una vez revisados los informes mensuales del N°1 al N°12, del componente ambiental se tienen las siguientes observaciones para todos los informes.

1. Los informes deben estar firmados por el personal de interventoría que aparece en el documento.

2. No se observa el acta de conformación del grupo de gestión ambiental con firma de sus integrantes (*Proyecto 1: Conformación del grupo de la gestión ambiental- DAGA-1.1-01*).

3. Proyecto 3: Cumplimiento de requisitos legales - DAGA-1.3-03: La descripción que se detalla en el programa, no corresponde al alcance de este, en este apartado, se debe especificar si se tuvieron/gestionaron algún tipo de requerimiento o documento legal ambiental exigido por la autoridad ambiental, interventoría o entidad contratante, aquí se debe ser muy puntual.

4. **Proyecto 2: Explotación de fuentes de materiales- PAC-2.2-05**: El programa hace referencia a establecer si la empresa contratista realizó explotación directa de fuentes de materiales, es decir, de canteras de materiales pétreos; así las cosas, se debe ser muy puntual, y es describir que no se realizó explotación directa de fuente de materiales, ya que el proyecto no contempla la explotación de canteras, y que el material será adquirido mediante un tercero.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663
Para efectos de ser más precisos, si en el período, no se ejecutaron actividades en el proyecto, se debe colocar en cada programa que no se realizaron/ejecutaron actividades en de obra. esto se debe hacer para cada informe en caso de no haberse ejecutado actividades.

Si durante el período del informe se ejecutaron actividades, se deben colocar de manera muy puntual que tipo de actividades se ejecutaron y el registro fotográfico, se debe tener en cuenta el nombre del programa, y así mismo colocar únicamente la actividad que se ejecutó sin alargarse más en comentarios.

Componente SST:

- Informe mensual SST N°1-V3, agosto 2022.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.
2. En la página 30, mencionan 11 anexos y solo hay 8 anexos, falta: Anexo 9. Mantenimientos maquinaria, Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias.
3. ¿Por qué no hubo capacitaciones SST en este periodo?

4. En la siguiente tabla se describe documentos adjuntos, se solicita justificar la ausencia de los que se mencionan en el mismo.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Andrés Alberto Garcia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles SAS
2	Eduar Ivan Avendaño Bautista	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles SAS
3	Hernán Arévalo Diaz	SI	NO	SI		SI	SI	Promciviles SAS
4	Juan Camilo Luna	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promotora Puga LTDA
5	Maximino Becerra Yacumal	SI	SI	SI	NO ejercito		SI	Promciviles SAS
6	Albertino Vasques Baquero	SI	NO	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
7	Aldumar Vasques Baquero	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
8	Belmo Yesid Meneses Mora	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
9	Fernando Vásquez Baquero	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
10	Fredy Alonso Hurtado	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
11	Gilberto Campo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Construcciones Coral Serrano S.A.S.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
12	John Alexander Cifuentes	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
13	José Luis Benavides	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
14	Miguel Ángel González	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
15	Orlando López Hernández	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
16	Leidy Alexandra Almanza	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Promotora Puga LTDA
17	Brayan Ferney Amézquita	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
18	Junior Yesid Rodríguez	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
19	William Marroquín Valbuena	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
20	Dora Eunises Pérez	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Gaviones 95

- Informe mensual SST N° 2-V3, septiembre 2022.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 30, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias.

3. En la siguiente tabla se describe documentos pendientes por adjuntar.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
24	Rito Celio Moreno Ariza	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
25	David Rodelo Vanegas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental EP S.A.S.

4. Se solicita adjuntar las planillas de seguridad social originales o en su defecto aportar planillas que sean legibles ya que las aportadas no lo son.

- Informe mensual SST N°4-V3, noviembre 2022.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

3. Se solicita adjuntar las planillas de seguridad social originales o en su defecto aportar planillas que sean legibles ya que las aportadas no lo son.

- Informe mensual SST N° 5-V3, diciembre 2022

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. En la siguiente tabla se describe documentos pendientes por adjuntar

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Orlando López Hernández	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
2	Lady Alexandra Almanza C.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Promotora Puga
3	William Marroquin Valbuena	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental Ep Sas
4	Dora Eunises Pérez Bustos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
5	Janie Amanda Colmenares Calderón	NO	NO	NO	NO	NO	NO	C. Gaviones 95
6	Junior Rodríguez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental EP Sas
7	Angy Lorena Vásquez Castillo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
8	David Rodelo Vanegas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental EP Sas

- Informe mensual SST N° 6-V3 enero 2023.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 30, mencionan 11 anexos y solo hay 8 anexos, falta: Anexo 09. Mantenimiento de maquinaria, Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. ¿Por qué en el cronograma de capacitaciones colocan que ya se realizaron actividades de febrero, marzo y abril de 2023, si el informe que se está presentando es de enero 2023?

4. En la siguiente tabla se describe documentos pendientes por adjuntar.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Julián Yesid Fajardo Sánchez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Gaviones 95

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
2	Fredy Alfonso Hurtado P.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
3	Julián Yesid Fajardo Sánchez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
4	Miguel Ángel González	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Construcciones Coral Serrano S.A.S.
5	Wilson Rodríguez	NO	NO	Corregir # de cedula, ya que no coincide listado con la planilla de seguridad social				Corregir nombre del contratante, ya que no coincide listado con la planilla de seguridad social.
6	Luis Guillermo Quitian	NO	NO	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
7	Aristires Pardo Niño	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
8	Oscar Fernando Pinzón	NO	NO	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
9	Brayan Torres Vásquez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
10	Arlos Andrés Peñaloza	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades
11	Maicol A Peñaloza	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Temporades

- Informe mensual SST N°7-V3 febrero 2023

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. ¿Por qué en el cronograma de capacitaciones colocan que ya se realizaron actividades de marzo y abril de 2023, si el informe que se está presentando es de febrero?

4. En la siguiente tabla se describe documentos pendientes por adjuntar.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Jhon Beltran	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rental EP S.A.S.
2	Eduar Iván Avendaño Bautista	NO	NO	NO	NO	NO	NO	C. Gaviones 95
3	Yina Marcela Tulande Sánchez	NO	NO	NO	NO	NO	NO	C. Gaviones 95

- Informe mensual SST N°8-V3, marzo 2023.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. ¿Por qué en el cronograma de capacitaciones colocan que ya se realizaron actividades de abril de 2023, si el informe que se está presentando es de marzo?

4. Se solicita presentar las planillas de seguridad social de todo el personal, ya que solo están presentando las de los trabajadores de C. Gaviones 95.

- Informe mensual SST N° 9-V3, abril 2023.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. En la página 31, mencionan 11 anexos y solo hay 9 anexos, falta: Anexo 10. Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos Anexo 11, Plan de Emergencias

3. Se solicita presentar las planillas de seguridad social de todo el personal, ya que solo están presentando las de los trabajadores de C. Gaviones 95.

- Informe mensual SST N°10-V3, febrero 2024.

1. Se solicita el envío de registro fotográfico del componente SST, según manual de interventoría, con información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), esto como evidencia a las actividades realizadas

- Informe mensual SST N°11-V3, marzo 2024.

1. Fotos no tienen información completa requerida (fecha, hora, georreferencia, lugar), justificar la ausencia de esta información.

2. Se solicita colocar portada a cada anexo del informe, según documentos, de acuerdo a requerimiento previo por la interventoría.

3. Basados en el listado de personal presentado en la página 15, dicen que hay 18, pero según el conteo da 20, adicional en la página 262, 263 reportan 19 trabajadores para el mes de marzo de 2024. Se solicita se reporte a la interventoría la información correcta.

4. Se solicita colocar una columna con información de las fechas de ingreso de cada trabajador, en la tabla de reporte de personal.

5. Algunos de los **exámenes médicos ocupacionales,** no corresponden al periodo reportado.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

6. Se reitera solo adjuntar documentación del periodo reportado y no de otros periodos.

7. En la siguiente tabla se describe documentos de personal reportado como nuevo en la empresa, así mismo se solicita información del por qué hay trabajadores con exámenes ocupacionales con fecha anterior y posterior al periodo reportado y solicitud de los documentos faltantes.

ITEM	Nombre	EMO	Inducción	ARL	EPS	AFP	CCF	Empresa contratante
1	Ana Jennifer Torres T.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
2	Aristires Pardo Niño	SI 22-2-2024	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
3	José Jeferson Viuche V.	SI 26-2-2024	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
4	Maydoseny Javela Serrato	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
5	Orlando Hernández Martínez	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promotora Puga Ltda
6	Ferdy Neil Sánchez Polo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Rental EP S.A.S.
7	Hernán Arévalo Diaz	SI 28-5-2024	NO	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
8	Cindy Katherine Tovar	SI 24-9-2022	NO	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
9	Yecica Licep Arias	SI 16-6-2023	NO	NO	NO	NO	NO	Promotora Puga Ltda
10	Oscar Emilio Zornosa López	SI 08-2-2024	NO	SI	SI	SI	SI	Promciviles S.A.S.
11	Sebastián Elias Echavarría R	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Promotora Puga Ltda

8. En la página 275, adjuntan documento de conformación de comité de seguridad vial, el cual no pertenece al periodo reportado, aun cuando se ha reiterado no adjuntar documentación de otros periodos.

- <u>Informe mensual SST N°12-V1, abril 2024.</u>

1. Teniendo en cuenta que el contrato de obra **478 de 2022**, fue suspendido el **16 de abril de 2024**, se solicita se ajuste el periodo del informe y los documentos de este, ya que no cumplen con el periodo correspondiente.

- <u>Informe mensual SST N°13-V1, mayo 2024.</u>

1. En base al informe 13V1 de mayo de 2024, este no se tendrá en cuenta para revisión, debido a que en este periodo el contrato se encontraba suspendido.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

Con lo relacionado en las observaciones de todos los informes del componente SST,,se solicita justificar porque se contrató el personal con la empresa **Promotora Construcciones Coral Serrano S.A.S.** y **Temporades**, y no directamente con la empresa responsable de la ejecución de obra ya que no existe registro en la interventoría del vínculo contractual de la empresa en mención, ni la autorización por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial, quien es la entidad contratante.

Esto teniendo en cuenta que en el CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 478 DEL 10/02/2022, Pagina 19 clausula 20 indica: *"El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s)".*

Componente Técnico:

- Informe mensual N°1:

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

3. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 06.

4. No es claro donde el Consorcio Gaviones 95 realizó dichas apreciaciones, dado que al revisas las actas de comité a la fecha del informe no reposa dicha información página 15.

5. Página 15, Referente a la apreciación del contratista, "Es importante que, conforme al contrato de interventoría, la interventoría haga la revisión, aprobación y entrega de los diseños, de forma tal que estos puedan ser utilizados como insumos para la ejecución de las actividades de obra" …, se le solicita al consorcio Gaviones 95 indiqué, donde la interventoría no ha realizado dicha función, toda vez que la interventoría ha cumplido a cabalidad con el anexo técnico del contrato, Se aclara al contratista de obra que la interventoría es responsable únicamente de enviar los estudios y diseños resultantes de la entrega de la UEARMV.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

6. Página 17, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

> Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe.

7. Página 18, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra, se le exige al consorcio Gaviones 95 que consolide la información reposada en los diferentes componentes, esto no es una solicitud de la interventoría, esta documentación es solicitada en los anexos y documentos técnicos de la licitación.

8. Página 19 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de *"Gran Satisfacción"*, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

9. Página 23, no es clara la apreciación, indicar donde se realizó, anotaciones en bitácora y/o comunicaciones de la interventoría donde indique esto.

10. Página 24, capitulo 5.15, se le solicita al contratista de obra Gaviones 95 informe donde emitió los conceptos de error donde indica los retrasos de obra y demás.

11. Página 15 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

12. Página 25, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

13. Página 25 y 26, ámbito económico, como el titulo lo indica no se entiende por qué el contratista de obra nombra actividades de obra, se le reitera al contratista que los capítulos deben desarrollarse en su totalidad.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

14. Página 26 Acta de recibo parcial, es obligación del contratista de obra radicar cuentas parciales mensualmente, no es clara la apreciación de no se ha establecido con interventoría el método de cuantificación de cantidades ya que es el contratista el obligado a realizar esta cuantificación, la interventoría es la encargada de verificar la calidad y cantidad de los productos, más no, la encargada de cuantificar actividades para el contratista de obra.

15. Página 26 capitulo 7.2 memorias de cálculo, No es clara la apreciación del capítulo, en el capítulo 7.1 indican que no se han podido elaborar las cuantificaciones, en este calitulo"7.2" se indica que se cuantifico y se está en revisión, ¿se encuentra en proceso o no?

16. Página 29, ajustar

8.2. PÓLIZAS DEL CONTRATO

A continuación, se presente mediante la siguiente tabla, el control de pólizas obligatorias con sus respectivas actualizaciones (según firma de contrato, acta de inicio, prórrogas y/o modificaciones y llegado el caso de haber suspensiones, adiciones presupuestales) que debe tomar el contratista de obra para asegurarle a la entidad contratante su complimiento frente a sus obligaciones contractuales adquiridas con el contrato 478 de 2022.

- Informe mensual N°2:

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El índice de tablas no se encuentra anclado al contenido de las tablas que están incluidas dentro del documento.

3. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

4. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 06.

5. Página 14, se solicita al contratista plasme en el desarrollo del título 5.3 donde realizó las solicitudes reiterativas con respecto a la entrega del paquete de diseños y planos definitivos, así como también indique en que comités de seguimiento semanal se realizaron dichas apreciaciones, dado que al constatar con las actas de comité del mes de septiembre no se encuentran dichas solicitudes por parte del contratista.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

6. Página 16, Referente a la apreciación del contratista, “Es importante que, conforme al contrato de interventoría, la interventoría haga la revisión, aprobación y entrega de los diseños, de forma tal que estos puedan ser utilizados como insumos para la ejecución de las actividades de obra” …, se le solicita al consorcio Gaviones 95 indiqué, donde la interventoría no ha realizado dicha función, toda vez que la interventoría ha cumplido a cabalidad con el anexo técnico del contrato, Se aclara al contratista de obra que la interventoría es responsable únicamente de enviar los estudios y diseños resultantes de la entrega de la UEARMV.

7. Página 17, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

> Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe.

8. Página 18. No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra, se le exige al consorcio Gaviones 95 que consolide la información reposada en los diferentes componentes, esto no es una solicitud de la interventoría, esta documentación es solicitada en los anexos y documentos técnicos de la licitación.

9. Página 20 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de *“Gran Satisfacción”*, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

10. Página 26 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

11. Página 27, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

12. Página 33, se nombra dos veces el listado de anexos.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

- Informe mensual N°3.

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El índice de tablas no se encuentra anclado al contenido de las tablas que están incluidas dentro del documento.

3. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

4. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 06.

5. No es claro donde el Consorcio Gaviones 95 realizó dichas apreciaciones, dado que al revisas las actas de comité a la fecha del informe no reposa dicha información página 15.

6. Se aclara al contratista de obra que la interventoría es responsable únicamente de enviar los estudios y diseños resultantes de la entrega de la UEARMV, con respecto a lo conceptuado en la página 16.

7. Página 19, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

> Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe.

8. Página 18, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra, se le exige al consorcio Gaviones 95 que consolide la información reposada en los diferentes componentes, esto no es una solicitud de la interventoría, esta documentación es solicitada en los anexos y documentos técnicos de la licitación.

9. Página 21 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de *"Gran Satisfacción"*, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

10. Página 25, balance presupuestal el contratista informa que realiza la entrega del balance, pero también indica que presenta discrepancias en el mismo, se solicita unifique los conceptos y plasme los balances realizados en este capítulo, por medio de tablas y análisis de los mismos.

11. Página 29 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

12. Página 29, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

13. Página 36, se nombra dos veces el listado de anexos.

- Informe mensual N°4.

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El índice de tablas no se encuentra anclado al contenido de las tablas que están incluidas dentro del documento.

3. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

4. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 6.

5. No es claro donde el Consorcio Gaviones 95 realizó dichas apreciaciones, dado que al revisas las actas de comité a la fecha del informe no reposa dicha información página 14.

6. Se aclara al contratista de obra que la interventoría es responsable únicamente de enviar los estudios y diseños resultantes de la entrega de la UEARMV, con respecto a lo conceptuado en la página 16.

7. Página 19, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

8. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe.

9. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra, se le exige al consorcio Gaviones 95 que consolide la información reposada en los diferentes componentes, esto no es una solicitud de la interventoría, esta documentación es solicitada en los anexos y documentos técnicos de la licitación.

10. Página 21 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de “Gran Satisfacción”, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

11. Página 27, capitulo 5.12, se solicita al contratista de obra, informe donde informo a la interventoría y/o UAERMV, duchos errores en los insumos topográficos, dado que lo informo tardía en vista de la fecha de presentación del informe.

12. Página 28, balance presupuestal el contratista informa que realiza la entrega del balance, pero también indica que presenta discrepancias en el mismo, se solicita unifique los conceptos y plasme los balances realizados en este capítulo, por medio de tablas y análisis de los mismos.

13. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

14. Página 21 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de *"Gran Satisfacción"*, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

15. Página 28, balance presupuestal el contratista informa que realiza la entrega del balance, pero también indica que presenta discrepancias en el mismo, se solicita unifique los conceptos y plasme los balances realizados en este capítulo, por medio de tablas y análisis de los mismos.

16. Página 30, se solicita al contratista indique donde se realizaron dichas apreciaciones, ya bien sea nombrando el N° de comunicado remitido referente al tema de la propuesta de solución de a la estabilización de los taludes.

17. Página 33 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

18. Página 34, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

19. Página 34, ámbito económico, se solicita el contratista indique donde realizó la remisión de dicha acta parcial a los correos oficiales de la interventoría, en su caso a los correos de la UAERMV en dado de darse el caso.

20. Página 35, acta de recibo parcial, se solicita al contratista plasme en el cuerpo de este título las cantidades remitidas en el acta parcial de obra.

21. Página 36, se nombra dos veces el listado de anexos.

- Informe mensual N°5.

1. La tabla de contenido no se encuentra anclada al contenido del documento, actualizar.

2. El índice de tablas no se encuentra anclado al contenido de las tablas que están incluidas dentro del documento.

3. El control interno de firmas no cuenta con la firma de revisión y aprobación por parte del director de Obra.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

4. No es clara la fecha ni la versión del informe, ajustar de acuerdo a las entregas realizadas, página 06.

5. Página 14, titulo 5.3, se solicita al contratista remita donde realizó dicho requerimiento.

6. Página 15, se solicita al contratista remita donde se realizaron dichas apreciaciones, dado que al revisar en las actas de comité del periodo no se evidencian, aclarar.

7. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

8. Página 27, capitulo 5.12, se solicita al contratista de obra, informe donde informo a la interventoría y/o UAERMV, duchos errores en los insumos topográficos, dado que lo informo tardía en vista de la fecha de presentación del informe.

9. Página 20, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

> Se hace hincapié de que la información relacionada en el capitulo maquinaria y equipos no corresponde al informe técnico, dado que dicha información corresponde al informe SST. Se incluye en el presente informe a solicitud expresa de la interventoría. Adicional, si se presentan diferencias con lo reportado en el documento mencionado (informe SST) no se deberán considerar errores de este informe.

10. Página 20, titulo 5,5 fuentes de material, No se entienden las apreciaciones del contratista sobre errores en la documentación entregada, el contratista es el único responsable de entregar la información acorde a lo implementado en obra.

11. Página 20 titulo 5.6, se solicita aclare el contratista por que el comentario de a solicitud de la interventoría, si bien las aclaraciones las realizó la interventoría, en los documentos técnicos del contrato de obra, el contratista dentro de sus obligaciones debe acatar todos los requerimientos en estos documentos, se requiere se cumplan con estos lineamientos, so pena de incumplimiento a las obligaciones del mismo.

12. Página 21 ensayos de laboratorio, es importante que el contratista de obra realice el desglose del resultado de los ensayos de laboratorio, no solamente se remita a emitir un concepto de “Gran Satisfacción”, el contenido es de un informe técnico de campo, remitir los correspondientes análisis cuantitativos de cada capítulo.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 663

13. Página 25, balance presupuestal el contratista informa que realiza la entrega del balance, pero también indica que presenta discrepancias en el mismo, se solicita unifique los conceptos y plasme los balances realizados en este capítulo, por medio de tablas y análisis de los mismos.

14. Página 33 capitulo 5.15.1 curvas s, si bien el contrato puede tener retrasos, avances y demás situaciones, las curvas S son las que indican el desarrollo de obra, las apreciaciones que el contratista desee hacer se hacen posterior a la curva S solicitada en el anexo técnico del contrato.

15. Página 34, para la correspondencia remitida se solicita se realice una relación de la misma, esta observación se ha realizado y reiterado.

16. Página 34, ámbito económico, se solicita el contratista indique donde realizó la remisión de dicha acta parcial a los correos oficiales de la interventoría, en su caso a los correos de la UAERMV en dado de darse el caso.

17. Página 35, acta de recibo parcial, se solicita al contratista plasme en el cuerpo de este título las cantidades remitidas en el acta parcial de obra.

18. Página 36, se nombra dos veces el listado de anexos.

Se observa de manera general que las observaciones son reiterativas a lo largo de los 12 informes remitidos, se solicita al contratista ajuste los informes y se apegue a lo solicitado en los documentos técnicos del contrato.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al Consorcio Gaviones 95, se subsanen las observaciones ya que estás para todos los componentes son reiterativas, se radiquen en un máximo de 3 días calendario, al recibo del presente comunicado.

Atentamente,

Ermy A. Hurtado R.
Directora de Interventoría.

Anexo: N/A

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: EHR
Reviso: JPG

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-698

Bogotá D.C. 12 de junio de 2025.

Señor
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO García
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: *"CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 478 DE 2022 CONTRATO LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna Verde.)*

Asunto: Respuesta a correo electrónico del 9-06-25 *"Informes semanales SST, correspondientes a abril, mayo y junio de 2025.*

Respetado señor,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra Consorcio Gaviones 95.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión SST, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

De acuerdo a lo anterior una vez revisada la información remitida concerniente a los informes semanales se tienen los siguientes comentarios por parte de interventoría que requieren de la atención por parte del Consorcio Gaviones 95:

Informe semanal del 1 al 6 de abril de 2025 – No fue entregado
Informe semanal del 7 al 13 de abril de 2025 – No fue entregado
Informe semanal del 14 al 20 de abril de 2025 – No fue entregado
Informe semanal del 21 al 27 de abril de 2025 – No fue entregado
Informe semanal del 14 al 20 de abril de 2025 – No fue entregado

Los informes del mes mayo de 2025, fueron entregados y el informe de la primera semana del mes de junio de 2025, de los cuales se tiene las siguientes observaciones:

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-698

- Tienen fotos sin la información completa,
- Los indicadores sin la fórmula para saber su resultado.
- Falta la firma en la última página de los informes.
- No relacionan el retiro o ingreso de personal.
- No hay reporte de inducciones realizadas.
- Teniendo en cuenta que hay un vehículo tipo camioneta en obra, no se evidencia reporte de preoperacionales realizados.
- Hacer entrega de los informes semanales que hacen falta del mes de abril de 2025.

Se realizo mesa de trabajo el 12 de junio con la profesional SST, del contratista de obra donde se socializaron las observaciones.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al consorcio Gaviones 95, allegue a la interventoría los requerimientos, según observaciones de los informes, en un máximo de 3 días calendario al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: JAR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-702

Bogotá D.C. 12 de junio de 2025.

Señor
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO García
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: *"CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 478 DE 2022 CONTRATO LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna Verde.)*

Asunto: Respuesta a comunicado: D-24-2025-37 *"Informes SST # 14 abril 2025 y # 15 mayo 2025 V1.*

Respetado señor,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra Consorcio Gaviones 95.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión SST, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

De acuerdo a lo anterior una vez revisada la información remitida concerniente a los informes semanales se tienen los siguientes comentarios por parte de interventoría que requieren de la atención por parte del Consorcio Gaviones 95:

1. Informe mensual SST No. 14 correspondiente a abril 2025

    1.1. Página 5, titulo 3, se refieren a "**GENERALIDADES DEL CONTRATO 335-2022"** lo cual no es correcto el número de contrato, se solicita corregir este título".

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-702

1.2. Según se evidencia, los trabajadores:

- Paul Alberto Rangel Páez, ingresó a la empresa, según soporte de ARL, el 01 de agosto de 2024.
- Maximinio Becerra Yacumal, ingresó a la empresa, según soporte de ARL, el 28 de octubre de 2024.
- Wilson Orlando Rodríguez, ingresó a la empresa, según soporte de ARL, el 01 de agosto de 2024.
- Aristires Pardo Niño, ingresó a la empresa, según soporte de ARL, el 25 de enero de 2023.

Por lo tanto, se solicita la planilla de pago de seguridad social del periodo reportado de los trabajadores en mención.

1.3. Se evidencia un vehículo tipo camioneta en uso para traslado de personal, se solicita documentación respectiva (preoperacionales, tarjeta de propiedad, SOAT, revisión tecno mecánica si aplica y mantenimientos realizados en el periodo reportado)

2. Informe No. 15, correspondiente a mayo de 2025

2.1. Página 5, titulo 3, se refieren a "**GENERALIDADES DEL CONTRATO 335-2022"** lo cual no es correcto el número de contrato, se solicita corregir este título".

2.2. Según se evidencia, el trabajador:

John Jairo Guerrero Cabrera, ingresó a la empresa, según soporte de ARL, el 11 de febrero de 2025, por lo tanto, se solicita la planilla de pago de seguridad social acorde al periodo reportado del presente informe.

2.3. Se solicita el nombramiento del vigía SST, ya que se evidencia que se cumple con el número de personal para la asignación y también se observa que no hay retiro ni rotación de personal en los periodos de abril y mayo de 2025.

2.4. Se solicita la conformación del Comité de Convivencia Laboral, teniendo en cuenta que se cumple con el número de trabajadores según Resolución 1356 de 2012.

2.5. Se evidencia un vehículo tipo camioneta en uso para traslado de personal, se solicita documentación respectiva (preoperacionales, tarjeta de propiedad, SOAT, revisión tecno mecánica si aplica y mantenimientos realizados en el periodo reportado)


ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-702

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al consorcio Gaviones 95, allegue a la interventoría los requerimientos, según observaciones de los informes, en un máximo de 3 días calendario al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,



ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: JAR
Reviso: EHR

4.C INFORME GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

ECOVIAS SAS



INFORME MENSUAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
No 29

1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Versión 01

Bogotá, D.C. mayo de 2025

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1978 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		N°. DE COPIAS
Copia N°.1	Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	1 (Original)
Copia N°.2	Biblioteca del Proyecto	1 (Copia)

CONTROL DE VERSIONES

ÍNDICE VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFCACIÓN	FOLIOS
01	10/07/2025	Primera versión	350

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN



TULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 29			
PERIODO:	**1 al 30 de junio de 2025**			
NUMERO DE REVISIÓN			1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN Residente de Interventoría	Nombre:	Isabel Bernal Yasso		
	Firma:			
	Fecha:	10 /07 /2025		
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Ermy A. Hurtado R.		
	Firma:			
	Fecha:	10/05/2025		
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
				
	Fecha:	10/07/2025		

TABLA CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 15
2. OBJETIVOS 16
2.1 OBJETIVO GENERAL 16
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16
3. NORMATIVIDAD 17
4. RECURSO HUMANO DE GESTION SOCIAL PARA LA INTERVENTORIA 20
5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 20
6. CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95 21
6.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 21
6.1.1 PERSONAL DEL COMPONENTE SOCIAL. 23
6.1.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 23
6.1.2.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO 23
6.1.2.2 RECORRIDOS 25
6.1.2.3 MESA DE TRABAJO 27
6.1.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 29
6.1.3.1 PROCESOS SENSIBILIZACIÓN 29
6.1.3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 30
6.1.3.1 REUNIONES PARTICIPATIVAS 30
6.1.3.1.1 REUNIONES DE INICIO 31
6.1.3.1.2 REUNIÓN DE AVANCE 31
6.1.3.1.3 REUNIÓN DE FINALIZACIÓN 32
6.1.3.1.4 REUNIONES EXTRAORDINARIAS. 32
6.1.3.1.5 REUNIONES COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANO. (VEEDURÍA) 32
6.1.3.1.6 VALLA INFORMATIVA MÓVILES 33
6.1.3.1.7 PASACALLES. 34
6.1.3.1.8. VOLANTE DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES 35
6.1.3.1.9 VOLANTES INFORMATIVOS Y/O CONVOCATORIAS 35
6.1.3.1.10 AFICHE INFORMATIVO 37
6.1.3.1.11 PUNTOS FIJOS INFORMATIVOS 37
6.1.3.1.12. ACTAS DE VECINDAD 38
6.1.3.1.13. ACTA DE COMPROMISO 38

6.1.3.1.14. ACTA DE GESTIÓN ADELANTADA 38
6.1.4. PROGRAMA DE CULTURA VIAL 39
6.1.5. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA 40
6.1.5.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONTRATACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE 40
6.1.5.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD 40
6.1.5.3 CONTRATACIÓN DE MUJERES 40
6.1.5.4 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 41
6.1.5.5 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. 41
6.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 42
6.2.1 LISTAS DE CHEQUEO DEL CONTRATISTA 42
6.2.2 REVISIÓN DOCUMENTAL 43
6.2.3 INFORMES MENSUALES 43
6.2.5. COMITÉS DE SEGUIMIENTO INTEGRAL 45
6.2.6 COMITÉS DE SEGUIMIENTO SOCIAL 46
6.2.7 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 46
6.2.8 ESTADO DEL CONTRATO 47
7. CONTRATO DE OBRA NO. 479 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL. 48
7.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 48
7.1.1 PERSONAL DEL COMPONENTE SOCIAL 48
7.1.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 49
7.1.2.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO 49
7.1.2.2 RECORRIDOS 51
7.1.2.3 MESA DE TRABAJO 54
7.1.3 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO. 56
7.1.3.1 PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN 56
7.1.4 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 58
7.1.4.1 REUNIONES PARTICIPATIVAS 58
7.1.4.1.1 REUNIÓN DE INICIO 59
7.1.4.1.2. REUNIÓN DE AVANCE 59
7.1.4.1.3. REUNIÓN DE FINALIZACIÓN 59

7.1.4.1.4. REUNIONES EXTRAORDINARIAS. 60
7.1.4.1.5. REUNIONES COMITÉ VEEDOR 61
7.1.4.1.6. VALLA INFORMATIVA MÓVILES 62
7.1.4.1.7. PASACALLES 62
7.1.4.1.8 VOLANTE DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES 63
7.1.4.1.9 VOLANTES INFORMATIVOS Y/O CONVOCATORIAS. 64
7.1.4.1.10 AFICHE INFORMATIVO. 66
7.1.4.1.11 PUNTOS FIJOS INFORMATIVOS. 67
7.1.4.1.11. ACTAS DE VECINDAD 69
7.1.4.1.12. ACTA DE COMPROMISO. 82
7.1.5. PROGRAMA DE CULTURA VIAL 83
7.1.6. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA 84
7.1.6.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONTRATACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE 84
7.1.6.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD 84
7.1.6.3 CONTRATACIÓN DE MUJERES 85
7.1.6.4 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 85
7.1.6.5 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. 86
7.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 87
7.2.1 LISTAS DE CHEQUEO DEL CONTRATISTA: 87
7.2.2 REVISIÓN DOCUMENTAL 87
7.2.3 INFORMES MENSUALES 88
7.2.5. COMITÉS DE SEGUIMIENTO INTEGRAL 91
7.2.6 COMITÉS DE SEGUIMIENTO SOCIAL 93
7.2.7 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 93
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 93
7.2.8 ESTADO DEL CONTRATO 94
8. CONTRATO DE SERVCIO - 480 – DEL 22/02/2022 SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S 94
8.1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 94
8.2. ESTADO DEL CONTRATO 94

9. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)..... 95

9.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 95

9.1.1 PROGRAMA DE SERVICIO AL USUARIO. 95

9.1.1.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO 95

9.1.1.2 RECORRIDOS 99

9.1.2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 103

9.1.2.1 PROCESOS SENSIBILIZACIÓN 103

9.1.3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 105

9.1.3.1 REUNIONES PARTICIPATIVAS 106

9.1.3.1.1 REUNIONES DE INICIO 106

9.1.3.1.2 REUNIÓN DE AVANCE 106

9.1.3.1.3 REUNIÓN DE FINALIZACIÓN 107

9.1.3.1.4 REUNIONES EXTRAORDINARIAS. 107

9.1.3.1.5 REUNIONES COMITÉ VEEDOR. 109

9.1.3.1.6. VALLA INFORMATIVA MÓVIL 110

9.1.3.1.7 PASACALLES 110

9.1.3.1.7. VOLANTES DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES 112

9.1.3.1.9. AFICHE INFORMATIVO. 114

9.1.3.1.10. PUNTOS INFORMATIVOS FIJOS 115

9.1.3.1.11. Actas de vecindad 116

9.1.3.1.12. ACTA DE COMPROMISO 120

9.1.3.1.13. ACTA DE GESTIÓN ADELANTADA. 122

9.1.3.1.14. EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL. 122

9.1.4. PROGRAMA DE CULTURA VIAL 123

9.1.5. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA 123

9.1.5.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONTRATACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE. 124

9.1.5.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD. 124

9.1.5.3 CONTRATACIÓN DE MUJERES 124

9.1.5.4 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 125

9.1.5.5 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. 125

9.1.6 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 126
9.1.6.1. LISTAS DE CHEQUEO DEL CONTRATISTA: 126
9.1.6.2 REVISIÓN DOCUMENTAL 126
9.1.6.3. INFORMES MENSUALES. 127
9.1.6.4. INFORME SEMANAL 130
9.1.6.5 COMITÉS DE SEGUIMIENTO INTEGRAL 131
9.1.6.6. COMITÉS DE SEGUIMIENTO SOCIAL 132
9.1.6.7 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 133
9.1.6.8 ESTADO DEL CONTRATO 134
10. CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022 134
10.1 ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA. 134
10.1.1 ESTADO DEL CONTRATO 135
11. CONCLUSIONES 136
12. RECOMENDACIONES 137

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Profesional social de Interventoría. 20
Tabla 2: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social 22
Tabla 3: Profesional social Consorcio Gaviones 95 23
Tabla 4: Ubicación punto PAC Contrato No 478/2022 Consorcio Gaviones 95 24
Tabla 5: Indicadores cumplimiento gestión social Programa de atención al usuario ... 28
Tabla 6. Consolidado acciones formación a empleados Consorcio Gaviones 95 30
Tabla 7. Indicadores de cumplimiento del Programa Educación y capacitación al personal vinculado al contrato. Consorcio Gaviones 95 30
Tabla 8: Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación comunitario. 33
Tabla 9: Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria, volantes. 37
Tabla 10: Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria. 39
Tabla 11. Consolidado personal consorcio Gaviones 95 42
Tabla 12: Informes mensuales contrato de obra N° 478 Consorcio Gaviones 95 43

Tabla 13: Comité integral de seguimientos Consorcio Gaviones 95 45
Tabla 14: Comité integral de seguimientos Consorcio Gaviones 95. 46
Tabla 15: Correspondencia recibida y enviada Contrato..... 47
Tabla 16: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social 48
Tabla 17: Profesional social Contrato No 479/2022 Consorcio Estabilización Vial. 48
Tabla 18. Información Punto atención a la comunidad Contrato No 479/2022 Consorcio Estabilización Vial..... 49
Tabla 19: Recorrido Contrato No 479/2022, Consorcio Estabilización Vial..... 51
Tabla 20: Indicadores de cumplimiento del Programa Atención al Usuario. 54
Tabla 21. Consolidado acciones formación a empleados Consorcio Estabilización vial 57
Tabla 22. Indicadores de cumplimiento del Programa de Información y participación Comunitaria. 61
Tabla 23. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria. 63
Tabla 24. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria volantes 66
Tabla 25. Instalación Puntos informativos fijos Consorcio Estabilización Vial 67
Tabla 26. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria 68
Tabla 27: actas de vecindad Frente de obra San Antonio El Toldo y unión Tunales junio 2025..... 69
Tabla 28: Consolidado total actas de vecindad de apertura realizadas 81
Tabla 29: Consolidado de actas de compromiso Frente de obra Unión Tunales..... 82
Tabla 30. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria. 83
Tabla 31. Consolidado personal consorcio Estabilización Vial..... 86
Tabla 32. Informes mensuales contrato de obra no. 479 – del 10/02/2022 Consorcio Estabilización Vial..... 88
Tabla 33. Trazabilidad informe semanales Consorcio Estabilización Vial..... 91
Tabla 34. Comité integral de seguimientos Consorcio Estabilización Vial 92
Tabla 35. Comité de seguimiento social Consorcio Estabilización Vial..... 93
Tabla 36: Correspondencia recibida y enviada Contrato..... 94

Tabla 37: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social 95
Tabla 38: Información Punto PAU UAERMV 96
Tabla 39. Recorrido entidad ejecutora Unidad Administrativa especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV – Interventoría – Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz 99
Tabla 40. Indicadores de cumplimiento del Programa Atención al Usuario 102
Tabla 41. Consolidado acciones formación a empleados UAERMV 104
Tabla 42. Indicadores de cumplimiento del Programa Educación y capacitación al personal vinculado al contrato UAERMV 105
Tabla 43. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria 109
Tabla 44. indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria Frente Unión Tunales – Frente Capitolio – San Antonio El Toldo 111
Tabla 45. Entrega de volantes informativos frente de obra Unión Tunales -Capitolio- San Antonio El Toldo 112
Tabla 46. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria 114
Tabla 47. Consolidada instalación de afiches informativos UAERMV 114
Tabla 48. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria Frente de obra Unión Tunales 116
Tabla 49: actas de vecindad Frente de obra San Antonio El Toldo y unión Tunales junio 2025 117
Tabla 50: Consolidado total actas de vecindad de apertura realizadas 120
Tabla 51: Consolidado de actas de compromiso Frente de San Antonio El Toldo 121
Tabla 52: Consolidado de actas de compromiso Frente de San Antonio El Toldo 121
Tabla 53. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria 123
Tabla 54. Consolidado personal UAERMV 126
Tabla 55. Trazabilidad Informes mensuales UAERMV 127
Tabla 56. Informes semanales 131
Tabla 57. Comité integral de seguimientos UAERMV 131
Tabla 58. Comité de seguimiento social UAERMV 132
Tabla 59: Correspondencia recibida y enviada Contrato 134

LISTA DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Foto: 1: Punto de atención a la comunidad, tramo vial de Laguna verde, Consorcio Gaviones 95..... 24
Foto: 2: Recorrido Tramo Laguna Verde. Consorcio Gaviones 95..... 26
Foto: 3: Recorrido Tramo Laguna Verde. Consorcio Gaviones 95..... 26
Foto: 4: Registros grupo del grupo de WhatsApp comunidad de Laguna Verde. 27
Foto: 5: Entrega de volantes de inicio de obra Laguna Verde..... 36
Foto: 6: Entrega de volantes de inicio de obra Laguna Verde..... 36
Foto: 7: volantes de inicio de obra Laguna Verde. 36
Foto: 8: Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 46 45
Foto: 9: Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 47. 45
Foto: 10: Comité de seguimiento social contrato 478 - 2022 No 8 46
Foto: 11: Comité de seguimiento social contrato 478 - 2022 No 9..... 46
Foto: 12: Punto de atención fijo a la comunidad CEV 50
Foto: 13: Punto de atención móvil de atención a la comunidad CEV Unión Tunales. 50
Foto: 14: Punto de atención móvil de atención a la comunidad CEV San Antonio El Toldo..... 50
Foto: 15: Recorrido conjunto Unidad de Mantenimiento vial - Consorcio Estabilización vial. 51
Foto: 16: Recorrido conjunto Unidad de Mantenimiento vial - Consorcio Estabilización vial. 51
Foto: 17: Recorrido conjunto Unidad de Mantenimiento vial - Consorcio Estabilización vial. 52
Foto: 18: Registros grupo de WhatsApp comunidad de San Antonio El Toldo y Unión Tunales. 53
Foto: 19: mesa de trabajo CEV 54
Foto: 20: mesa de trabajo CEV 54
Foto: 21: Sensibilización con el personal de obra CEV..... 56
Foto: 22: Sensibilización con el personal del contrato..... 58
Foto: 23: Reunión extraordinaria presidenta de Junta de acción comunal San Antonio El Toldo..... 60
Foto: 24: Instalación de valla informativa móvil Unión Tunales. 62

Foto: 25: Instalación de valla móvil San Antonio El Toldo. 62
Foto: 26: Instalación pasacalle Unión Tunales 63
Foto: 27: Instalación pasacalle Unión Tunales. 63
Foto: 28: Volante informativo Convocatoria Laboral..... 65
Foto: 29: Volante informativo reunión extraordinaria. 65
Foto: 30: Pantallazo entrega del volante informativo reunión extraordinaria Unión Tunal bajo. 65
Foto: 31: Pantallazo entrega del volante informativo reunión extraordinaria Unión Tunal bajo. 65
Foto: 32: diseño afiche informativo. 67
Foto: 33: Punto informativo Unión Tunales 67
Foto: 34: Punto satélite informativo Unión Tunales. 68
Foto: 35: Punto satélite informativo San Antonio El Toldo. 68
Foto: 36: acta de compromiso, con el fin de informar el diseño de la entrada al predio 82
Foto: 37: acta de compromiso, con el fin de solicitar permiso para disposición de material de excavación 82
Foto: 38: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 68. 92
Foto: 39: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 69. 92
Foto: 40: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 70 92
Foto: 41: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 71. 92
Foto: 42: Comité de seguimiento social No 24 contrato 479 – 2022. 93
Foto: 43: Comité de seguimiento social No 25 contrato 479 – 2022. 93
Foto: 44: Verificación de interventoría punto de atención fijo, Frente Unión Tunales. 97
Foto: 45: Verificación del punto móvil atención al usuario. Frente de Capitolio. 98
Foto: 46: Verificación del punto móvil atención al usuario. Frente de San Antonio El Toldo. 98
Foto: 47: Recorrido conjunto Unión Tunales. 99
Foto: 48: Recorrido conjunto San Antonio. 99
Foto: 49: Pantallazo información a la comunidad en el grupo de WhatsApp en el frente de obra, Unión Tunales, Capitolios y San Antonio El Toldo. 102
Foto: 50: Sensibilización al personal de obra San Antonio El Toldo. 105
Foto: 51: Sensibilización al personal de obra Unión Tunales. 105

Foto: 52: Reunión extraordinaria San Antonio El Toldo. 108
Foto: 53: verificación valla informativa Unión Tunales 111
Foto: 54: verificación valla informativa San Antonio el Toldo. 111
Foto: 55: verificación instalación Pasacalles informativa San Antonio el Toldo. 111
Foto: 56: verificación instalación Pasacalles informativa San Antonio el Toldo. 111
Foto: 57: Volante informativo programación de cierres viales frente de obra Capitolio. 113
Foto: 58: Afiches informativo Unión Tunales. 114
Foto: 59: Afiche informativo San Antonio. 115
Foto: 60: Afiche informativo Capitolio. 115
Foto: 61: Comité de seguimiento integral No 42, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá. 132
Foto: 62: Comité de seguimiento integral N° 43, CTO Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá. 132
Foto: 63: Comité de seguimiento integral No 44, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá. 132
Foto: 64: Comité de seguimiento integral No 45, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá..... 132
Foto: 65: Comité de seguimiento social No 35, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá. 133
Foto: 66: Comité de seguimiento social No 36, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá. 133
Foto: 67: Mesa de trabajo..... 133

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Consorcio Gaviones 95

A1:

- Soportes de pagos señora Balbina.
- Comunicado 186-1-701
- Comunicado 186-1-716
- Comunicado 186-1-724.

A2

- Trazabilidad pantallazo de entrega y aprobación del volante informativo de invitación a reunión de inicio de obra en el tramo vial de Laguna Verde.

A3:

- Listado de personal Consorcio Gaviones 95.

A4

- Lista de chequeo mes de junio Consorcio Gaviones 95.

A5

- Copia Bitácora Consorcio Gaviones 95.

A6

- Comunicado 186-1-718 el 24 de junio del 2025, observaciones informes mensuales 14 V1.

A7

- Acta de comité social N° 8 y N° 9

Consorcio Estabilización Vial

A8

- Correos electrónicos pantallazos trazabilidad de solicitud y aprobación de pieza divulgativa volante convocatorio a contratación mano de obra no calificada.

A9

- CEV/22-409 del 5 de junio del 2025 Radicación actas de vecindad de apertura tramo San Antonio II El Toldo y Unión Tunales
- 186-1- 717 del 24 de junio del 2025. Respuesta al comunicado CEV/22- 409, del 5-06-25, Actas de vecindad de apertura sector San Antonio II El Toldo. Y Unión Tunales CEV.

A10

- Comunicado CEV/22-419
- Comunicado 186-1-734

A11

- Listado de personal Consorcio Estabilización vial.

A 12

- Lista de chequeo mes de junio Consorcio Estabilización vial.

A 13

- Copia Bitácora Social Consorcio Estabilización Vial junio.

A 14

- Comunicado 186-1- 711
- comunicado CEV/22-408
- Comunicado 186-1- 710

A15

- Actas de comité social seguimiento y mesa de trabajo Consorcio Estabilización vial

Unidad Administrativa especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV

A 16

- Correos electrónicos trazabilidad de solicitud y aprobación piezas divulgativas volantes y comunicados informativos. UAERMV.

A 17.

- Lista de personal junio UAERMV.

A18

- Lista de chequeo mes de junio UAERMV.

A 19

- Copia Bitácora Social junio UAERMV.

A 20

- Radicado: 20251920081301
- comunicado 186-1-713 del 24 de junio del 2025

A 21

- Actas de comité de seguimiento social junio UAERMV.

A 22

- Correspondencia enviada y recibida.

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las actividades realizadas por el componente social de Interventoría **"ECOVIAS SAS"** a través del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022,** cuyo Objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR".** mediante la Resolución Nº 008 del 04 de febrero de 2022. El proceso de Concurso de Méritos le fue adjudicado a **ECOVÍAS S.A.S**, durante el período comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2025 al hacer el seguimiento, verificación y acompañamiento al desempeño del componente social de del ejecutor del contrato Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), y de los contratista Consorcio Gaviones 95, Soluciones Geoespaciales SAS, mediante un modelo de ejecución mixta, que contempla dos procesos de obra independientes, los cuales se describen a continuación. Obras hidráulicas (Subdrenes, berma-cunetas, box culvert) y muros en gavión, se ejecutarán mediante los contratos que surja de la licitación pública No. LP-006-2021, cuyo objeto es "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020" publicado, por la UAERMV e Instalación del material granular y del fresado estabilizado en las vías, serán ejecutadas directamente por la UAERMV.

El presente informe da a conocer las condiciones de avance de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), y los contratistas, cuyos contratos son: CONSORCIO GAVIONES 95 No 478 – 2022, CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL No 479 - 2022 y SOLUCIONES GEOESPACIALES SAS – SOLGEO SAS No 480- 2022, este último se encuentra en proceso de nulidad por tanto no se presenta información en el componente Social de acuerdo con lo estipulado contractualmente en el anexo técnico en la etapa de construcción.

Los anexos que se presentan están relacionados a la gestión de seguimiento y control de la Interventoría. Dando a conocer las condiciones de avance del CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 en el componente Social de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Describir la metodología para el acompañamiento a la supervisión y verificación del Área de Gestión Social, desarrollada por los ejecutores del contrato, para el pleno cumplimiento de las labores establecidas dentro del anexo técnico, fundamentado en los criterios de calidad, suficiencia y oportunidad, donde se evidencia los procedimientos implementados y se cuente con los soportes de resultado.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Revisar, aprobar y hacer el seguimiento a los planes de gestión social, de los Contratista, conforme a los documentos contractuales.

- ✓ Comprobar a través de seguimiento, acompañamiento, verificación y evaluación la labor desarrollada por el ejecutor, para establecer que la ejecución de las actividades del componente sociales se ajuste con los requerimientos contractuales del contrato.

- ✓ Informar a Fondo de desarrollo Local del Sumapaz, periódicamente el avance y dificultades que surjan con el desarrollo del proyecto, en cada una de las actividades de gestión social realizadas por el ejecutor.

- ✓ Revisar, conceptuar y aprobar los informes elaborados por el ejecutor, en virtud de lo estipulado contractualmente.

- ✓ Propender por el cumplimiento de la propuesta metodológica y el desarrollo de las actividades y tiempos propuestos por el consultor en el Plan de Gestión Social, para cada uno de los programas establecidos.

- ✓ Asesorar y acompañar al contratista durante las actividades que realice en las etapas de construcción.

3. NORMATIVIDAD

- ✓ Constitución Política de Colombia.
- ✓ Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
- ✓ Ley 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- ✓ Ley 1882 de 2018 o Ley de Infraestructura
- ✓ Ley 1083 de 2006: Establece algunas normas sobre planeación urbana sostenible. Señala que para garantizar la accesibilidad de todas las personas a las redes de movilidad y transitar por las mismas en condiciones adecuadas, en especial a las niñas, niños y personas que presenten algún tipo de discapacidad, las vías públicas que se construyan al interior del perímetro urbano a partir de la vigencia de esta ley. Ley 1801 de 2016 o Código Nacional de Policía y Convivencia.
- ✓ Ley 80 de 1993: Estatuto general de contratación de la administración pública.
- ✓ Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
- ✓ Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan de Desarrollo.
- ✓ Ley 388 de 1997: Ley de desarrollo territorial.
- ✓ Ley 134 de 1994: Mecanismos de participación ciudadana.
- ✓ Ley 190 de 1995: Normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

- ✓ Ley 489 de 1998: Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional.

- ✓ Ley 1618 de 2013: Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

- ✓ Ley 1437 de 2012: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

- ✓ Decreto 2820 de 2010, de la Presidencia de la República: Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, modificado por el Decreto 2041 de 2014.

- ✓ CONPES 3819 de 2014, por medio del cual establece los lineamientos de la Política nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia. Resolución 49906 del 6 de julio de 2015: Por la cual se adopta la Política de Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía, o la que haga sus veces.

- ✓ Acuerdo 584 de 2015: Adopción de los lineamientos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital.

- ✓ Acuerdo 79 de 2003: Código de Policía de Bogotá D.C.

- ✓ Acuerdo 142 de 2005: por medio del cual se adoptan mecanismos e instancias para apoyar y promover en el ámbito distrital las Veedurías Ciudadanas

- ✓ Acuerdo No. 645 de 2016: Por el cual se adopta el plan de desarrollo, económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2016-2020; Bogotá Mejor para Todos.

- ✓ Decreto Distrital 371 de 2010: Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.

- ✓ Decreto Distrital 529 de 2015.

- ✓ Decreto Distrital 162 de 2015: Por el cual se autorizan las intervenciones en los elementos constitutivos artificiales o construidos del espacio público y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Decreto Distrital 380 del 2015: Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Resolución 747 de 1998: Topes máximos para sueldos y demás gastos que se pueden pagar por contratos.

- ✓ Decreto Distrital 190 de 2004: Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá.

- ✓ Decreto Distrital 1660 de 2003: Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad.

- ✓ Decreto Distrital 197 de 2014: Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.

- ✓ Decreto Distrital 503 de 2011: Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital.

- ✓ Decreto Distrital 166 de 2010: Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Decreto Distrital 558 de 2018: Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Decreto Distrital 1078 de 2015 sobre Políticas y Lineamientos de Tecnología de la Información.

- ✓ Resolución 325 de 2015: Por medio de la cual se adopta el Plan Sectorial de Transversalidad de Género en el Sector Movilidad y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Directiva 001 de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital, promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas vulnerables marginales y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”.

- ✓ Resolución 979 de 2017 que establece como propósito central o Misión institucional del IDU “Generar bienestar en los habitantes de la ciudad mejorando la calidad de vida, mediante el desarrollo de infraestructura para la movilidad, contribuyendo a la construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna”

- ✓ Resolución 4940 del 18 de octubre de 2018, mediante la cual el IDU adopta su Política de Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía.

- ✓ Decreto 332 del 2020, el cual establece medidas afirmativas para promover la participación de la mujer en la ejecución de contratos del Distrito Capital.

4. RECURSO HUMANO DE GESTION SOCIAL PARA LA INTERVENTORIA

A continuación, se da conocer el perfil y la experiencia que hace parte del profesional social de la interventoría.

Tabla 1. Profesional social de Interventoría.

PROFESIONAL	CARGO	DEDICACIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Trabajadora Social Isabel Bernal Yasso. La hoja de vida de la profesional social fue aprobada por el fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz Radicado No. 20237020012741 Fecha: 14-08-2023	Profesional Social	100%	Profesional en trabajo social o sociología o sicología o profesiones afines. Acreditar experiencia general mínimo detres (3) años. Título de postgrado: No Aplica	Experiencia en el cargo de profesional social de un (1) año en proyectos de interventoría para la construcción y/o conservación y/o rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura vial (tomado de anexo técnico –Cto 161-2022)

Fuente: Propia

5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

En el marco de las actividades constructivas el plan de gestión social pretende implementar estrategias que minimicen el impacto que generan las labores constructivas, las cuales están enmarcadas en el Plan de Gestión Social y sus programas y se ejecutarán de acuerdo con los lineamientos del modelo establecido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL); las cuales se adaptan al alcance y la misionalidad de la UAERMV; lo anterior teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra financiado por recursos de orden nacional del Sistema General de Regalías.

De acuerdo a lo anterior la UAERMV presenta un plan de gestión social el cual es aprobado por la interventoría el 16 de noviembre del 2023.

Los Contratista Consorcio Estabilización vía presenta actualización el plan de gestión social el cual es aprobado por la interventoría el 29 de diciembre del 2023.

El Consorcio Gaviones 95, hace entrega del documento en el mes de marzo del 2025 y da aval mediante comunicado 186-1-683, el 29 de mayo del 2025 en su versión 4.

El plan de gestión social esta descrito bajo las fichas PAGA, enmarcado de acuerdo con los lineamientos del modelo establecido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL); y son adaptados al alcance y la misionalidad de la UAERMV.

Las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL) se enmarca en 4 programas los cuales se relacionan a continuación.

- ✓ MEDIDA DE MANEJO 1-PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO- PGS-6.1-16
- ✓ MEDIDA DE MANEJO 2- PROGRAMA EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO. PGS-6.2-17.
- ✓ MEDIDA DE MANEJO 3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA- PGS-6.4-18.
- ✓ MEDIDA DE MANEJO 4. PROGRAMA DE CULTURA VIAL- PGS-6.5-19.
- ✓ VINCULACIÓN MANO DE OBRA.

6. CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95

6.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El contratista CONSORCIO GAVIONES 95, el plan de Gestión social se encuentra enmarcado de acuerdo con los lineamientos del modelo establecido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL); y son adaptados al alcance y la misionalidad de la UAERMV; teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra financiado por recursos de orden nacional del Sistema General de Regalías, De acuerdo a lo anterior la interventoría solicita realizar una actualización al documento.
A continuación, se presente la trazabilidad del documento.

Tabla 2: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social Contrato No 478/2022 Consorcio Gaviones 95.

FECHA	TRAZABILIDAD	APROBACIÓN
2 de octubre del 2023. 29 de febrero del 2024 El 19 de marzo del 2025	La interventoría mediante comunicado 186- 1- 309 del 2 de octubre del 2023, alcance donde indican que debe ser actualizado de acuerdo al Plan de Gestión Social implementado por la UAERMV, el cual se encuentra enmarcado con los lineamientos del modelo establecido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL). El consorcio reinicia el contrato el 5 de febrero del 2024, se realiza mesa de trabajo con el fin de dar respuesta a las inquietudes que se presenta en la actualización e implementación de las fichas PAGA, el 29 de febrero del año en curso. El 12 de marzo es radicado oficialmente con comunicado D 22-2024 – 37, el consorcio realizo entrega del plan de gestión social con las observaciones subsanadas V3. La interventoría da respuesta al comunicado mediante comunicado 186-1-538 el 1 de abril del 2024 con observaciones. El contrato entra en suspensión el 16 de abril del 2024. Queda pendiente entrega por parte del Consorcio en su versión 4, con las observaciones subsanadas. El Consorcio hace entrega del Plan de Gestión social con las observaciones subsanadas Es de aclarar que la interventoría reinicia las actividades del contrato el 1 de abril del 2025. La interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-683, el 29 de mayo del 2025. Donde la interventoría aval al documento en su versión 4.	29 de mayo del 2025 comunicado 186-1-683

Fuente: Propia

6.1.1 PERSONAL DEL COMPONENTE SOCIAL.

Tabla 3: Profesional social Consorcio Gaviones 95

PROFESIONAL	CARGO	DEDICACIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Psicólogo Andrés A. García	Profesional Social	100 %	Acreditar Experiencia General mínimo Cinco (5) Años.	Profesional Social en al menos tres (3) contratos de obra pública.

Fuente: Propia

6.1.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Este programa establece la instalación por parte del Contratista de un sistema de atención al ciudadano, en el que se registren de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos como: peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD), interpuestos por los ciudadanos de manera presencial, escrita, telefónicamente, correo electrónico y/o redes sociales.

6.1.2.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Los puntos de atención a la comunidad (PUNTO PAU) debe estar dotada de:

- Baño
- Línea telefónica exclusiva
- Cartelera informativa
- Computador con los programas necesarios
- Sillas y escritorio para la persona encargada de la atención.
- Espacio, sillas disponibles, chaquetas según el manual de identidad visual.

A la fecha de cierre del presente informe el contratista informo que el punto fijo de atención a la comunidad se encuentra ubicado en el predio de la señora Clara Martínez de la vereda Auras, que estableció un horario de atención de 8: 30 a.m. a 3: 00 p.m. a la fecha no se ha dado adecuación del punto, la interventoría realizará seguimiento a su cumplimiento.

Tabla 4: Ubicación punto PAC Contrato No 478/2022 Consorcio Gaviones 95

PUNTO PAC LAGUNA VERDE CONTRATO 478 -2022	
Localización	Casa de la señora Clara Martínez
Línea Telefónica	3143248985
Correo electrónico:	atencioncomunidadlvcg95@gmail.com

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto: 1: Punto de atención a la comunidad, tramo vial de Laguna verde, Consorcio Gaviones 95.

La interventoría solicita se entregue los PAZ Y SALVO, sobre las presuntas deudas que se generaron con la comunidad, por servicios prestados a los ciudadanos que a continuación se relacionan:

Wilfor Lara Sanabria, identificado con cédula No. 11.245.318 de San Bernardo, Cundinamarca, quien manifiesta que se tiene una deuda por un total de $ 1.300.000, 00 por concepto de:
$1.200.000 por el descargue de material en su predio, servicios como internet, $60.000, electricidad $40.000, lo que suma $1.300.000.

Balbina Peñaloza, identificada con cédula No. 1.022.956.962, quien solicita el pago por concepto de arriendo de dos meses el cual manifiesta que le adeudan un total de $ 4.500.000.00

Marcela Martínez, de la vereda Laguna Verde de Sumapaz, quien realizó un subcontrato de alquiler de volquetas con el Consorcio Gaviones 95, quien manifiesta que se tiene una deuda de $52.943.850.00,

A continuación, se presenta la trazabilidad de seguimiento a los casos descritos:

1. El 22 de mayo del año en curso mediante comunicado 186-1-701solicita los Paz y Salvos de los ciudadanos mencionados.
2. El Consorcio da respuesta mediante comunicado D19 del 28 de mayo del 2025, donde se evidencia el Paz y Salvo de la señora Marcela Martínez.
3. El 6 de junio del 2025, la señora Balbina Peñaloza por medio de WhatsApp, informa que el Consorcio Gaviones 95, se encuentra a paz y salvo y envía los soportes de pagos realizados.
4. El 24 de junio del año en curso, la interventoría da respuesta al comunicado D 19, mediante comunicado 186-1-716. Donde solicita nuevamente la paz y salvo del señor Wilfor Lara Sanabria manifiesta que se tiene una deuda por concepto de: $1.200.000 por el descargue de material en su predio, servicios como internet, $60.000, electricidad $40.000, sumando un total de $ 1300.000. El cuidando hace entrega el día 13 de junio del año en curso, un derecho de petición donde relaciona la deuda descrita anteriormente.
5. El 26 de junio del 2025 la interventoría solicita nuevamente respuesta al caso mediante comunicado 186-1-724
   A la fecha de cierre del presente informe se encuentra pendiente respuesta, la interventoría continuará realizando solicitud y seguimiento al caso.

   A1:
   - ***Soportes de pagos señora Balbina.***
   - ***comunicado D19***
   - ***Comunicado 186-1-716***
   - ***Comunicado 186-1-724.***

6.1.2.2 Recorridos

El contrista está en la obligación de realizar recorridos, con el fin de verificar la atención con la comunidad, estableciendo puntos móviles, permitiendo canalizar de forma personalizada las manifestaciones de la comunidad.

La interventoría realizará seguimiento y verificación en recorridos a los compromisos adquiridos en el componente social.

Durante el periodo comprendido la interventoría realiza recorridos revisa las actividades a implementar en el tramo vial de Laguna Verde.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto: 2: Recorrido Tramo Laguna Verde. Consorcio Gaviones 95.	***Foto: 3:*** **Recorrido Tramo Laguna Verde. Consorcio Gaviones 95.**

- **Línea WhatsApp:**

Durante este periodo, el contratista informa en el grupo de WhatsApp con la comunidad de frente de obra de Laguna Verde, con el fin informar las actividades relevantes a realizar durante el desarrollo del contrato.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

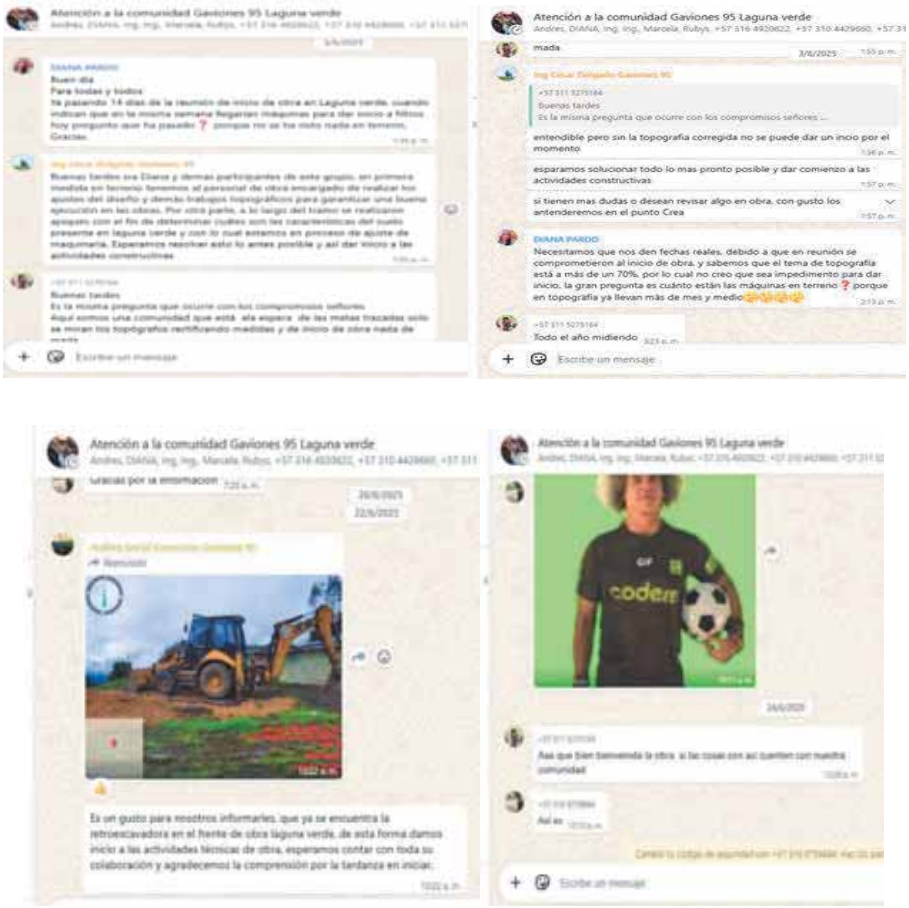


Foto: 4: Registros grupo del grupo de WhatsApp comunidad de Laguna Verde.

6.1.2.3 Mesa de trabajo

Durante el periodo comprendido no se realizan mesas de trabajo.

Tabla 5: Indicadores cumplimiento gestión social Programa de atención al usuario

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO		
INDICADOR	**FORMULA**	**CUMPLIMIENTO**
PRODUCTIVIDAD	Línea telefónica solicitada/Línea telefónica implementada 1 X 100 = 1	100 %
PRODUCTIVIDAD	Correo electrónico solicitado / Correo electrónico implementado 1 X 100 = 1	100%
PRODUCTIVIDAD	Formato de control de atenciones diligenciado/Formato de atenciones recibidas 0 x 100 = 0	**NA**
PRODUCTIVIDAD	Recorridos /Realizados 1 X100 = 1	**100%**
PRODUCTIVIDAD	Total, de equipamiento básico instalado / total de equipamiento básico requerido 0 x 100 = 0	0%
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Durante el periodo comprendido el Consorcio Gaviones 95, no ha realizado notificación de la adecuación del punto de atención fijo en el frente de obra de Laguna Verde. La Interventoría en comités de seguimiento realiza el requerimiento y mediante comunicado 186-1-724 del 26 de junio del 2025.	

Fuente: Propia

6.1.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

6.1.3.1 Procesos Sensibilización

Se establecerá dentro de las sensibilizaciones al personal vinculado al proyecto en todas las áreas sobre temas relacionados con las medidas de manejo ambiental y social del proyecto.

La sensibilización al personal vinculado al proyecto contiene los siguientes elementos:

- Descripción técnica del proyecto

- Presentación de las obligaciones de gestión social de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

- Objetivos, alcances y operaciones de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

- Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales (política general en temas laborales, recursos humanos, condiciones de trabajo y términos de empleo organizaciones laborales, no discriminación e igualdad de oportunidades, reducción y mecanismos de protección de la fuerza laboral, mecanismo de atención a quejas y reclamos).

- Seguridad vial en obra

- Normas de convivencia con las comunidades laborales sociales y bióticas enfatizando en las limitaciones al personal procedente de otros lugares para la extracción de fauna, flora y demás recursos de los pobladores vecinos del área.

- Mensualmente se realizarán charlas de refuerzo de los conceptos ya incluidos y se complementará con información sobre el avance de las obras, problemas surgidos durante las mismas y soluciones encontradas a modo de lecciones aprendidas. De igual forma se reforzará en estas charlas, aquellos temas que se hayan detectado como de alta sensibilidad para las comunidades y para los colaboradores del proyecto.

Durante el desarrollo del presente informe el Consorcio Gaviones 95, realizó una sensibilización con el personal que se encuentra vinculado al proyecto el 13 de junio del 2025. A continuación, se presenta la trazabilidad.

Tabla 6. Consolidado acciones formación a empleados Consorcio Gaviones 95

Fecha registro	Tema	Descripción
13 /06/2025	Autocuidado en obras civiles	El componente social del Consorcio Estabilización vial, realizó sensibilizaciones a los trabajadores de obra y operarios en el tramo vial de Laguna Verde

Fuente: Propia

Tabla 7. Indicadores de cumplimiento del Programa Educación y capacitación al personal vinculado al contrato. Consorcio Gaviones 95

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	1 sensibilizaciones realizadas x100 / 1 sensibilizaciones requeridas x 100	100 %

Fuente: Propia

6.1.3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Para el siguiente programa, la interventoría adelantará labores de verificación, supervisión, acompañamiento a los diferentes momentos establecidos para el programa, con el propósito de garantizar el cumplimiento de este, desde el seguimiento a las siguientes actividades.

6.1.3.1 Reuniones participativas

La interventoría verificará que las reuniones se realicen de acuerdo a los parámetros, requisitos y generalidades propuestos por el contratista (CONSORCIO GAVIONES 95) La Interventoría revisará y determinará la información a presentar en las reuniones, los formatos a aplicar, el lugar de la reunión, a tratar en las reuniones y el comité veedor.

El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del Proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

El Contratista deberá convocar a la población del área de influencia directa del proyecto, Alcaldías Local, Organizaciones de comerciantes Administradores, Juntas de Acción Comunal – JAC, entre otras.

Dichas reuniones, por ser masivas y tratarse de personas de veredas distantes pero pertenecientes al mismo sector o tramo, se realizarán de manera presencial serán convocados por el contratista.

6.1.3.1.1 Reuniones de inicio

Cuando se realicen las reuniones de inicio de obra, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando de la asistencia, así mismo se reportará los aciertos y desaciertos. El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

Durante el periodo comprendido no se realiza reuniones de inicio por no ser necesario. No aplica.

6.1.3.1.2 Reunión de avance

Cuando se realicen las reuniones de avance de obra cumpliendo con un 50%, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información y evidenciando el porcentaje de asistencia, así mismo se reportará los aciertos y desaciertos, si se cumplió con le estipulado para las reuniones de avance y con el resumen de la evaluación de desempeño que reporte el Contratista. Estas reuniones tienen como fin informa sobre el estado de avance de las obras constructivas y cronograma de ejecución de las actividades faltantes, cuando se complete la ejecución del 50% de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales, informar la fecha de finalización de las obras, y responderá las inquietudes de los asistentes.

No aplica por no ser necesario realizar reuniones de avance.

6.1.3.1.3 Reunión de Finalización

Se realizarán las reuniones de finalización de obra cuando se complete el 95% de las labores constructivas, la Interventoría hará el respectivo reporte donde presentara los resultados de finalización, consolidando la información de asistencia, así mismo se reportará los aciertos y desaciertos, si se cumplió con lo estipulado para las reuniones de finalización y con el resumen de la evaluación de desempeño que reporte el Contratista.

Las reuniones de finalización tienen como fin presentar a la comunidad, las entidades encargadas del contrato, cuando se complete el 95% de la ejecución de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales informa la fecha de finalización de obra, y responderá las inquietudes de los asistentes.

No aplica por no ser necesario realizar reuniones de finalización.

6.1.3.1.4 Reuniones Extraordinarias.

Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en los casos en que el desarrollo del contrato lo amerite, o que la comunidad, la Interventoría, la supervisión del Fondo de desarrollo Rural de Sumapaz lo solicitaron. Estas reuniones se llevaron a cabo con el fin de tratar asuntos no convencionales y que por su naturaleza o urgencia requerían un espacio para ser revisados. La Interventoría hará el respectivo reporte donde, consolida la información y evidencia el porcentaje de asistencia, así mismo se reportará los aciertos y desaciertos, si se cumplió con lo estipulado para las reuniones.

No aplica por no ser necesario realizar reuniones extraordinarias.

6.1.3.1.5 Reuniones Comité de participación Ciudadano. (veeduría)

La Interventoría realizará acompañamiento, al comité veedor conformado por la comunidad, supervisará las convocatorias y cumplimiento de las solicitudes de las reuniones que programe el comité, los temas a tratar y los compromisos establecidos en cada reunión.

No aplica por no ser necesario realizar reuniones de Comité de participación Ciudadana.

Tabla 8: Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación comunitario.

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	
Reuniones de Inicio	**CUMPLIMIENTO**
# de reuniones de inicio programadas en el periodo # de reuniones de inicio ejecutadas en el periodo 0 x100 0	NA
Reuniones Extraordinarias	
# de reuniones extraordinarias programadas en el periodo # de reuniones extraordinarias ejecutadas en el periodo 0 x100 0	NA
Reuniones de Finalización	
# de reuniones de finalización programadas en el periodo # de reuniones de finalización ejecutadas en el periodo 0 x100 0	NA
Reuniones Comité de participación Ciudadana	
# de reuniones de comité veedor programadas en el periodo # de reuniones de comité veedor ejecutadas en el periodo 0 x100 0	NA
ANALISIS DE LOS INDICADORES	A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio no realiza reunión por no ser necesario.

Fuente: Propia

6.1.3.1.6 Valla Informativa Móviles

Para la etapa de construcción del contratista instalará las vallas informativas la cual se encuentra ubicada en el frente de obra.

El numeral 5.4.2 se aclara que en los comités tanto sociales como integrales, la interventoría ha solicitado la reposición de los pasacalles el cual está establecida contractualmente en el anexo técnico***" Pasacalles Informativos de Inicio/Fin, El contratista deberá suministrar, instalar y mantener los pasacalles en el inicio/fin de cada tramo a intervenir según las dimensiones descritas en el PMT, previa aprobación por parte de la interventoría".*** por tanto el Consorcio realizará reposición de pérdida o daño de las ya instaladas por la UAERMV, pero esto no indica que reemplace la valla informativa móvil, por cuanto que esta también debe realizarse la instalación de acuerdo al anexo técnico donde indica, en la página 115, numeral 10 Señalización ***" Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas***

informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes". Por lo anterior, en el informe separar y describir mes a mes el cumplimiento a la instalación vallas informativas móviles y la reposición de los pasacalles instalados por la UAERMV.

Durante el desarrollo del presente informe el contratista inicia las actividades de adecuación para el inicio de las actividades de intervención técnicas, la interventoría solicita su implementación en comités de seguimiento integral una vez se inicien las actividades de ejecución de obra.

6.1.3.1.7 Pasacalles.

El numeral 5.4.2 se aclara que en los comités tanto sociales como integrales, la interventoría ha solicitado la reposición de los pasacalles el cual está establecida contractualmente en el anexo técnico***," Pasacalles Informativos de Inicio/Fin, El contratista deberá suministrar, instalar y mantener los pasacalles en el inicio/fin de cada tramo a intervenir según las dimensiones descritas en el PMT, previa aprobación por parte de la interventoría".*** por tanto el Consorcio realizará reposición de pérdida o daño de las ya instaladas por la UAERMV, pero esto no indica que reemplace la valla informativa móvil, por cuanto que esta también debe realizarse la instalación de acuerdo al anexo técnico donde indica, en la página 115, numeral 10 Señalización ***" Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes"***. Por lo anterior, en el informe separar y describir mes a mes el cumplimiento a la instalación vallas informativas móviles y la reposición de los pasacalles instalados por la UAERMV.

De acuerdo a lo descrito anteriormente la interventoría solicita que el Consorcio realice reposición de pasacalle faltante en el frente de obra Capitolio lo realizará el consorcio, es de aclar que la Unidad de mantenimiento vial realizó su instalación en este frente de obra, el Consorcio realizarán reposición. A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio no ha hecho la reposición del pasacalle en el tramo vial de Santo Domingo - Capitolio. La interventoría desde el primer comité de seguimiento comité integral # 42 realizado el 9 de mayo del 2025 hasta el comité de seguimiento integral # 49 realizado el 27 de junio del 2025 y por medio del comunicado 186-1-724 el 26 de junio del 2025, realiza la solicitud de las actividades al profesional social del Consorcio Gaviones 95.

En cuanto al tramo vial de la vereda Laguna Verde, quien debe realizar su instalación es la Unidad de Mantenimiento Vial por cuanto que es un tramo nuevo a iniciar.

- ***Ver A1: Comunicado 186-1-724 el 26 de junio del 2025*.**

6.1.3.1.8. Volante de información de actividades

Estas piezas de divulgación que incluyen información sobre la fecha de actividades de obra relevante como programación de cierres viales él debe incluir el número de la línea de atención a la ciudadanía y otros aspectos y características específicas que el Contratista, la Interventoría y el Fondo de Desarrollo rural del Sumapaz. Consideren pertinentes y relevantes. A continuación, se presenta la trazabilidad del volante informativo diseñados y entregados por el Consorcio, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría.

6.1.3.1.9 Volantes informativos y/o convocatorias

Los volantes se entregarán a la comunidad con información sobre contingencias, convocatorias e información de interés del proyecto, es decir, ante situaciones no previstas que afecten la cotidianidad de la población, se deberá informar inmediatamente a la población que resulte afectada.

El Consorcio hace entrega del volante informativo de inicio de obra en el tramo vial de Laguna verde. A continuación, se presenta la trazabilidad para su entrega.

El consorcio hace entrega del volante el miércoles 25 de junio del año en curso.
La interventoría realiza observaciones estas son subsanadas el jueves 26 de junio del 2025, la interventoría da aval para su entrega y solicita sean entregado de inmediato.
De igual manera recuerda al contratista que antes de iniciar actividades técnicas se debe informar a la comunidad por medio de un volante informativo por lo menos de 3 a 5 días de anticipación (Inicio de obras Programación de cierres, vecindad entre otras actividades). Como se establece contractualmente en el Plan de Gestión social.
La interventoría informa al contratista que no se cumple con el tiempo establecido para ducha actividad, los cuales son entregado el 27 de junio del año en curso a la comunidad.

El contratista realizó entrega de 12 piezas divulgativas volante de inicio de obra La interventoría realizó revisión y aval al mismo para ser distribuidos a la comunidad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



***Foto: 5*: Entrega de volantes de inicio de obra Laguna Verde**



Foto: 6: Entrega de volantes de inicio de obra Laguna Verde.


Inicio de
construcción de filtros alcantarillas y cunetas
Vereda Laguna Verde

Foto: 7: volantes de inicio de obra Laguna Verde.

Tabla 9: Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria, volantes.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	12 volantes entregados/ 12 volantes requeridos X100 =	100%
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Consorcio Gaviones 95, realiza diseño y entrega de volante informativo de inicio de actividades técnicas hidráulicas, los cuales son revisados y aprobados por la interventoría, son distribuidos por la comunidad, realizó entrega de piezas divulgativas de invitación a reunión de inicio de obra en el tramo vial de Laguna Verde, como se establece contractualmente.	

Fuente: Propia

A2

- ***Trazabilidad pantallazo de entrega y aprobación del volante informativo de invitación a reunión de inicio de obra en el tramo vial de Laguna Verde.***

6.1.3.1.10 Afiche informativo

Son piezas de divulgación mediante las cuales se describen generalidades de la obra y datos de contacto del Contratista. Estos deben ser instalados en el Punto fijo de atención a la comunidad y en los Puntos fijos Información y se realizará su reemplazo cuando se encuentren deteriorados, contado con el aval de la interventoría.

Durante el desarrollo del presente informe el profesional social realizó entrega del afiche informativo nuevamente presenta observaciones, se encuentra pendiente entrega.

6.1.3.1.11 Puntos fijos informativos

Para efectos del presente contrato, el ejecutor, instalaran los puntos de información, propuestos en el plan de gestión social, la interventoría realizará seguimiento en su instalación, estos permitirán una amplia divulgación de la información del contrato.

Durante el desarrollo del presente informe el Consorcio no ha realizado instalación de puntos fijos informativos, la interventoría solicita su instalación por cuanto que se entregan volantes informativos de inicio de obra. La interventoría solicita su instalación.

6.1.3.1.12. Actas de vecindad

El acta de vecindad es un documento que se elabora por medio de una visita domiciliaria a cada uno de los predios que se encuentran en el área de influencia directa de la obra. El objetivo de esta actividad es establecer las condiciones físicas iniciales de los predios a fin de determinar variaciones en las mismas derivadas de la ejecución del proyecto.

Durante el desarrollo del presente informe el Consorcio no ha hecho entrega del consolidado de actas de vecindad realizadas en Capitolio, San Antonio y Laguna Verde. La interventoría ha realizado requerimiento en los comités de seguimiento integral y por medio del comunicado 186-1-724 el 26 de junio del 2025,

***Ver A1: Comunicado* 186-1-724 el 26 de junio del 2025.**

6.1.3.1.13. Acta de compromiso

Las actas de compromiso es un documento que se elabora en caso de ser necesario hacer algún compromiso o acuerdo con la comunidad, institución o comerciante, con el fin de realizar alguna actividad de obra que repercuta con la comunidad, el contratista levantará el acta de compromiso.

La Interventoría realizará el seguimiento del cumplimiento o no, de las actas de compromiso y se notificará en el informe correspondiente, se firma el acta por el componente social y técnico, cuando se le cumpla al propietario con los compromisos registrados en el acta.

Durante el desarrollo del presente informe no se realizan actas de compromiso por no ser necesario en Laguna Verde.

Se encuentra pendiente la entrega de las actas de compromiso de los acopios en cuanto a apertura cierre del tramo vial de Capitolio, compromiso que se adquirió en el recorrido socio ambiental realizado el 14 de mayo del año en curso. La interventoría ha realizado requerimiento en los comités de seguimiento integral y por medio del comunicado 186-1-724 el 26 de junio del 2025 Ver A1.

6.1.3.1.14. Acta de gestión adelantada

Las actas de gestión adelantada tienen como fin, abordar las inquietudes y resolver las dudas planteadas por la comunidad y brindar una respuesta clara a las preguntas planteadas.

La Interventoría realizará el seguimiento del cumplimiento o no, de las actas de compromiso y se notificará en el informe correspondiente. Se firma el acta por el componente social y técnico, cuando se le cumpla al propietario con los compromisos registrados en el acta. Durante el periodo comprendido no se realizan actas de compromiso por no ser necesario.

Durante el desarrollo del presente informe no se realiza esta actividad por no ser necesario.

Tabla 10: Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# actas de vecindad del frente de obra Capitolio realizadas / # actas de vecindad del frente de obra de Capitolio requeridas x 100	NA
	# de acta de compromiso realizadas x100 / # de acta de compromiso requeridas x 100	NA
	# actas de gestión adelantada realizadas x100 / # actas de gestión adelantada requeridas x 100	N/A
	# ejercicio de control social realizadas x100 / # ejercicio de control social requeridas x 100	NA
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Consorcio Gaviones 95, Durante el desarrollo del presente informe no realiza actas de vecindad, ni de compromiso en el frente de obra de Laguna Verde, por no ser necesario.	

Fuente: Propia

6.1.4. PROGRAMA DE CULTURA VIAL

Este Programa tiene como fin generar nuevas actitudes de responsabilidad en relación con el manejo de la infraestructura vial y su entorno por parte de la población vecina u usuaria. Las sensibilizaciones de sostenibilidad y cuidados de las vías se realizarán al finalizar las intervenciones, con el fin de apropiar a la comunidad del cuidado y conservación de las vías a lo largo del tiempo. Por lo anterior, se darán a conocer las recomendaciones que la comunidad debe tener en cuenta para conservar las vías intervenidas permitiendo que sean sostenibles.

Las sensibilizaciones quedaran soportadas por un acta, lista de asistencia y registro fotográfico y se realizará una vez se termine el proceso constructivo.

No aplica. Por no ser necesario.

6.1.5. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA

Este programa busca generar oportunidades laborales a las comunidades donde se ejecute el proyecto, contratando a un porcentaje de la población de mano de obra no calificada, Vulnerable y mujeres esta última regida por el decreto 332/2020, donde indica que para el mes de junio del 2023 para proyecto de construcción se contrate un 13.8%, que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas. Esto facilitará que haya una mayor apropiación del trabajo realizado y se evitarán conflictos con la comunidad.

6.1.5.1 Mano de obra no calificada contratación población vulnerable

La contratación de población vulnerable, la interventoría verificará el cumplimiento en la contratación de población vulnerable contratado. Dado lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a la contratación de personal en situación de vulnerabilidad, establecido contractualmente en el Decreto 380 del 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "Por ***el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones".***

6.1.5.2 Mano de obra no calificada de la localidad

Contratación de mano de obra no calificada, la interventoría verificará el cumplimiento del 75% del personal no calificado de la localidad del Sumapaz beneficiada por la ejecución de las obras. De acuerdo a lo enunciado en el anexo técnico que a la letra dice "Teniendo en cuenta la base de datos suministrada por el Fondo de Desarrollo Local del Sumapaz (FDLS) se indicó que, aproximadamente el 75% de la mano de obra no calificada está disponible para la vinculación al proyecto. Por cuanto se hace necesario vincular al personal de mano de obra local según el porcentaje descrito, lo cual sugiere disponer de personal foráneo en un 25% aproximadamente".

6.1.5.3 Contratación de mujeres.

De acuerdo al Decreto Distrital 332 de 2020, "**VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO.** Sin perjuicio de la autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y organismos distritales, el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, según corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales de los procesos de selección pública y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o contrato,

según los porcentajes que se establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales.

La vinculación de mujeres será diferenciada por rama, así:

Ramas de actividad económica	**Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contratos**		
	A partir del 1 º de junio de 2021	**A partir del 1º de junio de 2022**	**A partir del 1 º de junio de 2023 en adelante**
Construcción	6,8%	9,3%	13,8%

6.1.5.4 Contratación de trabajadores en condición de discapacidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal con discapacidad: "Que el numeral 7 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 establece que el Gobierno Nacional debe implementar mediante decreto reglamentario un sistema de preferencias aplicables a los procesos de adjudicación y celebración de contratos de organismos estatales para quienes vinculen laboralmente a personas con discapacidad debidamente certificadas, en un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores, lo que se encuentra reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, establecer un sistema de preferencias como factor de desempate para los proponentes que acrediten por lo menos el 10% de su nómina personas con discapacidad en el respectivo proceso de contratación".

6.1.5.5 Contratación de trabajadores en condición de vulnerabilidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad tales como:

-Madres cabeza de hogar
-Desplazados
- Estratificación 0- 1

Estas condiciones deben ser demostradas mediante certificado que le acredite como persona vulnerable, para ser tenidas en cuenta durante el proceso de selección.

Así mismo en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad".

Para el cierre del presente informe el componente social reporta un total de 16 trabajadores entre mano de obra calificada 15 y no calificada 1 el cual pertenece a la localidad del Sumapaz. Es de aclarar que este personal reportado es comparado con el reporte que el contratista realiza al componente SST de interventoría.

Tabla 11. Consolidado personal consorcio Gaviones 95

PERSONAL TOTAL	PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA	PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA	TOTAL, MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	TOTAL, MANO DE OBRA NO CLAIFICADA VULNERABLE	TOTAL, DE MUJERES CONTRATADAS
16	15	1	1	1	3
PORENTAJES		PORCENTAJE % MONC	PORCENTAJE % MONCL	PORCENTAJE % VULNERABLE	PORCENTAJE % MUJERES
		6,25 %	100 %	6,25 %	18.75 %

Fuente: Propia

De acuerdo a los indicadores se evidencia que el consorcio cumple con la contratación de mano de obra no calificada por cuanto que cuenta con un (1) trabajador de la zona con un 100 % y de acuerdo con lo establecido contractualmente se debe contratar un 75 %, la interventoría en comité de seguimiento solicita se continue con el cumplimiento a lo establecido contractualmente.

A3:

- ***Listado de personal Consorcio Gaviones 95***

6.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

El área social de la Interventoría realiza las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por el ejecutor y los contratistas en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico.

6.2.1 Listas de Chequeo del Contratista

A la fecha de cierre del presente informe la interventoría realiza la lista de chequeo donde evalúa la gestión realizada en el componente social basados en cada programa que establece las fichas PAGA, la calificación durante el periodo comprendido es de 50 %. El profesional social no ha dado cumplimiento en la entrega de los productos establecido contractualmente.

A4

- ***Lista de chequeo mes de junio Consorcio Gaviones 95.***

6.2.2 Revisión documental

Durante el periodo de este informe se realizó la consulta de los documentos legales:

- Contratos de Interventoría y Contratistas
- Anexo técnico.
- Plan de gestión Social.
- Comunicados
- Informes mensuales.
- correspondencia

A5

- ***Copia Bitácora Consorcio Gaviones 95.***

6.2.3 Informes Mensuales

En la siguiente tabla se registran los informes mensuales presentados, por el contratista, en el periodo comprendido el Consorcio Estabilización vial el cual se describe su trazabilidad.

Tabla 12: Informes mensuales contrato de obra N° 478 Consorcio Gaviones 95

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
1	9 al 30 de agosto del 2022	El 14 de marzo del 2024, el Consorcio Gaviones 95 remite respuesta a interventoría a las observaciones realizadas por la interventoría, quien da respuesta a los informes mediante comunicado 186-1- 663 el 26 de mayo del 2025. Donde aprobación a los mismos por cuanto que se evidencia cumplen con los requerimientos mínimos del componente se aprueba los informes del 1 al 9 del 9 de agosto del 2022 al 22 de abril el 2023, y presenta observaciones los informes 10, 11, 12
2	1 al 30 de septiembre del 2022	
3	1 al 31 de octubre del 2022	
4	1 al 30 de noviembre del 2022	
5	1 al 31 de diciembre del 2022	
6	1 al 31 de enero del 2023	
7	1 al 28 de febrero del 2023	
8	1 al 31 de marzo del 2023	
9	1 al 22 de abril de 2023	

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
10	5 de febrero al 28 de febrero del 2024	Pendiente aprobación, presenta observaciones por parte de interventoría mediante comunicado 186-1- 663 el 26 de mayo del 2025, el 26 de junio el profesional social hace entrega del informe con las observaciones subsanadas, el cual presenta nuevamente observaciones, a la fecha de cierre del presente informe el consorcio no ha hecho entrega.
11	1 al 31 de marzo del 2024	Pendiente aprobación presenta observaciones por parte de interventoría mediante comunicado 186-1- 663 el 26 de mayo del 2025, el 26 de junio el profesional social hace entrega del informe con las observaciones subsanadas, el cual presenta nuevamente observaciones, a la fecha de cierre del presente informe el consorcio no ha hecho entrega.
12	1 al 16 de abril del 2024	Pendiente aprobación, presenta observaciones por parte de interventoría a la fecha de cierre del presente informe el consorcio no ha hecho entrega.,
13	1 al 30 de abril del 2025	Pendiente aprobación, a la fecha de cierre del presente informe el consorcio no ha hecho entrega.,
14	1 al 31 de mayo del 2025	El profesional social hace entrega del informe mensual social # 14 por correo electrónico el 16 de junio del año en curso, la interventoría emite respuesta y da observaciones mediante comunicado 186-1-718 el 24 de junio del 2025, a la fecha de cierre del presente informe no ha hecho entrega del mismo.
15	1 al 30 de junio del 2025	A la fecha de cierre del presente informe el consorcio no ha hecho entrega.

Fuente: Propia

A6

- ***Comunicado 186-1-718 el 24 de junio del 2025, observaciones informes mensuales 14 V1.***

6.2.4. Informes Semanales

Durante el desarrollo del presente informe el Consorcio Gaviones 95, no ha hecho entrega de los informes semanales. La interventoría solicita su entrega en los comités de seguimiento social e integral y mediante el comunicado 186-1-724 Solicitud de documentación y actividades pendiente componente social. Ver A1

6.2.5. Comités de Seguimiento Integral

Durante el desarrollo del presente informe se realizan cuatro comités de seguimiento integral, los cuales relaciono a continuación.

Tabla 13: Comité integral de seguimientos Consorcio Gaviones 95

No COMITÉ	FECHAS
46	06/06/2025
47	27/06/2025

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto: 8: Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 46



Foto: 9: **Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 47.**

6.2.6 Comités de Seguimiento social

Durante el desarrollo del presente informe se realizan un comité de seguimiento social, con el de realizar seguimiento al componente social.

Tabla 14: Comité integral de seguimientos Consorcio Gaviones 95.

No COMITÉ	FECHAS
8	12/06/2025
9	26/06/2025

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO

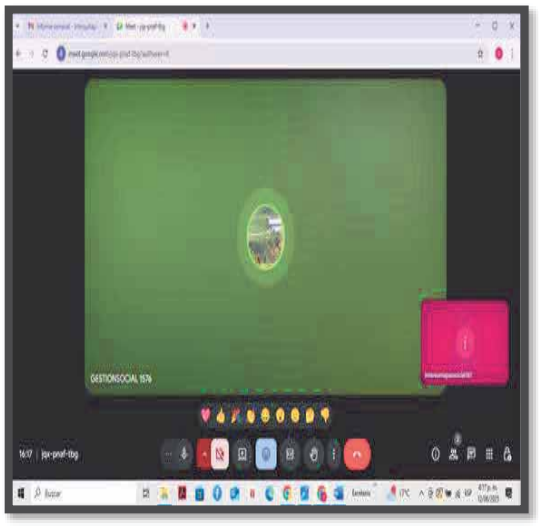


Foto: 10: Comité de seguimiento social contrato 478 - 2022 No 8

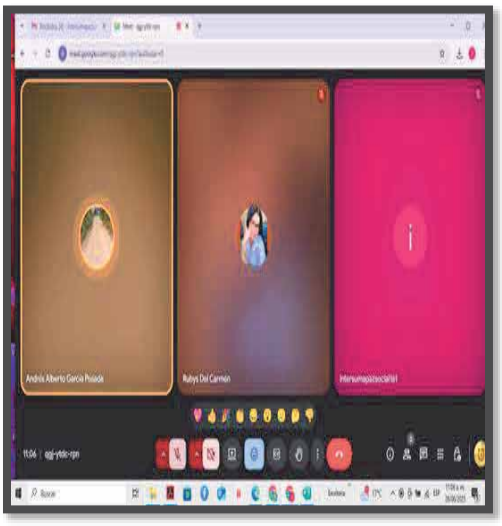


Foto: 11: **Comité de seguimiento social contrato 478 - 2022 No 9.**

A7

- **Acta de comité social N° 8 y N° 9**
-

6.2.7 Correspondencia enviada y recibida.

Durante el desarrollo del presente informe se genera correspondencia la cual se relaciona a continuación:

Tabla 15: Correspondencia recibida y enviada Contrato

Correspondencia recibida			Correspondencia enviada		
Consecutivo	**Asunto**	**Fecha**	**Consecutivo**	**Asunto**	**Fecha**
D19	. Respuesta al comunicado 186-1-701	28/05/2025.	186-1-701	Solicitud de Paz y Salvos pagos pendientes a la comunidad Consorcios Gaviones 95.	22/05/2025
			186-1-716	Respuesta al comunicado D-3 del 3 de marzo del 2025 y D 19 del 28 de mayo del 2025	24/06/2025
			186-1-724	Solicitud de documentación y actividades pendiente componente social Consorcios Gaviones 95.	26 /06/2025
			86-1-718	*Respuesta al correo electrónico del 16 de junio del 2025. Informe mensual social N° 14 – mayo – 2025. Consorcio Gaviones 95.*	24/06/2025

Fuente: Propia

Ver A1 y A6

- **Correspondencia enviada y recibida.**

6.2.8 Estado del Contrato

Estado del contrato 478 del 20/05/2022: **Activo.**

7. CONTRATO DE OBRA No. 479 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.

7.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El plan de gestión social se encuentra aprobado por la interventoría a continuación se presenta la trazabilidad a la aprobación al documento.

Tabla 16: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social Contrato No 479/20. Consorcio Estabilización Vial

FECHA	TRAZABILIDAD	APROBACIÓN
4 de mayo 2022. 1 de diciembre del 2024	La interventoría mediante comunicado 186-1-044 realiza aprobación. la interventoría solicita la actualización por cuanto que se encuentra enmarcadas con los lineamientos del modelo establecido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL); las cuales se adaptan al alcance y la misionalidad de la UAERMV, por tal motivo el documento debía ser actualizado con las fichas PAGA V4. El 1 de diciembre del 2023, el consorcio Estabilización vial hace entrega del Plan de gestión social V3, actualizado, mediante comunicado CEV/22-235. La interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-430, Donde la interventoría da aval al documento.	29 de diciembre de 2023.

Fuente: Propia

7.1.1 PERSONAL DEL COMPONENTE SOCIAL

Tabla 17: Profesional social Contrato No 479/2022 Consorcio Estabilización Vial.

PROFESIONAL	CARGO	DEDICACIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Trabajadora Social Alejandra Limas P. aprobada por la interventoría el mediante comunicado 186-1-645 el 11 de abril del 2025.	Profesional Social	100 %	Acreditar Experiencia General mínimo Cinco (5) Años.	Profesional Social en al menos tres (3) contratos de obra pública.

Fuente: Propia

7.1.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Este programa establece la instalación por parte del Contratista de un sistema de atención al ciudadano, en el que se registren de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos como: peticiones, quejas, reclamos, denuncias sugerencias, felicitaciones, denuncias (PQRSFD), interpuestos por los ciudadanos de manera presencial, escrita, telefónicamente, correo electrónico y/o redes sociales.

7.1.2.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Los puntos de atención a la comunidad (PUNTO PAC) debe estar dotada de:

- Baño
- Línea telefónica exclusiva
- Cartelera informativa
- Computador con los programas necesarios
- Sillas y escritorio para la persona encargada de la atención.
- Espacio, sillas disponibles, chaquetas según el manual de identidad visual.
- Piezas de información, planos pertinentes para el proyecto, afiches y demás información pertinente para el proyecto.

Durante el periodo comprendido el Consorcio Estabilización vial, continua con la instalación de un sistema de atención al ciudadano en el que se registren de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos peticiones, quejas, reclamos, denuncias sugerencias, felicitaciones, denuncias (PQRSFD), interpuestos por los ciudadanos por medio presencial, escrito, telefónico correo electrónico y/o redes sociales, el cual cuenta con los siguientes canales de comunicación.

Tabla 18. Información Punto atención a la comunidad Contrato No 479/2022 Consorcio Estabilización Vial

PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO CONTRATO DE OBRA No. 479 DE 2022	
Dirección	Vereda La Unión (pueblo) Cra 3 N.º 3- 43
Línea telefónica	3204461693 lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Sábados de 7:30 a.m. a 11:00 a.m.
Correo electrónico	socialconsorcioev@gmail.com
Horario de atención	Horario de atención: miércoles, jueves de 7:30 a.m. a 12:30 p.m.

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto: 12: **Punto de atención fijo a la comunidad CEV**

El contratista cuenta con puntos de atención de móvil a la comunidad, la carpa se ubicó en los tramos de obra activas (San Antonio El Toldo y Unión Tunales. Sin embargo, la profesional social hace recorridos por todo el tramo para recoger inquietudes de los residentes del área. Los horarios de atención móvil están designados de la siguiente manera:

- Unión Tunales: lunes de 9:00 am a 1:00 pm
- San Antonio El Toldo: martes y jueves de 9:00 am a 1:00 pm

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto: 13: **Punto de atención móvil de atención a la comunidad CEV Unión Tunales.**



Foto: 14: **Punto de atención móvil de atención a la comunidad CEV San Antonio El Toldo.**

7.1.2.2 Recorridos

El contrista está en la obligación de realizar recorridos, con el fin de verificar la atención con la comunidad, estableciendo puntos móviles, permitiendo canalizar de forma personalizada las manifestaciones de la comunidad, La interventoría realizará seguimiento y verificación en recorridos.

La interventoría durante el periodo comprendido realiza recorrido conjunto con el fin de verificar en campo las actividades del componente social ejecutadas.

Tabla 19: Recorrido Contrato No 479/2022, Consorcio Estabilización Vial.

ID	Fecha	Tramo	Observaciones	Registro fotográfico
1	5 de junio del 2025 11 de junio del 2025 27 de junio del 2025	Frente de obra Unión Tunales y San Antonio El Toldo.	La interventoría realiza recorridos, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades del componente social.	 **Foto: 15: Recorrido conjunto Unidad de Mantenimiento vial - Consorcio Estabilización vial.**  ***Foto: 16:*** **Recorrido conjunto Unidad de Mantenimiento vial - Consorcio Estabilización vial.**


				 ***Foto: 17:*** **Recorrido conjunto Unidad de Mantenimiento vial - Consorcio Estabilización vial.**

Fuente: Propia

Línea WhatsApp:

Durante este periodo, el contratista Consorcio Estabilización Vial cuenta con un grupo de WhatsApp que incluye personas de la comunidad en general, el cual es utilizado, para brindar información del contrato a la comunidad de forma instantánea, así mismo atender las solicitudes ciudadanas que se puedan presentar, durante el periodo comprendido el contratista hace entrega de información en el grupo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

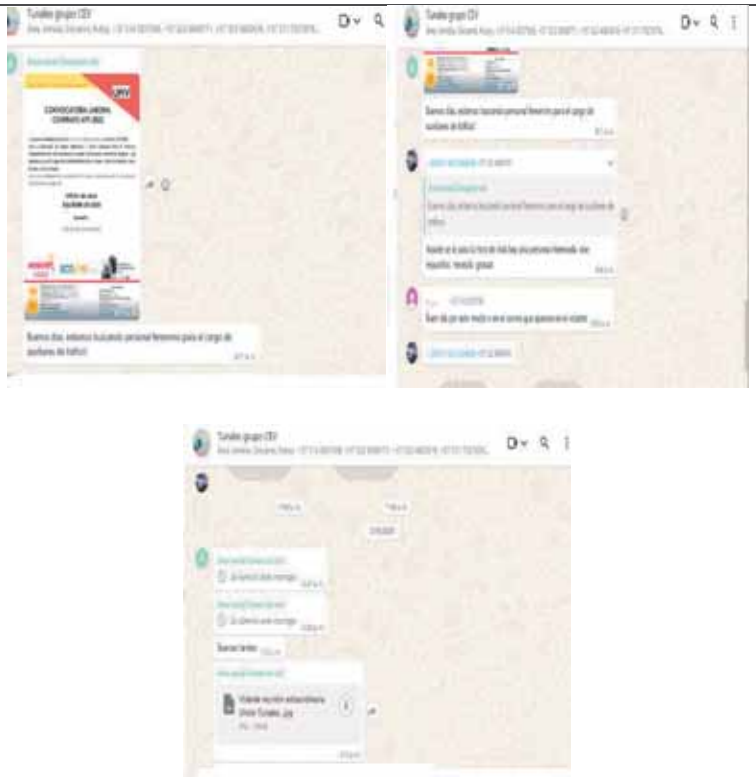

Unión Tunales



San Antonio El Toldo

Foto: 18: Registros grupo de WhatsApp comunidad de San Antonio El Toldo y Unión Tunales.

7.1.2.3 Mesa de trabajo

Durante el periodo comprendido se realizó una mesa trabajo las cuales se realiza a continuación su trazabilidad.

- 20 de junio del 2025, se realizó mesa de trabajo con la profesional social y técnico del Consorcio Estabilización vial, con el fin de resolver inquietudes que se tienen en los informes mensuales 14, 15, 16,17 con información de los datos y porcentajes de contratación de mano de obra no calificada local y mujeres y anexos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO


	
Foto: 19: **mesa de trabajo CEV**	***Foto: 20:*** **mesa de trabajo CEV**

Tabla 20: Indicadores de cumplimiento del Programa Atención al Usuario.

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO		
INDICADOR	**FORMULA**	**CUMPLIMIENTO**
PRODUCTIVIDAD	Línea telefónica solicitada/Línea telefónica implementada N° X 100 = N°	**100 %**
PRODUCTIVIDAD	Correo electrónico solicitado / Correo electrónico implementado N° X 100 = N°	**100 %**

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	Formato de control de atenciones diligenciado/Formato de atenciones recibidas N° x 100 = 1	**NA**
PRODUCTIVIDAD	Recorridos /Realizados 4 X100 = 4	**100 %**
PRODUCTIVIDAD	Total, de equipamiento básico instalado / total de equipamiento básico requerido 1 x 100 = 1	**100 %**
ANALISIS DE LOS INDICADORES	EL Consorcio Estabilización Vial, del componente social realiza recorridos constantes con el fin de realizar acompañamiento al área técnica y atender de manera personalizada a la comunidad. Así mismo la interventoría y el Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz, realiza recorridos, con el fin de revisar los avances y cumplimientos de la ejecución del contrato. En cuanto a la implementación del Punto de atención al usuario. A la fecha de cierre del presente informe la interventoría evidencia en recorrido realizados que cuenta con el punto fijo el cual es adecuado para la atención de la comunidad. A la fecha no se presenta	

Fuente: Propia

Durante el periodo comprendido la interventoría recibe una queja por parte de la señora Eva Sánchez, arrendataria del predio ubicado en la abscisa k1+554 de San Antonio El Toldo y solicita al consorcio recpcionar la queja y hacer seguimiento al caso. Indica que que "los trabajadores de la obra están utilizando los potreros como baño, y esto puede enfermar las vacas".

En respuesta a esta queja desde el componente social del consorcio le dio al personal de obra una retroalimentación de las normas internas haciendo énfasis en el uso de los baños dispuestos, además sensibilizar a los participantes frente al cuidado y respeto por el entorno natural.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

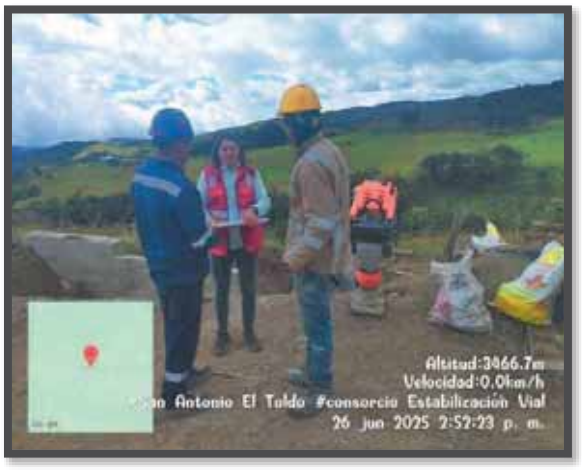


Foto: 21: **Sensibilización *con el personal de obra CEV***

7.1.3 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO.

7.1.3.1 Procesos de sensibilización

Se establecerá dentro de las sensibilizaciones al personal vinculado al proyecto en todas las áreas sobre temas relacionados con las medidas de manejo ambiental y social del proyecto.

La sensibilización al personal vinculado al proyecto contiene los siguientes elementos:

- Descripción técnica del proyecto
- Presentación de las obligaciones de gestión social de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
- Objetivos, alcances y operaciones de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
- Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales (política general en temas laborales, recursos humanos, condiciones de trabajo y términos de empleo organizaciones laborales, no discriminación e igualdad de

oportunidades, reducción y mecanismos de protección de la fuerza laboral, mecanismo de atención a quejas y reclamos).

- Seguridad vial en obra

- Normas de convivencia con las comunidades laborales sociales y bióticas enfatizando en las limitaciones al personal procedente de otros lugares para la extracción de fauna, flora y demás recursos de los pobladores vecinos del área.

- Mensualmente se realizarán charlas de refuerzo de los conceptos ya incluidos y se complementará con información sobre el avance de las obras, problemas surgidos durante las mismas y soluciones encontradas a modo de lecciones aprendidas. De igual forma se reforzará en estas charlas, aquellos temas que se hayan detectado como de alta sensibilidad para las comunidades y para los colaboradores del proyecto.

Durante el periodo comprendido el Consorcio realizo sensibilización con el personal que se encuentra contratado para el contrato.

Durante el desarrollo del presente informe el Consorcio Estabilización vial, realizó una sensibilización con el personal que se encuentra vinculado al proyecto el 20 de junio del 2025. A continuación, se presenta la trazabilidad.

Tabla 21. Consolidado acciones formación a empleados Consorcio Estabilización vial

Fecha registro	Tema	Descripción
20 /06/2025	Sensibilización al personal vinculado del Consorcio, acerca de no transportasen en la parte exterior de las camionetas y los minicargadores, ya que estos son acciones inseguras tanto para el pasajero, como para el conductor,	El componente social del Consorcio Estabilización vial, realizó sensibilizaciones a los trabajadores de obra y operarios en el frente de obra Unión Tunales y San Antonio El Toldo.

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto: 22: **Sensibilización con el personal del contrato.**

7.1.4 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Para el siguiente programa, la interventoría adelantará labores de verificación, supervisión, acompañamiento a los diferentes momentos establecidos para el programa, con el propósito de garantizar el cumplimiento del mismo, desde el seguimiento a las siguientes actividades.

7.1.4.1 Reuniones participativas

La interventoría verificará que las reuniones se realicen de acuerdo a los parámetros, requisitos y generalidades propuestos por el contratista (CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL).

La Interventoría revisará y determinará la información a presentar en las reuniones, los formatos a aplicar, el lugar de la reunión, a tratar en las reuniones y el comité de participación ciudadana.

El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del Proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

El Contratista deberá convocar a la población del área de influencia directa del proyecto, Alcaldías Local, Organizaciones de comerciantes Administradores, Juntas de Acción Comunal – JAC, entre otras.

Dichas reuniones, por ser masivas y tratarse de personas de veredas distantes pero pertenecientes al mismo sector o tramo, se realizarán presencialmente serán convocados por el contratista.

7.1.4.1.1 Reunión de inicio

Cuando se realicen las reuniones de inicio de obra, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información se establecerá porcentaje de cumplimiento con le estipulado para las reuniones de inicio. El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.
Durante el periodo comprendido el Consorcio Estabilización Vial no realiza reuniones de inicio por no ser necesario.

7.1.4.1.2. Reunión de avance

Cuando se realicen las reuniones de avance de obra cumpliendo con un 50%, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información se establecerá porcentaje de cumplimiento con le estipulado para las reuniones de avance. Estas reuniones tienen como fin informa sobre el estado de avance de las obras constructivas y cronograma de ejecución de las actividades faltantes, cuando se complete la ejecución del 50% de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales, informar la fecha de finalización de las obras, y responderá las inquietudes de los asistentes.

Durante el periodo comprendido el consorcio no realiza reuniones, por no ser necesario.
No aplica.

7.1.4.1.3. Reunión de Finalización

Cuando se realicen las reuniones de finalización de obra cuando se complete el 95% de las labores constructivas, la Interventoría hará el respectivo reporte donde presentara los resultados de finalización, se hará el respectivo reporte consolidando la información se establecerá porcentaje de cumplimiento con le estipulado para las reuniones de finalización. Las reuniones de finalización tienen como fin presentar a la comunidad, las entidades encargadas del contrato, cuando se complete el 95% de la ejecución de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales, informa la fecha de finalización de obra, y responderá las inquietudes de los asistentes.

Durante el desarrollo del presente informe el consorcio realizó una reunión extraordinaria, realizó encuentro con la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Toldo, esta con el objetivo de aclarar un supuesto descargue de material del consorcio en una zona de acopio de la Unidad de Mantenimiento Vial, ante esto la presidenta aclara que fue una equivocación, por lo cual firma el acta de reunión.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto: 23: Reunión extraordinaria presidenta de Junta de acción comunal San Antonio El Toldo.

7.1.4.1.4. Reuniones Extraordinarias.

Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en los casos en que el desarrollo del contrato lo amerite, o que la comunidad, la Interventoría, la supervisión del Fondo de desarrollo Rural de Sumapaz lo solicitaron. Estas reuniones se llevaron a cabo con el fin de tratar asuntos no convencionales y que por su naturaleza o urgencia requerían un espacio para ser revisados.

La Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información se establecerá porcentaje de cumplimiento con le estipulado para las reuniones extraordinarias.

Durante el periodo comprendido el consorcio no realiza reuniones, por no ser necesario. No aplica

7.1.4.1.5. Reuniones Comité Veedor

La Interventoría verificará la inscripción, al comité veedor realizada, estas se realizarán mensualmente, se supervisará la asistencia y cumplimiento de la reunión, los temas a tratar y los compromisos establecidos en cada reunión.

Durante el periodo comprendido el consorcio no realiza reuniones, por no ser necesario. No aplica.

Tabla 22. Indicadores de cumplimiento del Programa de Información y participación Comunitaria.

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	
Reuniones de Inicio	**CUMPLIMIENTO**
# de reuniones de inicio programadas en el periodo # de reuniones de inicio ejecutadas en el periodo # x100 #	NA
Reuniones Extraordinarias	
1 de reuniones extraordinarias programadas en el periodo 1 de reuniones extraordinarias ejecutadas en el periodo 1 x100 1	100%
Reuniones de Finalización	
# de reuniones de finalización programadas en el periodo # de reuniones de finalización ejecutadas en el periodo 0 x100 0	NA
Reuniones Comité Veedor	
# de reuniones de comité veedor programadas en el periodo # de reuniones de comité veedor ejecutadas en el periodo 0 x100 0	NA
ANALISIS DE LOS INDICADORES	A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio Estabilización Vial, realiza una reunión extraordinaria con la presidente de Junta de acción comunal de San Antonio El Toldo.

Fuente: Propia

7.1.4.1.6. Valla Informativa móviles

Para la etapa de construcción del contrato se instará las vallas informativas la cual se encuentra ubicada en el frente de obra al inicio y finalizando el tramo.

En el periodo comprendido el Consorcio Estabilización Vial, realiza la instalación de dos (2) vallas móviles en Unión Tunales, en el inicio y final del tramo y en el tramo de San Antonio Toldo (2) vallas móviles en Unión Tunales, en el inicio y final del tramo

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto: 24: **Instalación de valla informativa móvil Unión Tunales.**	***Foto: 25:*** **Instalación de valla móvil San Antonio El Toldo.**

7.1.4.1.7. Pasacalles

A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio cuenta con los tres pasacalles que estaban pendiente uno en el tramo de San Antonio El Toldo y dos en Tunales Bajo y Tunales Alto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

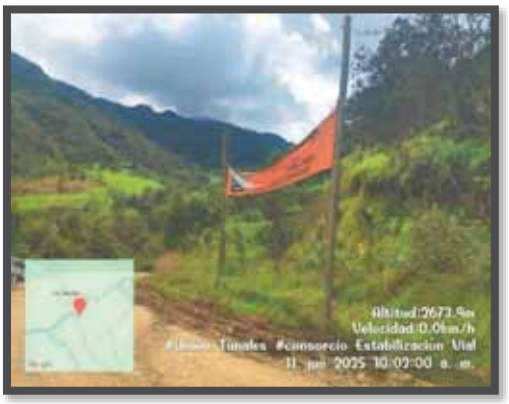
	
Foto: 26: Instalación pasacalle Unión Tunales	**Foto: 27: Instalación pasacalle Unión Tunales.**

Tabla 23. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	4 de vallas informativas instaladas x100 / 4 vallas informativas solicitadas.	100 %
	3 pasacalle instalados X 100/ 3 pasacalles solicitados.	100 %
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Consorcio Estabilización Vial, realiza la instalación de las vallas informativas móviles, cumpliendo con un 100% por cuanto que el tramo de San Antonio El Todo se encuentran completas. En cuanto a los pasacalles el Consorcio realiza reposición cuando se pierdan o deterioren. Solicitud realizada por interventoría en comités de seguimiento integral a la fecha de cierre del presente informe el consorcio realiza reposición.	

Fuente: Propia

7.1.4.1.8 Volante de información de actividades

Estas piezas de divulgación que incluyen información sobre la fecha de actividades de obra relevante como programación de cierres viales él debe incluir el número de la línea de atención a la ciudadanía y otros aspectos y características específicas que el

Contratista, la Interventoría y el Fondo de Desarrollo rural del Sumapaz. Consideren pertinentes y relevantes.

7.1.4.1.9 Volantes informativos y/o convocatorias.

Los volantes se entregarán a la comunidad con información sobre contingencias, convocatorias e información de interés del proyecto, es decir, ante situaciones no previstas que afecten la cotidianidad de la población, se deberá informar inmediatamente a la población que resulte afectada.

Durante el periodo comprendido el Consorcio Estabilización Vial realizó entrega de volantes informativo programación de horarios de los cierres viales en la construcción de cunetas y filtros. La interventoría durante el periodo comprendido del presente informe, evaluó y revisó los volantes, entregados por el Consorcio.

A continuación, se presenta la trazabilidad del volante informativo diseñados y entregados por el Consorcio, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría.

- El 11 y 19 de junio del 2025 el Consorcio Estabilización Vial realizo entrega de piezas divulgativas volante de mano de obra no calificada. Fueron aprobados en el mes de junio del 2025.La interventoría realiza revisión y aprobación del mismo, este es radiado por correo electrónico.
- El 27 de junio del año en curso el consorcio de Estabilización vial diseña y entrega a la presidenta de junta de acción comunal de Unión Tunales bajo, por es entregado por medio del grupo de WhatsApp del Consorcio y del grupo de la comunidad general WhatsApp, así mismo la interventoría apoyo con la convocatoria.

  Esta reunión es realizada con el fin de con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo del proyecto mejoramiento de vías terciarias, brinda el espacio para escuchar las inquietudes de la comunidad del sector de Unión Tunales quien convoca a una reunión extraordinaria para tratar temas de interés e inquietud colectiva, es por eso que el Consorcio Estabilización Vial, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz y la Interventoría Ecovias SAS, en el marco de las intervenciones que se están adelantando en el sector apoyan y garantizan divulgar y atender a la comunidad.

  Una vez aprobado los volantes informativos por interventoría y el Fondo de desarrollo rural de Sumapaz, son distribuido a la comunidad, los cueles se describen a continuación:

A8

- ***Correos electrónicos pantallazos trazabilidad de solicitud y aprobación de pieza divulgativa volante convocatorio a contratación mano de obra no calificada.***

REGISTRO FOTOGRÁFICO

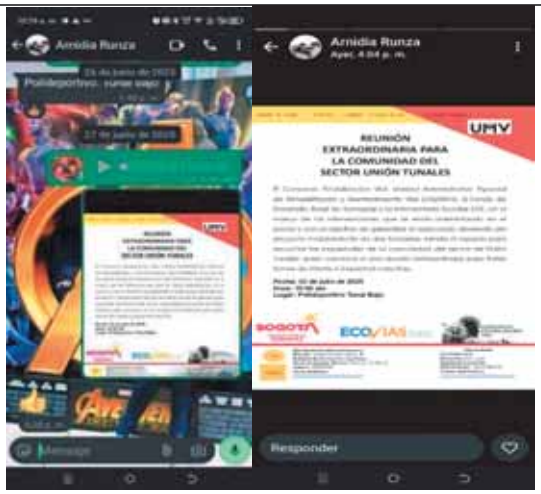
<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Foto: 28: Volante informativo Convocatoria Laboral.</td>
<td>Foto: 29: Volante informativo reunión extraordinaria.</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Foto: 30: Pantallazo entrega del volante informativo reunión extraordinaria Unión Tunal bajo.</td>
<td>Foto: 31: Pantallazo entrega del volante informativo reunión extraordinaria Unión Tunal bajo.</td>
</tr>
</table>

Tabla 24. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria volantes

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	5 volantes entregados/ 5 volantes requeridos X100 =	100%
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Consorcio Estabilización vial, realiza diseño y entrega de volante informativo de convocatoria laboral con el fin de convocar a el personal de la comunidad para trabajar como mano de obra no calificada en el proyecto, de igual manera entrega de un volante informativo de convocatoria a reunión extraordinarios los cuales son entregados a la comunidad con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del proyecto mejoramiento de vías terciarias, brinda el espacio para escuchar las inquietudes de la comunidad del sector de Unión Tunales quien convoca a una reunión extraordinaria para tratar temas de interés e inquietud colectiva. son revisados y aprobados por la interventoría y el Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz.	

Fuente: Propia

7.1.4.1.10 Afiche informativo.

Son piezas de divulgación mediante las cuales se describen generalidades de la obra y datos de contacto del Contratista. Estos deben ser instalados en el Punto fijo de atención a la comunidad y en los Puntos fijos Información y se realizará su reemplazo cuando se encuentren deteriorados, contado con el aval de la interventoría.

A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio de Estabilización Vial, realiza instalación de 4 afiche informativo en el punto fijo de atención a la comunidad, puntos de atención móvil y puntos satélites informativos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Foto: 32: diseño afiche informativo.</td>
<td>Foto: 33: Punto informativo Unión Tunales</td>
</tr>
</table>

7.1.4.1.11 Puntos fijos informativos.

Para efectos del presente contrato, el ejecutor, instalará los puntos de información, propuestos en el plan de gestión social, la interventoría realizará seguimiento en su instalación, estos permitirán una amplia divulgación de la información del contrato.

A la fecha del presente informe el componente social del Consorcio Estabilización vial realizo la instalación de 4 puntos satélites en:

Tabla 25. Instalación Puntos informativos fijos Consorcio Estabilización Vial

Fecha	Frente de obra	Sitios de instalación	Descripción de la actividad
Frete Unión Tunales			
11/06/2025	Unión Tunales	Casa de la señora Anidia Runza presidenta de junta de acción comunal	100%
		Casa de la señora Diana Palacios.	100%

Frente de obra San Antonio El Toldo			
19/06/2025	San Antonio El Toldo	Predios del señor Luis Bustos.	100%
		Escuela Juan de la cruz Varela (sede de k)	100%
TOTAL 4			

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto: 34: Punto satélite informativo Unión Tunales.



***Foto: 35:* Punto satélite informativo San Antonio El Toldo.**

Tabla 26. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	4 afiches informativos instalados X 100/ 4 afiches fijos solicitados x100 4 puntos informativos fijos instalados x100/ 4 puntos fijos informativos solicitados x 100 =	100% 100%
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Consorcio Estabilización vial, instala los afiches y puntos satélites informativo cumpliendo con lo establecido contractualmente en el plan de gestión social.	


Fuente: Propia



7.1.4.1.11. Actas de vecindad


El acta de vecindad es un documento que se elabora por medio de una visita domiciliaria a cada uno de los predios que se encuentran en el área de influencia directa de la obra. El objetivo de esta actividad es establecer las condiciones físicas iniciales de los predios a fin de determinar variaciones en las mismas derivadas de la ejecución del proyecto.


El contratista hace entrega de 2 actas de vecindad de San Antonio el Toldo y 14 actas de vecindad de apertura de Unión Tunales mediante comunicado CEV/22- 409 el 5 de junio del 2025, la interventoría realiza revisión y da aval mediante comunicado 186-1-717 del 24 de junio del 2025.






Tabla 27: actas de vecindad Frente de obra San Antonio El Toldo y unión Tunales junio 2025


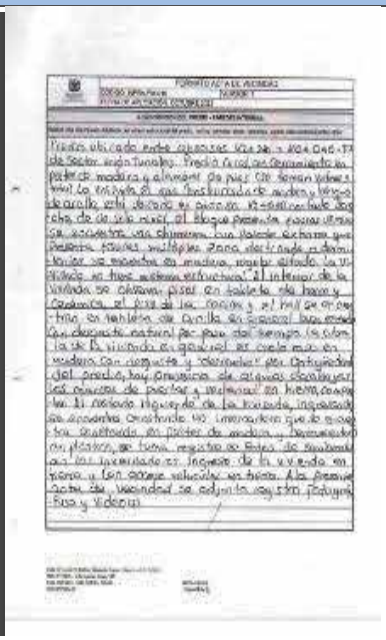
NUMERO DE ACTA	PROPIETARIOS	ACTA DE VECINDAD
Tramo vial Unión Tunales		
2	K2 + 230 a K0+ 040 Finca costado derecho Arnidia Runza	 

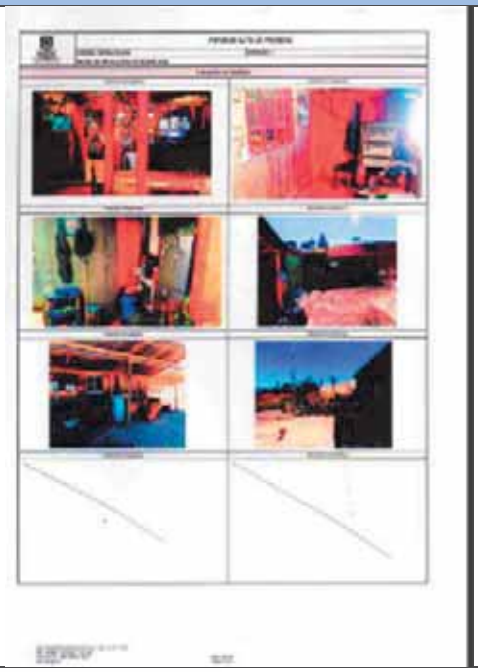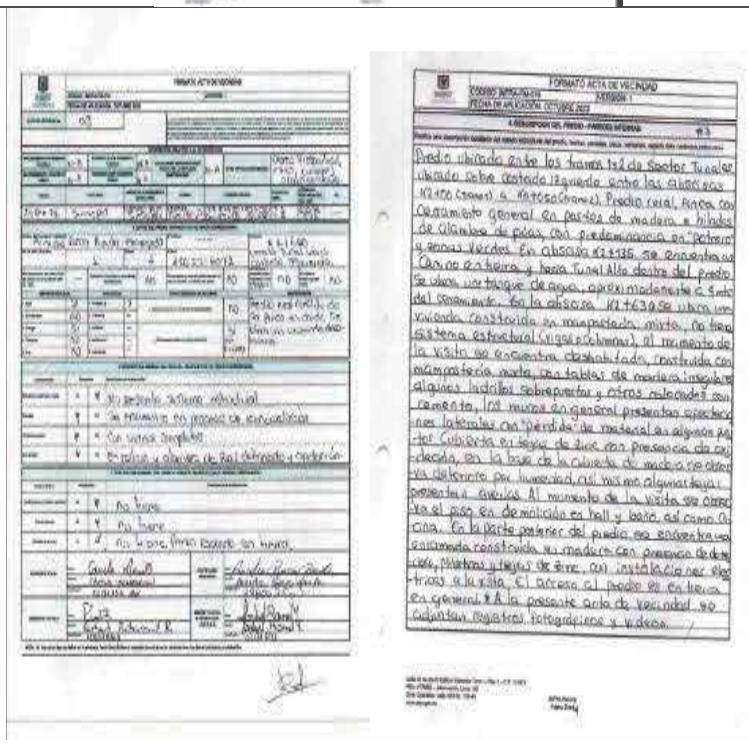
NUMERO DE ACTA	PROPIETARIOS	ACTA DE VECINDAD
		
3	K2 + 000 a K2+ 230 Finca costado izquierdo Arnidia Runza encargada	

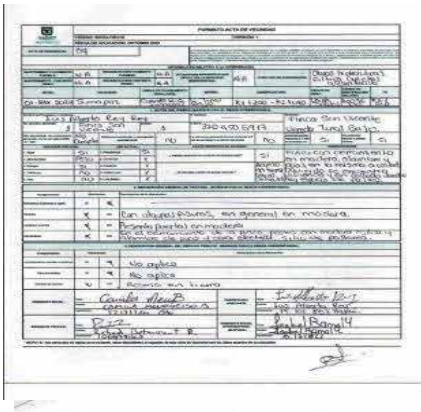		 
4	K1 + 200 a K2+ 010 Finca San Vicente Luis Alberto Rey Rey	   

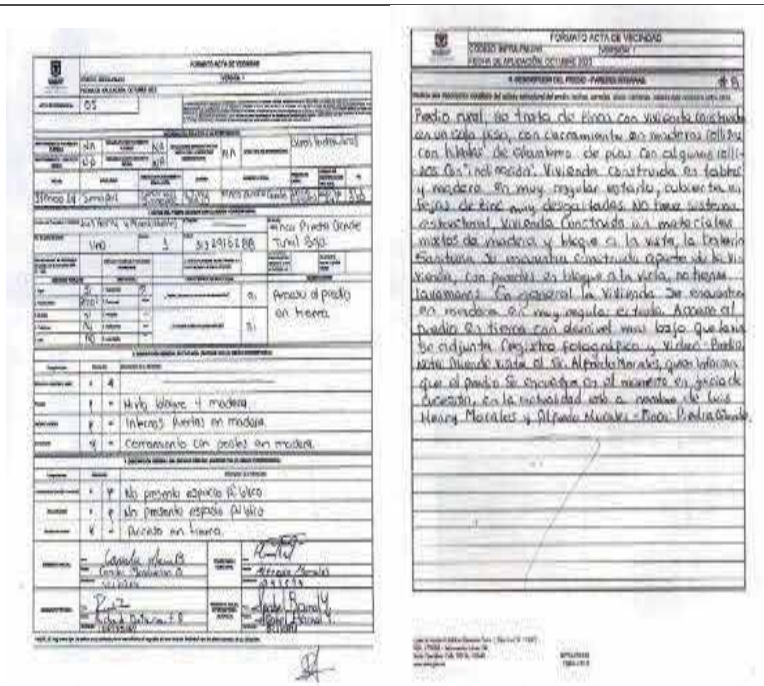5	Finca Piedra Blanca Luis Henrry y Alfredo Morales	

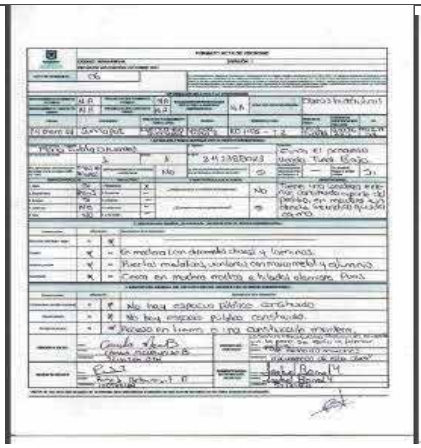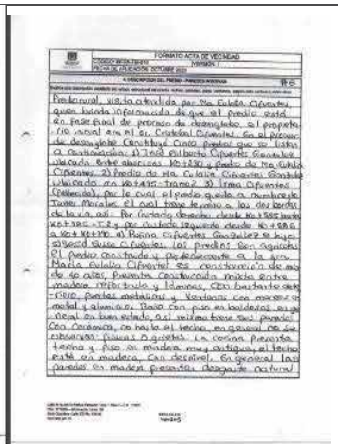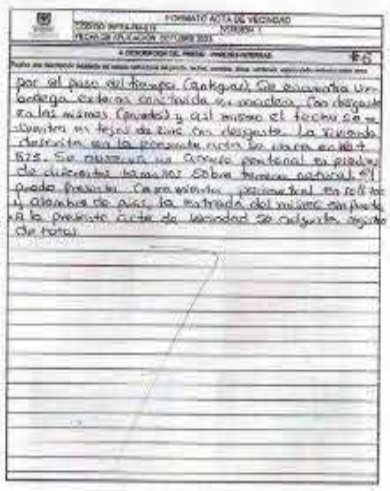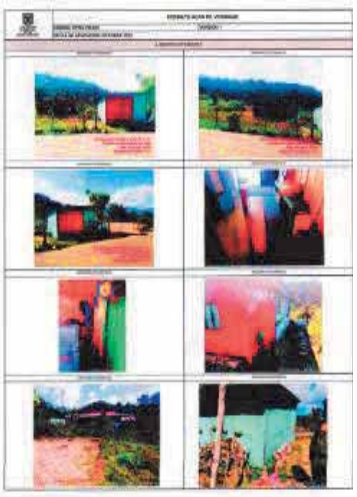
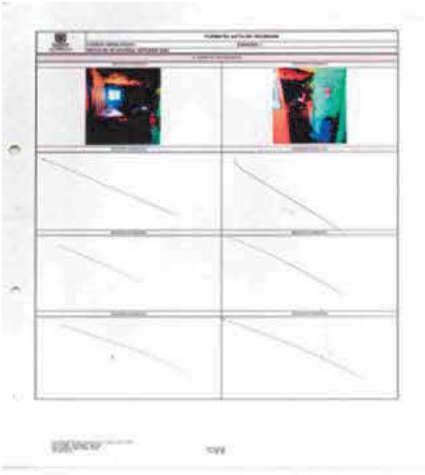
6	K0 + 475 tramo 2 y 3 Finca El Progreso María Eulalia Cifuentes	    

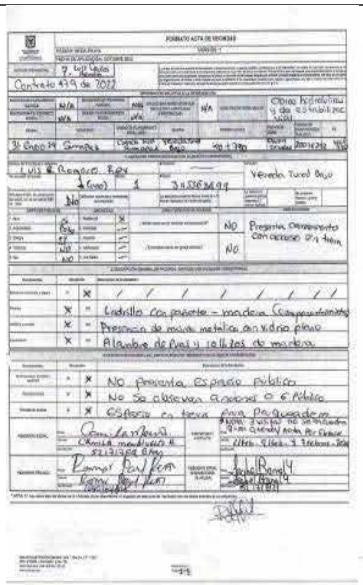
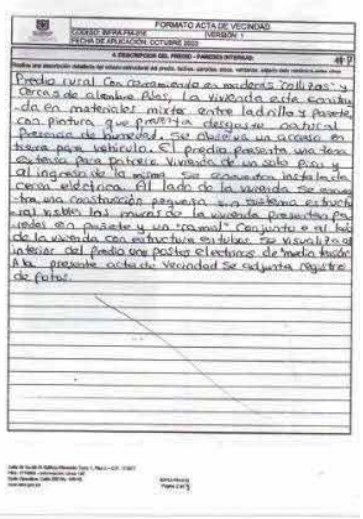
7	K0 + 790 Finca Vereda Tunal Bajo Luis Romero Rey	

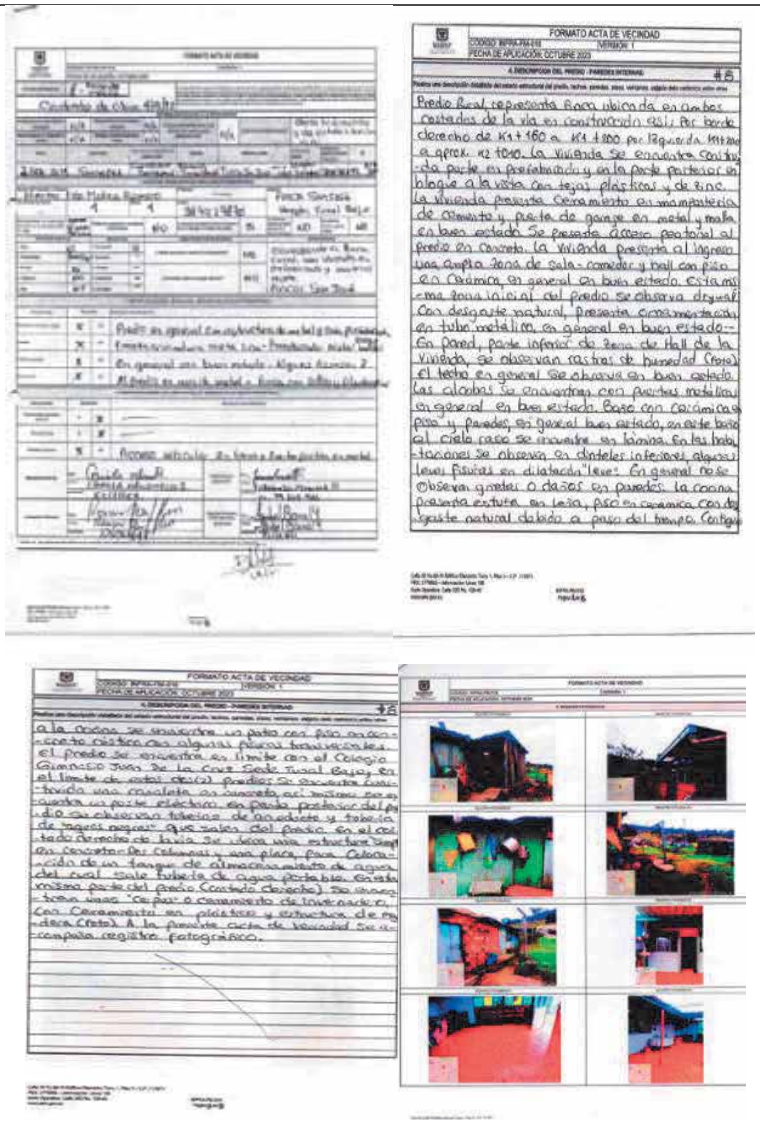8	K1 + 200 Finca San José Tunal Bajo Héctor Molina	



9	K1 + 620 Colegio IDE Gimnasio Juan de la Cruz y polideportivo Rafael Cortez	    

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

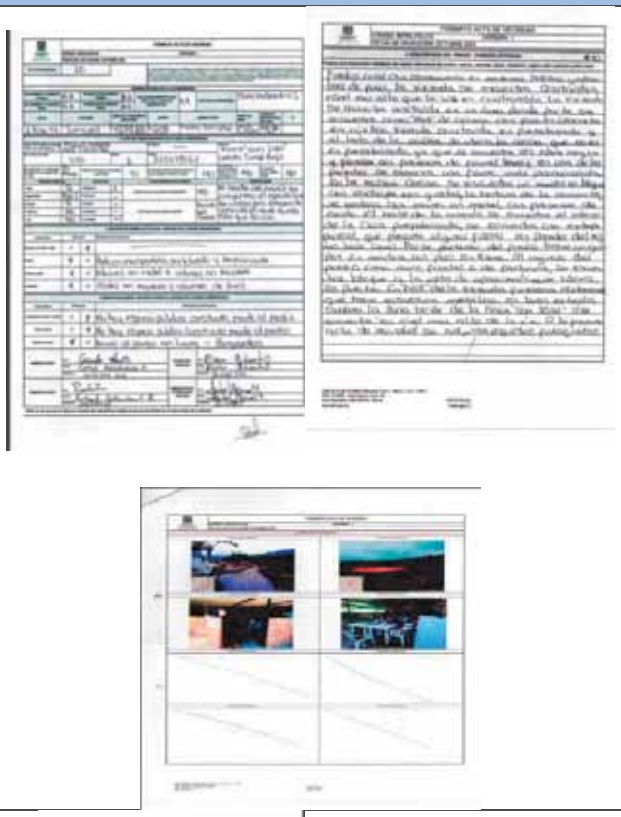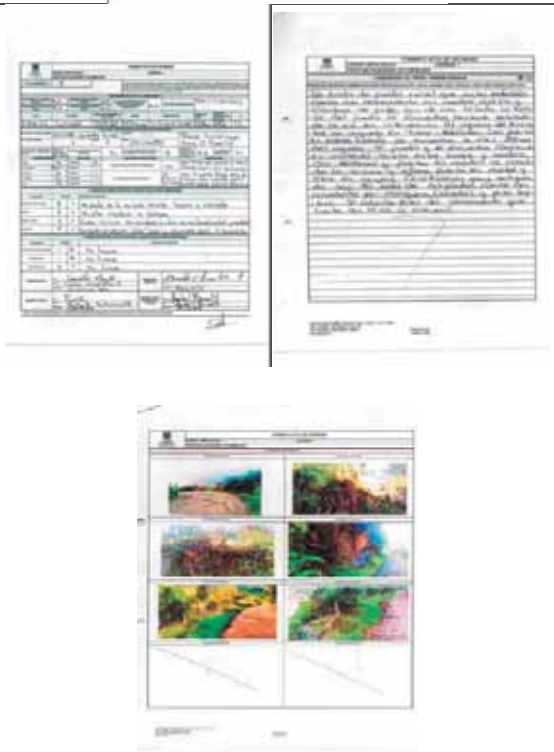NUMERO DE ACTA	PROPIETARIOS	ACTA DE VECINDAD
10	Finca San José Alberto Delgado	
11	Finca El Paraíso Oswaldo Cifuentes	

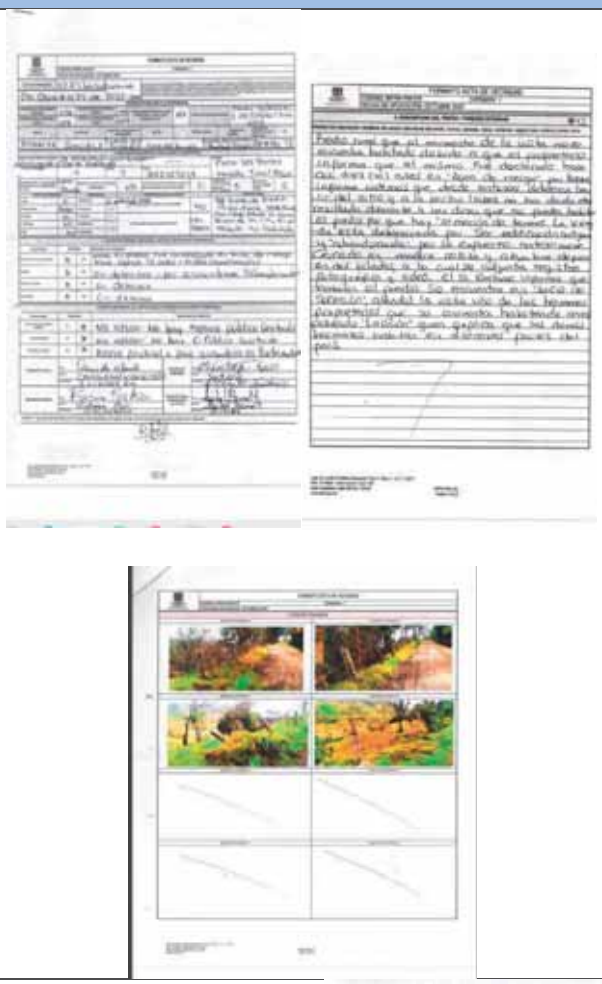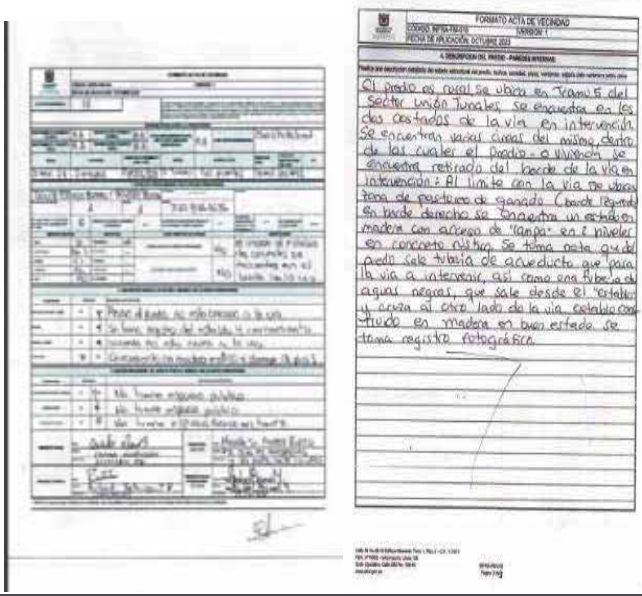NUMERO DE ACTA	PROPIETARIOS	ACTA DE VECINDAD
12	Finca Los Bancos Eliberto Guchavo	
13	Finca Los Puentes Dieck Clavijo	

NUMERO DE ACTA	PROPIETARIOS	ACTA DE VECINDAD
		
14	K2 + 170 Sin datos de propietario	 

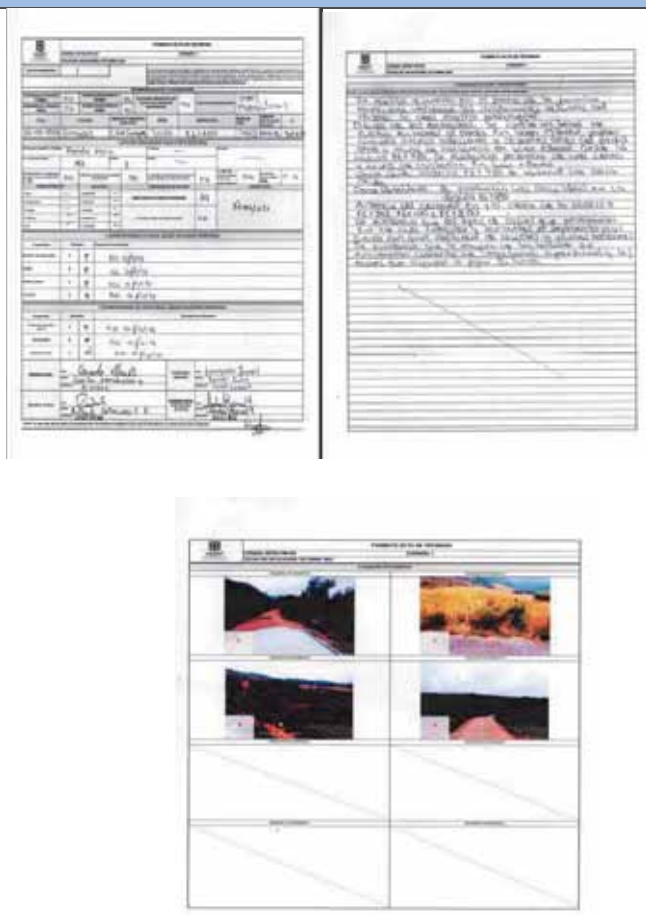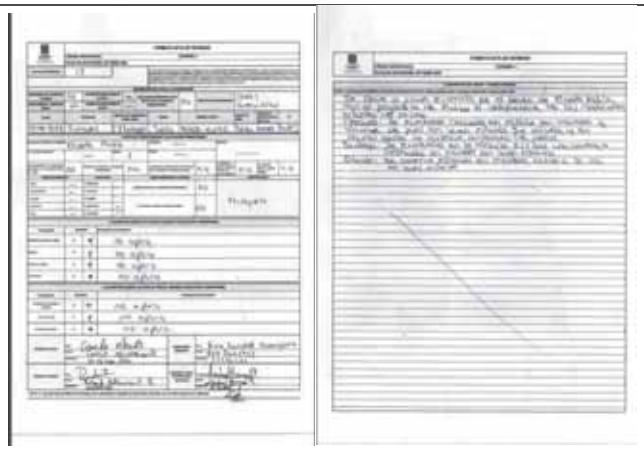Tramo vial San Antonio El Toldo		
NUMERO DE ACTA	**PROPIETARIOS**	**ACTA DE VECINDAD**
1	K6 + 200 Familia Mora	
13	K0 + 690 a K0 + 710 Elibeht Ardila	

NUMERO DE ACTA	PROPIETARIOS	ACTA DE VECINDAD
		
TOTAL ACTAS DE VECINDAD 2		
Consolidado de actas de vecindad de apertura 16		

Fuente: Propia

Tabla 28: Consolidado total actas de vecindad de apertura realizadas

TRAMO VIAL	ACTA DE VECINDAD DE APERTURA TOTAL	ENTREGA Y APROBACIÓN
San Antonio El Toldo	13	CEV/22-392 del 7 de mayo del 2025 186-1- 675 del 28 de mayo del 2025
Unión Tunales	14	CEV/22-409 del 5 de junio del 2025 186-1- 717 del 24 de junio del 2025
TOTAL ACTAS DE VECINDAD DE APERTURA 27		

Fuente: Propia

A9

- **CEV/22-409 del 5 de junio del 2025 Radicación actas de vecindad de apertura tramo San Antonio II El Toldo y Unión Tunales**
- **186-1- 717 del 24 de junio del 2025.** ***Respuesta al comunicado CEV/22- 409, del 5-06-25, Actas de vecindad de apertura sector San Antonio II El Toldo. Y Unión Tunales CEV.***

7.1.4.1.12. Acta de compromiso

Las actas de compromiso es un documento que se elabora en caso de ser necesario hacer algún compromiso o acuerdo con la comunidad, institución o comerciante, con el fin de realizar alguna actividad de obra que repercuta con la comunidad, el contratista levantará el acta de compromiso.

La Interventoría realizará el seguimiento del cumplimiento de los compromisos pactados en las actas de compromiso y se notificará en el informe correspondiente. Se firma el acta por el componente social y técnico, cuando se le cumpla al propietario con los compromisos registrados en el acta.

Durante el periodo comprendido el Consorcio realizó acta de compromiso, la cual se describen a continuación:

Tabla 29: Consolidado de actas de compromiso Frente de obra Unión Tunales

Fuente: Propia

Fecha registro	Dirección	Propietarios y/o encargado	Descripción
20/06/2025	Vereda Unión Tunales	*Luis Romero*	**Foto: 36: acta de compromiso, con el fin de informar el diseño de la entrada al predio** 
26/06/2025	Vereda de Unión Tunales	Luis Alberto Rey	**Foto: 37: acta de compromiso, con el fin de solicitar permiso para disposición de material de excavación** 
Total, actas de compromiso del periodo: 2			

Fuente: Propia

7.1.4.1.13 Acta de gestión adelantada

Las actas de gestión adelantada tienen como fin, abordar las inquietudes y resolver las dudas planteadas por la comunidad y brindar una respuesta clara a las preguntas planteadas.

La Interventoría realizará el seguimiento del cumplimiento a los compresos pactados y se notificará en el informe correspondiente. Se firma el acta por el componente social y técnico, cuando se le cumpla al propietario con los compromisos registrados en el acta.

Durante el periodo comprendido el Consorcio Estabilización Vial no ha realizado actas de gestión adelantada, por no ser necesario.

Tabla 30. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	16 actas de vecindad de apertura realizadas / 16 actas de vecindad de apertura requeridas x 100	100%
	2 acta de compromiso realizadas x100 / 2 acta de compromiso requeridas x 100	100%
	# actas de gestión adelantada realizadas x100 / # actas de gestión adelantada requeridas x 100	NA
	# actas de gestión externa realizadas x100 / # actas de gestión externa requeridas x 100	NA
	0 ejercicio de control social realizadas x100 / 0 ejercicio de control social requeridas x 100	NA
ANALISIS DE LOS INDICADORES	El Consorcio cumple con los productos de las aperturas de actas de Vecindad de apertura de acuerdo a lo establecido contractualmente en el plan de gestión social.	

Fuente: Propia

7.1.5. PROGRAMA DE CULTURA VIAL

Este Programa tiene como fin generar nuevas actitudes de responsabilidad en relación con el manejo de la infraestructura vial y su entorno por parte de la población vecina u usuaria. Las sensibilizaciones de sostenibilidad y cuidados de las vías se realizarán al finalizar las intervenciones, con el fin de apropiar a la comunidad del cuidado y

conservación de las vías a lo largo del tiempo. Por lo anterior, se darán a conocer las recomendaciones que la comunidad debe tener en cuenta para conservar las vías intervenidas permitiendo que sean sostenibles.

Las sensibilizaciones quedaran soportadas por un acta, lista de asistencia y registro fotográfico y se realizará una vez se termine el proceso constructivo.

Durante el periodo comprendido el Consorcio no realiza sensibilización de sostenibilidad por no ser necesario, este programa se desarrolla al finalizar las obras.

7.1.6. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA

Este programa busca generar oportunidades laborales a las comunidades donde se ejecute el proyecto, contratando a un porcentaje de la población de mano de obra no calificada, Vulnerable y mujeres esta última regida por el decreto 332/2020, donde indica que para el mes de junio del 2023 para proyecto de construcción se contrate un 13.8%, que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas. Esto facilitará que haya una mayor apropiación del trabajo realizado y se evitarán conflictos con la comunidad.

Este programa busca generar oportunidades laborales a las comunidades donde se ejecute el proyecto, contratando a un porcentaje de la población de mano de obra no calificada, Vulnerable y mujeres esta última regida por el decreto 332/2020, donde indica que para el mes de junio del 2023 para proyecto de construcción se contrate un 13.8%, que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas. Esto facilitará que haya una mayor apropiación del trabajo realizado y se evitarán conflictos con la comunidad.

7.1.6.1 Mano de obra no calificada contratación población vulnerable

La contratación de población vulnerable, la interventoría verificará el cumplimiento en la contratación de población vulnerable contratado. Dado lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a la contratación de personal en situación de vulnerabilidad, establecido contractualmente en el Decreto 380 del 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. “Por ***el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones”.***

7.1.6.2 Mano de obra no calificada de la localidad

Contratación de mano de obra no calificada, la interventoría verificará el cumplimiento del 75% del personal no calificado de la localidad del Sumapaz beneficiada por la ejecución de las obras. De acuerdo a lo enunciado en el anexo técnico que a la letra dice “Teniendo en cuenta la base de datos suministrada por el Fondo de Desarrollo Local del Sumapaz (FDLS) se indicó que, aproximadamente el 75% de la mano de obra

no calificada está disponible para la vinculación al proyecto. Por cuanto se hace necesario vincular al personal de mano de obra local según el porcentaje descrito, lo cual sugiere disponer de personal foráneo en un 25% aproximadamente".

7.1.6.3 Contratación de mujeres.

De acuerdo al Decreto Distrital 332 de 2020, "**VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO.** Sin perjuicio de la autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y organismos distritales, el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, según corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales de los procesos de selección pública y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales.

La vinculación de mujeres será diferenciada por rama, así:

Ramas de actividad económica	**Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contratos**		
	A partir del 1 º de junio de 2021	**A partir del 1º de junio de 2022**	**A partir del 1 º de junio de 2023 en adelante**
Construcción	6,8%	9,3%	13,8%

7.1.6.4 Contratación de trabajadores en condición de discapacidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal con discapacidad: "Que el numeral 7 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 establece que el Gobierno Nacional debe implementar mediante decreto reglamentario un sistema de preferencias aplicables a los procesos de adjudicación y celebración de contratos de organismos estatales para quienes vinculen laboralmente a personas con discapacidad debidamente certificadas, en un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores, lo que se encuentra reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, establecer un sistema de preferencias como factor de desempate para los proponentes que acrediten por lo menos el 10% de su nómina personas con discapacidad en el respectivo proceso de contratación".

7.1.6.5 Contratación de trabajadores en condición de vulnerabilidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad tales como:

-Madres cabeza de hogar
-Desplazados
-Estratos 0 y 1

Estas condiciones deben ser demostradas mediante certificado que le acredite como persona vulnerable, para ser tenidas en cuenta durante el proceso de selección.

Así mismo en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad".

***Tabla 31. Consolidado personal consorcio* Estabilización Vial**

PERSONAL TOTAL	PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA	PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA	TOTAL, MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	TOTAL, MANO DE OBRA NO CLAIFICADA VULNERABLE	TOTAL, DE MUJERES CONTRATADAS
40	21	19	11	11	7
PORENTAJES		PORCENTAJE % MONC	PORCENTAJE % MONCL	PORCENTAJE % VULNERABLE	PORCENTAJE % MUJERES
		52.5 %	59,89 %	27,5 %	17,05 %

Fuente: Propia

De acuerdo a los indicadores se evidencia que el consorcio cumple con la contratación de mano de obra no calificada por cuanto que cuenta con un 78 % y de acuerdo con lo establecido contractualmente se debe contratar un 75 %, la interventoría en comité de seguimiento solicita se continue con el cumplimiento a lo establecido contractualmente. El consorcio Estabilización vial radica comunicado CEV/22-419 el 19 de junio del 2025, donde informan que se está presentado con la contratación de mano de obra no calificada residente de la localidad de Sumapaz, ya que el personal que ha sido contratado por parte del Consorcio han manifestado renuncias voluntarias, tales como es el caso puntual de dos auxiliares de tráfico Diana Avellaneda y María Camargo quienes ingresaron el 9 de abril del 2025 y presentaron su carta de renuncia el 10 de junio de 2025 atribuido a situaciones personales, renuncia que fue aceptada por parte del Consorcio. El día 11 de junio se evidencio que estas dos trabajadoras fueron contratadas por la UAERMV, por lo que solicitamos a la interventoría que intervenga y solicite a la UAERMV que no contrate personal que tenga contrato vigente con el

Consorcio Estabilización Vial, ya que esto ha perjudicado el avance de las actividades debido al bajos rendimientos por carecía de personal, adicionalmente el trasladar personal fuera de la localidad de Sumapaz incrementa el factor prestacional de la mano de obra no calificada descrita en los análisis de precios unitarios.
El Consorcio Estabilización Vial, ha desarrollado convocatorias en la zona divulgando volantes por medio de los grupos de WhatsApp incluyendo al grupo del sindicato de la UAERMV y socialización con el presidente de la junta de acción comunal, con el fin de contratar personal de mano de obra no calificada, a lo cual ha sido poca la recepción por parte de la comunidad, por lo anterior el Consorcio no ha dado cumplimiento al 75% de la mano de obra no calificada residente de la localidad, tal como está establecido en el Plan de Gestión Social, la interventoría da traslado al comunicado a la Unidad de Mantenimiento vial mediante comunicado 186-1-734 el 1 de julio del 2025.

A10

- ***Comunicado CEV/22-419***
- ***Comunicado 186-1-734***

A11

- ***Listado de personal Consorcio Estabilización vial***

7.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

El área social de la Interventoría realiza las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por el ejecutor y los contratistas en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico.

7.2.1 Listas de Chequeo del Contratista:

A la fecha de cierre del presente informe la interventoría realiza la lista de chequeo donde evalúa la gestión realizada en el componente social basados en cada programa que establece las fichas PAGA. Con una calificación del 96 %

A 12

- ***Lista de chequeo mes de junio Consorcio Estabilización vial.***

7.2.2 Revisión documental

Durante el periodo de este informe se realizó la consulta de los documentos legales:

- Contratos de Interventoría y Contratistas
- Anexo técnico
- Plan de Gestión Social
- Informes mensuales.
- Bitácora Social
- correspondencia

A 13

- ***Copia Bitácora Social Consorcio Estabilización Vial junio.***

7.2.3 Informes Mensuales

En la siguiente tabla se registran los informes mensuales presentados, por el contratista, en el periodo comprendido el Consorcio Estabilización vial el cual se describe su trazabilidad.

Tabla 32. Informes mensuales contrato de obra no. 479 – del 10/02/2022 Consorcio Estabilización Vial.

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
1	Del 16 al 31 de julio del 2022	El 28 de noviembre del 2023, el consorcio Estabilización Vial remite respuesta a interventoría a las observaciones realizadas por la interventoría mediante comunicado CEV /22-232, la interventoría realiza nuevamente observaciones, las cuales son revisada en mesas de trabajo. Finalmente, el Consorcio hace entrega de los informes el 19 de diciembre del 2023 la interventoría realiza revisión, a los informes de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2022, y enero, febrero, marzo y abril de 2023 (informe del 1 al 10), la interventoría da aprobación a los mismos por cuanto que se evidencia cumplen con los requerimientos mínimos del componente, mediante oficio 186-1-431 del 29 de diciembre del 2023.
2	1 al 31 de agosto del 2022	
3	1 al 30 de septiembre del 2022	
4	1 al 31 de octubre del 2022	
5	1 al 30 de noviembre del 2022	
6	1 al 31 de diciembre del 2022	
7	1 al 31 de enero del 2023	
8	1 al 28 de febrero del 2023	
9	1 al 31 de marzo del 2023	
10	1 al 13 de abril de 2023	

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
11	10 al 31 de octubre del 2023	El 13 de diciembre del 2023, la interventoría da respuesta a la comunidad CEV/22-247 del 13 de diciembre de 2023, Informe 11 V1, donde realiza observaciones, mediante comunicado 186 -1- 406, el 14 de diciembre del año en curso el Consorcio Estabilización Vial da respuesta a las observaciones emitidas por la interventoría al informe 11 V1 mediante comunicado CEV /22-248, versión 2, la interventoría realiza observaciones nuevamente, las cuales son revisada en mesas de trabajo. Finalmente, el Consorcio hace entrega del informe mensual social 11 V3 el 19 de diciembre del 2023, por correo electrónico, la interventoría da aprobación al informe 11 V3, porque cumplen con los requerimientos mínimos del componente, mediante comunicado 186-1-431 del 29 de diciembre del 2023.
12	1 al 30 de noviembre del 2023	EL 14 de diciembre del 2023, la interventoría solicita la radicación del informe 12 mes de noviembre mediante comunicado 186-1- 410, el 14 de diciembre el consorcio Estabilización Vial da respuesta y radicado el informe mensual del mes de noviembre V1, mediante comunicado CEV /22-250, la interventoría realiza observaciones nuevamente, las cuales son revisada en mesas de trabajo. Finalmente, el Consorcio hace entrega del informe mensual social 12 V2 el 19 de diciembre del 2023, por correo electrónico, la interventoría da aprobación al informe 11 V3, porque cumplen con los requerimientos mínimos del componente, mediante comunicado 186-1-431 del 29 de diciembre del 2023.
14	1 al 31 de enero del 2024	El 7 de febrero del año en curso, el Consorcio hace entrega del informe mensual del mes de enero, mediante comunicado CEV/22-289, la interventoría realizo observaciones mediante comunicado 186-1-478 e 13 de febrero / 2024, el consorcio subsana observaciones y hace entrega de informe 14 v3 con comunicado CEV 22-306 del 29 de febrero del 2024, la interventoría realiza observaciones nuevamente y envía al Consorcio mediante comunicado 186-1- 531 el 20 de marzo del 2024. El 19 de mayo del 2025, el consorcio Estabilización Vial realiza entrega del informe por correo electrónico, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1- 673, el 28 de mayo del 2025. El 5 de junio del 2025 el consorcio hace entrega del informe mensual social 14 por correo electrónico, la interventoría hace entrega de observaciones nuevamente, mediante comunicado 186-1-711 el 18 de junio del 2025. Se encuentra pendiente respuesta.

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
15	1 al 29 de febrero del 2024	El 11 de marzo del año en curso, el Consorcio hace entrega del informe mensual del mes de febrero, mediante comunicado CEV/22-312, la interventoría realiza observaciones e informa al Consorcio mediante comunicado 186-1- 532 el 20 de marzo del 2024, se encuentra pendiente la subsanación de las observaciones El 19 de mayo del 2025, el consorcio Estabilización Vial realiza entrega del informe por correo electrónico, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1- 673, el 28 de mayo del 2025. El 5 de junio del 2025 el consorcio hace entrega del informe mensual social 15 por correo electrónico, la interventoría hace entrega de observaciones nuevamente, mediante comunicado 186-1-711 el 18 de junio del 2025, se encuentra pendiente respuesta.
16	1 al 31 de marzo del 2024	El 11 de abril del año en curso, el Consorcio hace entrega del informe mensual del mes de marzo, mediante comunicado CEV/22-332, la interventoría realiza observaciones por medio del comunicado el 24 de abril del 2024, 186-1-575 Respuesta a oficio CEV/22- 332 del 11 de abril del 2024, Entrega informe mensual social N° 16 V1. El 19 de mayo del 2025, el consorcio Estabilización Vial realiza entrega del informe por correo electrónico, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1- 673, el 28 de mayo del 2025. El 5 de junio del 2025 el consorcio hace entrega del informe mensual social 16 por correo electrónico, la interventoría hace entrega de observaciones nuevamente, mediante comunicado 186-1-711 el 18 de junio del 2025, se encuentra pendiente respuesta.
17	1 al 16 de abril del 2024	El 19 de mayo del 2025, el consorcio Estabilización Vial realiza entrega del informe por correo electrónico, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1- 673, el 28 de mayo del 2025. El 5 de junio del 2025 el consorcio hace entrega del informe mensual social 17 por correo electrónico, la interventoría hace entrega de observaciones nuevamente, mediante comunicado 186-1-711 el 18 de junio del 2025, se encuentra pendiente respuesta.
18	1 al 30 de abril del 2025	El 5 de mayo del 2025, el consorcio hace entrega del informe mensual, mediante comunicado CEV/22-388, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1- 653, el 7 de mayo del año en curso, El 15 de mayo del año en curso el consorcio hace entrega del informe mediante comunicado CEV/22-400, el 29 de mayo del 2025, la interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-682 y emite que se subsanaron las observaciones no se da por cuanto que se encuentran pendientes los informes 14, 15, 16, 17.
19	1 al 31 de mayo del 2025	El Consorcio hace entrega del informe mensual social mediante comunicado CEV/22- 408 el 5 de junio del 2025 V0, la interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-710 el 18 de junio del 2025, a la fecha de cierre del presente informe el consorcio no ha hecho entrega.

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
20	1 al 30 de junio del 2025	A la fecha de cierre del presente informe el consorcio no ha realizado entrega.

Fuente: Propia

A 14

- ***Comunicado 186-1- 711***
- ***comunicado CEV/22-408***
- ***Comunicado 186-1- 710***

7.2.4. Informes Semanales

En la siguiente tabla se registran los informes semanales presentados por la interventoría.

Tabla 33. Trazabilidad informe semanales Consorcio Estabilización Vial

N° SEMANA	PERÍODO
66	26 de mayo al 1 de junio del 2025
67	2 al 8 de junio del 2025
68	9 al 15 de junio del 2025
69	16 al 22 de junio del 2025
70	23 al 29 de junio del 2025
71	30 de junio al 6 de julio del 2025

Fuente: Propia

Ver anexo técnico informes semanales

7.2.5. Comités de Seguimiento Integral

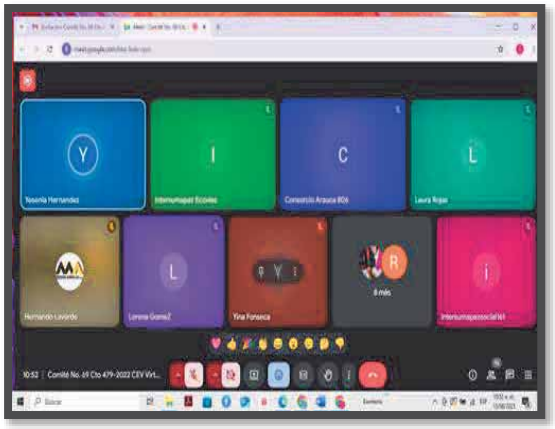
Durante el desarrollo del presente informe se realizan cuatro comités de seguimiento integral, los cuales relaciono a continuación.

Tabla 34. Comité integral de seguimientos Consorcio Estabilización Vial

No COMITÉ	FECHAS
68	5/06/2025
69	13/06/2025
70	19/06/2025
71	27/06/2025

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto: 38: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 68.</td><td>Foto: 39: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 69.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto: 40: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 70</td><td>Foto: 41: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 71.</td></tr>
</table>

Ver anexo técnico informes semanales.

7.2.6 Comités de Seguimiento social y mesas de trabajo

Tabla 35. **Comité de *seguimiento* social Consorcio Estabilización Vial**

No COMITÉ	FECHAS
24	12/06/2025
25	26/06/2025
Mesa de trabajo.	20/06/2025

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto: 42: Comité de seguimiento social No 24 contrato 479 – 2022.	**Foto: 43: Comité de seguimiento social No 25 contrato 479 – 2022.**

A15

- ***Actas de comité social y mesa de trabajo seguimiento Consorcio Estabilización vial***

7.2.7 Correspondencia enviada y recibida.

Correspondencia enviada y recibida.

Durante el desarrollo del presente informe se genera correspondencia la cual se relaciona a continuación:

Tabla 36: Correspondencia recibida y enviada Contrato

Correspondencia recibida			Correspondencia enviada		
Consecutivo	**Asunto**	**Fecha**	**Consecutivo**	**Asunto**	**Fecha**
CEV/22- 408	. "Informe mensual Social No 19 V1. CEV	5/06/2025	186-1- 710	Respuesta al comunicado CEV/22- 408, del 5-06-25, "Informe mensual Social No 19 V1. CEV."	18/06/2025
CEV/22-419	Contratación de personal de mano de obra no calificada	19/06/2025	186-1- 734	Traslado Contratación de personal de mano de obra no calificada	29/05/2025
Correo electrónico	*Informes mensuales Social N°14-V5, N°15-V4, N°16-V3, N°17-V2. CEV*	*5 de junio del 2025.*	186-1-186-1-711	*Respuesta al correo electrónico del 5 de junio del 2025, Informe mensuales Social N°14-V5, N°15-V4, N°16-V3, N°17-V2. CEV.*	18/06/2025

Fuente: Propia

Ver A10 y A14

- **Correspondencia enviada y recibida.**

7.2.8 Estado del Contrato

Estado del contrato 479 del 20/05/2022: **ACTIVO.**

8. CONTRATO DE SERVCIO - 480 – DEL 22/02/2022 SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S

8.1. Actividades de Gestión Social

No aplica, dado que es un contrato de prestación de servicios.

8.2. Estado del Contrato

Estado del contrato 480 del 10/02/2022**: Finalizado tiempo contractual, sin recibo de los productos a satisfacción.**

9. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

9.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El documento se encuentra aprobado, para ser puesto en marcha durante la ejecución del contrato, a continuación, se presenta su trazabilidad.

Tabla 37: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social UAERMV

FECHA	TRAZABILIDAD	APROBACIÓN
7 de noviembre del 2023	La entidad ejecutora realiza entrega del plan de gestión social mediante Radicado: **20231180117931**	
	La interventoría realiza aprobación al documento mediante comunicado 186-1-374	16 de noviembre del 2025

Fuente: Propia

9.1.1 PROGRAMA DE SERVICIO AL USUARIO.

Este programa establece la instalación por parte de la entidad ejecutora de un sistema de atención al ciudadano, en el que se registren de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos como: peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias PQRS, interpuestos por los ciudadanos de manera presencial, escrita, telefónicamente, correo electrónico y/o redes sociales.

9.1.1.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Los puntos de atención a la comunidad (PUNTO PAU) debe estar dotada de:

- Baño

- Línea telefónica exclusiva
- Cartelera informativa
- Computador con los programas necesarios
- Sillas y escritorio para la persona encargada de la atención.
- Espacio, sillas disponibles, chaquetas según el manual de identidad visual.
- Piezas de información, planos pertinentes para el proyecto, afiches y demás información pertinente para el proyecto.

Durante el periodo objeto de este informe, la entidad ejecutora, continua con una línea de atención con correo electrónico los cuales relaciono a continuación.

Tabla 38: Información Punto PAU UAERMV

PUNTO PAC UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV	
Horario de Atención	Tramo **unión túnales** se realizará atenciones a la comunidad en el predio del señor Dick Clavijo, a partir de las 8:00 am hasta las 3:00 pm. Tramo **capitolio** se realizará atenciones los jueves a partir de las 8:00 am hasta las 3:00 pm. Tramo **san Antonio 1** se realizará atenciones a la comunidad el primer miércoles de 8:00 am hasta las 3:00 pm. para el tramo **san Antonio 2** se realizará atención en el predio del señor Luis Bustos a la comunidad los miércoles de 8:00 am hasta las 3:00 pm.
Línea Telefónica	3243024943 - 3226836208
Correo electrónico:	infosgr@dnp.gov.co atencionalciudadano@umv.gov.co
Profesional Social	Rubys Ruiz

Fuente: Propia

- ✓ ***Tramo Unión Tunales***

A la fecha de cierre del presente informe la profesional social de la entidad ejecutora continua en la implementación del punto de atención al usuario como lo establece el PAGA (Plan de acción de la guía ambiental -PAGA), cuenta con los volantes informativos, el PMT, y el afiche informativo. Así mismo realiza atención móvil, con el fin de recepcionar en el frente de obra todas las inquietudes de la comunidad. El punto de atención móvil se encuentra ubicado en el Tramo Unión Túnales – carpa se encuentra en el predio ubicado en la abscisa K 0 + 050 de Unión Tunales, específicamente en el predio de Dick Clavijo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto: 44: Verificación de interventoría punto de atención fijo, Frente Unión Tunales.

- ✓ ***Frente de Capitolio***

En el tramo de Capitolio, la interventoría da aval para que se implemente el punto de atención a la comunidad móvil, por cuanto que no se evidencia un predio cercano donde realizará atención en una carpa móvil de la UAERMV, cuenta con los volantes informativos, el PMT, y el afiche informativo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto: 45: Verificación del punto móvil atención al usuario. Frente de Capitolio.

- ✓ ***Frente de San Antonio EL Toldo***

En el tramo de Capitolio, la interventoría da aval para que se implemente el punto de atención a la comunidad móvil, por cuanto que no se evidencia un predio cercano donde realizará atención en una carpa móvil de la UAERMV, cuenta con los volantes informativos, el PMT, y el afiche informativo. La interventoría solicita un oficio donde se justifique su ubicación, dando alcance a lo establecido en el Plan de gestión social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto: 46: Verificación del punto móvil atención al usuario. Frente de San Antonio El Toldo.

9.1.1.2 Recorridos

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora está en la necesita realizar recorridos, con el fin de realizar atención personalizada a la comunidad estableciendo puntos móviles. De igual manera hacen acompañamiento a las actividades técnicas de la obra.

Así mismo la interventoría realiza recorridos en los tramos activos, con el fin de verificar las actividades del componente social y los compromisos adquiridos.

A continuación, se presenta la trazabilidad de los recorridos realizados en el mes del presente informe.

Tabla 39. Recorrido entidad ejecutora Unidad Administrativa especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV – Interventoría – Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz.


ID	Fecha	Tramo	Observaciones	Registro fotográfico
1	5 de junio del 2025 19 de junio del 2025 27 de junio del 20205	Frente de obra Unión Tunales, Capitolio, San Antonio El Toldo.	La interventoría realiza recorridos conjunto con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades del componente social.	 **Foto: 47: Recorrido conjunto Unión Tunales.**  **Foto: 48: Recorrido conjunto San Antonio.**

Fuente: Propia

- ✓ **Línea WhatsApp:**


Durante este periodo la entidad ejecutora, mantiene activos las cuentas del grupo de WhatsApp de los tres frentes de obra **(**Unión tunales, Capitolio, San Antonio El Toldo) que incluye personas de la comunidad en general, el cual es utilizado, para brindar información del contrato a la comunidad de forma instantánea, así mismo atender las solicitudes ciudadanas que se puedan presentar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

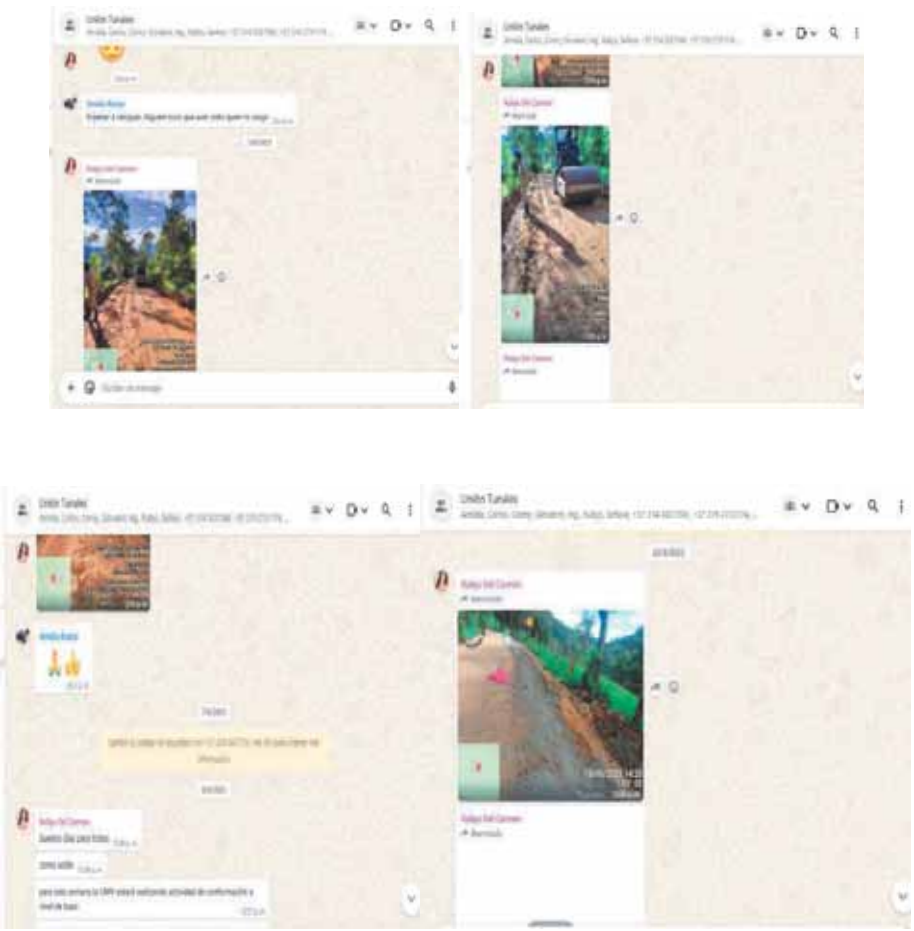



Frente de obra de Unión Tunales

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

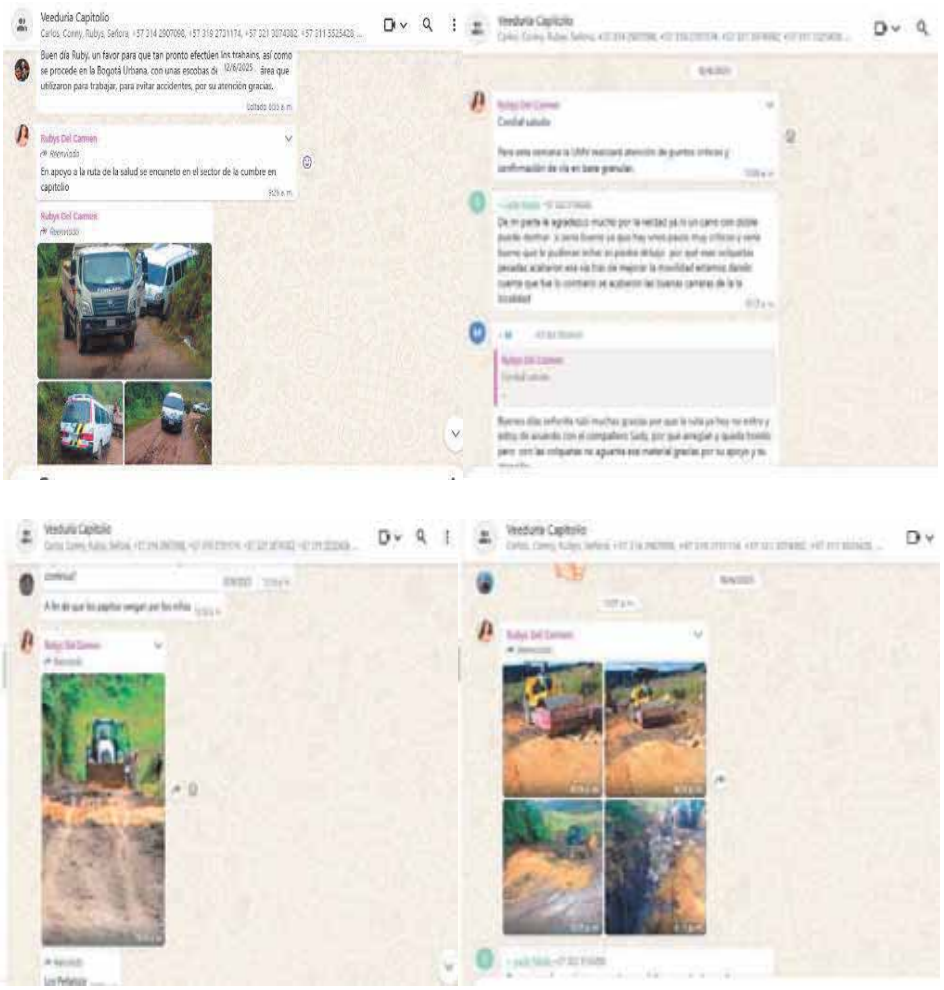

Frente de obra Capitolio



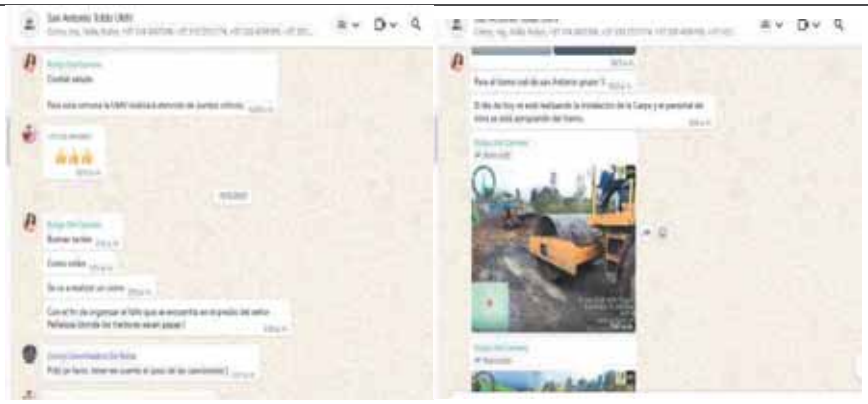

San Antonio El Toldo

Foto: 49: Pantallazo información a la comunidad en el grupo de WhatsApp en el frente de obra, Unión Tunales, Capitolios y San Antonio El Toldo.

Tabla 40. Indicadores de cumplimiento del Programa Atención al Usuario

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO		
INDICADOR	**FORMULA**	**CUMPLIMIENTO**
PRODUCTIVIDAD	Línea telefónica solicitada/Línea telefónica implementada 1 X 100 = 1	**100 %**
PRODUCTIVIDAD	Correo electrónico solicitado / Correo electrónico implementado 1 X 100 = 1	**100 %**
PRODUCTIVIDAD	Formato de control de atenciones diligenciado/Formato de atenciones recibidas 1 x 100 = 1	**100%**
PRODUCTIVIDAD	Recorridos /Realizados 3 X100 = 3	**100%**
PRODUCTIVIDAD	Total, de equipamiento básico instalado / total de equipamiento básico requerido 3 x 100 = 3	**100%**

ANALISIS DE LOS INDICADORES	La UAERMV del componente social realiza recorridos constantes con el fin de realizar acompañamiento al área técnica y atender de manera personalizada a la comunidad. Así mismo la interventoría y el Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz, realiza recorridos, con el fin de revisar los avances y cumplimientos de la ejecución del contrato. En cuanto a la implementación del Punto de atención al usuario, A la fecha de cierre del presente informe la interventoría evidencia en recorrido realizados que cuenta con el punto fijo el cual es adecuado para la atención de la comunidad, en el frente de Capitolio y San Antonio el Toldo cuentan con una carpa móvil, por cuanto la entidad no encuentra un lugar fijo, la interventoría verifica la información, para realizar atención con lo establecido contractualmente en las ficas PAGA. A la fecha no se presenta PQRSFD.

Fuente: Propia

9.1.2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

9.1.2.1 Procesos Sensibilización

Se establecerá dentro de las sensibilizaciones al personal vinculado al proyecto en todas las áreas sobre temas relacionados con las medidas de manejo ambiental y social del proyecto.

La sensibilización al personal vinculado al proyecto contiene los siguientes elementos:

- Descripción técnica del proyecto
- Presentación de las obligaciones de gestión social de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
- Objetivos, alcances y operaciones de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
- Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales (política general en temas laborales, recursos humanos, condiciones de trabajo y términos de empleo organizaciones laborales, no discriminación e igualdad de oportunidades, reducción

y mecanismos de protección de la fuerza laboral, mecanismo de atención a quejas y reclamos).

- Seguridad vial en obra

- Normas de convivencia con las comunidades laborales sociales y bióticas enfatizando en las limitaciones al personal procedente de otros lugares para la extracción de fauna, flora y demás recursos de los pobladores vecinos del área.

- Mensualmente se realizarán charlas de refuerzo de los conceptos ya incluidos y se complementará con información sobre el avance de las obras, problemas surgidos durante las mismas y soluciones encontradas a modo de lecciones aprendidas. De igual forma se reforzará en estas charlas, aquellos temas que se hayan detectado como de alta sensibilidad para las comunidades y para los colaboradores del proyecto.

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora realizó sensibilización al personal vinculado al proyecto, la información se verificó en los informes semanales reportados por el componente social.

Tabla 41. Consolidado acciones formación a empleados UAERMV

Fecha registro	Tema	Descripción
24, 25 /06/2025	Manejo del estrés	El componente social de la entidad ejecutora realizó sensibilizaciones a los trabajadores de obra y operarios en el frente de obra de San Antonio El Toldo, Capitolio, Unión Tunales.

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto: 50: Sensibilización al personal de obra San Antonio El Toldo.	**Foto: 51: Sensibilización al personal de obra Unión Tunales.**

Tabla 42. Indicadores de cumplimiento del Programa Educación y capacitación al personal vinculado al contrato UAERMV

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	3 sensibilizaciones realizadas x100 / 3 sensibilizaciones requeridas x 100	100%

Fuente: Propia

9.1.3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Para el siguiente programa, la interventoría adelantará labores de verificación, supervisión, acompañamiento a los diferentes momentos establecidos para el programa, con el propósito de garantizar el cumplimiento del mismo, desde el seguimiento a las siguientes actividades.

9.1.3.1 Reuniones participativas

La interventoría verificará que las reuniones se realicen de acuerdo a los parámetros, requisitos y generalidades propuestos por la entidad ejecutora UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV.

La Interventoría revisará y determinará la información a presentar en las reuniones, los formatos a aplicar, el lugar de la reunión, a tratar en las reuniones y el comité veedor.

El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del Proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

La entidad ejecutora, deberá convocar a la población del área de influencia directa del proyecto, Alcaldías Rurales, Organizaciones de comerciantes Administradores, Juntas de Acción Comunal – JAC, entre otras.

Dichas reuniones, por ser masivas y tratarse de personas de veredas distantes pero pertenecientes al mismo sector o tramo, se realizarán presencialmente serán convocados por la entidad ejecutora.

9.1.3.1.1 Reuniones de inicio

Cuando se realicen las reuniones de inicio de obra, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información. El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

Durante el periodo comprendido no se realizan reuniones por no ser necesario.

9.1.3.1.2 Reunión de avance

Cuando se realicen las reuniones de avance de obra cumpliendo con un 50%, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información, asistencia, Esta reunión tiene como fin informa sobre el estado de avance de las obras constructivas y cronograma de ejecución de las actividades faltantes, cuando se complete la ejecución del 50% de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales, informar la fecha de finalización de las obras, y responderá las inquietudes de los asistentes.

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora no realiza reunión de avance por no ser necesario.

9.1.3.1.3 Reunión de Finalización

Se realiza reunión de finalización de obra cuando complete el 95% de las labores constructivas, la Interventoría hará el respectivo reporte donde presentara los resultados de finalización, consolidando la información, asistencia. Esta reunión tiene como fin presentar a la comunidad, los resultados obtenidos, cuando se complete el 95% de la ejecución de la obra verificando el cumplimiento de los compromisos contractuales, informa la fecha de finalización de obra, y responderá las inquietudes de los asistentes.

A la fecha de cierre del presente informe la entidad ejecutora no realiza reunión de finalización, por no ser necesario.

9.1.3.1.4 Reuniones Extraordinarias.

Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en los casos en que el desarrollo del contrato lo amerite, o que la comunidad, la Interventoría, la supervisión del Fondo de desarrollo Rural de Sumapaz lo solicite. Estas reuniones se llevaron a cabo con el fin de tratar asuntos no convencionales y que por su naturaleza o urgencia requerían un espacio para ser revisados. La Interventoría hará el respectivo reporte donde, consolida la información, asistencia.

Durante el desarrollo del presente informe la entidad ejecutora realizó dos reuniones extraordinarias en los tramos viales activos San Antonio grupo I y el Toldo (San Antonio grupo II), las cuales se describen a continuación:

- **San Antonio El toldo**

El 11 de junio del año en curso se participó en una reunión que contó con la presencia de la comunidad de la vereda El Toldo, el alcalde local de Sumapaz y supervisor del Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz, representantes de la firma interventora y de la Unidad de Mantenimiento Vial. El objetivo de buscar soluciones al deterioro de la vía, resultado de esta reunión extraordinaria, se generaron los siguientes compromisos:

Compromisos UMV:

Se paran las actividades instalación de base granular y fresado estabilizado con el fin de hacer los puntos críticos que se encuentran a lo largo del tramo vial (hasta la fecha 30 de junio 2025)

Compromisos comunidad: Buscar solución predio del señor Bernardo Peñaloza donde se encuentran actualmente trabajando los tractores sacando la papa.

Compromisos Interventoría: Revisar con el contratista Consorcio Estabilización Vial, el acta de compromiso “solicitud de permiso para instalación de alcantarilla” predio del señor Bernardo Peñaloza.

Revisar el predio del señor Albino Torres sobre la queja que menciona sobre la actividad que se está realizando actualmente en su predio, comenta que no evidencia encole y descole en la alcantarilla y muestra preocupación por tema.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto: 52: Reunión extraordinaria San Antonio El Toldo.

- **San Antonio grupo 1**

La comunidad de la vereda San Antonio, Grupo 1, solicita que se realice reunión extraordinaria con el fin de recibir información clara sobre el inicio de las actividades por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), el equipo de obra asignado, las labores programadas y sus fechas de ejecución. En respuesta, el ingeniero Jorge Aldana, residente técnico y representante de la UMV, se presenta ante la comunidad e informa que las actividades de limpieza y manejo de aguas iniciaron el día 19 de junio de 2025

en el tramo correspondiente, mediante registro fotográfico, muestra los avances ejecutados hasta la fecha y explica que aún no se ha ingresado material debido al mal estado de la vía en el sector de El Toldo, lo cual ha dificultado el paso. Señala además que las lluvias han limitado el avance de la obra y que, por el momento, se están interviniendo los puntos más críticos. Durante un recorrido técnico realizado por el tramo de San Antonio 1, se identificaron aproximadamente 37 fallos. Una vez finalizada la atención de estos puntos, se iniciarán las actividades de instalación de base granular, a profesional social indica que, una vez se inicie el ingreso de materiales pétreos, se requerirán espacios para su acopio. Frente a esto, la comunidad sugiere que hay áreas disponibles a los costados de la vía que podrían utilizarse para dicha actividad.

9.1.3.1.5 Reuniones comité veedor.

La Interventoría verificará la atención al comité veedor, los cuales son conformados por los mismos ciudadanos, ellos programan las reuniones que requieran. Las profesionales sociales UAERMV realizará acompañamiento a cada uno requerimientos del comité.
La interventoría supervisará la asistencia y cumplimiento de la reunión, los temas a tratar y los compromisos establecidos en cada reunión.

Durante el periodo comprendido no se realizan reuniones con los comités de veeduría ciudadana de los frentes de obra activos, Unión Tunales y Capitolio.

Tabla 43. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Reuniones de Inicio
de reuniones de inicio programadas en el periodo / # de reuniones de inicio ejecutadas en el periodo = # / # x100 = NA
Reuniones Extraordinarias
2 de reuniones extraordinarias programadas en el periodo / 2 de reuniones extraordinarias ejecutadas en el periodo = 2 / 2 X100 = 100%

Reuniones de Finalización	
# de reuniones de finalización programadas en el periodo / # de reuniones de finalización ejecutadas en el periodo = # / # X100 = N/A	
Reuniones Comité Veedor	
1 de reuniones de comité veedor programadas en el periodo / 1 de reuniones de comité veedor ejecutadas en el periodo = # / # x 100 = N/A	
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar en el indicador durante el mes de junio se realizó dos reuniones extraordinarias, con los presidentes de Junta e acción comunal donde indicaron que no realizan más reuniones hasta que se tenga claridad de las intervenciones de los puntos críticos.

Fuente: Propia

9.1.3.1.6. Valla Informativa Móvil

Para la etapa de construcción del contrato se instala las vallas informativas la cual se encuentra ubicada en el frente de obra.

En este periodo la interventoría realizo verificación a la instalación de la valla móvil establecida contractualmente en el documento PAGA, por cuanto que la entidad ejecutora se encuentra realizando labores técnicas, se evidencia cumplimiento en su ubicación, establecidos dos por cada frente de obra.

En recorrido realizado la interventoría evidencio que se encuentra las vallas móviles establecidas contractualmente. En San Antonio El Toldo y Tunal Alto y bajo, y Capitolio.

9.1.3.1.7 Pasacalles

La interventoría solicita que el Consorcio Gaviones 95 realice reposición de pasacalle faltante en el frente de obra Capitolio, por cuanto que de acuerdo al anexo técnico estable que: "El contratista deberá suministrar, instalar y mantener los pasacalles en el inicio/fin de cada tramo a intervenir según las dimensiones descritas en el PMT, previa aprobación por parte de la interventoría" y como ya la Unidad de mantenimiento vial realizó su instalación, el Consorcio realizarán reposición en caso de daño o perdida. A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio no ha hecho la reposición del pasacalle en el tramo vial de la vereda Capitolio. Se encuentran al día en pasacalles de tramo vial Unión Tunales, San Antonio el Toldo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto: 53: verificación valla informativa Unión Tunales</td><td>Foto: 54: verificación valla informativa San Antonio el Toldo.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto: 55: verificación instalación Pasacalles informativa San Antonio el Toldo.</td><td>Foto: 56: verificación instalación Pasacalles informativa San Antonio el Toldo.</td></tr>
</table>

Tabla 44. indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria Frente Unión Tunales – Frente Capitolio – San Antonio El Toldo

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	6 de vallas informativas instaladas x100 / 6 vallas informativas solicitadas.	100%
	5 pasacalle instalados X 100/ **6** pasacalles solicitados.	83.33 %

ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar que la entidad ejecutora realiza la instalación de las vallas informativas cumpliendo con un 100% y pasacalles se cumple con un 83,33 % se encuentra pendiente la reposición de 1 pasacalles al consorcio Gaviones 96,

Fuente: Propia

9.1.3.1.7. Volantes de Información de actividades

Estas piezas de divulgación que incluyen información sobre la fecha de actividades de obra relevante como programación de cierres viales él debe incluir el número de la línea de atención a la ciudadanía y otros aspectos y características específicas que el Contratista, la Interventoría y el Fondo de Desarrollo rural del Sumapaz. Consideren pertinentes y relevantes

- ✓ **Frente Unión Tunales, Capitolio y San Antonio El Toldo.**

La interventoría durante el periodo comprendido del presente informe, evaluó y revisó los volantes informativos, entregados por la entidad ejecutora, así mismo son revisados y avalados por el Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz, en ellos notifican los cierres a realizar en el frente de obra de Capitolio y San Antonio El Toldo, las convocatorias a las reuniones con la comunidad, invitación al ejercicio de control social, con el fin de ser socializados a la comunidad.

A 16

- ***Correos electrónicos trazabilidad de solicitud y aprobación piezas divulgativas volantes y comunicados informativos. UAERMV.***

Tabla 45. Entrega de volantes informativos frente de obra Unión Tunales - Capitolio- San Antonio El Toldo

Fecha	Frente de obra	Descripción de la actividad	Total
9/06/2025	San Antonio El Toldo	Notificación de cierres viales	2 volates en físico 1 virtual

Fecha	Frente de obra	Descripción de la actividad	Total
9/06/2025	Santo DOMINGO Capitolio	Notificación de cierres viales	2 volates en físico 1 virtual
09/06/2025	Unión Tunales	Notificación de cierres viales	2 volates en físico 1 virtual

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto: 57: Volante informativo programación de cierres viales frente de obra Capitolio.

Tabla 46. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	9 volantes entregados/ 9 volantes requeridos X100 =	100 %
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar la entidad ejecutora realiza entrega de volantes informativos de programación de cierres viales, manteniendo informada a la comunidad. Cumpliendo con un 100%	

Fuente: Propia

9.1.3.1.9. Afiche informativo.

Son piezas de divulgación mediante las cuales se describen generalidades de la obra y datos de contacto del Contratista. Estos deben ser instalados en el Punto fijo de atención a la comunidad y en los Puntos fijos Información y se realizará su reemplazo cuando se encuentren deteriorados, contado con el aval de la interventoría.

A la fecha de cierre del presente informe la Entidad Ejecutora realizó instalación de afiches informativos en los puntos informativos, distribuidos de la siguiente manera. Los cuales se relacionan a continuación.

Tabla 47. Consolidada instalación de afiches informativos UAERMV

FRENTE DE OBRA	PREDIO – PROPIETARIO	REGISTRO FOTOGRAFICO
UNIÓN TUNALES	ARNIDIA RUNZA	 **Foto: 58: Afiches informativo Unión Tunales.**

FRENTE DE OBRA	PREDIO – PROPIETARIO	REGISTRO FOTOGRAFICO
SAN ANTONIO EL TOLDO	**LUIS BUSTOS**	 **Foto: 59: Afiche informativo San Antonio.**
CAPITOLIO	ADELOMO MORA	 **Foto: 60: Afiche informativo Capitolio.**
TOTAL 3		

Fuente: Propia

9.1.3.1.10. Puntos informativos fijos

Para efectos del presente contrato, la entidad ejecutora, instalará puntos satélites de información, propuestos en el Plan de gestión social, la interventoría realizará seguimiento en su instalación, estos permitirán una amplia divulgación de la información del contrato.

A la fecha del presente informe el componente social de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV). Implementa tres puntos satélites donde deja instalado afiche informativo, convocatoria a reunión de reinicio en los tramos de Unión Tunales, Capitolio y San Antonio, como se evidencia en la tabla 44

Tabla 48. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria Frente de obra Unión Tunales

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	3 afiches informativos instalados X 100/3 afiches fijos solicitados x100	100%
	3 puntos informativos fijos instalados x100/ 3 puntos fijos informativos solicitados x 100 =	100%

Fuente: Propia

9.1.3.1.11. Actas de vecindad

El acta de vecindad es un documento que se elabora por medio de una visita domiciliaria a cada uno de los predios que se encuentran en el área de influencia directa de la obra. El objetivo de esta actividad es establecer las condiciones físicas iniciales de los predios a fin de determinar variaciones en las mismas derivadas de la ejecución del proyecto.

- ✓ ***Frente Unión Tunales***

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV). hacer entrega de las actas de vecindad realizadas durante la etapa de construcción, las cuales son revisadas y aprobadas por la interventoría en el frente de obra de Unión Tunales, se evidencian 13 actas de vecindad, las cuales fueron relacionadas en el informe mensual 18, estas son revisadas y aprobadas por la interventoría. No aplica para el periodo comprendido.

- ✓ ***Frente Capitolio***

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV) hacer entrega de las actas de vecindad realizadas durante la etapa de construcción, las cuales son revisadas y aprobadas por la interventoría en el frente de obra Capitolio, se evidencian 18 actas de vecindad, las cuales son revisadas y aprobadas por la interventoría su reporte se refleja en el informe mensual social 20, estas son revisadas y aprobadas por la interventoría. No aplica para el periodo comprendido.

- ✓ ***Frente San Antonio El Toldo***

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV), realiza levantamiento de 10 actas de vecindad estas se encuentran todas firmadas por los propietarios y junta de acción de la comunidad, la interventoría realiza revisión y aprobación de las mismas. No aplica para el periodo comprendido.

- ✓ ***Frente San Antonio 1***

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV), realiza levantamiento de 9 actas de vecindad estas se encuentran todas 4 firmadas por los propietarios y 5 sin firmas por parte de los propietarios la interventoría realiza revisión y seguimiento para su terminación.

Tabla 49: actas de vecindad Frente de obra San Antonio El Toldo y unión Tunales junio 2025

NUMERO DE ACTA	PROPIETARIOS	ACTA DE VECINDAD
Tramo vial Unión Tunales		
1	Julio Riveros Acta firmada	
2	Wilfor Lara Acta firmada	

3	Escuela San Antonio Acta sin firma	
4	Robinson Sánchez Acta sin firma	
5	Yanet Prieto Acta firmada	
6	Sigifredo Molina Acta sin firma	

7	Almeiro Zanabria Acta sin firma	
8	Rut Mery Lara Acta firmada	
9	Édison Hernández Acta sin firma	
Total acta 9		

Tabla 50: Consolidado total actas de vecindad de apertura realizadas

TRAMO VIAL	ACTA DE VECINDAD DE APERTURA TOTAL
San Antonio El Toldo	10
Unión Tunales	13
Capitolio	18
San Antonio 1	9
TOTAL ACTAS DE VECINDAD DE APERTURA 40	

9.1.3.1.12. Acta de compromiso

Las actas de compromiso es un documento que se elabora en caso de ser necesario hacer algún compromiso o acuerdo con la comunidad, institución o comerciante, con el fin de realizar alguna actividad de obra que repercuta con la comunidad, el contratista levantará el acta de compromiso.

La Interventoría realiza el seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos en las actas de compromiso y se notificará en el informe correspondiente. Se firma el acta por el componente social y técnico, son revisada y aprobadas por la interventoría.

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora realiza dos actas de compromiso las cuales relaciono a continuación.

- ✓ ***Frente Unión tunales***

La entidad ejecutora durante el periodo no realiza actas de compromiso.

- ✓ ***Frente Capitolio***

La entidad ejecutora realizó en el frene de obra, acta de compromiso con el señor Peñaloza.

Tabla 51: Consolidado de actas de compromiso Frente de San Antonio El Toldo

Fecha registro	Dirección	Propietarios y/o encargado	Descripción
25/06/2025	Vereda San Antonio	K0+450 Señor Peñaloza	La profesional de la Unidad de Mantenimiento Vial, realiza acta de compromiso con el fin de solicitar permiso informar al propietario sobre el arrastre de material a la alcantarilla (material granular detrás del predio) se realiza limpieza y debida disposición del material. 

Fuente: Propia

- ✓ ***Frente San Antonio El Toldo***

La entidad ejecutora durante el periodo no realiza actas de compromiso.

- ✓ ***Frente San Antonio 1***

La entidad ejecutora realizó en el frene de obra, realizó acta de compromiso con la señora Nancy Janeth Prieto, sin ninguna remuneración.

Tabla 52: Consolidado de actas de compromiso Frente de San Antonio El Toldo

Fecha registro	Dirección	Propietarios y/o encargado	Descripción
25/06/2025	Vereda San Antonio	K9*410 Adelmo Mora	La profesional de la Unidad de Mantenimiento Vial, Solicita a la propietaria del predio, permiso para guardar herramientas menores, señalización, la propietaria da su aval. No se genera remuneración.

Fuente: Propia

9.1.3.1.13. Acta de gestión adelantada.

- ✓ ***Frente Unión Tunales***

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora no realizó en el frene de obra actas de gestión adelantada por no ser necesario.

- ✓ ***Frente Capitolio***

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora no realizó en el frene de obra actas de gestión adelantada por no ser necesario.

- ✓ ***Frente San Antonio El Toldo***

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora no realizó en el frene de obra actas de gestión adelantada por no ser necesario.

9.1.3.1.14. Ejercicio de control social.

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora, no realiza actividades de control social, la comunidad manifiesta que no participara en este ejercicio hasta tanto no se tenga un avance significativo de obra en todos los puntos de ejecución de obra, la Unidad de mantenimiento vial tenía programado realiza el ejercicio de control social el 15 de mayo del año en curso.

Tabla 53. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	4 actas de vecindad de San Antonio 1 realizadas / 4 actas de vecindad del tramo San Antonio 1 requeridas x 100	100%
	2 acta de compromiso realizadas x100 / 2 acta de compromiso requeridas x 100	100%
	# actas de gestión adelantada realizadas x100 / # actas de gestión adelantada requeridas x 100	NA
	0 ejercicio de control social realizadas x100 / 0 ejercicio de control social requeridas x 100	NA

Fuente: Propia

9.1.4. PROGRAMA DE CULTURA VIAL

Este Programa tiene como fin generar nuevas actitudes de responsabilidad en relación con el manejo de la infraestructura vial y su entorno por parte de la población vecina u usuaria. Las sensibilizaciones de sostenibilidad y cuidados de las vías se realizarán al finalizar las intervenciones, con el fin de apropiar a la comunidad del cuidado y conservación de las vías a lo largo del tiempo. Por lo anterior, se darán a conocer las recomendaciones que la comunidad debe tener en cuenta para conservar las vías intervenidas permitiendo que sean sostenibles.
Las sensibilizaciones quedaran soportadas por un acta, lista de asistencia y registro fotográfico y se realizará una vez se termine el proceso constructivo.

9.1.5. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA

Este programa busca generar oportunidades laborales a las comunidades donde se ejecute el proyecto, contratando a un porcentaje de la población de mano de obra no calificada, Vulnerable y mujeres esta última regida por el decreto 332/2020, donde indica que para el mes de junio del 2023 para proyecto de construcción se contrate un 13.8%, que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas. Esto facilitará que haya una mayor apropiación del trabajo realizado y se evitarán conflictos con la comunidad.

9.1.5.1 Mano de obra no calificada contratación población vulnerable.

La contratación de población vulnerable, la interventoría verificará el cumplimiento en la contratación de población vulnerable contratado. Dado lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a la contratación de personal en situación de vulnerabilidad, establecido contractualmente en el Decreto 380 del 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. “Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones”.

9.1.5.2 Mano de obra no calificada de la localidad.

Contratación de mano de obra no calificada, la interventoría verificará el cumplimiento del 75% del personal no calificado de la localidad del Sumapaz beneficiada por la ejecución de las obras. De acuerdo a lo enunciado en el anexo técnico que a la letra dice “Teniendo en cuenta la base de datos suministrada por el Fondo de Desarrollo Local del Sumapaz (FDLS) se indicó que, aproximadamente el 75% de la mano de obra no calificada está disponible para la vinculación al proyecto. Por cuanto se hace necesario vincular al personal de mano de obra local según el porcentaje descrito, lo cual sugiere disponer de personal foráneo en un 25% aproximadamente”.

9.1.5.3 Contratación de mujeres.

De acuerdo al Decreto Distrital 332 de 2020, “VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO. Sin perjuicio de la autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y organismos distritales, el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, según corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales de los procesos de selección pública y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales.

La vinculación de mujeres será diferenciada por rama, así:

Ramas de actividad económica	Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contratos		
	A partir del 1 º de junio de 2021	A partir del 1º de junio de 2022	A partir del 1 º de junio de 2023 en adelante
Construcción	6,8%	9,3%	13,8%

9.1.5.4 Contratación de trabajadores en condición de discapacidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal con discapacidad: "Que el numeral 7 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 establece que el Gobierno Nacional debe implementar mediante decreto reglamentario un sistema de preferencias aplicables a los procesos de adjudicación y celebración de contratos de organismos estatales para quienes vinculen laboralmente a personas con discapacidad debidamente certificadas, en un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores, lo que se encuentra reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, establecer un sistema de preferencias como factor de desempate para los proponentes que acrediten por lo menos el 10% de su nómina personas con discapacidad en el respectivo proceso de contratación".

9.1.5.5 Contratación de trabajadores en condición de vulnerabilidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad tales como:

-Madres cabeza de hogar
-Desplazados

Estas condiciones deben ser demostradas mediante certificado que le acredite como persona vulnerable, para ser tenidas en cuenta durante el proceso de selección.

Así mismo en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad".

Tabla 54. Consolidado personal UAERMV

PERSONAL TOTAL	PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA	PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA	TOTAL, MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	TOTAL, MANO DE OBRA NO CLAIFICADA VULNERABLE	TOTAL, DE MUJERES CONTRATADAS
111	85	26	26	2	22
PORENTAJES		**PORCENTAJE % MONC**	**PORCENTAJE % MONCL**	**PORCENTAJE % VULNERABLE**	**PORCENTAJE % MUJERES**
		23,42 %	100 %	1,80 %	19,81%

Fuente: Propia

De acuerdo a los indicadores se evidencia que la entidad ejecutora cumple con la contratación de mano de obra no calificada por cuanto que cuenta con un 100%, de acuerdo con lo establecido contractualmente se debe contratar un 75 %, la interventoría en comité de seguimiento solicita se continue con el cumplimiento a lo establecido contractualmente. Cuentan con 22 mujeres cumpliendo con un 19,81 %.

A 17.

- ***Lista de personal junio UAERMV.***

9.1.6 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

El área social de la Interventoría realiza las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por el ejecutor, en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico.

9.1.6.1. Listas de Chequeo del Contratista:

A la fecha de cierre del presente informe la interventoría realiza la lista de chequeo donde evalúa la gestión realizada en el componente social basados en cada programa que establece las fichas PAGA.

A18

- ***Lista de chequeo mes de junio UAERMV.***

9.1.6.2 Revisión documental

Durante el periodo de este informe se realizó la consulta de los documentos legales:

- Contratos de Interventoría
- Contrato de la entidad ejecutora
- Anexo técnico
- Plan de Gestión Social
- Lista de chequeo
- Bitácora social
- Informes semanales
- Informes mensuales.
- Correspondencia.

A 19

- ***Copia Bitácora Social junio UAERMV.***

9.1.6.3. Informes Mensuales.

En la siguiente tabla se registran los informes mensuales presentados, por la Unidad de Mantenimiento Vila (UAERMV), a continuación, se presenta la trazabilidad de los mismo.

Tabla 55. Trazabilidad Informes mensuales UAERMV

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
1	17 al 31 julio de 2023	El 9 de noviembre del 2023, mediante comunicado 186-1-369 la interventoría solicita entrega de los informes mensuales del componente social de la UAERMV. El 21 de noviembre del 2023
		noviembre por cuanto que en el mes de noviembre no se habían entregado. El 6 de diciembre del 2023, da respuesta a los oficios anteriormente mencionados mediante radicado: 20231900127271, el 12 de diciembre del 2023, la UAERMV hace entrega del informe mensual social correspondiente al mes de julio del 2023 por correo electrónico, el 28 de diciembre del 2023 por correo electrónico la interventoría emite observaciones, La UAERMV hace entrega del documento, con las observaciones subsanadas por correo electrónico en el mes de marzo del 2024, el 4 de abril el 2024 con comunicado 186-1-548, la interventoría da respuesta al radicado.20241920021591 del 29 de febrero de 2024.donde indica que las observaciones emitidas al informe del mes de julio del 2023, fueron subsanadas, se encuentra aprobado por interventoría,

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
		mediante comunicado 186-1-369, reitera la solicitud de los informes mensuales de julio, agosto, septiembre, octubre
2	1 al 31 de agosto del 2023	La interventoría solicita hacer entrega del informe mensual del mes de agosto del año en curso, mediante el comunicado oficio186-1-336 el 18 de octubre del 2023, El 18 de octubre del 2023 la UAERMV, hace entrega del informe mensual del mes de agosto por correo electrónico, El 14 de noviembre la interventoría realizó observaciones al documento por correo electrónico, El 19 de marzo 2024 es entregado con observaciones subsanadas por parte de la UAERMV, el 4 de abril del 2024, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1-547, 11 de abril del 2024, por correo electrónico envía informe con las observaciones subsanadas, se encuentra aprobado por interventoría
3	1 al 30 de septiembre del 2023	La interventoría solicita hacer entrega del informe mensuales del mes de septiembre del año en curso, los cuales fueron observados mediante el comunicado oficio186-1-336 el 18 de octubre del 2023, El 5 de diciembre del 2023 la UAERMV hace entrega del informe con las observaciones subsanadas, el 30 de diciembre del 2023 la interventoría realiza nuevamente observaciones al documento, el 19 de marzo del 2024 la UAERMV hace entrega del informe con las observaciones subsanadas por correo electrónico, la interventoría nuevamente realiza observaciones mediante comunicado 186-1-547 el 4 de abril del 2024. El 11 de abril del 2024, por correo electrónico envía informe con las observaciones subsanadas, se encuentra aprobado por interventoría.
4	1 al 31 de octubre del 2023	El 16 de noviembre del 2023 la UAERMV hace entrega del informe mensual del mes octubre del 2023, por correo electrónico, el mismo día la interventoría realiza observaciones por correo electrónico, el 23 de noviembre del 2023 la UAERMV hace entrega con las observaciones subsanadas, en comité de seguimiento social del 26 de octubre del 2023, la interventoría, da aval al informe, se encuentra aprobado por interventoría
5	1 al 30 de noviembre del 2023	El 5 de diciembre del 2023 la UAERMV hace entrega del informe mensual del mes de noviembre, la interventoría realiza observaciones el 12 de diciembre 2023 por correo electrónico, el 14 de diciembre la UAERMV hace entrega con las observaciones subsanadas, el 30 de noviembre del 2023 la interventoría realiza nuevamente observaciones, el 16 de febrero la UAERMV hace entrega del documento con las observaciones subsanadas por correo electrónico., el 4 de abril el 2024 con comunicado 186-1-548, la interventoría da respuesta al radicado.20241920021591 del 29 de febrero de 2024 de la UAERMV, donde indica que las observaciones

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
		emitidas al informe del mes de noviembre del 2023, fueron subsanadas, se encuentra aprobado por interventoría
6	1 al 31 de diciembre del 2023	El 5 de diciembre del 2023 la UAERMV hace entrega del informe mensual del mes de diciembre versión original, el 12 de diciembre del 2023, la interventoría realiza observaciones por correo electrónico, El 29 de diciembre del 2023, la UAERMV hace entrega del documento con las observaciones subsanadas el 4 de enero del 2024, la interventoría realiza observaciones por correo electrónico, el 16 de febrero el 2024 la UAERMV, hace entrega del documento con las observaciones subsanadas, por correo electrónico, El 4 de abril el 2024 con comunicado 186-1-548, la interventoría da respuesta al radicado.20241920021591 del 29 de febrero de 2024 de la UAERMV, donde indica que las observaciones emitidas al informe del mes de diciembre del 2023, fueron subsanadas. se encuentra aprobado por interventoría
7	1 al 31 de enero del 2024	El 6 de febrero del 2024 la UAERMV, hace entrega del informe mensual a la interventoría por correo electrónico, El 12 de febrero del 2024 la interventoría realiza observación al documento por correo electrónico, el 29 de febrero del 2024 la UMV, hace entrega con las observaciones subsanadas. y el 7 de marzo en comité de seguimiento social la interventoría da visto bueno, informando que una vez los informes anteriores pendientes se entreguen quedaría aprobados, El 4 de abril el 2024 con comunicado 186-1-548, la interventoría da respuesta al radicado.20241920021591 del 29 de febrero de 2024 de la UAERMV, donde indica que las observaciones emitidas al informe del mes de enero del 2024, fueron subsanadas, se encuentra aprobado por interventoría
8	1 al 29 de febrero del 2024	El 05 de marzo de 2024 la UAERMV, hace entrega del documento original, el 26 de marzo del 2024 la interventoría realiza observaciones al documento por correo electrónico, el 5 de abril del 2024, la UAERMV hace entrega del informe con las observaciones subsanadas, El 11 de abril del 2024 por correo electrónico, la interventoría realiza seguimiento y aprobación al informe última versión. Se encuentra a probado por interventoría.
9	1 al 31 de marzo del 2024	El 05 de abril de 2024 la UAERMV hace entrega del documento original, el 11 de abril la interventoría realiza observaciones al documento por correo electrónico, el mismo día la UAERMV subsana las observaciones y hace entrega con las observaciones subsanadas, el 24 de abril la interventoría emite observaciones al documento, por medio del comunicado 186-1- 574, La UAERMV subsanada las observaciones y entrega por correo electrónico el 29 de abril del 2024. Se encuentra aprobado por interventoría.

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
10	1 al 16 de abril el 2024	EL 23 de mayo del 2024, la interventoría realiza observaciones al informe mensual social 10, con observaciones, mediante comunicado dando respuesta a Respuesta a correo electrónico del 1 de mayo del 2024, "*Informe mensual social 10 mes abril 2024.".* UAERMAV El 7 de junio del 2024 mediante radicado: 20241920056681 la Unidad de mantenimiento vial da respuesta al documento subsanado las observaciones. El 18 de junio del 2024 la interventoría da aval al informe mediante comunicado 186-1- 599.
11	1 al 30 de abril del 2025	El 7 de mayo del año en curso, la profesional social realiza entrega del informe mensual de gestión social, la interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-664 del 19 de mayo del 2025. Se encuentra pendiente respuesta al cierre del presente informe.
12	1 al 31 de mayo del 2025	La profesional social hace entrega del informe mensual por correo electrónico el 14 de junio del 2025, la interventoría realizó observaciones 186-1-713 el 24 de junio del 2025, se encuentra pendiente entrega con las observaciones subsanadas.
13	1 al 30 de julio del 2025	A la fecha de cierre del presente informe se encuentra pendiente entrega.

Fuente: Propia

A 20

- ***Radicado: 20251920081301***
- ***comunicado 186-1-713 del 24 de junio del 2025***

9.1.6.4. Informe semanal

En la siguiente tabla se registran los informes semanales presentados por la UAERMV, los cuales se relacionan a continuación, estos son revisado y avalados por la interventoría.

Tabla 56. Informes semanales

N° SEMANA	PERÍODO
45	26 de mayo al 1 de junio del 2025
46	2 al 8 de junio del 2025
47	9 al 15 de junio del 2025
48	16 al 22 de junio del 2025
49	23 al 29 de junio del 2025
50	30 de junio al 6 de julio del 2025

Fuente: Propia

9.1.6.5 Comités de Seguimiento integral

A la fecha de cierre del presente informe la interventoría realiza 4 comités de seguimiento integral que a continuación se relacionan:

Tabla 57. Comité integral de seguimientos UAERMV

No COMITÉ	FECHAS
42	5/06/2025
43	13/06/2025
44	19/06/2025
45	27/06/2025

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto: 61: Comité de seguimiento integral No 42, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá.</td><td>Foto: 62: Comité de seguimiento integral N° 43, CTO Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto: 63: Comité de seguimiento integral No 44, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá.</td><td>Foto: 64: Comité de seguimiento integral No 45, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá.</td></tr>
</table>

Ver anexo técnico actas de comité de seguimiento integral

9.1.6.6. Comités de Seguimiento social

Tabla 58. Comité de seguimiento social UAERMV

No COMITÉ	FECHAS
36	12/06/2025
37	26/06/2025

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO

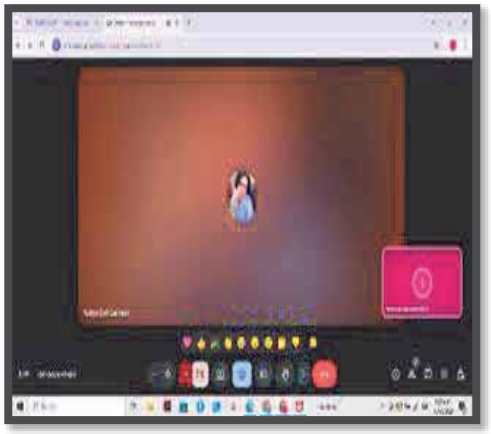


Foto: 65: Comité de seguimiento social No 35, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá.

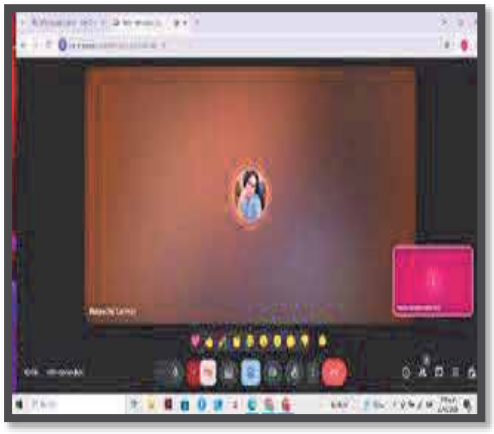


Foto: 66: Comité de seguimiento social No 36, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá.

A 21

- ***Actas de comité de seguimiento social junio UAERMV.***

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto: 67: Mesa de trabajo

9.1.6.7 Correspondencia enviada y recibida.

Durante el desarrollo del presente informe se genera correspondencia, durante el mes de mayo no se presenta correspondencia por parte de la Unidad de Mantenimiento vial.

Tabla 59: Correspondencia recibida y enviada Contrato

Correspondencia recibida			Correspondencia enviada		
Consecutivo	**Asunto**	**Fecha**	**Consecutivo**	**Asunto**	**Fecha**
20251920072261 UAERMV	Respuesta radicada UAERMV No 20251120077682 186-1-665- solicitud entrega de consolidado de actas de reuniones con la comunidad realizadas en el frente de obra de Capitolio.	10/06/2025	186-1-699	Respuesta a Radicado: 20251920072261 Fecha: 10-06-2025, recibido el 11 – 06 - 2025. Solicitud entrega de consolidado de actas de reuniones con la comunidad realizadas en el frente de obra de Capitolio	12/06/2025
			186-1-722	Respuesta al Radicado 20241920010231 del 31 de enero del 2024, UAERMV.	25/06/2025

Fuente: Propia

A 22

- **Correspondencia enviada y recibida.**

9.1.6.8 Estado del Contrato

Estado del contrato 17 de julio de 2023, inicia la etapa de construcción **ACTIVO**

10. CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022

10.1 Actividades de Interventoría

El área social de la Interventoría realizó las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por la entidad ejecutora, en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico. Mediante:

- Recorridos
- Comités de seguimiento integral
- Comités de seguimiento social
- Verificación de documentación.
- Llamados de atención
- Correspondencia enviada y recibida
- Bitácora social
- Lista de chequeo.

- Informes mensuales
- Correspondencia
- Informes semanales.

10.1.1 Estado del Contrato

Estado del contrato 17 de julio de 2023, inicia la etapa de construcción. **ACTIVO.**

11. CONCLUSIONES

- Para el presente periodo, la interventoría ha realizo recorrido conjuntos, con el fin de verificar los requerimientos y cumplimiento de las actividades establecidas contractualmente en el componente, en la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, Consorcio Estabilización Vial.

- El área social de la entidad ejecutora y la interventoría, participaron de los comités de seguimiento integrales y sociales citados por la interventoría.

- Durante el periodo comprendido la interventoría implementa la lista de chequeo, donde se evalúa las actividades desarrolladas por el componente social en el periodo del presente informe la calificación presentada fue de 100 %, para UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.

- Durante el periodo comprendido la interventoría, realiza la lista de chequeo, donde evalúa las actividades desarrolladas por el componente social en el periodo del presente informe, estas no se han realizado en su totalidad, la interventoría realiza llamados de atención al incumplimiento de las entregas de los productos, la calificación presentada fue 100%, para el Consorcio Estabilización Vial.

- Durante el periodo comprendido la interventoría, realiza la lista de chequeo, donde evalúa las actividades desarrolladas por el componente social en el periodo del presente informe, estas no se han realizado en su totalidad, la interventoría realiza llamados de atención al incumplimiento de las entregas de los productos, la calificación presentada fue 50%, para el Consorcio Gaviones 95.

- La Interventoría la Unidad de mantenimiento vial y los Contratista, ha realizado un trabajo conjunto para cumplir con las actividades establecidas contractualmente en el componente social y realizar una adecuada atención a la comunidad.

- La interventoría ha venido realizando la verificación de la atención al ciudadano por parte del contratista en los canales de atención establecidos.

- La interventoría ha venido realizando el acompañamiento y seguimiento al contratista en las reuniones de inicio realizadas en este periodo.

12. RECOMENDACIONES

- Continuar implementando los acompañamientos de recorrido con interventoría, para la ejecución del Plan de Gestión Social conforme lo establecido contractualmente logrando los objetivos propuestos.

- Enfocar las actividades y labores del proyecto en pro de dar reconocimiento de los beneficios de las obras de la localidad de Sumapaz, informando constantemente a la comunidad sobre ello.

- Contar con información clara para mantener a la comunidad al tanto de los avances sobre las labores de los contratos de obra.

- Mantener buena comunicación con los profesionales de las otras áreas, con el fin de poder ir de la mano en la programación e información que el área social deba dar a la comunidad.

- Continuar implementando las mesas de trabajo con el fin de resolver todas las inquietudes, en cada uno de las actividades y productos a entregar para la ejecución del Plan de Gestión Social conforme lo establecido contractualmente logrando los objetivos propuestos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

Consorcio Gaviones 95

A1:
Soportes de pagos señora Balbina.
Comunicado 186-1-701
Comunicado 186-1-716
Comunicado 186-1-724.

Fecha actual: 2024/05/22 | Hora: 07:57 | IP: 186.31.25.161

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa:	PROMOTORA PUGA LTDA	**No. Identificación:**	8300247969
Tipo Identificación:	NIT Persona Jurídica		
Generado por:	LUIS PULIDO		

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	07570978	**Fecha de Emisión**	2024/05/22

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	**No. Producto**	*****9498
Nombre Producto Origen	CAH9498		
Fecha Pago	2024/05/22		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9015411237
Beneficiario	CONSORCIO 2021 INCOP
Valor a Pagar	$2,818,253.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	30000000994
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2 CASAS Y LOTE
Información Adicional	COSNORCIO GAVIONES 095
Estado	En Proceso

Promciutes
1
Gavriones

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: PROMOTORA PUGA LTDA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8300247969
Generado por: LUIS PULIDO

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	09015411237
Nombre Beneficiario	BALBINA PENALOZA
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	30000000994
Valor Abonar	$2,483,884.00
Código Compensación	BANCOLOMBIA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	0000000002
Tipo Medio Notificación	E-MAIL
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	00000597

El RETIRO
↓
PROMOVIVIES
↓
GAVIONES

Fecha actual: 2024/08/20 | Hora: 15:46 | IP: 186.31.25.161

Fecha actual: 2024/08/20 | Hora: 15:46 | IP: 186.31.25.161

Agradezco de

natan T
C. 1.00
el:3106

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: PROMOTORA PUGA LTDA
Tipo Identificación: NIT Persona Juridica **No. Identificación:** 8300247969
Generado por: LUIS PULIDO

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	09015411237
Nombre Beneficiario	PENALOZA BALBINA
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	30000000994
Valor Abonar	$1,241,942.00
Código Compensación	007
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	0000000005
Tipo Medio Notificación	E-MAIL
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	00000515



Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Empresa: PROMOTORA PUGA LTDA
NIT: 830024796
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ARRIENDOBALBINA
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 14164939521

Fecha: 04-07-2024 **Hora:** 15:00:05
Fecha de Generación: 04-07-2024


Fecha de envío del pago: 04-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-07-2024

Impreso por: 52521515

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,241,942.00	**Valor Registros Procesados:** $1,241,942.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
30000000994	Ahorros	901541123	BALBINA PENALOZA 1	1,241,942.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVIENE DE CLIENTE	04-07-2024

Promotores → [illegible]

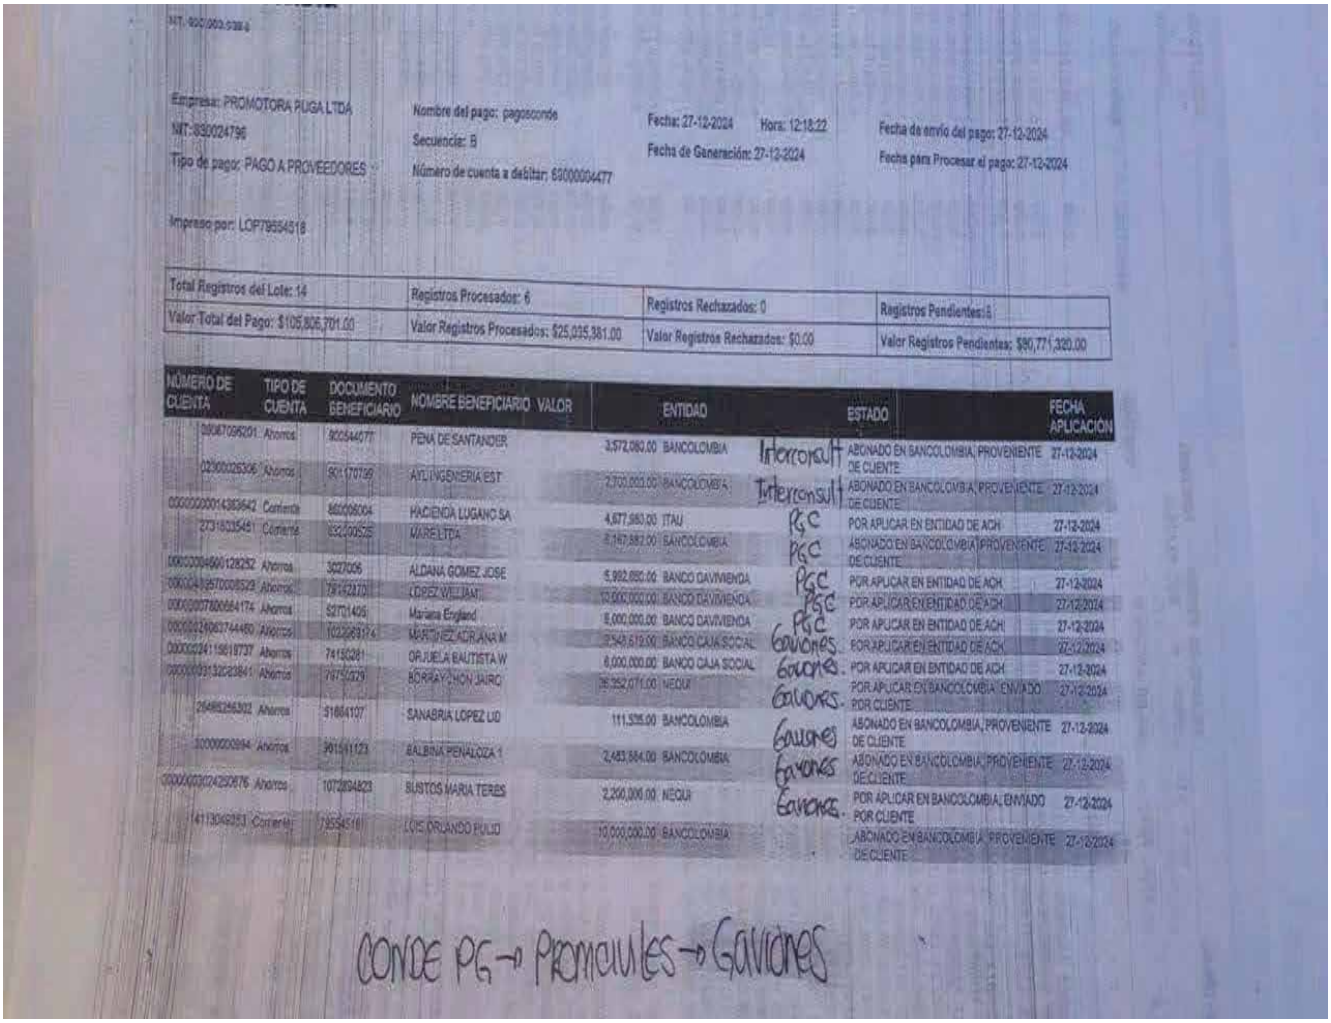

NIT: 830024796

Empresa: PROMOTORA PUGA LTDA
NIT: 830024796
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagosconde
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 69000004477

Fecha: 27-12-2024 Hora: 12:18:22
Fecha de Generación: 27-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: LOP79554318

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 8
Valor Total del Pago: $105,806,701.00	Valor Registros Procesados: $25,035,381.00	Valor Registros Rechazados: $0.00	Valor Registros Pendientes: $80,771,320.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD		ESTADO	FECHA APLICACIÓN
09067096201	Ahorros	900544077	PEÑA DE SANTANDER	3,572,080.00	BANCOLOMBIA	Interconsult	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CUENTE	27-12-2024
02300026306	Ahorros	901170199	AYLLINGENIERIA EST	2,703,003.00	BANCOLOMBIA	Interconsult	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CUENTE	27-12-2024
00000000014383642	Corriente	860066004	HACIENDA LUGANO SA	4,677,960.00	ITAU	PGC	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
27316033451	Corriente	63200525	MARELTDA	8,167,882.00	BANCOLOMBIA	PGC	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CUENTE	27-12-2024
00000004600128252	Ahorros	3027006	ALDANA GOMEZ JOSE	5,992,880.00	BANCO DAVIVIENDA	PGC	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000457000008523	Ahorros	79142470	LOPEZ WILLIAM	12,900,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PGC	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000007800664174	Ahorros	52701405	Mariana England	8,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PGC	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000024063744460	Ahorros	1022369174	MARTINEZ ADRIANA M	3,543,579.00	BANCO CAJA SOCIAL	Gaviones	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000024115619737	Ahorros	7415028I	ORJUELA BAUTISTA W	8,000,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	Gaviones	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000031312523841	Ahorros	7415029	BORRAY HON JAIRO	36,252,071.00	NEQUI	Gaviones	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA ENVIADO POR CUENTE	27-12-2024
26486266302	Ahorros	31864107	SANABRIA LOPEZ LID	111,535.00	BANCOLOMBIA	Gaviones	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CUENTE	27-12-2024
30000650894	Ahorros	901541123	BALBINA PENALOZA 1	2,483,584.00	BANCOLOMBIA	Gaviones	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CUENTE	27-12-2024
00000030024250876	Ahorros	1072804823	BUSTOS MARIA TERES	2,200,000.00	NEQUI	Gaviones	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA ENVIADO POR CUENTE	27-12-2024
14113049253	Corriente	79554318	LOIS ORLANDO RUIZ	10,000,000.00	BANCOLOMBIA		ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CUENTE	27-12-2024

CONDE PG → Promeciules → Gaviones

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-701

Bogotá D.C. 22 de mayo de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: **"**CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde).*

Asunto*:* *Solicitud de Paz y Salvos pagos pendientes a la comunidad Consorcios Gaviones 95.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95, se dé respuesta a:

1. La interventoría solicita se entregue los ***PAZ Y SALVO***, sobre las presuntas deudas que se generaron con la comunidad, por servicios prestados a los ciudadanos que a continuación se relacionan:

   - ✓ ***Wilfor Lara Sanabria*****,** identificado con cédula No. 11.245.318 de San Bernardo, Cundinamarca, quien manifiesta que se tiene una deuda por un total de ***$ 2.335.000, 00*** por concepto de:

     $1.200.000 por el descargue de material en su predio, servicios como internet, $60.000, electricidad $40.000 y 90 platos de comida, con un valor unitarios de $11.500, lo que suma $1.035.000.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-701

- ✓ ***Balbina Peñaloza***, identificada con cédula No. 1.022.956.962, quien solicita el pago por concepto de arriendo de dos meses el cual manifiesta que le aduedan un total de ***$ 4.500.000.00***

De igual manera se entregue el ***PAZ Y SALVO***, sobre la deuda de la *señora Marcela Martínez, de la vereda Laguna Verde de Sumapaz*, *quien realizó un subcontrato de alquiler de volquetas con el Consorcio Gaviones 95, quien manifiesta que se tiene una deuda de $52.943.850.00*, donde la interventoría a treves de comunicado 186-1-625, hace el requerimiento, además ella radica un derecho de petición solicitando el pago y es necesario realizar cierre a estos documentos.

2. Se recuerda al Consorcio que de acuerdo al "*anexo 5 minuta del contrato licitación de obra pública de infraestructura de transporte versión 3, contrato de obra pública No. 478 del 10-02-2022",* donde indica en su "***cláusula 9. obligaciones generales del contratista numeral 25 "****Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la* ***UAERMV*** *o a terceros*.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al Consorcio Gaviones 95, allegue a la interventoría lo solicitado, en un máximo al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-716

Bogotá D.C. 24 de junio de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: **"**CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)*

Asunto*:* *Respuesta al comunicado D-3 del 3 de marzo del 2025 y D 19 del 28 de mayo del 2025.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95, se dé respuesta a:

De acuerdo a la información entregada por ustedes en los comunicados a los cuales se hace referencia en asunto, donde indican que es falso que se le adeuda al señor ***Wilfor Lara Sanabria*****,** identificado con cédula No. 11.245.318 de San Bernardo, Cundinamarca, quien manifiesta que se tiene una deuda por concepto de: $1.200.000 por el descargue de material en su predio, servicios como internet, $60.000, electricidad $40.000, sumando un total de $ 1300.000. El cuidando hace entrega el día 13 de junio del año en curso, un derecho de petición donde relaciona la deuda descrita anteriormente.

La interventoría solicita atender la petición del ciudadano y hacer entrega del ***PAZ Y SALVO***. Se recuerda que la respuesta debe ser como lo indica la ley, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la misma.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-716

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al Consorcio Gaviones 95, allegue a la interventoría lo solicitado, al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: Copia del derecho de petición en un (1) Folio.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

Bogotá D.C 13 de junio de 2025

Cordial saludo

Señores: UMV

Consorcio Gaviones 95

Asunto: derecho de peticion referente a deudas

Yo, Wilfor Lara Sanabria identificado con numero de cedula 11245318 de San Bernardo Cundinamarca, me dijo a ustedes con el fin de recordarles el compromiso que hicimos con respecto al descargue de material que se realizo en mi predio, el cual ya han pasado 24 meses y no se ve reflejado eel pago durante este tiempo. El acuerdo de pago fue po $ 1.200.00. mensuales.

Por otra parte tambien se hizo el acuerdo de pago por los servicios energia electrica e internet, del cual se inicia a prestar el servicio desde el 2 septiembre de 2024 hasta el 30 el octubre del 2024. La cual tiene una suma de $ 60.000 de internet y $ 40.000 de energia electrica.

Agradeszco por su atencion prestada, espero una pronta y positive respespuesta.

ATT: Wilfor Lara

Propietario del predio

Wilfor Lara Sanabria

CC: 11245318

CEL: 3125838297

presidente de la junta

Carlos Suarez

CC: 3.154.818

CEL: 3125855624

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-724

Bogotá D.C. 26 de Júnio de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: **"**CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.) Grupo 1.*

Asunto*:* Solicitud de documentación y actividades pendiente componente social *Consorcios Gaviones 95.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95:

Teniendo en cuenta que el contrato se reinició desde el 16 de abril del 2025, la interventoría informa que a la fecha el Consorcio Gaviones 95, no ha hecho entrega de los siguientes documentos y actividades pendiente por implementar, los cuales relaciono a continuación:

1. Entrega de Informes mensuales 12 mes de abril del 2024 y 13 mes de abril del 2025.

2. Radicación de actas de vecindad del tramo vial de Capitolio, San Antonio I, Laguna Verde con su respectivo registro fílmicos y fotográficos.

3. Se encuentra pendiente la radicación de actas de compromiso de apertura y cierre de acopios realizadas en el tramo vial de Capitolio, este compromiso se adquirió en recorrido socio ambiental realizado el 14 de mayo del año en curso.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-724

4. Reposición del Pasacalles del frente del tramo vial de Capitolio.

5. Instalación y adecuación del punto de atención a la comunidad fijo tramo vial de Laguna Verde

6. Entrega de informe semanales desde el reinicio del contrato, (abril 2025).

7. Entregue de la paz y salvo sobre las presuntas deudas que se generó por servicios prestados al ciudadano Wilfor Lara Sanabria, identificado con cédula No. 11.245.318 de San Bernardo, Cundinamarca, quien manifiesta que se tiene una deuda por un total de $ 2.335.000, 00 por concepto de: $1.200.000 por el descargue de material en su predio, servicios como internet, $60.000, electricidad $40.000, sumado un total de $ 1.300.000

8. Se recuerda al contratista que antes de iniciar actividades técnicas se debe informar a la comunidad por medio de un volante informativo por lo menos de 3 a 5 días de anticipación (Inicio de obras Programación de cierres, vecindad entre otras actividades).

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al Consorcio Gaviones 95, allegue a la interventoría lo solicitado, al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

A2
Trazabilidad pantallazo de entrega y aprobación del volante informativo de inicio de obra en el tramo vial de Laguna Verde.

Gmail **intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>**

Volante ajustado

3 mensajes

residente social cg95 <atencioncomunidadlvcg95@gmail.com> 28 de junio de 2025, 5:51
Para: intersumapazsocial161@gmail.com

Cordial saludo.

Envío adjunto volante informativo Laguna verde, ajustado.

Agradeciendo la atención prestada.

Andrés A García.

VOLANTE DE INICIO DE OBRA LAGUNA VERDE- 28-06-2025.pptx
404K

intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com> 30 de junio de 2025, 19:23
Para: residente social cg95 <atencioncomunidadlvcg95@gmail.com>

Buenas noche Andres
C

El sáb, 28 jun 2025 a las 5:51, residente social cg95 (<atencioncomunidadlvcg95@gmail.com>) escribió:

> Cordial saludo.
>
> Envío adjunto volante informativo Laguna verde, ajustado.
>
> Agradeciendo la atención prestada.
>
> Andrés A García.

intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com> 30 de junio de 2025, 20:06
Para: residente social cg95 <atencioncomunidadlvcg95@gmail.com>

Buenas noches Andrés
Cordial saludo

Una vez revisada la pieza divulgativa, volante informativo de inicio de obra, la interventoría evidencia que se subsanaron las observaciones, la interventoría da aval para fines pertinentes.

Cordialmente,
Isabel Bernal Yasso.
Profesional Social.

A3:
Listado de personal Consorcio Gaviones 95.

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL - SST

CONTRATO NO.	Contrato de obra No 478-2022
OBJETO	"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2019000050020 (SAN ANTONIO I (K13-820+910), CAPITOLIO Y LAGUNA VERDE)".
FECHA REINICIO	martes, 1 de abril de 2025
PLAZO	8 MESES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	lunes, 30 de junio de 2025

LISTADO PERSONAL				OBRA		SALUD	PENSION	ARL		EXAMEN INGR	INDUCCIÓN NOT. RIESGO	DOTACIÓN
No.	NOMBRE	CC	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	ADMINISTRA.	ADMINISTRA.	ADMINISTRA.	RIESGO	FECHA	FECHA	FECHA
1	Luis Orlando Pulido	79.554.518	Director	5/04/2025	No Aplica	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	5	4/04/2025	5/04/2025	5/04/2025
2	Paul Alberto Rangel Páez	88.002.563	Residente SST	5/04/2025	No Aplica	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	5	4/04/2025	5/04/2025	5/04/2025
3	Cesar Augusto Delgado	1.022.324.860	Residente Ambiental	5/04/2025	No Aplica	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	5	4/04/2025	5/04/2025	5/04/2025
4	John Gabriel Yate Botache	1.098.648.719	Residente Técnico	12/05/2025	No Aplica	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	5	11/05/2025	12/05/2025	12/05/2025
5	Maximino Becerra Yacumal	4.743.041	Topógrafo	9/04/2025	No Aplica	SUBSISTEMA FUERZAS GENERALES	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	5	8/04/2025	9/04/2025	9/04/2025
6	Andrés Alberto García Posada	79.756.111	Residente Social	12/05/2025	No Aplica	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	5	11/05/2025	12/05/2025	12/05/2025
7	Wilson Orlando Rodríguez Sanabria	74.334.263	Cadenero	5/04/2025	No Aplica	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	5	4/04/2025	5/04/2025	5/04/2025
8	Arístides Pardo Niño	13.526.015	Oficial de Obra	6/04/2025	No Aplica	FAMISANAR	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	5	5/04/2025	6/04/2025	6/04/2025
9	John Jairo Guerrero Cabrera	79.183.755	Conductor	12/05/2025	No Aplica	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	5	11/05/2025	12/05/2025	12/05/2025
10	William Hernández Ortega	1.000.464.177	Ayudante de Obra	5/05/2025	No Aplica	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	5	4/05/2025	5/05/2025	5/05/2025
11	Katherine Tovar	1.010.220.888	Talento Humano	5/05/2025	No Aplica	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	5	4/05/2025	5/05/2025	5/05/2025
12	Leidy Johana Bastidas Arévalo	1.016.078.304	Secretaria	5/05/2025	No Aplica	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	5	4/05/2025	5/05/2025	5/05/2025
13	Walter Andrés Albino Beltrán	1.013.627.988	Conductor	10/06/2025	No Aplica	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	5	9/06/2025	10/06/2025	10/06/2025

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL - SST

CONTRATO NO.	Contrato de obra No 478-2022
OBJETO	"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2019000050020 (SAN ANTONIO I (K13-820+910), CAPITOLIO Y LAGUNA VERDE)".
FECHA REINICIO	martes, 1 de abril de 2025
PLAZO	8 MESES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	lunes, 30 de junio de 2025

14	Liz Maribel Murillo Naranjo	1.054.709.749	Profesional SISOMA	10/06/2025	No Aplica	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	5	9/06/2025	10/06/2025	10/06/2025
15	Junior Yesid Rodríguez Jiménez	1.192.924.869	Conductor	24/06/2025	No Aplica	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	5	23/06/2025	24/06/2025	24/06/2025
16	Osman Andrés Camacho González	14.327.218	Conductor	25/05/2025	No Aplica	FAMISANAR	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	5	24/05/2025	25/05/2025	25/05/2025

TOTAL, PERSONAL: 16
Mano de obra calificada MOC: 15
Mano de obra no calificada MONC: 1 6,25%
Mano de no obra no calificada Local MONCL: 1 100%
Mujeres: 3 18,75%

A4
Lista de chequeo mes de junio Consorcio Gaviones 95.


BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ	CONSORCIO GAVIONES 95 CTO 478/22 GRUPO 1 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.) CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022	ECOVIAS SAS

FECHA: 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 COMPONENTE SOCIAL

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CONSOLIDADO
		100%	50%	0,0%	N/A	
1	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
2	El personal social cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
3	El profesional social asistió a los comités de seguimiento integral y social a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de Gestion Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Plan de Gestión Social						
Programa de atención al Usurario						
1	Instaló el punto de atención al Usurario.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
2	El punto de atención ciudadano funcionó en el horario establecido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
3	El punto de atención al usuario cuenta con dotación mínima requerida.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRSFD .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
5	Realizó el respectivo seguimiento a las PQRSFD abiertas durante el período de evaluación.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
6	Dio respuesta a las PQRSFD de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
7	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRSFD solicitados por la Interventoría.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
8	El contratista cumplió con los recorridos programados por frente de obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Programa de información y participación comunitaria						
1	Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
2	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
3	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
4	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA

5	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
6	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
7	Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
8	Elaboró las actas de gestión adelantada con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
9	El contratista cumplió con los compromisos en los tiempos pactados con el ciudadano.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
10	Elaboró las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
11	Entregó las actas de vecindad y compromiso a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
12	El profesional hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actas establecidas contractualmente.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
13	Se entregó copia de las actas de compromiso y de vecindad a la comunidad, si son requeridas por la misma, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
14	El profesional social realizó el acompañamiento durante los registros fílmicos del estado inicial de las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
15	Se entregó el respectivo registro fílmico de las vías a la Interventoría para su revisión y aprobación de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
16	La entidad ejecutora realiza acompañamiento al comité veedor conformado por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
17	La entidad ejecutora convoca y realiza reuniónes de comité de participación comunitaria (veedor), de acuerdo a las solicitudes realizadas por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Programa de Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto						
1	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa del cultura vial						
1	Realiza sensibilización de sostenibilidad y cuidado de la vía con las temáticas y el tiempo establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Mano de obra no calificada						
1	Cumplió con el reporte en el informe mensual de personal de mano de obra no calificada local.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

2	Cumplió con el reporte en el informe mensual población en condición de vulnerable.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	Cumplió con el reporte en el informe mensual la contratación de mujeres en el proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Movilidad						
1	El contratista realiza socialización del PMT.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	NA
Información del proyecto						
1	Elaboró e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
2	Elaboró y distribuyó los volantes de inicio a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
3	Elaboró y distribuyó los volantes de finalización de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
4	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información de los cierres programados en la via a la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
5	Elaboró y distribuyó los volantes, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
6	Instaló el (los) Punto(s) informativos fijos de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
7	Realizó mantenimiento a (los) punto informativos y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
8	Instaló la (s) valla (s) informativa (s) móviles y pasacalles de acuerdo a los requisitos y tiempos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
Reportes						
1	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rual del Sumampaz, la información del plan de gestión social .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
2	Tiene disponibilidad al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
3	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Social	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
5	Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de de la Gestión social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
6	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	0%
TOTAL CALIFICACIÓN						**50%**

OBSERVACIONES	
ELABORÓ	
	Profesional social de Interventoría ECOVIAS SAS
	
	Isabel Bernal Yasso
ACEPTÓ	Profesional social del CONSORCIO GAVIONES 95
	
	Andres García

A5

Copia Bitácora Consorcio Gaviones 95.

social de la intervención, a quien se le informa que el mismo 21 de mayo fue creado el grupo de whatsapp Web con el objetivo de propiciar un espacio de participación social, la profesional social al respecto se muestra conforme sin embargo, sugiere que toda actividad que se realice con la comunidad debe llevarse a cabo antes de las 6:00 pm, ya que fue creado muy tarde, además se le da a conocer el oficio que fue entregado en algunos puntos de encuentro ciudadano en el Corregimiento de San Juan informando los canales de atención para la obra Santo Domingo - Capitolio, solicita que para las actividades técnicas en el frente de obra Laguna Verde sea modificado su diseño horas más tarde se envío un nuevo diseño de este piezo de información sin embargo no fue aprobada y sugiere como debe ser ejecutada.

Se realiza acta de vecindad en laguna verde que no había considerada ya que la vivienda hasta ahora esta en proceso constructivo, se observa en obra gris,

Se realiza acta de compromiso con el señor Carlos Contreras quien facilita un área de su predio para acopiar RCD.

Se realiza Capacitación en la temática Comunicación efectiva. - Andrés A García P.o social. Isabel Ramallo P. Social Intervención.

30/05/2025

No se realizan actividades concernientes al componente social - Andrés A García p.o social. Isabel Ramallo P. Social Intervención.

31/05/2025

No se realizan actividades concernientes al componente social Andrés A García p.o social. Isabel B.A P. Social Intervención.

03/06/2025

Se inicia ajustes al informe N° 10 correspondiente al

mes de febrero de 2024, a través de whatsapp, la comunidad informo su descontento por no haber iniciado las actividades técnicas.
04/06/2025 P. Social Isabel B4. Andrea García
se continuan realizando ajustes al info 10 y se inicia a realizar. Cambios al info Nº 11 y 12. Andrea García p.s social
P.S Isabel Bernal Y.
Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
05/6/2025 T. P. 080535212-R
se inicio el informe 13 y 14 y otros insumos solicitados por la intervantoria Andrea García p.s social
P. Social Isabel B. Andrea García
Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
06/06/2025
A las 9:00 AM. se realiza Comite integral de obra. con la firma interventoria y contratista; la U.M.V no se hace presente. debido a inconvenientes surgidos.
Andrea García. p.s social.
Isabel Bernal Y.
P. Social Interv.
Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
7/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.
Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Andrea García
Interv. Escuelas
8/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra
Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Andrea García
9/06/2025
Actividades realizadas
La interventoria realizó revision de informes 10 y 11 los cuales presentaron observaciones
Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Andrea García

10/06/2025
Actividades realizadas
La interventoría realiza revisión a informes mensuales 11. mes de marzo del 2024. El profesional social no se encuentra en el frente de obra

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T. P. 0805352[illegible]

Interventores

Andrés J García

11/06/2025
Actividades realizadas
La interventoría realiza revisión a informe 11 mes de marzo 2024, el cual presenta observaciones, el profesional social no realizó entrega de los informes semanales. El profesional no se encuentra en obra.

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T. P. 0805352[illegible]

Andrés J García

Interventores

12/06/2025
La interventoría realizó comité de seguimiento social la interventoría. Solicita al contratista cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato en el plan de gestión social, por cuanto que a la fecha se encuentra pendiente realizar entrega de los informes 12, 13, 14.

Andrés J García

Entrega de actas de compromiso frente Capitolio por los acopios apertura y cierre
Entrega de actas de veracidad frente de obra de Capitolio, San Antonio 1, Jagua Verde.
Adecuación y puesta en funcionamiento del punto de atención a la comunidad.
Instalación de Parasolle frente de obra Capitolio
Instalación de puntos informativos frente de obra Jagua Verde
Entrega de informes semanales de abril, Mayo y junio del 2025.

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T. P. 0805352[illegible]

Andrés J García

El contratista se compromete a realizar entrega el viernes 13 de junio del 2025 El profesional no se encuentra en obra.

Isabel Bernal Yanes
T.P.

Andrea Garcia

Interventoria
13/06/2025
Actividades realizadas
El profesional social nuevamente radica informes mensuales 10 y 11 con las observaciones subsanadas, se encuentra en revisión por parte de interventoria
La interventoria realizó revisión a la información presentada por el contratista. El profesional Social no se encuentra en obra.

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T.P.

Andrea Garcia

Interv. Ecovias
14/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T.P.

Andrea Garcia

interv. Ecovias
15/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T.P.

Andrea Garcia

interv. Ecovias
16/06/2025
Actividades realizadas
El profesional Social realizó entrega del informe mensual Social #14 mes de mayo del 2025, Se encuentra en revisión por parte de interventoria. El profesional social no se encuentra en obra.

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T.P.

Andrea Garcia

17/06/2025
Actividades realizadas
La interventoría realizó revisión del informe mensual social #14 mes de mayo del 2025

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Inter. Ecovias

Andrea J García

18/06/2025
La interventoría hace entrega del comunicado 186-1-701 donde Solicita los paz y salvos por deudas pendientes a la comunidad. Señor Wilfer Lara, Señora Balbina Peñabra, Marcela Martínez
La interventoría continua en la revisión del informe mensual social #14 mes de mayo del 2025. El profesional social no se encuentra en obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R
Inter Ecovias

Andrea J García

19/06/2025 y 20/06/2025
Actividades realizadas
La interventoría continúa con la revisión del informe mensual social # 14 mes de mayo 2025 el cual presento observaciones. El profesional social no se encuentra en obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Inter Ecovias

Andrea J García

21/06/2025
Actividades Realizadas
No se realizan actividades de obra

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Interven. Ecovias

Andrea J García

22/06/2025
Actividades Realizadas
No se realizan actividades de obra

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

23/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Andrés García

Inter Ecovías

24/06/2025
Actividades realizadas
La interventoría hace entrega de Comunicados al Consorcio 186-1-716 Respuesta al Comunicado 03 del 3 de marzo 2025 y 019 del 28 mayo del 2025. Solicitud Paz y Salvos Señor Wilfer Jara Sinabria.
186-1-718 → Respuesta al correo electrónico del 18 de Junio del 2025 observaciones informe social # 124 mayo 2025. El profesional no se encuentra en obra.

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Andrés García

Inter. Ecovías

25/06/2025
Actividades realizadas
El componente social no realiza actividades de obra. La interventoría solicita se realicen y se de cumplimiento a las actividades establecidas en el Componente Social. El profesional no se encuentra en obra

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Andrés García

Inter Ecovías

26/06/2025
Actividades realizadas
El Profesional Social realizó entrega del Volante informativo de Inicio de obra, la interventoría realizó observaciones e indica que se entrega con las observaciones subsanadas y poder hacer entrega de inmediato a la Comunidad por cuanto que este se debio entregar la Semana pasada por cuanto que el profesional informa que el 24 de junio del año curso inicia actividades técnicas constructivas.

Se recuerda al contratista que este se debe entregar de 5 a 3 días de anticipación en: (Inicio de obra, Programación de cierres, actas de vecindad, entre otras actividades) como se establo contractualmente en el Plan de Gestión Social.

- La interventoría realizo entrega del Comunicado 186-1-724 el 26/06/2025. realiza Solicitud de documentación y actividades del Componente Social pendientes.
- La interventoría realizó Comité de Seguimiento Social, donde solicita al contratista cumplir con las obligaciones establecidas en el plan de gestión Social, por cuanto que a la fecha continúa pendiente la entrega de:
  - Entrega de actas de compromiso frente de obra Capitulo acopios apertura y cierre.
  - instalación de Pasacalles frente de obra Capitulo
  - Entrega de actas de vecindad de Capitulo, Laguna verde, San Antonio 1
  - Entrega de informe 12 y 13 mensual
  - Entrega de informes Semanales mayo y junio del 2025
  - Instalación Punto de atención a la Comunidad fijo Laguna Verde. El profesional no se encuentra en obra

Isabel Bernal Ynoa
Trabajo Social
T. P. 0805535212-R

Andrés Garcia

Inter. Ecovias
27/06/2025
Actividades realizadas
El Componente Social realizó acompañamiento y participó en el comité de Seguimiento integral #49, con el fin de realizar Seguimiento a cada uno de los compromisos adquiridos en cada Componente técnico, ambiental, SST y Social.

Andrés Garcia

El profesional social hace entrega del volante informativo con las observaciones señaladas la interventoria solicita sea entregado de inmediato.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-9

Andrea Garcia

Inter. Ecoulas
28/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades actividades de obra

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-9 Interecoulas

Andrea Garcia

29/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-9

Andrea Garcia

Inter. Ecoulas
30/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-9

Andrea Garcia

1/07/2025
Actividades realizadas
La interventoria realizo llamado de atención al Comparante Social mediante Comunicado 196-1-729 por cuanto que a la fecha no se ha cumplido con los requerimientos contractuales establecidos en el plan de gestión social. El profesional no se encuentra en obra

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-9

Andrea Garcia

2/07/2025
Actividades realizadas

A6
Comunicado 186-1-718 el 24 de junio del 2025, observaciones informes mensuales 14 V1.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-718

Bogotá D.C. 24 de junio de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
Bogotá D.C

Referencia: **"**CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)*

Asunto*:* *Respuesta al correo electrónico del 16 de junio del 2025. Informe mensual social N° 14 – mayo – 2025. Consorcio Gaviones 95.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95, se tienen las siguientes observaciones del documento relacionado en el asunto Informe mensual No. 14 del mayo de 2025.:

1. Página 2, El control interno de firma, se encuentra sin firmas, subsanar.

2. Página 3, tabla de contenido, se evidencia diferente tamaño de letra

3. Pagina 9. "Tabla 3 Localización de tramos del proyecto regalías Sumapaz con abscisado y coordenadas" bajar titulo

4. Página 13, tabla 4. Información Contractual, actualizar información.

5. Página 13, Tabla 13: Indicadores de Gestión Programa de Educación y Capacitación al Personal vinculado al proyecto, en la columna de indicador No. de sensibilizaciones programadas 10 / No de sensibilizaciones realizadas 1 * 100, se indica que se tiene un 11 %, ¿se programaron 10 se sensibilizaciones en el periodo? Si es una subsanar.

1. Página 14, tabla 5. Datos generales del contratista, actualizar información.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-718

2. Página 15, tabla 6. Datos generales de la interventoría, actualizar información.

3. Página 25, bajar título “Tabla 11 Productos sociales en etapa de pre- construcción”

4. Pagina 26, 8. Plan de gestión social, no se describe el estado del plan de gestión social, indicar su trazabilidad en cuanto a observaciones y aprobación.

5. Página 31 la imagen uno, la fotografía no está georreferenciada. No se evidencia de donde es la fotografía. Subsanar.

6. Página 31 “Tabla 12. Indicadores de Gestión Programa de Atención al Usuario.” bajar el titulo se evidencia la tabla cortada.

7. Página 33, “Tabla 13: Indicadores de Gestión Programa de Educación y Capacitación al Personal vinculado al proyecto” bajar título, se evidencia tabla cortada.

8. Pagina 39, Tabla actas de compromiso, no se encuentra enumerada ni con título, completar información. Subsanar.

9. Página 41 “5 a 3 días con la debida oportunidad” en el informe se evidencia pegada la palabra “oportunidad”. Subsanar.

10. Página 42 “El afiche informativo tendrá una medida de 42 cm de ancho por 29,7 cm de largo. Durante este periodo se realizó un nuevo afiche, sin embargo, a la fecha no ha sido aprobado por la profesional social de la firma interventora” se solicita aclare el contratista por que el comentario de la solicitud de la interventoría e indicar porque no se ha realizado aprobación describir trazabilidad.

11. Página 42 “Puntos fijos informativos. Se proyectan dos (2) sitios, donde se ubicarán afiches informativos”, no sólo se instala afiches, también volantes informativos, además realizar descripción de donde estarán ubicados los puntos.

12. Página 43 “Durante el mes de mayo no fue instalado Pasacalle, se proyecta para el mes de junio instalar un Pasacalle en el frente de obra de Capitolio”. Escribir ¿por qué a la fecha no se ha hecho instalación?

13. Página 45, Tabla 14 Indicadores de Gestión y Participación comunitaria, columna de indicador, descripción del indicador, se encuentra mal formulado, la reunión de inicio, actas de compromiso, actas de vecindad, número de asistentes, número de asistentes. Ejemplo N° de volantes programadas 10 /No de volantes entregados 10 x 100 = 100%.

14. Pagina 51. 9. Vinculación de mano de obra, en el informe se reporta un total de 11 trabajadores, no coincide con el total de personal reportado por el componente SST donde reportan 12 trabajadores, se solicita unificar la información de acuerdo al reporte del componente SST para todos los informes que se presenten, de igual manera Angie Tatiana Labrador Profesional de Calidad, indican que desde hace 2 años no trabaja en la empresa.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-718

15. No se evidencia certificación del personal relacionado como mano de obra no calificada local.

16. Página 53 “Tabla 19 Indicadores de gestión vinculación mano de obra” verificar porcentajes.

17. Página 53 “Es importante afirmar que la profesional social de la firma interventora solicito los nueve informes realizados durante agosto de 2022 hasta mayo de 2023, con el fin de conocer las actividades realizadas y sugerir ajustes, tales como firma de los documentos anexos e incluir fotografías de……” no es clara la información mejorar redacción, en la descripción de las actividades se deben colocar de manera muy puntual que tipo de actividades se ejecutó, colocar únicamente la actividad sin alargarse más en comentarios. revisar y subsanar

18. No se evidencia información del estado de los informes incluir una tabla donde se describa el estado de cada informe mensual desde 1 al 14, incluir un título.

19. No se evidencia la trazabilidad de los informes semanales, incluir un título.

20. Página 54 “Tabla 20 Comités Integrales realizados durante el mes de mayo de 2025” Completar información, durante el mes de mayo se realizaron 4 comités. comité 42 el 9 de mayo, comité 43 el 16 de mayo, comité 44 el 21 de mayo y el 29 de mayo el comité 45.

21. Incluir un título para la trazabilidad de la correspondencia envida y recibida, falta incluir información.

22. Conclusiones mejorar redacción “se solicita aclare el contratista ¿por qué el comentario de la solicitud de la interventoría? e indicar por que no se ha realizado aprobación describir trazabilidad.

23. Página 64, cerrar el formato, donde no se evidencia registro fotográfico.

24. Se evidencia que los separadores de los anexos no corresponden. Subsanar.

25. Los formatos de los anexos deben tener el visto bueno de la profesional social de la Unidad de Mantenimiento Vial.

26. Los formatos se encuentran sin firma de la interventoría. Subsanar.

27. No se evidencia tabla de ilustraciones.

28. No se evidencia tabla de anexos.

29. No se evidencia tabla de fotos, es de aclarar las fotos no son imágenes. Subsanar.

30. Revisar y subsanar la numeración de las tablas.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-718

31. Para efectos de ser más precisos, si en el período, no se ejecutaron actividades en el proyecto, se debe colocar en cada programa que no se realizaron/ejecutaron actividades de obra. esto se debe hacer para cada informe y justificar, ejemplo Reuniones de avance No aplica para el periodo, por no ser necesario.

32. En la descripción de las actividades se deben colocar de manera muy puntual que tipo de actividades se ejecutó, colocar únicamente la actividad sin alargarse más en comentarios. revisar y subsanar.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al Consorcio Gaviones 95, se subsanen las observaciones, se radiquen en un máximo de 3 días calendario, al recibo del presente comunicado.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: NA

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

Gmail **Intersumapaz Ecovias <intersumapaz.ecovias@gmail.com>**

186-1-718 Rta. correo electrónico del 16-06-25. Informe mensual social N° 14 may-25. Consorcio Gaviones 95.

1 mensaje

Intersumapaz Ecovias <intersumapaz.ecovias@gmail.com> 24 de junio de 2025, 8:55 p.m.
Para: Informacion - PuGa <info@promotorapuga.com>, CDI Sumapaz <cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co>, Correspondencia <correspondencia@umv.gov.co>
CC: Jose David Donoso Tovar <jose.donoso@gobiernobogota.gov.co>, intersumapazsocial161 <Intersumapazsocial161@gmail.com>

Cordial saludo,

Se adjunta el comunicado relacionado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Ermy Hurtado R.
Directora de Interventoría
ECOVIAS - SUMAPAZ

186-1-718 Rta. correo electrónico del 16-06-25. Informe mensual social N° 14 may-25. Consorcio Gaviones 95..pdf
241K

A7
Acta de comité social N° 8 y N° 9

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Objeto de la reunión: Comité de Seguimiento Social #8. C- Tauruses 95

Fecha: 12/06/2024

Hora de inicio: 9:30am

Hora de finalización: 10:30am

Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

Lugar: Virtual

Dependencia:

Nombre del Responsable:

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
C	52171824	Isabel Bm14.	Tauruses	A-Social		✓							✓	Integrsempaz sept 16, 1@gmail.com	Isabel B.Y.
C	79756.14	Andrés García	Tauruses 95	A-Social		✓							✓	Atencionalciudadano egmail.com	Andrés García

Versión: 1 | Vigente desde: 29 de agosto de 2024 | Código: GDI-GPO-F029 | Página 1 de 2

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Verificación de Compromisos.

1- Entrega de informes 10, 11, 12, 13, 14., Se encuentra pendiente entrega

2- Entrega Consolidado de actas de compromiso frente Capitolio por concepto de acopios apertura y cierre pendiente entrega

3- Entrega actas de vecindad de capitolio, San Antonio 1, Jagua verde pendiente. entrega

Desarrollo del comité

→ Programa de atención al Ciudadano
a la fecha el profesional no ha hecho adecuación del punto de atención a la Comunidad. Informa que se instalará en la Casa de la vereda Aures
La interventoria Solicita Se informe donde se encuentra. Ubicado.

Programa de información y Participación
Valla informativa módulos
La interventoria Solicita Su implementación en el frente de obra-
Pasacalle.
La interventoria Solicita se realice la instalación en el frente de obra de capitolio
Afiche informativo
Se encuentra pendiente la interventoria realiza observaciones

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Actas de Seguridad

Pendiente entrega- Mercedes

Contratación Personal

Contratación 5 trabajadores APC
1 Contratación de nivel. 2.

Informes Pendientes

10. 11, 12. 13, 14. pendiente entrega.

Informes Semanales
pendiente entrega.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de Informes mensuales pendientes 12, 13, 14.	Ing. [illegible]	25/06/2025
2	Entrega acta de compromiso por capítulo	Ing. [illegible]	25/06/2025
3	Instalación pasacalles	Ing. [illegible]	25/06/2025
4	Instalar puntos Satélites	Ing. [illegible]	26/06/2025
5	Instalación punto de atención a la comunidad	Ing. [illegible]	2/06/2025

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de evidencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen herramientas.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Objeto de la reunión: Comité de Seguimiento Social #9 C. Jaulones 95

Fecha: 29/06/2024.

Lugar: Virtual

Dependencia:

Hora de inicio:

Hora de finalización:

Nombre del Responsable:

Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (también razón legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO / TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
C	52171824	Isabel Berral Y. Ecalas		P. Social			✓						✓	interlocutorp.social16l@gmail.com	Isabel Berral
C	79756.111	Andrés García	C. Jaulones 95	P. Social			✓						✓	atencionalmundo9@gmail.com.	Andrés García

COMENTARIOS:

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Verificación de compromisos:

1- Entrega de informe 10, 11, 12, 13, 14.
El profesional social hace entrega del informe 10, 11. se encuentra en revisión por parte de interventoria

2- Entrega informe mensual Social # 14 mayo →
El contratista hace entrega el 16 de junio del informe, presento observaciones mediante comunicado -

3 Entrega Consolidado de actas de apertura y cierre tramo vial de Capitolio. Jueves 3 julio - 2015

4- Entrega de actas de vecindad San Antonio 1, Capitolio, Laguna Verde.
pendiente entrega. U jueves 3 julio se realiza entrega

Desarrollo del comité

1. Programa de atención al Ciudadano

A la fecha el contratista informa que ya cuenta con un sitio para hacer atención a la comunidad en la casa de la Señora Clara Martinez que realiza reposición para ubicar el punto. que los horarios de atención serán los Martes 8-3a.m a 3:00 p.m y los Viernes 8 a 12 medio dia Laguna Verde.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

→ Programa de Información y Participación

Volante.

El Contratista hace entrega del volante informativo de inicio de obra indica que inician el 22 de junio, la interventoría solicita realizar entrega el día 26/06/2025. a la comunidad por cuanto que el tiempo no se cumple de acuerdo al plan de gestión Social.

El Contratista se compromete a realizar entrega

Inicia actividades desde la K0+00 K0+200.

acta de compromiso (15 días)

→ Programa de Educación y Capacitación al personal

El profesional informa que para el presente ítem no realizará entrega no programa Sensibilizaciones

pendiente Pasacalles, valla informativa.

Contratación de personal

5 trabajadores NO C


2 trabajador NO C L.

Informes pendientes 12, 13

Informes Semales

26/06/2025 de abril- pendiente Mayo - Junio.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

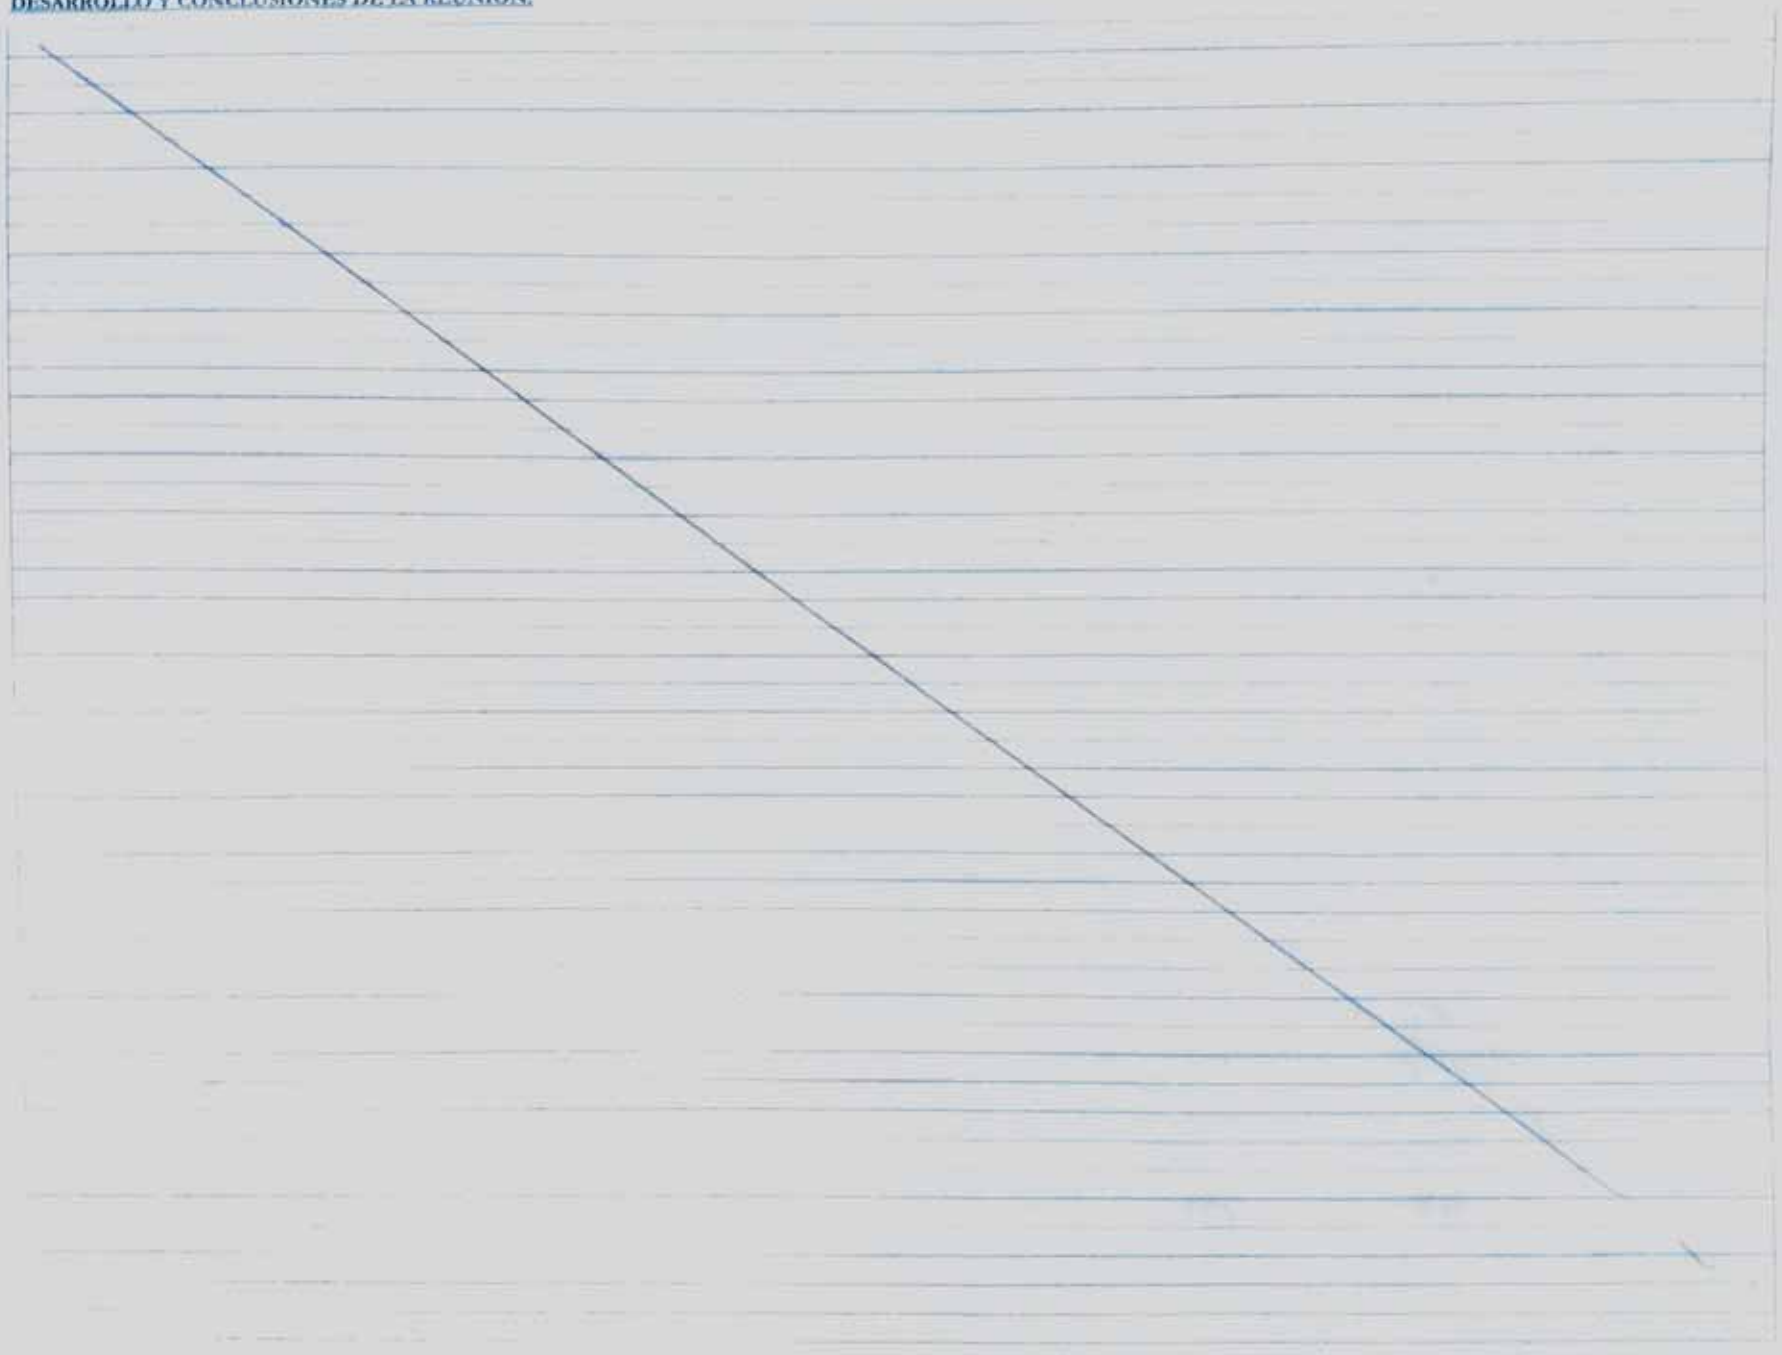

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de informes mensuales Pendientes 12, 13, 14.	Jaunes 95	1/07/2025
2	Entrega actas de comprom. pendientes capítulo 6	Gilberto 95	2/07/2025
		Jaime 95	2/07/2025
3.	Instalación Pasacalles	Juan 95	1/07/2025
4	Entrega de Update informativo Inicio de obra	Carlos 95	27/07/2025
5.	Instalación puntos satelitales	Juan 95	27/07/2025
6.	Instalación valla Antenas	Jaime 95	4/07/2025
7.	Instalación punto satelital	Juan 95	7/07/2025

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o pantallazos que generen evidencia.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

Consorcio Estabilización Vial

A8

Correos electrónicos pantallazos trazabilidad de solicitud y aprobación de pieza divulgativa volante convocatorio a contratación mano de obra no calificada.

Gmail **intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>**

Volante Monc

2 mensajes

Social CEV <socialconsorcioev@gmail.com> 23 de mayo de 2025, 11:54
Para: intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>
Cc: Consorcio Estabilización Vial <cevsumapaz@gmail.com>

Buenos días

Remito pieza comunicativa de convocatoria laboral Monc, para su revisión, quedando atenta a comentarios o sugerencias.

Pieza comunicativa MONC.pptx
562K

intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com> 26 de mayo de 2025, 10:40
Para: Social CEV <socialconsorcioev@gmail.com>

Buenas dias,
Cordial saludo
Una vez revisada la pieza divulgativa de convocatoria de contratación laboral para el Consorcio, se da aval, para su respectivo trámite.
Quedo atenta a cualquier inquietud.
Mil gracias.

Cordialmente,
Isabel Bernal Yasso.
Profesional Social.

Gmail **intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>**

Volante Monc

2 mensajes

Social CEV <socialconsorcioev@gmail.com> 23 de mayo de 2025, 11:54
Para: intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>
Cc: Consorcio Estabilización Vial <cevsumapaz@gmail.com>

Buenos días

Remito pieza comunicativa de convocatoria laboral Monc, para su revisión, quedando atenta a comentarios o sugerencias.

Pieza comunicativa MONC.pptx
562K

intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com> 26 de mayo de 2025, 10:40
Para: Social CEV <socialconsorcioev@gmail.com>

Buenas dias,
Cordial saludo
Una vez revisada la pieza divulgativa de convocatoria de contratación laboral para el Consorcio, se da aval, para su respectivo trámite.
Quedo atenta a cualquier inquietud.
Mil gracias.

Cordialmente,
Isabel Bernal Yasso.
Profesional Social.

A9

CEV/22-409 del 5 de junio del 2025 Radicación actas de vecindad de apertura tramo San Antonio II El Toldo Unión Tunales

186-1- 717 del 24 de junio del 2025. Respuesta al comunicado CEV/22- 409, del 5-06-25, Actas de vecindad de apertura sector San Antonio II El Toldo y Unión Tunales CEV.

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Nit: 901563835-7

CEV/22-409

Bogotá D.C., 5 de junio de 2025

Recibí: Isabel Bernal
5/06/25
1:00 p.m.

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Radicación de actas de vecindad

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos adjuntar las siguientes actas de vecindad originales:

- 14 actas de vecindad del tramo Tunales
- 2 actas de vecindad del tramo San Antonio, las cuales se encontraban pendientes.

TRÁMITE INTERNO
ATENDIDO POR: I. Bernal
RESPUESTA OFICIO No. 186-1-717

Cordialmente,

Hernando Laverde

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

ECOVÍAS S.A.S
No. RADICADO: 186-3-1195
FECHA: 5 JUN 25 HORA: 1:00 PM
RADICADO POR: L. Tenorio
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO, NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Con copia: - Archivo
Anexo: 16 actas de vecindad en original
HLM/ac

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-717

Bogotá D.C. 24 de junio de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: "*CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROSGAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020"). (San Antonio II (K6+910- K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas."). GRUPO 2:*

Asunto: *Respuesta al comunicado **CEV/22- 409,** del 5 de junio del 2025, Actas de vecindad de apertura de los tramos viales de Unión Tunales y San Antonio El Toldo. CEV.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, en atención al radicado del asunto, a través del cual el Consorcio Estabilización Vial, Radica el documento denominado actas de vecindad de apertura de los Tramo Vial- Unión Tunales, 14 actas de vecindad y Tramo Vial de San Antonio El Toldo 2 actas de vecindad, una vez revisados los documentos se tienen los siguientes comentarios:

Se da aval a las 14 acta de vecindad de apertura del frente de obra de Unión Tunales y de 2 actas de vecindad de San Antonio el Toldo, y se realiza devolución en físico de un total de 16 actas de apertura con las firmas respectivas.

Dichos anexos fueron remitidos de manera física al Consorcio Estabilización Vial.

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: dieciséis (16) Actas en Cuarenta (58) Folios

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV
Elaboro: IBY
Reviso: EHR

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

CONSORCIO
ESTABILIZACIÓN
VIAL

Nit: 901563835-7

SECTOR UNIÓN TUNALES

VEREDA TUNAL

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No. 01 - Tramo 1

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127053-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que estos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.uaerm.gov.co.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N-A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N-A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N-A	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	Obras hidráulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N-A	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	N-A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CODIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
24 Enero 24	Suma Paz	Cenca RIO Suma paz	Vereda Tunal Bajo	KO + 000	Unidad Funcionales	2007642	

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante: Alberto Delgado			# Telefono: 3224724065	Dirección: Finca La Argentina.					
No. de pisos del predio: 1	UNO	Estrato: 1	# Movil: 3224724065						
Año aproximado de construccion del predio con la normativa NSR-10: 1964	N-A	Edificacion construida o remodelada recientemente:	NO	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio	NO	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	SI	No presenta fisuras o grietas visibles	SI

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERISTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	SX	1. Residencial	X	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	NO	Cuenta con pozo septico, el servicio de acueducto se provee del diametro 2".
2. Alcantarillado	NO	2. Comercial	—			
3. Energía	SI	3. Industrial	—	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	SI	
4. Teléfonos	NO	4. Institucional	—			
5. Gas	NO	5. Lote Baldío	—			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	NO cuenta con sistema porticado.
Paredes	X	NO	Sistema combinado de bloque y teja con presencia de separacion en junta de bloques, en su mayoria a la vista.
Ventana y puertas	X	NO	En madera en regular estado, vidrio en pasta - muy antiguo.
Cerramiento	SI	X	Vivienda dentro del predio rural - Cerramiento en colindancias.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	NO	Ver item 4 de la presentación de esta acta.
Recubrimientos	SI	NO	No aplica, acceso al predio en tierra.
Rampas de acceso	X	NO	En tierra terreno natural (ver Fotografia).

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila MenB Nombre: Camila Mendivelso B Identificación: 52171764	PROPETARIO / HABITANTE:	Firma: Nombre: Otoniel DelgadoR Identificación: 1074576150
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: RuzC Nombre: Richard Betancourt R. Identificación: 1069751169	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Barnaly. Nombre: Isabel Barnaly. Identificación: 52171922

** NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS: #1

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica entre otras

Predio ubicado en tramo 1 de Sector Tunales, entre las abscisas K2+000 y K2+230, predio rural con Cerramiento en madera-"rollizos" y alambre de púas en 3 hiladas en general en regular estado ya que en algunos puntos se el alambre presenta oxidación. La encargada del predio informa que el predio se encuentra en proceso de desenglobe con el fin de Construir Varias viviendas, propiedades de las hermanas Delgado. El predio se encuentra en "desnivel" hacia abajo al ingreso del mismo, en donde se encuentra una Vivienda Constituida por una construcción rústica con pisos en general en tierra. Presenta el predio unas "Enramadas" al lado de la vivienda que se encuentran en construcciones mixtas con varias fisuras en los muros construidos con bloques. Pisos en madera se encuentran muy deteriorados y con desnivel. En parte exterior de la vivienda se encuentra un lavadero construido en piedra y se encuentran mangueras que "traen" el servicio de acueducto veredal. Presencia de varios individuos arbóreos. Sobre límite de la vía en costado derecho en abscisa K2+160 se encuentra construido en madera, un establo que está siendo utilizado en el momento. La visita es atendida por la encargada Adriana María Cifuentes. Nota: Se Complementa esta acta de vecindad con registros de fotos y videos.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No. 02

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de sus funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad misional, que estos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.uaerm.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N-A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N-A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N-A	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	Obras hidraulicas Filtro, cunetas y alcantarillado.
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N-A	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	N-A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
23 Enero 24	Sumapaz	Cuenca Rio Sumapaz	Vereda Tunal Bajo	Izquierdo K100-K0+050 Derecho K2+730-K0+040	Tramo 1 Tramo 2	20076 242.	

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante: Amidia Ruiza Encargado		# Telefono: ———		Dirección: K2 7640 Vereda Tunal bajo costado derecho.	
No. de pisos del predio: 1	UNO	Estrato: 1	# Movil: 322 472 4065		
Año aproximado de construccion del predio con la normativa NSR-10: 1984: N-A	Edificacion construida o remodelada recientemente: NO		La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio: NO	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	No presenta fisuras o grietas visibles: NO

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERISTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	SI X	1. Residencial	X	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	Si	Se trata de un predio rural, constituido por finca en donde se encuentra Invernadero, Cercas veredes, caballos y pistol dos viviendas.
2. Alcantarillado	NO	2. Comercial	—			
3. Energía	SI	3. Industrial	—	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	Si	
4. Teléfonos	NO	4. Institucional	—			
5. Gas	NO	5. Lote Baldio	—			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	NO	Las viviendas no presentan sistema estructural
Paredes	X	NO	Se describe en la pagina 2. desde el presente formato.
Ventana y puertas	X	NO	Se describe en la pagina siguiente de este formato.
Cerramiento	X	NO	Finca con cerramiento en collizos y alambre pua

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	XNO	No tiene
Recubrimientos	SI	XNO	no tiene
Rampas de acceso	SI	X	El predio se encuentra en tierra alrededor.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila MenB Nombre: CAMILA MENDIVELSO Identificación: 52171764 Bta	PROPETARIO / HABITANTE:	Firma: Amidia Ruiza Pinilla Nombre: Amidia Ruiza Pinilla Identificación: 39800350
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: [signature] Nombre: Richard Betancourt R. Identificación: 1069751169	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Bernal Nombre: Isabel Bernal Identificación: 52171921

** NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

[signature]

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica,entre otras

Predio ubicado entre abscisas K2+230 y K0+040-T.2 de Sector Unión Tunales. Predio rural, con Cerramiento en postes de madera y alambres de púas (se toman videos y fotos). La vivienda es una Construcción de madera y bloque de arcilla, está ubicada en abscisa K2+630 costado derecho, de Un solo nivel, el bloque presenta fisuras usuales se encuentra una chimenea con pañete externo que presenta fisuras múltiples. Zona destinada a dormitorios se encuentra en madera, regular estado. La Vivienda no tiene sistema estructural. Al interior de la vivienda se observan pisos en tableta de barro y cerámica, el piso de la cocina y el hall se encuentran en tableta de arcilla en general buen estado con desgaste natural por paso del tiempo. La cubierta de la vivienda en general es cielo raso en madera con desgaste y "desniveles" por antigüedad del predio, hay presencia de algunas claraboyas Los marcos de puertas y ventanas en hierro, completos. Al costado izquierdo de la vivienda, ingresando se encuentra construido un invernadero que se encuentra construido en postes de madera y cerramiento en plástico, se toma registro de Fotos de sembrado en los invernaderos. Ingreso de la vivienda en tierra y con acceso vehicular en tierra. A la presente acta de vecindad se adjunta registro fotográfico y Video(s).

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | **VERSIÓN:** 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 03

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que estos son en soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.vmr.gov.co.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N-A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N-A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N-A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Hidraulicas, Filtros, cuneta y alcantarillado.
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N-A	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	N-A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
24 Ene 24	Sumapaz	Cuenca Rio Sumapaz	Vereda Tunal Bajo	K24 K2+00 - K0+050 Del. K2+20 - K0+040	T 1 T. 2	100 76 242	—

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Amidia Ruinza Pinilla - Encargado		# Telefono:	—		Dirección:	K 2 + 640 Vereda Tunal bajo costado izquierdo.		
No. de pisos del predio:	1	Estrato:	1	# Móvil:	3202216072				
Año aproximado de construccion del predio con la normativa NSR-10 1984:	—	Edificacion construida o remodelada recientemente:	NO	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio	NO	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	NO	No presenta fisuras o grietas visibles	NO.

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	SI	1. Residencial	X	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	NO	Predio rural constituido por finca en donde se ubica una vivienda desabitada.
2. Alcantarillado	NO	2. Comercial	—			
3. Energía	SI	3. Industrial	—	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	Si en tierra.	
4. Telefonos	NO	4. Institucional	—			
5. Gas	NO	5. Lote Baldio	-			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripcion de la efectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	No presenta sistema estructural
Paredes	X	NO	Se encuentra en proceso de remodelacion.
Ventana y puertas	X	NO	Con vidrios completos
Cerramiento	X	NO	En rollizos y alambre de Rasj deteriorado y oxidación.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	X	no tiene
Recubrimientos	SI	X	no tiene
Rampas de acceso	SI	X	no tiene. Predio rodeado en tierra.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila MenB Nombre: CAMILA MENDIVELSO Identificación: 52171764 Bta	**PROPIETARIO / HABITANTE:**	Firma: Amidia Ruinza Pinilla Nombre: Amidia Ruinza Pinilla Identificación: 39800350
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Ruiz Nombre: Richard Betancourt R. Identificación: 1069771169	**RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)**	Firma: Isabel Ramal 4. Nombre: Isabel Ramal 4. Identificación: 1214921

** NOTA: SI hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS: #3

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica entre otras

Predio ubicado entre los tramos 1 y 2 de Sector Tunales, ubicado sobre costado Izquierdo entre las abscisas K2+00 (Tramo1) a K0+050 (Tramo2). Predio rural, finca con cerramiento general en postes de madera e hiladas de alambre de púas, con predominancia en "potrero" y zonas Verdes. En abscisa K2+135 se encuentra un Camino en tierra y hacia Tunal Alto dentro del predio se ubica un tanque de agua, aproximadamente a 4 mts del cerramiento. En la abscisa K2+630 se ubica una vivienda construida en mampostería mixta, no tiene sistema estructural (Vigas o Columnas), al momento de la visita se encuentra deshabitada, Construida con mampostería mixta, con tablas de madera irregulares algunos ladrillos sobrepuestos y otros colocados con cemento, los muros en general presentan afectaciones laterales con "pérdida" de material en algunos puntos. Cubierta en tejas de zinc con presencia de oxidación, en la base de la cubierta de madera se observa deterioro por humedad, así mismo algunas tejas presentan averías. Al momento de la visita se observa el piso en demolición en hall y baño, así como Cocina. En la parte posterior del predio se encuentra una enramada construida en madera con presencia de deterioro, plásticos y tejas de zinc, con instalaciones eléctricas a la vista. El acceso al predio es en tierra en general. * A la presente acta de vecindad se adjuntan registros fotográficos y videos.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO




REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No. 04

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127030-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad misional, que estos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.uaerm.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N-A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N-A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N-A	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	Obras hidráulicas Filtros cunetas alcantarilla
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N-A	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	N-A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
01-Febr. 2024	Suma paz	Cuenca Rio Sumapaz	V. Tunal Bajo.	K1+200 - K2+010	Unica Tunel	20076 242	K2+010

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante: Luis Alberto Rey Rey			# Telefono: —		Dirección: Finca San Vicente Vereda Tunal Bajo.				
No. de pisos del predio: 1	Finca San Vicente	Estrato: 1	# Móvil: 320 450 6917						
Año aproximado de construccion del predio con la normativa NSR-10 1984:	NO Cumple	Edificacion construida o remodelada recientemente:	NO	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio	NO	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	SI	No presenta fisuras o grietas visibles	SI

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	SI	1. Residencial	SI	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	SI	Finca con cerramiento en madera, alambre y puas, en la misma a costado izquierdo se encuentra vivienda y en costado derecho hay espacio de pastoreo.
2. Alcantarillado	POZO	2. Comercial	X			
3. Energía	SI	3. Industrial	X	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	Acceso en tierra sobre vehículos	
4. Teléfonos	NO	4. Institucional	X			
5. Gas	NO	5. Lote Baldío	X			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	—
Paredes	X	NO	Con algunas fisuras, en general en madera.
Ventana y puertas	X	NO	Presenta puertas en madera
Cerramiento	X	NO	En el cerramiento de la finca, postes con madera rolliza y alambre de puas y cerca electrica, sitio de pastoreo.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	NO	No aplica
Recubrimientos	SI	NO	No aplica
Rampas de acceso	X	NO	Acceso en tierra.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila Mend B Nombre: CAMILA MENDIVELSO B Identificación: 52171764 Bta	**PROPIETARIO / HABITANTE:**	Firma: Luis Alberto Rey Nombre: Luis Alberto Rey Identificación: 19. 101. 807 Bogotá.
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Richard Betancourt R. Identificación: 1069731162	**RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)**	Firma: Isabel Ramal Nombre: Isabel Ramal Identificación: D. 17824

** NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS: #4


Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado data cerámica entre otras

Predio ubicado en Vereda Tunal Bajo, por costado Izquierdo entramo 2 ubicado entre abscisas K1+200 a K1+390 y por costado derecho, mismo tramo 2 K1+200 a K2+010. El propietario informa que el predio aún se encuentra a nombre de Luz Alba molina, pues aún no ha podido realizar el traspaso de papeles. Se trata de un predio rural utilizado en costado derecho como "criadero" y cuidado de ganado ovejero. En general el predio se encuentra en cerramiento de maderas rollizas y alambres de púas, con algunas partes oxidadas, en la zona (costado derecho) donde se pas-torean ovejas, el cerramiento tambien tiene cerca eléctrica. En costado Izquierdo se ubica una Vivien-da con acceso conformado en material rocesa con presencia de dilataciones naturales. la Vivienda se encuentra en Construcción mixta, parte en mampostería y bloque a la vista, algunas fisuras en paredes del predio. Puerta principal se encuentra "descolgada" y es antigua. Se observa Caja de inspección al ingre-so, de "aguas residuales", sin tapa y tuberías a la vista. Predio con tejas de zinc con desgaste y presen-cia de oxido. Baño construido en ladrillo sin recubrimiento. Cocina con cubierta en madera, con desgaste y deterioro por humedad. Patio de ropas constituye "enramada" con deterioro en las paredes laterales. Presenta Canales de aguas lluvias en mal estado. A la presente acta de vecindad se adjunta registro de fotos y Videos.


	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

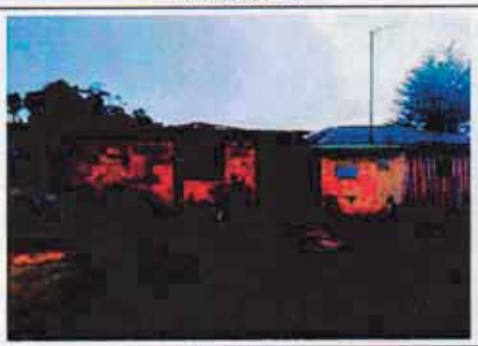

REGISTRO FOTOGRAFICO

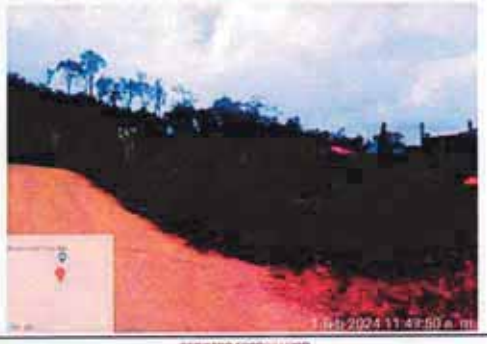


REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO




REGISTRO FOTOGRAFICO

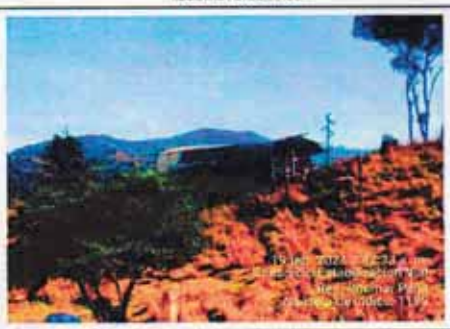

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

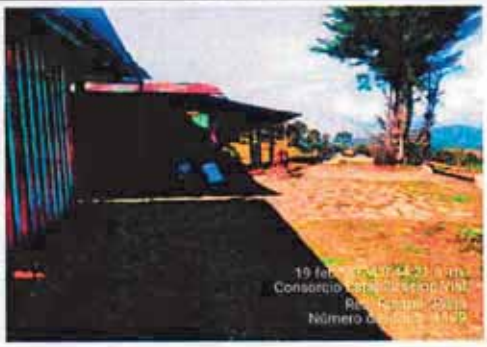

REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 05

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127022-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 de 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Unidad, en desarrollo de sus funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que estos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.uaermv.gov.co.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	NA	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras hidráulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	NA	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	NA				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
31 Enero 24	Suma paz	Cerca Rio Suma paz	El Tunal Bajo	Finca Piedra Grande	Unica (Tunal)	200 76 247	K1 + 000

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Jus Herry y Alfredo Morales			# Teléfono:		Dirección:	Finca Piedra Grande Tunal Bajo.		
No. de pisos del predio:	Uno		Estrato	1	# Móvil	3132916288			
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10 1984:		Edificación construida o remodelada recientemente:		La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio		Observaciones: La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al		No presenta fisuras o grietas visibles	

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES:
1. Agua	SI	1. Residencial	SI	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	SI	Acceso al predio en tierra.
2. Alcantarillado	POZO	2. Comercial	—			
3. Energía	SI	3. Industrial	—	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	SI	
4. Teléfonos	NO	4. Institucional	—			
5. Gas	NO	5. Lote Baldío	—			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y viga)	SI	X	
Paredes	X	NO	Mixta bloque y madera.
Ventana y puertas	X	NO	Internas puertas en madera.
Cerramiento	SI X	NO	Cerramiento con postes en madera.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	X	No presenta espacio público
Recubrimientos	SI	X	No presenta espacio público
Rampas de acceso	X	NO	Acceso en tierra.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila Mendivelso B. Nombre: Camila Mendivelso B Identificación: 52171764	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Nombre: Alfredo Morales Identificación: 344397
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Richard Betancourt R. Identificación: 1069751169	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Isabel Barrag Y. Identificación: 52171821

NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS: #5

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica entre otras

Predio rural, se trata de finca con vivienda construida en un solo piso, con cerramiento en maderas rollizas con hiladas de alambres de pias con algunos rollizos con "inclinación". Vivienda construida en tablas y madera en muy regular estado, cubierta en tejas de zinc muy desgastadas. NO tiene sistema estructural, Vivienda Construida en materiales mixtos de madera y bloque a la vista, la batería Sanitaria se encuentra construida aparte de la vivienda, con paredes en bloque a la vista, no tiene lavamanos. En general la vivienda se encuentra en madera en muy regular estado. Acceso al predio en tierra con desnivel mas bajo que la vía Se adjunta registro fotográfico y video - Predio. Nota: Atiende visita el Sr. Alfredo Morales, quien informa que el predio se encuentra en el momento en juicio de sucesión, en la actualidad esté a nombre de Luis Henry Morales y Alfredo Morales - Finca: Piedra Grande.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO


REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No. 06

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127053-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que estos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.uaerv.gov.co.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N.A	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	Obras hidráulicas		
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N.A	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	N.A						

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
24 Enero 24	Sumapaz	Quenca Rio Sumapaz	Vereda Tunal B.	KO +475 – T. 2	Unidad Tunales	30076 247	410277 44

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante: Maria Eulalia Aparentes				# Telefono: —		Dirección: Finca El progreso Vereda Tunal Bajo.			
No. de pisos del predio: 1		Estrato: 1		# Móvil: 3112388023					
Año aproximado de construccion del predio con la normativa NSR-10 1984:	Mas de 40 años	Edificacion construida o remodelada recientemente:	No	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio	SI	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	—	No presenta fisuras o grietas visibles	SI

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	SI	1. Residencial	X	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	No	Tiene una bodega exterior, construida aparte del predio, en madera en donde se indica que vive como.
2. Alcantarillado	Pozos	2. Comercial	—			
3. Energía	SI	3. Industrial	—	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	SI	
4. Teléfonos	NO	4. Institucional	—			
5. Gas	NO	5. Lote Baldío	—			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	
Paredes	X	NO	En madera (con diferentes clases) y laminas.
Ventana y puertas	X	NO	Puertas metalicas, ventanas con marco metal y aluminio.
Cerramiento	X	NO	Cerca en madera malliza e hilada alambre Puas.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	X	No hay espacio público construido.
Recubrimientos	SI	X	No hay espacio público construido.
Rampas de acceso	SI	NX	Acceso en tierra o una construcción madera.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila MenB Nombre: CAMILA MENDIVELSO B Identificación: 52171764 Bta	PROPIETARIO / HABITANTE:	La señora Maria Eulalia Aparentes atiende us. la, pero se rehusa a firmar porque: "He firmado muchos documentos de esta Obra"
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Richard Betancourt R Identificación: 1069731169	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Ramal 4. Nombre: Isabel Ramal 4. Identificación: 52171921

** NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS: #6

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica entre otras

Predio rural, visita atendida por Ma. Eulalia Cifuentes, quien brinda información de que el predio está en fase final de proceso de desenglobe, el propietario inicial era el sr. Cristobal Cifuentes. En el proceso de desenglobe Constituyó Cinco predios que se listan a continuación: 1) José Gilberto Cifuentes Gonzalez ubicado entre abscisas K0+230 y predio de Ma. Eulalia Cifuentes. 2) Predio de Ma. Eulalia Cifuentes Gonzalez ubicado en K0+495 - tramo 2. 3) Irma Cifuentes (fallecida), por lo cual el predio queda a nombre de Javier Morales. El cual tiene terreno a los dos bordes de la vía, así: Por Costado derecho desde K0+585 hasta K0+785 - T. 2 y por Costado Izquierdo desde K0+585 a K0+ K0+790. 4) Rufina Cifuentes González e hijo 5) Yesid Sussa Cifuentes. Los predios Son agrícolas El predio construido y perteneciente a la sra. María Eulalia Cifuentes es construcción de más de 40 años, Presenta Construcción mixta entre madera reforzada y láminas, con bastante deterioro, puertas metálicas y Ventanas con marcos en metal y aluminio. Baño con piso en baldosas en general en buen estado, así mismo tiene Sus paredes Con Cerámica, no hasta el techo, en general no se observan fisuras o grietas. La cocina presenta techo y piso en madera muy antigua, el techo está en madera, Con desnivel. En general las paredes en madera presentan desgaste natural

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS: #6

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica entre otras

por el paso del tiempo (antiguas), Se encuentra una bodega externa construida en madera, Con desgaste en las mismas (paredes) y así mismo el techo se encuentra en tejas de zinc con desgaste. La Vivienda descrita en la presente acta se ubica en Km 525. Se observa un acceso peatonal en piedras de diferentes tamaños sobre terreno natural. El predio presenta Cerramiento perimetral en rollizos y alambre de púas, la entrada del mismo sin puerta. A la presente acta de Vecindad se adjunta registro de fotos.


	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

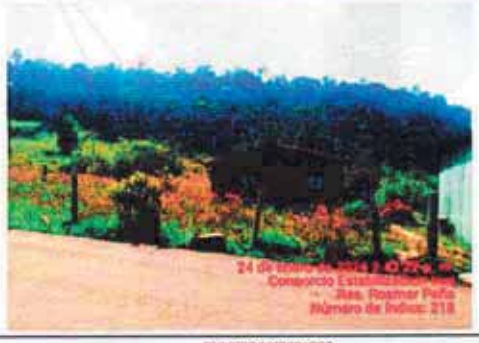

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 7. Luis Carlos Romero

Contrato 479 de 2022

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 800127033-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que estos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	Obras hidráulicas y de estabilizac. vial.
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
31. Enero. 24	Sumapaz	Cuenca Río Sumapaz	Vereda Tural Bajo	KO + 790	Orion Tunales	20076292	KO+790

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante: Luis G. Romero. Rey		# Telefono: —		Dirección: Vereda Tural Bajo	
No. de pisos del predio: 1 (uno)	Estrato: 1	# Móvil: 3115368499			
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10 1984: No	Edificacion construida o remodelada recientemente:	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio		La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada	No presenta fisuras o grietas visibles

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	Si	1. Residencial	X	¿ Habían personas en condición de discapacidad?	NO	Presenta cerramiento con acceso en tierra.
2. Alcantarillado	Pozo	2. Comercial	—			
3. Energía	Si	3. Industrial	—	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	NO	
4. Teléfonos	NO	4. Institucional	—			
5. Gas	NO	5. Lote Baldío	—			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	/ / / / / / / /
Paredes	X	NO	Ladrillo con pañete - madera (Componentemixto)
Ventana y puertas	X	NO	Presencia de marco metálico con vidrio plano.
Cerramiento	X	NO	Alambre de Pues y rollizos de madera.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	X	NO presenta Espacio público
Recubrimientos	SI	X	No se observan andenes o E. Público.
Rampas de acceso	SI	X	ESPACIO en tierra para Parqueadero

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila Mendivelso B. Nombre: CAMILA MENDIVELSO B. Identificación: 52171764 Bta	PROPIETARIO / HABITANTE:	*Nota: 3 visitas no se encuentra quien atienda/ Acta por Exterior Firma: Nombre: 2/Feb - 9/Feb - Y 7 Febrero - 2024 Identificación:
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Romar Paul Ruiz Nombre: Romar Paul Ruiz Identificación: 1090364648	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Barrag. Nombre: Isabel Barrag. Identificación: 52171821

** NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS: #7

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica entre otras

Predio rural Con cerramiento en maderas "rollizas" y cercas de alambre Púas, la vivienda esta construi-da en materiales mixtos entre ladrillo y pañete, con pintura que presenta desgaste natural. Presencia de humedad. Se observa un acceso en tierra para vehiculo. El predio presenta una zona extensa para potrero. Vivienda de un solo piso y al ingreso de la misma se encuentra instalada cerca eléctrica. Al lado de la vivienda se encuen-tra una construcción pequeña sin sistema estructu-ral visible, los muros de la vivienda presentan pa-redes en pañete y un "ramal" Conjunto o al lado de la vivienda con estructura en tubos. Se visualiza al interior del predio unos postes electricos de "media tensión". A la presente acta de Vecindad se adjunta registro de fotos.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 8 - Fernando Molina

Contrato de obra 479/22

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900137020-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.umv.gov.co.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	Obras hidráulicas y de estabilización Vial
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
2 Feb. 2024	Sumapaz	Cuencario Sumapaz	Vereda Tunal Bajo	Finca San José Km 200	Unión Tunales	20076242	Km 200

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante: Hector Fdo. Molina Romero		# Teléfono: —		Dirección: Finca San José Vereda Tunal Bajo	
No. de pisos del predio: —	1	Estrato: 1	# Móvil: 3119927876		

Año aproximado de construccion del predio con la normativa NSR-10 1984:	Aprox. 5 años No tiene	Edificacion construida o remodelada recientemente:	NO	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio	SI	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada	NO	No presenta fisuras o grietas visibles	NO

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES
1. Agua	SI	1. Residencial	SI	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	NO	Corresponde a finca rural, con vivienda en prefabricado y material mixto. Finca: San José
2. Alcantarillado	Pozo Sep	2. Comercial	—			
3. Energía	SI	3. Industrial	—	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	NO	
4. Teléfonos	NO	4. Institucional	—			
5. Gas	NO	5. Lote Baldío	—			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	X	NO	Predio en general con estructura de metal y casa prefabricada
Paredes	X	NO	Presenta armadura metalica - Prefabricada - mixta: Bloque ladrillo
Ventana y puertas	X	NO	En general en buen estado - Algunas fisuras en 2
Cerramiento	X	NO	Al predio en reja de metal - finca con rollizo y Alambre pua

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	X	—
Recubrimientos	SI	X	—
Rampas de acceso	X	NO	Acceso vehicular en tierra y Puerta porton en metal.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila Mendivelso B. Nombre: CAMILA MENDIVELSO B. Identificación: 52177864.	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Fernando Molina R. Nombre: FERNANDO MOLINA R Identificación: CC. 79 209 960
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Ramon Paul Flor Nombre: Ramon Paul Flor Identificación: 1090364698	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Barna L. Nombre: Isabel Barna L. Identificación: 52171021

** NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

UAERMV

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS: #8

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica entre otros

Predio Rural, representa finca ubicada en ambos costados de la vía en construcción así: Por borde derecho de K1 + 160 a K1 + 200 por Izquierda K1+200 a aprox. K2 +010. La vivienda se encuentra constru-da parte en prefabricado y en la parte posterior en blogue a la vista con tejas plásticas y de zinc. La vivienda presenta Cerramiento en mampostería de cemento y puerta de garaje en metal y malla en buen estado. Se presenta acceso peatonal al predio en concreto. La vivienda presenta al ingreso una amplia zona de sala - comedor y hall con piso en Cerámica, en general en buen estado. Esta mis-ma zona inicial del predio se observa drywall con desgaste natural, presenta ornamentación en tubo metálico, en general en buen estado.- En pared, parte inferior de zona de Hall de la vivienda, se observan rastros de humedad (Foto) El techo en general se observa en buen estado. Las alcobas se encuentran con puertas metálicas en general en buen estado. Baño con cerámica en piso y paredes, en general buen estado, en este baño el cielo raso se encuentra en lámina. En las habi-taciones se observan en dinteles inferiores, algunas leves fisuras en dilatación "leve". En general no se observan grietas o daños en paredes. La cocina presenta estufa en leña, piso en cerámica con des-gaste natural debido a paso del tiempo. Contiguo

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	


4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS: #8

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica entre otras

a la cocina se encuentra un patio con piso en con-
-creto rústico con algunas fisuras transversales.
El predio se encuentra en limite con el Colegio
Gimnasio Juan De la Cruz Sede Tunal Bajo; En
el limite de estos dos(2) predios se encuentra cons-
-truida una canaleta en concreto, así mismo se en
-cuentra un poste eléctrico. En parte posterior del pre
-dio se observan tuberias de acueducto y tuberia
de "aguas negras" que salen del predio. En el cos-
-tado derecho de la via se ubica una estructura "Simple"
en concreto - Dos columnas y una placa, para Coloca-
-ción de un tanque de almacenamiento de agua
del cual sale tuberia de agua potable. En esta
misma parte del predio (costado derecho) se encuen
-tran unas "carpas" o cerramiento de invernadero,
con Cerramiento en plástico y estructura de ma
-dera (foto). A la presente acta de vecindad se a-
-compaña registro fotográfico.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

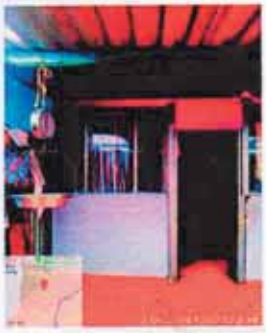REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No. 09

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los Titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estatuto y aquellas propias de la actividad misional, que estos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.uaermv.gov.co.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N.A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras hidráulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N.A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N.A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
7 FEBR 24	Sumapaz	Cuenca Río Sumapaz	V. Tunal Bajo.	Abscisa: Km 620	Unidad Funcional	200762 U7	Km 620

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Colegio y Polideportivo Rafael Cortez.		# Teléfono:	—	Dirección:	Vereda Unida Tunales: I.E.D Gimnasio Juan de la Cruz			
No. de pisos del predio:	1	Estrato: 1	# Móvil:	3125047397					
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10:	1984	Edificación construida o remodelada recientemente:	Si	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio	No se observan	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	No.	No presenta fisuras o grietas visibles	Si

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	Si	1. Residencial	—	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	No	Institución educativo de un (1) piso con 4 construcciones diferentes, entre ellas un coliseo.
2. Alcantarillado	Pozos	2. Comercial	—			
3. Energía	Si	3. Industrial	—	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	Si	
4. Teléfonos	No	4. Institucional	X			
5. Gas	No	5. Lote Baldío	—			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	X	NO	No se evidencian deterioro
Paredes	X	NO	leves fisuras y deterioros puntuales
Ventana y puertas	X	NO	En general en buen estado
Cerramiento	X	NO	Cerramiento en malla metálica con deterioro natural.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	X	Area en pavimento sin confinamiento, algunos desprendimientos.
Recubrimientos	X	NO	En ediplaca.
Rampas de acceso	X	NO	Rampa de acceso a personas discapacitadas en concreto.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila Men B. Nombre: CAMILA MENDIVELSO B. Identificación: 521713611 Bta.	**PROPIETARIO / HABITANTE:**	Firma: Yohana Katherine Gutiérrez Galindo - Docente Social Pedagogo Nombre: Yohana Katherine Gutiérrez Galindo Identificación: 1010.175.957
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Ruiz Nombre: Richard Betancourt R. Identificación: 1067751169	**RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)**	Firma: Isabel Bernal Nombre: Isabel Bernal Identificación: 52171421

** NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS: #9

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica entre otras

El predio Corresponde a Institución, Gimnasio Juan de La Cruz Varela - Tunal Bajo. La edificación presenta diferentes Construcciones o espacios así: Un poli-deportivo Con piso en Concreto, en placas de concreto que presentan diferentes fisuras, así mismo el muro y estructuras del coliseo presentan en diferentes puntos, 'resagas' de humedad y así mismo en (pre) mismo Coliseo Se observan en diferentes puntos deposiciones de aves, al igual que en la estructura metálica del techo. Exceptuando los rastros de "deposición" de animales, la estructura metálica y Cubierta del coliseo se encuentra en buen estado. El acceso al Gimpasio en parte que limita con la vía se encuentra una "rampa" de acceso en concreto rústico. puerta con malla eslabonada y en metal, en buen estado, al interior del predio parte del acceso está Construido en granito y baldosas de Color rojo, mismo material se encuentra en "hall" de acceso a las aulas escolares, en general no se observan baldosas fisuradas. El acceso interior al coliseo se encuentra construido en Concreto que conforma escaleras y rampa para personas discapacitadas, así mismo se encuentran barandas metálicas con pintura; en general las barandas están en buen estado. La edificación de las aulas se encuentra construida en estructura metálica con canaleta de aguas lluvias en buen estado, vidrios de las

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS: #9

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica,entre otras

Aulas se encuentran en buen estado, así como los pisos y paredes de las aulas (no se observan daños estruc-turales). En techo del aula cercana a los baños, el drywall se encuentra roto en dos puntos. Se ubica una estructura o edificación en donde se encuentra la cocina, en bloque, muy antigua, con tejas de zinc con deterioro por presencia de oxidación (fotos); esta cocina es construcción antigua con respecto al colegio. Los baños se encuentran con pisos y paredes en baldosa, en los dos baños se observan fisuras al lado de la ventana (fotos). El Colegio tiene una huerta en buen estado, así mismo en parte lateral - del coliseo parte posterior de la rampa de acceso al mismo, se encuentra un módulo de juegos infantiles en general en buen estado. Este parque de niños se encuentra en zona verde. Se evidencia zona de acopio de ma-teriales de la U.M.V., en zona que limita directamente con el colegio. A la presente acta de veandad se adjuntan registro de fotos y video.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No. 10

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UNIÓN, identificada con el NIT 900127052-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad general, que estos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.srm.gov.co.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N.A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obra hidraulica J
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N.A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N.A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
1 Febr 24	Sumapaz	Cuenca Río Sumapaz	V. Tunal Bajo	Finca San José	Una Tunales	208 42	

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante: Alberto Delgado Amiendo: Diana Cifuentes			# Teléfono: —		Dirección: Finca "San José" Vereda Tunal Bajo.				
No. de pisos del predio: UNO		Estrato: 1	# Móvil: 3224781231						
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10 1984:	En Prefabr.	Edificación construida o remodelada recientemente:	SI	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio	NO	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	No	No presenta fisuras o grietas visibles	NO

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	SI	1. Residencial	X	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	NO	Al frente del predio se encuentra un espacio que se utiliza para parqueo de vehiculos. El nivel es mas alto que la via.
2. Alcantarillado	Pozo J	2. Comercial	—			
3. Energía	SI	3. Industrial	—	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	Acceso en tierra	
4. Teléfonos	NO	4. Institucional	—			
5. Gas	NO	5. Lote Baldío	—			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	—
Paredes	X	NO	Parte en mamposteria, parte ladrillo y prefabricado.
Ventana y puertas	X	NO	Externas en metal e internas en madera.
Cerramiento	X	NO	Postes en madera y alambre de puas.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	X	No hay espacio público construido frente al predio
Recubrimientos	SI	X	No hay espacio público construido frente al predio
Rampas de acceso	X	NO	Acceso al predio en tierra — Parqueadero.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila Mend B. Nombre: CAMILA MENDIVELSO B Identificación: 52171764 Bta	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Diana Cifuentes Nombre: Diana Cifuentes Identificación: 35.536.292
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Richard Betancourt R. Identificación: 1069751169	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Bernal G. Nombre: Isabel Bernal G. Identificación: 52171821

** NOTA: SI hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS: #10

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica,entre otras

Predio rural con cerramiento en maderas rollizas y alambres de puas, la vivienda se encuentra construidaa nivel mas alto que la vía en construcción. La vivienda se encuentra construida en un área donde parte se encuentra como "Hall" de acceso con piso en concreto en rústico. Vivienda construida en prefabricado y al lado de la misma se ubica la cocina que no es en prefabricado, ya que se encuentra en obra negra y paredes con presencia de fisuras leves y en una de las paredes se observa una fisura más pronunciada. En la misma cocina se encuentra un mesón en bloque con enchape con grietas, la ventana de la cocina tiene ventana con marco en metal, con presencia de oxido. El baño de la vivienda se encuentra al interior de la Casa prefabricada, se encuentra con enchape parcial, que presenta algunas fisuras en paredes del mismo baño (leves). Parte posterior del predio tiene un galpon en madera, con piso en tierra. Al ingreso del predio como muro frontal o de fachada, se encuentra bloque a la vista de aproximadamente 1,50 mts., sin puerta. En "hall" de la vivienda funciona restaurante que tiene estructura metálica en buen estado. Tambien la zona verde de la finca "San José" se encuentra en nivel mas alto de la vía. A la presente acta de vecindad se adjunta registro fotográfico.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**FORMATO ACTA DE VECINDAD**	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	**VERSIÓN: 1**
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No. 11

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UNITAM, identificada con el NIT 900127052-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente acto de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad general, que estos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.unitam.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N.A	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	Obras hidraulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N.A	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	N.A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
1 Febr 24	Sumapaz	Cerca Rio Sumapaz	V.El Paraiso	T4 TS Union Tunal	Union Tunal	2003 6747	TS.

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Oswaldo Cifuentes Torres			# Telefono:	—	Dirección:	Vereda Tunal bajo Finca El Paraiso		
No. de pisos del predio:	1	Estrato:	1	# Móvil:	3134468857				
Año aproximado de construccion del predio con la normativa NSR-10 1.,of:	Casa Aprox. No exacto	Edificacion construida o remodelada recientemente:	SI	La estructura presenta fisuras mayores a 3 mm en fachada o al interior del predio	SI	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	N.A	No presenta fisuras o grietas visibles	SI

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	SI	1. Residencial	SI	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	NO	Se trata de predio rural finca con un acceso en tierra para vehiculo Puerta en hierro casa queda aprox. 200 mt. de la vía.
2. Alcantarillado	Pozos.	2. Comercial	—			
3. Energía	SI	3. Industrial	—	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	SI Acceso en tierra	
4. Teléfonos	NO	4. Institucional	—			
5. Gas	NO	5. Lote Baldío	—			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	X SI	NO	Una parte de la misma mixta: Hierro y concreto.
Paredes	X SI	NO	Mixto madera y bloque
Ventana y puertas	X	NO	Mixta: afuera en madera y otro en material metal y madera.
Cerramiento	X SI	NO	De todo el predio: Palo "Lotó" y alambre pues + helado.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	X NO	no tiene
Recubrimientos	SI	X NO	no tiene
Rampas de acceso	X	NO	no tiene.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila Mendivelso B. Nombre: Camila Mendivelso B. Identificación: 52171764 Bta.	**PROPIETARIO / HABITANTE:**	Firma: Oswaldo Cifuentes. T Nombre: Identificación: 349015
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: [signature] Nombre: Richard Betancourt R. Identificación: 1069931169	**RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)**	Firma: Isabel Ramal Y Nombre: Isabel Ramal Y. Identificación: 52151621

** NOTA: SI hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS: #11

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica,entre otras

Se trata de predio rural que en su extensión cuenta con cerramiento en madera rolliza y alambres de púas, son de una hilada. La vivienda del predio se encuentra bastante retirada de la vía en intervención. Al ingreso se encuentra un ingreso en "tierra" - vehicular, con puerta en hierro. Vivienda se encuentra a unos 200 mts del ingreso al predio y se encuentra construida en material mixto entre bloque y madera, con ventanas y puertas en madera al interior de la misma y afuera puerta en metal y otra en madera. Construcción muy antigua de casi 40 años de antigüedad, cuenta con acueducto por manguera (veredal) y pozo séptico. Se adjuntan fotos del cerramiento que limita con la vía a intervenir.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No.	12. Eliberto Guchuvo.
Cto. Obra # 479 de 2022 - UMV	

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 800127033-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente acto de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.umv.gov.co.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	Obras hidraulicas y de estabilizac. vial
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
21/Feb/24	Sumapaz	Cuenca Rio Sumapaz	Finca: Los Barcos	Finca en Tunal bajo	Union Tunales	20076242	T.S

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Se encuentra en suicio Sucesión Encargado: Eliberto Guchuvo	Teléfono:	—	Dirección:	Finca: Los Barcos Vereda: Tunal Bajo
N. de pisos del predio:	1	Estrato:	1	# Móvil:	3142769574

Año aproximado de construccion del predio con la normativa NSR-10 1984:	aprox. 50 años.	Edificacion construida o remodelada recientemente:	NO	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio	Si	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada	Si	No presenta fisuras o grietas visibles	Si

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	Si	1. Residencial	Si x deshabitada.	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	NO	Se trata de predio Rural - Finca, se encuentra una vivienda a aprox. 30 mts de la via, en el momento no habitada.
2. Alcantarillado	Pozo.	2. Comercial	—			
3. Energía	Si	3. Industrial	—	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	Ver Observ.	
4. Teléfonos	NO	4. Institucional	—			
5. Gas	NO	5. Lote Baldío	—			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	X	NO	Nota: El predio fue catalogado en zona de riesgo hace aprox. 12 años - Predio abandonado/
Paredes	X	NO	En deterioro - por encontrase "abandonada"
Ventana y puertas	X	NO	En deterioro
Cerramiento	X	NO	En deterioro

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	X	NO aplica - No hay espacio público Construido
Recubrimientos	SI	X	No aplica - No hay E. Público Construido.
Rampas de acceso	SI	X	Acceso peatonal y para ganadería en Puerta madera.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila M. B. Nombre: CAMILA MENDIVELSO B. Identificación: 52171764 Bta	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Eliberto Guchuvo. Nombre: Eliberto Guchuvo. Identificación: 3432109 C.C. 2.547.79 Guchuvo
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Roimer Peña Nombre: Roimer Peña Identificación: 1090364648	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Rurna L. Nombre: Isabel Rurna L. Identificación: 52171824

** NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS: #12

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica entre otree

Predio rural que al momento de la visita no se encuentra habitado debido a que el propietario informa que el mismo fue declarado hace casi diez (10) años en "zona de riesgo" por IDIGER. Informa ademas que, desde entonces debieron Sa-lir del sitio y a la fecha IDIGER no ha dado otro resultado diferente y les dicen que no pueden habitar el predio por que hay "remoción de terreno". La vivien-da esta deteriorada por Ser edificación antigua y "abandonada" por lo expuesto anteriormente. Cercado en madera rolliza y alambre de pias en dos hiladas, a lo cual se adjunta registro fotográfico y video. El Sr. Cuchuvo informa que tambien el predio Se encuentra en "Inicio de Sucesión", atendió la visita uno de los hermanos propietarios que se encuentra habitando en el poblado "La Unión" quien explica que los demas hermanos habitan en diferentes partes del pais.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No. 13

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UNIÓN, identificada con el NIT 900127033-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente acta de vecindad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad general, que estos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados, con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.uniongr.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N.A	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	Obras hidraulicas.
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N.A	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	N.A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
21 Febr. 24	Sumapaz	Cuenca Rio Sumapaz	V. Tunales	Los puentes	Tercos	2007847	

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	# Telefono:	Direccion:
Deick Clavijo Romero / Encargado Andres Runza	—	
No. de placa del predio: 1	Estrato: 1	# Móvil: 320 8264636

Año aproximado de construccion del predio con la normativa NSR-10 1984:	6	Edificacion construida o remodelada recientemente:	—	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio	—	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al	—	No presenta fisuras o grietas visibles	—

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	SI	1. Residencial	+	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	NO	El ingreso al establo de animales se encuentra en el borde de la via.
2. Alcantarillado	Pozo S	2. Comercial	—			
3. Energía	SI	3. Industrial	—	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	NO	
4. Teléfonos	NO	4. Institucional	—			
5. Gas	NO	5. Lote Baldio	—			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	NO X	Predio al fondo, no esta cercano a la via.
Paredes	SI	NO X	Se toma registro del establo y cerramiento
Ventana y puertas	SI	NO X	Vivienda no esta cerca a la via.
Cerramiento	SI X	NO	Cerramiento en madera rollizo y alambre de puas

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	NO X	No tiene espacio publico
Recubrimientos	SI	NO X	No tiene espacio publico
Rampas de acceso	SI	NO X	No tiene espacio, Acceso en tierra.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila Mendivelso Nombre: CAMILA MENDIVELSO Identificación: 521713 BG BTA	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Atiende SI. Andres Runza Nombre: INF. que es encargado Identificación: Y YA ALIMO ACTA COMU.
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Ruiz Nombre: Richard Betancourt R. Identificación: 1069751169	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Bama14. Nombre: Isabel Bama14. Identificación: 1171921

** NOTA: SI hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica entre otras

El predio es rural, se ubica en Tramo 5 del Sector unión Tunales, se encuentra en los dos costados de la vía en intervención. Se encuentran varias áreas del mismo, dentro de las cuales el predio - o vivienda se encuentra retirado del borde de la vía en intervención = Al límite con la vía se ubica zona de pastoreo de ganado (borde izquierdo) En borde derecho se encuentra un establo en madera con acceso de "rampa" en 2 niveles en concreto rústico. Se toma nota que del predio sale tubería de acueducto que pasa la vía a intervenir, así como una tubería de aguas negras, que sale desde el "establo" y cruza al otro lado de la vía. establo construido en madera en buen estado. se toma registro fotográfico.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No.	14.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127932-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que estos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.ame.gov.co.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	NA	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	Obras Hidraulicas.
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	NA	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	NA				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
27-05-25	Sumapaz	C.R Sumapaz	Yomalá	K2 + 170	Tramo 1		

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Predio Solo	# Telefono:	—	Direccion:	Abscisa K2 + 170
No. de pisos del predio:	1	Estrato:	1	# Movil:	

Año aproximado de construccion del predio con la normativa NSR-10 1984:	2024	Edificacion construida o remodelada recientemente:	SI	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio		La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada		No presenta fisuras o grietas visibles	

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial	X	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	No se puede verificar	El predio se encuentra Solo, por lo cual se hace registro unicamente de fachada.
2. Alcantarillado		2. Comercial	—			
3. Energía	X	3. Industrial	—	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	NO	
4. Telefonos	—	4. Institucional	—			
5. Gas	—	5. Lote Baldío	—			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	No aplica.
Paredes	X	NO	Se evidencia paredes en tabla
Ventana y puertas	X	NO	Se evidencian en estructura de tablado
Cerramiento	X	NO	Se evidencia rollizos y alambre de pua s

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	X	No aplica.
Recubrimientos	SI	X	No se evidencia
Rampas de acceso	SI	X	No se evidencia

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Alejandra Limas P Nombre: Alejandra Limas P Identificación: 1022 351 286	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Predio Solo Nombre: Identificación:
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Ruiz Nombre: Richard Betancourt Identificación: 1026751165	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Isabel Bonal 4. Nombre: Isabel Bonal 4. Identificación: 52171824

** NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

UAERMV.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado deta cerámica,entre otras

Se realiza el registro de las condiciones físicas del predio ubicado en la abscisa K2+170 vereda Tunal Alto, este registro es unicamente de fachada, puesto que el predio se encuentra Solo.
La construcción es en madera, con una estructura Solida y acabado rustico, posiblemente con tablas de pino claro, el techo esta cubierto con teja de Zinc. La ornamentación de la vivienda es igualmente en madera de lo que se puede evidenciar.
El ingreso al predio esta sin intervención constructiva, ni capa vegetal, el posible acceso vehicular queda encima de las cunetas existentes de la vía
Cerrado en madera rolliza con alambre de pua, se evidencia desgaste natural

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	
REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO
	

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Nit: 901563835-7

SECTOR SAN ANTONIO II

VEREDA EL TOLDO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | **VERSIÓN:** 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 1

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 800127932-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.uerv.gov.co.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	na	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	na	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	na	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	Obras Hidraulicas		
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	na	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	na						
FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK		
02-03-2024	Sumapaz	CRIO Sumapaz	Toldo	KG 1+200	Toldo	7007678	9027658		

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Familia Mora		# Telefono: —	Dirección: —					
No. de pisos del predio:	na	Estrato: 1	# Móvil: —						
Año aproximado de construccion del predio con la normativa NSR-10: 1984:	na	Edificacion construida o remodelada recientemente:	na	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio	na	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada	na	No presenta fisuras o grietas visibles	na

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	—	1. Residencial	—	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	na	Ninguna
2. Alcantarillado	—	2. Comercial	—			
3. Energía	—	3. Industrial	—	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	na	
4. Teléfonos	—	4. Institucional	—			
5. Gas	—	5. Lote Baldío	—			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	NO X	na aplica
Paredes	SI	NO X	no aplica
Ventana y puertas	SI	NO X	no aplica
Cerramiento	SI	NO X	no aplica

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	NO X	no aplica
Recubrimientos	SI	NO X	no aplica
Rampas de acceso	SI	NO X	no aplica.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila Mendivelso B. Nombre: Camila Mendivelso B Identificación: 52171764	**PROPIETARIO / HABITANTE:**	Firma: Encargado Javier S Nombre: Javier Sosa Identificación: 1069230567
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Richard Betancourt R. Identificación: 1069751165	**RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)**	Firma: Isabel Bernal Y. Nombre: Isabel Bernal Y. Identificación: 52171824

** NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

UMV.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado deta cerámica,entre otras

Se realiza recorrido en el predio de la familia Hera, para verificar las condiciones actuales del mismo. Se deja registro fotográfico.
Estado de las entradas. Se consta un total de cuatro entradas al predio en buen estado, propiciando acceso adecuado a diferentes zonas del predio cerca y muro de contención en buen estado. Desde la abscisa K6+981, se evidencia presencia de una cerca y muro de contención en buen estado
Cerca caída: abscisa K6+750 se observa una cerca caída.
Cerca debilitado: Se evidencia una cerca debil. en la abscisa K6+380
Ausencia del cercado en y/o cerca de la abscisa K6+345, K6+100 y K5+800
Se evidencia que los tipos de árbol que predominan son de copa irregular y horizontal, el segmento vial cuenta con gran cantidad de arbustos y plantas herbáceas.
Se evidencia que la mayoría de los taludes se encuentran cubiertos de vegetación superficial, y las raíces que ayudan a fijar la tierra.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No. 13

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127020-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente avisa de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad general, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.uaerm.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	na	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	na	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	na	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	Obras Hidraulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	na	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	na				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
03-04-2024	Sumapaz	C.P Sumapaz	Todo	Km670 - Km710	Todo	1004200	9107813

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Elibeth Ardila		# Telefono: —	Direccion: —			
No. de pisos del predio:	—	Estrato: 1	# Movil: —				
Año aproximado de construccion del predio con la normativa NSR-10: 1984	na	Edificacion construida o remodelada recientemente:	na	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio	na	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada	na
No presenta fisuras o grietas visibles	na						

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	—	1. Residencial	—	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	na	Ninguna
2. Alcantarillado	—	2. Comercial	—			
3. Energía	—	3. Industrial	—	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	na	
4. Teléfonos	—	4. Institucional	—			
5. Gas	—	5. Lote Baldío	—			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	~~NO~~ X	no aplica
Paredes	SI	~~NO~~ X	no aplica
Ventana y puertas	SI	~~NO~~ X	no aplica
Cerramiento	SI	~~NO~~ X	no aplica

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	~~NO~~ X	no aplica
Recubrimientos	SI	~~NO~~ X	no aplica
Rampas de acceso	SI	~~NO~~ X	no aplica.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Camila MenB Nombre: CAMILA MENDIVELSO B. Identificación: 52 171 766 Bta.	**PROPIETARIO / HABITANTE:**	Firma: Eva Sanchez Encargada Nombre: Eva Sanchez Identificación: 25242275
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: [signature] Nombre: Richard Betancourt R. Identificación: 1069751165	**RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)**	Firma: Isabel Ramal G. Nombre: Isabel Ramal G. Identificación: 52 [illegible]

** NOTA: SI hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

UAERMV

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerâmica,entre otras

Se lleva a cabo recorrido por el predio de Elibeth Avila, con el propósito de realizar la verificación de las condiciones actuales del mismo


Cercado: Se evidencia cercado en malla en madera y alambre de pua en buen estado sin roturas, y en algunas partes se observa ausencia de cerca.

Bodega: Se evidencia en la abscisa K1+700 una bodega construida en madera en buen estado.

Establo: Se observa establo en madera, cerca a la via en buen estado.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

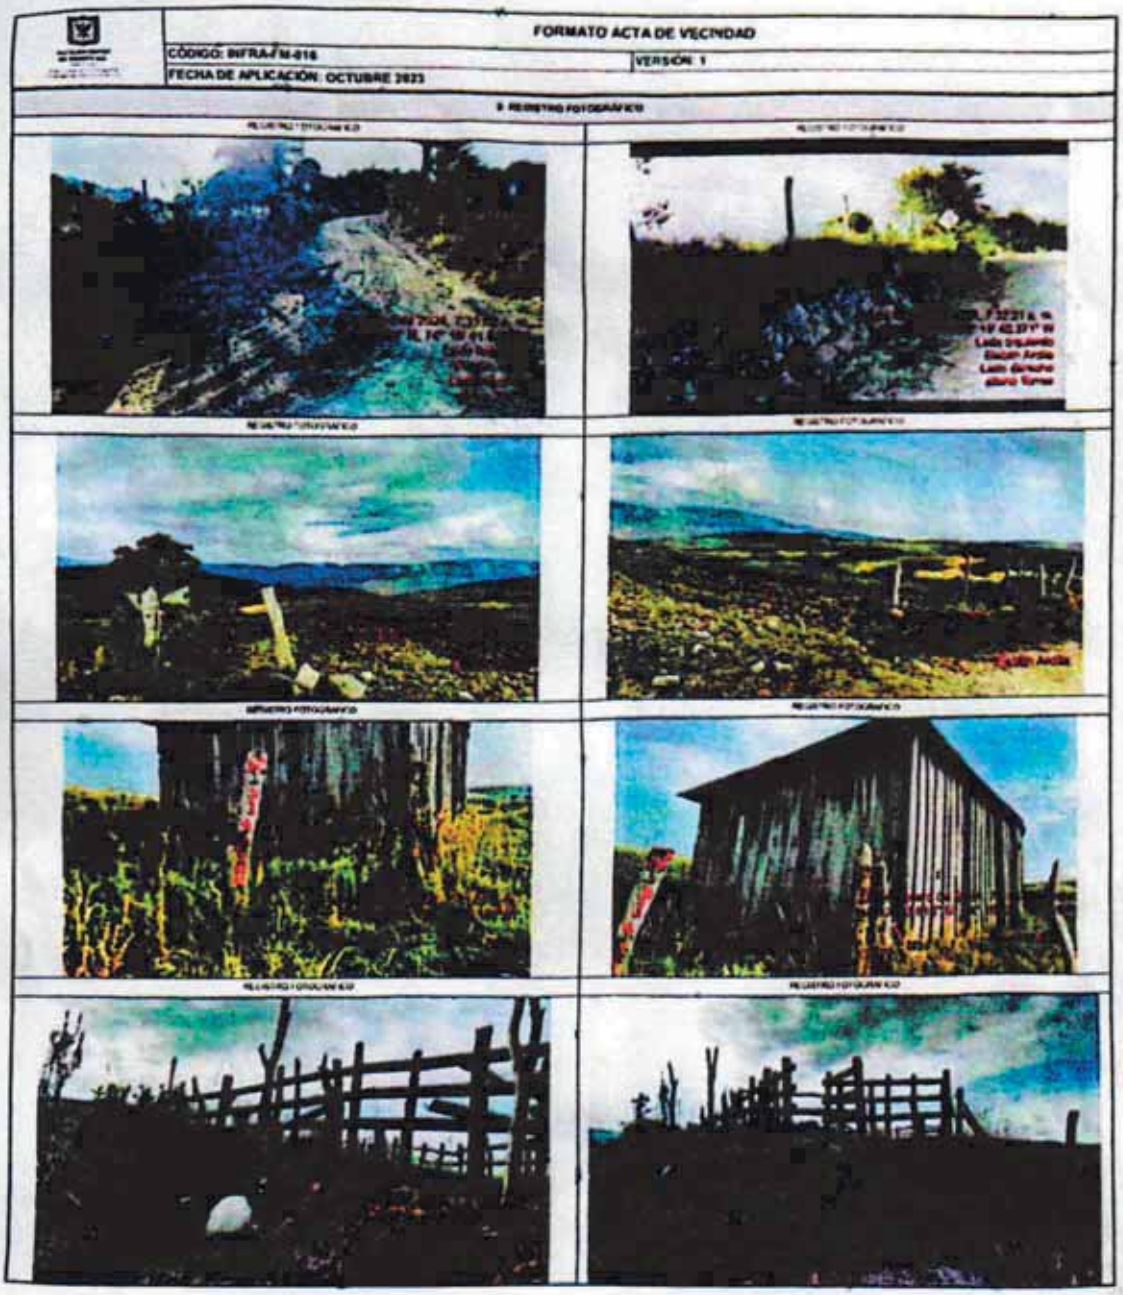

Powered by CamScanner

A10
Comunicado CEV/22-419
Comunicado 186-1-734

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-419

Bogotá D.C., 19 de junio de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Respetados señores,

Por medio de la presente queremos informar la eventualidad que se ha presentado con la contratación de mano de obra no calificada residente de la localidad de Sumapaz, ya que el personal que ha sido contratado por parte del Consorcio han manifestado renuncias voluntarias, tales como es el caso puntual de dos auxiliares de tráfico Diana Avellaneda y María Camargo quienes ingresaron el 9 de abril del 2025 y presentaron su carta de renuncia el 10 de junio de 2025 atribuido a situaciones personales, renuncia que fue aceptada por parte del Consorcio. El día 11 de junio se evidencio que estas dos trabajadoras fueron contratadas por la UAERMV, por lo que solicitamos a la interventoría que intervenga y solicite a la UAERMV que no contrate personal que tenga contrato vigente con el Consorcio Estabilización Vial, ya que esto ha perjudicado el avance de las actividades debido al bajos rendimientos por carecía de personal, adicionalmente el trasladar personal fuera de la localidad de Sumapaz incrementa el factor prestacional de la mano de obra no calificada descrita en los análisis de precios unitarios.

El Consorcio Estabilización Vial, ha desarrollado convocatorias en la zona divulgando volantes por medio de los grupos de whatsapp incluyendo al grupo del sindicato de la UAERMV y socialización con el presidente de la junta de acción comunal, con el fin de contratar personal de mano de obra no calificada, a lo cual ha sido poca la recepción por parte de la comunidad, por lo anterior el Consorcio no ha dado cumplimiento al 75% de la mano de obra no calificada residente de la localidad, tal como está establecido en el Plan de Gestión Social.

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Copia: - Ing. Julio Cesar Pinzón Reyes - Subdirector de Intervención de la Infraestructura UAERMV
HLM/ac

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-734

Bogotá D.C. 1 de julio del 2025.

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. JULIO CESAR PINZÓN-GERENTE DEL PROYECTO
Gerente del proyecto
Bogotá D.C.

Referencia: ***"****PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".*

Asunto: *Traslado del comunicado CEV/*22-419, *Fecha: 19 – 06 - 2025, recibido el 01-06- 2025, "*CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA".

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV. En atención al radicado de referencia se realiza traslado al comunicado.

Con la presente nos permitimos realizar traslado del oficio CEV/22- 419 *"Contratación de personal de mano de obra no calificada"* del Consorcio Estabilización Vial, donde indican que realizan contratación de personal de mano de obra no calificada de la localidad del Sumapaz, (auxiliares de tráfico), pero esta al poco tiempo de la contratación renuncian por ir a trabajar con la UAERMV, manifiestan que se están viendo perjudicados por no poder contar con el personal y poder avanzar en las actividades, debido a los bajos rendimientos por carencia de personal y no poder cumplir con lo establecido contractualmente de contratar el 75 % de población de la localidad.


ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-734

Con lo relacionado anteriormente se le solicita a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV, que revise lo manifestado por el Consorcio Estabilización Vial.

Atentamente,



ERMY A. HURTADO

Anexos: Oficio CEV/22-419 en (2 folio)

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-419

Bogotá D.C., 19 de junio de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Respetados señores,

Por medio de la presente queremos informar la eventualidad que se ha presentado con la contratación de mano de obra no calificada residente de la localidad de Sumapaz, ya que el personal que ha sido contratado por parte del Consorcio han manifestado renuncias voluntarias, tales como es el caso puntual de dos auxiliares de tráfico Diana Avellaneda y María Camargo quienes ingresaron el 9 de abril del 2025 y presentaron su carta de renuncia el 10 de junio de 2025 atribuido a situaciones personales, renuncia que fue aceptada por parte del Consorcio. El día 11 de junio se evidencio que estas dos trabajadoras fueron contratadas por la UAERMV, por lo que solicitamos a la interventoría que intervenga y solicite a la UAERMV que no contrate personal que tenga contrato vigente con el Consorcio Estabilización Vial, ya que esto ha perjudicado el avance de las actividades debido al bajos rendimientos por carecía de personal, adicionalmente el trasladar personal fuera de la localidad de Sumapaz incrementa el factor prestacional de la mano de obra no calificada descrita en los análisis de precios unitarios.

El Consorcio Estabilización Vial, ha desarrollado convocatorias en la zona divulgando volantes por medio de los grupos de whatsapp incluyendo al grupo del sindicato de la UAERMV y socialización con el presidente de la junta de acción comunal, con el fin de contratar personal de mano de obra no calificada, a lo cual ha sido poca la recepción por parte de la comunidad, por lo anterior el Consorcio no ha dado cumplimiento al 75% de la mano de obra no calificada residente de la localidad, tal como está establecido en el Plan de Gestión Social.

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Copia: - Ing. Julio Cesar Pinzón Reyes - Subdirector de Intervención de la Infraestructura UAERMV
HLM/ac

A11
Listado de personal Consorcio Estabilización vial.

LISTADO DE PERSONAL JUNIO DEL 2025			
N.	**Nombre**	**Cargo**	**Lugar de residencia**
PERSONAL PROFESIONAL			
1	Hernando Laverde	Director de obra	Bogotá
2	Alejandra Cangrejo	Coordinadora de proyecto	Bogotá
3	Richard Betancor	Residente técnico	Bogotá
4	Gloria Sepúlveda Garzón	Profesional SST	Tenjo
5	Alejandra Limas Plazas	Profesional Social	Bogotá
6	Lorena Gómez Ramírez	Profesional Ambiental	Bogotá
7	Luis David Franco Muñoz	Ing. Topógrafo	Bogotá
PERSONAL OPERATIVO			
8	Ferney Castro	Operador minicargador	Soacha
9	Hermes Guerrero	Operador minicargador	Bogotá
10	Rafael Niño Galindo	Conductor	Fusagasugá
11	Edgar Mancilla	Laboratorista	Bogotá
12	Luis Fernando Acevedo	Operador retroexcavadora	Bogotá
13	Jorge Leonardo Tejedor	Conductor volqueta	Bogotá
14	Pablo David Plazas	Conductor volqueta	Bogotá
15	Julián Mauricio Preciado	Supervisión de obra	Bogotá
16	Sebastián Perilla	Supervisión de obra	Bogotá
17	Cesar Augusto Moscote	Maestro	Bogotá
18	Luis Alfredo Moscote	Maestro	Bogotá
19	Leonel Saavedra	Maestro	Bogotá
20	Manuel Humberto Piñeros	Maestro	Bogotá
21	Erik Andrés Gordo	Oficial	Bogotá
MANO DE OBRA NO CALIFICADA			
22	Carlos Andrés Guette	Ayudante	Bogotá
23	Samuel Delgado	Ayudante	Sumapaz
24	Edison Ancizar Dimate	Ayudante	Sumapaz
25	Habiasney Pineda	Ayudante	Sumapaz
26	Lenin Moscote	Ayudante	Bogotá
27	Anderson Runza	Ayudante	Sumapaz
28	Miller Andrés Ramírez	Ayudante	Sumapaz
29	Carlos Mario Martínez	Ayudante	Bogotá
30	Francisco Javier Molina	Cadenero	Sumapaz
31	Francy Yolima Sanabria	Auxiliar Operativa	Sumapaz
32	Marly Cruz Guzmán	Auxiliar Operativa	Sumapaz
33	Angie Xiomara Espitia	Auxiliar Operativa	Sumapaz
34	Omer David Ortega	Ayudante	Bogotá
35	Uriel Eduardo Rincón	Ayudante	Bogotá

36	Jader Beltrán Urrego	Ayudante	Bogotá

N.	Nombre	Cargo	Lugar de residencia
PERSONAL RETIRADO DURANTE EL MES			
37	Diana Cristina Avellana	Auxiliar Operativa	Sumapaz
38	Elvia María Camargo	Auxiliar Operativa	Sumapaz
39	José Yeferson Vicheu	Ayudante	Bogotá
40	Manuel Saumeth	Ayudante	Bogotá
TOTAL, DE PERSONAL		40	
TOTAL, MOC		21	52,5 %
TOTAL, MONC		19	47,5 %
TOTAL, MONCL		11	57,89 %
TOTAL, MUJERES		7	17,5 %

A 12
Lista de chequeo mes de junio Consorcio Estabilización vial.


BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.) suscrito con la UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022	ECOVIAS SAS

FECHA: 1 al 30 de junio del 2025 **COMPONENTE SOCIAL**

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CALIFICACIÓN
		100%	50%	0,0%	N/A	
1	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal social cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional social asistió a los comités de seguimiento integral y social a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de Gestion Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Plan de Gestión Social						
Programa de atención al Usurario						
5	Instaló el punto de atención al Usurario.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
6	El punto de atención ciudadano funcionó en el horario establecido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
7	El punto de atención al usuario cuenta con dotación mínima requerida.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
8	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRSFD .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
9	Realizó el respectivo seguimiento a las PQRSFD abiertas durante el período de evaluación.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
10	Dio respuesta a las PQRSFD de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
11	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRSFD solicitados por la Interventoría.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
12	El contratista cumplió con los recorridos programados por frente de obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa de información y participación comunitaria						
13	Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
14	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
15	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
16	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA

17	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
18	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
19	Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
20	Elaboró las actas de gestión adelantada con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
21	El contratista cumplió con los compromisos en los tiempos pactados con el ciudadano.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
22	Elaboró las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
23	Entregó las actas de vecindad y compromiso a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
24	El profesional hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actas establecidas contractualmente.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
25	Se entregó copia de las actas de compromiso y de vecindad a la comunidad, si son requeridas por la misma, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
26	El profesional social realizó el acompañamiento durante los registros fílmicos del estado inicial de las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
27	Se entregó el respectivo registro fílmico de las vías a la Interventoría para su revisión y aprobación de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
28	El contratista realiza acompañamiento al comité veedor conformado por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
29	el contratista convoca y realiza reuniónes de comité veedor, de acuerdo a las solicitudes realizadas por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Programa de Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto						
30	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa del cultura vial						
31	Realiza sensibilización de sostenibilidad y cuidado de la vía con las temáticas y el tiempo establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Mano de obra no calificada						
32	Cumplió con el reporte en el informe mensual de personal de mano de obra no calificada local.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

33	Cumplió con el reporte en el informe mensual población en condición de vulnerable.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
34	Cumplió con el reporte en el informe mensual la contratación de mujeres en el proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Movilidad						
35	El contratista realiza socialización del PMT.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	NA
Información del proyecto						
36	Elaboró e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
37	Elaboró y distribuyó los volantes de inicio a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
38	Elaboró y distribuyó los volantes de finalización de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
39	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información de los cierres programados en la via a la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
40	Elaboró y distribuyó los volantes, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
41	Instaló el (los) Punto(s) informativos fijos de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
42	Realizó mantenimiento a (los) punto informativos y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
43	Instaló la (s) valla (s) informativa (s) móviles de acuerdo a los requisitos y tiempos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Reportes						
44	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rual del Sumampaz, la información del plan de gestión social .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
45	Tiene disponibilidad al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
46	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Social	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
47	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
48	Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de de la Gestión social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
49	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	100%
TOTAL CALIFICACIÓN						**100%**

OBSERVACIONES	
ELABORÓ	
	Profesional social de Interventoría ECOVIAS SAS
	
	Isabel Bernal Yasso
ACEPTÓ	Profesional social del CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
	
	Alejandra Limas P.

A 13
Copia Bitácora Social Consorcio Estabilización Vial junio.

30/05/25
Actividades realizadas
Se realiza acompañamiento al comité integral, en donde se hace recorrido en los tramos de Unión-Tunal y Toldo San Antonio. Alejandra LR. PS. CEV.
Isabel Bamal Y.
P. social interv.

31/05/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades en obra.
Isabel Bamal Y. Alejandra Lucas P
P. social interv. PS C.E.V.
CEV UMV.

1/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.
Isabel Bamal Yasso
Trabajadora Social
T.P 0805315212-D
Alejandra Lucas P
CEV.
UMV
Interv. Escuelas.

02/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.
Isabel Bamal Yasso
Trabajadora Social
T.P [illegible]
Alejandra Lucas P
CEV
UMV
Intervención Escuelas

03/06/2025
Actividades realizadas
La interventoría realizó recorrido, donde evidencio que el contratista cuenta con cartelera informativa con volantes informativos, afiche informativo, plan de manejo de tráfico en el punto de atención fijo
No se presenta PQRS
En los tramos viales de San Antonio El Toldo y Unión Tunales cuenta con vallas informativas.

en el inicio y fin del tramo, se coordina el pasacalle de San Antonio El Toldo.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Alejandra Ussa
CEU

UMV

Interv: Ecovias.

4/06/2025

Actividades realizadas

La profesional Social realiza mantenimiento a los puntos satélites instalados en:
Unión Tunalos: Casa de la Señora Arnidia Ponza y la Señora Diana Cifuentes.
San Antonio El Toldo: Casa del Señor Luis Bustos y Escuela del Toldo

Alejandra Ussa
CEU

UMV.

Interv Ecovias.

5/06/2025

La interventoría realiza recorrido con el fin de realizar verificación a las actividades contempladas en el plan de gestión Social, se coordinara que se cuente con los puntos móviles establecidos para la atención a la comunidad., se tienen instalados las vallas informativas, los pasacalles, Puntos Satélites informativos, cuente con sus afiches informativos

El componente Social participa en el comité de seguimiento integral donde se verifica los cumplimiento de los componentes técnicos, ambiental, SST y social.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Alejandra Ussa
CEU.

UMV

Interventoría Ecovias SAS

6/06/2025

Actividades realizadas

La profesional Social del consorcio realizo atención a la comunidad en el punto de atención fijo, no se

presentan PQRS por parte de la comunidad.

Interv. Ecovias

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Alejandra Lucas D
CEV.

UMV

7/06/2025

Actividades realizadas

No se realizan actividades en obra.

JB

Alejandra Lucas D
CEV.

UMV

Interv Ecovias

8/06/2025

Actividades realizadas

No se realizan actividades en obra.

JB

Alejandra Lucas D
CEV.

UMV

Interventoria

9/06/2025

Actividades realizadas

La Profesional Social realiza recorrido, con el fin de verificar los puntos de atención a la comunidad, donde se evidencia que los puntos móviles cuentan con su cartelera informativa. no se presentan PQRS de la comunidad, se realiza atención en el frente de unión

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Alejandra Lucas D
CEV.

UMV

Interv. Ecovias

10/06/2025

Actividades realizadas

La interventoria realizo recorrido con el fin de verificar las actividades establecidas en el plan de gestión social en los frentes de obra activos. se identifica que el Consorcio realizo la instalación de cuatro vallas móviles dos se encuentran ubicadas en el tramo de Unión Tunales, y las otras dos en San Antonio El Toldo

Se evidencia los Pasacalles, los cuales se encuentran ubicados en el inicio del tramo de San Antonio el Toldo y en el inicio de Alto y Tunal bajo.
No se evidencia PARS activos los puntos móviles se encuentran funcionado en los horarios establecidos Unión Tunales Lunes de 9a.m a 1:00 p.m
San Antonio el Toldo martes y jueves 9:00 a.m a 1:00 p.m

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Alejandra Lucas P
CEU.

UMV

Intervención Ecovias SAS
11/06/2025
Actividades Realizadas
La profesional Social realiza recorrido con el fin de realizar mantenimiento en los puntos satélites que se encuentran ubicados en el tramo vial de unión tunales casa de la presidenta de junta de acción comunal de tunal bajo y el segundo punto casa de la Señora Dona Cifuentes.
En San Antonio el toldo el primer punto en la casa del Señor Luis Bustos y el segundo en la escuela del toldo, donde pública el volante de convocatoria laboral en todos los puntos satélites

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Alejandra Lucas P
CEU.

UMV.

Intervención Ecovias SAS
12/06/2025
Actividades realizadas
La intervención realizó comité de seguimiento Social con el fin de realizar seguimiento y control a las actividades y compromisos adquiridos

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

UMV

13/06/2025
Actividades realizadas
El Componente Social realizó acompañamiento y participó en el comité de Seguimiento Integral, con el fin de realizar Seguimiento a cada uno de los compromisos adquiridos en cada componente técnico, ambiental, SST y social.
De igual manera se realizó recorrido en los tramos viales de Unión Tunales y San Antonio el Toldo.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Interv. Ecovias SAS.

AlejandraLucasP
CEU

UMV

14/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Interv Ecovias SAS

AlejandraLucasP
CEU.

UMV

15/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Interv Ecovias

AlejandraLucasP
CEU.

UMV

16/06/2025
Actividades realizadas
La Profesional social realizó atención a la Comunidad en el punto móvil de Unión Tunales, dando cumplimiento al horario establecido, no se presentan PQRS la interventoría realiza verificación

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

AlejandraLucasP
CEU.

UMV

17/06/2025
Actividades realizadas
La profesional social realiza acta de Compromiso en el predio del ubicado en la abscisa K1+860 con el fin de informar como se realizara y quedaron las entradas del predio,
La interventoría realiza recorrido en los frentes activos con el fin de verificar las actividades establecidas contractualmente.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Inter Ecovias SAS

Alejandra Lucas P
CEV.

18/06/2025
Actividades a realizar
La Profesional social realiza recorrido en el tramo vial de San Antonio El Toldo, con el fin de levantar acta de compromiso con el propietario del predio del señor Bono Penaloza y la Señora Eva Rodríguez. no fue posible contactar al propietario se encuentra en Bogotá urbana. se encuentra pendiente firma.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Inter Ecovias SAS

Alejandra Lucas P
CEV

19/06/2025
Actividades realizadas
El Componente Social realizó acompañamiento y participó en el comité de seguimiento integral, con el fin de realizar Seguimiento integral a cada uno de los compromisos adquiridos en cada componente técnico, ambiental, SST y Social
De igual manera se realizó recorrido en los tramos viales de San Antonio El Toldo y Tonal Unión

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Inter ecovias

Alejandra Lucas P
CEV

20/06/2025
Actividades realizadas
Se realiza mesa de trabajo con el consorcio y la interventoría. con el fin de aclarar las dudas a las observaciones presentadas a los informes 14, 15, 16, 17 A... el Contratista se compromete a ajustar los informes y realizar entrega a la interventoría.

Isabel Bernal Yanez
Trabajo Social
C.T. P. 080535212-R
Interventoría Ecovias

Alejandra Ruiz P
CEV

UMV

21/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yanez
Trabajo Social
C.T. P. 080535212-R
Inter. Ecovias SAS

Alejandra Ruiz P
CEV.

UMV

22/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yanez
Trabajo Social
C.T. P. 080535212-R
Inter. Ecovias SAS

Alejandra Ruiz P
CEV.

UMV

23/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yanez
Trabajo Social
C.T. P. 080535212-R
Interv. Ecovias SAS

Alejandra Ruiz P
CEV.

UMV

24/06/2025
Actividades de obra
Unión Tunalos
La Presidenta de Junta de acción comunal de Tunal Bajo la Señora Arnidia Ruiza, Solicita Programar una reunión extraordinaria, con el fin de canalizar y dar Solución a inquietudes de la Comunidad.

la reunión es programada para el jueves 3 de julio del año en curso, la presidente Solicita se le colabore con la convocatoria la interventora y el consorcio Estabilización Vial se comprometen en la convocatoria.

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Interv. Eccivias

Alejandra Ruiz P
CEV.

RA
UMV.

25/06/2025

Actividades realizadas

La profesional social realiza recorrido en el frente de Obra de Unión Tunales con el fin de atender a la Comunidad. y realizar atención en el punto móvil De igual manera realiza atención a la comunidad en el punto fijo de atención a la Comunidad, no Se presentan Pqrs

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Interv Eccivias

Alejandra Ruiz P
CEV.

RA
UMV.

26/06/2025

Actividades realizadas

Unión Tunales

La Profesional Social realiza acta de compromiso con el señor Luis Alberto Rey predio ubicado en el Km320 el tema a tratar la adecuación de material de excavación . Acta de compromiso en el predio ubicado en la abscisa Km +860 Construcción de buena entrada se definen Umts al ingreso. Señor Rafael Romero, quien manifiesta no esta de acuerdo e indica que con 4 metros no garantiza el poder ingresar o dar la vuelta a camiones, buseta y maquinaria que hace mantenimiento a la vía, de acuerdo a lo anterior se trata el tema en la reunión programada para el jueves 3 de julio 2025.

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Interv. Eccivias.

Alejandra Ruiz P
CEV.

RA
UMV

La interventoria realizó comité de Seguimiento social, con el fin de realizar seguimiento al contrato.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Alejandra Vasquez
CEU

UMV

Intra Ecuias.
27/06/2025
Actividades a realizar Tramo Unión Tunales
La profesional Social del Consorcio y de interventoria hacen entrega del volante de invitación a reunión extraordinaria que se realizará el 3 de julio 2025. el volante es adjuntado al Grupo del Consorcio de la Comunidad apoyando el proceso de convocar a la Comunidad. y entregado a la presidente de junta de acción Comunal quien realizará la convocatoria.
Tramo oral San Antonio El Toldo
La interventoria realizó recorrido en el tramo en el cual se recibió una queja verbal por parte de la Señora Eva por cuanto que informa que en el predio ubicado en la abscisa K12+100, informa que se está haciendo uso inadecuado en las zonas Verdes el cual se esta utilizando como baño público, la profesional Social realiza visita al predio con el fin de atender el requerimiento ciudadano.
- El componente Social realizó acompañamiento y participó en el comité de Seguimiento integral #71, con el fin de realizar Seguimiento a cada uno de los compromisos adquiridos en cada componente técnico, Ambiental, SST y Social.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Alejandra Vasquez
P CEU.

UMV

28/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
CT. P. 080535212-R

Alejandra Ucas P
CEU

UMV

Intervención Escolar

29/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
CT. P. 080535212-R

Alejandra Ucas P
CEU

UMV

Intervención Escolar

30/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
CT. P. 080535212-R

Alejandra Ucas P
CEU.

UMV

Intervención Escolar

1/07/2025
Actividades realizadas

Alejandra Ucas P
CEU

UMV.

A 14
Comunicado 186-1- 711
Comunicado CEV/22-408
Comunicado 186-1- 710

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-711

Bogotá D.C. 18 de junio de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: *CONTRATO DE OBRA No. 479-22. GRUPO 2: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910- K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.").*

Asunto: *Respuesta al correo electrónico del 5 de junio del 2025, Informe mensual Social No 14 V4,15 V4,16 V3,17V2. CEV.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización Vial. Se tiene las siguientes observaciones:

Informe No. 14 V4.

1. Página 2, No se evidencia firmas de quien revisó y quien aprobó.

2. Página 3, La tabla de contenido vinculación de mujeres presenta error en el marcador.

3. Página 21, Tabla 11, Personal vinculado al proyecto, enero 2024, De acuerdo alistado presentado se evidencia 20 trabajadores de MONC, presentan 21 por cuanto que se están contando al Maestro LEONIDAS CASTAÑEDA, el cual no hace parte de la mano de obra no calificada, subsanar, revisar el porcentaje de mano de obra no calificada.

4. Los anexos, se solicita cargar directamente en PDF los anexos y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-711

5 Anexo 4, Entrega de volantes, la pieza informativa no corresponde, por cuanto que en la tabla 9 se evidencia descripción de Volante Información Cierre de Vía_ Sector Unión Tunales así mismo el registro fotográfico se evidencia en volante anteriormente mencionado.

6 Los formatos de los anexos deben tener el visto bueno de la profesional social de la interventoría, no se evidencian todos los formatos firmados.

Informe 15 V4.

1. Página 2, No se evidencia firmas de quien revisó y quien aprobó.

2. Página 28, revisar el porcentaje de mano de obra no calificada, de acuerdo al listado presentado se evidencia que cuentan con 27 trabajadores de mano de obra no calificada de los cuales 25 son de la localidad, se cumple con un 92,59 %

3. Los anexos, se solicita cargar directamente en PDF los anexos y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información.

4. Los formatos de los anexos deben tener el visto bueno de la profesional social de la UAERMV.

Informe 16 V3.

1. *Página 2, No se evidencia firmas de quien revisó y quien aprobó.*

2. En la tabla de versiones indican que la versión 3 es el informe 15 V3, subsanar.

3. Página 25, revisar el porcentaje de mano de obra no calificada, de acuerdo al listado presentado se evidencia que cuentan con 28 trabajadores de mano de obra no calificada de los cuales 19 son de la localidad, no se cumple con un 67,85 %

4. Los anexos, se solicita cargar directamente en PDF los anexos y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información.

5. Los formatos de los anexos deben tener el visto bueno de la profesional social de la UAERMV.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-711

Informe 17 V2.

1. Página 2, No se evidencia firmas de quien revisó y quien aprobó.

2. Página 25, revisar el porcentaje de mano de obra no calificada, de acuerdo al listado presentado se evidencia que cuentan con 23 trabajadores de mano de obra no calificada de los cuales 21 son de la localidad, se cumple con un 91,30 %

3. Página 47, totalizar la entrega de volantes y cerrar la planilla.

4. Los anexos, se solicita cargar directamente en PDF los anexos y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información.

5. Los formatos de los anexos deben tener el visto bueno de la profesional social de la UAERMV.

6. Todos los formatos deben estar firmados.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al Consorcio Estabilización Vial, allegue a la interventoría lo solicitado en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-408

Bogotá D.C., 5 de junio de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Informe mensual social No 19

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del informe mensual del componente social No 19, correspondiente al periodo del mes de mayo del 2025.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Archivo en PDF
HLM/ac

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-710

Bogotá D.C. 18 de junio de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: *CONTRATO No. 479-2022 "GRUPO 2: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910- K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.").*

Asunto: *Respuesta al comunicado* CEV/22-408 del 5 de junio del 2025 *"Informe mensual social No 19"*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización Vial. Una vez revisado el documento relacionado en el asunto se tiene las siguientes observaciones:

Informe 19 V1.

1. Página 14, Programa de atención a la comunidad, de acuerdo con las fiches PAGA presentadas en el plan de gestión social indican que es *"plan de gestión social al usuario" subsanar.".*
2. Página 10, bajar el título "Localización del Proyecto"
3. Pagina 15, se evidencia un espacio en blanco numeral 1.2.
4. Tabla 4, Indicador del programa de educación y capacitación al personal vinculado.
5. En la columna de registro de cumplimento completar la fórmula 1*100/1= 100%.
6. Tabla 6, Puntos satélites por tramo se encuentra incompleta la información en el tramo de Unión Tunales se tiene dos puntos satélites.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-710

7. Página 24, numeral “4. PROGRAMA DE INSTRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS”. De acuerdo al PAGA estableciendo los programas del plan de gestión social, no se evidencia este programa, la descripción de actas de vecindad están incluidas en el programa de “INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA”. subsanar.

8. Tabla 7. Relación actas de compromiso numeral 7, no se encuentra completo el nombre del ciudadano.

9. Página 29, numeral 4.3. completar el nombre es acta de gestión social adelantada.

10. Página 29, Tabla 9 Indicadores de la gestión del programa de información y participación comunitaria. en la columna del indicador se encuentra descrita así:
“Reuniones de inicio de obras ejecutadas, mes mayo 2025 1 * 100
“Reuniones de inicio de obras requeridas, mes mayo 2025 1” subsanar no se realizaron reuniones.

    No. De actas de vecindad programadas 1 x 100 = 100%
    No. De actas de vecindad realizada” describir el número de actas que se radicaron a la interventoría. Subsanar.

11. Página 30 “5. PROGRAMA DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA” De acuerdo con el PAGA estableciendo los programas del plan de gestión social, no se evidencia este programa el nombre el “PROGRAMA DE CULTURA VIAL”. subsanar.

12. Página 31, Contratar mano de obra del área directa de influencia del proyecto, en el informe se reporta un total de 33 trabajadores, no coincide con el total de personal reportado por el componente SST donde reportan 38 trabajadores, se solicita unificar la información de acuerdo con el reporte del componente SST.

13. Página 34, Tabla 12 Relación comités técnicos y sociales de obra, falta incluir el comité social realizado el 16 de mayo del 2025.

14. Página 38, Titulo “ANEXO” Centrar título.

15. Página 58, en el separador Anexo 4: INFRA-FM-022 Formato control instalación afiche. Completar y/o volante informativo.

16. Anexo 15, las certificaciones son de cada uno del personal relacionado como mano de obra no calificada local, completar certificación.

17. Los formatos de los anexos deben tener el visto bueno de la profesional social de la Unidad de Mantenimiento vial.
18 Los formatos se encuentran sin firma de la interventoría.

19 Enumerar los títulos y subtítulos del informe.


ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-710

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al Consorcio Estabilización Vial, allegue a la interventoría lo solicitado en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,



ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

A15
Actas de comité social de seguimiento y mesas de trabajo Consorcio Estabilización vial

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Comité de Seguimiento Social #24 C. e V.
Fecha:	12/06/2025
Lugar:	Virtual
Dependencia:	
Hora de inicio:	2:42 p.m
Hora de finalización:	3:45 p.m
Nombre del Responsable:	Isabel Bernal Y.
Modalidad:	✓ Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
E	1271821	Isabel Bernal Y.	Ecovios	P. Social			✓						-	Intersumapaz Social16@gmail.com	Isabel B. Y.
E	1022351286	Alejandra M P	CEV	P. Social			X							Social consorcio @gmail.com	Alejandra M P

CONSENTIMIENTO: Que registro mis datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declaro que conozco y acepto la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Asimismo, y acepto que cualquier tratamiento o recolección relacionada con el tratamiento de mis datos personales podrá ser ejercida verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3358000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar este autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera autorizo que los datos aquí consignados sean usados para temas académicos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver DAC-MM2 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sig

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Verificación de Compromisos:

1. Entrega informes mensuales # 14, 15, 16, 17
El Consorcio realizó entrega de los informes el 5 de junio del año en Curso
Se encuentran en revisión por parte de interventoria
2. Entrega de informe mensual Social # 19 mes de mayo
El Consorcio realizó entrega del informe el 5 junio del año en curso mediante Comunicado CGV/22-408, Se encuentra en revisión por parte de interventoria.
3. Levantamiento actas de compromiso
Natural de RCD Volquetas presidente de junta acción Comunal Toldo

Desarrollo del comité

→ Programa de atención al Ciudadano
A la fecha no se presentan PQRS 0
Se cumple con los horarios de atención en el punto fijo y móvil
El grupo de Whatsapp se encuentra funcionando adecuadamente

Programa de información y Participación Comunitaria
Los puntos Satélites Se encuentran al día
Los Vallos informativos Se encuentran al día

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

La interventoria Solicita realizar acta de compromiso en el predio de la Señora Eya Rodríguez, quien es arrendataria, al Señor Bamo peralozan en el tramo vial de San Antonio El Toldo.

Actas de Vecindad.

El Consorcio realiza entrega de 14 actas de Vecindad de apertura de Unión Tonales y dos actas de vecindad del tramo vial de San Antonio El Toldo mediante Comunicado CEU/22-409. el 5 de junio del 2025, Se encuentra en revisión por parte de interventoria.

Programa de Contratación al personal

Total de personal 31 trabajadores

19 Mano de obra Calificada (MOC)

12 Mano de obra no calificada (MONC) 38,70%.

7 Mano de obra no calificada Local (MONCL) (38,70%.) 58,33%.

6 Mujeres 19,35%.

7. personal Vulnerable 22,58%.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Levantamiento acta de compromiso San Antonio El Toldo	C. E. U.	26/6/2025
2	Entrega de firmas 14, 15, 16, 17	C. E. U	26/6/2025

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o pantallazos que generen fotos/video.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso ISOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Comité de Seguimiento Social # 25 C.E.V
Fecha:	26/06/2025
Lugar:	Virtual
Dependencia:	
Hora de inicio:	9:000 a.m
Hora de finalización:	10.000 a.m
Nombre del Responsable:	Isabel Bamal Y.
Modalidad:	Presencial / ✓ Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1022352[illegible]PO	Alejandra Lucas P	ID CEV	CEV			+							Social.consorcio @ Cuadl.com	Alejandra P
CC	52121821	Isabel Bamal Y	ECOLOGIS SAS	P. Social			✓						✓	interamapas scu1161@gmail.com	Isabel B. Y.

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, confirma a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3580000. Manifiesta que son los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver LAC 3067 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gdi.gobiernobogota.gov.co/content/cartas-trato-digno-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Verificación de Compromisos:

1. Levantamiento acta de compromiso del predio del Señor Bermo pendiente
3) Elibeth Ardila arrendataria Eva Rodríguez Pendiente →
2. Levantamiento de acta de compromiso con el Señor Rafael Romero predio Km 840 y Km 860 bahea entrada y metros ingreso Se Comple. el propietario informa que no esta de acuerdo por cuanto tiene unos camiones y no es posible garantizar ingresos y dar vueltas del transporte de busetas y maquinaria que hacen mantenimiento

Desarrollo del comité

1. Verificación de material de RCD volqueta en el predio de la Señora Tactiva Presidente de junta de acción Comunal del Tolda. Indica que este material era de la Unidad.

→ Programa de atención a la Comunidad

A la fecha no se presentan PQRS
Se Cumple con los horarios de atención en el punto fijo y móvil
El grupo de Whatsapp Se evidencia Cumplimiento

→ Programa de Información y Participación

los puntos Satélites, pasacalles, Vallas informativas se encuentran el día acta de compromiso: Luis Alberto Rey ambiental Gobierno de naturaleza Unión-Tonales

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Acta de Compromiso Levantamiento material de excavación

Actas de Vecindad

La Interventoría realizó revisión de 16 actas de vecindad de apertura 14 actas de Unión Tunales y 2 actas de San Antonio El Tolda, mediante comunicado 186-1-717 del 24 de junio-2025.

↓ Programa de Educación y Capacitación al personal Vinculado al proyecto

La profesional Social informa que realizará (reunión) Sensibilización con el personal de obra - tema manejo de residuos, además además realizó Sensibilización al personal del consorcio con relación a la inadecuada práctica de transporte de personas en el minicargador y plataón de la Comunidad

→ atención a la Comunidad.

Se solicita al Consorcio levantar una PARS con la Señora Eva Rodriguez por cuanto que en recorrido realizado por interventoría la Auxiliar por cuanto que indica que el personal esta haciendo sus necesidades fisiologicas en el potrero y cuando van a ver el ganado ontados de excrementos.

- Levantar acta de compromiso por daños de cercas acopio de material daños en cercas

→ Reunión

La interventoría informa que la Presidenta de Junta de acción comunal Solicitan en nombre de la Comunidad realizar reunión extraordinaria

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

en la comunidad de Ilag/ Tunal bajo, esta se realizará el jueves a las 10 a.m.

Contratación de personal

total de trabajadores 38

19 HOE

19. HONC 50 %.

10 HONCL = 52,63 %.

7 mujeres. = 18,42 %.

Se evidencia no cumplimiento en la Contratación de pernal HONCL 52,63 % = 75 %.

Informes mensuales. 14, 15, 16, 17 con observaciones mediante consolidado

Informes mensuales 19 mediante consolidado 186-1-710. 18 junio/2025.

Informes Semanales al día.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Levantamiento actos de Compromiso	C.E.V	1/07/25
2.	Entrega de informes Subsinados Nº 14, 15, 16, 17, 18, 19.	C-E-V.	1/07/25

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen listado de asistencia.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión: Mesa de trabajo informes 14, 15, 16, 17 C.E.V.

Fecha: 20/06/2025

Hora de inicio: 9:30 a.m

Hora de finalización: 10:30 a.m

Lugar: Virtual

Modalidad: Presencial / ✓ Virtual / Telefónica / Mixta

Dependencia:

Nombre del Responsable: Isabel Barnal Y.

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
E	1022351286	Alejandra Mas P	CEV	P Social			1						1	social.corsacio @cualcer	Alejandra P.
E	52131804	Isabel Barnal Y.	Ecaros	P. Soal			1						1	interamapas soal16@gmail.com	Isabel B Y.

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Asimismo, acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, centro responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3220000. Manifiesta que son los datos personales sobre el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a obtener información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver S.M. 3880 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gobiernobogota.gov.co/content/oferta-integrada-de-gestion-soc

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza mesa de trabajo con el componente Social y técnico del Consorcio Estabilización Vial, con el fin de aclarar dudas que se presentan con las observaciones realizadas por interventoría a los informes 14, 15, 16, 17

- Se aclara como se miden los porcentajes de mano de obra no calificada, versus mano de obra no calificada local estableciendo que es MONCL X 100 ÷ MONC
- Se aclara que los anexos se anexan entregan con el documento en PDF y no pegados al documento Word.

El Contratista se compromete a realizar entregar antes del Comité Integral.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de informes mensuales 14, 15, 16, 17	C.E.U.	26/06/2025

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o pantallazos que generen constancia.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

Unidad Administrativa especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV

A 16
Correos electrónicos trazabilidad de solicitud y aprobación piezas divulgativas volantes y comunicados informativos. UAERMV.

Gmail intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>

Volantes de cierres viales

2 mensajes

Rubys Del Carmen Ruiz Arrieta <rubys.ruiz@umv.gov.co> 4 de junio de 2025, 20:34
Para: intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>
Cc: Rafael Dario Peña Florez <rafael.pena@umv.gov.co>, Camilo Ernesto Rojas Garcia <camilo.rojas@umv.gov.co>, Jorge Luis Aldana Perdomo <jorge.aldana@umv.gov.co>, Astrid Lorena Morera Chacon <astrid.morera@umv.gov.co>

Cordial saludo

Estimada Isabel,

Adjunto envío volantes de cierres viales de los tramos que actualmente están en ejecución

- El Toldo
- Santo Domingo - Capitolio
- Unión Tunales

Para su revisión

Saludos

Atentamente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

RUBYS DEL CARMEN RUIZ
Contratista
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Unidad de Mantenimiento Vial
Teléfono: (+60-1) 3779555
Sede Administrativa: Calle 26 No. 69-76 piso 3 Edificio Elemento torre Aire

3 adjuntos

- **Capitolio.pdf** 4554K
- **El Toldo.pdf** 5083K
- **Unioìn Tunales.pdf** 4886K

intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com> 9 de junio de 2025, 10:10
Para: Rubys Del Carmen Ruiz Arrieta <rubys.ruiz@umv.gov.co>

Buenas días Rubys
Cordial saludo
Una vez revisados las piezas divulgativas informativas de los cierres viales de los tramos que actualmente están en ejecución

- El Toldo
- Santo Domingo - Capitolio
- Unión Tunales.

La interventoría da aval para fines pertinentes. Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,
Isabel Bernal Yasso.
Profesional Social.

A 17.
Lista de personal junio UAERMV.

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE JUNIO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

UNIDADES EJECUTORAS Y OPERATIVAS VINCULADAS - CONTRATO 609 DE 2023 - PROYECTO REGALIAS SUMAPAZ

No. de Orden	NOMBRE DE LA UNIDAD	DENOMINACIÓN	COMPOSICION	CANTIDAD PERSONAS	FECHA DE INGRESO
	UNIDAD DE EJECUCION DIURNA TIPO 1	**UEMRD1-REG-01**	1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes	**4 personas**	**16-dic-24**
1	CARLOS HERNAN RAMOS ERAZO	1087784620	INSPECTOR OBRA	1 personas	##########
2	JOSE YECID HERNANDEZ GUTIERREZ	80235605	OFICIAL I	1 personas	16-dic-24
3	YEISON MAURICIO CASTELLANOS	1003670730	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
4	ALFREDO ARNULFO DIMATE GONZALEZ	1032656546	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	16-dic-24
	UNIDAD DE EJECUCION DIURNA TIPO 1	**UEMRD1-REG-02**	1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes	**4 personas**	**13-ene-25**
5	FIDEL DIAZ ZULUAGA	9807823	INSPECTOR OBRA	1 personas	13-ene-25
6	RUBEN PEÑALOZA VALBUENA	1022979320	OFICIAL I	1 personas	13-ene-25
				1 personas	
7	IVAN ANDRES PEÑALOZA VALBUENA	1032656001	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
	UNIDAD DE EJECUCION DIURNA TIPO 1	**UEMRD1-REG-03**	1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes	**4 personas**	**13-ene-25**
8	LUIS ANIBAL DURAN MONTERO	80434593	INSPECTOR OBRA	1 personas	13-ene-25
9	ONOLASCO DELGADO VERGARA	80745216	OFICIAL I	1 personas	13-ene-25
10	JUAN DAVID PENAGOS PABON	1069231247	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
11	FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ	349277	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	9-jun-25
	UNIDAD DE EJECUCION DIURNA TIPO 1	**UEMRD1-REG-04**	**1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**4 personas**	##########
12	OSCAR LEONARDO CAÑON MOJICA	80755852	INSPECTOR OBRA	1 personas	##########
13	ESTEBAN YOJANY MONTAÑA AMAYA	1070947389	OFICIAL I	1 personas	##########
14	BRAYAN ALECIX PEÑALOZA CORTES	1022979929	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	##########
15	ELKIN ESTIVEN CARO PEÑALOZA	1032656213	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	##########
	UNIDAD DE EJECUCION DIURNA TIPO 2	**UEMRD2-REG-01**	2 Ayudantes	**2 personas**	**13-ene-25**
16	JONATHAN ARVEY TORRES RODRIGUEZ	1069717922	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
17	RICARDO HERNANDEZ TORRES	1024512837	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
	UNIDAD DE EJECUCION DIURNA TIPO 2	**UEMRD2-REG-02**	2 Ayudantes	**2 personas**	11-jun-26
18	IVAN ARLEY TORRES LARA	1032656076	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	11-jun-26
19	ANDRES FELIPE GONZALEZ PRIETO	1072894591	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	11-jun-25
	UNIDAD DE EJECUCION DIURNA TIPO AYUDANTE - BOAL	**UEMRDAB-REG-01**	2 Boal´s	**2 personas**	##########
20	BRAYAN STIVEN PORRAS PALACIOS	1022997635	AYUDANTE BOAL	1 personas	##########
21	LUIS HERNANDO RAMIREZ PEÑALOZA	3125436	AYUDANTE BOAL	1 personas	##########
	UNIDAD DE EJECUCION DIURNA TIPO 3	**UEMRD3-REG-01**	2 Auxiliares de control de trafico	**2 personas**	**16-dic-24**
22	DORA EUNICES PEREZ BUSTOS	1072894823	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	16-dic-24
23	JOHANNA CELEMIN NARANJO	1106949475	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	16-dic-24
	UNIDAD DE EJECUCION DIURNA TIPO 3	**UEMRD3-REG-02**	2 Auxiliares de control trafico	**2 personas**	**13-ene-25**
24	BLANCA ISABEL CASTELLANOS MORALES	1069231364	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
25	LINA MARCELA PARADA PEÑALOZA	1022936290	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
	UNIDAD DE EJECUCION DIURNA TIPO 3	**UEMRD3-REG-03**	2 Auxiliares de control trafico	**2 personas**	**13-ene-25**
26	JESLY JULIANA GUZMAN MORA	1003486609	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
27	CAREN VANESSA GUZMAN MORA	1069230250	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
	UNIDAD DE EJECUCION DIURNA TIPO 3	**UEMRD3-REG-04**	2 Auxiliares de control trafico	**2 personas**	11-jun-25
28	ELVIA MARIA CAMARGO LOPEZ	1032029173	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	11-jun-25
29	DIANA CRISTINAAVELLANEDA HERNANDEZ	1002548039	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	11-jun-25
	UNIDAD DE EJECUCION DE LABORES TOPOGRAFICAS DIURNA SGR	**UELTD-REG-01**	1 Topografo, 1 cadenero 1º y 1 cadenero 2º	**3 personas**	**16-dic-24**
30	JOSE DAVID LOPEZ BOBADILLA	80810144	TOPOGRAFO	1 personas	16-dic-24
31	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	1003486903	CADENERO I	1 personas	16-dic-24
32	GERBER ANDRES AGUDELO BARBOSA	1022984996	CADENERO I	1 personas	16-dic-24
	UNIDAD DE EJECUCION DE LABORES TOPOGRAFICAS DIURNA SGR	**UELTD-REG-02**	1 Topografo, 1 cadenero 1º y 1 cadenero 2º	**3 personas**	**9-ene-25**
33	GIOVANNY ALFREDO GIRALDO NAVARRO	79839669	TOPOGRAFO	1 personas	9-ene-25
34	NEYER IVAN AGUDELO BARBOSA	80127396	CADENERO I	1 personas	9-ene-25
35	JULIO ESNEYDER RAMIREZ GIL	1000454144	CADENERO II	1 personas	9-ene-25
	UNIDAD DE EJECUCION DE LABORES TOPOGRAFICAS DIURNA SGR	**UELTD-REG-03**	1 Topografo, 1 cadenero 1º y 1 cadenero 2º	**3 personas**	##########
36	NELSON RUBIEL GARCIA FUENTES	80512590	TOPOGRAFO	1 personas	##########
37	SERGIO STIVEN ROZO BERNAL	1013104274	CADENERO I	1 personas	##########
38	DILAN ANDRES CANO ROMERO	1007101606	CADENERO II	1 personas	##########
	UNIDAD DE EJECUCION DE LABORES TOPOGRAFICAS DIURNA SGR	**UELTD-REG-04**	1 Topografo, 1 cadenero 1º y 1 cadenero 2º	**2 personas**	3-jun-25
39	JEISSON ORLANDO FONSECA TAMI	1030662359	TOPOGRAFO	1 personas	3-jun-25
40	CRISTIAN ZAIMIR MOLINA LOZANO	1030562124	TOPOGRAFO	1 personas	16-jun-25
41	JUAN DAVID DELGADO VERGARA	1032656043	CADENERO II	1 personas	3-jun-25
	UNIDAD DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - DIURNA	**UGSTD-REG-01**	2 Tecnologos SST con curso de alturas	**2 personas**	**16-dic-24**
42	NEIDI JHOANNA NOVA BERMUDEZ	53049895	TECNOLOGO SST - CON CURSO DE ALTURAS	1 personas	16-dic-24
43	JOSE RICARDO BUITRAGO LADINO	80129274	TECNOLOGO SST - CON CURSO DE ALTURAS	1 personas	16-dic-24
	UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A _Modificacion 02	**UOTVHD-10A-Rur-M2**	2 Conductores volqueta doble-troque _ Aliment y Alojamiento	**2 personas**	**16-dic-24**
44	WILLIAN NEIRA MORENO	79816036	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	5-feb-25
45	HERNAN DARIO HERRERA MORALES	80747512	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
	UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A	**UOTVHD-10A**	2 Conductores volqueta doble-troque.	**2 personas**	**16-dic-24**
46	WILMAN ALONSO MUNOZ BAUTISTA	1022994231	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
47	JAIRO ALBERTO ROZO HERNANDEZ	79801113	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
	UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A	**UOTVHD-10A**	2 Conductores volqueta doble-troque	**2 personas**	**16-dic-24**
48	RICARDO ALBA NINO	79363456	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
49	RICAUTE CARDONA AGUIRRE	18222467	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
	UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A	**UOTVHD-10A**	2 Conductores volqueta doble-troque	**2 personas**	26-feb-25
50	JOHN FERNAN RODRIGUEZ ZAMORA	80350271	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	27-feb-25
51	JUAN GABRIEL MORENO HERNANDEZ	1033731171	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	28-feb-25
				51 personas	

INGENIERO SUPERVISOR ZONAL - CONTRATO 609 DEL 2023

	INGENIERO SUPERVISOR ZONAL	**ING-IZ**	**1 Ingeniero inspector de zona**	**1 persona**	**16/12/2024**
52	JULIO ALBEIRO HERNANDEZ CALDERON	1013662369	INGENIERO INSPECTOR ZONAL	1 personas	16-dic-24
				1 personas	

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE JUNIO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

CONTRATO No. 936 del 2024 CONSORCIO H Y C SERVICIOS DE MAQUINARIA

FRENTE DE OBRA UNION-TUNALES

	OPERADORES DE MAQUINAS Y CONDUCTOR DE VEHICULOS	GO-01_HYC		7 Personas	
53	BRAYAN CAMILO TOVAR TORRES	1003775492	OPERADOR RETROCARGADOR	1 persona	15-ene.-25
54	WILLIAN BARACALDO	18235992	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	16-ene.-25
55	EDGAR RAUL ESPITIA RODRIGUEZ	1106482733	OPERADOR CARRO TANQUE	1 persona	16-ene.-25
56	JUAN FRANCISCO CORTES CAMARGO	79248746	OPERADOR MOTONIVELADORA	1 persona	22-ene.-25
57	CRISTIAN CAMILO HURTADO GRAJALES	1053607177	OPERADOR MINICARGADOR	1 persona	16-jun.-25
58	ISMAEL OLMOS DIMATE	80269138	OPERADOR CARRO TANQUE	1 persona	21-abr.-25
59	SEBASTIAN BLANCO SANCHEZ	1025322582	SUPERVISOR MAQUINARIA	1 persona	15-ene.-25
				7 personas	

CONTRATO No. 936 del 2024 CONSORCIO H Y C SERVICIOS DE MAQUINARIA

FRENTE DE OBRA SANTO DOMINGO/CAPITOLIO

	OPERADORES DE MAQUINAS Y CONDUCTOR DE VEHICULOS	GO-02_HYC		7 Personas	
60	NILSON LOPEZ BURGOS	11435690	OPERADOR VOLQUETA SENCILLA	1 persona	14-abr.-25
61	ARNULFO LOPEZ BURGOS	11435690	OPERADOR RETROESCAVADORA	1 persona	30-mar.-25
62	LUIS GABRIEL PEREZ CASTRILLO	1064786137	OPERADOR MINICARGADOR	1 persona	31-mar.-25
63	ALONSO VARGAS PLAZAS	3232285	OPERADOR MOTONIVELADORA	1 persona	22-may.-25
64	OCTAVIO ALFONZO MENDEZ	3214253	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	19-may.-25
65	LEONARDO ENRIQUE MARTINEZ CUEVAS	79777521	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	1 persona	10-mar.-25
66	HENRY RUA	1067593903	OPERADOR RETROESCAVADORA	1 persona	10-mar.-25
				7 persona	

CONTRATO No. 936 del 2024 CONSORCIO H Y C SERVICIOS DE MAQUINARIA

FRENTE DE OBRA TOLDO/SAN ANTONIO

	OPERADORES DE MAQUINAS Y CONDUCTOR DE VEHICULOS	GO-03_HYC		7 Personas	
67	ERIBERTO JIMENEZ FERNANDEZ	3166130	OPERADOR MOTONIVELADORA	1 persona	5-feb.-25
68	ERNESTO MEDINA MELO	11251471	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	21-abr.-25
69	JUAN CARLOS SILVA	1032400140	OPERADOR RETROESCAVADORA	1 persona	16-jun.-25
70	LUIS EMIRO TORRES PADILLA	7308755	CONDUCTOR VOLQUETA SENCILLA	1 persona	16-jun.-25
71	WILMER YOANY PEREZ CASTRO	1069231015	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	16-jun.-25
72	LUIS HOYOS	1003501103	OPERADOR MINICARGADOR	1 persona	16-jun.-25
73	LUIS EDUARDO LOPEZ GUERRERO	79249265	OPERADOR MINICARGADOR	1 persona	20-ene.-25
				7 personas	

CONTRATO No. 485 del 2022 MEGASEGURIDAD LTDA. SERVICIOS DE VIGILANCIA

FRENTE DE OBRA UNION-TUNALES

	GUARDAS DE SEGURIDAD - VIGILANTES	GO-04_MEG-SEG		3 Personas	15-ene-25
74	LEIDY BAQUERO ORJUELA	1069740888	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
75	ALBERTO VILLALBA VERGARA	79632496	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
76	DANIEL OCTAVIO GONZALEZ	1033793787	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
				3 personas	

CONTRATO No. 485 del 2022 MEGASEGURIDAD LTDA. SERVICIOS DE VIGILANCIA

FRENTE DE OBRA SANTO DOMINGO / CAPITOLIO

	GUARDAS DE SEGURIDAD - VIGILANTES	GO-04_MEG-SEG		3 Personas	15-ene-25
77	MAICOL ALEJANDRO PENALOZA MUNOZ	1069231461	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
78	YAQUELIN LOPEZ MENESES	1032656446	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
79	ALCY PAIPA CUBILLOS	79726810	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
				3 personas	

CONTRATO No. 485 del 2022 MEGASEGURIDAD LTDA. SERVICIOS DE VIGILANCIA

FRENTE DE OBRA EL TOLDO / SAN ANTONIO

	GUARDAS DE SEGURIDAD - VIGILANTES	GO-04_MEG-SEG		3 Personas	15-ene-25
80	DUBER JULIO SANCHEZ VILLALBA	3171163	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
81	NIDIA HERNANDEZ PENAGOS	20824393	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
82	ADRIANA LUCIA MARTIN PALACIOS	1007297824	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
				3 personas	

CONTRATO No. 485 del 2022 MEGASEGURIDAD LTDA. SERVICIOS DE VIGILANCIA

ALMACEN CENTRO POBLADO SAN JUAN

	GUARDAS DE SEGURIDAD - VIGILANTES	GO-04_MEG-SEG		3 Personas	15-ene-25
*	ADRIANA POVEDA DELGADO	1003652964	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
**	VIVIAN STEYSI CANO ROMERO	1001061206	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
*	BALBINA PENALOZA VALBUENA	1022956902	VIGILANCIA	1 personas	15-ene.-24
				3 personas	

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE JUNIO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

	CONTRATISTAS UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL					
86	RAFAEL DARIO PEÑA FLORES	79105538	DIRECTOR DE OBRA	1 persona		28-nov.-24
87	CAMILO ERNESTO ROJAS GARCIA	1010162306	RESIDENTE DE OBRA	1 persona		29-nov.-24
88	JORGE LUIS ALDANA PERDOMO	79958784	RESIDENTE DE OBRA	1 persona		14-abr.-25
89	KARINA ISBELIA PRIETO RIANO	1049633079	RESIDENTE DE DISEÑOS TOPOGRAFICOS	1 persona		27-dic.-24
90	JESICA PAOLA VIDAL POLOCHE	1030669188	RESIDENTE AMBIENTAL	1 persona		7-abr.-25
91	RUBY DEL CARMEN RUIZ ARRIETA	1005551124	RESIDENTE SOCIAL	1 persona		4-abr.-25
92	LEIDY YOHANA ORTIZ URREA	1069764358	RESIDENTE SST	1 persona		4-abr.-25
93	JENNIFER CAROLINA VELA PAIVA	1018482183	PROFESIONAL ENCARGADO DE TRAZABILIDAS Y SEGUIMIENTO TECNICO	1 persona		2-dic.-24
94	OMAR FERNEY PATIÑO TORRES	80197609	PROFESIONAL TRAZABILIDAD Y MAQUINARIA	1 persona		13-dic.-24
95	YINA RUTH FONSECA ACOSTA	1069744056	APOYO ADMINISTRATIVO	1 persona		2-dic.-24
				10 persona		

	CONTRATO CAMIONETAS 4*4					
96	NORBEY PALACIOS HURTADO	1000691962	CONDUCTOR CAMIONETA	1 persona		01-04-2'25
97	GONZALO RIOS MURCIA	80070964	CONDUCTOR CAMIONETA	1 persona		01-04-2'26
98	ELMER USECHE MOLINA	79596077	CONDUCTOR CAMIONETA	1 persona		24-jun.-25
				3 persona		

TOTAL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO	98

Profesional SST LEIDY YOHANNA ORTIZ URREA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

PERSONAL RETIRADO DURANTE EL PERIODO REPORTADO	FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE JUNIO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

UNIDADES EJECUTORAS Y OPERATIVAS VINCULADAS - CONTRATO 609 DE 2023 - PROYECTO REGALIAS SUMAPAZ					
No. de Orden	NOMBRE DE LA UNIDAD	DENOMINACIÓN	COMPOSICION	CANTIDAD PERSONAS	FECHA DE RETIRO
	JOHN ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	80765369	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	24-jun-25
	IVAN IGNACIO BRICEÑO VARGAS	1015399293	OPERADOR DE MAQUINAS VIBROCOMPACTADORES	1 personas	18-jun-25
	JUAN PABLO ROJAS CASTRO	1033683032	OPERADOR DE MAQUINAS VIBROCOMPACTADORES	1 personas	18-jun-25
	JUAN JOSE RAMIREZ LOPEZ	1072447616	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	1 personas	18-jun-25
	JUAN GABRIEL CABALLERO DELGADO	1023023297	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	1 personas	18-jun-25
				5 personas	

CONTRATO No. 936 del 2024 CONSORCIO H Y C SERVICIOS DE MAQUINARIA					
1	OPERADORES DE MAQUINAS Y CONDUCTOR DE VEHICULOS	GO-01_HYC		6 Personas	
	DILAN AUGUSTO PINILLA	1000003107	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	9-jun.-25
	JOSE MIGUEL ROMERO ALMONACID	79869713	OPERADOR MOTONIVELADORA	1 persona	9-jun.-25
	CARLOS JULIO ANDRADE	1115740486	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	9-jun.-25
	CESAR AUGUSTO VARGAS ANDRADE	1022974026	OPERADOR RETROESCAVADORA	1 persona	3-jun.-25
	BRAYER YAMIR PRIETO PENAGOS	1072895049	OPERADOR VOLQUETA SENCILLA	1 persona	20-jun.-25
	LEONIDAS RICARDO HERNANDEZ ALVAREZ	1022927194	OPERADOR RETROESCAVADORA	1 persona	3-jun.-25
				6 persona	

CONTRATO CAMIONETAS 4*4					
	OSMEL DUVAN TAUTIVA BELTRAN	1069757593	CONDUCTOR CAMIONETA	1 persona	20-jun.-25
	LIDER YOANE JIMENEZ ALONSO	11382383	CONDUCTOR CAMIONETA	1 persona	13/06/2025
				2 persona	

TOTAL PERSONAL RETIRADO	13

TOTAL DE PERSONAL QUE ESTUVO VINCULADO AL PROYECTO	111

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

PERSONAL RETIRADO DURANTE EL PERIODO REPORTADO	FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE JUNIO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

UNIDADES EJECUTORAS Y OPERATIVAS VINCULADAS - CONTRATO 609 DE 2023 - PROYECTO REGALIAS SUMAPAZ					
No. de Orden	**NOMBRE DE LA UNIDAD**	**DENOMINACIÓN**	**COMPOSICION**	**CANTIDAD PERSONAS**	**FECHA DE RETIRO**
99	JOHN ALEXANDER CIFUENTES CIFUENTES	80765369	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	24-jun-25
100	IVAN IGNACIO BRICEÑO VARGAS	1015399293	OPERADOR DE MAQUINAS VIBROCOMPACTADORES	1 personas	18-jun-25
101	JUAN PABLO ROJAS CASTRO	1033683032	OPERADOR DE MAQUINAS VIBROCOMPACTADORES	1 personas	18-jun-25
102	JUAN JOSE RAMIREZ LOPEZ	1072447616	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	1 personas	18-jun-25
103	JUAN GABRIEL CABALLERO DELGADO	1023023297	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	1 personas	18-jun-25
				5 personas	

CONTRATO No. 936 del 2024 CONSORCIO H Y C SERVICIOS DE MAQUINARIA					
1	**OPERADORES DE MAQUINAS Y CONDUCTOR DE VEHICULOS**	**GO-01_HYC**		**6 Personas**	
104	DILAN AUGUSTO PINILLA	1000003107	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	9-jun.-25
105	JOSE MIGUEL ROMERO ALMONACID	79869713	OPERADOR MOTONIVELADORA	1 persona	9-jun.-25
106	CARLOS JULIO ANDRADE	1115740486	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1 persona	9-jun.-25
107	CESAR AUGUSTO VARGAS ANDRADE	1022974026	OPERADOR RETROESCAVADORA	1 persona	3-jun.-25
108	BRAYER YAMIR PRIETO PENAGOS	1072895049	OPERADOR VOLQUETA SENCILLA	1 persona	20-jun.-25
109	LEONIDAS RICARDO HERNANDEZ ALVAREZ	1022927194	OPERADOR RETROESCAVADORA	1 persona	3-jun.-25
				6 persona	

CONTRATO CAMIONETAS 4*4					
	OSMEL DUVAN TAUTIVA BELTRAN	1069757593	CONDUCTOR CAMIONETA	1 persona	20-jun.-25
	LIDER YOANE JIMENEZ ALONSO	11382383	CONDUCTOR CAMIONETA	1 persona	13/06/2025
				2 persona	

TOTAL PERSONAL RETIRADO	13

TOTAL DE PERSONAL QUE ESTUVO VINCULADO AL PROYECTO	111

A18
Lista de chequeo mes de junio UAERMV.


BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).". UAERMV CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022	ECOVIAS SAS

FECHA: 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 COMPONENTE SOCIAL

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CALIFICACIÓN
		100%	50%	0,0%	N/A	
1	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal social cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional social asistió a los comités de seguimiento integral y social a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	La entidad ejecutora entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de Gestion Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Plan de Gestión Social						
Programa de atención al Usurario						
1	Instaló el punto de atención al Usurario.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El punto de atención ciudadano funcionó en el horario establecido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El punto de atención al usuario cuenta con dotación mínima requerida.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRSFD .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
5	Realizó el respectivo seguimiento a las PQRSFD abiertas durante el período de evaluación.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
6	Dio respuesta a las PQRSFD de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
7	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRSFD solicitados por la Interventoría.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
8	La entidad ejecutora cumplió con los recorridos programados por frente de obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa de información y participación comunitaria						
1	Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
2	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
3	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
4	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA

5	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
6	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
7	Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
8	Elaboró las actas de gestión adelantada con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
9	La entidad ejecutora cumplió con los compromisos en los tiempos pactados con el ciudadano.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
10	Elaboró las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
11	Entregó las actas de vecindad y compromiso a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
12	El profesional hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actas establecidas contractualmente.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
13	Se entregó copia de las actas de compromiso y de vecindad a la comunidad, si son requeridas por la misma, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
14	El profesional social realizó el acompañamiento durante los registros fílmicos del estado inicial de las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
15	Se entregó el respectivo registro fílmico de las vías a la Interventoría para su revisión y aprobación de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
16	La entidad ejecutora realiza acompañamiento al comité veedor conformado por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
17	La entidad ejecutora convoca y realiza reuniónes de comité veedor, de acuerdo a las solicitudes realizadas por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Programa de Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto						
1	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa del cultura vial						
1	Realiza sensibilización de sostenibilidad y cuidado de la vía con las temáticas y el tiempo establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Mano de obra no calificada						
1	Cumplió con el reporte en el informe mensual de personal de mano de obra no calificada local.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

2	Cumplió con el reporte en el informe mensual población en condición de vulnerable.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	Cumplió con el reporte en el informe mensual la contratación de mujeres en el proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Movilidad						
1	El contratista realiza socialización del PMT.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	NA
Información del proyecto						
1	Elaboró e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	Elaboró y distribuyó los volantes de inicio a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
3	Elaboró y distribuyó los volantes de finalización de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
4	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información de los cierres programados en la via a la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
5	Elaboró y distribuyó los volantes, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
6	Instaló el (los) Punto(s) informativos fijos de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
7	Realizó mantenimiento a (los) punto informativos y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
8	Instaló la (s) valla (s) informativa (s) móviles de acuerdo a los requisitos y tiempos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Reportes						
1	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rual del Sumampaz, la información del plan de gestión social .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	Tiene disponibilidad al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Social	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
5	Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de de la Gestión social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
6	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	100%
TOTAL CALIFICACIÓN						**100%**

OBSERVACIONES	
ELABORÓ	
	Profesional social de Interventoría ECOVIAS SAS
	
	Isabel Bernal Yasso
ACEPTÓ	Profesional social de la UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV)
	
	Rubys Ruiz

A 19
Copia Bitácora Social junio UAERMV.

1/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades en obra.
Isabel Bonal Y.
P. Social Interv.

2/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades en obra
Isabel Bonal Y.
P. Social Interv.

3/06/2025.
Actividad 1: Medida de manejo 1: programa de atención al usuario pgs 6.1-19
TEMA: ATENCION AL USUARIO EN EL TRAMO VIAL SANTO DOMINGO - CAPITOLIO
OBJETIVO: Realizar atención a la comunidad
Metodología: Se Realiza atención en el tramo vial con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, Recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.

04/06/2025
Actividad 1: Medida de Manejo 1: programa de atención al usuario pgs. 6.1.19
TEMA: ATENCION AL USUARIO EN EL TRAMO VIAL EL TOLDO
OBJETIVO: Realizar Atención a la Comunidad
METODOLOGIA: Se Realiza atención en el tramo vial con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.

Isabel Bonal Y. Trabajo Social T.P. 080535212-R

05/06/2025
ACTIVIDAD 1: Medidas de manejo 1 programa de atención al usuario par 6 / 19.
TEMA: ATENCION AL USUARIO EN EL TRAMO VIAL: UNION TUNALES
OBJETIVO: Realizar atención a la comunidad
METODOLOGIA: Se realiza entención en el tramo vial con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobe el progreso de las obras. UMV.

Isabel Bernal Gross
Trabajadora Social
T.P. 0805352121-R
Int Ecuvias

05/06/2025
Actiurda #1 anexos Objetivos contractuales
- TEMA: COMITE INTERVENTORIA - UAERMV - CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL
OBJETIVO: Realizar atención a la comunidad
METODOLOGIA: Se realiza atención en el tramo vial con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir Retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras. UMV.
- OBJETIVOS: pArticipar en el comité liderado por la interventoría
- METODOLOGIA: Se participa de un comite de obra interventoria - UMV - Consorcio estabilitación vial proyectos de regalias Sumapaz, que involucra componentes de SST, tecnico ambiental y social, se revisan los compromisos asumidos para garantitar la alineación de todos los participantes con las tareas asignadas y los platos establecidos. UMV

En este recorrido social se abordan temas claves como la entega oportuna de acopios solicitud de acopios, entrega de cercas en buenos estados.

UMV.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Inter. Ecoles

06/06/2025
Actividad 1: anexos objetivos contractuales
TEMA: COMITE PROYECTO DE REGALIAS
OBJETIVO: participar en el comite de seguimiento semanal Liderado por la UAERMV
METODOLOGIA: se participa de un comite de obras UMV proyecto de regalias Sumapaz, que involucra componentes de SST, administrativo tecnico, ambiental y social se revisan los compromisos asumidos para garantizar la alineación de todos los participantes con las tareas asignadas y los platos establecidos. En esta reunión se abordan temas clave como la entega oportuna de informes semanales, el seguimiento al tiempo de ejecución del proyecto segun el cronograma del SGR.

UMV.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R
Inter. Ecoles

Inventoria
7/06/2025
Actividades Realizadas
No se realizan actividades de obra

Isabel Bernal Y.
P. Social Interv.

8/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra

Isabel Bernal Y.
T. P. 080535212-R
Inter. Ecoles

9/06/2025
Actividades de obra.
Se realiza mesa de trabajo en las instalaciones de la interventoria, con el fin de revisar los formatos Soportes del informe mensual social # 12 mes de mayo.
Asi mismo se revisa las observaciones del Informe # 11 mes de abril el cual presento observaciones.
Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 089535212-D

10/06/2025
Actividades realizadas.
La Profesional Social realiza Sensibilización con la Comunidad, con el fin de brindar información Sobre los horarios de cierre viales que se estaran manejando en el mes de junio del 2025 en el tramo vial de Unión Tunales, de igual manera informa que es prioridad las rutas escolares, Rutas de Salud, rutas de alimentos hasta entrega del Volante Informativo. de Cierres viales.
Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 089535212-D

Interv. Escuelas
11/06/2025
Actividades realizadas
La Profesional Social realizó atención a la Comunidad en el punto móvil del frente de obra de San Antonio El Toldo
La interventoria, el Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz y la entidad ejecutora, participan en la reunión Extraordinaria programada por la comunidad de San Antonio El Toldo, Por cuanto que se encuentran preocupados por el estado actual de

de la vía. La entidad ejecutora atende la solicitud presentada por la Comunidad en se compromete a sacar los fallos que se encuentran en el tramo vial.

Isabel Bernal Hasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

RAFAEL PEÑA

Interv Ecovias

12/06/2025

Actividades realizadas

Tramo vial San Antonio 1

La profesional Social inicia el levantamiento de actas de vecindad realizó registro fotográfico y fílmico donde se puede evidenciar el estado de las cercas y viviendas

Isabel Bernal Hasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

RAFAEL PEÑA

Interv. Ecovias

13/06/2025

La interventoría realizó comité de Seguimiento Social #36, con el fin de realizar Seguimiento al desarrollo del componente Social.

El componente Social realizó acompañamiento y Participó en el comité de Seguimiento integral #47 con el fin de realizar Seguimiento a cada uno de los compromisos adquiridos en cada componente Social, ambiental, técnico y SST.

La profesional Social realiza acompañamiento a la Comunidad de San Antonio El Toldo, con el fin de apoyar en el traslado de la carreta familiar, por cuanto que la vía se encuentra en muy malas condiciones.

Isabel Bernal Hasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

RAFAEL PEÑA

Interv. Ecovias

14/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Rafael Peña.

Inter. Ecovias

15/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Rafael Peña.

Inter. Ecovias.

16/06/2025
Actividades realizadas
La Profesional Social de la entidad ejecutora realiza entrega del informe mensual Social #12 mes de mayo, se encuentra en revisión por parte de interventoría.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Rafael Peña

Inter. Ecovias

17/06/2025
Actividades realizadas
tramo vial Capitulo
La profesional Social realiza atención a la comunidad en el punto móvil, en el fin de atender las inquietudes. no se presentan PQRS
La interventoría realizó revisión del informe #12 el cual presento observaciones.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Rafael Peña

Inter. Ecovias

18/06/2025
Actividades realizadas
La profesional Social participo en la reunión realizada con la directora de la entidad ejecutora, Alcaldía Rural de Sumapaz, interventoría, equipo de obra del proyecto regalías, con el objeto de aclarar dudas e inquietudes relacionadas con la ejecución del proyecto.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

FB

Inter-Ecovias

19/06/2025
Actividades realizadas
El componente Social realizó acompañamiento y participo en el comité de seguimiento integral #48, con el fin de realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en cada componente técnico, ambiental, SST y Social.
La profesional Social realizó atención a la comunidad en el tramo vial de Santo Domingo Capitolio

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Inter Ecovias

20/06/2025
Actividades realizadas
La profesional Social realizó atención a la comunidad en el punto móvil del tramo vial de Unión Tunjos, el cual tiene como fin realizar atención personalizada a la comunidad.
La profesional Social realizó atención a la Comunidad en el punto movil en el tramo vial de San Antonio El Tolda

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Inter. Ecovias

21/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Rafael Peña.

inter Ecovias

22/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Rafael Peña.

inter Ecovias

23/06/2025
Actividades realizadas
No se realizaron actividades de obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Rafael Peña.

inter Ecovias

24/06/2025
Actividades realizadas
La Profesional Social realiza atención al Ciudadano en el tramo vial de San Antonio El Toldo la interventoria realizó recorrido, con el fin de verificar las actividades realizadas por el componente, se evidencia punto móvil afiche informativo y volantes informativos

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Rafael Peña.

inter Ecovias

25/06/2025
Actividades realizadas
La profesional social realizó atención a la Comunidad en el punto móvil en el tramo vial de Santo Domingo Capitulo.

Rafael Peña.

realizo Sensibilizacion a la Comunidad sobre el Cuidado de las Vias, hace entrega de volante donde indica acerca a seguir como no arrojar Sustancias y/o residuos químicos (aceites, Gasolina). Frente de obra Capitello.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R
Interv Ecovias

RAFAEL PEÑA.

26/06/2025.

Actividades realizadas

La interventoria realiza Comité de Seguimiento Social, con el fin de revisar el estado del componente y hacer Seguimiento a los compromisos adquiridos.

La interventoria realiza recorrido en los tramos viales, donde se verifico las actividades del componente, se recepciona inquietudes de la Comunidad de San Antonio El Toldo.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R
Interv Ecovias

RAFAEL PEÑA.

27/06/2025

Actividades realizadas

La profesional Social realiza atención a la Comunidad en el tramo vial de unión Toralbo en la Carpa móvil establecida

El componente Social realizo acompañamiento y participó en el comité de Seguimiento integral #49, con el fin de realizar Seguimiento a las actividades establecidas en los componentes técnicos, Ambiental SST y Social

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

RAFAEL PEÑA.

28/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Rafael Peña

Interv. Ecoulos

29/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Rafael Peña

Interv. Ecoulos

30/06/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Rafael Peña

Interv Ecoulos

1/07/2025
Actividades realizadas.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

A 20
Radicado: 20251920081301
Comunicado 186-1-713 del 24 de junio del 2025

Bogotá D.C.

Ing.
LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal ECOVIAS S.A.S
intersumapaz.ecovias@gmail.com
Ciudad;

REFERENCIA: Proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”, del Sistema General de Regalías -SGR- identificado con código BPIN 2018000050020. (Localidad 20 de Sumapaz)

ASUNTO*:* Respuesta a observaciones realizadas en el oficio 186-1-664 con radicado UAERMV No 20251120077662, respecto al Informe Mensual Social No. 11 V1 – Proyecto: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ – SGR- BPIN 2018000050020” – Localidad 20 de Sumapaz.

Cordial saludo,
En el marco del proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”, del Sistema General de Regalías-SGR, identificado con código BPIN 2018000050020 (Localidad 20 de Sumapaz), la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, en atención al Oficio No. 186-1-664, con radicado UMV 20251120077662, relacionado con el Informe Mensual Social No. 11 V1, mediante el cual se presentaron observaciones, se permite informar que todas y cada una de las mismas fueron debidamente subsanadas.

El informe corregido, junto con los respectivos anexos, ha sido consolidado en un único archivo en formato PDF para su revisión, el cual se adjunta a la presente.

Atentamente,

Anexo: Informe Mensual Social No. 11 V1

Documento 20251920081301 firmado electrónicamente por:	
JULIO CESAR PINZÓN REYES	Subdirector de Intervención de la Infraestructura SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA julio.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 27-06-2025 15:53:10
Revisó:	RAFAEL DARÍO PEÑA FLÓREZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - rafael.pena@umv.gov.co
	RAFAEL DARÍO PEÑA FLÓREZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - rafael.pena@umv.gov.co
Proyectó:	RUBYS DEL CARMEN RUIZ ARRIETA - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - rubys.ruiz@umv.gov.co
7a594063426b924600929bdade281048411ab3862d8c337cdd05bc671aa38786 Codigo de Verificación CV: 353ba Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-713

Bogotá D.C. 24 de junio de 2025.

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: *"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".*

Asunto: *Respuesta al correo electrónico recibido el 14 de junio del 2025 informe mensual social N° 12 mes de mayo del 2025.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV. En atención al radicado de referencia se tiene las siguientes observaciones:

1. Página 2, no se evidencia firma de revisión y aprobación del informe.

2. Página 3, Tabla de contenido, ¡se evidencia que registra "Error! Marcador no definido". Subsanar.

3. Página 6, La lista de tablas relacionado se encuentra mal enumerada. Subsanar

4. Página 9, La lista de anexos relacionado no corresponden a los se encuentran en el texto del informe los cuales enumero a continuación:

   "Anexo 1: Formatos acta de reunión FM-016-V5
   Anexo 2: Formato Acta de reunión control de asistencia externa.
   Anexo 3: INFRA-FM-020-V1 formato entrega de volantes.

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-713

Anexo 4: Formato control de instalación Afiche y/o volante informativo INFRA-FM-022
Anexo 5: Formato control de instalación de afiche y/o volante informativo INFRA-FM-022
Anexo 6: Formato acta de Gestión Adelantada INFRA-FM -021- V1
Anexo 7: Cronograma de actividades mes de mayo año 2025.
ANEXO 8: EXCEL Vinculación mano de obra, listado de personal del proyecto".

5. Página 24, Tabla 5. Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz, y tabla 7 datos de interventoría "Sebastián Saldarriaga" subsanar por cuanto que el nombre del alcalde de Sumapaz es Diego García Bejarano.

6. Página 61, Tabla 14 Sensibilizaciones volantes de horarios de cierres viales en los tramos Unión Tunales, capitolio y El Toldo, se evidencia cortado el encabezado. subsanar.

7. Página 51, Tabla 12. Actas de compromiso El Toldo y Capitolio, se evidencia cortado el encabezado. subsanar.

8. Página 75, Tabla 19. Formato acta gestión adelantada. se evidencia cortado el encabezado. subsanar.

9. Página 81, Tabla 22. Indicadores de cumplimiento vinculación mano de obra. La información. De acuerdo al reporte realizado donde indican que 97 trabajadores contratados entre mano de obra calificada y no calificada, no coincide con el total de personal reportado por el componente SST, se solicita unificar la información de acuerdo con el reporte presentado por el del componente SST.

10. Página 83, Tabla 25. Trazabilidad Informes mensuales, se evidencia cortado el encabezado. Subsanar.

11. Página 83, Tabla 25, realizar trazabilidad del estado del informe mensual social N° 11 mes de abril del 2025, por cuanto este ya fue observado por interventoría y fue entregado por correo nuevamente con observaciones subsanada el 7 de mayo del año en curso

12. Página 85, 88 se evidencian espacios en blanco subsanar.

13. Los anexos, se solicita cargar directamente en PDF y no que sean convertidos en imagen colocados en Word y luego convertidos en PDF teniendo en cuenta que esto hace perder calidad a la imagen lo que no permite ver bien la información.

14. Los separadores de los anexos no concuerdan con los relacionados en el texto del informe.

15. Anexo 8: EXCEL Vinculación mano de obra, listado de personal del proyecto". no se evidencia.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA


Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-713

16. Verificar la numeración y tamaño de la letra de las tablas. Subsanar.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV, allegue a la interventoría lo solicitado en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,



ERMY A. HURTADO
Directora de interventoría.

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

A 21
Actas de comité de seguimiento social junio UAERMV.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Comité de Seguimiento Social #36 - UM.U.				
Fecha:	12/06/2025.	Hora de inicio:	Modalidad:	Presencial	
Lugar:		Hora de finalización:		Virtual	
Dependencia:		Nombre del Responsable:		Telefónica	
				Mixta	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	1005551124.	Rubi del Carmen R.	P. Social	UAERMV.			✓						✓	ribys.ruiz.ecuav-1@tesempresa.com	
CC	52171821	Isabel Bonilla	P. Social	Enlace			✓						✓	isabel.bonilla16@gmail.com	Isabel B.L.

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno; y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser ejercida válidamente a por cuenta ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, esta página web en www.gobiernobogota.gov.co y en teléfono de atención en 3358000. Manifiesta que son los datos proporcionados tiene al derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de esta consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera consiente que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-30062 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en: https://gobiernobogota.gov.co/tramites/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Verificación de Compromisos

1- Respuesta Derecho de petición del Señor Fabio Nelson Pulido empresa OPL

2- Retiro Vibo Señora Nidia Hernández - Pendiente retiro

3- Acta de Compromiso Señora Leidy Penagos, Unión Temales

4- Realizar recorrido conjunto consorcio Estabilización

5- Retiro de material acta de cierre Alberto Cifuentes Unión Temales pendiente.

6. Pago $ 100000 Capitolio - Señor Tautiva

Desarrollo del Comité

→ Programa de atención al ciudadano
a la no se presenta PQRS
se evidencia Complimento en los atenciones a la comunidad en los puntos móviles
Cuentan con Valla informativas, Pasacalles

→ Programa de información y Participación
Puntos Satélites al día con afiches informativos
Valla informativa al día pasacalles

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Entrega de acopios
Actos de cierres
Unión tenales
1 Señora Arnedia → Natural.
2- Yesid. adeuu acopio

Informes mensuales
Informe 11 abril presenta observaciones
Informes semanales
al día.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de informes mensual Sead mes abril	U.M.V	26/06/2025
2	Socialización acta de compromiso	U.M.V	26/06/2025
3	Respeto derecho de petición	U.M.V	26/06/2025

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o pantallazos que generen fotocuadros.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión: Comité de Seguimiento Socal # 37 U.M.V.

Fecha: 26/06/2025

Lugar: Virtual.

Dependencia:

Hora de inicio: _____

Hora de finalización: _____

Nombre del Responsable:

Modalidad: Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1005551124	Lubi del Carmen R.	P-Social	UAERUV			✓						✓	rubysanus@gmail.com	
CE	52321821	Isabel Bernal G.	P-Social	Oficina			✓						✓	161espg4.com	Isabel B.G.

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3358300. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, y solicitar prueba de este consentimiento; a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el envío a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gpa.gobiernobogota.gov.co/documento/sistema-integrado-de-gestion-sig

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Verificación de cumplimiento

1- Respuesta Derecho de petición Señor Fabio Nelson Rubio empresa OPL. pendiente. →

2- Retiro Vibro. Señora Nidia Hernández, la profesional Social informa que continuó la maquinaria el acta de acopio continua Vigente. se realizará un arreglo pro entregando alambre dulce para la cerca mientra se realiza entrega de acopio.

3- Acta de Compromiso Señora Leidy Penagos. pendiente tenales

4- acta con el Señor Alberto Cifuente si se retro el material tenales

Desarrollo del comité

1 → Programa de atención al Ciudadano
La profesional Social. Cumple con la atención al Ciudadano con los puntos móviles en unión tenales, Capitolio y San Antonio el Tolo.

2. Programa de información y Participación
La profesional Social informa que se realizó reunión extraordinaria con la comunidad de San Antonio el manejo de aguas y e iniciar con el arreglo de los 32 Puntos críticos.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Toldo.
Señora Nidia Hernández continuan con el acopio, se realiza un arreglo provisional para la cerca mientras se hace entrega del acopio.
-Continuar con la plantación de árboles en el terreno.
→ Se tiene contemplado abrir un acceso con el señor Torney al final del terreno.

Capitolio.
Atiende a la Comunidad con el Señor Adelino Hero, y Peñalosa
Atento en el punto móvil.
Se actualiza afiche informativo

San Antonio 2
Se realiza un acta de compromiso gurdar hermeta menor y natural.
Se realizo el pago de los $100.000 pesos se levanta acta.
→ Programa de Educación y Capacitación al personal Vinculado al proyecto.
Se realizó Capacitación Sensibilización al personal ex, los temas del componente Social.

Informes
Se encuentra Pendiente el informe del mes de abril por entregar observaciones Subsanadas

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Informe del mes de mayo presento observaciones, Pendiente entrega Informes Semales. al día.

COMPROMISOS D

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega de reporte mensual scad global.	O.M.U	1 de julio/2005
1	Entrega trimestral scad mayo	O.M.U	1 de/07/2005
1	Respuesta derecho de peticion	V.M.U.	1 de/07/2005

NOTA 1: En caso de no asistencia física se puede acceder el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que quieran formalizarse.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

A 22
Correspondencia enviada y recibida.
logrando los objetivos propuestos.

Correspondencia enviada

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-699

Bogotá D.C. 12 de junio del 2025.

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: ***"****PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".*

Asunto: *Respuesta a Radicado: 20251920072261 Fecha: 10-06-2025, recibido el 11 – 06 - 2025. Solicitud entrega de consolidado de actas de reuniones con la comunidad realizadas en el frente de obra de Capitolio.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV. En atención al radicado de referencia se tiene la siguiente observación:

1. No se evidencia en el adjunto el consolidado de las actas de las reuniones realizadas con la comunidad de la vereda de Santo Domingo y Capitolio. Se adjunta pantallazo de información que se evidencia al abrir el link adjunto al comunicado.



ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA


Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-699

Con lo relacionado anteriormente se le solicita a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV, que revisen los documentos adjuntos cuando envíen un comunicado y que se pueda acceder al enlace.

Tendiendo en cuenta los relacionado anteriormente se le solicita a la UAERMV, allegue a la interventoría los anexos del comunicado relacionado en el asunto en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,



ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-722

Bogotá D.C. 25 de junio de 2025.

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: *"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".*

Asunto: *Respuesta al Radicado* 20241920010231 del 31 de enero del 2024, UAERMV.

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV. En atención al radicado de referencia, se da respuesta al comunicado que en el asunto en referencia se relaciona presentados por la UAERMV:

Respuesta a radicado 20241920010231 del 31 de enero del 2024. La interventoría informe que la profesional social del Consorcio Estabilización vial realizó entrega del informe mensual # 13 V 3 - diciembre del 2023, se encuentra revisado y cuenta con el aval por parte de interventoría mediante comunicado 186-1- 477, el 13 de febrero del 2024.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO
Directora Interventoría

Anexos: Comunicado 186-1-477, en dos (2) folios.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 477

Bogotá D.C. 13 de Febrero de 2024.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Bogotá D.C.

Referencia: **"***CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROSGAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020").*

GRUPO 2: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910- K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.").

Asunto: Respuesta a comunicado CEV/22- 286 del 5 de febrero del 2024, Informe mensual Social No 13 – diciembre 2023. V3.

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022, en su Numeral 13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR del ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA, CLÁUSULA 10 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: TÉCNICAS: subnúmerales 1, 8 y 12. Una vez revisada la información concerniente al informe mensual N° 13 V3, correspondiente al mes de diciembre de 2023, se tienen los siguientes comentarios por la interventoría.

Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Social realizados mediante el comunicado 186-1- 458 del 29 de enero de


ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 477

2024, al informe del mes de diciembre del 2023, se da aprobación teniendo en cuenta que cumplen con los requerimientos mínimos del componente.

Atentamente,



ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A.

C.C: José David Donoso Tovar – Apoyo a la supervisión FDRS
Julio Cesar Pinzón Reyes – Gerente de Proyectos – UAERMV

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

Correspondencia recibida

Bogotá D.C. 10 de junio 2025

Ingeniero:
LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal ECOVÍAS S.A.S.
Carrera 45 No. 85-50
Teléfono (605)3576115
intersumapaz.ecovias@gmail.com; temporalsumapaz@gmail.com

Referencia : Proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”, del Sistema General de Regalías -SGR- identificado con código BPIN 2018000050020. (Localidad 20 de Sumapaz)

Asunto: Respuesta radicado UAERMV No 20251120077682- solicitud entrega de consolidado de actas de reuniones con la comunidad realizadas en el frente de obra de Capitolio.

Cordial saludo,

En desarrollo del proyecto “Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá", identificado con código BPIN 2018000050020, y financiado con recursos del Sistema General de Regalías - SGR, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV remite el **consolidado de las actas de reuniones con la comunidad** correspondientes al frente de obra de la vereda Capitolio en atención a la solicitud contenida en el oficio de la referencia, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el recorrido técnico realizado el 10 de abril de 2025.

Cordialmente,

Documento 20251920072261 firmado electrónicamente por:	
JULIO CESAR PINZÓN REYES	Subdirector de Intervención de la Infraestructura SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA julio.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 11-06-2025 16:03:44
Revisó:	GLORIA ROCIO BOTERO SANCHEZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - gloria.botero@umv.gov.co
Proyectó:	RUBYS DEL CARMEN RUIZ ARRIETA - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - rubys.ruiz@umv.gov.co

6e52d38643a7a6f8715633190dc925c5c14e20a1750a7d1b6cbafcd832a3a448
Codigo de Verificación CV: 3696b Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

4.D INFORMES SEMANALES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORIA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (SAN ANTONIO II (K6+910-K0+000), UNIÓN TUNALES Y ANIMAS BAJAS.").	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$12.494.588.139,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$2.498.917.628,00	N/A
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	9/08/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. 94 **DEL** lunes, 2 de junio de 2025 **AL** domingo, 8 de junio de 2025

AVANCES DE OBRA

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO	21,00%	10,81%	-10,19%	
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	Tramo 2 * Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos k0+990 a k1+060. Total 11 módulos. * Se realiza fundida de 13 módulos previamente aprobados por interventoría. Se solicita mayor vibrado de concreto para evitar porosidad y presencia de vacíos k0+915 a K0+970. * Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos k0+990 a k1+060. Total 11 módulos. * Se realiza fundida de 10 módulos previamente aprobados por interventoría. Se solicita mayor vibrado de concreto k0+975 a K1+010 * Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos k1+015 a k1+060. Total 10 módulos. * Se realiza fundida de 10 módulos intermedios previamente aprobados por interventoría. Se solicita mayor vibrado de concreto k0+970 a K1+010 * Se realiza corte de fresado costado izquierdo k1+060 a k1+080 * K1+030 - K1+180 se efectua corte de fresado * K1+030 - K1+190 adecuación de suelo * K0+975 - a K1+115 se funden 10 intermedios y 2 módulos

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	12.494.588.139,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

TRAMO UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 05
1 inspector, 2 auxiliares de tráfico, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto, 1 generador de energía
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 02 de junio de 2025. Clima:
* Festivo
* **Martes 03** de junio de 2025. Clima: Seco
* Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos k0+990 a k1+060. Total 11 módulos.
* Se realiza fundida de 13 módulos previamente aprobados por interventoría. Se solicita mayor vibrado de concreto para evitar porosidad y presencia de vacíos k0+915 a K0+970.
Miércoles 04 de junio 2025. Clima: Seco
* Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos k0+990 a k1+060. Total 11 módulos.
* Se realiza fundida de 10 módulos previamente aprobados por interventoría. Se solicita mayor vibrado de concreto k0+975 a K1+010
Jueves 05 de junio de 2025. Clima: lloviznas 09:00-12:00
* Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos k1+015 a k1+060. Total 10 módulos.
* Se realiza fundida de 10 módulos intermedios previamente aprobados por interventoría. Se solicita mayor vibrado de concreto k0+970 a K1+010
* Se realiza corte de fresado costado izquierdo k1+060 a k1+080.
* **Viernes 06** de junio de 2025. Clima:
* K1+030 - K1+180 se efectua corte de fresado
* K1+030 - K1+190 adecuación de suelo
* K0+975 - K1+115 se funden 10 intermedios y 2 módulos
Sábado 07 de junio de 2025. Clima:
Domingo 08 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - ** Se recomienda compactación de base mejorada con cemento con pisón o rana del K0+970 al K1+030, con el propósito de que no comprometa la instalación de concreto
* Se recomienda hacer aseo y limpieza en áreas donde se ha fundido cunetas con el fin de que ese desperdicio no se sume al desprendimiento del fresado y aumente su abrasión. * No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de recalce de alcantarillas. * Se evidencia porosidad en los hombros costado frontal. Se debe arreglar los costados afectados. * Se realiza piloto cruzando la dosificación de arena-grava en 1 de los hombros de las cunetas para verificar si se mejora la porosidad.(Se maneja 9 de grava x 7 de arena, se cruzan las medidas) ****En K0+073 se evidencia batea. Queda módulo en observación**

TRAMO CAPITOLIO

Personal disponible en tramo 05
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor. 2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 operador minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 05
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor. 2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 operador minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto

Actividades realizadas
Lunes 19 de mayo de 2025. Clima:
*
Martes 20 de mayo de 2025. Clima:
*
Miércoles 21 de mayo de 2025. Clima:
*
Jueves 22 de mayo de 2025. Clima:
*
Viernes 23 de mayo de 2025. Clima:
*.
Sábado 24 de mayo de 2025. Clima:
*
Domingo 25 de mayo de 2025. Clima: Seco

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Tramo de Unión Tunales.
Programa de información y participación comunitaria.
Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)
Programa de información y participación comunitaria.
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacelles, establecidos contractual.
Acta de vecindad:
La profesional social radica 14 actas de vecindad mediante comunicado CEV/22- 409, el 5 de junio del 2025, se encuentra en revisión por parte de interventoría.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento de dos puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Tunal Bajo
Casa de la señora Diana Cifuentes.

Se evidencia que cuanta con afiche informativo, volantes informativos.
Programa Educación y Capacitación al personal
NA
Programa de atención al Usuario.
La profesional social, realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil en el tramo vial de Unión Tunales, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra.
Cuenta con un punto de atención a la comunidad Fijo, el cual está ubicado en la Unión y cuanta con una línea de atención móvil 3204461693, el correo electrónico socialconsorcioev@gmail.com
Quien realiza atención a la comunidad.
A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.

Programa Educación y Capacitación al personal
NA

Programa de atención al Usuario.
La profesional social, realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil en el tramo vial de Unión Tunales, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra.
Cuenta con un punto de atención a la comunidad Fijo, el cual está ubicado en la Unión y cuanta con una línea de atención móvil 3204461693, el correo electrónico socialconsorcioev@gmail.com
Quien realiza atención a la comunidad.
A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

OBSERVACIONES AL CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL
Componente SST 1ra semana de junio 2025:
Observaciones SST Tramo 2 Tunales:
Personal / 06-06-2025
1 inspector
2 auxiliares de tráfico
5 ayudantes
1 oficial
1 operador de minicargador
Maquinaria en obra:
1 Minicargador
1 Mezcladora
1 placa vibratoria
1 vibrador de concreto
1 generador de energía
Observaciones SST
•Se realiza comité integral el 05 de junio 2025
•Dotación en orden
•Se observa 2 varillas en cunetas de tramo 1, pendientes por retirar
•Se observa falta de orden y aseo en zona donde se están fundiendo cunetas
•Dos carpas de resguardo para el personal en la zona.
•PMT en orden
•Se solicitó la contratación de el segundo SST en campo
•Se observa kit de emergencias en orden
•Punto de hidratación en orden
•Punto ecológico en orden
•Se observa gravilla en la vía, lo cual es un riesgo para los motociclistas de la zona
•Se solicitó orden y aseo en acopio de materiales

Observaciones SST Tramo San Antonio:
Personal en obra: 06-06-2025
1 Inspector
1 Topógrafo
1 Cadenero
2 Oficiales
2 Auxiliares de trafico
6 ayudantes
1 conductor camioneta y/o volqueta doble.
1 Operador de Minicargador.
1 Operador de retrocargador

Observaciones SST
•Se evidencia carpa de campamento, con kit de emergencia (botiquín, camilla, kits antiderrames, extintor)
•Dotación de trabajadores en orden
•PMT en orden
•No hay unidades sanitarias en terreno, trabajadores manifiestan que los baños permitidos están muy lejos de la zona donde se realiza trabajos
•Señalización de acopios en orden
•Se realizó la observación de entibar excavación de alcantarillas en San Antonio, además de señalizar la parte superior de las mismas

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1. Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2. Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3. Revisión de informe mensual No 19 V1
4. Participación del comité de seguimiento No 68; donde se realiza seguimiento al componente.
Frente Tunales

-Se evidencian acopios de hierro señalizados
-Tramo 2 km 0+260 residuos de una alcantarilla en predio privado, se solicitó retiro y el consorcio se comprometió retirar dichos materiales para el día 04 de junio y no se ha cumplido, en comité se reprogramo para el día 10 de junio. Es reiterativo
-Km 1+550 acopio de gravilla y arena ocupando parte de la vía, materiales sin cubrir y se requiere mejorar la delimitación, se requiere que estos acopios se ubiquen de tal manera que no obstaculicen la vía, es necesario su adecuación con el fin de cumplir las medidas de manejo ambiental para acopio de materiales.
-En obra se evidencia, kit de emergencias y control de derrames, cartelera informativa
-En obra se evidencio la adecuación del campamento temporal, donde se ubicó punto ecológico.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
Cabe mencionar que algunos acopios se encuentran delimitados y cubiertos, medidas que se deben mantener para todos lo sitios destinados como acopios.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas intervenidas en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
-En recorrido realizado se evidencia que las bolsas de cemento se mantienen acopiadas en bolsas rojas y señalizado el área donde están almacenadas temporalmente.
-PMT correctamente implementado con las señales necesarias y dos auxiliares de tráfico en sitio.
-Se solicito que el material producto de la excavación de la cuneta sea empleado en el lleno de la misma, con el fin de limpiar los terrenos donde han sido depositados.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)





Descripción Foto 1.

Frente Tunales.Se realiza fundida de 13 módulos previamente aprobados por interventoría. Se solicita mayor vibrado de concreto para evitar porosidad y presencia de vacios k0+915 a K0+970.

Descripción Foto 2.

Frente Tunales. Se realiza fundida de 13 módulos previamente aprobados por interventoría. Se solicita mayor vibrado de concreto para evitar porosidad y presencia de vacios k0+915 a K0+970.





Descripción Foto 3.

Frente Tunales: Se realiza fundida de 10 módulos previamente aprobados por interventoría. Se solicita mayor vibrado de concreto k0+975 a K1+010

Descripción Foto 4.

Frente Tunales: Recorrido Conjunto Unión Tunales.





Descripción Foto 5

Frente Tunales. Se solicitó orden y aseo en lugar de trabajo, además de señalización

Descripción Foto 6

Frente Tunales: Acopio con medidas de manejo

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORIA
NO. CONTRATO	479-2022	CIN-161-2022
OBJETO	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (SAN ANTONIO II (K6+910-K0+000), UNIÓN TUNALES Y ANIMAS BAJAS.").	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$12.494.588.139,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$2.498.917.628,00	N/A
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	9/08/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. 95 **DEL** lunes, 9 de junio de 2025 **AL** domingo, 15 de junio de 2025

AVANCES DE OBRA

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO	21,00%	10,81%	-10,19%	K4+928 a K4+908 Alistamiento de 6 módulos intermedios. K1+550 Instalación de concreto IN SITU para zapata de alcantarilla K4+928 a K4+908 Instalación de concreto in situ para 6 módulos intermedios. K4+784 a K4+748 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta. K1+550 Instalación concreto in situ para placa de erosión. K4+772 a K4+749 Instalación de concreto in situ para 6 módulos. K4+740 a K4+716 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta. K1+550 Armado de acero para Aletas y cabezal en Alcantarilla K4+772 a K4+749 Desencofrado de modulos para 6 módulos. K4+650 a K4+605 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta. K1+550 Armado de acero para Aletas y cabezal en Alcantarilla. K4+960 a K4+010 Descarga, acopio y disposición de cemento
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	K1+015 - K1+055 se arman módulos, en total 7 y 3 intermedios * K1+024 - K1+0070 se arman módulos, se funde un total de 13 módulos. * Se armar 3 módulos intermedios y se funden, k1+020 a k1+010. Se realiza la demolición de roca existente sobre perímetro de las cunetas k0+845. * Se evidencia la demolición y recolección de RCD existente sobre tramo 2 k0+235. Alcantarilla. * En el punto K1+070 - K1+125 se arman 18 UND de módulos y se funden. * Se arman 12 módulos intermedios y se funden, k1+025 a k1+050. * Se realiza armado de 8 módulos para vaciado de concreto. K0+090 a k0+130 * Se arman 12 módulos intermedios y se funden, k1+025 a k1+050. * Se realiza el retiro de 12 módulos intermedios de k1+020 a k1+045. * Se realiza la fundida de 14 módulos previamente aprobados por la interventoría. K1+118 a k1+146. * Se realiza alistamiento de 10 módulos intermedios en k1+080 a k1+100.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	12.494.588.139,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

TRAMO UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 05
1 inspector, 2 auxiliares de tráfico, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto, 1 generador de energía
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 09 de junio de 2025. Clima: Lluvia
K1+015 - K1+055 se arman módulos, en total 7 y 3 intermedios
Martes 10 de junio de 2025. Clima:Seco
* K1+024 - K1+0070 se arman módulos, se funde un total de 13 módulos.
* Se armar 3 módulos intermedios y se funden, k1+020 a k1+010.
Miércoles 11 de junio 2025. Clima: Seco
* Se realiza la demolición de roca existente sobre perímetro de las cunetas k0+845.
* Se evidencia la demolición y recolección de RCD existente sobre tramo 2 k0+235. Alcantarilla.
* En el punto K1+070 - K1+125 se arman 18 UND de módulos y se funden.
* Se arman 12 módulos intermedios y se funden, k1+025 a k1+050
Jueves 12 de junio de 2025. Clima: lluvias moderadas 01:00 a 03:30
* Se realiza armado de 8 módulos para vaciado de concreto. K0+090 a k0+130
* Se arman 12 módulos intermedios y se funden, k1+025 a k1+050.
* Se realiza el retiro de 12 módulos intermedios de k1+020 a k1+045.
Viernes 13 de junio de 2025. Clima: lluvias moderadas 09:00 a 11:30 - 02:00 a 04:00.
* Se realiza la fundida de 14 módulos previamente aprobados por la interventoría. K1+118 a k1+146.
* Se realiza alistamiento de 10 módulos intermedios en k1+080 a k1+100.
Sábado 14 de junio de 2025. Clima:

Domingo 15 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - * Se recomienda compactación de base mejorada con cemento con pisón o rana del K1+015 al K1+055, con el propósito de que no comprometa la instalación de concreto..* Se recomienda hacer aseo y limpieza en áreas donde se ha fundido cunetas con el fin de que ese desperdicio no se sume al desprendimiento del fresado y aumente su abrasión. * No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de recalce de alcantarillas. * Se evidencia porosidad en los hombros costado frontal. Se debe arreglar los costados afectados. * En k0+073 se evidencia batea. Queda módulo en observación * Por parte de interventoría NO se autoriza fundida del K1+015 - K1+055 por presentar material saturado
Se solicita al componente social realizar acercamiento con el dueño del predio del k0+840 al k0+860, esto con el fin de realizar la batea de acceso a los predios y completar el tramo en ejecución.. * Se presenta la renuncia de uno de los obreros del tramo. * Se recomienda hacer aseo y limpieza en áreas donde se ha fundido cunetas con el fin de que ese desperdicio no se sume al desprendimiento del fresado y aumente su abrasión. * Se evidencia la llegada del martillo demoledor adaptado al minicargador. * Se recomienda hacer aseo y limpieza en áreas donde se ha fundido cunetas con el fin de que ese desperdicio no se sume al desprendimiento del fresado y aumente su abrasión. * No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de recalce de alcantarillas. * Se solicita al componente social realizar acercamiento con el dueño del predio del k0+840 al k0+860, esto con el fin de realizar la batea de acceso a los predios y completar el tramo en ejecución.

TRAMO CAPITOLIO

Personal disponible en tramo 05
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor. 2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 operador minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 05
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto

Actividades realizadas
Lunes 09 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:30 a 12:00 y 1:00 a 4:00 pm
K4+928 a K4+908 Alistamiento de 6 módulos intermedios.

K1+550 Instalación de concreto IN SITU para zapata de alcantarilla
Martes 10 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:30 a 11:00 y 1:00 a 4:00 pm
K4+928 a K4+908 Instalación de concreto in situ para 6 módulos intermedios.
K4+784 a K4+748 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta.
K1+550 Instalación concreto in situ para placa de erosión.
Miércoles 11 de junio 2025. Clima:
K4+772 a K4+749 Instalación de concreto in situ para 6 módulos.
K4+740 a K4+716 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta.
K1+550 Armado de acero para Aletas y cabezal en Alcantarilla
Jueves 12 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:30 a 11:00 y 1:00 a 4:00 pm
K4+772 a K4+749 Desencofrado de modulos para 6 módulos.
K4+650 a K4+605 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta.
K1+550 Armado de acero para Aletas y cabezal en Alcantarilla.
Viernes 13 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 10:00 a 12:00 y 1:00 a 2:00 pm
K4+960 a K4+010 Descarga, acopio y disposición de cemento
Sábado 14 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO : Aún no se efectúa el entibado de la alcantarilla K1+550 teniendo desprendimiento de material continuamente. En zapata borde derecho el refuerzo queda en contacto con talud. Se evidencia que la tubería de 36" no queda a escuadra del muro cabezal, queda embebida 0,15 m, se pone en consideración del área técnica. Se realiza inspección visual de la instalación de concreto para zapata no se identifica la cinta flexible de PVC para sellar juntas. En observación K4+899 a K4+866 por construcción de alcantarilla en la cual se realiza empozamiento por lo que mientras no se defina su construcción no se fundiran los módulos. Se evidencia infiltración en cuneta de escorrentía en hueco generado por el torton y la varilla de la formaleta. Aún no se efectúa el entibado de la alcantarilla K1+550 teniendo desprendimiento de material continuamente. En zapata borde derecho el refuerzo queda en contacto con talud. Se realiza descarga de cemento en acopio K4+010

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Tramo de Unión Tunales.
Programa de información y participacion comunitaria.
Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa).

Programa de información y participación comunitaria.
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual. La interventoría solicita se realice mantenimiento, par evitar deterioro.
Acta de vecindad:
La profesional social radica 14 actas de vecindad mediante comunicado CEV/22- 409, el 5 de junio del 2025, se encuentra en revisión por parte de interventoría, estas son revisada y aprobadas por la interventoría.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento de dos puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Tunal Bajo
Casa de la señora Diana Cifuentes.
Se evidencia que cuanta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento.
Programa Educacion y Capacitacion al personal
NA

Programa de atencion al Usuario.
La profesional social, realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil en el tramo vial de Unión Tunales, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra.
Cuenta con un punto de atención a la comunidad Fijo, el cual está ubicado en la Unión y cuanta con una línea de atención móvil 3204461693, el correo electrónico socialconsorcioev@gmail.com
Quien realiza atención a la comunidad.
A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.

•Tramo de San Antonio El Toldo.
Programa de información y participacion comunitaria.
•Puntos satélites
El contratista realizó la instalación de dos puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa del señor Luis Bustos
Colegio del Toldo.

Se evidencia que cuanta con afiche informativo, volantes informativos.
•Vallas informativas
El contratista cuenta con la instalación de dos vallas móviles establecidas contractualmente.
Programa Educacion y Capacitacion al personal
NA
2Vinculación de personal mano de obra.

El Consorcio Estabilización vial cuenta en total con:
Con 31 trabajadores de los cuales 9 son MOC profesionales, 10 son operarios MOC teniendo 19 trabajadores de Mano de obra calificada, Mano de obra no calificada 12 de los cuales 7 pertenecen a la localidad. corresponde al 58,33 %
Cuenta con 6 mujeres cumpliendo con un 19,35 %,
La interventoría evidencia que no se realiza cumplimiento con el porcentaje indicado en el contrato el cual establece un 75%, de mano de obra no calificada, solicita realizare

3.RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV- CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL.
La interventoría participó en el recorrido realizado conjuntamente en el tramo vial de San Antonio El Toldo y Unión Tunales, con el objetivo de revisar el estado del componte social.

4.COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
El componente social participa de un comité de obra interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 68 el 13 de junio del 2025, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social. con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

5COMITÉ DE SEGUIMIENTO SOCIAL

La intervenía realiza comité se seguimiento social, con el fin de revisar los compromisos generados para el componente.

6Informes
El consorcio realiza entrega del informe mensual social del mes de mayo del 2025, se encuentra en revisión por parte de interventoría, es radicado por correo electrónico.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Observaciones SST Tramo 2 Tunales:
Personal / 13-06-2025
1 inspector, 2 auxiliares de tráfico, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador
Maquinaria en obra:
1 Minicargador
1 Mezcladora
1 placa vibratoria
1 vibrador de concreto
1 generador de energía
Observaciones SST
•Se realiza comité integral el 05 de junio 2025
•Botación en orden
•Se solicita orden y aseo en tramo de fundida en cuneta y campamento
•Se observa 2 varillas en cunetas de tramo 1, pendientes por retirar
•Dos carpas de resguardo para el personal en la zona.
•PMT en orden
•Se solicitó la contratación de el segundo SST en campo
•Se observa kit de emergencias en orden
•Punto de hidratación sin agua
•Punto ecológico en orden
•Se observa gravilla en la vía, lo cual es un riesgo para los motociclistas de la zona
•Se solicitó orden y aseo en acopio de materiales
•Se realizó observación de prohibir el traslado de personal en el platón de la camioneta
Observaciones SST Tramo San Antonio:
Personal en obra: 12-06-2025
1 Inspector. 1 Topógrafo. 1 Cadenero. 2 Oficiales. 6 ayudantes. 1 conductor camioneta y/o volqueta doble.
1 Operador de Minicargador.
1 Operador de retrocargador.

Maquinaria y equipos en obra:
1 Retrocargador
1 Minicargador

1 Mezcladora
1 Cortadora
1 Apisonador
1 placa vibratoria
1 Generador eléctrico
1 Vibrador de concreto
1 Volqueta doble

Observaciones SST
•Se evidencia carpa de campamento, con kit de emergencia (botiquín, camilla, kits antiderrames, extintor)
•Trabajadores de construcción de alcantarillas no portan el overol estipulado por la alcaldía
•PMT, no hay auxiliares de tráfico 11-06-2025 (motivo: renuncia)
•No hay unidades sanitarias en terreno, trabajadores manifiestan que los baños permitidos están muy lejos de la zona donde se realiza trabajos
•Señalización de acopios en orden
•No hay hidratación en obra
•Se realizó la observación de entibar excavación de alcantarillas en San Antonio, además de señalizar la parte superior de las mismas

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1. Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2. Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3. Envio de observaciones al informe mensual No 19 V1
4. Participación del comité de seguimiento No 69; donde se realiza seguimiento al componente.

Frente Tunales

-Se evidencian acopios de hierro señalizados
-Tramo 2 km 0+260 residuos de una alcantarilla en predio privado, se evidencio demolición y retiro d ellos RCD
-Km 1+550 acopio de gravilla y arena ocupando parte de la via, materiales cubiertos y se requiere mejorar la delimitación, se requiere que estos acopios se ubiquen de tal manera que no obstaculicen la via, es necesario su adecuación con el fin de cumplir las medidas de manejo ambiental para acopio de materiales.
-En obra se evidencia, kit de emergencias y control de derrames, cartelera.
-En obra se evidencio la adecuación del campamento temporal, donde se ubicó punto ecológico.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
Cabe mencionar que algunos acopios se encuentran delimitados y cubiertos, medidas que se deben mantener para todos lo sitios destinados como acopios.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas intervenidas en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
-En recorrido realizado se evidencia que las bolsas de cemento se mantienen acopiadas en bolsas rojas y señalizado el área donde están almacenadas temporalmente.
-PMT correctamente implementado con las señales necesarias y dos auxiliares de tráfico en sitio.
-Se solicito que el material producto de la excavación de la cuneta sea empleado en el lleno de la misma, con el fin de limpiar los terrenos donde han sido depositados.
Frente San Antonio

-El campamento fue reubicado, de acuerdo a los adelantos en obra, por lo cual se solicitó dejar en adecuadas condiciones el área donde se encontraba el campamento anterior, retirar la arena de rio que se conformó en sitio, gravilla y concreto dejado en el área. Reiterativo
-Km 4+740 se solicitó adecuar este acopio, cubrir y colocar contención en la parte posterior para evitar el aporte de materiales al cauce. Reiterativo
-Se requiere que todos los acopios de hierro y tubería se mantengan delimitados. En el periodo se identificó acopios señalizados.
-Se solicito mantener punto ecológico organizado y colocar la tapa blanca a la caneca.
-Se requiere mantener medidas de manejo de acopios de pétreos en el periodo se evidencio acopio en el km 2+600 sin medidas.
-En obra se evidencia kit control de derrames, kit de emergencias y cartelera implementada
-En lo corrido de la semana se evidencia una carpa con punto ecológico al cual se solicito en el periodo adecuación.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas intervenidas en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.
Frente Tunales. Se realiza la fundida de 14 módulos previamente aprobados por la interventoría. K1+118 a k1+146.



Descripción Foto 2.
Frente Tunales. Se realiza la fundida de 14 módulos previamente aprobados por la interventoría. K1+118 a k1+146.



Descripción Foto 3.
Tramo San Antonio Instalación concreto in situ para placa de erosión.



Descripción Foto 4.
Tramo San Antonio. Instalación concreto in situ para placa de erosión.



Descripción Foto 5
Tramo San Antonio. Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta.
K5+900



Descripción Foto 6
Tramo San Antonio. Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta.
K4+900



Descripción Foto 7

Comité de seguimiento integral # 68



Descripción Foto 8

verificación mantenimiento de puntos móvil de atención a la comunidad San Antonio El Toldo



Descripción Foto 9

Frente Tunales. Se solicitó orden y aseo en lugar de trabajo



Descripción Foto 10

Frente Tunales. No se evidencia hidratación en obra



Descripción Foto 11

Frente Tunales. Bolsas de cemento dispuestas en bolsa roja



Descripción Foto 12

Frente Tunales. Punto ecológico en sitio

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORIA
NO. CONTRATO	479-2022	CIN-161-2022
OBJETO	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (SAN ANTONIO II (K6+910-K0+000), UNIÓN TUNALES Y ANIMAS BAJAS.").	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$12.494.588.139,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$2.498.917.628,00	N/A
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	9/08/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. 96 **DEL** lunes, 16 de junio de 2025 **AL** domingo, 22 de junio de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO	21,00%	10,81%	-10,19%	* K4+783 a K4+771 Alistamiento y encofrado de módulos. * K4+757 a K4+753 Alistamiento y encofrado de módulos. * K2+241 Retiro de material desprendido de talud, aseo y limpieza de encole. * K2+150 Retiro de material desprendido de talud, aseo y limpieza de encole K4+631 a K4+592 Instalación de concreto In Situ en 10 módulos de cuneta. K1+550 Instalación de formaleta K4+778 a K4+770 Instalación de concreto In Situ en 3 módulos de cuneta. K4+758 a K4+752 Instalación de concreto In Situ en 2 módulos de cuneta. K4+900 a K4+874 Instalación de concreto In Situ en 7 módulos de cuneta. K4+648 a K4+644 Instalación de concreto In Situ en 2 módulos de cuneta. K1+550 Empalme de niple 36" a tubería novafort instalada. K4+743 a K4+675 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en 15 módulos de cuneta. K1+550 Entrega de formaletas plomos y recubrimiento de aceros. K2+231 Desarme de canastilla para encole K2+831 Excavación de encole por desprendimiento de talud. K2+239 Armado acero de refuerzo. Izaje de Acero de refuerzo. K1+550 Instalación de concreto In situ para Aletas y cabezal en estructura de descole.
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	* Se realiza el alistamiento (nivelación y compactación), de 3 módulos previamente aprobados por la interventoría. K1+160 a k1+145. * Se realiza alistamiento de 12 módulos intermedios en k1+035 a k1+090. * Se realiza la fundida de 3 módulos previamente aprobados por la interventoría. K1+160 a k1+145. * Se realiza la fundida de 12 módulos intermedios en k1+035 a k1+090. * Se realiza alistamiento y nivelación de terreno para instalación de módulos k1+190 a k1+220. * Se realiza desencofrado de 3 módulos previamente fundidos. K1+160 a k1+145. * Se retiran formaletas de 12 módulos intermedios en k1+035 a k1+090. * Se realiza alistamiento y nivelación de terreno para instalación de módulos intermedios k1+090 a k1+130. * Se realiza fundida de 4 módulos previamente aprobados por la interventoría . K1+148 a k1+122. * Se realiza la fundida de 9 módulos intermedios en k1+035 a k1+090. * Se realiza alistamiento y nivelación de terreno para instalación de módulos intermedios k1+149 a k1+155. * Se realiza alistamiento y encofrado de 4 módulos previamente aprobados por la interventoría . K1+175 a k1+190. * Se realiza alistamiento y encofrado de 10 módulos intermedios en k1+120 a k1+165. * Se realiza alistamiento y nivelación de terreno para instalación de módulos intermedios k1+190 a k1+200.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	12.494.588.139,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

TRAMO UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 05
1 inspector, 2 auxiliares de tráfico, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto, 1 generador de energía
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 16 de junio de 2025. Clima: Lluvia 11:30 - 02:00
* Se realiza el alistamiento (nivelación y compactación), de 3 módulos previamente aprobados por la interventoría. K1+160 a k1+145.
* Se realiza alistamiento de 12 módulos intermedios en k1+035 a k1+090.
Martes 17 de junio de 2025. Clima: Lluvia 01:30 - 03:00.
* Se realiza la fundida de 3 módulos previamente aprobados por la interventoría. K1+160 a k1+145.
* Se realiza la fundida de 12 módulos intermedios en k1+035 a k1+090.
* Se realiza alistamiento y nivelación de terreno para instalación de módulos k1+190 a k1+220.
Miércoles 18 de junio 2025. Clima:
* Se realiza desencofrado de 3 módulos previamente fundidos. K1+160 a k1+145.
* Se retiran formaletas de 12 módulos intermedios en k1+035 a k1+090.
* Se realiza alistamiento y nivelación de terreno para instalación de módulos intermedios k1+090 a k1+130.
Jueves 19 de junio de 2025. Clima: seco
* Se realiza fundida de 4 módulos previamente aprobados por la interventoría . K1+148 a k1+122.
* Se realiza la fundida de 9 módulos intermedios en k1+035 a k1+090.
* Se realiza alistamiento y nivelación de terreno para instalación de módulos intermedios k1+149 a k1+155.
Viernes 20 de junio de 2025. Clima: Seco
* Se realiza alistamiento y encofrado de 4 módulos previamente aprobados por la interventoría . K1+175 a k1+190.
* Se realiza alistamiento y encofrado de 10 módulos intermedios en k1+120 a k1+165.
* Se realiza alistamiento y nivelación de terreno para instalación de módulos intermedios k1+190 a k1+200.
Sábado 21 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - ** Se recomienda hacer aseo y limpieza en áreas donde se ha fundido cunetas con el fin de que ese desperdicio no se sume al desprendimiento del fresado y aumente su abrasión. * No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de recalce de alcantarillas. * Se solicita al componente social realizar acercamiento con el dueño del predio del k0+840 al k0+860, esto con el fin de realizar la batea de acceso a los predios y completar el tramo en ejecución.

TRAMO CAPITOLIO

Personal disponible en tramo 05
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor, 2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 operador minicargador

Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor. 2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 operador minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto

Actividades realizadas
Lunes 16 de junio de 2025. Clima:

Martes 17 de junio de 2025. Clima:

Miércoles 18 de junio 2025. Clima:
*
Jueves 19 de junio de 2025. Clima:

Viernes 20 de junio de 2025. Clima:

Sábado 21 de junio de 2025. Clima:

Domingo 22 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO:

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 05
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto

Actividades realizadas
Lunes 16 de junio de 2025. Clima: Lluvia Moderada 10:00 a 12:00am y 1:00 a 3:00 pm
K4+783 a K4+771 Alistamiento y encofrado de módulos.
K4+757 a K4+753 Alistamiento y encofrado de módulos.
K2+241 Retiro de material desprendido de talud, aseo y limpieza de encole.
K2+150 Retiro de material desprendido de talud, aseo y limpieza de encole
Martes 17 de junio de 2025. Clima: Lluvia Moderada 10:00 a 11:00am
K4+778 a K4+770 Instalación de concreto In Situ en 3 módulos de cuneta.
K4+758 a K4+752 Instalación de concreto In Situ en 2 módulos de cuneta.
K4+900 a K4+874 Instalación de concreto In Situ en 7 módulos de cuneta.
K4+648 a K4+644 Instalación de concreto In Situ en 2 módulos de cuneta.
K1+550 Empalme de niple 36" a tubería novafort instalada.
Miércoles 18 de junio 2025. Clima: Lluvia Moderada 8:30 a 9:30am
K4+631 a K4+592 Instalación de concreto In Situ en 10 módulos de cuneta.
K1+550 Instalación de formaleta
Jueves 19 de junio de 2025. Clima: seco
K4+743 a K4+675 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en 15 módulos de cuneta.
K1+550 Entrega de formaletas plomos y recubrimiento de aceros.
K2+231 Desarme de canastilla para encole
Viernes 20 de junio de 2025. Clima: seco
K2+831 Excavación de encole por desprendimiento de talud.
K2+239 Armado acero de refuerzo. Izaje de Acero de refuerzo.
K1+550 Instalación de concreto In situ para Aletas y cabezal en estructura de descole.
Sábado 21 de junio de 2025. Clima:

Domingo 22 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO : Se solicita al contratista realizar la intervención de encole en abscisa . Se evidencia que empalme de tubería 36" se corta para empalmar el niple con tubería instalada, se responsabiliza al contratista de infiltraciones a la estructura, aún cuando se empleé cinta PVC para asello de juntas. Entre abscisas K4+874 y K4+900 en observación debido a suspensión de alcantarilla y verificación por topografía de pendientes, el contratista inicia instalación sin la verificación por topografía, se deja en consideración pues si el área presenta empozamientos sería debido a las decisiones de instalación y las apreciaciones constructivas. Se evidencian restos de concreto en vía se solicita la limpieza del mismo. En área de mezclado se aprecia material contaminado y saturado. Se recibe acero a conformidad según diseños. **Recorrido con Topografía CEV- UMV- ECOVIAS** Se autoriza reducción de carril de 0,60 m en abscisas K3+090 a K3+000 con ampliación progresiva en abscisas K3+000 a K2+923 para recuperación de ancho de calzado 4,60 m se verifica la reducción en campo y la ampliación progresiva, se pone en consideración escalar la modificación de coordenadas al coordinador de topografía UMV para modificación en el alineamiento de vía.
Recorrido CEV y ECOVIAS En área en observación K4+900 a K4+808 por verificación de pendiente con Topografía se establece que en recorrido previo se suspende alcantarilla K4+866 debido a corte de talud que compromete la estabilidad del terreno, de esta forma y mediante perfil del terreno la topografía de CEV identifica pendiente de 0,008% en fresado instalado, se acuerda generar una sola pendiente entre abscisas mencionadas de por lo menos 0,01% que drene las aguas de escorrentía. **Ingresa unidad de ejecución para la construcción de encoles. Se evidencia solado de concreto de baja densidad en encole K2+231 el cual presenta material orgánico se requiera la limpieza y acondicionamiento del mismo.
Se pone en consideración del área SST el desarrollo de actividades en encoles y descoles los cuales debido al invierno desprenden material continuamente, se pone en conocimiento del contratista de manera reiterativa el apuntalamiento de las áreas intervenidas para salvaguardar la integridad del personal. Se evidencia empleo

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Tramo de Unión Tunales.

Programa de información y participación comunitaria.
Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto de atención móvil (carpa).

Programa de información y participación comunitaria.

•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual. La interventoría solicita se realice mantenimiento, para evitar deterioro.
•Puntos satélites

El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Tunal Bajo
Casa de la señora Diana Cifuentes.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento.

•Acta de compromiso

El contratista, realizo un acta compromiso con el encargado del predio ubicado en la abscisa k1+860,
con el objetivo de indicarle acerca de cómo va a quedar la entrada al predio.

Programa Educacion y Capacitacion al personal
NA

Programa de atencion al Usuario.
La profesional social, realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil en el tramo vial de Unión Tunales, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra.
Cuenta con un punto de atención a la comunidad Fijo, el cual está ubicado en la Unión y cuanta con una línea de atención móvil 3204461693, el correo electrónico socialconsorcioev@gmail.com
Quien realiza atención a la comunidad.
A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Observaciones SST
•Botación en orden
•Se solicita orden y aseo en tramo de fundida en cuneta y campamento
•Se observa varillas en en vía, se solicitó ubicar estas en lugares adecuados
•Dos carpas de resguardo para el personal en la zona.
•PMT en orden
•Se solicitó la contratación del segundo SST en campo
•Se observa kit de emergencias en orden
•Punto de hidratación sin agua
•Punto ecológico en orden
•Se solicitó orden y aseo en acopio de materiales
Personal / 17-06-2025
1 inspector
2 auxiliares de tráfico
4 ayudantes
1 oficial
1 operador de minicargador
Maquinaria en obra:
1 Minicargador
1 Mezcladora
1 placa vibratoria
1 vibrador de concreto
1 generador de energía

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión de informe semanal entregado por el contratista
4.Revisión del informe No 19 V02 aval del mismo
5.Revisión del informe No 15 V02 aval del mismo
6.Participación del comité de seguimiento No 70; donde se realiza seguimiento al componente.

Frente Tunales

-Se evidencian acopios de hierro señalizados
-Tramo 2 km 1+130 se implementó un acopio de RCD (producto de cortes y excavación de cunetas), requiere adecuación y retiro de RCD que cayo al cuerpo de agua, implementar medidas de manejo para acopios se recuerda que estos deben cumplir con las distancias descritas en la ficha PAGA respectiva.
-Km 1+550 acopio de gravilla y arena ocupando parte de la vía, materiales cubiertos y se requiere mejorar la delimitación, se requiere que estos acopios se ubiquen de tal manera que no obstaculicen la vía, es necesario su adecuación con el fin de cumplir las medidas de manejo ambiental para acopio de materiales.
-En obra se evidencia, kit de emergencias y control de derrames, cartelera.
-En obra se evidencio la adecuación del campamento temporal, donde se ubicó punto ecológico.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
Cabe mencionar que algunos acopios se encuentran delimitados y cubiertos, medidas que se deben mantener para todos los sitios destinados como acopios.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas pertinentes para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS)

necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas intervenidas en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
-En recorrido realizado se evidencia que las bolsas de cemento se mantienen acopiadas en bolsas rojas y señalizado el área donde están almacenadas temporalmente.
-PMT correctamente implementado con las señales necesarias y dos auxiliares de tráfico en sitio.
-Se solicito que el material producto de la excavación de la cuneta sea empleado en el lleno de la misma, con el fin de limpiar los terrenos donde han sido depositados.
Frente San Antonio

-Se solicito almacenar de manera correcta las bolsas de cemento
-Se solicito que los residuos sobrantes de las fundidas sean dispuestos de manera correcta como RCD y no en zonas verdes o alcantarillas del sector.
-Se solicito cubrir acopio de RCD ubicados al lado de la carpa
-Se sugirió al contratista limpiar la via posterior a las fundidas de concreto ya que el minicargador genera caída de material en el transporte del mismo.
-Se solicito clausurar el acopio de RCD ubicado en el K 5+270 y dejar el área correctamente conformada
-El campamento fue reubicado, de acuerdo a los adelantos en obra, por lo cual se solicitó dejar en adecuadas condiciones el área donde se encontraba el campamento anterior, retirar la arena de rio que se conformó en sitio, gravilla y concreto dejado en el área. Reiterativo
-En km 4+740 se solicitó adecuar este acopio, cubrir y colocar contención en la parte posterior para evitar el aporte de materiales al cauce. Reiterativo
-Se requiere que todos los acopios de hierro y tubería se mantengan delimitados. En el periodo se identificó acopios señalizados.
-Se solicito mantener punto ecológico organizado y colocar la tapa blanca a la caneca.
-Se requiere mantener medidas de manejo de acopios de pétreos en el periodo se evidencio acopio en el km 2+600 sin medidas.
-En obra se evidencia kit control de derrames, kit de emergencias y cartelera implementada
-En lo corrido de la semana se evidencia una carpa con punto ecológico al cual se solicitó en el periodo adecuación.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas intervenidas en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se solicito no depositar residuos de excavación sobre las zonas verdes donde se encuentra vegetación nativa del páramo.
-Se solicito evacuar el RCD que se encuentra frente a la carpa.
-Se solicito que el material producto de la excavación de la cuneta sea empleado en el lleno de la misma, con el fin de limpiar los terrenos donde han sido depositados.
-PMT correctamente implementado con las señales necesarias cabe mencionar que no contaron con auxiliares de tráfico en el periodo.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

Componente Técnico



Descripción Foto 1.

Tunales. Se realiza fundida de 4 módulos previamente aprobados por la interventoría . K1+148 a k1+122.



Descripción Foto 2.

Frente Tunales. Se realiza alistamiento y nivelación de terreno para instalación de módulos intermedios k1+149 a k1+155



Descripción Foto 3.

Tunales. Se realiza fundida de 4 módulos previamente aprobados por la interventoría . K1+148 a k1+122.



Descripción Foto 4.

Frente San Antonio. K1+550 Armado acero de refuerzo. Izaje de Acero de refuerzo



Descripción Foto 5

San Antonio. K2+239 Armado acero de refuerzo. Izaje de Acero de refuerzo



Descripción Foto 6

Frente San Antonio. Se evidencia que empalme de tubería 36" se corta para empalmar el niple con tubería instalada

Componente SST



Descripción Foto 7

Frente Tunales. Se solicitó orden y aseo en lugar de trabajo



Descripción Foto 8

Frente Tunales. Se observa señalización caída en obra

Componente Social







Descripción Foto 9

Llevantamiento acta de compromiso Unión Tunales.



Descripción Foto 10

Comité de seguimiento integral

Componente Ambiental



Descripción Foto 11

Frente San Antonio. Acopio que requiere adecuación



Descripción Foto 12

Frente San Antonio. Acopio que requiere clausura

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORIA
NO. CONTRATO	479-2022	CIN-161-2022
OBJETO	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (SAN ANTONIO II (K6+910-K0+000), UNIÓN TUNALES Y ANIMAS BAJAS.").	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$12.494.588.139,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$2.498.917.628,00	N/A
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	9/08/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. 97 **DEL** lunes, 23 de junio de 2025 **AL** domingo, 29 de junio de 2025

AVANCES DE OBRA

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO TRAMO 1				
TRAMO SAN ANTONIO TRAMO 2	21,00%	10,81%	-10,19%	K4+634 a K4+592 Instalación de concreto in Situ para 9 módulos de cuneta. K4+741 a K4+677 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en berma-cuneta. K1+550 Revoque de porosidad en alcantarilla. K4+644 a K4+638 Instalación de concreto in Situ para 2 módulos de cuneta. K4+884 a K4+898 Instalación de concreto in Situ para 4 módulos de cuneta. K4+722 a K4+741 Instalación de concreto in Situ para 5 módulos de cuneta. K4+679 a K4+681 Instalación de concreto in Situ para 1 módulo de cuneta. K2+150 Reparación tabla-estacado y desarme de acero. K1+550 Revoque de porosidad en alcantarilla K4+860 a K4+815 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en berma cuneta K2+150 Amado de acero en encole. K1+550 Revoque de porosidad en alcantarilla. K0+020 Figurado de acero para encoles.
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	TRAMO 2 * Se realiza fundida de 2 módulos previamente aprobados por la interventoría . K1+170 a k1+176. * Se realiza fundida de 8 módulos intermedios aprobados por interventoría en k1+125 a k1+150. * Se realiza alistamiento y nivelación de terreno para instalación de módulos intermedios k1+200 a k1+210. * Se realiza fundida de 1 módulo en aproximación a estructura de encole. Este módulo fue previamente aprobado por la interventoría . K0+730. * Se realiza fundida de 3 módulos intermedios aprobados por interventoría en k0+707 a k0+715. * Se realiza la modulación, encofrado y fundida de 5 módulos de la entrada al predio del k0+870 a k0+850. El dueño solicita mayor longitud en la medida de acceso vehicular * Se realiza fundida de 3 módulos intermedios.Estos módulos fueron previamente aprobados por la interventoría . K1+150 a k1+168. * Se realiza fundida de 7 módulos intermedios aprobados por interventoría en k1+175 a k1+195. * Se realiza el alistamiento y nivelación del área para los módulos de las cunetas. Esta actividad se realizó entre k1+190 a k1+220. * Se realiza fundida de 4 módulos intermedios en ingreso a finca.Estos módulos fueron previamente aprobados por la interventoría . K0+845 a k0+870. * Se realiza el desencofrado de 2 módulos intermedios en k1+170 a k1+198. * Se realiza el alistamiento y nivelación del área para los módulos de las cunetas. Esta actividad se realizó entre k1+178 a k1+198. Se arma un total de 7 módulos.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	12.494.588.139,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

TRAMO UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 05
1 inspector, 2 auxiliares de tráfico, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto, 1 generador de energía
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 23 de junio de 2025. Clima:
FESTIVO
Martes 24 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 02:00-04:00
* Se realiza fundida de 2 módulos previamente aprobados por la interventoría . K1+170 a k1+176.
* Se realiza fundida de 8 módulos intermedios aprobados por interventoría en k1+125 a k1+150.
* Se realiza alistamiento y nivelación de terreno para instalación de módulos intermedios k1+200 a k1+210.
Miércoles 25 de junio 2025. Clima: soleado
* Se realiza fundida de 1 módulo en aproximación a estructura de encole. Este módulo fue previamente aprobado por la interventoría . K0+730.
* Se realiza fundida de 3 módulos intermedios aprobados por interventoría en k0+707 a k0+715.
* Se realiza la modulación, encofrado y fundida de 5 módulos de la entrada al predio del k0+870 a k0+850. El dueño solicita mayor longitud en la medida de acceso vehicular
Jueves 26 de junio de 2025. Clima: soleado
* Se realiza fundida de 3 módulos intermedios.Estos módulos fueron previamente aprobados por la interventoría . K1+150 a k1+168.
* Se realiza fundida de 7 módulos intermedios aprobados por interventoría en k1+175 a k1+195.
* Se realiza el alistamiento y nivelación del área para los módulos de las cunetas. Esta actividad se realizó entre k1+190 a k1+220.
Viernes 27 de junio de 2025. Clima: llovizinas 07:00-13:00.
* Se realiza fundida de 4 módulos intermedios en ingreso a finca.Estos módulos fueron previamente aprobados por la interventoría . K0+845 a k0+870.
* Se realiza el desencofrado de 2 módulos intermedios en k1+170 a k1+198.
* Se realiza el alistamiento y nivelación del área para los módulos de las cunetas. Esta actividad se realizó entre k1+178 a k1+198. Se arma un total de 7 módulos.
Sábado 28 de junio de 2025. Clima:

Domingo 29 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - ** * Se recomienda hacer aseo y limpieza en áreas donde se ha fundido cunetas con el fin de que ese desperdicio no se sume al desprendimiento del fresado y aumente su abrasión. * No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de recalce de alcantarillas. * El componente social realiza acercamiento con el dueño del predio del k0+840 al k0+860, esto con el fin de realizar la batea de acceso, sin embargo el dueño manifiesta que tan solo 4 metros de ingreso no garantiza el poder ingresar o dar vuelta a camiones, busetas y maquinaria que hace mantenimiento. No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de recalce de alcantarillas.*** Se evidencia que se está creando una junta fría a raíz de la dinámica de la fundida de los módulos. Se realiza fundida del paño de la cuneta y a la hora de funde el hombro de la misma. Se recomienda más celeridad y mayor vibrado para evitar que se realicen juntas.

TRAMO CAPITOLIO

Personal disponible en tramo 05

Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor, 2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 operador minicargador

Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor. 2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 operador minicargador

Actividades realizadas
Lunes 23 de junio de 2025. Clima:

Martes 24 de junio de 2025. Clima:

Miércoles 25 de junio 2025. Clima:

Jueves 26 de junio de 2025. Clima:

Viernes 27 de junio de 2025. Clima:

Sábado 28 de junio de 2025. Clima:

Domingo 29 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO:

TRAMO SAN ANTONIO 1.
Personal disponible en tramo 05 1
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor. 2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 operador minicargador

Actividades realizadas
Lunes 23 de junio de 2025. Clima:
FESTIVO
Martes 24 de junio de 2025. Clima:

Miércoles 25 de junio 2025. Clima:

Jueves 26 de junio de 2025. Clima:

Viernes 27 de junio de 2025. Clima:

Sábado 28 de junio de 2025. Clima:

Domingo 29 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 1

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 05
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto

Actividades realizadas
Lunes 23 de junio de 2025. Clima:
FESTIVO
Martes 24 de junio de 2025. Clima: Lluvia Moderada 9:00 a 12:00 am
K4+634 a K4+592 Instalación de concreto in Situ para 9 módulos de cuneta.
K4+741 a K4+677 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en berma-cuneta.
K1+550 Revoque de porosidad en alcantarilla.
Miércoles 25 de junio 2025. Clima:
K4+644 a K4+638 Instalación de concreto in Situ para 2 módulos de cuneta.
K4+884 a K4+898 Instalación de concreto in Situ para 4 módulos de cuneta.
K4+722 a K4+741 Instalación de concreto in Situ para 5 módulos de cuneta.
K4+679 a K4+681 Instalación de concreto in Situ para 1 módulo de cuneta.
K2+150 Reparación tabla-estacado y desarme de acero.
K1+550 Revoque de porosidad en alcantarilla
Jueves 26 de junio de 2025. Clima: seco
K4+860 a K4+815 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en berma cuneta
K2+150 Amado de acero en encole.
K1+550 Revoque de porosidad en alcantarilla.
K0+020 Figurado de acero para encoles.
Viernes 27 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 7:00 a 8:00
K4+840 a K4+855 Instalación de concreto In Situ para 4 módulos de cuneta.
K4+721 a K4+684 Instalación de concreto In Situ para 10 módulos de cuneta.
K2+150 Instalación de concreto in Situ para base de estructura de encole.
K0+020 Figurado de acero para encoles.
Sábado 28 de junio de 2025. Clima:

Domingo 29 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO : Se debe asegurar la formaleta para impedir que se abra durante y después de la fundida. En abscisa K2+231 se evidencia sedimento y agua lluvia en estructura de descole previamente izada. En abscisa K3+120 en punto crítico UMV se entierra Volqueta CEV lo cual afecta la movilidad en la zona durante todo el día. Se evidencia falta de coordinación entre la UMV y CEV para el retiro de la volqueta en vía. Se solicita al encargado de obra no transitar ni generar actividades sobre los módulos fundidos con el minicargador. Se solicita al grupo de trabajo el empleo constante de sus elementos de protección personal. Se retira ayudante de obra de unidad de ejecución. **Nuevamente se indica al constructor el uso adecuado de ella cinta PVC para juntas pues en la fundida del piso en estructura de encole esta cinta se corta. Ingresa ayudante de obra.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Tramo de Unión Tunales.

Programa de atención al Usuario

La profesional social, realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil (carpa) en el tramo vial de Unión Tunales, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra, cuya atención son los lunes de 9: 00 a.m. a 1: 00 p.m.
Cuenta con un punto de atención a la comunidad Fijo, el cual está ubicado en la Unión tiene una una línea de atención móvil 3204461693, el correo electrónico socialconsorcioev@gmail.com
A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil, con el fin de atender a la comunidad cercano de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.

Programa de información y participación comunitaria

•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual. La interventoría solicita se realice mantenimiento, para evitar deterioro.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Tunal Bajo
Casa de la señora Diana Cifuentes.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento.

•Acta de compromiso

El contratista realizo:

Acta compromiso con propietario del predio ubicado en la abscisa con respecto a la adecuación del material de excavación.

Acta de compromiso con el señor Rafael Romero predio K0+940 Y k0 + 960 construcción de batea entrada 4 metros al ingreso.

•Actas de vecindad

La interventoría realiza aprobación de las actas de vecindad del tramo vial de Unión Tunales de 14 actas de vecindad de apertura el 24 de junio del año en curso con comunicado 186-1-717.

•Volantes informativos

Por solicitud realizada por la presidenta de Junta de acción Comunal de Tunal Bajo la señora Arnidia Runza, quien solicita una reunión extraordinaria con las entidades involucradas en la ejecución del contrato (Consorcio Estabilización vial, UAERMV, Interventoría SAS). por cuanto que la comunidad presenta inquietudes. El consorcio Estabilización vial hace entrega del volante informativo de invitación a la reunión el cual es estregado a la presidenta de Junta de acción comunal para que sea distribuido al grupo interno de la comunidad, así mismo la profesional informa en el grupo de la comunicad del consorcio conformando la invitación.

La interventoría evidencia que no se realiza cumplimiento con el porcentaje indicado en el contrato el cual establece un 75%, de mano de obra no calificada, la interventoría solicita se tomen las medidas necesarias para aumentar el porcentaje y/o justificar la no contratación de mano de obra no calificada local.

Mujeres 7 porcentaje de cumplimiento 18, 91 %
2.RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV- CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL.
La interventoría participó en el recorrido realizado conjuntamente en el tramo vial de San Antonio El Toldo y Unión Tunales, con el objetivo de revisar el estado del componte social.
3.COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
El componente social participa del comité de obra interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 71, el 27 de junio del 2025, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social, con el fin de realizar seguimiento al proyecto.
4.COMITÉ DE SEGUIMIENTO SOCIAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

OBSERVACIONES AL CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Componente SST 4ta semana de junio 2025:
Observaciones SST **Tramo 2 Tunales:**
Personal / 25-06-2025: 1 inspector (ausente). 2 auxiliares de tráfico. 4 ayudantes. 1 oficial . 1 operador de minicargador.
Maquinaria en obra. 1 Minicargador. 1 Mezcladora . 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto. 1 generador de energía
Observaciones SST
•Dotación en orden
•Se solicita orden y aseo en tramo de fundida en cuneta y campamento
•Está pendiente la contratación de el segundo SST
•Dos carpas de resguardo para el personal en la zona.
•PMT en orden

•Se observa un trabajador sin overol autorizado
•Se observa kit de emergencias en orden
•Punto de hidratación en orden
•Punto ecológico en orden
•Se solicitó orden y aseo en acopio de materiales
Observaciones SST **Tramo San Antonio:**
Personal en obra: 18-06-2025: 1 Topógrafo. 1 Cadenero . 2 Oficiales. 5 ayudantes. 1 conductor camioneta y/o volqueta doble. 1 Operador de Minicargador. 1 Operador de retrocargador.
Grupo encoles: 2 Oficiales. 2 Ayudantes. Maquinaria y equipos en obra: 1 Retrocargador. 1 Minicargador. 1 Mezcladora. 1 Cortadora. 1 Apisonador. 1 placa vibratoria. 1 Generador eléctrico. . Vibrador de concreto. 1 Volqueta doble
Observaciones SST
•Se evidencia carpa de campamento, con kit de emergencia (botiquín, camilla, kits antiderrames, extintor)
•PMT, hay auxiliar de tráfico sin il uniforme completo
•No hay unidades sanitarias en terreno, trabajadores manifiestan que los baños permitidos están muy lejos de la zona donde se realiza trabajos
•Señalización de acopios en orden
•Hidratación en obra en orden
•Se realizó la observación de entibar excavación de alcantarillas en San Antonio, además de señalizar la parte superior de las mismas lo cual no se ha cumplido

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

CONTRATO DE OBRA No. 479 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.
Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión de informe semanal entregado por el contratista
4.Revisión de los informes del 01 al 10 entregados por el contratista
5.Participación del comité de seguimiento No 71; donde se realiza seguimiento al componente.
Frente Tunales
-Se evidencian acopios de hierro señalizados
-Tramo 2 km 1+130 se implementó un acopio de RCD (producto de cortes y excavación de cunetas), requiere adecuación y retiro de RCD que cayo al cuerpo de agua, implementar medidas de manejo para acopios se recuerda que estos deben cumplir con las distancias descritas en la ficha PAGA respectiva. Respecto a esto se realizó recorrido el día 26 de junio con el área social y ambiental del contratista donde se genero un acta con el propietario Luis Alberto Rey, donde el consorcio se compromete a realizar adecuaciones del sitio.
-Km 1+550 acopio de gravilla y arena ocupando parte de la vía, materiales cubiertos y se requiere mejorar la delimitación, se requiere que estos acopios se ubiquen de tal manera que no obstaculicen la vía, es necesario su adecuación con el fin de cumplir las medidas de manejo ambiental para acopio de materiales.
-En obra se evidencia, kit de emergencias y control de derrames, cartelera.
-En obra se evidencio la adecuación del campamento temporal, donde se ubicó punto ecológico.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
Cabe mencionar que algunos acopios se encuentran delimitados y cubiertos, medidas que se deben mantener para todos los sitios destinados como acopios.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-En recorrido realizado se evidencia que las bolsas de cemento se mantienen acopiadas en bolsas rojas y señalizado el área donde están almacenadas temporalmente.
-PMT correctamente implementado con las señales necesarias y dos auxiliares de tráfico en sitio.
-Se solicito que el material producto de la excavación de la cuneta sea empleado en el lleno de la misma, con el fin de limpiar los terrenos donde han sido depositados.
Frente San Antonio
-Se evidencia campamento móvil organizado
-Se solicito que los residuos sobrantes de las fundidas sean dispuestos de manera correcta como RCD y no en zonas verdes o alcantarillas del sector.
-Se solicito cubrir acopio de RCD ubicados al lado de la carpa y organizarlos
-Se sugirió al contratista limpiar la vía posterior a las fundidas de concreto ya que el minicargador genera caída de material en el transporte del mismo.
-Se solicito clausurar el acopio de RCD ubicado en el K 5+270 y dejar el área correctamente conformada
-El campamento fue reubicado, de acuerdo a los adelantos en obra, por lo cual se solicitó dejar en adecuadas condiciones el área donde se encontraba el campamento anterior, retirar la arena de rio que se conformó en sitio, gravilla y concreto dejado en el área. Reiterativo
-Km 4+740 se solicitó adecuar este acopio, cubrir y evitar el aporte de materiales al cauce. Reiterativo
-Se requiere que todos los acopios de hierro y tubería se mantengan delimitados. En el periodo se identificó acopios señalizados.
-Se solicito mantener punto ecológico organizado y colocar la tapa blanca a la caneca.
-Se requiere mantener medidas de manejo de acopios de pétreos en el periodo se evidencio acopio en el km 2+600 y 1+500 sin medidas, lo cual fue subsanado el dia 26 de junio.
-En obra se evidencia kit control de derrames, kit de emergencias y cartelera implementada
-En lo corrido de la semana se evidencia una carpa con punto ecológico al cual se solicitó en el periodo adecuación.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas en intervención en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se solicito no depositar residuos de excavación sobre las zonas verdes donde se encuentra vegetación nativa del páramo.
-Se solicito que el material producto de la excavación de la cuneta sea empleado en el lleno de la misma, con el fin de limpiar los terrenos donde han sido depositados.
-PMT correctamente implementado con las señales verticales móviles necesarias.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

	Componente Técnico	



Descripción Foto 1.
Se realiza fundida de 3 módulos intermedios aprobados por interventoría en k0+707 a k0+715.



Descripción Foto 2.
Se realiza la modulación, encofrado y fundida de 5 módulos de la entrada al predio del k0+870 a k0+850. El dueño solicita mayor longitud en la medida de acceso vehicular



Descripción Foto 3.
Se realiza la modulación, encofrado y fundida de 5 módulos de la entrada al predio del k0+870 a k0+850. El dueño solicita mayor longitud en la medida de acceso vehicular



Descripción Foto 4.
En abscisa K2+231 se evidencia sedimento y agua lluvia en estructura de descole previamente izada





Descripción Foto 5

K0+020 Figurado de acero para encoles

Descripción Foto 6

K1+550 Revoque de porosidad en alcantarilla.

Componente SST





Descripción Foto 7


Frente Tunales: Señalización adecuada en campamento

Descripción Foto 8

Frente Tunales: Se observa hidratación en obra

Componente Social





Descripción Foto 9

Levantamiento acta de compromiso Unión Tunales.

Descripción Foto 10

Comité de seguimiento social

Componente Ambiental





Descripción Foto 11

Frente San Antonio. Acopio que requiere adecuación

Descripción Foto 12

Frente Tunales. Punto Ecológico

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORIA
NO. CONTRATO	479-2022	CIN-161-2022
OBJETO	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (SAN ANTONIO II (K6+910-K0+000), UNIÓN TUNALES Y ANIMAS BAJAS.").	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$12.494.588.139,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$2.498.917.628,00	N/A
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	9/08/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. 98 **DEL** lunes, 30 de junio de 2025 **AL** domingo, 6 de julio de 2025

AVANCES DE OBRA

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO TRAMO 2	21,00%	10,81%	-10,19%	K4+828 a K4+852 Alistamiento nivelación y compactación de B-200 en Berma- Cuneta. K4+585 a K4+564 Alistamiento nivelación y compactación en Berma-cuneta. K2+239 Limpieza de encole por lluvias en izaje de acero de refuerzo. K1+550 Disposición y acopio de acero para armado de estructura de encole * Se realiza alistamiento de 5 módulos intermedios en ingreso a finca. . K0+850 a k0+865. * Se realiza el alistamiento y nivelación del área para los módulos de las cunetas. Esta actividad se realizó entre k1+175 a k1+200. Se arma un total de 14 módulos. * Se realiza lijado y resane de frontales en hombros de cunetas k1+020 a k1+050. K4+529 a K4+563 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en berma-cuneta. K4+525 a K4+500 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta K2+150 Instalación de formaleta K2+150 Armado de acero depara encole. K2+239 Instalación de concreto In situ para base de estructura de encole.(La actividad no se pudo ejecutar el 02-07 se funde el 03-07) K2+831 Limpieza y aseo de encole.
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	* Se realiza alistamiento de 5 módulos intermedios en ingreso a finca. . K0+850 a k0+865. * Se realiza el alistamiento y nivelación del área para los módulos de las cunetas. Esta actividad se realizó entre k1+175 a k1+200. Se arma un total de 14 módulos. * Se realiza lijado y resane de frontales en hombros de cunetas k1+020 a k1+050. * Se realiza fundida de 5 módulos intermedios en ingreso a finca. . K0+850 a k0+865. * Se realiza la fundida de 5 módulos entre k1+175 a k1+195. Se revisa el alistado, acero y espesor de concreto. * Se realiza el alistado de 13 módulos entre k1+205 a k1+255. Se revisa el alistado, acero y espesor de concreto y alineación. * Se realiza corte de carpeta de fresado para instalación de módulos. Esta actividad se realiza con ayuda del minicargador. De k1+265 a k1+300. * Se realiza fundida de 13 módulos entre k1+205 a k1+255. Se revisa el alistado, acero, espesor de concreto y alineación. * Se realiza corte de carpeta de fresado para instalación de módulos. Esta actividad se realiza con ayuda del minicargador. De k1+295 a k1+320.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	12.494.588.139,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

TRAMO UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 05
1 inspector, 2 auxiliares de tráfico, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador
1 conductor de volqueta, 1 operario de retro cargador, 1 operario de motoniveladora, 1 operario de vibro compactador y 1 operario de minicargador.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto, 1 generador de energía
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 30 de junio de 2025. Clima:

Martes 01 de julio de 2025. Clima: : lloviznas 07:00-11:00.
* Se realiza alistamiento de 5 módulos intermedios en ingreso a finca. . K0+850 a k0+865.
* Se realiza el alistamiento y nivelación del área para los módulos de las cunetas. Esta actividad se realizó entre k1+175 a k1+200. Se arma un total de 14 módulos.
* Se realiza lijado y resane de frontales en hombros de cunetas k1+020 a k1+050.
Miércoles 02 de junio de 2025. Clima: seco
* Se realiza fundida de 5 módulos intermedios en ingreso a finca. . K0+850 a k0+865.
* Se realiza la fundida de 5 módulos entre k1+175 a k1+195. Se revisa el alistado, acero y espesor de concreto.
Jueves 03 de junio de 2025. Clima: Lluvias moderadas 07:00-08:30.
* Se realiza el alistado de 13 módulos entre k1+205 a k1+255. Se revisa el alistado, acero y espesor de concreto y alineación.
* Se realiza corte de carpeta de fresado para instalación de módulos. Esta actividad se realiza con ayuda del minicargador. De k1+265 a k1+300.
Viernes 04 de junio de 2025. Clima: seco
* Se realiza fundida de 13 módulos entre k1+205 a k1+255. Se revisa el alistado, acero, espesor de concreto y alineación.
* Se realiza corte de carpeta de fresado para instalación de módulos. Esta actividad se realiza con ayuda del minicargador. De k1+295 a k1+320.
Sábado 05 de junio de 2025. Clima:

Domingo 06 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - ** * Se evidencia el traslado del trompo, canecas y material (gravilla y arena de río). Se traslada hasta el punto k1+555. * Se evidencia que la formaleta está teniendo una deformación o curvatura, por este motivo, no se mantiene la medida en el centro de la formaleta de .15 MTS. * Se evidencia que se está creando una junta fría a raíz de la dinámica de la fundida de los módulos. Se realiza fundida del paño de la cuneta y a la hora de funde el hombro de la misma. Se recomienda más celeridad y mayor vibrado para evitar que se realicen juntas. ** No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de realce de alcantarillas. * El componente social realiza acercamiento con el dueño del predio del k0+840 al k0+860, esto con el fin de realizar la batea de acceso, sin embargo el dueño manifiesta que tan solo 4 metros de ingreso no garantiza el poder ingresar o dar vuelta a camiones, busetas y maquinaria que hace mantenimiento. *** Se evidencia el traslado del trompo, canecas y material (gravilla y arena de río). Se traslada hasta el punto k1+555. * Se evidencia que la formaleta está teniendo una deformación o curvatura, por este motivo, no se mantiene la medida en el centro de la formaleta de .15 MTS. * No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de realce de alcantarillas.

TRAMO CAPITOLIO

Personal disponible en tramo 05

Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor. 2 auxiliares de tráfico, 2 ayudantes, 1 oficial, 1 operador minicargador

Actividades realizadas
Lunes 30 de junio de 2025. Clima:

Martes 01 de julio de 2025. Clima: :

Miércoles 02 de junio de 2025. Clima:

Jueves 03 de junio de 2025. Clima:

Viernes 04 de junio de 2025. Clima:

Sábado 05 de junio de 2025. Clima:

Domingo 06 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO:

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 05
1 Topógrafo. 1 Cadenero. 2 Oficiales. 6 ayudantes. 1 Auxiliar de tráfico. 1 conductor camioneta y/o volqueta doble. 1 Operador de Minicargador. 1 Operador de retrocargador. 2 Oficiales. 2 Ayudantes
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Retrocargador. 1 Minicargador. 1 Mezcladora . 1 Cortadora. 1 Apisonador. 1 placa vibratoria. 1 Generador eléctrico. 1 Vibrador de concreto. 1 Volqueta doble
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 30 de junio de 2025. Clima:
FESTIVO
Martes 01 de julio de 2025. Clima: : Lluvia moderada 6:00 a 8:00
K4+828 a K4+852 Alistamiento nivelación y compactación de B-200 en Berma- Cuneta.
K4+585 a K4+564 Alistamiento nivelación y compactación en Berma-cuneta.
K2+239 Limpieza de encole por lluvias en izaje de acero de refuerzo.
K1+550 Disposición y acopio de acero para armado de estructura de encole
Miércoles 02 de junio de 2025. Clima: lloviznas 07:00-11:00.
* Se realiza alistamiento de 5 módulos intermedios en ingreso a finca. . K0+850 a k0+865.
* Se realiza el alistamiento y nivelación del área para los módulos de las cunetas. Esta actividad se realizó entre k1+175 a k1+200. Se arma un total de 14 módulos.
* Se realiza lijado y resane de frontales en hombros de cunetas k1+020 a k1+050.
Jueves 03 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 6:00 a 8:00 y am 4:00 a 6:00 pm
K4+565 a K4+585 Instalación de concreto In situ para 6 módulos de cuneta.
K4+828 a K4+838 Instalación de concreto In situ para 3 módulos de cuneta.
K4+876 aK4+882 Instalación de concreto In situ para 2 módulos de cuneta.
K2+150 Armado de acero de refuerzo para estructura de encole.
Inicio de instalación de formaleta
K2+239 Instalación de concreto In situ para base de estructura de encole.
Viernes 04 de julio de 2025. clima: 7:00 a 8:00 am y 10:00 a 11:00 am
K4+529 a K4+563 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en berma-cuneta.
K4+525 a K4+500 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta
K2+150 Instalación de formaleta
K2+150 Armado de acero depara encole.
K2+239 Instalación de concreto In situ para base de estructura de encole.(La actividad no se pudo ejecutar el 02-07 se funde el 03-07)
K2+831 Limpieza y aseo de encole.
Sábado 05 de julio de 2025. Clima:
Domingo 06 de julio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO : Aún falta completar el personal de tráfico en obra. Se requiere completar la conexión de filtro en abscisas K4+866 y K1+550 y en general en las áreas en las cuales aún no se realiza tal actividad. * Se evidencia el traslado de carpa de PMT del K0+770 a k1+555. * Se evidencia que la formaleta está teniendo una deformación o curvatura, por este motivo, no se mantiene la medida en el centro de la formaleta de .15 MTS.
* Se evidencia que se está creando una junta fría a raíz de la dinámica de la fundida de los módulos. Se realiza fundida del paño de la cuneta y a la hora de funde el hombro de la misma. Se recomienda más celeridad y mayor vibrado para evitar que se realicen juntas.
* No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de realce de alcantarillas. * El componente social realiza acercamiento con el dueño del predio del k0840 al k0+860, esto con el fin de realizar la batea de acceso, sin embargo el dueño manifiesta que tan solo 4 metros de ingreso no garantiza el poder ingresar o dar vuelta a camiones, busetas y maquinaria que hace mantenimiento. Pendiente por ingreso auxiliar de tráfico. En abscisas K4+585 a K4+565 se instala concreto elaborado en sitio pero no se realiza ensayo de densidades hasta el momento se han instalado 6 módulos de cuneta los cuales quedan en observación. **Se evidencia ingreso de Mezcladora para uso de cuadrilla descoles. Aún no se da ingreso al auxiliar de tráfico faltante.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Tramo de Unión Tunales.

Programa de atención al Usuario

La profesional social, realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil (carpa) en el tramo vial de Unión Tunales, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra, cuya atención son los lunes de 9: 00 a.m. a 1: 00 p.m.
Cuenta con un punto de atención a la comunidad Fijo, el cual está ubicado en la Unión tiene una línea de atención móvil 3204461693, el correo electrónico socialconsorcioev@gmail.com
A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil, con el fin de atender a la comunidad cercano de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.

Programa de información y participación comunitaria.

•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual. La interventoría solicita se realice mantenimiento, para evitar deterioro.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Tunal Bajo
Casa de la señora Diana Cifuentes.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento.

•Acta de compromiso

Durante la semana del presente informe no se realizan actas de compromiso, por no ser necesario.

•Actas de vecindad
Durante la semana del presente informe no se realizan actas de vecindad por no ser necesario.

•Volantes informativos

Durante la semana no se realizan entrega de volantes informativos por no ser necesario.

•Reunión extraordinaria

El 03 de julio de 2025, se realizó la reunión extraordinaria por solicitud de la comunidad, con el fin de hablar temas acerca del diseño de las entradas a los previos, espacios de acopio, compromisos
anteriores a la suspensión con la comunidad. Por otra parte, se aclararon las inquietudes acerca de la construcción del puente en madera. Se genera el compromiso que el diseño de las entradas a predios se dejara de 5 metros.

Tramo de San Antonio El Toldo.

Programa de información y participación comunitaria.

•Puntos satélites

El contratista realizó la instalación de dos puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa del señor Luis Bustos
Colegio del El Toldo.
Se evidencia que cuanta con afiche informativo, volantes informativos.

•Vallas informativas

El contratista cuenta con la instalación de dos vallas móviles establecidas contractualmente.

•Pasacalles
El contratista realizó la instalación del pasacalle que se encontraba pendiente por su instalación, pero este en recorrido realizado por la interventoría, se evidencia que se rompió, la interventoría solicita su reposición a la UMV.

•Actas de vecindad

Durante la semana del presente informe no se realizan actas de vecindad por no ser necesario.

•Actas de compromiso
La profesional social realizó acta de compromiso el 03 de julio se firmo con el señor Bernardo
Peñaloza, propietario del predio por la construcción de la alcantarilla y la señalización de la misma.

Programa de atención al Usuario.
La profesional social, realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil (carpa) en el tramo vial de Unión Tunales, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra, cuya atención son los martes y jueves de 9: 00 a.m. a 1: 00 p.m.
Cuenta con un punto de atención a la comunidad Fijo, el cual está ubicado en la Unión tiene una línea de atención móvil 3204461693, el correo electrónico socialconsorcioev@gmail.com

Vinculación de personal mano de obra.

El Consorcio Estabilización vial cuenta en total con:
Con 39 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:

Mano de obra calificada (MOC)

9 trabajadores profesionales.
10 son operarios
Para un total de 19 trabajadores

Total, de porcentaje 48,71 %

Mano de obra no calificada (MONC)

9 trabajadores foráneos
11 trabajadores de la localidad
Total, de personal 20 trabajadores.
Porcentaje de cumplimiento un 55 %

La interventoría evidencia que no se realiza cumplimiento con el porcentaje indicado en el contrato el cual establece un 75%, de mano de obra no calificada, la interventoría solicita se tomen las medidas necesarias para aumentar el porcentaje y/o justificar la no contratación de mano de obra no calificada local.

Mujeres 7 porcentaje de cumplimiento 17,94 %

2.RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV- CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL.
La interventoría participó en el recorrido realizado conjuntamente en el tramo vial de San Antonio El Toldo y Unión Tunales, con el objetivo de revisar el estado y cumplimiento del componte social.

3.COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
El componente social participa del comité de obra interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 72, el 3 de julio del 2025, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social, con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

4INFORMES MENSUALES

A la fecha se encuentra pendiente la entrega del informe 19, el cual presento observaciones, el contratista se componente a realizar entrega para entes del comité integral 73.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Observaciones SST Tramo 2 Tunales:
Personal / 03-07-2025: 1 inspector (ausente). 2 auxiliares de tráfico. 4 ayudantes. 1 oficial . 1 operador de minicargador. Maquinaria en obra:. 1 Minicargador. 1 Mezcladora. 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto. 1 generador de energía
Observaciones SST
•Dotación en orden
•Se solicita orden y aseo en tramo de fundida en cuneta y campamento
•Está pendiente la contratación del segundo SST
•Se evidencia Dos carpas de resguardo para el personal en la zona.
•PMT en orden
•Se observa un trabajador sin overol autorizado
•Se observa kit de emergencias en orden
•Punto de hidratación en orden
•Punto ecológico en orden
•Se solicitó orden y aseo en acopio de materiales
Observaciones SST Tramo San Antonio:
Personal en obra: 03-07-2025: 1 Topógrafo . 1 Cadenero. 2 Oficiales . 6 ayudantes. 1 Auxiliar de tráfico . 1 conductor camioneta y/o volqueta doble. 1 Operador de Minicargador. 1 Operador de retrocargador.
Grupo encoles 4 Oficiales. 2 Ayudantes. Maquinaria y equipos en obra:. 1 Retrocargador. 1 Minicargador. 1 Mezcladora . 1 Cortadora . 1 Apisonador. 1 placa vibratoria. 1 Generador eléctrico. 1 Vibrador de concreto. 1 Volqueta doble
Observaciones SST
•Se evidencia carpa de campamento, con kit de emergencia (botiquín, camilla, kits antiderrames, extintor)
•Falta un auxiliar de tráfico
•No hay unidades sanitarias en terreno, trabajadores manifiestan que los baños permitidos están muy lejos de la zona donde se realiza trabajos
•Señalización de acopios en orden
•Hidratación en obra en orden
•Se realizó la observación de entibar excavación de alcantarillas en San Antonio, además de señalizar la parte superior, esta observación se realizó, pero se solicita reforzar el entibado ya que se evidencia inseguro.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

CONTRATO DE OBRA No. 479 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.
Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión de informe semanal entregado por el contratista
4.Participación del comité de seguimiento No 72; donde se realiza seguimiento al componente.
Frente Tunales
-Se evidencian acopios de hierro señalizados
-Tramo 2 km 1+130 se implementó un acopio de RCD (producto de cortes y excavación de cunetas), requiere adecuación y retiro de RCD que cayo al cuerpo de agua, implementar medidas de manejo para acopios se recuerda que estos deben cumplir con las distancias descritas en la ficha PAGA respectiva. Se acordó con el propietario adecuación de esta zona, lo cual quedo registrado en acta del componente social.
-Km 1+550 acopio de gravilla y arena ocupando parte de la vía, materiales cubiertos y se requiere mejorar la delimitación, se requiere que estos acopios se ubiquen de tal manera que no obstaculicen la vía, es necesario su adecuación con el fin de cumplir las medidas de manejo ambiental para acopio de materiales.
-En obra se evidencia, kit de emergencias y control de derrames, cartelera.
-En obra se evidencio la adecuación del campamento temporal, donde se ubicó punto ecológico.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
Cabe mencionar que algunos acopios se encuentran delimitados y cubiertos, medidas que se deben mantener para todos los sitios destinados como acopios.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-En recorrido realizado se evidencia que las bolsas de cemento se mantienen acopiadas en bolsas rojas y señalizado el área donde están almacenadas temporalmente.
-PMT correctamente implementado con las señales necesarias y dos auxiliares de tráfico en sitio.
-Se solicito que el material producto de la excavación de la cuneta sea empleado en el lleno de la misma, con el fin de limpiar los terrenos donde han sido depositados. En implementación
Frente San Antonio

-Se evidencia campamento móvil organizado
-Se solicito que los residuos sobrantes de las fundidas sean dispuestos de manera correcta como RCD y no en zonas verdes o alcantarillas del sector.
-Se solicito cubrir acopio de RCD ubicados al lado de la carpa y organizarlos
-Se sugirió al contratista limpiar la vía posterior a las fundidas de concreto ya que el minicargador genera caída de material en el transporte del mismo.
-Se solicito clausurar el acopio de RCD ubicado en el K 5+270 y dejar el área correctamente conformada, fue cumplido el dia 03 de julio.
-El campamento fue reubicado, de acuerdo a los adelantos en obra, por lo cual se solicitó dejar en adecuadas condiciones el área donde se encontraba el campamento anterior, retirar la arena de rio que se conformó en sitio, gravilla y concreto dejado en el área. En ejecución
-Km 4+740 se solicitó adecuar este acopio, cubrir y evitar el aporte de materiales al cauce. Reiterativo
-Se requiere que todos los acopios de hierro y tubería se mantengan delimitados. En el periodo se identificó acopios señalizados.
-Se solicito mantener punto ecológico organizado y colocar la tapa blanca a la caneca.
-Se requiere mantener medidas de manejo de acopios de pétreos en el periodo se evidencio acopio en el km 2+600 y 1+500 sin medidas, lo cual fue subsanado el dia 02 de julio.
-En obra se evidencia kit control de derrames, kit de emergencias y cartelera implementada
-En lo corrido de la semana se evidencia una carpa con punto ecológico al cual se solicitó en el periodo adecuación.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas en intervención en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se solicito no depositar residuos de excavación sobre las zonas verdes donde se encuentra vegetación nativa del páramo.
-Se solicito que el material producto de la excavación de la cuneta sea empleado en el lleno de la misma, con el fin de limpiar los terrenos donde han sido depositados.
-PMT correctamente implementado con las señales verticales móviles necesarias.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

		Componente Técnico	



Descripción Foto 1.

Frente Tunales. Se realiza fundida de 5 módulos intermedios en ingreso a finca. . K0+850 a k0+865.



Descripción Foto 2.

Frente Tunales. Se realiza fundida de 5 módulos intermedios en ingreso a finca. . K0+850 a k0+865.



Descripción Foto 3.

Frente Tunales. Se realiza el alistamiento y nivelación del área para los módulos de las cunetas. Esta actividad se realizó entre k1+175 a k1+200. Se arma un total de 14 módulos.



Descripción Foto 4.

Frente Tunales. Se realiza el alistamiento y nivelación del área para los módulos de las cunetas. Esta actividad se realizó entre k1+175 a k1+200. Se arma un total de 14 módulos.



Descripción Foto 5

Frente San Antonio. K2+150 Armado de acero de refuerzo para estructura de encole. Inicio de instalación de formaleta.



Descripción Foto 6

Frente San Antonio. K2+150 Armado de acero de refuerzo para estructura de encole. Inicio de instalación de formaleta.

Componente SST



Descripción Foto 7

Frente San Antonio. Se observa entibado poco seguro



Descripción Foto 8

Frente San Antonio. No hay entibado en los extremos derecho e izquierdo

Componente Social



Descripción Foto 9

: Recorrido frente de obra Unión Tunales



Descripción Foto 10

Reunión Extraordinaria Unión Tunales

Componente Ambiental



Descripción Foto 11

Frente San Antonio. Acopio con medidas de manejo



Descripción Foto 12

Frente Tunales. Acopio sin medidas de manejo

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	COP-478 de 2022	CIN-161-2022
OBJETO	"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". GRUPO 1 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20180000500200 (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y laguna verde") .	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$11.624.693.181,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$2.324.938.636,20	$0,00
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES	QUINCE (15) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	25/10/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor	Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	2	19
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	5	2

SEMANA N. 51 **DEL** lunes, 26 de mayo de 2025 **AL** domingo, 1 de junio de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Trabajo Ejecutado	0,80%	17,91%
Valor del Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 90.100.136,75	$ 2.025.483.192,26

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO SAN ANTONIO	N/A	N/A	N/A	No se reporta actividad en este tramo
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	Replanteo
TRAMO CAPITOLIO	No se programó	56,63%	N/A	No se reporta actividad en este tramo

NOTA:

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020" GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio I (K13+820 - K6+910), Capitolio y Laguna verde	GL	$11.624.693.181,00	No se programó	No se programó	0,797%	17,91%

Tramo Capitolio

Personal disponible en tramo
Personal del consorcio disponible:
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 Profesional Ambiental. 1 topógrafo, 1 cadenero.

Acitividades realizadas
Lunes 26 de Mayo de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Martes 27 de mayo de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Miércoles 28 mayo de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Jueves 29 de mayo de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Viernes 30 de mayo de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Sábado 31 de mayo de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Domingo 01 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES TRAMO CAPITOLIO

Tramo Laguna Verde

Personal disponible en tramo
Personal del consorcio disponible:
Maquinaria evidenciada en el tramo:
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 Profesional Ambiental. 1 topógrafo, 1 cadenero.

Acitividades realizadas
Lunes 26 de Mayo de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Martes 27 de mayo de 2025. Clima:lluvia moderada
Replanteo
Miércoles 28 mayo de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Jueves 29 de mayo de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteodes
Viernes 30 de mayo de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Sábado 31 de mayo de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Domingo 01 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES TRAMO LAGUNA VERDE

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Programa de información y participación comunitaria.
•Tramo Laguna Verde.
El contratista realiza la creación del grupo de WhatsApp, con el fin de mantener informada a la comunidad.
Actas de vecindad:
La interventoría solicita al contratista las actas de vecindad, quien in forma que estas ya fueron realizadas.
Actas de compromiso:
La interventoría solicita las actas de compromiso de los predios de K0+ 620 Y k0+ 480 por construcción de alcantarillas, el contratista indica que ya realizó acercamiento con la comunidad, pero no se evidencia actas

•Tramo Capitolio.
Pasacalle.
La interventoría solicita realizar reposición del pasacalle.
Actas de comprimo
La interventoría solicita hace entrega de las actas de compromiso realizadas para apertura de acopios al igual hacer entrega de actas de gestión adelantada para los cierres de los acopios.
[illegible]Programa de atención al Usuario.
A la fecha del presente informe no se ha dado apertura ni adecuación al punto de atención a la comunidad, el cual indica el componente social del contratista que se encuentra ubicado en la casa de la señora Marcela Martínez.
2.COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO GAVIONES 95.
Se participa de un comité de obra interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 45 Consorcio Gaviones 95, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social. con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

3.COMITÉ SOCIAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO GAVIONES 95.
La interventoría realiza el comité de seguimiento social interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 7 Consorcio Gaviones 95, con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

OBSERVACIONES AL CONSORCIO GAVIONES 95
Componente SST 4ta semana de mayo 2025 tramo Laguna Verde
[illegible]
del profesional.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión de los informes del No 1 al No 12 remitidos por el contratista
4.Revisión de informe semanal remitido por el contratista
5.Participación del comité de seguimiento No 48; donde se realiza seguimiento al componente.

Frente Laguna Verde

-Adecuación de acopio de material triturado
-Mantenimiento de Protección de alcantarillas del área de intervención
-Replanteo de diseño geométrico segmento vial del K 2 +600
-Señalización de materiales en el frente de obra
-Permanencia de kit de emergencias y kit control de derrames en campamento
-Señalización de zona de intervención con el filtro
-No ingresaron materiales pétreos en el periodo
-No se realizó generación ni retiro de RCD en el periodo.
Frente Capitolio
-No se evidencia desarrollo de actividades por parte del contratista.
Frente San Antonio
-No se evidencia desarrollo de actividades por parte del contratista.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

No se presentan ítems no previstos

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Protección de alcantarillas



Descripción Foto 2.

Kit de emergencia en sitio



Descripción Foto 3.

Comité de seguimiento social # 7



Descripción Foto 4.

Comité de seguimiento integral # 45

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	COP-478 de 2022	CIN-161-2022
OBJETO	"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". GRUPO 1 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y laguna verde") .	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$11.624.693.181,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$2.324.938.636,20	$0,00
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES	QUINCE (15) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	25/10/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor	Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	2	19
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	5	2

SEMANA N. 52 **DEL** lunes, 2 de junio de 2025 **AL** domingo, 8 de junio de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Trabajo Ejecutado	0,80%	17,91%
Valor del Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 90.100.136,75	$ 2.025.483.192,26

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO SAN ANTONIO	N/A	N/A	N/A	No se reporta actividad en este tramo
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	Replanteo
TRAMO CAPITOLIO	No se programó	56,63%	N/A	No se reporta actividad en este tramo

NOTA:

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020" GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio I (K13+820 - K6+910), Capitolio y Laguna verde	GL	$11.624.693.181,00	No se programó	No se programó	0,797%	17,91%

Tramo Laguna Capitolio

Personal disponible en tramo
Personal del consorcio disponible:
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 Profesional Ambiental. 1 topógrafo, 1 cadenero.

Acitividades realizadas
Lunes 02 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Martes 03 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Miércoles 04 junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Jueves 05 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Viernes 06 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Sábado 07 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Domingo 08 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES TRAMO CAPITOLIO

Tramo Laguna Verde

Personal disponible en tramo
Personal del consorcio disponible:
Maquinaria evidenciada en el tramo:
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 Profesional Ambiental. 1 topógrafo, 1 cadenero.

Acitividades realizadas
Lunes 02 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Martes 03 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Miércoles 04 junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Jueves 05 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Viernes 06 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Sábado 07 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Domingo 08 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES TRAMO LAGUNA VERDE

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 478 –CONSORCIO GAVIONES 95.
Semana del 1 al 8 de junio del 2025
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Tramo vial Laguna Verde
Programa de información y participación comunitaria.
Actas de vecindad:
La interventoría solicita al contratista las actas de vecindad, el contratista se compromete a realizar entrega el 9 de junio del 2025.

Actas de compromiso:
•El profesional social realiza acta de compromiso con el fin de solicitar el alquiler de baños para los trabajadores en la casa de la señora Marcela Martínez, K2+400.
•El profesional social realiza acta de compromiso solicitando permiso de acopio Ángel Leonidas y el predio de Carlos Contreras K1+480.
•Acta de permiso en la construcción del descole y encaminar el agua al predio de manera que no presente afectaciones al predio e instalar cercado K0+625.
•Acta de permiso en la construcción del descole y encaminar el agua al predio de manera que no presente afectaciones al predio e instalar cercado K0+132, Rolan Bautista.
Tramo Capitolio.
Pasacalle.
La interventoría solicita realizar reposición del pasacalle.
Actas de comprmiso.
La interventoría solicita hace entrega de las actas de compromiso realizadas para apertura de acopios al igual hacer entrega de actas de gestión adelantada para los cierres de los acopios.
1.Programa de atención al Usuario.
A la fecha del presente informe no se ha dado apertura ni adecuación al punto de atención a la comunidad, el cual indica el componente social del contratista que se encuentra ubicado en la casa de la señora Marcela Martínez.
2.COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO GAVIONES 95.
Se participa de un comité de obra interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 46 Consorcio Gaviones 95, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social. con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

OBSERVACIONES AL CONSORCIO GAVIONES 95
Componente SST 1ra semana de junio 2025 tramo Laguna Verde
[redacted]
presentado por el contratista.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión de PAGA V3, del cual se emite concepto de preaprobado hasta que sea remitido con las firmas.
4.Participación del comité de seguimiento No 46; donde se realiza seguimiento al componente.
Frente Laguna Verde
-Localización de posibles lugares para acopios de materiales.
-Se cuenta con un acopio de pétreos
-Se evidencia desarrollo de actividades de replanteo topográfico.
-Replanteo topográfico
-Nivelación de suelo natural.
-Acta de compromiso con el propietario de predio para acopio de RCD
-Capacitación de limpieza y cuidados de obras de drenaje
Frente Capitolio
-Se realizó un recorrido al frente de obra con el fin de establecer el estado del tramo para dar inicio a las actividades de obra.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

No se presentan ítems no previstos

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Comité de seguimiento integral # 46



Descripción Foto 2.

Recorrido Capitolio

Descripción Foto 3.

Descripción Foto 4.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	COP-478 de 2022	CIN-161-2022
OBJETO	"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". GRUPO 1 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20180000500200 (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y laguna verde") .	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$11.624.693.181,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$2.324.938.636,20	$0,00
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES	QUINCE (15) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	25/10/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor	Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	2	19
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	5	2

SEMANA N. 53 **DEL** lunes, 9 de junio de 2025 **AL** domingo, 15 de junio de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Trabajo Ejecutado	0,80%	17,91%
Valor del Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 90.100.136,75	$ 2.025.483.192,26

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO SAN ANTONIO	N/A	N/A	N/A	No se reporta actividad en este tramo
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	Replanteo
TRAMO CAPITOLIO	No se programó	56,63%	N/A	No se reporta actividad en este tramo

NOTA:

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020" GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio I (K13+820 - K6+910), Capitolio y Laguna verde	GL	$11.624.693.181,00	No se programó	No se programó	0,797%	17,91%

Tramo Capitolio

Personal disponible en tramo
Personal del consorcio disponible:
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 Profesional Ambiental. 1 topógrafo, 1 cadenero.

Acitividades realizadas
Lunes 09 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Martes 10 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Miércoles 11 junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Jueves 12 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Viernes 13 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Sábado 14 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Domingo 15 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES TRAMO CAPITOLIO

Tramo Laguna Verde

Personal disponible en tramo
Personal del consorcio disponible:
Maquinaria evidenciada en el tramo:
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 Profesional Ambiental. 1 topógrafo, 1 cadenero.

Acitividades realizadas
Lunes 09 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
replanteo
Martes 10 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
replanteo
Miércoles 11 junio de 2025. Clima: lluvia moderada
replanteo
Jueves 12 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
replanteo
Viernes 13 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
replanteo
Sábado 14 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
replanteo
Domingo 15 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES TRAMO LAGUNA VERDE

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL

Tramo vial Laguna Verde

Programa de información y participación comunitaria.

Actas de vecindad:

La interventoría solicita al contratista las actas de vecindad de Laguna Verde, Capitolio y San Antonio 1, el contratista se compromete a realizar entrega el 9 de junio del 2025. No se cumple con la entrega.

Tramo Capitolio.

Pasacalle.
La interventoría solicita realizar reposición del pasacalle de frente de obra de Capitolio, a la fecha no se ha hecho reposición.

Actas de comprimo.
La interventoría solicita hace entrega de las actas de compromiso realizadas para apertura de acopios al igual hacer entrega de actas de gestión adelantada para los cierres de los acopios en el frente de obra de Capitolio.

[illegible]rograma de atención al Usuario.

A la fecha del presente informe no se ha dado apertura ni adecuación al punto de atención a la comunidad, el cual indica el componente social del contratista que se encuentra ubicado en la casa de la señora Marcela Martínez.

2. COMITÉ DE SEGUIMIENTO SOCIAL

La interventoría realizó comité de seguimiento social, con el fin de realizar seguimiento a los compromisos establecidos en el componente.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1. Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2. Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3. Revisión de PAGA V3, del cual se emite concepto de aval
4. Revisión de informes semanales remitidos por el contratista
5. Mesa de trabajo con el profesional del contratista con el fin de verificar las observaciones de los informes mensuales.
6. Participación del comité de seguimiento No 47; donde se realiza seguimiento al componente.

Frente Laguna Verde

- Adecuación de acopio de material triturado
- Préstamo de predio para acopio de base granular a cargo de la UMV
- Nivelación de suelo natural desde el K 2+000
- Replanteo de diseño geométrico segmento vial del K 2 +600

Frente Capitolio
- No se evidencia desarrollo de actividades por parte del contratista.

Frente San Antonio
- No se evidencia desarrollo de actividades por parte del contratista.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)


No se presentan ítems no previstos

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Actividades de replanteo

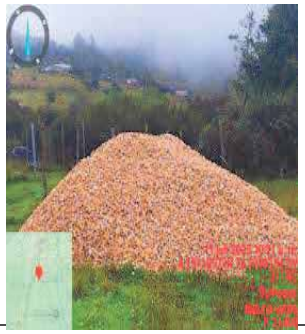

Descripción Foto 2.

Acopio de Triturado



Descripción Foto 3.

Comité de seguimiento social

Descripción Foto 4.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	COP-478 de 2022	CIN-161-2022
OBJETO	"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". GRUPO 1 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20180000500200 (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y laguna verde") .	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$11.624.693.181,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$2.324.938.636,20	$0,00
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES	QUINCE (15) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	25/10/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor	Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	2	19
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	5	2

SEMANA N. 54 **DEL** lunes, 16 de junio de 2025 **AL** domingo, 22 de junio de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Trabajo Ejecutado	0,80%	17,91%
Valor del Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 90.100.136,75	$ 2.025.483.192,26

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO SAN ANTONIO	N/A	N/A	N/A	No se reporta actividad en este tramo
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	No se reporta actividad en este tramo
TRAMO CAPITOLIO	No se programó	56,63%	N/A	No se reporta actividad en este tramo

NOTA:

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020" GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio I (K13+820 - K6+910), Capitolio y Laguna verde	GL	$11.624.693.181,00	No se programó	No se programó	0,797%	17,91%

Tramo Capitolio

Personal disponible en tramo
Personal del consorcio disponible:
Maquinaria evidenciada en el tramo:
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 Profesional Ambiental. 1 topógrafo, 1 cadenero.

Acitividades realizadas
Lunes 16 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Martes 17 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Miércoles 18 junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Jueves 19 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Viernes 20 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Sábado 21 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Domingo 22 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES TRAMO CAPITOLIO

Tramo Laguna Verde

Personal disponible en tramo
Personal del consorcio disponible:
Maquinaria evidenciada en el tramo:
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 Profesional Ambiental. 1 topógrafo, 1 cadenero.

Acitividades realizadas
Lunes 16 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Martes 17 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Miércoles 18 junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Jueves 19 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Viernes 20 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Sábado 21 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Domingo 22 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES TRAMO LAGUNA VERDE

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 478 –CONSORCIO GAVIONES 95.
Semana del 16 AL 22 de junio del 2025
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Tramo vial Laguna Verde
Programa de información y participación comunitaria.
Actas de vecindad:
La interventoría solicita al contratista las actas de vecindad de Laguna Verde, Capitolio y San Antonio 1, A la feche de cierre del presente informe no se cumple con la entrega.
Tramo Capitolio.
Pasacalle.
La interventoría solicita realizar reposición del pasacalle de frente de obra de Capitolio, a la fecha no se ha hecho reposición.

Actas de comprimo.
La interventoría solicita hace entrega de las actas de compromiso realizadas para apertura y cierre de acopios de los acopios en el frente de obra de Capitolio, a la fecha el contratista no ha hecho entrega de las actas.
Programa de atención al Usuario.
A la fecha del presente informe no se ha dado apertura ni adecuación al punto de atención a la comunidad, el cual indica el componente social del contratista que se encuentra ubicado en la casa de la señora Marcela Martínez.

2. INFORMES MENSUALES
El consorcio hace entrega del informe mensual social N° 14 mes de mayo del 2025, es revisado por la interventoría y presenta observaciones.
El Consorcio hace entrega de los informes mensuales sociales No 10 V4,11 V4, presentan observaciones

Se encuentra pendiente la entrega del informe mensual social 12 y 13

3. INFORMES SEMANALES
El consorcio no ha hecho entrega del reporte de informes semanales.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1. Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2. Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3. Revisión del informe No 13 V2 del cual se emite concepto de aval
4. Revisión del informe No 14 V1 del cual se emite concepto de aval
5. Revisión de informes semanales remitidos por el contratista
6. Participación del comité de seguimiento No 47; donde se realiza seguimiento al componente.

Frente Laguna Verde

- Adecuación de acopio de material triturado
- Protección de alcantarillas del área de intervención
- Replanteo de diseño geométrico segmento vial del K 2 +600
- Señalización de materiales en el frente de obra
- Capacitación en sustancias químicas
- Instalación de kit de emergencias y kit control de derrames en campamento

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

No se presentan ítems no previstos

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Protección de alcantarillas



Descripción Foto 2.

Protección de alcantarillas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	COP-478 de 2022	CIN-161-2022
OBJETO	"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". GRUPO 1 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20180000500200 (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y laguna verde") .	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$11.624.693.181,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$2.324.938.636,20	$0,00
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES	QUINCE (15) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	25/10/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor	Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	2	19
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	5	2

SEMANA N. 55 **DEL** lunes, 23 de junio de 2025 **AL** domingo, 29 de junio de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Trabajo Ejecutado	0,80%	17,91%
Valor del Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 90.100.136,75	$ 2.025.483.192,26

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO SAN ANTONIO	N/A	N/A	N/A	No se reporta actividad en este tramo
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	No se reporta actividad en este tramo
TRAMO CAPITOLIO	No se programó	56,63%	N/A	No se reporta actividad en este tramo

NOTA:

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020" GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio I (K13+820 - K6+910), Capitolio y Laguna verde	GL	$11.624.693.181,00	No se programó	No se programó	0,797%	17,91%

Tramo Laguna Verde

Personal disponible en tramo
Personal del consorcio disponible:1 residente Ambiental. 1 Topografo. 1 Cadenero. 1 Oficiales. 1 Ayudantes . 2 Operadores de retrocargador. 1 operador de minicargador. 1 Conductor de volqueta Sencilla.
Maquinaria y equipos de obra 1 Retrocargador Oruga CAT . 1 retroexcavadora. 1 Minicargador . 1 volqueta sencilla
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 Profesional Ambiental. 1 topógrafo, 1 cadenero.

Acitividades realizadas
Lunes 23 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Martes 24 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Miércoles 25 junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Jueves 26 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Viernes 27 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Sábado 28 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Domingo 29 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES TRAMO CAPITOLIO

Tramo Capitolio

Personal disponible en tramo
Personal del consorcio disponible:
Maquinaria evidenciada en el tramo:
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 Profesional Ambiental. 1 topógrafo, 1 cadenero.

Acitividades realizadas
Lunes 23 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Martes 24 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Miércoles 25 junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Jueves 26 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Viernes 27 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Sábado 28 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Domingo 29 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES TRAMO CAPITOLIO

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 478 –CONSORCIO GAVIONES 95.
Semana del 26 de mayo al 1 de junio del 2025
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Programa de información y participación comunitaria.
•Tramo Laguna Verde.
El contratista realiza la creación del grupo de WhatsApp, con el fin de mantener informada a la comunidad.
Actas de vecindad:
La interventoría solicita al contratista las actas de vecindad, quien in forma que estas ya fueron realizadas.
Actas de compromiso:
La interventoría solicita las actas de compromiso de los predios de K0+ 620 Y k0+ 480 por construcción de alcantarillas, el contratista indica que ya realizó acercamiento con la comunidad, pero no se evidencia actas
•Tramo Laguna Capitolio.
Pasacalle.
La interventoría solicita realizar reposición del pasacalle.
Actas de comprimo
La interventoría solicita hace entrega de las actas de compromiso realizadas para apertura de acopios al igual hacer entrega de actas de gestión adelantada para los cierres de los acopios.

[illegible]Programa de atención al Usuario.
A la fecha del presente informe no se ha dado apertura ni adecuación al punto de atención a la comunidad, el cual indica el componente social del contratista que se encuentra ubicado en la casa de la señora Marcela Martínez.
2.COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO GAVIONES 95.
Se participa de un comité de obra interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 45 Consorcio Gaviones 95, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social. con el fin de realizar seguimiento al proyecto.
3.COMITÉ SOCIAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO GAVIONES 95.
La interventoría realiza el comité de seguimiento social interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 7 Consorcio Gaviones 95, con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

OBSERVACIONES AL CONSORCIO GAVIONES 95
Componente SST 4ta semana de junio 2025 tramo Laguna Verde
Personal Gaviones 95
26-06-25
1 residente Ambiental. 1 Topografo. 1 Cadenero. 1 Oficiales. 1 Ayudantes . 2 Operadores de retrocargador. 1 operador de minicargador. 1 Conductor de volqueta Sencilla.
Maquinaria y equipos de obra: 1 Retrocargador Oruga CAT . 1 retroexcavadora. 1 Minicargador . 1 volqueta sencilla

[illegible] Para esta semana el consorcio Gaviones 95, realiza labores de replanteo topográfico
[illegible] Se observa señalización en excavación
[illegible] Se observa kit de emergencia en carpa
[illegible] En comité integral, se refiere la presencia del profesional SST.
[illegible] Informes semanales en revisión por parte de la interventoría.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

CONTRATO DE OBRA No. 478 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95
Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión de los informes del No 1 al No 12 remitidos por el contratista
4.Revisión de informe semanal remitido por el contratista
5.Participación del comité de seguimiento No 48; donde se realiza seguimiento al componente.
Frente Laguna Verde
-Adecuación de acopio de material triturado
-Mantenimiento de Protección de alcantarillas del área de intervención
-Replanteo de diseño geométrico segmento vial del K 2 +600
-Señalización de materiales en el frente de obra
-Permanencia de kit de emergencias y kit control de derrames en campamento
-Señalización de zona de intervención con el filtro
-No ingresaron materiales pétreos en el periodo
-No se realizó generación ni retiro de RCD en el periodo.
Frente Capitolio
-No se evidencia desarrollo de actividades por parte del contratista.
Frente San Antonio
-No se evidencia desarrollo de actividades por parte del contratista.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

No se presentan ítems no previstos

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Señalización de área de filtro



Descripción Foto 2.

Descargue de material



Descripción Foto 3.

Carpa de resguardo

Descripción Foto 4.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	COP-478 de 2022	CIN-161-2022
OBJETO	"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". GRUPO 1 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 20180000500200 (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y laguna verde") .	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$11.624.693.181,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$2.324.938.636,20	$0,00
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES	QUINCE (15) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	25/10/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor	Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	5	19
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	5	2

SEMANA N. 56 **DEL** lunes, 30 de junio de 2025 **AL** domingo, 6 de julio de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Trabajo Ejecutado	0,80%	17,91%
Valor del Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 90.100.136,75	$ 2.025.483.192,26

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO SAN ANTONIO	N/A	N/A	N/A	No se reporta actividad en este tramo
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	K1+400 Demolición de roca. K0+060 a K0+110 Instalación de geotextil. Instalación de material petreo filtrante. Instalacion de tubo perforado. **/
TRAMO CAPITOLIO	No se programó	56,63%	N/A	No se reporta actividad en este tramo

NOTA:

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020" GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio I (K13+820 - K6+910), Capitolio y Laguna verde	GL	$11.624.693.181,00	No se programó	No se programó	0,797%	17,91%

Tramo Laguna Verde

Personal disponible en tramo
Personal del consorcio disponible:1 residente Ambiental. 1 Topografo. 1 Cadenero. 1 Oficiales. 1 Ayudantes. 1 Operadores de retrocargador- 1 Conductor de volqueta Sencilla.. 1 Conductores camion.
Maquinaria y equipos de obra: 1 Retrocargador Oruga CAT. 1 Minicargador (sin operador). 1 volqueta sencilla (varada). 1 Camión
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 Profesional Ambiental. 1 topógrafo, 1 cadenero. 1 Inspector

Acitividades realizadas
Lunes 30 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Martes 01 de julio de 2025. Clima: Lluvia moderada 3:00 a 5:00 pm
Replanteo
Miércoles 02 julio de 2025. Clima: lluvia moderada
K1+400 Demolición de roca. K0+060 a K0+110 Instalación de geotextil. Instalación de material petreo filtrante.
Instalacion de tubo perforado.
Jueves 03 de julio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Viernes 04 de julio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Sábado 05 de julio de 2025. Clima: lluvia moderada
Replanteo
Domingo 06 de julio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES TRAMO CAPITOLIO

Tramo Capitolio

Personal disponible en tramo
Personal del consorcio disponible:
Maquinaria evidenciada en el tramo:
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 Profesional Ambiental. 1 topógrafo, 1 cadenero.

Acitividades realizadas
Lunes 30 de junio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Martes 01 de julio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Miércoles 02 julio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Jueves 03 de julio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Viernes 04 de julio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Sábado 05 de julio de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Domingo 06 de julio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES TRAMO CAPITOLIO: Desde abscisas K0+060 a K0+110 se evidencia material pétreo filtrante contaminado con restos de material orgánico, se solicita al contratista realizar el lavado del material pétreo y su reinstalación.
Entre abscisado K0+130 a K0+110 el geotextil tiene solape de 0,02m el cual mínimo debería ser de 0,30m tejido en área de solape y no en área de la Unión, se requiere modificar la longitud de solape.
En abscisa K1+450 se evidencia material de excavación conformado en lugar de ser acopiado, se realiza alerta temprana en conjunto con el componente ambiental para realizar la disposición del material en escombrera y no generar paisajes con el mismo.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1.ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Tramo vial Laguna Verde.
Programa de información y participación comunitaria.
Actas de vecindad:
La interventoría solicita al contratista las actas de vecindad de Laguna Verde, Capitolio y San Antonio 1, A la feche de cierre del presente informe no se cumple con la entrega. La interventoría realiza entrega de comunicado donde informa que a la fecha el Consorcio no ha cumplido con la entrega de la documentación y realiza un llamado de atención el 1 julio del año en curso, mediante comunicado 186-1-729.
Tramo Capitolio.
Pasacalle.
La interventoría solicita realizar reposición del pasacalle de frente de obra de Capitolio. La interventoría realiza entrega de comunicado donde informa que a la fecha el Consorcio no ha cumplido con la entrega de la documentación y realiza un llamado de atención el 1 julio del año en curso, mediante comunicado 186-1-729.
Volante informativo
El profesional hace entrega del volante informativo de inicio de obra a la comunidad de Laguna Verde.
Actas de compromiso.
La interventoría solicita hace entrega de las actas de compromiso realizadas para apertura y cierre de acopios de los acopios en el frente de obra de Capitolio. La interventoría realiza entrega de comunicado donde informa que a la fecha el Consorcio no ha cumplido con la entrega de la documentación y realiza un llamado de atención el 1 julio del año en curso, mediante comunicado 186-1-729.
Programa de atención al Usuario.
A la fecha del presente informe no se ha dado apertura ni adecuación al punto de atención a la comunidad, el cual indica el componente social del contratista que se encuentra ubicado en la casa de la señora Clara Martínez e indica que la atención se realizará los miércoles de 8: 30 a.m. a 3: 00 p.m. y los viernes de 8 a 12 del mediodía. La interventoría realiza entrega de comunicado donde informa que a la fecha el Consorcio no ha cumplido con la entrega de la documentación y realiza un llamado de atención el 1 julio del año en curso, mediante comunicado 186-1-729.
Vinculación de personal mano de obra.
El Consorcio Gaviones 95 cuenta en total con:
6 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:
Mano de obra calificada (MOC)
5 trabajadores profesionales.
Total, de porcentaje % 83,33 %
Mano de obra no calificada (MONC)

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Componente SST 1ra semana de julio 2025 tramo Laguna Verde
Personal Gaviones 95 // 04-07-25
1 residente Ambiental
1 Topógrafo
1 Cadenero
1 Oficiales
1 Ayudantes
2 Operadores de retrocargador.
1 operador de minicargador
1 Conductor de volqueta Sencilla.
Maquinaria y equipos de obra
1 Retrocargador Oruga CAT
1 retroexcavadora
1 Minicargador
1 volqueta sencilla
- Para esta semana el consorcio Gaviones 95, realiza labores de replanteo topográfico
- Se observa señalización en excavación
- No hay kit de emergencia en la carpa, siendo las 16:29 horas

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

CONTRATO DE OBRA No. 478 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95

Actividades Desarrolladas
1. Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2. Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3. Revisión de informe semanal remitido por el contratista
4. Participación del comité de seguimiento No 49.

Frente Laguna Verde

-Se requiere adecuación de acopio de material triturado en el frente de obra y en el acopio principal.
-Mantenimiento de Protección de alcantarillas del área de intervención
-Señalización de materiales en el frente de obra
-Permanencia de kit de emergencias y kit control de derrames en campamento
-Campamento móvil en sitio
-Señalización de zona de intervención con el filtro
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo
-No se cuenta con PMT aprobado implementado en el tramo en intervención, ni con los auxiliares de transito en sitio.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-Se evidencia acopios de RCD donde el material fue conformado en el sitio, se solicita que este material de excavación sea señalizado y cubierto mientras se procede con su retiro hacia sitio de disposición final. Acopios de K0+000 y K 1+450.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

No se presentan ítems no previstos

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

No se evidencia Kit de emergencias en carpa



Descripción Foto 2.

Acopios sin señalización



Descripción Foto 3.

Acopio RCD k1+450 requiere adecuación



Descripción Foto 4.

Entrega de volantes informativos de inicio de obra. Laguna verde.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORIA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2026	1/04/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor-Supervisión actividades de Obra	Supervisor Interventoría - Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. 49 **DEL** lunes, 2 de junio de 2025 **AL** domingo, 8 de junio de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO	21,00%	10,81%	-10,19%	
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	* Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+590 a K3+440. * Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+590 a K3+440. * Se realiza cereo aproximado de fresado 0.08mts. * Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante entre K3+400 a K3+370. Se realiza cerro aproximado. * Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+590 a K3+440. * Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+590 a K3+440. * Se realiza cereo a nivel de fresado 0.07mts. * Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+540 a K3+490. * Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+540 a K3+490. * Se realiza cereo a nivel de fresado 0.08mts. * Se realiza corte de junta para base estabilizada en k3+550. * Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+490 a K3+475. * Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+490 a K3+475. * Se realiza cereo a nivel de fresado 0.08mts.
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	Tramo 5: * Se realiza el perfilamiento subrasante entre k0+625 a k0+700. * Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante k0+625 a k0+680. 55x4.6x.10. * Se realiza aproximación de base del k0+665 a k0+700. (35×4.6×0.08)m * Se lleva a cabo replanteo de borde de vía para cunetas * Se realiza manejo de aguas escorrentías en k0+550 costado izquierdo. * Se lleva a cabo replanteo de borde de vía para cunetas k+205 a k0+400. * Se lleva a cabo aproximación de base granular en K0+455 - K0+510 * Se lleva a cabo replanteo de borde de vía para cunetas k+280 a k0+415

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	35.684.399.806,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTION TECNICA

UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 2 Ayudantes. 2Auxiliares de tráfico. 1 Boal. 1 Comisión topográfica. 1 Tecnologa SST. 1 operador de Vibrocompactador. 1 Operador Retro cargador. 1 Operador Motoniveladora. 1 Conductor Volqueta. 2 conductores de carro tanque
Maquinaria evidenciada en el tramo: 2 vibrocompactador. 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora. 1 carro tanque JTR-530. 1 carro emulsión. 1 volqueta Doble troque
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 02 de junio de 2025. Clima:
*
Martes 03 de junio de 2025. Clima: Seco
* Se realiza el perfilamiento subrasante entre k0+625 a k0+700.
* Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante k0+625 a k0+680. (55x4.6x.10)m= 25,3m3
Miércoles 04 de junio de 2025. Clima:
* Se realiza aproximación de base del k0+665 a k0+700. (35×4.6×0.08)m
* Se lleva a cabo replanteo de borde de vía para cunetas
Jueves 05 de junio de 2025. Clima:
* Se realiza manejo de aguas escorrentías en k0+550 costado izquierdo.
* Se lleva a cabo replanteo de borde de vía para cunetas k+205 a k0+400.
Viernes 06 de mayo de 2025. Clima:
* Se lleva a cabo aproximación de base granular en K0+455 - K0+510
* Se lleva a cabo replanteo de borde de vía para cunetas k+280 a k0+415
Sábado 07 de mayo de 2025. Clima:
-
Domingo 08 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - * En el punto k0+380 se evidencia una grieta producto del desplazamiento de la vía. Se solicita revisión ya que se evidencia mayor alteración. * Llega nuevo operario para el minicargador. * Se evidencia que siendonlas 3:30 PM, no llega aún la volqueta asignada al tramo para realizar labores de transporte de base granular. * Según inspección realizada en campo, se evidencia que no tienen material (Base granular- fresado estabilizado), para realizar actividades.* En el punto k0+380 se evidencia una grieta producto del desplazamiento de la vía. Se solicita revisión ya que se evidencia mayor alteración.

CAPITOLIO

Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 1 Oficial. 2 Ayudantes. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión topografica. 1 Operador vibrocompactador. 1 Operador retrocargador. 1 Conductor de volqueta. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Motoniveladora. 1 retrocargador. 1 Vibrocompactador 8tn. 1 Volqueta sencilla.
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 02 de junio de 2025. Clima: Seco
*
Martes 03 de junio de 2025. Clima:
- Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+590 a K3+440.
- Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+590 a K3+440.
- Se realiza cereo aproximado de fresado 0.08mts.
- Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante entre K3+400 a K3+370. Se realiza cerro aproximado.

Miércoles 04 de junio de 2025. Clima:
- Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+590 a K3+440.
- Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+590 a K3+440.
- Se realiza cereo a nivel de fresado 0.07mts.

Jueves 05 de junio de 2025. Clima:
- Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+540 a K3+490.
- Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+540 a K3+490.
- Se realiza cereo a nivel de fresado 0.08mts.
- Se realiza corte de junta para base estabilizada en k3+550.

Viernes 06 de mayo de 2025. Clima:
- Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+490 a K3+475.
- Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+490 a K3+475.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO: - * Se evidencia una mayoría de maquinaria varada, se realizan actividades importantes las cuales requieren del equipo completo de maquinaria. - En el punto K3+415, se evidencia que la tubería instalada previamente por gaviones 95, está presentando falta de apuntalamiento en el encole y descole de la alcantarilla lo cual genera pérdida de material y hundimiento de la vía. - Se realiza prueba de densidades con 5 puntos de referencia dando como resultado 99.5. - Se evidencia la falta de 1 óperario para el vibrocompactador de 4tn. - Se verifica que el minicargador asignado el pasado 28-04-25, ya se baro. Se solicita cambio del equipo. - se evidencia 1 punto para acción de movilidad K2+480. - se evidencia que el minicargador no tiene asegurada la cabina con el chasis, esto representa peligro para el operario. - Se evidencia reguero de aceite sobre acopio K3+600 producto de una fuga del minicargador. - se evidencia 1 punto para acción de movilidad K2+480. - Se evidencia que los acopios quedan señalizados y cubiertos. - Se evidencia que en el punto de PMT, se entierran 2 volquetas por estar intentando pasar al mismo tiempo. Se solicita mayor coordinación para evitar este tipo de inconvenientes.

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 05

Actividades realizadas
Personal disponible

Actividades realizadas
Lunes 26 de mayo de 2025. Clima:

Martes 27 de mayo de 2025. Clima:

Miércoles 28 de mayo de 2025. Clima:

Jueves 29 de mayo de 2025. Clima:

Viernes 30 de mayo de 2025. Clima:

Sábado 31 de mayo de 2025. Clima:
-
Domingo 01 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO :-

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

Tramo de Unión Tunales.
Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)

Programa de información y participación comunitaria
□ Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
□ Volante informativo
La profesional social realiza entrega de volante informativo de cierre viales donde indican durante el mes de junio realizarán cierres intermitentes por 40 minutos de 7 a.m. a 12 del mediodía y de 1p.m. a 6 p.m. la interventoría realiza revisión y da aval para fines pertinentes, los cuales serán distribuidos a la comunidad.
□ Tramo de Capitolio
Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)
Programa de información y participación comunitaria

•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.

•Volante informativo
La profesional social realiza entrega de volante informativo de cierre viales donde indican durante el mes de junio realizarán cierres intermitentes por 40 minutos de 7 a.m. a 12 del mediodía y de 1p.m. a 6 p.m. la interventoría realiza revisión y da aval para fines pertinentes, los cuales serán distribuidos a la comunidad.

Volante informativo
La profesional social hace entrega de volante informativo por imprimación de calzada la cual realizara un cierre por 2 horas.
RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV.
La interventoría realizó recorrido conjunto en los frentes de obra activos, con el de realizar seguimiento a las actividades de gestión social..
COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERMV
La interventoría invita a comité de seguimiento # 46, con e fin de realizar seguimiento al desarrollo del contrato, este no es posible realizarlo, por cuanto que el director del contrato de regalías no puede asistir al mismo.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Tramo Capitolio:
Personal UMV / 06-06-2025
1 Inspector, 1 Oficial, 1 Boal, 3 Ayudantes, 2 Auxiliar Tráfico, 1 comisión topografía, 2 Operarios vibrocompactador, 1 Operador retrocargador, 1 Conductor de volqueta, 1 operador Motoniveladora, 1 operador Minicargador, 1 vigilante
Maquinaria y equipos de obra
1 Motoniveladora, 1 retrocargador(varada), 1 Vibrocompactador 8tn, 1 vibrocompactador 4tn, 1 Volqueta sencilla(varada). 1 minicargador(varado)
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de Sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Está pendiente subsanar overoles autorizados en operadores de maquinaria.
•No se evidencia punto de hidratación
•Operarios de maquinaria amarilla, contrato 936 de 2024, Consorcio HyC el día 06 de junio de 2025, operadores de maquinaria y volqueta, no tienen preoperacional.
•Volqueta presenta golpe fuerte en la parte frontal, lo cual dificulta el cierre de la puerta izquierda además de no tener las luminarias en su totalidad funcionales.
•Se realiza observación de crear preoperacional para cada máquina ya que se evidencia que se está utilizando un solo formato para todas.
•PMT en orden
•Se evidencia aseo en baterías sanitarias
•Se observa etiquetado de sustancias químicas.
•Campamento en orden y aseo
Observaciones SST Tramo Tunales tramo 5:

Personal UMV / 04-06-2025
1 Inspector, 1 Topógrafo, 1 Cadenero, 2 Oficiales, 2 Auxiliares de trafico, 6 ayudantes, 1 conductor camioneta y/o volqueta doble. 1 Operador de Minicargador, 1 Operador de retrocargador, 1 Vigilante

Maquinaria y equipos de obra
1 Retrocargador, 1 Minicargador, 1 Mezcladora, 1 Cortadora, 1 Apisonador, 1 placa vibratoria, 1 Generador eléctrico, 1 Vibrador de concreto, 1 Volqueta doble
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•No se evidencia punto de hidratación
•Operarios de maquinaria amarilla, contrato 936 de 2024, Consorcio HyC, 04-06-2025 no se evidencia preoperacionales diligenciados.
•Se solicitó no dejar maquinaria ni vehículos parqueados al borde de la vía, en la cual la banca pueda ceder y ocurrir un accidente.
•Se ha solicitado en comités la individualización de preoperacionales de cada máquina
•Operarios de maquinaria sin uniforme identitario
•PMT en orden
•Señalización SGA en acopio combustible en orden
•Se observan 2 unidades sanitarias.
•Se observa la instalación de gel antibacterial en unidades sanitarias

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por la entidad ejecutora.
2Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3Recorrido conjunto con la profesional ambiental de la UMV al frente de obra San Antonio, con el fin de verificar componente ambiental.
4La UMV Remite Plan de compensación.
5Participación del comité de seguimiento No 46; donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente.
Frente Capitolio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
En el Km 1+000; 1+900; Km 3+500 se evidencia acopio de materiales pétreos con medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04, parcialmente implementadas, requieren adecuación, especialmente cubrimiento.
Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
Km 3+500 acopio pétreos que requiere adecuación.
Se verifico que la UMV mantiene el punto de acopio de RESPEL y combustibles señalizado y etiquetaron las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA.
Se mantiene dos unidades sanitarias portátiles, del proveedor Bamocol, estas no poseen lavamanos, cuentan con mantenimientos semanales.
Se evidencia en el km 0+485 arrastre de materiales pétreos al predio privado, se solicita realizar limpieza de inmediato, este es reiterativo.
En el Km 1+830 aún se evidencia materiales pétreos depositado directamente en el cauce y ronda de la fuente hídrica, durante la semana con el apoyo de la cuadrilla BOAL se procedió a realizar el retiro en su totalidad de los materiales depositados en el cuerpo de agua innominado.
Se verifico que donde realizaron la acción de movilidad k1+030 se mantiene el área correctamente señalizada con triple cinta. Se sugiere a la UMV realizar jornada de mejoramiento de señalización en todas las alcantarillas intervenidas.
Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos, esta actividad se inicio con el apoyo d ellos BOAL.
Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
Se mantiene punto ecológico activo y señalizado.
Se presento un derrame producto de una falla mecánica de un equipo.
Frente Tunales
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, el cual se mantiene ubicado para protegerlo de la acción de la lluvia con el fin de evitar proliferación de vectores y malos olores por descomposición de los residuos.
Las canecas de almacenamiento de combustible se mantienen rotuladas de acuerdo con el sistema globalmente armonizado se sugiere se realice seguimiento a la permanencia de esta señalización y se mantenga el área ordenada.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
En el Tramo 5 Unión Tunales desde el día 30 de abril se volvió a emplear el acopio para residuos de construcción y demolición RCD que se encuentra sobre la via en el Km 1+550, es claro que sobre espacio público no está autorizado la ubicación de ningún tipo de acopio, por lo cual se solicita retirar este material RCD de manera inmediata la UMV procedió a señalizarlo y cubrirlo, la interventoría ratifico a la UMV que no es viable la ubicación de ningún tipo de acopio en áreas de espacio público (vías).
Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
Se mantiene acopio de fresado estabilizado ubicado en el tramo dos cubiertos y señalizado, de igual manera se colocó la contención para evitar que este material continue cayendo al costado del mismo acopio, se implementó polisombra mixta.
Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
Se cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
Se evidencia realización de jornada de orden y aseo en el campamento y frente de obra.
Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Frente Capitolio: Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+490 a K3+475.



Descripción Foto 2.

Frente Capitolio: Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+490 a K3+475.



Descripción Foto 3.

Frente Tunales Tramo 5: Se lleva a cabo replanteo de borde de vía para cunetas k+280 a k0+415



Descripción Foto 4.

Verificación instalación punto de atención móvil cartelera informativa, Unión Tunales



Descripción Foto 5

Persiste Minicargador con fallas en su funcionamiento, además de presentar derrame de aceite



Descripción Foto 6

Frente Capitolio: Aplicación de imprimación

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORIA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2026	1/04/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor-Supervisión actividades de Obra	Supervisor Interventoría - Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. 50 **DEL** lunes, 9 de junio de 2025 **AL** domingo, 15 de junio de 2025

AVANCES DE OBRA

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO	21,00%	10,81%	-10,19%	K3+150 a K3+130 Perfilacion subrasante. K3+150 a K3+130 Extendida de base. K3+130 a K3+115 Trasiego de RCD. K3+120 y K3+335 Limpieza de Alcantarillas K3+130 a K3+120 Perfilacion subrasante K3+130 a K3+120 K1+420 a K1+390 Perfilacion de exceso de material saturado y barro. K3+130 a K3+120 Conformación con Rajon. (para habilitar paso en vía y retomar actividad el día siguiente) K1+100 a K1+180 Perfilacion de exceso de material saturado y barro. K1+180 a K1+170 Excavación de fallo e:0.40 Instalación de Rajon e:0.30 Sello con RAP e:0.18 (se instala este espesor para proteger vía.) K1+400 a K1+390 Reproceso excavación de fallo para recuperación de movilidad. Excavación e:0.60 Mejoramiento con Rajon e:0.40 Sello con RAP e:0.20 K1+400 a K1+415 Reproceso excavación de fallo. Excavación e= 0,60 Mejoramiento Rajon en=0,50 Sello B-200 e= 0,10 Instalación de Base Granular e=0,15 K2+800 a K2+793 Acción de movilidad instalación de Rajon e: 0,20.
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	* Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+475 a K3+440. *Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+475 a K3+440. * Se realiza cereo a nivel de fresado 0.08mts. * Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+570 a K3+450. * Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+570 a K3+450. * Se realiza cereo a nivel de vía * Se realiza imprimacion mecánica sobre carpeta de fresado estabilizado K3+570 a K3+450. * Se evidencia la extendida de base granular para protección de subrasante en K3+245 a K3+275. * Se realiza la conformación con rajon y sello con rap en el punto K3+300 a K3+340. * Se realiza la extendida de base granular sobre base conformado. K3+300 a K3+340. * Se realiza imprimacion mecánica sobre carpeta de base granular K3+300 a K3+340. * perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k2+500 al k3+440 y la abscisa del K2+220 al K2+250. * Conformación con piedra reutilizada (rajón) entre las abscisas del K2+450 al K2+455, costado izquierdo a menores. * instalación de material RAP, entre las abscisas del k2+500 al k2+440 y la abscisa del K2+220 al K2+250. * Remocion de material de escombro (limpieza de cunetas) entre las abscisas del K2+540 al K2+580, en ambos costados
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	* Se lleva a cabo chequeo de Medición de anchos y revision de alcantarillas para realce de cabezales (Desde el tramo 1 hasta el tramo 3). * Se evidencia la limpieza de 3 alcantarillas y la demarcación de las mismas. K0+450, K0+500 y K0+570. * Se realiza manejo de aguas escorrentías en el K0+540 a K0+560. * Se lleva a cabo chequeo de niveles de siseño Ko+455 - K0+600 * Se lleva a cabo chequeo de Medición de anchos y revision de alcantarillas para realce de cabezales (Desde el tramo 3 hasta el tramo 5). * Se realiza manejo de aguas escorrentías en el K0+540 a K0+560. * Se recomienda realizar una excavación más profunda debido a que el relleno de los hombros es superior al nivel de la subrasante, esto genera que el agua se filtre a la carpeta de base granular. * Se realizan puntos de control de desplazamiento de punto de bioingeniería y alcantarilla. Se marcan un total de 14 puntos. * Se realiza demarcación y levantamiento de anchos de vía entre K0+380 y K0+430. Se evidencia que según el ancho de vía se tiene que retirar parte del talud para la construcción de las cunetas costado izquierdo. Se requiere de una visita de los componentes social, ambiental y técnico para definir la intervención y el alcance de la misma. * Se realiza manejo de aguas escorrentías en el K0+540 a K0+560. * Se recomienda realizar una excavación más profunda debido a que el relleno de los hombros es superior al nivel de la subrasante, esto genera que el agua se filtre a la carpeta de base granular. * Se realiza extendida de base granular con cereo a nivel entre K0+570 a k0+620. * Se realiza materialización de niveles y verificácion de los mismos k0+570 a k0+620 * Se realiza manejo de aguas escorrentías en el K0+605 a K0+630. * Se recomienda realizar una excavación más profunda debido a que el relleno de los hombros es superior al nivel de la subrasante, esto genera que el agua se filtre a la carpeta de base granular. * Se realiza extendida de base granular con cereo a nivel entre K0+650 a k0+680. * Se realiza compactación de base granula

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	35.684.399.806,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTION TECNICA

UNIÓN TUNALES
Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 2 Ayudantes. 2Auxiliares de tráfico. 1 Boal. 1 Comisión topográfica. 1 Tecnologa SST. 1 operador de Vibrocompactador. 1 Operador Retro cargador. 1 Operador Motoniveladora. 1 Conductor Volqueta. 2 conductores de carro tanque
Maquinaria evidenciada en el tramo: 2 vibrocompactador. 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora. 1 carro tanque JTR-530. 1 carro emulsión. 1 volqueta Doble troque
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 09 de junio de 2025. Clima: Lluvia
* Se lleva a cabo chequeo de niveles de siseño Ko+455 - K0+600
Martes 10 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 11:00-12:30
* Se lleva a cabo chequeo de Medición de anchos y revision de alcantarillas para realce de cabezales (Desde el tramo 1 hasta el tramo 3).
* Se evidencia la limpieza de 3 alcantarillas y la demarcación de las mismas. K0+450, K0+500 y K0+570.
* Se realiza manejo de aguas escorrentías en el K0+540 a K0+560.
Miércoles 11 de junio de 2025. Clima: Seco
* Se lleva a cabo chequeo de Medición de anchos y revision de alcantarillas para realce de cabezales (Desde el tramo 3 hasta el tramo 5).
* Se realiza manejo de aguas escorrentías en el K0+540 a K0+560.
* Se recomienda realizar una excavación más profunda debido a que el relleno de los hombros es superior al nivel de la subrasante, esto genera que el agua se filtre a la carpeta de base granular.
* Se realizan puntos de control de desplazamiento de punto de bioingeniería y alcantarilla. Se marcan un total de 14 puntos.
* Se realiza demarcación y levantamiento de anchos de vía entre K0+380 y K0+430. Se evidencia que según el ancho de vía se tiene que retirar parte del talud para la construcción de las cunetas costado izquierdo. Se requiere de una visita de los componentes social, ambiental y técnico para definir la intervención y el alcance de la misma.
Jueves 12 de junio de 2025. Clima: Seco
* Se realiza manejo de aguas escorrentías en el K0+540 a K0+560.
* Se recomienda realizar una excavación más profunda debido a que el relleno de los hombros es superior al nivel de la subrasante, esto genera que el agua se filtre a la carpeta de base granular.
* Se realiza extendida de base granular con cereo a nivel entre K0+570 a k0+620.
* Se realiza materialización de niveles y verificácion de los mismos k0+570 a k0+620
Viernes 13 de mayo de 2025. Clima: lluvias moderadas 09:30 a 11:30- 01:00-03:30
* Se realiza manejo de aguas escorrentías en el K0+605 a K0+630.
* Se recomienda realizar una excavación más profunda debido a que el relleno de los hombros es superior al nivel de la subrasante, esto genera que el agua se filtre a la carpeta de base granular.
* Se realiza extendida de base granular con cereo a nivel entre K0+650 a k0+680.
* Se realiza compactación de base granular

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - Según inspección realizada en campo, se evidencia que no tienen material (Base granular- fresado estabilizado), para realizar actividades.
* En el punto k0+380 se evidencia una grieta producto del desplazamiento de la vía. Se solicita revisión ya que se evidencia mayor alteración. * Según inspección realizada en campo, se evidencia que no tienen material (Base granular- fresado estabilizado), para realizar actividades.
* Se evidencia que están realizando la recolección de material proveniente del desplazamiento del talud superior costado izq, se solicita revisión. * Se evidencia que la base granular aplicada en el tramo K0+450 - K0+540, se encuentra muy saturada y con acolchonamiento. Se evidencia que el punto de bioingeniería k0+381, está teniendo mayor desplazamiento. * Se realiza manejo de aguas escorrentías en el K0+605 a K0+630. * Se recomienda realizar una excavación más profunda debido a que el relleno de los hombros es superior al nivel de la subrasante, esto genera que el agua se filtre a la carpeta de base granular. * Se realiza extendida de base granular con cereo a nivel entre K0+650 a k0+680. * Se realiza compactación de base granular.

CAPITOLIO
Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 1 Oficial. 1 Boal. 2 Ayudantes. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión topografica. 1 Operador vibrocompactador. 1 Operador retrocargador. 1 Conductor de volqueta. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Motoniveladora. 1 retrocargador. 1 Vibrocompactador 8tn. 1 Volqueta sencilla. 1 Vibrocompactador. 1 Minicargador
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 09 de junio de 2025. Clima: lluvias moderadas 08:30-11:00 y 01:00-04:30
** Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+475 a K3+440.
*Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+475 a K3+440.
* Se realiza cereo a nivel de fresado 0.08mts.
Martes 10 de junio de 2025. Clima: lluvias moderadas 01:30-3:00
* Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+570 a K3+450.
* Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+570 a K3+450.
* Se realiza cereo a nivel de vía.
Miércoles 11 de junio de 2025. Clima: lluvias moderadas 12:30-2:00
- Se realiza imprimacion mecánica sobre carpeta de fresado estabilizado K3+570 a K3+450.
- Se evidencia la extendida de base granular para protección de subrasante en K3+245 a K3+275.
Jueves 12 de junio de 2025. Clima: lluvias moderadas 01:30-05:00
* Se realiza la conformación con rajon y sello con rap en el punto K3+300 a K3+340.
* Se realiza la extendida de base granular sobre base conformado. K3+300 a K3+340.
* Se realiza imprimacion mecánica sobre carpeta de base granular K3+300 a K3+340.
Viernes 13 de mayo de 2025. Clima: lluvias moderadas 11:30-02:00
* perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k2+500 al k3+440 y la abscisa del K2+220 al K2+250.
*. Conformación con piedra reutilizada (rajón) entre las abscisas del K2+450 al K2+455, costado izquierdo a menores.
*. instalación de material RAP, entre las abscisas del k2+500 al k2+440 y la abscisa del K2+220 al K2+250.
*. Remocion de material de escombro (limpieza de cunetas) entre las abscisas del K2+540 al K2+580, en ambos costados
Sábado 14 de mayo de 2025. Clima:
-
Domingo 15, de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO: - * Se evidencia el traslado de un operario del vibrocompactador del tramo 9 a tramo 6 debido a que los operarios de capitolio renunciaron. - se evidencian 3 puntos para la acción de movilidad K2+480, K2+080 y K1+500. - Se evidencia que se realizan mantenimientos de maquinarias en tramo sin cumplir con las medidas de seguridad. - Se evidencia que en el punto donde realizan mantenimiento de la maquinaria, se entierra una volqueta con peligro de volcamiento. Se solicita mayor coordinación debido a que no se esperan los tiempos de cierre.** - Se evidencian 4 puntos para la acción de movilidad K2+480, K2+080, K3+330 y K1+500. - Se evidencia que en el tramo en intervención, solo se encuentra el operario del vibrocompactador desarrollando actividades. - se evidencia que la motoniveladora asignada, se encuentra varada desde el lunes 9. - Se evidencian algunas grietas sobre hombro costado izquierdo, se solicita revisión e intervención. Se evidencia que se retira del tramo la motoniveladora GALION ya que se encuentra varada. Se evidencian 6 puntos para acción de movilidad K2+480, K2+080, K3+330, K3+040, K3+120 y K1+500. No se evidencia en tramo el residente de obra. Se solicita al oficial de obra, mayor intervención con respecto a los manejos de aguas escorrentías por los costados de la vía. Es importante manejar el drenaje del agua para evitar la saturacion de los materiales que se agreguen a la vía. K2+260 a k2+240

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 05 1 Residente técnico. 1 profesional SST. 1 profesional ambiental . 1 profesional social. 2 Inspector. 2 Oficiales. 3 Ayudantes. 1 Boal. 2 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topografica. 1 operador minicargador. 2 Operadores de Motoniveladora. 1 Operadores de retrocargador. 3 operadores de vibrocompactador. 1 Conductores camioneta. 1 conductor de volqueta. 1 Conductor de Carrotanque. 1 conductor de volqueta sencilla.
Maquinaria y equipos de obra 2 vibrocompactador. 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora (sin operador). 1 minicargador (sin operador).
Personal disponible de Interventoria: 1 residente técnico.1inspector de obra. 1 profesionalambiental.1profesional SST. 1 profesional social.1 conductor

Actividades realizadas

Lunes 09 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:30 a 12:00 y 1:00 a 4:00 pm
K3+150 a K3+130 Perfilacion subrasante
K3+150 a K3+130 Extendida de base.
K3+130 a K3+115 Trasiego de RCD
K3+120 y K3+335 Limpieza de Alcantarillas
Martes 10 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:30 a 11:00 y 1:00 a 4:00 pm
K3+130 a K3+120 Perfilacion subrasante K3+130 a K3+120
Miércoles 11 de junio de 2025. Clima: : Lluvia moderada 8:30 a 11:00 y 1:00 a 4:00 pm
K1+420 a K1+390
Perfilacion de exceso de material saturado y barro.
K3+130 a K3+120
Conformación con Rajon. (para habilitar paso en vía y retomar actividad el día siguiente)
Jueves 12 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:30 a 11:00 y 1:00 a 4:00 pm
K1+100 a K1+180 Perfilacion de exceso de material saturado y barro.
K1+180 a K1+170 Excavación de fallo e:0.40 Instalación de Rajon e:0.30 Sello con RAP e:0.18 (se instala este espesor para proteger vía.)
K1+400 a K1+390 Reproceso excavación de fallo para recuperación de movilidad. Excavación e:0.60 Mejoramiento con Rajon e:0.40 Sello con RAP e:0.20
Viernes 13 de mayo de 2025. Clima: Lluvia moderada 10:00 a 12:00am y 1:00 a 2:00 pm
K1+400 a K1+415 Reproceso excavación de fallo. Excavación e= 0,60
Mejoramiento Rajon en=0,50 Sello B-200 e= 0,10
Instalación de Base Granular e=0,15 K2+800 a K2+793
[illegible]

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO :- Gran afectación en sector del toldo, en abscisas K2+850 a K2+740, K2+630, K1+995, K1+725, K1+420 a K1+370, K1+200, K0+790, K0+200, K0+020 y K6+850 a K6+910, se requiere intervención inmediata para evitar los cierres en vía por vehículos atrapados en las zonas afectadas. Afectación de geotextil en filtro abscisas K3+020 K3+015 y K3+010. Se requiere retirar el material RCD en acopio pues afecta el desarrollo de actividades y contamina la instalación de base. El material RCD se está acopiando en el campamento cuestión que afecta la vegetación circundante. Debido a condiciones climáticas y deterioro del afirmado volquetas de contrató descargan material B-200 en vía, en esta actividad se contamina arena de río acopiado por el contratista CEV. Durante recorrido diario de interventoría se observa carro tanque de contrato atascado en paso vial afectado K1+400, generando concentración de tráfico en los cierres viales por la imposibilidad del paso. Ingresan auxiliares de tráfico para Unidad ejecutora de San Antonio 1. Se realiza cierre de vía definitivo para recuperación de puntos críticos. El contratista CEV apoya en punto crítico K2+800, con retrocargador para perfilacion de material saturado y barro el cual queda en vía. Para recuperación de puntos críticos la UMV retira la máquinaria y el personal asignado para conformación de estructura en vía. Se generar reprocesos continuos en abscisas K1+420 a K1+370 se sugiere al constructor verificar el funcionamiento del filtro y determinar la afectación debido a deterioro o daño de geotextil que provocan infiltración en el área de intervención.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

Actividades desarrolladas por el componente social.

□Tramo de Unión Tunales.

Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)

Programa de información y participación comunitaria
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Volante informativo
La profesional social realiza entrega de volante informativo de cierre viales, predio a predio en la comunidad.

•Sensibilización de cierres viales.

La profesional social realiza una sensibilización con la comunidad con el fin de brindarles la información sobre los horarios de cierres viales que se estarán manejando durante el mes de junio del año en curso y las prioridades que hay que tener en cuenta cuando se hagan estos cierres con respecto a las rutas escolares, ruta de la salud, ruta de la alimentación.

□Tramo de San Antonio El Toldo.

Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)

Programa de información y participación comunitaria

•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.

•Volante informativo
La profesional social realiza entrega de volante informativo de cierre viales donde indican durante el mes de junio realizarán cierres intermitentes por 40 minutos de 7 a.m. a 12 del mediodía y de 1p.m. a 6 p.m. la interventoría realiza revisión y da aval para fines pertinentes, los cuales serán distribuidos a la comunidad.

•Reunión con la comunidad

La supervisión del Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz, la interventoría y la Unidad de Mantenimiento vial participan en la reunión realizada en el tramo vial con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, donde se aborda las inquietudes y problemáticas presentadas por el estado actual de la vía. Esta reunión se realizó el miércoles 12 de junio del año en curso.

El jueves 12 y viernes 13 de junio del año en curso, la profesional social realiza acompañamiento en la zona con el fin de atender los requerimientos de la comunidad.
•facilita una camioneta a la comunidad con el fin de apoyar en el traslado de la canasta familiar del tramo vial san Antonio.

□Tramo de Capitolio.
Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)
Programa de información y participación comunitaria

•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.

•Volante informativo
La profesional social realiza entrega de volante informativo de cierre viales donde indican durante el mes de junio realizarán cierres intermitentes por 40 minutos de 7 a.m. a 12 del mediodía y de 1p.m. a 6 p.m. la interventoría realiza revisión y da aval para fines pertinentes, los cuales serán distribuidos a la comunidad.

□Tramo de San Antonio 1.
Programa de información y participación comunitaria
La profesional social de la Unidad de Mantenimiento Vial continua con el levantamiento de las actas de vecindad de 7 predios aledaños al área de influencia directa, se encuentra pendientes de firmas, realiza registro fotográfico y fílmico. que permite evidenciar el estado actual de las cercas, viviendas y demás elementos aledaños al tramo vial objeto de intervención.

2. RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV.
La interventoría realizó recorrido conjunto en los frentes de obra activos, con el de realizar seguimiento a las actividades de gestión social.

3. COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERMV
La interventoría invita a comité de seguimiento # 46, con e fin de realizar seguimiento al desarrollo del contrato, este no es posible realizarlo, por cuanto que el director del contrato de regalías no puede asistir al mismo.

Actividades desarrolladas por el componente social.
□Tramo de Unión Tunales.
Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)
Programa de información y participación comunitaria
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Volante informativo
La profesional social realiza entrega de volante informativo de cierre viales, predio a predio en la comunidad.
•Sensibilización de cierres viales.
La profesional social realiza una sensibilización con la comunidad con el fin de brindarles la información sobre los horarios de cierres viales que se estarán manejando durante el mes de junio del año en curso y las prioridades que hay que tener en cuenta cuando se hagan estos cierres con respecto a las rutas escolares, ruta de la salud, ruta de la alimentación.
□Tramo de San Antonio El Toldo.

Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)

Programa de información y participación comunitaria
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Volante informativo
La profesional social realiza entrega de volante informativo de cierre viales donde indican durante el mes de junio realizarán cierres intermitentes por 40 minutos de 7 a.m. a 12 del mediodía y de 1p.m. a 6 p.m. la interventoría realiza revisión y da aval para fines pertinentes, los cuales serán distribuidos a la comunidad.
•Reunión con la comunidad
La supervisión del Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz, la interventoría y la Unidad de Mantenimiento vial participan en la reunión realizada en el tramo vial con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, donde se aborda las inquietudes y problemáticas presentadas por el estado actual de la vía. Esta reunión se realizó el miércoles 12 de junio del año en curso.

El jueves 12 y viernes 13 de junio del año en curso, la profesional social realiza acompañamiento en la zona con el fin de atender los requerimientos de la comunidad.
•facilita una camioneta a la comunidad con el fin de apoyar en el traslado de la canasta familiar del tramo vial san Antonio.
□Tramo de Capitolio.
Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)
Programa de información y participación comunitaria
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Volante informativo
La profesional social realiza entrega de volante informativo de cierre viales donde indican durante el mes de junio realizarán cierres intermitentes por 40 minutos de 7 a.m. a 12 del mediodía y de 1p.m. a 6 p.m. la interventoría realiza revisión y da aval para fines pertinentes, los cuales serán distribuidos a la comunidad.

□Tramo de San Antonio 1.
Programa de información y participación comunitaria
La profesional social de la Unidad de Mantenimiento Vial continua con el levantamiento de las actas de vecindad de 7 predios aledaños al área de influencia directa, se encuentra pendientes de firmas, realiza registro fotográfico y fílmico. que permite evidenciar el estado actual de las cercas, viviendas y demás elementos aledaños al tramo vial objeto de intervención.

2. RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV.
La interventoría realizó recorrido conjunto en los frentes de obra activos, con el de realizar seguimiento a las actividades de gestión social.

3. COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERMV
La interventoría invita a comité de seguimiento # 46, con e fin de realizar seguimiento al desarrollo del contrato, este no es posible realizarlo, por cuanto que el director del contrato de regalías no puede asistir al mismo.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Componente SST 2da semana de junio 2025:
Observaciones Tramo Capitolio:

Personal UMV / 11-06-2025
1 Inspector, 1 Oficial, 1 Boal, 2 Ayudantes, 2 Auxiliar Tráfico, 1 comisión topografía, 1 Operario vibrocompactador, 1 Operador retrocargador, 1 Conductor de volqueta, 1 operador Motoniveladora, 1 operador Minicargador, 1 vigilante
Maquinaria y equipos de obra
1 Motoniveladora(varada), 1 motoniveladora trasladada del tramo de San Antonio.
1 retrocargador, 1 Vibrocompactador 8tn, 1 vibrocompactador 4tn, 1 Volqueta sencilla
1 minicargador
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de Sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•En recorrido de obra el 10-06-2025 15:00 horas solo estaba en obra operador de Vibro compactador, demás personal se encontraban en carpa.
•se subsana overoles en operadores de maquinaria.
•Se evidencia entrega de botilitos a personal para que traigan hidratación a obra
•Operarios de maquinaria amarilla, contrato 936 de 2024, Consorcio HyC el día 12 de junio de 2025, operadores de maquinaria y volqueta, no tienen preoperacional.
•Volqueta presenta golpe fuerte en la parte frontal, lo cual dificulta el cierre de la puerta izquierda además de no tener las luminarias en su totalidad funcionales.
•Se realiza observación de crear preoperacional para cada máquina ya que se evidencia que se está utilizando un solo formato para todas.
•PMT, no se observa auxiliares de tráfico en obra.
•Se evidencia aseo en baterías sanitarias
•Se observa etiquetado de sustancias químicas.

Observaciones SST Tramo Tunales tramo 5:

Personal UMV / 12-06-2025
1 oficial, 2 Ayudantes, 2 Auxiliares de tráfico, 1 Boal, 1 Tecnologa SST, 2 operarios de Vibrocompactador, 1 Operador Retro cargador, 1 Vigilante

Maquinaria y equipos de obra
2 vibrocompactador, 1 Retro cargador, 1 Motoniveladora, 1 minicargador(sin operador)
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Se evidencia entrega de botilitos a personal para que traigan hidratación a obra

•Se ha solicitado en comites la individualizacion de preoperacionales de cada maquina
•Operarios de maquinaria con uniforme identitario
•PMT en orden
•Señalización SGA en acopio combustible en orden
•Se observan 2 unidades sanitarias.
•Se observa la instalación de gel antibacterial en unidades sanitarias

Observaciones SST Tramo San Antonio:
Personal UMV / 12-06-2025
1 residente técnico, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 2 Inspector, 2 Oficiales, 5 Ayudantes, 1 Boal, 4 Auxiliar Tráfico, 1 Comisión Topográfica
1 operador minicargador, 2 Operadores de Motoniveladora, 1 Operadores de retrocargador. 3 operadores de vibrocompactador, 1 Conductores camioneta.
1 conductor de volqueta. 1 Conductor de Carrotanque, 1 conductor de volqueta sencilla.
1 vigilante

Maquinaria y equipos de obra
1 Motoniveladoras(se retira del frente la otra motoniveladora con destino frente Capitolio marca RHINO. 1 Vibrocompactador, 1 Vibrocompactador (operativo sin potencia y sin horómetro), 2 minicargador, 1 Retrocargador CAT (ingresa al frente), 1 Retrocargador Luding, 1 Carrotanque, 1 Volquetas Doble (una del proyecto y la otra de misionalidad)
1 volqueta sencilla (operativo), 1 volqueta doble, Maquinaria de misionalidad, 1 vibrocompactador mixto.
Maquinaria de misionalidad
1 vibrocompactador mixto
Observaciones SST:
•Personal de Sintrauniobras con EPP y overol en orden
•PMT en orden
•Se observa equipos de emergencia (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames) Se realiza observación de mantener despajado estos implementos
•Operadores de maquinaria contrato 936 de 2024, Consorcio HyC, operador de motoniveladora y volqueta sin preoperacional
•Se observan acopios de material granular y pétreos sin señalización
•En comité integral se reiteró preoperacional acorde a cada máquina.
•Operadores de maquinaria no están portando uniforme identitario
•No se observa puntos de hidratación.
•Señalización de acopios de sustancias químicas y de seguridad en orden
•Se observa kits de emergencia en orden

•Se observan 3 unidades sanitarias en terreno, para esta semana se les realizó aseo
•Se observa instalación de potes de gel antibacterial en unidades sanitarias.
•Se observó camioneta acargo de la UMV, realizando traslado de personal en nel platón de la camioneta, (acto y condición insegura)

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por la entidad ejecutora.
2Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3Recorrido conjunto con la profesional ambiental de la UMV al frente de obra San Antonio, con el fin de verificar componente ambiental, alcantarillas con permiso ocupación de cauce POC
4La UMV Remite actualización de PAGA
5La UMV remite informe de mayo de 2025, se procede a revisión y emitir observaciones respectivas para que sean atendidas.
6Participación del comité de seguimiento No 46; donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente.

Frente Capitolio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
Se verifico que donde realizaron la acción de movilidad k1+030 se requiere que el área sea correctamente señalizada con triple cinta y se evidencia acopio de materiales pétreos sin medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04.
Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
Se verifico que la UMV mantiene el punto de acopio de RESPEL y combustibles señalizado y etiquetaron las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA.
Se mantiene dos unidades sanitarias portátiles, del proveedor Bamocol, estas no poseen lavamanos, cuentan con mantenimientos semanales.
Se evidencia en el km 0+485 arrastre de materiales pétreos al predio privado, la limpieza inicio desde el pasado 06 de junio de 2025.
En el Km 1+830 cuerpo de agua la UMV procedió a retirar el material pétreo depositado en la ronda y cauce con el apoyo de la cuadrilla BOAL, actividad que será verificada conjuntamente con la UMV.
Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos, esta actividad se inicio con el apoyo de los BOAL. Esta es una actividad continua.
Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
Se mantiene punto ecológico activo y señalizado.
Se realizo recomendación al contratista de maquinaria que cuando se proceda a realizar reparaciones puntuales de equipos se tomen las medidas de manejo ambiental respectivas, como aislar el suelo con plástico para evitar posibles contaminaciones del suelo y agua por escorrentía
Frente Tunales
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
Se solicito adecuar acopio de pétreos ubicado en el predio del señor Gilberto y evacuarlo.
En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, el cual se mantiene ubicado para protegerlo de la acción de la lluvia con el fin de evitar proliferación de vectores y malos olores por descomposición de los residuos.
Las canecas de almacenamiento de combustible se mantienen rotuladas de acuerdo con el sistema globalmente armonizado se sugiere se realice seguimiento a la permanencia de esta señalización y se mantenga el área ordenada.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
En el Tramo 5 Unión Tunales desde el día 30 de abril se volvió a emplear el acopio para residuos de construcción y demolición RCD que se encuentra sobre la via en el Km 1+550, es claro que sobre espacio público no está autorizado la ubicación de ningún tipo de acopio, por lo cual se solicita retirar este material RCD de manera inmediata la UMV procedió a señalizarlo y cubrirlo, la interventoría ratifico a la UMV que no es viable la ubicación de ningún tipo de acopio en áreas de espacio público (vías).
Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
Se mantiene acopio de fresado estabilizado ubicado en el tramo dos cubiertos y señalizado, de igual manera se colocó la contención para evitar que este material continue cayendo al costado del mismo acopio, se implementó polisombra mixta.
Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
Se cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
Se evidencia realización de jornada de orden y aseo en el campamento y frente de obra.
Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
Se cuenta con dos unidades sanitarias en sitio del proveedor Bamocol, las cuales no cuentan con lavamanos, se evidencia mantenimientos semanales. .

Frente San Antonio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
-En el Km 3+100 se evidencian arboles afectados por disposición de material pétreo, requiere limpieza, adecuación y evaluar la instalación de contención de materiales. Se solicita dar prioridad a la evacuación de los RCD de este predio y conformar de manera correcta el área.
-Se solicita retiro de RCD acopiados al costado de la via en el k 3+100
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-El punto de acopio de RESPEL y combustibles se mantiene señalizado y etiquetadas las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA. El punto de acopio de sustancias químicas se mantiene adecuado y cubierto.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). acopio km 2+350, km 1+655 y km 0+730.
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
-Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
-Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, y protegido de la acción de la lluvia.
-Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT (señales 200 y 100 mts inicio de obra, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
-Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
-En comité de obra No 47 se reiteró a la UMV evacuar hacia sitio de disposición final autorizado los materiales RCD almacenados en distintos acopios, lo anterior debido a que superan en tiempo máximo permitido para permanencia en obra.
-Se cuenta con tres unidades sanitarias portátiles del proveedor Bamocol, las cuales son poseen lavamanos.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)



Descripción Foto 1.

Frente San Antonio. Chequeo de niveles de siseño Ko+455 - K0+600



Descripción Foto 2.

Frente Capitolio. Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+475 a K3+440.



Descripción Foto 3.

Frente San Antonio. Perfilacion subrasante K3+130 a K3+115



Descripción Foto 4.

Frente San Antonio. Perfilacion subrasante K3+130 a K3+120



Descripción Foto 5

Frente Unión Tunales. Se realizan puntos de control de desplazamiento de punto de bioingeniería y alcantarilla. Se marcan un total de 14 puntos.



Descripción Foto 6

Frente Unión Tunales. Se realizan puntos de control de desplazamiento de punto de bioingeniería y alcantarilla. Se marcan un total de 14 puntos.



Descripción Foto 7

Frente San antonio. Acompañamiento a la reunión extraordinaria de San Antonio El Toldo



Descripción Foto 8

Frente San Antonio. Acompañamiento apoyo traslado de la canasta familiar, San Antonio El Toldo.



Descripción Foto 9

Frente San Antonio. Inspección Kit control derrames



Descripción Foto 10

Frente Capitolio. Acopio de pétreos que requiere delimitación.



Descripción Foto 11

Frente San Antonio. Motoniveladora con extintor vencido



Descripción Foto 12

Frente Tunales. Entrega de botillos para traer hidratación

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORIA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2026	1/04/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor-Supervisión actividades de Obra	Supervisor Interventoría - Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS	10	2

SEMANA N. 50 **DEL** lunes, 16 de junio de 2025 **AL** domingo, 22 de junio de 2025

AVANCES DE OBRA

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO 2 EL TOLDO	21,00%	10,81%	-10,19%	K1+640 a K1+720 Replanteo de bordes de vía. K1+200 a K1+208 Excavación de fallo e:0.30 Instalación de Rajon e:0.20 Sello con RAP e:0.10 K1+400 a K1+370 Reproceso retiro de base granular saturada y Rajon contaminado 1. perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k2+200 al k2+260. 2. Conformación con piedra reutilizada (rajón) entre las abscisas del K2+080 al K2+100. 3. instalación de material RAP, entre las abscisas del k2+200 al k2+230. 4. Remocion de material de escombro (limpieza de cunetas) entre las abscisas del K2+080 al K2+105, en ambos costados K1+397 a K1+390 Reproceso Acción de movilidad Excavación e=0,60 Mejoramiento con Rajon e=0,40 Sello con Rap e=0,18 Identificación de puntos críticos para la movilidad. K6+950 Instalación de campamento K1+390 a K1+400 izq Reproceso Acción de movilidad Excavación e=0,40 Mejoramiento con Rajon e=0,25 Sello con Rap e=0,15 K1+402 a K1+409 der Reproceso Acción de movilidad Excavación e=0,80 Mejoramiento con Rajon e=0,50 Sello con Rap e=0,25 K1+380 a K1+400 Conformación con base granular. K1+390 a K1+350 Der e Izq Manejo de aguas lluvias.
TRAMO SAN ANTONIO 1				K3+090 a K6+980 a K9+230 Traslado de Campamento y unidades sanitarias portátiles. K9+100 a K9+071 (ancho 4,60m) Perfilacion de material saturado. Conformación de piedra Rajon existente entre reutilizada. Sello de Rajon con material Arcilloso existente. K9+071 a K9+100 Manejo de aguas lluvias. Identificación de puntos críticos para la movilidad. K6+950 Instalación de campamento K8+640 a K8+630 izq Manejo de aguas lluvias. K2+860 a K2+740 Acción de movilidad apoyo el toldo
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	* Perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k2+200 al k3+150. * Conformación con piedra reutilizada (rajón) entre las abscisas del K2+1600 al K2+170, costado izquierdo a mayores * Instalación de material RAP, entre las abscisas del k2+200 al k2+260. * Remocion de material de escombro (limpieza de cunetas) entre las abscisas del K2+150 al K2+260, en ambos costados *. Perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k3+180 al k3+230. *. Retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+345 al K3+325 y k3+213 al k3+205. *. Remocion de material de escombro (limpieza de cunetas) entre las abscisas del K2+080 al K2+105, en ambos costados * Perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k3+280 al k3+385. * . Se realiza extendida de base granular y cerró a nivel entre k3+280 a k3+385. *. Retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+320 al K3+350. *Perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k3+400 al k3+405. * Se realiza extendida de base granular y cerró a nivel entre k3+320 a k3+340. *. Retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+400 al K3+405 4.6 x.60.
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	Tramo 5 * Se realiza manejo de aguas escorrentías en el K0+605 a K0+630. * Se recomienda realizar una excavación más profunda debido a que el relleno de los hombros es superior al nivel de la subrasante, esto genera que el agua se filtre a la carpeta de base granular. * Se realiza perfilación de subrasante a nivel de cota desde k0+710 a k0+740. * Se realiza extendida de base granular con cereo aproximado 0.08 entre K0+710 a k0+740. * Se realiza compactación de base granular. * Se realiza perfilación de subrasante a nivel de cota desde k0+715 a k0+860. * Se realiza extendida de base granular con cereo aproximado 0.08 entre K0+715 a k0+850. * Se realiza compactación de base granular * Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+625 a k0+720. Se revisan cortes y rellenos de vía. * Se realiza compactación de base granular. * Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+720 a k0+790. Se revisan cortes y rellenos de vía. * Se realiza manejo de aguas escorrentías y retiro de talud que se desprende en el k0+480 a k0+500. Está actividad se realiza manualmente para evitar que la actividad mecánica afecte el desplazamiento. * Se realiza intervención de hombro izquierdo del k0+650 a k0+670, donde se escarificación y remplazo del material saturado. 20x.80x0.15 * Se realiza compactación de base granular. * Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+705 a k0+770. esto teniendo en cuenta la modificación del hombro. * Se realiza manejo de aguas escorrentías y retiro de talud que se desprende en el k0+705 a k0+710. Está actividad se realiza manualmente para evitar que la actividad mecánica afecte el desplazamiento. * Se realiza excavación mecánica para conformar la zanja-cuneta en el tramo k0+001 a k0+015. * Se realiza mezcla heterogénea (cemento, grava, recebo y agua). Para realizar cuneta de conducción de agua escorrentías. * Se realiza compactación de base granular.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL	GLB	35.684.399.806,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNIÓN TUNALES
Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 2 Ayudantes. 2Auxiliares de tráfico. 1 Boal. 1 Comisión topográfica. 1 Tecnologa SST. 1 operador de Vibrocompactador. 1 Operador Retro cargador. 1 Operador Motoniveladora. 1 Conductor Volqueta. 2 conductores de carro tanque
Maquinaria evidenciada en el tramo: 2 vibrocompactador. 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora. 1 carro tanque JTR-530. 1 carro emulsión. 1 volqueta Doble troque
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.
Actividades realizadas
Lunes 16 de junio de 2025. Clima: seco
* Se realiza manejo de aguas escorrentías en el K0+605 a K0+630.
* Se recomienda realizar una excavación más profunda debido a que el relleno de los hombros es superior al nivel de la subrasante, esto genera que el agua se filtre a la carpeta de base granular.
* Se realiza perfilación de subrasante a nivel de cota desde k0+710 a k0+740.
* Se realiza extendida de base granular con cereo aproximado 0.08 entre K0+710 a k0+740.
* Se realiza compactación de base granular.
Martes 17 de junio de 2025. Clima: lluvias moderadas 01:00-03:30
* Se realiza perfilación de subrasante a nivel de cota desde k0+715 a k0+860.
* Se realiza extendida de base granular con cereo aproximado 0.08 entre K0+715 a k0+850.
* Se realiza compactación de base granular
Miércoles 18 de junio de 2025. Clima:
* Se realiza replanteo y materializacion de niveles entre k0+625 a k0+720. Se revisan cortes y rellenos de vía.
* Se realiza compactación de base granular.
Jueves 19 de junio de 2025. Clima:
* Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+720 a k0+790. Se revisan cortes y rellenos de vía.
* Se realiza manejo de aguas escorrentías y retiro de talud que se desprende en el k0+480 a k0+500. Está actividad se realiza manualmente para evitar que la actividad mecánica afecte el desplazamiento.
* Se realiza intervención de hombro izquierdo del k0+650 a k0+670, donde se escarificación y remplazo del material saturado. 20x.80x0.15
* Se realiza compactación de base granular.
Viernes 20 de junio de 2025. Clima:
* Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+705 a k0+770. esto teniendo en cuenta la modificación del hombro.
* Se realiza manejo de aguas escorrentías y retiro de talud que se desprende en el k0+705 a k0+710. Está actividad se realiza manualmente para evitar que la actividad mecánica afecte el desplazamiento.
* Se realiza excavación mecánica para conformar la zanja-cuneta en el tramo k0+001 a k0+015.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - * Se evidencia que la carpeta de base granular, presenta buenas condiciones de humedad, compactación y consistencia. Son 200mts los que ya tienen en pista, se solicita poder realizar extendida de fresado

para aprovechar la pista existente. * Se evidencia que están realizando la recolección de material proveniente del desplazamiento del talud superior costado izq, se solicita revisión ya que el mismo presenta afectación de cercas. * Se evidencia que el punto de bioingeniería k0+381, está teniendo mayor desplazamiento. * Se realiza seguimiento al desplazamiento del punto k0+380. Ya se evidencia una diferencia de 1.5 CM con respecto a la semana pasada. *** Desde el día lunes se tiene en tramo el minicargador bobcat varado, no se evidencia ningun mantenimiento. * Se evidencia que la carpeta de base granular, presenta buenas condiciones de humedad, compactación y consistencia. Son 280mts los que ya tienen en pista, se solicita poder realizar una extendida de fresado para aprovechar la pista existente. * Se evidencia que están realizando la recolección de material proveniente del desplazamiento del talud superior costado izq, se solicita revisión ya que el mismo presenta afectación de cercas. * Se evidencia que el punto de bioingeniería k0+380, está teniendo mayor desplazamiento. * Se realiza visita técnica y ambiental con el profesional forestal del CEV, donde se evidencia que la reducción de carril en el punto k0+390 a k0+420, se tendría que realizar una solicitud ante el ministerio de ambiente para poder reubicar los árboles que se verían afectados por el corte del talud. Se propone realizar una intervención contemplando la medida de la cuneta como Berna para cumplimiento de ancho de vía(4.6mts). * Desde el día viernes (13/06/25) se tiene en tramo el minicargador bobcat varado, no se evidencia ningun mantenimiento. Se solicita retiro de la máquina. * Se evidencia que la carpeta de base granular, presenta buenas condiciones de humedad, compactación y consistencia. Son 280mts los que ya tienen en pista, se solicita poder realizar una extendida de fresado para aprovechar la pista existente. * Se evidencia que están realizando la recolección de material proveniente del desplazamiento del talud superior costado izq, se solicita revisión ya que el mismo presenta afectación de cercas.

CAPITOLIO

Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 1 Oficial. 1 Boal. 2 Ayudantes. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión topografica. 1 Operador vibrocompactador. 1 Operador retrocargador. 1 Conductor de volqueta. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Motoniveladora. 1 retrocargador. 1 Vibrocompactador 8tn. 1 Volqueta sencilla. 1 Vibrocompactador. 1 Minicargador
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 16 de junio de 2025. Clima: lluvias moderadas 11:30-12:30
* perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k2+200 al k3+150.
* Conformación con piedra reutilizada (rajón) entre las abscisas del K2+1600 al K2+170, costado izquierdo a mayores
* instalación de material RAP, entre las abscisas del k2+200 al k2+260.
* Remocion de material de escombro (limpieza de cunetas) entre las abscisas del K2+150 al K2+260, en ambos costados
Martes 17 de junio de 2025. Clima:lluvias moderadas 01:30-03:30
*. perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k2+200 al k2+260.
*. Conformación con piedra reutilizada (rajón) entre las abscisas del K2+080 al K2+100.
*. instalación de material RAP, entre las abscisas del k2+200 al k2+230.
*. Remocion de material de escombro (limpieza de cunetas) entre las abscisas del K2+080 al K2+105, en ambos costados
Miércoles 18 de junio de 2025. Clima:
*. perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k3+180 al k3+230.
*. retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+345 al K3+325 y k3+213 al k3+205.
*. Remocion de material de escombro (limpieza de cunetas) entre las abscisas del K2+080 al K2+105, en ambos costados
Jueves 19 de junio de 2025. Clima:
* perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k3+280 al k3+385.
* . Se realiza extendida de base granular y cerró a nivel entre k3+280 a k3+385.
*. retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+320 al K3+350.
Viernes 20 de junio de 2025. Clima:
*Perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k3+400 al k3+405.
*.Se realiza extendida de base granular y cerró a nivel entre k3+320 a k3+340.
*. Retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+400 al K3+405 4.6 x.60.
Sábado 21 de junio de 2025. Clima:

Domingo 22 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO: - * Se evidencia el traslado de un operario del vibrocompactador del tramo 9 a tramo 6 debido a que los operarios de capitolio renunciaron. - se evidencian 3 puntos para la acción de movilidad K2+480, K2+080 y K1+500. - Se evidencia que se realizan mantenimientos de maquinarias en tramo sin cumplir con las medidas de seguridad. - Se evidencia que en el punto donde realizan mantenimiento de la maquinaria, se entierra una volqueta con peligro de volcamiento. Se solicita mayor coordinación debido a que no se esperan los tiempos de cierre.** - Se evidencian 4 puntos para la acción de movilidad K2+480, K2+080, K3+330 y K1+500. - Se evidencia que en el tramo en intervención, solo se encuentra el operario del vibrocompactador desarrollando actividades. - se evidencia que la motoniveladora asignada, se encuentra varada desde el lunes 9. - Se evidencian algunas grietas sobre hombro costado izquierdo, se solicita revisión e intervención. Se evidencia que se retira del tramo la motoniveladora GALION ya que se encuentra varada. Se evidencian 6 puntos para acción de movilidad K2+480, K2+080, K3+330, K3+040, K3+120 y K1+500. No se evidencia en tramo el residente de obra. Se solicita al oficial de obra, mayor intervención con respecto a los manejos de aguas escorrentías por los costados de la vía. Es importante manejar el drenaje del agua para evitar la saturacion de los materiales que se agreguen a la vía. K2+260 a k2+240. *** Se realiza cambio del retrocargador Terex por un Jhon Deere. * Se evidencia un fallo que por tercera vez necesita intervención. Se solicita mayor cama con rajon k3+430 y k3+405. - No se evidencia en tramo el residente de obra. - Se evidencian algunas grietas sobre hombro costado izquierdo. Adicionalmente se evidencian algunas bateas sobre los costados. Se solicita revisión e intervención.

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 09 1 Residente técnico. 1 profesional SST. 1 profesional ambiental . 1 profesional social. 2 Inspector. 2 Oficiales. 3 Ayudantes. 1 Boal. 2 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topografica. 1 operador minicargador. 2 Operadores de Motoniveladora. 1 Operadores de retrocargador. 3 operadores de vibrocompactador. 1 Conductores camioneta. 1 conductor de volqueta. 1 Conductor de Carrotanque. 1 conductor de volqueta sencilla.
Maquinaria y equipos de obra 2 vibrocompactador. 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora (sin operador). 1 minicargador (sin operador).
Personal disponible de Interventoría: 1 residente técnico. 1 inspector de obra. 1 profesionalambiental.1 profesional SST. 1 profesional social.1 conductor

Actividades realizadas
Lunes 16 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 10:00 a 12:00am y 1:00 a 3:00 pm
K1+640 a K1+720 Replanteo de bordes de vía.
K1+200 a K1+208 Excavación de fallo e:0.30
Instalación de Rajon e:0.20
Sello con RAP e:0.10 K1+400 a K1+370
Reproceso retiro de base granular saturada y Rajon contaminado
Martes 17 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 10:00 a 11:00am
K1+397 a K1+390 Reproceso Acción de movilidad
Excavación e=0,60 Mejoramiento con Rajon e=0,40 Sello con Rap e=0,18
Miércoles 18 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:30 a 9:30am
K1+390 a K1+400
Reproceso Acción de movilidad
Excavación e=0,40 Mejoramiento con Rajon e=0,25 Sello con Rap e=0,15
Jueves 19 de junio de 2025. Clima: seco
K1+390 a K1+400 izq Reproceso Acción de movilidad
Excavación e=0,40 Mejoramiento con Rajon e=0,25 Sello con Rap e=0,15
Viernes 20 de junio de 2025. Clima: seco
K1+402 a K1+409 der Reproceso Acción de movilidad
Excavación e=0,80 Mejoramiento con Rajon e=0,50 Sello con Rap e=0,25
K1+380 a K1+400 Conformación con base granular.
K1+390 a K1+350 Der e Izq Manejo de aguas lluvias .
Sábado 21 de junio de 2025. Clima:

Domingo 22 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO :- La acción de movilidad en abscisas K1+400 a K1+370 no estabiliza el área no se sella el material, el cual el día de hoy se evidencia saturado por lluvias. La UMV realiza recorrido en identifica 14 puntos críticos para la movilidad en abscisas K3+125, K2+800, K2+660, K2+330, K1+910, K1+860K1+815, K1+705,K1+690K1+202, K0+730, K0+320, K0+200 y K0+050 actualmente se encuentra en intervención K1+400. En área de intervención K1+400 en horas de la tarde queda volqueta doble de la UMV enterrada. Los cierres viales superan los 30min, debido a trabajos de reproceso en vía abscisa K1+420. Se indica al encargado de obra que las instalacion de Rajon debe realizarse en capas selladas y compactadas, para evitar fallos internos. Se requiere definir la orientación del abscisado y materializarlo en campo. Se evidencia presencia de la UMV en frente San Antonio 1. Recorrido verificación Permisos Cause-ocupacion. En tramo 9 Toldo se verifican los permisos faltantes. Se separan las unidades ejecutoras. Se interviene la parte izquierda del fallo en abscisa K1+400. Se retiran del frente de obra las máquinas y vehículos de misionalidad. Se separan las unidades ejecutoras. Se interviene la parte izquierda del fallo en abscisa K1+400. Se retiran del frente de obra las máquinas y vehículos de misionalidad.** Se evidencia material de mejoramiento Rajon contaminado desde el acopio. Debido a avería en retrocargador CAT se ve afectado el normal avance de obra

TRAMO SAN ANTONIO 1

Personal disponible en tramo 09 1 Inspector. 1 Oficiales. 1 Ayudantes. 1 Comisión Topografica. 1 Conductor camioneta.
Maquinaria y equipos de obra N/A. 1 Retrocargador Luding. 1 Vibrocompactador doble tándem Ammann. 1 Volqueta Doble
Personal disponible de Interventoría: 1 residente técnico. 1 inspector de obra. 1 profesionalambiental.1 profesional SST. 1 profesional social.1 conductor

Actividades realizadas
Lunes 16 de junio de 2025. Clima:
Martes 17 de junio de 2025. Clima:
Miércoles 18 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:30 a 9:30am
Identificación de puntos críticos para la movilidad.
K6+950 Instalación de campamento
Jueves 19 de junio de 2025. Clima: seco
K3+090 a K6+980 a K9+230 Traslado de Campamento y unidades sanitarias portátiles.
K9+100 a K9+071 (ancho 4,60m) Perfilacion de material saturado.
Conformación de piedra Rajon existente entre reutilizada.
Sello de Rajon con material Arcilloso existente.
K9+071 a K9+100 Manejo de aguas lluvias.
Viernes 20 de junio de 2025. Clima: seco
K8+640 a K8+630 izq Manejo de aguas lluvias.
K2+860 a K2+740 Acción de movilidad apoyo el toldo
OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 1 Se requiere definir la orientación del abscisado y materializarlo en campo. Se evidencia presencia de la UMV en frente San Antonio 1
Recorrido verificación Permisos Cause-ocupacion En Tramo 9 San Antonio 1 no se puede verificar los permisos debido a que el tramo NO tiene un abscisado continuo que permita establecer la ubicación exacta de alcantarillas existentes o proyectadas
Se ejecutan acciones de movilidad en este frente. El minicargador Bobcat presenta avería, el contratista se compromete a solucionarlo el martes

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

Actividades desarrolladas por el componente social.
□Tramo de Unión Tunales.

Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)
Programa de información y participación comunitaria
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.

□Tramo de San Antonio El Toldo.

Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)

Programa de información y participación comunitaria

•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.

•Reunión con la comunidad

La profesional social realiza atención a la comunidad, por solicitud de la comunidad se participa de una reunión donde los residentes de la vereda de San Antonio y Toldo Manifiestan su preocupación por el estado actual de la vía. La UMV atiende solicitud comprometiéndose a sacar los fallos que se encuentran en el tramo vial durante el mes de junio año 2025.

□Tramo de Capitolio.
Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)
Programa de información y participación comunitaria

•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente. .

2. RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV.
La interventoría realizó recorrido conjunto en los frentes de obra activos, con el de realizar seguimiento a las actividades de gestión social.

3. COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERMV
La interventoría realiza el comité de seguimiento integral 48, con el fin de realizar seguimiento al desarrollo del contrato.
4. INFORMES MENSUALES
La profesional social hace entrega del informe mensual social N° 12 mes de mayo del 2025, es revisado por la interventoría y presenta observaciones

1.INFORMES SEMANALES

El consorcio se encuentra al día en el reporte de informes semanales.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Observaciones Tramo Capitolio:

Personal UMV / 17-06-2025
1 Inspector. 1 Oficial. 1 Boal. 2 Ayudantes. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión topografía. 1 Operario vibrocompactador . 1 Operador retrocargador. 1 Conductor de volqueta. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador. 1 vigilante
Maquinaria y equipos de obra: 1 Motoniveladora(varada). 1 motoniveladora. 1 retrocargador. 1 Vibrocompactador 8tn. 1 vibrocompactador 4tn. 1 Volqueta sencilla. 1 minicargador
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de Sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Unidades sanitarias en orden y aseo.
•Se observa maquinaria sin sticker del contrato.
•Minicargador marca HAMM, no le funciona alarma de reversa
•Operarios de maquinaria amarilla, contrato 936 de 2024, Consorcio HyC tienen preoperacional en orden.
•Volqueta presenta golpe fuerte en la parte frontal, lo cual dificulta el cierre de la puerta izquierda además de no tener las luminarias en su totalidad funcionales.
•Se crea preoperacional para cada máquina, se subsana esta observación, pero es conveniente reviasr ya que hay algunos puntos que se repiten en las filas del formato.
•PMT, en orden.
•Se evidencia aseo en baterías sanitarias
•Se observa etiquetado de sustancias químicas.

Observaciones SST Tramo Tunales tramo 5:

Personal UMV / 17-06-2025
1 oficial. 1 Ayudantes. 2 Auxiliares de tráfico. 1 Boal . 1 Tecnologa SST. 2 operarios de Vibrocompactador. 1 Operador Retro cargador. 1 operario motoniveladora. 1 operario minicargador. 1 operario carro tanque. 1 Vigilante
Maquinaria y equipos de obra: 2 vibrocompactador. 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora. 1 Minicargador Bobcat (averiado desde el 14-06-2025 al 20-06-2025). 1 Carro Tanque

Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Operarios de minicargador y Vibro compactador sin uniforme identitario
•Se observa maquinaria sin sticker del contrato.
•PMT en orden
•Señalización SGA en acopio combustible en orden
•Se observan 2 unidades sanitarias en orden.
•Se observa la instalación de gel antibacterial en unidades sanitarias
•Se realiza observación de revisar el estado de desgaste de llantas del minicargador

Observaciones SST Tramo San Antonio El Toldo:
Personal UMV / 19-06-2025
1 residente técnico. 1 profesional SST. 1 profesional ambiental . 1 profesional social. 1 Inspector. 1 Oficiales. 4 Ayudantes. 4 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topográfica. 2 operadores minicargador. 1 Operadores de Motoniveladora.. 2 Operadores de retrocargador. 3 operadores de vibrocompactador.
1 Conductores camioneta. 1 conductor de volqueta. 1 Conductor de Carrotanque. 1 Conductor de volqueta sencilla 1 vigilante
Maquinaria y equipos de obra: 1 Motoniveladoras. 1 Vibrocompactador. 2 minicargador. 1 Retrocargador CAT . 1 Carrotanque . 1 volqueta sencilla . 3 Volquetas dobles.

Observaciones SST Tramo San Antonio Tramo 9:

1 Inspector. 1 Oficiale. 1 Ayudantes. 1 Comisión Topográfica. 1 Conductor camioneta.. 1 Conductor de volqueta. 1 Operador de retrocargador. 1 Operador de Vibrocompactador
Maquinaria y equipos de obra contrato 936: 1 Retrocargador Luding. 1 Vibrocompactador doble tándem Amman. Maquinaria y equipos del proyecto. 1 Volqueta Doble
Observaciones SST:
•Personal de Sintrauniobras con EPP y overol en orden
•PMT en orden
•Se observa equipos de emergencia (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames) Se realiza observación de mantener despajado estos implementos
•Operadores de maquinaria contrato 936 de 2024, Consorcio HyC, operador de motoniveladora y volqueta con preoperacional en orden
•Se observan acopios de material granular y pétreos con señalización
•Señalización de acopios de sustancias químicas y de seguridad en orden
•Se observan 4 unidades sanitarias en terreno, en orden y aseo
•Se observa instalación de potes de gel antibacterial en unidades sanitarias.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por la entidad ejecutora.
2Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3Recorrido conjunto con la profesional ambiental de la UMV al frente de obra San Antonio, con el fin de verificar componente ambiental, alcantarillas con permiso ocupación de cauce POC
4Revisión del Plan de adaptación de la guía ambiental PAGA y aval del mismo
5Revisión del informe semanal enviado por le entidad ejecutora.
6Se solicito la entrega de los ajustes del informe de abril
7Participación del comité de seguimiento No 47; donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente.

Frente Capitolio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
Se verifico que donde realizaron la acción de movilidad k1+030 se requiere que el área sea correctamente señalizada con triple cinta y se evidencia acopio de materiales pétreos sin medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04. Reiterativo
Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.

Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
Se verifico que la UMV mantiene el punto de acopio de RESPEL y combustibles señalizado y etiquetaron las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA.
Se mantiene dos unidades sanitarias portátiles, del proveedor Bamocol, estas no poseen lavamanos, cuentan con mantenimientos semanales.
Se evidencia en el km 0+485 arrastre de materiales pétreos al predio privado, la limpieza inicio desde el pasado 06 de junio de 2025.
Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos, esta actividad se inició con el apoyo de los BOAL. Esta es una actividad continua.
Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
Se mantiene punto ecológico activo y señalizado.
Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
Se mantiene recomendación al contratista de maquinaria que cuando se proceda a realizar reparaciones puntuales de equipos se tomen las medidas de manejo ambiental respectivas, como aislar el suelo con plástico para evitar posibles contaminaciones del suelo y agua por escorrentía.
Frente Tunales
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
Se solicito adecuar acopio de pétreos ubicado en el predio del señor Gilberto y el ubicado al lado del colegio y evacuarlo. Reiterativo
Se evidencio retiro total de los RD acopiados al lado de la via en tunal bajo Km 1+550,
En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, el cual se mantiene ubicado para protegerlo de la acción de la lluvia con el fin de evitar proliferación de vectores y malos olores por descomposición de los residuos.
Las canecas de almacenamiento de combustible se mantienen rotuladas de acuerdo con el sistema globalmente armonizado se sugiere se realice seguimiento a la permanencia de esta señalización y se mantenga el área ordenada.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
Se cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
Se evidencia realización de jornada de orden y aseo en el campamento y frente de obra.
Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
Se cuenta con dos unidades sanitarias en sitio del proveedor Bamocol, las cuales no cuentan con lavamanos, se evidencia mantenimientos semanales.

4. PREDIOS NO PREVISTOS - Deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS AREAS)

Componente Técnico



Descripción Foto 1.

San Antonio El Toldo. Mejoramiento con Rajon e=0,50 Sello con Rap e=0,25 K1+380 a K1+400



Descripción Foto 2.

San Antonio El Toldo.m Sello con Rap



Descripción Foto 3.

San Antonio El Toldo. K1+380 a K1+400 C203 Conformación con base granular.



Descripción Foto 4.

Frente Capitolio. perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k3+180 al k3+230.



Descripción Foto 5

Frente Capitolio. perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k3+180 al k3+230.



Descripción Foto 6

Frente Capitolio. Se realiza replanteo y materializacion de niveles entre k0+625 a k0+720.

Componente Social



Descripción Foto 7

Participación reunión extraordinaria



Descripción Foto 8

Comité de seguimiento integral 46

Componente SST



Descripción Foto 9

Frente San Antonio. Señalización de acopios en orden



Descripción Foto 10

Frente San Antonio. Kit de emergencias en orden

Componente Ambiental



Descripción Foto 11

Frente Capitolio: Campamento móvil



Descripción Foto 12

Frente Capitolio. Acopio de Pétreos con medidas de manejo

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORIA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2026	1/04/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor-Supervisión actividades de Obra	Supervisor Interventoría - Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. 51 **DEL** lunes, 23 de junio de 2025 **AL** domingo, 29 de junio de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO 1				K8+645 a K8+660 Izq Manejo de aguas lluvias. K8+645 a K8+660 Izq Manejo de aguas lluvias. Jueves 26 de junio de 2025. Clima: seco K8+620 a K8+595 Izq Manejo de aguas lluvias. K8+990 a 8+992 Acción de movilidad con material reciclado en vía. 4,00m. Excavación e: 0,20 Mejoramiento roca reciclada e: 0,15 Sello con material reciclado e:0,05
TRAMO SAN ANTONIO 2 EL TOLDO	21,00%	10,81%	-10,19%	K1+670 a K1+680 Acción de movilidad Excavación e=0,40 Mejoramiento con Rajon e=0,25. Sello con Rap e=0,15 K2+850 a K2+740. Perfilacion de Material Saturado (el cual queda en vía) K0+200 y K3+130 Asistencia con maquinaria para percances en vía. K1+409 a K1+415 Acción de movilidad A: 4,60 Excavación e=0,70 Mejoramiento Rajon e=0,50 Sello con Rap e=0,20 K1+715 a K1+780 Manejo de aguas lluvias en ambos costados. K1+820 y K1+830 Acción de movilidad Izq A:3:00 Excavación e: 0,50 Mejoramiento Rajon e: 0,30 Sello con B-200 e: 0,12 Conformación con Rap e:0,15 K1+871 a K1+874 Der Acción de movilidad A:2,80 Excavación e:0,30 Mejoramiento Rajon e:0,15 Sello con B-200 e:0,12 Conformación con Rap e:0,13. K1+866 a K1+868 eje Acción de movilidad A:4,00 Excavación e:0,30 Mejoramiento Rajon e:0,15 Sello con B-200 e:0,10 Conformación con Rap e:0,12. K2+810 a K2+794 Perfilacion de material saturado. K2+808 a K2+797 Acción de movilidad A: 2,30 Excavación e=0,70 Mejoramiento Rajon e=0,50 (se reutiliza Rajon) Sello con Rap e=0,20 K2+820 a K2+760 Manejo de aguas lluvias en ambos costados y retiro de material de perfilacion en vía. K1+800 a K1+820 Manejo de agua lluvias ambos costados. K1+810 a K1+820 A 4,60 Acción de movilidad Excavación e:0,40 Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15 K1+865 a K1+875 A: 4:00 Acción de movilidad Excavación e:0,30 Mejoramiento Rajon e: 0,20 Sello con Rap 0,10 K1+900 a K1+910 A:4:00 Acción de movilidad Excavación e:0,40 Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap 0,15 K2+815 a K2+820 Perfilacion de material saturado. K2+815 a K2+820 Acción de movilidad A: 2,70 Excavación e=0,60 Mejoramiento Rajon e=0,40 (se reutiliza Rajon) Sello con Rap e=0,20.
TRAMO SAN ANTONIO 1				
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	K1+670 a K1+680 Acción de movilidad Excavación e=0,40 Mejoramiento con Rajon e=0,25. Sello con Rap e=0,15 K2+850 a K2+740. Perfilacion de Material Saturado (el cual queda en vía) K0+200 y K3+130 Asistencia con maquinaria para percances en vía. Se realiza extendida de base granular y cerró a nivel entre k3+345 a k3+375. * Se realiza extendida de base granular y cereo a nivel entre k3+400 a k3+430. * Se realiza manejo de aguas escorrentías por saturacion de fallo entre k3+420 a k3430. Se realiza extendida de base granular y cerró aproximado entre k3+425 a k3+235. * Retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+435 a k0+428 4.6 x.70.
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	* Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+705 a k0+770. esto teniendo en cuenta la modificación del hombro. * Se realiza manejo de aguas escorrentías y retiro de talud que se desprende en el k0+760 a k0+785. Está actividad se realiza manualmente para evitar que la actividad mecánica afecte el desplazamiento. * Se realiza compactación de base granular. * Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+760 a k0+820. esto teniendo en cuenta la modificación del hombro. * Se mantienen en observación el tramo k0+760 a k0+790, ya que se afecto el geotextil que envuelve el filtro y se mantiene roto. * Se realiza extendida de base granular y cereó aproximado de subrasante del k0+760 a k0+780. * Se realiza compactación de base granular. * Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+790 a k0+850. esto teniendo en cuenta la modificación del hombro. * Se mantienen en observación el tramo k0+760 a k0+790, ya que se afecto el geotextil que envuelve el filtro y se mantiene roto. * Se realiza extendida de base granular y cereó aproximado de subrasante del k0+765 a k0+820. * Se realiza compactación de base granular

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL	GLB	35.684.399.806,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNIÓN TUNALES
Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 2 Ayudantes. 2Auxiliares de tráfico. 1 Boal. 1 Comisión topográfica. 1 Tecnologa SST. 1 operador de Vibrocompactador. 1 Operador Retro cargador. 1 Operador Motoniveladora. 1 Conductor Volqueta. 2 conductores de carro tanque
Maquinaria evidenciada en el tramo: 2 vibrocompactador. 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora. 1 carro tanque JTR-530. 1 carro emulsión. 1 volqueta Doble troque
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 23 de junio de 2025. Clima:
FESTIVO
Martes 24 de junio de 2025. Clima: :Lluvias moderadas 02:00-04:00
* Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+705 a k0+770. Esto teniendo en cuenta la modificación del hombro.
* Se realiza manejo de aguas escorrentías y retiro de talud que se desprende en el k0+760 a k0+785. Está actividad se realiza manualmente para evitar que la actividad mecánica afecte el desplazamiento.
* Se realiza compactación de base granular.
Miércoles 25 de junio de 2025. Clima: seco
* Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+760 a k0+820. esto teniendo en cuenta la modificación del hombro.
* Se realiza manejo de aguas escorrentías y retiro de talud que se desprende en el k0+760 a k0+790. Está actividad se realiza mecánicamente por la cantidad de material que se cayó, sin embargo se vio afectado el filtro que por allá pasa.
* Se solicita revisión ya que se afecto un aproximado de 30mts
* Se realiza compactación de base granular.
Jueves 26 de junio de 2025. Clima: seco
* Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+760 a k0+820. esto teniendo en cuenta la modificación del hombro.
* Se mantienen en observación el tramo k0+760 a k0+790, ya que se afecto el geotextil que envuelve el filtro y se mantiene roto.
* Se realiza extendida de base granular y cereó aproximado de subrasante del k0+760 a k0+780.
* Se realiza compactación de base granular.
Viernes 27 de junio de 2025. Clima:
* Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+790 a k0+850. esto teniendo en cuenta la modificación del hombro.
* Se mantienen en observación el tramo k0+760 a k0+790, ya que se afecto el geotextil que envuelve el filtro y se mantiene roto.
* Se realiza extendida de base granular y cereó aproximado de subrasante del k0+765 a k0+820.
* Se realiza compactación de base granular
Sábado 28 de junio de 2025. Clima:

Sábado 28 de junio de 2025. Clima:

Domingo 29 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - * * Se evidencia que se está acopiando a los costados de la vía, impidiendo que las aguas escorrentías fluyan por la cuneta. Adicionalmente representa una contaminación con el material ya agregado. * En el punto k0+020, se evidencia que la obra hidráulica está teniendo un desplazamiento. Esto se puede verificar a través del desprendimiento que está teniendo el disipador de la viga y placa de erosión de la estructura de descole de la alcantarilla. Se evidencia que se realiza una mezcla heterogénea en la cual se realiza una zanja-cuneta para encauzar el agua proveniente de la placa huella y/hasta la alcantarilla. Esto con el fin de evitar que el agua se filtre por los gaviones y altere su desplazamiento.* Desde el día viernes (13/06/25) se tiene en tramo el minicargador bobcat varado, no se evidencia ningun mantenimiento. Se solicita retiro de la máquina. * Se evidencia que la carpeta de base granular, presenta buenas condiciones de humedad, compactación y consistencia. Son 280mts los que ya tienen en pista, se solicita poder realizar una extendida de fresado para aprovechar la pista existente. * Se evidencia que están realizando la recolección de material proveniente del desplazamiento del talud superior costado izq, se solicita revisión ya que el mismo presenta afectación de cercas. * Se evidencia que el punto de bioingeniería k0+380, está teniendo mayor desplazamiento. * Se evidencia que se está conformando parte de los hombros de la vía, con material contaminado. Es un material que no es apto para conformar K0+880 a k0+845. * En el punto k0+020, se evidencia que la obra hidráulica está teniendo un desplazamiento. Esto se puede verificar a través del desprendimiento que está teniendo el disipador de la viga y placa de erosión de la estructura de descole de la alcantarilla. Se evidencia que se realiza una mezcla heterogénea en la cual se realiza una zanja-cuneta para encauzar el agua proveniente de la placa huella y/hasta la alcantarilla. Esto con el fin de evitar que el agua se filtre por los gaviones y altere su desplazamiento. * Desde el día viernes (13/06/25) se tiene en tramo el minicargador bobcat varado, no se evidencia ningun mantenimiento. Se solicita el retiro de la máquina. * Se evidencia que la carpeta de base granular, presenta buenas condiciones de humedad, compactación y consistencia. Son 280mts los que ya tienen en pista, se solicita poder realizar una extendida de fresado para aprovechar la pista existente. * Se evidencia que están realizando la recolección de material proveniente del desplazamiento del talud superior costado izq, se solicita

CAPITOLIO

Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 1 Oficial. 1 Boal. 2 Ayudantes. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión topografica. 1 Operador vibrocompactador. 1 Operador retrocargador. 1 Conductor de volqueta. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Motoniveladora. 1 retrocargador. 1 Vibrocompactador 8tn. 1 Volqueta sencilla. 1 Vibrocompactador. 1 Minicargador
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 23 de junio de 2025. Clima:
FESTIVO
Martes 24 de junio de 2025. Clima: lluvia moderada 01:00-03:30.
* Se realiza extendida de base granular y cerró aproximado entre k3+425 a k3+235.
* Retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+435 a k0+428 4.6 x.70.
Miércoles 25 de junio de 2025. Clima: seco
* Se realiza extendida de base granular y cerró aproximado entre k3+300 a k3+315 y k3+210 a k3+220.
* retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+315 a k0+300 y k3+210 a k3+220 de 4 x.70 ambos
Jueves 26 de junio de 2025. Clima: seco
* Se realiza extendida de base granular y cerró a nivel entre k3+345 a k3+375
Viernes 27 de junio de 2025. Clima:
* Se realiza extendida de base granular y cereo a nivel entre k3+400 a k3+430.
* Se realiza manejo de aguas escorrentias por saturacion de fallo entre k3+420 a k3430.
Sábado 28 de junio de 2025. Clima:

Domingo 29 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO: - ** Se evidencia que las volquetas que traen material pétreo, las están cargando de vuelta con RCD, sin embargo en inspección realizada se puede verificar que las están devolviendo con medio viaje. Esto representa que no están aprovechando al máximo la capacidad de carga de la volqueta para evacuar el material que hay en el frente de obra. * Se evidencia que las auxiliares están realizando cierres en la mitad del PMT esto debido a que tiene que tener punto de vista para poderse avisar ya que los radios no sirven y no pueden comunicarse. Se solicita el arreglo lo más pronto posible para evitar el abandono de los PMT. * Se evidencia que la base granular agregada y compactada en el k3+350 a k3+340, presenta saturación y acolchonamiento. Se solicita el remplazo del mismo - No se evidencia en el tramo el residente de obra. - Se evidencian algunas grietas sobre el hombro costado izquierdo. Adicionalmente se evidencian algunas bateas sobre los costados. Se solicita revisión e intervención. * Se presenta la renuncia del topógrafo. * Se evidencia que se agrego rajon en un fallo, sin embargo no retiro material saturado ni se realizó el cajón respectivo. K2+730. * Se evidencia una señalización con afectación por golpe con una máquina. Se solicita el retiro del mismo k3+215. * Se evidencia que se afecto un cuerpo de agua con material RCD, se solicita el retiro del mismo k3+210. * Se evidencia que las volquetas que traen material pétreo, las están cargando de vuelta con RCD, sin embargo en inspección realizada se puede verificar que las están devolviendo con medio viaje. Esto representa que no están aprovechando al máximo la capacidad de carga de la volqueta para evacuar el material que hay en el frente de obra. * Se evidencia que se agrego rajon en un fallo, sin embargo no retiro material saturado ni se realizó el cajón respectivo. K2+730.
* Se evidencia una señalización con afectación por golpe con una máquina. Se solicita el retiro del mismo k3+215. * Se evidencia que se afecto un cuerpo de agua con material RCD, se solicita el retiro del mismo k3+210.
* Se evidencia que las volquetas que traen material pétreo, las están cargando de vuelta con RCD, sin embargo en inspección realizada se puede verificar que las están devolviendo con medio viaje. Esto representa que no están aprovechando al máximo la capacidad de carga de la volqueta para

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 09 1 Residente técnico. 1 profesional SST. 1 profesional ambiental . 1 profesional social. 2 Inspector. 2 Oficiales. 3 Ayudantes. 1 Boal. 2 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topografica. 1 operador minicargador. 2 Operadores de Motoniveladora. 1 Operadores de retrocargador. 3 operadores de vibrocompactador. 1 Conductores camioneta. 1 conductor de volqueta. 1 Conductor de Carrotanque. 1 conductor de volqueta sencilla.
Maquinaria y equipos de obra 2 vibrocompactador. 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora (sin operador). 1 minicargador (sin operador).
Personal disponible de Interventoría: 1 residente técnico. 1 inspector de obra. 1 profesionalambiental.1 profesional SST. 1 profesional social.1 conductor

Actividades realizadas
Lunes 23 de junio de 2025. Clima:

Martes 24 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 9:00 a 12:00am
K1+670 a K1+680 Acción de movilidad Excavación e=0,40 Mejoramiento con Rajon e=0,25. Sello con Rap e=0,15 K2+850 a K2+740. Perfilacion de Material Saturado (el cual queda en vía)
K0+200 y K3+130 Asistencia con maquinaria para percances en vía.
Miércoles 25 de junio de 2025. Clima: seco
K1+409 a K1+415 Acción de movilidad A: 4,60 Excavación e=0,70 Mejoramiento Rajon e=0,50 Sello con Rap e=0,20
K1+715 a K1+780 Manejo de aguas lluvias en ambos costados.
K1+820 y K1+830 Acción de movilidad Izq A:3:00 Excavación e: 0,50 Mejoramiento Rajon e: 0,30 Sello con B-200 e: 0,12 Conformación con Rap e:0,15
K1+871 a K1+874 Der Acción de movilidad A:2,80 Excavación e:0,30 Mejoramiento Rajon e:0,15 Sello con B-200 e:0,12 Conformación con Rap e:0,13.
K1+866 a K1+868 eje Acción de movilidad A:4,00 Excavación e:0,30 Mejoramiento Rajon e:0,15 Sello con B-200 e:0,10 Conformación con Rap e:0,12.
Jueves 26 de junio de 2025. Clima: seco
K2+810 a K2+794 Perfilacion de material saturado.
K2+808 a K2+797 Acción de movilidad A: 2,30 Excavación e=0,70 Mejoramiento Rajon e=0,50 (se reutiliza Rajon) Sello con Rap e=0,20
K2+820 a K2+760 Manejo de aguas lluvias en ambos costados y retiro de material de perfilacion en vía.
Viernes 27 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 7:00 a 8:00 am
K1+800 a K1+820 Manejo de agua lluvias ambos costados.
K1+810 a K1+820 A 4,60 Acción de movilidad Excavación e:0,40 Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15
K1+865 a K1+875 A: 4:00 Acción de movilidad Excavación e:0,30 Mejoramiento Rajon e: 0,20 Sello con Rap 0,10 K1+900 a K1+910 A:4:00
Acción de movilidad
Excavación e:0,40 Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap 0,15 K2+815 a K2+820 Perfilacion de material saturado.
K2+815 a K2+820 Acción de movilidad A: 2,70 Excavación e=0,60 Mejoramiento Rajon e=0,40 (se reutiliza Rajon) Sello con Rap e=0,20.
Sábado 28 de junio de 2025. Clima:

Domingo 29 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO :- En operación se evidencia 4 volquetas dobles del proyecto en este tramo transportando material. Pendiente por retiró del frente Vibrocompactador Bomag. En operación se evidencia 4 volquetas dobles del proyecto en este tramo transportando material.

TRAMO SAN ANTONIO 1

Personal disponible en tramo 09 1 Inspector. 1 Oficiales. 1 Ayudantes. 1 Comisión Topografica. 1 Conductor camioneta.
Maquinaria y equipos de obra N/A. 1 Retrocargador Luding. 1 Vibrocompactador doble tándem Ammann. 1 Volqueta Doble
Personal disponible de Interventoría: 1 residente técnico. 1 inspector de obra. 1 profesionalambiental.1 profesional SST. 1 profesional social.1 conductor

Actividades realizadas
Lunes 23 de junio de 2025. Clima:
FESTIVO
Martes 24 de junio de 2025. Clima:
Sin reporte de actividad
Miércoles 25 de junio de 2025. Clima: seco
K8+645 a K8+660 izq Manejo de aguas lluvias.
Jueves 26 de junio de 2025. Clima: seco
K8+620 a K8+595 izq Manejo de aguas lluvias.
K8+990 a 8+992 Acción de movilidad con material reciclado en vía. 4,00m. Excavación e: 0,20 Mejoramiento roca reciclada e: 0,15 Sello con material reciclado e:0,05
Viernes 27 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 7:00 a 8:00am
K9+150 a K9+100 izq Manejo de aguas lluvias.
Sábado 28 de junio de 2025. Clima:

Domingo 29 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 1 No se evidencia el kit de Maquinaria completo, vibrocompactador asignado no tiene potencia para el desplazamiento. El grupo de trabajo no cuenta con materiales pétreo para el desarrollo de acciones de movilidad. Se requiere suministro de pétreos en este frente para reparar los puntos críticos en vía. Las acciones de movilidad no se pueden compactar debido a que no hay un ibrocompactador asignado a este frente. Se requiere suministro de pétreos en este frente para reparar los puntos críticos en vía. Las acciones de movilidad no se pueden compactar debido a que no hay un vibrocompactador asignado a este frente.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1Actividades desarrolladas por el componente social.

Tramo de Unión Tunales.

Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)

Programa de información y participación comunitaria

Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.

Programa de información y participación comunitaria.

•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.

•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual.

•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Tunal Bajo
Y la carpa móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento.

Programa Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto.

La profesional social realiza sensibilización el tema a tratar gestión social en obra, con el fin de informar al personal de obra el objeto que tiene el componente social, que busca mitigar los impactos que puedan generarse en la comunidad durante la ejecución de las actividades.

Tramo de San Antonio El Toldo.

Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)

Programa de información y participación comunitaria

•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.

•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual.

•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
carpa móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento.

Programa Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto.

La profesional social realiza sensibilización el tema a tratar gestión social en obra, con el fin de informar al personal de obra el objeto que tiene el componente social, que busca mitigar los impactos que puedan generarse en la comunidad durante la ejecución de las actividades.

Tramo de Capitolio.
Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa).

Programa de información y participación comunitaria.

•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
carpa móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento.

Programa Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto.

La profesional social realiza sensibilización el tema a tratar gestión social en obra, con el fin de informar al personal de obra el objeto que tiene el componente social, que busca mitigar los impactos que puedan generarse en la comunidad durante la ejecución de las actividades.

Programa de cultura vial

La profesional social realiza atención a la comunidad, con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado de las vías, se realiza la entrega de volantes en el tramo vial Capitolio; explicándole a la comunidad que no deberían: arrojar sustancias y/o residuos químicos como pinturas, aceites, Gasolinas entre otros.

Tramo de San Antonio I

Programa de información y participación comunitaria

•Actas de vecindad
Con el fin de dar cumplimiento al proceso de levantamiento de actas de vecindad, la profesional social realizó registro audiovisual (video) que permite evidenciar el estado actual de las cercas, viviendas y demás elementos aledaños al tramo vial objeto de intervención. Este registro tiene como propósito contar con un soporte visual que respalde las condiciones existentes antes del inicio de las obras, permitiendo identificar posibles afectaciones, garantizar la trazabilidad del proceso y brindar mayor transparencia en la ejecución del proyecto.

•Reunión extraordinaria

La profesional social con el acompañamiento de componente técnico, realizó reunión extraordinaria
Con el presidente de la Junta de acción Comunal informan que se intervendrán los 37 puntos críticos y el manejo de las aguas. La Unidad de Mantenimiento atiende solicitud comprometiéndose a sacar los fallos que se encuentran en el tramo vial durante el mes de junio año 2025.

2. RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV.
La interventoría realizó recorrido conjunto en los frentes de obra activos, con el de realizar seguimiento a las actividades de gestión social.

3. COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERMV
La interventoría realiza el comité de seguimiento integral 49, con el fin de realizar seguimiento al desarrollo del contrato. el 27 de junio del 2025, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social, con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

4.COMITÉ DE SEGUIMIENTO SOCIAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
El componente social participa del comité de obra interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 37, el 26 de junio del 2025, con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

9INFORMES MENSUALES
Se encuentra pendiente entrega de los informes 11 y 12, por parte del UMV, los cuales presentaron observaciones.

8INFORMES SEMANALES

El consorcio se encuentra al día en el reporte de informes semanales.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

OBSERVACIONES A LA UAERMV
Componente SST 4ta semana de junio 2025:
Observaciones **Tramo Capitolio:**

Personal UMV / 27-06-2025
1 Inspector. 1 Oficial. 1 Boal . 1 ayudante. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión topografía (No se evidencia el topógrafo).. 1 Operario vibrocompactador . 1 Operador retrocargador. 1 Conductor de volqueta. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador. 1 vigilante.
Maquinaria y equipos de obra: 1 Motoniveladora. 1 retrocargador Jhon Deere . 1 Vibrocompactador 8tn. 1 vibrocompactador 4tn. 1 Volqueta sencilla. 1 minicargador
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de Sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Unidades sanitarias en orden y aseo.
•Se observa maquinaria sin sticker del contrato.
•Minicargador marca HAMM, no le funciona alarma de reversa
•Operarios de maquinaria amarilla, contrato 936 de 2024, Consorcio HyC tienen preoperacional en orden.
•Volqueta presenta golpe fuerte en la parte frontal, lo cual dificulta el cierre de la puerta izquierda además de no tener las luminarias en su totalidad funcionales.
•Se evidencia aseo en baterías sanitarias
•Se observa etiquetado de sustancias químicas.
Observaciones SST Tramo Tunales tramo 5:

Personal UMV / 27-06-2025
1 oficial
1 Ayudantes
2 Auxiliares de tráfico
1 Boal
1 Tecnologa SST
1 comisión topografica
2 operarios de Vibrocompactador
1 Operador Retro cargador
1 operario motoniveladora
1 operario minicargador
1 operario carro tanque
1 Vigilante
Maquinaria y equipos de obra
2 vibrocompactador

1 Retro cargador
1 Motoniveladora
1 minicargador(varado)
1 carro tanque1 Carro Tanque
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Operarios de minicargador y Vibro compactador sin uniforme identitario
•Se observa maquinaria sin sticker del contrato.
•PMT en orden
•Señalización SGA en acopio combustible en orden
•Se observan 2 unidades sanitarias en orden.
•Se observa la instalación de gel antibacterial en unidades sanitarias
•Se realiza observación de overol autorizado en operador de retroexcavadora
•Paleta de pare y siga se observa deteriorada
•Minicargador Bobcat varado desde el 13 de junio
•Se observa retroexcavadora si sticker del contrato

Observaciones SST Tramo San Antonio El Toldo:
Personal UMV / 27-06-2025
1 residente tecnico. 1 profesional SST. 1 profesional ambiental. 1 profesional social. 1 Inspector. 1 Oficiales. 3 Ayudantes. 1 Boal. 2 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topografica. 2 operadores minicargador. 1 Operadores de Motoniveladora. 2 Operadores de retrocargador. 2 operadores de vibrocompactador. camioneta. 1 conductor de volqueta. 1 Conductor de Carrotanque. 1 conductor de volqueta sencilla. 1 vigilante

Maquinaria y equipos de obra

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por la entidad ejecutora.
2Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3Revisión del informe semanal enviado por le entidad ejecutora.
4Se solicito la entrega de los ajustes del informe de abril de manera oficial
5Participación del comité de seguimiento No 48; donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente.

Frente Capitolio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
Se evidencia retiro de RCD del frente de obra hacia sitio de disposición final.
Se verifico que donde realizaron la acción de movilidad k1+030 se requiere que el área sea correctamente señalizada con triple cinta y se evidencia acopio de materiales pétreos sin medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04. Reiterativo
Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.

Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
Se verifico que la UMV mantiene el punto de acopio de RESPEL y combustibles señalizado y etiquetaron las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA.
Se mantiene dos unidades sanitarias portátiles, del proveedor Bamocol, estas no poseen lavamanos, cuentan con mantenimientos semanales.
Se evidencia en el km 0+485 arrastre de materiales pétreos al predio privado, la limpieza inicio desde el pasado 06 de junio de 2025.
Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos, esta actividad se inició con el apoyo de los BOAL. Esta es una actividad continua.
Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
Se mantiene punto ecológico activo y señalizado.
Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
Se mantiene recomendación al contratista de maquinaria que cuando se proceda a realizar reparaciones puntuales de equipos se tomen las medidas de manejo ambiental respectivas, como aislar el suelo con plástico para evitar posibles contaminaciones del suelo y agua por escorrentía.
Frente Tunales
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
Se evidencio adecuación de acopio de pétreos ubicado en el predio del señor Gilberto y el ubicado al lado del colegio.
En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, el cual se mantiene ubicado para protegerlo de la acción de la lluvia con el fin de evitar proliferación de vectores y malos olores por descomposición de los residuos.
Las canecas de almacenamiento de combustible se mantienen rotuladas de acuerdo con el sistema globalmente armonizado se sugiere se realice seguimiento a la permanencia de esta señalización y se mantenga el área ordenada.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
Se cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
Se evidencia realización de jornada de orden y aseo en el campamento y frente de obra.
Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
Se cuenta con dos unidades sanitarias en sitio del proveedor Bamocol, las cuales no cuentan con lavamanos, se evidencia mantenimientos semanales.
El acopio de Pétreos ubicado en el tramo 3 al cual se colocó contención se mantiene con medidas de manejo ambiental, sin embargo, se mantiene la solicitud reiterativa en comités del retiro de los materiales pétreos que se cayeron en el costado posterior actividad que aún no se ha realizado.

Frente San Antonio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
-En el Km 3+100 se evidencian arboles afectados por disposición de material pétreo, requiere limpieza, adecuación y evaluar la instalación de contención de materiales. Se solicita dar prioridad a la evacuación de los RCD de este predio y conformar de manera correcta el área. Reiterartivo, se inicia con esta actividad el día 25 de junio.
-Se solicita retiro de RCD acopiados al costado de la via en el k 3+100. Reiterativo
-En este frente se evidenciaron dos derrames de combustibles en el periodo de retro terex varada y volqueta varada.
-El punto de acopio de RESPEL y combustibles se mantiene señalizado y etiquetadas las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA. El punto de acopio de sustancias químicas se mantiene adecuado y cubierto.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). acopio km 2+350, km 1+655 y km 0+730.
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
-Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
-Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, y protegido de la acción de la lluvia.
-Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT (señales 200 y 100 mts inicio de obra, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
-Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
-En comité de obra No 49 se reiteró a la UMV evacuar hacia sitio de disposición final autorizado los materiales RCD almacenados en distintos acopios, lo anterior debido a que superan en tiempo máximo permitido para permanencia en obra.
-Se cuenta con cuatro unidades sanitarias portátiles del proveedor Bamocol, las cuales son poseen lavamanos.
-Se sugiere realizar un adecuado manejo de aguas de escorrentía para evitar afectaciones en la via.
-Se cuenta con dos campamentos móviles dotados de elementos necesarios a lo largo del todo el tramo, San Antonio I y II.
-Se evidencio implementación de acopio de RCD en k 5+300, el cual se encuentra cubierto y delimitado. A lo largo del tramo se evidencia diferentes puntos de acopio de RCD que requieren adecuación y retiro hacia sitio autorizado.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (Deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

Componente Técnico



Descripción Foto 1.

En abscisa K0+200 en borde izquierdo Vibrocompactador Bogman recién descargado y asignado a San Antonio 1 se queda sin frenos en vía y se precipita a Alcantarilla



Descripción Foto 2.

En abscisa K0+200 en borde izquierdo Vibrocompactador Bogman recién descargado y asignado a San Antonio 1 se queda sin frenos en vía y se precipita a Alcantarilla



Descripción Foto 3.

Se realiza manejo de aguas escorrentías y retiro de talud que se desprende en el k0+760 a k0+785. Está actividad se realiza manualmente para evitar que la actividad mecánica afecte el desplazamiento.



Descripción Foto 4.

Se realiza manejo de aguas escorrentías y retiro de talud que se desprende en el k0+760 a k0+785. Está actividad se realiza manualmente para evitar que la actividad mecánica afecte el desplazamiento.



Descripción Foto 5

Retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+435 a k0+428 4.6 x.70.



Descripción Foto 6

Retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+435 a k0+428 4.6 x.70.

Componente Social



Descripción Foto 7

Participación reunión extraordinaria San Antonio I



Descripción Foto 8

Sensibilización al personal del proyecto.

Componente SST



Descripción Foto 9

Frente Capitolio. Observación en volqueta que no le funciona parte de las luminarias



Descripción Foto 10

Frente Tunales. Operador de Retroexcavadora sin uniforme identitario

Componente Ambiental



Descripción Foto 11

Frente San Antonio. Permanencia de acopio de RCD al costado de vía, requiere evacuación inmediata



Descripción Foto 12

Frente San Antonio. Canecas de combustible rotuladas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORIA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2026	1/04/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor-Supervisión actividades de Obra	Supervisor Interventoría - Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. 52 **DEL** lunes, 30 de junio de 2025 **AL** domingo, 6 de julio de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO 1				K9+680 a K9+650 izq Manejo de aguas lluvias. K9+100 Aseo orden y limpieza de acopio. K9+500 a K9+400 der Manejo de aguas lluvias.
TRAMO SAN ANTONIO 2 EL TOLDO	21,00%	10,81%	-10,19%	K2+330 a K2+340 A: 4,00 Acción de movilidad Excavación e:0,40 Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15 K2+600-K2+400-K2+250 Aseo orden y limpieza de acopios K2+620 a K2+610 A: 4,60 Acción de movilidad Excavación e:0,40 Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15 K9+500 a K9+400 der Manejo de aguas lluvias. K2+870 a K2+720 Perfilacion de material saturado (queda acopiado en vía) K3+148 a K3+138 A: 3,50 Acción de movilidad Excavación e:0,40 Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15
TRAMO SAN ANTONIO 1				K9+680 a K9+650 izq Manejo de aguas lluvias. K9+100 Aseo orden y limpieza de acopio. K9+650 a K9+600 der Manejo de aguas lluvias. K9+100 Trasiego de material K9+500 a K9+400 der Manejo de aguas lluvias.
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	1. Se retira el fallo sobre vía, donde se realiza retiro de material remanente saturado por lluvias, apertura de cajón y agregado de rajon para conformación de estructura de via. Entre k3+420 a k3+410. 2. Se realiza manejo de aguas escorrentías por saturacion de fallo entre k3+800 a k3+700. 1. Se retira fallos sobre vía, donde se realiza retiro de material remanente saturado por lluvias, apertura de cajón y agregado de rajon para conformación de estructura de via. Entre (K2+110 a K2+105), (K2+080 a K2+083). 2. Se realiza manejo de aguas escorrentías por saturacion de fallo entre k2+050 a k2+120.
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	* Se mantienen en observación el tramo k0+760 a k0+790, ya que se afecto el geotexil que envuelve el filtro y se mantiene roto. * El personal de obra no calificado realiza manejo de aguas escorrentías sobre costado derecho K0+85. 1. Limpieza de cunetas entre k3+800 a k3+700 costado izquierdo. 2. Se realiza manejo de aguas escorrentías por saturacion de fallo entre k3+650 a k3+700. 3. Se realiza barrido de fresado estabilizado instalado, esto con el fin de evitar el desprendimiento de demás material o accidente por grava en la vía. * Se mantienen en observación el tramo k0+760 a k0+790, ya que se afecto el geotexil que envuelve el filtro y se mantiene roto. * Se realiza perfilacion de subrasante, desplazando el material de corte hacia menores para realizar lleno y confirmar subrasante. Esta actividad se realiza con relleno de base granular en el punto k0+840 a K0+860 * Se mantienen en observación el tramo k0+760 a k0+790, ya que se afecto el geotexil que envuelve el filtro y se mantiene roto. * Se realizan manejos de aguas con el personal. No se cuenta con la ayuda de la maquinaria para remover desprendimiento de talud ni volumen de excavación ya que se realiza cambio del parque de maquinaria * Se mantienen en observación el tramo k0+760 a k0+790, ya que se afecto el geotexil que envuelve el filtro y se mantiene roto. * Se realiza la perfilación de subrasante (con retrocargado-aguilon), desplazando el material de corte hacia menores para realizar lleno y conformar subrasante. Esta actividad se realiza con relleno de base granular en el punto k0+880 a K0+860. * Se realiza chequeo de niveles para subrasante k0+880 a k0+860. * Se evidencia el cambio de parque de maquinaria. Sin embargo el retrocargador que llegó era el que estaba asignado a tramo capitolio, la máquina trabaja en tercera marcha. Por parte del vibrocompactador se cambia uno de 8 tn por uno doble tandem de 4 tn, este vibro llega con fallas eléctricas y de dirección. No se evidencia llegada de motoniveladora, sin embargo la que estaba de la llevan. * Teniendo en cuenta la observación anterior, se puede identificar que la maquinaria no tiene un chequeo de preingreso. Sigue llegando máquinaria varada. * Se evidencia que hay puntos para realizar manejo de agua y retiro de material remanente saturado por lluvias. K0+470 a K0+500. * Se evidencia que la carpeta de base granular, presenta buenas condiciones de humedad, compactación y consistencia. Son 300 mts los que ya tienen en pista, se solicita poder realizar una extendida de fresado para aprovechar la pista existente. * Se evidencia que el punto de bioingeniería k0+380, está teniendo mayor desplazamiento.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL	GLB	35.684.399.806,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNIÓN TUNALES
Personal disponible en tramo 05
1 oficial. 1 inspector (Ausente). 1 Ayudantes. 2 Auxiliares de tráfico. 1 Boal . 1 Tecnologa SST(Ausente). 1 comisión topografica(1 cadenero). 2 operarios de Vibrocompactador(Ausentes). 1 Operador Retro cargador(Ausente). 1 operario motoniveladora(Ausente). 1 operario minicargador (Ausente). 1 operario carro tanque(Ausente)
Maquinaria evidenciada en el tramo:2 vibrocompactador
1 Retro cargador. 1 Motoniveladora. 1 minicargador(varado). 1 carro tanque
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 30 de junio de 2025. Clima:
FESTIVO
Martes 01 de julio de 2025. Clima: : lluvia moderada 07:00-10:30
* Se mantienen en observación el tramo k0+760 a k0+790, ya que se afecto el geotextil que envuelve el filtro y se mantiene roto.
* El personal de obra no calificado realiza manejo de aguas escorrentías sobre costado derecho K0+85.
Miércoles 02 de junio de 2025. Clima:seco
* Se mantienen en observación el tramo k0+760 a k0+790, ya que se afecto el geotextil que envuelve el filtro y se mantiene roto.
* Se realiza perfilacion de subrasante, desplazando el material de corte hacia menores para realizar lleno y confirmar subrasante. Esta actividad se realiza con relleno de base granular en el punto k0+840 a K0+860
Jueves 03 de junio de 2025. Clima: lluvias moderadas 07:00-10:30
* Se mantienen en observación el tramo k0+760 a k0+790, ya que se afecto el geotextil que envuelve el filtro y se mantiene roto.
* Se realizan manejos de aguas con el personal. No se cuenta con la ayuda de la maquinaria para remover desprendimiento de talud ni volumen de excavación ya que se realiza cambio del parque de maquinaria
Viernes 04 de junio de 2025. Clima: seco
* Se mantienen en observación el tramo k0+760 a k0+790, ya que se afecto el geotextil que envuelve el filtro y se mantiene roto.
* Se realiza la perfilación de subrasante (con retrocargado-aguilon), desplazando el material de corte hacia menores para realizar lleno y conformar subrasante. Esta actividad se realiza con relleno de base granular en el punto k0+880 a K0+860.
* Se realiza chequeo de niveles para subrasante k0+880 a k0+860.
Sábado 05 de junio de 2025. Clima: seco

Domingo 06 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - * * Durante el recorrido no se evidencia personal laborando, no se encontraba personal de maquinaria ni encargados de frente de obra. * Se evidencia que hay puntos para realizar manejo de agua y retiro de material remanente saturado por lluvias. K0+470 a K0+500. * Desde el día viernes (13/06/25) se tiene en tramo el minicargador bobcat varado, no se evidencia ningun mantenimiento. Se solicita el retiro de la máquina. * Se evidencia que la carpeta de base granular, presenta buenas condiciones de humedad, compactación y consistencia. Son 300 mts los que ya tienen en pista, se solicita poder realizar una extendida de fresado para aprovechar la pista existente. * Se evidencia que están realizando la recolección de material proveniente del desplazamiento del talud superior costado izq, se solicita revisión ya que el mismo presenta afectación de cercas. * Se evidencia que el punto de bioingeniería k0+380, está teniendo mayor desplazamiento. ** * Se evidencia el cambio de parque de maquinaria. Sin embargo el retrocargador que llegó era el que estaba asignado a tramo capitolio, la máquina trabaja en tercera marcha. Por parte del vibrocompactador se cambia uno de 8 tn por uno doble tandem de 4 tn, este vibro llega con fallas eléctricas y de dirección. No se evidencia llegada de motoniveladora, sin embargo la que estaba se la llevan. * Según la inspección realizada, la maquinaria llegó a intervención directa de los mecánicos. * Teniendo en cuenta la observación anterior, se puede identificar que la maquinaria no tiene un chequeo de preingreso. Sigue llegando máquinaria varada.

CAPITOLIO
Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 1 Oficial. 1 Boal. 2 Ayudantes. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión topografica. 1 Operador vibrocompactador. 1 Operador retrocargador. 1 Conductor de volqueta. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Motoniveladora. 1 retrocargador. 1 Vibrocompactador 8tn. 1 Volqueta sencilla. 1 Vibrocompactador. 1 Minicargador
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 30 de junio de 2025. Clima:
FESTIVO
Martes 01 de julio de 2025. Clima: : seco
1. Limpieza de cunetas entre k3+800 a k3+700 costado izquierdo.
2. Se realiza manejo de aguas escorrentías por saturacion de fallo entre k3+650 a k3+700.
3. Se realiza barrido de fresado estabilizado instalado, esto con el fin de evitar el desprendimiento de demás material o accidente por grava en la vía.
Miércoles 02 de junio de 2025. Clima: seco
1. Se retira el fallo sobre vía, donde se realiza retiro de material remanente saturado por lluvias, apertura de cajón y agregado de rajon para conformación de estructura de via. Entre k3+420 a k3+410.
2. Se realiza manejo de aguas escorrentías por saturacion de fallo entre k3+800 a k3+700.
Jueves 03 de junio de 2025. Clima: lluvias moderadas 07:00 a 10:30
1. Se retira fallos sobre vía, donde se realiza retiro de material remanente saturado por lluvias, apertura de cajón y agregado de rajon para conformación de estructura de via. Entre (K2+400 a K2+404), (K2+396 a K2+400), (k2+410 a K2+413), (K2+390 a K2+393)
2. Se realiza manejo de aguas escorrentías por saturacion de fallo entre k3+415 a k3+375.
Viernes 04 de junio de 2025. Clima: seco
1. Se retira fallos sobre vía, donde se realiza retiro de material remanente saturado por lluvias, apertura de cajón y agregado de rajon para conformación de estructura de via. Entre (K2+110 a K2+105), (K2+080 a K2+083).
2. Se realiza manejo de aguas escorrentías por saturacion de fallo entre k2+050 a k2+120
Sábado 05 de junio de 2025. Clima:

Domingo 06 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO: - ** * El personal de maquinaria no desarrollo actividades debido a la falta de combustible.* Se evidencia una señalización con afectación por golpe con una máquina. Se solicita el retiro del mismo k3+215. * Se evidencia que se afecto un cuerpo de agua con material RCD, se solicita el retiro del mismo k3+210. * Se evidencia que las volquetas que traen material pétreo, las están cargando de vuelta con RCD, sin embargo en inspección realizada se puede verificar que las están devolviendo con medio viaje. Esto representa que no están aprovechando al máximo la capacidad de carga de la volqueta para evacuar el material que hay en el frente de obra. * Se evidencia que las auxiliares están realizando cierres en la mitad del PMT esto debido a que tiene que tener punto de vista para poderse avisar ya que los radios no sirven y no pueden comunicarse. Se solicita el arreglo lo más pronto posible para evitar el abandono de los PMT.* Se evidencia que la base granular agregada y compactada en el k3+350 a k3+210, presenta saturación y acolchonamiento. Se solicita el reemplazo del mismo. - No se evidencia en el tramo el residente de obra. - Se evidencian algunas grietas sobre el hombro del costado izquierdo. Adicionalmente se evidencian algunas bateas sobre los costados. Se solicita revisión e intervención.
*** Se evidencia el remplazo del retrocargador Jhon Deere por una Caterpillar.
* Según información recibida y la inspección realizada, se puede evidenciar que no hay material para conformar carpeta de base granular y fresado estabilizado.
* Se evidencia que se está instalando la alarma de reversa y bombillo delantero del vibrocompactador Hamm.
* Se evidencia una señalización con afectación por golpe con una máquina. Se solicita el retiro del mismo k3+215.
* Se evidencia que se afecto un cuerpo de agua con material RCD, se solicita el retiro del mismo k3+210.
* Se evidencia que las auxiliares están realizando cierres en la mitad del PMT esto debido a que tienen que tener punto de vista para poderse avisar ya que los radios no sirven y no pueden comunicarse. Se solicita el arreglo lo más pronto posible para evitar el abandono de los PMT.
* Se evidencia que la base granular agregada y compactada en el k3+350 a k3+210, presenta saturación, acolchonamiento, pérdida de finos y caída de hombros. Se solicita el reemplazo del mismo
- No se evidencia en el tramo el residente de obra.
- Se evidencian algunas grietas sobre el hombro del costado izquierdo. Adicionalmente se evidencian algunas bateas sobre los costados. Se solicita revisión e intervención.

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 09 1 residente tecnico. 1 profesional SST. 1 profesional ambiental. 1 profesional social. 1 Inspector. 1 Oficiales. 5 Ayudantes (2 en apoyo). 1 Boal. 4 Auxiliar Tráfico (2 en apoyo). 1 Comisión Topografica. 1 operador minicargador. 1 Operadores de Motoniveladora. 2 Operadores de retrocargador. 1 operadores de vibrocompactador. 1 Conductores camioneta. 1 conductor de volqueta sencilla.
Maquinaria y equipos de obra 1 Motoniveladoras. 1 Vibrocompactador. 1 Vibrocompactador. 2 minicargador. 1 Retrocargador CAT. 1 Retrocargador Terex. (Varada). 1 Carrotanque. 1 volqueta sencilla (varada
Personal disponible de Interventoría: 1 residente técnico. 1 inspector de obra. 1 profesionalambiental.1 profesional SST. 1 profesional social.1 conductor

Actividades realizadas
Lunes 30 de junio de 2025. Clima:
FESTIVO
Martes 01 de julio de 2025. Clima: : seco
K2+330 a K2+340 A: 4,00 Acción de movilidad Excavación e:0,40 Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15
K2+600-K2+400-K2+250 Aseo orden y limpieza de acopios.
Miércoles 02 de junio de 2025. Clima:Lluvia moderada 6:00 a 8:00 am y 4:00 a 6:00 pm
K2+620 a K2+610 A: 4,60 Acción de movilidad Excavación e:0,40
Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15
Jueves 03 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 7:00 a 8:00 am y 10:00 a 11:00 am
K9+500 a K9+400 der
Manejo de aguas lluvias.
Viernes 04 de junio de 2025. Clima: 7:00 a 8:00 am y 10:00 a 11:00 am
K2+870 a K2+720 Perfilacion de material saturado (queda acopiado en vía)
K3+148 a K3+138 A 3,50 Acción de movilidad Excavación e:0,40 Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15
Sábado 05 de junio de 2025. Clima:

Domingo 06 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO :- El tramo no cuenta con volqueta doble asignada. En apoyo unidad de ejecución San Antonio 1 dos ayudantes y dos auxiliares de tráfico. En abscisa K2+340 la instalación de sello en fallo quedó baja, se solicita al encargado de frente renivelar y compactar para evitar la afectación del área intervenida.

TRAMO SAN ANTONIO 1

Personal disponible en tramo 09 1 inspector. 1 Oficiales. 1 Ayudantes. 1 Comisión Topografica. 1 Conductores camioneta. 1 Operador de retrocargador y Minicargador
Maquinaria y equipos de obra: 1 Retrocargador Luding. 1 Vibrocompactador doble tándem Ammann (esta máquina nunca ha asistido actividades de obra en este frente). 1 Minicargador Bobcat (sin operador)
Personal disponible de Interventoría: 1 residente técnico. 1 inspector de obra. 1 profesionalambiental.1 profesional SST. 1 profesional social.1 conductor

Actividades realizadas
Lunes 30 de junio de 2025. Clima:
FESTIVO
Martes 01 de julio de 2025. Clima: : Lluvia moderada 7:00 a 9:00
K9+680 a K9+650 izq Manejo de aguas lluvias.
K9+100 Aseo orden y limpieza de acopio.
Miércoles 02 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 6:00 a 8:00 am y 4:00 a 6:00 pm
K9+650 a K9+600 der Manejo de aguas lluvias.
K9+100 Trasiego de material
Jueves 03 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 7:00 a 8:00 am y 10:00 a 11:00 am
K9+500 a K9+400 der
Manejo de aguas lluvias.
Viernes 04 de junio de 2025. Clima: Lluvia moderada 11:00 a 1:00 am
K9+819 a K9+700 der Manejo de aguas lluvias.
Sábado 05 de junio de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 1 En apoyo a unidad del toldo 2 ayudantes y 2 auxiliares de tráfico. Ingresa motoniveladora Komatsu a apoyar frente la misma queda en frente el toldo, debido a que no se cuenta con Unidad de vigilancia. De la misma forma se desplaza minicargador y retrocargador por temas de vigilancia, se requiere apoyo de vigilancia este frente actualmente No cuenta con Kit completo ni suministro de materiales pétreos. ******Las Auxiliares de tráfico requieren intercomunicadores para coordinar cierres perimetrales, la distancia entre cierres alcanza a ser de más de 100 m lo cual dificulta la comunicación. Aún falta Vibrocompactador de 8 tn para completar el Kit de maquinaria. El frente no tiene acopio de material pétreo ni fresado, las actividades que se desarrollan No generan gran impacto en la intervención. *****El avance en obra se ve condicionado por el suministro de pétreos y maquinaria (Vibrocompactador) las áreas intervenidas no se compactan lo cual ocasiona que los vehículos se entierren en vía.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1Actividades desarrolladas por el componente social.

Tramo de Unión Tunales.

Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)
Programa de información y participación comunitaria

Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.

Programa de información y participación comunitaria

•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.

•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual.

•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Tunal Bajo
Y la carpa móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento.
•Acta de compromiso
La profesional social realizó acta de compromiso con el señor Yesid Susa, con el fin de solicitar permiso para la instalación de un tubo, para el manejo de aguas en el predio.

•Reunión Extraordinaria
La Unidad de Mantenimiento vial participa en la reunión extraordinaria convocada por la comunidad de Unión Tunales.

Tramo de San Antonio El Toldo.

Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)

Programa de información y participación comunitaria
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los pasacalles, establecidos contractual. De acuerdo a lo informado en el comité integral quien realiza instalación del pasacalle es la Unidad de Mantenimiento vial
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
carpa móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento.
Tramo de Capitolio.
Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa).
Programa de información y participación comunitaria
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual, pero uno de ello presento deterioro y se rompió, se esta a la espera que el Consorcio Gaviones 95, realice la reposición.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
carpa móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento.

Tramo de San Antonio I

Programa de información y participación comunitaria

Actas de vecindad
Con el fin de dar cumplimiento al proceso de levantamiento de actas de vecindad, la profesional social realizó registro audiovisual (video) que permite evidenciar el estado actual de las cercas, viviendas y demás elementos aledaños al tramo vial objeto de intervención. La profesional social cuanta, con 4 actas firmadas por los propietarios de los predios, quedan pendiente por firmar 4 actas, una vez se obtenga todo el paquete completo de las actas de vecindad de apertura, la entidad ejecutora realizará radicación para su revisión.

2. RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV.
La interventoría realizó recorrido conjunto en los frentes de obra activos, con el de realizar seguimiento a las actividades de gestión social.
3. COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERMV
La interventoría realiza el comité de seguimiento integral 50, con el fin de realizar seguimiento al desarrollo del contrato. el 3 de junio del 2025, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social, con el fin de realizar seguimiento al proyecto.
4INFORMES MENSUALES.
La entidad ejecutora da respuesta a las observaciones del informe 11 mes de abril Respuesta a Radicado: 20251920081301 Fecha: 27-06-2025, recibido el 1/07/25. "Respuesta a observaciones realizadas en el oficio 186-1-664 con radicado UAERMV No 20251120077662, pero este no es posible revisar por cuanto que no es abrir el link del comunicado, la interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-735 el 1 de julio del 2025, solicitando que se entregado de nuevo.
Se encuentra pendiente el informe mensual social 12, la profesional social se compromete a realizar entrega antes del comité integral

5INFORMES SEMANALES

El consorcio se encuentra al día en el reporte de informes semanales.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Personal UMV / 02-07-2025
1 Inspector.. 1 Oficial. 1 Boal. 2 ayudante, 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión topografía(No se evidencia topógrafo). 1 Operario vibrocompactador. 1 Operador retrocargador. 1 Conductor de volqueta. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador. 1 vigilante.
Maquinaria y equipos de obra: 1 Motoniveladora. 1 retrocargador Jhon Deere. 1 Vibrocompactador 8tn. 1 vibrocompactador 4tn. 1 Volqueta sencilla. 1 minicargador
Observaciones SST:
•Se observa mecánicos realizando instalación de alarma de reversa de Vibrocompactador HAMM, se le pregunta al mecánico y argumenta que realizará reparación de las observaciones de las demás máquinas.
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de Sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Unidades sanitarias en orden y aseo.
•Se observa maquinaria sin sticker del contrato.
•Operarios de maquinaria amarilla, contrato 936 de 2024, Consorcio HyC tienen preoperacional en orden.
•Volqueta presenta golpe fuerte en la parte frontal, lo cual dificulta el cierre de la puerta izquierda además de no tener las luminarias en su totalidad funcionales.
•Se observa etiquetado de sustancias químicas.
•Se evidencia que las auxiliares están realizando cierres en la mitad del PMT esto debido a que tienen que tener punto de vista para poderse avisar ya que los radios no sirven y no pueden comunicarse. Se solicita el arreglo lo más pronto posible para evitar el abandono de los PMT

Personal UMV / 04-07-2025
1 oficial. 1 inspector. 1 Ayudantes. 2 Auxiliares de tráfico. 1 Boal. 1 Tecnologa SST. 1 comisión topografico. 2 operarios de Vibrocompactador. 1 Operador Retro cargador. 1 operario motoniveladora. 1 operario minicargador. 1 operario carro tanque. 1 Vigilante
Maquinaria y equipos de obra: 1 vibrocompactador. 1 Retro cargador. 1 minicargador. 1 carro tanque
Observaciones SST:
•Se evidencia el cambio de parque de maquinaria. Sin embargo, el retrocargador que llegó era el que estaba asignado a tramo capitolio, la máquina trabaja en tercera marcha.
•Vibrocompactador de 8 tn se cambia por uno doble tandem de 4 tn, este vibro llega con fallas eléctricas y de dirección.
•No se evidencia llegada de motoniveladora, y la que estaba se la llevan.
•Teniendo en cuenta la observación anterior, se puede identificar que la maquinaria no tiene un chequeo de preingreso. Sigue llegando maquinaria varada.
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Se observa maquinaria sin sticker del contrato.
•PMT en orden
•Señalización SGA en acopio combustible en orden
•Se observan 2 unidades sanitarias en orden.
•Se observa la instalación de gel antibacterial en unidades sanitarias
•Paleta de pare y siga se observa deteriorada
•Se observa retroexcavadora si sticker del contrato
•Se solicitó retiro de barricadas botadas en tramo 5 y 4
•Se observa trabajos de reparación en maquinaria por parte de mecánicos del contratista de maquinaria.
Observaciones SST Tramo San Antonio 1:
Personal UMV / 03-07-2025
1 inspector. 1 Oficiales. 2 Ayudantes. 1 Boal. 2 Auxiliares de tráfico. 1 Comisión Topografica. 1 Conductores camioneta.. 1 Operador de Motoniveladora y Minicargador . 1 Operador de retrocargador. 1 vigilante
Maquinaria y equipos de obra
1 Motoniveladora Komatsu
1 Retrocargador Luding
1 Vibrocompactador doble tándem Ammann (esta máquina nunca ha asistido actividades de obra en este frente)

San Antonio Toldo
Tramo 9
Clima: Lluvia moderada 7:00 a 8:00 am y 10:00 a 11:00 am
Personal UMV
03-07-25
1 residente técnico. 1 profesional SST. 1 profesional ambiental . 1 profesional social. 1 Inspector . 1 Oficiales. 3 Ayudantes. 1 Boal. 2 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topográfica. 1 operador minicargador . 1 Operadores de Motoniveladora. 2 Operadores de retrocargador. 1 operadores de vibrocompactador. 1 Conductores camioneta. 1 conductor de volqueta sencilla. 1 Conductor de Volqueta Doble. 1 Vigilante
Maquinaria y equipos de obra contrato 936: 1 Motoniveladoras. 1 Vibrocompactador . 1 minicargador. 1 Retrocargador CAT . 1 Retrocargador Terex. 1 volqueta sencilla (varada). Maquinaria y equipos del proyecto. 1 Volqueta Doble
Observaciones SST:
•Personal de Sintrauniobras con EPP y overol en orden
•PMT en orden
•Se observa equipos de emergencia (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Operadores de maquinaria contrato 936 de 2024, Consorcio HyC, operador de motoniveladora y volqueta con preoperacional en orden
•Se observan acopios de material granular y pétreos con señalización y cubiertos
•Señalización de acopios de sustancias químicas y de seguridad en orden
•Se observan 4 unidades sanitarias en terreno, en orden y aseo
•Se observa instalación de gel antibacterial en unidades sanitarias.
•Minicargador Bobcat no le funciona la alarma de reversa
•Vibrocompactador doble rodillo no tiene fuerza y por ende no se puede operar en partes inclinadas

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTION AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por la entidad ejecutora.
2Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3Revisión del informe semanal enviado por la entidad ejecutora.
4Se realizo recepción, revisión y aprobación con salvedades del informe de abril de 2025
5Se remite oficio 186-1-738 solicitud de retiro de RCD de San Antonio.
6Participación del comité de seguimiento No 50; donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente.

Frente Capitolio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
Se evidencia retiro de RCD del frente de obra hacia sitio de disposición final.
Se verifico que donde realizaron la acción de movilidad k1+030 se requiere que el área sea correctamente señalizada con triple cinta y se evidencia acopio de materiales pétreos sin medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04. Reiterativo
Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
Se verifico que la UMV mantiene el punto de acopio de RESPEL y combustibles señalizado y etiquetaron las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA.
Se mantiene dos unidades sanitarias portátiles, del proveedor Bamocol, estas no poseen lavamanos, cuentan con mantenimientos semanales.
Se evidencia en el km 0+485 arrastre de materiales pétreos al predio privado, la limpieza inicio desde el pasado 06 de junio de 2025 en ejecución.
Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos, esta actividad se inició con el apoyo de los BOAL. Esta es una actividad continua.
Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
Se mantiene punto ecológico activo y señalizado.
Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
Se mantiene recomendación al contratista de maquinaria que cuando se proceda a realizar reparaciones puntuales de equipos se tomen las medidas de manejo ambiental respectivas, como aislar el suelo con plástico para evitar posibles contaminaciones del suelo y agua por escorrentía.
En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.

Frente Tunales
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
Se evidencio que se mantienen señalizados acopios de pétreos ubicados en el predio del señor Gilberto y al lado del colegio.
En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, el cual se mantiene ubicado para protegerlo de la acción de la lluvia con el fin de evitar proliferación de vectores y malos olores por descomposición de los residuos.
Las canecas de almacenamiento de combustible se mantienen rotuladas de acuerdo con el sistema globalmente armonizado se sugiere se realice seguimiento a la permanencia de esta señalización y se mantenga el área ordenada.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera.
Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.

* cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
*Se evidencia realización de jornada de orden y aseo en el campamento y frente de obra.
*Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
*Se cuenta con dos unidades sanitarias en sitio del proveedor Bamocol, las cuales no cuentan con lavamanos, se evidencia mantenimientos semanales.
El acopio de Pétreos ubicado en el tramo 3 al cual se colocó contención se mantiene con medidas de manejo ambiental, sin embargo, se mantiene la solicitud reiterativa en comités del retiro de los materiales pétreos que se cayeron en el costado posterior actividad que aún no se ha realizado
*Frente San Antonio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS AREAS)

Componente Técnico



Descripción Foto 1.

frente San Antonio. K2+620 a K2+610 A: 4,60 Acción de movilidad



Descripción Foto 2.

frente San Antonio. K2+620 a K2+610 A: 4,60 Acción de movilidad Excavación e:0,40 Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15



Descripción Foto 3.

frente San Antonio. K2+620 a K2+610 A: 4,60 Acción de movilidad Excavación e:0,40 Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15



Descripción Foto 4.

frente San Antonio. K2+620 a K2+610 A: 4,60 Acción de movilidad Excavación e:0,40 Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15



Descripción Foto 5

Frente Tunales. Se realiza perfilacion de subrasante, desplazando el material de corte hacia menores para realizar lleno y confirmar subrasante. Esta actividad se realiza con relleno de base granular en el punto k0+840 a K0+860



Descripción Foto 6

Frente Tunales. Se realiza perfilacion de subrasante, desplazando el material de corte hacia menores para realizar lleno y confirmar subrasante. Esta actividad se realiza con relleno de base granular en el punto k0+840 a K0+860

Componente Social



Descripción Foto 7

Participación reunión extraordinaria Unión Tunales



Descripción Foto 8

Frente Tunales. levantamiento de actas de compromiso predio del señor Yesid Susa

Componente SST



Descripción Foto 9

Frente San Antonio. Kit de emergencias en orden



Descripción Foto 10

Frente San Antonio. Señales de PMT en orden

Componente Ambiental



Descripción Foto 11

Frente San antonio. PMT correctamente implementado



Descripción Foto 12

Frente San Antonio. Acopios que requieren adecuación
