Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	APU,01			DESCRIPCIÓN		PINTURA PARA FACHADA 2 MANOS PRIMERA CALIDAD RESISTENTE A LA INTEMPERIE, HIDROREPELENTE, ANTIHONGOS, LA		UNIDAD	M2

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL
FACHADA CALLE 5 ZONA OFICINAS		30,00	6,75		1,00		202,5	202,5
ESPACIO OFICINAS SEGUNDO PISO		-23,22	2,45		1,00		-56,89	-56,89
VENTANAS SEGUNDO PISO		-1,36	-1,46		4,00		1,99	7,96
PEURTA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		-2,77	1,21		1,00		-3,35	-3,35
PUERTAS OFICINA DE CONTROL		-2,77	1,21		1,00		-3,35	-3,35
PUERTAS DE LA OFICINA 3		2,90	1,21		1,00		3,51	3,51
PUERTA OFICINA 4		-1,58	1,23		1,00		-1,94	-1,94
PUERTA INGRESO AL SEGUNDO PISO CALLE 5		-2,94	1,97		1,00		-5,79	-5,79
VENTANAS CALLE 5 OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		-1,47	1,17		2,00		-1,72	-3,44
VENTANA 3 OFICINAS PRIMER PISO CALLE 5		-1,75	1,17		1,00		-2,05	-2,05
VENTANA 4 OFICINAS PIRMER PISO CALLE 5		-1,35	1,17		1,00		-1,58	-1,58
VENTANA 5 OFICINAS PIRMER PISO CALLE 5		-1,75	1,17		1,00		-2,05	-2,05
VENTANA OFICINAS SEGUNDO PISO CALLE 5		-1,75	1,19		4,00		-2,08	-8,32
DISEÑO DE ARCO DE REBAJADO		-3,90	0,25		10,00		-0,98	-9,8
ZOCALO SUPERIOR DE PARED CALLE 5		-17,60	0,30		1,00		-5,28	-5,28
ZOCALO INFERIOR DE PARED CALLE 5		-21,13	0,20		1,00		-4,23	-4,23
ALAR CALLE 5		30,00	1,20		1,00		36	36
BARANDA PASAMANOS CALLE 5		3,07	0,17		7,00		0,52	3,64
BARANDA BASE CALLE 5		3,07	0,23		7,00		0,71	4,97
COLUMNAS REDONDAS CALLE 5		1,90	0,76		6,00		1,44	8,64
CAPITEL COLUMNAS REDONDAS CALLE 5		0,30	1,10		6,00		0,33	1,98
FACHADA CALLE 5 ZONA ALTA		13,00	7,30		1,00		94,9	94,9
ALAR CALLE 5 ZONA FACHADA ALTA		13,50	1,20		1,00		16,2	16,2
PUERTAS		-2,40	1,20		2,00		-2,03	-4,06
VENTANA 1		-1,50	1,35		1,00		-2,02	-2,02
VENTANA 2		-1,30	1,55		1,00		-2,02	-2,02
PARTE SUPERIOR TEATRO, ZONA SOBRE LA CUBIERTA		11,2	3,8		1		42,56	42,56
PUERTAS DE LA PARTE SUPERIOR DEL TEATRO, SOBRE LA CUBUERTA		-2	0,7		2		-1,4	-2,8
PARTE IZQUIERDA DE LA ALCALDIA, MURO COLINDA CON SUPERMERCADO		11	3,8		1		41,8	41,8
VIGA SOBRECOLUMNA PISO 1 CARRERA 5		49,70	0,55		1,00		27,34	27,34
VIGA SOBRECOLUMNA PISO 1 ESQUINA ENTRE CALLE 5 Y CARRERA 5		1,85	0,55		1,00		1,02	1,85
VIGA SOBRE COLUMANA PISO 2 CALLE 5		20,65	0,52		1,00		10,74	1,85
TOTAL								376,73

ESQUEMA









CONTRATISTA:

Firma
Nombre: ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:

Firma
Nombre: ALVARO PEDREROS CASALLAS

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025									
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA									
CONTRATO No.	274-2025									
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS			
ITEM	APU.02			DESCRIPCIÓN		PINTURA PARA FACHADA 2 MANOS PRIMERA CALIDAD RESISTENTE A LA INTEMPERIE, HIDROREPELENTE, ANTIHONGOS, LA			UNIDAD	ML

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	Segmentos	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL
LOS DE LAS VENTANAS DE LA FACHADA (OFICINA DE COMISARIA Y OFICINA DEL FONDO) CALLE		5,54			4,00			22,16
BARANDA PARA BALAUSTRES CARA INTERNA CALLE 5 SEGUNDO PISO ZONA LATERAL DEL HALL DEL CONCEJO		0,60		6,00	1,00			3,6
BARANDA PARA BALAUSTRES CARA EXTERNA CARRERA 5 SEGUNDO PISO		0,60		14,00	1,00			8,4
BARANDA PARA BALAUSTRES CARA INTERNA CARRERA 5 SEGUNDO PISO		0,60		14,00	15,00			126
SOBRECOLUMNAS SEGUNDO PISO CALLE 5		23,22			2,00			46,44
COLUMNAS REDONDAS SEGUNDO PISO CALLE 5		-0,35			6,00			-2,1
BARANDA PARA BALAUSTRES CARA EXTERNA CALLE 5 SEGUNDO PISO ZONA PERSONERIA		0,60		14,00	7,00			58,8
BARANDA PARA BALAUSTRES CARA INTERNA CALLE 5 SEGUNDO PISO ZONA PERSONERIA		0,60		14,00	7,00			58,8
DISEÑO ARCO REBAJADO EN LA FACHADA SOBRE LA CALLE 5		3,90			10,00			39
ZOCALO SUPERIOR DE PARED CALLE 5		17,60			1,00			17,6
ZOCALO INFERIOR DE PARED CALLE 5		21,13			1,00			21,13
TAPA FILO ALAR CALLE 5		43,00			1,00			43
PARTE SUPERIOR TEATRO, ZONA SOBRE LA CUBIERTA BORDES Y LETRAS		32,00			1,00			32
FILOS DE LAS PUERTAS DE OFICINAS PRIMER PISO CALLE 5		7,06			4,00			28,24
FILO PUERTA QUE DIRIGE AL SEGUNDO PISO CALLE 5		7,85			1,00			7,85
FILOS VENTANAS OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		5,58			2,00			11,16
FILOS VENTANA 1 OFICINA 2 CALLE 5		5,08			1,00			5,08
FILOS VENTANA 2 OFICINA 2 CALLE 5		5,58			1,00			5,58
FILOS VENTANA 1 OFICINA DE HACIENDA		5,70			1,00			5,7
FILOS VENTANA 2 OFICINA DE HACIENDA		5,77			1,00			5,77
FILOS DEL CAJERO		1,84			1,00			1,84
FILOS PUERTA OFICINA DE HACIENDA		4,62			1,00			4,62
FILOS PUERTA TEATRO		5,64			1,00			5,64
FILOS PUERTA INPEC		4,84			1,00			4,84
FILOS PUERTA ALCALDPIA		4,58			1,00			4,58
FILOS PUERTA DE RADICACIPON		4,52			1,00			4,52
FILOS PUERTAS DE SERVICIOS PUBLICOS		4,52			1,00			4,52
VIGAS QUE SOPORTAN EL VALCON		0,45			6			2,7
TOTAL								574,77

ESQUEMA



CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS


Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA


FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA
CONTRATO No.	274-2025
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7 — **SUPERVICIÓN**: ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS
ITEM	18,23 — **DESCRIPCIÓN**: VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Incluye resane y estuco) — **UNIDAD**: M2

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
VINILO PARA FACHADA CARRERA 5 PIRMER PISO	3,25	49,70		0,00	0,00	0,00	161,53	161,53	
PUERTA SECRETARIA DE HACIENDA	1,32	1,50		0,00	0,00	0,00	1,980	1,980	
PUERTA TEATRO	-1,50	2,55		0,00	0,00	0,00	-3,83	-3,83	
PUERTA CAJERO GRUPO AVAL	-1,33	1,37		0,00	0,00	0,00	-1,82	-1,82	
PUERTA ALACALDIA	-1,58	1,48		0,00	0,00	0,00	-2,34	-2,34	
PUERTA INPEC	-1,83	2,05		0,00	0,00	0,00	-3,75	-3,75	
PUERTA RADICACIÓN Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,48	1,53		0,00	2,00	0,00	-2,26	-4,52	
VENTANA DE RECOLECCIÓN	-0,72	0,84		0,00	1,00	0,00	-0,6	-0,6	
MUROS ESPACIO VENTANA DE RECOLECCIÓN	1,27	0,44			1,00		0,56	0,56	
	2,45	0,56			2,00		1,37	2,74	
ZONA EN PINTURA UNMUNE A LA HUMEDAD	-0,92	38,56			1,00		-35,48	-35,48	
VINILO PARA FACHADA DE LA CARRERA 5 SEGUNDO PISO	2,75	49,70			1,00		136,68	136,68	
GUARDAESCOBA	-0,22	49,70			1,00		-10,93	-10,93	
PUERTAS SEGUNDO PISO	-2,18	1,20			9,00		-2,62	-23,58	
ESPACIO PARA ESCALERA	-2,25	1,45			1,00		-3,26	-3,26	
PAREDES LATERALES ESPACIO PARA LA ESCALERA	2,50	0,74			2,00		1,85	3,7	
TECHO CARRERA 5 SEGUNDO PISO ZONA ESCALERAS	5,2	3,2			1		16,64	16,64	
VINILO PARA FACHADA DE LA CALLE 5 SEGUNDO PISO	2,45	23,22			1		56,89	56,89	
PUERTAS SEGUNDO PISO CALLE 5	-1,84	0,94			7,00		-1,73	-12,11	
PUERTA DEL BAÑO SEGUNDO PISO CALLE 5	-1,86	0,66			1		-1,23	-1,23	
PUERTA DE LA COCINA SEGUNDO PISO CALLE 5	-1,85	0,55			1		-1,02	-1,02	
VENTANAS SEGUNDO PISO CALLE 5	-1,39	1,37			5,00		-1,9	-9,5	---
ESPACIO PARA ESCALAERA SEGUNDO PISO CALLE 5	-1,8	2,4			1		-4,32	-4,32	
PARED QUE DIVIDE EL BAÑO Y LA COCINA CARA EXTERNA	2,45	2,1			1		5,15	5,15	
VENTANA BAÑO SEGUNDO PISO CALLE 5	-0,52	1			1		-0,52	-0,52	
TECHO SEGUNDO PISO CALLE 5		23,22	1,03		1		23,92	23,92	
MURO IZQUIERDO ENTRADA A LA COCINA CALLE 5	2,45	0,29			1,00		0,71	0,71	
GUARDA ESCOBA SEGUNDO PISO CALLE 5	-0,3	21,3			1,00		-6,39	-6,39	
VINILO PARA LA OFICINA DE LA COMISARIA MUROS HORIZONTALES	2,43	4,5			2		10,94	21,88	
VINILO PARA LA OFICINA DE LA COMISAIRIA MUROS VERTICALES	2,43	4,18			2		10,16	20,32	
PUERTA OFICINA COMISARIA	-2,26	0,94			1		-2,12	-2,12	
VENTANAS	-1,36	1,46			2		-1,99	-3,98	
GUARDAESCOBA HORIZONTALES	-0,05	4,5			2		-0,23	-0,46	
GUARDAESCOBA VERTICALES	-0,05	4,18			2		-0,21	-0,42	
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS MUROS HORIZONTALES OFICINAS 1	2,45	9,37			2		22,96	45,92	
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS MUROS VERTICALES OFICINAS 1	2,45	4,5			4		11,03	44,12	
BAÑO OFICINA OBRAS PUBLICSAS	-1,7	0,45			1		-0,77	-0,77	
BAÑO OFICINA OBRAS PUBLICSAS	-1,5	0,45			1		-0,68	-0,68	
PUERTA OFICINA DE OBRAS PUBLICOS	-2,45	1,21			1		-2,96	-2,96	
VENTANAS OFICINA DE OBRAS PUBLICOS	-1	1,19			3		-1,19	-3,57	
PARTE INFERIOR VENTANAS DE OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	0,35	1,27			1,00		0,44	0,44	
DIVISIÓN MURO	-0,1	4,50			1,00		-0,45	-0,45	
PUERTA DEL BAÑO DE LA OFCINA DE OBRAS PUBLICAS	-2,14	0,93			1,00		-1,99	-1,99	
ZONA ESCALERAS EN LA CARRERA 5 MURO LATERALES	6,23	3,22			2		20,06	40,12	
ZONA ESCALERAS EN LA CARRERA 5 MUROS FRONTALES	6,23	4,95			2		30,84	61,68	
PUERTA ENTRADA A LA ALCALDÍA CARRERA 5	-2,48	1,48			1		-3,67	-3,67	
CONTADORES EN LA ZONA DE LAS ESCALERAS 1	-0,8	0,82			1		-0,66	-0,66	
CONTADORES EN LA ZONA DE LAS ESCALERAS 2	-0,54	0,25			1		-0,14	-0,14	













CONTADORES EN LA ZONA DE LAS ESCALERAS 3		-0,33	0,48			1		-0,16	-0,16
ZONA ESCALERAS EN LA CARRERA 5 ESPACIO ESCALERA LLEGADA		-1,8	2,4			1		-4,32	-4,32
GUARDA ESCOBA ESCALERAS CARRERA 5		-0,2	14,32			1		-2,86	-2,86
DESCANSO ESCALERA FRONTAL		-1,35	3,22			1		-4,35	-4,35
DESCANSO ESCALERA LATERALES		-1,35	1,65			2		-2,23	-4,46
MUROS LATERALES PUERTA INGRESO A ESCALERAS CARRERA 5		0,69	2,5			2		1,73	3,46
MURO BAJO LA ESCALERA LATERA COCINA		1,35	0,85			1		1,15	1,15
MURO SUPERIOR DE LA PUERTA A INGRESO A LAS ESCALERAS CARRERA 5		0,7	1,8			1		1,26	1,26
ZONA ESCALERA EN LA CALLE 5 MUROS LATERALES		6,36	4,5			2		28,62	57,24
ZONA ESCALERA EN LA CALLE 5 PLACA DE LA ESCALERA		3,02	1,1			1		3,32	3,32
		4,48	1			1		4,48	4,48
ZONA ESCALERA EN LA CALLE 5 ESCALERAS PARTE DESCANSO		1,8	1,95			1		3,51	3,51
ZONA ESCALERA EN LA CALLE 5 PEURTA DE INGRESO		3,9	2,78			1		10,84	10,84
ZONA ESCALERA EN LA CALLE 5 PUERTA		-1,97	2,98			1		-5,87	-5,87
TRIANGULO ESCALERA PRIMER PISO		-2,2	2,15			1		-2,37	-2,37
GUARDA ESCOBA CALLE 5 ZONA ESCALERAS		-0,08	18,67			1		-1,49	-1,49
OFICINA ALCALDIA MUROS HORIZONTALES		3,7	2,96			2		10,95	21,9
OFICINA ALCALDIA MUROS VERTICALES		5,1	2,96			2		15,1	30,2
GUARDA ESCOBA		-10,64	0,08			1		-0,85	-0,85
VENTANA		2,52	1,5			1		3,78	3,78
PUERTA BAÑO		-2,5	1,16			1		-2,9	-2,9
CONEXIÓN SALA DE JUNTASS		-5,1	2,96			1		-15,1	-15,1
PUERTA		-2,52	3,7			1		-9,32	-9,32
PAREDES LATERALES PUERTA		0,67	2,54			2,00		1,7	3,4
SALA DE JUNTAS MUROS VERTICALES		5,57	2,58			2,00		14,37	28,74
SALA DE JUNTAS MUROS HORIZONATLES		5,10	2,58			1,00		13,16	13,16
VIGA MADERA SOBRE CONEXIÓN A LA SECRETARIA		-1,05	0,14			1,00		-0,15	-0,15
DISEÑO DE PIEDRA		-2,58	0,52			2,00		-1,34	-2,68
PUERTA		-2,55	1,60			1,00		-4,08	-4,08
PAREDES LATERALES PUERTA		2,54	0,67			2,00		1,7	3,4
PUERTA CONEXIÓN A LA ALCALDÍA		-2,35	5,10			1,00		-11,99	-11,99
VIGA MADERA SUPERIOR A LA CONEXIÓN A ALCALDÍA		-4,50	0,15			1,00		-0,68	-0,68
VENTANA		-1,43	1,70			1,00		-2,43	-2,43
MURO QUE SOPORTA LA VENTANA		1,37	0,60			1,00		0,82	0,82
RECEPCIÓN		2,58	1,48			1,00		3,82	3,82
TOTAL									616,33







CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	18,24			DESCRIPCIÓN		VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)		UNIDAD	ML

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
A ESCOBA ESCALERAS CARRERA 5		18,92		18,92	1			18,92	
DA ESCOBA ESCALERAS CALLE 5		18,67		18,67	1			18,67	
ESCOBA SEGUNDO PISO CALLE 5		22,9		22,90	1,00		0	22,9	
TAS SEGUNDO PISO CALLE 5		-1,20		-1,20	9,00			-10,8	
PARA BAJAR A LAS ECALERAS		-1,48		-1,48	1,00			-1,48	
TA DE LA COCINA DEL SEGUNDO PISO DE LA CALLE 5		0,52		0,52	1,00			0,52	
RTAS LATERLAES DEL SEGUNDO PISO DE LA CALLE 5		0,94		0,94	2,00			1,88	
VANO SUPERIOR DEL ESPACIO DE LAS ESCALERAS DEL SEGUNDO PISO EN LA CERRERA 5		1,45		1,45	3,00			4,35	
FILOS DE LA OFICINA DE LA COMISARIA CON LA FACHADA Y PUERTA OPUESTA		1,40		1,40	2,00			2,8	
FILO DE LAS VENTANAS SEGUNDO PISO CALLE 5		5,52		5,52	5,00			27,6	
FILO DE LA PARED IZQUIERDA COCINA SEGUNDO PISO CALLE 5		2,45		2,45	1,00			2,45	
DIVISION OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		5,57		5,57	1,00			5,57	
ESCALONES DE LA ESCALERA CALLE 5		2,15		2,15	1,00			2,15	
FILOS OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS		11,15		11,15	1,00			11,15	
TOTAL								106,68	






CONTRATISTA

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	18,11			DESCRIPCIÓN		ESMALTE SOBRE MADERA LLENA		UNIDAD	M2

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL
PUERTA COCINA EN LA ALCALDÍA	1,68		0,72		1,00		1,21	1,21
OFICINAS SEGUNDO PISO CALLE 5 BALCONES	2,40		1,20		2,00		2,88	5,76
PUERTA HACIENDA	1,10		1,50		1,00		1,65	1,65
PUERTA TEATRO	1,10		2,23		1,00		2,45	2,45
PUERTA RADICACIÓN	0,85		1,53		1,00		1,3	1,3
PUERTA SERVICIOS PÚBLICOS	0,85		1,53		1,00		1,3	1,3
PUERTAS SEGUNDO PISO CALLE 5	1,84		0,94		7,00		1,73	12,11
PUERTA SEGUNDO PISO BAÑO CALLE 5	1,86		0,62		1,00		1,15	1,15
PUERTA SEGUNDO PISO COCINA CALLE 5	1,85		0,54		1,00		1	1
PUERTAS PRIMER PISO CALLE 5	2,58		1,23		1,00		3,17	3,17
PUERTA DEL ALMACEN	2,90		1,21		1,00		3,51	3,51
VENTANAS SOBRE LA CALLE 5 OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	1,47		1,17		2,00		1,72	3,44
VENTANAS SOBRE LA CALLE 5 OFICINA DE HACIENDA	0,4		1,35		1,00		0,54	0,54
ALAR SEGUNDO PISO CARRERA 5		60,9	0,43		1,00		26,19	26,19
SOPORTES VIGA SOPORTA CUBIERTA SEGUNDO PISO CARRERA 5		0,80	0,20		15,0		0,16	2,4
VIGA SEGUNDO PISO CARRERA 5		49,7	0,46		1		22,86	22,86
TOTAL								90,04

ESQUEMA





CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	18.10			DESCRIPCIÓN	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL			UNIDAD	ML

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
PUERTA HACIENDA travesaños		8,20		8,20	1,00			8,2	
PUERTA HACIENDDA marco		10,81		10,81	1,00			10,81	
PUERTA TEATRO travesaños		14,30		14,30	1,00			14,3	
PUERTA TEATRO marco		6,45		6,45	1,00			6,45	
PUERTA RADICACIÓN travesaños		23,76		23,76	1,00			23,76	
PUERTA RADICACIÓN marco		6,96		6,96	1,00			6,96	
PUERTA SERVICIOS PÚBLICOS travesaños		23,76		23,76	1,00			23,76	
PUERTA SERVICIOS PÚBLICOS marco		6,46		6,46	1,00			6,46	
PUERTA COCINA ALCALDIA marco		4,24		4,24	1,00			4,24	
PUERTAS SEGUNDO PISO CARRERA 5 travesaños		9,38		9,38	9,00			84,42	
PUERTAS SEGUNDO PISO CARRERA 5 marco		6,32		6,32	9,00			56,88	
PUERTAS CON BALCÓN SEGUNDO PISO CALLE 5 travesaños		9,38		9,38	2,00			18,76	
PUERTAS CON BALCÓN SEGUNDO PISO CALLE 5 marco		6,32		6,32	2,00			12,64	
PUERTA 1 CALLE 5		6,39		6,39	1,00			6,39	
PUERTA 2 CALLE 5		7		7,00	1,00			7	
PURRTAS SEGUNDO PISO CALLE 5 marco		6,42		6,42	7,00			44,94	
PUERTAS SEGUNDO PISO CALLE 5 marco baño		5,80		5,80	1,00			5,8	
PUERTAS SEGUNDO PISO CALLE 5 marco cocina		5,82		5,82	1,00			5,82	
VENTANAS EN LA FACHADA DE LA CARRERA 5 SEGUNDO PISO		12,51		12,51	4,00			50,04	
TRAVESAÑOS DEL BALCON EN LA CALLE 5		0,90			26,00			23,4	
GUARDA ESCOBA OFICINA ALCALDIA		10,54			1,00			10,54	
GUARDA ESCOBA SALA DE JUNTAS		13,9			1,00			13,9	
TOTAL								445,47	







CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025									
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA									
CONTRATO No.	274-2025									
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7						SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	18,90			DESCRIPCIÓN		ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA			UNIDAD	M2

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL
Puerta que dirige al segundo piso carrera 5	2,85		2,00		1,00		5,7	5,7
PUERTA ALCALDÍA	2,58		1,48		2,00		3,82	7,64
SUPERIOR VENTANA 4 CALLE 5	0,57		1,00		1,00		0,57	0,57
CONTADORES ZONA ESCALERA ALCALDIA	0,82	0,60			1,00		0,49	0,49
CONTADORES ZONA ESCALERA ALCALDIA	0,53	0,25			1,00		0,13	0,13
CONTADORES ZONA ESCALERA ALCALDIA	0,32	0,48			1,00		0,15	0,15
VENTANA CONTADOR 1	-0,36	0,36			1,00		-0,13	-0,13
PUERTA DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	2,77	1,21			1,00		3,35	3,35
TOTAL								17,9

ESQUEMA





CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO DEOBRAS PUBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025							
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA							
CONTRATO No.	274-2025							
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS	
ITEM	18,80			DESCRIPCIÓN		ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	UNIDAD	ML

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
PUERTA ALCALDÍA marco		6,6		6,6	1			6,6	
PUERTA INPEC marco		8,16		8,16	1,00			8,16	
materas con diseño sobre la carrera 5		2,47		2,47	14,00			34,58	
pasamanos de la escalera que dirige al segundo piso de la alcaldía alcaldía		7,63		7,63	3,00			22,89	
travesaños de la escalera que dirige dirige al segundo piso de la alcaldía		0,56		0,56	41,00			22,96	
barrotes de la escalera que dirige al segundo piso de la alcaldía		3,65		3,65	1,00			3,65	
dieño en cuadricula de la escalera que durige al segundo piso de la alcaldía		0,60		0,60	7,00			4,2	
Lamparas sobre el primero piso carrera 5		1,35		1,35	8,00			10,8	
Ventana de la oficina obras publicas		9,40		9,40	2,00			18,8	
Ventana de la oficinas tesoreria		11,91		11,91	1,00			11,91	
Ventana de la oficina tesoreria 1 rejilla		15,76		15,76	1,00				
Ventana de la oficina tesoreria 2		13,58		13,58	1,00			13,58	
Ventana de la oficina tesoreria 2 rejilla		17,36		17,36	1,00			17,36	
Ventana de la oficina de hacienda sobre la calle 5		17,57		17,57	1,00			17,57	
Ventana de la oficina de hacienda sobre la calle 5 marco		20,79		20,79	1,00			20,79	
Ventana 2 de la oficina de hacienda sobre la calle 5 rejilla		17,56		17,56	1,00			17,56	
Ventana 2 de la oficina de hacienda sobre la calle 5 marco		22,21		22,21	1,00			22,21	
marco de la puerta de obras publicas		11,01		11,01	1,00			11,01	
ventana 3 travesaños		18,31		18,31	1,00			18,31	
ventana 3 rejilla		19,22		19,22	1,00			19,22	
ventanas segundo piso calle 5 oficina de comisaria		9,70		9,70	1,00			9,7	
ventanas segundo piso calle 5 oficina de inspección		9,70		9,70	1,00			9,7	
ventanas segundo piso calle 5 oficina de personeria		9,30		9,30	3,00			27,9	
ventana lateral baño piso 2 sobre la calle 2		3,32		3,32	1,00			3,32	
pasamanos de la escalera que dirigeal segundo piso de la alcaldía alcaldía		7,60		7,60	4,00			30,4	
travesaños de la escalera que dirige dirige al segundo piso de la alcaldía alcaldía		0,43		0,43	40,00			17,2	
barrotes de la escalera que dirige al segundo piso de la alcaldía		6,02		6,02	1,00			6,02	
dieño en cuadricula de la escalera que durige al segundo piso de la alcaldía		3,36		3,36	1,00			3,36	
marco de puerta rejilla que se encuentra en el descanso de la escalera por la calle 5		4,72		4,72	1,00			4,72	
puerta rejilla que se encuentra en el descanso de la escalera por la calle 5		14,95		14,95	1,00			14,95	
TOTAL								429,43	







CONTRATISTA

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

pa		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTIBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	6.15			DESCRIPCIÓN		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3, E=1.5CM		UNIDAD	M2

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL
pañete oficina de obras publicas	1,15		8,20	0,00	1,00	0,00	9,43	9,43
pañete 2 oficinas calle 5	0,87		2,00	0,00	1,00	0,00	1,74	1,74
pañete 3 antes del ingreso al segundo piso calle 5	0,81		1,09	0,00	1,00	0,00	0,88	0,88
pañete 3 despues del ingreso al segundo piso calle 5	0,81		8,00	0,00	1,00	0,00	6,48	6,48
pañete finalizando oficinas piso 1 calle 5	4,24		0,28		1,00		1,19	1,19
pañete en la ventana 5 calle 5	2,56		1,75	0,00	1,00	0,00	4,48	4,48
pañete en la zona de los balcones	2,65		1,50	0,00	1,00	0,00	3,98	3,98
pañete en esquina de la oficina de hacienda	2,38		9,50	0,00	1,00	0,00	21,16	21,16
	-1,45		1,00	0,00				
pañete 2 zona de los balcones	1,52		2,50		1,00		3,8	3,8
TOTAL								53,14

ESQUEMA







CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS


Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	6.16			DESCRIPCIÓN		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3, E=1.5CM (LINEAL)		UNIDAD	ML

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
peñete del filo entre oficina entreda segundo piso personeria y oficina de obras publicas		0,94		0,94	1,00			0,94	
pañete 2 filo		0,84		0,84	1,00			0,84	
pañete 3 filo		0,80		0,80	1,00			0,8	
pañetes en los viseles sobre la calle 5		0,50		0,50	1,00			0,50	
Pañete en las columnas de primer piso por la carrera 5		0,85		0,85	15,00			12,75	
Pañetes varios en la carrera 5 en la zona pintura resistente a la interperie		0,25		0,25	35,00			8,750	
TOTAL								24,587	







CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	15,90			DESCRIPCIÓN	MALLA CON VENA			UNIDAD	M2

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
pañete oficina de obras publicas	1,35		2,20		1,00		2,97	2,97	
pañete 2 oficina de obras publicas	1,20		0,45		1,00		0,54	0,54	
pañete 3 puerta ingreso al segundo piso calle 5	0,81		1,64		1,00		1,33	1,33	
pañete en la ventana 5 calle 5	2,25		1,75		1,00		3,94	3,94	
pañete en la zona de los balcones	2,65		1,50		1,00		3,98	3,98	
pañete en esquina de la oficina de hacienda	2,38 -1,45		9,50 1,00		1,00		21,16	21,16	
pañete 2 zona de los balcones	1,30		2,50		1,00		3,25	3,25	
TOTAL								37,17	



CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	1,13			DESCRIPCIÓN	DEMOLICION PAÑETE MURO			UNIDAD	M2

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL
pañete oficina de obras publicas	1,15		8,20	0,00	1,00	0,00	9,43	9,43
pañete 2 oficinas calle 5	0,87		2,00	0,00	1,00	0,00	1,74	1,74
pañete 3 antes del ingreso al segundo piso calle 5	0,81		1,09	0,00	1,00	0,00	0,88	0,88
pañete 3 despues del ingreso al segundo piso calle 5	0,81		8,00	0,00	1,00	0,00	6,48	6,48
pañete finalizando oficinas piso 1 calle 5	4,24		0,28		1,00		1,19	1,19
pañete en la ventana 5 calle 5	2,25		1,75	0,00	1,00	0,00	3,94	3,94
pañete en la zona de los balcones	2,65		1,50	0,00	1,00	0,00	3,98	3,98
pañete en esquina de la oficina de hacienda	2,38 -1,45		9,50 1,00	0,00 0,00	1,00	0,00	21,16	21,16
pañete 2 zona de los balcones	1,30		2,50		1,00		3,25	3,25
peñete del filo entre oficina entreda personeria y oficina de obras publicas		0,94	0,14		1,00		0,13	0,13
pañete 2 filo		0,84	0,14		1,00		0,12	0
pañete 3 filo		0,80	0,14		1,00		0,11	0
pañetes en los viseles sobre la calle 5		0,50	0,10		1,00		0,05	0,50
Pañete en las columnas de primer piso por la carrera 5		0,85	0,72		15,00		0,61	0,85
Pañetes varios en la carrera 5 en la zona pintura resistente a la interperie		0,35	0,10		32,00		0,04	0,35
TOTAL								53,88

ESQUEMA



CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

					ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA	
Código		**Versión**	1	VERSION 1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					**SUPERVICION**		ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS	
ITEM	1,14			**DESCRIPCION**	DEMOLICION CIELO RASO FALSO			**UNIDAD**	M2

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
demolición alar zona inspección		9,08	1,20	1,00	1,00		10,9	10,9	
demolición del alero	0,25	9,08		1,00	1,00		2,27	2,27	
demolición alar zona alta fachada calle 5		1,70	1,20	0,00	1,00		2,04	3,04	
demolición alar zona alta fachada calle 5	0,25	1,70		0,00	1,00		0,43	0,43	
TOTAL								16,64	





CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	APU.03			DESCRIPCIÓN	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6MM (Incluye pintura vinilo tipo coraza para exterior 3 manos, resane de juntas, estructura en omegas y viguetas) altura de trabajo n			UNIDAD	M2

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
alar zona inspección		9,08	1,20		1,00		10,9	10,9	
Alar calle 5 zona fachada alta		1,70	1,20		1,00		2,04	2,04	
TOTAL								12,94	





CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELY S BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	APU.04			DESCRIPCIÓN	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6MM (Incluye pintura vinilo tipo coraza para exterior 3 manos, resane de juntas, estructura en omegas y viguetas) altura de trabajo n			UNIDAD	ML

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
alar zona inspección		9,08		9,08	1,00	0,00	0	9,08	
Alar calle 5 zona fachada alta		1,70		1,70	1,00	0,00	0	1,70	
TOTAL								10,78	



CONTRATISTA

Firma

Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR


Firma

Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		**Versión**	1	VERSION 1	**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA**	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					**SUPERVICIÓN**	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	1,12			**DESCRIPCIÓN**	DEMOLICION ENCHAPE MURO			**UNIDAD**	M2

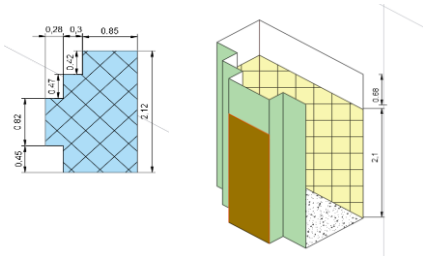DESCRIPCION	**ALTO (m)**	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**	**LONG**	**UND**	**V(m3)**	**A (m2)**	**TOTAL**	**ESQUEMA**
muro 1	2,10		2,12	0,00	1,00	0,00	4,45	4,45	
muro 2	2,10		0,85	0,00	1,00	0,00	1,79	1,79	
muro 3	2,10		0,42	0,00	1,00	0,00	0,88	0,88	
muro 4	2,10		0,30	0,00	1,00	0,00	0,63	0,63	
muro 5	2,00		0,47	0,00	1,00	0,00	0,94	0,94	
muro 6	2,00		0,28	0,00	1,00	0,00	0,56	0,56	
muro 7	2,00		0,46	0,00	1,00	0,00	0,92	0,92	
muro 8	2,00		0,28	0,00	1,00	0,00	0,56	0,56	
muro 9	2,10		1,16		1,00		2,44	2,44	
TOTAL								13,17	

CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:


Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	1,10			DESCRIPCIÓN		DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02M		UNIDAD	M2

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
zona 1		0,42	0,85	0,00	1,00	0,00	0,36	0,36	
zona 2		0,47	1,15	0,00	1,00	0,00	0,54	0,54	
zona 3		0,82	1,43	0,00	1,00	0,00	1,17	1,17	
zona 4		0,45	1,16	0,00	1,00	0,00	0,52	0,52	
TOTAL								2,59	

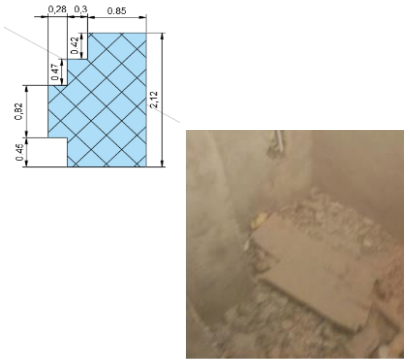

CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**


SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025							
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA							
CONTRATO No.	274-2025							
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS	
ITEM	1.26			DESCRIPCIÓN	DEMOLICION PLACA PISO 0.10M		UNIDAD	M2

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL
zona 1		0,42	0,85	0,00	1,00	0,00	0,36	0,36
zona 2		0,47	1,16	0,00	1,00	0,00	0,55	0,55
zona 3		0,82	1,44	0,00	1,00	0,00	1,18	1,18
zona 4		0,45	1,16	0,00	1,00	0,00	0,52	0,52
				0,00	0,00	0,00	0	0
				0,00	0,00	0,00	0	0
				0,00	3,00	0,00	0	0
				0,00	3,00	0,00	0	0
TOTAL								2,61

ESQUEMA

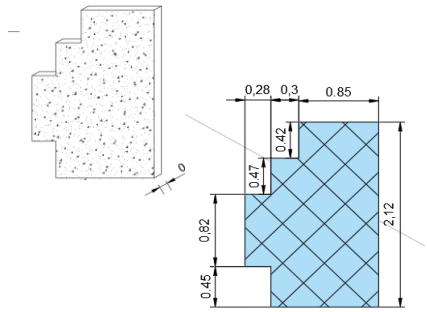

CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA									
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	1,32			DESCRIPCIÓN	DESMONTE APARATOS SANITARIOS			UNIDAD	UND

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
Desmonte sanitario					1,00			1	
Desmonte Lavamanos					1,00			1	
TOTAL								2	

CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR


Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025									
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA									
CONTRATO No.	274-2025									
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7						SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	6,17			DESCRIPCIÓN		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5CM			UNIDAD	M2

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
muro 1	2,78	2,12			1,00		5,89	5,89	
muro 2	2,78	0,85			1,00		2,36	2,36	
muro 3	2,78	0,42			1,00		1,17	1,17	
muro 5	2,78	0,47			1,00		1,31	1,31	
muro 7	0,62	0,82			1,00		0,51	0,51	
muro 9	2,62	0,45			1,00		1,18	1,18	
muro 10	2,75	1,16			1,00		3,19	3,19	
zona 1		0,42	0,85	0,00	1,00	0,00	0,36	0,36	
zona 2		0,47	1,15	0,00	1,00	0,00	0,54	0,54	
zona 3		0,82	1,43	0,00	1,00	0,00	1,17	1,17	
zona 4		0,45	1,16	0,00	1,00	0,00	0,52	0,52	
TOTAL								18,2	



CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:


Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

					ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA	
Código		**Versión**	1	VERSION 1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025							
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA							
CONTRATO No.	274-2025							
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					**SUPERVICION**	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS	
ITEM	6,18		**DESCRIPCION**		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5CM (LINEAL)		**UNIDAD**	ML

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
pañete muro 4		2,62		2,62	1,00	0,00	0	2,62	
pañete muro 6		2,62		2,62	1,00	0,00	0	2,62	
pañete muro 8		2,62		2,62	1,00	0,00	0	2,62	
laterales de la parte superior de la puerta		0,82		0,82	1,00	0,00	0	0,82	
TOTAL								8,68	

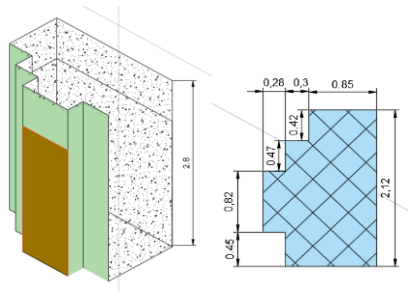

CONTRATISTA

Firma
Nombre: **ANGELYS ORICENO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR


Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	14,10			DESCRIPCIÓN		BALDOSA CERAMICA PISO PARED 30x60 CALIDAD PRIMERA		UNIDAD	M2

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
muro 1	2,00		2,12	0,00	1,00	0,00	4,24	4,24	
muro 2	2,00		0,85	0,00	1,00	0,00	1,7	1,7	
muro 3	2,00		0,42	0,00	1,00	0,00	0,84	0,84	
muro 5	2,00		0,47	0,00	1,00	0,00	0,94	0,94	
muro 7	2,00		0,45	0,00	1,00	0,00	0,9	0,9	
muro 9	2,00		1,16	0,00	1,00	0,00	2,32	2,32	
zona 1 PISO		0,41	0,85	0,00	1,00	0,00	0,35	0,35	
zona 2 PISO		0,41	1,15	0,00	1,00	0,00	0,47	0,47	
zona 3 PISO		0,82	1,43	0,00	1,00	0,00	1,17	1,17	
zona 4 PISO		0,45	1,16	0,00	1,00	0,00	0,52	0,52	
TOTAL								13,45	

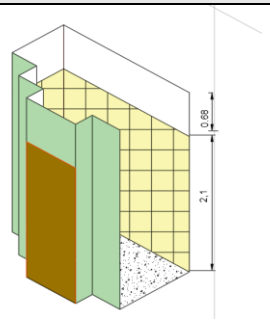

CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:


Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	14,20			DESCRIPCIÓN	BALDOSA CERAMICA PISO PARED 30x60 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)			UNIDAD	ML

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
pañete muro 4		2,00		2,00	1,00	0,00	0	2,00	
pañete muro 6		2,00		2,00	1,00	0,00	0	2,00	
pañete muro 8		2,00		2,00	1,00	0,00	0	2,00	
TOTAL								6	

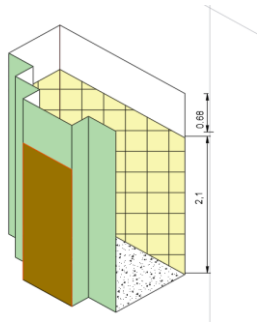

CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:


Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	18.16			DESCRIPCIÓN		ESTUCO Y VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS		UNIDAD	M2

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
pared 1 del baño	0,74	0,85			1,00		0,63	0,63	
pared 2 del baño	0,74	0,42			1,00		0,31	0,31	
pared 3 del baño	0,74	0,47			1,00		0,35	0,35	
Pared 4 del baño	0,74	0,28							
pared 5 del baño	0,74	0,82			1,00		0,61	0,61	
pared 6 del baño	0,66	0,30					0,2		
pared 7 del baño	0,66	0,45			1,00		0,3	0,3	
pared 8 del baño	0,66	0,28					0,18		
pared 9 del baño	0,66	1,13			1,00		0,75	0,75	
zona 1 techo		0,42	0,85		1,00		0,36	0,36	
zona 2 techo		0,47	1,15		1,00		0,54	0,54	
zona 3 techo		0,82	1,43		1,00		1,17	1,17	
zona 4 techo		0,45	1,16		1,00		0,52	0,52	
TOTAL								5,54	





CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA							
CONTRATO No.	274-2025							
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS	
ITEM	17.10			DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E ISNTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)		UNIDAD	UND

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
Sanitario tanque para el baño del concejo				0,00	1,00	0,00	0	1	
				0,00	0,00	0,00	0	0	
				0,00	0,00	0,00	0	0	
				0,00	0,00	0,00	0	0	
				0,00	0,00	0,00	0	0	
				0,00	0,00	0,00	0	0	
				0,00	3,00	0,00	0	0	
				0,00	3,00	0,00	0	0	
TOTAL								1	

CONTRATISTA

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA							
CONTRATO No.	274-2025							
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS	
ITEM	17,70			DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALCION E INSTALACION ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERIA)		UNIDAD	UND

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
orinal de llave para el baño de concejo				0,00	1,00	0,00	0	1	
TOTAL								1	

CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7


SUPERVISOR:

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA							
CONTRATO No.	274-2025							
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS	
ITEM	17.40			DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERIA)		UNIDAD	UND

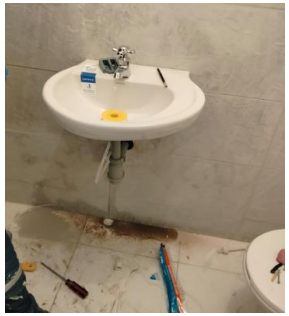DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
lavamanos colgar para el baño del baño				0,00	1,00	0,00	0	1	
				0,00	0,00	0,00	0	0	
				0,00	0,00	0,00	0	0	
				0,00	0,00	0,00	0	0	
				0,00	0,00	0,00	0	0	
				0,00	0,00	0,00	0	0	
				0,00	3,00	0,00	0	0	
				0,00	3,00	0,00	0	0	
TOTAL								1	

CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA							
CONTRATO No.	274-2025							
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS	
ITEM	12,16			DESCRIPCIÓN	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2"		UNIDAD	UND

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
punto hidraulico pvc de 1/2" para el baño del concejo					1,00		0	1	
TOTAL								1	



CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

					ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA	
Código		Versión	1	VERSION 1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA									
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICION	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	11,19			DESCRIPCION		SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"		UNIDAD	UND

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
Salida sanitaria de 2" para el baño del concejo para el orinal					1,00	0,00	0	1	
TOTAL								1	

CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR:

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA										
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA									
CONTRATO No.	274-2025									
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7						SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	15,50			DESCRIPCIÓN		CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)			UNIDAD	M2

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
cielo raso oficina servicios publicos		9,37	4,50	0,00	1,00	0,00	42,17	42,17	
		-1,50	1,30	0,00	1,00	0,00	-1,95	-1,95	
		-0,10	1,27	0,00	1,00	0,00	-0,13	-0,13	
TOTAL								40,09	

CONTRATISTA

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	5,90			DESCRIPCIÓN		MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12M (Incluye vinilo 3 manos)		UNIDAD	M2

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
Drywall divisorio longitudinal		4,18	2,42		1,00		10,12	10,12	
Drywall divisorio transversal		2,62	2,42		1,00		6,34	6,34	
puertas		-2,00	0,80		2,00		-1,6	-3,2	
TOTAL								13,26	

CONTRATISTA

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS

Código		Versión	1	VERSION 1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	

FECHA	15 DE OCTUBRE DEL 2025								
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA								
CONTRATO No.	274-2025								
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS -NIT: 900789383-7					SUPERVICIÓN	ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS		
ITEM	5,10			DESCRIPCIÓN		MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12M (incluye vinilo 3 manos) (LINEAL)		UNIDAD	ML

DESCRIPCION	ALTO (m)	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	LONG	UND	V(m3)	A (m2)	TOTAL	ESQUEMA
filos para las puertas		4,80		4,80	2,00			9,6	
TOTAL								9,6	

CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **ANGELYS BRICEÑO MARTINEZ**
REP. LEGAL CAB CONSTRUCTORA S.A.S.
NIT: 900789383-7

SUPERVISOR

Firma
Nombre: **ALVARO PEDREROS CASALLAS**

SECRETARIO SE OBRAS PÚBLICAS
