
CONTRATO DE OBRA No 2025-2781

"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.

INFORME MENSUAL No. 04

JULIO 01 DE 2025 – JULIO 31 DE 2025

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ: NOMBRE: Arq. María Paz Rosario FECHA: 07-08-2025	REVISÓ: NOMBRE: Ing. Andrés Barriga F. FECHA: 07-08-2025	APROBÓ: NOMBRE: Ing. William Acosta L. FECHA: 07-08-2025
 FIRMA:	 FIRMA:	 FIRMA:
AUXILIAR DE INGENIERÍA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA

MODIFICACIONES			
VERSIÓN	FECHA	DETALLES	ELABORÓ
V1	07/08/2025	Inicial	Arq. María Paz Rosario
V2	13/08/2025	Modificación	Arq. María Paz Rosario
V3	26/08/2025	Modificación	Arq. María Paz Rosario
V4	04/09/2025	Modificación	Arq. María Paz Rosario
RUTA DE ALMACENAMIENTO			

VERSIÓN 04

BOGOTÁ D.C. JULIO 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No 2025-2781

"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.

BOGOTÁ D.C.
2025.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5

2. GENERALIDADES 6

2.1 Antecedentes 6

2.2 Localización Del Proyecto 6

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7

4. SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS OBRAS 7

4.1. Actividades Realizadas en el Mes (Del 01 al 31 de Julio de 2025) 8

4.2. Resultados y Análisis de Laboratorio y de campo 14

4.3. Plan de Calidad y Controles de Calidad 15

4.4. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO 15

5. ASPECTO ADMINISTRATIVO. 16

5.1. Correspondencia Enviada 26

5.1.1. Correos Electrónicos Enviados 27

5.2. Correspondencia Recibida 29

5.2.1. Correos Electrónicos Recibidos 30

5.3. Actas de Reunión 35

6. ASPECTO JURÍDICO 35

7. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 37

7.1 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL MES (01 de Julio al 31 de Julio de 2025) 41

7.2. Actividades y pendientes 55

8. INFORME SSTMA 55

9.1. Pagos y aportes de seguridad social y parafiscales. 55

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Tabla seguimiento Técnico de las obras.....7
Tabla 2. Inventario de Bienes Fabricados y Acumulado.....7
Tabla 3. Intersecciones Nuevas.....8
Tabla 4. Complementos Peatonales - AK 80 X CL 40C SUR.....9
Tabla 5. Complementos Peatonales - KR 80 X CL 38C SUR.....10
Tabla 6. Complementos Peatonales - KR 79 X CL 40C SUR.....11
Tabla 7. Complementos Peatonales - KR 79 X CL 38C SUR.....12
Tabla 8. Complementos Peatonales - KR 78K X CL 38C SUR.....13
Tabla 9. Cronogramas Presentados.....13
Tabla 10. Correctivos ordenes de trabajo.....14
Tabla 11. Ensayos de laboratorio – Concreto.....14
Tabla 12. Ensayos de laboratorio.....14
Tabla 13. Certificado de Materiales.....15
Tabla 14. Estado Actual de los PMT - Típicos.....15
Tabla 15. Estado Actual de los PMT – Específicos.....16
Tabla 16. Obligaciones Generales del Contratista.....16
Tabla 17. Obligaciones Especificas del Contratista.....19
Tabla 18. Vehículos Presentados.....21
Tabla 19. Maquinaria, herramientas y equipos Presentados.....21
Tabla 20. Personal Relacionado este mes.....23
Tabla 21. Personal mano de obra no calificada durante el Contrato.....25
Tabla 22. Correspondencia enviada mediante oficio.....26
Tabla 23. Correos electrónicos enviados.....27
Tabla 24. Correspondencia recibida mediante oficio.....29
Tabla 25. Correos electrónicos recibidos.....30
Tabla 26. Actas de reunión.....35
Tabla 27. Póliza inicial Según Contrato – Cumplimiento.....36
Tabla 28. Póliza Inicial según Contrato - Responsabilidad Civil.....36
Tabla 29. Póliza Según Acta de Inicio – Cumplimiento.....36
Tabla 30. Póliza según Acta de Inicio - Responsabilidad Civil.....37
Tabla 31. Balance financiero.....37
Tabla 32. Actividades y pendientes.....54

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Cronograma de Actividades
Anexo 2. Ensayos de Laboratorio-Concreto
Anexo 3. Ensayos de Laboratorio – Compactación
Anexo 4. Certificados de Materiales
Anexo 5. Acreditación Puntaje de Ponderables
Anexo 6. Radicados interventoría
Anexo 7. Memorias de Calculo
Anexo 8. Cámara de Comercio
Anexo 9. RUP - CDJ WILLIAMS
Anexo 10. Bitácora

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD busca realizar los siguientes objetivos propuestos para mejorar el sistema semafórico de la ciudad:

- Construir obras civiles para semaforizar intersecciones atendiendo las necesidades de tránsito por localidad.
- Complementar intersecciones semaforizadas existentes con obras civiles que permitan la instalación de nuevos dispositivos de demanda vehicular, peatonal y de bici usuarios.
- Implementar nuevos controles semafóricos.
- Realizar el mantenimiento sobre los elementos del sistema de semaforización, garantizando el correcto funcionamiento de todas las intersecciones semaforizadas de la Ciudad.
- Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Anexo 1 "ANEXO TÉCNICO" – Especificaciones técnicas del presente proceso de contratación.
- Los trabajos se ejecutarán en espacios públicos, para lo cual se tuvo en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos.

2. GENERALIDADES

2.1 Antecedentes

Con el objeto de contratar "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR para la implementación de nuevos controles semaforizados. Proceso de licitación pública **No. SDM-LP-001-2025** le adjudicó al **CONSORCIO MOVILIDAD 2025** el contrato mediante la **Resolución No. 440145 del 09 de Abril de 2025**, cuyo objeto es: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.

2.2 Localización Del Proyecto

El objeto del Contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C., sobre las intersecciones semaforizadas del sistema de semaforización, instaladas actualmente y sobre aquellas intersecciones que se vayan integrando al sistema de semaforización, durante el plazo de ejecución del contrato adjudicado.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	07 de Agosto de 2025	**PERIODO No.**	4	DEL	**01 de Julio**	AL	**31 de Julio**

OBJETO DEL CONTRATO	"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE OBRA	
CONSORCIO MOVILIDAD NIT. 901.932.603-9 DRA. Nancy Quintero Chacón R.L. CC. 39.646.248 de Bogotá D.C. Cra 78h # 65c-72 Sur Bogotá (+57) 300 267 4503 – 314 235 8882 Consorciomovilidad2025@gmail.com	
CONTRATO No.	2025-2781
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 de Abril de 2025
PLAZO INICIAL:	10 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	29 de Abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	28 de Febrero de 2025
VALOR INICIAL:	$ 5.141.951.324 M/CTE
INTERVENTOR:	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

4. SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS OBRAS

Tabla 1. Tabla Seguimiento Técnico de las Obras

ESTADO ACTUAL	
TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	10 Meses
TIEMPO TRASCURRIDOS DESDE ACTA DE INICIO	94 Días
% TIEMPO TRASCURRIDO DESDE ACTA DE INICIO	30.72%
% DE EJECUCION	14.34%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Inventario de Bienes Fabricados y Acumulado

Orden de Fabricación	Ítem	Referencia	Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Fecha de Solicitud	Fecha de Entrega	Ubicación
No. 1	46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	50	50	21 de Mayo de 2025	08 de Julio de 2025	Carrera 29 # 69-17 - Bodega Principal
	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso.	50	50			
No. 2	66	Suministro e instalación de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE)	50	Pendiente	22 de Mayo de 2025	Pendiente	
	67	Suministro de armario unificado de comunicaciones y energía (AUCE)					
No. 3	46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	50	Pendiente	19 de Junio de 2025	Pendiente	
	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso.					

Fuente: Elaboración propia

4.1. Actividades Realizadas en el Mes (Del 01 al 31 de Julio de 2025)

ORDEN DE TRABAJO

Tabla 3. Intersecciones Nuevas

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
NUEVAS	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	60%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	02/07/2025	11/08/2025	14/07/2025	31/06/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	60%	02/07/2025	11/08/2025	14/07/2025	-
	Demoliciones	20%	25/07/2025	23/09/2025	14/07/2025	-
	Excavaciones	15%	25/07/2025	23/09/2025	14/07/2025	-
	Perforaciones	20%	10/07/2025	26/08/2025	14/07/2025	-
	Construcción de cajas de paso y redes	0%	30/07/2025	26/09/2025	14/07/2025	-
	Construcción de bases para postes	0%	28/07/2025	24/10/2025	14/07/2025	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	0%	02/09/2025	31/10/2025	14/07/2025	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	31/10/2025	04/11/2025	14/07/2025	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	01/10/2025	10/12/2025	14/07/2025	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	01/10/2025	07/11/2025	14/07/2025	-
PORCENTAJE PROMEDIO						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Complementos Peatonales - AK 80 X CL 40C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
AK 80 X CL 40C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	100%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	25/6/25	25/6/25	21/07/25	17/06/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	25/6/25	25/6/25	21/07/25	20/06/2025
	Demoliciones	40%	26/6/25	8/7/25	21/07/25	-
	Excavaciones	60%	26/6/25	8/7/25	21/07/25	-
	Perforaciones	N/A	-	-	21/07/25	-
	Construcción de cajas de paso y redes	10%	2/7/25	29/7/25	21/07/25	-
	Construcción de bases para postes	0%	29/7/25	25/8/25	21/07/25	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	20%	26/8/25	18/9/25	21/07/25	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	15/9/25	18/9/25	21/07/25	-
	Entrega de resultados de laboratorio	10%	22/9/25	29/10/25	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	22/9/25	24/9/25	21/07/25	-
PORCENTAJE PROMEDIO						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Complementos Peatonales - KR 80 X CL 38C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 80 X CL 38C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	20%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/7/25
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/7/25
	Demoliciones	25%	25/7/25	21/8/25	21/07/25	-
	Excavaciones	10%	25/7/25	21/8/25	21/07/25	-
	Perforaciones	N/A	-	-	21/07/25	-
	Construcción de cajas de paso y redes	10%	30/7/25	26/8/25	21/07/25	-
	Construcción de bases para postes	0%	18/8/25	10/9/25	21/07/25	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	0%	3/9/25	29/9/25	21/07/25	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	29/9/25	30/9/25	21/07/25	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	22/9/25	21/10/25	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	6/10/25	21/07/25	-
PORCENTAJE PROMEDIO						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Complementos Peatonales - KR 79 X CL 40C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 79 X CL 40C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	20%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	25/6/25	25/6/25	21/07/25	18/06/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	25/6/25	25/6/25	21/07/25	18/06/2025
	Demoliciones	75%	26/6/25	9/7/25	21/07/25	-
	Excavaciones	80%	10/7/25	23/7/25	21/07/25	-
	Perforaciones	100%	26/6/25	28/7/25	21/07/25	25/7/25
	Construcción de cajas de paso y redes	50%	24/7/25	28/7/25	21/07/25	-
	Construcción de bases para postes	0%	24/7/25	6/8/25	21/07/25	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	15%	8/9/25	19/9/25	21/07/25	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	19/9/25	22/9/25	21/07/25	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	22/9/25	29/10/25	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	22/9/25	24/9/25	21/07/25	-
PORCENTAJE PROMEDIO						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Complementos Peatonales - KR 79 X CL 38C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 79 X CL 38C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	20%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/7/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	16/7/25	18/7/25	21/07/25	18/7/2025
	Demoliciones	20%	18/7/25	4/9/25	21/07/25	-
	Excavaciones	10%	18/7/25	26/8/25	21/07/25	-
	Perforaciones	100%	16/7/25	11/8/25	21/07/25	01/8/2025
	Construcción de cajas de paso y redes	0%	23/7/25	9/9/25	21/07/25	-
	Construcción de bases para postes	0%	16/7/25	24/9/25	21/07/25	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	0%	29/8/25	29/9/25	21/07/25	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	29/9/25	30/9/2025	21/07/25	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	22/9/25	21/10/25	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	6/10/25	21/07/25	-
PORCENTAJE PROMEDIO						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Complementos Peatonales - KR 78K X CL 38C SUR

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
KR 78K X CL 38C SUR	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	20%	-	-	19/05/25	-
	Localización, verificación y replanteo	100%	29/7/25	31/7/25	21/07/25	22/07/2025
	Estudio y trazado de redes existentes	100%	29/7/25	31/7/25	21/07/25	22/07/2025
	Demoliciones	10%	29/7/25	4/9/25	21/07/25	-
	Excavaciones	5%	29/7/25	4/9/25	21/07/25	-
	Perforaciones	40%	29/7/25	12/8/25	21/07/25	-
	Construcción de cajas de paso y redes	0%	30/7/25	9/9/25	21/07/25	-
	Construcción de bases para postes	0%	18/8/25	24/9/25	21/07/25	-
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	0%	3/9/25	29/9/25	21/07/25	-
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%	29/9/25	30/9/25	21/07/25	-
	Entrega de resultados de laboratorio	0%	22/9/25	21/10/25	21/07/25	-
	Realización y entrega de planos Récord	0%	30/9/25	6/10/25	21/07/25	-
PORCENTAJE PROMEDIO						

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Cronogramas Presentados

CRONOGRAMA	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
Cronograma Lote 2 V1	19 de Junio de 2025	09 de Julio de 2025	EXT 3119, EXT 3928, EXT 3121, EXT 3122, EXT 3120

Anexo 1. *Cronograma de Actividades*

CORRECTIVOS

Tabla 10. Correctivos ordenes de trabajo

ORDEN DE TRABAJO	EXT.	DIRECCION	FECHA DE SOLICITUD	TRABAJO REALIZADO	FECHA DE EJECUCION	FECHA VIGENCIA PMT	
						INICIO	FIN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia

4.2. Resultados y Análisis de Laboratorio y de campo

Tabla 11. Ensayos de laboratorio – Concreto

PRUEBAS REALIZADAS									
FECHA DE MUESTRA	INTERSECCION	TIPO DE MATERIAL	NOMBRE DEL LABORATORIO	OT	EDAD (DIAS)	RESISTENCIA ESPECIFICADA (PSI)	RESISTENCIA ENSAYO (PSI)	FECHA DE ROTURA	RESULTADOS (%)
25/06/2025	Tapas - Cajas Sencillas	1. CEMENTO (ARGOS) 2. GRAVA GRIS DE 3"4 (SEGÚN DISEÑO) 3. ARENA DE RIO CAFÉ (SEGÚN DISEÑO) 4. ACERO (DIACO)	DAPCIL S.A.S	225	3	3000	3073	28/06/2025	102
25/06/2025	Tapas - Cajas Sencillas			225	7	3000	3133	02/07/2025	104
08/07/2025	Tapas - Cajas Sencillas			316	3	2281	2281	11/07/2025	76
08/07/2025	Tapas - Cajas Sencillas			316	7	3078	3078	15/07/2025	103

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2. *Ensayos de Laboratorio - Concreto*

Tabla 12. Ensayos de laboratorio

PRUEBAS REALIZADAS							
INTERSECCIÓN	ESQUINA	PRUEBA REALIZADA	NOMBRE LABORATORIO	OT	TIPO DE MATERIAL	FECHA DE REALIZACIÓN	RESULTADOS
AK 80 X CL 40C SUR	RAMPA	Compactación	DAPCIL SAS	308	BASE GRANNULAR RECIBLADA (RCD MOLINOS JN)	29/07/2025	98.9%
	FRANJA PEATONAL	Compactación				29/07/2025	98.9%
	RAMPA SUR	Compactación				29/07/2025	98.6%

Fuente: Elaboración propia

Anexo 3. *Ensayos de Laboratorio – Compactación*

Tabla 13. Certificado de Materiales

CERTIFICADOS DE MATERIALES	
MATERIAL	**PROVEEDOR**
Acero (varillas y ángulos)	GYJ Ferreterías SA

Fuente: Elaboración propia

Anexo 4. *Certificados de Materiales*

4.3. Plan de Calidad y Controles de Calidad

El día 30 de abril del 2025 se envió mediante correo electrónico el OFICIO No. WEXT-2025-2781-02, en el hace entrega del Plan de Calidad del CONSORCIO MOVILIDAD 2025 para revisión y aprobación por parte de la Interventoría CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL. Para lo cual, Consorcio Movilidad 2025, participó en 3 mesas de trabajo realizadas los días, 20 de junio de 2025 y el día 15 de julio de 2025 cuya subsanación con versión 2 fue remitida a la interventoría el día 29 de julio de 2025 mediante el oficio WEXT-2025-2781-93, en este momento se está a la espera de la revisión de la documentación por parte de la interventoría para llevar a cabo los ajustes necesarios o para su respectiva aprobación.

4.4. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Durante el mes de Julio de 2025, se desarrollaron las actividades registradas en los informes el avance de las actividades generadas para la formulación del PMT de las intersecciones en el mes se resumen a continuación:

Tabla 14. Estado Actual de los PMT - típicos

PMT¨ S TIPICOS								
INTERSECCION		**FECHA DE SOLICITUD**	**ID**	**EXT**	**LOCALIDAD**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FIN**	**No. DE RADICADO SDM**
1.	KR 18 B X CL 53 SUR Y DG 54 SUR	19/05/2025	1177	3013	TUNJUELITO	11/07/2025	26/07/2025	202561201705042
2.	KR 19C X CL 48 C SUR Y DG 48 SUR		1082	3429	TUNJUELITO			
3.	AV BOYACA (AK 72) X CL 9		819	2393	KENNEDY			
4.	KR 16 X CL 22		1202	2301	LOS MARTIRES			
5.	KR 17 X CL 22		519	2301	LOS MARTIRES			
6.	KR 79 X CL 38C SUR		887	3454	KENNEDY	19/07/2025	27/07/2025	202531207916131
7.	KR 79 X CL 40 C SUR		881	3795	KENNEDY			
8.	AK 80 X CL 38 C SUR		896	3796	KENNEDY			
9.	AK 80 X CL 40 C SUR		1168	3873	KENNEDY			
10.	KR 17 X CL 22	17/07/2025	519	2301	LOS MARTIRES	26/07/2025	10/08/2025	202561201705042
11.	KR 18 B X CL 53 SUR Y DG 54 SUR		1177	3013	TUNJUELITO			

PMT¨S TIPICOS								
INTERSECCION		FECHA DE SOLICITUD	ID	EXT	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	No. DE RADICADO SDM
12.	KR 19C X CL 48 C SUR Y DG 48 SUR		1082	3429	TUNJUELITO			
13.	AV BOYACA (AK 72) X CL 9		819	2393	KENNEDY			
14.	KR 16 X CL 22		1202	2301	LOS MARTIRES			

Tabla 15. Estado Actual de los PMT – Específicos

PMT¨S ESPECIFICOS								
INTERSECCION		TIPO	ID	EXT	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	No. DE RADICADO SDM
1.	KR 14 I X CL 84 Sur	Nueva	1921	3121	USME	11/07/2025	09/10/2025	202561202123142
2.	KR 78K X CL 38C SUR	Complemento	1754	3049	KENNEDY	18/07/2025	09/10/2025	202561202152752
3.	AK 80 X CL 40 C Sur	Complemento	896	3796	KENNEDY	25/07/2025	16/10/2025	202561202233562
4.	KR 79 X CL 40 C Sur	Complemento	881	3795	KENNEDY	25/07/2025	09/10/2025	202561202233432
5.	KR 46A X CL 68S	Nueva	1900	3928	CIUDAD BOLIVAR	25/07/2025	23/10/2025	202561202242812
6.	TV 60 X DG 70 Sur	Nueva	1922	3122	CIUDAD BOLIVAR	25/07/2025	23/10/2025	202561202327302
7.	KR 79 X CL 38 C Sur	Complemento	887	3454	KENNEDY	01/08/2025	30/10/2025	202561202176732 202561202690792
8.	AK 80 X CL 38 C sur	Complemento	1168	3873				202561202233702 202561202690832

Fuente: Elaboración propia

5. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

ASPECTO ADMINISTRATIVO	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	29 de Abril de 2025
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Obligaciones Generales del Contratista

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
1.	Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.	Pólizas / Secop II	Vigente	10 de Febrero de 2025
2.	Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato	Secop II	1	Se entrego al inicio del contrato
3.	Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a 10 días calendario, una vez se haya perfeccionado el contrato.	Acta de Inicio del 29 de Abril de 2025	1	Suscrita el 29 de Abril de 2025
4.	Para la suscripción del acta de inicio el contratista deberá allegar el compromiso antisoborno y SARLAFT vigente facilitado por la SDM.	Acta de Inicio del 29 de Abril de 2025	1	29 de Abril de 2025

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
5.	Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con los términos y condiciones señalados en el pliego de condiciones y/o Invitación Pública, el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte de este proceso de selección, así como en el ordenamiento jurídico y en los ofrecimientos adicionales de la propuesta.	Informes Semanales y Mensuales	Vigente	del 1 al 31 de Julio de 2025
6.	Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.	Informes Semanales y Mensuales	Vigente	del 1 al 31 de Julio de 2025
7.	Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.	Informes Semanales y Mensuales	Vigente	del 1 al 31 de Julio de 2025
8.	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.	Informes Semanales, Mensuales y Actas de Seguimiento	Vigente	del 1 al 31 de Julio de 2025
9.	Atender de forma diligente e inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el interventor y/o el/la supervisor(a) del contrato.	Informes Semanales, Mensuales y Actas de Seguimiento	Vigente	del 1 al 31 de Julio de 2025
10.	Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.	Informe Mensual	Vigente	08 de Agosto de 2025
11.	Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.	Paz y salvo de Parafiscales y Planillas de Seguridad Social	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
12.	Contar con los equipos, herramientas, insumos y/o personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual.	OFICIO WEXT-2025-2781-09 - Presentación Hojas de vida de los Equipos y Herramientas del Contrato	1	del 1 al 31 de Julio de 2025
13.	Suministrar los uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad y salud en el trabajo, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
14.	Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
15.	Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
16.	Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago.	Paz y salvo de Parafiscales y Planillas de Seguridad Social e Informe Mensual	Mensual	Del 29 de Abril de 2025 al 31 de Julio de 2025.
17.	Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor y/o el/la supervisor(a) del mismo.	Informe Mensual y Actas de Seguimiento	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
18.	Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
19.	Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación del mismo y presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la	RUT y Cámara de Comercio de los Consorciados	Mensual	Del 29 de Abril de 2025 al 31 de Julio de 2025.

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
	suscripción de la correspondiente acta de liquidación. (cuando aplique)			
20.	En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al interventor y/o al supervisor del contrato de manera escrita.	Actas de Seguimiento	Semanal	del 1 al 31 de Julio de 2025
21.	Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.	Actas de Seguimiento e Informes Mensuales	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
22.	Identificar e implementar oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato y en el sitio de la obra.	Anexo de Apoyo a la Industria Nacional y Aplicativo Bogotá Trabaja	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
23.	Atender los lineamientos previstos en la Ley 2040 de 2020 "*Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores y se dictan otras disposiciones* sin que esto implique afectaciones al cumplimiento del contrato, según aplique.	N/A	N/A	N/A
24.	El contratista se obliga a prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
25.	Atender los requerimientos de la Supervisión para una correcta ejecución del contrato.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
26.	Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020, modificado por el artículo 2 del Decreto Distrital 634 de 2023. "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", "(...) *Se encuentran exceptuados de la aplicación de las medidas afirmativas previstas en este decreto, los procesos adelantados por acuerdo marco de precios, bolsa de productos, tienda virtual del Estado y las tipologías contractuales para la adquisición de bienes y servicios que por su naturaleza no requieran de personal para la ejecución del contrato y/o convenio, entre ellos arrendamiento de bienes inmuebles, compraventa, adquisición de bienes a través de la bolsa de productos, subastas a través de martillo, suministros, enajenación de bienes, comodatos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (...)"*(Cuando aplique).	Informe Mensual SSTMA y OFICIO_WEXT-2025-2781-72-Informe Semestral de Cumplimiento Decreto 332 de 2020.	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
27.	Mantener durante la ejecución del contrato el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expida el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable en el artículo 1° del Decreto 392 de 2018. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables (cuando aplique).	Certificación de cumplimiento de Vinculación de Persona en condición de Discapacidad	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
28.	Las demás que se deriven del contrato que sean pertinentes para la óptima ejecución del mismo y las contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y la invitación, la cual hará parte integral del futuro contrato.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025

Tabla 17. Obligaciones Especificas del Contratista

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
1.	Desarrollar el objeto del contrato en la forma y condiciones previstas en el estudio previo, el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-01 Licitación y los sub anexos técnicos que lo componen, la propuesta presentada por el contratista adjudicatario y el contrato suscrito.	Informes Semanales, Mensuales y Bitácora	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
2.	Presentar a la interventoría los análisis de precios unitarios, listado unificado de insumos de todos y cada uno de los ítems del presente proceso, concordantes con la oferta económica con el objeto de que la interventoría realice la revisión y aprobación. Los valores no deberán ser diferentes a los ofertados.	OFICIO WEXT-2025-2781-15 – Presentación APUS del Contrato No. 2025-2781 y AIU	1	30 de Abril de 2025.
3.	Realizar por parte de la Interventoría la revisión y aprobación a satisfacción de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente proceso y en la ley. La interventoría deberá informar de manera escrita a la Entidad sobre la aprobación de todos y cada uno de los requisitos del contrato.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
4.	El contratista entregará a la Interventoría, un cronograma de actividades dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación, esto con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato y planificar y controlar las actividades programadas.	OFICIO WEXT-2025-2781-08 - Presentación del Cronograma de Obra del Contrato No. 2025-2781.	1	30 de Abril de 2025.
5.	Garantizar la disponibilidad de los grupos de trabajo y sus recursos mínimos en los horarios establecidos por la Entidad.	Informes Mensuales, semanales y Bitácora	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
6.	Cumplir los requerimientos de la Entidad dentro de los tiempos de reacción, definidos para las actividades de mantenimiento correctivo.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
7.	Hacer uso adecuado, proteger y reintegrar, cuando la SDM lo estime pertinente, los bienes que se le entreguen con ocasión de la ejecución del contrato.	Informe Mensual	Mensual	Al momento no se han presento devoluciones
8.	Presentar las certificaciones de calidad de los materiales suministrados, a solicitud de la Entidad o de la interventoría.	Informe Mensual	Mensual	7 de Agosto de 2025
9.	Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos y herramientas requeridos durante el plazo de ejecución del contrato. En el caso de que alguno de los equipos o herramientas presente fallas en la prestación del servicio, el contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto, sin que se afecte la programación de las labores a ejecutar ni las labores coordinadas con los otros grupos de mantenimiento.	Informe Mensual SSTMA	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
10.	En caso de haber ofertado como factor de calidad, el plan de calidad, el contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. El plan de calidad deberá incluir los procedimientos técnicos y administrativos, formatos de control y reportes necesarios para desarrollar las actividades del contrato. El plan de calidad deberá ser entregado a la Interventoría dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y deberá ser aprobado por la Interventoría.	OFICIO WEXT-2025-2781-02 - Presentación Plan de Calidad V00 Contrato de Obra No. 2025-2781	1	30 de Abril de 2025
11.	Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y sistema de calidad del proyecto	Informe Mensual	Mensual	7 de Agosto de 2025
12.	Mantener en perfecto estado de operación los bienes suministrados por la Secretaría.	N/A	N/A	N/A

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
13.	En los eventos en los que se requiera la recuperación del espacio público afectado por las obras, el contratista se debe regir por los lineamientos técnicos sobre construcción de vías, pavimentos y Cartilla de Espacio Público del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
14.	Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Informe Mensual y Actas de Seguimiento	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
15.	El contratista deberá formular y radicar para su aprobación un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) general, ante la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la SDM. Estos planes de manejo de tránsito se deberán mantener vigentes durante todo el tiempo de ejecución del contrato.	Oficios radicados a GUPMT	Constante	21 de Mayo de 2025
16.	Implementar y mantener toda la señalización en cantidad y ubicación del PMT tal y como sea aprobada por la Subdirección de Planes de manejo de Tránsito de la SDM, antes de efectuar cualquier labor en espacio público.	Informe Mensual y Bitácora	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
17.	Estar atento y dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en temas de los PMT.	Informe PMT	Constante	del 1 al 31 de Julio de 2025
18.	Garantizar la coordinación con la interventoría, con el fin de hacer efectivas las actividades programadas.	Informe Mensual	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
19.	Informar de forma escrita al interventor cualquier problema relacionado con la ejecución del contrato.	Informe Mensual, semanal y Bitácora	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
20.	En los sitios donde se adelanten las obras, el contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales.	Bitácora	Semanal	del 1 al 31 de Julio de 2025
21.	Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de estricto cumplimiento en el perímetro urbano de la ciudad.	PMA	Semanal	del 1 al 31 de Julio de 2025
22.	Realizar el control de residuos de construcción y demolición, y presentar copia de los correspondientes certificados (reutilización, reciclaje y disposición final) producidos en las labores y obras en el mes.	RCD	Mensual	7 de Agosto de 2025
23.	Controlar y reportar el empleo de los materiales de construcción y del Manejo de la vegetación.	PMA y RCD	Mensual	7 de Agosto de 2025
24.	En el caso de los bienes suministrados por el contratista, deberá realizar el trámite de ingreso de éstos al almacén de la SDM, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento Gestión de Bienes e Inventarios - Ingresos, Egresos y Traslados de Almacén (procedimiento PA01-PR12) y según lo definido en el Instructivo para el ingreso, egreso y traslados de bienes No. PA01-PR12-IN01.	Documentos Financieros	Constante	17 de Julio de 2025
25.	Reparación y/o restitución por su cuenta, de las obras que no sean satisfactorias por cumplimiento de estándares de calidad debidamente controladas por la Interventoría (obras defectuosas, incompletas o inaceptables).	Informe Mensual	Mensual	N/A
26.	Proporcionar y mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido. El cual se debe presentar dentro de los diez días hábiles una vez firmada el acta de inicio	OFICIO WEXT-2025-2781-16, 19 - Hojas de vida personal	1	30 de Abril de 2025
27.	Se obliga a tramitar las licencias y/o permisos de intervención en espacio público y demás necesarias para la correcta ejecución del contrato.	N/A	N/A	21 de Mayo de 2025

No.	OBLIGACIÓN	FUENTE O DOCUMENTO SOPORTE	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
28.	Coordinar, requerir la información planimétrica y verificar la existencia previa de redes de servicios públicos que puedan afectar la ejecución de las obras e informar a la Interventoría sobre posibles impedimentos para la ejecución de los trabajos por intersección con redes de servicios públicos domiciliarios.	Bitácora e Informes Mensual y semanal	Mensual	del 1 al 31 de Julio de 2025
29.	Reponer, reparar o restituir cualquier daño o afectación a las redes de prestadores y/o operadores de servicios públicos que puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos.	Informe Mensual	Mensual	No se presentó en el mes
30.	Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Informe Mensual	Mensual	Del 1 al 31 de Julio de 2025

Anexo 5. *Acreditación Puntaje de Ponderables*

Tabla 18. Vehículos Presentados

VEHICULOS PRESENTADOS						
PLACAS	**OBSERVACIONES**	**No. RADICADO DE APROBACION**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**CILINDRAJE**	**MODELO**	**CIUDAD**
JKZ 914	PARA EL TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	SEM-CMC-CM25-026-25	17 de junio de 2025	1.997	2020	BOGOTÁ D.C.
KYP 683	PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPO			2.746	2022	BOGOTÁ D.C.
JKU 690	PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPO			2.746	2021	BOGOTÁ D.C.
JKU 049.	PARA EL TRASLADO E IZAJE DE AUCE O GIC, PEDESTALES Y BASES PORTÁTILES	PENDIENTE	PENDIENTE	7.790	2020	COTA CUNDINAMARCA

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19. Maquinaria, herramientas y equipos Presentados.

TABLA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS					
MAQUINARIA		**FECHA DE PRESENTACION (MES)**	**INSPECCION VISUAL INTERVENTORIA**	**No. DE RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION**
1	Equipo de perforación neumática (Perforadora JT27 20, Perforadora 7x 11ª y Perforadora Horizontal Vermer D24x26, Auger Boring)	30 de Abril de 2025	22 de mayo de 2025	En revisión	En revisión
HERRAMIENTA		**FECHA (MES)**	**INSPECCION VISUAL INTERVENTORIA**	**No. DE RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION**
1	Señales móviles	30 de Abril de 2025	22 de mayo de 2025	SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
2	Nivel			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
3	Cuña de demolición			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
4	Escuadra Cantero			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
5	Flexómetro			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
6	Llana de madera			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
7	Llana metálica			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025

8	Maceta			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
9	Martillo			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
10	Palustre			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
11	Puntero			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
12	Barrera de protección			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
13	Cizalla			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
14	Escalera en fibra de vidrio			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
15	Pistola para pintura			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
16	Remachadora			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
17	Grata de acero			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
18	Juego de copas con Rachet			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
19	Juego de llaves fijas			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
20	Juego de machos para roscar			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
21	Lija			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
22	Volvedor macho T/Cruceta 3/8"			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
23	Macho para Roscar de 3/8"			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
24	Cualquier otra, requerida para ejecutar las labores			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
EQUIPOS		**FECHA (MES)**			
1	Equipo de soldadura	30 de Abril de 2025	22 de mayo de 2025	SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
2	Pulidora			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
3	Canguro			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
4	Cortadora de concreto			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
5	Compresor			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
6	Equipo de Oxicorte			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
7	Planta eléctrica			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
8	Taladro			SEM-CMC-CM25-020-25	10 de junio de 2025
9	Vibrador			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
10	Apisonador rana			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
11	Regla vibratoria			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
12	Hidrolavadora			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
13	Motobomba			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
14	Demoledor de Pavimento			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025

15	Rana			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025
16	Vibrador de Concreto			SEM-CMC-CM25-033-25	10 de julio de 2025

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20. Personal Relacionado este mes

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	FECHA DE RADICACION	RADICADO CONTRATISTA	FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA	RADICADO INTERVENTORIA	TELEFONOS
1.	Nebardo Robles Yasno	Persona en condición de discapacidad y Almacenista	25/04/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-11	26/05/2025	SEM-CMC-CM25-009-25	3002674503
2.	Nancy Quintero Chacón	Representante legal.	N/A	N/A	N/A	N/A	3002674503
3.	William Augusto Acosta López	Director de Obra	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	20/05/2025	SEM-CMC-CM25-003-25	3143258882
4.	Andrés Alejandro Barriga Florián	Residente de Obra	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	20/05/2025	SEM-CMC-CM25-003-25	3138474705
5.	Christian Roqueme Salazar	Ing. Especialista en Transito	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	20/05/2025	SEM-CMC-CM25-003-25	3013053429
6.	María Paz Rosario Orjuela	Auxiliar de ingeniería	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	20/05/2025	SEM-CMC-CM25-003-25	3002674503
7.	Merly Gineth Avaunza Charry	Tecnólogo en Áreas de ingeniería (SST o SISOMA)	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	16/06/2025	SEM-CMC-CM25-024-25	3138499871
8.	Héctor Mauricio Mora Martínez	Inspector de Obra	09/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-16	16/06/2025	SEM-CMC-CM25-024-25	3138501809
9.	José Miguel Pérez Ramírez	Maestro de Obra	13/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-19	22/05/2025	SEM-CMC-CM25-007-25	3002674503
10.	Noelia Nader Correa	Profesional SST	18/06/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-19	24/06/2025	SEM-CMC-CM25-030-25	3002674503
11.	Danilo Arévalo Estupiñán	Conductor para vehículo tipo camioneta	14/05/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-20	30/05/2025	SEM-CMC-CM25-014-25	3002674503
12.	José Uriel Barrero Tabares	Oficial de Obra	4/06/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-38	13/06/2025	SEM-CMC-CM25-023-25	3002674503
13.	Nicolas Cuartas Castro	Ayudante de construcción	4/06/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-38	13/06/2025	SEM-CMC-CM25-023-25	3002674503
14.	José David Castro Ochoa	Conductor para camión tipo grúa cabina sencilla	4/06/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-38	13/06/2025	SEM-CMC-CM25-023-25	3002674503

Fuente: Elaboración propia

PERSONAL OPERATIVO DE PERFORACIONES – PH INGENIERIA							
ÍTEM	NOMBRE	CARGO	FECHA DE RADICACION	RADICADO CONTRATISTA	FECHA CORREO APROBACION INTERVENTORIA	RADICADO INTERVENTORIA	FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA
15.	Zambrano Antonio	Auxiliar de Obra	02/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-64	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-044-25	21/07/2025
16.	Ramírez Calderón Anyi Yamile	Inspectora HSEQ					
17.	Jiménez Riaño armando	Coordinador Operativo					
18.	Gamboa Díaz Dairon Jean Pierre	Auxiliar de Obra					
19.	González Sánchez Eduardo Antonio	Operador Miniretro					
20.	Gómez Arciniegas Faruth Ismael	Auxiliar de Obra					
21.	Granados Yamaga Francisco Javier	Operador Miniretro					
22.	Bonilla Gavilán Holman	Operador Miniretro					
23.	Verjan Cruz Huber Yesid	Auxiliar de Obra					
24.	Castaño Hernández Jhon Sebastián	Operario Perforadora					
25.	García Cepeda Jorge Eliecer	Operario Perforadora					

PERSONAL OPERATIVO DE PERFORACIONES – PH INGENIERIA							
ÍTEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**FECHA DE RADICACION**	**RADICADO CONTRATISTA**	**FECHA CORREO APROBACION INTERVENTORIA**	**RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA**
26.	Martínez Roncancio Jorge Enrique	Operario Perforadora	09/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-77	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-044-25	21/07/2025
27.	Yara Gualaco José Alfredo	Auxiliar de Obra					
28.	Diaz Valbuena José Dimas	Operario Perforadora					
29.	Romero Barbosa José Miguel	Operario Detectorista					
30.	Montaña Contreras Justo Pastor	Operario Perforadora					
31.	Serna Villalba María de los Ángeles	Inspectora HSEQ					
32.	Cubillos Casallas Miguel Ángel	Operario Perforadora					
33.	Rodríguez Cañate Narciso	Auxiliar de Obra					
34.	Jiménez Sastre Pedro Emilio	Operario Minicargador					
35.	Barreto Carranza Rafael Antonio	Operario Perforadora					
36.	Suarez Romero Rafael Antonio	Operador Auger					
37.	Torres Martínez Walter Enrique	Auxiliar de Obra					
38.	Salamanca Zea William Guillermo	Operario Detectorista					
39.	Ángel Ortiz Astrid Roció	Residente Perforaciones	10/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-78	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-044-25	21/07/2025
40.	Castaño Dueñas Nicolás	Auxiliar de Obra					
41.	Herrera Galván Jarol Antonio	Auxiliar de Obra					
42.	Rincón Mendoza Michael Fabián	Auxiliar de Obra					
43.	Rodríguez Bernal Bernardino	Auxiliar de Obra					
44.	Salamanca Zea Juan Camilo	Auxiliar de Obra	28/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-92	30/07/2025	Pendiente	Pendiente
45.	Diaz Valvuena Ricardo	Coordinador Operativo					
46.	Romero Suarez Oscar Eduardo	Coordinador Operativo					

Fuente: Elaboración propia

PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS CIVILES							
ÍTEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**FECHA DE RADICACION**	**RADICADO CONTRATISTA**	**FECHA CORREO APROBACION INTERVENTORIA**	**RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA**
47.	Albarado Martínez Helver esneider	Ayudante de obra	10/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-79	12/07/2025	SEM-CMC-CM25-042-25	16/07/2025
48.	Albarado Chivor Elver Antonio						
49.	Palacios Córdoba Wilson de Jesús						
50.	Machado Monroy Johany Alexander	Ayudante de obra	11/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-80			
51.	Brito Castiblanco Edgar de Jesús						
52.	Bocanegra Rodríguez Karen Julieth						
53.	Arias Jiménez José Alexander						
54.	Toro Robles Yeferson Andrés		12/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-81	14/07/2025	SEM-CMC-CM25-045-25	29/07/2025
55.	Puerta Ballestas Victor Luis	Ayudante de obra	12/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-81	15/07/2025	SEM-CMC-CM25-045-25	29/07/2025
56.	Mora Mora Jesús Andrés						
57.	Triviño Moreno Gustavo						
58.	Rodríguez Córdoba Luis Ferney	Ayudante de obra	13/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-82			
59.	Vidal Mora Jorge						
60.	Peña Muñoz Richard Ferney						
61.	Lara Fabio Leonardo						
62.	Velandia Henry Jesus						
63.	Velásquez Colorado Fredy Giovany						
64.	Montealegre Oviedo José Darío	Ayudante de obra	16/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-84	18/07/2025	SEM-CMC-CM25-051-25	29/07/2025

PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS CIVILES							
ÍTEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**FECHA DE RADICACION**	**RADICADO CONTRATISTA**	**FECHA CORREO APROBACION INTERVENTORIA**	**RADICADO INTERVENTORIA**	**FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA**
65.	Tanicamo Nitagay Diner				24/07/2025	SEM-CMC-CM25-051-25	29/07/2025
66.	Copete Chala Camilo Antonio	Ayudante de obra	16/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-84	17/07/2025	SEM-CMC-CM25-051-25	29/07/2025
67.	Prieto Barrios Cristian						
68.	López Ramírez Guillermo	Ayudante de obra	16/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-84	24/07/2025	SEM-CMC-CM25-051-25	29/07/2025
69.	Torres Romaña Edwar Camilo						
70.	Lascano Anicharico José Ivan	Ayudante de obra	16/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-85			
71.	Lascano Martínez Franklin						
72.	Lascano Anicharico José Alexander						
73.	Ruiz Quiñones Segundo Agustín	Ayudante de obra	22/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-86	22/07/2025	Pendiente	Pendiente
74.	Córdoba Gómez Jhon Deivi	Ayudante de obra	22/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-86	04/08/2025	Pendiente	Pendiente
75.	Quesada Duarte Jhoan Andrés	Ayudante de obra	22/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-86	22/07/2025	Pendiente	Pendiente
76.	Ariza López Roberth Enrique	Oficial de obra	22/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-86	Pendiente	Pendiente	Pendiente
77.	Crespo Rodríguez Mario	Conductor de Camión	22/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-87	24/07/2025	SEM-CMC-CM25-049-25	29/07/2025
78.	Alarcón Alarcón Alfonso	Ayudante de obra	24/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-89		Pendiente	Pendiente
79.	Navarro Luis Carlos					Pendiente	Pendiente
80.	Rodriguez Medellín Hector Lisnardo					Pendiente	Pendiente
81.	Gómez Suarez Jorge Andrés					Pendiente	Pendiente
82.	Rodríguez Ramos Carlos Arturo	Ayudante de obra	24/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-89	Pendiente	Pendiente	Pendiente
83.	Yepes Rojas Juan José	Ayudante de obra	24/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-89		Pendiente	Pendiente
84.	Besynger Ramírez Yeison Andrés	Ayudante de obra	24/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-89	25/07/2025	Pendiente	Pendiente
85.	González Delgado Heriberto					Pendiente	Pendiente
86.	Valera Suarez Ivan David					Pendiente	Pendiente
87.	Mercanza Negria Neldo					Pendiente	Pendiente
88.	Medina Campos José de Jesús					Pendiente	Pendiente
89.	Puchicama Ismare Roberth					Pendiente	Pendiente
90.	Acosta Rubiano Henry	Maestro de obra	25/07/2025	OFICIO WEXT-2025-2781-90	26/07/2025	Pendiente	Pendiente

Dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de Obra No. 2025-2781: *"Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres."*, a continuación, se presenta la tabla de relación del personal de mano de obra no calificado activo, de la región y femenino que hizo parte del Contrato 2025-2781:

Tabla 21. Personal mano de obra no calificada durante el Contrato

PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA			
	ACTIVOS	**No. DE PERSONAS DE BOGOTA**	**MUJERES**
Cantidad	90	62	5
Porcentaje	100%	68.88%	5.5%

Fuente: Elaboración propia

5.1. Correspondencia Enviada

Tabla 22. Correspondencia enviada mediante oficio

CORRESPONDENCIA ENVIADA							
No.	**FECHA DE RADICADO**	**No. RADICADO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**No. RADICADO SDM**	**FECHA**	**NO. RADICADO INTERVENTORIA**
1.	02 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-64	Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561202262932	02/07/2025	CMC-SEM-269
2.	02 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-65	Subsanación PMA y Programa de Manejo Ambiental de RCD.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561202264252	02/07/2025	CMC-SEM-270.
3.	02 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-66	Compromiso traslado de traslado de cuenta del Vehículo de Placas JKU 049.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202500001124042	02/07/2025	CMC-SEM-270.
4.	02 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-67	Presentación documentos SST de personal Aprobado.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202500001124622	02/07/2025	CMC-SEM-275
5.	04 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-68	Subsanación Informe Mensual No. 2 V3 del mes de Mayo.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561202300552	04/07/2025	CMC-SEM-278.
6.	07 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-69	Informe Mensual No.2 V0 del Mes de junio de 2025 del Componente SSTMA.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561202339592	07/07/2025	CMC-SEM-294.
7.	07 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-70	Informe Mensual No. 3 V1 del Mes de Junio de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202500001131992	07/07/2025	CMC-SEM-295.
8.	07 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-71	Documentos para pago del Corte de Obra No. 1	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202500001132182	07/07/2025	CMC-SEM-296
9.	08 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-72	Informe Semestral de Cumplimiento Decreto 332 de 2020.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561202354032	08/07/2025	CMC-SEM-302.
10.	08 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-73	Documentación para radicación de Orden de Fabricación No. 1 – Tapas Sencillas y Antivandálicas	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202500001133572	08/07/2025	CMC-SEM-305.
11.	09 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-77	Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202500001135792	09/07/2025	CMC-SEM-311.
12.	10 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-78	Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561202392472	10/07/2025	CMC-SEM-312.
13.	10 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-79	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561202399912	10/07/2025	CMC-SEM-316
14.	11 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-80	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561202407312	11/07/2025	Pendiente
15.	12 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-81	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202500001140712	12/07/2025	CMC-SEM-320
16.	13 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-82	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202500001142362	13/07/2025	CMC-SEM-322.
17.	14 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-83	Informe Mensual No. 2 V4 del mes de Mayo – APROBADO.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561202429382	14/07/2025	CMC-SEM-322.
18.	16 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-84	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561202485752	16/07/2025	CMC-SEM-331.
19.	16 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-85	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202500001147002	16/07/2025	CMC-SEM-350.
20.	22 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-86	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561202560882	22/07/2025	CMC-SEM-343.
21.	22 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-87	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202500001155152	22/07/2025	CMC-SEM-346.
22.	23 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-88	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-035-25, Subsanación de Pólizas de RCE y CUMPLIMIENTO.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561202577122	23/07/2025	CMC-SEM-350.
23.	24 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-89	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561202598402	24/07/2025	CMC-SEM-354

CORRESPONDENCIA ENVIADA							
No.	**FECHA DE RADICADO**	**No. RADICADO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**No. RADICADO SDM**	**FECHA**	**NO. RADICADO INTERVENTORIA**
24.	24 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-90	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561202606812	24/07/2025	CMC-SEM-355.
25.	25 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-91	Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561202630332	25/07/2025	CMC-SEM-357.
26.	28 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-92	Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202500001166002	28/07/2025	CMC-SEM-363.
27.	29 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-93	Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-047-25, Subsanación de Plan de Calidad.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202561202665332	29/07/2025	CMC-SEM-364.
28.	31 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-94	Entrega Cronograma de Obra Complementos Peatonales V3 con subsanación de observaciones de Interventoría.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	202500001170852	31/07/2025	CMC-SEM-377.

Fuente: Elaboración propia

Anexo 6. *Radicados Interventoría*

5.1.1. Correos Electrónicos Enviados

Tabla 23. Correos electrónicos enviados

CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS			
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
1.	01 de Julio de 2025	Subsanación Informe Mensual No. 02 - V2 del Mes de Mayo de 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
2.	01 de Julio de 2025	VISITA A BODEGA PH [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
3.	01 de Julio de 2025	Visita para Revisión de estructura exterior de AUCE en la empresa aliada TITAN	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
4.	01 de Julio de 2025	Listado de documentos para facturación e ingreso almacén	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
5.	02 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-64 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
6.	02 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-65 - Subsanación PMA y Programa de Manejo Ambiental de RCD.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
7.	02 de Julio de 2025	Compromisos Acta No. 3 - Comité de seguimiento 26/06/25	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
8.	04 de Julio de 2025	PROYECCIÓN ECONOMICA OBRAS VISITADAS CON ACOMPAÑAMIENTO DE SUPERVISIÓN	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
9.	07 de Julio de 2025	Revisión aprobación hojas de vida oficio WEXT-2781-64	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
10.	07 de Julio de 2025	SEM - ACTA No. 1 - COMITÉ SEGUIMIENTO OBRA CTO 2025-2781_20MAY2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
11.	07 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-69 - Informe Mensual No.2 V0 del Mes de junio de 2025 del Componente SSTMA.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
12.	07 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-70 - Informe Mensual No. 3 V1 del Mes de Junio de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
13.	09 de Julio de 2025	INFORME MENSUAL MAYO CON OBSERVACIONE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
14.	09 de Julio de 2025	Alcance al Oficio No. OFICIO_WEXT-2025-2781-73 - Documentación para radicación de Orden de Fabricación No. 1 – Tapas Sencillas y Antivandálicas	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
15.	09 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-77 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
16.	10 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-78 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS			
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
17.	11 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-80 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
18.	12 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-81 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
19.	13 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-78 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
20.	13 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-82 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
21.	15 de Julio de 2025	Informe de Avance de Orden de Fabricación No. 02 - AUCE O GICE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
22.	16 de Julio de 2025	SEM - ACTA No. 2 - COMITÉ SEGUIMIENTO OBRA CTO 2025-2781_30MAYO2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
23.	18 de Julio de 2025	ACTA COMITE QUINCENAL NO.3 16/07/2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
24.	21 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-85 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
25.	22 de Julio de 2025	INFORME SEMANAL No. 1 - Del 14 al 19 de Julio de 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
26.	23 de Julio de 2025	RV: OT 2 y 3 - CTO 2781	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
27.	23 de Julio de 2025	INFORME MENSUAL No. 03 - DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 V1	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
28.	24 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-89 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
29.	24 de Julio de 2025	DOCUMENTOS MINICARGADOR Y OPERADOR	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
30.	24 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-84 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
31.	24 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-87 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
32.	25 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-91 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
33.	25 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-90 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
34.	28 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-90 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
35.	28 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-92 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERIA	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
36.	29 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-93 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-047-25, Subsanación de Plan de Calidad.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
37.	29 de Julio de 2025	INFORME SEMANAL No. 02 - DEL 21 AL 26 DE JULIO DE 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
38.	29 de Julio de 2025	CAMBIO DE BASE Y SUB BASE	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
39.	30 de Julio de 2025	Acta Comité de Seguimiento No. 3 al Contrato 2025-2781 CM25-26.06.2025-V0	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
40.	31 de Julio de 2025	INICIO DE OBRAS CTO 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

Fuente: Elaboración propia

5.2. Correspondencia Recibida

Tabla 24. Correspondencia recibida mediante oficio

	CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
No.	**FECHA RADICAD.**	**No. OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
1.	01 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-033-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta comunicado WEXT-2025-2781-57 Entrega Cronograma de Obra V1 con subsanación de observaciones de Interventoría – Contrato 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
2.	03 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-034-25 Radicación de Correspondencia	Requerimiento informe semestral decreto 332 CTO 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
3.	04 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-035-25 Radicación de Correspondencia	Observaciones a pólizas suscritas con ocasión de la suscripción del Acta de Inicio - Contrato No. 2025-2781- solicitud de ajustes	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
4.	04 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-036-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a WEXT-2025-2781-59. Presentación del proveedor PH Ingeniería de Perforaciones Horizontales Contrato No. 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
5.	09 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-037-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta comunicado WEXT-2025-2781-57 Entrega Cronograma de Obra V1 con subsanación de observaciones de Interventoría – Contrato 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
6.	14 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-038-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-15 relacionado con Análisis de Precios Unitarios – APU.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
7.	14 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-039-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a comunicados WEXT-2025-2781- 42 Informe mensual No. 2 V1 del mes de mayo de 2025 y WEXT- 2025-2781-43 Informe mensual No. 1 V1 del mes de mayo de 2025 componente SSTMA. – Contrato 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
8.	15 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-040-25 Radicación de Correspondencia	Obligaciones para cumplimiento de criterios Ambientales.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
9.	15 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-041-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a los comunicados WEXT-2025-2781-29, WEXT-2025-2781-47 y WEXT-2025-2781-65 relacionados con Atención observaciones PMA y PMRCD, atención observaciones PMRCD Y subsanación PMA y PMRCD	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
10.	16 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-042-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta comunicados WEXT-2025-2781-79 y WEXT-2025-2781-80 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles. – Contrato 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
11.	22 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-043-25 Radicación de Correspondencia	Ocupación indebida del espacio público - PMT General – Contrato 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
12.	21 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-044-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a comunicados WEXT-2025-2781-77 y WEXT- 2025-2781-78 – Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERIA – Contrato 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
13.	22 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-045-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a los comunicados WEXT-2025-2781-81 y WEXT-2025-2781-82 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles – Contrato 2025- 2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
14.	23 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-046-25 Radicación de Correspondencia	Llamado de atención PMRCD y Gestión SST.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
15.	24 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-047-25 Radicación de Correspondencia	Seguimiento entrega plan de calidad.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
16.	29 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-048-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a WEXT-2025-2781-59 - Presentación del proveedor PH Ingeniería de Perforaciones Horizontales Contrato n.° 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
17.	29 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-049-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a comunicado WEXT-2025-2781-87 con referencia: Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

	CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
No.	**FECHA RADICAD.**	**No. OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
18.	29 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-050-25 Radicación de Correspondencia	Comunicado SPMT_202531208410841 intervención y/o afectación indebida del espacio público sin PMT Carrera 80 con Calle 38 C sur– Contrato 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
19.	29 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-051-25 Radicación de Correspondencia	Respuesta a comunicados WEXT-2025-2781-84 y WEXT-2025-2781-85 – Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

Fuente: Elaboración propia

5.2.1. Correos Electrónicos Recibidos

Tabla 25. Correos electrónicos recibidos

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
1.	01 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-033-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
2.	01 de Julio de 2025	RE: Radicación de cuentas personas jurídicas	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
3.	01 de Julio de 2025	Compromisos Acta No. 3 - Comité de seguimiento 26/06/25	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
4.	02 de Julio de 2025	RV: PLANTILLAS PARA DILIGENCIAMIENTO EN PLATAFORMA MÁNTUM 01072025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
5.	02 de Julio de 2025	RV: SOLICITUD DE ACLARACION RADICADOS SDM 202561202233432 - SDM202561202233562 - SDM 202561202233702 - SDM 202561202242812	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
6.	02 de Julio de 2025	RV: Observaciones Fwd: PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO PMT General típicos - Contrato SDM-2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur - comunicado SPMT_202531207916131 (07 JULIO AL 22 DE JULIO)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
7.	05 de Julio de 2025	ACTA No. 3 MESA DE TRABAJO SSTA	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
8.	02 de Julio de 2025	RV: Observaciones al radicado 202561202176732– CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - 2781, SDM 2025 - 2781 - PMT complemento KR 79 x CL 38c sur - Kennedy	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
9.	02 de Julio de 2025	RE: Visita para Revisión de estructura exterior de AUCE en la empresa aliada TITAN	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
10.	02 de Julio de 2025	Aceptado: Visita Presencial para Revisión de estructura exterior de AUCE en la empresa aliada TITAN	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
11.	09 de Julio de 2025	Cumplimiento obligación contra actual Acuerdo Distrital 381 de 2009	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
12.	02 de Julio de 2025	Subsanación Informe Mensual No. 02 - V2 del Mes de Mayo de 2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
13.	02 de Julio de 2025	Aceptado: Entrega Tapas Sencillas y Antivandálicas de Orden de Trabajo No. 1	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
14.	02 de Julio de 2025	SEM-CMC- CM25-033-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
15.	02 de Julio de 2025	Aceptado: Visita Presencial para Revisión de estructura exterior de AUCE en la empresa aliada TITAN	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
16.	02 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-64 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERIA	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
17.	02 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-65 - Subsanación PMA y Programa de Manejo Ambiental de RCD.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
18.	02 de Julio de 2025	RE: OFICIO_WEXT-2025-2781-66 - Compromiso traslado de traslado de cuenta del Vehículo de Placas JKU 049.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
19.	02 de Julio de 2025	Observaciones Fwd: PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO PMT General típicos - Contrato SDM-2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur - comunicado SPMT_202531207916131 (07 JULIO AL 22 DE JULIO)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
20.	03 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-034-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
21.	03 de Julio de 2025	RE: OFICIO_WEXT-2025-2781-67 - Presentación documentos SST de personal Aprobado.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
22.	04 de Julio de 2025	RV: COI 27 del 03 de julio de 2025 - Aprobación PMT típicos - Contrato SDM-2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
23.	04 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-035-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
24.	04 de Julio de 2025	RE: OFICIO_WEXT-2025-2781-68 - Subsanación Informe Mensual No. 2 V3 del mes de Mayo.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
25.	04 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-036-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
26.	04 de Julio de 2025	RE: COI 27 del 03 de julio de 2025 - Aprobación PMT típicos - Contrato SDM-2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
27.	05 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "SUBSANACION PERSONAL DE APOYO DE PH INGENIERIA.pdf"	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
28.	05 de Julio de 2025	RE: SUBSANACIÓN PRELIMINAR DE OBSERVACIONES AL SGSST	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
29.	07 de Julio de 2025	Invitación de un remitente desconocido: Normativa en Residuos de Construcción Decreto 507 de 2023 mié 23 de jul de 2025 9am - 10am (COT) (consorciomovilidad2025@gmail.com)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
30.	07 de Julio de 2025	Fwd: OBSERVACIONES DEL PMA- proveedor PH Ingeniería	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
31.	07 de Julio de 2025	RE: Observaciones radicado 202561202123142	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
32.	07 de Julio de 2025	ENTREGA DE TAPAS OT 1	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
33.	07 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "1. SUBSANACION PERSONAL DE APOYO PH INGENIERIA.pdf"	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
34.	07 de Julio de 2025	Revisión aprobación hojas de vida oficio WEXT-2781-64	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
35.	08 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-69 - Informe Mensual No.2 V0 del Mes de junio de 2025 del Componente SSTMA.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
36.	08 de Julio de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-70 - Informe Mensual No. 3 V1 del Mes de Junio de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
37.	08 de Julio de 2025	RV: OFICIO WEXT-2025-2781-70 - Informe Mensual No. 3 V1 del Mes de Junio de 2025.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
38.	08 de Julio de 2025	RE: OFICIO WEXT-2025-2781-72 - Informe Semestral de Cumplimiento Decreto 332 de 2020.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
39.	08 de Julio de 2025	Informe Mensual No. 1 V1 del Mes de Mayo de 2025 del Componente SSTMA.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
40.	08 de Julio de 2025	Comité Quincenal 16-jul-25- Cto 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
41.	08 de Julio de 2025	RE: Observaciones al radicado 202561202233432– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
42.	08 de Julio de 2025	RE: Observaciones al radicado 202561202233702– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
43.	08 de Julio de 2025	RE: ALCANCE Observaciones al radicado 202561202233562– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
44.	08 de Julio de 2025	RE: Observaciones al radicado 202561202233562– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
45.	09 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-037-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
46.	09 de Julio de 2025	RV: OFICIO WEXT-2025-2781-73 - Documentación para radicación de Orden de Fabricación No 1 Tapas Sencillas y Antivandálicas	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
47.	09 de Julio de 2025	Presentación Personal	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
48.	09 de Julio de 2025	SEM - ACTA No. 2 - COMITÉ SEGUIMIENTO OBRA CTO 2025-2781_30MAYO2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
49.	09 de Julio de 2025	Acta Comité de Obra No. 2 Contrato 2025-2781-19.06.2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
50.	09 de Julio de 2025	INFORME MENSUAL MAYO CON OBSERVACIONES	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
51.	10 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "ANEXO 1.pdf"	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
52.	10 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "ANEXO 2.pdf"	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
53.	10 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "ANEXO 3.pdf"	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
54.	10 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "ANEXO 4.pdf"	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
55.	10 de Julio de 2025	RV: Observaciones No 2 al radicado 202561202233562– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
56.	10 de Julio de 2025	RV: OFICIO_WEXT-2025-2781-77 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERIA	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
57.	10 de Julio de 2025	RE: PROGRAMACIÓN PMT General típicos 10/07/2025 - Contrato SDM-2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur - comunicado SPMT_202531207916131 - periodo (19 JULIO AL 27 DE JULIO)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
58.	11 de Julio de 2025	COI 28 del 10 de julio de 2025 - Aprobación PMT Específicos y típicos - Contrato SDM-2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
59.	11 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-77 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERIA	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
60.	11 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
61.	11 de Julio de 2025	ORDEN DE TRABAJO 1 - COMPLEMENTOS	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
62.	11 de Julio de 2025	VISITA MARTIRES [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
63.	11 de Julio de 2025	VISITA TUNJUELITO-USME [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
64.	12 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-78 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
65.	12 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-80 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
66.	13 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
67.	14 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
68.	14 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
69.	14 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-81 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
70.	14 de Julio de 2025	RV: OFICIO_WEXT-2025-2781-83 - Informe Mensual No. 2 V4 del mes de Mayo. APROBADO.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
71.	14 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-78 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERIA	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
72.	14 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-038-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
73.	14 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-039-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	SECRETARIA DE MOVILIDAD
74.	15 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-82 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
75.	15 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-040-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
76.	15 de Julio de 2025	SEM-CMC-SDM-041-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
77.	15 de Julio de 2025	CASO RF-827250-8-10273 FABRICACION DE TAPAS JUNIO CONTRATO 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
78.	15 de Julio de 2025	RE: OT 2 y 3 - CTO 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
79.	15 de Julio de 2025	Entrega 100 tapas - almacén SDM	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
80.	15 de Julio de 2025	RV: Alcance al Oficio No. OFICIO_WEXT-2025-2781-73 - Documentación para radicación de Orden de Fabricación No. 1 – Tapas Sencillas y Antivandálicas	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
81.	15 de Julio de 2025	Alerta: Mensaje 1841956 con estado Lectura del mensaje	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
82.	16 de Julio de 2025	Seguimiento Mensual SSTA- CM 2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
83.	16 de Julio de 2025	ACTA COMITE QUINCENAL NO.3 16/07/2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
84.	16 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-042-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
85.	16 de Julio de 2025	RV: Solicitud de tapas antivandálicas Ext. 3276	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
86.	16 de Julio de 2025	Comité de Seguimiento No. 4 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 No. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
87.	16 de Julio de 2025	RV: Socialización plantillas para el diligenciamiento aplicativo Mantum	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
88.	16 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
89.	16 de Julio de 2025	Actas visitas a intersecciones junio/julio	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
90.	17 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
91.	17 de Julio de 2025	RV: PROGRAMACIÓN PMT General típicos 17/07/2025 - Contrato SDM-2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur - comunicado SPMT_202531207916131	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
92.	18 de Julio de 2025	COI 29 del 18 de julio de 2025 - Aprobación PMTs obras - Contrato SDM-2025-2781 - Zona Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
93.	18 de Julio de 2025	RE: Solicitud de tapas antivandálicas Ext. 3276	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
94.	18 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
95.	18 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
96.	21 de Julio de 2025	Seguimiento Mensual SSTA- CM 2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
97.	21 de Julio de 2025	ITEMS IMPREVISTOS	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
98.	21 de Julio de 2025	ITEMS NP NO PREVISTOS	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
99.	21 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
100.	21 de Julio de 2025	RV: Esquema 3D vado KR 80 x CL 38C Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
101.	21 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-85 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
102.	21 de Julio de 2025	Solicitud de compartir "ANEXOS - PERSONAL OPERATIVO OBRAS CIVILES.pdf"	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
103.	21 de Julio de 2025	Retiro inmediato de personal no avalado - Frentes de trabajo Kennedy	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
104.	21 de Julio de 2025	PROYECCIÓN ECONOMICA OBRAS VISITADAS CON ACOMPAÑAMIENTO DE SUPERVISIÓN	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
105.	21 de Julio de 2025	RE: Atención Observaciones al radicado 202561202233432– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
106.	21 de Julio de 2025	RE: Atención Observaciones No 2 al radicado 202561202233562– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
107.	21 de Julio de 2025	INFORME MENSUAL No. 03 - DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 V1	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
108.	22 de Julio de 2025	Invitación: Reunión de seguimiento - PRESENCIAL mar 22 de jul de 2025 2:30pm - 3:15pm (COT) (CONSORCIO MOVILIDAD 2025)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
109.	22 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-043-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
110.	22 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-044-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
111.	22 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-045-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
112.	22 de Julio de 2025	Observaciones No 3 - al radicado 202561202233432– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
113.	22 de Julio de 2025	RE: Devolución de Interventoría al PMT para complemento - intersección semaforizada - EXT_3814 ID_882 - KR 63 X CL 57 B SUR - Contrato 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
114.	23 de Julio de 2025	RE: OFICIO_WEXT-2025-2781-88 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-035-25, Subsanación de Pólizas de RCE y CUMPLIMIENTO.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
115.	23 de Julio de 2025	Acta Comité de Seguimiento No. 3 al Contrato 2025-2781 CM25-26.06.2025-V0	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
116.	23 de Julio de 2025	Suspensión de actividades por incumplimiento de condiciones SST - Externo 3121 ID1921	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
117.	23 de Julio de 2025	PROGRAMACIÓN OBRAS CIVILES LOTE 2	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
118.	23 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-046-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
119.	23 de Julio de 2025	RV: ACTA No.5 Cargue documentos ambientales	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
120.	24 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-047-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
121.	24 de Julio de 2025	Visita intersección Sierra Morena TV 60 X DG 70 Sur [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
122.	24 de Julio de 2025	DOCUMENTOS MINICARGADOR Y OPERADOR	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
123.	24 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-89 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
124.	24 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-87 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
125.	24 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-84 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
126.	25 de Julio de 2025	INICIO DE OBRAS CTO 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
127.	25 de Julio de 2025	RV: Observaciones a registros Mántum Julio 2025 - OBRAS CIVILES - SE-302	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
128.	25 de Julio de 2025	RV: OT 2 y 3 - CTO 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
129.	25 de Julio de 2025	Recuperar: COI 30 del 24 de julio de 2025 - Aprobación PMTs obras - Contrato SDM-2025-2781 - Zona Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
130.	25 de Julio de 2025	COI 30 del 24 de julio de 2025 - Aprobación PMTs obras - Contrato SDM-2025-2781 - Zona Sur	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
131.	25 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-90 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
132.	26 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-91 - Presentación de Personal Operativo para Actividades de Obras Civiles.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
133.	28 de Julio de 2025	RV: Kennedy Activa límites de intervención SEMA_SDM	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
134.	28 de Julio de 2025	RV: Ajuste hombros de vados Externo 3873	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
135.	28 de Julio de 2025	RV: Observaciones No 2 al radicado 202561202233702– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
136.	29 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-93 - Respuesta al Oficio No. SEM-CMC-CM25-047-25, Subsanación de Plan de Calidad.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
137.	29 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-048-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
138.	29 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-049-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
139.	29 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-050-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
140.	29 de Julio de 2025	SEM-CMC-CM25-051-25 Radicación de Correspondencia	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
141.	29 de Julio de 2025	Visita intersección Sierra Morena TV 60 X DG 70 Sur [En persona]	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
142.	29 de Julio de 2025	RV: Devolución de Interventoría a subsanación de Observaciones No 2 al radicado 202561202233702– CONSORCIO MOVILIDAD 2025, SDM 2025 - 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
143.	30 de Julio de 2025	RV: OT 4 - Mantenimientos	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
144.	30 de Julio de 2025	RV: Atención a Observaciones No 2 de la SDM - radicado 202561202176732– CONSORCIO MOVILIDAD 2025 - 2781, SDM 2025 - 2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
145.	30 de Julio de 2025	Invitación de un remitente desconocido: Solicitud reunión revisión observaciones de SDM al PMT de... mié 30 de jul de 2025 10am - 11am (COT) (consorciomovilidad2025@gmail.com)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
146.	30 de Julio de 2025	Solicitud reunión revisión observaciones de SDM al PMT de la AK 80 con Cl 38 Sur.	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
147.	30 de Julio de 2025	Invitación actualizada con una nota: Solicitud reunión revisión observaciones de SDM al PMT de... mié 30 de jul de 2025 12pm - 1pm (COT) (consorciomovilidad2025@gmail.com)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
148.	30 de Julio de 2025	Invitación actualizada: Solicitud reunión revisión observaciones de SDM al PMT de... mié 30 de jul de 2025 12:30pm - 1pm (COT) (consorciomovilidad2025@gmail.com)	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
149.	30 de Julio de 2025	OFICIO_WEXT-2025-2781-92 - Presentación de Personal de Apoyo para Actividades de Perforación – PH INGENIERIA	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
150.	30 de Julio de 2025	Compromisos 30 de julio 2025	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
151.	30 de Julio de 2025	ALTERNATIVA REUBICACION PERFORACION DIRIGIDA EXT 3454/ ID 887	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
152.	31 de Julio de 2025	Actas 06 y 07	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
153.	31 de Julio de 2025	Hallazgos bodega	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
154.	31 de Julio de 2025	RV: Radicación cuentas terceros agosto	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
155.	31 de Julio de 2025	PROGRAMACIÓN semana siguiente PMT General típicos 31/07/2025 - Contrato SDM-2025-2781 – Lote 2 - Zona Sur - comunicado SPMT_202531207916131	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

Fuente: Elaboración propia

5.3. Actas de Reunión

Tabla 26. Actas de reunión

ITEM	ACTA	FECHA
1.	Visita Presencial para Revisión de estructura exterior de AUCE en la empresa aliada TITAN	03 de Julio de 2025
2.	Entrega Tapas Sencillas y Antivandálicas de Orden de Trabajo No. 1	04 de Julio de 2025
3.	Comité Quincenal 16-jul-25- Cto 2781	16 de Julio de 2025
4.	Entrega 100 tapas - almacén SDM	17 de Julio de 2025
5.	Reunión de seguimiento - PRESENCIAL	22 de Julio de 2025

Fuente: Elaboración propia

6. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2025-2781	14 de Abril de 2025
ACTA DE INICIO	29 de Abril de 2025

Tabla 27. Póliza inicial Según Contrato - Cumplimiento

PÓLIZA ACTA DE INICIO (CUMPLIMIENTO)						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONTRATO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/04/2025	14/08/2026	$1,542,585,397.20	30%	APROBADA
	CALIDAD DEL SERVICIO	14/02/2026	14/08/2026	$1,542,585,397.20	30%	
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	14/02/2026	14/08/2026	$2,056,780,529.60	40%	
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/04/2025	14/02/2029	$514,195,132.40	10%	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/02/2026	14/02/2031	$1,542,585,397.20	30%	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 28. Póliza Inicial según Contrato - Responsabilidad Civil

PÓLIZA ACTA DE INICIO (RESPONSABILIDAD CIVIL)						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONTRATO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00	11.07%	APROBADA
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		
	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00		

Fuente: Elaboración propia

Tabla 29. Póliza Según Acta de Inicio - Cumplimiento

PÓLIZA ACTA DE INICIO (CUMPLIMIENTO)						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONTRATO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/04/2025	29/08/2026	$1,542,585,397.20	30%	APROBADA
	CALIDAD DEL SERVICIO	01/03/2026	29/08/2026	$1,542,585,397.20	30%	
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	01/03/2026	29/08/2026	$2,056,780,529.60	40%	
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/04/2025	01/03/2029	$514,195,132.40	10%	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	01/03/2026	01/03/2031	$1,542,585,397.20	30%	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 30. Póliza según Acta de Inicio - Responsabilidad Civil

PÓLIZA ACTA DE INICIO (RESPONSABILIDAD CIVIL)						
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**PORCENTAJE DEL TOTAL DEL CONTRATO**	**ESTADO**
SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00	11.07%	APROBADA
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		
	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	29/04/2025	01/03/2026	$569,400,000.00		

Fuente: Elaboración propia

EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se firma el Acta de Inicio	29 de Abril de 2025

Fuente: Elaboración propia

7. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

Tabla 31. Balance financiero

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
A	VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 5.141.951.324 M/CTE
B	TOTAL ADICIONES	$ 0
C	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A+B)	$ 5.141.951.324 M/CTE
D	VALOR ACUMULADO DEL MES ANTERIOR	$ 83.152.575
E	VALOR PRESENTE ACTA	$ 597.185.122
F	VALOR TOTAL EJECUTADO (D+E)	$ 680.337.697
G	VALOR RETENCIÓN ACUMULADA	$ 34.015.885
H	VALOR POR EJECUTAR (C-F)	$ 4.461.613.627

Fuente: Elaboración propia

Imagen No. 1. Actividades y cantidades ejecutadas durante el mes de Julio

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I. ÍTEMS por disponibilidad mensual					
1	1	Implementación del plan de manejo de tráfico	12 ML	0,00	$ 0,00
2	2	Localización, verificación y replanteo	UN	0	$ 0,00
3	3	Limpieza de Caja de Paso	UN	0	$ 0,00
4	4	Limpieza de Caja de Paso con riesgo biológico	UN	0	$ 0,00
					$ 0,00
II. Demoliciones					
5	5	Demolición de Pavimento Asfáltico (Espesor Variable)	M3	2,31	$ 751.988,00
6	6	Demolición y construcción de losas de Concreto Hidráulico en calzada (MR-43KG/CM2 y espesor variable)	M3	0	$ 0,00
7	7	Demolición de Andenes en Concreto o Andenes en General	M3	43,25	$ 12.871.589,00
8	8	Demolición de Sardinel Existente	ML	135,09	$ 5.236.764,00
9	9	Demolición Muro Sencillo en Ladrillo Recocido de Cajas de Paso o Muro en Bloque de Concreto	M2	10,16	$ 455.463,00
10	10	Demolición Placa Base de Caja de Paso	M3	0,18	$ 24.303,00
					$ 19.340.107,00
III. Excavaciones					
11	11	Excavación Manual en Material Común para Redes, entre Cero y Dos Metros (0,00 a 2,00 m) de Profundidad	M3	224,00	$ 54.078.304,00
					$ 54.078.304,00
IV. Transporte de escombros					
12	12	Transporte y Disposición final en el botadero autorizado por autoridad ambiental	M3	0	$ 0,00
					$ 0,00
V. Suministro para redes					
13	13	Suministro e Instalación de dos (2) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	23,10	$ 1.883.043,00
14	14	Suministro e Instalación de tres (3) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	0	$ 0,00
15	15	Suministro e Instalación de cuatro (4) ductos PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	0	$ 0,00
16	16	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo DB de dos (2") pulgadas de diámetro	ML	0	$ 0,00
17	17	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de tres pulgadas (3") de diámetro	ML	0	$ 0,00
18	18	Suministro e Instalación de un (1) ducto PVC tipo TDP de cuatro pulgadas (4") de diámetro	ML	0	$ 0,00
19	19	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Dos (2") Pulgadas de Diámetro	UN	0	$ 0,00
20	20	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Tres (3") Pulgadas de Diámetro	UN	0	$ 0,00
21	21	Suministro e Instalación de Adaptador Terminal Campana de Cuatro (4") Pulgadas de Diámetro	UN	0	$ 0,00
					$ 1.883.043,00

VI. Rellenos					
22	22	Suministro, Extendida y Compactación de Arena para base y Recubrimiento de Ductos	M3	1,78	$ 439.475,00
23	23	Relleno tipo Sub-Base Granular SBG-1 INVIAS	M3	0	$ 0,00
24	24	Relleno Tipo Base Granular BG-1 INVIAS	M3	65,02	$ 21.411.606,00
25	25	Base Asfáltica Tipo MDC-1	M3	0	$ 0,00
26	26	Rodadura Asfáltica Tipo MDC-3	M3	0	$ 0,00
27	27	Relleno Manual de Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	M3	6,78	$ 705.540,00
					$ 22.556.621,00
VII. Construcciones					
28	28	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2 - Veintiocho (28) Días de Fraguado), Espesor de Diez Centímetros (0,10 m)	M2	0	$ 0,00
29	29	Construcción de Andén en Concreto de Resistencia a la Compresión de Doscientos diez Kilogramos por Centímetro Cuadrado (210 Kg/cm2)	M3	0	$ 0,00
30	30	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico Pesado	M2	0	$ 0,00
31	31	Construcción de Andén en Adoquín en Arcilla Tráfico liviano	M2	50,39	$ 10.398.329,00
32	32	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico Pesado	M2	0	$ 0,00
33	33	Construcción de Andén en Adoquín en Concreto Tráfico liviano	M2	0	$ 0,00
34	34	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Tableta o Tablón de Gres o Similares	M2	0	$ 0,00
35	35	Construcción de Andén en Concreto y acabado en gravilla No, 2 (Piedra Mona)	M2	0	$ 0,00
36	36	Construcción de Andén en Concreto y acabado en Granito Pulido	M2	0	$ 0,00
37	37	Piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06)	M2	5,8	$ 1.191.790,00
38	38	Construcción de Caja de Paso Sencilla, incluye marco y tapa	UN	0	$ 0,00
39	39	Construcción de Caja de Paso Doble , incluye marco y tapa	UN	1	$ 2.288.856,00
40	40	Construcción de Caja de Paso para AUCE o GIC, incluye marco y tapa	UN	0	$ 0,00
41	41	Construcción de Placa Base para Caja de Paso, en Concreto de Resistencia a la compresión (175 Kg/cm2),	M2	0	$ 0,00
42	42	Construcción de Muro Sencillo en Ladrillo Recocido	M2	0	$ 0,00
43	43	Construcción de Pañetes	M2	0	$ 0,00
44	44	Suministro e instalación de marco rectangular para caja de paso sencilla o para caja de paso para AUCE o GIC	UN	0	$ 0,00
45	45	Suministro e instalación de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	0	$ 0,00
46	46	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso	UN	50,00	$ 16.647.600,00
47	47	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador.	UN	0	$ 0,00
48	48	Limpieza Exterior de Armario Unificado de Comunicaciones y Energia - AUCE o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC y equipo de control local o controlador. con riesgo biológico	UN	0	$ 0,00
49	49	Perforación dirigida	ML	346,86	$ 250.628.896,00
50	50	Perforación neumática	ML	0	$ 0,00
51	51	Construcción Sardinel Monolítico	ML	0	$ 0,00
52	52	Suministro e Instalación de Sardinel Prefabricado en Concreto	ML	64,00	$ 8.095.040,00
53	53	Empradización	M2	0	$ 0,00

54	54	Construcción de Base para Poste Semafórico T1, T1X, T2 (L=2,50 metros A 6,50 metros)	UN	0	$ 0,00
55	55	Construcción de Base para Poste Semafórico T2 (L=8,50 metros)	UN	0	$ 0,00
56	56	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T1, T2 y T6	UN	0	$ 0,00
57	57	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T3	UN	0	$ 0,00
58	58	Construcción de Base para Poste para cámaras de video detección (sensorización) Tipo T4 y T5	UN	0	$ 0,00
59	59	Suministro e Instalación de Tubo Galvanizado de 2" x 6 m para la Bajante de la Acometida Eléctrica	UN	0	$ 0,00
60	60	Suministro e Instalación de Bolardo en concreto tipo M60	UN	0	$ 0,00
61	61	Suministro e Instalación de Bolardo alto en hierro M63	UN	0	$ 0,00
62	62	Concreto Armado para muro de contención de resistencia a la compresión de doscientos diez kilogramos por centímetro cuadrado (210Kg/cm2 - Veintiocho (28) días de fraguado)	M3	0	$ 0,00
63	63	Rehabilitación de andén en adoquín de arcilla tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	0	$ 0,00
64	64	Rehabilitación de andén en adoquín de concreto tráfico liviano, con materiales del sitio	M2	0	$ 0,00
65	65	Rehabilitación piso en loseta prefabricada A-50, A-55 Táctil Alerta o A-56 Guía, (04x04x06), con materiales del sitio	M2	0	$ 0,00
66	66	Suministro e instalación de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	0	$ 0,00
67	67	Suministro de Armario Unificado de Comunicaciones y Energía (AUCE) o Gabinete Integrado de Comunicaciones - GIC con puertas adecuadas para implementar el sistema de control de acceso (SCA) para Equipo de Control y Losa de concreto prefabricada.	UN	0	$ 0,00
68	68	Suministro e instalación de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE.	UN	0	$ 0,00
69	69	Suministro (Entrega en sitio) de losa de concreto prefabricada para base de AUCE o GICE	UN	0	$ 0,00
70	70	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso sencilla	UN	0	$ 0,00
71	71	Suministro e instalación de marco rectangular ANTIVANDÁLICO para caja de paso doble	UN	0	$ 0,00
72	72	Suministro (entrega en sitio) de tapa rectangular ANTIVANDÁLICA para caja de paso	UN	50,00	$ 23.548.950,00
73	73	Suministro (Entrega en sitio) de marco rectangular para caja de paso sencilla	UN	0	$ 0,00
74	74	Suministro (Entrega en sitio) de Marco Rectangular para Caja de Paso Doble	UN	0	$ 0,00
75	75	Suministro (entrega en sitio) de Tapa rectangular para Caja de Paso de 10 cm de espesor	UN	0	$ 0,00
					$ 312.799.461,00
VIII. Ensayos de Laboratorio					
76	76	Ensayo de compactación	UN	3,00	$ 639.828,00
77	77	Ensayo resistencia a la compresión cilindros de concreto	UN	3,00	$ 146.490,00
78	78	Ensayo Granulometría de agregados	UN	1,00	$ 142.744,00
					$ 929.062,00
IX. Transportes					
79	79	Vehículo tipo camión, incluye conductor	MES	2,00	$ 28.945.368,00

80	80	Camión tipo grúa cabina sencilla para el traslado y movimiento de AUCE o GICE, pedestales y bases portátiles	HR	0	$ 0,00
					$ 28.945.368,00
X. Personal					
81	81	Personal Profesional Técnico y Administrativo	MES	1,00	$ 36.666.871,00
82	82	Personal Técnico de Obra	MES	1,00	$ 11.623.094,00
					$ 48.289.965,00
				T. Acta	**$ 488.821.931,00**

Anexo 11. Memorias de Calculo

7.1 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL MES (01 de Julio al 31 de Julio de 2025)

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas por intersección durante el mes de Julio:

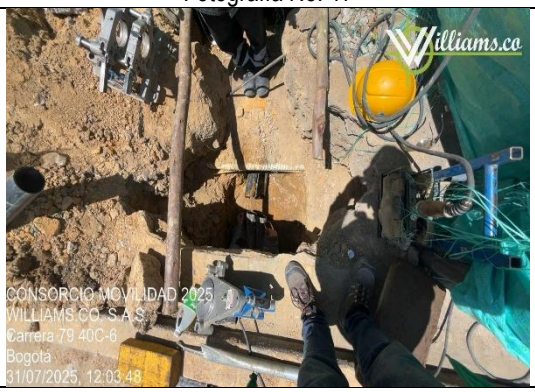
AK 72 X CL 9 .	
	
Fotografía No.1	Fotografía No.2
	
Fotografía No.3	Fotografía No.4

	
Fotografía No.5	Fotografía No.6

KR 14 I X CL 84 SUR	
	
Fotografía No.7	Fotografía No. 8
	
Fotografía No. 9	Fotografía No. 10

	
Fotografía No. 11	Fotografía No. 12
	
Fotografía No. 13	Fotografía No. 14

KR 79 CL 40C SUR	
	
Fotografía No.15	Fotografía No. 16

	
Fotografía No. 17	Fotografía No. 18
	
Fotografía No. 19	Fotografía No. 20

KR 79 X CL 38C S	
	
Fotografía No.21	Fotografía No. 22



Fotografía No. 23



Fotografía No. 24



Fotografía No. 25



Fotografía No. 26

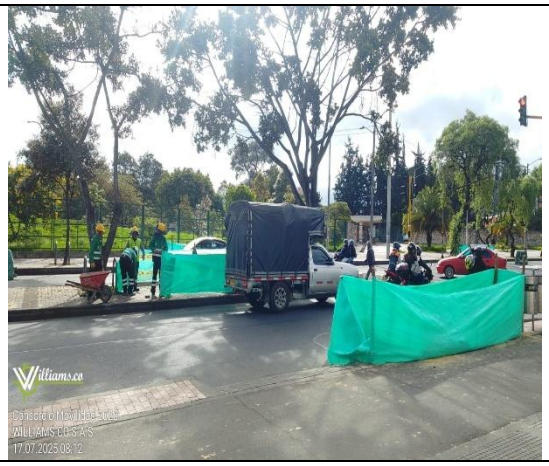


Fotografía No. 27



Fotografía No. 28

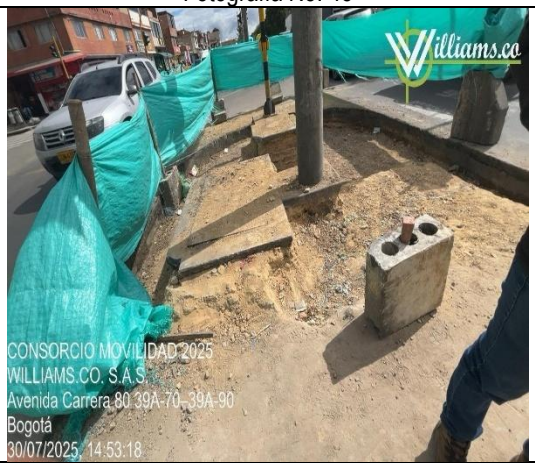
	
Fotografía No. 29	Fotografía No. 30
	
Fotografía No. 31	Fotografía No. 32
	
Fotografía No. 33	Fotografía No. 34

	
Fotografía No. 35	Fotografía No. 36

KR 78K CL 38C SUR	
	
Fotografía No.37	Fotografía No. 38
	
Fotografía No. 39	Fotografía No. 40

	
Fotografía No. 41	Fotografía No. 42
	
Fotografía No. 43	Fotografía No. 44

AK 80 CL 40C SUR	
	
Fotografía No. 45	Fotografía No. 46

	
Fotografía No. 47	Fotografía No. 48
	
Fotografía No. 49	Fotografía No. 50
	
Fotografía No. 51	Fotografía No. 52



Fotografía No. 53



Fotografía No. 54



Fotografía No. 55



Fotografía No. 56



Fotografía No. 57



Fotografía No. 58

	
Fotografía No. 59	Fotografía No. 60

AK 80 CL 38C SUR	
	
Fotografía No. 61	Fotografía No. 62
	
Fotografía No. 63	Fotografía No. 64



Fotografía No. 65



Fotografía No. 66



Fotografía No. 67



Fotografía No. 68



Fotografía No. 69



Fotografía No. 70

	
Fotografía No. 71	Fotografía No. 72
	
Fotografía No. 73	Fotografía No. 74
	
Fotografía No. 75	Fotografía No. 76



Fotografía No. 77



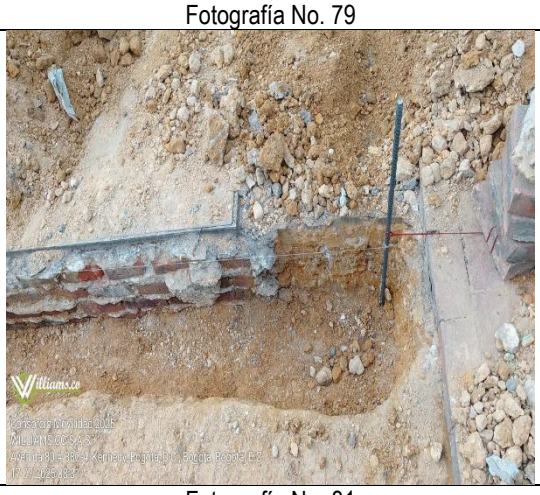
Fotografía No. 78



Fotografía No. 79



Fotografía No. 80



Fotografía No. 81



Fotografía No. 82

7.2. Actividades y pendientes

Tabla 32. Actividades y pendientes

ACTIVIDADES	
1.	Replanteo de intersecciones nuevas.
2.	Inicio de Actividades de perforación, demolición, excavación para intersecciones nuevas

Fuente: Elaboración propia

8. INFORME SSTMA

En el presente numeral se describen las actividades referentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente – SSTMA, desarrollas en el marco de contrato de obra CONTRATO DE OBRA No 2025-2781 "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR, en el mes de Julio de 2025 que se encontraran en el informe SSTMA.

9.1. Pagos y aportes de seguridad social y parafiscales.

- Director de Obra.
- Residente de obra.
- Tecnólogo SST
- Especialista en Transito
- Auxiliar de Ingeniería.
- Conductor para vehículo tipo camioneta.
- Maestro de Obra
- Profesional SST
- Oficial de Obra
- Inspector de Obra
- Ayudante de Obra
- Conductor para vehículo tipo grúa cabina sencilla
- Personal Operativo (84 personas)
