
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	
OBJETO DEL INFORME	Informe de supervisión Final del Convenio No. 20233707
NOMBRE DEL PROYECTO	Convenio Interadministrativo No. 20233707
FECHA DEL INFORME	20 de Diciembre de 2024
PERSONAL QUE ADELANTA EL INFORME - SUPERVISOR	Mayor. Diego Francisco Cepeda Sanchez Supervisor Convenio Interadministrativo No.20233707
II. DATOS GENERALES DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
CONVENIO O CONTRATO N°	Convenio Interadministrativo No. 20233707
INTERVINIENTES	Alcaldía Municipal de Pasto Brigada de Ingenieros de Construcciones **Batallón de Ingenieros de Construcción No.52 "General. Francisco Tamayo Cortes"**
OBJETO DEL CONVENIO	"Anuar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, entre el municipio de Pasto y el Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional – Comando de Ingenieros – Brigada de Ingenieros de Construcciones – Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52 (BICON52) a través de la CENAC – ING, con el fin de realizar mantenimiento y mejoramientos en la vías urbanas y rurales de la ciudad de San Juan de Pasto – Nariño".
CANTIDAD A EJECUTAR	Mantenimiento y reparación estructura pavimento rígido y flexible (Longitud 1078,7 m), intervención vías rurales Longitud (77,800 m).
UNIDAD EJECUTORA	Batallón de Ingenieros de Construcciones No.52 "Gral. Francisco Tamayo Cortes" (BICON52)
POBLACION BENEFICIADA	La población que se beneficiara con el proyecto de "mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural vigencia 2023 del municipio de Pasto, el cual se planea ejecutar mediante un convenio interadministrativo, se estima en 26.888 personas beneficiadas de manera directa, en los corregimientos de Catambuco, Jongovito, Gualmatan, Obonuco y Mapachico. La población que se beneficiara con el proyecto de "Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana vigencia 2023 del Municipio de Pasto, el cual se planea ejecutar mediante un convenio interadministrativo, se estima en 215,000 personas de manera directa.

BICON52

FECHA DE SUSCRIPCION	27 de Junio de 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 2.637.247.844,00 millones de pesos**
FECHA DE ACTA DE INICIO	13 diciembre de 2023
FECHA DE ENTREGA	29 de Noviembre de 2024
MODIFICATORIOS	Prorroga el convenio hasta 29 de noviembre 2024,a partir del vencimiento del convenio principal es decir desde el 1 de enero de 2024 hasta el 29 de noviembre de 2024.

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO

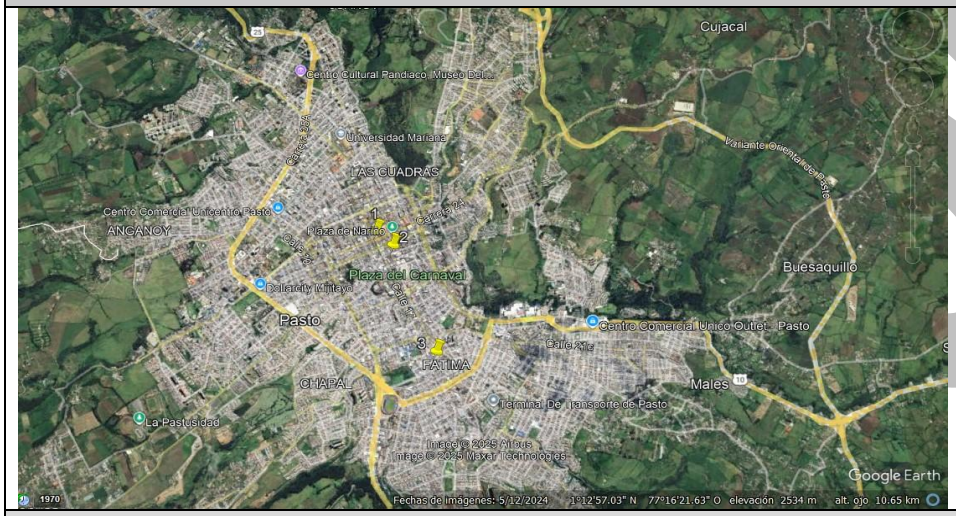

"Las actividades se llevarán a cabo en el departamento de Nariño, específicamente en el casco urbano de la ciudad de Pasto y en las veredas cercanas a la misma."

IV. INFORMACION JURIDICA

1. Durante este mes se han llevado a cabo mesas de trabajo, con la alcaldía de Pasto con la finalidad de proyectar el modificatorio del convenio documentación que fue remitida a la CENACING para su revisión y trámite.
2. De acuerdo a la respuesta emitida por parte de la CENACING no es viable el moficatorio en tiempo y alcance del convenio N°20233707 toda vez que los tiempos que se proyectan no alcanzan para la ejecución del mismo.
3. Se procede con el término del convenio de acuerdo a lo estipulado en el modificatorio N°1 a fecha 29 de noviembre del 2024.
4. Es importante informar que los procesos de contratación fueron realizados por la Alcaldía de Pasto Nariño, de acuerdo a esto el supervisor del Convenio remite a ejercito el balance financiero de acuerdo a los contratos adjudicados y los recursos empleados durante la ejecución del convenio lo cual es equivalente a $ 238.682.844,10 lo cual equivale al 23,24 %.

V. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS

Se presenta la información inicial y de planeación para el presente Proyecto, así:

1. **Plan de Compras**
2. **Presupuesto**
3. **Balance Financiero Final**

2. APROPIACIÓN VIGENCIA 2023

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL OBRA, BIENES Y SERVICIOS	VALOR OBRA, CONTRATADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	CONTRATO	POLIZA	APROB. POLIZA	ACTA DE INICIO	PAGADO
20234457	PANAVIAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SA	El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar el SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO NÚMERO 20233707 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE PASTO.	**$ 625.000.000**	28/11/2023	15/12/2023 (PRORROGA 29/11/24)	SUMINISTRO	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ETATAL 41-44-101277537	SI	SI 27 DE JUNIO DE 2023	**$ 52.940.940**
20234397	AB Y AR SAS	El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar el SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN; HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR; ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y MATERIALES DE SEGURIDAD VIAL en cumplimiento del convenio interadministrativo No. 20233707 del 27 de junio de 2023, según las condiciones técnicas requeridas.	**$99.500.000**	17/11/2023	15/12/2023 (PRORROGA 29/11/24)	SUMINISTRO	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ETATAL 41-44-101277537	SI	SI 23/12/2023	**$ 40.865.800**

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL OBRA, BIENES Y SERVICIOS	VALOR OBRA, CONTRATADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	CONTRATO	POLIZA	APROB. POLIZA	ACTA DE INICIO	PAGADO
20234424	MARÍA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO	El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE PARTES, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, Y MANO DE OBRA CALIFICADA DE LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS PERTENECIENTES AL EJERCITO NACIONAL EN DESARROLLO DEL CONVENIO NÚMERO 20233707 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE PASTO.	**$158.980.000**	4/12/2023	15/12/2023 (PRORROGA 29/11/24)	SUMINISTRO	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 41-44-101277500	Si	Si 24/11/2023	**$ 65.884.600**
119015	TERPEL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL BANCO DE MAQUINARIA, VEHICULOS DE CARGA Y OTROS PERTENECIENTES AL EJERCITO NACIONAL EN DESARROLLO DEL CONVENIO NO. 20233707	**$ 94.328.500**	2-nov-23	29-nov-24	SUMINISTRO	POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 2051196	SI	SI	**$ 30.091.504,10**
20240584	RIGOBERTO LEON REALPA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	**$ 3.800.000**	19-ene-24	29-feb-24	Prestación de servicios	-	NO	-	**$ 3.800.000**
20240642	MARIIO FERNANDO CUCHALA JOJOA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	**$ 5.000.000**	19-ene-24	29-feb-24	Prestación de servicios	-	NO	-	**$ 5.000.000**

BIGNIS

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL OBRA, BIENES Y SERVICIOS	VALOR OBRA, CONTRATADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	CONTRATO	POLIZA	APROB. POLIZA	ACTA DE INICIO	PAGADO
20241848	RIGOBERTO LEON REALPA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	**$ 7.600.000**	**19-ene-24**	**29-feb-24**	Prestación de servicios	-	NO	-	**$ 7.600.000**
20234648	ANGELA GABRIIELA ENRÍQUEZ ARROYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	**$ 2.500.000**	**19-ene-24**	**29-feb-24**	Prestación de servicios	-	NO	-	**2.500.000**
20240582	JORGE ALEXANDER DIIAZ VARGAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	**$ 5.000.000**	**19-ene-24**	**29-feb-24**	Prestación de servicios	-	NO	-	**$ 5.000.000**
20241181	JOSE INGNACIO MIRANDA VALLEJO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	**$ 15.000.000**	**19-ene-24**	**29-jun-24**	Prestación de servicios	-	NO	-	**$ 15.000.000**
20241966	JORGE ALEXANDER DIIAZ VARGAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	**$ 10.000.000**	**19-mar-24**	**20-nov-24**	Prestación de servicios	-	NO	-	**$ 10.000.000**
TOTAL ADJUDICADO			**$ 1.026.708.500**	**TOTAL EJECUTADO**						**$ 238.682.844,10**

BICONSA

VI. MATERIAL RECIBIDO

- **CONTRATO 20234424 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE PARTES, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, Y MANO DE OBRA CALIFICADA DE LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS PERTENECIENTES AL EJERCITO NACIONAL**

Concepto	Unidad de Medi	Contrato	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
Aceite motor 15W40	GAL	20234424	98000	138,00	13.524.000,00
Grasa KP 2 G 40 (EP2)	LB	20234424	32000	15,00	480.000,00
Aceite motor 20W50	GAL	20234424	118000	54,00	6.372.000,00
ACEITE 80W90	GAL	20234424	115600	43,00	4.970.800,00
ACEITE HIDRAULICO ISO68	GAL	20234424	85000	59,00	5.015.000,00
BATERIA BORNE 31H	UND	20234424	986000	2,00	1.972.000,00
Filtro Combustible Primario BF970 BALDWIN	UND	20234424	89600	2,00	179.200,00
Filtro Aire Primario RS3544 BALDWIN	UND	20234424	310600	3,00	931.800,00
Filtro Aceite BT8850-MPG BALDWIN	UND	20234424	321300	2,00	642.600,00
Filtro Aire Secundario RS3545 BALDWIN	UND	20234424	227900	3,00	683.700,00
Filtro Hidraulico P569206 DONALDSON	UND	20234424	368900	3,00	1.106.700,00
FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO BF7557 BALDWIN	UND	20234424	345600	2,00	691.200,00
FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO BF1365 BALDWIN	UND	20234424	256000	2,00	512.000,00
Filtro Aceite BT339 BALDWIN	UND	20234424	89600	1,00	89.600,00
Filtro Combustible Primario Tipo cartucho PF7748 BALDWIN	UND	20234424	180600	6,00	1.083.600,00
Filtro Aire Primario RS4862 BALDWIN	UND	20234424	376200	3,00	1.128.600,00
Filtro Aire Secundario RS4863 BALDWIN	UND	20234424	435200	3,00	1.305.600,00
Filtro Hidraulico B5134 BALDWIN	UND	20234424	78900	3,00	236.700,00
Filtro Aceite BD7154 BALDWIN	UND	20234424	321300	3,00	963.900,00
Filtro Combustible Primario BF1226 BALDWIN	UND	20234424	125600	1,00	125.600,00
Filtro Aire Primario PA2474 BALDWIN	UND	20234424	564500	1,00	564.500,00
Filtro Aire Secundario PA2836 BALDWIN	UND	20234424	345600	1,00	345.600,00
Filtro Hidraulico BT 9422 BALDWIN	UND	20234424	538600	1,00	538.600,00
AUTOMATICO AUXILIAR DE ARRANQUE HELLA	UND	20234424	156900	1,00	156.900,00
MOTOR DE ARRANQUE DELCO REMY	UND	20234424	1568900	1,00	1.568.900,00
Filtro Aceite OLP-014	UND	20234424	61500	1,00	61.500,00
Filtro Combustible Primario FLP-340	UND	20234424	23500	1,00	23.500,00
Filtro Combustible Secundario FLP-317	UND	20234424	24600	1,00	24.600,00
Filtro Aire Primario AIP-543	UND	20234424	94300	1,00	94.300,00
Filtro Aceite OLP-144 PREMIUN FILTERS	UND	20234424	35600	1,00	35.600,00
Filtro Combustible Primario FLP-472 OILO FILTERS	UND	20234424	68600	2,00	137.200,00
Filtro Aire Primario AIP-961 OIL FILTERS	UND	20234424	42600	2,00	85.200,00
Filtro Aceite P502465 DONALSSON	UND	20234424	135600	2,00	271.200,00
Filtro Aire Primario RS3544 BALDWIN	UND	20234424	310600	1,00	310.600,00
Filtro Aire Secundario RS3545 BALDWIN	UND	20234424	227900	1,00	227.900,00
LLANTAS 14.00-24 PN 14 G2 /L4	UND	20234424	4689000	2,00	9.378.000,00
LLANTAS P 225 / 70 R 16	UND	20234424	789600	2,00	1.579.200,00
BATERIA 34D - 1200	UND	20234424	689000	1,00	689.000,00
REPARACION BOMBA INYECCION	UND	20234424	5412700	1,00	5.412.700,00
REPARACION SISTEMA ELECTRICO	REPARA(	20234424	2365000	1,00	2.365.000,00

➢ **CONTRATO 20234457 SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETOS**

Concepto	Unidad de Medi	Contrato	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 - EN PLANTA	GAL	20234457	22000	50,00	1.100.000,00
BASE GRANULAR C.B.R. >=80 EN PLANTA	M3	20234457	88000	14,00	1.232.000,00
BASE GRANULAR C.B.R. >=80 EN PLANTA	M3	20234457	88000	14,00	1.232.000,00
CONCRETO ASFÁLTICO MDC 19 - EN PLANTA	M3	20234457	683560	6,00	4.101.360,00
CONCRETO ASFÁLTICO MDC 19 - EN PLANTA	M3	20234457	683560	6,00	4.101.360,00
BASE GRANULAR C.B.R. >=80 EN PLANTA	M3	20234457	88000	7,00	616.000,00
CONCRETO ASFÁLTICO MDC 19 - EN PLANTA	M3	20234457	683560	12,00	8.202.720,00
BASE GRANULAR C.B.R. >=80 EN PLANTA	M3	20234457	88000	14,00	1.232.000,00
BASE GRANULAR C.B.R. >=80 EN PLANTA	M3	20234457	88000	14,00	1.232.000,00
CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 3500 PSI CON ACELERANTE A 3 DÍA	M3	20234457	597000	7,00	4.179.000,00
BASE GRANULAR C.B.R. >=80 EN PLANTA	M3	20234457	88000	14,00	1.232.000,00
BASE GRANULAR C.B.R. >=80 EN PLANTA	M3	20234457	88000	6,00	528.000,00
CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 3500 PSI CON ACELERANTE A 3 DÍA	M3	20234457	597000	7,00	4.179.000,00
BASE GRANULAR C.B.R. >=80 EN PLANTA	M3	20234457	88000	7,00	616.000,00
BASE GRANULAR C.B.R. >=80 EN PLANTA	M3	20234457	88000	2,00	176.000,00
BASE GRANULAR C.B.R. >=80 EN PLANTA	M3	20234457	88000	2,00	176.000,00
CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 3500 PSI CON ACELERANTE A 3 DÍA	M3	20234457	597000	7,00	4.179.000,00
CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 3500 PSI CON ACELERANTE A 3 DÍA	M3	20234457	597000	7,00	4.179.000,00
CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 3500 PSI CON ACELERANTE A 3 DÍA	M3	20234457	597000	6,00	3.582.000,00
CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 3500 PSI CON ACELERANTE A 3 DÍA	M3	20234457	597000	5,00	2.985.000,00
CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA 3500 PSI CON ACELERANTE A 3 DÍA	M3	20234457	597000	6,50	3.880.500,00

➢ **CONTRATO 20234397 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN; HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR; ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y MATERIALES DE SEGURIDAD VIAL.**

Concepto	Unidad de Medi	Contrato	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
Antisol blanco	KG	20234397	11400	60,00	684.000,00
Sellasil soporte cordon respaldo	ML	20234397	1200	146,00	175.200,00
Acero 3/8" corrugado	KG	20234397	6800	272,00	1.849.600,00
ALMADANA 20 LBS	UND	20234397	203000	2,00	406.000,00
CODALES DE 3 CM * 8 CM * 6 MTS	UND	20234397	29000	4,00	116.000,00
PLASTICO NEGRO	ML	20234397	1000	144,00	144.000,00
BARRERA VIAL O MALETIN PLASTICO 2m largo x 1m alto	UND	20234397	690000	4,00	2.760.000,00
COLOMBINA VIAL PLASTICA REFLECTIVA	UND	20234397	45000	10,00	450.000,00
Alambre de amarre	KG	20234397	8900	14,00	124.600,00
Disco de corte diamantado 18" mixto	UND	20234397	500000	16,00	8.000.000,00
Masilla carburante 6mm	GAL	20234397	280700	5,00	1.403.500,00
BARRAS DE 18"	UND	20234397	107000	4,00	428.000,00
CINCEL DE 3/4 X 8"	UND	20234397	8000	4,00	32.000,00
FLEXOMETRO DE 5 M	UND	20234397	22000	4,00	88.000,00
DECAMETRO DE 30MTS	UND	20234397	93000	2,00	186.000,00
CIMBRA	UND	20234397	9000	3,00	27.000,00
PALA CUADRADA # 4	UND	20234397	48000	8,00	384.000,00
PALINES	UND	20234397	31000	8,00	248.000,00
ANILINA	UND	20234397	44000	3,00	132.000,00
LLANA METÁLICA DENTADA	UND	20234397	30000	6,00	180.000,00
LLANA DE MADERA	UND	20234397	12000	4,00	48.000,00
EXTENSION 30 MTS 3X 12	UND	20234397	316000	4,00	1.264.000,00
PERFIL METALICO 4 CM X10 CM X 6 MTS LARGO	UND	20234397	109000	3,00	327.000,00
CASCO TIPO SAFARI COLOR AMARILLO	UND	20234397	48000	20,00	960.000,00
OVEROL TIPO PILOTO COLOR VERDE OLIVA	UND	20234397	120000	34,00	4.080.000,00
BOTAS PUNTA DE ACERO	UND	20234397	119000	34,00	4.046.000,00
CHALECO REFLETIVO	UND	20234397	39000	10,00	390.000,00
KIT DE SEÑALIZACION (CONO, PALETAS)	UND	20234397	203000	3,00	609.000,00
GAFAS DE PROTECCION	UND	20234397	13000	34,00	442.000,00
TORRE DE ILUMINAICON PORTATIL	UND	20234397	5321950	2,00	10.643.900,00
TAPAOIDOS	UND	20234397	7000	34,00	238.000,00

➢ **ORDEN DE COMPRA 119015 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL BANCO DE MAQUINARIA, VEHICULOS DE CARGA Y OTROS PERTENECIENTES AL EJERCITO NACIONAL.**

Retornar

Vehicul	Semana	DIA	MES	AÑO	Salida o Ingreso	Saldo	Vlr Transacción
Ingreso ACPM	5	31	1	2024	Ingreso	78,324	$ 759.194,53
Ingreso ACPM	6	8	2	2024	Ingreso	240	$ 2.015.040,00
Ingreso GASOLINA	6	9	2	2024	Ingreso	9	$ 119.844,00
Ingreso ACPM	7	13	2	2024	Ingreso	315,136	$ 2.645.881,86
Ingreso ACPM	8	22	2	2024	Ingreso	240	$ 2.015.040,00
Ingreso GASOLINA	8	23	2	2024	Ingreso	10,004	$ 133.213,26
Ingreso GASOLINA	9	1	3	2024	Ingreso	7	$ 100.692,88
Ingreso GASOLINA	10	5	3	2024	Ingreso	10,041	$ 144.436,75
Ingreso ACPM	11	11	3	2024	Ingreso	235,71	$ 2.125.602,54
Ingreso GASOLINA	11	12	3	2024	Ingreso	11,105	$ 159.742,07
Ingreso ACPM	11	12	3	2024	Ingreso	220	$ 1.983.931,77
Ingreso GASOLINA	11	13	3	2024	Ingreso	9,029	$ 129.397,41
Ingreso ACPM	12	18	3	2024	Ingreso	220	$ 1.977.041,11
Ingreso ACPM	12	19	3	2024	Ingreso	220	$ 1.977.041,11
Ingreso ACPM	12	19	3	2024	Ingreso	11,338	$ 101.889,51
Ingreso ACPM	12	20	3	2024	Ingreso	220	$ 1.977.041,11
Ingreso ACPM	14	3	4	2024	Ingreso	91,274	$ 813.547,73
Ingreso GASOLINA	14	3	4	2024	Ingreso	10,001	$ 142.264,97
Ingreso GASOLINA	15	13	4	2024	Ingreso	10,001	$ 143.327,45
Ingreso ACPM	23	7	6	2024	Ingreso	25	$ 227.817,74
Ingreso GASOLINA	23	7	6	2024	Ingreso	8,831	$ 127.497,99
Ingreso ACPM	23	7	6	2024	Ingreso	180	$ 1.640.287,69
Ingreso ACPM	24	10	6	2024	Ingreso	240	$ 2.187.050,26
Ingreso GASOLINA	35	28	8	2024	Ingreso	8,836	$ 127.570,18
Ingreso ACPM	37	13	9	2024	Ingreso	220	$ 2.105.821,08
Ingreso ACPM	37	14	9	2024	Ingreso	220	$ 2.105.821,08
Ingreso ACPM	38	17	9	2024	Ingreso	220	$ 2.105.821,08

VII. DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL CONVENIO O CONTRATO N°20233707

A la fecha se ha cancelado lo siguiente:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO NO.1:	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y CONCRETOS	**$ 52.940.940**
PAGO NO.2:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN; HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR; ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y MATERIALES DE SEGURIDAD VIAL	**$ 40.865.800**
PAGO NO.3:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE PARTES, REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, Y MANO DE OBRA CALIFICADA DE LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS PERTENECIENTES AL EJÉRCITO NACIONAL	**$ 65.884.600**
PAGO NO.4:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL BANCO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS DE CARGA Y OTROS PERTENECIENTES AL EJÉRCITO NACIONAL	**$ 30.091.504,10**
PAGO NO.5:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	**$ 3.800.000**
PAGO NO.6:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	**$ 5.000.000**
PAGO NO.7:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	**$ 7.600.000**
PAGO NO.8:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	**$ 2.500.000**
PAGO NO.9:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	**$ 5.000.000**
PAGO NO.10:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	**$ 15.000.000**
PAGO NO.11:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	**$ 10.000.000**
TOTAL		**$ 238.682.844,10**

BICON52

VIII. BALANCE CONTRACTUAL FINAL

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA
ALCALDÍA DE PASTO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL - No. 20233707

BALANCE PRESUPUESTAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	No. CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	VALOR PLANEADO CONVENIO	VALOR ADJUDICADO	SALDO (DIFERENCIA PLANEADO - ADJUDICADO)	VALOR SUMINISTRADO
1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	20234457	- PANAVIAS ING Y CONSTRUCCIONES S.A.	6-dic-23	29-nov-24	780.372.722,61	639.236.900,00	141.135.822,61	52.940.940,00
		20234397	AB & AR SAS	4-dic-23	29-nov-24				12.236.900,00
2	ALQUILER DE FORMALETA					4.578.350,00	-	4.578.350,00	-
3	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	20234397	AB & AR SAS	4-dic-23	29-nov-24	59.230.000,00	46.351.700,00	12.878.300,00	14.653.900,00
4	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR	119015	Organización Terpel S.A.	4-dic-23	29-nov-24	99.337.200,00	94.328.500,00	5.008.700,00	30.091.504,10
5	GRASAS Y LUBRICANTES	20234424	MARÍA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO	4-dic-23	29-nov-24	44.666.800,00	43.842.800,00	824.000,00	30.361.800,00
6	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA EJERCITO	20234424	MARÍA ALEJANDRA BARRERA ZAMBRANO	4-dic-23	29-nov-24	115.924.500,00	115.137.200,00	787.300,00	35.522.800,00
7	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	20234397	AB & AR SAS	4-dic-23	29-nov-24	23.385.000,00	29.523.400,00	- 6.138.400,00	10.156.000,00
8	PAGO ESCOMBRERA DISPOSICIÓN FINAL					9.935.000,00	-	9.935.000,00	-
9	MATERIALES SEGURIDAD VIAL	20234397	AB & AR SAS	4-dic-23	29-nov-24	37.533.000,00	9.388.000,00	28.145.000,00	3.819.000,00
10	PAPELERIA Y EQUIPO					3.620.000,00	-	3.620.000,00	-
11	CONTRATACIÓN APOYO TECNICO MAESTRO Y MECANICO	20240584 20240642 20241848	RIGOBERTO LEON REALPA MARIO FERNANDO CUCHALA JOJOA RIGOBERTO LEON REALPA	19-ene-24 19-ene-24 22-mar-24	28-feb24 28-feb-24 31-oct-24	14.400.000,00	16.400.000,00	- 2.000.000,00	16.400.000,00
12	PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	20234648 20240582 20241181 20241966	ANGELA GABRIELA ENRIQUEZ ARROYO JORGE ALEXANDER DIAZ VARGAS JOSE IGNACIO MIRANDA VALLEJO JORGE ALEXANDER DIAZ VARGA	1-dic-23 19-ene-24 23-feb-24 22-mar-24	31-dic-23 28-feb-24 31-jul-24 30-jun-24	36.000.000,00	32.500.000,00	3.500.000,00	32.500.000,00
	TOTAL PLAN DE COMPRAS					**1.228.982.572,61**	**1.026.708.500,00**	**202.274.072,61**	**238.682.844,10**
	COSTO DIRECTO					1.228.982.572,61	1.026.708.500,00	202.274.072,61	238.682.844,10
	PAGO SECRETARÍA DE TRÁNSITO PMT					3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
	IMPUESTOS Y RETENCIONES CONVENIO					71.576.000,00	-	71.576.000,00	-
	COSTO BASICO					**1.304.058.572,61**	**1.026.708.500,00**	**277.350.072,61**	**238.682.844,10**
	DEMERITO Y DESGASTE 15%					184.347.385,89	154.006.275,00	30.341.110,89	35.802.426,62
	ADMINISTRACIÓN 2.5%					30.724.564,32	25.667.712,50	5.056.851,82	5.967.071,10
	IMPREVISTOS 3%					36.869.477,18		36.869.477,18	
	TOTAL PRESUPUESTO					**1.556.000.000,00**	**1.206.382.487,50**	**349.617.512,50**	**280.452.341,82**

Ing JOHN AYRON GUEVARA SOLARTE
Profesional Universitario Infraestructura

Ing. WILBER [illegible] MARTILLO ARTEAGA
Subsecretario de Infraestructura Urbana

Ing. JORGE ALEXANDER DIAZ VARGAS
Contratista SIVM

IX. INFORMACIÓN TECNICA

De acuerdo al Acta de Entrega del Convenio N°20233707 Pasto Nariño se presenta un avance contractual del **23,24 %** de ejecución, Así:

- **A EJECUTAR:** En la zona urbana 445.7 m pavimento rígido y 633 m de pavimento flexible para un total de 1078.7 Mts, en la zona rural 77,800 Mts mantenimiento básico de la capa existente mediante escarificación y conformación de estructura.

- **EJECUTADO:** En la zona rural, sector granja UDENAR se realizó el mejoramiento de 14,500 Mts, en el centro poblado CATAMBUCO 6.000 Mts y en el centro poblado DAZA 8.900 Mts para un total de 29,400 Mts en mejoramiento de la existente. En la zona urbana se realizaron 3 intervenciones las cuales fueron en la calle 17 con carrera 24 en donde el primer punto se intervino un aérea de 38,70 Mts2 en concreto asfaltico, en el segundo punto en la carrera 22 entre calle 17 y 18 se Intervino un área de 35,22 Mts2 en concreto asfaltico y en el tercer punto en la carrera 12 N° 16-17 se intervino un aérea 228 Mts2 para un total de intervención en la zona urbana de 301,92 Mts2.

- **% EJECUTADO** = 23,24 %
- **VR. A EJECUTAR** = De acuerdo con el alcance del Convenio
- **VR. EJECUTADO =** $ 238.682.844,10

X. ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRAS

Se proyecta el **ACTA DE ENTREGA DE OBRA FINAL** avalada entre los supervisores del convenio de la alcaldía de Pasto Nariño y de Ejercito Nacional (EJC) en donde se especifica (03) intervenciones en la zona urbana y (03) intervenciones en la zona rural, obras que fueron ejecutadas dentro del alcance del convenio interadministrativo N°20233707.

BICON52

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL COMANDO DE INGENIEROS	ACTA DE ENTREGA DE OBRAS PROYECTOS DE CONSOLIDACIÓN	Pág. 1 de 24 Código: FO-COING-568 Versión: 3 Fecha de emisión: 2020-12-15

BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIÓN No. 52
"GENERAL FRANCISCO TAMAYO CORTES"

Acta No. 2024544014302346/
No. Folios 24/

Lugar y fecha: Pasto, Nariño, 20 de noviembre 2024

INTERVIENEN:
Mayor CEPEDA SANCHEZ DIEGO
Ejecutivo y Segundo Comandante de Batallón de Ingenieros de Construcciones No 52 "General Francisco Tamayo Cortes"
Supervisor del Convenio 20233707 Ejercito

Cabo Primero CHAVARRO VEGA CARLOS ALBERTO
Residente de obra Convenio 20233707

Ingeniera JESIKA JERALDIN CEBALLOS
Supervisora del Convenio 20233707
Secretaria de Infraestructura Alcaldía de Pasto


Ingeniero WILBER MORILLO ARTEAGA
Subsecretario Infraestructura Urbana Alcaldía de Pasto

ASUNTO: **ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LAS OBRAS "CALLE 17 CARRERA 24, DIAGONAL TEMPLO SAN AGUSTIN, CARRERA 22 ENTRE CALLES 17 Y 18, CARRERA 12 ENTRE CALLE 16 Y 17, CENTRO POBLADO CATAMBUCO DEL KM 00+000 AL KM 06+000, GRANJA UDENAR KM 00+000 AL KM 14+500, DAZA DEL KM 00+00 AL KM 08+300**, QUE HACE EL BATALLON DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES NO. 52 "GR. FRANCISCO TAMAYO CORTES" AL MUNICIPIO DE PASTO – NARIÑO, POR INTERMEDIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE PASTO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO VINCULADO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 20233707 DE EL MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - COMANDO DE INGENIEROS - BRIGADA DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES - BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 52. A TRAVÉS DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS.

TIPO DE ACTA: TOTAL_____ PARCIAL_____X_____

PATRIA HONOR LEALTAD
Vereda Jamondino – Nariño,
bicon52@buzonejercito.mil.co- (50085) 3057341637

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL COMANDO DE INGENIEROS	ACTA DE ENTREGA DE OBRA PROYECTOS DE CONSOLIDACIÓN	Pág. 16 de 24 Código: FO-COING-568 Versión: 3 Fecha de emisión: 2020-12-15

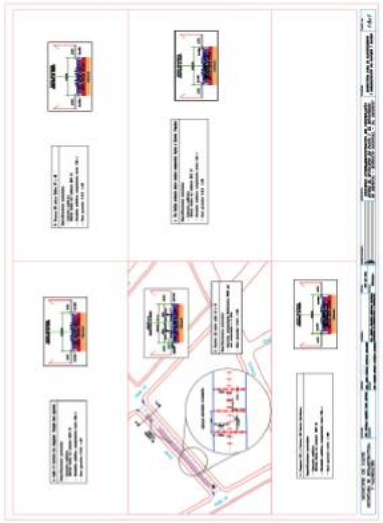

PATRIA HONOR LEALTAD
Vereda Jamondino – Nariño,
bicon52@buzonejercito.mil.co- (50085) 3057341637

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL COMANDO DE INGENIEROS	ACTA DE ENTREGA DE OBRA PROYECTOS DE CONSOLIDACIÓN	Pág. 21 de 24 Código: FO-COING-568 Versión: 3 Fecha de emisión: 2020-12-15







PATRIA HONOR LEALTAD
Vereda Jamondino – Nariño,
bicon52@buzonejercito.mil.co- (50085) 3057341637

BIC

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LAS OBRAS "CALLE 17 CARRERA 24, DIAGONAL TEMPLO SAN AGUSTIN, CARRERA 23 ENTRE CALLES 17 Y 18, CARRERA 22 ENTRE CALLE 16 Y 17, CENTRO POBLADO CATAMBUCO DEL K M 00+000 AL K00 05+000, GRANJA LOBANA K00 05+000 AL K00 14+300, DAZA DEL K00 00+00 AL K00 08+900, QUE HACE EL BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES NO. 52 "GR. FRANCISCO TAMAYO CORTES" AL MUNICIPIO DE PASTO – NARIÑO, POR INTERMEDIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE PASTO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO VINCULADO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 20233707 DE EL MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - COMANDO DE INGENIEROS - BRIGADA DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES - BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 52 A TRAVES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS


Registro Fotográfico:





ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LAS OBRAS "CALLE 17 CARRERA 24, DIAGONAL TEMPLO SAN AGUSTIN, CARRERA 23 ENTRE CALLES 17 Y 18, CARRERA 22 ENTRE CALLE 16 Y 17, CENTRO POBLADO CATAMBUCO DEL K M 00+000 AL K00 05+000, GRANJA LOBANA K00 05+000 AL K00 14+300, DAZA DEL K00 00+00 AL K00 08+900, QUE HACE EL BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES NO. 52 "GR. FRANCISCO TAMAYO CORTES" AL MUNICIPIO DE PASTO – NARIÑO, POR INTERMEDIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE PASTO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO VINCULADO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 20233707 DE EL MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - COMANDO DE INGENIEROS - BRIGADA DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES - BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 52 A TRAVES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS





ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LAS OBRAS "CALLE 17 CARRERA 24, DIAGONAL TEMPLO SAN AGUSTIN, CARRERA 23 ENTRE CALLES 17 Y 18, CARRERA 22 ENTRE CALLE 16 Y 17, CENTRO POBLADO CATAMBUCO DEL K M 00+000 AL K00 05+000, GRANJA LOBANA K00 05+000 AL K00 14+300, DAZA DEL K00 00+00 AL K00 08+900, QUE HACE EL BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES NO. 52 "GR. FRANCISCO TAMAYO CORTES" AL MUNICIPIO DE PASTO – NARIÑO, POR INTERMEDIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE PASTO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO VINCULADO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 20233707 DE EL MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - COMANDO DE INGENIEROS - BRIGADA DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES - BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 52 A TRAVES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS





ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LAS OBRAS "CALLE 17 CARRERA 24, DIAGONAL TEMPLO SAN AGUSTIN, CARRERA 23 ENTRE CALLES 17 Y 18, CARRERA 22 ENTRE CALLE 16 Y 17, CENTRO POBLADO CATAMBUCO DEL K M 00+000 AL K00 05+000, GRANJA LOBANA K00 05+000 AL K00 14+300, DAZA DEL K00 00+00 AL K00 08+900, QUE HACE EL BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES NO. 52 "GR. FRANCISCO TAMAYO CORTES" AL MUNICIPIO DE PASTO – NARIÑO, POR INTERMEDIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE PASTO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO VINCULADO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 20233707 DE EL MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - COMANDO DE INGENIEROS - BRIGADA DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES - BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 52 A TRAVES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS






ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LAS OBRAS "CALLE 17 CARRERA 24, DIAGONAL TEMPLO SAN AGUSTIN, CARRERA 23 ENTRE CALLES 17 Y 18, CARRERA 22 ENTRE CALLE 16 Y 17, CENTRO POBLADO CATAMBUCO DEL K M 00+000 AL K00 05+000, GRANJA LOBANA K00 05+000 AL K00 14+300, DAZA DEL K00 00+00 AL K00 08+900, QUE HACE EL BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES NO. 52 "GR. FRANCISCO TAMAYO CORTES" AL MUNICIPIO DE PASTO – NARIÑO, POR INTERMEDIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE PASTO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO VINCULADO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 20233707 DE EL MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - COMANDO DE INGENIEROS - BRIGADA DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES - BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 52 A TRAVES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS





No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada y en constancia se firma por los que en ella intervienen a los 20 días del mes de noviembre de 2024

Cabo Primero CHAVARRO VEGA CARLOS ALBERTO
Residente de obra Convenio 20233707

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LAS OBRAS "CALLE 17 CARRERA 24, DIAGONAL TEMPLO SAN AGUSTIN, CARRERA 23 ENTRE CALLES 17 Y 18, CARRERA 22 ENTRE CALLE 16 Y 17, CENTRO POBLADO CATAMBUCO DEL K M 00+000 AL K00 05+000, GRANJA LOBANA K00 05+000 AL K00 14+300, DAZA DEL K00 00+00 AL K00 08+900, QUE HACE EL BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES NO. 52 "GR. FRANCISCO TAMAYO CORTES" AL MUNICIPIO DE PASTO – NARIÑO, POR INTERMEDIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE PASTO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO VINCULADO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 20233707 DE EL MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - COMANDO DE INGENIEROS - BRIGADA DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES - BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES No. 52 A TRAVES DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS


Mayor YEPEDA SANCHEZ DIEGO
Ejecutivo y Segundo Comandante de Batallón de Ingenieros de Construcciones No 52 "General Francisco Tamayo Cortes"
Supervisor del Convenio 20233707 Ejercito

Ingeniera JESIKA JERALDIN CEBALLOS
Supervisora del Convenio 20233707
Secretaria de Infraestructura Alcaldía de Pasto

Ingeniero WILBER MORILLO ARTEAGA
Subsecretario Infraestructura Urbana Alcaldía de Pasto

XI PROGRAMACION DE OBRA FINAL

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
1		CONVENIO PASTO - NARIÑO N°20233707				214 días	lun 29/01/24	vie 29/11/24		24%
2		LOCALIZACION Y REPLANTEO				2 días	lun 29/01/24	mié 31/01/24		100%
3		URBANA				2 días	lun 29/01/24	mié 31/01/24		100%
4		Reconocimiento del SECTOR URBANO	M	1078	1078	2 días	lun 29/01/24	mié 31/01/24		100%
5		RURAL				2 días	lun 29/01/24	mié 31/01/24		100%
6		Reconocimiento del SECTOR RURAL	M	77800	77800	2 días	lun 29/01/24	mié 31/01/24		100%
7		FIN LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				0 días	mié 31/01/24	mié 31/01/24	6	100%
8		INTERVENCION VIAS URBANAS				199,83 días	jue 8/02/24	mié 20/11/24		18%
9		Calle 17 con carrera 24				17 días	lun 12/02/24	mié 6/03/24		100%
10		Corte pavimento	M	37,6	37,6	3 días	lun 12/02/24	jue 15/02/24		100%
11		Demolición pavimento	M2	9,3	9,3	4,25 días	jue 15/02/24	mié 21/02/24	10	100%
12		Excavaciones manuales	M2	9,3	9,3	3,13 días	mié 21/02/24	lun 26/02/24	11	100%
13		Base granular para parcheo	M3	19	19	1,75 días	lun 26/02/24	mié 28/02/24	12	100%
14		Imprimacion asfaltica CRL-1	GAL	25	25	2,25 días	mié 28/02/24	sáb 2/03/24	13	100%
15		Instalación carpeta asfáltica MDC19	M3	12	12	2,63 días	sáb 2/03/24	mié 6/03/24	14	100%
16		Carrera 22 entre calles 17 y 18				8,13 días	jue 8/02/24	mar 20/02/24		100%
17		Corte pavimento	M	35,2	35,2	2 días	jue 8/02/24	sáb 10/02/24		100%
18		Demolición pavimento	M2	16,5	16,5	2 días	sáb 10/02/24	mar 13/02/24	17	100%
19		Excavaciones manuales	M2	16,5	16,5	2 días	mié 14/02/24	vie 16/02/24	18	100%
20		Base granular para parcheo	M3	17	17	3 días	mié 14/02/24	sáb 17/02/24	18	100%
21		Imprimacion asfaltica CRL-1	GAL	25	25	1 día	lun 19/02/24	mar 20/02/24	20	100%
22		Instalación carpeta asfáltica MDC19	M3	12	12	1 día	lun 19/02/24	mar 20/02/24	19	100%
23		Carrera 12 calle 16 - 17 fatima				10,88 días	vie 8/03/24	sáb 23/03/24		100%
24		Corte pavimento	M2	597	597	2 días	vie 8/03/24	lun 11/03/24		100%
25		Demolición pavimento	M3	597	597	2 días	lun 11/03/24	mié 13/03/24	24	100%
26		Excavaciones manuales	M3	56,2	56,2	2 días	jue 14/03/24	sáb 16/03/24	25	100%
27		Base granular para parcheo	M3	58	58	3 días	sáb 16/03/24	jue 21/03/24	26	100%
28		Fundicion de concreto rigido	M3	12	12	2 días	jue 21/03/24	sáb 23/03/24	26	100%
29		Carrera 13 calle 11 - 12 fatima				1 día	vie 29/03/24	sáb 30/03/24		0%
35		Calle 18 A # 12 -43 fatima				2,5 días	sáb 30/03/24	mié 3/04/24		0%
41		Calle 21 29-04 Las Cuadras				3 días	mié 3/04/24	lun 8/04/24		0%
48		Calle 21 entre 27 y 28				3 días	lun 8/04/24	jue 11/04/24		0%

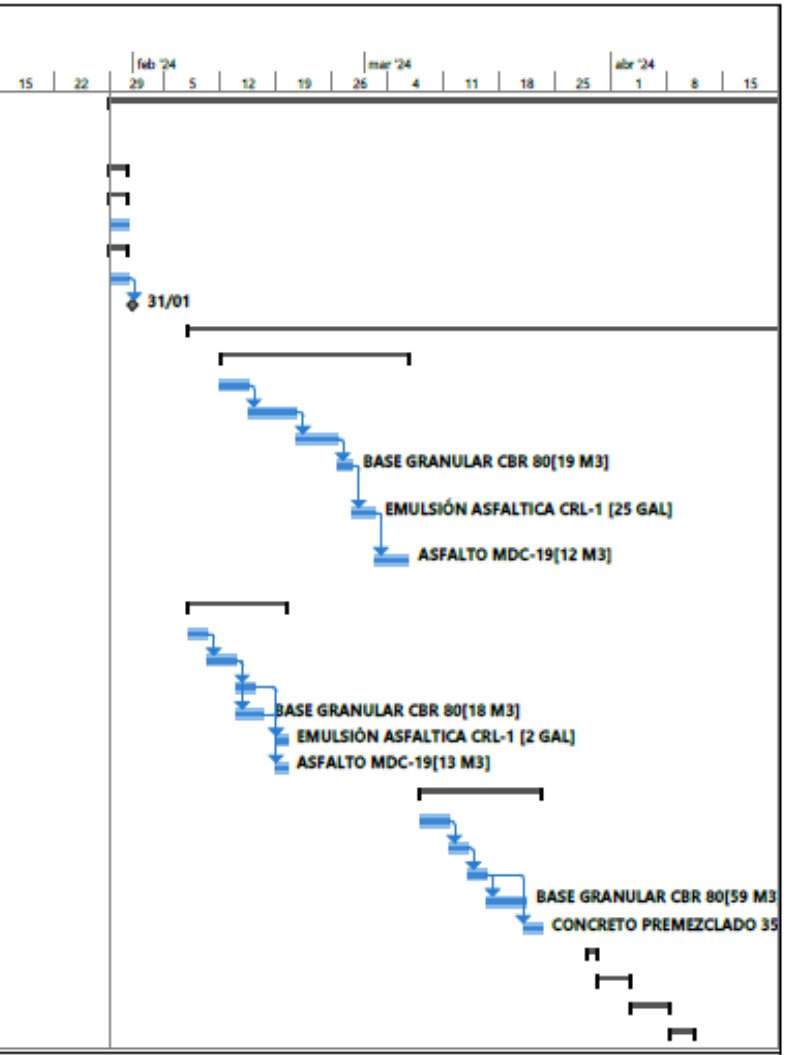


Proyecto: 2024_APROBADA_CO
Fecha: mié 20/08/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Página 1


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	UNIDAD DE MEDID	CANTID	CANTID EJECUT	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	% completac
55		Intersección carrera 27 con calle 21				3 días	jue 11/04/24	mar 16/04/24		0%
62		Carrera 26 entre calles 20 y 21				2,5 días	mar 16/04/24	vie 19/04/24		0%
68		Carrera 26 entre calles 18 y 19				5 días	vie 19/04/24	vie 26/04/24		0%
74		Intersección carrera 26 con calle 18				6 días	vie 26/04/24	lun 6/05/24		0%
81		Carrera 24 con calle 17				2,5 días	lun 6/05/24	jue 9/05/24		0%
87		Calle 18 con carrera 22 esquina				3 días	jue 9/05/24	lun 13/05/24		0%
93		Calle 19 entre 218 y 22				3 días	mar 14/05/24	vie 17/05/24		0%
100		Calle 17 con carrera 22 (La Merced)				3 días	vie 17/05/24	mié 22/05/24		0%
107		Calle 17 con cra 22				5 días	mié 22/05/24	mié 29/05/24		0%
113		Carrera 22 entre calles 15 y 16				6 días	mié 29/05/24	jue 6/06/24		0%
120		Calle 13 entre 23 y 24				3 días	jue 6/06/24	mar 11/06/24		0%
127		Carrera 23 entre calles 12 y 13				3 días	mar 11/06/24	vie 14/06/24		0%
134		Carrera 23 entre calle 10 y 11				48,63 días	sáb 15/06/24	vie 23/08/24		0%
140		Calle 10 entre carreras 32 y 30				3 días	vie 23/08/24	mié 28/08/24		0%
147		Calle 11 con carrera 32 Sn Ignacio				15 días	mié 28/08/24	jue 19/09/24		0%
154		Calle 14 26-72 centro				7 días	jue 19/09/24	sáb 28/09/24		0%
161		Calle 15 26-91				6 días	lun 30/09/24	mar 8/10/24		0%
168		Calle 14 Unad Bombona				6,5 días	mar 8/10/24	jue 17/10/24		0%
175		Calle 14 30a 55				6,5 días	jue 17/10/24	vie 25/10/24		0%
181		Calle 14 entre carreras 30 A y 31				8,5 días	sáb 26/10/24	jue 7/11/24		0%
187		Carrera 34 con calle 14				6 días	jue 7/11/24	vie 15/11/24		0%
193		Calle 14 Proinsalud				2,2 días	vie 15/11/24	mar 19/11/24		0%
199		Calle 14 Proinsalud				0,6 días	mar 19/11/24	mié 20/11/24		0%
205		Calle 14 34-52				0,4 días	mié 20/11/24	mié 20/11/24		0%
211		Calle 14 entre carreras 34 y pana				1 día	vie 1/11/24	sáb 2/11/24		0%
218		Calle 14 entre carreras 34 y pana				1,5 días	mié 12/06/24	jue 13/06/24		0%
225		Calle 14 entre cra 35 y panamericana				1,5 días	jue 13/06/24	sáb 15/06/24		0%
231		Calle 21 entre carreras 33 y 34				1,5 días	lun 17/06/24	mar 18/06/24		0%
238		Carrera 32 21-12 Hosp infantil				1 día	mar 18/06/24	mié 19/06/24		0%
245		Calle 21 A entre carreras 41 y 42				1,5 días	mié 19/06/24	vie 21/06/24		0%
252		Calle 22 41a y 43 Morasurco				2,5 días	vie 21/06/24	mar 25/06/24		0%
258		Calle 22 43a y 43b Morasurco				2,5 días	mar 25/06/24	vie 28/06/24		0%
264		Carrera 42 A entre calles 17 B y 11 El dorado				1,5 días	vie 28/06/24	lun 1/07/24		0%
271		Calle 17 entre 40 y 40A El Dorado				1 día	lun 1/07/24	mar 2/07/24		0%
278		Calle 16 40-24				1 día	mié 3/07/24	jue 4/07/24		0%

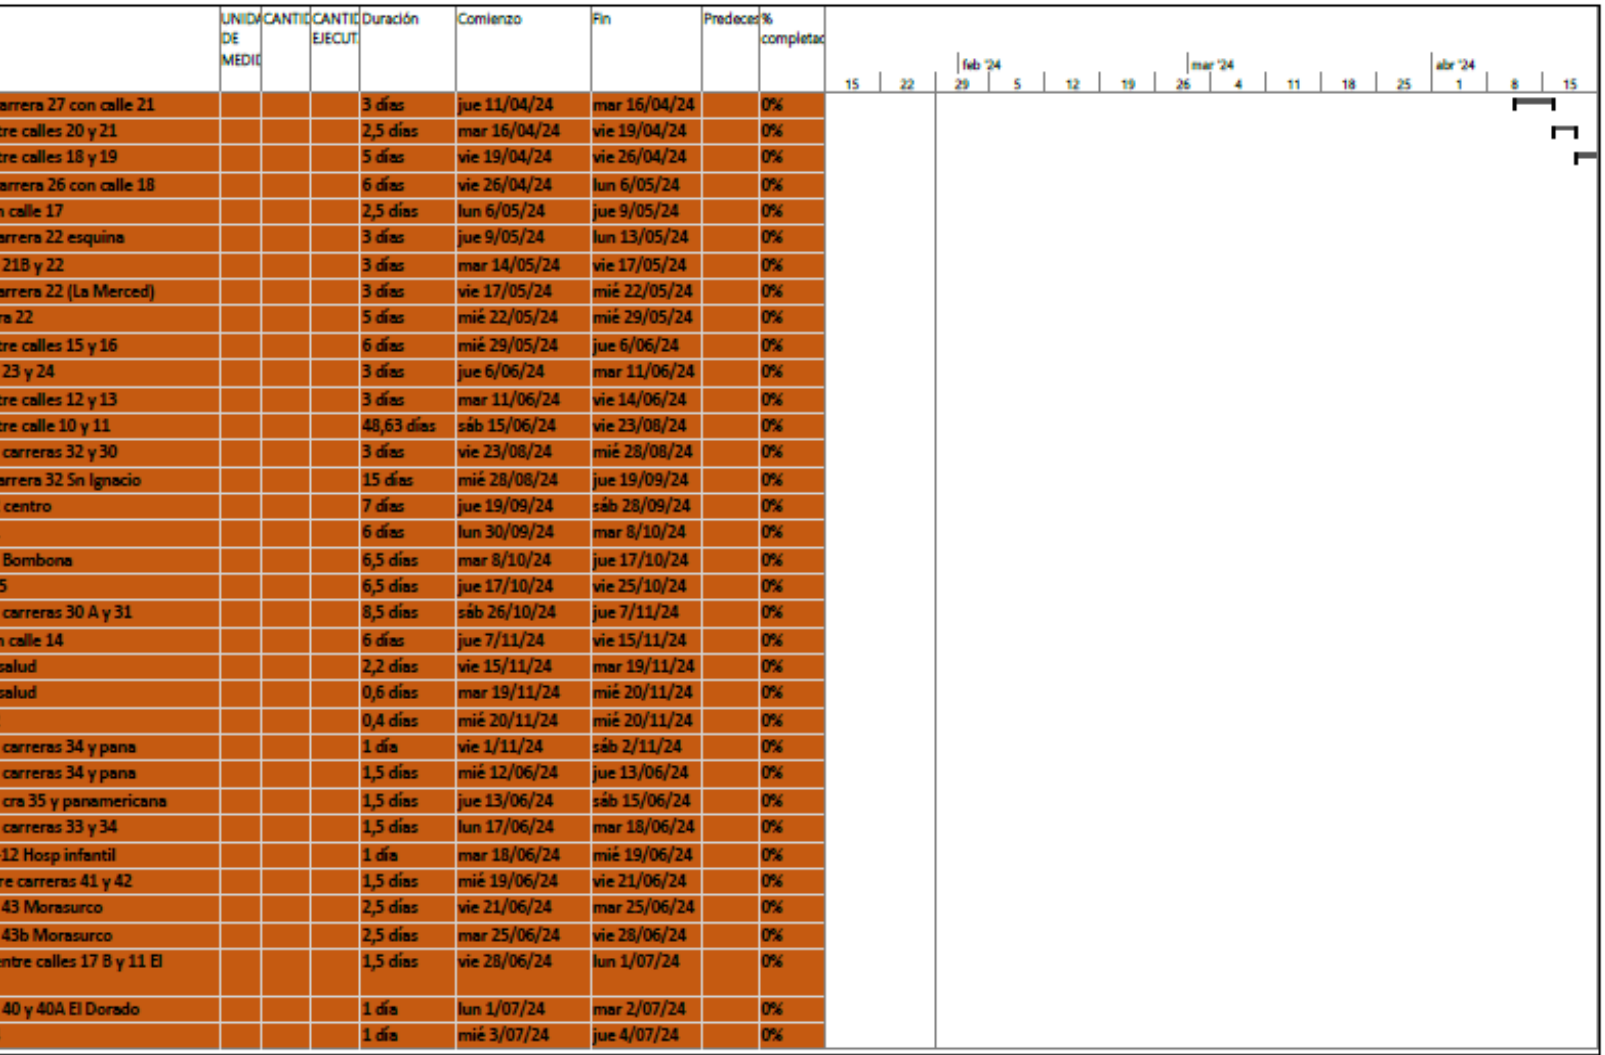


Proyecto: 2024_APROBADA_CO
Fecha: mié 20/08/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	UNIDAD DE MEDIC	CANTID	CANTID EJECUT	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	% completac
285		Calle 16 con 41				1 día	jue 4/07/24	vie 5/07/24		0%
292		Calle 16 42 b 04				1 día	vie 5/07/24	sáb 6/07/24		0%
299		Glorieta frente Hospital San Pedro				1 día	sáb 6/07/24	lun 8/07/24		0%
306		Vía frente Hospital San Rafael				0,6 días	mar 9/07/24	mar 9/07/24		0%
312		Carrera 40 entre calles 12 A y 12 Mariluz				1,5 días	mar 9/07/24	jue 11/07/24		0%
318		Calle 7 entre carreras 36 y 37				1,5 días	jue 11/07/24	sáb 13/07/24		0%
324		Calle 7 entre carreras 37 y 38 Sn Vicente				1,5 días	sáb 13/07/24	mar 16/07/24		0%
330		Carrera 36 entre calles 7 y 8 Sn Vicente				1,5 días	mar 16/07/24	mié 17/07/24		0%
336		Carrera 36 esquina Mna G Panorámico				1 día	mié 17/07/24	vie 19/07/24		0%
343		Carrera 35 entre calles 5 y 6				1,5 días	vie 19/07/24	lun 22/07/24		0%
349		Carrera 35 entre calles 5 y 6				1,5 días	lun 22/07/24	mar 23/07/24		0%
355		Calle 5 entre carreras 33 y 34				2,5 días	mar 23/07/24	vie 26/07/24		0%
361		Calle 5 con cra 37 y 39 Sn Vicente				2,5 días	vie 26/07/24	mié 31/07/24		0%
367		Cruce panamericana con x 27				1,5 días	mié 31/07/24	jue 1/08/24		0%
374		Cruce panamericana con x 27				2,5 días	jue 1/08/24	mar 6/08/24		0%
381		Cruce panamericana con x 27				2,5 días	mar 6/08/24	jue 8/08/24		0%
388		Cruce panamericana con x 27				2,5 días	jue 8/08/24	mar 13/08/24		0%
395		Carrera 23 A entre calles 2 y 3				2,5 días	mar 13/08/24	vie 16/08/24		0%
402		Calle 4 con carreras 22 F esquina				1 día	vie 16/08/24	sáb 17/08/24		0%
409		Carrera 22 E entre calles 2 y 4				2,5 días	sáb 17/08/24	mié 21/08/24		0%
416		Panamericana entre 27 y 22 b				1 día	mié 21/08/24	jue 22/08/24		0%
423		Cruce Exito panamericana con x 22b				2,5 días	jue 22/08/24	lun 26/08/24		0%
430		Cruce Exito panamericana con x 22b				6,75 días	lun 26/08/24	mié 4/09/24		0%
437		Cruce Exito panamericana con x 22b				1 día	mié 4/09/24	jue 5/09/24		0%
444		Cruce Exito panamericana con x 22b				1,5 días	jue 5/09/24	sáb 7/09/24		0%
451		Clle 12 enrtre CR 9 CR 10 Estadio				1,1 días	sáb 7/09/24	lun 9/09/24		0%
458		Calle 18 con carrera 14				1,1 días	lun 9/09/24	mié 11/09/24		0%
465		Carrera 16 calle 18 - 18 centro				1,5 días	mié 11/09/24	jue 12/09/24		0%
471		Carrera 16 calle 17 - 16b centro				1,5 días	jue 12/09/24	sáb 14/09/24		0%
477		Carrera 16 calle 17 - 16b centro				1,5 días	sáb 14/09/24	mar 17/09/24		0%
483		Carrera 16 A calle 12 - 11 coliseo				1,5 días	mar 17/09/24	jue 19/09/24		0%
489		Carrera 16 A calle 12 - 11 coliseo				9,25 días	vie 13/09/24	jue 26/09/24		0%
495		Intersección calle 25 con cra 19				1,5 días	jue 26/09/24	sáb 28/09/24		0%
502		Manzana C casa 32 Panorámico				1 día	sáb 28/09/24	lun 30/09/24		0%
509		Manzana E casa 41 Panorámico				1 día	lun 30/09/24	mar 1/10/24		0%
516		Manzana H casa 15 Panorámico				1,5 días	mar 1/10/24	jue 3/10/24		0%

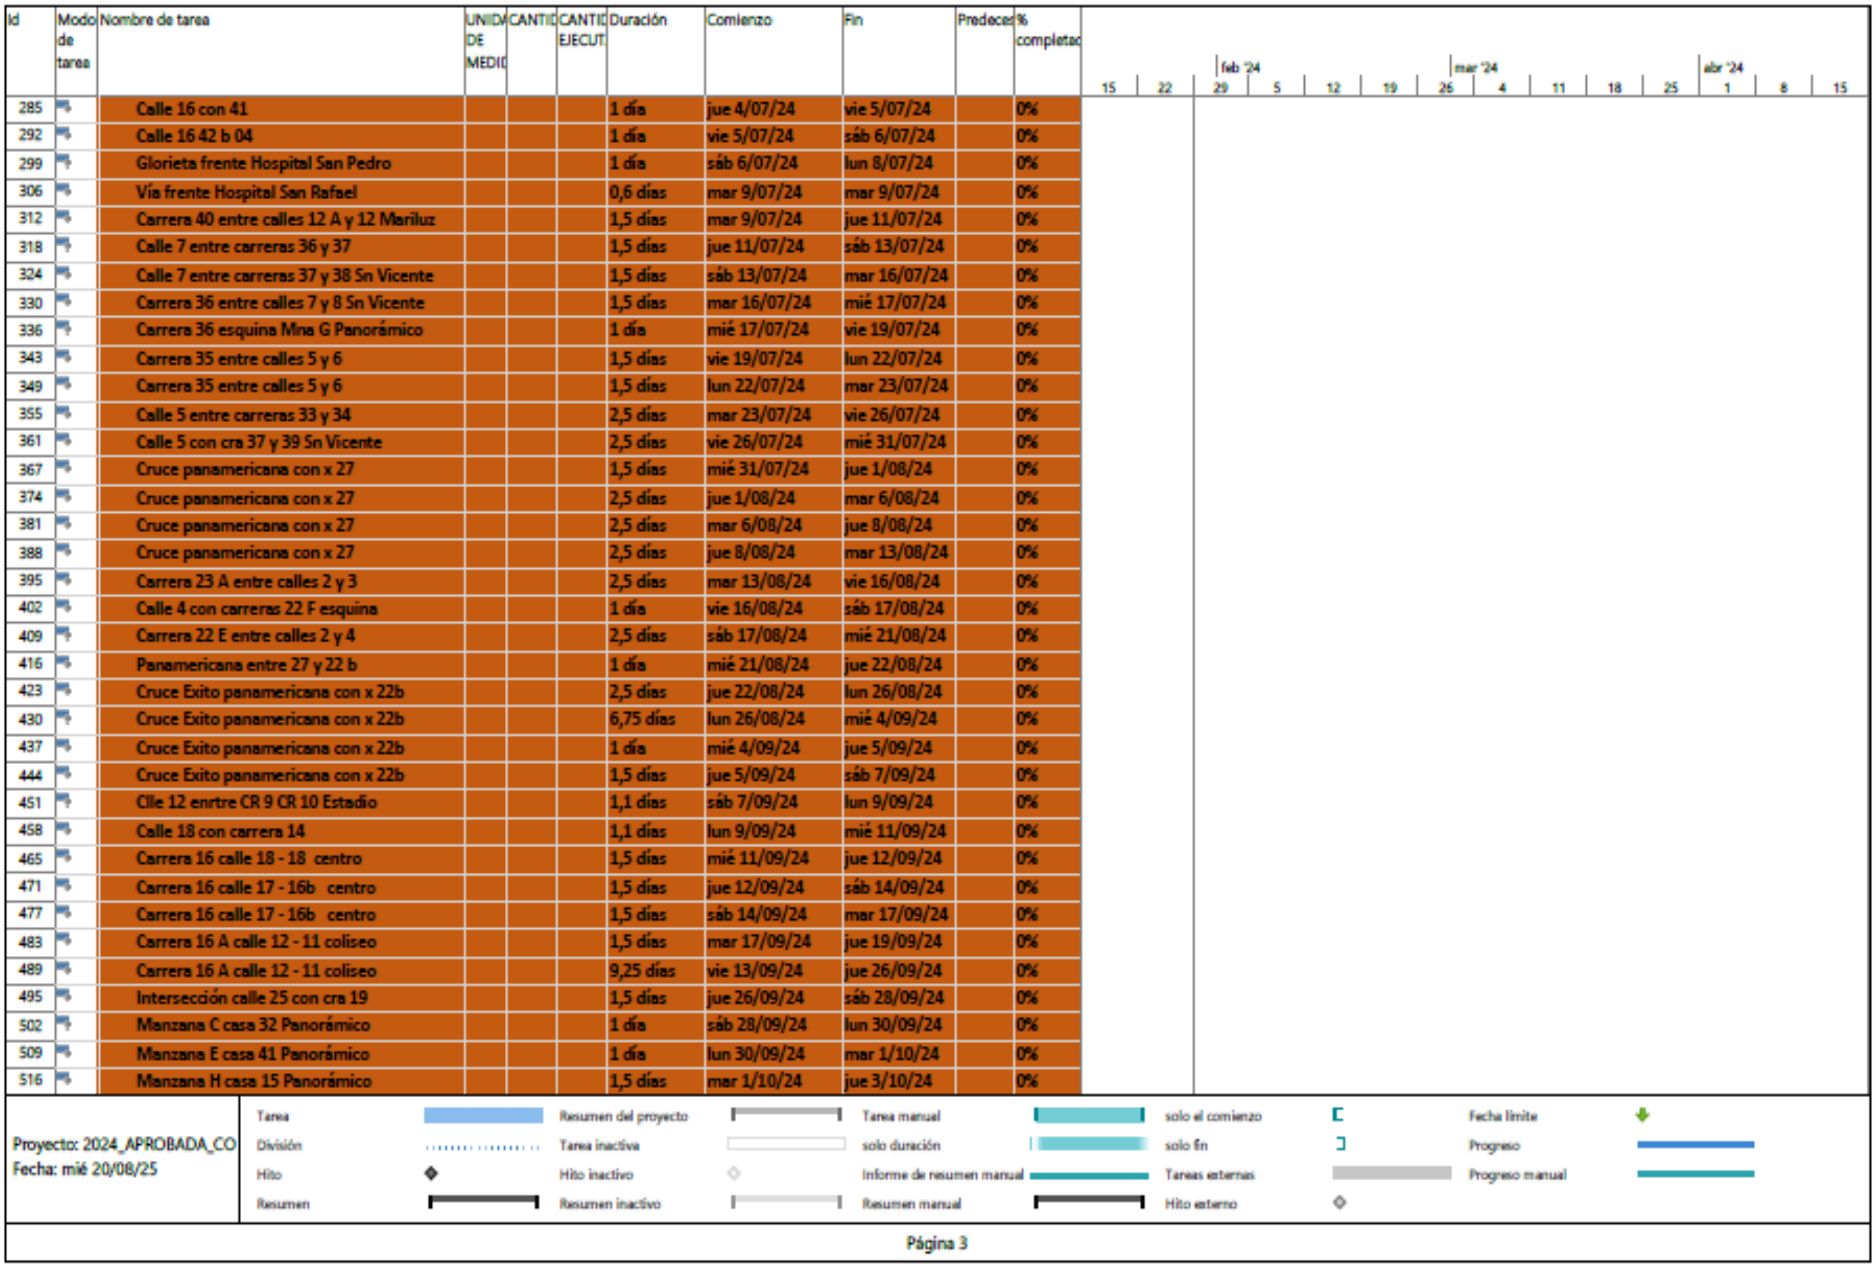

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	UNIDAD DE MEDIC	CANTID	CANTID EJECUT	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	% completac
522		Panorámico manzana F casa 17				28,63 días	jue 3/10/24	mié 13/11/24		0%
529		FIN INTERVENCION VIAS URBANAS				0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24	522	0%
530		INTERVENCION VIAS RURALES				182,13 días	jue 14/03/24	vie 29/11/24		47%
531		Granja UdeNar				14,63 días	jue 14/03/24	mié 3/04/24		100%
532		ESCARIFICACION, EXTENSION, ADECUACION DE CUNETAS Y MEJORAMIENTO DE VIA	M	14500	14500	14 días	jue 14/03/24	mié 3/04/24		100%
533		Centro Poblado Catambuco				9 días	jue 23/05/24	mié 5/06/24		100%
534		ESCARIFICACION, EXTENSION, ADECUACION DE CUNETAS Y MEJORAMIENTO DE VIA	M	6000	6000	9 días	jue 23/05/24	mié 5/06/24		100%
535		Deza				12 días	lun 14/10/24	mié 30/10/24		100%
536		ESCARIFICACION, EXTENSION, ADECUACION DE CUNETAS Y MEJORAMIENTO DE VIA	M	8900	8900	12 días	lun 14/10/24	mié 30/10/24		100%
537		Cujacal				5 días	mié 13/11/24	mié 20/11/24		0%
539		Hospital San Pedro				7 días	lun 11/11/24	mié 20/11/24		0%
541		Anganoy				12 días	mié 13/11/24	vie 29/11/24		0%
543		Jamondino				8 días	sáb 9/11/24	mié 20/11/24		0%
545		IEM Ciudadela				8 días	sáb 9/11/24	mié 20/11/24		0%
547		FIN INTERVENCION VIAS RURALES				0 días	vie 29/11/24	vie 29/11/24	534;53	0%

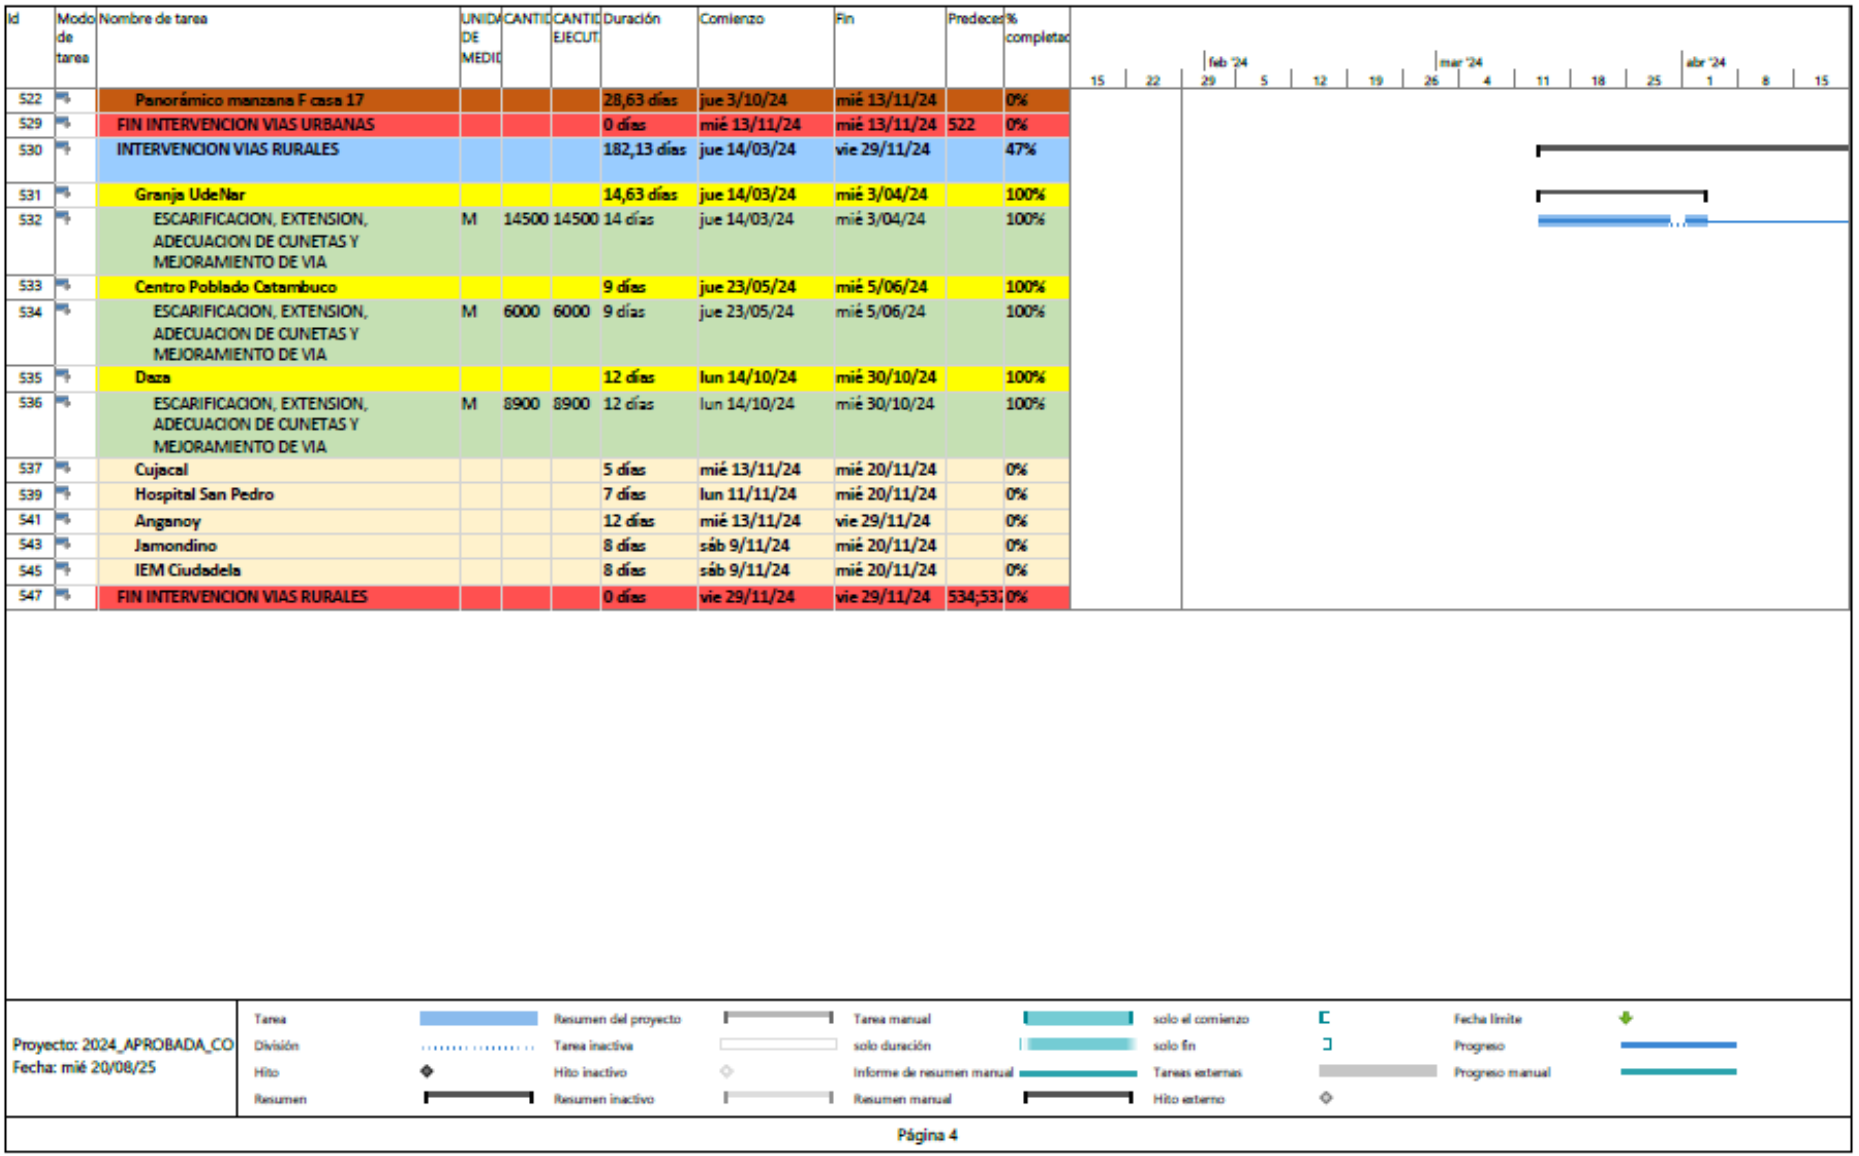

De acuerdo a lo anterior, con relación a la **PROGRAMACION DE OBRA FINAL** se proyecta las obras intervenidas durante la ejecución en la vigencia 2024 el convenio N°20233707 Pasto Nariño.

RESEÑA FOTOGRÁFICA

ZONA RURAL SECTOR GRANJA UDENAR






ZONA URBANA CARRERA 12 N°16 - 17








2 abr 2024 11:30:48 a. m.
1°12'7.134"N -77°16'27.018"W
16-17 Carrera 12
Pasto
Nariño

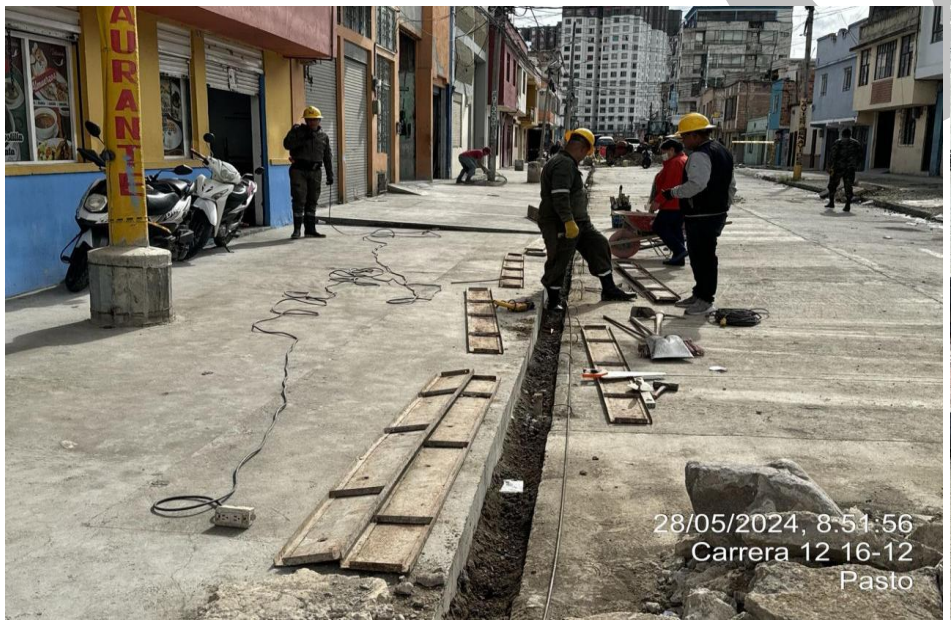
28/05/2024, 8:51:56
Carrera 12 16-12
Pasto


28/05/2024, 10:01:22
Carrera 12 16-8
Pasto


Punto Agricola Valle de Atriz
Todo para el Campo
Chunky
ESCAPES
BELLOTA
29/05/2024, 15:39:47
Carrera 12 16-14
Pasto


REFRI
GALERAS
TRIPLEX
TABLEX
PUERTAS
MADECOR
29/05/2024, 15:39:39
Carrera 12 16-14
Pasto





ZONA RURAL SECTOR CENTRO POBLADO DAZA









ZONA RURAL SECTOR CENTRO POBLADO CATAMBUCO










CASE
430
Series 3




REFRI
LG


San Marcos


CASE
430


BELLOTA


CASE


CASE
SR175

ZONA URBANA CARRERA 22 ENTRE 17 - 18









ZONA URBANA CARRERA 17 CON CARRERA 24









XIII. INFORMACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la Ejecución del convenio se llevó a cabo una socialización en el área rural y urbana, convocando a los representantes de las veredas, quienes expresan su profundo agradecimiento por la labor realizada. Además, donde se llevó a cabo labores de mejoramiento vial en el área del centro, utilizando asfalto rígido y flexible, lo que ha generado un fuerte respaldo y gratitud por parte de la población local.



XIV. INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Todos los tramites ambientales y obligaciones específicas con relación a la ejecución del Convenio N°20233707 están cargadas a la Alcaldía de Pasto Nariño y los tramites antes los entes de control de Coorponariño como lo son:

1. **(Residuos de Construcción y Demolición):** El Municipio deberá hacer el trámite para un Zodme, de lo contrario realizar un contrato con Municipio que disponga este servicio; además se deberá presentar reporte de las cantidades generadas de RCD en el desarrollo del proyecto a la Autoridad Ambiental a través de informes trimestrales, y estar registrados ante la misma como generadores de Residuos de Construcción y Demolición RCD).

2. **(Residuos Peligrosos):** Se debe tener el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos De acuerdo a la Resolución 4741 del 2005, para la gestión interna de este tipo de residuos generados para cada uno de los proyectos mencionados, cabe resaltar que se debe realizar la cuantificación de los mismos ya sean de carácter administrativo y de proceso como se mencionaba, y además tener a disposición un área de disposición de Residuos Peligrosos es por esto que la gestión externa de este tipo de residuos se debe realizar con gestores autorizados que cuenten con Licencia Ambiental con CORPONARIÑO para la recolección de los mismos, las empresas autorizadas por la Autoridad Ambiental). Una vez finalizada dicho proyecto en mención deberá a llegar a CORPONARINO los respectivos informes trimestrales con los correspondientes certificados de disposición final tanto de Residuos de Construcción y Demolición como Residuos Peligrosos dados por los gestores autorizados para verificar el cumplimiento.
3. **Paz y salvo** de cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Ambiental.
4. **Informes de seguimiento ambiental** de cumplimiento al componente o al concepto técnico de la autoridad ambiental.
5. **Certificados de recolección y disposición final de residuos peligrosos**, grasas, aceites y lubricantes certificada por gestores autorizados por la Autoridad Ambiental.
6. **Certificados de recolección y disposición final de residuos de construcción y demolición** certificada por gestores autorizados por la Autoridad Ambiental.
7. **Certificado de la necesidad o no, de realizar el PAGA** (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental INVIAS), de acuerdo con las actividades ejecutadas.
8. **Certificado de la necesidad** o no del empleo de las Zonas de Disposición de Material de Excavación Sobrantes (ZODMES) autorizados por la Autoridad Ambiental.
9. **Certificado de explotación minera** de las conteras utilizadas para la extracción de material granular.

Nota: Se resalta que el cumplimiento al componente ambiental del proyecto no es injerencia del Ejército Nacional, por ende, el cumplimiento a las obligaciones ambientales es de estricto cumplimiento de la Alcaldía de Pasto. Dejando exentó a las Fuerzas militares de cualquier tipo de proceso sancionatorio que se llegue apertura por incumplimiento de las obligaciones ambientales por medio de la Ley 1333 de 2009.1, modificada por la Ley 2387 de 20242.

BICONF2

XV. INFORMACIÓN SALUD OCUPACIONAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIONES REALIZADAS				
ACTA N°	**FECHA**	**TEMA**	**CANTIDAD PERSONAL CAPACITADO**	**OBSERVACIONES**
00220092	07/02/2024	LEVANTAMIENTOS MECÁNICOS EN ÁREAS DE TRABAJO	08	N/A
00220139	15/02/2024	CAPACITACIÓN HIGIENE POSTURAL	08	N/A
00202169	22/02/2024	CAPACITACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL	06	N/A
00250349	01/03/2024	ACTA DE CAPACITACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL	23	N/A
00206825	06/03/2024	CAPACITACIÓN MÓDULOS BÁSICOS DE PELIGROS Y RIESGOS	09	N/A
00369578	15/03/2024	CAPACITACIÓN SEGURIDAD VIAL	09	N/A
00342696	22/03/2024	CAPACITACIÓN DEL USO DE EPP	09	N/A
00507391	08/04/2024	CAPACITACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL	10	N/A
00507246	16/04/2024	CAPACITACIÓN HIGIENE POSTURAL	10	N/A
00507343	24/04/2024	CAPACITACIÓN MODELOS BÁSICOS DE PELIGRO Y RIESGO	10	N/A
00507453	30/04/2024	CAPACITACIÓN SEGURIDAD VIAL	10	N/A
00607296	03/05/2024	CAPACITACIÓN DIFUSIÓN BOLETÍN 208 NORMAS PARA PREVENCIÓN DE LECCIONES POR HIPOTERMIA	09	N/A
00607291	10/05/2024	CAPACITACIÓN DIFUSIÓN BOLETÍN N 195 SISTEMAS MAQUINARIA AMARILLA	09	N/A
00607288	17/05/2024	CAPACITACIÓN DIFUSIÓN BOLETÍN N 154 COMO PREVENIR CAÍDAS EN ALTURAS	09	N/A
00607297	24/05/2024	CAPACITACIÓN DEL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	09	N/A
00910983	09/07/2024	CAPACITACIÓN DIFUSIÓN TAREA CRITICA N16 LEVANTAMIENTO MECÁNICO DE CARGAS	09	N/A

0091042	15/07/2024	CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD VIAL	09	N/A
00910949	23/07/2024	CAPACITACIÓN DIFUSIÓN BOLETÍN N 154 COMO PREVENIR CAÍDAS EN ALTURA EN ACTIVIDADES DE TRABAJO	09	N/A
00910916	31/07/2024	CAPACITACIÓN DEL USO DE LOS EPP	09	N/A
00953243	14/08/2024	CAPACITACIÓN DIFUSIÓN BOLETÍN N050 INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA	10	N/A
00983771	20/08/2024	CAPACITACIÓN DIFUSIÓN BOLETÍN N 137 RECOMENDACIONES PARA PREVENIR CAÍDAS EN ALTURA	09	N/A
01007235	26/08/2024	ACTA DE CAPACITACIÓN RIESGOS Y PELIGRO CON EL COMBUSTIBLE	08	N/A
01039527	03/09/2024	ACTA DE CAPACITACIÓN USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	09	N/A
01117908	17/09/2024	ACTA DE CAPACITACIÓN SOBRE PREVENIR CAÍDAS EN ALTURAS	08	N/A
01155947	24/09/2024	ACTA CAPACITACIÓN SOBRE LOS RIESGOS Y PELIGRO QUE SE PRESENTA CON EL COMBUSTIBLE	10	N/A
2024544012483746	16/10/2024	CAPACITACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL	12	N/A
01364180	12/11/2024	CAPACITACIÓN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	08	N/A
00910916	19/11/2024	CAPACITACIÓN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	08	N/A
01413286	25/11/2024	CAPACITACIÓN DE COMBUSTIBLE	10	N/A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
ELEMENTO ENTREGADO	**FECHA**	**CANTIDAD**	**PERSONAL QUE RECIBE EPP**	**TIPO (PRIMERA VEZ O REPOSICIÓN)**	**OBSERVACIONES**
CASCO TIPO SAFARI COLOR AMARILLO	1/02/2024	20	PERSONAL QUE TRABAJA EN LA OBRA ORGÁNICOS DEL BICON52	PRIMERA VEZ	OMITIDO
OVEROL TIPO PILOTO COLOR VERDE OLIVA		15			
BOTAS PUNTA DE ACERO		15			
GAFAS DE PROTECCIÓN		17			
TAPAOIDOS		17			
CHALECO REFLECTIVO		5			
OVEROL TIPO PILOTO COLOR VERDE OLIVA	13/03/2024	19	PERSONAL QUE TRABAJA EN LA OBRA ORGÁNICOS DEL BICON52	PRIMERA VEZ	OMITIDO
BOTAS PUNTA DE ACERO		19			
GAFAS DE PROTECCION		17			
TAPAOIDOS		17			
CHALECO REFLECTIVO		5			
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO					
FECHA	**TIPO (ACCIDENTE O INCIDENTE)**	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**PERSONAL AFECTADO**	**MEDIDA CORRECTIVA**
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

XVI. CONSIDERACIONES ESPECIALES

- La alcaldía de Pasto Nariño realizo la solicitud de modificatorio N°2el día 17 de noviembre de 2024 de acuerdo radicado N°114203682024 por el cual expuso sus motivos para tal fin.
- Se llevó a cabo el trámite para el modificatorio en el mes de noviembre del 2024, documentación que se llevó acabo con la BRCON, COING y la alcaldía de Pasto Nariño la cual fue radicada en la CENACING.
- La CENACING no aprobó el modificatorio por los tiempos de ejecución, inquietudes de ejecución y la vigencia fiscal, por lo cual se dio por terminado el convenio N°20233707.
- El BICON52 le dio repuesta a las inquietudes a la CENACING, pero no se puedo llegar algún resultado satisfactorio ya que el convenio fenecia el 29 de noviembre del 2024 y a esta fecha no se había obtenido el modificatorio del mismo.

XVII. CONCLUSIONES

- El convenio no fue ejecutado al 100% por tiempos de ejecución y retrasos en la entrega de suministros por parte de la supervisión de la alcaldía de Pasto Nariño, por lo anterior la ejecución contractual del mismo se estipula de acuerdo al balance financiero con relación a la ejecución de la contratación derivada del convenio N°20233707 Pasto Nariño equivalente a un **23,24%.**

- Se remiten las solicitudes del Pago de Demerito y Desgaste por un 15 % y administración por un 2,5% de la ejecución del convenio con relación a los costos directos de acuerdo a la establecido en la directiva ***N°0231 de 2017 "Instrucciones y Lineamientos para el desarrollo de trabajos generales de ingenieros con el fin de construir obras de consolidación del arma de ingenieros"*** el cual asciende a **$ 41.769.497.72 M/C**, de cual la administración responde que se están realizando los trámites para el reconocimiento al Ejercito Nacional (EJC).

- Se le solicito a la supervisión de la Alcaldía de Pasto Nariño a través del supervisor contractual de la contracción derivada del convenio N°20233707 Pasto Nariño que allegue los trámites para la liquidación de cada contrato del presente convenio, la cual debe ser remitida a la supervisión del Ejercito Nacional (EJC) con todos los soportes jurídicos y contables ya que a la fecha hace falta que alleguen la facturación para culminar los trámites administrativos ante la CENACING y el BIBYA como almacén centralizador.

- Se resalta que el cumplimiento al componente ambiental del proyecto no es injerencia del Ejército Nacional, por ende, el cumplimiento a las obligaciones ambientales es de estricto cumplimiento de la Alcaldía de Pasto. Dejando exentó a las Fuerzas militares de cualquier tipo de proceso sancionatorio que se llegue apertura por incumplimiento de las obligaciones ambientales por medio de la Ley 1333 de 2009.1, modificada por la Ley 2387 de 20242.

BICON52

XVIII. RECOMENDACIONES

- Se debe continuar por parte de la unidad, con la formalización de la contratación derivada del convenio una ve la Alcaldía de Pasto a través del supervisor contractual suministre todos los soportes contables y legales para dicho trámite.
- Se debe continuar con el seguimiento y tramites administrativos con la Alcaldía de Pasto Nariño para realizar la liquidación bilateral.
- Se debe realizar mesas jurídicas con el COING para realizar el acta de liquidación bilateral del convenio.
- Seguimiento al desembolso del Pago de Demerito y Desgaste por parte de la Alcaldía de Pasto Nariño.
- La Alcaldía debe suministrar toda la documentación técnica, jurídica y económica para la liquidación bilateral del convenio.

FIRMA _____

Mayor DIEGO FRANCISCO CEPEDA SANCHEZ
EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BICON52
SUPERVISOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°20233707

FIRMA _____

Teniente MAHECHA ESPARZA GERMAN CAMILO
OFICIAL COORDINADOR DE INGENIEROS S10

BICON52
