FECHA (D/M/A): 04-09-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: 1	CANTIDAD: 10.03 TON
ZONA: 5	FRENTE DE TRABAJO: 1
COMUNA: 14 EL POBLADO	
BARRIO: SANTA MARIA DE LOS ANGELES	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO: 8:00 PM	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
TERMINACIÓN: 4:00 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1 UCALIZACIÓN BACHES A INTERVENIR
2 INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN
3 LIMITACIÓN ZONA DE TRABAJO
4- DEMARCACIÓN DE BACHES A INTERVENIR Y DEMOLICIÓN DE LOS MISMOS
5- DESEMBOMBE, EXCAVACIÓN Y ACOPIO PROVICIONAL DE ESCOMBRO.
6- PERFILADO Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA, EN BACHE. 2 SE REALIZA LLENO EN ZONA FACHADA Y COMPACTACIÓN DE LA MISMA
7 TOMA DE TEMPERATURA DE LA MEZCLA ASFALTICA, INSTALACIÓN PRIMERA CAPA CON SU RESPECTIVA COMPACTACIÓN CON RODILLO
8- INSTALACIÓN SEGUNDA CAPA ACORDE A LA INFAIVIDAD DE LA VIA.
9- CARGUE, LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DEL ESCOMBRO
10- RETIRO DE SEÑALIZACIÓN
NOTA: SE REALIZA MITIGACIONES EN LA CL12SUR CR42 PUENTE, CR42 CL5SUR EAFIT, CR42 CL17ASUR SENTIDO SUR-NORTE YA QUE ESTOS CONSTITUIDO UN RIESGO LATENTE PARA TODOS LOS ACTORES VIALES

5. VISITANTES

Paola Alzate. RESIDENTE SST

José Luis Guzmán

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA Wilson Lenis	NOMBRE: JOHN FREDY RIVERA Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: JRG	FIRMA:
NOMBRE: Juan Guillermo Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Edgardo Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 04-08-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	DILLSUN ALBERTO [illegible]	X		EYP
2	Encargado/INGENIERO	SANTIAGO SUAREZ	X		EYP
3	Liguero	SERGIO PEREA BENITES	X		EYP
4	Rastrillero	YONNY LONDOÑO MONTOYA	X		EYP
5	Rastrillero				
6	Ayudante	ORLANDO JOSE MENDOZA	X		EYP
7	Ayudante	JOSE LUIS BUNIGA BEDOYA	X		EYP
8	Ayudante	CERQUERA BENEDER ESCUDERO	X		EYP
9	Ayudante	YADIK HENRRY PEREA	X		EYP
10	Ayudante	SEBASTIAN VELASQUEZ CUADRADO	X		EYP
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	JOSE MANUEL LOZANO HERNANDEZ	X		EYP
17	Operador compresor	ALBEIRO DE JESUS BEDOYA CASTAÑEDA	X		EYP
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	DANILSUN BENITEZ	X		EYP
29	Conductor Volqueta(s)	JORGE IVAN RESTREPO	X		EYP

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	MIFASA	✓		EYP
2	Compresor	DOOSAN C185	✓		EYP
3	Fresadora		N/A		
4	Finisher		N/A		
5	Retroexcavadora		N/A		
6	Vibrocompactador		N/A		
7	Compactador llantas		N/A		
8	Cortador Asfalto			✓	
9	Equipo Imprimación	MOMMFO.	✓		EYP
10	Placa vibratoria	HONDA GX 209	✓		EYP
11	Soplador				
12	Mini cargador		N/A		
13	Barredora				
14	Carrotanque		N/A		
15	Camión	SUO 420	✓		EYP
16	Volqueta(s)	TDZ 809	✓		EYP

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 04-08-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4003460	158120	7A	CR 48C CL 12Sur 148	1,70	2,44	0,13	4,15	0,54	1,29
4003460	158120	1B	CR 48C. CL 12Sur 148	4,15	3,83	0,13	15,89	2,07	4,96
4003460	158610	2	CR 48C CL 12Sur -106	4,92	2,10	0,13	10,33	1,34	3,22
4003461	158811	3	CR 48C 14Sur -31	0,90	1,30	0,14	1,17	0,16	0,39
4001123	158836	4	CL 16A CR 48B	0,70	1	0,10	0,70	0,07	0,17
TOTALES							32,24	4,18	10.03

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233069	TDZ899	10,03	10,03	150°


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23011	TDZ899	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 04-08-2025

10. ESQUEMAS

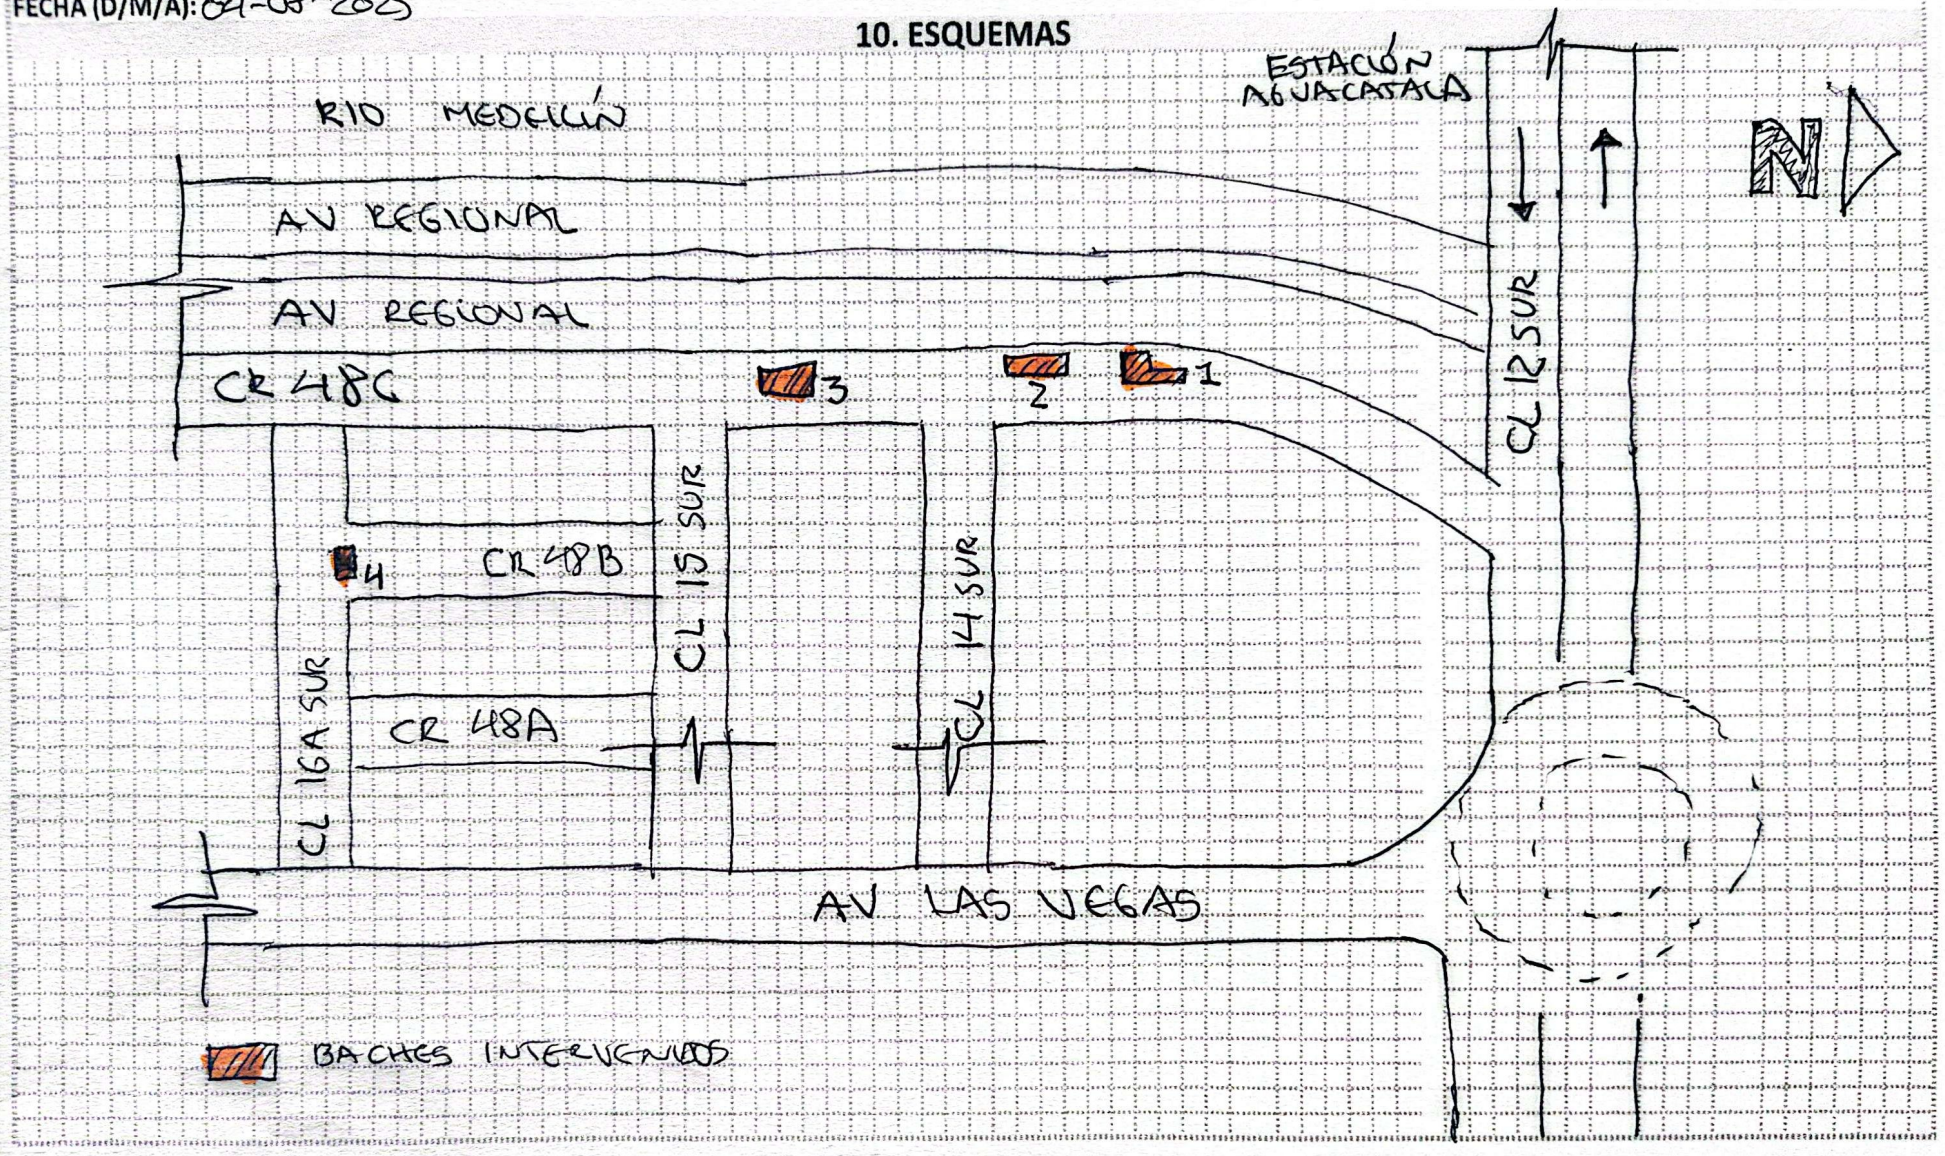

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	1	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,03 TON	CANTIDAD:	
BARRIO	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	DIRECCIÓN	CR 48C ENTRE CL 15 SUR Y CL 12 SUR	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A

Ingenieros Contratistas

TIQUETE DE BASCULA: 220069

FECHA: 04/08/2025

HORA: 4:54:28 PM

CONDUCTOR: FREDY GALLEGO

PLACA: TDZ899

OBRA: 2307

BANCH.MEZ ASF. ESTRUC. FAV MED

CLIENTE: 900106388

PESO BRUTO: 17.25 Toneles

PESO TARA: 7.22 Toneles

PESO NETO: 10.03 Toneles

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBÁ CON RAP MD19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADO: 61.77 Toneles

EST S PAVS

Estructuras y Pavimentos S.A.S.

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23011**

PROVEEDOR: Vial Red

VALE POR UN VIAJE: Escombros

5-Bgas 25

PLACA No: TDZ 899 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

PROCOPAL S.A Nit. 890.930.386-0

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
