FECHA (D/M/A): 06-08-2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL		
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,05 TON

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

ZONA	3	FRENTE DE TRABAJO:	1
COMUNA	LA CANDELARIA		
BARRIO	PERPETUO SOCORRO		

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 8:00 PM	
TERMINACIÓN: 4:00 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA	DESPEJADO HASTA 12:15
	TARDE	LLUVIA BAJA INTENSIDAD DESDE 12:15 HASTA 1:30 AM

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1 INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y LIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
2 DEMARCACIÓN DE ZONAS A INTERVENIR
3 SE REALIZA DEMOLICIÓN DE BACHE DOS CON CARPETA AHUELLADA Y DESPRENDIMIENTO PARCIAL DE FORMA PUNTUAL, ENCONTRANDOSE UN ESPESOR PROMEDIO DE 27CM HASTA LA BASE.
4- EN BACHE UNO SE REALIZA INTERVENCIÓN DE AREA AFECTADA POR DESCASCARAMIENTO PARCIAL DE LA CARPETA DE RODADURA; LA CARPETA INTERMEDIA SE DEJA INTACTA, YA QUE SE ENCONTRABA EN BUEN ESTADO Y NO ERA NECESARIO SU INTERVENCIÓN. CON DICHA INTERVENCIÓN SE BUSCA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LOS VEHICULOS.
5- DURANTE LA JORNADA SE COMPARTIO EL ESPACIO CON EL PERSONAL DE EVENTOS POR LO QUE SE REALIZO LA ZONA DE TRABAJO PARA EVITAR EL INGRESO DE PERSONAL AJENO A LAS ZONAS CRITICAS

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE:	Wilson Perez	JOHN FREDY RIVERA GUARÍN
	Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA		
NOMBRE:	Juan David Rodriguez	EDWARD RODRIGUEZ
	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06-08-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON ALBERTO SERNA	X		E y P
2	Encargado/INGENIERO	SANTIAGO SUAREZ	X		E y P
3	Liguero	SERGIO PEREA BENITES	X		E y P
4	Rastrillero	YONNY LONDOÑO MONTOYA	X		E y P
5	Rastrillero				
6	Ayudante	ORLANDO JOSE MONTOYA	X		E y P
7	Ayudante	JOSE LUIS ZUÑIGA BEDOYA	X		E y P
8	Ayudante	CERQUERA ESNEYDER ESCUDERO	X		E y P
9	Ayudante	YADIR HENRY PEREA	X		E y P
10	Ayudante	SEBASTIAN VELASQUEZ CUADRADO	X		E y P
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	JOSE MANUEL LOZANO HERNANDEZ	X		E y P
17	Operador compresor	ALBEIRO DE JESU BEDOYA CASTAÑEDA	X		E y P
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	SERGIO PEREA	X		E y P
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	DANILSON BENITEZ	X		E y P
29	Conductor Volqueta(s)	JORGE IVAN RESTREPO	X		E y P

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	MIKASA	X		
2	Compresor	DOOSAN C 185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	HONDA GX 200	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	SVO 4120 FOTON	X		
16	Volqueta(s)	NPR 2011 SENCILLA	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06-08-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
1000068	158954	1A	CR 61 CL 36	4,72	5,05	0,06	23,84	1,43	3,43
1000068	158954	1B	CR 61 CL 36 +12m	1,70	1,86	0,06	3,16	0,19	0,46
1000068	158955	2	CR 61 CL 36+12m	5,90	7,63	0,27	9,50	2,56	6,16
TOTALES							36,50	4,18	10,05

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233133	TDE899	10,05	10,05	140


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23013	TDE899	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06-08-2025

10. ESQUEMAS

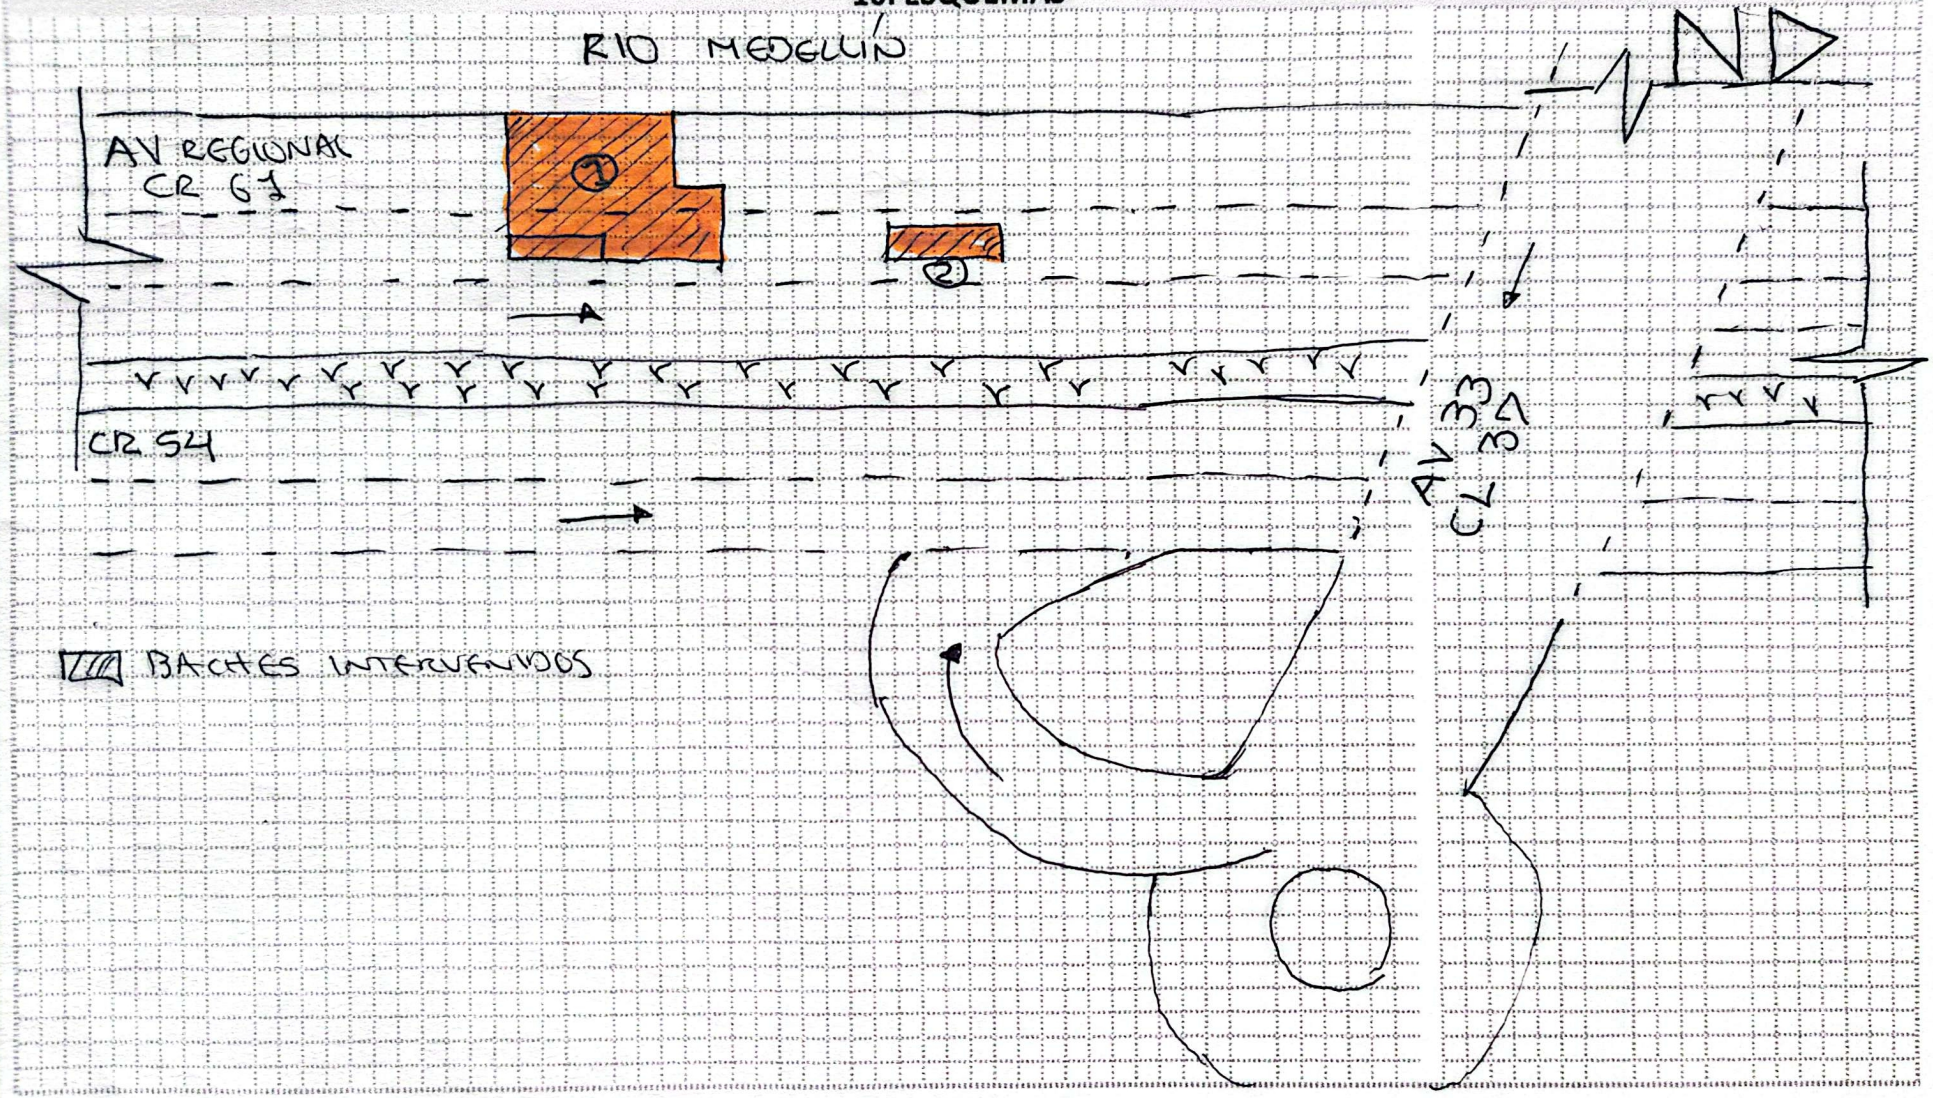

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	1	FRENTE
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,05 TON	CANTIDAD:
BARRIO	PERPETUO SOCORRO	DIRECCIÓN	CR 61 CL 36	DIRECCIÓN

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 233133

FECHA: 06/08/2025

HORA: 4:13:23 PM

CONDUCTOR: FREDY GALLEGO

PLACA: TDZ899

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 17.24 Tonnes

PESO TARA: 7.19 Tonnes

PESO NETO: 10.05 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 41.80 Tonnes

Jovell Cano

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23013**

PROVEEDOR: Vial Med

VALE POR UN VIAJE: Escombro

7 - Agos - 25

PLACA No: TDS 899 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A
Nit. 890 906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
