FECHA (D/M/A): 11-08-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL		
RANGO:	1	CANTIDAD:	70,03 TON
ZONA	3	FRENTE DE TRABAJO:	1
COMUNA	LA CANDELARIA		
BARRIO	EL CHAGUALO		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00PM	PROCESO DE DEMOLICIÓN DISPENDIOSO CON UNA DURACIÓN DE DICHA ACTIVIDAD DE APROXIMADAMENTE 8 HORAS
TERMINACIÓN: 8:00 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	NUBLADO HASTA LAS 11:30 PM
TARDE	DESPEJADO DESDE 11:30 PM

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1- INSTALACIÓN DE VERTICALES E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN LUZ LIMITANDO LA ZONA DE TRABAJO, CERRANDO VÍA RAPIDA AV REGIONAL CARRIL DERECHO SENTIDO SUR-NORTE.

2- SE IDENTIFICAN LOS BACHES A DEMOLER Y SU REPORTE EN EL SIRO

3- SE REALIZA ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN Y SE ENCONTRO ESPESURES DE CAPA DE 0,25M, EL BACHE 1 SE INICIO PROCESO DE DEMOLICIÓN A LAS 8:40PM Y FINALIZA A LAS 3:40AM Y LA DEMOLICIÓN DE TODOS LOS BACHES A LAS 5:50 AM; GENERANDO UN ATRAZO CONSIDERABLE EN EL RESTO DE ACTIVIDADES.

4- SE REALIZA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, INSTALACIÓN DE MEZCLA A LA PAR CON EL BARGUE DE VOLQUETA Y DEMOLICIONES DEL BACHE 2 Y 3 A LAS 3:40AM OBSERVANDOSE UN RENDIMIENTO AL FINAL DE LA JORNADA.

5- SE INFORMA EL ATRAZO DE ACTIVIDADES POR EFECTOS DE PERMISOS DE LOS HORARIOS AUTORIZADOS EN EL PMT.

6- SE LLEVA A FELIZ TERMINO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE:	Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	JOHN FREDY RIVERA Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA		
NOMBRE:	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-08-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	WILSON ALBERTO SERNA	X		EYP
2	Encargado				
3	Liguero	SERGIO PEREA BENITES	X		EYP
4	Rastrillero	YONNY LONDOÑO MONTOYA	X		EYP
5	Rastrillero				
6	Ayudante	ORLANDO JOSE MONTOYA	X		EYP
7	Ayudante	JOSE LUIS ZUÑIGA BEDOYA	X		EYP
8	Ayudante	CERQUERA ESNEIDER ESCUDERO	X		EYP
9	Ayudante	YADIR HENRY PEREA	X		EYP
10	Ayudante	SEBASTIAN VELASQUEZ CUADRADO	X		EYP
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	JOSE MANUEL LOZANO HERNANDEZ	X		EYP
17	Operador compresor	ALBEIRO DE JESUS BEDOYA CASTAÑO	X		EYP
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	SERGIO PEREA	X		EYP
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	DANILSÓN BENITEZ	X		EYP
29	Conductor Volqueta(s)	JORGE IVAN RESTREPO	X		EYP

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	MIKASA	X		
2	Compresor	DOOSAN C185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	HONDA GX 200	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	SVO 420 FOTON	X		
16	Volqueta(s)	IDZ 899 SENCILLA	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-08-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
1000113	159142	1	CR 58 CL62	7,27	1,70	0,25	12,36	3,09	7,42
1000113	159165	2	CR 58 CL62-74	2,18	1,13	0,20	2,46	0,49	1,18
1000113	159164	3	CR 58 CL62-74+10m	3,51	1,05	0,16	3,69	0,59	1,42
TOTALES							18,51	4,17	10,02

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233188	TDZ899	10,03	10,03	141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23015	TDZ899	SENCILLA	1	PROCOPOM

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-08-2025

10. ESQUEMAS

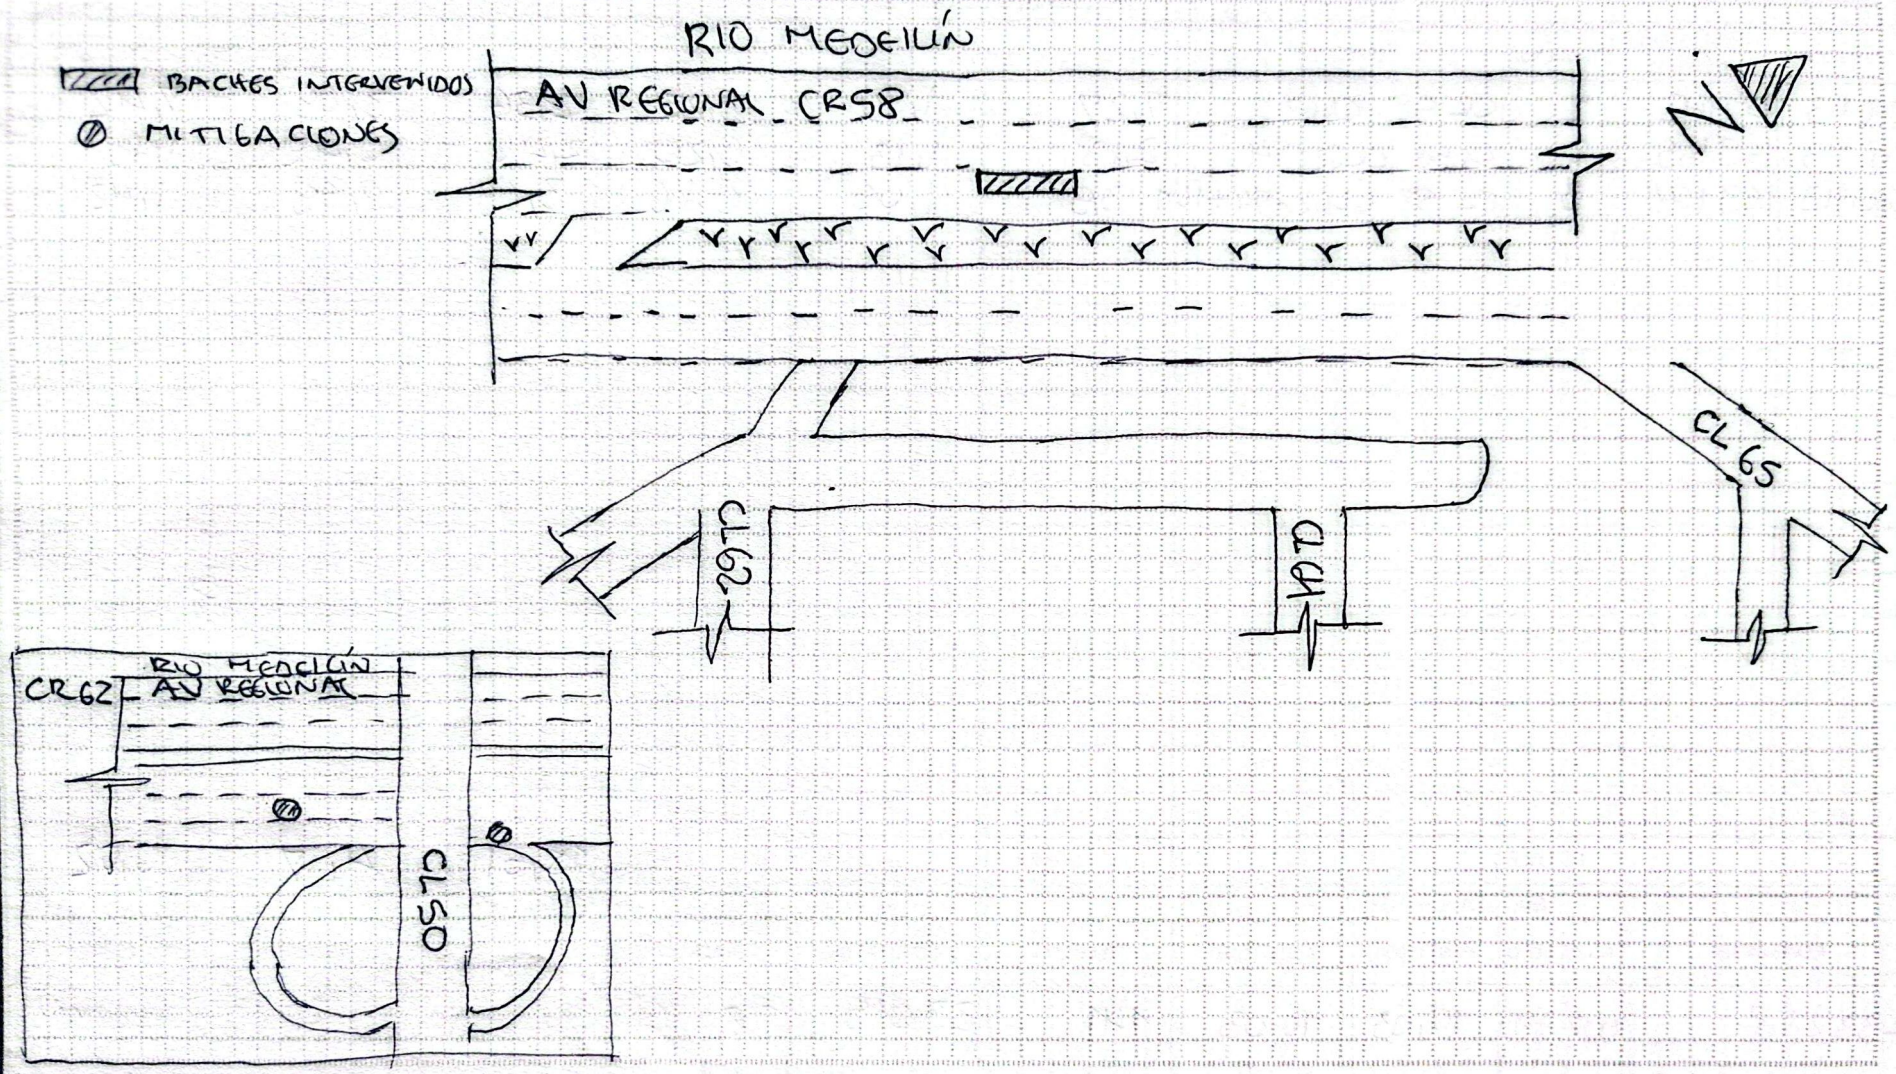

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	1	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,02 TON	CANTIDAD:	
BARRIO	EL CHAGUALO	DIRECCIÓN	CR 58 CL 62	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 23015

PROVEEDOR: Vial Sol

VALE POR UN VIAJE: Escombros

11-8-25

PLACA No: TDJ 877 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

PROCOPAL S.A. Nit. 890.906.388-0

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 233198

FECHA: 11/08/2025

HORA: 4:07:00 PM

CONDUCTOR: FREDY GALLEGO

PLACA: TDZ899

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 17.27 Tonnes

PESO TARA: 7.24 Tonnes

PESO NETO: 10.03 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBTA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADO: 36.08 Tonnes

Powered by CamScanner
