FECHA (D/M/A): Agosto 8 /2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Bache		
RANGO:	0	CANTIDAD:	4.83 Ton
ZONA	6	FRENTE DE TRABAJO:	2
COMUNA	15		
BARRIO	Guayabal		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00Am	Intervenciones en varios puntos lluvias en la tarda.
TERMINACIÓN: 7:00Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleado
	TARDE: con lluvias

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Identificación de los bachas para ejecutar.
- Instalación de la señalización segun PMT.
- Demarcación, demolición y retiro del pavimento existante
- Compactación de la rasante, para observar su estado
- Imprimación con emulsión asfaltica en frio
- Aplicación y compactación de la mezcla asfaltica MDC19 con RAP TIBIA, provenianta de la planta PROCOPAL.
- Recogida de los escombros en la volqueta
- Limpieza y aseo del area de trabajo
- Retiro de la señalización PMT.

Observación: Se realizan bachas en 3 direcciones diferentes, esto retrazo las actividades por el traslado de la cuadrilla.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Herrera.	Hanly Lopera.
Vo.Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro R.	NOMBRE: Cristian David Gomez Alvarado.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Agosto 8 /2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Honao	X	—	Vialmad
2	Encargado	—	—	—	—
3	Liguero	Laivar Enrique Padilla	X	—	EYP
4	Rastrillero	Javiar Manbal soto	X	—	EYP
5	Rastrillero	—	—	—	—
6	Ayudante	Victor Alfonso Cordoba	X	—	— EYP
7	Ayudante	Simon Uran Jaramillo	X	—	EYY
8	Ayudante	Cristian Algondro Jimanez	—	—	EYP NO LLEGO
9	Ayudante	Alvaro Antonio mazo	X	—	EYP
10	Ayudante	Sabastian murillo	X	—	EYP
11	Ayudante		—	—	—
12	Ayudante		—	—	—
13	Ayudante		—	—	—
14	Ayudante		—	—	—
15	Ayudante		—	—	—
16	Operador Rodillo manual	Sabastian Murillo	X	—	EYP
17	Operador compresor	Misael Ortago	X	—	EYP
18	Operador fresadora		—	—	—
19	Operador finisher		—	—	—
20	Operador Retroexcavadora		—	—	—
21	Operador Vibrocompactador		—	—	—
22	Operador Compactador llantas		—	—	—
23	Operador Cortador Asfalto		—	—	—
24	Operador Equipo Imprimación	Laivar Enrique pbdilla	X	—	EYP
25	Operador Mini cargador		—	—	—
26	Operador Barredora		—	—	—
27	Coductor Carrotanque		—	—	—
28	Conductor Camión	William Colorado	X	—	EYP
29	Conductor Volqueta(s)	Mateo Arango	X	—	EYP
	—		—	—	—
	—		—	—	—
	—		—	—	—
	—		—	—	—
	—		—	—	—

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Ecoroad EC 770	X	—	
2	Compresor	Ingarsoll Rand	X	—	
3	Fresadora		—	—	
4	Finisher		—	—	
5	Retroexcavadora		—	—	
6	Vibrocompactador		—	—	
7	Compactador llantas		—	—	
8	Cortador Asfaltó		—	—	
9	Equipo Imprimación	Marmita	X	—	
10	Placa vibratoria	Honda FC 30	X	—	
11	Soplador		—	—	
12	Mini cargador		—	—	
13	Barredora		—	—	
14	Carrotanque		—	—	
15	Camión	15020 SZP 929	X	—	
16	Volqueta(s)	Internacional SMV 676	X	—	
17	Baño Movil	S y E	X	—	
	—		—	—	
	—		—	—	

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): AGOSTO 8/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000703	159292	1	CR 50 FF CL 9 Sur	6.30	0.65	0.11	4.10	0.45	1.08
2000703	159033	2	CR 50 FF CL 8 Sur	1.05	1.20	0.11	1.26	0.14	0.33
5008706	159030	3	CR 50 FF CL 7 Sur- SI	2.65	0.65	0.14	1.72	0.24	0.58
2001124	158601	4	CL 2 CR 65-326	1.33	1.20	0.14	1.60	0.22	0.54
4001161	159016	5A	CR 72 CL 17-16	1.15	1.90	0.11	2.19	0.24	0.58
4001161	159016	5B	CR 72 CL 17-16	2.90	1.15	0.11	3.34	0.37	0.88
4001161	159039	6	CR 72 CL 17-28	1.27	1.46	0.10	1.85	0.19	0.45
4001161	159040	7	CR 72 CL 18-20	1.80	0.90	0.10	1.62	0.16	0.39
TOTALES							17.68	2.01	4.83 ✓

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233150	SMV 676	4.83 ✓		140°


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
22914	SMV 676	Sencilla	7	Procopal.

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS

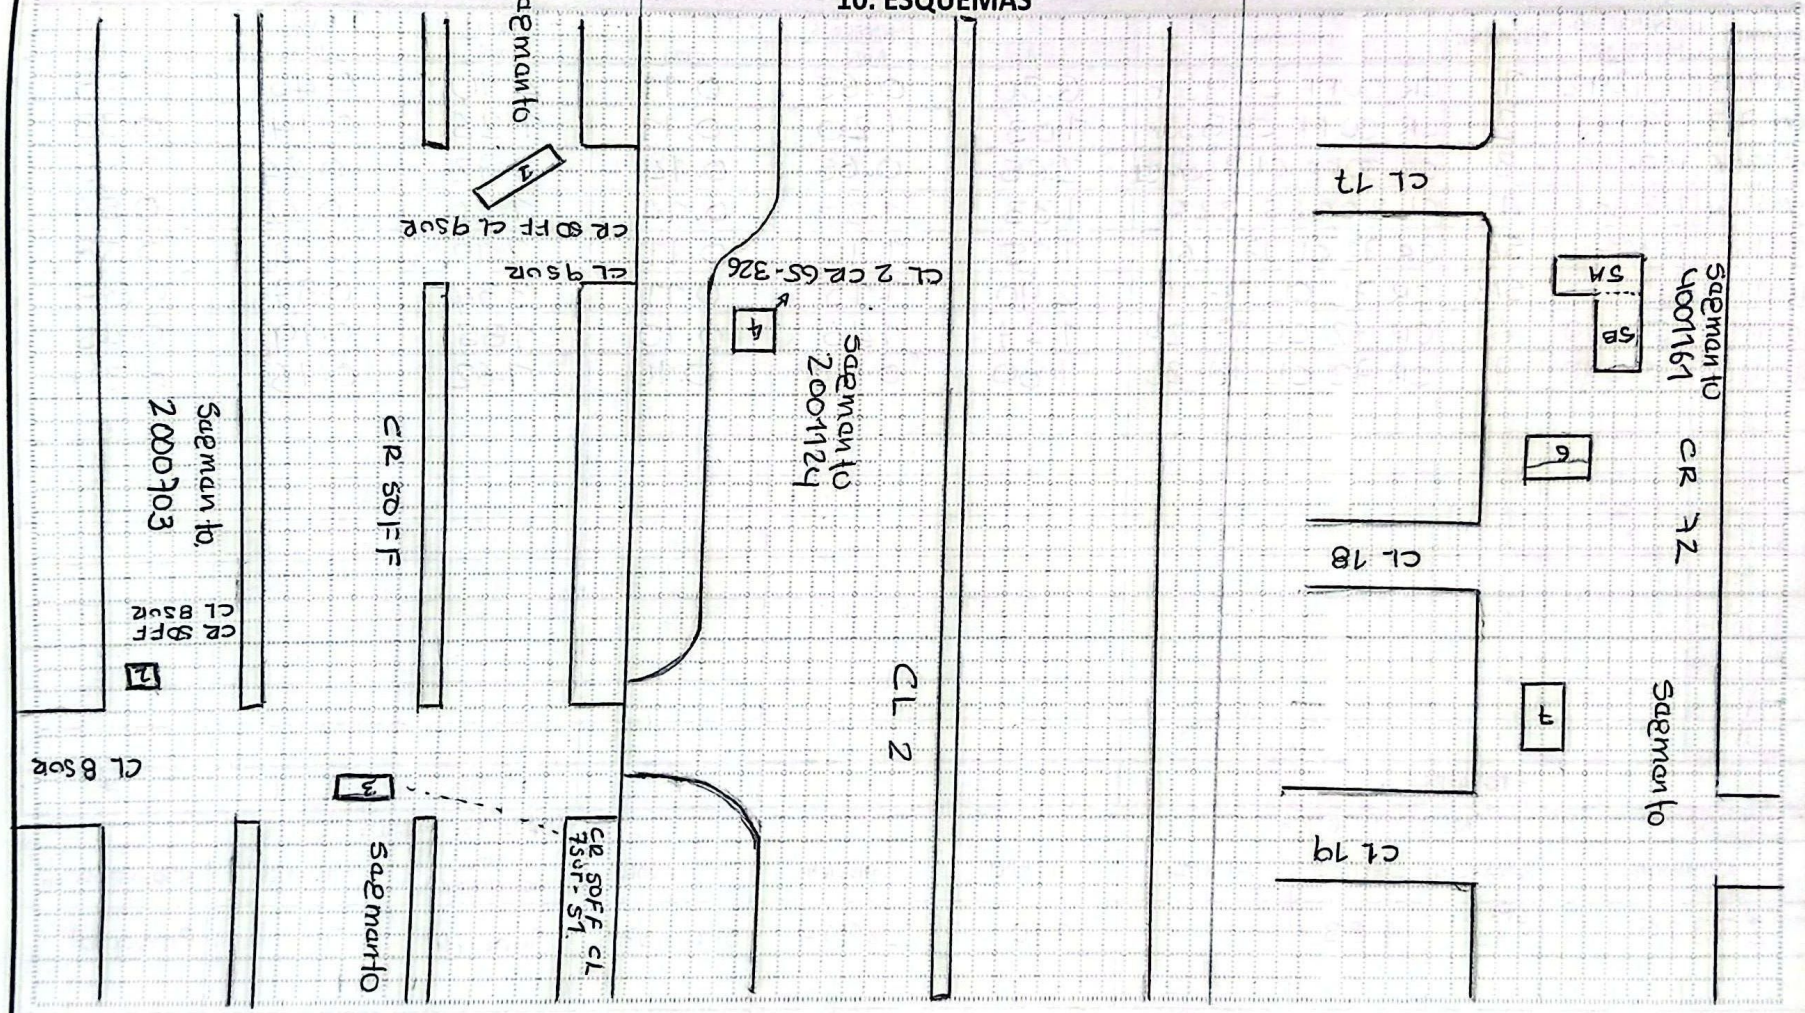

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bachas	FRENTE	2	FRENTE	
RANGO:	O	CANTIDAD:	4.83	CANTIDAD:	
BARRIO	Guayabal	DIRECCIÓN	CR 50FF CL 95SE	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHO BASCULA

Santiago Henao M.

TIQUETE DE BASCULA: 233150

FECHA: 08/08/2025

HORA: 8:56:17 AM

CONDUCTOR: MATEO ARANGO

PLACA: SMV676

OBRA: 230

SUMINEMEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.32 Tonnes

PESO TARA: 7.49 Tonnes

PESO NETO: 4.83 Tonnes

PRODUCTO: 112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.83 Tonnes

Henry Lopera
Interventoría

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 22914**

PROVEEDOR: Frente 2 Vialmed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

08/08/25

PLACA No: SMV 676 CAPACIDAD: 3 M3

DESTINO: Procopal PROCOPAL S.A.

RECIBIDO POR: 11 AGO 2025

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este tiquete no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

DESPACHOS BASCULA

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
