FECHA (D/M/A): Agosto 13/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD)	Baches		
RANGO	0	CANTIDAD:	4.85 Ton
ZONA	4	FRENTE DE TRABAJO:	2
COMUNA	12		
BARRIO	Los Pinos		

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 Am	—
TERMINACIÓN: 5:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- ubicacion de los baches para intervenir.
- Instalacion de la señalizacion segun PMT.
- Demarcacion, demolicion y retiro del pavimento existente
- Compactacion de la base granular, para observar su estado
- Imprimacion con emulsion asfaltica en frio.
- Aplicacion y compactacion de la mezcla asfaltica MDC 19 con RAP TIBIA, proveniente de la planta PROCOPAL
- Recogida de los escombros en la volqueta
- Limpieza y aseo del area de trabajo.
- Retiro de la señalizacion PMT.
- Se realiza recorrido desde el área Social de la interventoria y apoyo social Alcaldia, se realiza seguimiento a las piezas comunicacionales: Valla fijera y lona de Volqueta.

observacion: Se tuvo visita de telecomunicaciones de la alcaldia.

5. VISITANTES

Margenta Maria Mejia C. 50 (4) - Sit Supervision

Catalina Martinez Social

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Herrera M.	Henry Lopera
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Jose Alejandro Castro R.	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A) Agosto 13/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Hanao	X	—	Vialmad
2	Encargado		—	—	—
3	Liguero	Jaivar Enrique Padilla	X	—	EYP
4	Rastrillero	Javier Mondal Soto	X	—	EYP
5	Rastrillero		—	—	—
6	Ayudante	Victor Alfonso Cordoba	X	—	EYP
7	Ayudante	Simon Uran Jaramillo	X	—	EYP
8	Ayudante	Cristian Alejandro Martinez	X	—	EYP
9	Ayudante	Sabastian Murillo	X	—	EYP
10	Ayudante	Alvaro Antonio Mora	X	—	EYP
11	Ayudante		—	—	
12	Ayudante		—	—	
13	Ayudante		—	—	
14	Ayudante		—	—	
15	Ayudante		—	—	
16	Operador Rodillo manual	Sabastian Murillo	X	—	EYP
17	Operador compresor	Misael Ortega.	X	—	JYH
18	Operador fresadora		—	—	
19	Operador finisher		—	—	
20	Operador Retroexcavadora		—	—	
21	Operador Vibrocompactador		—	—	
22	Operador Compactador llantas		—	—	
23	Operador Cortador Asfalto		—	—	
24	Operador Equipo Imprimación	Jaivar Enrique Padilla	X	—	EYP
25	Operador Mini cargador		—	—	
26	Operador Barredora		—	—	
27	Coductor Carrotanque		—	—	
28	Conductor Camión	William (Jaramillo) Colorado	X	—	Josa Homid
29	Conductor Volqueta(s)	Mateo Arango.	X	—	EYP
	—		—	—	
	—		—	—	
	—		—	—	
	—		—	—	
	—		—	—	

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN SI	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Ecoroad EC 770	X	—	
2	Compresor	Ingersoll Rand	X	—	
3	Fresadora		—	—	
4	Finisher		—	—	
5	Retroexcavadora		—	—	
6	Vibrocompactador		—	—	
7	Compactador llantas		—	—	
8	Cortador Asfalto		—	—	
9	Equipo Imprimación		—	—	
10	Placa vibratoria	Marmita	X	—	
11	Soplador	Honda FC 30	X	—	
12	Mini cargador		—	—	
13	Barredora		—	—	
14	Carrotanque		—	—	
15	Camión		—	—	
16	Volqueta(s)	Isuzu SZP 329	X	—	
17	Baño Movil	Internacional SMV 696	X	—	
	—	S y C	X	—	
	—	—	—	—	
		—	—	—	

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Agosto 13/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001725	159772	1	CR 78 CL 32 - 85	1.80	1.40	0.10	2.52	0.25	0.60
2000093	159318	2	CR 80 CL 44 - 60	1.50	1.05	0.18	1.58	0.28	0.68
2000096	159319	3	CR 80 CL 44 - 68	0.90	1.05	0.18	0.95	0.17	041
2000093	15932	4	CR 80 CL 44 - 74.	095	1.00	0.18	0.95	0.17	041
2000093	158129	5	CR 80 CL 44A-09	1.74	1.53	0.15	2.66	0.40	0.96
2000096	159326	6	CR 80 CL 44A-100 t40m	1.26	1.05	0.16	1.32	0.21	051
2000097	159329	7	CR 80 CL 44B - 3	0.82	1.00	0.15	0.82	012	0.30
2000097	159331	8	CR 80 CL 44B - 7	1.04	0.95	0.15	0.99	0.15	0.36
2000097	159332	9	CR 80 CL 44B - 6	1.30	0.67	0.15	0.87	0.13	0.31
2000097	159333	10	CR 80 CL 44B - 6 15m	1.60	0.68	0.12	1.09	0.13	0.31
TOTALES							13.75	2.01	4.85

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233250	SMV 676	4.85	—	141°


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
22918	SMV 676	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Agosto 13 /2025

10. ESQUEMAS

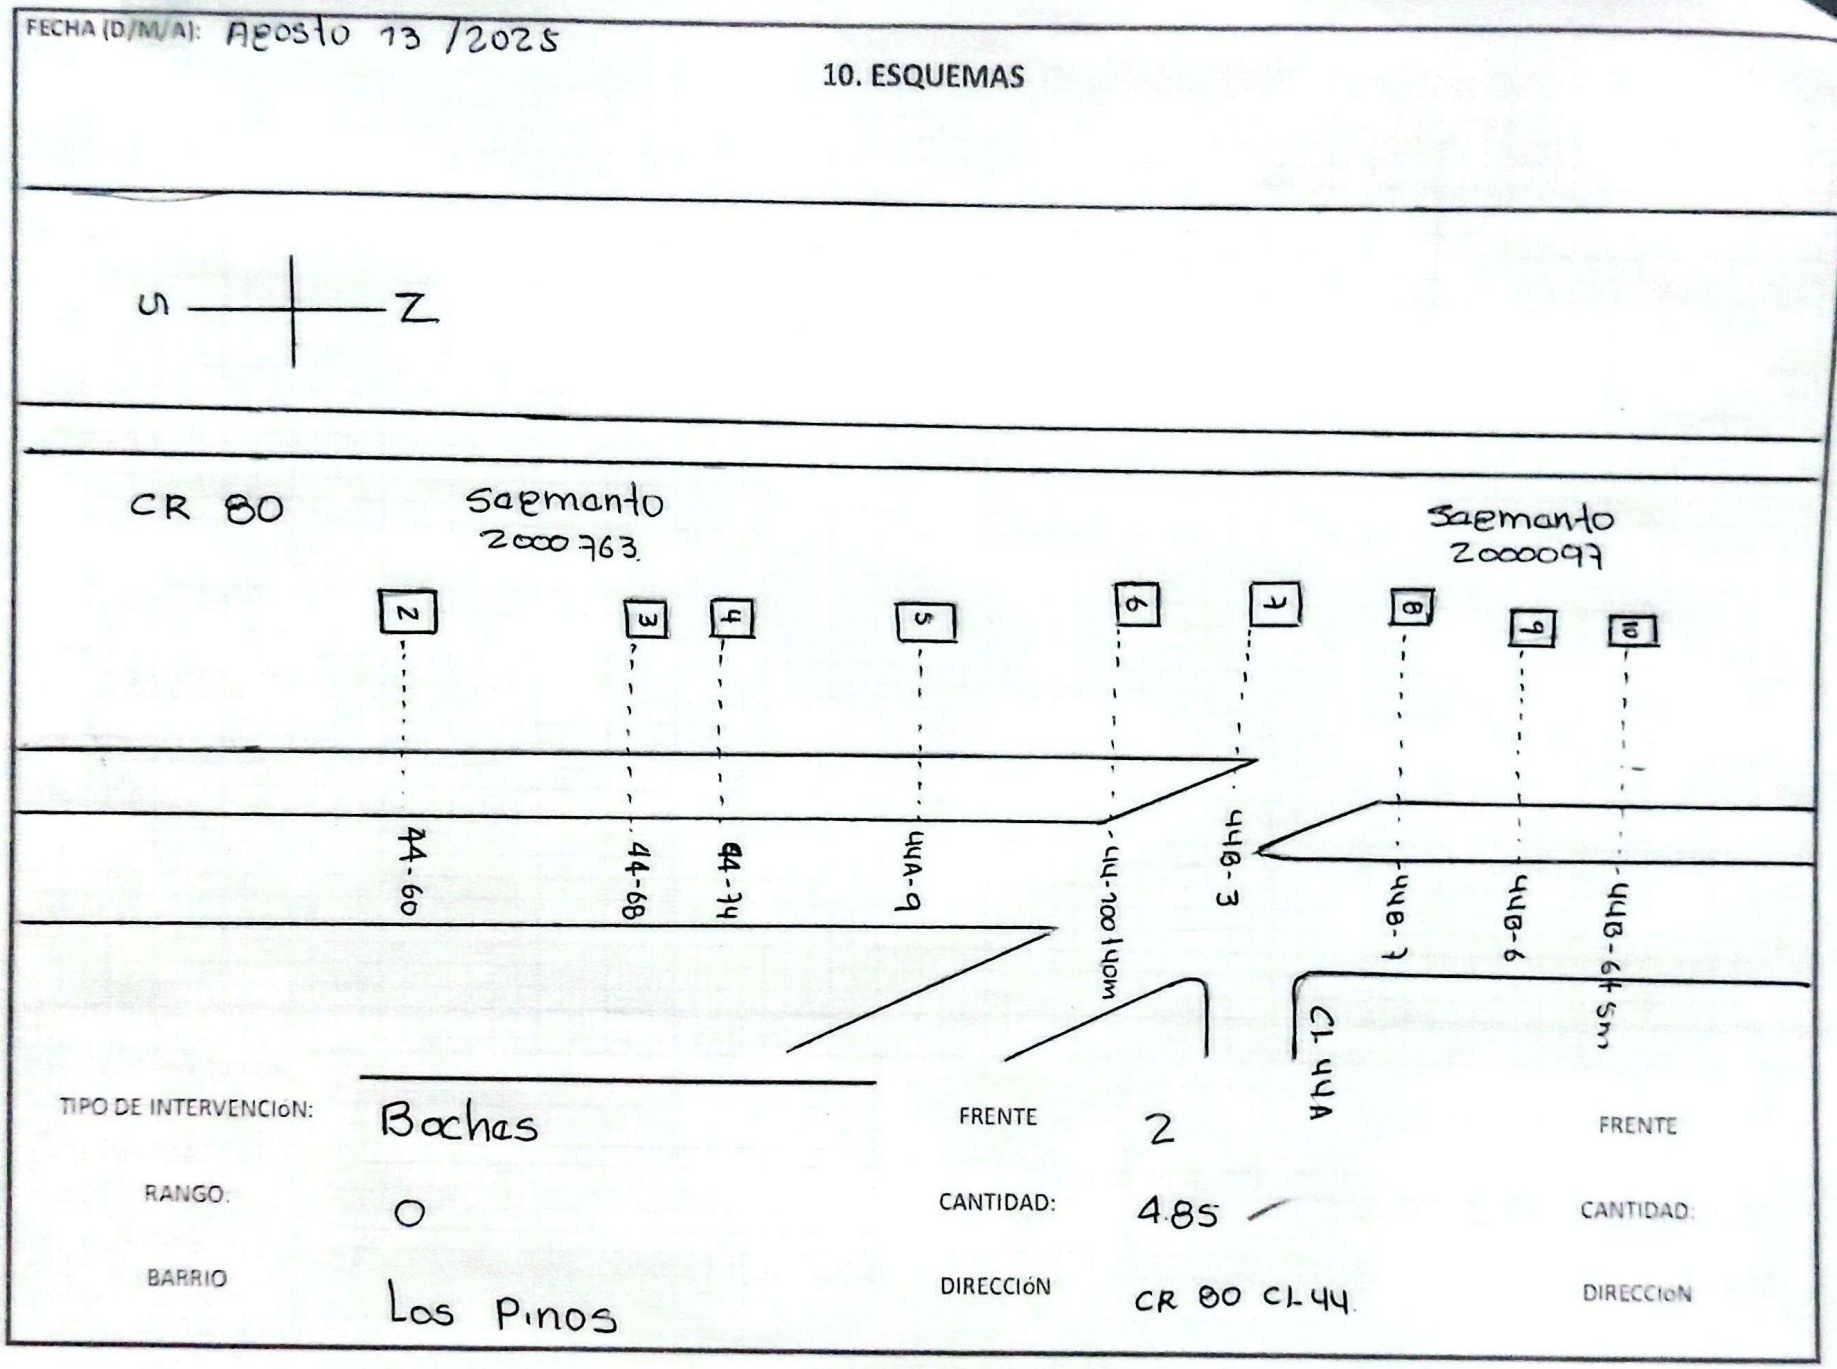


TIPO DE INTERVENCIoN:	Baches	FRENTE	2	FRENTE
RANGO:	0	CANTIDAD:	4.85	CANTIDAD:
BARRIO	Los Pinos	DIRECCIóN	CR 80 CL 44.	DIRECCIoN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): AGOSTO 13 /2025

9. ESQUEMAS

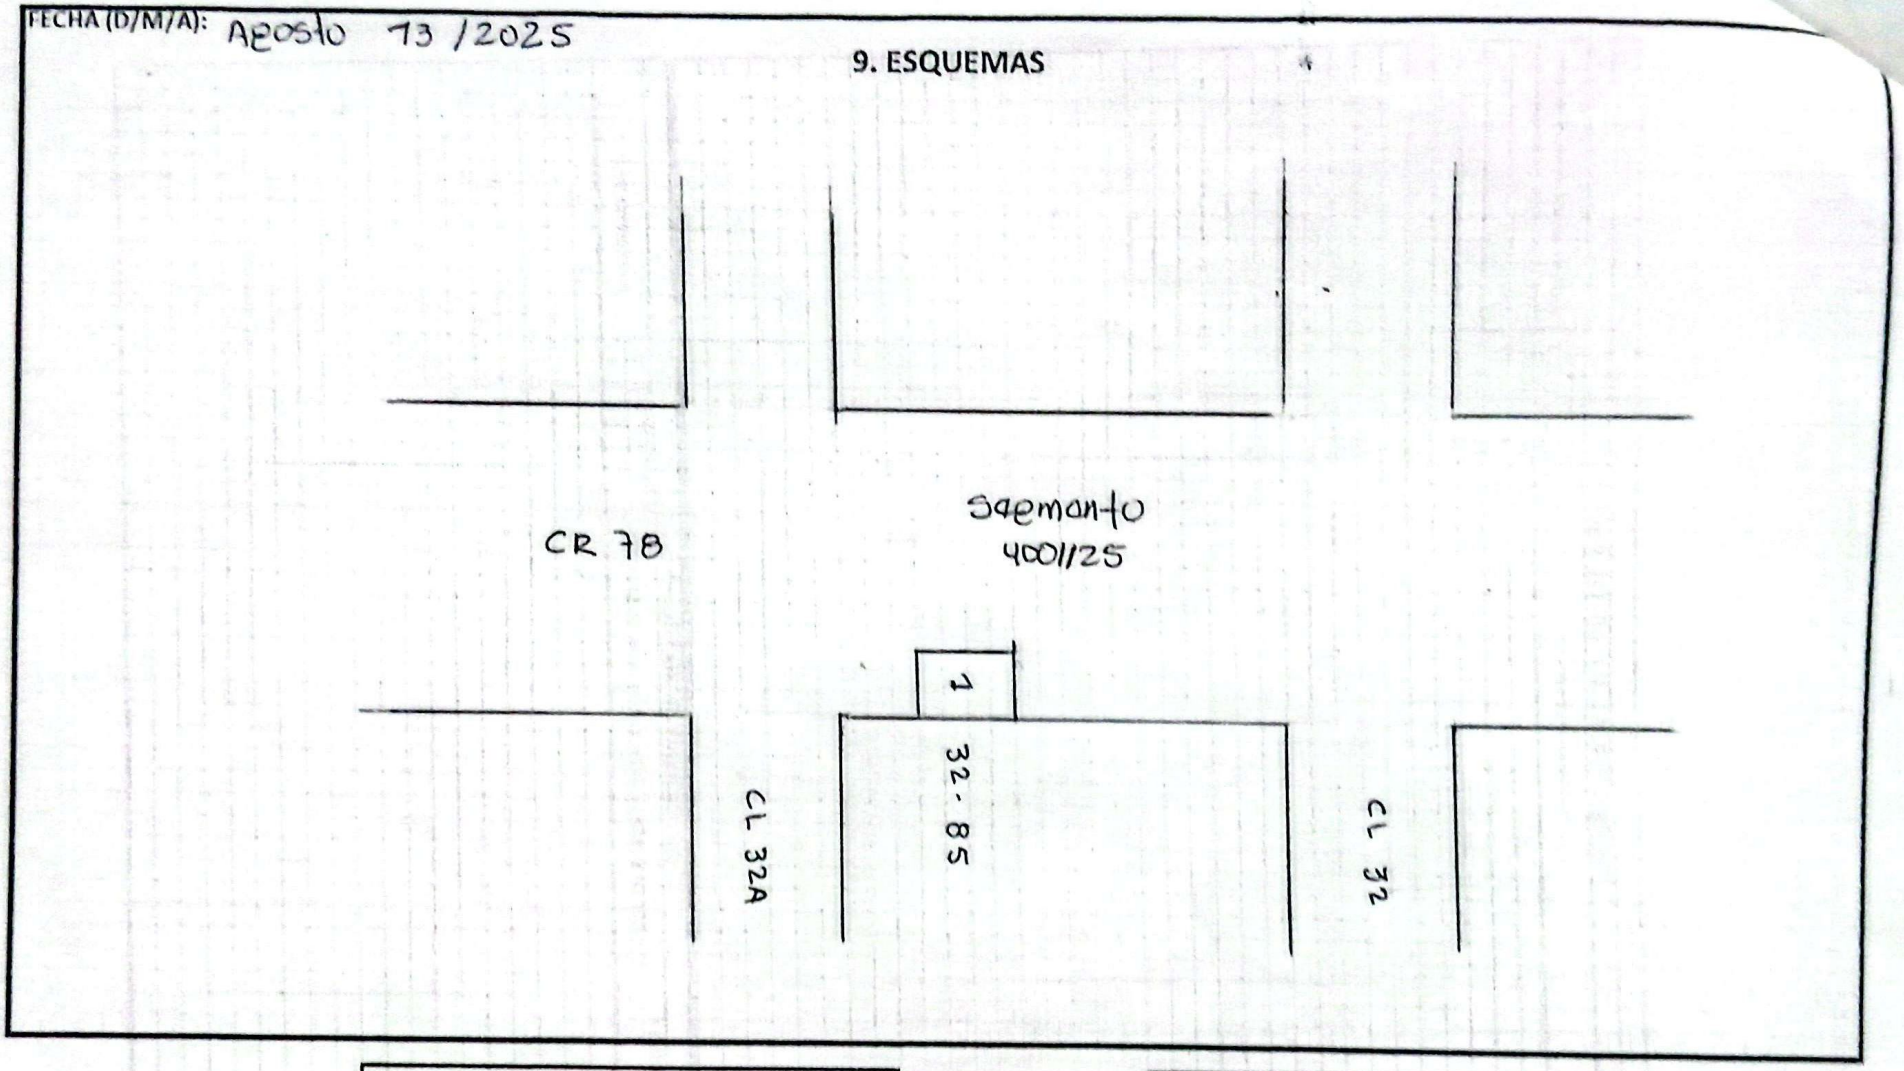

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bachas	FRENTE	2
RANGO:	O	CANTIDAD:	4.85
BARRIO	El Nogal Los Almendros	DIRECCIÓN	CR 78 CL 32

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
PLANTA DE ASFALTO - BASCULA

Santiago Herrera M.

Henry Lopera
Interventoria

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 22918**

PROVEEDOR: Frente 2 Vial med — 13/08/25

VALE POR UN VIAJE: Escombros

PLACA No: MV 676 CAPACIDAD: 3 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A. NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

161 °C

Henry Lopera
Interventoria

Powered by CamScanner
