FECHA (D/M/A): 01/08/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	81 ton
ZONA	Corregimientos	FRENTE DE TRABAJO:	3
COMUNA	Santa Elena		
BARRIO	Piedra gorda - Mazo		

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00	
TERMINACIÓN: 17:00	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleado
TARDE	Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Instalación señalización ~~horizontal~~ vertical (PMT)
- Demarcación de áreas a intervenir
- Demolición y acopio de material resultante
- Conformación y compactación de base granular existente
- Imprimación con emulsión asfáltica en áreas a intervenir
- Aplicación y compactación de mezcla asfáltica MDC19 (Tibia) + RAP
- El contratista no cuenta con controladores viales certificados,
- Por temas de precisión, la aplicación de los reportes está generando ubicaciones no correspondientes al lugar real donde se realizan los reportes, por lo tanto se toman las direcciones tomadas en campo para la trazabilidad de la información
- Para los baches # 4 y 5 la vía no tiene más nomenclatura que cl 49 #54 por ser una vía interna
- Visita de personal audiovisuales de la SIF

5. VISITANTES

Ibarra Vargas B. | Luis Restrepo.

6. FIRMAS

NOMBRE: William Tobón Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: William Tobón	FIRMA:
NOMBRE: Juan Camilo Rodriguez G. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Juan J. Bermudez Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 01/08/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	William Restrepo	x		Consorcio vial Mej 2025
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Leno Marin	x		
4	Rastrillero	Yoianny Cuesta Ordiz	x		
5	Rastrillero	Aldair calle	x		
6	Ayudante	Faber Quiroz	x		
7	Ayudante	José Saldarriaga	x		
8	Ayudante	Juan Esteban Murillo	x		
9	Ayudante	Jaib valencia	x		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Nelson Sena	x		
17	Operador compresor	Juan Jairo Herrera	x		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Yair Algate	x		
29	Conductor Volqueta(s)	Alexander Yali	x		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			SI	No	
1	Rodillo manual	Bicilindro Hasenama AB LP6500	x		
2	Compresor	Doosan C185	x		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	marmita	x		
10	Placa vibratoria	Placa vibratoria	x		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	WCS338 Isuzu	x		
16	Volqueta(s)	Sencilla GTY061	x		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 07/03/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2007755	158700	1	Cr 40 este 56-450	6	2	0,11	12	1,32	3,17
7007754	158699	2	Cr 40 este 56-487	2,5	2	0,10	~~0,50~~ 5	0,50	1,20
7007755	158705	3	Cr 40 este 56-551	1,4	2,5	0,12	3,5	0,42	1,01
7007284	158707	4	Cl 49 # 54	4	1,2	0,14	4,8	0,67	1,61
7007284	158709	5	Cl 49 #54	3,5	1	0,13	3,5	0,46	1,1
TOTALES				17,4	8,7	0,6	28,8	3,37	8,09

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233037	GTY061	8,1	8,1	140


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
	GTY061	Sencilla	1	Procopal SA

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 01/03/2025

10. ESQUEMAS

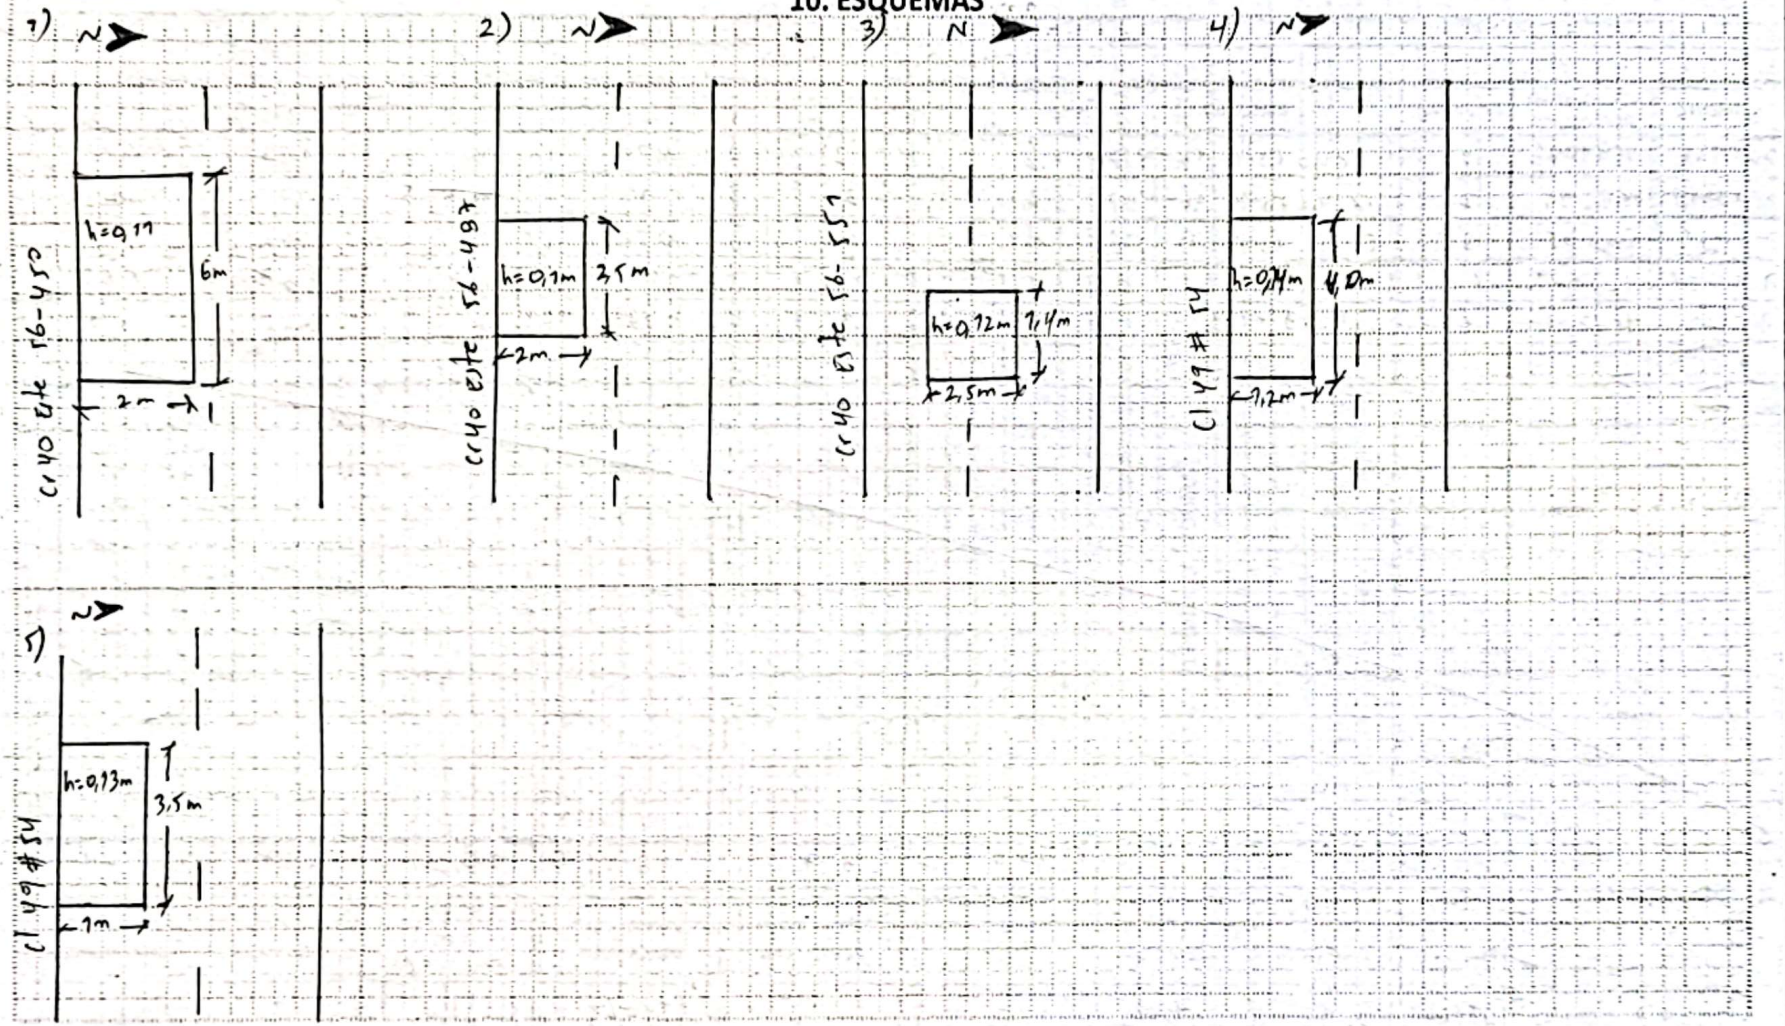

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Rutinal	FRENTE	3	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	8,1 ton / 5 baches	CANTIDAD:	
BARRIO	Piedra gorda - Mayo	DIRECCIÓN	cr 40 este 56 - 450	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 01/03/2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):			
RANGO:		CANTIDAD:	
ZONA		FRENTE DE TRABAJO:	
COMUNA			
BARRIO			

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO :	
TERMINACIÓN:	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA
	TARDE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

5. FIRMAS

NOMBRE: William Tobón	
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA William Tobón	FIRMA
NOMBRE: Juan David Rodriguez G.	NOMBRE: Juan J. Bermudez R
Vo.Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

E.P.S

PROCOPAL

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233037

FECHA: 01/08/2025

HORA: 8:39:35 AM

CONDUCTOR: ALEX YALI

PLACA: GTY061

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 16.25 Tonnes

PESO TARA: 8.15 Tonnes

PESO NETO: 8.10 Tonnes

PRODUCTO: 112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADA: 29.77 Tonnes

William Tobón

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 22960

PROVEEDOR: Frente 3. Valmed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

01-08-25

PLACA No: GTY 061 CAPACIDAD: 10 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A
Nit. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

William Tobón
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
