FECHA (D/M/A): 08-08-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 12,01 Ton.
ZONA: 1	FRENTE DE TRABAJO: 3
COMUNA: 4 Aranjuez	
BARRIO: La Piñuela	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 A.M.	1. Fuertes lluvias en el transcurso del medio día y la tarde. También alto tráfico vehicular.
TERMINACIÓN: 4:41 P.M.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado seco

TARDE: lluvias intermitentes.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

La jornada inicia demarcando las áreas a intervenir para posteriormente instalar la señalización Vial y el cerramiento de cada espacio dentro del segmento vial. Mientras se señalizaba el sitio de trabajo se acerca un ciudadano que se identifica como líder de la Comunidad y de manera enfática señala que se debe hacer un cierre total de la calle (segmento 5002919). Debido a la insistencia, el contratista procede a hacerlo de esta manera. Cabe resaltar que esta situación fue notificada al componente social y que la misma no surtió ningún inconveniente. Luego se inician las labores de demolición y acopio de escombros, para luego dar paso a la compactación de la base granular de cada superficie. En consiguiente se da paso a la imprimación con emulsión asfáltica.

Siendo las 10:00 a.m. llega la mezcla asfáltica (MDC-19 + RAP TIBIA) con una temperatura de 140°C. De este modo comienzan la instalación de la mezcla, que pasado el medio día se detiene debido a fuertes precipitaciones en la zona y que retrasan las actividades. Sin embargo y a pesar de las lluvias intermitentes durante la tarde se pudo instalar la totalidad de la mezcla en las áreas designadas.

Finalmente se realiza el cargue de escombros en la volqueta. Se le recomienda al Contratista que debe procurar realizar una buena limpieza en los sitios donde estuvieron acopiados los escombros, puesto que habrían residuos de los mismos y podrían revestir -

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: William Tobón Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Daniel Sánchez. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: Andy Anocya N	FIRMA:
NOMBRE: Andy Anocya N. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 08-08 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 12,01 Ton
ZONA: 1	FRENTE DE TRABAJO: 3
COMUNA: 4 Aranjuez	
BARRIO: La piñuela.	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO :	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
TERMINACIÓN:	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA
	TARDE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

algún peligro para los usvarios de la vía. El contratista acata dicha sugerencia perfeccionando el aseo en dichos lugares

Por último se retira la señalización y así concluye la jornada de trabajo.

Nota: En la dirección Cr 49 # 86 -07 se afectó la pintura del resalto existente en el sitio

5. FIRMAS

NOMBRE: William Tobón	Daniel Sánchez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: Andy Anaya N	FIRMA: Juan J. Bermudez R
NOMBRE: Andy Anaya N,	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

HA (D/M/A): 08-08-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	William Tobón	X		Vialmed 2025
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Cano	X		E y P
4	Rastrillero	Yovanny Cuesta	X		E y P
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Faber Quiroz	X		E y P
7	Ayudante	Jhon Jairo Valencia	X		E y P
8	Ayudante	Juan Esteban ~~Valz~~ Murillo	X		E y P
9	Ayudante	José Nilsen Saldarriaga	X		E y P
10	Ayudante	David Zapata Arboleda	X		E y P
11	Ayudante	Luis Carlos Castillo	X		E y P
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jhorleth Contreras	X		E y P
17	Operador compresor	Jhon Jairo Herrera	X		E y P
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Yair Alzate	X		E y P
29	Conductor Volqueta(s)	Alexander Yali.	X		E y P.

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna LP 6506	X		
2	Compresor	Doosan C 185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Honda FC 30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	WCS - 338	X		
16	Volqueta(s)	Freightliner 6TY - 061	X		
	1 Baño Móvil	S Y E.	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 08-08-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5002919	155388	1	Cl 86 # 49B 46	4,20	2,20	0,15	9,24	1,39	3,34
5002919	159028	2	Cl 86 # 49B-16	2,78	2,30	0,14	6,39	0,89	2,14
5002918	159029	3A	Cl 86 # 49B-58	1,20	2,65	0,15	3,18	0,48	1,15
		3B		2,40	1,70	0,15	4,08	0,61	1,46
5002910	159031	4	Cl 86 # 50-02	2,32	1,15	0,15	2,67	0,40	0,96
3000386	159024	5	CR 49 # 85 C-60	1,44	1,44	0,15	2,07	0,31	0,74
3000386	159034	6	CR 49 # 85 C-70	1,20	1,16	0,15	1,39	0,21	0,50
3000387	159035	7	CR 49 # 86-7	1,00	1,70	0,16	1,70	0,27	0,65
3000387.	159036.	8	CR 49 # 85 C-92.	2,00	1,30	0,17	2,60	0,44	1,06
TOTALES							33,32	5,00	12,00.

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233152	GTY-061	12,01	12,01	140°


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
22964	GTY-061	Sencilla	1	Procopal.

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 08-08-2025

10. ESQUEMAS

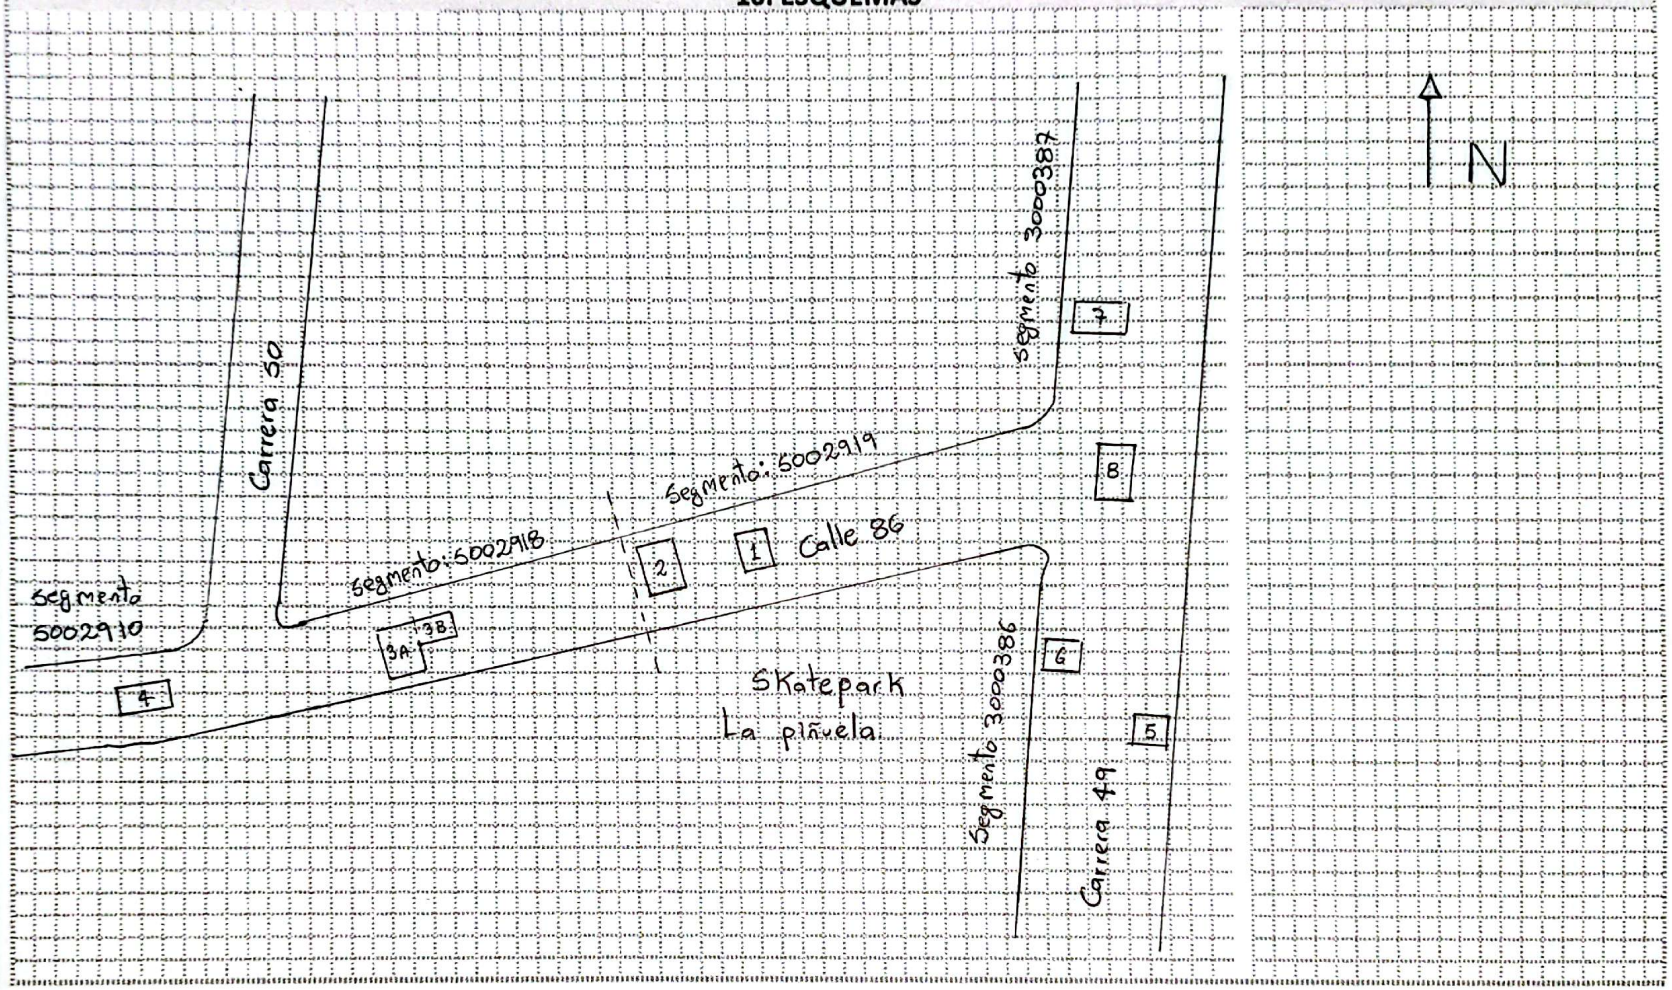

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	3	FRENTE	
RANGO:	1.	CANTIDAD:	12,00 Ton.	CANTIDAD:	
BARRIO	La Piñuela	DIRECCIÓN	C186 # 49B-46	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

E T y Pavimentos

PROCOPAL S.A.

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233152

FECHA: 08/08/2025

HORA: 9:04:45 AM

CONDUCTOR: ALEX YALI

PLACA: GTY061

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 20.20 Tonnes

PESO TARA: 8.19 Tonnes

PESO NETO: 12.01 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADA: 26.99 Tonnes

William Tobón

Daniel Sánchez. Interventora.

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 22964**

PROVEEDOR: Frente 3. V. Palmed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

08-08-2025

PLACA No: CAPACIDAD: 7.0 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A
Nit. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

William Tobón
Firma Autorizada

Daniel Sánchez
Interventoria.

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
