FECHA (D/M/A): 12-08-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 12,03 Ton

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA	2
COMUNA	5 Castilla
BARRIO	Tejelo
FRENTE DE TRABAJO:	3

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 A.M.	
TERMINACIÓN: 5:00 P.M.	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Despejado, seco
	TARDE: Soleado.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

De manera inicial se realizan las marcaciones correspondientes en los baches a ejecutar. De los cuales 3 son baches mediáticos. Los demás baches intervenidos corresponden a reportes de siro e identificados en el recorrido previo. Luego se da paso a la instalación del cerramiento y la señalización estipulada según el PMT, para después comenzar la demolición de las áreas afectadas.

Posterior a la demolición, se realiza la limpieza y compactación de la base granular para luego imprimarla con emulsión asfáltica.

Una vez imprimada cada área, se inicia la instalación de la mezcla asfáltica (MDC-19 + RAP TIBIA) la cual registró una temperatura de 140°C. Su hora de llegada a obra fue a las 10:00 A.M.

Por último se compacta la mezcla e inicia la recolección de escombros y aseo de cada sitio donde se trabajó, para finalmente retirar la señalización y dar por terminada la jornada.

Nota: Durante la tarde hubo acompañamiento por parte de la profesional SST contratista.

5. VISITANTES

GISELA ATENCIA. (SST)

6. FIRMAS

NOMBRE: Wilhom Tobón	Daniel Sánchez
Vo. Bo. ~~TECNÓLOGO~~ CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-08-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 12,03 Ton.
ZONA: 2	FRENTE DE TRABAJO: 3
COMUNA: 5 Castilla	
BARRIO: Tejelo	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 A.M.	
TERMINACIÓN: 5:00 P.M	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Despejado, seco
	TARDE: Soleado.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

observación: En los siguientes direcciones existieron afectaciones de señalización horizontal (Pictogramas):

* Cr 74 x Cl 115-03: Flecha de frente, giro a la derecha o a la izquierda.
* Cr 74 x Cl 113-37: Pictograma de Cruce escolar
* Cr 74 x Cl 115-27: Cruce peatonal (Cebra).

5. FIRMAS

NOMBRE: William Tobón	Daniel Sánchez
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Taso	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-08-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	William Tobón	X		Consorcio Vialmed
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Cano	X		EYP
4	Rastrillero	Yovanny Cuesta	X		EYP
5	Rastrillero				EYP
6	Ayudante	Faber Quiroz	X		EYP
7	Ayudante	Jhon Jairo Valencia	X		EYP
8	Ayudante	Juan Esteban Murillo	X		EYP
9	Ayudante	Jose Nilser Saldarriaga	X		EYP
10	Ayudante	David Zapata Arboleda	X		EYP
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jhorleth Contreras	X		EYP
17	Operador compresor	Jhon Jairo Herrera	X		EYP
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Yair Alzate	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Alexander Yali	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Husqvarna LP 6500	X		
2	Compresor	Doosan C-185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Honda FC 30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrotet NPR WCS-338	X		
16	Volqueta(s)	Freightliner 6TY-061	X		
	1 Baño Móvil	6 y E	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-08-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4003681	149658	1A	Cr 74 x Cl 112	1,8	4,0	0,14	7,20	1,01	2,42
		1B		2,5	1,1	0,14	2,75	0,39	0,94
4003656	159175	2	Cr 74 x Cl 113-37	1,3	3,77	0,15	4,90	0,74	1,78
4003654	159176	3A	Cr 74 x Cl 115-03	1,5	1,4	0,14	2,10	0,29	0,70
		3B		1,25	0,9	0,14	1,13	0,16	0,38
5016168	159183	4A	Cl 116 x Cr 74-13	1,85	2,05	0,14	3,79	0,53	1,27
		4B		0,8	1,2	0,14	0,96	0,13	0,31
4003654	159182	5	Cr 74 x Cl 115-35	1,92	2,5	0,14	4,80	0,67	1,61
4003654	159180	6	Cr 74 x Cl 115-27	2,4	2,23	0,15	5,35	0,80	1,92
4003654	159188	7.	Cr 74 x Cl 115-19	1,38	1,38	0,15	1,90	0,29	0,70
TOTALES							34,88	5,01	12,03

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233203	GTY-061	12,03	12,03	141°


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
22966	GTY-061	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12 - 08 - 2025

10. ESQUEMAS

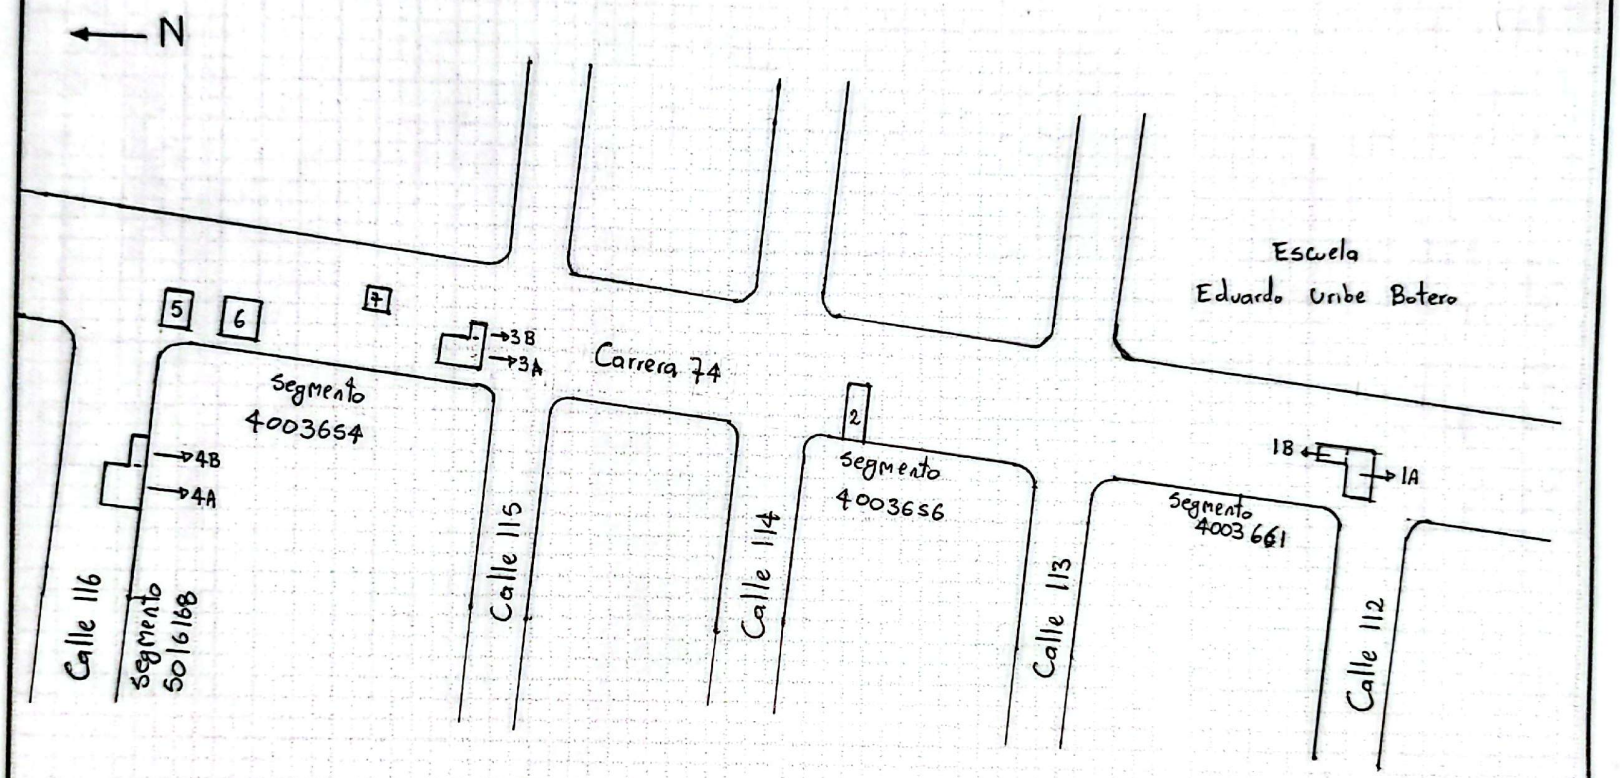

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	3	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	12,03 Ton.	CANTIDAD:	
BARRIO	Tejelo	DIRECCIÓN	CR 74 x Cl 112.	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233203

FECHA: 12/08/2025

HORA: 8:23:16 AM

CONDUCTOR: ALEX YALI

PLACA: GTY061

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 20.17 Tonnes

PESO TARA: 8.14 Tonnes

PESO NETO: 12.03 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIPIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 16.83 Tonnes

William Tobón

Daniel Sánchez
Interventoría

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 22966

PROVEEDOR: Frente 3 V. Olmed

VALE POR UN VIAJE: Escombros

PLACA No: GTY061 CAPACIDAD: M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

12-08-2025

PROCOPAL S.A.

13 AGO 2025

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

DESPACHOS - BASCULA
William Tobón
Firma Autorizada

Daniel Sánchez
Interventoría

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
