FECHA (D/M/A): 26/08/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1 N y O.	CANTIDAD: 16.25 Ton
ZONA: 3	FRENTE DE TRABAJO: 4
COMUNA: 10	
BARRIO: San Diego	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 7:00 P.M	N/A
TERMINACIÓN: 4:30 a.m	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: SECO

~~NOCHE~~ TARDE: SECO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se Procede a continuar con las actividades ya realizadas por la wadrilla #2. Dicha wadrilla realizo la demolicion y adecuacion alrededor de la socavacion, escarificacion, retiro y reemplazo de material, lleno y compactacion. La cuadrilla #4 ingresa a las 7:00 P.M, se trabaja en conjunto y se termina de realizar el lleno en capas con base granular y su correcta compactacion. Instalacion de señalizacion vertical y cerramiento del sitio de intervencion. La wadrilla #2 se retira de obra a las 11:15 P.M.

Imprimacion con emulsion asfaltica en frio.

Instalacion de mezcla MDC19 Tibia con Rap, Planta de mezcla PROCOPAL.

Nota: De la wadrilla #16 nos suministran 4.00 Ton de mezcla MSC19 Rap Tibia de la Planta de mezcla PAVIMENTAR, esto debido a que las medidas de la intervencion cuantifican una cantidad mayor a la mezcla Programada inicialmente. Compactacion mecanica.

- Recoleccion de escombro y limpieza del area intervenida.
- Retiro de señalizacion y cerramiento.

Nota: Se Paga la remision #233515 por RNOCTURNO y la remision #522218

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Manuel Delgado	Alejandra Arango Betancur
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE: José Luis Guzman. A
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 26/08/2025.

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Rutual

RANGO: 1N y O. | CANTIDAD:

ZONA: 3

COMUNA: 10

BARRIO: San Diego

FRENTE DE TRABAJO: 4

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO : 7:00 P.M

TERMINACIÓN: 4:30 a.m

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: NA

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Seco

~~TARDE~~ NOCHE: Seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se Pagara Por R O.

- Instrucción dado Por Supervisión.

5. FIRMAS

NOMBRE: Manuel Delgado Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Alejandra Arango Betancur Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26/08/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Manuel Delgado	Y		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	Dilan Yesid Lemus	X		
4	Rastrillero	Miguel Guerra	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	Albeiro Suarez	X		
7	Ayudante	Carlos Carmona	X		
8	Ayudante	Victor Mejia	X		
9	Ayudante	Deivi Pino	X		
10	Ayudante	Leimar Perea	X		
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	Carlos Ortega	X		
17	Operador compresor	Isaias Tobon	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	N/A			
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	Daniel Hernandez	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Giovani Castaño	X		
30	Conductor Volqueta	Fredy Mejia Pareja	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Husqvarna LP6500	X		
2	Compresor	Ingersoll Rand	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Honda	X		
11	Soplador	Ingersoll Rand	X		
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	TTT997 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	TJZ 305	X		
17	Volqueta	TRR 324 (doble troque)	X		

FECHA (D/M/A): 26/08/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2001068	160194	1A	CR38FINPAEC128+600-36m	6.61	3.86	0.20	25.51	5.10	12.25
"	"	1B		2.16	3.86	0.20	8.34	1.67	4.00
TOTALES							33.85	6.77	16.25

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233515	TJZ305	12.27		141°
522218.	TRK324	4.00		146°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23173	TJZ 305	sencilla	1	PROCOPAL.
—	—	doble	—	—

FECHA (D/M/A): 26/08/2025.

10. ESQUEMAS

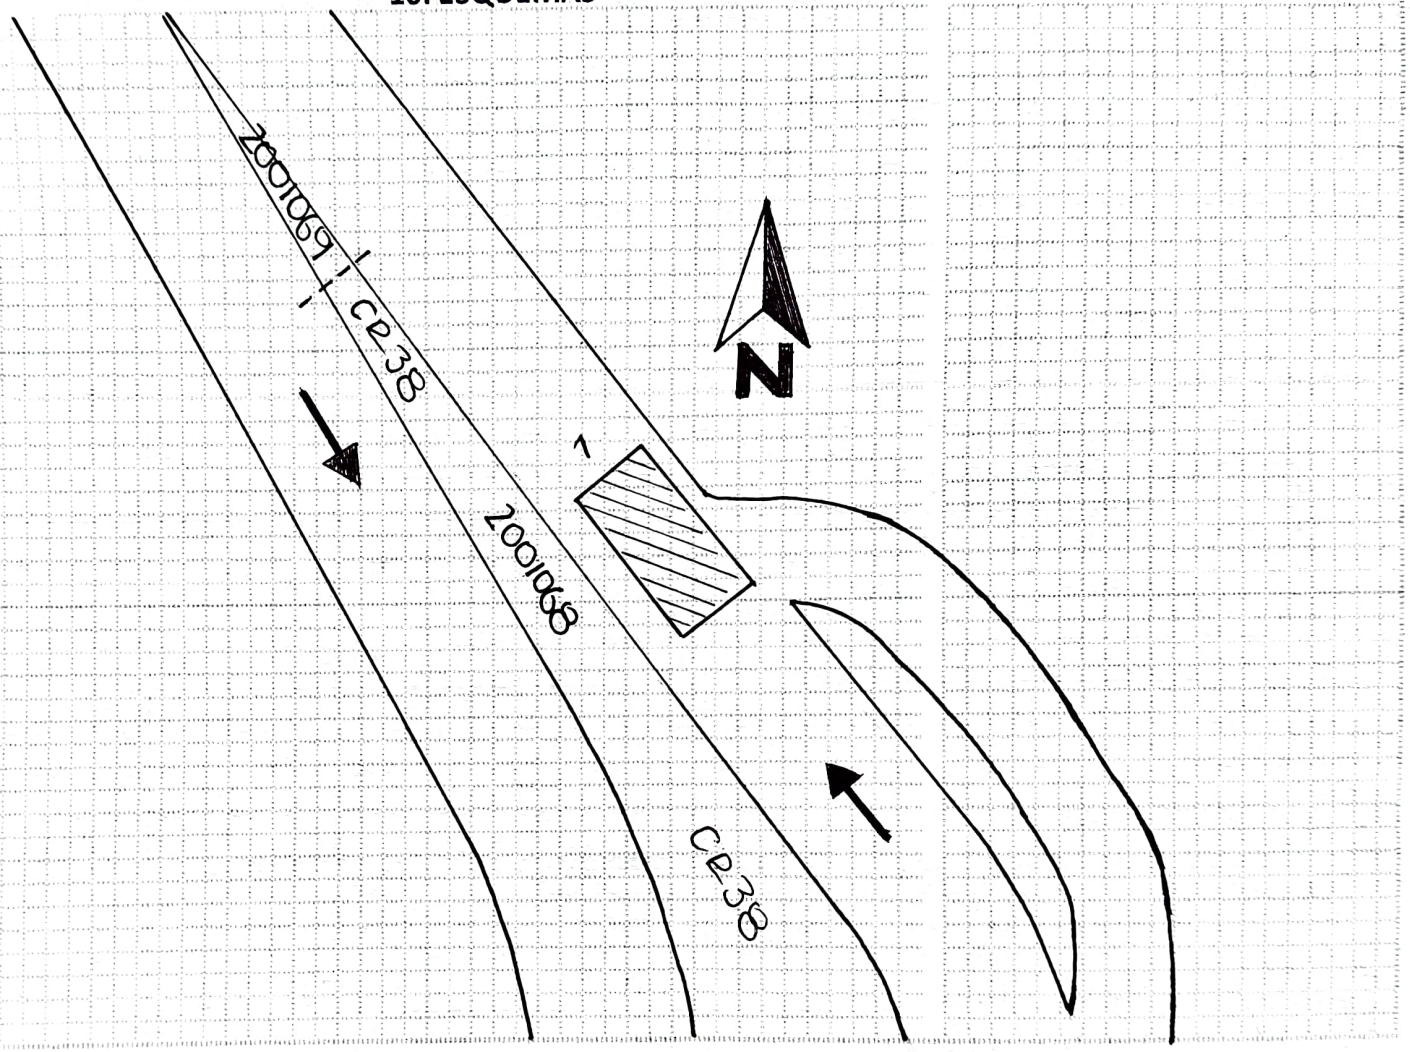

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Rutual	FRENTE	4	FRENTE	
RANGO:	1 NOCTURNO	CANTIDAD:	16.25 Ton.	CANTIDAD:	
BARRIO	San Diego	DIRECCIÓN	CR38 FIN PUE CL28 +600 - - 36m.	DIRECCIÓN	

2 ST y Pavis

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 233515

FECHA: 26/08/2025

HORA: 4:04:52 PM

CONDUCTOR: HENRY PUERTA

PLACA: TJZ305

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 20.34 Tonnes

PESO TARA: 8.07 Tonnes

PESO NETO: 12.27 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP NDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADA: 43.41 Tonnes

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522218
PLACA: TRK324
CONDUCTOR: JHON FREDY MEJIA PAREJA

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-19 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 4,00 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.710,00
PESO BRUTO:15.710,00

ENTRADA: 26 ago 2025 - 09:22 p.
SALIDA: 26 ago 2025 - 09:22 p.
TEMPERATURA:146,00

Santiago Lopez C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Jhon Mejia
FIRMA DEL CONDUCTOR

Manuel Delgado
FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Cuadrilla Oscar Orozco
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Oscar Orozco

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23173**

PROCOPAL S.A. 27 AGO 2025

PROVEEDOR: procopal

VALE POR UN VIAJE: Escombro

PLACA No: TJZ305 CAPACIDAD: _____ M3

DESTINO: procopal

RECIBIDO POR: _____

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuel Delgado.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia
