FECHA (D/M/A): 15-08-2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 10.08 TN
ZONA: 2	FRENTE DE TRABAJO: 5
COMUNA: 9 Castilla	
BARRIO: Tricentenario	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO : 8:00 pm
TERMINACIÓN: 5:30 am

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Jornada nocturna.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:
MAÑANA: Seco - Lluvias desde 10:30 pm
TARDE:
noche

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Instalación señalización vertical GMT
- Demarcación de las áreas a intervenir
- Inicia demolición y guacheo material de escombros
- Conformación y compactación base granular existente
- Imprimación con emulsión asfáltica
- Cargue temperatura mezcla asfáltica MDC-19 con RAP fibra
- Aplicación y compactación mezcla asfáltica MDC-19 con RAP fibra
- Aseo y limpieza de las áreas intervenidas
- Retiro de la señalización instalada
- Se solicita al contratista la reparación de la señalización instalada peso peatonal.
- Se atienden solicitudes del secretario de infraestructura.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Pablo Ochoa	Jaimes S Taborda
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Pablo Toro	NOMBRE: Juan J. Bermúdez
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15-08-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Juan Pablo Ochoa	X		Consorcio Vial MED 2025
2	Encargado				
3	Liguero	Jorge Andres Mosquera Gomez	X		EYP
4	Rastrillero	Jose Arley Duque Duarte	X		EYP
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Marlon Martinez Suarez	X		EYP
7	Ayudante	Juan David Palacios Quinto	X		EYP
8	Ayudante	Francisco Javier Toro Tobón	X		EYP
9	Ayudante	Jose Alejandro Ortalobes	X		EYP
10	Ayudante	Thomas Cuadros Cordoba	X		EYP
11	Ayudante	Eduardo Enriquez Mesa Rodriguez	X		EYP
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Juan David San Martin Cordoba	X		EYP
17	Operador compresor	Ever Usoga	X		H&H
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Héctor Darío Pareja	X		H&H
29	Conductor Volqueta(s)	Edison Vali	X		Ingeomix

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Dynapac - CP 590	X		
2	Compresor	Ingersoll rand - 185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo imprimación	Mamota	X		
10	Placa vibratoria	Honda FC-30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet - NWG 711 - 2010	X		
16	Volqueta(s)	Freightliner - WLW 714	X		
	Botiquín móvil	SPE	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 21-08-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
1000059	159374	1	CR 6A CL 77-1200 CL 101C	5.54	3.30	0.13	18.28	2.38	5.71
1000055	159477	2	CR 64 CL 77-1200 CL 101C	3.19	2.60	0.11	8.19	0.90	2.16
1000063	159478	3	CR 63 CL 113 CL 113-147	7.00	2.20	0.06	19.40	0.92	2.21
								4.20	10.08
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233308	WLW714	10.08	10.08	140


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23117	WLW714	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15-08-2025.

10. ESQUEMAS

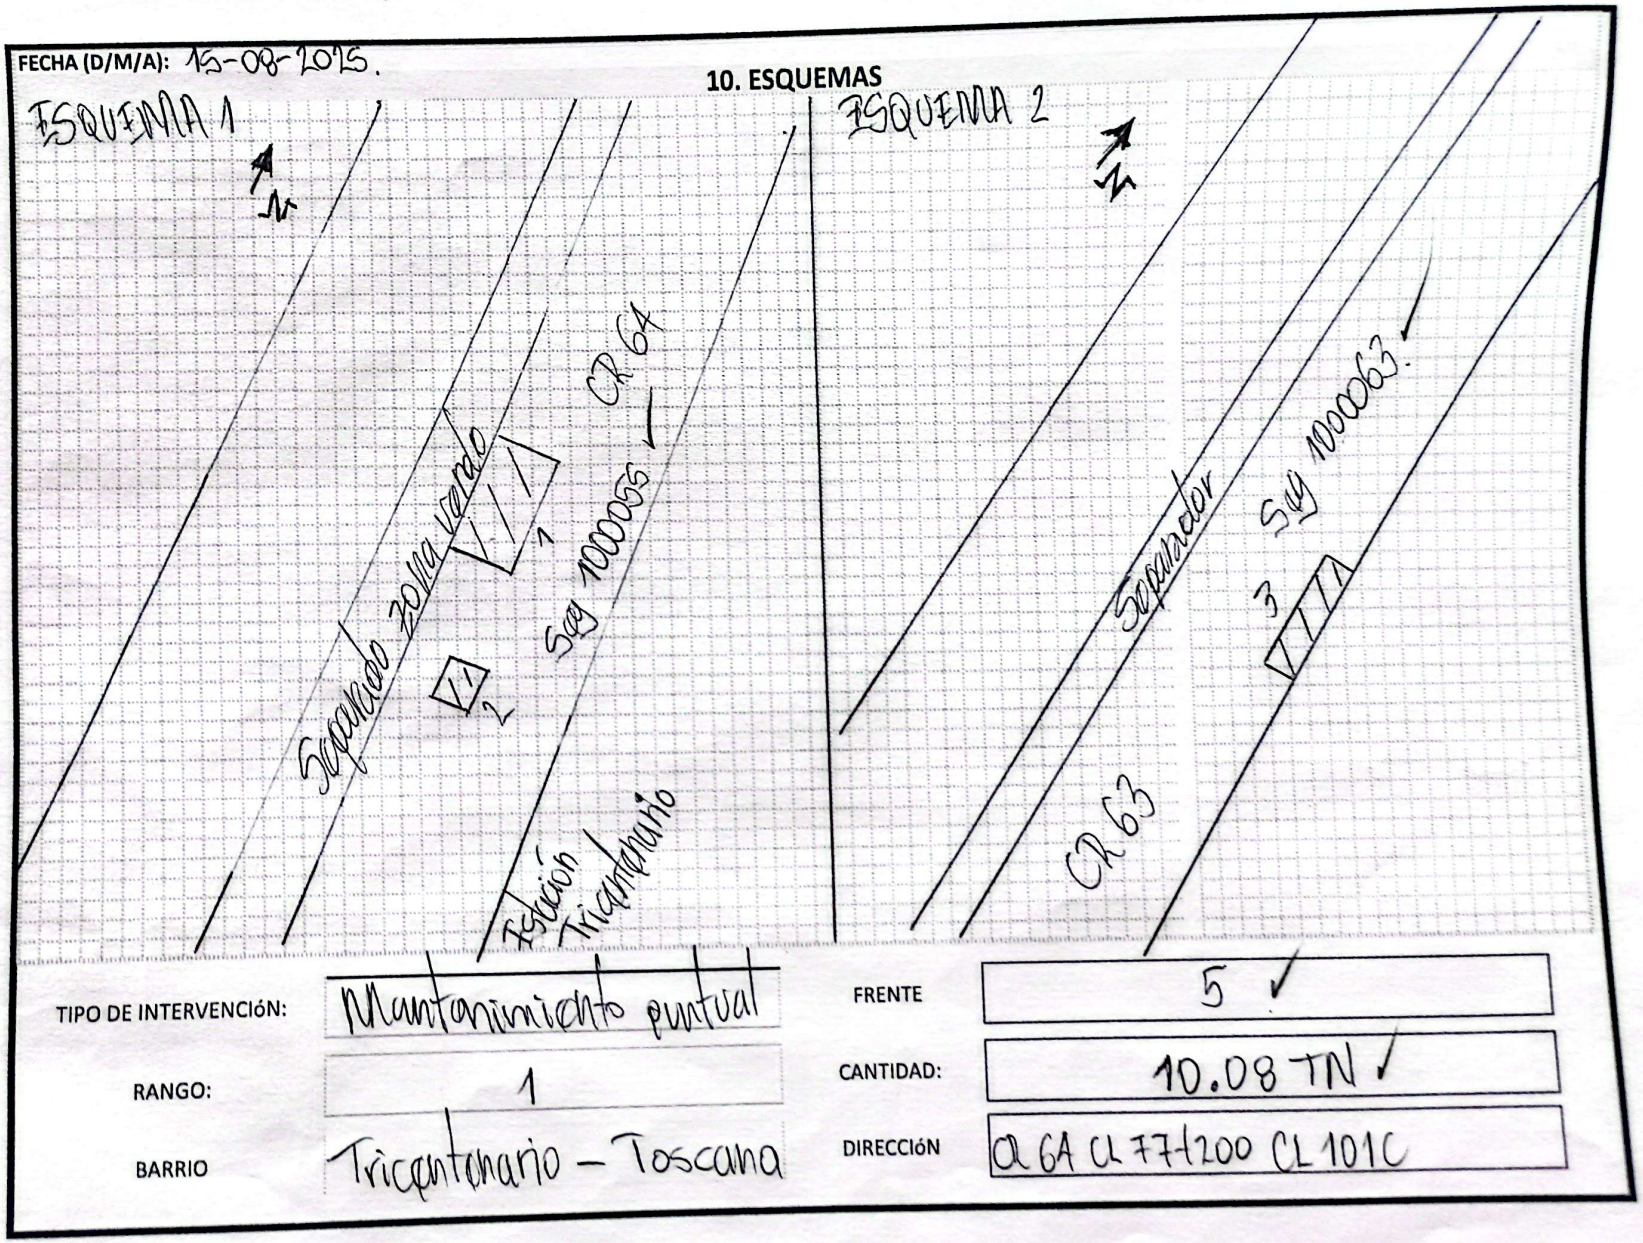

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntual	FRENTE	5 ✓
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.08 TN ✓
BARRIO	Tricentenario – Toscana	DIRECCIÓN	CR 64 CL 77-1200 CL 101C

Powered by CamScanner

EST 5 PAV 02

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 233308

FECHA: 15/08/2025 TRICENTENARIO PARALELA

HORA: 7:18:10 PM

CONDUCTOR: EDISON YALI

PLACA: WLW714

James S. Tabares Interventoría

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906398

J. Pablo Ochoa

PESO BRUTO: 18.12 Tonnes

PESO TARA: 8.04 Tonnes

PESO NETO: 10.08 Tonnes

PRODUCTO:112 Edison Yali 15/08/2025

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 47.11 Tonnes

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS

Nº 23117

PROVEEDOR: Frente #5 - Vial Med

VALE POR UN VIAJE: Escombro

15-08-2025

PLACA No: WLW 714 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

Tarifa Estándar Interventoría

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A
Nit. 800.006.398-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Pablo Ochoa

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
