FECHA (D/M/A): 29-08-2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,08 TN

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

ZONA	1	FRENTE DE TRABAJO:	5
COMUNA	4 Aranjuez		
BARRIO	0405 Moravia		

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 8:00 pm	Jornada nocturna
TERMINACIÓN: 5:30 am	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA	Seco
	NOCHE TARDE	Seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se realiza instalación señalización vertical PMT
- Demarcación de las áreas a intervenir.
- Inicia demolición y evacuación material demolido.
- Conformación y compactación base granular existente.
- Imprimación con emulsión asfáltica.
- Cargue y temperatura mezcla asfáltica MDC-19 con RAP tibia 150°C
- Tendido y compactación mezcla asfáltica MDC-19 con RAP tibia
- Aseo y limpieza de las áreas intervenidas
- Retiro de la señalización instalada.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juan Pablo Ochoa	James S Taborda
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Ruo	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 29-08-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Juan Pablo Ochoa	X		Consorcio Vial MED 2025
2	Encargado				
3	Liguero	Jorge Andres Mosquera Gómez	X		EYP
4	Rastrillero	Jose Andy Duque Duarte	X		EYP
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Marlon Martinez Suarez	X		EYP
7	Ayudante	Juan David Palacios Quinto	X		EYP
8	Ayudante	Francisco Javier Tobón Tobón	X		EYP
9	Ayudante	Jose Alejandro Villalobos	X		EYP
10	Ayudante	Thomar Cadavid Cordoba		X	EYP
11	Ayudante	Eduardo Enrique Mejia Rodriguez	X		EYP
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Juan David San Martin Cordoba	X		EYP
17	Operador compresor	Ever Usuga	X		HYH
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Héctor Dario Pareja	X		HYH
29	Conductor Volqueta(s)	Alex Yali	X		Ingeonex

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Doosan	X		
2	Compresor	Doosan - 185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Facom FC-30	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet - TNG F12 - 2010	X		
16	Volqueta(s)	Freightliner - WLW - 714	X		
	01 baño movil	SYC	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 29-08-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
1000125	160049	1	CR 61 CL 78 CL 78 #200	5.29	3.10	0.16	16.28	2.60	6.24
1000125	160308	2	CR 60 CL 78 CL 78 #200	2.45	3.10	0.18	7.60	1.37	3.29
1000126	160309	3	CR 61 CL 78 #200 CL 85	1.13	1.15	0.18	1.30	0.23	0.55
TOTALES								4.20	10.08

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233613	GTY061	10.09	10.09	140


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23126	GTY061	Sencilla	1	Principal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 29-08-2025

10. ESQUEMAS

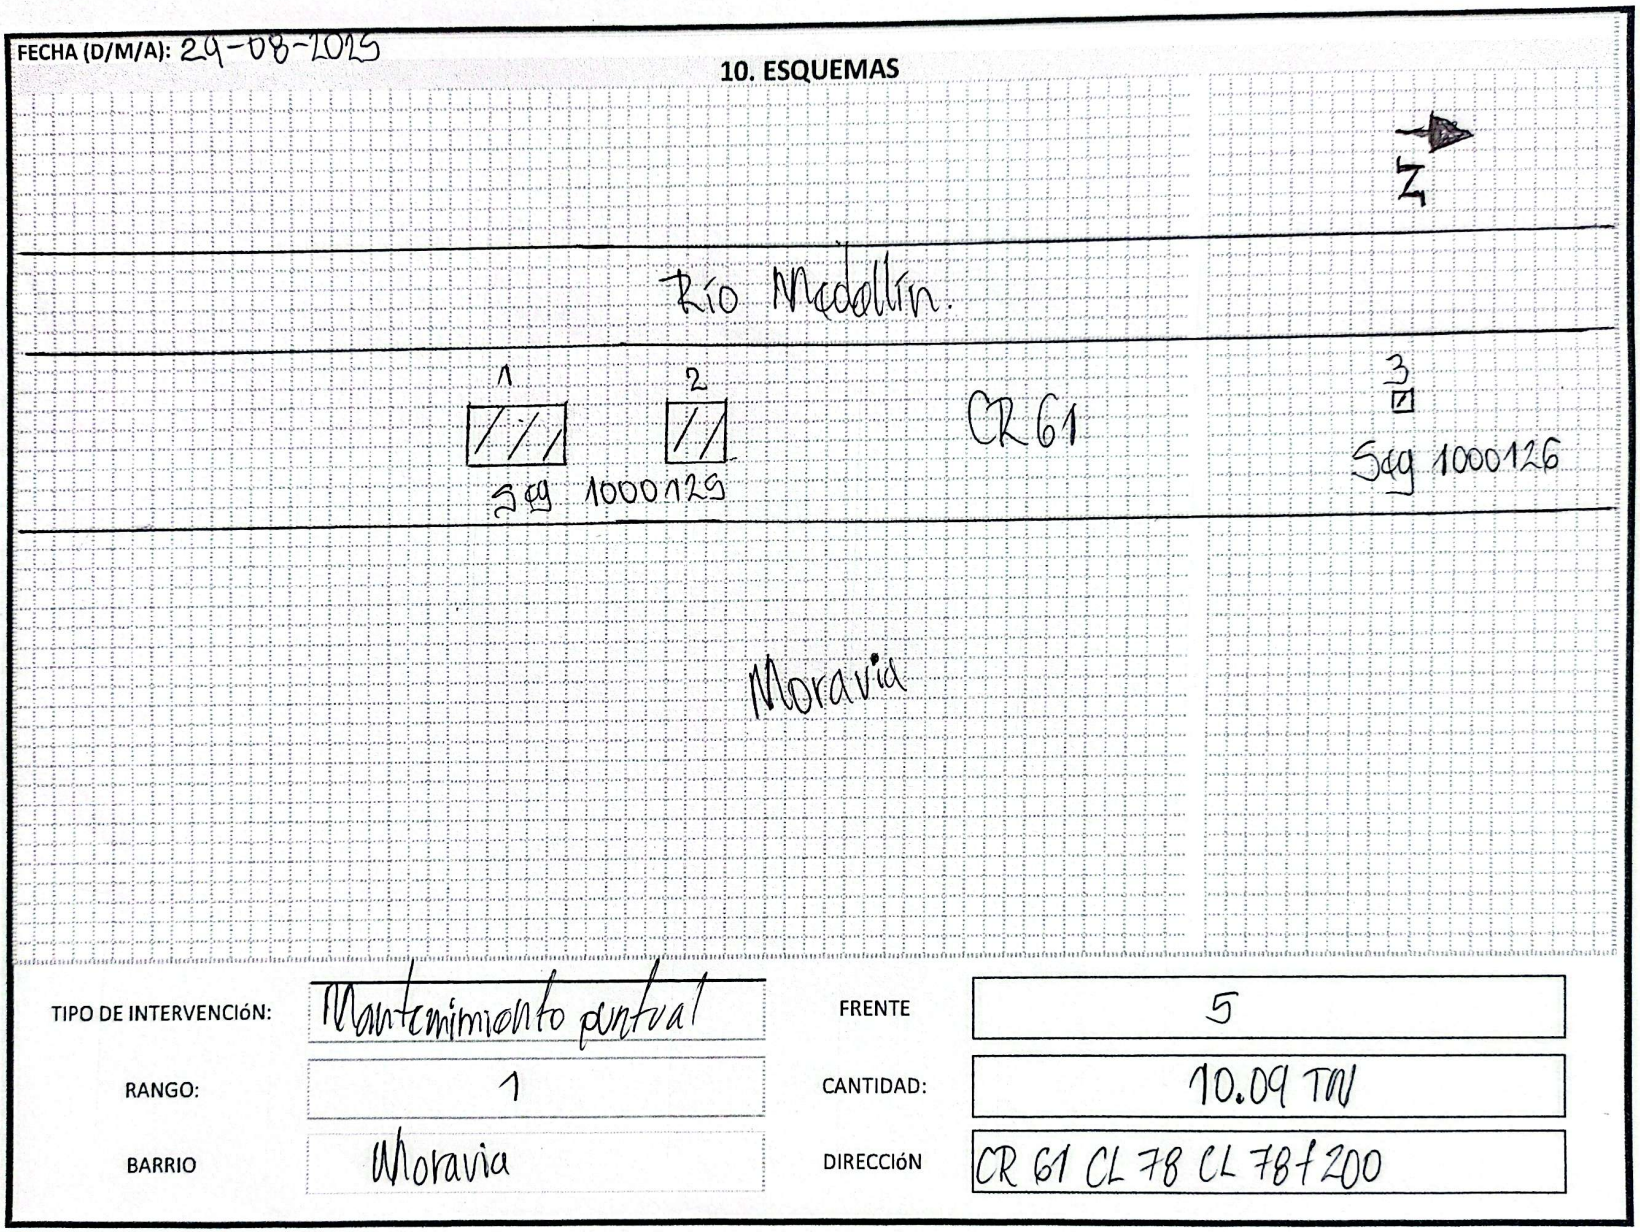

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntual	FRENTE	5
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.09 TN
BARRIO	Moravia	DIRECCIÓN	CR 61 CL 78 CL 78 f 200

Powered by CamScanner

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 233613

FECHA: 29/08/2025

HORA: 4:03:49 PM

CONDUCTOR: ALEX YALI

PLACA: GTY061

James S Taborda Interventoría.

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

Pablo Ochoa

PESO BRUTO: 18.31 Toneles

PESO TARA: 8.22 Toneles

PESO NETO: 10.09 Toneles

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 9

TOTAL DESPACHADA: 90.05 Toneles

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23126**

PROVEEDOR: Frente #5 - Vial Mco

VALE POR UN VIAJE: Escombros

29-09-2025

PLACA No: GTY 061 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: James S Taborda Interventoría

PROCOPAL S.A.

01 SEP 2025

DESPACHOS - BASCULA

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

J Pablo

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
