FECHA (D/M/A): 22/08/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Bache

RANGO: 1 CANTIDAD: (12,05) 11,29

ZONA: 2

COMUNA: 7

BARRIO: SAN GERMAN

FRENTE DE TRABAJO: 7

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:00 AM

TERMINACIÓN: 18 30 PM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: lluvias 8:00 / 9:10 AM

TARDE: lluvias 12:40 PM / 1:0 PM.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega al lugar 9:00 AM, Camion listo y personal 7:45. Se espera por lluvias. al escampar personal se dispone a la instalación de señalización y Realizar cerramiento del punto solicitado por la SIT. en el Cero de la Glorieta. El Cual se envia marcado al Residente de Interventoria para su aprobación. Se empieza con demolición y al 2do Hueco nuevamente lluvias a las 12:40 pm Cuando se encontraban en la 2da capa de Mezcla de Bache #1. Vaciado una parte de Mezcla en lona. La Mezcla al Vaciado Cogs temperatura de 118° en obra.

* El Eje vial que se tenia se ~~Tolleon~~ a las 10:15 AM para otra cuadrilla, ya que el Residente del contratista dice que no se necesitaba sacando ayudante para esta actividad. Al terminar Actividad de Aplicación de Mezcla que habia en la Volqueta en el Hueco #2 y 3 no se pudo Realizar mas porque mezcla que habia en lona no contaba con buena temperatura, estaba para y fria

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Higuita Valencia Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: Tatiana Henao Perez. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA Cristian D. Cano A.
NOMBRE: Carlos Toro Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Higuita.	✓		
2	Encargado	Jaime Herrera	✓		
3	Liguero	Brayan Ochoa	✓		
4	Rastrillero	Jairan Galeano	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante	David perez	✓		
8	Ayudante	Omar Alejandro	✓		
9	Ayudante	Alvaro	✓		
10	Ayudante	mateo mosquera	✓		
11	Ayudante	Alexander mosquera	✓		
12	Ayudante	Edinson sanchez	✓		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio sanchez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Luis fernando montoya	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Jhon Jairo Gutierrez	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Dynapac	✓		
2	Compresor	Ingersoll	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet TRI 504	✓		
16	Volqueta(s)	TTO 2015	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 22/08/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5029833	159377	14	CR 77 CL 63	5,4	3,4	0,14	18,36	2,57	6,17
5029833		15	CR 77 CL 63	4,08	1,7	0,14	6,94	0,97	2,33
5029833	156981	2	CR 77 60-45	1,75	1,77	0,13	3,10	0,40	0,97
5029835	159804	3	CL 63 76A-38	4,85	1,2	0,13	5,82	0,76	1,82
TOTALES									11,29 ✓

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
521757	TTO 095	12,05 ✓		145°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23320	TTO095	Sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

20250822 07:13

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 521757
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,05 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V
IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.410,00
PESO BRUTO:19.460,00

ENTRADA: 22 ago 2025 -m07:14 a.
SALIDA: 22 ago 2025 - m07:14 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%

20250823 06:19

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23320.
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON STIVEN VARGAS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.410,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 23 ago 2025 -m06:20 a.
SALIDA: 23 ago 2025 - m06:20 a.
TEMPERATURA 0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA


FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 17840
Peso tara : 7410
Peso neto : 10430

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 22/08/2025

10. ESQUEMAS

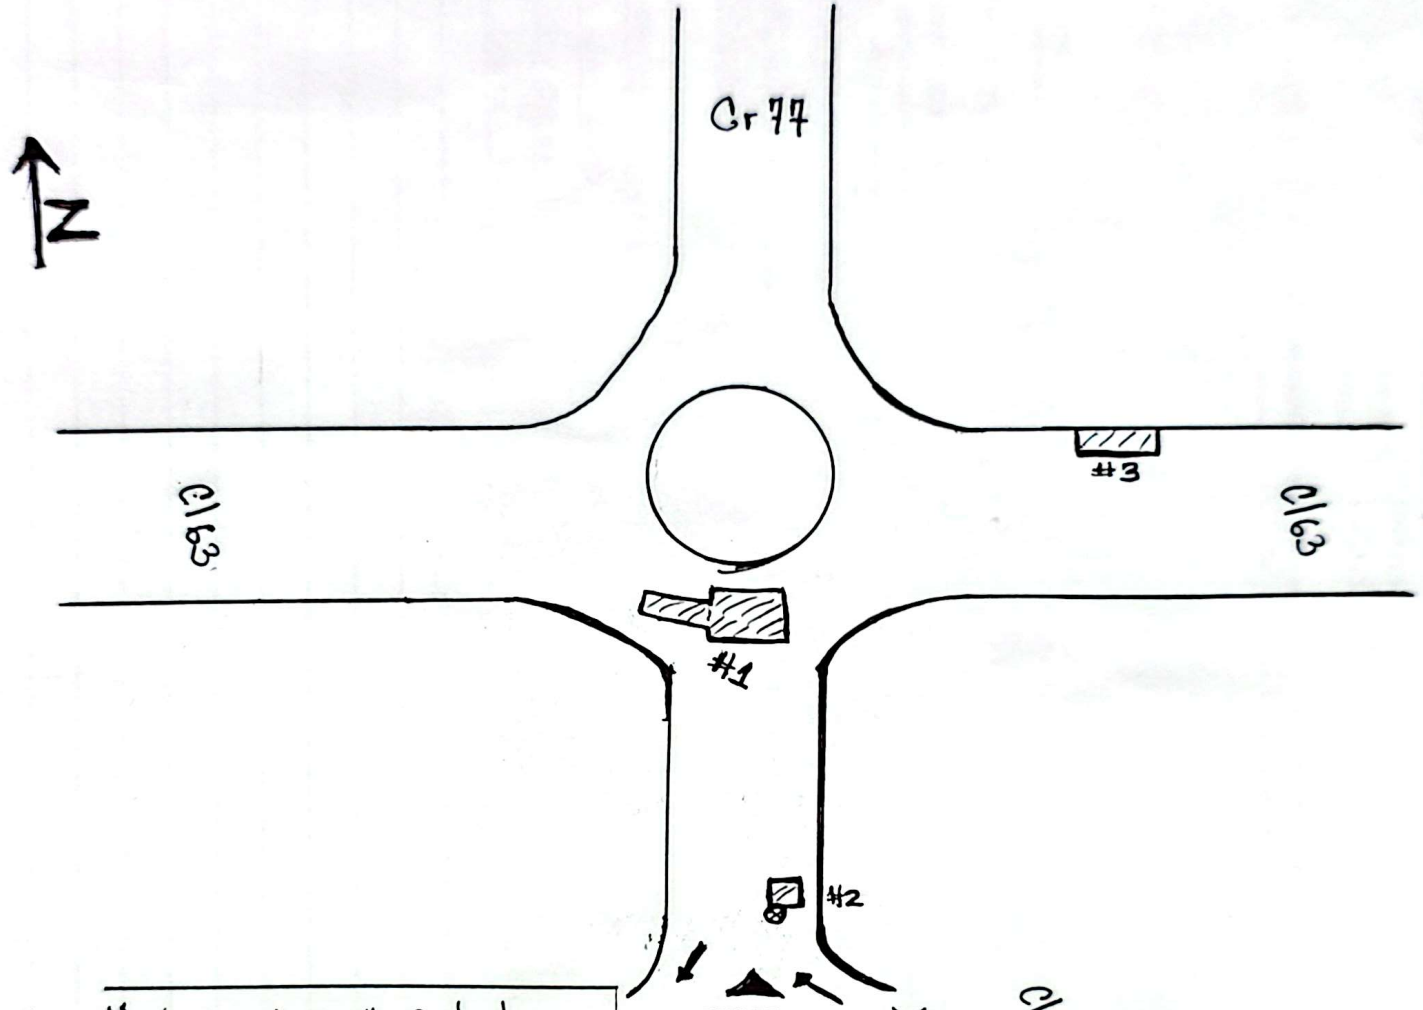

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Pacte Portical	FRENTE	17 C/B	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,29 ✓	CANTIDAD:	
BARRIO	San Germán	DIRECCIÓN	CR 77 Cl 63	DIRECCIÓN	

Powered by CamScanner

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS

Nº 23320

PROVEEDOR: SOM - 2058

VALE POR UN VIAJE: Escombro. Frente #17

22/08/2025

PLACA No: TTO 095 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Pavimentar

RECIBIDO POR: Juan Diego

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Santiago H.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 22/06/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):

RANGO: 1 CANTIDAD:

ZONA 1

COMUNA 7

BARRIO San Germán

FRENTE DE TRABAJO: 7

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO : 8:00AM

TERMINACIÓN: 1:30pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA lluvia

TARDE lluvia

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Con temperatura tomada a 65° el cual fue descontado 760 kg la cual no fue instalada. Cargado de escombros en volqueta y camión con equipos. Actividades terminada a las 1:30pm

Se realiza sugerencia de ampliación del bache #3 debido a que limita con un área que presenta perdida de finos y se generan empozamientos de agua lluvia; lo cual puede afectar la durabilidad y estabilidad del bache realizado. Santiago Higuita.

5. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Higuita Valencia Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Tatiana Henao Perez Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner
