FECHA (D/M/A): 26/08/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Rocha Puntual		
RANGO:		CANTIDAD:	10.06 ✓
ZONA	2	FRENTE DE TRABAJO:	7
COMUNA	7		
BARRIO	Santa Margarita		

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:30 AM	
TERMINACIÓN: 1:30 pm	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleada
	TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega a obra 7:00 AM, Comen 7:30 y personal se dispone a organizar señalización y cargar de herramienta. Todo coordinado con la SST. Se comienza con la demarcación y se tiene la UTA con 2 controladores viales, se empieza con limpieza y se compacta se toma medidas y Espesor con Hilo. Se emulsiona y llega mezcla en Volqueta MDCR-220 Rep 9 temperatura en obra 145° Se instala y compacta

Vota y queda un tramo sin terminar 2da Capa 3 x 4.20 el cual se realizara el día de mañana queda con rampa y marcaciones.

Actividad terminada con cargue de escombro y volqueta Agmios con señalizaciones y Herramientas y equipos A las 1:30 pm.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Higuita Valencia	Tatiana Henao Perez.
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA Cristian D. Giraldo A.
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Hoyos	✓		
2	Encargado	Jaime Herrera	✓		
3	Liguero	Brayan Cortes	✓		
4	Rastrillero	Julian Galeano	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante	David Perez	✓		
8	Ayudante	Alexander Mosquera	✓		
9	Ayudante	Mateo Mosquera	✓		
10	Ayudante	Edwards Sanchez	✓		
11	Ayudante	Alvaro	✓		
12	Ayudante	Omar Alejandro	✓		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Cardona	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Luis Fernando Montoya	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Julian Mateo Gutierrez	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Dynapac	✓		
2	Compresor	Navarra	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	TRT 804	—		
16	Volqueta(s)	TTO 095	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2001532	159927	1A	CL63 103C-44	7.6	4.2	0.12	31.92	3,83	9.19
		1B		1.18	2.2	0.14	2.6	0.36	0.87
TOTALES									10.06

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
922058	TTO 095	10.06		147°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23323	TTO 095	Sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

20250826 09:07

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522058
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,06 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA
IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.410,00
PESO BRUTO:17.470,00

ENTRADA: 26 ago 2025 -m09:08 a.
SALIDA: 26 ago 2025 - m09:08 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20250827 07:18

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23323.
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON STIVEN VARGAS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.410,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 27 ago 2025 -m07:19 a.
SALIDA: 27 ago 2025 - m07:19 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

CUADR
HUMED
OBSER
Sum.
Peso
Peso
Peso

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23323**

PROVEEDOR: SUM - 2058

VALE POR UN VIAJE: Escombro. Frente #7

26/08/2025

PLACA No: TTO 095 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Pavimentar

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Santiago H.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS

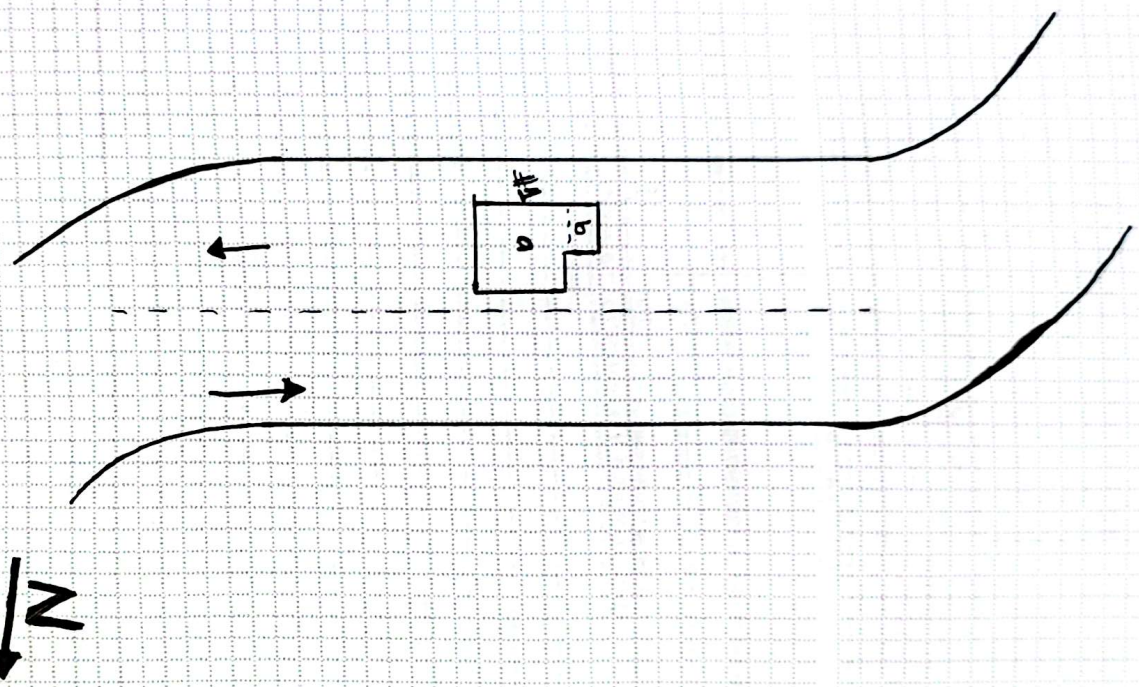

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Bache Rutual	FRENTE	7
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,06. ✓
BARRIO	Santa Margarita	DIRECCIÓN	Cl 63 -103C - 44.

Powered by CamScanner
