FECHA (D/M/A): 01 agosto 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 10,07
ZONA	6
COMUNA	14 Poblado
BARRIO	Manila – villa Carlota
FRENTE DE TRABAJO:	8

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 AM	la Jornada estaba Compuesta Por cuatro direcciones Para un total de 7 baches
TERMINACIÓN: 8:30 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: soleado

TARDE: soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

se inicia la Jornada Con total normalidad, Instalacion de señales verticales, cierre de uno de los Carriles de la carrera 43D, y se instala el baño con su respectivo punto ecologico.
en la CR43D Con calle 11 se realiza el primer bache acompañado de una mitigacion, mas adelante sobre la CR43C sobre el puente se realiza la segunda intervencion para continuar por la calle 11 y luego nuevamente sobre la 43D entre la el 10 y 11 a/ frente del restaurante mamasita.
se realiza socializacion por parte de los contratistas y se les pide que por favor mejoren el cerramiento para dividir la zona vehicular de la zona de trabajo.
el contratista toma temperatura.
siendo las 3:50 pm se realiza recorrido con el residente Juan guillermo de la contratista Para mirar el ultimo bache ubicado en la carrera 43D con calle 16 el cual se inicia a eso de la 5:40 pm.
el contratista hace uso de los toros para descargar la totalidad de la mezcla e iniciar con el cargue y la recolecion escombro y señales verticas.
se Finaliza la Jornada con el bache 7, se realiza aseo por parte de la contratista y se retiran las señales verticales de la CR43B con C16, Antes de retirarse de la zona el Contratista siendo las 8:00 pm hace entrega de la comida para los trabajadores.
se Finaliza la Jornada a la 8:30 pm con total normalidad.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luis Daniel P.V. – Luis daniel delatorre Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Sebastian villegas Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA JRG – Juan guillermo	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Eduardo Restrepo Lopez Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luis daniel de la Rosa	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Breymer smith zapata	✓		
4	Rastrillero	Juan david banegas	✓		
5	Rastrillero		✓		
6	Ayudante	Luis emiro mosquera	✓		
7	Ayudante	Jaime alberto ehica	✓		
8	Ayudante	Johan steven renteria	✓		
9	Ayudante	Pedro luis roble	✓		
10	Ayudante	Sebastian sanchez	✓		
11	Ayudante	ackeis de jesus montero	✓		
12	Ayudante	Jose david Quejada	✓		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Kevin Correa	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	alirio david	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Elmer alexander Galvis	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Hasqvarna	✓		
2	Compresor	Kayser			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Maimita	✓		
10	Placa vibratoria	Fecon FC30	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	TS2903	✓		
16	Volqueta(s)	SS2557 Genalla	✓		
	Baño movil	SY E	✓		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001405	156559	1	CR 47D # 11-47	1,85	2,45	0,12	4,53	0,54	1,31
2000890	158694	2	CL 11 # 43B-71	5,60	2,25	0,09	12,60	0,88	2,12
5019578	158695	3	CL 11 # 43B-50	1,10	2,05	0,17	2,26	0,38	0,92
5003947	158680	4	CR43D # 10-44	2,23	1,11	0,12	2,48	0,30	0,71
5003947	158681	5	CR43D # 10-50	1,35	1,43	0,12	1,93	0123	0,56
5003947	158682	6	CR43D # 10-84	2,70	1,50	0,17	4,05	0,69	1,65
5003891	158728	7	CR 43B & CL 16	2,10	4,10	0,13	8,61	1,12	2,69
TOTALES								4,15	9,95

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
520751	SS2557	10,07	10,07	147	23205	SS2 557	sencilla	1	[illegible]

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): agosto 01 2025

10. ESQUEMAS

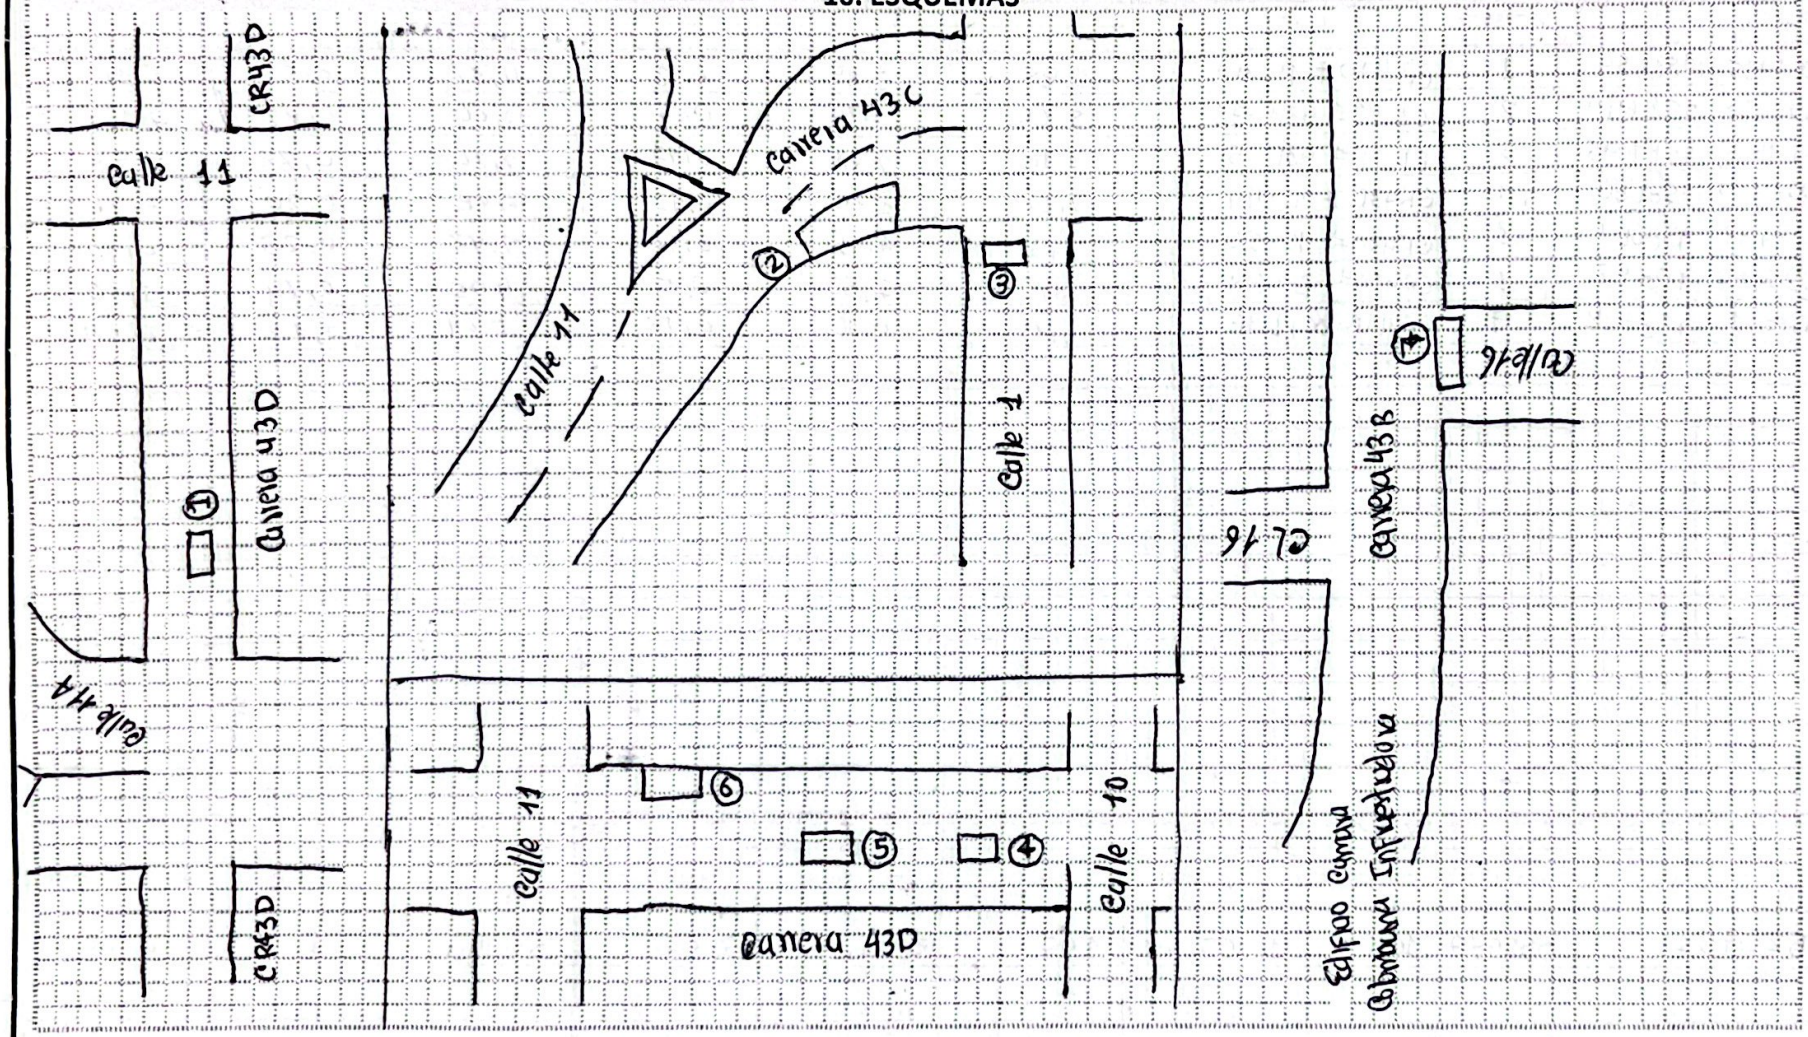

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	8	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	9,95	CANTIDAD:	
BARRIO	Manila	DIRECCIÓN	CR43D#11,47	DIRECCIÓN	

Scanned with CamScanner

20250801 09:47
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 520751
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER ALEXANDER GALVIS

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,07 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055

PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:17.220,00

ENTRADA: 01 ago 2025 - 09:49 a.
SALIDA: 01 ago 2025 - 09:49 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Elmer Galvis

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

Estructuras y Pavimentos SAS

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23205**

PROVEEDOR: Viralmed F-8
VALE POR UN VIAJE: Escombros
PLACA No: SSZ 557 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Principal
RECIBIDO POR:

01/08/25

COPIA
PAVIMENTAR S.A
NIT 800.040.014-6

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Scanned with CamScanner
