FECHA (D/M/A): 4 agosto 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Pontal		
RANGO:	4	CANTIDAD:	10,02 ton
ZONA	5	FRENTE DE TRABAJO:	8
COMUNA	14		
BARRIO	Los naranjos		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 7:00 am	Baches dispersos
TERMINACIÓN: 6:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada

TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inicia la jornada con la instalacion de las señales verticas y cerramiento de uno de los carriles para iniciar con la demolicion del primer bache y asi sucesivamente con los siguientes baches.

Se observa dos capas de pavimento pero ambas estan fracturadas, se le pide al contratista Demoler hasta encontrar la base.

Se le hace la observacion al contratista que debe mejorar las juntas y el acabado de los baches.

se realiza recorrido con el residente Joan Guillermo para observar la jornada del siguiente dia

se realiza aseo y se procede a desintalar las señales verticales

se realiza cargue de todos los elementos de trabajo en el camion y se da por terminado la jornada.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luis Fernando Vélez	Sebastian villegas
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Guillermo Rodriguez	NOMBRE: Edwards Rodriguez
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 4 agosto 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luis daniel de la Rosa	✓		Consorcio vial med 25
2	Encargado				
3	Liguero	Breymer smith Zapata	✓		Consorcio vial med 25
4	Rastrillero	Juan David Vanegas	✓		Consorcio vial med 25
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jose David Querida	✓		Consorcio vial med 2025
7	Ayudante	Adelis robles	✓		Consorcio vial med 2025
8	Ayudante	Sebastian Bedoya	✓		Consorcio vial med 2025
9	Ayudante	steven Pantera	✓		Consorcio vial med 2025
10	Ayudante	Jaime alberto	✓		Consorcio vial med 2025
11	Ayudante	Elkin ozuna	✓		Consorcio vial med 2025
12	Ayudante	Pedro Robles	✓		Consorcio vial med 2025
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Kevin Olivea	✓		Consorcio vial med 2025
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Alvio David Villa	✓		Consorcio vial med 2025
29	Conductor Volqueta(s)	Elmer alexander Galviz	✓		Consorcio vial med 2025

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Husqvarna	✓		
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Mamita	✓		
10	Placa vibratoria	Fecon FC	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	T52903	✓		
16	Volqueta(s)	SSZ 553 Senalla	✓		
	Baño Movil	SYE			

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 4 agosto 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5010097	151166	1A	Cl 2 # 17-21	8,60	1,30	0,13	8,58	1,12	2,68
5010097	151166	1B	Cl 2 # 17-21	1,73	1,63	0,13	2,82	0,37	0,88
5010097	155445	2A	Cl 2# 17-162	1,53	1,80	0,13	2,75	0,36	0,86
5010097	155445	2B	Cl 2# 17-162	4,90	1,09	0,13	5,34	0,69	1,67
5010097	158829	3	Cl 2# 17-162 +25m	4,73	2,02	0,11	9,55	1,05	2,52
5010097	152333	4	Cl 2# 17-169	2,33	1,21	0,11	2,82	0,31	0,74
5010097	158839	5	Cl 2# 17-66	2,00	1,15	0,12	2,30	0,28	0,66
TOTALES								4,17	10,01

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
520809	SSZ557	10,02	10,02	145


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23206	SSZ552	Sencilla	1	Parimentar

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 4 agosto 2025

10. ESQUEMAS

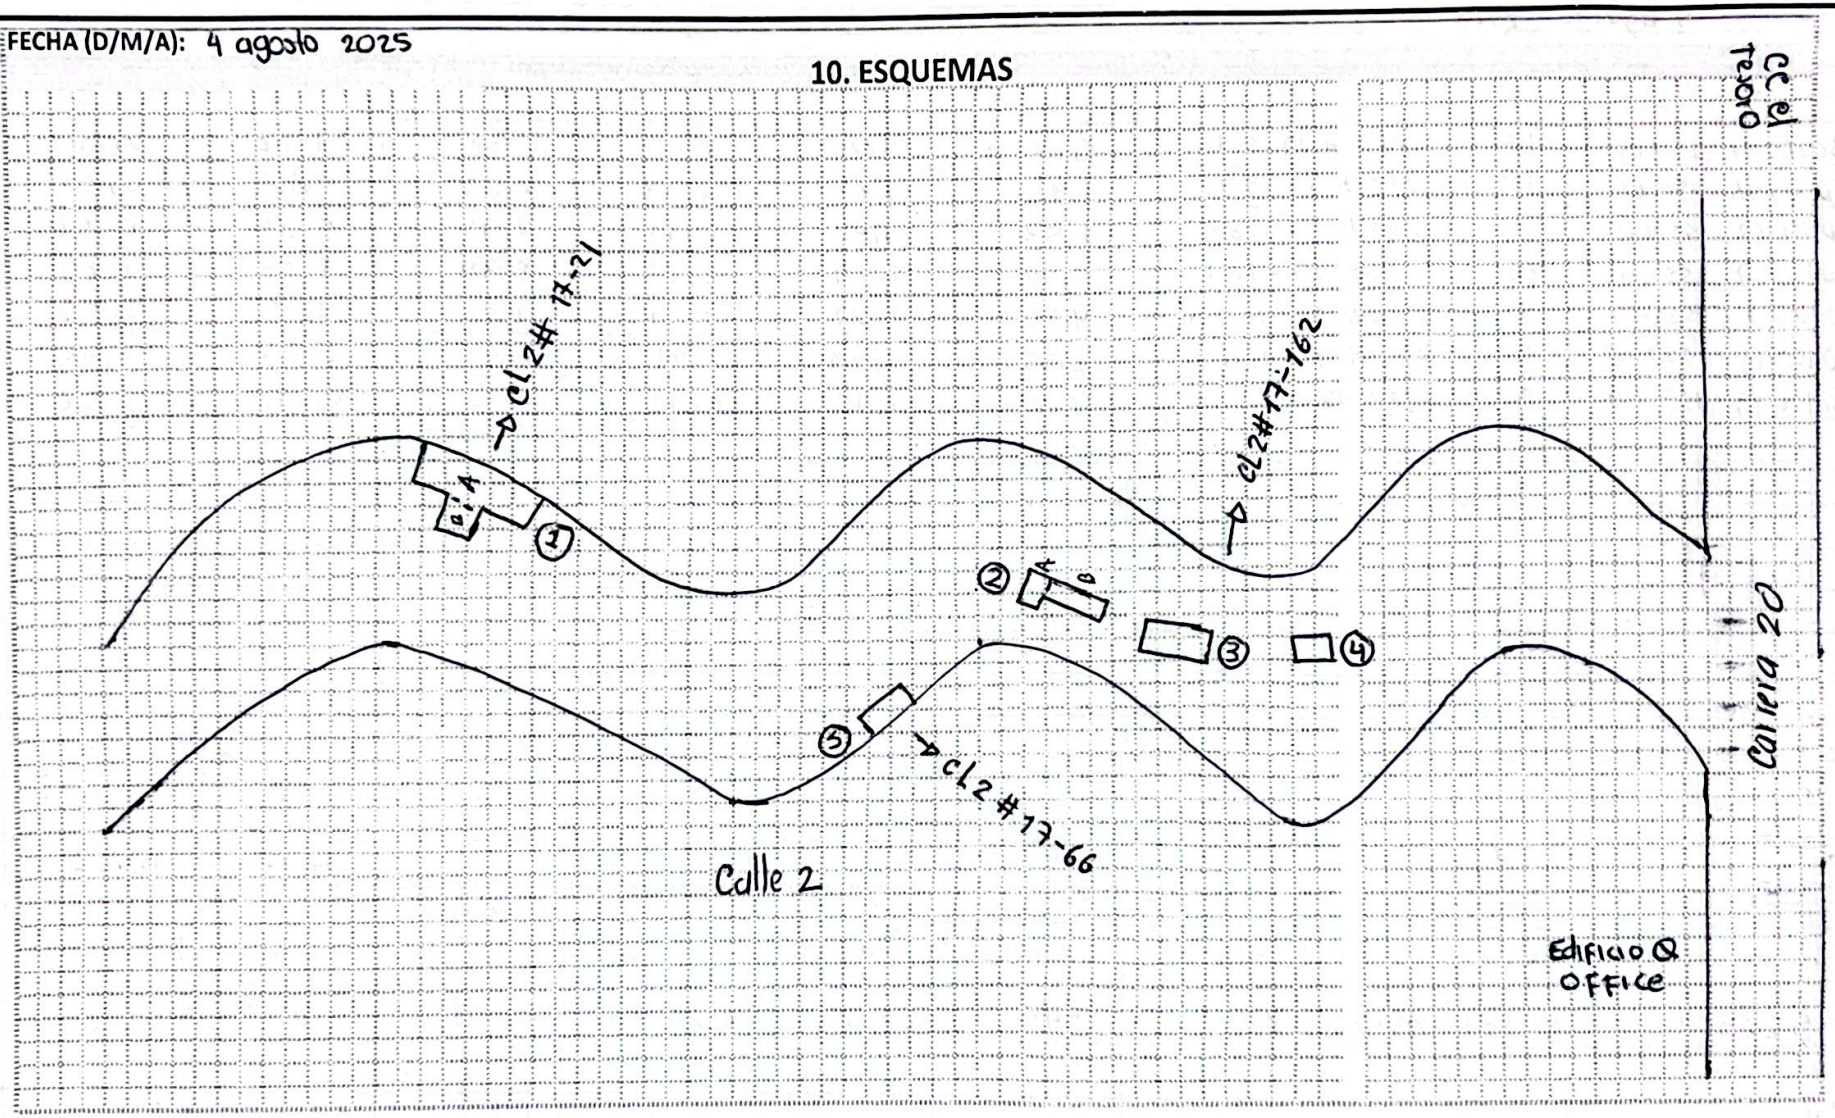

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	8	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,01	CANTIDAD:	
BARRIO	Los naranjos	DIRECCIÓN	el2sur #20	DIRECCIÓN	

Scanned with CamScanner

4 agosto 2025

Mezcla

Sobrante llegó

REMISION DE MATERIALES 20250804 08:21
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 520809
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER ALEXANDER GALVIS

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-19 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED
#2055
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:17.170,00

ENTRADA: 04 ago 2025 - 08:22 a.
SALIDA: 04 ago 2025 - 08:22 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Elmer G

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Escombro

Sobrante llegó

REMISION DE MATERIALES 20250805 07:34
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23206
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER GALVIS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 05 ago 2025 - 07:35 a.
SALIDA: 05 ago 2025 - 07:35 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Elmer G

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
peso bruto : 15020
Peso tara : 7150
Peso neto : 7870

Scanned with CamScanner
