FECHA (D/M/A): 8 agosto 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 10,114 Jun
ZONA	5
COMUNA	14 Poblado
BARRIO	La Florida
FRENTE DE TRABAJO:	8

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 AM	
TERMINACIÓN: 5:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleada
	TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inicia labores a las 7:40 am, se instala señales del PMT (verticales) y se organiza el Punto ecologico con baño.
Se realiza recorrido Para identificar los baches a intervenir
Se inicia demolicion y se fija punto para acopiar escombro
se inicia aplicacion y compactacion de mezcla
se realiza mitigacion en la Calle 8A # 35-40
Una parte del Personal inicia recolecion de escombros
se finaliza aplicacion, compactacion y recolecion de escombros y material (Mezcla)
se inicia con el aseo de las zonas dondese trabajo
Se retira las señales verticales, balizas y demas señales utilizadas durante la Jornada
Finaliza la jornada con total normalidad.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juan Pablo Y.	Sebastian Villegas
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Carlos Rodriguez	NOMBRE: Eduardo Rodriguez
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 6 agosto 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	luis daniel de la Roxa	✓		Consorcio vial med
2	Encargado				
3	Liguero	(B) Elkin Ozuna	✓		Consorcio vial med
4	Rastrillero	Juan David Vanegas	✓		Consorcio vial med
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jose david Quesada	✓		Consorcio vial med
7	Ayudante	Sebastian bedoya	✓		Consorcio vial med
8	Ayudante	Steven ventena	✓		Consorcio vial med
9	Ayudante	Jaime alberto	✓		Consorcio vial med
10	Ayudante	Pedro robles	✓		Consorcio vial med
11	Ayudante	B			
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Adelis de Jesus	✓		Consorcio vial med
17	Operador compresor	Kevin Correa	✓		Consorcio vial med
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Alirio David villa	✓		Consorcio vial med
29	Conductor Volqueta(s)	Elmer alexander Galvis	✓		consorcio vial med

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			SI	No	
1	Rodillo manual	Huayuana	✓		
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Mamito	✓		
10	Placa vibratoria	Feron FC 30	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	ES2903	✓		
16	Volqueta(s)	SSZ 553 Sencilla	✓		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 6 Agosto 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5003591	156620	1	CL 7 35-56	2,50	1,57	0,13	3,93	0,51	1,22
5003591	157624	2A	CR36 7 - 18	4,62	1,62	0,09	7,48	0,67	1,62
5003591	157624	2B	CR36 7 - 18	4,00	2,29	0,09	9,16	0,82	1,98
5003591	151205	3	CR36 CL7	1,60	2,00	0,13	3,20	0,42	1,00
5003591	151204	4	CL6 36-12	1,35	2,00	0,10	2,70	0,27	0,65
5009460	155564	5	CL37 7-40 + 20m	6,10	1,00	0,13	6,10	0,79	1,90
5003598	159009	6	CR35A CL5E	3,30	1,49	0,15	4,92	0,74	1,77
TOTALES								4,22	10,14

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
520977	SSZ557	10,14	10,14	146

BOTADA DE ESCOMBROS


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23208	SSZ557	Sencilla	1	Pavimentar

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 6 agosto 2025

10. ESQUEMAS

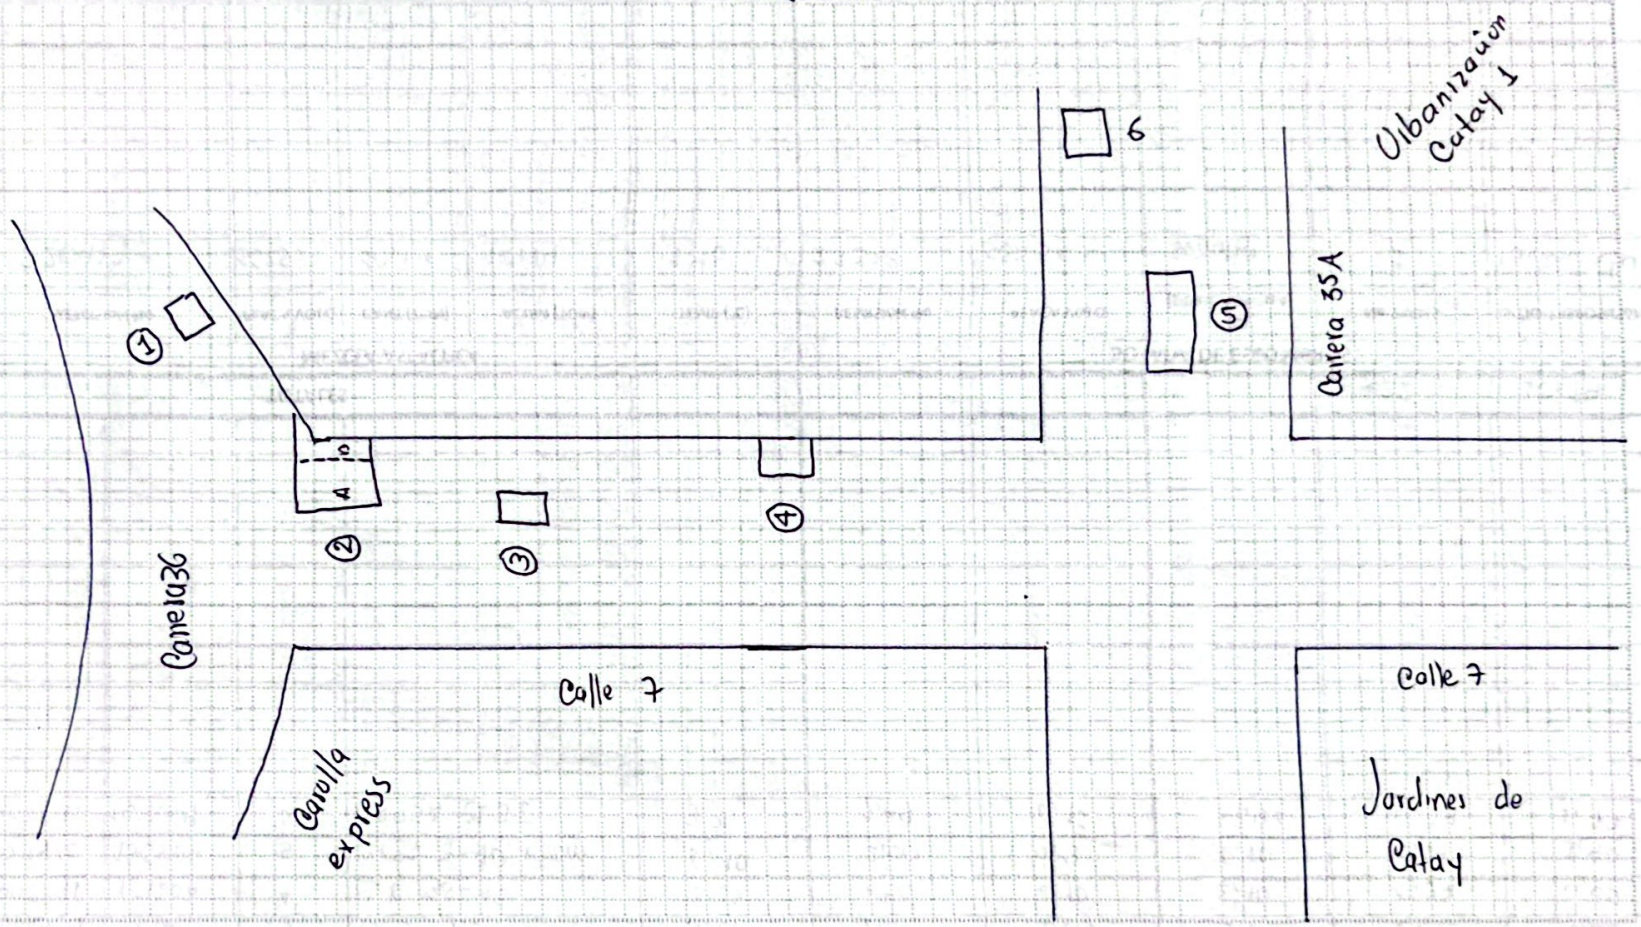

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	8	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,14	CANTIDAD:	
BARRIO	La Florida	DIRECCIÓN	CR 36 7-18	DIRECCIÓN	

Sebastian villegas

20250806 08:36
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 520977
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER ALEXANDER GALVIS

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,14 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED
#2055
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:17.290,00

ENTRADA: 06 ago 2025 - 08:37 a.
SALIDA: 06 ago 2025 - 08:37 a.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Elmer Gdls
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20250808 08:06
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23208
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER GALVIS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 08 ago 2025 - 08:07 a.
SALIDA: 08 ago 2025 - 08:07 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Elmer G
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
peso bruto : 15330
Peso tara : 7150
Peso neto : 8180

Scanned with CamScanner
