FECHA (D/M/A): 12 agosto 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	9.99 Km

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA	5	FRENTE DE TRABAJO:	8
COMUNA	14 Poblado		
BARRIO	El Poblado		

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 AM	Problemas en la Planta
TERMINACIÓN: 6:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada
TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inicia con la instalacion de la señales de PMT y Punto ecologico
en conjunto con el contratista y Residente de interventoria se realiza la marcacion de los bacheo los cuales tienen su respectivo reporte en sitio por parte de la Comunidad.
siendo las 8:20 am vamos de recorrido junto al Residente de interventoria y Compañero del contratista Luis de la Rosa para mirar la jornada del dia Miercoles 13 de agosto y aprovechamos para mirar y confirmar la direccion de los mitigaciones del dia anterior en la calle 55 sur con Carrera 35.
Siendo las 9:00Am nos informan que la bogarilla que va entre compresor y manguera se revento son las 10:05Am y aun continuan tratando de reparar dicha conexion.
El Restrillero Juan David vanegas NO se presento, las funcion de Restrillero los realizara el ingeniero Brayner smith zapata quien tiene suficiente experiencia para realizar de manera correcta esta funcion.
a las 10:20 Am hace presencia la Patrol de Comunicacion de la alcaldia.
10:30 llega el camion del contratista con el Repuesto del Compresor, proceden hacer el cambio para continuar las labores.
10:42 Am se retoman las actividades de demolicion.
Siendo las 10:54 Am nos informan que la Planta Pavimentos presenta fallas por lo tanto las volquetas son enviadas a Procopal a eso de las 12:00 Pm.

5. VISITANTES

Sebastian Villegas

6. FIRMAS

NOMBRE: Luis J. de la V.	Sebastian Villegas
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Guillermo Rodriguez	NOMBRE: Eduardo Rodriguez
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 12 agosto 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luis daniel de la Rosa	✓		Consorcio vial med
2	Encargado				
3	Liguero	Breymer smith zapata			
4	Rastrillero	Juan David Banegas No se presento	x	✓	Consorcio vial med
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jose David Quevada	✓		Consorcio vial med
7	Ayudante	Sebastian Dedoya	✓		Consorcio vial med
8	Ayudante	Jaime alberto	✓		Consorcio vial med
9	Ayudante	Pedro Robles	✓		Consorcio vial med
10	Ayudante	Steven Renteria	✓		Consorcio vial med
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Adelis de Jesus	✓		Consorcio vial med
17	Operador compresor	Kevin Correa	✓		Consorcio vial med
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Alirio villa	✓		Consorcio vial med
29	Conductor Volqueta(s)	Elmer Alexander Galvis			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna	✓		Consorcio vial med
2	Compresor	Kayser	✓		Consorcio vial med
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		Consorcio vial med
10	Placa vibratoria	Fecon FC30	✓		Consorcio vial med
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	TSZ903	✓		Consorcio vial med
16	Volqueta(s)	SSZ553 Sencilla	✓		Consorcio vial med

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 25 agosto 2023

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5003440	157212	1A	Cr 37A 1SUR 138	2,40	4,80	0,11	11,52	1,27	3,04
5003440	157212	1B	Cr 37A 1SUR 138(1)	0,60	2,10	0,11	1,26	0,14	0,33
5003440	157213	2	Cr 37A 1SUR 138+1	3,25	2,00	0,12	6,50	0,78	1,87
5003440	159174	3A	Cr 37A 1SUR 98	3,10	1,30	0,10	4,03	0,40	0,97
5003440	159174	3B	Cr 37A 1SUR 98	2,40	1,60	0,10	3,84	0,38	0,92
5003440	157215	4	Cr 37A 1SUR 123	9,90	1,00	0,12	9,90	1,19	2,85
TOTALES								4,16	9,99

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233219	SS2557	9,99	9,99	139


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23211	SS2557	Sencilla	1	Pavimenta.

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A) 29 agosto 2025

10. ESQUEMAS

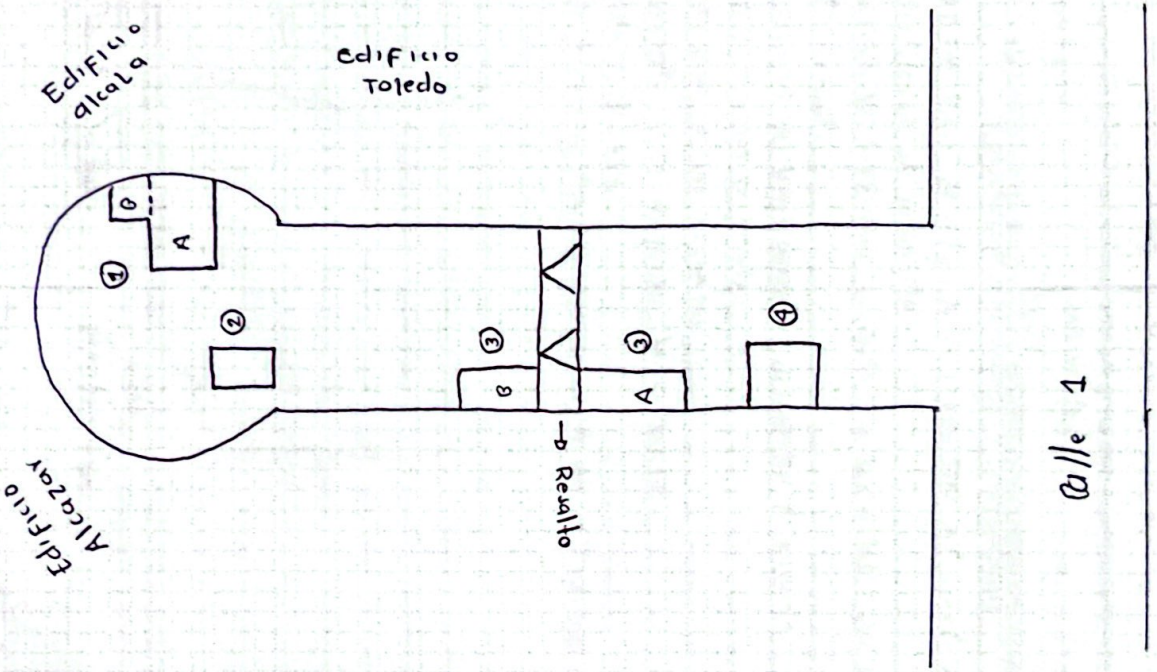

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	8	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	9,99 TON	CANTIDAD:	
BARRIO	El Poblado	DIRECCIÓN	CR37A 1SUR 98	DIRECCIÓN	

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 12 agosto 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	9,99

ZONA	5	FRENTE DE TRABAJO:	8
COMUNA	14 Poblado		
BARRIO	El Poblado		

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 AM	Problemas en la Planta
TERMINACIÓN:	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleado
	TARDE:

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

A eso de las 1:48 Pm llego la volqueta con 9.99 TON al frente de trabajo.
Se inicia con la instalacion de la mezcla
se le pide al contratista tener mas cuidado con los ciclos que se le deben dar a los baches con el Rodillo manual.
se realiza aseo general del lugar donde se desarrollo la jornada
se recoge la señalizacion y las verticales
el baño se le realiza aseo a las 12:00 Pm
se recoge la herramienta y se despacha la volqueta
Se da por terminado la jornada.
NOTA: en la presente bitacora tambien dejo por escrito que se limpiaron dos sumideros durante la jornada.

5. FIRMAS

NOMBRE: Luis Daniel de la Rosa	Se baitha en ullega
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Pablo Restrepo	NOMBRE: Edwar
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

12 agosto 2025

Sebastian villegas

PROCORVAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 233219

FECHA: 12/08/2025

HORA: 12:10:52 PM

CONDUCTOR: ELMER GALVIS

PLACA: SSZ557

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 17.56 Tonnes

PESO TARA: 7.57 Tonnes

PESO NETO: 9.99 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 139 C

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADA: 38.83 Tonnes

escombro

Sebastian villegas

20250813 06:23

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23211
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER GALVIS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED M2058
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 13 ago 2025 - 06:24 a.
SALIDA: 13 ago 2025 - 06:24 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Elmer Galvis

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. -- Suministros a terceros
peso bruto : 15470
Peso tara : 7150
Peso neto : 8320

Scanned with CamScanner
