FECHA (D/M/A): 13 agosto 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Rutval
RANGO: 1	CANTIDAD: 10,02 Km
ZONA	5
COMUNA	14 Poblado
BARRIO	Manila - Villa Carlota
FRENTE DE TRABAJO:	8

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 AM	Baches Dispersos
TERMINACIÓN: 6:30 Pm	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Calida
	TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

El contratista deúde iniciar en el barrio manila con el sitio 158677, lugar diferente al programado el dia anterior, luego de atender este sitio continuaremos en la direccion programada en el barrio villa carlota.

se inicia a las 7:40 am con la instalacion del PMT (señales verticales) y cerramiento de la zona a demoler con balizas y malla.

Se inicia demolicion a las 7:54 am

Para las 9:00 Am me informan que llego la parte social y Ambiental, en ese momento me encuentro con el residente de Interventoria realizando recorrido para escoger la jornada del siguiente dia

se traslado el personal para la obicacion programada en la Carrera 43B

Siendo las 4:35 PM iniciamos con la demolicion del quinto bache al frente de Colmedica CR 43B CL 14-98.

Se realiza recorrido con el Residente de contratista Juan guillermo para observar unos posibles puntos en Ciudad del Rio.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juan C. Hdez V.	Sebastian villegas
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Carlos Rodriguez	NOMBRE: Eduardo Rodriguez
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luis daniel de la Rosa	✓		Consorcio vial med
2	Encargado				
3	Liguero	Breymer smith zapata			
4	Rastrillero	Juan David Vanegas	✓		Consorcio vial med
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante	Jose david Quesada	✓		Consorcio vial med
8	Ayudante	Sebastian bedoya	✓		Consorcio vial med
9	Ayudante	Jaime alberto	✓		Consorcio vial med
10	Ayudante	Pedro Robles	✓		Consorcio vial med
11	Ayudante	Stevenienfesia	✓		Consorcio vial med
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Adelis de Jesus	✓		Consorcio vial med
17	Operador compresor	Kevin Correa	✓		Consorcio vial med
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Alirio villa	✓		Consorcio vial med
29	Conductor Volqueta(s)	Elmer Galvis	✓		Consorcio vial med

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			SI	No	
1	Rodillo manual	Horquaina	✓		Consorcio vial med
2	Compresor	Kayser	✓		Consorcio vial med
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		Consorcio vial med
10	Placa vibratoria	Tecon FC30	✓		Consorcio vial med
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	TSZ903	✓		Consorcio vial med
16	Volqueta(s)	SSZ553 Sencilla	✓		Consorcio vial med

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
	158677	1	Cl 11A Cr 43B-22	5,75	2,29	0,14	13,17	1,84	4,42
4001410	159230	2A	CR43B cl12-21	2,14	2,96	0,14	6,33	0,89	2,13
4001410	159230	2B	CR43B cl12-21	0,85	1,38	0,14	1,17	0,16	0,39
4001410	159271	3	CR43B cl11B-84	2,47	1,64	0,13	4,05	0,53	1,26
4001412	159270	4	CR43B cl14-54	2,87	1,18	0,11	3,39	0,37	0,89
4001412	159295	5	CR43B cl14-54+2	3,56	0,82	0,13	2,92	0,38	0,91
TOTALES								4,17	10,02

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
527267	SS2557	10,02	10,02	146


BOTADA DE ESCOMBROS


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23212	SS2557	Sencilla	1	Pavimentar

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 13 agosto 2025

10. ESQUEMAS

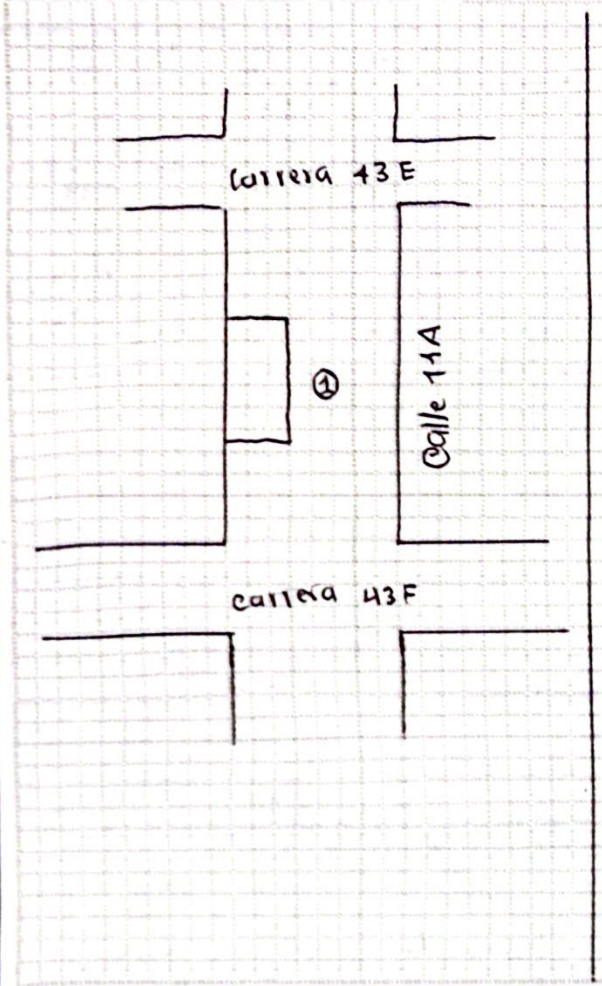

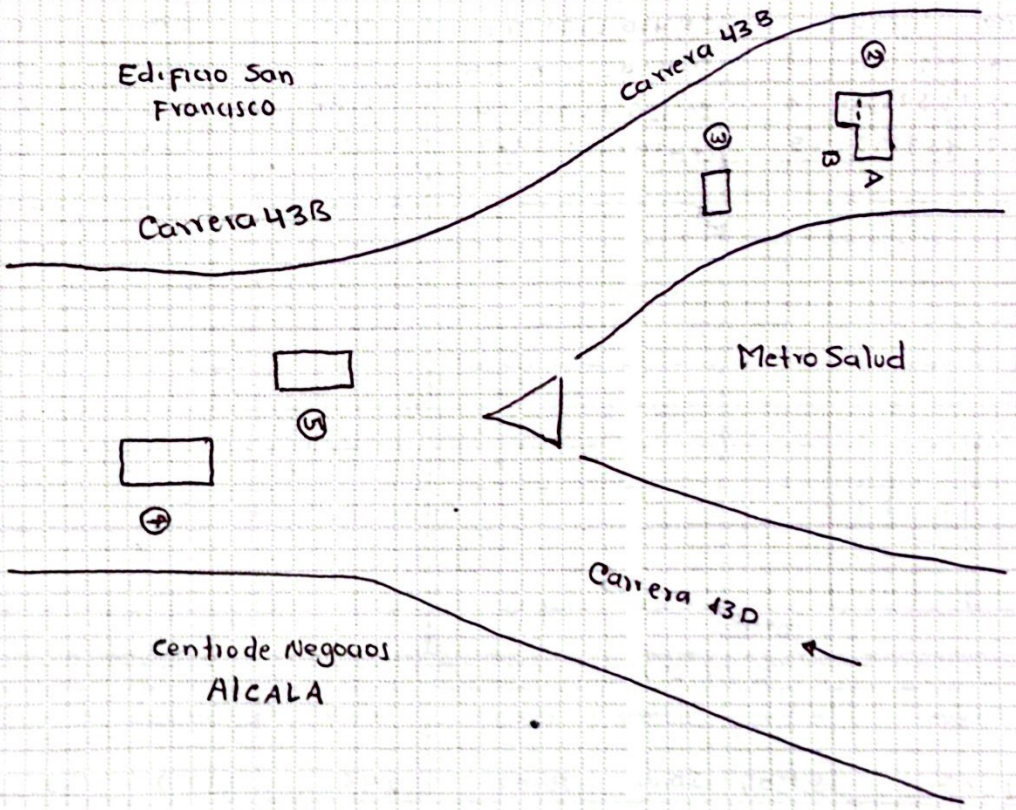

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	8	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:		CANTIDAD:	
BARRIO	Manila - Villa Carlota	DIRECCIÓN	CR 43B 14-51	DIRECCIÓN	

Scanned with CamScanner

13 agosto 2025

Mezcla

Sebastian Mejes ----------20250813 07:31
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 521267
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER ALEXANDER GALVIS

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:17.170,00

ENTRADA: 13 ago 2025 - 07:29 a.
SALIDA: 13 ago 2025 - 07:29 a.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Elma G

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Escombro

Sebastian villegas ----------20250814 06:57
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23212
PLACA: SSZ357
CONDUCTOR: ELMER GALVIS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 14 ago 2025 - 07:08 a.
SALIDA: 14 ago 2025 - 07:08 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Elma G

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
peso bruto : 15930
Peso tara : 7150
Peso neto : 8780

Scanned with CamScanner
