FECHA (D/M/A): 14 agosto 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 10,02
ZONA	5
COMUNA	14 Poblado
BARRIO	Las lomas 2 - los Naranjos
FRENTE DE TRABAJO:	8

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 Am	Cambio direccion lluvias en la noche
TERMINACIÓN: 18:30 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: lluviosa
	TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se inicia la jornada con un pequeño cambio en la direccion, se inicia en una direccion distinta a la programada por comodidad de traslados ya que la idea es terminar la jornada en la direccion programada, direccion donde se inicia es la Transversal inferior con la Cl 10b.
Se instala señalizacion PMT en ambos costados de la via y se prosigue con el cargamiento del canal inguinado.
Se recibe acompañamiento de la SST del contratista Claudia Collazos.
se inicia la demolicion, se hace lenta la actividad algunas zonas estan complicadas de demoler por el tema de los espesores que nos encontramos.
Para esa de las 12:00 pm llega los agentes de transito exigiendo el PMT al Contratista y nos manifiestan que se esta causando un pare trancon desde cesar diego. los manifestamos que realizaremos solo el restante del bache uno ubicado en la parte derecha del canal y habilitaremos la via. se revisa o buscan dos baches mas sobre la calle 10b. con el contratista.
sobre las 3:45 pm se habilita Completamente la via y se prosigue con la demolicion del bache 4.
se continua con la demolicion bache 5 el cual se termina de demoler e imprimar para las 5:00 Pm y para las 5:26 Pm se inicia con la primera capa

5. VISITANTES

Claudia M. Collazos - Res. SST.	

6. FIRMAS

NOMBRE: Luis [illegible]	Sebastian villegas
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Guillermo Restrepo	NOMBRE: Eduardo Restrepo
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 14 agosto 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luis daniel de la Rosa	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Breymer smith zapata	✓		Consorcio vial med
4	Rastrillero	Juan Daniel Vanegas	✓		Consorcio vial med
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jose david quejada	✓		Consorcio vial med
7	Ayudante	Sebastian bedoya	✓		Consorcio vial med
8	Ayudante	Jaime alberto	✓		Consorcio vial med
9	Ayudante	Pedro Robles	✓		Consorcio vial med
10	Ayudante	Jose Daniel mejia	✓		Consorcio vial med
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Adelis de Jesus	✓		Consorcio vial med
17	Operador compresor	Kevin Correa	✓		Consorcio vial med
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Alirio villa	✓		Consorcio vial med
29	Conductor Volqueta(s)	Elmer Galvis	✓		Consorcio vial med

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna	✓		Consorcio vial med
2	Compresor	Kaysor	✓		Consorcio vial med
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Moimita			
10	Placa vibratoria	Fecon FC 30	✓		Consorcio vial med
11	Soplador		✓		Consorcio vial med
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	TS2 903			
16	Volqueta(s)	SS2 553 Sencilla	✓		Consorcio vial med

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 14 agosto 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001442	159335	1A	TV inferior cl 10B	2,90	2,10	0,15	6,09	0,91	2,19
4001442	159335	1B	TV inferior cl 10B	0,80	4,70	0,15	3,76	0,56	1,35
4001442	159367	2	TV inferior cl 10B+ 5m	2,08	1,20	0,13	2,50	0,32	0,78
4001442	159354	3	TV inferior cl 10B + 10m	1,55	0,80	0,13	1,24	0,16	0,39
5003710	159366	4	CL10B CF-20-68	5,20	0,80	0,11	4,16	0,46	1,10
5003710	159379	5	CL10B CF 28-151	2,80	1,10	0,11	3,08	0,34	0,81
4001613	158727	6	CF 32 CL1A 50 FS-22	4,50	2,25	0,14	10,13	1,42	3,40
TOTALES								4,18	10,02

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
521331	SSZ557	10,02	10,02	145


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23214	SSZ552	Sencilla	1	Pavimenta-

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): agosto 14 2025

10. ESQUEMAS

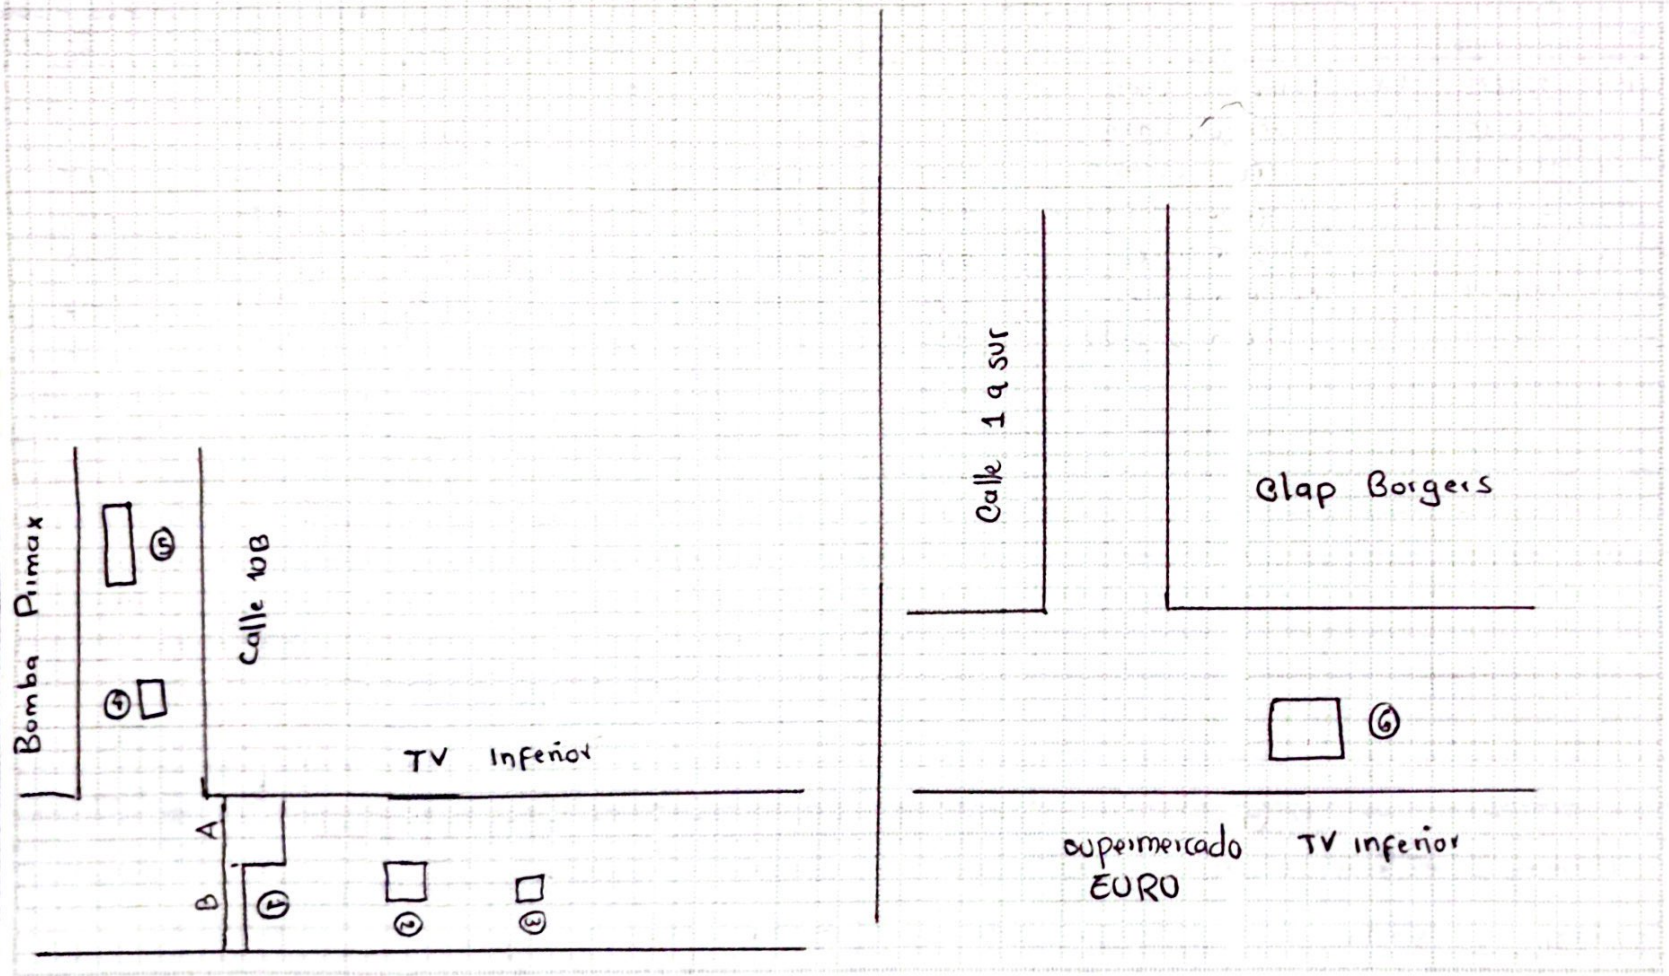

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	8	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,02	CANTIDAD:	
BARRIO	Las Lomas 2 - Los Naranjos	DIRECCIÓN	TVinferior CL 10B	DIRECCIÓN	

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 14 agosto 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:		CANTIDAD:	10,02 Ton
ZONA	5	FRENTE DE TRABAJO:	8
COMUNA	14 Poblado		
BARRIO	las lomas 2 - los Naranjos		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 9:00 Am	
TERMINACIÓN:	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Lluviosa
	TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

se deju todo el escombro debidamente acopiado y nos tasladamos para el punto programado, Cl 32 Cl 1A Su 122, siendo las 6:20Pm llegumos al punto para iniciar con la instalacion de las señales Verticales y marcacion del bache el cual seria el bache 6.
se baja toda la mezcla sobre Carpas y se tapa para mantener su temperatura la volqueta se dispone a regresar ala ubicacion anterior para Cargar escombros. Siendo las 8:05Am se presentan lluvias, en el momento se encontraban pisando con el rodillo manual la ultima Capa del bache 6. se logra terminar de pisar. quedamos a la espera que pare la lluvia para cargar escombro se retoman las actividades a eso de las 9:05 Am, otra parte del personal va realizando aseo.
Se recogen balizas, maletines y bono.
se reabre la via y se retira señales de PMT
Para las 10:27Mse habilita la via.
se culmina la jornada laboral

5. FIRMAS

NOMBRE: Luis Alfredo Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Sebastian ullegos Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Jhon Fredy Quiroz Restrepo Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Eduardo Vasquez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

14 agosto 2025

Mezcla

Mezcla

Sebastian villegas

20250814 08:32
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 521331
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER ALEXANDER GALVIS

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:17.170,00

ENTRADA: 14 ago 2025 -m08:33 a.
SALIDA: 14 ago 2025 - m08:33 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20250815 07:57
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23214
PLACA: SSZ557
CONDUCTOR: ELMER GALVIS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.150,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 15 ago 2025 -m08:25 a.
SALIDA: 15 ago 2025 - m08:25 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
peso bruto : 16850
Peso tara : 7150
Peso neto : 9700

Scanned with CamScanner
