FECHA (D/M/A): 5/08/2025	**BITACORA DE OBRA**

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 12,28 t
ZONA: 4	FRENTE DE TRABAJO: 9
COMUNA: 11	
BARRIO: Lorena	

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 am	———
TERMINACIÓN: 5:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Nublado
	TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Inicio de actividades con la instalación de señalización vertical en la zona a ejecutar segun el PMT.
- Cerramiento en el área de intervención con malla, Barricadas y Balizas.
- Marcación para la zona a demoler, inicio de demolición, excavación y retiro de material sobrante.
- Nivelación y compactación de la base granular existente.
- Imprimación de baches, extensión de Mezcla y compactación de mezcla en 1 y 2 capa.
- Recolección de escombros y Retiro de señalización.

Observación: Se realiza limpieza e imprimación de la primera capa del bache N°3 del día 4 de agosto del 2025, con ID 158807 ubicado en la CL 32 B # 83 38, garantizando un espesor de 0.07.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Diedal Castro	Daniela Barragán
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro	NOMBRE: José Luis Guzman. A.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 5/08/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4002580	156969	1	CR 76 CL 43	4.90	1.60	0.14	7.84	1.10	2.64
4002966	158889	2A	CL 43 CR 76	3.35	2.30	0.14	7.71	1.08	2.59
4002966	158889	2B	CL 43 CR 76	1.65	1.20	0.14	1.98	0.28	0.67
4002580	158875	3	CL 43 CR 76	2.85	1.60	0.14	4.56	0.64	1.54
4002581	158896	4	CL 43 CR 77	2.40	2.80	0.14	6.72	0.94	2.26
5009317	158807	5A	CL 32 B CR 83-38	5.50	2.05	0.07	11.28	0.79	1.90
5009317	158807	5B	CL 32B CR 83-38	2.10	1.85	0.07	3.89	0.27	0.65
TOTALES							43.98	5.10	12.25

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
520906	SMR969	12.28	12.28	145°C


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23358	SMR 969	Sencilla	1	Pavimentar

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 05-08-2025

10. ESQUEMAS

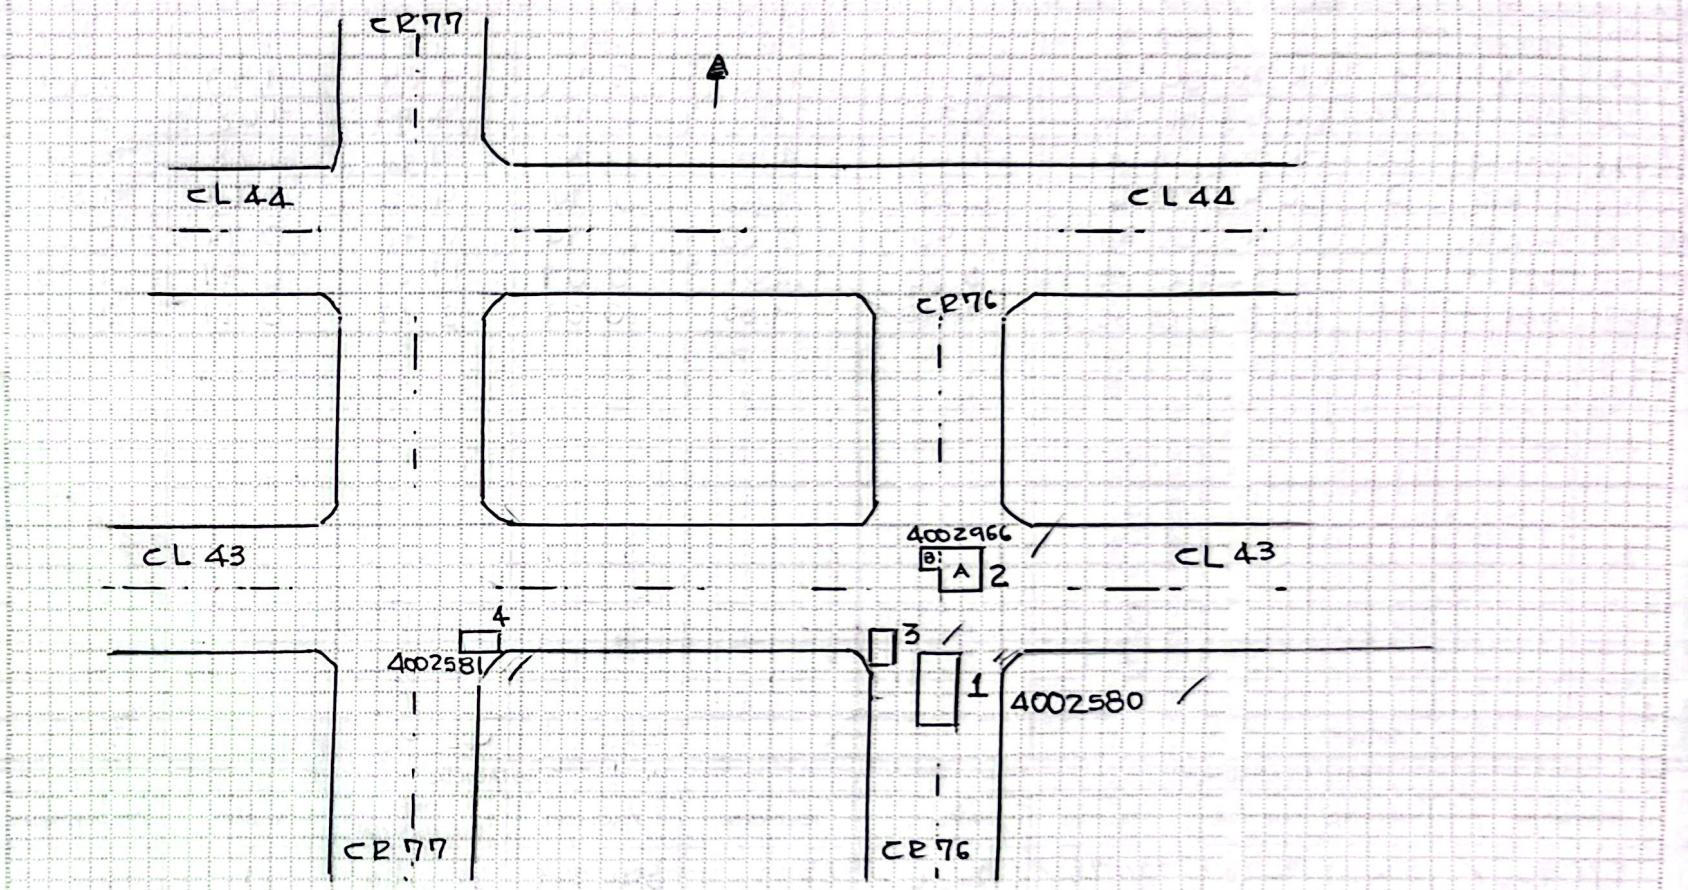

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	9	FRENTE
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.25	CANTIDAD:
BARRIO	Lorena	DIRECCIÓN	CR 76 CL 43	DIRECCIÓN

Scanned with CamScanner

----------20250805 08:35
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 520906
PLACA: SNR969
CONDUCTOR: SANTIAGO IBARRA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,28 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V
IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.470,00
PESO BRUTO:19.750,00

ENTRADA: 05 ago 2025 -m08:41 a.
SALIDA: 05 ago 2025 - m08:41 a.
TEMPERATURA:145,00

Santiago Ibarra C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Sant. J. Ibarra
FIRMA DEL CONDUCTOR

MARTHA LOPEZ

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Daniela Barragán

----------20250806 07:35
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23358
PLACA: SNR969
CONDUCTOR: SANTIAGO IBARRA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.470,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 06 ago 2025 -m07:47 a.
SALIDA: 06 ago 2025 - m07:47 a.
TEMPERATURA:0,00

Leon Cano
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Santiago Ibarra
FIRMA DEL CONDUCTOR

carlos orrego
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
peso bruto : 16460
Peso tara : 7470
Peso neto : 8990

Daniela Barragán

Scanned with CamScanner
