FECHA (D/M/A): 13/05/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	12:02 ton

ZONA	4
COMUNA	13
BARRIO	El Corazón
FRENTE DE TRABAJO:	9

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 am	- Compresor llega tarde a la zona. llego a las 11:30
TERMINACIÓN: 9:30 Pm	- lluvia desde las 3:30 hasta las 5:30.
	- Compresor con manguera rota.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Lluvioso

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se Realiza instalacion de señalicion vial segun el PMT.
- Cerramiento provisional del área a intervenir, con malla y Balizas.
- Se inician labores de demolición a las 11:40 am por Fallas presentadas en el compresor.
- Se evidencian espesores en la carpeta existente entre 0.14 y 0.22 cm.
- El proceso de demolición y retiro de escombro se realiza con dificultad debido al espesor encontrado y tambien debido al alto Flujo vehicular con ruta de buses y es demasiado angosta.
- Siendo las 3:20 Pm se paralizan las actividades debido a que la manguera del compresor esta rota, lo qué genera escapes de aire, la interventoria le sugiere al contratista realizar el cambio de inmediato con el Fin de tener un avance optimo en las actividades programadas.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Piedad Castro	Daniela Barragán
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Jhon Jairo Rodriguez	NOMBRE: Jaider Guzmán
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13/08/2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO:	1
CANTIDAD:	
ZONA	4
COMUNA	13
BARRIO	El Corazón
FRENTE DE TRABAJO:	9

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 am	- Compresor llega tarde a la zona. llega a las 11:00
TERMINACIÓN: 9:30 Pm	- lluvia desde las 3:30 pm hasta las 5:30
	- Compresor manguera rota.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleado
TARDE	lluvioso

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se logra hacer un corte y un ingerto provisional en la manguera del compresor para terminar la actividad de demolición en un tramo de la vía.
- Excavación y retiro del material sobrante de demolición.
- Se realiza compactación e imprimación del área de trabajo.
- Se realiza la extensión de la primera y segunda capa de la mezcla.
- Inicio de lluvia a la 5:50 Pm, se evidencia 5 bajantes de viviendas que afectan directamente el trabajo.
- Se inicia la extensión de la tercera capa y compactación.
- Retiro de señalización vertical y cerramiento.

Observación: El Bache mediatico de 119A 39 tiene un resalto existente el cual se encuentra en observación para ser reconstruido.

5. FIRMAS

NOMBRE: [illegible]	Daniela Barragán
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: José Luis Guzmán M
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 13/08/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero				
2	Encargado				
3	Liguero	Diego Andres Villa Rios	X		
4	Rastrillero	johan Stiven Quintero Tamegra	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jaime Alexis Serna	X		
7	Ayudante	Yair Antonio Aspilla Valencia	X		
8	Ayudante	Luis Carlos Monsalve	X		
9	Ayudante	Oscar Dano Zapata	X		
10	Ayudante	Ailan de Jesus Julio Garcia	X		
11	Ayudante	Jose Bernardo J Correa Cuevas	X		
12	Ayudante	Santiago Muñoz Rodriguez	X		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Torres	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Walter Muñoz	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Carlos Ibarra	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN SI	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	Doosan	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Fecon	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX 043	X		
16	Volqueta(s)	SNR 969	X		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 13/08/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4000467	749770	1	cl 34B CR 118-86	5.00	1.00	0.16	27.67	4.44	9.86
4000467	752108	2	cl 34B CR 118-11	7.80	2.77	0.19	5.00	0.80	1.92
TOTALES							26.61	4.91	11,78

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
527289	SNR969	12,02	12,02	147°C


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23363	SNR969	Sencilla	1	Parimentar

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 13-08-2025

10. ESQUEMAS

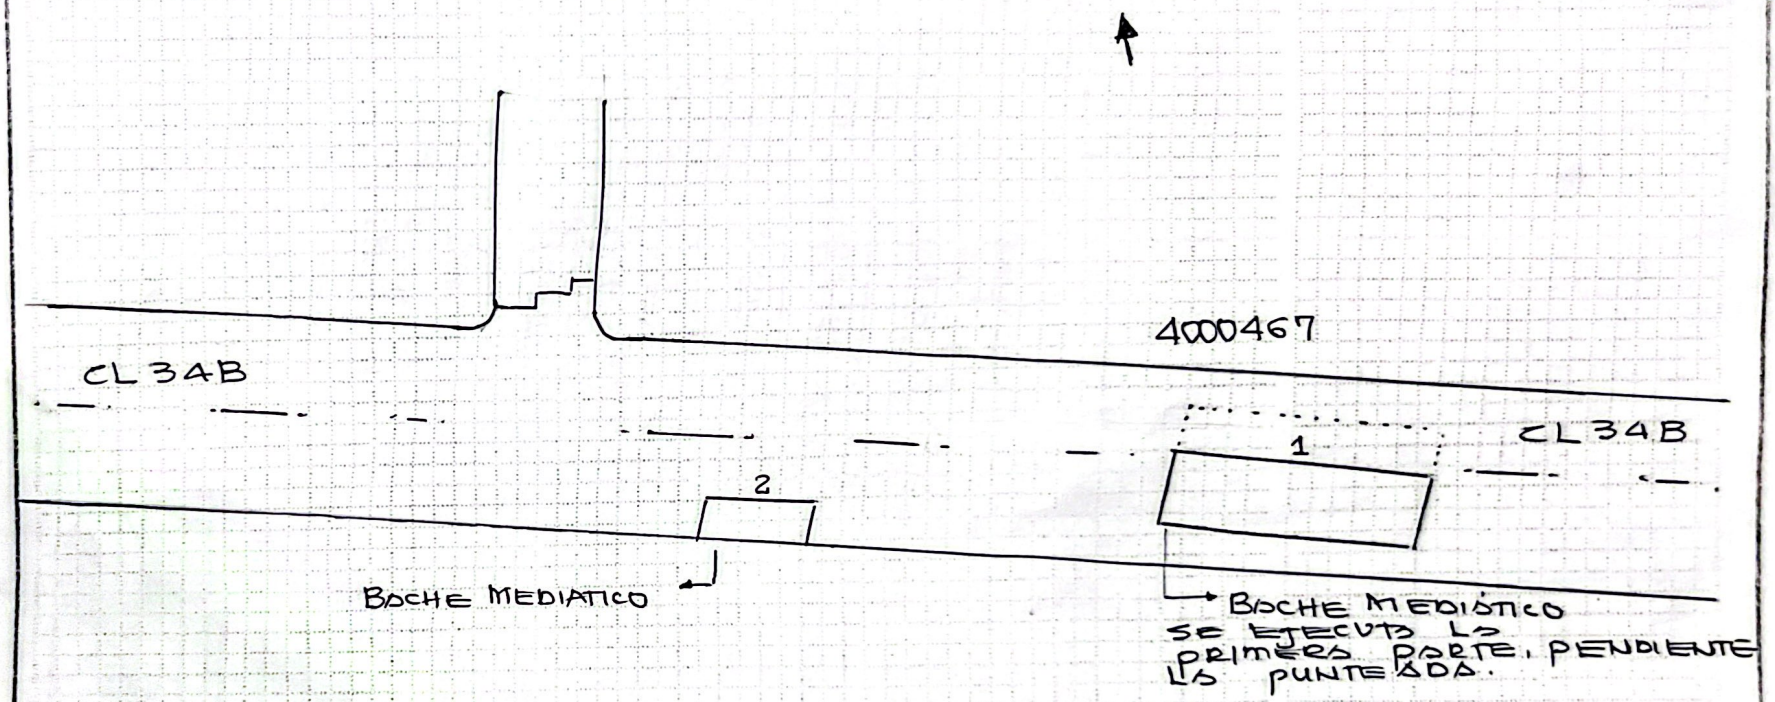

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	11.78	CANTIDAD:	
BARRIO	EL CORAZON	DIRECCIÓN	CL 34B CR 119A-43 CL 34B CR 118-86	DIRECCIÓN	

Scanned with CamScanner

----------20250813 09:26
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 521289
PLACA: SNR969
CONDUCTOR: SANTIAGO IBARRA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1
9 - tibia -
asfalto 60 -70 -- BAR
CANT. NETA: 12,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V
IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.470,00
PESO BRUTO:19.490,00

ENTRADA: 13 ago 2025 -m09:31 a.
SALIDA: 13 ago 2025 - m09:31 a.
TEMPERATURA:147,00

Santiago Lopez C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Santiago Ibarra
FIRMA DEL CONDUCTOR

Daniela Barragán
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

----------20250813 12:01
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23363
PLACA: SNR969
CONDUCTOR: SANTIAGO IBARRA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI
MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR
OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.470,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 14 ago 2025 -m06:28 a.
SALIDA: 14 ago 2025 - m06:28 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Santiago Ibarra
FIRMA DEL CONDUCTOR

Martha Lorena
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
peso bruto : 18110
Peso tara : 7470
Peso neto : 10640

Daniela Barragán

Scanned with CamScanner
