BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

FECHA (D/M/A): 14-08-2025

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: 1	CANTIDAD: 12.07 TON
ZONA: CORREGIMIENTO	FRENTE DE TRABAJO: 9
COMUNA: 70 ALTAVISTA	
BARRIO: EL CORAZON	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00AM
TERMINACIÓN: 7:00 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
- VIA ANGOSTA CON ALTO FLUJO VEHICULAR
. CAPA ASFALTICA MUY DURA

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:
MAÑANA: DESPEJADO
TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CON LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, SIGUIENDO EL PMT ASIGNADO.
. CERRAMIENTO DEL AREA EN INTERVENCIÓN, UN CARRIL, CON MALLA Y BALIZAS. . MARCACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE.
. ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL, PROVENIENTE DE EXCAVACION Y DEMOLICIÓN
. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE GRANULAR EXISTENTE.
. LLEGADA DE VOLQUETAS SENCILLAS NR 969 CON MEZCLA ASFALTICA MDC-19 TIBIA CON RAP, PROCEDENTE DE LA PLANTA PAVIMENTAR A LAS 9:20 AM.
. IMPRIMACIÓN DE CADA UNO DE LOS BACHES EN INTERVENCION.
. CHEQUEO DE TEMPERATURA A MEZCLA MDC-19 CON RAP TIBIA
. EXTENSIÓN DE MEZCLA
. COMPACTACION DE MEZCLA EN 1-2-3 CAPAS, DADO LOS ESPESORES ENCONTRADOS
. NIVELACION Y COMPACTACION. RETIRO DE ESCOMBROS.
. RETIRO DE SEÑALIZACION VERTICAL.

5. VISITANTES

Juan J. Bárcenas P.
Edwar J. Cardona A - SIF - Supervisor.

6. FIRMAS

NOMBRE: Rafael Castro Celis Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	MARTHA GLADIS LOPEZ VARELA Vo. Bo TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Jhonny Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzmán. A Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 14-08-2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL		
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.07 TON.
ZONA	CORREGIMIENTO	FRENTE DE TRABAJO:	9
COMUNA	70 ALTAVISTA		
BARRIO	EL CORCHAL		

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 AM	- PAVIMENTO DURO - VIA ANGOSTA Y DE ALTO FLUJO
TERMINACIÓN: 7:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO
TARDE: SOLEADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

14/08/2025. incidente relacionado con una motocicleta que se salta el pare y sigo, ocasionó al Ligero Diego villa un golpe en la rodilla derecha, se hace el reporte interno para hacer seguimiento, no presenta herida abierta, camina por sus propios medios con leve dificultad. continua en observaciones con el area SST de Estructuras y pavimentos SAS. Freddy Gomez. Profesional SST. Hora: 2:06 PM.

EN VISITA DEL ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA Y EL ING DE LA SUPERVISION, SE AUTORIZA REALIZAR RESANO, CON ESTO, SE REPONE EL EXISTENTE, EL CUAL NO CUMPLIA CON LA NORMA, EL ACTUAL QUEDARA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, TAL LO INDICA LA NORMA, DE IGUAL MANERA, EL CONTRATISTA DEBE DE DEJARLO SEÑALIZADO CON PINTURA ACRILICA CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES.

5. FIRMAS

NOMBRE: [illegible]	[illegible]
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: [illegible] Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Jose Luis Guzman A. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 14-08-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	PIEDAD CASTRO	X		
2	Encargado				
3	Liguero	DIEGO ANDRES VILLA	X		
4	Rastrillero	JOHAN STIVEN QUINTERO FONNEGRA	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	YOIR ANTONIO ASPRILLA VALENCIA	X		
7	Ayudante	JOSE BERNARDO CORREA	X		
8	Ayudante	SANTIAGO MUÑOZ	X		
9	Ayudante	ALAN DE JESUS JULIO GARCIA	X		
10	Ayudante	LUIS CARLOS MONSALVE	X		
11	Ayudante	OSCAR ZAPATA	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	TONY UPUEN			
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	WALTER MUÑOZ			
29	Conductor Volqueta(s)	SANTIAGO IBARRA			

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	EA 330	X		
2	Compresor	DOOSAN	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto		X		
9	Equipo Imprimación	MAEMITA	X		
10	Placa vibratoria	FECON			
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	GTX043	X		
16	Volqueta(s)	SNP969	X		
1	DRAGON				

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4000467	152110	1	CL 134B CR 119A-21	1.0	1.40	0.13	1.40	0.18	0.43
4000467	159336	2	CL 134B CR 118-78	3.05	1.25	0.12	3.81	0.46	1.10
4000467	159337	3	CL 134B CR 119A-01	2.70	2.70	0.13	7.29	0.95	2.28
4000467	149767	4	CL 134B CR 118-106	1.30	1.30	0.12	1.69	0.20	0.48
4000467	152108	5A	CL 134B CR 119A-43	7.80	1.90	0.15	14.82	2.22	5.33
4000467	152108	5B	CL 134B CR 119A-43	1.15	1.25	0.15	1.44	0.22	0.53
4000467		RESALTO	CL 134B CR 119A-43	2.0	5.0	0.08	10.0	0.80	1.92
TOTALES							40.45	5.03	12.07

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
521319	SNR969	12.07		146


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23364	SNR969	SENCILLA	1	PAVIMENTAR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 14-08-2025

10. ESQUEMAS

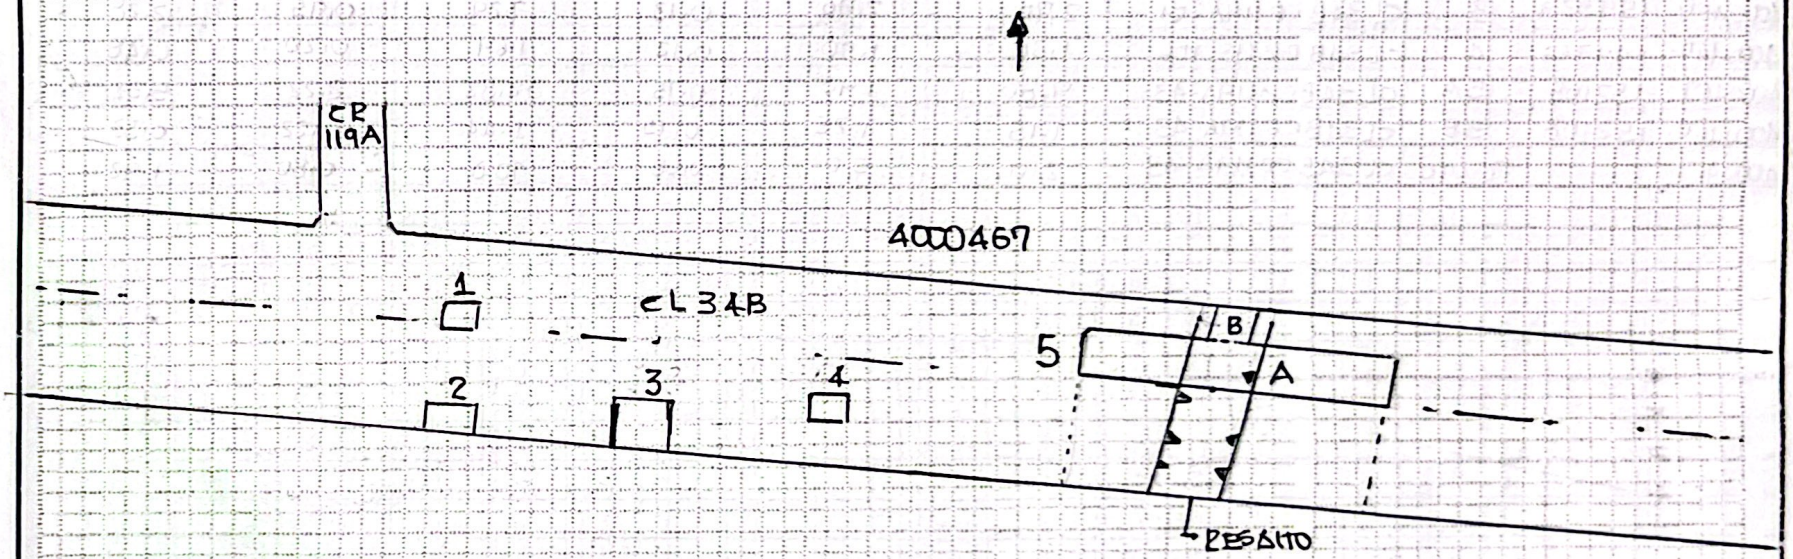

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	9	FRENTE	
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.07	CANTIDAD:	
BARRIO	EL CORAZON	DIRECCIÓN	CL 34B CR 118-106	DIRECCIÓN	

Scanned with CamScanner

----------20250814 07:29
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 521319
PLACA: SNR969
CONDUCTOR: SANTIAGO IBARRA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-19 - tibia -
asfalto 60 -70 - BAP
CANT. NETA: 12,07 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED
#2055
PESO TARA: 7.470,00
PESO BRUTO:19.540,00

ENTRADA: 14 ago 2025 -m07:34 a.
SALIDA: 14 ago 2025 - m07:34 a.
TEMPERATURA:146,00

Santiago Lopez C.
FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Santg. Ibarra
FIRMA DEL CONDUCTOR

ATARFIS LOPES Rodolfo.
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

----------20250815 06:38
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23364
PLACA: SNR969
CONDUCTOR: SANTIAGO IBARRA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.470,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 15 ago 2025 -m06:38 a.
SALIDA: 15 ago 2025 - m06:38 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Santg. Ibarra
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
peso bruto : 17520
Peso tara : 7470
Peso neto : 10050

Scanned with CamScanner
