FECHA (D/M/A): 21-08-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Mantenimiento Puntual

RANGO: 1 diurno | CANTIDAD: 11,00 TON

ZONA: 4

COMUNA: 11 - Laureles

BARRIO: Laureles

FRENTE DE TRABAJO: 11

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 07:00 am
TERMINACIÓN: 07:00 Pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Intervenciones retiradas y en ambos carriles de la vía

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada
TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones de la jornada en conjunto con el contratista.
Instalacion de señalizacion vertical y de cerramiento
Demarcacion del area del pavimento a intervenir, corte y demolicion del mismo.
Visitas:
Se evidencia personal ejerciendo sus labores de ejecución de obra (pavimento) de forma organizada.

Margenty Marta M

Se realiza recorrido social por el Frente de obra, se hace reconocimiento de piezas comunicacionales: Valla Tijera, lona en Vehiculos, cumpliendo con el manual de imagen

Catalina Naranjo K. Soc. Pol. INT

* Se capacitó al personal de obra en manejo de residuos solidos

5. VISITANTES

Margenty Marta mejía G - Pro social DIF

Luisa Restrepo. Residente Social INT

6. FIRMAS

NOMBRE: Andres Reyes 29/08/2025 1059703434	Daniel Alvarez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Guillermo R.	NOMBRE: Juan J. Ramirez R
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 21-08-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Andres Reyes	✓		
2	Encargado	—			
3	Liguero	Ruben Dario, Espinal	✓		
4	Rastrillero	Daniel Galeano Rios	✓		
5	Rastrillero	—			
6	Ayudante	Tony Polo Urueta	✓		
7	Ayudante	Wilson Caicedo	✓		
8	Ayudante	Andres Restrepo	✓		
9	Ayudante	Kaner Ramirez	✓		
10	Ayudante	Jose Valencia	✓		
11	Ayudante	Julian Mazo	✓		
12	Ayudante	—			
13	Ayudante	—			
14	Ayudante	—			
15	Ayudante	—			
16	Operador Rodillo manual	Tony Polo (Ayudante)	✓		
17	Operador compresor	Dibier Castaño	✓		
18	Operador fresadora	—			
19	Operador finisher	—			
20	Operador Retroexcavadora	—			
21	Operador Vibrocompactador	—			
22	Operador Compactador llantas	—			
23	Operador Cortador Asfalto	—			
24	Operador Equipo Imprimación	Ruben Dario Espinal	✓		
25	Operador Mini cargador	—			
26	Operador Barredora	—			
27	Coductor Carrotanque	—			
28	Conductor Camión	Omar Uribe	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Alejandro Estrada	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Ecoroad - 2017	✓		
2	Compresor	Doosan C185	✓		
3	Fresadora	—			
4	Finisher	—			
5	Retroexcavadora	—			
6	Vibrocompactador	—			
7	Compactador llantas	—			
8	Cortador Asfalto	—			
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	EMS 90B.	✓		
11	Soplador	—			
12	Mini cargador	—			
13	Barredora	—			
14	Carrotanque	—			
15	Camión VLH 281	Ford, Cargo 2007	✓		
16	Volqueta(s) ZNM 449.	Internacional	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 21-08-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
3000319	157985	1A	TV 39D # 74A-12	2,60	3,70	0,13	9.62	1,25	3,00
3000319	157985	1B	TV 39D # 74A-12	2,15	2,60	0,13	5,59	0,73	1,75
5001587	159747	2A	TV 39D # Circ 74B	3,50	1,90	0,18	6,65	1,20	2,88
5001587	159747	2B	TV 39D # Circ 74B	2,10	0,90	0,18	1,89	0,34	0,82
3000317	159643	3	CL 39D # 73-152	1,50	1,50	0,14	2,25	0,32	0,77
3000317	159644	4	CL 39D # 73-72	2,10	2,50	0,14	5,25	0,74	1,78
TOTALES							31,25	4,58	11,00

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
521682	ZNM 449	11,02	—	149


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23604	ZNM 449	Sencillo	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 21-08-2025

10. ESQUEMAS

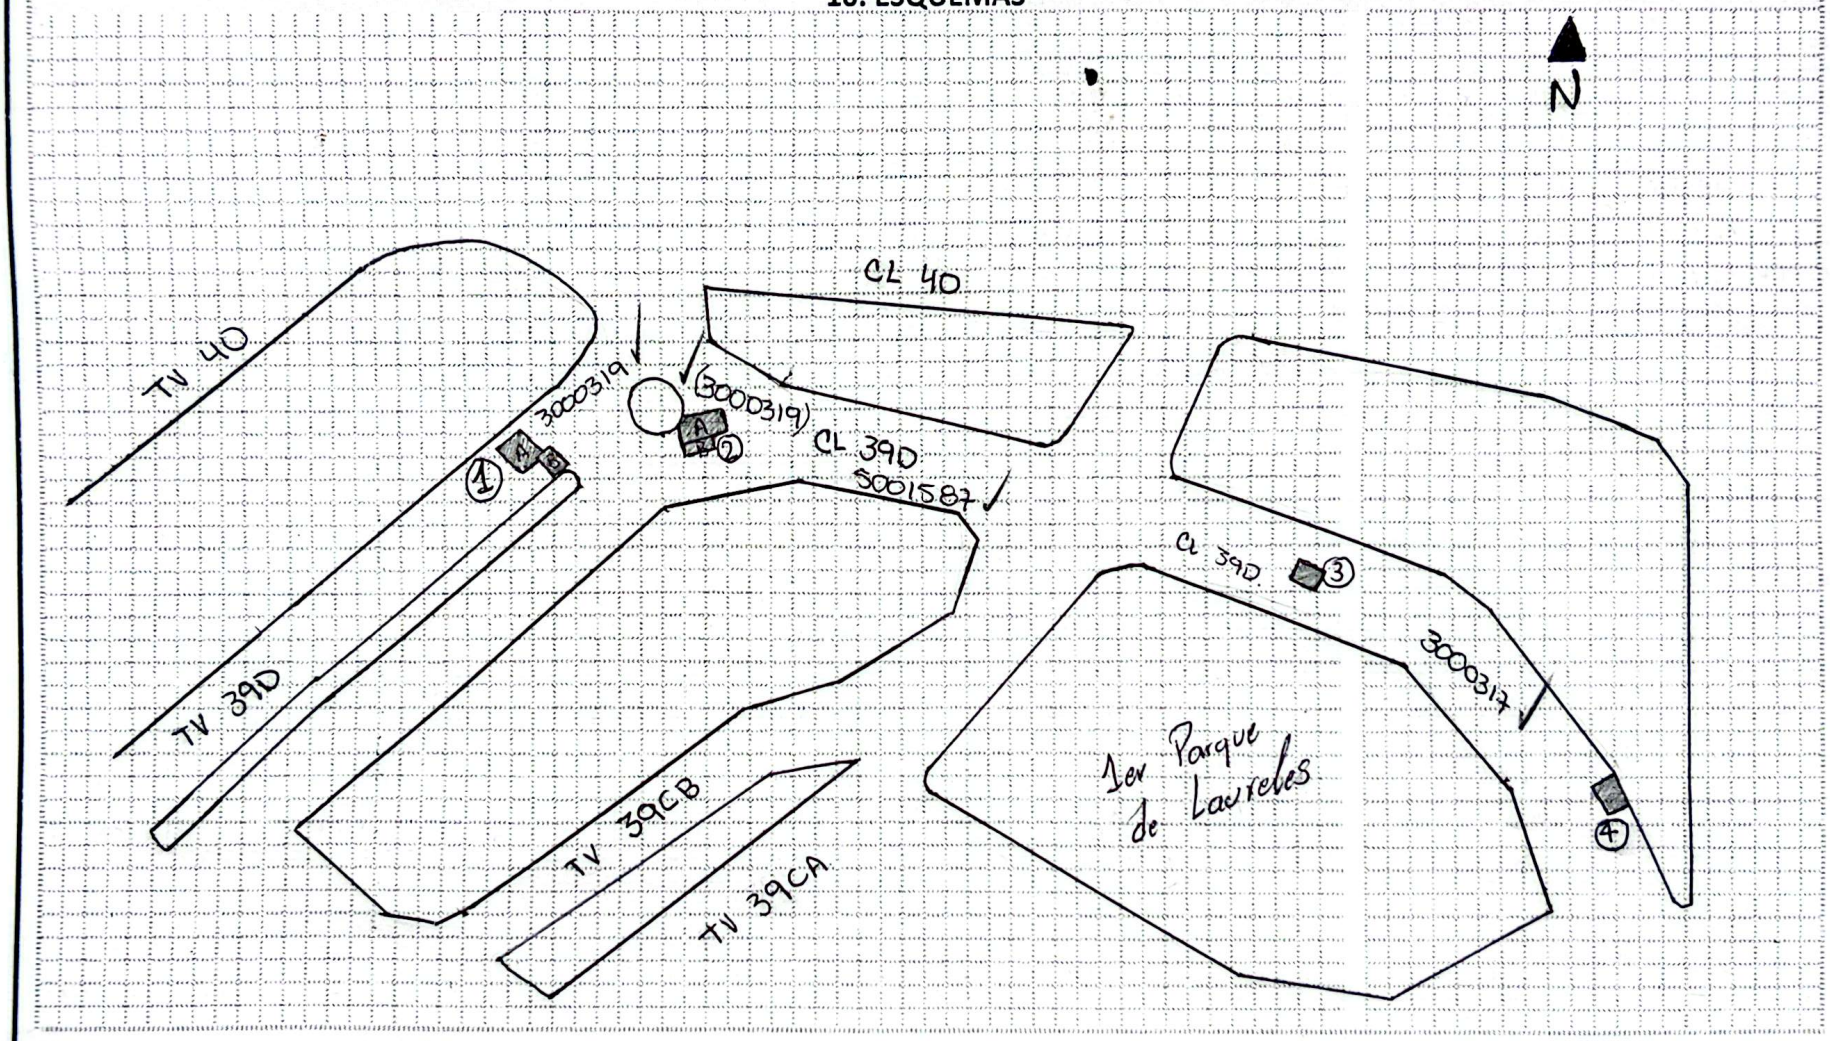

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	11	FRENTE	—
RANGO:	1 diurno	CANTIDAD:	11.00 TON	CANTIDAD:	—
BARRIO	Laureles	DIRECCIÓN	TV 39D Cir 79B	DIRECCIÓN	—

Powered by CamScanner

----------20250821 08:40
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE 2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 521682
PLACA: ZNM449
CONDUCTOR: ALEJANDRO ESTRADA

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 11,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V IAL MED
#2055
PESO TARA: 0,00
PESO BRUTO:11.020,00

ENTRADA: 21 ago 2025 -m08:42 a.
SALIDA: 21 ago 2025 - m08:42 a.
TEMPERATURA:149,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

21/8/25
Andres Reyes 1036403980
FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

David A.

----------20250822 04:51
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23604
PLACA: ZNM449
CONDUCTOR: ALEJANDRO ESTRADA

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.400,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 22 ago 2025 -m06:52 a.
SALIDA: 22 ago 2025 - m06:52 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Alejandro E
FIRMA DEL CONDUCTOR

1036403980
Andres Reyes
FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a Terceros
Peso bruto : 17470
Peso tara : 7400
Peso neto : 10070

David A.

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 21-08-2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO: 1 diurno	CANTIDAD:	11,00 TON	
ZONA	4	FRENTE DE TRABAJO:	11
COMUNA	11- Laureles		
BARRIO	Laureles		

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00 am	Intervenciones retiradas y en ambos carriles de la vía
TERMINACIÓN: 07:00 pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA	Soleada
	TARDE	Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Acopio de escombros y cobertura del mismo
Limpieza de las intervenciones y compactacion de base.
Aplicacion de emulsion asfaltica.
Aplicacion y compactación de mezcla asfaltica tipo MDC 19 tibia con rap.
Cargue de escombros a la volqueta
Limpieza general del frente de obra
Recogida de señalizacion vertical y de cerramiento en el camión.

5. FIRMAS

NOMBRE: Andres Rueda	David Alvarez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Sean Jair Rodriguez C.	NOMBRE: Juan Diego Ramirez
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner
