INFORME No. 04

CONTRATO:	345	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TERMINACION UMI**	**NIT No.:**	**901.919.277-7**
OBJETO:	**CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
PERIODO DEL INFORME:	**AGOSTO DE 2025.**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
6.167.353.887,00	416.317.801,00	JUNIO DE 2025	5.751.036.086,00	FV-1
	444.278.554,00	JULIO DE 2025	5.306.757.532,00	FV-2
ADICION	3.083.611.678,00	JULIO DE 2025	8.390.369.210,00	N/A
	1.416.257.582,00	AGOSTO DE 2025	6.974.111.628,00	FV-3
	726.798.368,00	SEPTIEMBRE DE 2025	6.247.313.260,00	FV-4

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 345 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: el **CONSORCIO TERMINACION UMI,** DURANTE EL MES DE **AGOSTO DE 2025**, HA VENIDO REALIZANDD LA **CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE** LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

El supervisor del contrato se permite certificar que el contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por el Hospital, tal como lo indican en certificación el Arquitecto **ALEXIS FABIAN MORENO GONZALEZ,** y la Arquitecta **MELISSA BERMUDEZ GUARIN,** en su condición de Apoyo a la Supervisión del Contrato por parte del Hospital, el Acta Parcial No. 4, la Sábana de Cuadro de Cantidades Contratadas y Ejecutadas, las Cantidades de Obra Acumulada, la Certificación de Interventoría de pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales por parte del Contratista, Certificación de Interventoría de Cumplimiento con Requisitos Ambientales y Seguridad en el Trabajo por parte del Contratista, Certificación de Interventoría de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas de Materiales y Procesos Constructivos por parte del Contratista, Certificación de Interventoría de Revisión y Verificación de Planillas de Pago de Seguridad Social de los empleados por parte del Contratista, Informe de Interventoría del mes **de AGOSTO** de 2025, y Bitácora de Obra, los que hacen parte integral del presente, y sobre los cuales se basa la supervisión para la elaboración de este informe. (Se anexa CD con Acta Parcial No. 4. La cual contiene Sábana de Cantidades de Obra Ejecutada e Informe del mes de **AGOSTO DE 2025** con todos sus soportes).

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	X		FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES	X	

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 726.798.368.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, septiembre de dos mil veinticinco (2025).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato.

Revisó: ARQ. **ALEXIS FABIAN MORENO GONZALEZ**. Apoyo Supervisión Contrato No. 345 de 2023.
ARQ. **IVON MELISSA BERMUDEZ GUARIN.** Apoyo Supervisión Contrato No. 345 de 2023.

C.C. Carpeta del Contrato.

Elaboró: Dora v. Secretaria Técnica Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

CONSORCIO TERMINACION UMI
NIT 901.919.277-7
Diagonal 74D 32BB 25
Tel: (604) 4883991
Medellín - Colombia
retencionesdelafuente@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 4

Señores	ESE Hospital Universitarios San Rafael de Tunja			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.800.231-0	**Teléfono**	(608) 7405030 - Ext. 000	**Generación**	17/09/2025, 06:11
Dirección	Carrera 11 27 27	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	17/09/2025, 06:11
				Vencimiento	24/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO 345 DE 2025	1.00	559,075,668.00
2	AIU	1.00	167,722,700.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos veintiseis millones setecientos noventa y ocho mil trescientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-24 por $ 726,798,368.00

Total Bruto	726,798,368.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	726,798,368.00

Observaciones:
Valor total ejecutado presente acta parcial #4 (1 de Agosto 2025 a 31 de Agosto 2025)
$ 726.798.368

Favor consignar en la cuenta de Ahorros DAVIVIENDA No 0371 0009 3436 a nombre de CONSORCIO TERMINACION UMI Nit. 901.919.277-7

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090657101 aprobado en 20250318 prefijo FV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112, Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: 7bf021f5a4475cc2912d177fa2ff68c8c6cc23ec464a589b93218a4ec59b7cbdb99d6499601241a5c303ad46d1fd9ba4f

Código: C-F-45	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 01	FORMATO ACTA PARCIAL	Fecha: 24/03/2023
ACTA PARCIAL		FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA PARCIAL	No 4	
FECHA PRESENTE ACTA	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
CONTRATO X CONVENIO	CONTRATO DE OBRA 345 DE 2025	DE FECHA: 08 DE MARZO DE 2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
CONTRATISTA	CONSORCIO TERMINACIÓN UMI R.L. ING. ESTEFANIA CARVJAL HENAO	NIT: 901.919.277-7 C.C: 1.037.630.191
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025 R.L. BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO	NIT: 901.928.077-0 C.C: 1.123.628.511
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR INICIAL :	$ 6.167.353.887,00
ADICIONAL N° 1	VALOR	$ 3.083.611.678,00
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 9.250.965.565,00	
PLAZO INICIAL	10 meses	
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:
PLAZO TOTAL	10 meses	
FECHA DE INICIACIÓN	21/03/2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:	
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31/12/2025	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 01/08/2025 al 31/08/2025	
RBPP N°	232010100102080	

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 232010100102080808

En las oficinas de la obra en la Avenida universitaria 51 - 60 se reunieron los señores, BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO Interventora y la señora ING.ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 79806242, 34458551 de Agosto 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	9.250.965.565,00	
Amortización Anticipo		-
Valor a pagar de la presente acta		*176.798.368,00*
Valor Total actas pagadas		2.276.853.937,00
Saldo por ejecutar		6.247.313.260,00
Sumas iguales	9.250.965.565,00	9.250.965.565,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 0371 0009 3436	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista a interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: ING. ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Contratista
CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

Firma: _____
Nombre: BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACION PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

LOS ARQUITECTOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 345-2025 DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA:

Que el: **CONSORCIO TERMINACIÓN UMI**, identificado con Nit. 901.919.277-7, presentó acta parcial de obra No 4, correspondiente al periodo de ejecución de obra del 01 de agosto al 31 de agosto del 2025, de acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato 345 de 2025.

La siguiente es la relación de documentos a los cuales se les realizo la revisión, y que hacen parte del acta No 4. Aprobada por la interventoría.

1. Formato de ACTA PARCIAL, de la entidad, firmada por los representantes legales de contratista de obra e interventoría. (1 folio).

2. SABANA- CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS, con cantidades de obra contractuales, Balance de obra, condiciones actualizadas, cantidades de obra ejecutada en la presente acta, cantidades de obra acumuladas en acta anterior, Cantidades de obra acumulada. con valor total a pagar en la presente acta de SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, ($726.798.368,00) mtc moneda legal y corriente (3 folios).

3. Factura electrónica de venta No FV 4, emitida por el CONSORCIO TERMINACIÓN UMI. por valor ($726.798.368,00). (1 folio).

4. CERTIFICACION BANCARIA de la empresa CONSORCIO TERMINACIÓN UMI, con NIT. 901.919.277-7 expedida por el banco DAVIVIENDA el producto cuenta de Ahorros Ahorro No 0371 0009 3436 Aperturada el 05 DE JUNIO DE 2025. (1 folio).

5. CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, emitida por la representante legal, ING. ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO, firmada la BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. (1 folio). Con fecha del 16 de septiembre del 2025.

6. CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES, por parte de contador de la empresa o CONSORCIO TERMINACIÓN UMI firmada bajo la gravedad de juramento y emitida por Contador público ELIZABETH JEIN ARIAS SOTO, con C.C. No 44.008.013 y tarjeta profesional No. 207538-T de la Junta Central de Contadores de Colombia. ANEXA fotocopia de cedula de ciudadanía, tarjeta profesional de contador público y certificación de vigencia emitida por la junta central de contadores. (4 folios).

7. Certificación firmada por la representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025, certificando el Acta Parcial No 4 del contrato de obra, en cuanto al cumplimiento: Técnico, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. (2 folios).

8. Certificación firmada por la representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025, certificando al contratista en el CUMPLIMIENTO DE OBRA AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (1 folio).

INFORME DE SUPERVISION No. 4 A LA INTERVENTORIA CONTRATO 352 2025	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

INFORME No:	4	FECHA:	18	de	SEPTIEMBRE	de	2025

PERIODO:	DEL	1	de	AGOSTO	de	2025	AL	30	de	AGOSTO	de	2025

CONTRATO DE OBRA No:	345	DE	2025		

OBJETO:

CONSTRUCCION PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

AVENIDA UNIVERSITARIA No. 51-60 UNIDAD MATERNO INFANTIL MARIA JOSEFA CANELONES

INFORMACION DEL CONTRATO

ENTIDAD TERRITORIAL	
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS Teléfono: 3115228103 Dirección **CARRERA 11 No. 27-27**	

APORTES:ENTIDAD CONTRANTE

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			TOTAL
$ 6.167.353.887,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 6.167.353.887,00**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No RE-CD- 352 - 2025	18 DE MARZO 2025	CRP-758
Estudios Previos	04 DE MARZO 2025	
Proyecto de pliego de condiciones	N/A	MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA
Pliego de condiciones definitivos	N/A	MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA
Acto de adjudicación	N/A	MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	**$ 332.100.432,99**

CONTRATO No:	352	DE	2025		

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA, PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025 Teléfono: 3022948180 Dirección: calle 14 No. 30-247 CARTAGENA BOLV	**BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO** Teléfono: 3022948180 Dirección: calle 14 No. 30-247 CARTAGENA BOLV


INFORME DE SUPERVISION No. 4 A LA INTERVENTORIA CONTRATO 352 2025	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	21	3	2025
PLAZO INICIAL (MESES)		10	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	12	2025
ADICIONES EN PLAZO			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	12	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN Y

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	36,80%	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	57,20%	% PAGOS AUTORIZADOS	13,95%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA: Hospitalizacion 4to nivel y 1mer nivel.
Fachada sur y oriental
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES: En zonas húmedas, como: unidades sanitarias, trabajos limpios, trabajos sucios, cuartos de aseo y filtros de zonas de 1 y 2 nivel.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS BASES Y ACABADOS: En zonas de 1 nivel, como: pasillo URG, sala de espera Adulto, circulaciones y en 4 piso, se registra en: pasillos, central de enfermería, descanso médico, procedimientos, habitaciones de hospitalización, balcón y habitaciones de hospitalización de ginecobstetricia. Bócapuerta en granito en 4 piso.
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DETECCION: Instalación, derivación y alambrado de cable FPLP dentro de la tuberia emt instalada, registrándose en zonas de 3 y 4 nivel.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES: 2do nivel, de: UCI NEONATAL y en 3 nivel, zonas de: hospitalización
CONSTRUCCIÓN DE MUROS PERIMETRALES Y ARMADO DE LOSA DE CUBIERTA Y SE REGISTRA ENTIBADO PARA ESTRUCTURAS ENTERRADAS: TANQUE DE ALMACENAMIENTO
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL Y LLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO, DE ACUERDO A DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES.URBANISMO
NP. PISOS EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE: Zonas húmedas de unidades sanitarias, trabajo limpio, trabajo sucio, cuartos de aseo, residuos, ropa limpia, ropa sucia, duchas y lavados de las zonas de pisos: 1, 2 y 3.
FAJAS CON PAÑETE LISO SOBRE MUROS (M): Tercer piso hospitalización pediátrica, en vanos de puertas desmontadas.
DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS: Tercer piso hospitalización pediátrica.
RED DE GASES MEDICINALES: - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 2" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO BOLA DE 2": Red principal de distribución de Vacío de niveles: 1 y 2 y distribución entre niveles.
RED HVAC: - SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDUCTO EN LÁMINA GALVANIZADA: En niveles 1, 2, Sótano y Fachada Oriental.

INFORME DE SUPERVISION No. 4 A LA INTERVENTORIA CONTRATO 352 2025

HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

RELACION DE ACTAS GENERADAS (inicio, Suspension, reinicio, etc.)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	21 3 2025	

POLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No PÓLIZA	BCH-100042077	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							21	3	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21	3	2025	3	7	2026	$ 33.210.018,50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E IND.	21	3	2025	3	1	2029	$ 33.210.018,50
CALIDAD DEL SERVICIO	3	1	2026	3	1	2031	$ 66.420.037,00

No PÓLIZA	BCH-100008970	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							21	3	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21	3	2025	3	1	2026	$ 569.400.000,00

ADICIONALES Y PRORROGAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ACTA DE INICIO 21-03-25 (Plazo inicial)		DIEZ (10) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
Anticipo		SIN ANTICIPO
ACTA 1	24 6 2025	$ 22.417.915,57
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS		**$ 22.417.915,57**

INFORME DE SUPERVISION No. 4 A LA INTERVENTORIA CONTRATO 352 2025	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
* Supervisar el cumplimiento de las actividades programadas en cada ficha de manejo ambiental	todo el proyecto
* Control de personal, aportes legales y seguridad social, contrato de obra	todo el proyecto
* Verificar que el proyecto cumpla con los permisos ambientales requeridos	todo el proyecto
* Verificar que el personal este siendo debidamente capacitado	todo el proyecto
* Verificar registros de maquinaria y equipo de obra	todo el proyecto
* Verificar que los elementos de atención a emergencias cumplan con los protocolos de seguridad	todo el proyecto
* Verificar que el personal reciba pausas activas	todo el proyecto

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
• Avance de ejecución de Obra • Pendientes técnicos de obra: - Solicitud de Contratista de, definición del tipo de cable para la red de TV: Coaxial o UTP - Se define por la Supervisión, considerar puntos de llamados de enfermería + código para las zonas de hospitalización de 3 y 4 piso. - Solitud de Contratista de, definición si se considera Código Azul para UCI's - Solicitud de Contratista de, definición del tipo de pintura a usar por espacios. - Solicitud de Contratista de, definición de dimensión del vano de ventana en zona de RX hacia el espacio de disparos. - Solicitud de Contratista de, envío del detalle de distribución del espacio en Quirófanos y Salas de Partos. • Recorrido en obra	13	8	2025	Comité de obra 16,

INFORME DE SUPERVISION No. 4 A LA INTERVENTORIA CONTRATO 352 2025				HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
• Pendientes técnicos de obra: - Compromiso de entrega de documento de los requerimientos para el espacio de Data Center por parte del equipo de Sistemas del HUSRT a la Supervisión del contrato. - Consulta de la Supervisión con Colombia +TV, como contratista externo del Hospital, para la definición de si ellos realizan el suministro e instalación del cable (UTP Cat 6ª) de la red de TV. - Se aclara por la Supervisión que, la definición de la pintura por zonas se realizará según requerimientos de la Norma. - Se solicita por arq. Cristian de la Supervisión, considerar con asesor técnico de Gases Medicinales, realizar continuidad individual de anillos por espacios, con el fin de, que el servicio no sea interrumpido totalmente. • Avance de ejecución Obra - Se recuerda a obra, poder programar visita con Bomberos para	20	8	2025	Comité de obra 17
• Definición de especificaciones, tipología y materialidad de Puertas • Definición de ubicación por zonas de llamados de enfermería.				Acta de Reunion No. 16

INFORME DE SUPERVISION No. 4 A LA INTERVENTORIA CONTRATO 352 2025				HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
•Red de TV y puntos de Datos: -Definición de tipo de cable a usar para la red de TV -Se indica por el equipo de apoyo de Sistemas que, obra es la encargada de realizar el suministro e instalación de cableado para la red de TV -Solicitud por la Supervisión a Contratista de Obra, de requerimientos finales para puntos de Datos -Se programa entrega por parte del equipo de Sistemas, la entrega a la Supervisión de los requerimientos para el Data Center, esto para revisión y evaluación por parte de ellos. • Definición de altura de mesón en granito de Laboratorio. • Definición por zonas y pisos de Código Azul en llamados de enfermería. • Definición de la anulación de las puertas de baños sociales de Sala de Espera Adultos 1er piso. • Se solicita por la supervisión que, se instalen en zona de Hospitalización Pediátrica (3er piso) 12 accesorios en sanitarios para uso de niños. • Definición de piso vilico conductivo en zonas de: Tomógrafo y RX (pendiente definición de color) • Definición del dimensionamiento de vano del vidrio blindado en	19	8	2025	Acta de Reunion No. 17

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	21	3	2025	30	4	2025	
Informe de Supervisión No. 2	1	5	2025	31	5	2025	
Informe de Supervisión No. 3	1	6	2025	30	6	2025	
Informe de Supervisión No. 4	1	7	2025	30	7	2025	
Informe de Supervisión No. 5	1	8	2025	30	8	2025	INFORME ACTUAL

OBSERVACIONES:

INFORME DE SUPERVISION No. 4 A LA INTERVENTORIA CONTRATO 352 2025	HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

INFORME DE SUPERVISION

	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual se incorporarón los recursos	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoría	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoria	YA SE RADICO	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	YA SE RADICO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	SI	6 - 657
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	
Copia de informes de Interventoría presentadas de acuerdo al manual de interventoría	SI	1 - 8
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	485 - 492
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	119 - 140
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	YA SE RADICO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	YA SE RADICO	
Bitácora de obra	SI	493 - 508
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	

INFORME DE SUPERVISION No. 4 A LA INTERVENTORIA CONTRATO 352 2025	HOSPITAL Universitario San Rafael de Tunja	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	181 - 198
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	555 - 615
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	NO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	509 - 541
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	SI	222 - 292
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	218 - 287
Generales		
Registro fotográfico	SI	199 - 217
Correspondencia enviada y recibida	SI	141 - 180
Registro de instalación Valla informativa	YA SE RADICO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas de acuerdo al manual de interventoría	SI	1 - 657
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	189 - 192
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	120 - 140
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	YA SE RADICO	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	656
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	YA SE RADICO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	NO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	655
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	657
Generales		
Registro fotográfico	SI	199 - 217
Correspondencia enviada y recibida	SI	141 - 180

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

SubGerente HUSRT

NOMBRE: VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS

ELABORO/REVISO: ARQ. MELISSA BERMUDEZ/PROF APOYO A LA SUPERVISION

	FORMATO	VERSION: 0
	SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS	CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA:	16/09/2025
CONTRATO:	345 DE 2025
OBJETO:	CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION, DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERMINACION UMI
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
V. INICIAL	$ 6,167,353,887.30
V. ADICIONAL	$ 3,083,611,678.00
VALOR TOTAL	$ 9,250,965,565.00

FECHA DE INICIACION REAL	21/03/2025	ACTA PARCIAL	x
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	31/12/2025	ACTA FINAL	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	31/12/2025	ACTA No.	4
		FECHA:	16 de septiembre de 2025
		MES:	agosto de 2025

% OBRA EJECT.	32.5%	% TIEMPO	57.2%

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO			
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor		
1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA**				$ 224,016,456.00		$ 191,616,541.00		$ 147,437,636.00		$ 249,264,179.00		
1.01	ESTUCO MUROS	Metro Cuadrado	12,112.05	$ 16,464.00	$ 148,304,376.00	1,742.86	$ 17,595,994.19	7,432.19	$ 76,466,454.21	9,175.05	$ 93,062,438.41		
1.02	ESTUCO MUROS ANCHOS MENORES DE 0.6 M	Metro Lineal	1,071.88	$ 7,114.00	$ 7,625,212.00	67.38	$ 479,331.32	3,392.26	$ 23,492,277.64	3,359.64	$ 23,971,618.96		
1.03	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro Lineal	3,727.31	$ 8,502.00	$ 31,686,579.00		$ -	4,593.58	$ 39,031,638.25	4,593.58	$ 39,031,638.25		
1.04	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	Metro Cuadrado	8,056.70	$ 10,391.00	$ 80,453,618.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
1.05	PINTURA ANTI BACTERIAL PARA MUROS	Metro Cuadrado	9,043.39	$ 21,868.00	$ 197,759,294.00	2,428.00	$ 67,737,107.16	0.00	$ -	2,428.00	$ 67,737,107.16		
1.06	PINTURA FACHADAS EN VINILO PARA EXTERIORES	Metro Cuadrado	2,403.10	$ 17,574.00	$ 42,238,679.00	663.12	$ 14,372,298.68	469.95	$ 10,176,305.94	1,144.08	$ 24,548,604.62		
1.07	PINTURA FACHADAS EN VINILO PARA EXTERIORES ANCHOS MENORES DE 0.6 M	Metro Lineal	3,488.25	$ 13,647.00	$ 47,598,820.87	344.38	$ 4,623,806.63	176.55	$ 2,400,961.35	522.93	$ 7,024,767.98		
2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES**				$ 220,448,060.00		$ 71,819,868.00		$ 34,322,322.00		$ 106,143,181.80		
2.01	ENCHAPE CERÁMICA BLANCA 30X60CM	Metro Cuadrado	1,708.38	$ 113,392.00	$ 193,794,660.00	60.18	$ 6,824,330.00	286.14	$ 32,466,270.96	346.32	$ 39,290,600.96		
2.02	REMATES BOCEL - LUMINOS MINOS	Metro Lineal	1,200.10	$ 11,543.00	$ 13,848,200.00	213.34	$ 2,423,529.16	165.03	$ 1,877,051.22	378.37	$ 4,300,580.38		
2.03	DILATACION BRONCE	Metro Lineal	880.25	$ 21,409.00	$ 18,841,200.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS - BASES - ACABADOS**				$ 843,775,923.00		$ 14,041,632.00		$ 185,220,886.00		$ 150,262,518.00		
3.01	MORTERO AUTONIVELANTE	Metro Cuadrado	938.24	$ 88,607.00	$ 83,140,838.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEDICANCA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO	Metro Lineal	2,260.65	$ 89,963.00	$ 203,384,596.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
3.03	BOCA PUERTA EN GRANITO FUNDIDO INCLUYE DILATACION EN BRONCE	Metro Lineal	847.31	$ 74,462.00	$ 63,097,804.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
3.04	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSIN DE GRANITO	Metro Cuadrado	4,164.07	$ 41,392.00	$ 172,357,626.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
3.05	BANDAS ANTIDESLIZANTES	Metro Lineal	168.75	$ 24,826.00	$ 4,189,726.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ANTIGUO CONDUCTOLINO INCLUYE MEDIA CAÑA EN PVC	Metro Cuadrado	166.79	$ 324,355.00	$ 54,092,693.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO ANTIBACTERIAL (NO INCLUYE MEDIA CAÑA EN PVC)	Metro Cuadrado	898.19	$ 652,917.00	$ 211,994,913.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
3.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL BOCACAÑA CURVO EN PVC	Metro Lineal	2,066.39	$ 32,839.00	$ 108,833,989.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA**				$ 956,796,251.00		$ -		$ -		$ -		
4.01	DIVISION PARA BATERIA SANITARIA - EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO	Metro Cuadrado	75.35	$ 717,007.00	$ 54,031,064.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
4.02	ENCHAPADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE	Metro Lineal	20.39	$ 750,471.00	$ 15,079,586.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
4.03	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PINTURA BLANCA HOSPITALARIA	Metro Cuadrado	597.07	$ 458,093.00	$ 268,599,250.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
4.04	DIVISION EN ALUMINIO PINTURA BLANCA DOBLE PANTALLA NO INCLUYE VIDRIO, ESTE SE PARTE POR SUPERSECTADO (DE)	Metro Cuadrado	644.94	$ 346,624.00	$ 223,551,633.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
4.05	MANTENIMIENTO PUERTA EN STENTE EN PVC	Metro Cuadrado	360.73	$ 214,833.00	$ 77,498,553.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
4.06	MANTENIMIENTO VENTANA EN STENTE EN PVC	Metro Cuadrado	160.75	$ 177,662.00	$ 28,560,643.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
4.07	VIDRIO 4 MM	Metro Cuadrado	37.14	$ 64,903.00	$ 2,311,737.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
4.08	VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 3+3 MM	Metro Cuadrado	627.29	$ 242,576.00	$ 136,459,654.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
4.09	CERRADURA ALCOBA	Unidad	458.00	$ 51,936.00	$ 23,782,200.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
4.1	CERRADURA BAÑO	Unidad	56.00	$ 62,205.00	$ 3,484,200.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
4.11	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	Unidad	30.00	$ 156,151.00	$ 4,684,530.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
4.12	SELLADO DEL MARCOS VENTANERIA CON FONDO DE JUNTA CON ESPUMA Y ACABADO DE JUNTA CON VASELINA ELASTICA DE POLIURETANO	Metro Lineal	1,854.76	$ 29,469.00	$ 54,656,470.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
4.13	SUMINISTRO GUARDA CAMILLA PLASTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INCLUYE PUNTERA DE REMATE	Metro Lineal	204.90	$ 183,059.00	$ 37,500,027.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS**				$ 278,163,748.00		$ -		$ -		$ -		
5.01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETRO	Unidad	112.00	$ 1,975,243.00	$ 221,227,672.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER SIN REBOSADOR BLANCO INC. GRIFERIA	Unidad	143.00	$ 294,224.00	$ 42,068,256.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO GRIFERIA CROMO	Unidad	21.00	$ 313,559.00	$ 6,587,940.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCION**				$ 330,864,354.00		$ 17,776,922.00		$ 109,046,669.00		$ 126,726,092.00		
6.01	TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE CONECTORES, SOPORTES, ETC	Metro Lineal	2686.70	$ 29,832.00	$ 80,135,834.00		$ -	2,107.81	$ 62,821,980.22	2,107.81	$ 62,821,980.22		
6.02	SALIDA APARATO DE DETECCIÓN	Unidad	436.70	$ 113,203.00	$ 49,437,636.00		$ -	400.00	$ 45,426,309.00	400.00	$ 45,426,309.00		
6.03	CABLE FP	Metro Lineal	9,830.33	$ 10,043.00	$ 98,731,660.00	1,770.56	$ 17,776,922.40	0.00	$ -	1,770.56	$ 17,776,922.40		
6.04	BOCINA CON ESTROBO	Unidad	84.00	$ 103,105.00	$ 8,660,820.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
6.05	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO	Unidad	360.00	$ 328,417.00	$ 114,246,650.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
6.06	DETECTOR TERMICO	Unidad	4.00	$ 268,804.00	$ 1,134,176.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
6.07	ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA	Unidad	24.00	$ 293,007.00	$ 7,393,128.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
6.08	MODULO DE MONITOREO	Unidad	30.00	$ 290,944.00	$ 7,369,320.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
6.09	PANEL DE CONTROL	Unidad	1.00	$ 11,371,672.00	$ 11,371,672.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
7	**SUMINISTRO E INSTALACION DE GASES MEDICINALES**				$ 1,136,645,810.00		$ 67,646,199.00		$ 382,299,304.00		$ 490,238,590.00		
7.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L D.ANG. 1/2" INCLUYE ACCESORIOS.	Metro Lineal	1300.33	$ 125,442.00	$ 163,108,206.00	438.86	$ 46,273,493.00	886.27	$ 93,436,881.54	1,325.13	$ 139,706,375.54		
7.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L D.ANG. 3/4" INCLUYE ACCESORIOS.	Metro Lineal	1500.30	$ 140,667.00	$ 211,000,500.00	327.52	$ 44,634,585.84	1,139.97	$ 157,542,819.99	1,467.49	$ 202,177,405.83		
7.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L D.ANG. 1" INCLUYE ACCESORIOS.	Metro Lineal	174.40	$ 237,492.00	$ 41,423,693.00	16.75	$ 3,977,991.00	423.64	$ 100,611,113.88	440.39	$ 104,589,104.88		
7.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L D.ANG. 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS.	Metro Lineal	96.50	$ 290,993.00	$ 28,623,700.00	21.79	$ 6,253,204.70	101.40	$ 29,089,702.00	123.19	$ 35,346,906.70		
7.05	GENTEC CHEETAH L OUTLET - 1/2" O2	Unidad	192.36	$ 543,829.00	$ 68,347,138.80		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
7.06	GENTEC CHEETAH L OUTLET - 1/2" VAC	Unidad	140.20	$ 543,829.00	$ 76,135,040.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
7.07	GENTEC CHEETAH L OUTLET - 1/2" AIR	Unidad	112.00	$ 543,829.00	$ 60,908,848.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
7.08	ALARMA DE AREA DE FABRICACION NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 5 GASES INCLUYE INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXION ELECTRICA INTERNA DE LOS MODULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CABLEADO A CERO METROS.	Unidad	9.00	$ 9,727,997.00	$ 85,331,973.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
7.09	ALARMA DE AREA DE FABRICACION NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 4 GASES INCLUYE INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXION ELECTRICA INTERNA DE LOS MODULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CABLEADO A CERO METROS.	Unidad	14.00	$ 10,463,843.00	$ 146,440,026.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
7.1	ALARMA DE AREA DE FABRICACION NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 6 GASES INCLUYE INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXION ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MODULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CABLEADO A CERO METROS.	Unidad	3.00	$ 11,855,117.00	$ 35,565,330.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
7.11	CAJA DE VALVULAS CON VALVULA TIPO H TORN AUDS 900 INCL DANE FABRICACIÓN NACIONAL INCLUYE INSTALACIÓN	Unidad	6.00	$ 2,929,849.00	$ 14,379,054.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
7.12	CAJA DE VALVULAS CONVENCIONALES EN 3S TIPO A TORNILLOS 6X0 W/OG. DIAM: 1 1/2"-1/2"-1 1/2" 2" 2-1/2" 3" FABRICACION NACIONAL, INCLUYE INSTALACION	Unidad	3.00	$ 2.653.617.00	$ 7.960.851.00		$ -	3.00	$ -	3.00	$ -
7.13	CAJA DE VALVULAS CONVENCIONALES TIPO A TORNILLOS 6X0 W/OG. DIAM: 1 1/2"-1/2" FABRICACION NACIONAL, INCLUYE INSTALACION	Unidad	14.00	$ 2.091.033.00	$ 29.268.462.00		$ -	4.00	$ 8.367.600.00	4.00	$ 8,367,600.00
7.14	CONTROL DE REGULACION TIPO 1 PARA 02 Y AIRE DE ALTO FLUJO 6X0 REGULADORES DE ALTA CONOA 6708 Y UN REGULADOR DE LINEA CONOA 67M (DOBLE BY-PASS)	Unidad	1.00	$ 7,256,897.00	$ 7,256,897.00		$ -	3.00	$ -	3.00	$ -
7.15	CONTROL DE REGULACION TIPO 1 PARA 02 Y AIRE DE ALTO FLUJO 4S INCLUYE DOS REGULADORES DE ALTA CONOA 6740 Y UN REGULADOR DE LINEA CONOA 67M O REGO 1744 CON BY-PASS	Unidad	1.00	$ 8,633,025.00	$ 8,633,025.00		$ -	3.00	$ -	3.00	$ -
7.16	ESTRUCTURA PARA MANIFOLD 2X2 CON SOPORTES VALVULAS DE CORTE DE ALTA PRESION POR CILINDRO Y MANGUERAS IMPORTADAS PARA INSTALAR A MURO	Unidad	2.00	$ 10,182,089.00	$ 20,364,178.00		$ -	9.00	$ -	9.00	$ -
7.17	RACOR G 3S PARA SUMINISTRO PISO 2	Unidad	18.00	$ 42,767.00	$ 676,766.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.18	RACOR G 3S PARA JOCKEY PISO 2	Unidad	186.00	$ 42,767.00	$ 9,376,282.00		$ -	0.00	$ -	3.00	$ -
7.19	SISTEMA DE EVACUACION DE GASES ANESTESICOS CON GENTEC SISTEMAS INCLUYE CAJA EN A 1/2" NO PARA NOVENA ESTRENO	Unidad	3.00	$ 9,344,441.00	$ 28,033,323.00		$ -	0.00	$ -	3.00	$ -
7.2	SISTEMA PULMON TRADICIONAL (INTERCONEXIÓN, SISTEMA PRINCIPAL Y SISTEMA BACKUP) - PLANO CAD-184 INCLUYE INSTALACION	Unidad	2.00	$ 7,391,525.00	$ 22,174,575.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.21	TOMA PANEL CONNECT SERIE 400 VACIO	Unidad	18.00	$ 548,365.00	$ 9,870,570.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.22	UNIDAD DE REGULACION DOBLE EN BRONCE DE 3" PARA TANQUE CRIOGENICO SISTEMA DE AIRE MEDICINAL SIN CON FILTROS EN Y Y REGULADORES REGO ALTO FLUJO	Unidad	3.00	$ 23,710,583.00	$ 71,131,749.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.23	VALVULA DE CORTE EN BRONCE MARCA CMO SIMILAR NO PROCEDENCIA ASIÁTICA, DIAM: 1" INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE TODO COSTO	Unidad	4.00	$ 376,356.00	$ 1,505,424.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.24	VALVULA DE CORTE EN BRONCE MARCA CMO SIMILAR NO PROCEDENCIA ASIÁTICA, DIAM: 1 1/2" INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE TODO COSTO	Unidad	101.00	$ 269,025.00	$ 36,924,348.00	-3.00	$ (1,128,768.00)	3.00	$ 1,228,768.00	0.00	$ -
7.25	VALVULA DE CORTE EN BRONCE MARCA CMO SIMILAR NO PROCEDENCIA ASIÁTICA, DIAM: 1/2" 2" INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE TODO COSTO	Unidad	2.00	$ 585,780.00	$ 1,171,560.00	+5.00	$ 1,045,140.00	5.00	$ 1,045,140.00	0.00	$ -
7.26	VALVULA DE CORTE EN BRONCE MARCA CMO SIMILAR NO PROCEDENCIA ASIÁTICA, DIAM: 3" INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE TODO COSTO	Unidad	114.00	$ 264,792.00	$ 30,186,288.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8	TANQUE DE ALMACENAMIENTO				$ 169,013,838.00	+4.00	$ 1,059,169.00	4.00	$ 1,059,169.00	0.00	$ -
8.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	Metro Cuadrado	120.00	$ 6,371.00	$ 764,520.00		$ 89,948,384.00		$ 89,539,456.00		$ 159,487,840.00
8.02	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Metro Cubico	236.94	$ 25,449.00	$ 6,029,706.00	1,479.00	$ 9,416,330.00	75.04	$ 479,354.04	1,553.04	$ 9,895,692.04
8.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cubico	58.99	$ 64,534.00	$ 3,806,013.87		$ -	341.62	$ 8,693,995.54	341.62	$ 8,693,995.54
8.04	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Metro Cubico	17.79	$ 95,421.00	$ 1,697,536.00		$ -	27.33	$ 1,763,710.35	27.33	$ 1,763,710.35
8.05	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	Metro Cubico	1,004.27	$ 1,850.00	$ 1,857,900.00		$ -	13.66	$ 1,303,925.10	13.66	$ 1,303,925.10
8.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y O GRANULAR DESPUES DE 3 KM INSTALADO Y COMPACTADO SEGUN SECCION DE DISEÑO	Metro/km	4,527.62	$ 2,342.00	$ 10,604,648.00	1,292.00	$ 2,393,199.57	0.00	$ -	1,292.00	$ 2,393,199.57
8.07	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES A TUSOS	Metro Cuadrado	109.76	$ 53,869.00	$ 5,913,624.00	9,228.21	$ 19,048,748.25	0.00	$ -	9,228.21	$ 19,048,748.25
8.08	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS (MIN 2 CMS)	Metro Cuadrado	64.48	$ 41,574.00	$ 2,680,672.00	95.03	$ 7,233,476.46	0.00	$ -	95.03	$ 7,233,476.46
8.09	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - 4000 PSI, IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Metro Cubico	15.36	$ 1,005,344.00	$ 20,624,350.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.1	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - 4000 PSI, IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Metro Cubico	18.90	$ 1,152,691.00	$ 20,181,259.00		$ -	29.97	$ 27,533,063.28	29.97	$ 27,533,063.28
8.11	SUMINISTRO Y DOBLADO Y ARMADO DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	5,168.40	$ 7,000.00	$ 57,103,726.00	2.71	$ 2,567,497.51	12.69	$ 16,994,944.69	15.40	$ 19,562,432.86
8.12	CINTA SIKA PVC V-22	Metro lineal	70.40	$ 76,643.00	$ 5,396,667.00	4,140.84	$ 28,994,133.67	3,316.98	$ 24,825,555.95	7,457.82	$ 53,819,992.62
8.13	IMPERMEABILIZACION DE TANQUES Y OBRAS HIDRAULICAS TIPO SIKATOP SEAL 107 O SIMILAR	Metro Cuadrado	102.96	$ 263,016.00	$ 26,350,627.00		$ -	28.00	$ 2,146,004.00	28.00	$ 2,146,004.00
9	CONSTRUCCIÓN DE URBANISMO				$ 283,625,312.00		$ -	3.00	$ -	3.00	$ -
9.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Metro Cubico	69.43	$ 64,534.00	$ 4,481,836.00		$ 8,613,295.00		$ 87,884,859.00		$ 92,898,165.00
9.02	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO MANUAL Y O EQUIPO COMPACTADOR	Metro Cubico	68.99	$ 93,648.00	$ 6,462,000.00	577.56	$ 5,623,295.00	909.43	$ 51,847,419.49	581.20	$ 56,860,710.89
9.03	ANDEN ACOPLANDO DESAGUE	Metro Cuadrado	350.00	$ 125,668.00	$ 43,783,800.00		$ -	397.56	$ 36,037,443.77	397.56	$ 36,037,443.77
9.04	ASEO GENERAL ENTREGA	Metro Cuadrado	7,375.52	$ 7,139.00	$ 52,655,979.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.05	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17 E=0.17 M - 3000 PSI	Metro Cuadrado	120.00	$ 120,054.00	$ 15,606,480.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.06	PISO EN GRAVA INCL. TIERRA NEGRA	Metro Cuadrado	2,000.00	$ 30,643.00	$ 61,668,000.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.07	SARDINEL FUNDIDO EN SITU H=0.40 MTS - A=0.20 MTS CONCRETO DE 2500 PSI	Metro lineal	140.00	$ 56,910.00	$ 7,309,230.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.08	BORDE CONTENEDOR DE RAMPAS A-10	Metro lineal	60.00	$ 81,011.00	$ 4,860,660.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.09	CANUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	Metro lineal	20.00	$ 61,099.00	$ 1,221,800.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.1	CERRAMIENTO METALICO	Metro Cuadrado	258.00	$ 366,824.00	$ 88,195,872.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10	ITEMS NO PREVISTOS						$ -	3.00	$ -	0.00	$ -
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE	Metro Cuadrado		$ 87,713.00			$ 176,719,336.00		$ 734,771,885.00		$ 614,491,221.00
NP 2	AJUSTADO PISO 15 E=4.0 CM	Metro Cuadrado		$ 39,159.57		163.81	$ 14,355,407.16	0.00	$ -	163.81	$ 14,368,407.16
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN DE GRANITO (0.30 X 0.30 X 1.7 CM)	Metro Cuadrado		$ 132,448.57			$ -	189.96	$ 6,001,641.55	189.96	$ 6,001,641.55
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION SANITAR CODE FLUXOMETRO MOVILIDAD REDUCIDA	Unidad		$ 1,940,264.00			$ -	793.42	$ 105,085,519.54	793.42	$ 105,085,519.54
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BALCONER COLOR BLANCO	Unidad		$ 332,271.20			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SEMIPEDESTAL	Unidad		$ 565,535.00			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Unidad		$ 358,625.11			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3/4 1/2 S PARA BAÑO IMPORTADO EL PORTAJABON TOALLERO EN ACERO INOXIDABLE	Unidad		$ 89,032.50			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	Metro lineal		$ 73,454.27			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	Metro lineal		$ 101,592.80			$ -	4.00	$ 434,771.20	4.00	$ 434,771.20
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA 36 ALCANTARILLADO PVC D=12"	Metro lineal		$ 87,993.05			$ -	100.00	$ 21,681,431.16	100.00	$ 21,681,431.16
NP 12	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 Y 1.00 (INCLUYE TAPA)	Unidad		$ 727,841.36			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLO Y TAPA EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCION D=1.50 M	Unidad		$ 1,807,760.50			$ -	0.80	$ -	0.80	$ -
NP 14	POZO DE INSPECCIÓN CILÍNDRICO INTERIOR 1.2 M (2.23 M < H < 2.50 M) (INC. INCLUYE ANILLO Y TAPA)	Unidad		$ 2,608,093.27			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACIÓN SUBRASANTE CAPAS GRANULARES Y O SUBDRENES FILTROS	Metro cuadrado		$ 7,325.24			$ -	81.22	$ 595,065.94	81.22	$ 595,065.94
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE 10-25 MM DE CANTO RODADO	Metro cubico		$ 137,693.68			$ -	69.37	$ 9,520,123.95	69.37	$ 9,520,123.95
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal		$ 13,454.89			$ -	29.20	$ 677,396.26	29.20	$ 677,396.26
NP 18	CONCRETO CICLOPEO DE 21 MPA 3000 PSI RELACION 60% CP	Metro cubico		$ 588,750.71			$ -	36.77	$ 21,647,930.62	36.77	$ 21,647,930.62
NP 19	PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO	Metro lineal		$ 161,372.63			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 20	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal		$ 2,694.48			$ -	379.62	$ 1,023,641.53	379.62	$ 1,023,641.53
NP 21	CORTE Y DEMOLICION CONCRETO 17C PISO EN BALDOSA DE GRANO PARA LA INSTALACION DE MEDIA CAÑA	Metro lineal		$ 2,691.00		4,983.23	$ 14,406,512.15	0.00	$ -	4,983.23	$ 14,406,512.15
NP 22	CERRAMIENTO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 6 MM	Metro cuadrado		$ 69,026.00			$ -	226.73	$ 19,653,933.36	226.73	$ 19,653,933.36
NP 23	AJUSTE EN PISO UNA CARA DE E = 0.08 M, EN LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 2 MM	Metro lineal		$ 67,478.00			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTETICO PARA ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO	Kilogramo		$ 4,197.57			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTENIDA PARA PAÑETAR	Metro cuadrado		$ 23,401.47		253.15	$ 5,900,750.86	252.15	$ 5,900,750.86	252.15	$ 5,900,750.86
NP 26	PAÑETE LISO 3/8 CON MALLA 1:4	Metro cuadrado		$ 23,441.07		471.37	$ 18,591,494.93	0.00	$ -	471.37	$ 18,591,494.93
NP 27	PAÑA PAÑETE LISO 1/2 1:4	Metro lineal		$ 21,550.00		166.40	$ 3,588,920.00	623.45	$ 13,432,347.50	789.85	$ 17,021,267.50
NP 28	DESMONTE DE MARCOS PUERTAS Y VENTANAS	Metro cuadrado		$ 97,207.12		81.83	$ 2,554,134.36	240.77	$ 7,534,063.78	322.61	$ 10,088,238.16
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO L DIAM: 2" INCLUYE ACCESORIOS	Metro lineal		$ 849,372.00		9.86	$ 3,444,807.92	81.73	$ 28,554,173.98	91.59	$ 31,999,981.46
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE AREA CODE DIGITAL GASES MEDICINALES	Unidad		$ 6,763,165.00			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN BRONCE DIAM 2"	Unidad		$ 736,205.00		1.00	$ 736,206.00	1.00	$ 738,206.00	2.00	$ 3,476,412.00
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE DE 1 1/2"-1/2" EN BRONCE	Unidad		$ 1,261,835.00			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 3/8 " L"	Metro lineal		$ 102,765.00			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 34	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE 5/8 " L"	Metro lineal		$ 173,165.00			$ -	3.00	$ -	0.00	$ -

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE DIMENSIONES SEGN PLANOS INCLUYE SOPORTERIA TIPO PERFIL LA CUELGA CAMPANA TAPA LLAVE ACUMULADOR OTROS REDUCCION ELEMENTOS DE SUJECION ANGULARES SELLANTE ESPUMEROS TORNILLERIA DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION FUNCIONAMIENTO	Kilogramo		$ 53,051.00		2,620.18	$ 140,021,359.11	6,924.57	$ 473,946,579.20	11,574.75	$ 614,167,961.30
NP 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LAMINA RIGIDA DE POLISOCIANURATO DE 50 MM DE ESPESOR RECUBIERTO POR AMBAS CARAS CON LAMINA DE ALUMINIO CORRUGADO DE 60 MICRAS DE ESPESOR INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION ANGULARES SELLANTE Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Metro cuadrado		$ 170,027.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 37	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 6" X 6" TIPO ALETA FIJA O SIMILARES A LA REFERENCIA DE LAMINA RE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MULTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑON INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 152,111.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 38	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 8" X 8" TIPO ALETA FIJA O SIMILARES A LA REFERENCIA DE LAMINA RE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MULTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑON INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 222,511.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 39	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 8" X 8" TIPO ALETA FIJA O SIMILARES A LA REFERENCIA DE LAMINA RE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MULTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑON INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 268,111.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 40	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 12" X 12" TIPO ALETA FIJA O SIMILARES A LA REFERENCIA DE LAMINA RE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MULTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑON INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 298,111.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 41	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO EXTRACCION O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 6x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DAMPER) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 164,313.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO EXTRACCION O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 8x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DAMPER) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 241,152.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 43	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO EXTRACCION O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 8x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DAMPER) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 215,403.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 44	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO EXTRACCION O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 10X6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DAMPER) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 247,182.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 45	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO EXTRACCION O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 10x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DAMPER) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 303,780.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 46	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO EXTRACCION O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DAMPER) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 342,917.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 47	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO EXTRACCION O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DAMPER) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 382,567.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 48	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO EXTRACCION O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12x12 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DAMPER) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 416,137.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 49	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO EXTRACCION O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 16x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DAMPER) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 440,363.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO EXTRACCION O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 16x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DAMPER) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 503,741.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 51	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO EXTRACCION O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 16x10 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DAMPER) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 624,141.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 52	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO EXTRACCION O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 20x18 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DAMPER) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Unidad		$ 747,625.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 53	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR FLUJO LAMINAR CIRCULAR CON PORTA FILTRO TERMINAL DE 24"x24"	Unidad		$ 2,636,975.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 54	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS HEPA TERMINALES 24" X 24" DE 3" DE ESPESOR	Unidad		$ 1,941,000.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP 55	BALANCEAMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AIRE ENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO INCLUYE BAROMETRO O ANEMOMETRO TOMA DE MEDIDAS SUPERVISION E INFORME	Unidad		$ 1,227,457.00		0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	COSTOS DIRECTOS				$ 4,744,116,374.00		$ 659,075,668.00		$ 1,751,426,105.00		$ 2,338,501,776.00
	A.I.U. __%				$ 1,423,235,513.00		$ 197,722,700.00		$ 525,427,832.00		$ 701,550,532.00
	COSTO TOTAL				$ 6,167,393,887.00		$ 726,798,368.00		$ 2,276,853,937.00		$ 3,003,652,309.00

VALOR OBRAS EJECUTADAS	$ 726,798,368.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO __%	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 726,798,368.00

SON: SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L


Firma: ____
BRENDA LIZ HUNTADO HUNTADO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025


Firma: Estefanía Carvajal H
ESTEFANIA CARVAJAL HUTAO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
CONSORCIO TERMINACION UNO

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	1.01	ESTUDIO MUROS	CAP	1.00

Registro fotográfico

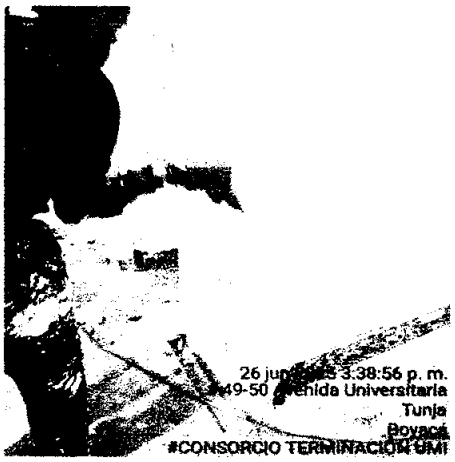

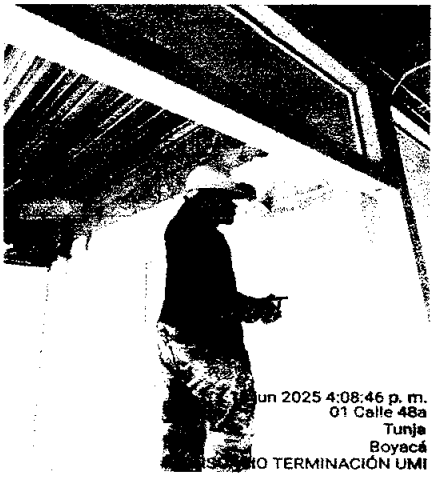






SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA		UNIDAD	Metro Cuadrado		UBICACIÓN	UNI SAN RAFAEL
Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
SOTANO						
19.00	2.53	N/A	1	100%	48.06	LAVANDERIA
1.50	2.10	N/A	-1	100%	-3.15	RESTA DE UNA PUERTA LUZ LAVANDERIA
27.90	2.70	N/A	1	100%	75.33	PARQUEADERO SOTANO
23.15	2.80	N/A	1	100%	64.82	PARQUEADERO SOTANO
1.00	2.10	N/A	-5	100%	-10.50	DESCUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
1.50	2.10	N/A	-1	100%	-3.15	DESCUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
0.40	2.00	N/A	-1	100%	-0.80	DESCUENTO VENTANA AREA DE PARQUEADERO
1.20	2.10	N/A	-5	100%	-12.60	DESCUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
1.00	1.10	N/A	-1	100%	-1.10	DESCUENTO VENTANA AREA DE PARQUEADERO
14.00	2.45	N/A	1	100%	34.30	CONSULTORIO DE DIETAS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA CONSULTORIO DE DIETAS
16.66	2.45	N/A	1	100%	40.82	ROPA LIMPIA
1.40	2.10	N/A	1	100%	2.94	DESCUENTO PUERTA ROPA LIMPIA
9.38	2.50	N/A	1	100%	23.45	ROPA SUCIA
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO PUERTA ROPA SUCIA
56.68	2.35	N/A	1	100%	124.64	BODEGA FARMACIA
0.40	2.00	N/A	-1	100%	-0.80	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
0.90	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUENTO DE PUERTA BODEGA FARMACIA
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.54	DESCUENTO DE PUERTA BODEGA FARMACIA
38.19	2.52	N/A	1	100%	96.01	ARCHIVO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.54	DESCUENTO DE PUERTA ARCHIVO
0.40	1.20	N/A	-1	100%	-0.48	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
0.40	2.00	N/A	-1	100%	-0.80	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
20.21	2.45	N/A	1	100%	49.51	CUARTO ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DIETAS
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.65	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
15.10	2.53	N/A	1	100%	38.20	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
1.05	2.39	N/A	-1	100%	-2.77	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
14.82	2.50	N/A	1	100%	37.05	DEP. CADAVERES
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO PUERTA EN DEP DE CADAVERES
11.21	2.40	N/A	1	100%	26.90	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2.20	2.20	N/A	1	100%	4.84	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
1.40	1.50	N/A	1	100%	2.10	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.55	1.00	N/A	1	100%	-0.55	DESCUENTO VENTANA EN CIRCULACION
14.00	2.50	N/A	1	100%	33.15	CIRCULACION SALA DE ESPERA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
8.53	0.73	N/A	1	100%	-6.24	DESCUENTO VENTANA EN CIRCULACION
17.25	2.52	N/A	1	100%	43.47	DEPOSITO ALMACEN
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA EN DEPOSITO ALMACEN
0.55	1.00	N/A	-1	100%	-0.55	DESCUENTO VENTANA EN DEPOSITO ALMACEN
2.40	0.40	N/A	-1	100%	-0.80	DESCUENTO VENTANA EN DEPOSITO ALMACEN
14.22	2.70	N/A	1	100%	38.38	ASEO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO PUERTA
0.40	0.67	N/A	-1	100%	-0.27	DESCUENTO VENTANA
PISO 1						
17.53	2.60	N/A	1	100%	45.58	LOCUTATORIO
2.03	1.10	N/A	1	100%	3.22	MURO INTERMEDIO ALABAMA FRENTE
0.92	2.09	N/A	1	100%	2.63	MURO INTERMEDIO LAVA OJOS
4.84	2.60	N/A	1	100%	12.06	CUARTO LAVAMATERIAL
0.80	2.10	N/A	-3	100%	-5.04	DESCUENTO PUERTA
1.30	1.30	N/A	-4	100%	-6.76	DESCUENTO VENTANA
10.21	0.99	N/A	1	100%	10.14	LABORATORIO INFECTOLOGIA
2.74	1.39	N/A	1	100%	3.29	LABORATORIO INFECTOLOGIA
1.65	1.15	N/A	1	100%	2.64	LABORATORIO INFECTOLOGIA
35.74	2.50	N/A	1	100%	76.98	LABORATORIO PARASITOLOGIA
0.92	2.10	N/A	-1	100%	-2.84	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
0.91	2.10	N/A	-1	100%	-1.83	DESCUENTO VENTANA
0.77	2.10	N/A	-1	100%	-1.49	DESCUENTO PUERTA
1.30	0.65	N/A	-1	100%	-0.85	DESCUENTO VENTANA
2.60	2.50	N/A	1	100%	9.08	LAVAMANOS/SOBROS RESPOLABLES ORDINARIOS
0.78	2.10	N/A	-1	100%	-1.66	DESCUENTO PUERTA
0.65	1.39	N/A	-1	100%	-0.64	DESCUENTO VENTANA
0.75	0.95	N/A	-1	100%	-0.74	DESCUENTO VENTANA
3.91	2.69	N/A	1	100%	10.17	CUARTO NEVERA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-2.08	DESCUENTO PUERTA
10.97	2.60	N/A	1	100%	26.39	CUARTO TRANFUSIONAL
0.92	2.10	N/A	-3	100%	-2.84	DESCUENTO DE PUERTA
0.45	1.10	N/A	-1	100%	-1.43	DESCUENTO DE VENTANA
0.95	1.00	N/A	-1	100%	-0.95	DESCUENTO D. VENTANA
5.46	2.60	N/A	1	100%	14.20	CUARTO NEVERA MURO
3.77	2.60	N/A	1	100%	9.65	HALL CIRCULACION
3.81	0.61	N/A	1	100%	9.74	CIRCULACION HALL
4.49	2.60	N/A	1	100%	18.56	MURO HALL ENTRADA LABORATORIO
3.70	2.60	N/A	1	100%	9.62	MURO TOMA DE MUESTRAS
2.86	2.60	N/A	1	100%	7.44	MURO TOMA DE MUESTRAS
2.80	2.60	N/A	1	100%	7.28	MURO TOMA DE MUESTRAS
1.61	2.60	N/A	1	100%	4.26	TOMA DE MUESTRAS
3.61	2.60	N/A	1	100%	9.48	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
1.47	2.60	N/A	1	100%	3.82	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
1.16	2.60	N/A	1	100%	4.34	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.66	DESCUENTO DE PUERTA GINECOLOGICA
2.06	2.60	N/A	1	100%	5.36	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGICA
2.06	2.60	N/A	1	100%	5.36	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGICA
1.50	1.40	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO VENTANA
3.97	2.60	N/A	1	100%	10.17	ENTREGA DE MUESTRAS
8.29	2.60	N/A	1	100%	21.55	MURO FRENTE A FARMACIA
0.96	0.65	N/A	-1	100%	-0.64	DESCUENTO VENTANA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
6.51	2.69	N/A	1	100%	17.51	MURO EXTERIOR FARMACIA
0.99	3.00	N/A	-1	100%	-2.97	DESCUENTO VENTANA
1.75	2.51	N/A	1	100%	10.75	MURO INTERNO FARMACIA
0.99	3.00	N/A	-1	100%	-2.97	DESCUENTO
2.72	2.53	N/A	1	100%	7.39	MURO INTERNO FARMACIA
5.56	2.53	N/A	1	100%	11.51	MURO INTERNO FARMACIA
0.63	1.65	N/A	1	100%	0.97	MURO INTERNO FARMACIA
0.94	2.55	N/A	1	100%	2.38	MURO INTERNA FARMACIA
3.46	2.60	N/A	1	100%	9.00	AREA ENTREGA DE FARMACIA
3.77	2.60	N/A	1	100%	9.80	AREA ENTREGA DE FARMACIA
0.50	0.64	N/A	-1	100%	-0.32	DESCUENTO VENTANA
7.91	2.60	N/A	1	100%	20.64	AREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO PUERTA
0.50	0.65	N/A	-1	100%	-0.33	DESCUENTO VENTANA
3.83	2.60	N/A	1	100%	10.05	MURO CIRCULACION A FARMACIA
1.20	2.60	N/A	1	100%	3.54	MURO HALL ALTADO DE AMBULANCIA
1.10	2.10	N/A	-1	100%	-2.31	DESCUENTO DE PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO DE PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO DE PUERTA
1.29	2.10	N/A	-1	100%	-2.71	DESCUENTO DE PUERTA
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO DE PUERTA
8.52	2.60	N/A	1	100%	22.03	PROCEDIMIENTOS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
1.10	2.10	N/A	-1	100%	-2.31	DESCUENTO PUERTA
0.40	1.00	N/A	-1	100%	-0.40	DESCUENTO VENTANA
7.06	2.60	N/A	1	100%	20.75	SALA DE ESPERA FARMACIA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
17.60	2.60	N/A	1	100%	45.47	AMBULATORIOS
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA



13 jun 2025 2:38:54 p. m.
ST Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

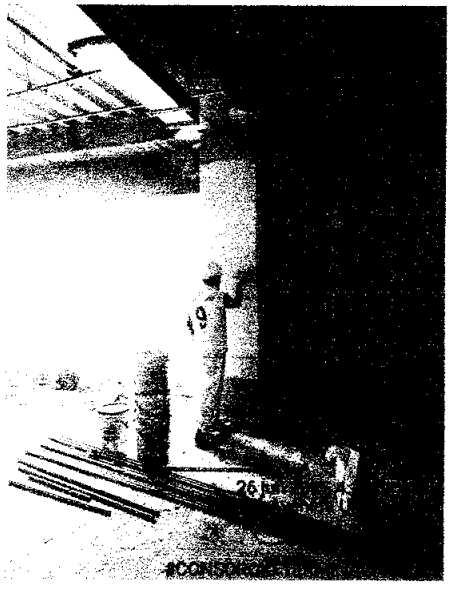






1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.71	DESCUENTO PUERTA
14.80	2.60	N/A	1	100%	38.44	PROCEDIMIENTOS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
1.10	2.10	N/A	-1	100%	-2.31	DESCUENTO PUERTA
0.90	1.30	N/A	-1	100%	-1.17	DESCUENTO VENTANA
1.30	1.90	N/A	-1	100%	-1.69	DESCUENTO VENTANA
6.16	2.60	N/A	1	100%	16.02	TRABAJO SUCIO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
12.67	2.60	N/A	1	100%	32.94	CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA
11.25	2.65	N/A	1	100%	37.05	LAVADO CIRCULACION
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
2.20	2.10	N/A	1	100%	-4.83	DESCUENTO PUERTA
1.14	1.20	N/A	-1	100%	-2.67	DESCUENTO ACUMSOR
9.10	2.60	N/A	1	100%	23.66	OFICINA RADIOLOGIA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.98	DESCUENTO PUERTA
0.80	1.20	N/A	-1	100%	-1.92	DESCUENTO VENTANA
7.00	2.60	N/A	1	100%	18.38	INSUMOS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	INSUMOS
10.03	2.60	N/A	1	100%	26.08	SALA DE ESPERA
1.10	2.10	N/A	-2	100%	-3.62	DESCANSO DE PUERTA
1.00	0.95	N/A	-1	100%	-0.80	DESCANSO DE VENTANA
21.59	2.60	N/A	1	100%	56.13	SERVICIO DE RADIOONCOLOGIA
1.18	2.10	N/A	-1	100%	-2.31	SERVICIO DE RADIOONCOLOGIA
1.30	1.90	N/A	-1	100%	-1.69	SERVICIO DE RADIOONCOLOGIA
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	SERVICIO DE RADIOONCOLOGIA
16.04	2.60	N/A	1	100%	41.78	CONSULTORIO DISPONIBLE PARA ECOGRAFO
0.90	1.30	N/A	-1	100%	-1.17	DESCUENTO
1.18	2.10	N/A	-1	100%	-2.31	DESCUENTO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
28.54	2.47	N/A	1	100%	73.86	HALL DE CIRCULACION
10.38	2.10	N/A	-1	100%	-21.8	DESCUENTO DE PUERTAS
1.00	1.18	N/A	-1	100%	-1.18	DESCUENTO VENTANA
12.70	2.47	N/A	1	100%	27.92	HALL CIRCULACION
11.17	2.10	N/A	-1	100%	-24.09	DESCUENTO PUERTAS
1.00	1.00	N/A	-4	100%	-3.89	DESCUENTO VENTANAS
1.00	1.10	N/A	-1	100%	-1.40	DESCUENTO VENTANAS
17.31	2.54	N/A	1	100%	44.04	CONSULTORIO 3
1.20	2.19	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO PUERTA
1.80	2.54	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTA
19.71	2.10	N/A	1	100%	35.09	CONSULTORIO 4
1.20	2.19	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO PUERTA
1.00	1.00	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO VENTANA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
11.16	2.42	N/A	1	100%	27.06	MONITOREO CINESIOTERAPIA
1.73	2.10	N/A	-3	100%	-7.27	DESCUENTO PUERTA
16.67	2.60	N/A	1	100%	43.54	REANIMACION
1.80	1.90	N/A	-2	100%	-3.38	DESCUENTO VENTANA
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTA
19.56	2.60	N/A	1	100%	49.30	AUDITORIO
1.30	2.10	N/A	-1	100%	-2.73	DESCUENTO PUERTA
14.14	2.70	N/A	1	100%	38.18	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0.40	0.80	N/A	-1	100%	-0.32	DESCUENTO VENTANA
2.00	0.80	N/A	-1	100%	-0.80	DESCUENTO VENTANA
2.00	0.40	N/A	-1	100%	-0.80	DESCUENTO VENTANA
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO VENTANA
8.95	2.70	N/A	1	100%	24.17	CIRCULACION HALL
0.40	0.80	N/A	-1	100%	-0.32	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1.98	2.70	N/A	2	100%	10.69	BAÑO
1.70	2.10	N/A	-2	100%	-3.74	DESCUENTO PUERTA
3.00	2.70	N/A	1	100%	8.10	BAÑO MUJERES ADULTOS Y PRIMER PISO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
1.33	2.70	N/A	1	100%	3.62	BAÑO MUJERES
18.59	2.70	N/A	1	100%	50.19	CUARTO PERSONAL ASISTENCIAL
1.00	2.18	N/A	-1	100%	-2.18	DESCUENTO PERTA
0.40	0.80	N/A	-1	100%	-0.32	DESCUENTO VENTANA
2.00	0.40	N/A	-1	100%	-0.80	DESCUENTO VENTANA
4.68	2.70	N/A	1	100%	12.64	AUTORIZACIONES
1.00	1.90	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO DE VENTANA
1.41	2.70	N/A	1	100%	11.91	HALL PRINCIPAL
10.00	2.80	N/A	1	100%	23.00	ESCONITA
1.00	1.90	N/A	-1	100%	-1.90	DESCUENTO PUERTA
21.80	2.80	N/A	1	100%	50.28	CONSULTA INTERNA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO BAÑOS
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO PUERTA
11.37	2.53	N/A	1	100%	28.99	CAFETERIA
0.90	2.10	N/A	-2	100%	-3.78	DESCUENTO PUERTA
1.30	2.10	N/A	-1	100%	-2.73	DESCUENTO PUERTA
10.54	2.46	N/A	1	100%	24.42	MANTENIMIENTO
1.20	2.19	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
5.11	2.36	N/A	2	100%	12.15	VESTIER CONTINUO A RADIOGRAFO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
5.43	2.16	N/A	1	100%	13.47	CIRCULACION CENTRAL DE ENFERMERIA
6.77	2.68	N/A	1	100%	16.64	CIRCULACION CENTRAL DE ENFERMERIA
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTA TAC
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.87	DESCUENTO PUERTA TAC
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.87	DESCUENTO PUERTA ASEO
2.00	2.40	N/A	2	100%	9.60	PUERTA ENTRE CENTRAL DE ENFERMERIA Y TAC
2.00	1.96	N/A	-2	100%	-7.92	DESCUENTO PUERTA
19.52	2.47	N/A	1	100%	43.80	TAC
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO PUERTA
0.40	0.90	N/A	-1	100%	-0.56	DESCUENTO VENTANA
6.94	2.47	N/A	1	100%	16.45	CUARTO DISPAÑO
0.90	0.90	N/A	-1	100%	-0.54	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.19	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO VENTANA
4.53	2.47	N/A	1	100%	11.22	OBSERVACION CIRCUNSTANCIA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA TUNNEL
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA TSUCIO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA LSUCIO
31.49	2.45	N/A	1	100%	78.01	OBSERVACION PREPARTO
0.90	2.10	N/A	-2	100%	-3.78	DESCUENTO PUERTA
8.67	0.80	N/A	2	100%	19.87	CENTRAL DE ENFERMERIA
1.60	2.57	N/A	1	100%	12.15	RESIDUOS ORDINARIOS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
1.77	2.52	N/A	1	100%	10.76	RESIDUOS PELIGROSOS
9.00	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
11.48	2.32	N/A	1	100%	26.63	URGENCIAS
1.00	1.00	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO VENTANA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
10.01	2.43	N/A	1	100%	25.18	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS
1.65	2.10	N/A	-1	100%	-3.47	DESCUENTO PUERTA
12.13	2.40	N/A	1	100%	29.11	SALA DE YESOS
0.94	1.00	N/A	-1	100%	-0.94	DESCUENTO VENTANA
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTA
15.09	2.39	N/A	1	100%	33.47	DIGITACION
0.98	2.19	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
1.28	1.00	N/A	-1	100%	-1.28	DESCUENTO VENTANA
0.84	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
14.90	2.90	N/A	1	100%	37.25	SALA ERA
0.90	2.89	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
1.80	1.90	N/A	-1	100%	-1.30	DESCUENTO VENTANA
14.37	2.80	N/A	1	100%	35.93	CONSULTORIO 5
1.30	2.10	N/A	-1	100%	-2.73	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
1.61	1.00	N/A	-1	100%	-1.61	DESCUENTO VENTANA
16.26	2.50	N/A	1	100%	40.65	CONSULTORIO 7
1.50	1.90	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO VENTANA
1.20	2.19	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
19.66	2.48	N/A	1	100%	39.38	CONSULTORIO 1
1.20	2.19	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO PUERTA
1.00	2.19	N/A	-1	100%	-2.19	DESCUENTO PUERTA
0.97	0.89	N/A	-1	100%	-0.75	DESCUENTO VENTANA
13.80	2.55	N/A	1	100%	33.77	ADMISIONES URGENCIAS
0.94	2.10	N/A	-1	100%	-1.97	DESCUENTO PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
1.20	1.80	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO VENTANA
2.40	1.40	N/A	-1	100%	-2.80	DESCUENTO VENTANA












3.21	2.60	N/A	1	100%	21.95	RET Y CONTRA RET
1.00	7.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO PUERTA
11.20	2.53	N/A	1	100%	28.34	SALA ESPERA URGENCIAS
1.40	0.93	N/A	-1	100%	-1.30	DESCUENTO VENTANA
1.40	0.93	N/A	-1	100%	-1.30	DESCUENTO VENTANA
0.40	1.10	N/A	-1	100%	-0.40	DESCUENTO VENTANA
7.51	2.53	N/A	1	100%	19.00	ACCESO URGENCIAS
2.00	2.10	N/A	-1	100%	-4.20	DESCUENTO PUERTA ACCESO URGENCIAS
0.70	1.00	N/A	-1	100%	-0.70	DESCUENTO VENTANA
6.35	2.53	N/A	1	100%	16.07	SALA ESPERA ADULTOS
1.20	1.95	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO VENTANA
1.13	1.73	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO VENTANA
6.15	0.75	N/A	1	100%	4.78	AUTIPECHO SALA DE ESPERA
16.16	2.72	N/A	1	100%	40.77	DESCUENTO VENTANA
0.92	0.97	N/A	-1	100%	-0.94	DESCUENTO VENTANA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
13.31	2.82	N/A	1	100%	38.58	CUARTO DE TURNOS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
10.40	4.56	N/A	-1	100%	-9.20	DESCUENTO VENTA
13.60	2.20	N/A	1	100%	34.00	RAYOS X
0.90	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUENTO PUERTA
14.90	2.54	N/A	1	100%	37.85	SALA ESPERA (BAÑO, PASILLO FARMACIA FARMACIA Y MUROS EXTERIOR Y POSTERIOR DE CONTROL IMAGENOLOGIA CARDIO)
1.84	1.05	N/A	-1	100%	-1.93	DESCUENTO VENTANA PASILLO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA CONTROL IMAGENOLOGIA
3.51	1.00	N/A	2	100%	7.02	CONTROL IMAGENOLOGIA CARDIO - RECEPCION (ANTEPECHO)
2.50	1.00	N/A	2	100%	5.00	SALA ESPERA (HALL) - RECEPCION ANTEPECHO
1.25	2.54	N/A	1	100%	3.18	SALA ESPERA (HALL) - RECEPCION MURO FONDO LATERAL DERECHO
6.76	2.64	N/A	1	100%	18.11	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS ACCESO A URG Y
0.70	2.64	N/A	1	100%	1.85	ACCESO A TRIAGES
1.16	1.75	N/A	-1	100%	-2.03	DESCUENTO VENTANA EXTERIOR
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO PUERTA TRIAGE 1
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA TRIAGE 2
1.40	2.50	N/A	1	100%	13.00	ACCESO A LAVADO DE PACIENTES
2.00	2.10	N/A	-1	100%	-4.20	DESCUENTO PUERTA PASILLO
20.35	2.54	N/A	1	100%	52.20	MONITOREO OBSERVACION
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO PUERTA CUARTO LIMPIO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA BAÑO
1.11	2.10	N/A	-1	100%	-2.33	DESCUENTO PUERTA PRINCIPAL
15.29	2.64	N/A	1	100%	40.21	SALA ESPERA
0.95	0.75	N/A	-1	100%	-0.71	DESCUENTO VENTANA EXTERIOR
1.94	1.00	N/A	-1	100%	-1.94	DESCUENTO VENTANA PASILLO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA BAÑO
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO PUERTA PRINCIPAL
4.30	2.66	N/A	1	100%	11.62	AUDITORIO (LADO ORIENTAL)
1.13	1.72	N/A	-1	100%	-1.94	DESCUENTO VENTANA EXTERIOR
5.04	2.26	N/A	1	100%	13.75	RAYOS X DESCANSO (RX FARMACIA, DIGITALIZACION
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTA
4.60	2.50	N/A	1	100%	11.50	RETIA LIMPIA, DIGITACION
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA
4.81	2.50	N/A	1	100%	12.03	RETA SUCIA, DIGITACION
2.95	2.56	N/A	1	100%	7.38	FACTURACION, AUTORIZACION Y ADMISION (LADO SUR)
5.77	2.4	N/A	1	100%	13.85	TRIAGE 2
2.53	2.4	N/A	1	100%	6.07	
0.81	1.5	N/A	-1	100%	-1.22	DESCUENTO VENTANA
2.10	2.7	N/A	1	100%	4.62	SALA ESPERA ADULTO
1.14	2.4	N/A	1	100%	2.74	AUDITORIO
1.00	2.8	N/A	1	100%	4.00	
1.19	2.4	N/A	7	100%	15.17	DESCANSO URGENCIAS
3.15	2.4	N/A	1	100%	7.56	
0.80	2.1	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUENTO PUERTA
1.83	2.4	N/A	1	100%	3.97	DESCANSO URGENCIAS
1.70	2.0	N/A	1	100%	3.06	OBSERVACION URGENCIAS ENFERMERIA
1.40	1.1	N/A	1	100%	1.54	
1.60	1.55	N/A	1	100%	5.85	CUARTO ASEO URGENCIAS
2.78	1	N/A	1	100%	2.27	SALA ERA
5.85	2.4	N/A	1	100%	14.04	CUARTO LIQUIDOS (RX)
0.90	2.07	N/A	-1	100%	-1.86	DESCUENTO PUERTA
0.86	0.9	N/A	1	100%	0.72	SALA YESO
1.76	0.7	N/A	1	100%	1.12	
1.30	1.67	N/A	1	100%	1.61	PASILLO URGENCIAS TABLERO GASES
0.75	0.15	N/A	-1	100%	-0.11	PASILLO URGENCIAS TABLERO
1.50	1.3	N/A	1	100%	1.95	PROCEDIMIENTO
2.40	0.9	N/A	1	100%	2.16	
2.00	0.8	N/A	1	100%	1.60	RESIDUOS PELIGROSOS
1.30	1	N/A	1	100%	1.30	RESIDUOS BENIGNANTE
2.82	0.9	N/A	1	100%	2.54	
2.60	1.1	N/A	1	100%	2.86	OBSERVACION PEDIATRIA TOMAS Y CAMAS
1.40	2.6	N/A	1	100%	3.64	
1.20	0.95	N/A	1	100%	1.19	SENTRAL DE ENFERMERIA
5.40	1.5	N/A	2	100%	29.67	TRABAJO LIMPIO TRABAJO SUCIO
0.80	2.1	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUENTO PUERTAS
5.50	1.3	N/A	1	100%	7.19	CIRCULACION CUARTO DE ASEO
1.30	1.02	N/A	1	100%	1.33	CUARTO DE ASEO 02
0.60	2.4	N/A	1	100%	1.44	TOMA DE PULSINA
1.97	2.4	N/A	1	100%	3.89	RESIDUOS PELIGROSOS LABORATORIO
1.65	1.1	N/A	1	100%	2.09	FARMACIA AREA ENTREGA
3.44	1.3	N/A	1	100%	5.63	
2.40	0.4	N/A	1	100%	1.92	FACTURACION ADMISION
		PISO 2				
3.005	2.50	N/A	1	100%	92.63	PASILLO RECUPERACION
8.25	2.10	N/A	-1	100%	-17.33	DESCUENTO PUERTAS
17.52	2.40	N/A	1	100%	42.05	PREPARACION PACIENTES
3.70	2.10	N/A	-1	100%	-7.77	DESCUENTO PUERTAS
39.12	2.55	N/A	1	100%	98.76	RECUPERACION QUIRURGICA
5.11	2.10	N/A	-1	100%	-10.73	DESCUENTO PUERTAS
13.37	0.70	N/A	-1	100%	-8.36	DESCUENTO VENTANAS
11.97	0.73	N/A	1	100%	8.46	CENTRAL ENFERMERIA
27.13	2.50	N/A	1	100%	68.28	CENTRAL ESTERILIZACION
1.90	2.10	N/A	-1	100%	-3.99	DESCUENTO PUERTAS
1.45	1.00	N/A	1	100%	1.48	DESCUENTO VENTANAS
1.00	0.70	N/A	-1	100%	-0.70	DESCUENTO VENTANAS
0.81	1.55	N/A	-1	100%	-1.23	DESCUENTO VENTANAS
11.39	2.50	N/A	1	100%	28.40	INGRESO AUTOCLAVE
2.10	2.10	N/A	-2	100%	-4.41	DESCUENTO PUERTAS
0.81	1.00	N/A	-1	100%	-0.81	DESCUENTO VENTANAS
61.80	2.50	N/A	1	100%	154.50	CIRCULACION DE JURUBELOS A SALA DE PARTOS
19.81	2.10	N/A	-1	100%	-39.60	DESCUENTO PUERTAS
1.50	1.25	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO VENTANAS
2.15	0.90	N/A	-1	100%	-1.94	DESCUENTO VENTANAS
1.00	1.10	N/A	-2	100%	-2.80	DESCUENTO VENTANAS
1.00	1.50	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO VENTANAS
2.90	2.50	N/A	-1	100%	-5.80	DESCUENTO ENTRADA A PASILLO
16.11	2.60	N/A	1	100%	41.89	SALA DE PARTOS #1
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTAS
1.05	0.95	N/A	-1	100%	-0.90	DESCUENTO VENTANAS
16.82	3.00	N/A	1	100%	43.73	SALA DE PARTOS #2
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTAS
4.12	0.90	N/A	-1	100%	-3.56	DESCUENTO VENTANAS
11.67	2.50	N/A	1	100%	29.18	CUART. DE EQUIPOS
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO PUERTAS
21.53	2.50	N/A	1	100%	53.83	DESCANSO QUIROFANOS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-2	100%	-3.78	DESCUENTO PUERTAS
1.51	0.95	N/A	-1	100%	-1.61	DESCUENTO VENTANAS
18.07	2.60	N/A	1	100%	46.98	QUIROFANO #1
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTAS
18.17	2.60	N/A	1	100%	47.24	QUIROFANO #2
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTAS
18.16	2.60	N/A	1	100%	47.08	QUIROFANO #3
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTAS
2.42	2.60	N/A	1	100%	6.29	TRABAJO SUCIO
3.50	2.10	N/A	-1	100%	-7.35	DESCUENTO PUERTAS
2.00	0.37	N/A	-1	100%	-0.74	DESCUENTO PUERTAS
1.00	0.70	N/A	-1	100%	-0.70	DESCUENTO VENTANAS







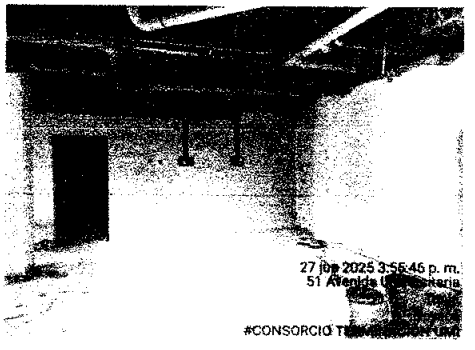


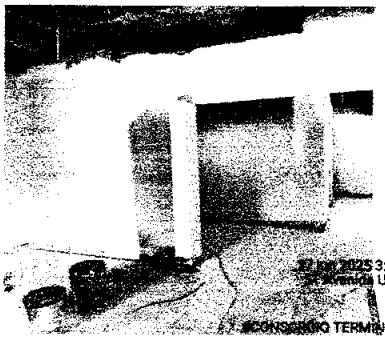

12.91	2.30	N/A	1	100%	32.28	FARMACIA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
1.90	1.00	N/A	-3	100%	-1.00	DESCUENTO VENTANAS
0.37	2.00	N/A	-1	100%	-0.74	DESCUENTO VENTANAS
5.95	2.50	N/A	1	100%	14.88	BODEGA
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
13.69	2.50	N/A	1	100%	34.15	DESCANSO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
0.60	2.10	N/A	-1	100%	-1.26	DESCUENTO PUERTAS
1.00	1.00	N/A	-1	100%	-1.00	DESCUENTO VENTANAS
8.85	2.50	N/A	1	100%	22.05	PASILLO ESTER
0.80	2.10	N/A	-3	100%	-5.04	DESCUENTO PUERTAS
20.57	2.10	N/A	1	100%	49.37	VESTIER MUJERES
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUENTO PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-3	100%	-4.41	DESCUENTO VENTANAS
20.70	2.40	N/A	1	100%	49.68	VESTIER HOMBRES
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUENTO PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-2	100%	-2.94	DESCUENTO VENTANAS
83.30	2.45	N/A	1	100%	204.09	PASILLO CENTRAL A UCI
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO PUERTAS
1.00	0.70	N/A	-1	100%	-0.70	DESCUENTO VENTANAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
2.00	2.45	N/A	-1	100%	-4.90	DESCUENTO VENTANAS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTAS
1.00	1.60	N/A	-1	100%	-1.60	DESCUENTO VENTANAS
1.96	2.10	N/A	-1	100%	-4.12	DESCUENTO VENTANAS
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
0.76	2.10	N/A	-1	100%	-1.60	DESCUENTO PUERTAS
1.70	2.10	N/A	-1	100%	-3.57	DESCUENTO PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
0.60	2.10	N/A	-1	100%	-1.26	DESCUENTO PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO PUERTAS
2.00	2.10	N/A	-1	100%	-4.20	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
1.10	2.45	N/A	-1	100%	-2.70	DESCUENTO PUERTAS
1.70	2.10	N/A	-2	100%	-7.14	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
3.68	0.68	N/A	1	100%	3.80	RESECION
34.33	0.50	N/A	1	100%	17.17	TRABAJO DE PARTO
1.67	2.10	N/A	-1	100%	-3.51	DESCUENTO PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTAS
2.13	0.90	N/A	-1	100%	-1.92	DESCUENTO PUERTAS
1.50	1.30	N/A	-3	100%	-5.85	DESCUENTO PUERTAS
4.90	0.85	N/A	1	100%	4.17	CENTRAL DE ENFERMERIA
38.26	2.50	N/A	1	100%	95.65	RECUPERACION DE PARTOS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUNTO DE PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUNTO DE PUERTAS
1.50	1.30	N/A	-2	100%	-3.90	DESCUNTO DE VENTANA
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUNTO DE PUERTAS
2.00	2.10	N/A	-1	100%	-4.20	DESCUNTO DE PUERTAS
5.22	0.77	N/A	1	100%	4.02	CENTRAL DE ENFERMERIA
5.95	2.50	N/A	1	100%	14.88	ROPA LIMPIA
0.95	2.10	N/A	-1	100%	-2.00	DESCUNTO DE PUERTAS
19.11	2.50	N/A	1	100%	47.78	VESTIER PANTOS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUNTO DE PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUNTO DE PUERTAS
96.00	2.50	N/A	1	100%	240.00	UCI ADULTOS
1.96	2.10	N/A	-1	100%	-4.12	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUNTO DE PUERTAS
1.80	2.10	N/A	-2	100%	-8.72	DESCUNTO DE PUERTAS
1.50	1.30	N/A	-4	100%	-7.80	DESCUNTO DE VENTANA
0.95	0.91	N/A	-2	100%	-1.81	DESCUNTO DE VENTANA
1.10	2.10	N/A	-2	100%	-3.62	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUNTO DE PUERTAS
1.30	0.92	N/A	-1	100%	-1.20	DESCUNTO DE VENTANA
1.00	1.00	N/A	-1	100%	-1.00	DESCUNTO DE VENTANA
1.25	0.80	N/A	-2	100%	-2.00	DESCUNTO DE VENTANA
0.95	0.95	N/A	-1	100%	-0.90	DESCUNTO DE VENTANA
1.20	1.30	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUNTO DE VENTANA
5.10	0.87	N/A	1	100%	4.47	CENTRAL DE ENFERMERIA FRENTE A UCI ADULTOS
7.28	0.74	N/A	1	100%	5.68	CENTRAL DE ENFERMERIA FRENTE A UCI ADULTOS
7.60	2.50	N/A	1	100%	19.13	FILTRO ACCESO FAMILIARES
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-1.36	DESCUNTO DE PUERTAS
5.20	2.50	N/A	1	100%	13.50	INFORMACION FAMILIARES
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUNTO DE PUERTAS
18.41	2.50	N/A	1	100%	46.53	FILTRO ACCESO PERSONAL
0.80	2.10	N/A	-3	100%	-5.04	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-2	100%	-2.94	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUNTO DE PUERTAS
9.50	2.50	N/A	1	100%	23.75	DESCANSO
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUNTO DE PUERTAS
1.00	1.50	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUNTO DE PUERTAS
15.15	2.50	N/A	1	100%	38.25	CONTRACION
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUNTO DE PUERTAS
9.81	2.50	N/A	1	100%	24.53	DILTRO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUNTO DE PUERTAS
11.51	2.50	N/A	1	100%	28.78	PASILLO ACCESO UCI
2.00	2.10	N/A	-2	100%	-8.40	DESCUNTO DE VENTANA
0.85	3.10	N/A	-1	100%	-2.64	DESCUNTO DE VENTANA
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUNTO DE PUERTAS
0.55	2.10	N/A	-1	100%	-1.39	DESCUNTO DE PUERTAS
17.21	2.50	N/A	1	100%	43.03	LACTARIO
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUNTO DE PUERTAS
11.91	2.50	N/A	1	100%	29.78	AMBIENTE TRABAJO ESTERI
0.80	2.10	N/A	-3	100%	-5.04	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	1.60	N/A	-3	100%	-6.72	DESCUNTO DE VENTANA
96.38	2.50	N/A	1	100%	240.95	UCI INTERMEDIA
2.00	2.10	N/A	-1	100%	-4.20	DESCUNTO DE PUERTAS
1.35	2.10	N/A	-1	100%	-2.84	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	1.30	N/A	-1	100%	-1.17	DESCUNTO DE VENTANA
1.30	1.30	N/A	-6	100%	-10.14	DESCUNTO DE VENTANA
1.80	1.90	N/A	-1	100%	-1.37	DESCUNTO DE VENTANA
0.70	1.60	N/A	-5	100%	-5.60	DESCUNTO DE VENTANA
0.70	1.70	N/A	-2	100%	-1.88	DESCUNTO DE VENTANA
0.90	1.30	N/A	-3	100%	-1.47	DESCUNTO DE VENTANA
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUNTO DE VENTANA
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUNTO DE VENTANA
0.90	2.50	N/A	-1	100%	-2.25	DESCUNTO DE VENTANA
1.35	2.10	N/A	-1	100%	-2.84	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUNTO DE PUERTAS
0.75	2.10	N/A	-1	100%	-1.58	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUNTO DE PUERTAS
15.00	0.60	N/A	1	100%	9.00	UCI AISLADO
12.70	0.66	N/A	1	100%	8.44	UCI AISLADO
4.68	0.57	N/A	-4	100%	-10.35	CENTRAL DE ENFERMERIA
10.64	0.87	N/A	1	100%	9.72	CENTRAL DE ENFERMERIA
13.41	2.50	N/A	1	100%	28.53	PASILLO ASEO
0.80	2.10	N/A	-4	100%	-6.72	DESCUNTO DE PUERTAS
20.37	2.50	N/A	1	100%	50.80	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-3	100%	-5.04	DESCUNTO DE VENTANA
1.90	1.30	N/A	-1	100%	-2.47	DESCUNTO DE VENTANA
1.30	1.30	N/A	-1	100%	-1.69	DESCUNTO DE VENTANA
0.90	1.30	N/A	-1	100%	-1.17	DESCUNTO DE VENTANA
11.70	2.50	N/A	1	100%	29.45	PASILLO ASEO Y LAVADO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUNTO DE PUERTAS
17.56	2.50	N/A	1	100%	43.90	PASILLO ASEO ASISTENCIAL






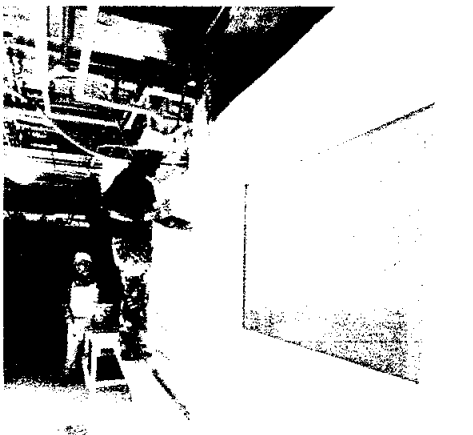




1.80	2.10	N/A	-1	100%	-3.78	DESCUENTO DE PUERTAS	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO DE PUERTAS	
0.75	2.10	N/A	-1	100%	-1.58	DESCUENTO DE PUERTAS	
0.70	2.10	N/A	-3	100%	-5.04	DESCUENTO DE PUERTAS	
1.73	2.10	N/A	-1	100%	-3.63	DESCUENTO DE PUERTAS	
2.67	2.40	N/A	1	100%	6.14	ROPA LIMPIA	
2.90	2.80	N/A	1	100%	8.67	ROPA SUCIA	
13.60	2.60	N/A	1	100%	35.36	ASEO EN ASISTENCIAL	
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUENTO DE PUERTAS	
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO DE PUERTAS	
0.70	1.60	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO DE PUERTAS	
9.21	2.40	N/A	1	100%	22.10	COORDINACION	
1.80	2.10	N/A	-1	100%	-3.78	DESCUENTO DE PUERTAS	
4.29	0.70	N/A	-1	100%	-3.00	DESCUENTO DE VENTANA	
23.98	2.60	N/A	1	100%	59.78	UNA PENUMBRA	
1.90	2.10	N/A	-1	100%	-3.99	DESCUENTO DE PUERTAS	
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO DE PUERTAS	
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	DESCUENTO DE PUERTAS	
2.20	2.10	N/A	-2	100%	-4.62	DESCUENTO DE PUERTAS	
		PISO 3					
2.28	2.40	N/A	1	100%	6.38	LUDOTECA	
1.56	2.60	N/A	1	100%	4.34	LUDOTECA	
1.67	2.60	N/A	1	100%	4.48	LUDOTECA	
1.56	2.60	N/A	1	100%	4.34	LUDOTECA	
2.57	2.60	N/A	1	100%	7.28	LUDOTECA	
6.68	2.60	N/A	1	100%	16.70	LUDOTECA	
4.78	2.60	N/A	1	100%	13.38	LUDOTECA	
4.78	2.60	N/A	1	100%	13.38	LUDOTECA	
5.01	2.60	N/A	1	100%	18.03	LUDOTECA	
4.80	2.60	N/A	1	100%	13.44	LUDOTECA	
2.25	2.60	N/A	1	100%	6.38	LUDOTECA	
3.31	2.60	N/A	1	100%	13.75	LUDOTECA	
2.13	2.80	N/A	1	100%	5.96	LUDOTECA	
1.91	2.60	N/A	1	100%	5.46	LUDOTECA	
1.95	2.80	N/A	1	100%	5.46	LUDOTECA	
2.23	2.80	N/A	1	100%	6.34	LUDOTECA	
3.46	2.80	N/A	1	100%	9.69	LUDOTECA	
7.90	2.80	N/A	1	100%	22.12	LUDOTECA	
1.76	2.60	N/A	1	100%	13.33	LUDOTECA	
4.17	2.80	N/A	1	100%	11.68	LUDOTECA	
1.91	2.80	N/A	1	100%	5.46	LUDOTECA	
1.10	2.80	N/A	1	100%	3.08	LUDOTECA	
2.53	2.80	N/A	1	100%	7.08	LUDOTECA	
0.93	2.80	N/A	1	100%	2.60	LUDOTECA	
1.76	2.80	N/A	1	100%	4.93	LUDOTECA	
1.95	2.80	N/A	1	100%	5.46	LUDOTECA	
1.50	1.60	N/A	-1	100%	-2.40	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA	
1.90	1.80	N/A	-1	100%	-3.16	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA	
1.30	1.60	N/A	-1	100%	-2.40	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA	
7.74	4.76	N/A	-1	100%	-10.71	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA	
2.25	2.40	N/A	-1	100%	-5.10	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA	
1.95	4.80	N/A	1	100%	-6.48	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA	
1.35	3.35	N/A	-1	100%	-4.52	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.94	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA	
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-3.46	DESCUENTO PUERTA AREA LUDOTECA	
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.94	DESCUENTO PUERTA AREA LUDOTECA	
11.87	2.55	N/A	1	100%	38.27	EXTRACION DE LICOR MATERNAL	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.90	DESCUENTO PUERTA LECHE MATERNAL	
7.28	2.60	N/A	1	100%	18.93	DEPOSITO DE INSUMOS	
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO PUERTA AREA DEPOSITO	
5.27	2.60	N/A	1	100%	15.39	FILTRO INGRESO	
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	PREPARACION DE FORMULAS	
12.67	2.60	N/A	1	100%	39.85	PREPARACION DE FORMULAS	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	PREPARACION DE FORMULAS	
1.95	1.75	N/A	-1	100%	-3.45	PREPARACION DE FORMULAS	
1.55	1.65	N/A	-1	100%	-1.63	PREPARACION DE FORMULAS	
11.50	2.60	N/A	1	100%	29.90	INFORMACION FAMILIARES	
0.90	2.80	N/A	-1	100%	-2.52	INFORMACION FAMILIARES	
13.17	2.70	N/A	1	100%	35.56	COORDINACION PEDIATRA	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	COORDINACION PEDIATRA	
37.41	2.54	N/A	1	100%	82.87	CIRCULACION	
0.90	2.10	N/A	-5	100%	-9.49	CIRCULACION	
0.70	2.10	N/A	-2	100%	-2.94	CIRCULACION	
13.10	2.70	N/A	1	100%	33.87	DESCANSO DE MEDICO	
0.70	2.50	N/A	-1	100%	-1.75	DESCANSO DE MEDICO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCANSO DE MEDICO	
10.19	2.70	N/A	1	100%	27.27	DESCANSO ENFERMERIA	
0.70	2.50	N/A	-1	100%	-1.75	DESCANSO ENFERMERIA	
4.05	2.50	N/A	1	100%	10.32	ESTACION DE CAFE	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	ESTACION DE CAFE	
15.44	2.80	N/A	1	100%	43.26	COORDINACION UCI PEDIATRICA	
1.90	1.95	N/A	-1	100%	-3.71	COORDINACION UCI PEDIATRICA	
1.90	1.94	N/A	-1	100%	-1.77	COORDINACION UCI PEDIATRICA	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	COORDINACION UCI PEDIATRICA	
6.91	2.79	N/A	1	100%	18.91	PREPARACION DE ALIMENTOS	
9.35	2.70	N/A	1	100%	25.25	ASISTENCIAL	
0.70	0.80	N/A	-1	100%	-0.56	ASISTENCIAL	
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	ASISTENCIAL	
8.18	2.60	N/A	1	100%	21.27	ROPA LIMPIA	
0.70	1.11	N/A	-1	100%	-0.80	ROPA LIMPIA	
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	ROPA LIMPIA	
9.40	2.60	N/A	1	100%	24.44	CUARTO ESTERIL DEPOSITO DE INSUMOS	
0.70	0.80	N/A	-1	100%	-0.56	CUARTO ESTERIL DEPOSITO DE INSUMOS	
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	CUARTO ESTERIL DEPOSITO DE INSUMOS	
9.13	2.60	N/A	1	100%	23.74	CUARTO EQUIPOS	
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	CUARTO EQUIPOS	
0.70	0.80	N/A	-1	100%	-0.56	CUARTO EQUIPOS	
32.07	2.73	N/A	1	100%	87.51	CIRCULACION	
0.80	2.10	N/A	-7	100%	-11.76	CIRCULACION	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	CIRCULACION	
33.24	2.60	N/A	1	100%	65.07	CIRCULACION INFORMACION FAMILIAR	
2.90	0.73	N/A	-5	100%	-8.76	CIRCULACION INFORMACION FAMILIAR	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	CIRCULACION INFORMACION FAMILIAR	
0.20	2.10	N/A	-1	100%	-0.42	CIRCULACION INFORMACION FAMILIAR	
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	CIRCULACION INFORMACION FAMILIAR	
14.64	2.67	N/A	1	100%	37.62	ORATORIO	
2.90	2.10	N/A	-1	100%	-4.83	ORATORIO	
2.45	2.10	N/A	-5	100%	-10.29	ORATORIO	
17.69	2.65	N/A	1	100%	45.39	SALA DE ESPERA	
2.32	2.17	N/A	-1	100%	-4.62	SALA DE ESPERA	
2.10	2.10	N/A	-1	100%	-4.41	SALA DE ESPERA	
0.80	2.10	N/A	-3	100%	-5.04	SALA DE ESPERA	
2.00	2.10	N/A	-1	100%	-4.20	SALA DE ESPERA	
11.48	2.73	N/A	1	100%	31.57	U.C.I. 1	
0.90	1.50	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 1 DESCUENTO	
11.83	2.78	N/A	1	100%	31.94	U.C.I. 3	
0.90	1.50	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 3 DESCUENTO	
2.50	0.60	N/A	-1	100%	-1.50	U.C.I. 3 DESCUENTO	
1.12	0.46	N/A	-1	100%	-0.46	U.C.I. 3 DESCUENTO	
11.34	2.70	N/A	1	100%	30.62	U.C.I. 5	
0.90	1.50	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 5 DESCUENTO	
0.70	2.50	N/A	-1	100%	-1.75	U.C.I. 5 DESCUENTO	
1.10	0.18	N/A	-1	100%	-0.18	U.C.I. 5 DESCUENTO	
11.92	2.70	N/A	1	100%	32.18	U.C.I. 7	
0.90	1.50	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 7 DESCUENTO	
0.70	2.50	N/A	-1	100%	-1.75	U.C.I. 7 DESCUENTO	
1.10	0.18	N/A	-1	100%	-0.18	U.C.I. 7 DESCUENTO	
11.51	2.70	N/A	1	100%	31.08	U.C.I. 9	
0.90	1.50	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 9 DESCUENTO	
2.50	2.50	N/A	-1	100%	-6.25	U.C.I. 9 DESCUENTO	
1.10	0.18	N/A	-1	100%	-0.18	U.C.I. 9 DESCUENTO	
13.81	2.75	N/A	1	100%	37.98	U.C.I. 11	
0.90	1.50	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 11 DESCUENTO	
2.50	2.50	N/A	-1	100%	-6.25	U.C.I. 11 DESCUENTO	
1.10	0.18	N/A	-1	100%	-0.18	U.C.I. 11 DESCUENTO	
13.50	2.79	N/A	1	100%	36.85	U.C.I. 12	
0.90	2.15	N/A	-1	100%	-1.94	U.C.I. 12 DESCUENTO	
0.90	1.50	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 12 DESCUENTO	
1.90	1.00	N/A	-1	100%	-1.90	U.C.I. 12 DESCUENTO	
1.10	0.76	N/A	-1	100%	-0.84	U.C.I. 12 DESCUENTO	
0.23	2.70	N/A	-1	100%	-0.62	U.C.I. 12 DESCUENTO	






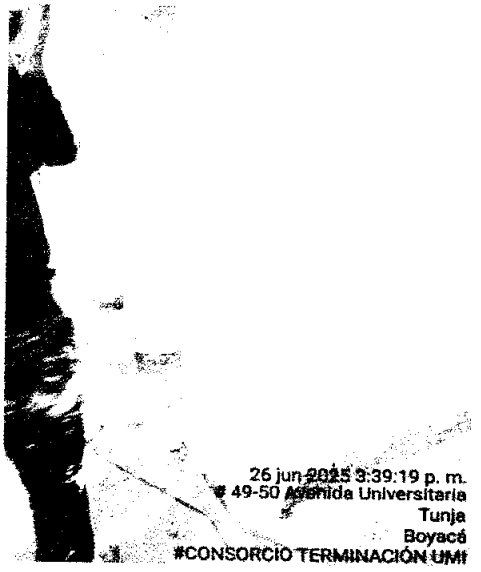




9.62	2.70	N/A	1	100%	25.97	U.C.I. 10
1.50	0.90	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 10 DESCUENTO
0.70	2.50	N/A	-1	100%	-1.75	U.C.I. 10 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	100%	-0.18	U.C.I. 10 DESCUENTO
10.40	2.70	N/A	1	100%	28.08	U.C.I. 8
0.90	2.70	N/A	-1	100%	-2.43	U.C.I. 8 DESCUENTO
0.70	3.05	N/A	-1	100%	-2.14	U.C.I. 8 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	100%	-0.18	U.C.I. 8 DESCUENTO
10.00	2.70	N/A	1	100%	27.00	U.C.I.
0.90	1.50	N/A	-1	100%	-1.35	U.C.I. 6 DESCUENTO
0.70	3.05	N/A	-1	100%	-2.10	U.C.I. 6 DESCUENTO
1.10	0.16	N/A	-1	100%	-0.18	U.C.I. 6 DESCUENTO
7.00	2.70	N/A	1	100%	18.90	U.C.I. 4
3.00	0.70	N/A	-1	100%	-2.10	U.C.I. 4 DESCUENTO
6.70	2.70	N/A	1	100%	18.09	U.C.I. 2
3.00	0.70	N/A	-1	100%	-2.10	U.C.I. 2 DESCUENTO
2.80	2.70	N/A	1	100%	7.56	CIRCULACION
0.80	2.10	N/A	-2	100%	-3.36	CIRCULACION
17.64	2.40	N/A	1	100%	42.82	HABITACION 301
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
1.00	1.45	N/A	-1	100%	-1.45	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
1.94	2.10	N/A	1	100%	4.07	HABITACION 301 - CLOSET
18.17	2.40	N/A	1	100%	43.61	HABITACION 302
1.90	2.10	N/A	1	100%	3.97	HABITACION 302 - CLOSET
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.09	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
0.95	0.95	N/A	-1	100%	-0.90	DESCUENTO
10.45	2.40	N/A	1	100%	25.08	HABITACION 303
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 303 - CLOSET
0.75	2.09	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
19.51	2.40	N/A	1	100%	46.82	HABITACION 304
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 304 - CLOSET
0.75	2.09	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
22.02	2.40	N/A	1	100%	52.85	HABITACION 305
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 305 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.09	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
23.62	2.40	N/A	1	100%	56.69	HABITACION 306
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 306 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.09	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
7.29	2.40	N/A	1	100%	17.50	CUARTO DE EQUIPOS
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
18.20	2.40	N/A	1	100%	43.68	HABITACION 309
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 309 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.09	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.15	2.40	N/A	1	100%	43.56	HABITACION 310
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 310 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
17.05	2.40	N/A	1	100%	40.93	HABITACION 311
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 311 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.73	2.39	N/A	1	100%	44.77	HABITACION 312
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 312 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
0.75	2.09	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
21.42	2.40	N/A	1	100%	51.41	HABITACION 313
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 313 - CLOSET
1.20	1.50	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO
0.75	2.09	N/A	-1	100%	-1.57	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.53	2.40	N/A	1	100%	44.29	HABITACION 314
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 314 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.09	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.42	2.40	N/A	1	100%	44.21	HABITACION 315
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 315 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.45	2.09	N/A	-1	100%	-0.94	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.02	2.40	N/A	1	100%	43.25	HABITACION 316
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 316 - CLOSET
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.45	2.00	N/A	-1	100%	-0.90	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.37	2.40	N/A	1	100%	44.09	HABITACION 317
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 317 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.28	2.40	N/A	1	100%	43.87	HABITACION 318
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 318 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.45	2.40	N/A	1	100%	44.28	HABITACION 319
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 319 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.09	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.45	2.40	N/A	1	100%	44.28	HABITACION 320
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 320 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.09	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.21	2.40	N/A	1	100%	43.70	HABITACION 321
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 321 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO




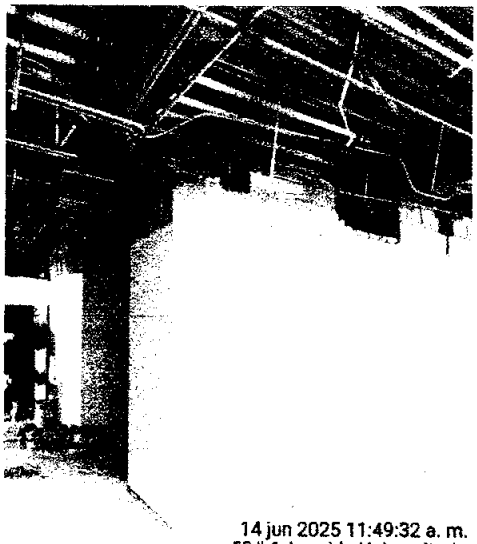






0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
17.95	2.30	N/A	1	100%	41.29	HABITACION 402	
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 402 - CLOSET	
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO	
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO	
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
19.48	2.40	N/A	1	100%	46.75	HABITACION 403	
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 403 - CLOSET	
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO	
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO	
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
18.01	2.40	N/A	1	100%	43.22	HABITACION 404	
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 404 - CLOSET	
0.95	0.90	N/A	-1	100%	-0.86	DESCUENTO	
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO	
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
19.18	2.40	N/A	1	100%	46.03	HABITACION 405	
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 405 - CLOSET	
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO	
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
5.30	2.10	N/A	1	100%	11.13	ZONA TRABAJO NORTE	
7.31	0.65	N/A	1	100%	4.75		
63.65	2.30	N/A	1	100%	146.40	CIRCULACION HABITACIONES	
1.20	2.10	N/A	-25	100%	-63.00	DESCUENTO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
0.80	0.80	N/A	1	100%	0.64	DESCUENTO CABINETE	
0.53	0.25	N/A	-2	100%	-0.27	DESCUENTO CAJA CONEL GASES	
13.00	1.15	N/A	1	100%	14.95	CENTRAL ENFERMERIA	
5.14	2.40	N/A	1	100%	12.34		
0.85	2.10	N/A	-1	100%	-1.79	DESCUENTO	
8.76	2.40	N/A	1	100%	21.02	TRABAJO LIMPIO	
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO	
3.41	2.40	N/A	1	100%	8.18	ROPA LIMPIA	
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO	
5.06	2.10	N/A	1	100%	10.63	TRABAJO SUCIO	
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO	
11.64	2.40	N/A	1	100%	27.94	PROCEDIMIENTOS	
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO	
11.28	2.40	N/A	1	100%	27.07	DESCANSO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
1.30	1.50	N/A	1	100%	1.95	DESCUENTO	
27.97	2.40	N/A	1	100%	67.13	CIRCULACION RESTRINGIDA	
1.20	1.50	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
1.30	2.10	N/A	-1	100%	-2.73	DESCUENTO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO	
0.80	0.63	N/A	-1	100%	-0.50	DESCUENTO CANTE	
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO	
1.20	2.10	N/A	1	100%	2.52	SALIDA BALCON SUR	
6.28	0.85	N/A	1	100%	5.34	BALCON SUR	
3.14	2.40	N/A	1	100%	7.54	ROPA LIMPIA	
4.65	2.40	N/A	1	100%	11.16	RESIDUOS ORDINARIOS	
0.75	2.10	N/A	-1	100%	-1.58	DESCUENTO	
3.07	2.40	N/A	1	100%	7.37	RESIDUOS PELIGROSOS	
0.75	2.10	N/A	-1	100%	-1.58	DESCUENTO	
14.35	2.10	N/A	1	100%	30.14	PASILLO ACCESO	
0.75	2.10	N/A	-2	100%	-3.15	DESCUENTO	
8.90	2.10	N/A	3	100%	18.69	DESCUENTO	
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO	
23.10	2.40	N/A	1	100%	55.44	UCI	
6.45	1.45	N/A	-1	100%	-9.35	DESCUENTO	
3.45	1.45	N/A	1	100%	5.00	DESCUENTO	
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO	
1.66	1.66	N/A	1	100%	2.76	DESCUENTO	
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO	
12.20	2.40	N/A	1	100%	29.28	COORDINACION	
1.05	2.65	N/A	1	100%	2.78	DESCUENTO	
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO	
1.00	1.47	N/A	1	100%	1.47	DESCUENTO	
0.73	1.47	N/A	-1	100%	-1.07	DESCUENTO	
		PISO 4					
17.51	2.30	N/A	1	100%	42.82	HABITACION 401	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO	
1.00	1.65	N/A	-1	100%	-1.65	DESCUENTO	
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO	
1.94	2.10	N/A	1	100%	4.07	HABITACION 401 - CLOSET	
18.77	2.10	N/A	1	100%	43.61	HABITACION 402	
1.90	2.10	N/A	1	100%	3.99	HABITACION 402 - CLOSET	
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO	
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
0.95	0.95	N/A	-1	100%	-0.90	DESCUENTO	
18.14	2.40	N/A	1	100%	44.23	HABITACION 403	
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 403 - CLOSET	
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO	
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO	
26.42	2.40	N/A	1	100%	63.41	HABITACION 404	
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 404 - CLOSET	
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO	
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO	
18.61	2.40	N/A	1	100%	44.66	HABITACION 405	
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 405 - CLOSET	
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO	
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO	
27.97	2.10	N/A	1	100%	64.85	HABITACION 406	
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 406 - CLOSET	
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO	
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO	
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
19.49	2.40	N/A	1	100%	44.38	HABITACION 407	
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 407 - CLOSET	
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO	
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO	
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
23.62	2.40	N/A	1	100%	55.60	HABITACION 408	
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 408 - CLOSET	
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO	
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO	
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
7.55	2.30	N/A	1	100%	17.36	CUARTO DE EQUIPOS	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
18.70	2.30	N/A	1	100%	43.00	RECEPCION 409	
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 409 - CLOSET	
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO	
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO	
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
18.12	2.40	N/A	1	100%	43.56	HABITACION 410	
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 410 - CLOSET	
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO	
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO	
0.75	2.00	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO	
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO	
17.95	2.40	N/A	1	100%	43.08	HABITACION 411	
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 411 - CLOSET	
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO	

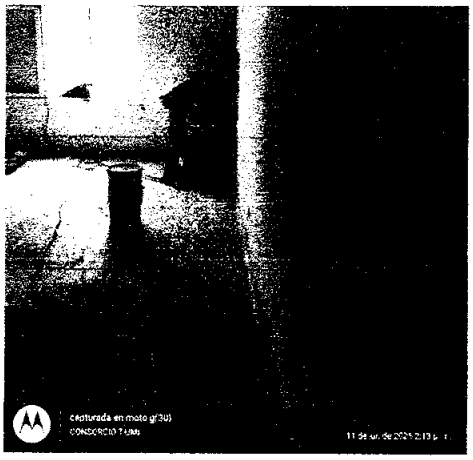





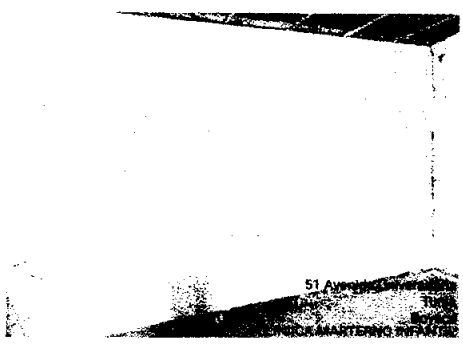

0.75	2.60	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.78	2.10	N/A	1	100%	39.44	HABITACION 412
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 412 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
24.42	2.60	N/A	1	100%	51.41	HABITACION 413
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 413 - CLOSET
1.20	1.60	N/A	1	100%	1.80	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.33	2.40	N/A	1	100%	43.99	HABITACION 414
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 414 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.42	2.30	N/A	1	100%	44.21	HABITACION 415
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 415 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.45	2.00	N/A	-1	100%	-0.90	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.07	2.30	N/A	1	100%	43.25	HABITACION 416
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 416 - CLOSET
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.95	1.45	N/A	-1	100%	-1.38	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.37	2.30	N/A	1	100%	44.09	HABITACION 417
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 417 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.78	2.30	N/A	1	100%	43.87	HABITACION 418
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 418 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.53	2.40	N/A	1	100%	44.04	HABITACION 419
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 419 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.34	2.30	N/A	1	100%	44.13	HABITACION 420
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 420 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.81	2.40	N/A	1	100%	43.70	HABITACION 421
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 421 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
17.99	2.30	N/A	1	100%	43.19	HABITACION 422
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 422 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
19.48	2.30	N/A	1	100%	44.83	HABITACION 423
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 423 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.01	2.30	N/A	1	100%	43.22	HABITACION 424
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 424 - CLOSET
0.95	0.99	N/A	-1	100%	-0.94	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
18.15	2.40	N/A	1	100%	43.63	HABITACION 425
1.95	2.10	N/A	1	100%	4.10	HABITACION 425 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	100%	-1.50	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
6.10	2.10	N/A	1	100%	12.24	ZONA TRABAJO NORTE
2.01	0.85	N/A	1	100%	6.72	
43.01	2.40	N/A	1	100%	199.32	CIRCULACION HABITACIONES
1.26	2.10	N/A	-25	100%	-63.80	DESCUENTO
0.99	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
0.80	0.80	N/A	-3	100%	-1.92	DESCUENTO GABINETE
0.33	0.25	N/A	-2	100%	-0.17	DESCUENTO CAJA CONTROL GASES
13.90	1.05	N/A	1	100%	14.60	CENTRAL TELEFONICA
6.14	2.40	N/A	1	100%	12.34	
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
8.74	2.40	N/A	1	100%	21.07	TRABAJO LIMPIO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
3.41	2.40	N/A	1	100%	8.18	ROPA LIMPIA
0.70	2.10	N/A	-1	100%	-1.47	DESCUENTO
5.86	2.40	N/A	1	100%	14.06	TRABAJO SUCIO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
11.60	2.40	N/A	1	100%	28.00	PROCEDIMIENTOS
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO
11.78	2.40	N/A	1	100%	27.07	DESCANSO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	100%	-1.95	DESCUENTO
27.87	2.40	N/A	1	100%	66.89	CIRCULACION RESTRINGIDA
1.20	1.50	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
1.30	2.10	N/A	-1	100%	-2.73	DESCUENTO
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.68	DESCUENTO
1.40	2.10	N/A	-1	100%	-2.94	DESCUENTO
0.83	0.83	N/A	-1	100%	-0.69	DESCUENTO GABINETE
0.80	2.10	N/A	-1	100%	-1.89	DESCUENTO
4.59	2.60	N/A	1	100%	11.91	SALIDA BALCON SUR
6.25	0.85	N/A	1	100%	5.34	BALCON SUR
12.10	2.40	N/A	1	100%	5.04	RENTA LIMPIA
4.68	2.40	N/A	1	100%	11.23	RESIDUOS ORDINARIOS
0.75	2.10	N/A	-1	100%	-1.58	DESCUENTO
4.00	2.40	N/A	1	100%	9.65	RESIDUOS PELIGROSOS
0.75	2.10	N/A	-1	100%	-1.58	DESCUENTO
14.45	2.40	N/A	1	100%	34.44	PASILLO ACCESO
0.75	2.10	N/A	-2	100%	-3.15	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-3	100%	-5.67	DESCUENTO
0.75	2.40	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO
23.19	2.30	N/A	1	100%	55.44	HAB
6.35	1.45	N/A	-1	100%	-9.23	DESCUENTO
3.45	1.35	N/A	-1	100%	-5.59	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	100%	-2.52	DESCUENTO
1.05	1.85	N/A	-1	100%	-1.74	DESCUENTO
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO
12.30	2.40	N/A	1	100%	29.66	HABITACION
1.05	2.65	N/A	-1	100%	-2.79	DESCUENTO
1.00	2.10	N/A	-1	100%	-2.10	DESCUENTO
1.65	1.47	N/A	-1	100%	-2.44	DESCUENTO
0.78	1.47	N/A	-1	100%	-1.15	DESCUENTO
2.30	1.2	N/A	1	100%	2.16	HAB 401
1.70	2.4	N/A	1	100%	4.08	PASILLO HAB 401 GABINETE
0.81	0.83	N/A	-1	100%	-0.66	DESCUENTO GABINETE
3.20	2.4	N/A	1	100%	7.69	HAB 403
1.00	1.5	N/A	1	100%	1.59	HAB 405
2.40	2.4	N/A	1	100%	5.76	HAB 407

53-114 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CLINIICA MARTERNO INFANTIL

0.94	2.4	N/A	1	100%	2.26	HAB 406
1.20	2.4	N/A	1	100%	2.88	HAB 409
3.14	2.4	N/A	1	100%	7.54	HAB 410
1.00	1.5	N/A	1	100%	1.50	HAB 411
2.30	2.4	N/A	1	100%	5.52	HAB 412
1.70	2.4	N/A	1	100%	4.08	PASILLO HAB 417
0.51	9.81	N/A	-1	100%	-0.66	PASILLO HAB 418
1.20	1.5	N/A	1	100%	1.80	HAB 414
1.20	1.5	N/A	1	100%	1.80	HAB 415
2.04	2.4	N/A	1	100%	4.90	HAB 416
2.10	1.4	N/A	1	100%	2.94	HAB 417
1.00	1.6	N/A	1	100%	1.60	HAB 418
3.03	2.4	N/A	1	100%	7.30	HAB 419
1.80	1.5	N/A	1	100%	2.70	HAB 420
1.30	1.7	N/A	1	100%	2.21	HAB 421
1.30	1.5	N/A	1	100%	1.95	HAB 422
1.20	1.5	N/A	1	100%	1.80	HAB 423
1.20	1.5	N/A	1	100%	1.80	HAB 424
1.60	2.4	N/A	1	100%	3.84	PASILLO GABINETE
0.80	0.8	N/A	-1	100%	-0.64	GABINETE

OBSERVACIONES:

TOTAL	9,175.05	Metro Cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	7,432.19	Metro Cuadrado
PRESENTE ACTA	1,742.86	Metro Cuadrado

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA
Aprobó Interventoria:	Ricardo Leo Hurtado	FIRMA


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNOINFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	1.02	1 SELLO MUROS ANCHOS MENORES DE 0.6 M	CAP	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UNIVERSIDAD U

Registro fotográfico





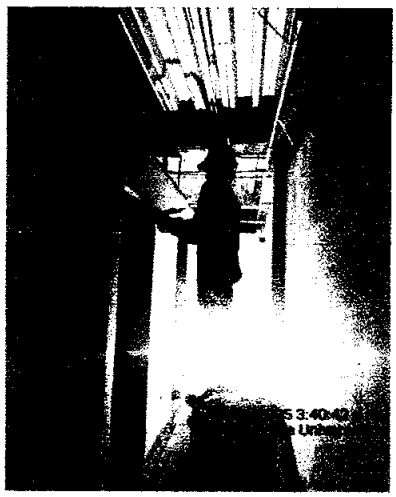





Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
			SOTANO			
2.55	N/A	N/A	12	100%	30.60	BODEGA FARMACIA
2.52	N/A	N/A	11	100%	27.72	ARCHIVO
2.10	N/A	N/A	5	100%	10.50	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
1.40	N/A	N/A	1	100%	1.40	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DIETAS
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
2.53	N/A	N/A	3	100%	7.59	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
1.40	N/A	N/A	1	100%	1.40	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
2.50	N/A	N/A	3	100%	7.50	DEP. CADAVERES
2.10	N/A	N/A	8	100%	16.80	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2.00	N/A	N/A	2	100%	4.00	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
1.40	N/A	N/A	1	100%	1.40	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	CIRCULACIÓN SALA DE STAR
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	CIRCULACIÓN SALA DE STAR
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	CIRCULACION SALA DE STAR
2.52	N/A	N/A	5	100%	12.60	DEPOSITO ALMACEN
2.50	N/A	N/A	5	100%	12.50	LAVANDERIA
2.70	N/A	N/A	1	100%	2.70	PARQUEADERO SOTANO
2.80	N/A	N/A	3	100%	8.40	PARQUEADERO SOTANO
			PISO 1			
4.02	N/A	N/A	1	100%	4.02	LAVADO DE OJOS
2.90	N/A	N/A	1	100%	2.90	LAVADO DE OJOS
0.96	N/A	N/A	1	100%	0.96	LAVADO DE OJOS
1.30	N/A	N/A	15	100%	19.50	LABORATORIO
2.20	N/A	N/A	2	100%	4.40	LABORATORIO
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	LABORATORIO
1.60	N/A	N/A	1	100%	1.60	INYECTOLOGIA
2.28	N/A	N/A	1	100%	2.28	INYECTOLOGIA
4.37	N/A	N/A	1	100%	4.37	INYECTOLOGIA
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	INYECTOLOGIA
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	INYECTOLOGIA
3.86	N/A	N/A	1	100%	3.86	INYECTOLOGIA
2.76	N/A	N/A	1	100%	2.76	INYECTOLOGIA
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.02	RESIDUOS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	RESIDUOS
0.64	N/A	N/A	2	100%	1.28	RESIDUOS
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	RESIDUOS
0.47	N/A	N/A	1	100%	0.47	RESIDUOS
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	RESIDUOS
2.60	N/A	N/A	3	100%	7.80	INYECTOLOGIA
1.08	N/A	N/A	1	100%	1.08	AREA MATERNA
2.02	N/A	N/A	2	100%	4.04	PRETRASFUCION AL
1.10	N/A	N/A	1	100%	1.10	PRETRASFUCION AL
0.96	N/A	N/A	2	100%	1.92	PRETRASFUCION AL
2.60	N/A	N/A	3	100%	7.80	PRETRASFUCION AL
0.65	N/A	N/A	2	100%	1.30	PRETRASFUCIONAL
1.08	N/A	N/A	1	100%	1.08	PRETRASFUCIONAL
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	BAÑO URGENCIAS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	MUESTRAS GINECO
1.30	N/A	N/A	4	100%	5.20	MUESTRAS GINECO
1.07	N/A	N/A	3	100%	3.21	MUESTRAS GINECO
2.60	N/A	N/A	2	100%	5.20	TOMA DE MUESTRAS
1.21	N/A	N/A	2	100%	2.42	ENTRADA INSPECION HOSPITALARIA
1.10	N/A	N/A	1	100%	1.10	ENTRADA INSPECION HOSPITALARIA
2.60	N/A	N/A	14	100%	36.40	FARMACIA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	FARMACIA
3.00	N/A	N/A	2	100%	6.00	FARMACIA
1.52	N/A	N/A	6	100%	9.08	FARMACIA
1.64	N/A	N/A	1	100%	1.64	FARMACIA
2.10	N/A	N/A	6	100%	12.60	FARMACIA
2.60	N/A	N/A	4	100%	10.40	FARMACIA
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	CICULACION HALL
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	CICULACION HALL
1.25	N/A	N/A	1	100%	1.25	CICULACION HALL
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	CICULACION HALL
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	ADMISIONES
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	MANOGRAFO
1.10	N/A	N/A	1	100%	1.10	IMAGENOLOGIA
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	IMAGENOLOGIA
0.40	N/A	N/A	2	100%	0.80	IMAGENOLOGIA
2.60	N/A	N/A	1	100%	2.60	ADMISIONES
2.10	N/A	N/A	5	100%	10.50	ADMISIONES
1.10	N/A	N/A	1	100%	1.10	ADMISIONES
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	ADMISIONES
2.60	N/A	N/A	1	100%	2.60	PROCEDIMIENTOS
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	PROCEDIMIENTOS
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	PROCEDIMIENTOS
2.60	N/A	N/A	2	100%	5.20	CONSULTORIO CARDIOLOGIA
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	CIRCULACION HALL A ASEPCIA
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	CIRCULACION HALL A ASEPCIA
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	CIRCULACION HALL A ASEPCIA
2.60	N/A	N/A	1	100%	2.60	CAPILLA RADIOLOGIA
2.60	N/A	N/A	1	100%	2.60	INSUMOS
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	INSUMOS
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	INSUMOS
2.60	N/A	N/A	4	100%	10.40	SALA DE ESPERA CONSULTORIO ECOGRAFO
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	SALA DE ESPERA CONSULTORIO ECOGRAFO
1.10	N/A	N/A	2	100%	2.20	SALA DE ESPERA CONSULTORIO ECOGRAFO
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	SALA DE ESPERA CONSULTORIO ECOGRAFO
0.40	N/A	N/A	2	100%	0.80	SALA DE ESPERA CONSULTORIO ECOGRAFO
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	ECOGRAFIA
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	ECOGRAFIA
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	ECOGRAFIA
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	ECOGRAFIA
2.60	N/A	N/A	3	100%	7.80	CONSULTORIO ECOGRAFIA
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	CONSULTORIO ECOGRAFIA
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	CONSULTORIO ECOGRAFIA
2.10	N/A	N/A	8	100%	16.80	CIRCULACION ASESORIAS
11.47	N/A	N/A	1	100%	11.47	FAJAS DINTE CONSULTORIO 3
1.00	N/A	N/A	4	100%	16.00	FAJAS DINTE CONSULTORIO 3
1.40	N/A	N/A	2	100%	2.80	CONSULTORIO 4
1.00	N/A	N/A	4	100%	4.00	CONSULTORIO 4
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	CONSULTORIO 4
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	MONITOREO GINECOSTETRIA
1.73	N/A	N/A	1	100%	1.73	REANIMACION
1.30	N/A	N/A	8	100%	10.40	REANIMACION
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	REANIMACION
2.16	N/A	N/A	1	100%	2.16	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
2.30	N/A	N/A	6	100%	12.66	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
2.70	N/A	N/A	1	100%	2.70	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0.80	N/A	N/A	4	100%	3.20	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
2.00	N/A	N/A	4	100%	8.00	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0.40	N/A	N/A	8	100%	3.20	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	CUARTO PERSONAL ASEO TECNICAL
2.00	N/A	N/A	2	100%	4.00	CUARTO PERSONAL ASEO TECNICAL




30 jun 2025 12:03:05 p. m.
51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI



27 jun 2025 6:49:55 p. m.
[illegible] 1 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

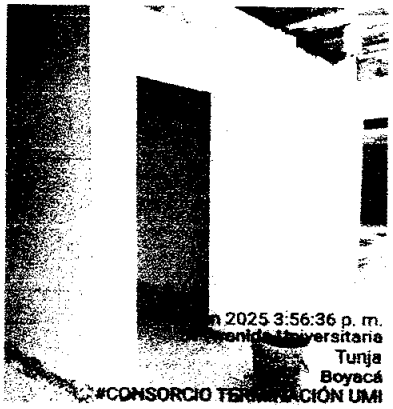

[illegible]n 2025 3:56:36 p. m.
[illegible]venida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

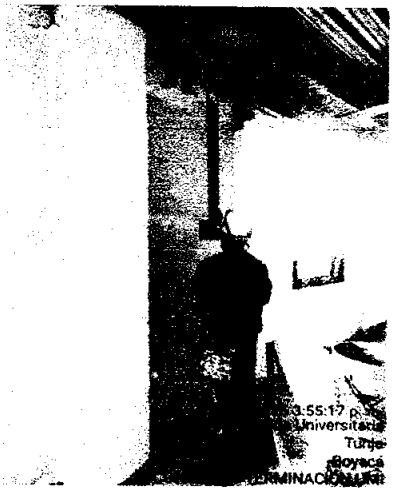

[illegible]:55:17 p.
[illegible] Universitaria
Tunja
Boyacá
[illegible]TERMINACIÓN UMI


0.40	N/A	N/A	4	100%	1.60	CUARTO PERSONAL ASISTENCIAL
2.20	N/A	N/A	6	100%	16.20	FACTURACION
1.00	N/A	N/A	4	100%	4.00	FACTURACION
2.20	N/A	N/A	6	100%	16.20	HALL GENERAL
2.30	N/A	N/A	4	100%	9.20	COCINETA
1.90	N/A	N/A	1	100%	1.90	COCINETA
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	CAFETERIA
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	CAFETERIA
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	CAFETERIA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	PUERTA MANUGRAFO
0.50	N/A	N/A	1	100%	0.50	PUERTA DINTEL
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	TAC
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	TAC
0.80	N/A	N/A	3	100%	2.40	TAC
1.70	N/A	N/A	2	100%	3.40	DISPARO
2.38	N/A	N/A	3	100%	7.14	DISPARO
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	DISPARO
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	DISPARO
2.45	N/A	N/A	6	100%	14.70	OBSERVACION GINECOLOGIA
2.30	N/A	N/A	6	100%	12.60	OBSERVACION GINECOLOGIA
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	OBSERVACION GINECOLOGIA
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	OBSERVACION GINECOLOGIA
2.73	N/A	N/A	3	100%	8.19	OBSERVACION PEDIATRA
0.79	N/A	N/A	3	100%	2.37	OBSERVACION PEDIATRA
0.51	N/A	N/A	2	100%	1.02	OBSERVACION PEDIATRA
2.45	N/A	N/A	11	100%	26.95	OBSERVACION PEDIATRA
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	OBSERVACION PEDIATRA
6.67	N/A	N/A	1	100%	6.67	CENTRAL DE ENFERMERIA
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	CENTRAL DE ENFERMERIA
1.00	N/A	N/A	3	100%	3.00	DIR URGENCIAS
2.42	N/A	N/A	3	100%	7.26	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	DIGITACION
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	DIGITACION
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	DIGITACION
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	DIGITACION
2.50	N/A	N/A	3	100%	7.50	SALA ERA
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	SALA ERA
1.30	N/A	N/A	2	100%	2.60	SALA ERA
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	SALA ERA
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	SALA ERA
2.50	N/A	N/A	4	100%	10.00	CONSULTORIO 3
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	CONSULTORIO 3
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	CONSULTORIO 3
1.90	N/A	N/A	2	100%	2.80	CONSULTORIO 3
1.40	N/A	N/A	2	100%	2.80	CONSULTORIO 3
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	CONSULTORIO 2
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	CONSULTORIO 2
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	CONSULTORIO 2
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	CONSULTORIO 2
1.30	N/A	N/A	2	100%	2.60	CONSULTORIO 2
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	CONSULTORIO 2
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	CONSULTORIO 1
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	CONSULTORIO 1
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	CONSULTORIO 1
0.93	N/A	N/A	2	100%	1.86	CONSULTORIO 1
0.92	N/A	N/A	2	100%	1.84	CONSULTORIO 1
2.50	N/A	N/A	3	100%	7.50	COMISIONES
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	REF Y CONTRA REF
2.52	N/A	N/A	4	100%	10.08	SALA ESPERA URGENCIAS
1.40	N/A	N/A	4	100%	5.60	SALA ESPERA URGENCIAS
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	SALA ESPERA URGENCIAS
2.52	N/A	N/A	2	100%	5.04	SALA ESPERA URGENCIAS
1.20	N/A	N/A	2	100%	2.40	SALA ESPERA URGENCIAS
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	SALA ESPERA URGENCIAS
0.75	N/A	N/A	2	100%	1.50	ANTEPECHO SALA DE ESPERA
2.52	N/A	N/A	1	100%	2.52	DESCANSO INTERNOS
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	DESCANSO INTERNOS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	DESCANSO INTERNOS
2.82	N/A	N/A	5	100%	12.60	EQUIPOS
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	EQUIPOS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	EQUIPOS
2.54	N/A	N/A	4	100%	10.16	PASILLO - SALA ESPERA AFIRMATIVA COLUMNAS
1.04	N/A	N/A	1	100%	1.04	PASILLO - SALA ESPERA AFIRMATIVA VENTANA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	CONTROL IMAGENOLOGIA - CARDIOLOGIA VANO PUERTA (ALTO)
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	CONTROL IMAGENOLOGIA - CARDIOLOGIA VANO PUERTA (ANCHO)
2.50	N/A	N/A	1	100%	2.50	SALA ESPERA - RECEPCION ANTEPECHO (LARGO)
1.60	N/A	N/A	1	100%	1.60	SALA ESPERA - RECEPCION ANTEPECHO (ALTO)
3.51	N/A	N/A	1	100%	3.51	CONTROL IMAGENOLOGIA - CARDIO ANTEPECHO
1.50	N/A	N/A	1	100%	1.50	CONTROL IMAGENOLOGIA - CARDIO COLUMNETA
2.50	N/A	N/A	1	100%	2.50	SALA ESPERA RECEPCION MURO CORTO LATERAL DERECHO
2.64	N/A	N/A	2	100%	5.28	CABINA Y SILLAS RUEDAS COLUMNA
2.00	N/A	N/A	1	100%	2.00	DE ACCESO URG A PASILLO HACIA CENTRAL DE ENFERMERIA PUERTA (ANCHO) VENTANA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	DE ACCESO URG A PASILLO HACIA CENTRAL DE ENFERMERIA PUERTA ACCESO (ALTO)
2.54	N/A	N/A	5	100%	12.70	MONITOREO GINESCOBTETRIA COLUMNAS
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	MONITOREO GINESCOBTETRIA PUERTAS (ALTOS)
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	MONITOREO GINESCOBTETRIA PUERTA BAÑO (ANCHO)
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	MONITOREO GINESCOBTETRIA PUERTA CUARTO LIMPIO (ANCHO)
1.71	N/A	N/A	1	100%	1.71	MONITOREO GINESCOBTETRIA PUERTA PRINCIPAL (ANCHO)
0.95	N/A	N/A	4	100%	3.80	SALA EDA VENTANA EXTERIOR
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	SALA EDA VENTANA PASILLO (ANCHO)
1.07	N/A	N/A	2	100%	2.14	SALA EDA VENTANA PASILLO (ALTO)
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	SALA EDA PUERTAS (ALTOS)
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	SALA EDA PUERTA BAÑO (ANCHO)
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	SALA EDA PUERTA PRINCIPAL (ANCHO)
2.63	N/A	N/A	4	100%	10.52	SALA EDA COLUMNAS
1.13	N/A	N/A	2	100%	2.26	AUDITORIO MURO ORIENTAL VENTANA (ANCHO)
1.72	N/A	N/A	1	100%	1.72	AUDITORIO MURO ORIANTAL VENTANA (ALTO)
2.62	N/A	N/A	1	100%	2.62	AUDITORIO MURO ORIENTAL COLUMNA
3.80	N/A	N/A	4	100%	15.20	
2.37	N/A	N/A	1	100%	2.37	AUDITORIO MURO NORTE VENTANA
2.82	N/A	N/A	1	100%	2.82	
2.46	N/A	N/A	5	100%	13.30	AUDITORIO MURO NORTE COLUMNAS
3.89	N/A	N/A	2	100%	7.78	SALA ESPERA ADULTO VENTANA (ANCHO)
2.80	N/A	N/A	1	100%	2.80	SALA ESPERA ADULTO VENTANA (ALTO)
2.91	N/A	N/A	4	100%	15.00	SALA ESPERA ADULTO COLUMNAS
3.10	N/A	N/A	1	100%	3.10	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA (DIGITACION) PUERTA (ALTO)
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA (DIGITACION) PUERTA (ANCHO)
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	ROPA LIMPIA (DIGITACION) PUERTA (ALTO)
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	ROPA LIMPIA (DIGITACION) PUERTA (ANCHO)
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	ROPA SUCIA (DIGITACION) PUERTA (ALTO)
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	ROPA SUCIA (DIGITACION) PUERTA (ANCHO)
2.58	N/A	N/A	2	100%	5.06	REMISION COLUMNA
4.57	N/A	N/A	4	100%	18.28	DIGITACION COLUMNA
2.60	N/A	N/A	3	100%	7.80	DISP. GINESCOBTETRICS
2.55	N/A	N/A	2	100%	5.10	PROCEDIMIENTOS COLUMNAS
2.52	N/A	N/A	2	100%	5.04	SALA DE LECTURA DE IMAGENOLOGIA COLUMNAS
2.50	N/A	N/A	5	100%	12.50	RX COLUMNAS
2.56	N/A	N/A	2	100%	5.12	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICA COLUMNA
2.56	N/A	N/A	2	100%	5.12	RESIDUOS RECICLABLES ORDINARIOS COLUMNAS
2.81	N/A	N/A	8	100%	20.80	COCINA COLUMNAS
2.60	N/A	N/A	2	100%	5.20	CAFETERIA COLUMNAS
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA (DIGITACION)
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	PUERTA
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	ROPA LIMPIA (DIGITACION) PUERTA
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	ROPA SUCIA (DIGITACION) PUERTA
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	







2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	ACOMETIDA ELECTRICA DESCANSO URGENCIAS
2.08	N/A	N/A	3	100%	6.24	ACOMETIDA ELECTRICA REANIMACION
2.15	N/A	N/A	1	100%	2.15	ACOMETIDA ELECTRICA REANIMACION
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	ACOMETIDA ELECTRICA SALA EDA
1.10	N/A	N/A	1	100%	1.10	ACOMETIDA ELECTRICA SALA ERA
1.40	N/A	N/A	1	100%	1.40	ACOMETIDA ELECTRICA SALA ERA
1.60	N/A	N/A	1	100%	1.60	ACOMETIDA ELECTRICA SALA ERA
1.80	N/A	N/A	1	100%	1.80	ACOMETIDA ELECTRICA SALA ERA
2.30	N/A	N/A	1	100%	2.30	ACOMETIDA ELECTRICA SALA ERA
2.15	N/A	N/A	2	100%	4.30	ACOMETIDA HIDRAULICA RESIDUOS PELIGROSO
1.55	N/A	N/A	1	100%	1.55	ACOMETIDA ELECTRICA R/
2.30	N/A	N/A	1	100%	2.30	ACOMETIDA ELECTRICA PROCEDIMIENTO
1.40	N/A	N/A	1	100%	1.40	ACOMETIDA ELECTRICA ECOGRAFO
1.60	N/A	N/A	1	100%	1.60	ACOMETIDA ELECTRICA ECOGRAFO
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	ACOMETIDA HIDRAULICA RESIDUOS NO CLASIFICABLE
1.90	N/A	N/A	1	100%	1.90	ACOMETIDA ELECTRICA LABORATORIO
1.44	N/A	N/A	1	100%	2.44	ACOMETIDA ELECTRICA FRETRAFUNCIONAL
1.60	N/A	N/A	1	100%	1.60	ACOMETIDA ELECTRICA PRETRAFUNCIONAL
1.45	N/A	N/A	1	100%	1.45	ACOMETIDA ELECTRICA FRETRAFUNCIONAL
1.00	N/A	N/A	4	100%	4.00	ACOMETIDA NOTARIA GABINETE DISPENSARIO
2.95	N/A	N/A	1	100%	2.95	ACOMETIDA ELECTRICA ESCALERA SOTANO
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	ACOMETIDA ELECTRICA ESCALERA SOTANO
2.30	N/A	N/A	1	100%	2.30	ACOMETIDA ELECTRICA V. C
2.40	N/A	N/A	3	100%	7.20	ACOMETIDA ELECTRICA V. C
1.60	N/A	N/A	1	100%	1.60	ACOMETIDA ELECTRICA RECEPCION HAU
2.20	N/A	N/A	1	100%	2.20	ACOMETIDA ELECTRICA COCINETA
2.30	N/A	N/A	1	100%	2.30	ACOMETIDA ELECTRICA COCINETA
1.10	N/A	N/A	1	100%	1.10	ACOMETIDA ELECTRICA COCINETA
1.60	N/A	N/A	2	100%	3.20	ACOMETIDA ELECTRICA CAFETERIA
		PISO 2				
6.90	N/A	N/A	1	100%	6.90	PASILLO RECUPERACION QUIRURGICA
2.30	N/A	N/A	8	100%	18.40	PASILLO RECUPERACION QUIRURGICA
2.50	N/A	N/A	3	100%	7.50	PASILLO RECUPERACION QUIRURGICA
1.70	N/A	N/A	1	100%	3.78	PREPARACION PACIENTES
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	PREPARACION PACIENTES
2.40	N/A	N/A	2	100%	4.80	PREPARACION PACIENTES
3.11	N/A	N/A	1	100%	3.11	RECUPERACION QUIRURGICA
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	PACIENTES
2.55	N/A	N/A	7	100%	17.85	PAJAS ESQUINERAS
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	COLUMNA
8.47	N/A	N/A	1	100%	8.47	CENTRAL DE ENFERMERIA
1.48	N/A	N/A	2	100%	2.96	PAJAS MEDIANAS
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	PAJAS LATERALES
2.50	N/A	N/A	6	100%	15.00	CENTRAL DE ESTERILIZACION
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	INGRESO AUTOCLAVE
18.61	N/A	N/A	1	100%	18.61	CIRCULACION QUIROFANOS
2.10	N/A	N/A	21	100%	44.10	CIRCULACION QUIROFANOS
1.00	N/A	N/A	10	100%	10.00	CIRCULACION QUIROFANOS
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	CIRCULACION QUIROFANOS
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	CIRCULACION QUIROFANOS
2.15	N/A	N/A	2	100%	4.30	CIRCULACION QUIROFANOS
2.50	N/A	N/A	5	100%	12.50	SALA DE PARTOS 1
0.95	N/A	N/A	4	100%	3.80	SALA DE PARTOS 1
2.60	N/A	N/A	2	100%	5.20	SALA DE PARTOS 2
0.50	N/A	N/A	2	100%	1.00	VENTANA
4.32	N/A	N/A	2	100%	8.64	VENTANA
3.21	N/A	N/A	2	100%	6.42	DESCANSO QUIROFANOS
0.60	N/A	N/A	2	100%	1.80	VENTANAPUERTA COLUMNA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	QUIROFANO 1
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	QUIROFANO 2
2.60	N/A	N/A	2	100%	5.20	QUIROFANO 3
2.40	N/A	N/A	3	100%	7.20	PASILLO TRABAJO SUCIO
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	PASILLO TRABAJO SUCIO
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	PASILLO TRABAJO SUCIO
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	PASILLO TRABAJO SUCIO
0.37	N/A	N/A	2	100%	0.74	PASILLO TRABAJO SUCIO
2.00	N/A	N/A	2	100%	4.00	FARMACIA
0.37	N/A	N/A	2	100%	0.74	FARMACIA
2.00	N/A	N/A	2	100%	4.00	FARMACIA
2.50	N/A	N/A	5	100%	12.50	FARMACIA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	FARMACIA
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	FARMACIA
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	BODEGA
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	BODEGA
2.10	N/A	N/A	1	100%	6.30	DESCANSO
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	DESCANSO
1.00	N/A	N/A	4	100%	4.00	DESCANSO
0.60	N/A	N/A	1	100%	0.60	DESCANSO
2.50	N/A	N/A	9	100%	22.50	DESCANSO
2.10	N/A	N/A	7	100%	14.70	VESTIER MUJERES
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	VESTIER MUJERES
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	VESTIER MUJERES
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	VESTIER MUJERES
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	VESTIER HOMBRES
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	VESTIER HOMBRES
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	VESTIER HOMBRES
2.40	N/A	N/A	3	100%	7.20	VESTIER HOMBRES
2.10	N/A	N/A	23	100%	48.30	PASILLO PRINCIPAL UCI
15.60	N/A	N/A	1	100%	15.60	PUERTA DINTEL
2.45	N/A	N/A	5	100%	12.25	ESQUINERO
5.00	N/A	N/A	1	100%	5.00	RECEPCION
2.10	N/A	N/A	1	100%	6.30	TRABAJO DE PARTOS
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	TRABAJO DE PARTOS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	TRABAJO DE PARTOS
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	TRABAJO DE PARTOS
2.50	N/A	N/A	8	100%	20.00	TRATAJO DE PARTOS
4.69	N/A	N/A	1	100%	4.69	CENTRAL DE ENFERMERIA
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	RECUPERACION PARTOS
0.95	N/A	N/A	1	100%	0.95	RECUPERACION PARTOS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	RECUPERACION PARTOS
1.00	N/A	N/A	1	100%	2.00	RECUPERACION PARTOS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	RECUPERACION PARTOS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	RECUPERACION PARTOS
2.50	N/A	N/A	20	100%	50.00	RECUPERACION PARTOS
5.31	N/A	N/A	1	100%	5.31	CENTRAL DE ENFERMERIA
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	ROPA LIMPIA
2.40	N/A	N/A	2	100%	5.80	CAJA VESTIER PARTOS
2.10	N/A	N/A	10	100%	21.00	UCI ADULTOS (UARO)
0.80	N/A	N/A	4	100%	3.20	UCI ADULTOS (UARO)
1.10	N/A	N/A	2	100%	2.20	UCI ADULTOS (UARO)
1.30	N/A	N/A	3	100%	3.90	UCI ADULTOS (UARO)
1.30	N/A	N/A	2	100%	2.60	UCI ADULTOS (UARO)
0.92	N/A	N/A	2	100%	1.84	UCI ADULTOS (UARO)
0.25	N/A	N/A	4	100%	1.00	UCI ADULTOS (UARO)
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	UCI ADULTOS (UARO)
0.95	N/A	N/A	4	100%	3.80	UCI ADULTOS (UARO)
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	UCI ADULTOS (UARO)
1.20	N/A	N/A	2	100%	2.40	UCI ADULTOS (UARO)
0.60	N/A	N/A	1	100%	0.60	UCI ADULTOS (UARO)
2.35	N/A	N/A	2	100%	4.70	UCI ADULTOS (UARO)
0.95	N/A	N/A	4	100%	3.80	UCI ADULTOS (UARO)
0.60	N/A	N/A	1	100%	0.60	UCI ADULTOS (UARO)
0.80	N/A	N/A	3	100%	2.40	UCI ADULTOS (UARO)
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	UCI ADULTOS (UARO)
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	UCI ADULTOS (UARO)
2.50	N/A	N/A	47	100%	117.50	UCI ADULTOS (UARO)
12.00	N/A	N/A	2	100%	24.00	MURO DIVISORIO UCI 1 Y UCI 2
11.72	N/A	N/A	2	100%	23.44	MURO DIVISORIO UCI 2 Y UCI 3
12.56	N/A	N/A	2	100%	25.12	MURO DIVISORIO UCI 3 Y UCI 4
11.72	N/A	N/A	2	100%	23.44	MURO DIVISORIO UCI 4 Y UCI 5
11.75	N/A	N/A	2	100%	23.50	MURO DIVISORIO UCI 5 Y UCI 6
13.31	N/A	N/A	2	100%	26.62	MURO DIVISORIO UCI 7 Y UCI 8
12.74	N/A	N/A	2	100%	25.48	MURO DIVISORIO UCI 8 Y UCI 9
3.77	N/A	N/A	1	100%	3.77	CENTRAL DE ENFERMERIA UCI 8 Y 9
1.54	N/A	N/A	1	100%	1.54	CENTRAL DE ENFERMERIA UCI 5 A 9
0.80	N/A	N/A	4	100%	3.20	DESCANSO

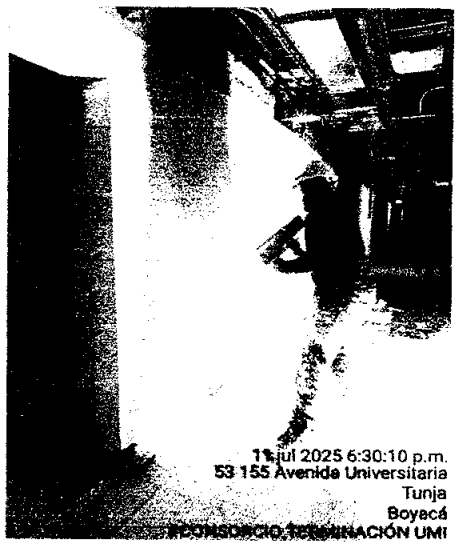








2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	DESCANSO
2.50	N/A	N/A	1	100%	2.50	DESCANSO
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	FILTRO
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	FILTRO
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	ACCESO UCI NEONATAL
2.50	N/A	N/A	3	100%	7.50	LACTARIO
2.50	N/A	N/A	1	100%	2.50	LACTARIO
2.40	N/A	N/A	4	100%	9.60	LACTARIO
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERI
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERI
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERI
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERI
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	UCI NEONATAL
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	UCI NEONATAL
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI NEONATAL
1.30	N/A	N/A	28	100%	36.40	UCI NEONATAL
0.30	N/A	N/A	2	100%	0.60	UCI NEONATAL
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.68	UCI NEONATAL
1.05	N/A	N/A	2	100%	2.10	UCI NEONATAL
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	UCI NEONATAL
0.70	N/A	N/A	6	100%	4.20	UCI NEONATAL
0.90	N/A	N/A	4	100%	3.60	UCI NEONATAL
1.00	N/A	N/A	1	100%	1.00	UCI NEONATAL
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	UCI NEONATAL
1.35	N/A	N/A	1	100%	1.35	UCI NEONATAL
0.70	N/A	N/A	1	100%	0.70	UCI NEONATAL
2.50	N/A	N/A	36	100%	90.00	UCI NEONATAL
0.71	N/A	N/A	1	100%	0.71	AISLADO INTENSIVO
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	AISLADO INTENSIVO
1.66	N/A	N/A	4	100%	16.64	CENTRALES SATELITE
7.69	N/A	N/A	1	100%	7.69	CENTRAL DE ENFERMERIA
0.80	N/A	N/A	4	100%	3.28	PASILLO DESCANSO
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	PASILLO DESCANSO
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	DESCANSO
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	DESCANSO
1.30	N/A	N/A	4	100%	5.20	DESCANSO
1.90	N/A	N/A	1	100%	1.90	DESCANSO
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	DESCANSO
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	PASILLO DESCANSO
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	PASILLO DESCANSO
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	PASILLO DESCANSO
2.10	N/A	N/A	3	100%	6.30	PASILLO ACCESO ASISTENCIAL
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	PASILLO ACCESO ASISTENCIAL
0.75	N/A	N/A	1	100%	0.75	PASILLO ACCESO ASISTENCIAL
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	PASILLO ACCESO ASISTENCIAL
1.50	N/A	N/A	1	100%	1.50	ROPA LIMPIA
1.73	N/A	N/A	1	100%	1.73	ROPA SUCIA
2.10	N/A	N/A	4	100%	8.40	VESTIER
0.80	N/A	N/A	4	100%	3.20	VESTIER
0.78	N/A	N/A	1	100%	0.78	VESTIER
3.60	N/A	N/A	2	100%	7.20	VESTIER
2.80	N/A	N/A	2	100%	4.28	COORDINACION
1.80	N/A	N/A	1	100%	1.80	COORDINACION
3.20	N/A	N/A	2	100%	6.40	COORDINACION
2.50	N/A	N/A	3	100%	7.50	HALL
		PISO 3				
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.18	
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	
2.60	N/A	N/A	1	100%	2.60	
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	
1.80	N/A	N/A	1	100%	1.80	
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	
1.05	N/A	N/A	1	100%	1.05	
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.80	
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	
2.52	N/A	N/A	6	100%	15.12	
0.90	N/A	N/A	5	100%	4.50	
2.70	N/A	N/A	11	100%	29.40	
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	
2.10	N/A	N/A	1	100%	5.10	LUDOTECA Y ZONA ADMINISTRATIVA
6.40	N/A	N/A	1	100%	6.40	
5.70	N/A	N/A	1	100%	5.70	
3.00	N/A	N/A	1	100%	3.00	
2.50	N/A	N/A	1	100%	2.50	
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	
2.10	N/A	N/A	1	100%	2.10	
0.83	N/A	N/A	2	100%	1.66	
0.42	N/A	N/A	2	100%	1.84	
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	
0.80	N/A	N/A	2	100%	1.60	
2.10	N/A	N/A	1	100%	16.80	
0.80	N/A	N/A	7	100%	5.60	
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	
2.00	N/A	N/A	3	100%	6.00	
2.60	N/A	N/A	1	100%	2.60	
2.12	N/A	N/A	1	100%	2.12	
2.45	N/A	N/A	2	100%	4.90	
2.55	N/A	N/A	2	100%	5.10	
1.18	N/A	N/A	1	100%	1.18	
2.70	N/A	N/A	2	100%	5.60	UCI # 1
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI # 1
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	UCI # 1
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	UCI # 1
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI # 3
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	UCI # 3
2.70	N/A	N/A	1	100%	2.70	UCI # 3
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	UCI # 3
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	UCI # 3
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI # 5
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	UCI # 5
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	UCI # 5
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	UCI # 5
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	UCI # 5
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	UCI # 7
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	UCI # 7
2.70	N/A	N/A	1	100%	2.70	UCI # 7
2.70	N/A	N/A	2	100%	5.40	UCI # 9
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI # 9
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	UCI # 9
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	UCI # 9
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI # 11
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	UCI # 11
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	UCI # 11
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	UCI # 11
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	UCI # 12
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	UCI # 12
1.00	N/A	N/A	4	100%	4.00	UCI # 12
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	UCI # 12
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI # 12
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	UCI # 12
2.50	N/A	N/A	2	100%	5.00	UCI # 10
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	UCI # 10
1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	UCI # 10
3.05	N/A	N/A	2	100%	6.10	UCI # 8
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	UCI # 8
1.50	N/A	N/A	2	100%	3.00	UCI # 8
0.90	N/A	N/A	2	100%	1.80	UCI # 8
1.65	N/A	N/A	1	100%	1.65	UCI # 6
1.00	N/A	N/A	2	100%	2.00	UCI # 6
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	UCI # 6




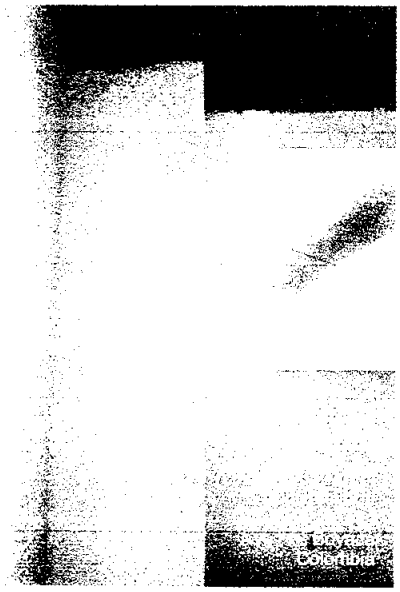





2.70	N/A	N/A	1	100%	2.70	DCI#6
3.00	N/A	N/A	2	100%	6.00	DCI#1
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	DCI#4
2.70	N/A	N/A	2	100%	5.40	DCI#2
3.00	N/A	N/A	2	100%	6.00	DCI#2
0.70	N/A	N/A	2	100%	1.40	DCI#7
2.10	N/A	N/A	2	100%	4.20	CIRCULACION
2.90	N/A	N/A	2	100%	1.60	CIRCULACION
2.70	N/A	N/A	1	100%	2.70	CIRCULACION
		PISO 4				
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 425
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 425
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 425
1.28	N/A	N/A	1	100%	1.28	HABITACION 425
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 425
2.30	N/A	N/A	5	100%	11.50	HABITACION 424
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 424
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 424
1.28	N/A	N/A	1	100%	1.28	HABITACION 424
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 424
2.30	N/A	N/A	4	100%	6.90	HABITACION 423
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 423
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 423
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 423
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 423
2.30	N/A	N/A	5	100%	11.50	HABITACION 422
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 422
1.96	N/A	N/A	2	100%	3.92	HABITACION 422
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 422
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 422
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 421
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 421
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	HABITACION 421
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 421
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 421
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 420
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 420
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 420
1.28	N/A	N/A	1	100%	1.28	HABITACION 420
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 420
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 419
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 419
1.96	N/A	N/A	2	100%	3.92	HABITACION 419
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 419
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 419
2.30	N/A	N/A	1	100%	2.30	HABITACION 418
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 418
1.96	N/A	N/A	6	100%	11.76	HABITACION 418
1.28	N/A	N/A	1	100%	1.28	HABITACION 418
0.76	N/A	N/A	1	100%	0.76	HABITACION 418
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 417
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 417
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	HABITACION 417
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 417
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 417
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 416
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 416
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 416
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 416
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 416
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 415
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 415
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	HABITACION 415
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 415
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 415
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 414
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 414
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	HABITACION 414
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 414
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 414
2.30	N/A	N/A	1	100%	2.30	HABITACION 413
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 413
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	HABITACION 413
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 413
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	HABITACION 413
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 412
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 412
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 412
1.28	N/A	N/A	1	100%	1.28	HABITACION 412
0.76	N/A	N/A	2	100%	1.52	HABITACION 412
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 411
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 411
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 411
1.28	N/A	N/A	1	100%	1.28	HABITACION 411
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 411
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 410
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 410
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 410
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 410
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 410
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 409
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 409
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 409
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 409
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 409
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 408
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 408
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 408
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 408
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 408
2.30	N/A	N/A	1	100%	2.30	HABITACION 407
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 407
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 407
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 407
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 407
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 406
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 406
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 406
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 406
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 406
2.30	N/A	N/A	5	100%	11.50	HABITACION 405
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 405
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	HABITACION 405
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 405
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 405
2.30	N/A	N/A	2	100%	4.60	HABITACION 404
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 404
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 404
1.28	N/A	N/A	1	100%	1.28	HABITACION 404
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 404
2.30	N/A	N/A	11	100%	25.30	HABITACION 403
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 403
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	HABITACION 403
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 403
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 403
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 402
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 402
1.96	N/A	N/A	3	100%	5.88	HABITACION 402
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 402
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 402
2.30	N/A	N/A	3	100%	6.90	HABITACION 401
0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	HABITACION 401
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	HABITACION 401
1.20	N/A	N/A	1	100%	1.20	HABITACION 401
0.77	N/A	N/A	2	100%	1.54	HABITACION 401
7.80	N/A	N/A	1	100%	7.80	CENTRAL DE CONCRETERA
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.96	TRABAJO LIMPIO



0.90	N/A	N/A	1	100%	0.90	TRABAJO LIMPIO
8.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	TRABAJO SUCIO
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.96	TRABAJO SUCIO
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.96	PROCEDIMIENTO
1.40	N/A	N/A	1	100%	1.40	PROCEDIMIENTO
2.40	N/A	N/A	4	100%	9.60	PROCEDIMIENTO
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	CUARTO DE ASEO
0.96	N/A	N/A	1	100%	0.96	CUARTO DE ASEO
2.40	N/A	N/A	2	100%	4.80	DESCANSO VESTIER
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	DESCANSO VESTIER
1.90	N/A	N/A	2	100%	3.80	DESCANSO VESTIER
2.40	N/A	N/A	9	100%	21.60	CIRCULACION RESTRINGIDA
1.96	N/A	N/A	2	100%	3.92	CIRCULACION RESTRINGIDA
1.30	N/A	N/A	1	100%	1.30	CIRCULACION RESTRINGIDA
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	RESIDUOS ORDINARIOS
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.96	RESIDUOS ORDINARIOS
0.80	N/A	N/A	1	100%	0.80	RESIDUOS ORDINARIOS
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.96	RESIDUOS PELIGROSO
1.96	N/A	N/A	4	100%	7.84	BAÑOS
0.86	N/A	N/A	2	100%	1.72	BAÑOS
0.93	N/A	N/A	1	100%	0.93	BAÑOS
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.96	COORDINACION
2.63	N/A	N/A	1	100%	2.63	COORDINACION
1.85	N/A	N/A	1	100%	1.85	COORDINACION
2.74	N/A	N/A	1	100%	2.74	COORDINACION
2.40	N/A	N/A	3	100%	7.20	COORDINACION
1.79	N/A	N/A	1	100%	4.79	COORDINACION
0.78	N/A	N/A	2	100%	1.56	COORDINACION
5.75	N/A	N/A	1	100%	28.25	SALA DE ESPERA
3.43	N/A	N/A	3	100%	10.29	SALA DE ESPERA
2.40	N/A	N/A	5	100%	12.00	SALA DE ESPERA
5.58	N/A	N/A	1	100%	5.58	SALA DE ESPERA

OBSERVACIONES:

TOTAL	3,389.64	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	3,382.26	Metro lineal
PRESENTE ACTA	67.38	Metro lineal

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA
Aprobo Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	1.85	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA MURO	CAP	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico








Dimensiones					Total [m]	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
			SOTANO			
13.09	2.55	N/A	1	33%	15.93	LAVANDERIA
1.50	2.10	N/A	-1	33%	-1.84	DESCUENTO PUERTA EN LAVANDERIA
27.60	2.70	N/A	1	33%	74.88	PARQUEADERO SOTANO
24.17	2.69	N/A	1	33%	21.30	PARQUEADERO SOTANO
1.00	2.10	N/A	-5	33%	-3.47	DESCUENTO PUERTA ARA A PARQUEADERO
1.50	2.10	N/A	-1	33%	-1.04	DESCUENTO PUERTA AREA PARQUEADERO
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUENTO PUERTA ARA A PARQUEADERO
0.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.26	DESCUENTO VENTANA AREA DE PARQUEADERO
1.20	2.20	N/A	-5	33%	-4.16	DESCUENTO PUERTA ARA A PARQUEADERO
1.00	1.10	N/A	-1	33%	-0.36	DESCUENTO VENTANA AREA DE PARQUEADERO
11.00	2.55	N/A	1	33%	11.33	CONSULTORIO DE DICTAS
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA CONSULTORIO DE DICTAS
19.66	2.49	N/A	1	33%	13.47	ROPA LIMPIA
1.40	2.10	N/A	1	33%	-0.97	DESCUENTO PUERTA ROPA LIMPIA
9.38	2.60	N/A	1	33%	7.74	ROPA SUCIA
0.70	2.10	N/A	1	33%	-0.49	DESCUENTO PUERTA ROPA SUCIA
49.88	2.55	N/A	1	33%	41.13	BODEGA FARMACIA
0.40	2.60	N/A	-1	33%	-0.26	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
0.90	2.10	N/A	-2	33%	-1.11	DESCUENTO DE PUERTA BODEGA FARMACIA
1.21	2.10	N/A	-1	33%	-0.84	DESCUENTO DE PUERTA BODEGA FARMACIA
38.10	2.52	N/A	1	33%	31.68	ARCHIVO
1.21	2.10	N/A	-1	33%	-0.84	DESCUENTO DE PUERTA ARCHIVO
0.40	1.20	N/A	-1	33%	-0.16	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
0.40	0.65	N/A	-1	33%	-0.26	DESCUENTO VENTANA BODEGA FARMACIA
20.21	2.45	N/A	1	33%	16.34	CIRCULACION DE ARCHIVO A DESPACHO DE DICTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.56	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.97	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
13.10	2.53	N/A	1	33%	12.61	CIRCULACION DE ROPA SUCIA A DEPOSITO DE CADAVERES
1.32	2.10	N/A	-1	33%	-0.91	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.97	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
14.87	2.20	N/A	1	33%	12.23	DEP. CADAVERES
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.97	DESCUENTO PUERTA EN DEP DE CADAVERES
11.21	2.10	N/A	1	33%	8.86	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
2.20	2.20	N/A	1	33%	1.60	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
1.40	1.50	N/A	1	33%	0.69	CIRCULACION ENTRE ROPA LIMPIA A PARQUEADERO
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.97	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.55	1.00	N/A	-1	33%	-0.18	DESCUENTO VENTANA EN CIRCULACION
14.06	2.50	N/A	1	33%	11.60	CIRCULACION SALA DE STAR
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.97	DESCUENTO PUERTA EN CIRCULACION
0.13	0.74	N/A	-1	33%	-0.06	DESCUENTO VENTANA EN CIRCULACION
17.25	2.52	N/A	1	33%	14.35	DEPOSITO ALMACEN
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA EN DEPOSITO ALMACEN
0.55	1.00	N/A	-1	33%	-0.18	DESCUENTO VENTANA EN DEPOSITO ALMACEN
2.00	0.40	N/A	-1	33%	-0.26	DESCUENTO VENTANA EN DEPOSITO ALMACEN
14.25	2.70	N/A	1	33%	12.76	ASEO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO PUERTA
0.40	0.67	N/A	-1	33%	-0.09	DESCUENTO VENTANA
			PISO 1			
17.83	2.60	N/A	1	33%	13.04	BODEGA LIMPIO
2.93	2.10	N/A	1	33%	1.06	MURO INTERNO LABORATORIO
0.97	2.09	N/A	1	33%	0.67	MURO INTERMEDIO LAVA OJOS
3.61	2.69	N/A	1	33%	3.98	CUARTO LABORATORIO
0.80	2.10	N/A	-3	33%	-1.66	DESCUENTO PUERTA
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-2.73	DESCUENTO VENTANA
10.20	0.99	N/A	1	33%	3.33	LABARATORIO INFECTOLOGIA
2.74	1.29	N/A	1	33%	1.09	LABARATORIO INFECTOLOGIA
3.61	3.12	N/A	1	33%	0.61	LABARATORIO INFECTOLOGIA
20.41	2.50	N/A	1	33%	25.38	LABORATORIO PARASITOLOGIA
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.67	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA
0.84	2.10	N/A	-1	33%	-0.34	DESCUENTO VENTANA
0.71	2.10	N/A	-1	33%	-0.48	DESCUENTO PUERTA
1.30	0.65	N/A	-1	33%	-0.28	DESCUENTO VENTANA
3.80	2.60	N/A	1	33%	2.97	CUARO RESIDUOS RESICLABLES ORDINARIOS
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
0.40	1.30	N/A	-1	33%	-0.21	DESCUENTO VENTANA
0.80	0.85	N/A	-1	33%	-0.24	DESCUENTO VENTANA
3.01	2.60	N/A	1	33%	3.33	CUARTO NEVERA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.60	DESCUENTO PUERTA
10.42	2.60	N/A	1	33%	9.37	CUARTO TRANSICIONAL
0.97	2.10	N/A	-1	33%	-0.67	DESCUENTO DE PUERTA
0.94	1.10	N/A	-1	33%	-0.34	DESCUENTO DE VENTANA
0.95	1.00	N/A	-1	33%	-0.31	DESCUENTO DE VENTANA
2.46	2.60	N/A	1	33%	4.68	CUARTO NEVERA MURO
3.21	2.69	N/A	1	33%	3.18	HALL CIRCULACION
1.21	9.61	N/A	1	33%	0.24	CIRCULACION HALL
1.06	2.69	N/A	1	33%	3.48	MURO HALL ENTRADA LABORATORIO
3.20	2.69	N/A	1	33%	3.17	MURO TOMA DE MUESTRAS
2.86	2.60	N/A	1	33%	2.45	MURO TOMA DE MUESTRAS
2.82	2.60	N/A	1	33%	2.42	MURO TOMA DE MUESTRAS
1.64	2.60	N/A	1	33%	1.41	TOMA DE MUESTRAS
3.64	2.60	N/A	1	33%	3.12	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
1.47	2.60	N/A	1	33%	1.26	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
1.67	2.60	N/A	1	33%	1.43	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGICAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.56	DESCUENTO DE PUERTA GINECOLOGICA
2.66	2.60	N/A	1	33%	1.77	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGICA
2.66	2.60	N/A	1	33%	1.77	TOMA DE MUESTRA GINECOLOGICA
1.70	1.10	N/A	-1	33%	-0.54	DESCUENTO VENTANA
3.91	2.60	N/A	1	33%	3.35	ENTREGA DE MUESTRAS
8.20	2.69	N/A	1	33%	7.11	MURO INTERNO FARMACIA
0.99	0.65	N/A	-1	33%	-0.21	DESCUENTO VENTANA
0.80	1.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
6.81	2.69	N/A	1	33%	5.84	MURO EXTERIOR FARMACIA
0.90	3.10	N/A	-1	33%	-0.96	DESCUENTO VENTANA
4.25	2.63	N/A	1	33%	3.63	MURO INTERNO FARMACIA
0.90	1.10	N/A	-1	33%	-0.96	DESCUENTO
7.02	3.33	N/A	1	33%	2.44	MURO INTERNO FARMACIA
4.05	2.64	N/A	1	33%	3.84	MURO INTERNO FARMACIA
0.83	1.65	N/A	1	33%	4.29	MURO INTERNO FARMACIA
0.94	2.93	N/A	1	33%	0.78	MURO ENTREGA FARMACIA
3.46	2.66	N/A	1	33%	2.97	AREA ENTREGA DE FARMACIA
3.27	2.65	N/A	1	33%	3.23	AREA ENTREGA DE FARMACIA
0.50	0.61	N/A	1	33%	-0.17	DESCUENTO VENTANA
7.94	2.69	N/A	1	33%	6.81	AREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
0.90	2.10	N/A	1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.40	DESCUENTO PUERTA
0.50	0.65	N/A	-1	33%	-0.11	DESCUENTO VENTANA
3.85	2.60	N/A	1	33%	3.33	MURO CIRCULACION A FARMACIA
1.36	2.69	N/A	1	33%	1.17	MURO HALL AL LADO DE ADMICIONES
1.10	2.10	N/A	-1	33%	-0.76	DESCUENTO DE PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO DE PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO DE PUERTA
1.29	2.10	N/A	-1	33%	-0.89	DESCUENTO DE PUERTA
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO DE PUERTA
9.82	2.60	N/A	1	33%	7.57	PROCEDIMIENTOS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
1.10	2.10	N/A	-1	33%	-0.76	DESCUENTO PUERTA
0.48	1.00	N/A	-1	33%	-0.13	DESCUENTO VENTANA
7.46	2.60	N/A	1	33%	5.43	SALA DE INFUSATOLOGIA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO DE PUERTA
17.14	2.60	N/A	1	33%	13.01	ANDICIRES
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA



13 jun 2025 2:38:54 p. m.
51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

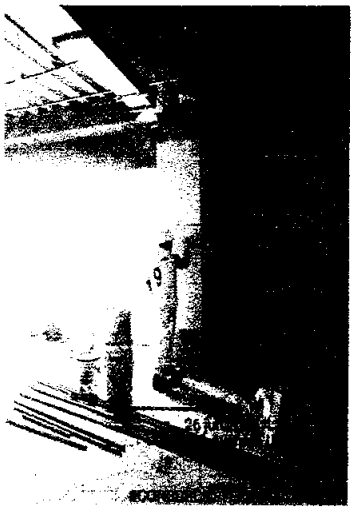








1.29	2.19	N/A	1	33%	-0.89	DESCUENTO PUERTA
11.80	2.60	N/A	1	33%	12.70	PROCEDIMIENTOS
0.90	2.19	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
1.10	2.19	N/A	-1	33%	-0.76	DESCUENTO PUERTA
0.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.39	DESCUENTO VENTANA
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.96	DESCUENTO VENTANA
6.16	2.19	N/A	1	33%	5.29	TRABAJO SUCIO
0.90	2.19	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
12.67	2.60	N/A	1	33%	10.47	CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA
18.25	2.60	N/A	1	33%	17.73	MUROS CIRCULACION
0.81	2.19	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA
2.20	2.19	N/A	-1	33%	-1.59	DESCUENTO PUERTA
1.11	1.50	N/A	-1	33%	-0.88	DESCUENTO VENTILADOR
9.10	2.60	N/A	1	33%	7.81	OFICINA RADIOLOGIA
0.90	2.19	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA
0.80	2.19	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
0.85	1.20	N/A	-1	33%	-0.34	DESCUENTO VENTANA
7.07	2.60	N/A	1	33%	6.07	INSUMOS
0.80	2.19	N/A	-1	33%	-0.55	INSUMOS
10.03	2.70	N/A	1	33%	8.61	SALA DE ESPERA
1.10	2.19	N/A	-2	33%	-1.52	DESCANSO DE PUERTA
1.00	1.20	N/A	-1	33%	-0.75	DESCANSO DE VENTANA
21.59	2.19	N/A	1	33%	18.52	SERVICIO DE RADIOLOGIA
1.19	2.19	N/A	-1	33%	-0.76	SERVICIO DE RADIOLOGIA
1.40	1.50	N/A	-1	33%	-0.56	SERVICIO DE IMAGENOLOGIA
1.30	2.19	N/A	-1	33%	-0.83	SERVICIO DE RADIOLOGIA
16.04	2.60	N/A	1	33%	13.76	CONSULTORIO DISPONIBLE PARA ECOGRAFO
0.90	1.50	N/A	-1	33%	-0.38	DESCUENTO
1.10	2.19	N/A	-1	33%	-0.76	DESCUENTO
0.70	2.19	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
30.52	7.42	N/A	1	33%	24.37	HALL DE CIRCULACION
10.38	2.19	N/A	-1	33%	-7.19	DESCUENTO DE PUERTAS
1.10	1.50	N/A	-1	33%	-0.36	DESCUENTO VENTANA
32.70	7.42	N/A	1	33%	25.71	HALL CIRCULACION
11.17	2.19	N/A	-1	33%	-7.95	DESCUENTO PUERTAS
1.00	1.50	N/A	-4	33%	-1.32	DESCUENTO VENTANAS
1.40	1.50	N/A	-1	33%	-0.46	DESCUENTO VENTANAS
17.31	7.64	N/A	1	33%	14.53	CONSULTORIO 3
1.20	2.19	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO PUERTA
1.80	2.51	N/A	-3	33%	-1.51	DESCUENTO PUERTA
15.13	2.19	N/A	1	33%	11.68	CONSULTORIO 4
1.20	2.19	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO PUERTA
1.00	1.50	N/A	-1	33%	-0.33	DESCUENTO VENTANA
0.80	2.19	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
11.18	3.42	N/A	1	33%	8.83	MONITOREO GINECOESTRETICO
1.74	2.19	N/A	-2	33%	-2.40	DESCUENTO PUERTA
19.96	2.60	N/A	1	33%	16.27	AUDITORIO
1.30	2.19	N/A	-1	33%	-0.90	DESCUENTO PUERTA
14.14	2.70	N/A	1	33%	12.60	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
0.40	0.89	N/A	-1	33%	-0.11	DESCUENTO VENTANA
2.90	0.89	N/A	-1	33%	-0.26	DESCUENTO VENTANA
2.00	0.40	N/A	-1	33%	-0.26	DESCUENTO VENTANA
1.00	2.19	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO VENTANA
9.95	2.70	N/A	1	33%	7.87	CIRCULACION HALL
0.40	0.80	N/A	-1	33%	-0.11	CIRCULACION SALA DE ESPERA HALL
1.90	2.70	N/A	-2	33%	3.53	MURO
1.70	1.19	N/A	-2	33%	-1.23	DESCUENTO PUERTA
3.00	2.20	N/A	-1	33%	2.87	BAÑO DISCAPACITADOS Y PRIMER PISO
0.80	2.19	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.19	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA
1.34	2.70	N/A	1	33%	1.19	BAÑO MUJERES
13.59	2.74	N/A	1	33%	10.56	CUARTO PERSONAL ASISTENCIAL
1.00	2.19	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO PUERTA
0.80	0.89	N/A	-1	33%	-0.11	DESCUENTO VENTANA
2.00	0.89	N/A	-1	33%	-0.26	DESCUENTO VENTANA
1.55	2.00	N/A	1	33%	0.16	AUTORIZACIONES
1.00	1.50	N/A	-1	33%	-0.33	DESCUENTO DE VENTANA
4.41	2.78	N/A	1	33%	3.93	SALA PRINCIPAL
10.00	2.50	N/A	1	33%	7.59	COCINETA
1.00	1.00	N/A	1	33%	0.63	DESCUENTO PUERTA
21.80	2.50	N/A	1	33%	16.59	COCINETA INTERNA
0.60	0.30	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO DAÑOS
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.68	DESCUENTO PUERTA
11.27	2.55	N/A	1	33%	9.57	CAFETERIA
0.90	2.19	N/A	-2	33%	-1.25	DESCUENTO PUERTA
1.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.90	DESCUENTO PUERTA
10.56	2.50	N/A	1	33%	8.06	MANOGRAFO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
5.11	2.58	N/A	1	33%	4.01	VESTIER CONTROL A MANOGRAFOS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
5.43	2.48	N/A	1	33%	4.44	CIRCULACION CENTRAL DE ESPERA HALL
6.71	2.19	N/A	1	33%	5.49	CIRCULACION CENTRAL DE ENFERMERIA
1.70	2.30	N/A	-1	33%	-1.18	DESCUENTO PUERTA TAC
0.89	2.19	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA TAC
0.89	2.19	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA ASEO
2.60	2.30	N/A	-1	33%	1.17	PUERTA ENTRE CENTRAL DE ENFERMERIA Y TAC
2.00	1.98	N/A	-2	33%	-2.61	DESCUENTO PUERTA
10.52	2.37	N/A	1	33%	14.46	TAC
1.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUENTO PUERTA
0.57	0.89	N/A	-1	33%	-0.18	DESCUENTO VENTANA
5.94	4.57	N/A	1	33%	3.43	CUARTO ASEADO
0.60	0.90	N/A	-1	33%	-0.18	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO VENTANA
1.50	2.10	N/A	-1	33%	3.70	OBSERVACION UNIDOSIS TRICA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA Y LIMPIO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA Y SUCIO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA Y SUCIO
31.39	2.19	N/A	1	33%	25.38	OBSERVACION PEDIATRIA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-1.25	DESCUENTO PUERTA
6.07	0.89	N/A	2	33%	3.52	CENTRAL DE ENFERMERIA
4.82	2.52	N/A	1	33%	4.01	RESIDUOS ORDINARIOS
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
4.27	2.52	N/A	1	33%	3.55	RESIDUOS PELIGROSOS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
11.43	2.52	N/A	1	33%	9.29	DISPOSICIONES
1.00	1.00	N/A	-1	33%	-0.33	DESCUENTO VENTANA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
10.61	2.43	N/A	1	33%	8.51	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS
1.65	2.10	N/A	-1	33%	-1.14	DESCUENTO PUERTA
12.11	2.45	N/A	1	33%	8.81	SALA DE YESOS
0.94	1.00	N/A	-1	33%	-0.31	DESCUENTO VENTANA
1.70	2.10	N/A	-1	33%	-1.18	DESCUENTO PUERTA
15.60	2.53	N/A	1	33%	13.02	DIGITACION
0.90	2.19	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA
1.29	1.00	N/A	-1	33%	-0.43	DESCUENTO VENTANA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
14.90	2.50	N/A	1	33%	12.29	SALA ERA
0.90	2.19	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA
1.00	1.50	N/A	-1	33%	-0.43	DESCUENTO VENTANA
14.27	2.59	N/A	1	33%	11.86	CONSULTORIO 1
1.30	2.19	N/A	-1	33%	-0.90	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA
1.41	1.80	N/A	-1	33%	-0.47	DESCUENTO VENTANA
16.26	2.30	N/A	1	33%	13.61	CONSULTORIO 2
1.50	1.98	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO VENTANA
1.20	2.19	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO PUERTA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA
15.87	2.48	N/A	1	33%	13.00	CONSULTORIO 1
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO PUERTA
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO PUERTA
0.92	0.89	N/A	-1	33%	-0.26	DESCUENTO VENTANA
13.72	1.57	N/A	1	33%	11.14	ADMISIONES SUBGUARDIAS
0.94	2.10	N/A	-1	33%	-0.65	DESCUENTO PUERTA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
1.20	1.40	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO VENTANA
2.00	1.40	N/A	-1	33%	-0.92	DESCUENTO VENTANA
8.71	2.57	N/A	1	33%	7.24	REF Y CONTRA REF
1.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUENTO PUERTA
11.20	2.53	N/A	1	33%	8.55	SALA ESPERA URGENCIAS






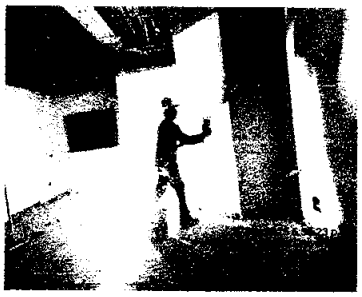






1.40	0.63	N/A	-1	33%	-0.43	DESCUENTO VENTANA
1.40	0.63	N/A	-1	33%	-0.43	DESCUENTO VENTANA
0.40	1.66	N/A	-1	33%	-0.13	DESCUENTO VENTANA
2.51	2.51	N/A	1	33%	6.27	ACCESO URGENCIAS
2.00	2.10	N/A	-1	33%	-1.39	DESCUENTO PUERTA ACCESO URGENCIAS
0.70	1.40	N/A	-1	33%	-0.23	DESCUENTO VENTANA
6.95	2.53	N/A	1	33%	5.58	SALA ESPERA ADULTOS
1.20	1.73	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO VENTANA
1.15	1.73	N/A	-1	33%	-0.66	DESCUENTO VENTANA
0.37	0.75	N/A	1	33%	1.58	ANTEPECHO SALA DE ESPERA
16.18	2.52	N/A	1	33%	13.46	DESCUENTO VENTANA
0.97	0.97	N/A	-1	33%	-0.31	DESCUENTO VENTANA
0.50	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTA
15.91	2.22	N/A	1	33%	12.73	CUARTO DE EQUIPOS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTA
0.40	0.50	N/A	-1	33%	-0.07	DESCUENTO VENTA
13.00	2.50	N/A	1	33%	71.22	RAYOS X
0.80	2.10	N/A	-2	33%	-1.11	DESCUENTO PUERTA
11.99	2.64	N/A	1	33%	12.49	SALA ESPERA (HALL) PASILLO NAOS I ANIMALIA Y PAIROS EXTERIOR Y POSTERIOR DE CONTROL IMAGENOLOGIA CARDIO
1.84	1.58	N/A	1	33%	[illegible]	DESCUENTO VENTANA PASILLO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	[illegible]	DESCUENTO PUERTA CONTROL IMAGENOLOGIA
3.91	1.50	N/A	2	33%	7.99	CONTROL IMAGENOLOGIA CARDIO RECEPCION (ANTEPECHO)
2.40	1.50	N/A	2	33%	1.65	SALA ESPERA (HALL) RECEPCION (ANTEPECHO)
1.95	2.54	N/A	1	33%	1.05	SALA ESPERA (HALL) - RECEPCION (MURO CORTO LATERAL DERECHO)
6.86	2.64	N/A	1	33%	5.98	CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS ACCESO A URGY
0.70	2.64	N/A	1	33%	0.61	ACCESO A TRIAGE
1.16	1.75	N/A	-1	33%	[illegible]	DESCUENTO VENTANA EXTERIOR
1.00	2.10	N/A	-1	33%	[illegible]	DESCUENTO PUERTA TRIAGE 1
0.90	2.10	N/A	-1	33%	[illegible]	DESCUENTO PUERTA TRIAGE 2
4.40	2.59	N/A	1	33%	3.63	ACCESO A LAVADO DE PACIENTES
2.00	2.10	N/A	-1	33%	[illegible]	DESCUENTO PUERTA PASILLO
20.65	2.54	N/A	1	33%	17.23	MANTENIDO CONSULTORIO OFTALMOLOGIA
0.70	2.10	N/A	-1	33%	[illegible]	DESCUENTO PUERTA CUARTO LIMPIO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	[illegible]	DESCUENTO PUERTA BAÑO
1.71	2.18	N/A	-1	33%	[illegible]	DESCUENTO PUERTA PRINCIPAL
15.94	2.63	N/A	1	33%	13.27	SALA ESPERA
0.75	0.55	N/A	-1	33%	[illegible]	DESCUENTO VENTANA EXTERIOR
1.05	1.66	N/A	-1	33%	[illegible]	DESCUENTO VENTANA PASILLO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	[illegible]	DESCUENTO PUERTA BAÑO
1.00	2.10	N/A	-1	33%	[illegible]	DESCUENTO PUERTA PRINCIPAL
4.37	2.66	N/A	1	33%	3.84	AUDITORIO (MURO ORIENTAL)
1.13	1.77	N/A	-1	33%	[illegible]	DESCUENTO VENTANA EXTERIOR
5.50	2.50	N/A	1	33%	4.54	INSUMOS DISPOSITIVOS FARMACIA DIGITACIÓN
0.90	2.10	N/A	-1	33%	[illegible]	DESCUENTO PUERTA
4.60	2.60	N/A	1	33%	3.86	ROPA LIMPIA DIGITACION
0.80	2.10	N/A	-1	33%	[illegible]	DESCUENTO PUERTA
4.01	2.60	N/A	1	33%	3.31	ROPA SUCIA DIGITACION
2.95	2.50	N/A	1	33% 33%	2.43	FACTURACION AUTORIZACION Y ADMISION (MURO SUR)
5.77	2.4	N/A	1	33%	4.57	TRIAGE 2
2.53	2.4	N/A	1	33%	3.09	
0.81	1.1	N/A	-1	33%	-0.40	DESCUENTO VENTANA
2.10	2.4	N/A	1	33%	1.52	SALA ESPERA ADULTO
1.11	2.4	N/A	1	33%	0.90	AUDITORIO
1.70	2.4	N/A	1	33%	1.35	
3.16	2.4	N/A	2	33%	5.01	DESCANSO URGENCIAS
1.15	2.4	N/A	1	33%	2.49	
0.60	2.1	N/A	-2	33%	-1.11	DESCUENTO PUERTA
1.65	2.4	N/A	1	33%	1.29	DESCANSO URGENCIAS
1.70	2.34	N/A	1	33%	1.31	OBSERVACION GINECOOBSTETRICIA
1.40	1.1	N/A	1	33%	0.51	
4.40	1.33	N/A	1	33%	1.93	CUARTO ASEO URGENCIAS
2.75	1	N/A	1	33%	0.75	SALA TAC
5.85	2.4	N/A	1	33%	4.65	CUARTO EQUIPO URG
0.90	2.07	N/A	-1	33%	-0.61	DESCUENTO PUERTA
0.80	0.9	N/A	1	33%	0.24	SALA YESO
1.00	0.7	N/A	1	33%	0.37	
1.50	1.07	N/A	1	33%	0.53	PASILLO URGENCIAS - TABLERO GASES
0.70	0.47	N/A	-1	33%	-0.04	PASILLO URGENCIAS - TABLERO
1.50	1.2	N/A	1	33%	0.59	PIR (ETHNIENTO)
2.40	0.3	N/A	1	33%	0.71	
2.90	0.3	N/A	1	33%	0.53	RESIDUOS PELIGROS
1.50	1	N/A	1	33%	0.43	RESIDUOS RESICLABLE
2.82	0.9	N/A	1	33%	0.84	
2.60	1.1	N/A	1	33%	0.94	OBSERVACION PEDIATRIA - TOMAS Y GASES
1.44	2.4	N/A	1	33%	1.26	
4.20	0.76	N/A	1	33%	1.05	CENTRAL DE ENFERMERIA
6.46	3.01	N/A	-2	33%	-6.82	TRABAJO LIMPIO - TRABAJO SUCIO
0.80	2.1	N/A	-2	33%	-1.11	DESCUENTO PUERTAS
5.24	2.44	N/A	1	33%	4.34	CIRCULACION - CUARTO DE ASEO
1.30	1.02	N/A	1	33%	0.44	CUARTO DE ASEO RX
0.60	2.4	N/A	1	33%	0.48	SALA DE MOLESTIA
1.62	2.4	N/A	1	33%	1.28	RESIDUOS PELIGROSOS LABORATORIO
2.03	1.1	N/A	1	33%	0.95	FARMACIA AREA ENTREGA
3.41	1.1	N/A	1	33%	1.79	
2.40	0.8	N/A	1	33%	0.63	FACTURACION ADMISION
		PISO 2				
37.05	2.50	N/A	1	33%	30.57	PASILLO RECUPERACION
6.25	2.10	N/A	-1	33%	-5.72	DESCUENTO PUERTAS
17.57	2.10	N/A	1	33%	13.88	PREPARACION PACIENTES
2.70	2.10	N/A	-1	33%	-2.56	DESCUENTO PUERTAS
39.17	2.50	N/A	1	33%	32.32	RECUPERACION QUIRURGICA
5.11	2.10	N/A	-1	33%	-4.84	DESCUENTO PUERTAS
13.97	0.70	N/A	-1	33%	-3.09	DESCUENTO VENTANAS
11.97	0.29	N/A	1	33%	3.43	CENTRAL ENFERMERIA
27.31	2.50	N/A	1	33%	22.53	CENTRAL ESTERILIZACION
1.90	2.10	N/A	-1	33%	-1.32	DESCUENTO PUERTAS
1.42	1.09	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUENTO VENTANAS
1.00	0.70	N/A	-1	33%	-0.23	DESCUENTO VENTANAS
0.74	1.45	N/A	-1	33%	-0.40	DESCUENTO VENTANAS
11.39	2.50	N/A	1	33%	9.40	INGRESO ANTECIRUGIA
2.10	2.10	N/A	-1	33%	-1.46	DESCUENTO PUERTAS
0.74	1.60	N/A	-1	33%	-0.27	DESCUENTO VENTANAS
64.20	2.50	N/A	1	33%	59.98	CIRCULACION DE CIRUGRACOS A SALA DE PARTOS
15.84	2.10	N/A	-4	33%	-12.90	DESCUENTO PUERTAS
1.50	1.26	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO VENTANAS
2.15	0.99	N/A	-1	33%	-0.84	DESCUENTO VENTANAS
1.00	1.00	N/A	-2	33%	-0.66	DESCUENTO VENTANAS
1.00	1.50	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO VENTANAS
2.00	2.50	N/A	1	33%	-1.65	DESCUENTO ENTRADA A PASILLO
14.67	2.50	N/A	1	33%	9.63	CUARTO DE EQUIPOS
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO PUERTAS
21.53	2.50	N/A	1	33%	17.76	DESCANSO JUNTA MUJ
0.77	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTAS
1.90	2.10	N/A	-2	33%	-1.26	DESCUENTO PUERTAS
3.71	1.58	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO VENTANAS
2.42	2.65	N/A	1	33%	3.08	TRABAJO SUCIO
3.50	2.10	N/A	-1	33%	-2.43	DESCUENTO PUERTAS
2.00	0.97	N/A	-1	33%	-0.24	DESCUENTO PUERTAS
1.00	0.70	N/A	-1	33%	-0.23	DESCUENTO VENTANAS
12.91	2.50	N/A	1	33%	10.63	FARMACIA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTAS
1.00	1.00	N/A	-3	33%	-0.99	DESCUENTO VENTANAS
0.95	0.70	N/A	-1	33%	-0.24	DESCUENTO VENTANAS
5.26	2.50	N/A	1	33%	4.91	BODEGA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTAS
13.97	2.50	N/A	1	33%	11.27	DESCANSO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTAS
0.60	2.10	N/A	-1	33%	-0.47	DESCUENTO PUERTAS
1.00	1.00	N/A	-1	33%	-0.33	DESCUENTO VENTANAS
8.02	2.50	N/A	1	33%	7.28	PASILLO VESTIER
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-1.66	DESCUENTO PUERTAS
20.57	2.40	N/A	1	33%	16.29	VESTIER MUJERES
0.80	2.10	N/A	-2	33%	-1.11	DESCUENTO PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-3	33%	-1.46	DESCUENTO VENTANAS





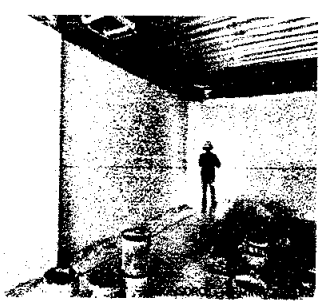

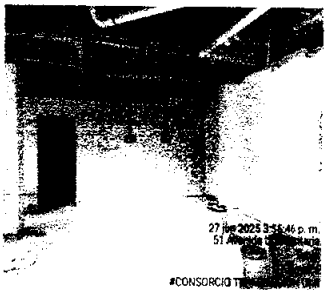


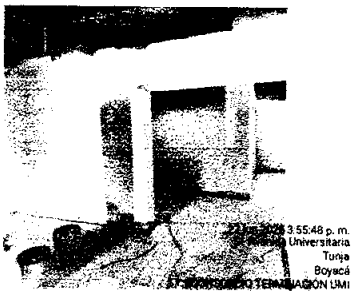

20.79	2.40	N/A	1	33%	16.39	VESTIER HOMBRES
0.80	2.10	N/A	-2	33%	1.11	DESCUENTO PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-2	33%	0.97	DESCUENTO VENTANAS
83.99	9.45	N/A	1	33%	67.35	PASILLO PRINCIPAL A UCI
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.97	DESCUENTO PUERTAS
1.00	0.70	N/A	-1	33%	-0.23	DESCUENTO VENTANAS
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTAS
2.00	2.15	N/A	-1	33%	-1.52	DESCUENTO VENTANAS
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTAS
1.50	1.50	N/A	-1	33%	-0.90	DESCUENTO VENTANAS
1.46	2.10	N/A	-1	33%	-1.36	DESCUENTO PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.68	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTAS
0.76	2.10	N/A	-1	33%	-0.53	DESCUENTO PUERTAS
1.70	2.10	N/A	-1	33%	-1.18	DESCUENTO PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTAS
0.60	2.10	N/A	-1	33%	-0.42	DESCUENTO PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUENTO PUERTAS
2.00	2.10	N/A	-1	33%	-1.39	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTAS
1.10	2.15	N/A	-1	33%	-0.80	DESCUENTO PUERTAS
1.70	2.10	N/A	-2	33%	-2.36	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTAS
3.83	0.98	N/A	1	33%	1.25	RESECION
4.31	0.60	N/A	1	33%	5.66	TRABAJO DE PARTO
1.67	2.10	N/A	-1	33%	-1.16	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-2	33%	-0.62	DESCUENTO PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUENTO PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO PUERTAS
2.13	0.90	N/A	1	33%	-0.83	DESCUENTO PUERTAS
1.50	1.20	N/A	-3	33%	-1.93	DESCUENTO PUERTAS
1.90	0.85	N/A	1	33%	1.37	CENTRAL DE ENFERMERIA
45.29	2.50	N/A	1	33%	31.56	RECUPERACION DE PARTOS
0.95	2.10	N/A	-1	33%	-0.66	DESCUENTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO DE PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO DE PUERTAS
1.50	1.30	N/A	-2	33%	-1.29	DESCUENTO DE VENTANA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO DE PUERTAS
2.00	2.10	N/A	-1	33%	-1.39	DESCUENTO DE PUERTAS
5.22	0.77	N/A	1	33%	1.33	CENTRAL DE ENFERMERIA
5.06	2.50	N/A	1	33%	4.91	ROPA LIMPIA
0.95	2.10	N/A	-1	33%	-0.66	DESCUENTO DE PUERTAS
19.11	2.50	N/A	1	33%	15.77	VESTIER ARTOS
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUNTO DE PUERTAS
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUNTO DE PUERTAS
96.00	2.50	N/A	4	33%	79.20	UCI ADULTOS
1.96	2.10	N/A	-1	33%	-1.36	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUNTO DE PUERTAS
0.60	2.10	N/A	-2	33%	-0.83	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUNTO DE PUERTAS
1.60	2.10	N/A	-2	33%	-2.22	DESCUNTO DE PUERTAS
1.50	1.30	N/A	-3	33%	-2.57	DESCUNTO DE VENTANA
0.95	0.85	N/A	-2	33%	-0.66	DESCUNTO DE VENTANA
1.80	2.10	N/A	-2	33%	-1.25	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-4	33%	-2.22	DESCUNTO DE PUERTAS
1.40	0.95	N/A	-1	33%	-0.39	DESCUNTO DE VENTANA
1.30	1.10	N/A	-1	33%	-0.56	DESCUNTO DE VENTANA
3.25	0.80	N/A	-2	33%	-0.66	DESCUNTO DE VENTANA
0.95	0.63	N/A	-1	33%	-0.30	DESCUNTO DE VENTANA
1.20	1.30	N/A	-1	33%	-0.51	DESCUNTO DE VENTANA
5.15	0.82	N/A	1	33%	1.46	CONTROL DE ENFERMERIA FRENTE A UCI ADULTOS
7.26	0.78	N/A	1	33%	1.87	CENTRAL DE ENFERMERIA FRENTE A UCI ADULTOS
7.55	2.50	N/A	1	33%	6.31	PUESTO ACCESO PARA UNOS
0.80	2.10	N/A	-2	33%	-1.11	DESCUNTO DE PUERTAS
6.20	2.50	N/A	1	33%	5.13	INFORMACION FAMILIARES
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUNTO DE PUERTAS
19.41	2.50	N/A	1	33%	16.04	FILTRO ACCESO PERSONAL
6.60	2.10	N/A	-3	33%	-1.66	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-2	33%	-0.97	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUNTO DE PUERTAS
2.50	2.50	N/A	1	33%	1.34	VESTIDOR
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUNTO DE PUERTAS
1.50	1.50	N/A	-1	33%	-0.90	DESCUNTO DE PUERTAS
12.10	2.50	N/A	1	33%	9.98	EXTRACION
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUNTO DE PUERTAS
9.81	2.50	N/A	1	33%	8.09	TUTIPEN
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.49	DESCUNTO DE PUERTAS
11.51	2.50	N/A	1	33%	9.50	PASILLO ACCESO UCI
2.00	2.10	N/A	-2	33%	-2.77	DESCUNTO DE VENTANA
0.85	3.10	N/A	-1	33%	-0.87	DESCUNTO DE VENTANA
1.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.46	DESCUNTO DE PUERTAS
17.21	2.50	N/A	1	33%	14.20	TACTARIO
1.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-2	33%	-1.11	DESCUNTO DE PUERTAS
11.93	2.50	N/A	1	33%	9.43	AMBIENTE TRABAJO ESTERIL
0.80	2.10	N/A	-2	33%	-1.66	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	1.00	N/A	-1	33%	-0.23	DESCUNTO DE VENTANA
99.99	2.50	N/A	1	33%	79.51	UCI NEONATAL
2.00	2.10	N/A	-1	33%	-1.39	DESCUNTO DE PUERTAS
1.15	2.10	N/A	1	33%	-0.94	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	1.40	N/A	-1	33%	-0.39	DESCUNTO DE VENTANA
1.50	1.50	N/A	-6	33%	-3.35	DESCUNTO DE VENTANA
1.30	1.05	N/A	-1	33%	-0.45	DESCUNTO DE VENTANA
0.70	1.00	N/A	-1	33%	-0.23	DESCUNTO DE VENTANA
0.70	1.70	N/A	-2	33%	-0.55	DESCUNTO DE VENTANA
0.90	1.30	N/A	-1	33%	-0.39	DESCUNTO DE VENTANA
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUNTO DE VENTANA
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.48	DESCUNTO DE VENTANA
0.95	1.50	N/A	-4	33%	-0.74	DESCUNTO DE VENTANA
1.15	2.10	N/A	-1	33%	-0.94	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	1	33%	-0.49	DESCUNTO DE PUERTAS
0.75	2.10	N/A	-1	33%	-0.52	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUNTO DE PUERTAS
11.00	0.65	N/A	1	33%	3.27	UCI ASLADO
12.79	0.64	N/A	1	33%	2.79	UCI ASLADO
7.65	0.80	N/A	4	33%	5.97	CENTRAL DE ENFERMERIA
10.64	0.82	N/A	1	33%	7.88	CENTRAL DE ENFERMERIA
11.11	2.50	N/A	1	33%	9.41	PASILLO DESCANSO
0.80	2.10	N/A	-4	33%	-2.23	DESCUNTO DE PUERTAS
20.32	2.50	N/A	1	33%	16.76	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-3	33%	-1.66	DESCUNTO DE VENTANA
1.90	1.30	N/A	1	33%	-0.82	DESCUNTO DE VENTANA
1.35	1.30	N/A	-1	33%	-0.56	DESCUNTO DE VENTANA
0.90	1.40	N/A	-1	33%	-0.39	DESCUNTO DE VENTANA
11.78	2.50	N/A	1	33%	9.72	PASILLO ASEO Y LAVADO
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUNTO DE PUERTAS
17.50	2.50	N/A	1	33%	14.49	PASILLO ASEO ASISTENCIAL
1.90	2.10	N/A	-1	33%	-1.25	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUNTO DE PUERTAS
0.75	2.10	N/A	-1	33%	-0.52	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	-3	33%	-1.69	DESCUNTO DE PUERTAS
1.73	2.10	N/A	-1	33%	-1.20	DESCUNTO DE PUERTAS
2.87	2.30	N/A	1	33%	2.93	ROPA LIMPIA
2.98	2.30	N/A	1	33%	2.28	ROPA SUCIA
13.60	2.60	N/A	1	33%	11.07	VESTIER ASISTENCIAL
0.80	2.10	N/A	-2	33%	-1.11	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	2.10	N/A	1	33%	-0.49	DESCUNTO DE PUERTAS
0.70	3.60	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUNTO DE PUERTAS
9.21	2.10	N/A	1	33%	7.29	COORDINACION
1.50	2.10	N/A	-1	33%	-1.25	DESCUNTO DE PUERTAS
4.79	0.70	N/A	1	33%	-0.96	DESCUNTO DE VENTANA
24.85	2.50	N/A	1	33%	19.70	HALL PRINCIPAL





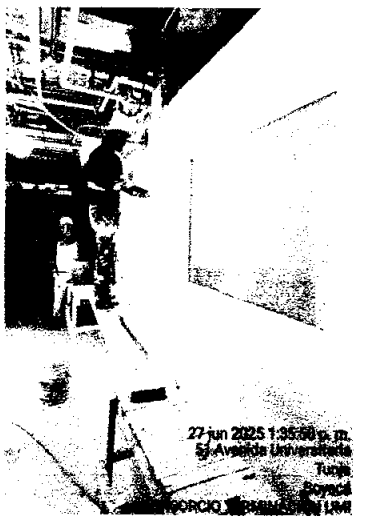




1.90	2.10	N/A	1	33%	-1.32	DESCUNTO DE PUERTAS
0.90	2.10	N/A	1	33%	-0.49	DESCUNTO DE PUERTAS
0.80	2.10	N/A	2	33%	-1.11	DESCUNTO DE PUERTAS
2.20	2.10	N/A	1	33%	-1.52	DESCUNTO DE PUERTAS
		PISO 3				
2.28	2.80	N/A	1	33%	2.11	LUDOTECA
1.57	2.80	N/A	1	33%	1.45	LUDOTECA
1.57	2.80	N/A	1	33%	1.45	LUDOTECA
1.55	2.80	N/A	1	33%	1.43	LUDOTECA
2.57	2.80	N/A	1	33%	2.37	LUDOTECA
6.68	2.80	N/A	1	33%	6.17	LUDOTECA
4.75	2.80	N/A	1	33%	4.43	LUDOTECA
4.78	2.80	N/A	1	33%	4.42	LUDOTECA
5.01	2.80	N/A	1	33%	4.63	LUDOTECA
4.90	2.80	N/A	1	33%	4.64	LUDOTECA
3.35	2.80	N/A	1	33%	3.10	LUDOTECA
4.91	2.80	N/A	1	33%	4.54	LUDOTECA
2.13	2.80	N/A	1	33%	1.97	LUDOTECA
1.93	2.80	N/A	1	33%	1.78	LUDOTECA
1.93	2.80	N/A	1	33%	1.78	LUDOTECA
2.25	2.80	N/A	1	33%	2.08	LUDOTECA
3.46	2.80	N/A	1	33%	3.20	LUDOTECA
1.90	2.80	N/A	1	33%	1.38	LUDOTECA
4.76	2.80	N/A	1	33%	4.40	LUDOTECA
3.17	2.80	N/A	1	33%	3.65	LUDOTECA
1.93	2.80	N/A	1	33%	1.78	LUDOTECA
3.10	2.80	N/A	1	33%	1.02	LUDOTECA
2.53	2.80	N/A	1	33%	2.34	LUDOTECA
0.91	2.80	N/A	1	33%	0.86	LUDOTECA
1.76	2.80	N/A	1	33%	1.63	LUDOTECA
1.93	2.80	N/A	1	33%	1.78	LUDOTECA
1.70	1.85	N/A	1	33%	-0.50	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1.20	1.85	N/A	-1	33%	-0.71	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1.20	2.00	N/A	1	33%	-0.79	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
2.24	4.76	N/A	-1	33%	-3.53	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
2.25	2.40	N/A	1	33%	-1.71	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1.35	4.89	N/A	-1	33%	-2.14	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
1.35	3.55	N/A	1	33%	-1.49	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
0.90	2.15	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO VENTANA AREA LUDOTECA
0.80	2.10	N/A	2	33%	-1.14	DESCUENTO PUERTA AREA LUDOTECA
0.90	2.15	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO PUERTA AREA LUDOTECA
11.87	2.05	N/A	1	33%	9.99	EXTRACION DE LECHE MATERNA
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO PUERTA LECHE MATERNA
7.28	2.60	N/A	1	33%	6.25	DEPOSITO DE INSUMOS
0.80	2.10	N/A	1	33%	-0.56	DESCUENTO PUERTA AREA DEPOSITO
5.90	2.60	N/A	1	33%	5.08	FILTRO INGRESO
0.80	2.10	N/A	1	33%	-0.56	PREPARACION DE FORMULAS
15.02	2.60	N/A	1	33%	12.89	PREPARACION DE FORMULAS
0.80	2.10	N/A	1	33%	-0.56	PREPARACION DE FORMULAS
1.96	1.25	N/A	1	33%	-0.81	PREPARACION DE FORMULAS
1.55	1.07	N/A	-1	33%	-0.54	PREPARACION DE FORMULAS
11.50	2.05	N/A	1	33%	9.87	INFORMACION FAMILIARES
0.90	2.60	N/A	-1	33%	-0.83	INFORMACION FAMILIARES
11.17	2.70	N/A	1	33%	11.73	COORDINACION PEDIATRA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	COORDINACION PEDIATRA
27.31	2.84	N/A	1	33%	27.08	CIRCULACION
0.90	2.10	N/A	-5	33%	-3.12	CIRCULACION
0.70	2.10	N/A	-2	33%	-0.97	CIRCULACION
13.59	2.70	N/A	1	33%	11.65	DESCANSO DE MEDICO
0.70	2.59	N/A	-1	33%	-0.58	DESCANSO DE MEDICO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCANSO DE MEDICO
10.10	2.40	N/A	1	33%	9.06	DESCANSO ENFERMERIA
0.70	2.30	N/A	1	33%	-0.58	DESCANSO ENFERMERIA
4.05	2.60	N/A	1	33%	3.41	ESTACION DE CAFE
0.90	2.10	N/A	1	33%	-0.62	ESTACION DE CAFE
16.45	2.80	N/A	1	33%	14.28	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1.90	1.25	N/A	1	33%	-0.85	COORDINACION UCI PEDIATRICA
1.20	1.25	N/A	-1	33%	-0.58	COORDINACION UCI PEDIATRICA
0.90	2.10	N/A	1	33%	-0.62	COORDINACION UCI PEDIATRICA
8.61	2.70	N/A	1	33%	3.08	TRANSFERENCIA MEDICAMENTOS
9.35	6.70	N/A	1	33%	8.33	ASISTENCIAL
0.70	1.20	N/A	1	33%	-0.18	ASISTENCIAL
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	ASISTENCIAL
8.18	2.05	N/A	1	33%	7.02	INSUMOS LIMPIA
0.70	1.15	N/A	-1	33%	-0.26	ROPA LIMPIA
0.90	2.10	N/A	1	33%	-0.55	ROPA LIMPIA
8.40	2.60	N/A	1	33%	7.21	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
0.20	0.80	N/A	1	33%	-0.18	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	CUARTO STERIL DEPOSITO DE INSUMOS
9.13	2.60	N/A	1	33%	7.83	CUARTO EQUIPOS
6.60	2.10	N/A	1	33%	5.55	CUARTO RESERVA
0.70	0.80	N/A	1	33%	0.15	CUARTO EQUIPOS
37.07	7.73	N/A	1	33%	28.85	CIRCULACION
0.30	2.10	N/A	-1	33%	-0.85	CIRCULACION
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	CIRCULACION
22.21	2.80	N/A	1	33%	21.47	CIRCULACION INFORMACION FAMILIAR
2.90	0.93	N/A	1	33%	2.89	CIRCULACION INFORMACION FAMILIAR
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	CIRCULACION INFORMACION FAMILIAR
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.14	CIRCULACION INFORMACION FAMILIAR
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	CIRCULACION INFORMACION FAMILIAR
13.64	2.27	N/A	1	33%	12.42	ORATORIO
2.90	2.10	N/A	-1	33%	-1.39	ORATORIO
0.45	2.10	N/A	-2	33%	-0.46	ORATORIO
17.80	2.55	N/A	1	33%	14.98	SALA DE ESPERA
2.42	2.12	N/A	-1	33%	-1.62	SALA DE ESPERA
2.10	2.10	N/A	-1	33%	-1.46	SALA DE ESPERA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-1.66	SALA DE ESPERA
2.00	2.10	N/A	-1	33%	-1.39	SALA DE ESPERA
11.48	2.75	N/A	1	33%	10.42	U.C.I. 1
0.90	1.50	N/A	-1	33%	-0.45	U.C.I. 1 DESCUENTO
11.61	2.75	N/A	1	33%	10.54	U.C.I. 3
0.90	1.50	N/A	-1	33%	-0.45	U.C.I. 3 DESCUENTO
2.50	0.60	N/A	-1	33%	-0.50	U.C.I. 3 DESCUENTO
1.12	0.45	N/A	-1	33%	-0.15	U.C.I. 3 DESCUENTO
11.31	2.75	N/A	1	33%	10.19	U.C.I. 5
0.90	1.50	N/A	-1	33%	-0.45	U.C.I. 5 DESCUENTO
11.51	2.75	N/A	1	33%	-0.56	U.C.I. 5 DESCUENTO
1.10	0.75	N/A	-1	33%	-0.06	U.C.I. 5 DESCUENTO
11.62	2.60	N/A	1	33%	10.63	U.C.I. 7
0.90	1.50	N/A	-1	33%	-0.45	U.C.I. 7 DESCUENTO
2.50	0.60	N/A	-1	33%	-0.50	U.C.I. 7 DESCUENTO
1.10	0.45	N/A	-1	33%	-0.66	U.C.I. 7 DESCUENTO
11.51	2.75	N/A	1	33%	10.26	U.C.I. 9
0.90	1.50	N/A	-1	33%	-0.45	U.C.I. 9 DESCUENTO
2.50	2.50	N/A	-1	33%	-2.06	U.C.I. 9 DESCUENTO
1.10	0.75	N/A	-1	33%	-0.06	U.C.I. 9 DESCUENTO
13.61	2.75	N/A	1	33%	12.53	U.C.I. 11
0.90	1.50	N/A	-1	33%	-0.45	U.C.I. 11 DESCUENTO
2.50	2.50	N/A	-1	33%	-2.06	U.C.I. 11 DESCUENTO
1.10	0.75	N/A	-1	33%	-0.06	U.C.I. 11 DESCUENTO
13.59	2.75	N/A	1	33%	12.03	U.C.I. 12
0.90	2.11	N/A	-1	33%	-0.64	U.C.I. 12 DESCUENTO
0.90	1.50	N/A	-1	33%	-0.45	U.C.I. 12 DESCUENTO
1.00	1.50	N/A	-1	33%	-0.33	U.C.I. 12 DESCUENTO
1.10	0.75	N/A	-1	33%	-0.06	U.C.I. 12 DESCUENTO
0.22	3.70	N/A	-1	33%	-0.20	U.C.I. 12 DESCUENTO
9.67	2.70	N/A	1	33%	8.57	U.C.I. 10
1.50	0.90	N/A	-1	33%	-0.45	U.C.I. 10 DESCUENTO
2.50	2.50	N/A	-1	33%	-0.56	U.C.I. 10 DESCUENTO
1.10	0.75	N/A	-1	33%	-0.06	U.C.I. 10 DESCUENTO
10.10	2.70	N/A	1	33%	9.27	U.C.I. 8
0.90	2.70	N/A	-1	33%	-0.80	U.C.I. 8 DESCUENTO
0.70	4.05	N/A	-1	33%	-0.78	U.C.I. 8 DESCUENTO
1.10	0.75	N/A	-1	33%	-0.06	U.C.I. 8 DESCUENTO
10.00	2.70	N/A	1	33%	8.91	U.C.I.
0.90	1.50	N/A	-1	33%	-0.45	U.C.I. 6 DESCUENTO
0.70	3.60	N/A	-1	33%	-0.69	U.C.I. 6 DESCUENTO
1.10	0.75	N/A	-1	33%	-0.06	U.C.I. 6 DESCUENTO
7.00	2.70	N/A	1	33%	4.24	U.C.I. 4
3.00	6.00	N/A	-1	33%	-0.69	U.C.I. 4 DESCUENTO
6.70	2.70	N/A	1	33%	5.97	U.C.I. 2











3.00	0.70	N/A	-1	33%	-0.69	U.C.1.2 DESCUENTO
2.80	2.70	N/A	1	33%	2.49	CIRCULACION
0.80	2.10	N/A	-2	33%	-1.11	CIRCULACION
17.61	2.40	N/A	1	6%	6.72	HABITACION 301
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.73	DESCUENTO
1.60	1.40	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
1.94	2.10	N/A	1	6%	0.76	HABITACION 301 - CLOSET
18.17	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 302
1.90	2.10	N/A	1	6%	0.85	HABITACION 302 - CLOSET
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.95	0.55	N/A	-1	6%	-0.22	DESCUENTO
18.43	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 303
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 303 - CLOSET
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
29.42	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 304
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 304 - CLOSET
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
18.61	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 305
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 305 - CLOSET
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
1.20	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
1.40	2.10	N/A	-1	6%	-0.83	DESCUENTO
27.62	2.30	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 306
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 306 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
18.89	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 307
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 307 - CLOSET
1.20	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
23.62	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 308
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 308 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
2.55	2.40	N/A	1	6%	1.00	CUARTO DE EQUIPOS
0.80	2.10	N/A	-1	6%	-0.63	DESCUENTO
18.50	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 309
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 309 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
17.89	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 310
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 310 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
17.89	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 311
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 311 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
19.79	2.10	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 312
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 312 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
23.42	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 313
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 313 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
18.23	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 314
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 314 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
18.42	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 315
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 315 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
18.40	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 316
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 316 - CLOSET
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.85	1.40	N/A	-1	6%	-0.67	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
18.47	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 317
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 317 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
19.28	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 318
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 318 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
18.35	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 319
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 319 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
18.36	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 320
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 320 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
18.23	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 321
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 321 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
17.99	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 322
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 322 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
18.48	2.39	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 323
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 323 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	6%	-0.88	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	6%	-0.60	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	6%	-0.68	DESCUENTO
18.01	2.40	N/A	1	6%	6.93	HABITACION 324
1.95	2.10	N/A	1	6%	0.77	HABITACION 324 - CLOSET



51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

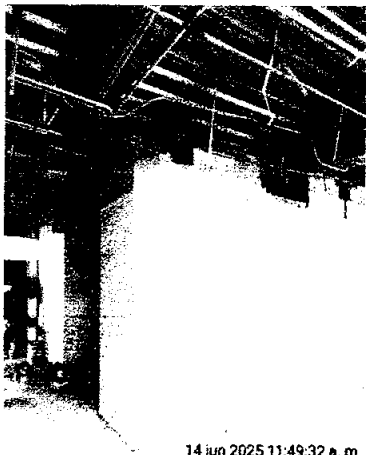


14 jun 2025 11:49:32 a. m.
50# 1 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI




13 jun 2025 2:40:21 p. m.
51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI




0.95	0.90	N/A	-1	5%	-0.05	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	1	33%	0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	1	33%	0.62	DESCUENTO
18.18	2.40	N/A	1	33%	12.12	HABITACION 325
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 325 - CLOSET
1.90	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	1	33%	0.62	DESCUENTO
5.10	2.40	N/A	1	33%	1.66	ZONA HUMEDA O NICHE
2.91	0.85	N/A	1	33%	0.96	
83.075	2.10	N/A	1	33%	7.00	CIRCULACION HABITACIONES
1.20	2.10	N/A	-25	33%	-0.83	DESCUENTO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
0.80	0.80	N/A	-3	33%	-0.55	DESCUENTO GABINETE
4.33	0.85	N/A	-1	33%	-0.96	DESCUENTO CAJA MOTE GASES
13.99	1.65	N/A	1	33%	3.07	
5.11	2.40	N/A	1	33%	1.69	CENTRAL ENFERMERIA
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
6.75	2.40	N/A	1	33%	1.69	TRABAJO LIMPIO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
3.41	2.40	N/A	1	33%	0.96	ROPA LIMPIA
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.48	DESCUENTO
6.84	2.40	N/A	1	33%	0.20	TRABAJO SUCIO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
1.68	2.40	N/A	1	33%	0.96	PROCEDIMIENTOS
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.96	DESCUENTO
11.28	2.40	N/A	1	33%	0.96	DESCANSO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
27.47	2.40	N/A	1	33%	0.96	CIRCULACION RESTRINGIDA
1.20	1.50	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.96	DESCUENTO
0.83	0.83	N/A	-1	33%	-0.57	DESCUENTO GABINTE
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
1.58	2.60	N/A	1	33%	0.75	SALIDA BALCON SUR
0.78	0.85	N/A	1	33%	0.25	BALCON SUR
2.10	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	INTRA LIMPIA
4.68	2.30	N/A	1	33%	0.49	RESIDUOS ORDINARIOS
0.75	2.10	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
4.02	2.40	N/A	1	33%	1.66	RESIDUOS PELIGROSOS
0.75	2.10	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
14.45	2.40	N/A	1	33%	1.37	PASILLO ACCESO
0.75	2.10	N/A	-2	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-3	33%	-1.86	DESCUENTO
0.75	2.40	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
23.19	2.40	N/A	1	33%	1.66	HALL
0.75	1.45	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
3.45	3.45	N/A	1	33%	4.08	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
1.65	1.65	N/A	-1	33%	-1.37	DESCUENTO
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO
12.46	2.40	N/A	1	33%	0.96	HABITACION 320
3.96	2.66	N/A	-1	33%	-1.75	DESCUENTO
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO
1.66	1.42	N/A	1	33%	0.96	DESCUENTO
0.78	1.42	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
		PISO 4				
17.60	2.10	N/A	1	33%	14.13	HABITACIÓN 401
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
1.70	1.70	N/A	-1	33%	-0.98	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
1.94	2.10	N/A	1	33%	1.34	HABITACION 401 - CLOSET
18.17	2.40	N/A	1	33%	14.39	HABITACION 402
1.90	2.10	N/A	1	33%	1.32	HABITACION 402 - CLOSET
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
0.95	0.95	N/A	-1	33%	-0.39	DESCUENTO
19.33	2.40	N/A	1	33%	11.90	HABITACION 403
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 403 - CLOSET
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
29.62	2.40	N/A	1	33%	20.97	HABITACIÓN 404
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 404 - CLOSET
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
28.53	2.40	N/A	1	33%	14.74	HABITACION 405
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 405 - CLOSET
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
27.07	2.40	N/A	1	33%	21.40	HABITACION 406
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 406 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
19.49	2.40	N/A	1	33%	14.64	HABITACION 407
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 407 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
23.64	2.40	N/A	1	33%	18.71	HABITACION 408
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 408 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
7.33	2.40	N/A	1	33%	5.01	CUARTO DE EQUIPOS
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
19.70	2.40	N/A	1	33%	14.41	HABITACION 409
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 409 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
19.11	2.40	N/A	1	33%	14.37	HABITACION 410
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 410 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
17.93	2.40	N/A	1	33%	14.22	HABITACION 411
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 411 - CLOSET
1.20	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.78	2.40	N/A	1	33%	13.01	HABITACION 412
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.33	HABITACION 412 - CLOSET
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
21.67	2.70	N/A	1	33%	10.96	HABITACION 413
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 413 - CLOSET
1.20	1.50	N/A	-1	33%	-0.99	DESCUENTO
0.75	2.00	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.00	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
19.33	2.40	N/A	1	33%	14.32	HABITACION 414
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 414 - CLOSET

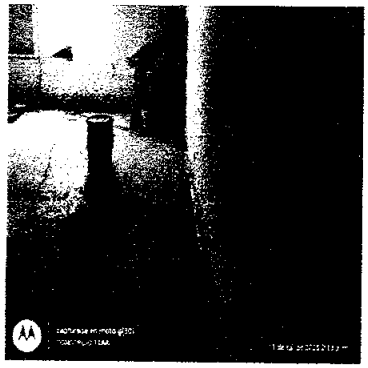







1.20	1.65	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.42	2.40	N/A	1	33%	14.59	HABITACION 415
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 415 - CLOSET
1.95	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.42	2.40	N/A	1	33%	14.59	HABITACION 416
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 416 - CLOSET
1.95	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.90	1.40	N/A	1	33%	-0.45	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.42	2.40	N/A	1	33%	14.55	HABITACION 417
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 417 - CLOSET
1.20	1.65	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.42	2.40	N/A	1	33%	14.48	HABITACION 418
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 418 - CLOSET
1.20	1.65	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.33	2.40	N/A	1	33%	14.53	HABITACION 419
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 419 - CLOSET
1.20	1.65	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.68	2.40	N/A	1	33%	14.58	HABITACION 420
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 420 - CLOSET
1.20	1.65	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.29	2.40	N/A	1	33%	14.42	HABITACION 421
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 421 - CLOSET
1.20	1.65	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.68	2.40	N/A	1	33%	14.64	HABITACION 422
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 422 - CLOSET
1.20	1.65	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.68	2.40	N/A	1	33%	14.64	HABITACION 423
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 423 - CLOSET
1.20	1.65	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.68	2.40	N/A	1	33%	14.26	HABITACION 424
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 424 - CLOSET
0.95	0.99	N/A	-1	33%	-0.28	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
18.16	2.40	N/A	1	33%	14.40	HABITACION 425
1.95	2.10	N/A	1	33%	1.35	HABITACION 425 - CLOSET
1.20	1.65	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
0.75	2.60	N/A	-1	33%	-0.50	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
5.10	2.40	N/A	1	33%	4.04	ZONA TRABAJO NORTE
2.91	0.85	N/A	1	33%	2.22	
24.01	2.40	N/A	1	33%	05.78	CIRCULACION HABITACIONES
1.20	2.10	N/A	-25	33%	-20.10	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.56	DESCUENTO
0.60	0.85	N/A	-1	33%	-0.53	DESCUENTO GABINETE
0.33	0.55	N/A	-1	33%	-0.05	DESCUENTO CAJA CHICA CASES
11.90	1.65	N/A	1	33%	4.82	CENTRAL ENFERMERIA
5.14	2.10	N/A	1	33%	4.07	
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
8.28	2.40	N/A	1	33%	6.95	TRABAJO LIMPIO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
3.41	2.40	N/A	1	33%	2.70	ROPA LIMPIA
0.70	2.10	N/A	-1	33%	-0.40	DESCUENTO
5.86	2.40	N/A	1	33%	4.64	TRABAJO SUCIO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
11.69	2.40	N/A	1	33%	9.26	PROCEDIMIENTOS
1.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.97	DESCUENTO
11.28	2.40	N/A	1	33%	8.93	DESCANSO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
1.30	1.50	N/A	-1	33%	-0.64	DESCUENTO
27.67	2.40	N/A	1	33%	22.07	CIRCULACION RUTA INTRIGADA
1.20	1.50	N/A	-1	33%	-0.59	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-1	33%	-0.62	DESCUENTO
1.30	2.10	N/A	-1	33%	-0.90	DESCUENTO
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
1.40	2.10	N/A	-1	33%	-0.97	DESCUENTO
0.83	0.83	N/A	-1	33%	-0.23	DESCUENTO GABINETE
0.80	2.10	N/A	-1	33%	-0.55	DESCUENTO
4.58	2.60	N/A	1	33%	3.63	SALIDA BALCON SUR
6.26	0.85	N/A	1	33%	1.76	BALCON SUR
2.10	2.40	N/A	1	33%	1.66	ROPA LIMPIA
1.08	4.40	N/A	1	33%	3.71	RESIDUOS ORDINARIOS
0.75	2.10	N/A	-1	33%	-0.52	DESCUENTO
3.02	2.40	N/A	1	33%	3.18	RESIDUOS PELIGROSOS
0.75	2.10	N/A	-1	33%	-0.52	DESCUENTO
14.45	2.40	N/A	1	33%	11.37	PASILLO ACCESO
0.75	2.10	N/A	-3	33%	-1.64	DESCUENTO
0.90	2.10	N/A	-3	33%	-1.87	DESCUENTO
0.75	2.10	N/A	-1	33%	-0.59	DESCUENTO
23.10	2.30	N/A	1	33%	18.30	HAB
6.35	1.45	N/A	-1	33%	-3.04	DESCUENTO
3.45	1.45	N/A	-1	33%	-1.65	DESCUENTO
1.20	2.10	N/A	-1	33%	-0.83	DESCUENTO
1.00	1.65	N/A	-1	33%	-0.58	DESCUENTO
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO
12.36	2.40	N/A	1	33%	9.78	CONFORMACION
1.05	2.65	N/A	-1	33%	-0.92	DESCUENTO
1.00	2.10	N/A	-1	33%	-0.69	DESCUENTO
1.00	1.47	N/A	-1	33%	-0.81	DESCUENTO
0.78	1.47	N/A	-1	33%	-0.36	DESCUENTO
2.30	1.2	N/A	1	33%	0.91	HAB 401
1.70	2.4	N/A	1	33%	1.35	PASILLO HAB 403 GABINETE
0.81	0.81	N/A	1	33%	0.22	DESCUENTO GABINETE
3.20	2.4	N/A	1	33%	2.53	HAB 403
1.00	1.5	N/A	1	33%	4.50	HAB 405
2.40	2.4	N/A	1	33%	1.90	HAB 407
0.74	2.4	N/A	1	33%	0.73	HAB 409
1.20	2.4	N/A	1	33%	0.95	HAB 409
3.11	2.4	N/A	1	33%	2.46	HAB 410
1.00	1.5	N/A	1	33%	0.59	HAB 411
2.30	2.4	N/A	1	33%	1.82	HAB 413
1.70	2.4	N/A	1	33%	1.35	PASILLO HAB 417
0.81	0.81	N/A	-1	33%	-0.22	PASILLO HAB 416
1.20	1.5	N/A	1	33%	0.59	HAB 411
1.20	1.5	N/A	1	33%	0.58	HAB 415
2.08	2.4	N/A	1	33%	1.63	HAB 416
2.10	1.4	N/A	1	33%	0.97	HAB 417
1.00	1.5	N/A	1	33%	0.53	HAB 418
2.06	2.4	N/A	1	33%	2.44	HAB 419
1.80	3.5	N/A	1	33%	4.89	HAB 420
1.30	1.7	N/A	1	33%	0.73	HAB 421

1.40	1.5	N/A	1	33%	0.64	HAB 422
1.20	1.5	N/A	1	33%	0.59	HAB 423
1.20	1.5	N/A	1	33%	0.55	HAB 424
1.60	2.4	N/A	1	33%	1.27	CASILLO GABINETE
0.80	0.8	N/A	-1	33%	-0.21	GABINETE

53-114 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CLINIICA MARTERNO INFANTIL

OBSERVACIONES:

TOTAL	2,428.00	Metro Cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	6.00	Metro Cuadrado
PRESENTE ACTA	2,428.00	Metro Cuadrado

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Hernao	FIRMA:
Aprobo Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA


ITEM	1.00	PINTURA FACHADA EN VIDRIO PARA CARTIDORES	CAP	1,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico






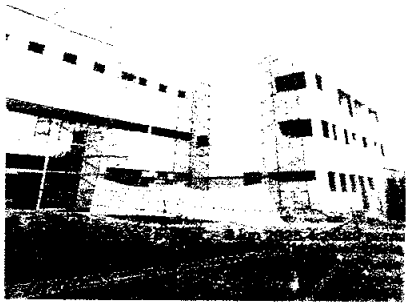

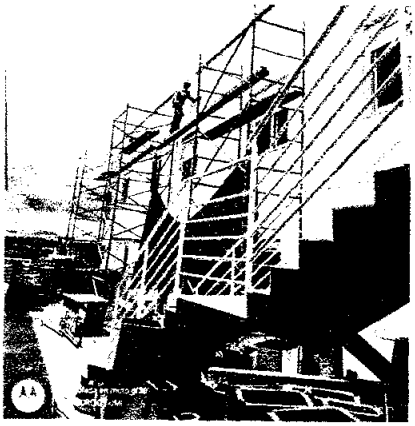

Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
FACHADO SUR-OCCIDENTAL						
8.64	10.24	N/A	1	50%	43.72	FACHADA SUR OCCIDENTAL
14.58	10.24	N/A	1	50%	74.65	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2	0.36	N/A	-1	50%	-0.38	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.95	0.95	N/A	1	50%	-0.45	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	1.3	N/A	-1	50%	-0.85	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2.65	2.5	N/A	-1	50%	-3.31	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	1.3	N/A	1	50%	-0.83	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	1.3	N/A	-1	50%	-0.83	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	1.3	N/A	1	50%	-0.83	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	1.3	N/A	1	50%	-0.83	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	1.3	N/A	-1	50%	-0.83	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	1.3	N/A	-1	50%	-0.83	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.88	1.27	N/A	-1	50%	-1.20	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.95	0.95	N/A	-1	50%	-0.45	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	1.28	N/A	-1	50%	-0.83	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	1.23	N/A	-1	50%	-0.80	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.4	1.29	N/A	-1	50%	-0.90	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1	0.7	N/A	-1	50%	-0.35	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.04	1.29	N/A	-1	50%	-0.67	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.94	1.26	N/A	-1	50%	-0.60	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	1.28	N/A	-1	50%	-0.83	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.19	1.35	N/A	-1	50%	-0.80	FACHADA SUR OCCIDENTAL
3.01	1.35	N/A	-1	50%	-2.03	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2.55	2.24	N/A	-1	50%	-2.86	FACHADA SUR OCCIDENTAL
3.02	2.24	N/A	-1	50%	-3.38	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	1.35	N/A	1	50%	-0.88	FACHADA SUR OCCIDENTAL
16.2	10	N/A	1	50%	81.00	FACHADA SUR OCCIDENTAL
6.9	10.24	N/A	1	50%	35.33	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.4	1.3	N/A	-2	50%	-1.69	DESCUENTO NOR OCCIDENTE VENTANA
1.02	0.93	N/A	1	50%	-0.47	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
0.5	1.03	N/A	-1	50%	-0.26	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
0.68	1.3	N/A	-1	50%	-0.44	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
1.9	0.7	N/A	-2	50%	-1.33	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
0.93	0.295	N/A	-1	50%	-0.14	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
4.6	1.3	N/A	-1	50%	-3.12	DESCUENTO NOR OCCIDENTE VENTANA
3.01	2.4	N/A	-1	50%	-3.61	DESCUENTO NOR OCCIDENTE VENTANA
3.01	2.4	N/A	-1	50%	-3.61	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
0.8	0.7	N/A	-2	50%	-0.56	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
0.7	0.67	N/A	-1	50%	-0.23	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
1.16	0.65	N/A	-1	50%	-0.39	DESCUENTO SUR OCCIDENTE VENTANA
FACHADA NOR-OCCIDENTAL						
20.36	10.24	N/A	1	50%	104.24	FACHADA NOR OCCIDENTAL
3.01	2.4	N/A	-1	50%	-3.64	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.01	2.4	N/A	-1	50%	-3.61	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.01	2.4	N/A	-1	50%	-3.61	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
1.33	0.68	N/A	-1	50%	-0.45	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.25	0.68	N/A	-3	50%	-3.11	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.06	0.68	N/A	-1	50%	-1.04	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.06	0.68	N/A	-1	50%	-1.03	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.1	0.68	N/A	-1	50%	-1.05	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	0.7	N/A	-1	50%	-1.07	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	0.7	N/A	-1	50%	-1.07	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	0.7	N/A	-1	50%	-1.07	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	0.7	N/A	-1	50%	-1.07	DESCUENTO VENTANA NOR OCCIDENTAL
FACHADA SUR						
14.5	5.76	N/A	1	50%	41.76	FACHADA SUR
12.56	4.21	N/A	1	50%	27.87	FACHADA SUR AL LADO LUDOTECA
2.14	2.9	N/A	1	50%	3.10	FACHADA SUR AL LADO LUDOTECA
15.41	7.25	N/A	1	50%	55.86	FACHADA SUR AL LADO LUDOTECA
3.23	8.2	N/A	-1	50%	-0.32	DESCUENTO SUR VENTANA
3.29	8.2	N/A	-1	50%	-0.33	DESCUENTO SUR VENTANA
1.2	1.8	N/A	-1	50%	-1.08	DESCUENTO SUR VENTANA
0.6	2.1	N/A	-1	50%	-0.84	DESCUENTO SUR VENTANA
2	1.2	N/A	-1	50%	-1.20	DESCUENTO SUR VENTANA
1.3	1.5	N/A	-2	50%	-2.93	DESCUENTO SUR VENTANA
0.71	1.2	N/A	-1	50%	-0.43	DESCUENTO SUR VENTANA
0.94	1.96	N/A	-1	50%	-0.83	DESCUENTO SUR VENTANA
0.84	1.98	N/A	-1	50%	-0.83	DESCUENTO SUR VENTANA
1.2	1.2	N/A	-2	50%	-1.44	DESCUENTO SUR VENTANA
0.84	1.98	N/A	-1	50%	-0.83	DESCUENTO SUR VENTANA
0.84	1.98	N/A	-1	50%	-0.83	DESCUENTO SUR VENTANA
0.94	0.95	N/A	-1	50%	-0.45	DESCUENTO SUR VENTANA
8.45	5.86	N/A	-1	50%	-19.22	DESCUENTO PUERTA PRINCIPAL
1.3	1.3	N/A	1	50%	-0.85	DESCUENTO VENTANA SUR
1.3	1.3	N/A	-1	50%	-0.85	DESCUENTO VENTANA SUR
0.91	1.3	N/A	-1	50%	-0.59	DESCUENTO VENTANA SUR
1.1	1.3	N/A	-1	50%	-0.85	DESCUENTO VENTANA SUR
1.3	1.3	N/A	-1	50%	-0.85	DESCUENTO VENTANA SUR
0.82	1.1	N/A	-1	50%	-0.54	DESCUENTO VENTANA SUR
0.8	1.1	N/A	1	50%	-0.50	DESCUENTO VENTANA SUR
1.3	1.1	N/A	-1	50%	-0.72	DESCUENTO VENTANA SUR
1.3	1.1	N/A	-1	50%	-0.72	DESCUENTO VENTANA SUR
1.3	1.29	N/A	-1	50%	-0.84	DESCUENTO VENTANA SUR
13.26	5.7	N/A	1	50%	37.79	ENTRE PISOS 1 - 2 Y EJES 1 - 1
0.5	0.5	N/A	-1	50%	-0.13	DESCUENTO PISO 1 VENTANA 34
0.5	0.5	N/A	-1	50%	-0.13	DESCUENTO PISO 1 VENTANA 35
1.22	0.55	N/A	-1	50%	-0.34	DESCUENTO PISO 1 VENTANA 36
0.48	0.48	N/A	-1	50%	-0.12	DESCUENTO PISO 2 VENTANA 1
1.2	1.3	N/A	1	58%	-0.78	DESCUENTO PISO 2 VENTANA 2
0.98	0.8	N/A	-1	50%	-0.39	DESCUENTO PISO 2 VENTANA 3
0.95	0.95	N/A	-1	50%	-0.45	DESCUENTO PISO 2 VENTANA 17
8.25	4.2	N/A	1	50%	17.33	FACHADA SUR
2.3	2.25	N/A	-1	50%	-2.59	DESCUENTO VENTANA
2.29	2.25	N/A	-1	50%	-5.38	DESCUENTO VENTANA
4.98	7.2	N/A	1	50%	18.77	FACHADA SUR
0.92	0.97	N/A	-1	50%	-0.97	DESCUENTO VENTANA
1.62	3	N/A	1	50%	2.43	FACHADA SUR
2.4	3.6	N/A	1	50%	5.32	FACHADA SUR
FACHADA NORTE						
6.05	4.38	N/A	1	50%	13.28	FACHADA NORTE
3.85	5.58	N/A	1	50%	10.66	FACHADA NORTE
2.25	3.92	N/A	-1	50%	-4.49	DESCUENTO VENTANA
5.59	5.74	N/A	1	50%	16.18	FACHADA NORTE
4.19	10.92	N/A	1	50%	29.50	FACHADA NORTE
4.46	5.04	N/A	1	50%	11.24	FACHADA NORTE
3.52	0.5	N/A	-1	50%	-0.88	DESCUENTO VENTANA
3.52	0.5	N/A	-1	50%	-0.88	DESCUENTO VENTANA
3.28	0.5	N/A	-1	50%	-0.82	DESCUENTO VENTANA
4.13	0.92	N/A	-1	50%	-1.90	DESCUENTO PUERTA
7	7.1	N/A	1	50%	24.85	FACHADA NORTE
7	1.83	N/A	-1	50%	-6.41	DESCUENTO VENTANA
7	1.83	N/A	-1	50%	-6.41	DESCUENTO VENTANA
17.41	4.43	N/A	1	58%	25.27	FACHADA ENTRE EJES 1 - 1
0.95	0.95	N/A	-1	50%	-0.45	DESCUENTO VENTANAS PISO 2

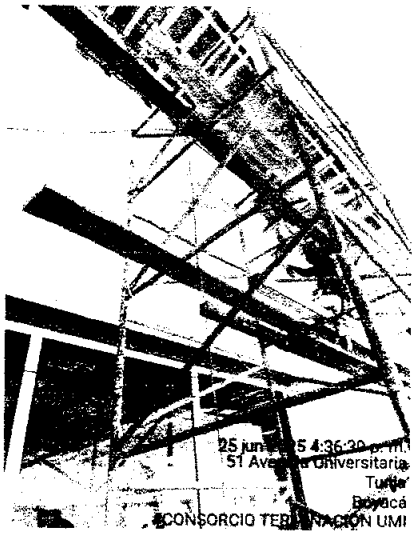

FACHADA ORIENTAL						
3.50	8.71	N/A	1	50%	15.36	FACHADA ORIENTAL
3.01	2.4	N/A	-1	50%	-3.61	DESCUENTO VENTANA
3.01	0.62	N/A	-1	50%	-1.82	DESCUENTO VENTANA
3.05	0.7	N/A	-1	50%	-1.07	DESCUENTO VENTANA
20.11	15.45	N/A	1	50%	154.34	FACHADA ORIENTAL
0.70	6.00	N/A	1	50%	4.20	FACHADA NORTE
1.50	1.50	N/A	-3	50%	-2.54	DESCUENTO VENTANAS PISO 1
0.45	0.95	N/A	-1	50%	-0.21	DESCUENTO VENTANAS PISO 1
1.50	1.50	N/A	-3	50%	-2.54	DESCUENTO VENTANAS PISO 2
0.45	0.95	N/A	-1	50%	-0.21	DESCUENTO VENTANAS PISO 2
1.50	1.50	N/A	-3	50%	-2.54	DESCUENTO VENTANAS PISO 3
2.24	0.50	N/A	-3	50%	-1.68	DESCUENTO VENTANAS PISO 4
0.80	2.00	N/A	-1	50%	-0.40	DESCUENTO VENTANAS PISO 5
22.82	15.3	N/A	1	50%	174.57	FACHADA ORIENTAL - ENTRE E S A' - F
1.3	1.5	N/A	-19	50%	-18.53	DESCUENTO VENTANA 1
0.95	0.95	N/A	-6	50%	-2.71	DESCUENTO VENTANA 2
0.95	1.5	N/A	-2	50%	-1.43	DESCUENTO VENTANA 3
0.9	1.5	N/A	-1	50%	-0.68	DESCUENTO VENTANA 4
0.55	0.3	N/A	-7	50%	-0.59	DESCUENTO VENTANA 5
2	0.37	N/A	-2	50%	-0.74	DESCUENTO VENTANA 6
1.2	0.37	N/A	-2	50%	-0.44	DESCUENTO VENTANA 7
FACHADA TERRAZA 3ER NIVEL (CIRCULACIÓN EXTERIOR)						
21.4	4.1	N/A	1	50%	43.87	FACHADA CIRCULACION 3ER NIVEL
2.5	0.7	N/A	-2	50%	-4.38	DESCUENTO VENTANA
21.4	7.1	N/A	1	50%	75.97	FACHADA TERRAZA 3ER NIVEL
1.3	1.5	N/A	-6	50%	-5.85	DESCUENTO VENTANA
0.85	3	N/A	-6	50%	-5.10	DESCUENTO PUERTA
1.2	1.2	N/A	-6	50%	-4.32	DESCUENTO VENTANA
FACHADA QUINTO PISO (TERRAZA)						
5.45	3.1	N/A	1	50%	11.17	CUARTO DE MAQUINAS - FACHADA NORTE
0.6	1.47	N/A	1	50%	4.85	CUARTO DE MAQUINAS - FACHADA NORTE
5.45	2.6	N/A	1	50%	7.09	CUARTO DE MAQUINAS - FACHADA NORTE
1.23	2.3	N/A	1	50%	1.41	DESCUENTO ESCALERA AZOTEA
0.92	0.84	N/A	-1	50%	-0.43	DESCUENTO VENTANA
0.9	2.24	N/A	1	50%	-1.91	DESCUENTO PUERTA MAQUINA
142.8	0.74	N/A	1	50%	52.84	ANTEPECHO PERIMETRAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
68.9	0.8	N/A	1	50%	27.56	ANTEPECHO PERIMETRAL AZOTEA CUARTO MAQUINAS

OBSERVACIONES:


TOTAL	1,044.08	Metro Cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	400.95	Metro Cuadrado
PRESENTE ACTA	643.13	Metro Cuadrado

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA
Aprobo Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA


ITEM	1.07	PINTURA FACHADA EN SINILO PARA EXTERIORES ANCHOS MENORES DE 0.6 M	CAP	1	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL


Registro fotográfico

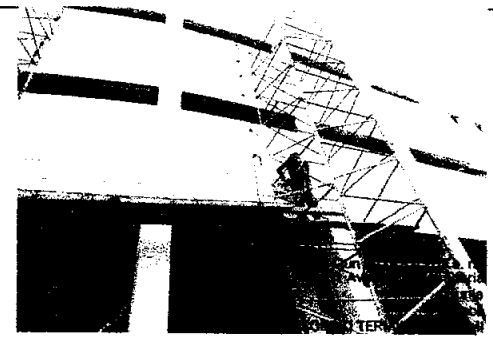








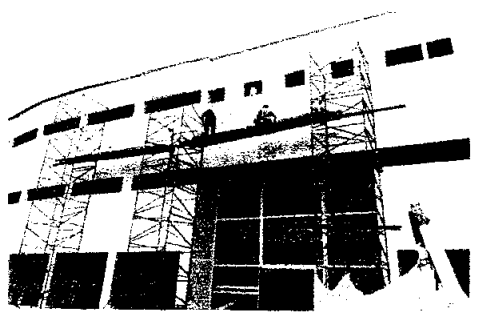


SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA							
Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
FACHADA SUR-OCCIDENTAL						
2	N/A	N/A	1	50%	1.00	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.96	N/A	N/A	1	50%	0.48	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2.66	N/A	N/A	1	50%	1.33	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	N/A	N/A	1	50%	0.64	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	N/A	N/A	1	50%	0.64	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	N/A	N/A	1	50%	0.64	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	N/A	N/A	1	50%	0.64	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	N/A	N/A	1	50%	0.64	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	N/A	N/A	1	50%	0.64	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.89	N/A	N/A	1	50%	0.95	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.98	N/A	N/A	1	50%	0.49	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.4	N/A	N/A	1	50%	0.70	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1	N/A	N/A	1	50%	0.50	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.01	N/A	N/A	1	50%	0.52	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.94	N/A	N/A	1	50%	0.47	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.19	N/A	N/A	1	50%	0.60	FACHADA SUR OCCIDENTAL
3.34	N/A	N/A	1	50%	1.67	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2.55	N/A	N/A	1	50%	1.28	FACHADA SUR OCCIDENTAL
3.02	N/A	N/A	1	50%	1.51	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.38	N/A	N/A	1	50%	0.19	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.95	N/A	N/A	1	50%	0.48	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2.5	N/A	N/A	1	50%	1.25	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.27	N/A	N/A	1	50%	0.64	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.95	N/A	N/A	1	50%	0.48	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.28	N/A	N/A	1	50%	0.64	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.23	N/A	N/A	1	50%	0.62	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.29	N/A	N/A	1	50%	0.65	FACHADA SUR OCCIDENTAL
0.7	N/A	N/A	1	50%	0.35	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.29	N/A	N/A	1	50%	0.65	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.28	N/A	N/A	1	50%	0.64	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.28	N/A	N/A	1	50%	0.64	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.35	N/A	N/A	1	50%	0.68	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.35	N/A	N/A	1	50%	0.68	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2.24	N/A	N/A	1	50%	1.12	FACHADA SUR OCCIDENTAL
2.24	N/A	N/A	1	50%	1.12	FACHADA SUR OCCIDENTAL
1.35	N/A	N/A	1	50%	0.68	FACHADA SUR OCCIDENTAL
FACHADA NOR-OCCIDENTAL						
3.03	N/A	N/A	1	50%	1.52	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.01	N/A	N/A	1	50%	1.51	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.01	N/A	N/A	1	50%	1.51	VENTANA NOR OCCIDENTAL
1.33	N/A	N/A	1	50%	0.67	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.25	N/A	N/A	1	50%	1.63	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	N/A	N/A	1	50%	1.53	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.04	N/A	N/A	1	50%	1.52	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.1	N/A	N/A	1	50%	1.55	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	N/A	N/A	1	50%	1.53	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	N/A	N/A	1	50%	1.53	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	N/A	N/A	1	50%	1.53	VENTANA NOR OCCIDENTAL
3.05	N/A	N/A	1	50%	1.53	VENTANA NOR OCCIDENTAL
2.4	N/A	N/A	1	50%	1.20	VENTANA NOR OCCIDENTAL
2.4	N/A	N/A	1	50%	1.20	VENTANA NOR OCCIDENTAL
2.4	N/A	N/A	1	50%	1.20	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.68	N/A	N/A	1	50%	0.34	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.68	N/A	N/A	1	50%	0.34	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.68	N/A	N/A	1	50%	0.34	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.68	N/A	N/A	1	50%	0.34	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.68	N/A	N/A	1	50%	0.34	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.7	N/A	N/A	1	50%	0.35	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.7	N/A	N/A	1	50%	0.35	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.7	N/A	N/A	1	50%	0.35	VENTANA NOR OCCIDENTAL
0.7	N/A	N/A	1	50%	0.35	VENTANA NOR OCCIDENTAL
FACHADA OCCIDENTAL						
1.1	N/A	N/A	2	50%	1.10	FACHADA OCCIDENTAL
0.93	N/A	N/A	2	50%	0.93	FACHADA OCCIDENTAL
1.04	N/A	N/A	2	50%	1.63	FACHADA OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	2	50%	1.30	FACHADA OCCIDENTAL
0.7	N/A	N/A	2	50%	0.70	FACHADA OCCIDENTAL
0.255	N/A	N/A	2	50%	0.30	FACHADA OCCIDENTAL
1.3	N/A	N/A	2	50%	1.30	FACHADA OCCIDENTAL
2.1	N/A	N/A	2	50%	2.40	FACHADA OCCIDENTAL
2.4	N/A	N/A	2	50%	2.40	FACHADA OCCIDENTAL
0.7	N/A	N/A	2	50%	2.80	FACHADA OCCIDENTAL
0.67	N/A	N/A	2	50%	0.67	FACHADA OCCIDENTAL
0.68	N/A	N/A	2	50%	0.68	FACHADA OCCIDENTAL
FACHADA SUR						
1.3	N/A	N/A	1	50%	2.60	FACHADA SUR
1.02	N/A	N/A	2	50%	1.02	FACHADA SUR
0.5	N/A	N/A	2	50%	0.50	FACHADA SUR
0.88	N/A	N/A	2	50%	0.64	FACHADA SUR
1.9	N/A	N/A	1	50%	3.80	FACHADA SUR
0.93	N/A	N/A	2	50%	0.93	FACHADA SUR
1.6	N/A	N/A	2	50%	3.80	FACHADA SUR
3.01	N/A	N/A	2	50%	3.01	FACHADA SUR
3.01	N/A	N/A	2	50%	3.01	FACHADA SUR
0.8	N/A	N/A	1	50%	1.60	FACHADA SUR
0.7	N/A	N/A	4	50%	1.40	FACHADA SUR
1.16	N/A	N/A	2	50%	1.16	FACHADA SUR
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	VENTANA SUR
0.91	N/A	N/A	1	50%	0.46	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	VENTANA SUR
0.92	N/A	N/A	1	50%	0.46	VENTANA SUR
0.9	N/A	N/A	1	50%	0.45	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.66	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	VENTANA SUR
1.3	N/A	N/A	1	50%	0.65	VENTANA SUR
1.1	N/A	N/A	1	50%	0.55	VENTANA SUR
1.1	N/A	N/A	1	50%	0.55	VENTANA SUR
1.1	N/A	N/A	1	50%	0.55	VENTANA SUR
1.1	N/A	N/A	1	50%	0.56	VENTANA SUR
1.29	N/A	N/A	1	50%	0.65	VENTANA SUR
5.72	N/A	N/A	1	50%	5.72	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
3.23	N/A	N/A	2	50%	3.23	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
9.2	N/A	N/A	1	50%	9.10	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
2	N/A	N/A	1	50%	1.90	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
1.2	N/A	N/A	2	50%	1.20	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
1.8	N/A	N/A	1	50%	0.90	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
2.1	N/A	N/A	1	50%	1.05	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
0.8	N/A	N/A	1	50%	0.40	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA







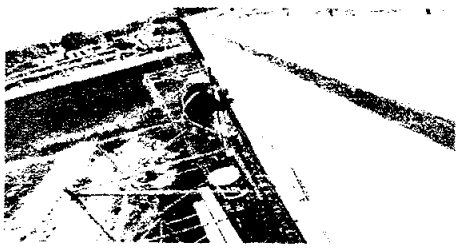


7.29	N/A	N/A	1	50%	3.63	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
1.5	N/A	N/A	3	50%	2.25	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
2	N/A	N/A	3	50%	3.00	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
1.2	N/A	N/A	5	50%	3.00	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
0.84	N/A	N/A	1	50%	0.42	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
2.27	N/A	N/A	2	50%	2.27	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
7.29	N/A	N/A	1	50%	3.63	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
0.56	N/A	N/A	1	50%	0.56	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
2.99	N/A	N/A	1	50%	1.50	FACHADA SUR AL LADO DE LUDOTECA
5.7	N/A	N/A	7	50%	19.95	ENTRE PISOS 1 Y 2 Y EJES 1 - 3; (COLUMNAS)
0.5	N/A	N/A	2	50%	0.50	PISO 1 Y EJES 1 A 3; VENTANA 34 (ALTO)
0.5	N/A	N/A	2	50%	0.50	PISO 1 Y EJES 1 A 3; VENTANA 34 (ANCHO)
0.5	N/A	N/A	2	50%	0.50	PISO 1 Y EJES 1 A 3; VENTANA 35 (ALTO)
0.5	N/A	N/A	2	50%	0.50	PISO 1 Y EJES 1 A 3; VENTANA 35 (ANCHO)
1.22	N/A	N/A	2	50%	1.22	PISO 1 Y EJES 1 A 3; VENTANA 36 (ALTO)
0.55	N/A	N/A	2	50%	0.55	PISO 1 Y EJES 1 A 3; VENTANA 36 (ANCHO)
0.46	N/A	N/A	2	50%	0.46	PISO 2 Y EJES 1 A 3; VENTANA 1 (ALTO)
0.46	N/A	N/A	2	50%	0.46	PISO 2 Y EJES 1 A 3; VENTANA 1 (ANCHO)
1.2	N/A	N/A	2	50%	1.20	PISO 2 Y EJES 1 A 3; VENTANA 2 (ALTO)
1.3	N/A	N/A	2	50%	1.30	PISO 2 Y EJES 1 A 3; VENTANA 2 (ANCHO)
0.98	N/A	N/A	2	50%	0.98	PISO 2 Y EJES 1 A 3; VENTANA 3 (ALTO)
0.8	N/A	N/A	2	50%	0.80	PISO 2 Y EJES 1 A 3; VENTANA 3 (ANCHO)
0.96	N/A	N/A	2	50%	0.96	PISO 2 Y EJES 1 A 3; VENTANA 7 (ALTO)
0.96	N/A	N/A	2	50%	0.96	PISO 2 Y EJES 1 A 3; VENTANA 7 (ANCHO)
4.1	N/A	N/A	3	50%	6.15	
1.53	N/A	N/A	12	50%	9.18	
4.49	N/A	N/A	1	50%	2.25	
4.37	N/A	N/A	1	50%	2.19	
3.82	N/A	N/A	1	50%	1.91	
2.5	N/A	N/A	10	50%	12.50	
0.7	N/A	N/A	10	50%	3.50	
1.3	N/A	N/A	12	50%	7.80	
1.5	N/A	N/A	12	50%	9.00	
1.9	N/A	N/A	12	50%	10.80	
2	N/A	N/A	12	50%	12.00	
0.85	N/A	N/A	2	50%	2.55	
7.2	N/A	N/A	2	50%	7.20	
0.97	N/A	N/A	4	50%	1.94	
2.8	N/A	N/A	1	50%	1.40	
		FACHADA NORTE				
3.70	N/A	N/A	1	50%	1.85	ENTRADA URGENCIAS
3.80	N/A	N/A	1	50%	1.90	VENTANA URGENCIAS
		FACHADA ORIENTAL				
17.44	N/A	N/A	3	50%	20.16	FACHADA ORIENTAL
7.73	N/A	N/A	1	50%	1.37	FACHADA ORIENTAL
7.80	N/A	N/A	2	50%	3.90	FACHADA ORIENTAL
1.10	N/A	N/A	18	50%	11.70	FAJA VENTANA
0.45	N/A	N/A	2	50%	0.45	FAJA VENTANA
2.24	N/A	N/A	3	50%	3.36	FAJA VENTANA
0.48	N/A	N/A	2	50%	0.48	FAJA VENTANA
0.95	N/A	N/A	2	50%	0.95	FAJA VENTANA
0.50	N/A	N/A	2	50%	0.50	FAJA VENTANA
2.00	N/A	N/A	2	50%	2.00	FAJA VENTANA
14.90	N/A	N/A	5	50%	37.50	FACHADA ENTRE EJES: A' - E; FAJAS DE COLUMNA
3.07	N/A	N/A	8	50%	12.28	FACHADA ENTRE EJES: A' - E; FAJAS DE COLUMNA
2.75	N/A	N/A	2	50%	2.75	FACHADA ENTRE EJES: A' - E; FAJAS DE COLUMNA
1.30	N/A	N/A	19	50%	12.35	FACHADA ENTRE EJES: A' - E; FAJAS DE VENTANA
0.95	N/A	N/A	14	50%	6.65	FACHADA ENTRE EJES: A' - E; FAJAS DE VENTANA
0.90	N/A	N/A	1	50%	0.45	FACHADA ENTRE EJES: A' - E; FAJAS DE VENTANA
0.56	N/A	N/A	7	50%	1.96	FACHADA ENTRE EJES: A' - E; FAJAS DE VENTANA
2.00	N/A	N/A	2	50%	2.00	FACHADA ENTRE EJES: A' - E; FAJAS DE VENTANA
1.20	N/A	N/A	2	50%	1.20	FACHADA ENTRE EJES: A' - E; FAJAS DE VENTANA
1.20	N/A	N/A	22	50%	16.50	FACHADA ENTRE EJES: A' - E; FAJAS DE VENTANA
0.95	N/A	N/A	7	50%	1.05	FACHADA ENTRE EJES: A' - E; FAJAS DE VENTANA
0.37	N/A	N/A	4	50%	0.74	FACHADA ENTRE EJES: A' - E; FAJAS DE VENTANA
		FACHADA QUINTO PISO (TERRAZA)				
0.75	N/A	N/A	12	50%	4.50	BANDA CONTORNO - EXTENSION DE COLUMNAS
142.8	N/A	N/A	1	50%	71.40	SOBRE ANTEPECHO PERIMETRAL
12.7	N/A	N/A	1	50%	6.35	SOBRE ANTEPECHO PERIMETRAL - CUARTO MAQUINAS
56.2	N/A	N/A	1	50%	28.10	


OBSERVACIONES:

TOTAL	522.93	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	178.55	Metro lineal
PRESENTE ACTA	344.38	Metro lineal


Elaboró contratista:	Estefanía Carvajal Honao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
ITEM	ENCHAPE CERÁMICA BLANCA 30X60CM	CAP	2.00
Registro Fotográfico			

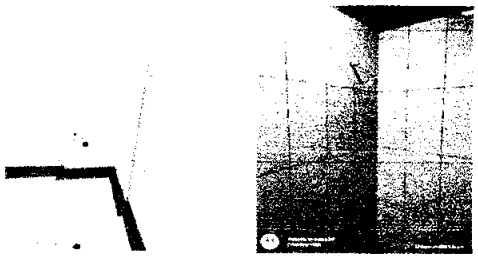






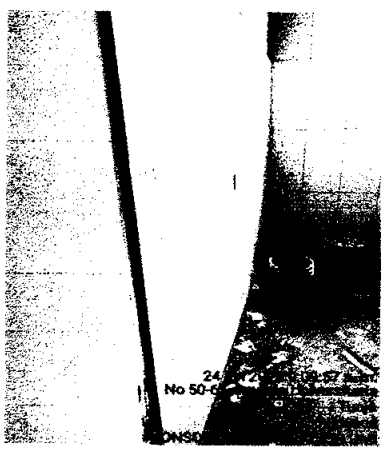





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES		UNIDAD	Metro Cuadrado		UBICACIÓN	UNI SAN RAFAEL
Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
		PISO 1				
7.34	2.4	N/A	1	100%	17.62	BAÑO PRIMER PISO
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
5.29	2.04	N/A	1	100%	10.79	BAÑO PRIMER PISO
0.77	2.02	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUENTO
0.83	0.1	N/A	1	100%	8.33	V/C FAMILIAR
12.93	2.4	N/A	1	100%	31.06	
0.18	0.18	N/A	-1	100%	-0.03	DESCUENTO VENTANA
0.9	2.02	N/A	-1	100%	-1.82	DESCUENTO PUERTA PRINCIPAL
8.1	2.4	N/A	1	100%	16.44	OBS. PEDIATRIA, BAÑO AISLADO
0.9	2.02	N/A	-1	100%	-1.82	DESCUENTO PUERTA
7.71	2.4	N/A	1	100%	18.50	SALA ESP. BAÑO
0.77	2.02	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUENTO PUERTA
5.7	2.4	N/A	1	100%	13.68	SALA ESP. BAÑO
0.89	2.02	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO PUERTA
3.1	2.4	N/A	1	100%	8.16	LAVADO DE PACIENTES
4.92	2.4	N/A	1	100%	18.37	LAVADO DE PACIENTES
1.47	1.03	N/A	1	100%	1.51	LAVADO DE PACIENTES
5.57	2.4	N/A	1	100%	13.37	CONSULTORIO 4
0.76	2	N/A	-1	100%	-1.52	DESCUENTO PUERTAS
5.78	2.4	N/A	1	100%	13.88	CONSULTORIO 1
0.97	2.02	N/A	-1	100%	-1.96	DESCUENTO PUERTAS
5.13	2.4	N/A	1	100%	12.31	CONSULTORIO 2
0.87	0.87	N/A	1	100%	-0.76	DESCUENTO PUERTAS
6	2.4	N/A	1	100%	14.40	CONSULTORIO 5
2.02	0.87	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO PUERTAS
5.74	2.4	N/A	1	100%	13.78	SALA ERA
2.02	0.87	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO PUERTAS
9.83	2.4	N/A	1	100%	23.59	V/C MUJERES - SALA ESPERA ADULTOS
0.75	2.02	N/A	-1	100%	-1.54	DESCUENTO PUERTAS
8.05	2.4	N/A	1	100%	19.30	BAÑO PUR - SALA ESPERA ADULTOS
0.98	2.02	N/A	-1	100%	-1.98	DESCUENTO PUERTAS
12.25	2.4	N/A	1	100%	29.42	V/C HOMBRES - SALA ESPERA ADULTOS
0.79	2.02	N/A	-1	100%	-1.58	DESCUENTO PUERTAS
7.65	2.4	N/A	1	100%	18.84	V/C MATO PUR
0.89	2.04	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO PUERTA
5.85	2.3	N/A	1	100%	12.29	V/C LABORATORIO
0.75	2.02	N/A	-1	100%	-1.54	DESCUENTO PUERTA
5.8	2.4	N/A	1	100%	13.79	V/C AREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
0.68	2.02	N/A	-1	100%	-1.37	DESCUENTO PUERTA
5.43	2.4	N/A	1	100%	13.03	V/C IMAGENOLOGIA
0.79	2.02	N/A	-1	100%	-1.60	DESCUENTO PUERTA
5.76	2.4	N/A	1	100%	13.82	V/C PERSONAL ASISTENCIAL
0.79	2.02	N/A	-1	100%	-1.60	DESCUENTO PUERTA
5.99	2.4	N/A	1	100%	14.38	V/C PERSONAL ASISTENCIAL
0.8	2.02	N/A	-1	100%	-1.62	DESCUENTO PUERTA
9.25	2.4	N/A	1	100%	85.06	V/C MONTORFO GINECOBSTETRICIA
0.89	2.02	N/A	-1	100%	-1.80	DESCUENTO PUERTA
5.38	2.4	N/A	1	100%	12.91	V/C ECOGRAFIA - IMAGENOLOGIA
1.16	2.02	N/A	-1	100%	-2.34	DESCUENTO PUERTA
		PISO 2				
9.29	2.4	N/A	1	100%	22.22	BAÑO DOLIARIO (FRENTE CAMAS)
1.07	2.01	N/A	-1	100%	-2.15	DESCUENTO PUERTA
7.82	2.4	N/A	1	100%	16.77	DUCHO BAÑO
0.8	2	N/A	-1	100%	-1.60	DESCUENTO PUERTA
4.86	2.3	N/A	1	100%	11.06	BAÑO RECUPERACION PARTO (FONDO)
0.8	2	N/A	-1	100%	-1.60	DESCUENTO PUERTA
6.62	2.4	N/A	1	100%	15.89	BAÑO RECUPERACION PARTO (POSTERIOR CENTRAL DERECHA)
1	2	N/A	1	100%	-2.00	DESCUENTO PUERTA
8.14	2.4	N/A	1	100%	29.26	BAÑO TRABAJO PARTO
0.8	2	N/A	-1	100%	-1.60	DESCUENTO PUERTA
5.42	2.4	N/A	1	100%	13.81	BAÑO DESCANSO
0.6	2	N/A	-1	100%	-1.28	DESCUENTO PUERTA
5.05	2.4	N/A	1	100%	12.12	DUCHA VESTIER MUJERES
0.7	2	N/A	-1	100%	-1.40	DESCUENTO PUERTA
4.95	2.4	N/A	1	100%	10.90	BAÑO 1 VESTIER MUJERES
0.7	2	N/A	-1	100%	-1.40	DESCUENTO PUERTA
4.54	2.4	N/A	1	100%	10.90	BAÑO 2 VESTIER MUJERES
0.7	2	N/A	-1	100%	-1.40	DESCUENTO PUERTA
		PISO 4				
7.55	2.4	N/A	1	100%	18.12	HABITACION # 1
0.86	2.02	N/A	-1	100%	-1.72	DESCUENTO
6.27	2.4	N/A	1	100%	15.05	HABITACION # 2
0.88	2.02	N/A	-1	100%	-1.77	DESCUENTO
7.14	2.4	N/A	1	100%	17.06	HABITACION # 11
0.86	2.02	N/A	-1	100%	-1.72	DESCUENTO
7.74	2.4	N/A	1	100%	11.58	HABITACION # 16
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.75	DESCUENTO
7.42	2.4	N/A	1	100%	17.01	HABITACION # 15
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.25	2.4	N/A	1	100%	17.40	HABITACION # 6
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.25	2.4	N/A	1	100%	17.40	HABITACION # 7
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.15	2.4	N/A	1	100%	17.16	HABITACION # 10
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.29	2.4	N/A	1	100%	17.50	HABITACION # 24
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.01	2.4	N/A	1	100%	16.82	HABITACION # 25
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
4.73	2.4	N/A	1	100%	11.35	BAÑO DESCANSO PISO 4
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCANSO
		PISO 5				
7.13	2.4	N/A	1	100%	17.11	HABITACION 301
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.42	2.4	N/A	1	100%	17.81	HABITACION 302
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.24	2.4	N/A	1	100%	17.38	HABITACION 307
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.7	2.4	N/A	1	100%	18.48	HABITACION 308
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.07	2.4	N/A	1	100%	16.85	HABITACION 310
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.37	2.4	N/A	1	100%	17.99	HABITACION 311
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.3	2.4	N/A	1	100%	17.76	HABITACION 316
0.8	2.02	N/A	-1	100%	-1.62	DESCUENTO
7.69	2.4	N/A	1	100%	18.46	HABITACION 318
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
7.23	2.4	N/A	1	100%	17.35	HABITACION 325
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
4.6	2.4	N/A	1	100%	11.52	BAÑO DESCANSO PISO 4
0.87	2.02	N/A	-1	100%	-1.76	DESCUENTO
4.8	1.2	N/A	1	100%	5.76	CUARTO ASEO TRANSFERCIA MEDICAMENTOS



0.77	1.2	N/A	-1	100%	-0.92	DESCUENTO PUERTA
5.94	2.4	N/A	1	100%	14.26	V. C ACCESO ASISTENCIAL
0.77	2.02	N/A	-1	100%	-1.56	DESCUENTO PUERTA
0.7	0.6	N/A	-1	100%	-0.42	DESCUENTO VENTANA
7.02	2.4	N/A	1	100%	16.85	BAÑO LUDOTECA
0.87	1.93	N/A	-1	100%	-1.69	DESCUENTO PUERTA
6.15	2.4	N/A	1	100%	14.76	BAÑO LUDOTECA
0.6	1.59	N/A	-1	100%	-1.10	DESCUENTO PUERTA ASEO
3.44	1.2	N/A	1	100%	4.13	ASEO
7.3	2.4	N/A	1	100%	17.28	BAÑO LUDOTECA
0.77	1.99	N/A	-1	100%	-1.53	DESCUENTO PUERTA
5.84	2.4	N/A	1	100%	14.02	V.C CONTINUO A COORDINACION
0.67	2.02	N/A	-1	100%	-1.35	DESCUENTO PUERTA
5.84	2.4	N/A	1	100%	14.02	V.C CONTINUO A COORDINACION
0.67	2.02	N/A	-1	100%	-1.35	DESCUENTO PUERTA
6.22	2.4	N/A	1	100%	14.93	
1.71	0.04	N/A	1	100%	0.05	
2.4	0.02	N/A	1	100%	0.05	LCI PEDIATRICA: BAÑO PMR
2.62	0.03	N/A	1	100%	0.10	
0.87	0.05	N/A	1	100%	0.04	
3.64	1.2	N/A	1	100%	4.37	CUARTO ASEO (CIRCULACION RESTRINGIDA)
[illegible]	[illegible]	N/A	[illegible]	100%	[illegible]	[illegible]


OBSERVACIONES:


TOTAL	968.12	Metro Cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	268.14	
PRESENTE ACTA	611.98	

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Honse	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
ITEM	[illegible]	CAP	2.00


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES	UNIDAD	Metro Cuadrado		UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Registro fotográfico	Dimensiones			Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	
		PISO 1			
2.87	N/A	N/A	1	100%	2.87	BAÑO PRIMER PISO
2.77	N/A	N/A	1	100%	2.77	BAÑO PRIMER PISO
		PISO 4			
2.4	N/A	N/A	4	100%	9.60	HABITACION # 1 PISO 4
2.87	N/A	N/A	1	100%	2.87	HABITACION # 1 PISO 4
2.4	N/A	N/A	4	100%	9.60	HABITACION # 2 PISO 4
2.87	N/A	N/A	1	100%	2.87	HABITACION # 2 PISO 4
2.4	N/A	N/A	3	100%	7.20	HABITACION # 11 PISO 4
2.87	N/A	N/A	1	100%	2.87	HABITACION # 11 PISO 4
2.4	N/A	N/A	4	100%	9.60	HABITACION # 15 PISO 4
2.89	N/A	N/A	1	100%	2.89	HABITACION # 15 PISO 4
2.4	N/A	N/A	3	100%	7.20	HABITACION # 16 PISO 4
2.87	N/A	N/A	1	100%	2.87	HABITACION # 16 PISO 4
2.4	N/A	N/A	4	100%	9.60	HABITACION # 7 PISO 4
2.89	N/A	N/A	1	100%	2.89	HABITACION # 7 PISO 4
2.4	N/A	N/A	2	100%	4.80	HABITACION # 8 PISO 4
2.87	N/A	N/A	1	100%	2.87	HABITACION # 8 PISO 4
2.4	N/A	N/A	4	100%	9.60	HABITACION # 19 PISO 4
2.89	N/A	N/A	1	100%	2.89	HABITACION # 19 PISO 4
2.4	N/A	N/A	3	100%	7.20	HABITACION # 24 PISO 4
2.89	N/A	N/A	1	100%	2.89	HABITACION # 24 PISO 4
2.4	N/A	N/A	4	100%	9.60	HABITACION # 23 PISO 4
2.89	N/A	N/A	1	100%	2.89	HABITACION # 23 PISO 4
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	BAÑO DESCANSO
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	BAÑO DESCANSO
2.4	N/A	N/A	1	100%	2.40	BAÑO DESCANSO
		PISO 3			
2.4	N/A	N/A	4	100%	9.60	HABITACION 301
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	HABITACION 301
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	HABITACION 301
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	HABITACION 302
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	HABITACION 302
2.4	N/A	N/A	4	100%	9.60	HABITACION 302
2.4	N/A	N/A	4	100%	9.60	HABITACION 307
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	HABITACION 307
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	HABITACION 307
2.4	N/A	N/A	2	100%	4.80	HABITACION 308
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	HABITACION 308
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	HABITACION 308
2.4	N/A	N/A	4	100%	9.60	HABITACION 310
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	HABITACION 310
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	HABITACION 310
2.4	N/A	N/A	4	100%	9.60	HABITACION 311
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	HABITACION 311
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	HABITACION 311
2.4	N/A	N/A	4	100%	9.60	HABITACION 316
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	HABITACION 316
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	HABITACION 316
2.4	N/A	N/A	4	100%	9.60	HABITACION 318
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	HABITACION 318
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	HABITACION 318
2.4	N/A	N/A	4	100%	9.60	HABITACION 325
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	HABITACION 325
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	HABITACION 325
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	DESCANSO
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	DESCANSO
2.4	N/A	N/A	1	100%	2.40	DESCANSO
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.20	CUARTO DE ASEO
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	CUARTO DE ASEO
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	CUARTO DE ASEO
1.21	N/A	N/A	1	100%	1.21	UCI PEDIATRICA - BAÑO PMR: SOBRECANCHO LAVAMANOS
2.4	N/A	N/A	1	100%	2.40	UCI PEDIATRICA - BAÑO PMR: ESQUINERO
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	UCI PEDIATRICA - BAÑO PMR: PUERTA
0.89	N/A	N/A	1	100%	0.89	
1.17	N/A	N/A	2	100%	2.34	CUARTO ASE - CIRCULACION RESTRINGIDA: MURO POCETA ASEO
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.20	CUARTO ASE - CIRCULACION RESTRINGIDA: MURO
		PISO 1			
2.87	N/A	N/A	1	100%	2.87	BAÑO PRIMER PISO
2.77	N/A	N/A	1	100%	2.77	BAÑO PRIMER PISO
0.75	N/A	N/A	2	100%	1.50	W/C FAMILIAR: SOBRELANCHO LAVAMANOS
0.38	N/A	N/A	1	100%	0.38	
2.02	N/A	N/A	5	100%	10.10	W/C FAMILIAR: PUERTAS (VAIVEN)
1.4	N/A	N/A	3	100%	4.20	W/C FAMILIAR: DIVISIONES
1.38	N/A	N/A	2	100%	2.76	W/C FAMILIAR: ACCESO HACIA CAMBIADOR
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	W/C FAMILIAR: PUERTA PRINCIPAL (ANCHO)
0.9	N/A	N/A	1	100%	0.90	W/C FAMILIAR: PUERTA SANITARIO ANCHO
2.02	N/A	N/A	2	100%	4.04	SALA EDA - BAÑO: PUERTA
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	
2	N/A	N/A	1	100%	2.00	CONSULTORIO 4
0.76	N/A	N/A	1	100%	0.76	CONSULTORIO 4
2.4	N/A	N/A	1	100%	2.40	CONSULTORIO 1
2.97	N/A	N/A	1	100%	2.97	CONSULTORIO 1
2.4	N/A	N/A	1	100%	2.40	CONSULTORIO 2
2.82	N/A	N/A	1	100%	2.82	CONSULTORIO 3
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	CONSULTORIO 2
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	CONSULTORIO 3
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	CONSULTORIO 3
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	SALA ERA
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	SALA ERA
0.76	N/A	N/A	1	100%	0.76	A/C HOMBRES
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	A/C MUJERES
2.98	N/A	N/A	1	100%	2.98	BANO DISCAPASISTENTES
2.4	N/A	N/A	2	100%	4.80	A/C HOMBRES
2.78	N/A	N/A	1	100%	2.78	A/C HOMBRES
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	W/C MANTO PRM
0.88	N/A	N/A	1	100%	0.88	
2.82	N/A	N/A	1	100%	2.82	
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	W/C AREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
0.88	N/A	N/A	1	100%	0.88	W/C LABORATORIO
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	
2.02	N/A	N/A	2	100%	4.04	W/C PROFEDIMIENTOS DE IMAGENOLOGIA
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	W/C ECOGRAFO
1.18	N/A	N/A	1	100%	1.18	
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	W/C PERSONAL ASISTENCIAL 1
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	W/C PERSONAL ASISTENCIAL 2
2.92	N/A	N/A	1	100%	2.92	
2.4	N/A	N/A	2	100%	4.80	W/C MONTOPOLO GINECOESTETRICIA
2.02	N/A	N/A	2	100%	4.04	

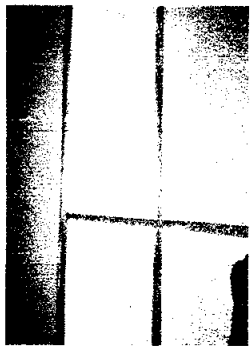







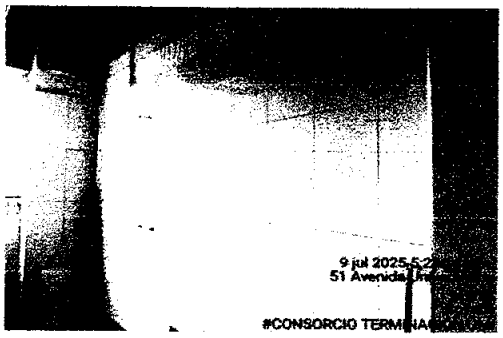

0.88	N/A	N/A	1	100%	0.88	
		PISO 2				
2.82	N/A	N/A	1	100%	2.82	BAÑO DISCAPACITADO
1.85	N/A	N/A	1	100%	1.85	BAÑO DISCAPACITADO
2.82	N/A	N/A	1	100%	2.82	BAÑO FILTRO ACCESO UNICO
0.76	N/A	N/A	1	100%	0.76	BAÑO FILTRO ACCESO UNICO
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	BAÑO FILTRO ACCESO UNICO
2.82	N/A	N/A	2	100%	4.64	BAÑO RECUPERACION PARTO
0.96	N/A	N/A	1	100%	0.96	BAÑO RECUPERACION PARTO
2.82	N/A	N/A	1	100%	2.82	BAÑO RECUPERACION PARTO
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	BAÑO RECUPERACION PARTO
2.82	N/A	N/A	2	100%	4.64	BAÑO PREPARACION PARTO
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	BAÑO PREPARACION PARTO
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	BAÑO PREPARACION PARTO
2.82	N/A	N/A	1	100%	2.82	BAÑO DESCANSO PARTO
0.77	N/A	N/A	1	100%	0.77	BAÑO VESTIER MUJER
0.65	N/A	N/A	1	100%	0.65	BAÑO VESTIER MUJER
2.82	N/A	N/A	1	100%	2.82	BAÑO VESTIER MUJER
0.67	N/A	N/A	1	100%	0.67	BAÑO VESTIER MUJER
2.82	N/A	N/A	1	100%	2.82	BAÑO VESTIER MUJER
0.65	N/A	N/A	1	100%	0.65	BAÑO VESTIER MUJER

OBSERVACIONES:


TOTAL	378.37	Metro Cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	165.03	
PRESENTE ACTA	213.34	

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA
Aprobo Interventoria:	Brenda Luz Ruidado	FIRMA

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA						
ITEM 3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO + PULIDO	CAP 3.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS - BASES - ACABADOS	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	HSR SAN RAFAEL

Registro fotográfico




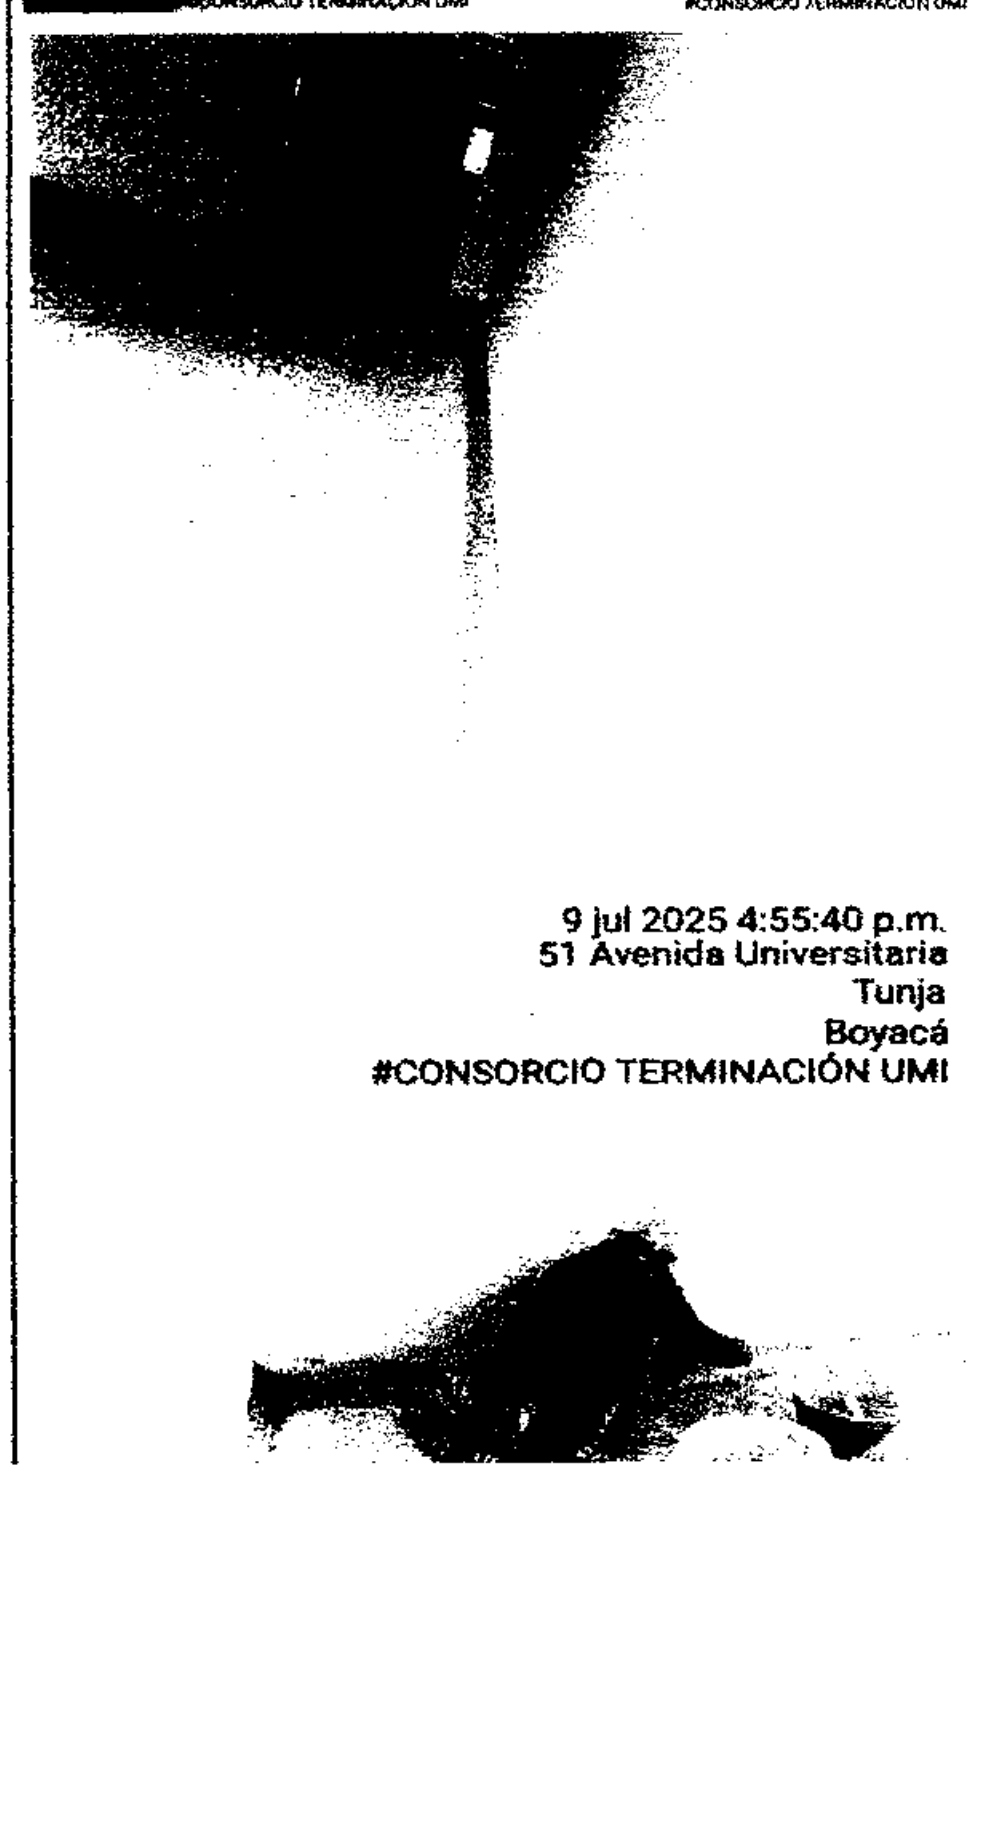


Dimensiones L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
PISO 2						
13.57	N/A	N/A	1	80%	10.86	UCI URO 9
15.64	N/A	N/A	1	80%	12.11	UCI URO 8
13.63	N/A	N/A	1	80%	10.58	UCI URO 7
11.67	N/A	N/A	1	80%	5.34	PASILLO Y/O CIRCULACIÓN DE UCI URO: DE 7 A 9
7.61	N/A	N/A	1	80%	6.09	UCI AURO 6
13.2	N/A	N/A	1	80%	18.56	
14.17	N/A	N/A	1	80%	11.34	UCI URO 5
11.15	N/A	N/A	1	80%	11.32	UCI URO 4
14.14	N/A	N/A	1	80%	11.31	UCI URO 3
13.92	N/A	N/A	1	80%	11.14	UCI URO 2
14.09	N/A	N/A	1	80%	11.27	UCI URO 1
18.22	N/A	N/A	1	80%	14.58	PASILLO Y/O CIRCULACIÓN DE UCI URO: DE 1 A 5
9.53	N/A	N/A	1	80%	7.62	CENTRAL DE ENFERMERÍA + MATERIAL FRENTE A UCI URO 5
3.51	N/A	N/A	1	80%	2.81	INGRESO CUARTOS DE UCI URO
10.26	N/A	N/A	1	80%	8.21	CENTRAL DE ENFERMERÍA FRENTE A UCI URO 3
2.57	N/A	N/A	1	80%	2.06	INFORMACIÓN FAMILIAR
6.52	N/A	N/A	1	80%	5.22	FILTRO ACCESO PERSONAL URO
5.04	N/A	N/A	1	80%	4.03	PASILLO ACCESO BAÑO COSTADO DE VESTIER PACIENTES
18.31	N/A	N/A	1	80%	14.65	VESTIER PACIENTES
2.3	N/A	N/A	1	80%	1.84	RACK
	N/A	N/A		80%		
40.76	N/A	N/A	1	80%	32.61	RECUPERACIÓN SALA PARTO
9.93	N/A	N/A	1	80%	7.94	ESTACIÓN ENFERMERÍA RECUPERACIÓN
9.04	N/A	N/A	1	80%	7.23	CIRCULACIÓN DE SALA PARTO A UCI ADULTO (LATERAL IZQUIERDO)
17.62	N/A	N/A	1	80%	14.14	CIRCULACIÓN DE: SALA DE PARTO 1 y 2 A DESCANSO
10.51	N/A	N/A	1	80%	8.41	CUARTO DE EQUIPOS
	N/A	N/A		80%		
8.68	N/A	N/A	1	80%	6.94	CIRCULACIÓN HACIA QUIRÓFANOS DESDE RECUPERACIÓN PARTOS (COSTADO DERECHO)
20.8	N/A	N/A	1	80%	16.64	DESCANSO MÉDICO - QUIRÓFANOS
9.32	N/A	N/A	1	80%	7.46	CIRCULACIÓN QUIRÓFANOS DEL 1 AL 3 (COSTADO DERECHO)
5.33	N/A	N/A	1	80%	4.26	BODEGA
44.36	N/A	N/A	1	80%	35.49	RECUPERACIÓN QUIRÚRGICA + ESTACIÓN ENFERMERÍA
10.7	N/A	N/A	1	80%	6.56	PASILLO A AUTOCLAVE DESDE RECUPERACIÓN QUIRÚRGICA
31.83	N/A	N/A	1	80%	25.46	AUTOCLAVE
7.85	N/A	N/A	1	80%	6.28	PASILLO AUTOCLAVE - HACIA QUIRÓFANOS (COSTADO DERECHO)
2.75	N/A	N/A	1	80%	2.20	
14.34	N/A	N/A	1	80%	11.47	PREPARACIÓN PACIENTES AMBULATORIOS
5.39	N/A	N/A	1	80%	4.31	W.C H. PREPARACIÓN DE PACIENTES AMBULA
6.06	N/A	N/A	1	80%	1.85	W.C M. PREPARACIÓN DE PACIENTES AMBULA
14.51	N/A	N/A	1	80%	11.63	PASILLO QUIRÓFANOS - DEL 3 AL 1 (COSTADO DERECHO)
14.39	N/A	N/A	1	80%	11.59	FARMACIA
24.89	N/A	N/A	1	80%	19.91	PASILLO POSTERIOR FARMACIA
5.85	N/A	N/A	1	80%	1.68	RESIDUOS TEMPORALES 1
4.76	N/A	N/A	1	80%	3.81	RESIDUOS TEMPORALES 2
5.21	N/A	N/A	1	80%	4.17	ASEO (AFUERA DE QUIRÓFANOS)
13.19	N/A	N/A	1	80%	10.55	PASILLO RECUPERACIÓN PARTOS - DESDE QUIRÓFANOS (COSTADO DERECHO)
15.4	N/A	N/A	1	80%	12.32	DESCANSO: RECUPERACIÓN y QUIRÓFANOS
5.18	N/A	N/A	1	80%	4.14	BODEGA (COSTADO DERECHO DE DESCANSO
5.31	N/A	N/A	1	80%	4.25	CIRCULACIÓN DESCANSO VESTIER
16.89	N/A	N/A	1	80%	13.51	VESTIER MUJERES VESTIER MUJERES
18.25	N/A	N/A	1	80%	14.69	VESTIER MUJERES VESTIER HOMBRES
4.53	N/A	N/A	1	80%	3.62	VESTIER MUJERES: DUCHA
4.11	N/A	N/A	1	80%	3.29	VESTIER MUJERES: BAÑO 1
4.06	N/A	N/A	1	80%	3.25	VESTIER MUJERES: BAÑO 2
3.72	N/A	N/A	1	80%	2.98	VESTIER HOMBRE: DUCHA
4.35	N/A	N/A	1	80%	3.48	VESTIER HOMBRE: BAÑO
3.09	N/A	N/A	1	80%	2.47	RESIDUO ORDINARIO (PASILLO FRENTE A RECUPERACIÓN PARTOS)
3.17	N/A	N/A	1	80%	2.54	RESIDUO PELIGROSO (PASILLO FRENTE A RECUPERACIÓN PARTOS)
7.01	N/A	N/A	1	80%	5.61	RECEPCIÓN - CONTROL (COSTADO DE RACK)
1.61	N/A	N/A	1	80%	1.29	MURO EXTERIOR: DESCANSO UCI URO
8.78	N/A	N/A	1	80%	7.02	DESCANSO UCI URO
6.26	N/A	N/A	1	80%	5.01	FILTRO FAMILIARES URO
19.08	N/A	N/A	1	80%	15.26	CIRCULACIÓN UCI URO A UCI NEO
6.2	N/A	N/A	1	80%	4.96	INGRESO UCI NEO (DESDE UCI URO)
9.4	N/A	N/A	1	80%	7.52	FILTRO VISITANTES UCI NEO
15.11	N/A	N/A	1	80%	12.09	LACTARIO + BODEGA
4.76	N/A	N/A	1	80%	3.81	WC PMR (COSTADO DE RESIDUOS TEMPORALES)
10.05	N/A	N/A	1	80%	8.04	AMBIENTE TRABAJO ESTÉRIL
11.35	N/A	N/A	1	80%	9.08	EXTRACCIÓN
2.67	N/A	N/A	1	80%	2.14	RESIDUOS TEMPORALES
9.76	N/A	N/A	1	80%	7.81	CIRCULACIÓN ASEO: UCI NEO
5.92	N/A	N/A	1	80%	4.74	LAVADO DE INCUBADORAS
2.53	N/A	N/A	1	80%	2.02	ASEO UCI NEO
45.52	N/A	N/A	1	80%	36.42	UCI NEO: INTENSIVOS
11.06	N/A	N/A	1	80%	8.86	CENTRAL ENFERMERÍA UCI INTENSIVOS
68.09	N/A	N/A	1	80%	54.47	UCI NEO: INTERMEDIOS
3.84	N/A	N/A	4	80%	12.29	CENTRAL ENFERMERÍA UCI NEO INTERMEDIOS
4.78	N/A	N/A	1	80%	3.82	T. LIMPIO: CENTRAL ENFERMERÍA INTERMEDIO
2.3	N/A	N/A	1	80%	1.84	ESTACIÓN SATELITE + ARCHIVO
11.24	N/A	N/A	1	80%	8.99	PASILLO HACIA DESCANSO UCI NEO
18.03	N/A	N/A	1	80%	14.42	DESCANSO UCI NEO
4.83	N/A	N/A	1	80%	3.86	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA
5.57	N/A	N/A	1	80%	3.46	T. SUCIO UCI NEO
4.79	N/A	N/A	1	80%	3.83	WC (EN PASILLO HACIA DESCANSO UCI NEO)
8.23	N/A	N/A	1	80%	6.58	ESPACIO POCETAS (HACIA DESCANSO) + MURO POSTERIOR DE CENTRAL ENFERMERÍA DE INTENSIVOS
20.14	N/A	N/A	1	80%	16.11	CUARTO DE EQUIPOS
6.77	N/A	N/A	1	80%	5.42	LIMPIO UCI NEO
6.66	N/A	N/A	1	80%	5.33	SUCIO UCI NEO
8.54	N/A	N/A	1	80%	6.83	PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
2.67	N/A	N/A	1	80%	2.14	SUCIO PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
2.92	N/A	N/A	1	80%	2.34	LIMPIO PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
6.13	N/A	N/A	1	80%	4.90	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA
4.88	N/A	N/A	1	80%	3.90	W.C MUJERES
6.31	N/A	N/A	1	80%	5.05	WC PMR MUJERES
11.25	N/A	N/A	1	80%	9.00	COORDINACIÓN UCI NEO
11.57	N/A	N/A	1	80%	5.26	VESTIER ASISTENCIAL
5.83	N/A	N/A	1	80%	4.66	W.C VESTIER
24.14	N/A	N/A	1	80%	19.31	SALA ESPERA HALL
4.05	N/A	N/A	1	80%	3.24	RACK
9.14	N/A	N/A	1	80%	7.58	PASILLO HACIA WCH Y VESTIER AUTOCLAVE
4.51	N/A	N/A	1	80%	3.61	W.C H (PASILLO HACIA VESTIER AUTOCLAVE)
4.05	N/A	N/A	1	80%	3.24	VESTIER AUTOCLAVE
9.81	N/A	N/A	1	80%	7.85	FILTRO AUTOCLAVE
11.93	N/A	N/A	1	80%	9.54	WC PMR HOMBRE + INGRESO WC
3.93	N/A	N/A	1	80%	3.14	ROPA SUCIA (EXTERIOR DE RECUPERACIÓN PARTOS)
5.46	N/A	N/A	1	80%	4.37	T. SUCIO (FRENTE CENTRAL ENFERMERÍA DE RECUPERACIÓN PARTOS)
41.22	N/A	N/A	1	80%	32.98	TRABAJO PARTO + CENTRAL DE ENFERMERÍA
7.77	N/A	N/A	1	80%	6.22	W.C TRABAJO PARTO
6.86	N/A	N/A	1	80%	5.49	T. LIMPIO (FRENTE CENTRAL ENFERMERÍA DE RECUPERACIÓN PARTOS)



1 Calle 49
Tunja
Boyacá
#CLINIICA MARTERNO INFANTIL





1 - 48 Calle 48a
Tunja
Boyacá
#CLINIICA MARTERNO INFANTIL



3.59	N/A	N/A	1	80%	4.47	RAMPA LIMPIA CENTRAL ENFERM DE RECUPERACION PARTO
4.9	N/A	N/A	1	80%	5.52	LIMPIO CENTRAL ENFERM DE RECUPERACION PARTO
3.47	N/A	N/A	1	80%	4.34	VC 1 RECUPERACION PARTO
4.2	N/A	N/A	1	80%	3.36	VC 2 RECUPERACION PARTO
3.76	N/A	N/A	1	80%	3.82	OFP. ROPA SUCIA QUIRO
1.64	N/A	N/A	1	80%	2.01	LIMPIO QUIRO
7.04	N/A	N/A	1	80%	3.79	VC QUIRURGICO 405
6.79	N/A	N/A	1	80%	5.43	VC 1 FRENTE QUIRO 401
8.39	N/A	N/A	1	80%	9.58	VC 2 FRENTE QUIR 402
3.34	N/A	N/A	1	80%	4.27	EQUIPOS FRENTE QUIRO 39
3.24	N/A	N/A	1	80%	2.59	ASEO FRENTE QUIRO 49
4.85	N/A	N/A	1	80%	3.88	T. SUCIO CENTRAL DE ENFERMERIA FRENTE A HABO 08
		PISO 1				
28.72	N/A	N/A	1	80%	22.98	AUDITORIO
39.16	N/A	N/A	1	80%	31.33	CAFETERIA
1.64	N/A	N/A	1	80%	1.31	
20.06	N/A	N/A	1	80%	16.05	COCINA
35.37	N/A	N/A	1	80%	28.30	SALA ESPERA IMAGENOLOGIA
22.25	N/A	N/A	1	80%	17.80	RECEPCION EQUIPAMIENTO FARMACIA
28.27	N/A	N/A	1	80%	22.62	FARMACIA
49.22	N/A	N/A	1	80%	39.38	EQUIPOS LABORATORIO
35.43	N/A	N/A	1	80%	28.34	CRIOTIPIA Y LOUPER LABORATORIO
9.94	N/A	N/A	1	80%	7.95	NEVERAS LABORATORIO
13.51	N/A	N/A	1	80%	10.81	PRE TRANSFUSIONAL LABORATORIO
18.64	N/A	N/A	1	80%	14.91	RESIDUOS PELIGROSO RESIDUOS RECICLABLES LAB LABORATORIO
7.00	N/A	N/A	1	80%	5.60	INGRESO LABORATORIO
11.06	N/A	N/A	1	80%	8.85	TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGIA
41.59	N/A	N/A	1	80%	33.28	TOMA DE MUESTRA
10.47	N/A	N/A	1	80%	8.38	PASILLO SUR IMAGENOLOGIA
6.74	N/A	N/A	1	80%	5.39	PROCEDIMIENTO IMAGENOLOGIA
9.33	N/A	N/A	1	80%	7.46	SALA DE ESPERA ECOGRAFIA
20.36	N/A	N/A	1	80%	16.29	CUBICULO 1
15.15	N/A	N/A	1	80%	12.12	CUBICULO 2
14.64	N/A	N/A	1	80%	11.71	ADMISIONES PROCEDIMIENTO
19.80	N/A	N/A	1	80%	15.84	PROCEDIMIENTO CARDIO
12.19	N/A	N/A	1	80%	9.75	CONSULTORIO CARDIOLOGIA
20.00	N/A	N/A	1	80%	16.00	OBSERVACION GINECOPEDIATRIA
11.79	N/A	N/A	1	80%	9.43	CIRCULACION ERA
9.09	N/A	N/A	1	80%	7.27	CIRCULACION RADIOGRAFIA
34.67	N/A	N/A	1	80%	27.74	OBSERVACION PEDIATRICA
23.41	N/A	N/A	1	80%	18.73	CENTRAL DE ENFERMERIA
7.78	N/A	N/A	1	80%	6.22	DESVANO
16.36	N/A	N/A	1	80%	13.09	T.A.C
14.43	N/A	N/A	1	80%	11.58	OFICINA RADIOLOGIA Y RECEPCION
9.38	N/A	N/A	1	80%	7.58	SALA LECTURA RADIOLOGIA
3.53	N/A	N/A	1	80%	2.82	CIRCULACION FRENTE SALA DE LECTURA
3.95	N/A	N/A	1	80%	3.16	RESIDUO ORDINARIO Y RECICLABLE
3.51	N/A	N/A	1	80%	2.80	RESIDUO PELIGROSO
15.46	N/A	N/A	1	80%	12.37	SALA ECO
16.54	N/A	N/A	1	80%	13.23	LIQUIDOS
3.89	N/A	N/A	1	80%	3.11	ROPA SUCIA
4.85	N/A	N/A	1	80%	3.88	ROPERO
13.83	N/A	N/A	1	80%	11.06	ERA
9.57	N/A	N/A	1	80%	7.65	CIRCULACION CENTRAL DE ENFERMERIA A ERA
10.68	N/A	N/A	1	80%	8.41	DIRECCION DE URGENCIAS
12.66	N/A	N/A	1	80%	7.94	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS
13.95	N/A	N/A	1	80%	8.37	SALA DE YESOS
13.1	N/A	N/A	1	80%	7.96	CONSULTORIO 5
25.96	N/A	N/A	1	80%	16.18	MONITOREO GINECOPSTETRICIA
14.56	N/A	N/A	1	80%	8.74	CONSULTORIO 2
14.57	N/A	N/A	1	80%	8.74	CONSULTORIO 1
14.66	N/A	N/A	1	80%	8.92	CONSULTORIO 4
15.4	N/A	N/A	1	80%	9.24	CONSULTORIO 3
21.2	N/A	N/A	1	80%	12.72	REANIMACION
28.74	N/A	N/A	1	80%	18.94	CIRCULACION URGENCIAS
1.71	N/A	N/A	1	80%	3.77	PASILLO CIRCULACION
9.2	N/A	N/A	1	80%	8.56	TRIAGE 2
12.72	N/A	N/A	1	80%	10.18	CIRCULACION TRIAGE 1 SILLAS DE RUEDAS
13.13	N/A	N/A	1	80%	8.90	TRIAGE 1
47.32	N/A	N/A	1	80%	27.86	SALA DE ESPERA ADULTOS
31.27	N/A	N/A	1	80%	25.02	CIRCULACION DE ESPERA URGENCIAS ATRIO PRINCIPAL
		PISO 4				
16.31	N/A	N/A	1	80%	13.05	HABITACION 424
16.67	N/A	N/A	1	80%	13.34	HABITACION 422
16.07	N/A	N/A	1	80%	12.86	HABITACION 418
16.22	N/A	N/A	1	80%	12.98	HABITACION 416
31.13	N/A	N/A	1	80%	24.90	PASILLO CIRCULACION NORTE
10.40	N/A	N/A	1	80%	8.32	CIRCULACION ACCESO
8.14	N/A	N/A	1	80%	6.51	PASILLO SALIDA DE EMERGENCIA
12.63	N/A	N/A	1	80%	10.10	HALL
12.71	N/A	N/A	1	80%	10.17	SAUX
18.72	N/A	N/A	1	80%	14.98	CENTRAL DE ENFERMERIA
25.46	N/A	N/A	1	80%	20.37	PASILLO CIRCULACION RESTRINGIDA
11.42	N/A	N/A	1	80%	9.14	PROCEDIMIENTOS
10.11	N/A	N/A	1	80%	8.10	DESCANSO MEDICO
8.48	N/A	N/A	1	80%	6.78	VC HABITACION 401
16.01	N/A	N/A	1	80%	12.81	HABITACION 403
8.85	N/A	N/A	1	80%	7.08	VC HABITACION 402
16.65	N/A	N/A	1	80%	13.24	HABITACION 407
8.64	N/A	N/A	1	80%	6.90	VC HABITACION 407
21.49	N/A	N/A	1	80%	17.19	HABITACION 408
4.17	N/A	N/A	1	80%	3.34	VC HABITACION 408
16.34	N/A	N/A	1	80%	13.07	HABITACION 410
8.29	N/A	N/A	1	80%	6.65	VC HABITACION 410
4.68	N/A	N/A	1	80%	3.74	PROCEDIMIENTOS
4.34	N/A	N/A	1	80%	3.47	VC DESCANSO
16.16	N/A	N/A	1	80%	12.93	HABITACION 411
8.38	N/A	N/A	1	80%	6.70	VC HABITACION 412
24.10	N/A	N/A	1	80%	19.28	PUESTO DE TRABAJO BALCON NORTE
14.51	N/A	N/A	1	80%	12.41	PASILLO CIRCULACION HABITACION 411
8.22	N/A	N/A	1	80%	6.58	
8.27	N/A	N/A	1	80%	6.62	BALCON SUR

OBSERVACIONES:

TOTAL	2,969.75	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	1,822.00	Metro lineal
PRESENTE ACTA	147.75	Metro lineal

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Heneo	FIRMA:
Aprobo Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	3.93	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO (NO INCLUYE DILATACION EN BRONCE)	CAP	3.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS - BASES - ACABADOS	UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UBICACION
Registro fotográfico					Dimensiones					
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
							PISO 4				
					1.21	N/A	N/A	1	80%	0.97	HABITACION 424
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 420
					1.21	N/A	N/A	1	80%	0.97	HABITACION 421
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 422
					1.21	N/A	N/A	1	80%	0.97	HABITACION 423
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 420
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 419
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 417
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 416
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 415
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 414
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 413
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 418
					1.76	N/A	N/A	1	80%	1.41	RESIDUOS ORDINARIOS
					1.76	N/A	N/A	1	80%	1.41	RESIDUOS PELIGROSOS
					0.75	N/A	N/A	1	80%	0.60	ROPA SUCIA
					0.9	N/A	N/A	1	80%	0.72	BAÑO MUJERES
					0.87	N/A	N/A	1	80%	0.70	BAÑOS HOMBRES
					0.93	N/A	N/A	1	80%	0.74	BAÑOS
					0.8	N/A	N/A	1	80%	0.64	TRABAJO SUCIO
					0.7	N/A	N/A	1	80%	0.56	ROPA LIMPIA
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 401
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 402
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 403
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 404
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 405
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 406
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 407
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 408
					0.8	N/A	N/A	1	80%	0.64	CUARTO DE EQUIPOS
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 409
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 410
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 411
					1.2	N/A	N/A	1	80%	0.96	HABITACION 412









40-50 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CLINICA MARTERNO INFANTIL

10A-10 Carrera 11 A
Tunja
Boyacá
#CLINICA MARTERNO INFANTIL


OBSERVACIONES:


TOTAL	31.44	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Metro lineal
PRESENTE ACTA	31.44	Metro lineal


Elaboró contratista:	Estefanía Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobo Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA


ITEM	6.03	CONCEPTO	CAP	6.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DETECCION	UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UNIVERSITARIA
Registro fotográfico					Dimensiones				Total (m)	Observaciones
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	
							PISO 1			
					10.20	N/A	N/A	1	100%	10.20	LABORATORIO A LAVADO YESO
					5.30	N/A	N/A	1	100%	5.30	LABORATORIO A AREA ADMINISTRATIVA
					3.70	N/A	N/A	1	100%	3.70	AREA ADMINISTRATIVA LAB A HALL
					5.40	N/A	N/A	1	100%	5.40	HALL A RESIDUOS PELIGROSO
					5.60	N/A	N/A	1	100%	5.60	RESIDUOS PELIGROSO A MUESTRA GINECOLOGIA
					8.50	N/A	N/A	1	100%	8.50	MUESTRA G-NECOLOGIA A SERVICIO IMAGENOLOGIA
					6.50	N/A	N/A	1	100%	6.50	LABORATORIO A FACTURACION
					10.80	N/A	N/A	1	100%	10.80	FARMACIA A ENTREGA FARMACIA
					9.10	N/A	N/A	1	100%	9.10	ENTREGA FARMACIA A DEPOSITO
					4.50	N/A	N/A	1	100%	4.50	DEPOSITO A TRASFUNCIONAL
					10.50	N/A	N/A	1	100%	10.50	TRASFUNCIONAL A HALL
					12.20	N/A	N/A	1	100%	12.20	HALL A SALIDA DE ESPERA
					8.50	N/A	N/A	1	100%	8.50	SALA DE ESPERA A HALL ESPERA
					9.30	N/A	N/A	1	100%	9.30	HALL GENERAL A INFORMACION
					7.50	N/A	N/A	1	100%	7.50	IMAGENOLOGIA A CONSULTORIO ECOGRAFO
					6.50	N/A	N/A	1	100%	6.50	CONSULTORIO ECOGRAFO A CAMBIADOR
					11.20	N/A	N/A	1	100%	11.20	CAMBIADOR A INSUMO
					7.30	N/A	N/A	1	100%	7.30	INSUMO A CONSULTORIO CARDIOLOGO
					6.20	N/A	N/A	1	100%	6.20	INSUMO A GINECOBSTETRICIA
					8.20	N/A	N/A	1	100%	8.20	OBSERVACION GINECOBSTETRICIA A OBSERVACION PEDIATRIA
					13.70	N/A	N/A	1	100%	13.70	OBSERVACION PEDIATRIA
					9.50	N/A	N/A	1	100%	9.50	OBSERVACION PEDIATRIA HALL URGENCIA
					5.90	N/A	N/A	1	100%	5.90	HALL URGENCIAS A VIRGEN
					8.50	N/A	N/A	1	100%	8.50	DISPARO A VIRGEN
					7.20	N/A	N/A	1	100%	7.20	DISPARO A HALL ECOGRAFO
					7.20	N/A	N/A	1	100%	7.20	HALL ECOGRAFO A T.A.C
					11.10	N/A	N/A	1	100%	11.10	T.A.C A MAMOGRAFIA
					6.80	N/A	N/A	1	100%	6.80	MAMOGRAFIA 1 A MAMOGRAFIA 2
					4.50	N/A	N/A	1	100%	4.50	MAMOGRAFIA A OFICINA
					7.50	N/A	N/A	1	100%	7.50	MAMOGRAFIA A ECOGRAFO
					8.00	N/A	N/A	1	100%	8.00	ECOGRAFO A HALL
					7.00	N/A	N/A	1	100%	7.00	ECOGRAFO A CONSULTORIO ECOGRAFO
					7.50	N/A	N/A	1	100%	7.50	CONSULTORIO ECOGRAFO A HALL
					5.50	N/A	N/A	1	100%	5.50	HALL A DIGITACION
					5.90	N/A	N/A	1	100%	5.90	DIGITACION A AUDIOLOGIA
					4.00	N/A	N/A	1	100%	4.00	AUDIOLOGIA A INSUMOS
					15.00	N/A	N/A	1	100%	15.00	INSUMO A RACK
					4.50	N/A	N/A	1	100%	4.50	RACK 1 A RACK 2
					6.20	N/A	N/A	1	100%	6.20	RACK A DESCANSO INTERNO
					8.70	N/A	N/A	1	100%	8.70	DESCANSO INTERNO A FACTURACION
					17.00	N/A	N/A	1	100%	17.00	FACTURACION A CONSULTORIO 5
					9.50	N/A	N/A	1	100%	9.50	CONSULTORIO 5 A HALL URGENCIA
					6.20	N/A	N/A	1	100%	6.20	HALL URGENCIAS A YESO
					7.90	N/A	N/A	1	100%	7.90	YESO A PROCESO ASEPTICO
					9.90	N/A	N/A	1	100%	9.90	PROCESO ASEPTICO 2 UCI
					15.00	N/A	N/A	1	100%	15.00	ECO A DIGITACION
					4.90	N/A	N/A	1	100%	4.90	DIGITACION A ROPA LIMPIA
					4.00	N/A	N/A	1	100%	4.00	ROPA LIMPIA A ROPA SUCIA
					3.00	N/A	N/A	1	100%	3.00	ROPA SUCIA A EQUIPO
					4.00	N/A	N/A	1	100%	4.00	EQUIPO A INSUMO FARMACIA
					7.70	N/A	N/A	1	100%	7.70	INSUMO FARMACIA A ERA
					7.20	N/A	N/A	1	100%	7.20	SALA ERA A CONSULTORIO 1
					7.50	N/A	N/A	1	100%	7.50	CONSULTORIO 1 A LAMPARA EM
					6.30	N/A	N/A	1	100%	6.30	CONSULTORIO 1 A CONSULTORIO 2
					15.00	N/A	N/A	1	100%	15.00	CONSULTORIO 2 A REANIMACION PEDIATRIA
					14.00	N/A	N/A	1	100%	14.00	REANIMACION PEDIATRIA A ADMISION URGENCIAS
					5.80	N/A	N/A	1	100%	5.80	ADMISION URGENCIAS A CONTRA
					7.00	N/A	N/A	1	100%	7.00	ADMISION URGENCIAS A CONSULTORIO 3
					6.30	N/A	N/A	1	100%	6.30	CONSULTORIO 1 A HALL URGENCIAS
					6.90	N/A	N/A	1	100%	6.90	HALL URGENCIAS CONSULTORIO 4
					5.80	N/A	N/A	1	100%	5.80	CONSULTORIO 4 A HALL MONITOREO
					7.50	N/A	N/A	1	100%	7.50	HALL MONITOREO A MONITORIO
					12.30	N/A	N/A	1	100%	12.30	GINECO A LOLINETA
					5.80	N/A	N/A	1	100%	5.80	COCINETA A CAFETERIA
					10.90	N/A	N/A	1	100%	10.90	CAFETERIA 1 A CAFETERIA 2
					12.60	N/A	N/A	1	100%	12.60	CAFETERIA A AUDITORIO
					12.00	N/A	N/A	1	100%	12.00	AUDITORIO A DESCANSO URGENCIAS
					13.00	N/A	N/A	1	100%	13.00	DESCANSO URGENCIAS A LAMPARA EM
					13.00	N/A	N/A	1	100%	13.00	DESCANSO URGENCIAS A SALA ESPERA ADULTO
					12.70	N/A	N/A	1	100%	12.70	SALA ESPERA ADULTO A ENTRADA URGENCIA
					7.80	N/A	N/A	1	100%	7.80	ENTRADA URGENCIAS A TRIAGE 2
					6.00	N/A	N/A	1	100%	6.00	TRIAGE 2 A TRIAGE 1
							PISO 3			
					44.50	N/A	N/A	1	100%	44.50	PASILLO DE SWICH 1 AL 2
					36.00	N/A	N/A	1	100%	36.00	PASILLO DE SWICH 2 AL 1
					44.60	N/A	N/A	1	100%	44.60	SUR A NORTE DE SWINCH 1 AL 4
					32.00	N/A	N/A	1	100%	32.00	NORTE A SUR DE SWICH 2 AL 3
					33.50	N/A	N/A	1	100%	33.50	UCI-P DE SWICH 3 AL 4
					38.00	N/A	N/A	1	100%	38.00	PASILLO DE SWICH 4 A BUITRON
					22.30	N/A	N/A	1	100%	22.30	BUITRON A PASILLO QUIRURGICO
					19.10	N/A	N/A	1	100%	19.10	DE QUIRURGICO A UCI P 1
					6.10	N/A	N/A	1	100%	6.10	DE UCI-P 3 A UCI P 5
					6.40	N/A	N/A	1	100%	6.40	DE UCI-P 5 A UCI-P 7
					6.40	N/A	N/A	1	100%	6.40	DE UCI-P 7 A UCI-P 9
					6.40	N/A	N/A	1	100%	6.40	DE UCI-P 9 A UCI-P 11
					8.60	N/A	N/A	1	100%	8.60	DE UCI-P 11 A UCI-P 13
					6.40	N/A	N/A	1	100%	6.40	DE UCI-P 17 A UCI-P 19
					7.46	N/A	N/A	1	100%	7.46	DE UCI-P 19 A UCI-P 8
					6.10	N/A	N/A	1	100%	6.10	DE UCI-P 8 A UCI-P 6
					5.50	N/A	N/A	1	100%	5.50	DE UCI-P 6 A UCI-P 3
					6.10	N/A	N/A	1	100%	6.10	DE UCI-P 4 A UCI-P 2
					3.80	N/A	N/A	1	100%	3.80	DE UCI-P 2 A TRABAJO PARTO
					7.50	N/A	N/A	1	100%	7.50	DE WC ADULTOS / WC NIÑOS - ESTAR DE TV
					5.80	N/A	N/A	1	100%	5.80	ESTAR DE TV A BODEGA
					5.90	N/A	N/A	1	100%	5.90	BODEGA A FORMACIÓN DE PEDIATRIA
					6.50	N/A	N/A	1	100%	0.50	COORDINACION PEDIATRIA A PREPARACION DE FORMULAS
					5.10	N/A	N/A	1	100%	5.10	PREPARACION DE FORMULAS A PASILLO FRENTE C. ASEO
					10.00	N/A	N/A	1	100%	10.00	PASILLO FRENTE C. ASEO A PASILLO DE PUNTO DE SALIDA EMERGENCIA
					5.70	N/A	N/A	1	100%	5.78	PASILLO DE PUNTO DE SALIDA EMERGENCIA A RACK
					6.10	N/A	N/A	1	100%	6.10	RACK A DEPOSITO DE INSUMOS
					5.50	N/A	N/A	1	100%	5.50	DEPOSITO DE INSUMOS A EXTRACCION DE LECHE MATERNA
					9.70	N/A	N/A	1	100%	8.70	EXTRACCION DE LECHE MATERNA A LUDOTECA
					41.70	N/A	N/A	1	100%	41.70	LUDOTECA 2 HOSPITALIZACIÓN HAB. 302
					10.10	N/A	N/A	1	100%	10.10	HOSPITALIZACIÓN HAB. 302 A HAB. 301
					45.50	N/A	N/A	1	100%	45.50	SALA ESPERA A BUITRON
					56.10	N/A	N/A	1	100%	56.10	SWICH 4 A SWICH 1
					1.70	N/A	N/A	1	100%	1.70	PROCEDIMIENTOS A ASEO

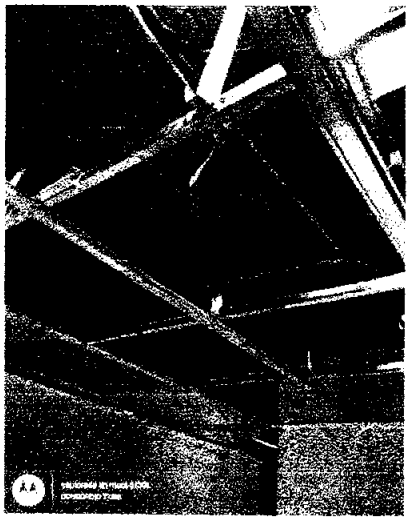

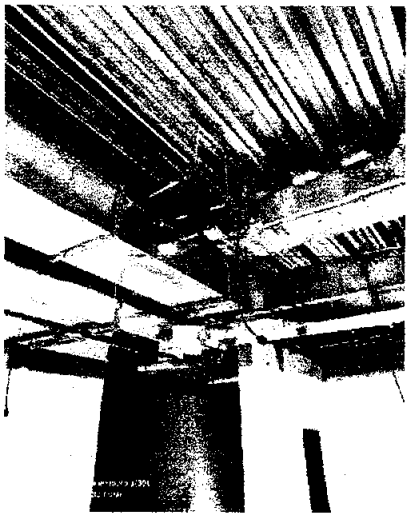

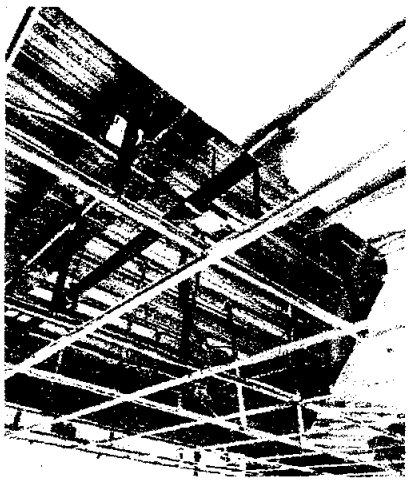

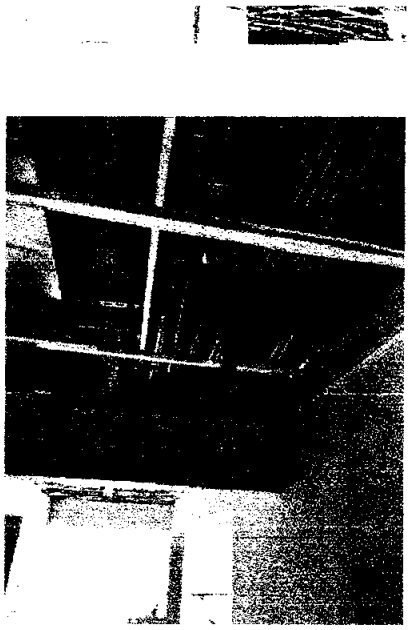

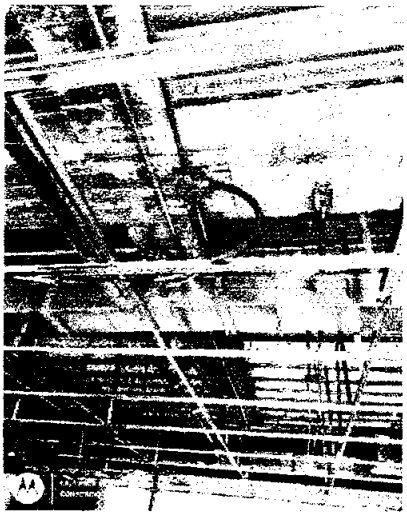

6.10	N/A	N/A	1	100%	6.10	ASEO A DEPOSITO DE INSUMOS
3.70	N/A	N/A	1	100%	3.70	ASEO A CIRCULACION RESTRINGIDA
4.90	N/A	N/A	1	100%	4.90	CIRCULACIÓN RESTRINGIDA A DESCANSO DE VESTIER
6.30	N/A	N/A	1	100%	6.30	DESCANSO VESTIER A INFORMACION FAMILIARES
4.20	N/A	N/A	1	100%	4.20	INFORMACIÓN FAMILIARES A TRANSFER TALENTAMIENTOS
9.80	N/A	N/A	1	100%	9.80	TRANSFER MEDICAMENTOS A INFORMACION FAMILIARES
5.10	N/A	N/A	1	100%	5.10	INFORMACION FAMILIARES A PASILLO FRENTE A COORDINACION UCI-P
7.40	N/A	N/A	1	100%	7.40	PASILLO FRENTE A COORDINACION UCI-P A PASILLO AFERENTE DE WC
10.10	N/A	N/A	1	100%	18.18	PASILLO AFERENTE DE WC A COORDINACION UCI-P
6.80	N/A	N/A	1	100%	6.80	COORDINACION UCI P A DESCANSO ENFERMERIA
7.40	N/A	N/A	1	100%	7.40	DESCANSO ENFERMERIA A DESCANSO DE MEDICOS
7.10	N/A	N/A	1	100%	7.10	DESCANSO DE MEDICOS A COMPLEMENTACIÓN PEDIATRICA
11.40	N/A	N/A	1	100%	11.40	COMPLEMENTACIÓN PEDIATRICA A ESTACIÓN DE CAFE
8.90	N/A	N/A	1	100%	8.90	ESTACIÓN DE CAFE A ENTRADA DE ACOMPAÑANTES Y WC NIÑOS
3.50	N/A	N/A	1	100%	3.50	TRABAJO LIMPIO A TRABAJO SUCIO
3.20	N/A	N/A	1	100%	3.20	TRABAJO SUCIO A CUARTO EQUIPOS
3.40	N/A	N/A	1	100%	3.40	CUARTO DE EQUIPOS A CUARTO ESTERIL Y DEPOSITO DE INSUMOS
3.30	N/A	N/A	1	100%	3.30	CUARTO ESTERIL Y DEPOSITO DE INSUMOS A ROPA LIMPIA
3.40	N/A	N/A	1	100%	3.40	ROPA LIMPIA A CUARTO DE ASEO
3.30	N/A	N/A	1	100%	3.30	CUARTO ASEO A PASILLO AFERENTE DE CUARTO DE ASEO
9.50	N/A	N/A	1	100%	9.50	PASILLO AL FRENTE DE CUARTO ASEO A PASILLO DE FRENTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
4.70	N/A	N/A	1	100%	4.78	PASILLO AL FRENTE DE RESIDUOS PELIGROSOS A RESIDUOS NO PELIGROSOS
3.00	N/A	N/A	1	100%	3.00	RESIDUOS NO PELIGROSOS A RESIDUOS PELIGROSOS
3.00	N/A	N/A	1	100%	3.80	RESIDUOS PELIGROSOS A ROPA SUCIA
8.20	N/A	N/A	1	100%	8.20	ROPA SUCIA A SALA DE ESPERA
10.20	N/A	N/A	1	100%	10.20	SALA ESPERA A AFERENTE DE WC M
4.90	N/A	N/A	1	100%	4.90	AL FRENTE DE WC M A DEPOSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS
2.40	N/A	N/A	1	100%	2.40	DEPOSITO DE RESIDUOS PELIGROSO A DEPOSITO DE RESIDUOS ORDINARIOS RECICLABLES
7.80	N/A	N/A	1	100%	7.80	DEPOSITO DE RESIDUOS ORDINARIOS RECICLABLES A TRABAJO LIMPIO
21.50	N/A	N/A	1	100%	21.50	TRABAJO LIMPIO A BEHERIL
		PISO 4				
5.45	N/A	N/A	1	100%	5.45	PROCEDIMIENTOS A TRABAJO LIMPIO
2.50	N/A	N/A	1	100%	2.50	TRABAJO LIMPIO A DEPOSITO
2.85	N/A	N/A	1	100%	2.85	DEPOSITO A TRABAJO SUIO
5.50	N/A	N/A	1	100%	5.50	TRABAJO SUCIO A CIRCULACION RESTRINGIDA
6.50	N/A	N/A	1	100%	6.50	CIRCULACION RESTRINGIDA A DEPOSITO RESIDUOS
3.20	N/A	N/A	1	100%	3.20	DEPOSITO RECIDIOS A EQUIPOS
6.20	N/A	N/A	1	100%	6.20	EQUIPOS A CIRCULACIÓN
8.80	N/A	N/A	1	100%	8.80	CIRCULACION A CIRCULACION
2.50	N/A	N/A	1	100%	2.50	CIRCULACION A ROPA LIMPIA
2.70	N/A	N/A	1	100%	2.70	ROPA LIMPIA A ROPA SUCIA
38.00	N/A	N/A	1	100%	38.00	ROPA SUCIA A DUCTO
20.00	N/A	N/A	1	100%	20.00	DUCTO A SALA DE ESPERA
7.50	N/A	N/A	1	100%	7.50	SALA DE ESPERA A FACTURACION
8.30	N/A	N/A	1	100%	8.30	FACTURACION A HABITACIÓN 13
5.00	N/A	N/A	1	100%	5.00	HABITACION 13 A HABITACION 15
8.00	N/A	N/A	1	100%	8.00	HABITACION 15 A CIRCULACION
5.00	N/A	N/A	1	100%	5.00	CIRCULACION A HABITACION 12
5.30	N/A	N/A	1	100%	5.30	HABITACION 12 A HABITACION 19
3.50	N/A	N/A	1	100%	3.50	HABITACION 19 A HABITACION 21
9.00	N/A	N/A	1	100%	9.00	HABITACION 21 A CIRCULACION
7.50	N/A	N/A	1	100%	7.50	DE CIRCULACION A HABITACION 23
8.50	N/A	N/A	1	100%	8.50	HABITACIÓN 23 A HABITACIÓN 25
8.60	N/A	N/A	1	100%	8.60	HABITACION 25 A PUESTO DE TRABAJO
8.30	N/A	N/A	1	100%	8.30	DE PUESTO DE TRABAJO A HABITACION 24
4.50	N/A	N/A	1	100%	4.50	HABITACION 24 A HABITACION 22
4.30	N/A	N/A	1	100%	4.30	HABITACION 22 A HABITACION 20
4.60	N/A	N/A	1	100%	4.60	HABITACION 20 A HABITACION 18
4.1	N/A	N/A	1	100%	4.18	HABITACION 18 A HABITACION 16
3.5	N/A	N/A	1	100%	3.50	HABITACION 16 A HABITACION 14
4.5	N/A	N/A	1	100%	4.50	HABITACION 14 A HABITACION 12
4.2	N/A	N/A	1	100%	4.20	HABITACION 12 A HABITACION 11
4.5	N/A	N/A	1	100%	4.50	HABITACION 11 A HABITACION 10
3.8	N/A	N/A	1	100%	3.80	HABITACION 10 A HABITACION 09
4.8	N/A	N/A	1	100%	4.80	HABITACION 09 A HABITACION 07
4.5	N/A	N/A	1	100%	4.50	HABITACION 07 A HABITACION 05
8.5	N/A	N/A	1	100%	8.50	HABITACION 05 A HABITACION 03
4.5	N/A	N/A	1	100%	4.50	HABITACION 03 A HABITACION 01
3.5	N/A	N/A	1	100%	3.50	HABITACION 01 A HABITACION 02
9	N/A	N/A	1	100%	9.00	HABITACION 02 A HABITACION 04
4	N/A	N/A	1	100%	4.00	HABITACION 04 A HABITACION 06
5	N/A	N/A	1	100%	5.00	HABITACION 06 A HABITACION 08
3.5	N/A	N/A	1	100%	3.50	HABITACION 08 A CIRCULACION RESTRINGIDA
10	N/A	N/A	1	100%	10.08	DE CIRCULACION RESTRINGIDA A CIRCULACION RESTRINGIDA
4.3	N/A	N/A	1	100%	4.30	DE CIRCULACION RESTRINGIDA A DESCANSO VESTIER B
9.5	N/A	N/A	1	100%	9.50	DE DESCANSO VESTIER A ASEO
24.9	N/A	N/A	1	100%	24.90	DE ASEO A DUCTO
20	N/A	N/A	1	100%	20.08	DE ASEO A DUCTO
1.5	N/A	N/A	1	100%	1.50	DE ASEO A DUCTO
28.5	N/A	N/A	1	100%	28.50	DE ASEO A DUCTO
1.5	N/A	N/A	1	100%	1.50	DE ASEO A DUCTO
46	N/A	N/A	1	100%	46.00	DE ASEO A DUCTO
1.5	N/A	N/A	1	100%	1.50	DE ASEO A DUCTO


OBSERVACIONES:

TOTAL	1,770.56	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	0.80	Metro lineal
PRESENTE ACTA	1,775.56	Metro lineal


Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA
Aprobó interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	7.01	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DIAM. 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	CAP	7.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UHI SAN RAFAEL
Registro fotográfico					Dimensiones			Total (m)	Observaciones

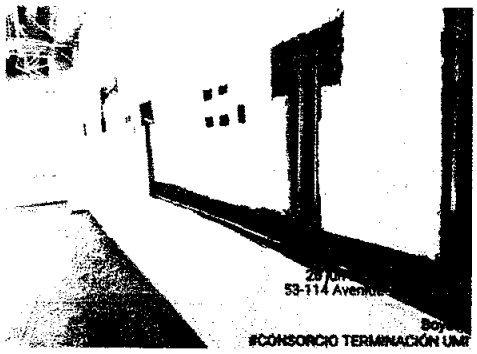




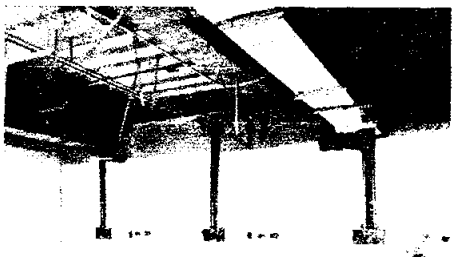

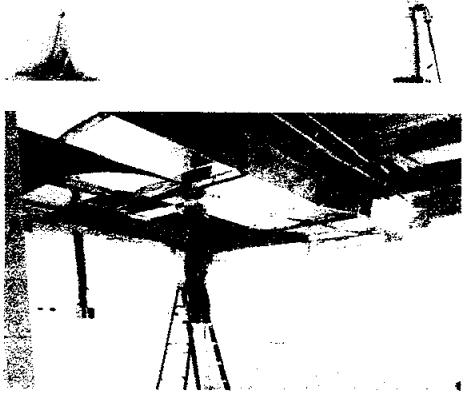


L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
		PISO 4				
7.85	N/A	N/A	1	100%	7.85	HABITACION 424
8.23	N/A	N/A	1	100%	8.23	HABITACION 425
8.85	N/A	N/A	1	100%	8.85	HABITACION 423
8.02	N/A	N/A	1	100%	8.02	HABITACION 422
8.24	N/A	N/A	1	100%	8.24	HABITACION 421
8.29	N/A	N/A	1	100%	8.29	HABITACION 420
8.32	N/A	N/A	1	100%	8.32	HABITACION 419
7.94	N/A	N/A	1	100%	7.94	HABITACION 418
8.11	N/A	N/A	1	100%	8.11	HABITACION 417
8.07	N/A	N/A	1	100%	8.07	HABITACION 416
8.09	N/A	N/A	1	100%	8.09	HABITACION 415
8.19	N/A	N/A	1	100%	8.19	HABITACION 414
12.16	N/A	N/A	1	100%	12.16	HABITACION 413
7.98	N/A	N/A	1	100%	7.98	HABITACION 412
7.61	N/A	N/A	1	100%	7.61	HABITACION 411
7.92	N/A	N/A	1	100%	7.92	HABITACION 410
8.24	N/A	N/A	1	100%	8.24	HABITACION 409
7.7	N/A	N/A	1	100%	7.70	HABITACION 407
10.2	N/A	N/A	1	100%	10.20	HABITACION 406
7.63	N/A	N/A	1	100%	7.63	HABITACION 405
10.54	N/A	N/A	1	100%	10.54	HABITACION 404
8.02	N/A	N/A	1	100%	8.02	HABITACION 403
10.36	N/A	N/A	1	100%	10.36	HABITACION 402
7.63	N/A	N/A	1	100%	7.63	HABITACION 401
7.94	N/A	N/A	1	100%	7.94	HABITACION 407
6.16	N/A	N/A	1	100%	6.16	GRUPO ACOMPAÑANTE DOBLE BAÑO
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	CUARTO PROCEDIMIENTOS
1.52	N/A	N/A	1	100%	1.52	CUARTO TECNICO DOBLE BAÑO
		PISO 1				
		AIRE MEDICINAL				
19.91	N/A	N/A	1	100%	18.91	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA C DE PASILLO HACIA FARMACIA PRINCIPAL
1.56	N/A	N/A	2	100%	3.12	FARMACIA PRINCIPAL
4.75	N/A	N/A	1	100%	4.75	PASILLO FRENTE A SALA 1 EDA FARMACIA 1° EN EXTERIOR DE SALA A
18.06	N/A	N/A	1	100%	18.06	EDA PRINCIPAL
13.53	N/A	N/A	1	100%	13.53	REANIMACIÓN, DERIVACIÓN
6.26	N/A	N/A	2	100%	12.52	DERIVACION TAC
14.9	N/A	N/A	2	100%	29.80	PRINCIPAL DE PASILLO OBSERVACION A FARMACIA
1.1	N/A	N/A	2	100%	2.84	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA C DE PASILLO HACIA FARMACIA ALIMENTACION PRINCIPAL
11.91	N/A	N/A	1	100%	11.91	OBSERVACION GINECOESTETRICA (V.I N° 2)F CAJA C EN PASILLO HACIA FARMACIA PRINCIPAL
4.99	N/A	N/A	1	100%	4.99	OBSERVACION GINECOESTETRICA - CAMA 1: DERIVACION
5.33	N/A	N/A	1	100%	5.33	OBSERVACION GINECOESTETRICA - CAMA 2: DERIVACION
6.25	N/A	N/A	1	100%	6.25	OBSERVACION GINECOESTETRICA - CAMA 3: DERIVACION
5.75	N/A	N/A	1	100%	5.75	OBSERVACION GINECOESTETRICA - CAMA 4: DERIVACION
5.31	N/A	N/A	1	100%	5.31	OBSERVACION GINECOESTETRICA - CAMA 5: DERIVACION
6.79	N/A	N/A	1	100%	6.79	DE CAJA D, C EN SALA EDA A OBSERVACION PEDIATRICA
18.01	N/A	N/A	1	100%	18.01	PRINCIPAL
4.89	N/A	N/A	1	100%	4.89	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 1: DERIVACION
8.34	N/A	N/A	1	100%	8.34	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 2 Y 3: DERIVACION
0.87	N/A	N/A	1	100%	0.87	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 4 Y 5: DERIVACION
5.79	N/A	N/A	1	100%	5.79	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 6: DERIVACION
4.91	N/A	N/A	1	100%	4.91	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 7: DERIVACION
7.78	N/A	N/A	1	100%	7.78	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 8 Y 9: DERIVACION
4.39	N/A	N/A	1	100%	4.39	PASILLO FRENTE A SALA 1 CAMA 1 EN EXTERIOR DE SALA A
18.06	N/A	N/A	1	100%	18.06	EDA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL
13.71	N/A	N/A	1	100%	13.71	REANIMACIÓN, DERIVACIÓN
12.69	N/A	N/A	1	100%	12.69	SALA EDA, DERIVACIÓN
8.37	N/A	N/A	1	100%	8.37	SALA YESOS, DERIVACIÓN
9.37	N/A	N/A	1	100%	9.37	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS, DERIVACIÓN
5	N/A	N/A	1	100%	5.00	DERIVACION DE REANIMACION 8 TRIAGE 2
8.57	N/A	N/A	1	100%	8.57	DERIVACION TAC
5.4	N/A	N/A	1	100%	5.40	DERIVACION RX SOLO HASTA PUERTA ACCESO
5.3	N/A	N/A	1	100%	5.30	SALA PROCEDIMIENTOS, DERIVACIÓN
10.7	N/A	N/A	1	100%	10.70	DERIVACIÓN PROCEDIMIENTOS - CAMA 1
11.2	N/A	N/A	1	100%	11.20	DERIVACION PROCEDIMIENTOS - CAMA 2
14.8	N/A	N/A	1	100%	14.80	PRINCIPAL DE PASILLO OBSERVACION A FARMACIA
8.23	N/A	N/A	1	100%	8.23	SALA EMA DERIVACION
2.56	N/A	N/A	1	100%	2.56	DERIVACION TRIAGE 2
1.87	N/A	N/A	1	100%	1.87	DERIVACION TRIAGE 1
		PISO 3				
		AIRE MEDICINAL				
3.56	N/A	N/A	1	100%	3.56	UCIP - 12: DERIVACION
6.43	N/A	N/A	1	100%	6.43	UCIP - 11: DERIVACION
4.09	N/A	N/A	1	100%	4.09	UCIP - 10: DERIVACION
6.55	N/A	N/A	1	100%	6.55	UCIP - 09: DERIVACION
4.75	N/A	N/A	1	100%	4.75	UCIP - 08: DERIVACION
6.56	N/A	N/A	1	100%	6.56	UCIP - 07: DERIVACION
5.18	N/A	N/A	1	100%	5.18	UCIP - 06: DERIVACION
6.57	N/A	N/A	1	100%	6.57	UCIP - 05: DERIVACION
5.24	N/A	N/A	1	100%	5.24	UCIP - 04: DERIVACION
8.56	N/A	N/A	1	100%	8.56	UCIP - 03: DERIVACION
5.19	N/A	N/A	1	100%	5.19	UCIP - 02: DERIVACION
6.56	N/A	N/A	1	100%	6.56	UCIP - 01: DERIVACION
3.64	N/A	N/A	1	100%	3.64	UCIP - 12: DERIVACION
6.37	N/A	N/A	1	100%	6.37	UCIP - 11: DERIVACION
4.22	N/A	N/A	1	100%	4.22	UCIP - 10: DERIVACION
6.35	N/A	N/A	1	100%	6.35	UCIP - 09: DERIVACION
4.82	N/A	N/A	1	100%	4.82	UCIP - 08: DERIVACION
6.52	N/A	N/A	1	100%	6.52	UCIP - 07: DERIVACION
5.22	N/A	N/A	1	100%	5.22	UCIP - 06: DERIVACION
6.48	N/A	N/A	1	100%	6.48	UCIP - 05: DERIVACION
5.36	N/A	N/A	1	100%	5.36	UCIP - 04: DERIVACION
6.53	N/A	N/A	1	100%	6.53	UCIP - 03: DERIVACION
6.17	N/A	N/A	1	100%	6.17	UCIP - 02: DERIVACION
6.47	N/A	N/A	1	100%	6.47	UCIP - 01: DERIVACION
8.95	N/A	N/A	1	100%	8.95	ENTRA, CAJA 20 DE HABITACIÓN 13 DE HOSPITALIZACIÓN
2.25	N/A	N/A	1	100%	2.25	ENTRA Y SALE, CAJA 20 DE HABITACIÓN 7 DE HOSPITALIZACIÓN
1.41	N/A	N/A	1	100%	1.41	ENTRA, CAJA 20 DE HABITACIÓN 12 DE HOSPITALIZACIÓN
11.06	N/A	N/A	1	100%	11.06	DERIVACION HABITACION 1, CAMAS 1 Y 2
8.00	N/A	N/A	1	100%	8.00	DERIVACION HABITACIÓN 3, CAMA 1
38.02	N/A	N/A	1	100%	38.02	DESDE PRINCIPAL POR CIRCULACIÓN RESTRINGIDA A PUNTOS EN QUIRÚRGICA
1.39	N/A	N/A	1	100%	1.39	
8.07	N/A	N/A	1	100%	8.07	
9.33	N/A	N/A	1	100%	9.33	
3.76	N/A	N/A	1	100%	3.76	
5.61	N/A	N/A	1	100%	5.61	
9.41	N/A	N/A	1	100%	9.41	
4.13	N/A	N/A	1	100%	4.13	
5.43	N/A	N/A	1	100%	5.43	
5.78	N/A	N/A	1	100%	5.78	
4.66	N/A	N/A	1	100%	4.66	
5.55	N/A	N/A	1	100%	5.55	
4.76	N/A	N/A	1	100%	4.76	
5.4	N/A	N/A	1	100%	5.40	
4.59	N/A	N/A	1	100%	4.59	
5.45	N/A	N/A	1	100%	5.45	
7.43	N/A	N/A	1	100%	7.43	
5.91	N/A	N/A	1	100%	5.91	
4.73	N/A	N/A	1	100%	4.73	
4.64	N/A	N/A	1	100%	4.64	
7.48	N/A	N/A	1	100%	7.48	




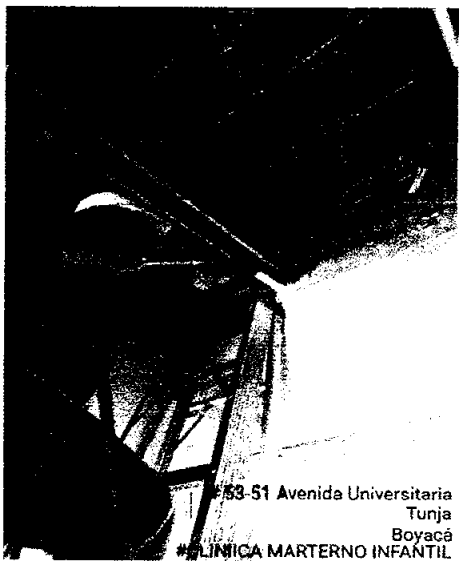


53-51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CLINICA MARTERNO INFANTIL

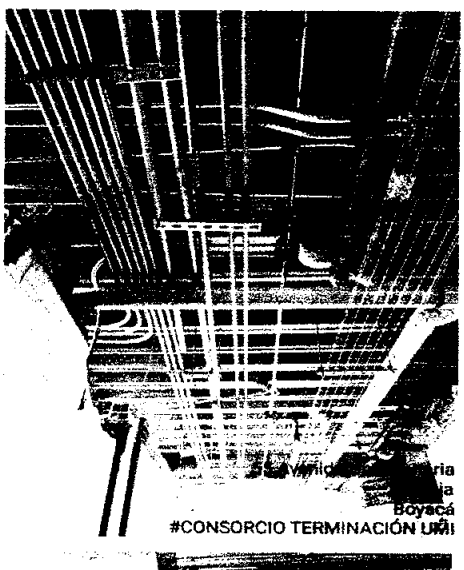

Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UCI

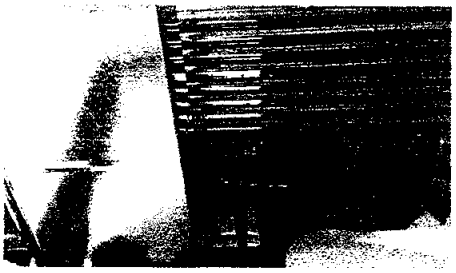

		PISO 2				
		AIRE ACONDICIONADO				
1.51	N/A	N/A	1	100%	1.57	A CAJA 3G DE QUIRÓFANO 1
2.11	N/A	N/A	1	100%	2.17	A CAJA 3G DE QUIRÓFANO 2
2.02	N/A	N/A	1	100%	2.03	A CAJA 3G DE QUIRÓFANO 3
1.82	N/A	N/A	1	100%	1.82	PRINCIPAL A CAJA 3G DE SALA PARTO 2
1.0	N/A	N/A	7	100%	7.98	PRINCIPAL A CAJA 3G DE SALA PARTO 1
1.59	N/A	N/A	1	100%	7.50	ENTRA CAJA 3G EN UCI ADU
1.45	N/A	N/A	1	100%	7.45	SALE DE CAJA 3G A PRINCIPAL DE UCI ADU
4.09	N/A	N/A	1	100%	4.09	DERIVACION CAMA 1 DE UCI ADU
4.56	N/A	N/A	4	100%	18.24	DERIVACION CAMA 2 A 5 DE UCI ADU
6.13	N/A	N/A	1	100%	6.13	DERIVACION CAMA 6 DE UCI ADU
3.41	N/A	N/A	1	100%	3.47	DERIVACION CAMA 7 A 9 DE UCI ADU
16.96	N/A	N/A	1	100%	16.96	DE CAJA 3G DE INGRESO UCI NEO INTENSIVOS POR UCI ADU A PRINCIPAL DE UCI NEO INTENSIVO (AISLADO 1)
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	DE AISLADO 1 A CAMA FRENTE A AISLADO 2
2.2	N/A	N/A	1	100%	2.28	DE PRINCIPAL A CAMA 1 - COSTADO DE AISLADO 2
0.85	N/A	N/A	1	100%	0.85	DE PRINCIPAL A CAMA 1 - COSTADO DE AISLADO 1
2.29	N/A	N/A	1	100%	2.38	DE PRINCIPAL A CAMA 2 - COSTADO DE AISLADO 2
2.19	N/A	N/A	1	100%	2.19	DE PRINCIPAL A CAMA 3 - COSTADO DE AISLADO 2
0.83	N/A	N/A	1	100%	0.83	DE PRINCIPAL A CAMA 2 - COSTADO DE AISLADO 1
0.82	N/A	N/A	1	100%	0.82	DE PRINCIPAL A CAMA 3 - COSTADO DE AISLADO 1
2.2	N/A	N/A	1	100%	2.20	DE PRINCIPAL A CAMA 4 - COSTADO DE AISLADO 2
0.68	N/A	N/A	1	100%	0.68	DE PRINCIPAL A CAMA 4 - COSTADO DE AISLADO 1
21.27	N/A	N/A	1	100%	21.27	DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI ADU A PRINCIPAL DE UCI NEO INTERMEDIO
3.04	N/A	N/A	1	100%	3.04	DERIVACION A AISLADO 1 INTERMEDIO
1.96	N/A	N/A	1	100%	7.96	DERIVACION A AISLADO 2 INTERMEDIO
1.84	N/A	N/A	1	100%	1.84	DERIVACION A CAMA 2 - COSTADO AISLADO 2
0.72	N/A	N/A	1	100%	0.72	DERIVACION A CAMA 1 - COSTADO AISLADO 1
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	DERIVACION CAMA 2 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y FRENTE A CAMA 1
0.71	N/A	N/A	1	100%	0.71	DERIVACION CAMA 3 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y COSTADO A CAMA 1
0.69	N/A	N/A	1	100%	0.69	DERIVACION CAMA 4 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y COSTADO A CAMA 2
0.76	N/A	N/A	1	100%	0.76	DERIVACION CAMA 6 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y COSTADO A CAMA 1
0.8	N/A	N/A	1	100%	0.80	DERIVACION CAMA 5 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y COSTADO A CAMA 3
5.57	N/A	N/A	1	100%	5.57	PRINCIPAL DE CAMAS FRENTE A AISLADO 1 INTERMEDIO
21.62	N/A	N/A	1	100%	21.62	DE CAJA 3G FRENTE A ESTACION SATELITE A PRINCIPAL DE CAMAS DE UCI NEO BASICO
7.1	N/A	N/A	1	100%	7.10	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
0.98	N/A	N/A	1	100%	0.98	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
0.85	N/A	N/A	1	100%	0.85	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
1.98	N/A	N/A	1	100%	1.98	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
0.85	N/A	N/A	1	100%	0.85	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
1.96	N/A	N/A	1	100%	1.96	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
0.76	N/A	N/A	1	100%	0.76	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
2.03	N/A	N/A	1	100%	2.04	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
2.19	N/A	N/A	1	100%	2.19	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
0.93	N/A	N/A	1	100%	0.93	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
1.16	N/A	N/A	1	100%	1.16	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
0.98	N/A	N/A	1	100%	0.98	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
1.47	N/A	N/A	1	100%	1.47	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
1.46	N/A	N/A	1	100%	1.46	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
1.57	N/A	N/A	7	N/A	1.57	A CAJA 5G DE QUIRÓFANO 3
2.08	N/A	N/A	1	100%	2.08	A CAJA 5G DE QUIRÓFANO 2
2.01	N/A	N/A	1	100%	2.09	A CAJA 5G DE QUIRÓFANO 1
1.93	N/A	N/A	1	100%	1.93	PRINCIPAL A CAJA 5G DE SALA PARTO 2
7.93	N/A	N/A	1	100%	7.94	PRINCIPAL A CAJA 5G DE SALA PARTO 1
10.97	N/A	N/A	1	100%	10.97	PRINCIPAL FRENTE A QUIROFANO 2 A PASILLO AUTOCLAVE
3.35	N/A	N/A	1	100%	3.35	PASILLO PARTOS 5 A 5 CAJA 5G
6.13	N/A	N/A	1	100%	6.13	SALE CAJA 5G A RECUPERACION QUIRURGICA
4.08	N/A	N/A	1	100%	4.08	PRINCIPAL DE RECUPERACION QUIRURGICA A CAMAS 3 Y 1
4.34	N/A	N/A	1	100%	4.34	DERIVACION A CAMA 1
1.95	N/A	N/A	1	100%	1.96	DERIVACION A CAMA 4
9.02	N/A	N/A	1	100%	9.02	DERIVACION A CAMAS 1 Y 2
14.24	N/A	N/A	1	100%	14.24	DERIVACION A CAMAS 5 Y 6
3.83	N/A	N/A	1	100%	3.83	DERIVACION A CAMA 7
5.66	N/A	N/A	1	100%	5.66	DERIVACION DE CAMA 7 A CAMA 8
5.21	N/A	N/A	1	100%	5.24	DERIVACION DE CAMA 8 A CAMA 9
3.22	N/A	N/A	1	100%	3.22	ENTRA PRINCIPAL PASILLO TRABAJO PARTO 2 CAJA DE 2G DE RECUPERACION PARTOS
18.64	N/A	N/A	1	100%	18.64	DE CAJA 2G A DERIVACION DE CAMAS DE RECUPERACION PARTOS
9.46	N/A	N/A	4	100%	9.44	DERIVACION A CAMAS 1 2 4 5
2.7	N/A	N/A	1	100%	2.76	DERIVACION DE CAMA 2 A CAMA 3
9.13	N/A	N/A	1	100%	9.13	DE PRINCIPAL RECUPERACION PARTOS A TRABAJO PARTOS
4.43	N/A	N/A	1	100%	8.13	DERIVACION CAMA 1 COSTADO DE CENTRAL
6.47	N/A	N/A	1	100%	6.47	DERIVACION A CAMAS 2 3 4 5
6.31	N/A	N/A	1	100%	6.34	
3.35	N/A	N/A	1	100%	3.35	ENTRA CAJA 3G DE UCI ADU A PRINCIPAL
1.3	N/A	N/A	1	100%	1.30	SALE CAJA 3G DE UCI ADU A PRINCIPAL
4.22	N/A	N/A	1	100%	4.22	DERIVACION CAMA 1 - UCI ADU
4.37	N/A	N/A	4	100%	17.48	DERIVACION CAMAS 2 3 4 5 UCI ADU
8.11	N/A	N/A	1	100%	8.13	DERIVACION CAMA 8 - UCI ADU
3.45	N/A	N/A	3	100%	10.35	DERIVACION CAMAS 7 8 9 - UCI ADU
17.16	N/A	N/A	1	100%	17.16	DE CAJA 3G DE INGRESO UCI NEO INTENSIVOS POR UCI ADU A PRINCIPAL DE UCI NEO INTENSIVOS (AISLADO 1)
2	N/A	N/A	1	100%	2.00	DE AISLADO 1 A CAMA FRENTE A AISLADO 2
2.12	N/A	N/A	1	100%	2.12	DE PRINCIPAL A CAMA 1 - COSTADO DE AISLADO 2
0.85	N/A	N/A	1	100%	0.85	DE PRINCIPAL A CAMA 1 - COSTADO DE AISLADO 1
2.18	N/A	N/A	1	100%	2.18	DE PRINCIPAL A CAMA 2 - COSTADO DE AISLADO 2
2.09	N/A	N/A	1	100%	2.09	DE PRINCIPAL A CAMA 3 - COSTADO DE AISLADO 2
0.93	N/A	N/A	1	100%	0.93	DE PRINCIPAL A CAMA 2 - COSTADO DE AISLADO 1
0.82	N/A	N/A	1	100%	0.82	DE PRINCIPAL A CAMA 3 - COSTADO DE AISLADO 1
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.19	DE PRINCIPAL A CAMA 4 - COSTADO DE AISLADO 2
0.78	N/A	N/A	1	100%	0.78	DE PRINCIPAL A CAMA 4 - COSTADO DE AISLADO 1
21.27	N/A	N/A	1	100%	21.27	DE CAJA 3G DE INGRESO POR UCI ADU A PRINCIPAL DE UCI NEO INTERMEDIO
3.14	N/A	N/A	1	100%	3.14	DERIVACION A AISLADO 1 INTERMEDIO
2.06	N/A	N/A	1	100%	2.06	DERIVACION A AISLADO 2 INTERMEDIO
7.94	N/A	N/A	1	100%	7.94	DERIVACION A CAMA 2 - COSTADO AISLADO 2
0.82	N/A	N/A	1	100%	0.82	DERIVACION A CAMA 1 - COSTADO AISLADO 1
0.7	N/A	N/A	1	100%	0.70	DERIVACION CAMA 2 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y FRENTE A CAMA 1
0.81	N/A	N/A	1	100%	0.87	DERIVACION CAMA 3 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y COSTADO A CAMA 1
6.59	N/A	N/A	1	100%	6.59	DERIVACION CAMA 4 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y COSTADO A CAMA 2
0.66	N/A	N/A	1	100%	0.66	DERIVACION CAMA 6 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y COSTADO A CAMA 1
0.7	N/A	N/A	1	100%	0.70	DERIVACION CAMA 5 - FRENTE A CAMA AISLADO 1 Y COSTADO A CAMA 3
5.59	N/A	N/A	1	100%	5.59	PRINCIPAL DE CAMAS FRENTE A AISLADO 1 INTERMEDIO
21.62	N/A	N/A	1	100%	21.62	DE CAJA 3G FRENTE A ESTACION SATELITE A PRINCIPAL DE CAMAS DE UCI NEO BASICO
1	N/A	N/A	1	100%	1.00	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
1.08	N/A	N/A	1	100%	1.08	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
0.75	N/A	N/A	1	100%	0.75	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
1.98	N/A	N/A	1	100%	7.98	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
0.75	N/A	N/A	1	100%	0.75	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
2.06	N/A	N/A	1	100%	2.06	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
0.66	N/A	N/A	1	100%	0.66	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
2.13	N/A	N/A	1	100%	2.74	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
2.03	N/A	N/A	1	100%	2.09	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
1.03	N/A	N/A	1	100%	1.03	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
7.06	N/A	N/A	1	100%	7.06	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
1.08	N/A	N/A	1	100%	1.08	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
7.37	N/A	N/A	1	100%	7.37	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
1.36	N/A	N/A	1	100%	1.36	DERIVACION CAMA DE UCI NEO BASICO
		AISLADOS				
1.65	N/A	N/A	1	100%	1.65	A CAJA 5G DE QUIRÓFANO 1
2.04	N/A	N/A	7	100%	2.04	A CAJA 5G DE QUIRÓFANO 2

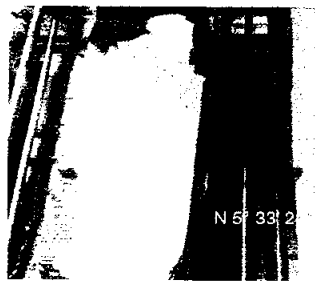

2.12	N/A	N.A	1	100%	2.12	A CAJA NG DE QUIRÓFANO 1
		DIOXIDO DE CARBONO (CO2)				
1.59	N/A	N.A	1	100%	1.59	A CAJA NG DE QUIRÓFANO 1
1.67	N/A	N.A	1	100%	1.67	A CAJA 5G DE QUIRÓFANO 2
2	N/A	N.A	1	100%	2.00	A CAJA NG DE QUIRÓFANO 1

OBSERVACIONES:

TOTAL	1,323.17	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	886.27	Metro lineal
PRESENTE ACTA	438.90	Metro lineal


Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobo Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA


ITEM	7.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L DIAM. 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	CAP	7.00


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico

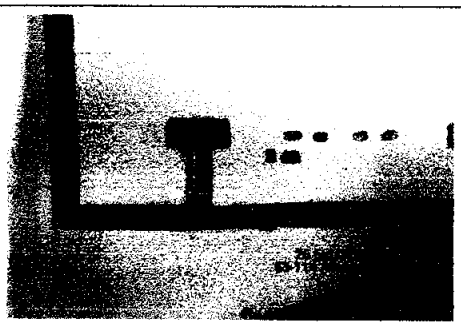

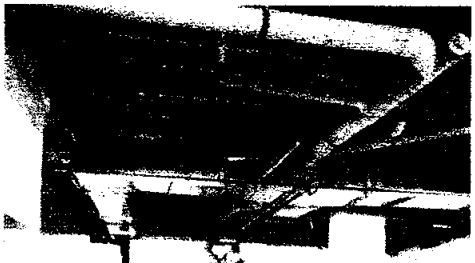


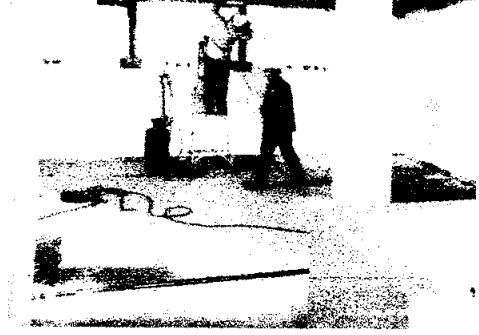

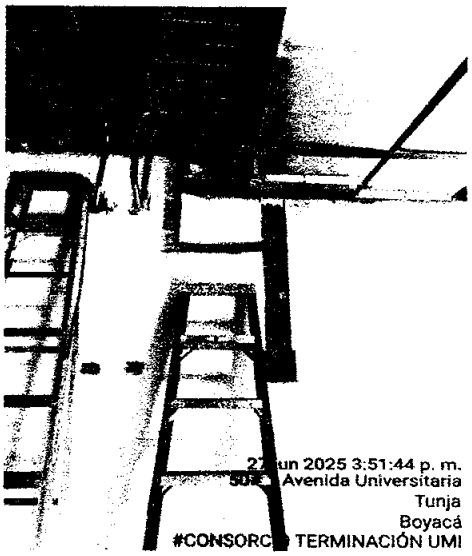




Dimensiones							
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
PISO 4						
VACIO						
7.37	N/A	N/A	1	100%	7.37	HABITACION 124
8.95	N/A	N/A	1	100%	8.95	HABITACION 125
8.86	N/A	N/A	1	100%	8.86	HABITACION 126
8.26	N/A	N/A	1	100%	8.26	HABITACION 122
8.67	N/A	N/A	1	100%	8.67	HABITACION 121
7.66	N/A	N/A	1	100%	7.66	HABITACION 120
8.66	N/A	N/A	1	100%	8.66	HABITACION 119
7.56	N/A	N/A	1	100%	7.56	HABITACION 118
8.69	N/A	N/A	1	100%	8.69	HABITACION 117
7.91	N/A	N/A	1	100%	7.91	HABITACION 116
8.41	N/A	N/A	1	100%	8.41	HABITACION 115
7.77	N/A	N/A	1	100%	7.77	HABITACION 113
12.71	N/A	N/A	1	100%	12.71	HABITACION 112
7.82	N/A	N/A	1	100%	7.82	HABITACION 111
8.23	N/A	N/A	1	100%	8.23	HABITACION 411
7.9	N/A	N/A	1	100%	7.90	HABITACION 410
8.23	N/A	N/A	1	100%	8.23	HABITACION 409
8.86	N/A	N/A	1	100%	8.86	HABITACION 407
11.14	N/A	N/A	1	100%	11.14	HABITACION 108
8.34	N/A	N/A	1	100%	8.34	HABITACION 405
10.54	N/A	N/A	1	100%	10.54	HABITACION 406
8.03	N/A	N/A	1	100%	8.03	HABITACION 403
10.96	N/A	N/A	1	100%	10.96	HABITACION 101
7.87	N/A	N/A	1	100%	7.87	HABITACION 401
8.06	N/A	N/A	1	100%	8.06	HABITACION 102
2.41	N/A	N/A	1	100%	2.41	CUARTO PROCEDIMIENTOS
1.32	N/A	N/A	1	100%	1.32	CUARTO PROCEDIMIENTOS
VACIO						
6.83	N/A	N/A	1	100%	6.83	CIRCULACION PROCEDIMIENTOS
23.65	N/A	N/A	1	100%	23.65	CIRCULACION HALL PRICIPAL ANILLO SUR
6.09	N/A	N/A	2	100%	6.18	CIRCULACION HALL PRICIPAL ANILLO SUR
1.4	N/A	N/A	2	100%	2.80	CIRCULACION HALL PRICIPAL ANILLO SUR
23.46	N/A	N/A	1	100%	23.46	CIRCULACION HALL PRICIPAL ANILLO SUR
21.12	N/A	N/A	2	100%	42.26	CIRCULACION HALL PRICIPAL ANILLO NORTE
1.07	N/A	N/A	2	100%	2.14	CIRCULACION HALL PRICIPAL ANILLO NORTE
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	CIRCULACION HALL PRICIPAL ANILLO NORTE
1.12	N/A	N/A	1	100%	1.12	CAJA DE CORTE
1.26	N/A	N/A	1	100%	1.26	CAJA DE CORTE
PISO 1						
NITROGENO						
7.19	N/A	N/A	1	100%	7.19	LAVADO DE PACIENTES Y ACCESO PASILLO URGENCIAS RED PRINCIPAL DE TANQUE
13.96	N/A	N/A	1	100%	13.96	ACCESO A PASILLO URGANCIAS A FRENTE A CONSULTORIO NO. 10 PRINCIPAL
5.5	N/A	N/A	1	100%	5.50	PRINCIPAL PASILLO URG - SUBE POR BUITRON DE PISO 1 A 2 FRENTE A CONSULTORIO 7
DIOXIDO DE CARBONO (CO2)						
7.13	N/A	N/A	1	100%	7.13	LAVADO DE PACIENTES Y ACCESO PASILLO URGENCIAS RED PRINCIPAL DE TANQUE
13.93	N/A	N/A	1	100%	13.93	ACCESO A PASILLO URGANCIAS A FRENTE A CONSULTORIO NO. 10 PRINCIPAL
5.5	N/A	N/A	1	100%	5.50	PRINCIPAL PASILLO URG - SUBE POR BUITRON DE PISO 1 A 2 FRENTE A CONSULTORIO 7
VACIO						
1.8	N/A	N/A	1	100%	1.80	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA C. DE PASILLO HACIA FARMACIA PRINCIPAL
VACIO						
1.2	N/A	N/A	2	100%	2.40	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA C. DE PASILLO HACIA FARMACIA PRINCIPAL
11.82	N/A	N/A	1	100%	11.82	OBSETRICIA - CAJA 1 DERIVACION
4.86	N/A	N/A	1	100%	4.86	OBSETRICIA - CAJA 2 DERIVACION
5.32	N/A	N/A	1	100%	5.32	OBSERVACION GINECOSTETRICA - CAMA 1 DERIVACION
6.53	N/A	N/A	1	100%	6.53	OBSERVACION GINECOSTETRICA - CAMA 2 DERIVACION
5.08	N/A	N/A	1	100%	5.08	OBSERVACION GINECOSTETRICA - CAMA 4 DERIVACION
5.31	N/A	N/A	1	100%	5.31	OBSERVACION GINECOSTETRICA - CAMA 5 DERIVACION
8.76	N/A	N/A	1	100%	8.76	DE CAJA DE C. EN SALA EDA A PEDIATRICA OBSERVACION PEDIATRICA PRINCIPAL
16.61	N/A	N/A	1	100%	16.61	
4.7	N/A	N/A	1	100%	4.78	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 1 DERIVACION
8.13	N/A	N/A	1	100%	8.13	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 2 Y 3 DERIVACION
8.97	N/A	N/A	1	100%	8.97	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 4 Y 5 DERIVACION
5.58	N/A	N/A	1	100%	5.58	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 6 OBSERVACION
4.82	N/A	N/A	1	100%	4.82	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 7 DERIVACION
7.44	N/A	N/A	1	100%	7.44	OBSERVACION PEDIATRICA - CAMA 8 Y 9 DERIVACION
4.98	N/A	N/A	1	100%	4.98	PASILLO FRENTE A SALA EYES Y ACCESO EN EXTERIOR DE SALA EDA, ALIMENTACION PRINCIPAL
18.86	N/A	N/A	1	100%	18.86	
13.74	N/A	N/A	1	100%	13.74	REANIMACION DERIVACION
8.36	N/A	N/A	1	100%	8.36	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS DERIVACION
5.69	N/A	N/A	1	100%	5.69	DERIVACION DE REANIMACION A TUNGE 1
6.74	N/A	N/A	1	100%	6.74	DERIVACION DE TAC
5.20	N/A	N/A	1	100%	5.20	DERIVACION SALA DE PROCEDIMIENTOS DE IMAGENOLOGIA
18.80	N/A	N/A	1	100%	18.80	DERIVACION PROCEDIMIENTOS CAMA 1
19.30	N/A	N/A	1	100%	19.30	DERIVACION PROCEDIMIENTOS CAMA 7
15.80	N/A	N/A	1	100%	15.80	PRINCIPAL DE PASILLO OBS. GINECOBSTETRICIA A FARMACIA
2.46	N/A	N/A	1	100%	2.46	DERIVACION TUNGE 2
1.76	N/A	N/A	1	100%	1.76	DERIVACION TUNGE 1
PISO 3						
25.35	N/A	N/A	1	100%	25.35	UCI PEDIATRICA - CIRCULACION PRINCIPAL
14.83	N/A	N/A	1	100%	14.83	SALE CAJA DE UCI PEDIATRICA A BUITRON EN PASILLO HACIA HOSPITALIZACION
20.82	N/A	N/A	1	100%	20.82	ENTRA CAJAS DE PISO 4 HOSPITALIZACION ENTRE HABITACIONES 13 A 25
10.82	N/A	N/A	1	100%	10.82	PRINCIPAL PASILLO HOSPITALIZACION ENTRE HABITACIONES 1 A 7 HASTA CAJA 20
9.68	N/A	N/A	1	100%	9.68	PRINCIPAL PASILLO HOSPITALIZACION ENTRE HABITACIONES 7 A 10 HASTA CAJA 26
25.19	N/A	N/A	1	100%	25.19	PRINCIPAL PASILLO HOSPITALIZACION PI CAJA 26 A HABITACION 25 (COSTADO DERECHO)
6.28	N/A	N/A	1	100%	6.28	
2.23	N/A	N/A	1	100%	2.23	
3.82	N/A	N/A	1	100%	3.82	
VACIO						
3.51	N/A	N/A	1	100%	3.51	UCIP - 12 DERIVACION
4.48	N/A	N/A	1	100%	4.48	UCIP - 11 DERIVACION
4.80	N/A	N/A	1	100%	4.80	UCIP - 10 DERIVACION
6.91	N/A	N/A	1	100%	6.91	UCIP - 09 DERIVACION
4.71	N/A	N/A	1	100%	4.71	UCIP - 08 DERIVACION
6.66	N/A	N/A	1	100%	6.66	UCIP - 07 DERIVACION
3.14	N/A	N/A	1	100%	3.14	UCIP - 06 DERIVACION
6.66	N/A	N/A	1	100%	6.66	UCIP - 05 DERIVACION
5.15	N/A	N/A	1	100%	5.15	UCIP - 03 DERIVACION
6.67	N/A	N/A	1	100%	6.67	UCIP - 04 DERIVACION
5.18	N/A	N/A	1	100%	5.18	UCIP - 02 DERIVACION
6.53	N/A	N/A	1	100%	6.53	UCIP - 01 DERIVACION
7.44	N/A	N/A	1	100%	7.44	ENTRA CAJA 25 DE HABITACION 13
2.65	N/A	N/A	1	100%	2.65	ENTRA Y SALE CAJA 24 HABITACION 14
1.44	N/A	N/A	1	100%	1.44	ENTRA CAJA 23 HABITACION 15
11.47	N/A	N/A	1	100%	11.47	DERIVACION A HABITACION 15 CAMAS 1 Y 2
7.98	N/A	N/A	1	100%	7.98	DERIVACION A HABITACION 15 CAMA 2
1.31	N/A	N/A	1	100%	1.31	
1.08	N/A	N/A	1	100%	1.08	
9.43	N/A	N/A	1	100%	9.43	
5.86	N/A	N/A	1	100%	5.86	
5.81	N/A	N/A	1	100%	5.81	
9.38	N/A	N/A	1	100%	9.38	

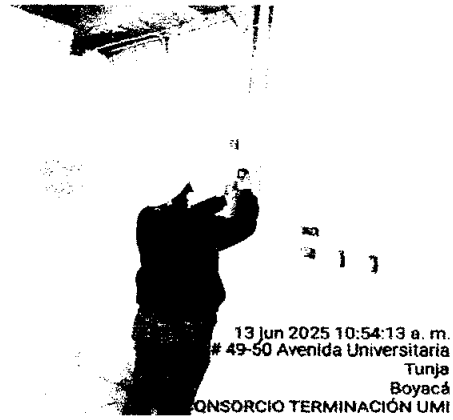



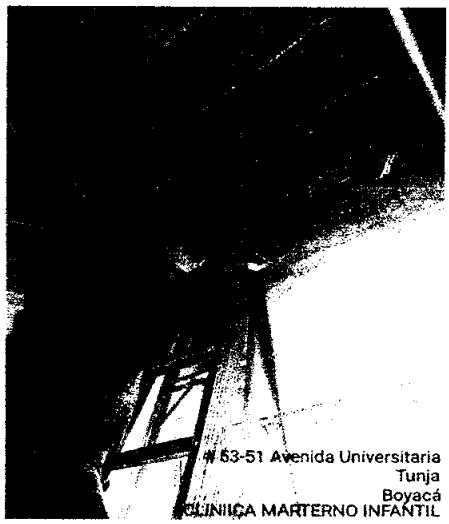

4.97	N/A	N/A	1	100%	4.97	
5.96	N/A	N/A	1	100%	5.96	
6.27	N/A	N/A	1	100%	6.27	
5.11	N/A	N/A	1	100%	5.11	
5.65	N/A	N/A	1	100%	5.65	
5.14	N/A	N/A	1	100%	5.14	
5.80	N/A	N/A	1	100%	5.80	
4.79	N/A	N/A	1	100%	4.79	
5.65	N/A	N/A	1	100%	5.65	
5.93	N/A	N/A	1	100%	5.93	
6.21	N/A	N/A	1	100%	6.21	
5.83	N/A	N/A	1	100%	5.83	
4.95	N/A	N/A	1	100%	4.95	
7.68	N/A	N/A	1	100%	7.68	
		PISO 2				
9.94	N/A	N/A	1	100%	9.94	PRINCIPAL DE QUIRÓFANO 1 A SALA PARTO 1
5.46	N/A	N/A	1	100%	5.46	SALE CAJA 3G A PRINCIPAL QUIRURGICO
17.83	N/A	N/A	1	100%	17.83	PRINCIPAL PASILLO QUIRURGICO
10.33	N/A	N/A	1	100%	10.33	PRINCIPAL PASILLO QUIRURGICO ENTRE CAMAS 7 A 9
12.05	N/A	N/A	1	100%	12.05	DE CAJA 3G DE INGRESO UCI HERMOSO INTERMEDIO A CAJA 3G FRENTE A ESTACIÓN SATELITE
		VACIO				
3.99	N/A	N/A	1	100%	3.99	A CAJA 3G DE QUIRÓFANO 2
1.98	N/A	N/A	1	100%	1.98	A CAJA 3G DE QUIRÓFANO 2
1.9	N/A	N/A	1	100%	1.90	A CAJA 3G DE QUIRÓFANO 1
2.1	N/A	N/A	1	100%	2.10	PRINCIPAL A CAJA 3G EN SALA PARTO 2
2	N/A	N/A	1	100%	2.00	PRINCIPAL A CAJA 3G DE SALA PARTO 1
11.12	N/A	N/A	1	100%	11.12	PRINCIPAL EN DE QUIRÓFANO 2 A PASILLO AUTOCLAVE
3.8	N/A	N/A	1	100%	3.80	DE PASILLO AUTOCLAVE A CAJA 2G
6.46	N/A	N/A	1	100%	6.46	DE CAJA 2G A SET UP EXTRACCIÓN QUIRÚRGICA
4.97	N/A	N/A	1	100%	4.97	PRINPAL A CAMAS 1 Y 4
4.41	N/A	N/A	1	100%	4.41	DERIVACIÓN CAMA 1
1.67	N/A	N/A	1	100%	1.67	DERIVACIÓN CAMA 4
8.92	N/A	N/A	1	100%	8.92	DERIVACION A CAMAS 1 Y 4
14.44	N/A	N/A	1	100%	14.44	DERIVACIÓN A CAMAS 1 Y 4
5.93	N/A	N/A	1	100%	5.93	DERIVACIÓN CAMA 2
5.56	N/A	N/A	1	100%	5.56	DERIVACION DE CAMA 2 A CAMA 5
5.24	N/A	N/A	1	100%	5.24	DERIVACIÓN DE CAMA 5 A CAMA 3
3.46	N/A	N/A	1	100%	3.46	ENTRA DE PASILLO TRABAJO PARTO A CAJA 2G DE RECUPERACION PARTOS
19.43	N/A	N/A	1	100%	19.43	SALE DE CAJA 2G A CAMA 5 DE RECUPERACION PARTOS
23.6	N/A	N/A	2	100%	94.40	DERIVACION A CAMAS 1, 2, 4, 5
2.19	N/A	N/A	1	100%	2.19	DERIVACIÓN DE CAMA 2 A CAMA 3
9.83	N/A	N/A	1	100%	9.83	PRINCIPAL RECUPERACION PARTOS A TRABAJO PARTO
4.53	N/A	N/A	1	100%	4.53	DERIVACIÓN CAMA 1 DE TRABAJO PARTO (COSTADO DE CENTRAL)
0.57	N/A	N/A	1	100%	0.57	DERIVACIÓN A CAMAS 2 3 4 5
6.34	N/A	N/A	1	100%	6.34	
4.21	N/A	N/A	1	100%	4.21	DERIVACIÓN CAMA 1 DE INCUBO
4.51	N/A	N/A	2	100%	18.84	DERIVACIÓN CAMA 2 A 5 DE INCUBO
6.13	N/A	N/A	1	100%	6.13	DERIVACIÓN CAMA 6 DE QUIRÚRGICO
9.93	N/A	N/A	1	100%	9.93	DERIVACIÓN CAMA 7 A 9 DE INCUBO
18.36	N/A	N/A	1	100%	18.36	DE CAJA 3G DE INGRESO QUIRÚRGICO INTERMEDIO POR UCI PARTO A PRINCIPAL DE FRENTE QUIRÚRGICO INTERMEDIO AISLADO 6
2.28	N/A	N/A	1	100%	2.28	DE AISLADO 1 A CAMA FRENTE A AISLADO 2
2.28	N/A	N/A	1	100%	2.28	DE PRINCIPAL A CAMA 1 - COSTADO DE AISLADO 1
8.75	N/A	N/A	1	100%	8.75	DE PRINCIPAL A CAMA 1 - COSTADO DE AISLADO 1
2.35	N/A	N/A	1	100%	2.35	DE PRINCIPAL A CAMA 2 - COSTADO DE AISLADO 2
2.29	N/A	N/A	1	100%	2.29	DE PRINCIPAL A CAMA 2 - COSTADO DE AISLADO 2
9.73	N/A	N/A	1	100%	9.73	DE PRINCIPAL A CAMA 3 - COSTADO DE AISLADO 3
9.72	N/A	N/A	1	100%	9.72	DE PRINCIPAL A CAMA 4 - COSTADO DE AISLADO 4
2.30	N/A	N/A	1	100%	2.30	DE PRINCIPAL A CAMA 4 - COSTADO DE AISLADO 4
0.58	N/A	N/A	1	100%	0.58	DE PRINCIPAL A CAMA 4 - COSTADO DE AISLADO 4
21.27	N/A	N/A	1	100%	21.27	DE CAJA 3G DE INGRESO POR QUIRÓFANO A PRINCIPAL DE QUIRÚRGICO INTERMEDIO
2.94	N/A	N/A	1	100%	2.94	DERIVACIÓN A AISLADO 1 PISO INTERMEDIO
1.64	N/A	N/A	1	100%	1.64	DERIVACIÓN CAMA 1 COSTADO AISLADO
1.74	N/A	N/A	1	100%	1.74	DERIVACIÓN CAMA 2 COSTADO AISLADO
8.62	N/A	N/A	1	100%	8.62	DERIVACIÓN CAMA 1 FRENTE AISLADO
8.86	N/A	N/A	1	100%	8.86	DERIVACIÓN CAMA 2 FRENTE AISLADO Y FRENTE CAMA 1
9.61	N/A	N/A	1	100%	9.61	DERIVACIÓN CAMA 3 FRENTE A AISLADO Y COSTADO DE CAMA 1
0.79	N/A	N/A	1	100%	0.79	DERIVACIÓN CAMA 1 FRENTE A AISLADO Y COSTADO DE CAMA 2
9.86	N/A	N/A	1	100%	9.86	DERIVACIÓN CAMA 3 FRENTE A AISLADO Y COSTADO DE CAMA 4
9.9	N/A	N/A	1	100%	9.90	DERIVACIÓN CAMA 5 FRENTE A AISLADO Y COSTADO DE CAMA 3
5.68	N/A	N/A	1	100%	5.68	PRINCIPAL CAMA FRENTE A AISLADO PUERTA DE
21.62	N/A	N/A	1	100%	21.62	DE CAJA 3G FRENTE A ESTACIÓN SATELITE A PRINCIPAL DE CAMAS DE INCUBADORA
1.2	N/A	N/A	1	100%	1.20	DERIVACIÓN CAMA DE QUIRÓFANO BASICO
8.68	N/A	N/A	1	100%	8.68	DERIVACIÓN CAMA DE QUIRÓFANO BASICO
0.95	N/A	N/A	1	100%	0.95	DERIVACIÓN CAMA DE QUIRÓFANO BASICO
2.20	N/A	N/A	1	100%	2.20	DERIVACIÓN CAMA DE QUIRÓFANO BASICO
0.95	N/A	N/A	1	100%	0.95	DERIVACIÓN CAMA DE QUIRÓFANO BASICO
1.66	N/A	N/A	1	100%	1.66	DERIVACIÓN CAMA DE QUIRÓFANO BASICO
0.89	N/A	N/A	1	100%	0.89	DERIVACIÓN CAMA DE QUIRÓFANO BASICO
1.93	N/A	N/A	1	100%	1.93	DERIVACIÓN CAMA DE QUIRÓFANO BASICO
2.29	N/A	N/A	1	100%	2.29	DERIVACIÓN CAMA DE QUIRÓFANO BASICO
8.82	N/A	N/A	1	100%	8.82	DERIVACIÓN CAMA DE QUIRÓFANO BASICO
1.28	N/A	N/A	1	100%	1.28	DERIVACIÓN CAMA DE QUIRÓFANO BASICO
0.88	N/A	N/A	1	100%	0.88	DERIVACIÓN CAMA DE QUIRÓFANO BASICO
1.57	N/A	N/A	1	100%	1.57	DERIVACIÓN CAMA DE QUIRÓFANO BASICO
1.56	N/A	N/A	1	100%	1.56	DERIVACIÓN CAMA DE QUIRÓFANO BASICO
		AIRE MEDICINAL				
29.88	N/A	N/A	1	100%	29.88	PRINCIPAL QUIRÓFANO 1 A SALA PARTO 1
		ANTIOXIDO				
4.63	N/A	N/A	1	100%	4.63	DE CAJA 3G DE QUIRÓFANO 1 A CAJA 3G DE QUIRÓFANO 2
7.15	N/A	N/A	1	100%	7.15	DE CAJA 3G DE QUIRÓFANO 2 A CAJA 3G DE QUIRÓFANO 1
19.6	N/A	N/A	1	100%	19.60	PRINCIPAL QUIRÓFANOS A PASILLO TRABAJO PARTO
3.88	N/A	N/A	1	100%	3.88	PRINCIPAL DE PASILLO RECUPERACIÓN PARTOS A RUTRON DETRAS DE CUARTO ASEO DE RECUPERACION PARTOS
		DIOXIDO DE CARBONO (CO2)				
4.63	N/A	N/A	1	100%	4.63	DE CAJA 3G DE QUIRÓFANO 1 A CAJA 3G DE QUIRÓFANO 2
7.15	N/A	N/A	1	100%	7.15	DE CAJA 3G DE QUIRÓFANO 2 A CAJA 3G DE QUIRÓFANO 1
19.6	N/A	N/A	1	100%	19.60	PRINCIPAL QUIRÓFANOS A PASILLO TRABAJO PARTO
3.88	N/A	N/A	1	100%	3.88	PRINCIPAL DE PASILLO RECUPERACIÓN PARTOS A RUTRON DETRAS DE CUARTO ASEO DE RECUPERACION PARTOS

OBSERVACIONES:

	TOTAL	1,437.49	Metro lineal
	ACUMULADO ANTERIOR	1,119.97	Metro lineal
	PRESENTE ACTA	317.52	Metro lineal

Elaboró contratista:	Estefanía Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	7.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L DIAM 1". INCLUYE ACCESORIOS	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico











Dimensiones						
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
			PISO 4			
			VACIO			
23.9	N/A	N/A	1	100%	23.90	ANILLO SUR CIRCULACION PRINCIPAL
23.67	N/A	N/A	1	100%	23.67	ANILLO SUR CIRCULACION PRINCIPAL
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	ANILLO SUR CIRCULACION PRINCIPAL
1.65	N/A	N/A	2	100%	3.30	ANILLO SUR CIRCULACION PRINCIPAL
21.28	N/A	N/A	2	100%	42.56	ANILLO NORTE CIRCULACION PRINCIPAL
0.9	N/A	N/A	2	100%	1.80	ANILLO NORTE CIRCULACION PRINCIPAL
1.33	N/A	N/A	2	100%	2.66	ANILLO NORTE CIRCULACION PRINCIPAL
1.31	N/A	N/A	1	100%	1.31	CAJA DE CORTE DOBLE
1.35	N/A	N/A	1	100%	1.35	CAJA DE CORTE DOBLE
6.71	N/A	N/A	1	100%	6.71	TUBERIA EN DUCTO AL BIENTATOR
			PISO 1			
			VACIO			
18.12	N/A	N/A	1	100%	18.12	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N 5 A CAJA C. DE PASILLO HACIA FARMACIA PRINCIPAL
			VACIO			
19.92	N/A	N/A	1	100%	19.92	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N 5 A CAJA C. DE PASILLO HACIA FARMACIA PRINCIPAL
			PISO 3			
			AIRE MEDICINAL			
23.35	N/A	N/A	1	100%	23.35	UCI PEDIATRICA - CIRCULACIÓN HOSPITALIZACIÓN (VÁLVULAS)
2.53	N/A	N/A	1	100%	2.53	
			VACIO			
23.35	N/A	N/A	1	100%	23.35	UCI PEDIATRICA - CIRCULACIÓN PRINCIPAL
14.37	N/A	N/A	1	100%	14.37	SALE CAJA 3G DE UCI P A HOSPITALIZACION
19.45	N/A	N/A	1	100%	19.45	ENTRA CAJA 2C A PASILLO HOSPITALIZACION ENTRE HABITACIONES 13 A 25
10.66	N/A	N/A	1	100%	10.66	PASILLO HOSPITALIZACION DE HABITACIONES 1 A 7 HASTA CAJA 2C
9.73	N/A	N/A	1	100%	9.73	PASILLO HOSPITALIZACIÓN DE HABITACIONES 7 A 12 HASTA CAJA 2C
24.19	N/A	N/A	1	100%	24.19	PASILLO HOSPITALIZACION DE CAJA 2B DE HAB 12 A HAB 25
6.35	N/A	N/A	1	100%	6.35	
2.47	N/A	N/A	1	100%	2.47	
3.6	N/A	N/A	1	100%	3.60	
			PISO 2			
			VACIO			
4.78	N/A	N/A	1	100%	4.78	PRINCIPAL A CAJA 3G DE QUIROFANO 2 A 2
7.21	N/A	N/A	1	100%	7.21	PRINCIPAL A CAJA 3G DE QUIROFANO 2 A 1
5.21	N/A	N/A	1	100%	5.21	PRINCIPAL DE QUIROFANO 1 A PRINCIPAL DE TRABAJO DE PARTO
19.6	N/A	N/A	1	100%	19.60	PRINCIPAL DE PASILLO TRABAJO DE PARTO
8.2	N/A	N/A	1	100%	8.20	PRINCIPAL DE RESIDUOS ORDINARIOS A CAJA 3G DE UCI URO
1.42	N/A	N/A	1	100%	1.42	ENTRA CAJA 3G DE UCI URO
4.11	N/A	N/A	1	100%	4.11	PASILLO ENTRE UCI URO A UCI NEO
4.13	N/A	N/A	1	100%	4.13	
2.5	N/A	N/A	1	100%	2.50	ENTRA UCI NEO INTENSIVOS DESDE PASILLO QUE VIENE DE UCI URO
7	N/A	N/A	1	100%	7.00	SUBE DE PISO 2 AL 3 - PRINCIPAL QUE VIENE DE PASILLO DE CUITRACION PASTOS POR BUITRON FRENTE CONTROL
			VACIO			
9.96	N/A	N/A	1	100%	9.96	PRINCIPAL QUIROFANOS 4 PRINCIPAL SALA DE PARTO
3.66	N/A	N/A	1	100%	3.66	ENTRA CAJA 3G DE UCI URO
7.17	N/A	N/A	1	100%	7.17	SALE CAJA 3G A PRINCIPAL UCI URO
17.13	N/A	N/A	1	100%	17.13	PRINCIPAL PASILLO UCI URO ENTRE CAMAS 1 A 6
10.33	N/A	N/A	1	100%	10.33	PRINCIPAL PASILLO UCI URO - ENTRE CAMAS 7 A 9
7	N/A	N/A	1	100%	7.00	PRINCIPAL DE ENTRADA A UCI NEO INTENSIVOS A CAJA DE 3G DE INGRESO
			AIRE MEDICINAL			
1.31	N/A	N/A	1	100%	1.31	ENTRA CAJA 3G DE UCI URO
5.58	N/A	N/A	1	100%	5.58	SALE CAJA 3G A PRINCIPAL DE UCI URO
17.13	N/A	N/A	1	100%	17.13	PRINCIPAL PASILLO UCI URO ENTRE CAMAS 1 A 6
10.33	N/A	N/A	1	100%	10.33	PRINCIPAL PASILLO UCI URO - ENTRE CAMAS 7 A 9

OBSERVACIONES:

TOTAL	440.39	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	423.64	Metro lineal
PRESENTE ACTA	16.75	Metro lineal

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:	
Aprobo Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA


ITEM	7.64	TUBERIA DE COBRE TIPO L DIAM. 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Metro lineal			UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Registro fotográfico					Dimensiones					Total (m)	Observaciones
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
					PISO 1						
					7.21	N/A	N/A	1	100%	7.21	LAVADO DE PACIENTES A ACCESO PASILLO URGENCIAS; RED PRENCIPAL DE TANQUE
					14.01	N/A	N/A	1	100%	14.01	ACCESO A PASILLO URGANCIAS A FRENTE A CONSULTORIO N 5; RED PRINCIPAL
					5.5	N/A	N/A	1	100%	5.50	PRINCIPAL PASILLO URG - SUBE POR BUITRON DE PISO 1 A 2 FRENTE A CONSULTORIO 5
					AIRE MEDICINAL						
					7.25	N/A	N/A	1	100%	7.25	LAVADO DE PACIENTES A ACCESO PASILLO URGENCIAS; RED PRENCIPAL DE TANQUE
					14.05	N/A	N/A	1	100%	14.05	ACCESO A PASILLO URGANCIAS A FRENTE A CONSULTORIO N 5; RED PRINCIPAL
					5.5	N/A	N/A	1	100%	5.50	PRINCIPAL PASILLO URG - SUBE POR BUITRON DE PISO 1 A 2 FRENTE A CONSULTORIO 5
					PISO 2						
					2.67	N/A	N/A	1	100%	2.67	SUBE DE PISO 2 AL 3 - PRINCIPAL QUE VIENE DE PASILLO RECUPERACION PARTOS POR BUITRON FRENTE CONTROL
					AIRE MEDICINAL						
					4.86	N/A	N/A	1	100%	4.86	PRINCIPAL DE CAJA 5.2 DE QUIROFANO 3 A 2
					6.96	N/A	N/A	1	100%	6.96	PRINCIPAL DE CAJA 5.3 DE QUIROFANO 2 A 1
					5.21	N/A	N/A	1	100%	5.21	PRINCIPAL FRENTE QUIROFANO 1 A PASILLO TRABAJO DE PARTO
					5.31	N/A	N/A	1	100%	5.31	
					19.6	N/A	N/A	1	100%	19.60	PRINCIPAL PASILLO TRABAJO DE PARTO
					8.8	N/A	N/A	1	100%	8.80	PRINCIPAL DE RESIDUOS ORDINARIOS A CAJA 5.1 UCI UNO
					4.02	N/A	N/A	1	100%	4.02	PASILLO UCI URO A UCI NEO
					4.12	N/A	N/A	1	100%	4.12	
					2.3	N/A	N/A	1	100%	2.38	PRINCIPAL QUE VIENE DE PASILLO RECUPERACIÓN PARTOS A BUITRON FRENTE CONTROL
					2.46	N/A	N/A	1	100%	2.46	ENTRA A UCI NEO INTENSIVOS DESDE UCI UARO
					3.36	N/A	N/A	1	100%	3.36	SUBE DE PISO 2 AL 3 PRINCIPAL QUE VIENE DE PASILLO RECUPERACIÓN PARTOS POR BUITRON FRENTE CONTROL











OBSERVACIONES:

TOTAL	123.19	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	101.40	Metro lineal
PRESENTE ACTA	21.79	Metro lineal

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA
Aprobo Interventoria.	Brenda Luz Hurtado	FIRMA

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA									
ITEM	7.23	VALVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA OMO SIMILAR NO PROCLIDENCIA ASI ITICA DIAM. 1" INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE TODO COSTO	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Unidad		UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Registro fotográfico					Dimensiones				Total (m)	Observaciones
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
					PISO 3						
					N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00	ALARMA CAJA 3G - UCI PEDIATRICA (VACIO)
					PISO 4						
					N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00	ALARMA CAJA 2G - HABITACIÓN 11 (VACIO)
					N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00	ALARMA CAJA 2G - HABITACIÓN 12 (VACIO)
					CONEXION						
					N/A	N/A	N/A		100%		
OBSERVACIONES:											
									TOTAL	0.00	Unidad
									ACUMULADO ANTERIOR	3.00	Unidad
									PRESENTE ACTA	0.00	Unidad
Elaboró contratista:					Estefania Carvajal Henao					FIRMA:	
Aprobo Interventoria:					Brenda Luz Hurtado					FIRMA:	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	7.24	VALVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DIAM. 1/2" INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO	CAP	7.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Unidad	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico	Dimensiones					Total (m)	Observaciones
	L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
			PISO 1				
	N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00	PASILLO FRENTE SALA EDA, CAJA CORTE DE TRES GASES - OXIGENO
	N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00	PASILLO FRENTE SALA EDA, CAJA CORTE DE DOS GASES - OXIGENO
	N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00	PASILLO FRENTE SALA EDA, CAJA CORTE DE DOS GASES - AIRE MEDICINAL
			PISO 3				
	N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00	INGRESO A UCI PEDIATRICA, CAJA CORTE DE TRES GASES - OXIGENO
	N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00	INGRESO A UCI PEDIATRICA, CAJA CORTE DE TRES GASES - AIRE MEDICINAL
			CONSTRUCCION				
	N/A	N/A	N/A	4	100%	4.00	

OBSERVACIONES:

TOTAL	0.00	Unidad
ACUMULADO ANTERIOR	5.00	Unidad
PRESENTE ACTA	5.00	Unidad


Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Hurtado	FIRMA:
Aprobo Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA									
ITEM	7.26	VALVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIATICA) DIAM: 3/4", INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE, TODO COSTO	CAP	7.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES	UNIDAD	Unidad		UBICACIÓN	UNI SAN RAFAEL
Registro fotográfico					Dimensiones				Total (m)	Observaciones
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	
					PISO 1					
					N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00 PASILLO FRENTE SALA EDA, CAJA CORTE DE TRES GASES - VACIO
					PISO 3					
					N/A	N/A	N/A	1	100%	1.00 INGRESO A UCI PEDIATRICA, CAJA CORTE DE TRES GASES - VACIO
					PISO 4					
					N/A	N/A	N/A	2	100%	2.00 ANILLO NORTE DE HABITACIONES Y ANILLO SUR DE HABITACIONES
							CORRECCION			
					N/A	N/A	N/A		100%	-1.00
OBSERVACIONES:										
								TOTAL		0.00 Unidad
								ACUMULADO ANTERIOR		4.00
								PRESENTE ACTA		4.00
Elaboró contratista:					Estefania Carvajal Henao					FIRMA:
Aprobó interventoría:					Brenda Luz Hurtado					FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

8.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	CAP	8.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	UNIDAD	Metro cuadrado	UBICACIÓN	UH SAN RAFAEL

Registro fotográfico

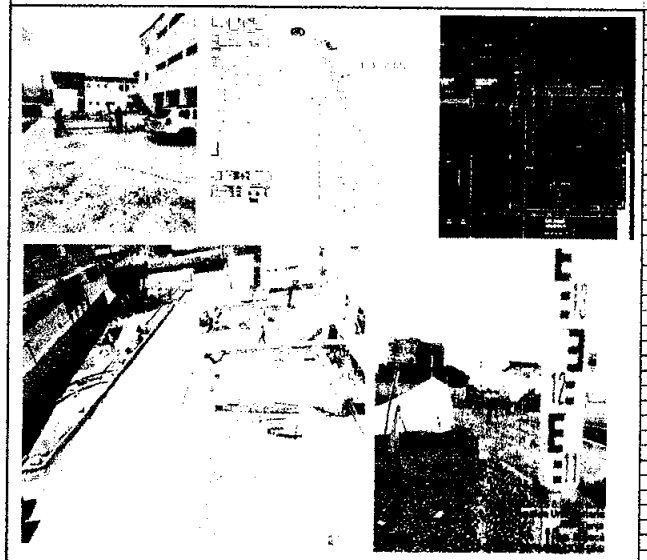

Dimensiones						
L (m)	A (m)	Área (m2)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
11.4	6.6		1	100%	75.24	Marcación inicial para excavación tanque
		1478	1	100%	1478	Área de Urbanismo

OBSERVACIONES:

TOTAL	1,553.24	Metro cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	75.24	Metro cuadrado
PRESENTE ACTA	1,478.00	Metro cuadrado

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:	
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:	

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

0.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	CAP	8.05	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	UNIDAD	M3-Km	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico





Dimensiones					Total (m)	Observaciones
m3	km cantera	km a restar	km			
					0.00	
25.97					0.00	8.09 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS
25.97	8.3	0	8.3	0.68	146.58	ARENA
25.97	21	0	21	0.68	370.85	TRITURADO
15.40			0			8.10 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS
15.40	8.3	0	8.3	1.00	127.81	ARENA
15.40	21	0	21	2.00	646.79	TRITURADO
			0			

OBSERVACIONES: Los agregados son traidos de la cantera agregados santa lucia que queda a 21 km del lugar de la obra y arena de cantera Dubal que está a 8,3 km del proyecto.

TOTAL	1,202.00	M3-Km

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó interventoría:	Catalina Roberte Torres	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

8.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	CAP	8.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO	UNIDAD	m3 km		UBICACIÓN	UNI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







Dimensiones						
m3	km cantera	km a restar	km		Total (m)	Observaciones
					0	
13.66	21	0	2	1.00	286.93	8.04 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA
397.56	21	1	20	1.00	7951.28	9.02 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	

OBSERVACIONES: Los agregados son traidos de la cantera agregados santa lucia que queda a 21 km del lugar de la obra

		TOTAL	8,238.21 m3 km

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	Catalina Roberto Torres	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	5.67	ENTIBADOS EN MADERA TIPO C PARA EXCAVACIONES A 2 USOS	CAP	8.00

TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UNIDAD	Metro Cuadrado	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico



Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
14.13	9.63	2.5	1	100%	95.03	PERIMETRAL MUROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO

OBSERVACIONES:

TOTAL	95.03	Metro Cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	Metro Cuadrado
PRESENTE ACTA	95.03	Metro Cuadrado


Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	8.1	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA (4000) PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	CAP	8.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UNIDAD	Metro Cubico		UBICACIÓN	TIME SANITARIA II

Registro fotográfico





Dimensiones						
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
28.7	0.3	1.5	1	100%	12.69	MUROS PERIMETRALES TANQUE ALMACENAMIENTO
4.0	0.3	4.13	1	100%	2.71	MURO PERIMETRAL CUARTO EQUIPOS

OBSERVACIONES:

TOTAL	15.40	Metro Cubico
ACUMULADO ANTERIOR	12.69	Metro Cubico
PRESENTE ACTA	2.71	Metro Cubico


Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobo Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

8.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	CAP	8.11	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	UNIDAD	Kilogramo	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico






Dimensiones						Total (m)	Observaciones
L (m) incluye ganchos	No de barra	Kg/m	Elementos/ cuales	Total KG	%		
8.5	4	3.99	48	406.32	100%	406.9	Longitudinal inferior losa de piso
4.5	4	3.99	48	213.84	100%	213.8	
5.5	4	3.99	48	261.36	100%	261.4	Longitudinal superior losa de piso
7.5	4	3.99	48	356.40	100%	356.4	
7.45	2	3.99	77	567.91	100%	567.9	Transversal inferior losa de piso
7.45	2	3.99	77	567.91	100%	567.9	Transversal superior losa de piso
1.8	4	3.99	40	71.28	100%	71.3	Vertical muro oriental
2.6	4	3.99	40	99.90	100%	99.9	Vertical muro oriental
11	2	3.99	17	138.90	100%	108.9	Transversal muro oriental
7.5	4	3.99	10	74.25	100%	74.3	Transversal muro oriental
2.5	4	3.99	86	212.95	100%	212.9	Vertical muro division cuarto de maquinas
6.85	2	3.99	20	136.63	100%	136.6	Transversal oriental muro division cuarto de maquinas
5.75	2	3.99	10	56.93	100%	56.9	Transversal occidental muro division cuarto de maquinas
2.8	4	3.99	86	212.95	100%	212.9	Vertical muro occidental
8.3	4	3.99	10	87.12	100%	87.1	Transversal occidental muro occidental
6.85	2	3.99	10	67.82	100%	67.8	
5.75	2	3.99	10	56.93	100%	56.9	Transversal oriental muro occidental
2.5	4	3.99	126	311.85	100%	311.9	Vertical muro norte
6.35	2	3.99	10	62.87	100%	62.9	Transversal sur muro norte
2.5	4	3.99	152	376.23	100%	376.2	Vertical muro sur
12	2	3.99	10	118.83	100%	118.8	Transversal norte muro sur
12	5	1.65	40	741.00	100%	725.0	Longitudinal inferior losa de cubierta
8.4	5	1.65	86	794.62	100%	794.6	Longitudinal superior losa de cubierta
6.85	5	1.552	75	797.34	100%	797.3	Transversal inferior losa de cubierta
3.65	5	1.552	150	849.24	100%	849.3	Transversal superior losa de cubierta

OBSERVACIONES:

TOTAL	7,857.81	Kilogramo
ACUMULADO ANTERIOR	3,516.98	Kilogramo
PRESENTE ACTA	4,140.84	Kilogramo

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA
Aprobó Interventoria:	Brendo Luz Hurtado	FIRMA

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	9.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	CAP	9.00

Registro fotográfico











CONSTRUCCIÓN DE URBANISMO	UNIDAD	metro cubico	UBICACIÓN	UBICACIÓN

Dimensiones					Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
URBANISMO						
13.83	0.5	0.4	1	100%	13.83	BORDILLO PERIMETRAL DE COSTADO OCCIDENTAL
33.12	7.00	0.71	1	100%	169.24	VIA PRINCIPAL
7.00	9.13	0.74	1	100%	23.33	VIA PRINCIPAL (AREA TRIANGULO)
52.94	17.58	0.49	1	100%	144.46	ANDEN Y ZONA VERDE (AREA TRIANGULO)
5.80	8.71	0.60	1	100%	30.31	VIA PRINCIPAL - ACCESO FARMACIA
6.24	4.55	0.60	1	100%	17.04	
9.37	2.00	0.30	1	100%	5.62	ANDEN CONTIGUO A TANQUES DE AGUA POTABLE
9.64	15.00	0.80	1	100%	64.48	ZONA PEATONAL - ACCESO PRINCIPAL
4.61	9.74	0.80	1	100%	35.92	
r	área	h (m)	Cantidad	%		
6	113.76	0.71	1	100%	82.56	ROTONDA (CIRCULAR)
RED DE ALCANTARILLADO						
53	1.3	1.2	1	100%	82.68	TUBERIA 12" - DE CAJA DE INSPECCION SUR A MH NORTE
36	1.3	1.45	1	100%	52.78	TUBERIA 12" - DE MH NORTE A MH VIA DE INGRESO
21.7	1.3	0.81	1	100%	33.77	TUBERIA 10" - DE SUR A NORTE
17	1.3	0.83	1	100%	18.34	TUBERIA 10" - DE CAJA INSPECCION SUR A MH NORTE
4	1.3	0.83	1	100%	4.32	TUBERIA 3" - DE SUR A NORTE
20.2	2.1	1.6	1	100%	180.61	FILTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO

OBSERVACIONES:

TOTAL	881.19	metro cubico
ACUMULADO ANTERIOR	803.41	metro cubico
PRESENTE ACTA	77.68	metro cubico

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA
Aprobo interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE	CAP	10.00

Registro fotográfico







#1-85 Calle 47A
Tunja
Boyacá
#CLINICA MARTERNO INFANTIL



No 50-05 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CLINICA MARTERNO INFANTIL







Tunja, Boyacá
Unidad Materno Infantil

ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro Cuadrado			UBICACIÓN	UNIDAD FUNCIONAL
	Dimensiones				Total (m)	Observaciones
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
		PISO 3				
1.7	1.54	N/A	1	100%	2.62	UCI PEDIATRICA: BAÑO PMR
2.36	1.4	N/A	1	100%	3.34	UCI PEDIATRICA: TRABAJO SUCIO
2.37	1.36	N/A	1	100%	3.22	UCI PEDIATRICA: TRABAJO LIMPIO
1.12	0.78	N/A	1	100%	0.87	UCI PEDIATRICA: ROPA SUCIA
1.12	0.78	N/A	1	100%	0.87	UCI PEDIATRICA: RESIDUOS PELIGROSOS
1.13	0.77	N/A	1	100%	0.01	UCI PEDIATRICA: RESIDUOS NO PELIGROSOS
1.74	1.4	N/A	1	100%	2.44	LUDOTECA: BAÑO PMR
0.68	0.33	N/A	1	100%	0.22	
2.71	1.45	N/A	1	100%	3.93	LUDOTECA: ÁREA LAVAMANOS
0.67	0.53	N/A	1	100%	0.17	LUDOTECA: CUARTO ASEO
1.02	0.58	N/A	1	100%	0.71	
0.67	0.3	N/A	1	100%	0.19	
0.66	0.34	N/A	1	100%	0.22	LUDOTECA: BAÑOS
1.49	1.6	N/A	1	100%	2.34	
0.68	0.72	N/A	1	100%	0.49	CUARTO ANCLOSEGURIDAD INFORMÁTICA
0.29	0.33	N/A	1	100%	0.15	
		PISO 1				
3.8	1.93	N/A	1	100%	7.33	LAVADO DE PACIENTES
2.67	1.53	N/A	1	100%	5.15	W.C MUJERES
1.52	2.21	N/A	1	100%	3.36	BAÑO DISCAPACITADOS
1.91	2.65	N/A	1	100%	5.14	W.C SALA ESPERA ADULTO
1.2	1.76	N/A	1	100%	2.11	W.C SALA ESPERA ADULTO
1.65	1.05	N/A	1	100%	1.70	CONSULTORIO 1
1.46	1.1	N/A	1	100%	1.61	CONSULTORIO 2
1.5	1.02	N/A	1	100%	1.53	CONSULTORIO 3
1.95	1.19	N/A	1	100%	1.85	CONSULTORIO 4
1.22	1.35	N/A	1	100%	1.65	SALA ERA
2.11	1.53	N/A	1	100%	3.23	W.C MIXTO PMR
2.11	1.13	N/A	1	100%	2.38	W.C MUJERES
1.17	1.45	N/A	1	100%	1.70	W.C AREA ADMINISTRATIVA FARMACIA
1.78	0.84	N/A	1	100%	1.50	W.C LABORATORIO
1.65	1.3	N/A	1	100%	1.37	W.C ENTREGA MUESTRAS
2.67	1.44	N/A	1	100%	2.96	W.C PROCEDIMIENTOS DE IMAGENOLOGIA
1.26	1.11	N/A	1	100%	1.46	W.C ECOGRAFO
1.27	1	N/A	1	100%	1.27	W.C CONSULTORIO DE ECOGRAFO
1.42	18	N/A	1	100%	25.08	W.C ADMINISTRACION DE PROCEDIMIENTOS
2.62	2.62	N/A	1	100%	2.62	T. LIMPIO ADMISIONES
1.7	1.2	N/A	1	100%	2.04	T. LIMPIO OBSERVACION PEDIATRIA
1.66	1	N/A	1	100%	1.66	T. SUCIO OBSERVACION PEDIATRIA
6	1.85	N/A	1	100%	11.10	W.C FAMILIAR OBS. PEDIATRIA
1.36	1.3	N/A	1	100%	1.77	W.C PERSONAL ASISTENCIAL 1
1.14	1.36	N/A	1	100%	1.55	W.C PERSONAL ASISTENCIAL 2
1.8	1.1	N/A	1	100%	1.98	W.C MONITOREO GINECOSTETRICIA
		PISO 2				
1.15	1.15	N/A	1	100%	1.32	W.C RECUPERACION PARTO
2.21	1.36	N/A	1	100%	3.01	TRABAJO LIMPIO - RECUPERACIÓN PARTOS
2.21	0.87	N/A	1	100%	1.61	ROPA LIMPIA - RECUPERACION PARTOS
1.56	1.25	N/A	1	100%	1.95	TRABAJO SUCIO - RECUPERACION PARTOS
2.64	1.25	N/A	1	100%	3.30	TRABAJO LIMPIO - RECUPERACION PARTOS DE TRAS DE CENTRAL ENFERMERIA
1.15	1.36	N/A	1	100%	1.56	W.C DUCHAS
1.64	1	N/A	1	100%	1.64	W.C VESTIER MUJERES
2.73	1.15	N/A	1	100%	3.15	
2.1	0.93	N/A	1	100%	1.95	W.C H.T.M.R
1.33	0.45	N/A	1	100%	0.60	
3.5	1.82	N/A	1	100%	6.37	FILTRO A ESTERILIZACION
1.23	1.16	N/A	1	100%	1.40	
1.93	1.18	N/A	1	100%	2.28	TRABAJO LIMPIO - RECUPERACIÓN QUIRÚRGICA
1.93	1.18	N/A	1	100%	2.28	TRABAJO SUCIO - RECUPERACIÓN QUIRÚRGICA
1.65	1.02	N/A	1	100%	1.71	C. ASEO - FRENTE A QUIRÓFANO 3
1.53	0.96	N/A	1	100%	1.15	W.C VESTIER HOMBRES
1.03	0.87	N/A	1	100%	5.90	DUCHA VESTIER HOMBRES
1.91	0.87	N/A	1	100%	1.69	ROPA SUCIA CENTRAL DE ENFERMERIA
1.26	1.3	N/A	1	100%	1.64	T. SUCIO CENTRAL DE ENFERMERIA
0.9	1.93	N/A	1	100%	1.74	MATTRIN - INSUMOS QUIRÚRGICOS
1.25	1	N/A	1	100%	1.25	DUCHA VESTIER MUJERE
1.27	2	N/A	1	100%	2.54	LAVADO INCUBADORA
1.78	1.16	N/A	1	100%	2.84	T. SUCIO OCTAVO

OBSERVACIONES:

TOTAL	163.81	Metro Cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	0.80	Metro Cuadrado
PRESENTE ACTA	163.01	Metro Cuadrado

Elaboro contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA
Aprobo Interventoria:	Brenda Liz Hurtado	FIRMA

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 21	CORTE Y DEMOLICION MURO Y/O PISO EN BALDOSA DE GRANO PARA APERTURA EN DE RAMPA CANA	CAP	10.00

Proyecto Hospital







51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CLINICA MARTERNO INFANTIL




ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UNIDAD SANITARIA
	Dimensiones				
L (m)	A (m)	h (m) PISO 2	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
13.57	N/A	N/A	2	100%	27.14	UCI URO - 6
15.64	N/A	N/A	2	100%	31.28	UCI URO - 5
12.63	N/A	N/A	2	100%	27.26	UCI URO - 7
11.67	N/A	N/A	2	100%	23.34	PASILLO POSTURGICAL A UCI URO - 7
7.61	N/A	N/A	2	100%	15.22	UCI URO - 8
7.20	N/A	N/A	2	100%	26.40	
14.17	N/A	N/A	2	100%	28.34	UCI URO - 5
14.15	N/A	N/A	2	100%	28.30	UCI URO - 4
14.14	N/A	N/A	2	100%	28.28	UCI URO - 3
13.92	N/A	N/A	2	100%	27.84	UCI URO - 2
14.09	N/A	N/A	2	100%	28.18	UCI URO - 1
19.23	N/A	N/A	2	100%	38.46	PASILLO POSTURGICAL A UCI URO - 1
9.53	N/A	N/A	2	100%	19.06	CENTRAL DE ENFERMERIA FRENTE A UCI URO 8
3.51	N/A	N/A	2	100%	7.02	INGRESO CUARTOS DE LA UCI
18.26	N/A	N/A	2	100%	36.52	CENTRAL DE ENFERMERIA FRENTE A UCI URO 5
2.57	N/A	N/A	2	100%	5.14	INFORMACION Y ARCHIVO
6.42	N/A	N/A	2	100%	12.84	ESTERILIZACION PERSONAL SUCIO
5.04	N/A	N/A	2	100%	14.06	PASILLO ACCESO SUCIO COSTADO DERECHO PACIENTES
18.51	N/A	N/A	2	100%	36.62	CESTOS PACIENTES
2.3	N/A	N/A	2	100%	4.69	PACS
0.00	N/A	N/A	2	100%		
40.76	N/A	N/A	2	100%	81.52	UCI CONVENCIONAL SUCIO
9.93	N/A	N/A	2	100%	19.86	ESTACION ENFERMERIA RECUPERACION
4.04	N/A	N/A	2	100%	19.06	CIRCULACION DE CAMA PARTO A UCI ASEPTICO LATERAL IZQUIERDO
17.67	N/A	N/A	2	100%	35.36	CIRCULACION DE SALA DE PARTO 1 Y 2 A DESCANSO
10.53	N/A	N/A	2	100%	21.82	CUARTO DE LICORES
9.06	N/A	N/A	2	100%	11.36	CIRCULACION HACIA CIRUGIA AMBULATORIA DESDE RECUPERACION PARTOS (COSTADO DERECHO)
20.8	N/A	N/A	2	100%	41.60	DESCANSO MEDICOS - URGENCIAS
18.32	N/A	N/A	2	100%	18.64	CIRCULACION QUIROFANO DEL 1 AL 3 (COSTADO DERECHO)
9.33	N/A	N/A	2	100%	18.66	BODEGA
49.36	N/A	N/A	2	100%	98.72	RECUPERACION QUIRURGICA + ESTACION ENFERMERIA
10.7	N/A	N/A	2	100%	21.40	PASILLO ASEPTICO ALTO DESDE RECUPERACION QUIRURGICA
31.83	N/A	N/A	2	100%	63.66	AUTOCLAVE
7.95	N/A	N/A	2	100%	15.78	PASILLO AUTOCLAVE HACIA QUIROFANOS
2.75	N/A	N/A	2	100%	5.50	(COSTADO DERECHO)
14.31	N/A	N/A	2	100%	28.62	PREPARACION PACIENTES AMBULATORIOS
5.39	N/A	N/A	2	100%	10.78	WC PREPARACION DE PACIENTES AMBULA
7.06	N/A	N/A	2	100%	14.12	CLOSET PREPARACION DE PACIENTES AMBULA
14.54	N/A	N/A	2	100%	29.08	PASILLO QUIROFANOS - DEL TAL 1 (COSTADO DERECHO)
14.38	N/A	N/A	2	100%	28.78	FARMACIA
24.89	N/A	N/A	2	100%	49.78	PASILLO POSTERIOR FARMACIA
5.89	N/A	N/A	2	100%	11.78	RESIDUOS TEMPORALES 1
4.76	N/A	N/A	2	100%	9.52	RESIDUOS TEMPORALES 2
5.31	N/A	N/A	2	100%	14.62	ASEO Y BODEGA DE LIMPIEZA 1 A 3
13.19	N/A	N/A	2	100%	26.38	PASILLO RECUPERACION POSTQUIRURGICA - DESDE QUIROFANOS (COSTADO DERECHO)
15.4	N/A	N/A	2	100%	30.80	DESCANSO RECUPERACION Y QUIROFANOS
5.18	N/A	N/A	2	100%	10.36	RUPTURA PASILLO RECUPERACION DESCANSO
5.51	N/A	N/A	2	100%	10.92	CIRCULACION DESCANSOS ESTER
16.89	N/A	N/A	2	100%	33.78	VESTIER MUJERES / VESTIER HOMBRES
18.25	N/A	N/A	2	100%	36.50	VESTIER MUJERES / VESTIER HOMBRES
4.35	N/A	N/A	2	100%	8.66	VESTIER MUJERES - BAÑO HA
4.13	N/A	N/A	2	100%	9.22	VESTIER MUJERES - BAÑO 1
4.06	N/A	N/A	2	100%	8.92	VESTIER MUJERES - BAÑO 2
3.72	N/A	N/A	2	100%	7.44	VESTIER HOMBRE - DUCHA
4.38	N/A	N/A	2	100%	8.76	VESTIER HOMBRE - BAÑO
3.09	N/A	N/A	2	100%	6.18	RETIRO ORDINARIO PASILLO CENTRAL A RECUPERACION PARTOS)
3.17	N/A	N/A	2	100%	6.34	RESIDUO PELIGROSO (PASILLO FRENTE A RECUPERACION PARTOS)
7.01	N/A	N/A	2	100%	14.02	ESTERILIZACION ENTRADA DE BAÑO
1.61	N/A	N/A	2	100%	3.22	MURO EXTERIOR DESCANSO QUIRURGICO
8.58	N/A	N/A	2	100%	17.16	DESCANSO QUIRURGICO
6.28	N/A	N/A	2	100%	12.32	PETTIS FAMILIARES QUIR
11.08	N/A	N/A	2	100%	38.16	CIRCULACION QUIRURGICA UNIDAD
6.7	N/A	N/A	2	100%	12.46	INGRESO QUIRURGICO DESDE QUIROFANOS
9.4	N/A	N/A	2	100%	19.80	PASILLO VISITANTES QUIRURGICO
15.11	N/A	N/A	2	100%	30.22	LACTARIO + BODEGA
4.75	N/A	N/A	2	100%	9.52	WC PARA ASEO DE RESIDUOS TEMPORALES
18.05	N/A	N/A	2	100%	36.10	AMBIENTE TRABAJO ESTUDIANTES
13.35	N/A	N/A	2	100%	27.70	ESTIMULACION
2.67	N/A	N/A	2	100%	5.34	RESIDUOS TEMPORALES
9.76	N/A	N/A	2	100%	19.52	CIRCULACION ASEO INTERNO
5.92	N/A	N/A	2	100%	11.84	LAVADO DE INCUBADORAS
2.55	N/A	N/A	2	100%	5.10	ASEO INTERNO
45.52	N/A	N/A	2	100%	91.04	UCI NEO INTENSIVO
11.08	N/A	N/A	2	100%	22.16	CENTRAL ENFERMERIA UCI NEO INTENSIVOS
68.09	N/A	N/A	2	100%	136.18	UCI NEO INTERMEDIA
3.84	N/A	N/A	2	100%	7.68	CENTRAL ENFERMERIA UCI NEO INTERMEDIOS
4.78	N/A	N/A	2	100%	9.56	LIBRO CENTRAL LINFUGUE INTERMEDIOS
2.3	N/A	N/A	2	100%	4.60	ESTACION SATELITE Y ARCHIVO
11.24	N/A	N/A	2	100%	22.48	PASILLO HACIA DESCANSO UCI NEO
18.03	N/A	N/A	2	100%	36.06	DESCANSO UCI NEO
4.83	N/A	N/A	2	100%	9.66	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA
5.57	N/A	N/A	2	100%	11.14	LAVADO UCI NEO
4.79	N/A	N/A	2	100%	9.58	WC EN PASILLO HACIA DESCANSO UCI NEO
8.23	N/A	N/A	2	100%	16.46	ESTACION ENFERMERIA DESCANSO + MEDIO POSTERIOR DE VENTRAL ENFERMERIA DE INTENSIVOS
20.14	N/A	N/A	2	100%	40.28	CUARTO DE EQUIPOS
6.77	N/A	N/A	2	100%	13.54	LIMPIEZA UCI NEO
9.56	N/A	N/A	2	100%	19.12	LAVADO INTERNO
7.04	N/A	N/A	2	100%	17.60	PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
2.67	N/A	N/A	2	100%	5.34	LAVADO PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
2.92	N/A	N/A	2	100%	5.84	LIMPIEZA PASILLO VESTIER PERSONAL ASISTENCIAL
6.13	N/A	N/A	2	100%	12.26	INSUMOS TERAPIA RESPIRATORIA
4.38	N/A	N/A	2	100%	8.76	WC MUJERES
6.21	N/A	N/A	2	100%	12.42	WC PAR MUJERES
11.45	N/A	N/A	2	100%	22.90	COORDINACION UCI NEO
11.57	N/A	N/A	2	100%	23.14	ESTIMULACION UCI NEO
5.81	N/A	N/A	2	100%	11.62	WC VESTIER
24.14	N/A	N/A	2	100%	48.28	SALA ESPERA BASE
4.05	N/A	N/A	2	100%	8.10	PACS
9.48	N/A	N/A	2	100%	18.96	PASILLO HACIA AREAS VESTIER AUTOCLAVE
4.51	N/A	N/A	2	100%	9.02	WC EN PASILLO HACIA VESTIER AUTOCLAVE
4.05	N/A	N/A	2	100%	8.10	VESTIER AUTOCLAVE
9.81	N/A	N/A	2	100%	19.62	ESTIBA AUTOCLAVE
11.93	N/A	N/A	2	100%	23.86	WC PAR HOMBRE + INGRESO UCI
3.03	N/A	N/A	2	100%	7.06	ROPA SUCIA VENTANA DE RECUPERACION PARTOS
5.46	N/A	N/A	2	100%	14.92	ESTACION ENFERMERIA CUARTO DE LA TABLA RECUPERACION PARTOS
11.27	N/A	N/A	2	100%	82.44	TRABAJO PARTO CENTRAL DE ENFERMERIA
5.77	N/A	N/A	2	100%	15.54	WC TRABAJO PARTO
6.09	N/A	N/A	2	100%	11.72	LIBRERIA FRENTE CENTRAL DE ENFERMERIA DE RECUPERACION PARTOS
9.29	N/A	N/A	2	100%	11.10	ENFERMERIA CENTRAL LINEA DE RECUPERACION PARTO
5.9	N/A	N/A	2	100%	13.80	LIBRO CENTRAL FRENTE DE RECUPERACION PARTOS
5.42	N/A	N/A	2	100%	10.84	WC RECUPERACION PARTO
3.7	N/A	N/A	2	100%	8.40	WC 2 RECUPERACION PARTO
3.78	N/A	N/A	2	100%	7.56	DEP ROPA SUCIA UCI NEO
9.53	N/A	N/A	2	100%	11.28	LIBRO UCI NEO
7.23	N/A	N/A	2	100%	14.46	WC UCI NEO AISLADO 06



55 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CLINIICA MARTERNO INFANTIL



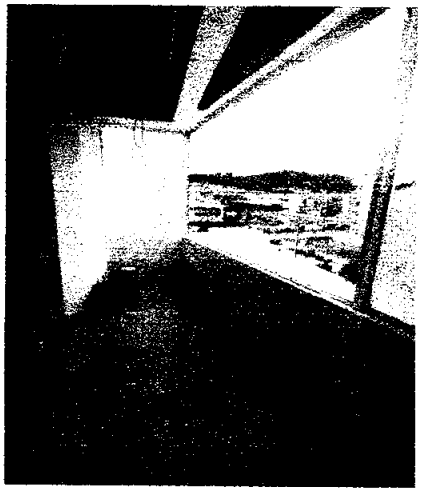

5.19	N/A	N/A	2	100%	13.58	PAS LATERAL DERECHO
5.46	N/A	N/A	2	100%	16.72	PAS LATERAL DERECHO
5.64	N/A	N/A	2	100%	16.66	EQUIPOS, FRENTE DARIA 09
1.18	N/A	N/A	2	100%	6.46	ASEO FRENTE DARIA 09
1.82	N/A	N/A	2	100%	9.79	T. MAL 09, CENTRAL DE ENFERMERIA FRENTE A DARIA 09
		PISO 1				
29.73	N/A	N/A	2	100%	97.46	AUDITORIO
24.16	N/A	N/A	2	100%	78.32	CAFETERIA
1.04	N/A	N/A	2	100%	3.29	
26.00	N/A	N/A	2	100%	40.12	COCINA
23.12	N/A	N/A	2	100%	76.74	SALA ESPERA RADIOTERAPIA
23.20	N/A	N/A	2	100%	44.60	RECEPCION MEDICAMENTO FARMACIA
29.27	N/A	N/A	2	100%	56.58	FARMACIA
45.72	N/A	N/A	2	100%	99.46	EQUIPOS LABORATORIO
25.11	N/A	N/A	2	100%	56.66	CITOHISTOLOGIA Y LOQUIFILTRACION LABORATORIO
9.94	N/A	N/A	2	100%	19.88	NEVERAS LABORATORIO
13.51	N/A	N/A	2	100%	27.02	DISTRIBUCION GENERAL LABORATORIO
19.14	N/A	N/A	2	100%	37.28	RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS RECEPCION LABORATORIO
7.99	N/A	N/A	2	100%	11.82	PASILLO LABORATORIO
13.09	N/A	N/A	2	100%	22.12	TOMA DE MUESTRA URGENCIAS
16.69	N/A	N/A	2	100%	33.35	TOMA DE MUESTRA
10.47	N/A	N/A	2	100%	20.94	PASILLO SUR IMAGENOLOGIA
7.73	N/A	N/A	2	100%	13.46	PASILLO NORTE IMAGENOLOGIA
9.33	N/A	N/A	2	100%	18.66	SALA DE ESPERA ECOGRAFIA
20.86	N/A	N/A	2	100%	40.72	ECOGRAFIA 1
15.15	N/A	N/A	2	100%	30.30	ECOGRAFIA 2
14.64	N/A	N/A	2	100%	29.28	ADMISIONES PASILLAMIENTO
17.82	N/A	N/A	2	100%	35.64	PROYECCION RX CARDIACA
12.19	N/A	N/A	2	100%	24.38	CONSULTORIO CARDIOLOGIA
20.00	N/A	N/A	2	100%	40.00	SALA DE ESPERA RX CONSULTORIO
11.29	N/A	N/A	2	100%	22.58	CIRCULACION RX
9.09	N/A	N/A	2	100%	18.18	CIRCULACION IMAGENOLOGIA
34.47	N/A	N/A	2	100%	68.34	OBSERVACION PEDIATRICA
23.41	N/A	N/A	2	100%	46.82	CENTRAL DE ENFERMERIA
7.78	N/A	N/A	2	100%	15.56	DISPAO
16.26	N/A	N/A	2	100%	32.52	T.A.C.
11.18	N/A	N/A	2	100%	20.96	OFICINA RADIOLOGIA / DIRECCION TEC
9.48	N/A	N/A	2	100%	19.06	SALA LECTURA RADIOLOGIA
2.73	N/A	N/A	2	100%	5.46	CIRCULACION FRENTE SALA LECTURA
3.95	N/A	N/A	2	100%	7.90	RESIDUO ORDINARIO Y RECICLABLE
1.50	N/A	N/A	2	100%	2.99	RESIDUOS PELIGROSOS
15.16	N/A	N/A	2	100%	30.32	SALA ESPERA
18.74	N/A	N/A	2	100%	37.48	DIRECCION
3.49	N/A	N/A	2	100%	7.38	ROPA SUCIA
4.65	N/A	N/A	2	100%	9.29	EQUIPOS
13.83	N/A	N/A	2	100%	21.66	UPS
9.37	N/A	N/A	2	100%	18.14	CIRCULACION LENCERIA DE ENFERMERIA ERA
10.56	N/A	N/A	2	100%	6.41	DIRECCION URGENCIAS
13.06	N/A	N/A	2	100%	7.84	PROCEDIMIENTOS ASEPTICOS
11.05	N/A	N/A	2	100%	8.31	SALA DE TECNOS
13.1	N/A	N/A	2	100%	7.98	CONSULTORIO 5
26.04	N/A	N/A	4	100%	16.13	MONITOREO GENERAL ASISTENCIAL
13.56	N/A	N/A	2	100%	8.74	CONSULTORIO 2
14.67	N/A	N/A	4	100%	8.74	CONSULTORIO 1
14.96	N/A	N/A	2	100%	9.92	CONSULTORIO 4
17.4	N/A	N/A	2	100%	9.28	CONSULTORIO 3
21.4	N/A	N/A	2	100%	12.72	PLANIFICACION
28.22	N/A	N/A	2	100%	16.94	CIRCULACION URGENCIAS
4.71	N/A	N/A	2	100%	9.42	PASILLO URGENCIAS
9.7	N/A	N/A	2	100%	19.40	TRIAGE 1
12.72	N/A	N/A	2	100%	25.44	CIRCULACION TRIAGE Y SILLAS DE RUEDAS
11.13	N/A	N/A	2	100%	22.26	TRIAGE 2
47.32	N/A	N/A	2	100%	94.64	SALA DE ESPERA ADULTOS
31.27	N/A	N/A	2	100%	62.54	CERRAMIENTO DE LA ESPERA URGENCIAS A FRENTE PRINCIPAL
		PISO 4				
16.11	N/A	N/A	2	100%	32.22	HABITACION 404
16.67	N/A	N/A	2	100%	33.34	HABITACION 405
16.02	N/A	N/A	2	100%	32.14	HABITACION 406
16.22	N/A	N/A	2	100%	32.44	HABITACION 407
41.13	N/A	N/A	2	100%	62.26	PASILLO HOSPITALIZACION PISO 4
10.49	N/A	N/A	4	100%	20.98	CIRCULACION + ACCESO
8.13	N/A	N/A	2	100%	16.26	PASILLO SALIDA DE EMERGENCIA
17.91	N/A	N/A	2	100%	35.26	HALL
12.61	N/A	N/A	2	100%	25.61	BAR
19.72	N/A	N/A	2	100%	37.44	CENTRAL DE ENFERMERIA
25.46	N/A	N/A	2	100%	50.92	PASILLO CIRCULACION HOSPITALIZA
11.12	N/A	N/A	2	100%	22.64	PROCEDIMIENTOS
10.13	N/A	N/A	2	100%	20.26	DESCANSO MEDICO
8.48	N/A	N/A	2	100%	16.96	HABITACION 403
16.01	N/A	N/A	2	100%	32.02	HABITACION 402
8.55	N/A	N/A	2	100%	17.10	WC HABITACION 402
16.55	N/A	N/A	2	100%	33.10	HABITACION 401
8.63	N/A	N/A	2	100%	17.26	WC HABITACION 401
21.49	N/A	N/A	2	100%	42.98	HABITACION 409
8.17	N/A	N/A	2	100%	8.34	WC HABITACION 408
16.41	N/A	N/A	2	100%	32.66	HABITACION 410
8.56	N/A	N/A	2	100%	17.12	WC HABITACION 410
4.68	N/A	N/A	2	100%	9.34	PROCEDIMIENTOS
3.93	N/A	N/A	2	100%	8.60	WC DESCANSO
16.16	N/A	N/A	2	100%	32.32	HABITACION 411
8.38	N/A	N/A	2	100%	16.76	WC HABITACION 411
24.19	N/A	N/A	2	100%	48.33	PUESTO DE TRABAJO ENFERMERIA
15.61	N/A	N/A	2	100%	31.87	
8.22	N/A	N/A	2	100%	16.44	PASILLO HABITACIONES 411
8.57	N/A	N/A	2	100%	14.54	BAÑO PISO 4

OBSERVACIONES:


	TOTAL	4.983,23 Metro lineal
	ACUMULADO ANTERIOR	0,00 Metro lineal
	PRESENTE ACTA	4.983,23 Metro lineal


Elaboró contratista:	Estefanía Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:


PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 27	FAJA PAÑETE LISO MUROS 1:4	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotografico

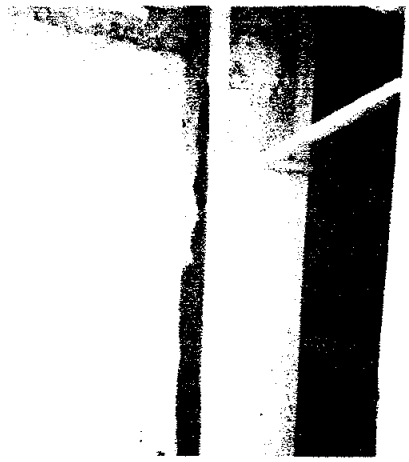


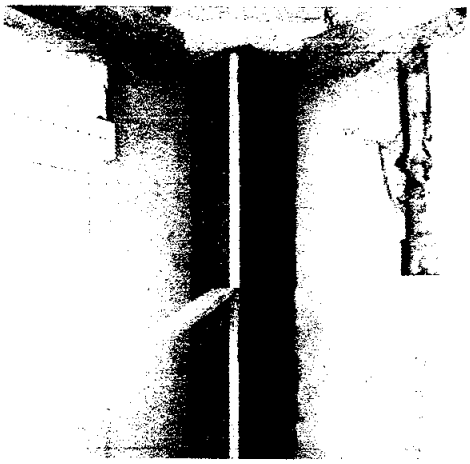



Dimensiones L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
		SOTANO				
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	CUARTO ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	BAÑO
N/A	1.55	2.1	1	100%	5.75	CIRCULACION ARCHIVO
		PRIMER PISO				
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	VESTIER IAC
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	OBSERVACION GINECOPSTETRICIA INTERNA
N/A	0.9	2.1	1	100%	5.1	BAÑO MIXTO SALA ESPERA
N/A	0.9	2.1	1	100%	5.1	BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA SALA DE ESPERA
		SEGUNDO PISO				
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	U.R.O INCAPACIDADES
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	W.C
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	TRABAJO SUCIO
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	ASEO
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	DEP ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	FILTRO ACCESO FAMILIARES U.R.O
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	FILTRO ACCESO U.R.O
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	RACK
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	ACCESO BAÑO
N/A	1	2.1	1	100%	5.4	VESTIER PASIENTES
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	ASEO
N/A	0.9	2.1	1	100%	5.1	W.C.H.INCAPACIDADES
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	DUCTO
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	DESCANSO
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	TRABAJO SUCIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	BAÑO RECUPERACION SALA DE PARTOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	BAÑO EN TRABAJO DE PARTOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	BODEGA
		TERCER PISO				
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	301 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	301 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	302 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	302 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	303 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	303 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	304 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	304 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	305 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	305 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	306 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	306 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	307 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	307 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	308 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	308 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	309 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	309 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	310 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	310 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	311 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	311 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	312 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	312 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	313 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	313 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	314 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	314 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	315 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	315 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	316 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	316 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	317 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	317 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	318 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	318 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	319 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	319 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	320 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	320 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	321 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	321 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	322 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	322 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	323 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	323 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	324 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	324 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	325 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	325 BAÑO
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	TRABAJO SUCIO
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	ROPA LIMPIA
N/A	1.4	2.1	1	100%	5.6	PROCEDIMIENTO
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	DESCANSO Y VESTIER
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	DEP RESIDUOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	DEP RESIDUOS PELIGROSOS
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	W.C. M
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	W.C. H
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	DUCTO
		CUARTO PISO				
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	101 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	401 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	402 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	402 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	403 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	103 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	404 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	404 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	405 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	405 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	406 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	406 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	407 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	407 BAÑO



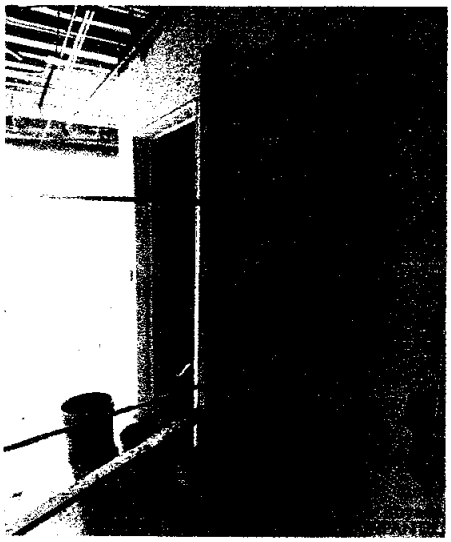

N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	408 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	408 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	409 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	409 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	410 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	410 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	411 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	411 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	412 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	412 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	413 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	413 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	414 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	414 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	415 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	415 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	416 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	416 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	417 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	417 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	418 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	418 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	419 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	419 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	420 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	420 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	421 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	421 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	422 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	422 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	423 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	423 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	424 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	424 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	5.4	425 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	5.1	425 BAÑO
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	TRABAJO SUCIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	ROPA LIMPIA
N/A	1.4	2.1	1	100%	5.6	PROCEDIMIENTO
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	DECANSO Y VESTIER
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	DEP RESIDUOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	4.9	DEP RESIDUOS PELIGROSOS
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	W.C. M
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	W.C. H
N/A	0.8	2.1	1	100%	5	DUCTO

OBSERVACIONES:


TOTAL	789.85 Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	623.45 Metro lineal
PRESENTE ACTA	166.40 Metro lineal

Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 28	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	CAP	10,00

Registro fotografico

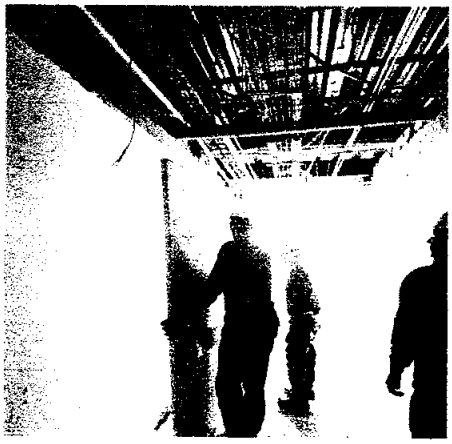







ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro cuadrado		UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL
Dimensiones					
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
SOTAÑO						
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	CUARTO ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	BAÑO
N/A	1.55	2.1	1	100%	3.255	CIRCULACION ARCHIVO
PRIMER PISO						
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	VESTIER TAC
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	OBSERVACION GINECOOBSTETRICIA INTERNA
N/A	0.9	2.1	1	100%	1.89	BAÑO MIXTO SALA ESPERA
N/A	0.9	2.1	1	100%	1.89	BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA SALA DE ESPERA
SEGUNDO PISO						
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	U.R.O INCAPACIDADES
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	W.C
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO SUCIO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ASEO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	DEP ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	FILTRO ACCESO FAMILIARES U.R.O
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	FILTRO ACCESO U.R.O
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	RACK
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	ACCESO BAÑO
N/A	1	2.1	1	100%	2.1	VESTIER PACIENTES
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ASEO
N/A	0.9	2.1	1	100%	1.89	W.C (INCAPACIDADES)
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DUCTO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DESCANSO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO SUCIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	BAÑO RECUPERACION SALA DE PARTOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	BAÑO EN TRABAJO DE PARTOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	AMBIENTE DE TRABAJO ESTERIL
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	BODEGA
TERCER PISO						
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	301 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	301 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	302 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	302 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	303 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	303 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	304 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	304 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	305 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	305 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	306 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	306 BAÑO
N/A	1.2	2.1	4	100%	10.08	307 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	307 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	308 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	308 BAÑO
N/A	1.2	2.1	4	100%	10.08	309 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	309 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	310 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	310 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	311 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	311 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	312 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	312 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	313 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	313 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	314 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	314 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	315 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	315 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	316 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	316 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	317 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	317 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	318 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	318 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	319 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	319 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	320 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	320 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	321 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	321 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	322 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	322 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	323 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	323 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	324 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	324 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	325 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	325 BAÑO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	TRABAJO SUCIO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ROPA LIMPIA
N/A	1.4	2.1	1	100%	2.94	PROCEDIMIENTO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DESCANSO Y VESTIER
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	UBI RESIDUOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	DEP RESIDUOS PELIGROSOS
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	W.C M
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	W.C H
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DUCTO
CUARTO PISO						
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	401 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	401 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	402 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	402 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	403 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	403 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	404 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	404 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	405 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	405 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	406 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	406 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	407 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	407 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	408 ENTRADA HABITACION





N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	408 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	409 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	409 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	410 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	410 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	411 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	411 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	412 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	412 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	413 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	413 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	414 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	414 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	415 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	415 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	416 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	416 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	417 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	417 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	418 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	418 BAÑO
N/A	1.2	8	1	100%	9.6	419 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	419 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	420 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	420 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	421 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	421 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	422 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	422 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	423 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	423 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	424 ENTRADA HABITACION
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	424 BAÑO
N/A	1.2	2.1	1	100%	2.52	425 ENTRADA HABITACION
N/A	0.9	2.1	1	100%	1.89	425 BAÑO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	TRABAJO LIMPIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	TRABAJO SUCIO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	ROPA LIMPIA
N/A	1.4	2.1	1	100%	2.94	PROCEDIMIENTO
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ASEO
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DECANSO Y VESTIER
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	ROPA SUCIA
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	DEP RESIDUOS
N/A	0.7	2.1	1	100%	1.47	DEP RESIDUOS PELIGROSOS
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	W.C. M
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	W.C. H
N/A	0.8	2.1	1	100%	1.68	DUCTO

OBSERVACIONES:

TOTAL	322.61 Metro cuadrado
ACUMULADO ANTERIOR	240.77 Metro cuadrado
PRESENTE ACTA	81.84 Metro cuadrado


Elaboró contratista:	Estefania Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO L DIAM: 2". INCLUYE ACCESORIOS.	CAP	10.00

Registro fotográfico








ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Metro lineal		UBICACIÓN	UNI SAN RAFAEL
Dimensiones					
L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%	Total (m)	Observaciones
ENTREPISOS						
VACIO						
6.7	N/A	N/A	1	100%	6.7	Red de distribución central de vacio de 2 piso a piso 4 - POR BU TRON
PISO 1						
VACIO						
7.35	N/A	N/A	1	100%	7.35	LAVADO DE PACIENTES A ACCESO PASILLO URGENCIAS RED PRENCIPAL DE TANQUE
14.15	N/A	N/A	1	100%	14.15	PASILLO FRENTE A CONSULTORIO N°5 A CAJA C. DE PASILLO HACIA FARMACIA; PRINCIPAL
5.5	N/A	N/A	1	100%	5.5	PRINC PAL PASILLO URG - SUBE POR BUITRÓN DE PISO 1 A 2 FRENTE A CONSULTORIO N°5
PISO 2						
VACIO						
4.87	N/A	N/A	1	100%	4.87	PR NC PAL ENTRE CAJA 5G DE QUIRÓFANO 3 A 2
6.76	N/A	N/A	1	100%	6.76	PR NC PAL ENTRE CAJA 5G DE QUIRÓFANO 2 A 1
5.31	N/A	N/A	1	100%	5.31	PR NC PAL FRENTE A QUIRÓFANO A A PRINCIPAL PASILLO TRABAJO DE PARTO
19.8	N/A	N/A	1	100%	19.8	PR NC PAL PASILLO TRABAJO DE PARTO
8.92	N/A	N/A	1	100%	8.92	PR NC PAL: DE RESIDUOS ORDINARIOS A CAJA 3G DE UCI UARO
4.05	N/A	N/A	1	100%	4.05	PASILLO DE UCI UARO A UCI NEO
4.02	N/A	N/A	1	100%	4.02	
2.36	N/A	N/A	1	100%	2.36	ENTRADA A UCI NEO INTENSIVOS DESDE UCI UARO
2	N/A	N/A	1	100%	2	PR NC PAL DE PASILLO RECUPERACIÓN PARTOS A BU TRON DETRÁS DE CUARTO ASEO DE RECUPERACIÓN PARTOS

OBSERVACIONES:

TOTAL	91.59	Metro lineal
ACUMULADO ANTERIOR	81.73	Metro lineal
PRESENTE ACTA	9.86	Metro lineal

Elaboró contratista:	Estefanie Carvajal Henao	FIRMA:
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA:

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA										
ITEM	NP 31	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN BRONCE DIAM 2"	CAP	10.00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Unidad			UBICACION	UMI SAN RAFAE
Registro fotografico					Dimensiones					Total (m)	Observaciones
					L (m)	A (m)	h (m)	Cantidad	%		
					PISO 4						
					N/A	N.A	N/A	1	100%	1.00	CIRCULACION DE HALL A HOSPITALIZACION
					PISO 2						
					N/A	N.A	N/A	1	100%	1.00	PASILLO RECUPERACION (VACIO)

OBSERVACIONES:

TOTAL	2.00	Unidad
ACUMULADO ANTERIOR	1.00	Unidad
PRESENTE ACTA	1.00	Unidad

Elaboro contratista:	Esteforia Carvajal Henao	FIRMA
Aprobó Interventoria:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA


PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

ITEM	NP 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE [illegible] DIMENSIONES [illegible] INCLUYE [illegible] CUELLOS, CORREAS, VARILLA, [illegible] SELLANTE, [illegible] TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	CAP	10,00	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD	Kilogramo	UBICACIÓN	UMI SAN RAFAEL

Registro fotográfico







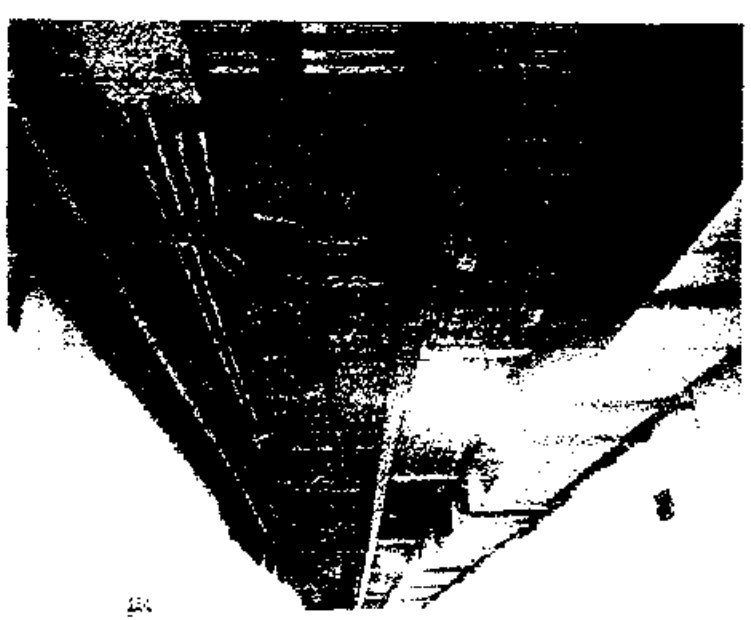




l (m)	A (pulgadas)	b (pulgadas)	Cantidad	No de pestañas	Calibre	peso x m2 (kg)	Total (KG)	Elemento	Observaciones
PISO 1									
SISTEMA DE SUMINISTRO (1)									
[illegible]	22	12	10	2	24	4.69	90.53	DUCTO	Sobre equipos, sala de yesos, [illegible] hall principal y sala de espera
0.7	22	12	1	2	24	4.69	5.40	[illegible]	
1.13	22	12	3	2	24	4.69	25.65	DUCTO	
0.21	22	12	1	2	24	4.69	[illegible]	[illegible]	
0.92	22	12	3	2	24	4.69	18.71	CODOS	
0.52	22	12	1	2	24	4.69	[illegible]	[illegible]	
1.13	22	12	10	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	[illegible]	12	1	2	24	4.69	4.94	[illegible]	
0.20	12	22	1	2	24	4.69	2.76	CURVA	
0.74	12	22	1	2	24	4.69	6.72	DUCTO	Circulación
0.7	12	22	1	2	24	4.69	6.49	CODOS	
1.14	12	22	5	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	Farmacia
0.35	12	22	1	2	24	4.69	3.21	DUCTO	
0.13	11.5	7	1	2	24	4.69	0.97	ZAPATO	
[illegible]	[illegible]	7	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
1.13	8	7	1	2	24	4.69	4.63	DUCTO	
0.3	[illegible]	7	1	2	24	4.69	1.40	DUCTO	
0	9	7	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.14	11	6	1	2	24	4.69	0.84	ZAPATO	
0.07	9	5	1	2	24	4.69	0.70	ZAPATO	
0.3	6	5	1	2	24	4.69	1.07	DUCTO	
0	6	5	1	2	24	4.69	0.46	TAPA	
0.13	11	5	1	2	24	4.69	0.91	ZAPATO	
0.12	8	5	1	2	24	4.69	1.42	ZAPATO	
0.72	6	5	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	5	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.12	21	12	1	2	24	4.69	4.00	TRANSICIÓN	
1.13	21	12	4	2	24	4.69	47.21	DUCTO	
0	21	12	1	2	24	4.69	1.18	TAPA	
0.12	11.5	9	1	2	24	4.69	1.03	ZAPATO	
[illegible]	9	9	1	2	24	4.69	0.73	ZAPATO	
0.4	9	9	1	2	24	4.69	2.36	DUCTO	
0.2	9	9	1	2	24	4.69	1.57	REDUCCIÓN	
0.2	6	9	1	2	24	4.69	1.04	DUCTO	
1.13	6	9	2	2	24	4.69	8.72	DUCTO	
0.47	6	9	1	2	24	4.69	1.55	DUCTO	
0.42	6	7	1	2	24	4.69	1.40	CODO	
0	5	2	1	2	24	4.69	0.16	TAPA	
0.12	11.5	6	1	2	24	4.69	1.23	ZAPATO	
1.13	5	9	1	2	24	4.69	4.79	DUCTO	
0	6	9	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.2	21	10	1	2	24	4.69	2.20	ZAPATO	
1.13	21	10	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	18	10	1	2	24	4.69	4.21	REDUCCIÓN	
1.13	18	10	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.4	17	10	1	2	24	4.69	3.12	REDUCCIÓN	[illegible]
1.13	15	10	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.4	8.5	13	1	2	24	4.69	2.31	REDUCCIÓN	
1.13	7	[illegible]	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.13	11.5	6	[illegible]	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
0.07	7	[illegible]	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
0.8	9	5	2	2	24	4.69	5.94	DUCTO	
0.13	11.5	7	1	2	24	4.69	0.96	ZAPATO	
0.07	9	5	1	2	24	4.69	0.53	ZAPATO	
1.13	5	5	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.6	5	9	1	2	24	4.69	2.30	DUCTO	
0	6	[illegible]	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0	10	7	1	2	24	4.69	0.43	TAPA	
0.2	14.5	13	1	2	24	4.69	1.80	ZAPATO	
0.5	10	14	1	2	24	4.69	4.23	DUCTO	
1.13	10	14	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.3	9	12	1	2	24	4.69	1.93	REDUCCIÓN	
1.13	5	10	2	2	24	4.69	15.46	DUCTO	
0.52	8	9	1	2	24	4.69	2.47	REDUCCIÓN	
1.13	5	5	[illegible]	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	8	8	1	2	24	4.69	2.33	DUCTO	
0.4	8	9	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
1.13	8	5	4	2	24	4.69	15.11	DUCTO	
0.14	5	5	1	2	24	4.69	[illegible]	CODO	
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.13	10.5	5	[illegible]	2	24	4.69	1.42	ZAPATO	
0.07	8	5	[illegible]	2	24	4.69	0.99	ZAPATO	
1.13	5	[illegible]	[illegible]	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.75	5	6	2	2	24	4.69	5.20	DUCTO	
0	5	5	2	2	24	4.69	0.60	TAPA	
0.12	10.5	5	1	2	24	4.69	0.70	ZAPATO	
0.12	6	5	1	2	24	4.69	1.00	ZAPATO	
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.12	11.5	7	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	FARMACIA
0.09	7	7	1	2	24	4.69	4.54	ZAPATO	
1.13	9	7	7	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.5	8	7	7	2	24	4.69	15.41	DUCTO AJUSTE	
0	8	7	7	2	24	4.69	2.80	TAPA	
0.12	14.5	5	7	2	24	4.69	5.43	ZAPATO	
0.12	5	5	7	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
0.9	6	5	7	2	24	4.69	21.46	DUCTO	
0	8	5	7	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0.15	10.5	4	7	2	24	4.69	5.00	ZAPATO	
[illegible]	9	4	7	2	24	4.69	9.41	DUCTO	
1.13	5	4	7	2	24	4.69	24.42	DUCTO	
0	5	4	7		24	4.69	[illegible]	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (2)									
1.12	28	12	10	2	24	4.69	90.91	DUCTO	[illegible] Hall y sala de espera
0.7	28	12	1	2	24	4.69	6.72	[illegible]	
0.32	28	12	2	2	24	4.69	4.37	SEMICODO	
1.13	28	12	1	2	24	4.69	9.30	DUCTO	
0.23	28	12	1	2	24	4.69	2.44	AJUSTE	
0.70	20	12	1	2	24	4.69	[illegible]	[illegible]	
1.13	28	12	3	2	24	4.69	27.90	DUCTO	
0.52	18.5	12	1	2	24	4.69	4.43	REDUCCIÓN	
1.13	12	12	3	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.72	12	12	1	2	24	4.69	[illegible]	AJUSTE	
0.4	12	12	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
1.13	13	12	[illegible]	2	24	4.69	21.20	DUCTO	
0.4	13	12	1	2	24	4.69	[illegible]	AJUSTE	
0.52	13	12	1	2	24	4.69	4.17	CODO	
1.13	13	12	1	2	24	4.69	7.47	DUCTO	
0.5	11	12.5	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
0.13	6	5	1	2	24	4.69	0.58	ZAPATO	
0.07	12	4	1	2	24	4.69	[illegible]		[illegible]
1.13	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0.13	14.5	5	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
0.07	12	5	1	2	24	4.69	0.56		
1.13	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.2	12	5	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.13	14.5	5	1	2	24	4.69	1.02	ZAPATO	
0.07	12	5	1	2	24	4.69	[illegible]		
1.13	12	5	1	2	24	4.69	4.94	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.4	14.5	9	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
1.13	5	7	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	5	5	1	2	24	4.69	0.44	TAPA	
[illegible]	10	4	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	BAÑO SALA ESPERA
0.52	10	4	2	2	24	4.69	4.07	DUCTO	
0	10	4	[illegible]	2	24	4.69	1.24	TAPA	
0.12	17	4	1	2	24	4.69	0.78	ZAPATO	DESCANSO ASISTENCIAL
0.4	6	4	1	2	24	4.69	1.40	ZAPATO	
1.13	5	4	3	2	24	4.69	10.46	DUCTO	
0.5	7	4	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
1.13	5	4	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0	5	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.12	12.5	4	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	[illegible]
0.13	10	4	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
1.13	10	8	2	2	24	4.69	12.55	DUCTO	
0.13	10.5	4	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
0.4	9	4	1	2	24	4.69	1.40	ZAPATO	
0	5	4	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0.4	10	7	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
0.52	5	10	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	9.5	7	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
[illegible]	5	7	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
1.13	5	8	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	

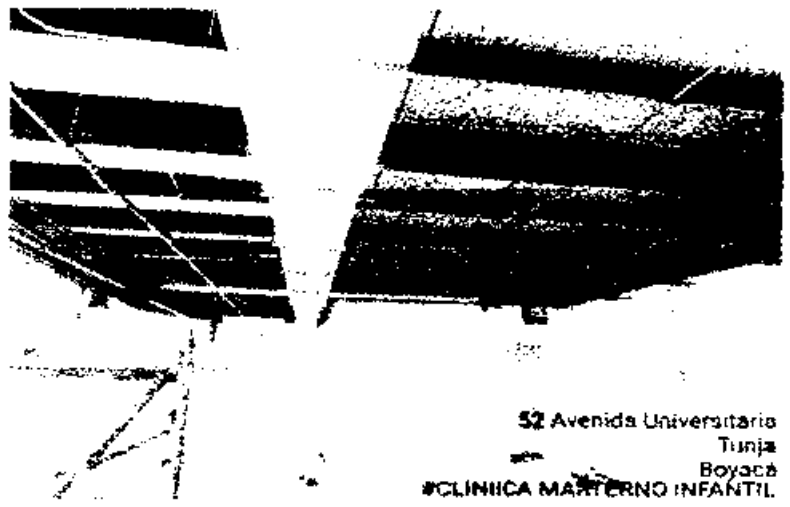

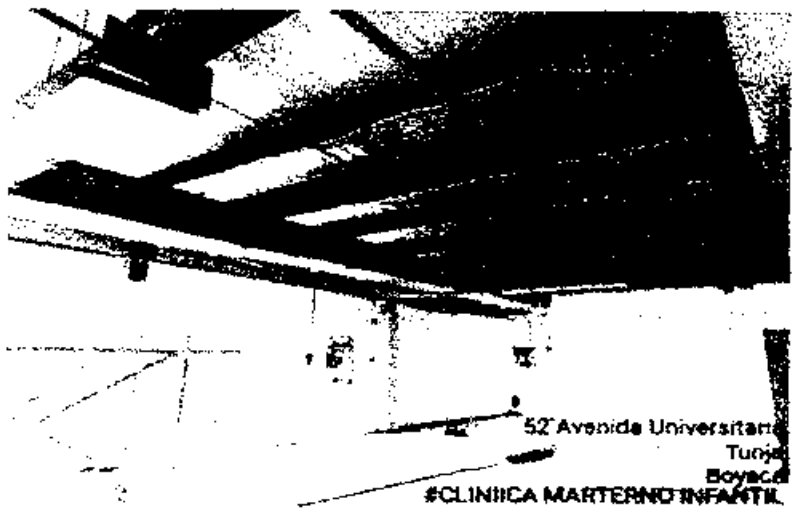


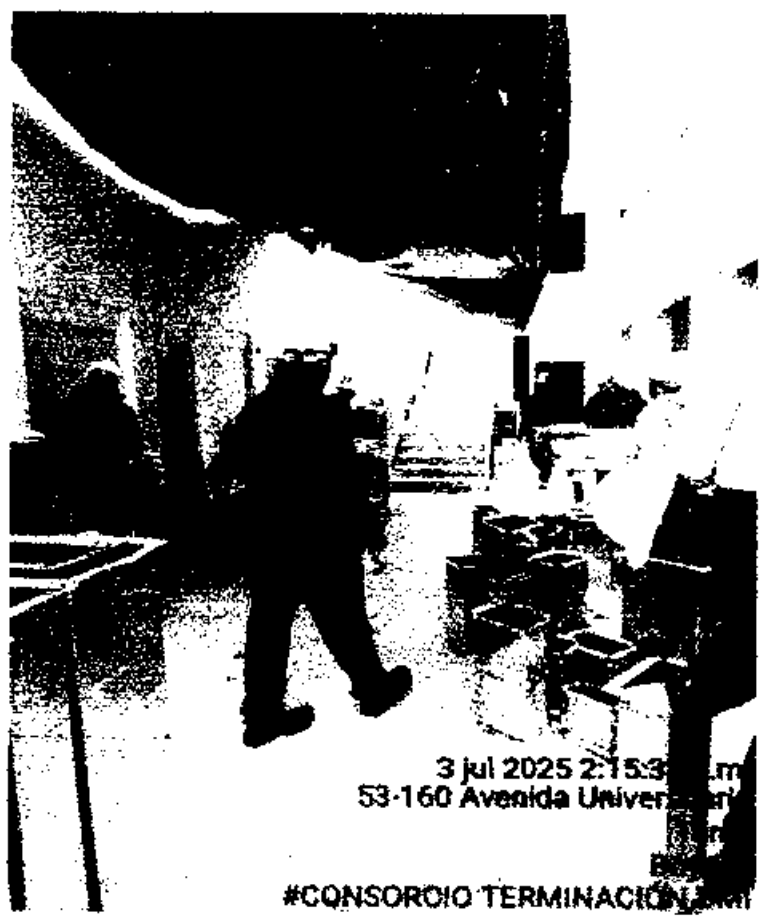







0	6	9	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0.14	11	4	1	2	24	4.69	0.96	ZAPATO	
0.4	6	4	1	2	24	4.69	1.40	ZAPATO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.16	TAPA	
0.15	6	4	1	2	24	4.69	0.68	ZAPATO	
0.07	6	4	1	2	24	4.69	0.61	ZAPATO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.65	6	6	1	2	24	4.69	1.13	DUCTO	
0.4	5	6	1	2	24	4.69	1.57	CODO	
1.13	9	6	2	2	24	4.69	8.14	DUCTO	CONSULTORIO 4 Y 5
0.25	5	6	1	2	24	4.69	1.17	DUCTO	
	6	6	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
1.13	6	6	1	2	24	4.69	8.14	DUCTO	
0	6	6	1	2	24	4.69	0.10	TAPA	
0.2	11.5	6	2	2	24	4.69	2.09	ZAPATO	
1.14	9	5	2	2	24	4.69	8.14	DUCTO	SALA ESPERA
0.94	9	5	2	2	24	4.69	6.07	DUCTO	
0	9	5	2	2	24	4.69	0.65	TAPA	
0.15	11.5	6	1	2	24	4.69	1.00	ZAPATO	
0.09	9	4	1	2	24	4.69	0.56	ZAPATO	
1.13	9	6	1	2	24	4.69	4.6	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.76	TAPA	
0.2	9	9	11	1	24	4.69	11.5	CUELLO	
0.14	10.5	5	2	2	24	4.69	1.70	ZAPATO	
0.14	6	5	1	2	24	4.69	0.46	ZAPATO	
SISTEMA DE SUMINISTRO (3)									
1.12	22	12	2	2	24	4.69	19.77	DUCTO	Sobre consultorio 2 y [illegible]
0.52	20.5	11	1	2	24	4.69	4.94	REDUCCION	
1.13	11	10	9	2	24	4.69	75.86	DUCTO	
0.4	10.5	9	1	2	24	4.69	2.90	REDUCCION	
1.13	12	6	1	2	24	4.69	6.39	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4.69	0.63	TAPA	
0.13	12	4	1	2	24	4.69	0.94	ZAPATO	
0.07	9	6	1	2	24	4.69	0.57		
1.13	9	6	3	2	24	4.69	12.04	DUCTO	
0.2	9	6	1	2	24	4.69	1.94	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.13	12	6	1	2	24	4.69	1.04	ZAPATO	Consultorios
0.07	6	6	1	2	24	4.69	0.57		
1.13	6	6	1	2	24	4.69	4.16	DUCTO	
0.9	6	6	1	2	24	4.69	4.54	DUCTO	
0	6	6	1	2	24	4.69	0.76	TAPA	
1.13	12	12	1	2	24	4.69	6.98	DUCTO	
1.13	11	6	2	2	24	4.69	12.75	DUCTO	[illegible]
0.5	11.5	9	1	2	24	4.69	1.41	REDUCCION	
1.13	6	6	1	2	24	4.69	4.41	DUCTO	
0.5	9.5	9	1	2	24	4.69	1.44	REDUCCION	
1.13	6	6	1	2	24	4.69	4.07	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	4.69	3.64	TAPA	[illegible]
1.13	9	6	2	2	24	4.69	6.14	DUCTO	
0.5	9	6	1	2	24	4.69	11.65	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.12	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (4)									
0	12	9	1	2	24	4.69	0.46	TAPA	
1.13	12	9	2	2	24	4.69	10.16	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4.69	4.47	DUCTO	
0.5	12	6	1	2	24	4.69	2.51	CODO	
0.5	9	12	1	2	24	4.69	1.96	REDUCCION	
1.14	12	12	2	2	24	4.69	12.75	DUCTO	
0.72	12	12	1	2	24	4.69	4.24	DUCTO	
0.5	14	12	1	2	24	4.69	1.06	CODO	Sobre consultorios, acceso a urgencias, sala de espera adultos, [illegible]
0.3	11	14	1	2	24	4.69	2.32	REDUCCION	
1.13	16	12	2	2	24	4.69	24.4	DUCTO	
0.52	16	12	1	2	24	4.69	4.36	REDUCCION	
1.13	21	12	11	2	24	4.69	160.41	DUCTO	
4.35	21	12	2	2	24	4.69	4.92	SEMI CODO	
0.52	21	12	1	2	24	4.69	4.90	DUCTO	
0.55	21	12	2	2	24	4.69	17.69	CODO	
0.27	21	12	1	2	24	4.69	2.62	ACOPLE	
1.3	21	12	1	2	24	4.69	15.93	DUCTO	
0.32	11.5	9	2	2	24	4.69	2.46	ZAPATO	CAFETERIA
4.66	12	9	2	2	24	4.69	1.46		
0.71	12	6	1	2	24	4.69	1.16	DUCTO	
0.72	12	9	1	2	24	4.69	3.47	DUCTO	
1.13	12	6	1	2	24	4.69	5.77	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4.69	0.42	TAPA	
0.27	11	12	1	1	24	4.69	16.61	CUELLO	
SISTEMA DE SUMINISTRO (5)									
0.5	15	12	1	2	24	4.69	1.95	CODO	
1.13	14	12	6	2	24	4.69	132.03	DUCTO	
0.52	13	11	1	2	24	4.69	4.21	REDUCCION	
1.13	12	10	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.44	18	10	1	2	24	4.69	4.56	DUCTO	
0.52	15	10	1	2	24	4.69	3.63	REDUCCION	
1.13	12	8	2	2	24	4.69	7.56	DUCTO	
4.52	15	7.5	1	2	24	4.69	2.63	REDUCCION	
1.13	12	6	5	2	24	4.69	44.72	DUCTO	
0.5	12	5	1	2	24	4.69	2.09	CODO	
0.72	12	5	1	2	24	4.69	3.28	ACOPLE	
1.13	18	12	5	2	24	4.69	30.65	DUCTO	
0.3	18	12	1	2	24	4.69	1.36	DUCTO	
0.65	14	12	1	2	24	4.69	3.39	CODO	
0.52	14.5	12	1	2	24	4.69	4.58	REDUCCION	Sobre consultorios, acceso a urgencias, sala de espera adultos, [illegible]
1.13	21	12	3	2	24	4.69	30.72	DUCTO	
0.12	12	6	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO	
0.07	9	6	1	2	24	4.69	0.57		
0.6	9	6	1	2	24	4.69	2.47	DUCTO	
0	6	9	1	2	24	4.69	0.16	TAPA	
0.14	11.5	9	3	2	24	4.69	2.70	ZAPATO	
0.07	9	4	3	2	24	4.69	1.72		
1.13	9	9	4	2	24	4.69	12.07	DUCTO	
0.65	9	9	3	2	24	4.69	10.34	CODO	
0.52	9	9	3	2	24	4.69	6.54	DUCTO	
0	9	6	3	2	24	4.69	1.01	TAPA	
0.12	12	9	3	2	24	4.69	2.90	ZAPATO	
0.07	9	6	3	2	24	4.69	1.72		
0.12	9	6	3	2	24	4.69	6.54	DUCTO	
0	9	6	2	2	24	4.69	1.00	TAPA	
0.15	12	12	1	1	24	4.69	1.34	cuello linea 5	
0.21	9	9	1	1	24	4.69	1.09	cuello linea 5	
SISTEMA DE SUMINISTRO (6)									
1.13	22	12	1	2	24	4.69	9.60	DUCTO	
0.3	22	12	1	2	24	4.69	1.16	CODO	
0.13	22	12	1	2	24	4.69	2.11	ACOPLE	
1.13	22	12	2	2	24	4.69	16.77	DUCTO	
1.13	22	12	3	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
4.52	22	12	1	2	24	4.69	4.84	REDUCCION	
0.4	22	12	1	2	24	4.69	4.07	DUCTO	
1.13	22	11	2	2	24	4.69	19.18	DUCTO	Sobre [illegible], [illegible] a urgencias, sala de espera adultos
0.4	16	10	1	2	24	4.69	2.12	REDUCCION	
1.13	13	10	2	2	24	4.69	14.54	DUCTO	
0.36	16	10	1	2	24	4.69	1.31	DUCTO	
0	11	10	1	2	24	4.69	0.53	TAPA	
0.12	12	11	1	2	24	4.69	5.80	[illegible] ZAPATO	
0.5	22	11	1	2	24	4.69	7.90	ZAPATO PARTE RECTA	
0.12	9	6	3	2	24	4.69	3.80	ZAPATO	Sala de espera urgencias
0.28	9	6	3	2	24	4.69	3.92		
0.2	9	6	1	2	24	4.69	1.94	DUCTO	
0.52	9	6	3	2	24	4.69	6.54	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	1.09	TAPA	
1.13	12	12	10	2	24	4.69	[illegible]	[illegible]	
0.26	9	9	1	1	24	4.69	5.76	cuello	
0.25	10.5	4	1	4	24	4.69	0.81	ZAPATO	
0.07	5	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO	
0.52	6	4	1	2	24	4.69	1.34	DUCTO	CONSULTORIO TRIAGE 1
1.13	6	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0.38	6	6	1	1	24	4.69	1.62	CUELLO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.29	TAPA	
0.52	15.5	6	1	2	24	4.69	3.42	REDUCCION	
1.13	9	4	5	2	24	4.69	7.74	DUCTO	
0.36	9	4	1	2	24	4.69	4.30	CODO	
0	9	4	1	2	24	4.69	0.29	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (7)									
1.13	18	12	3	2	24	4.69	25.16	DUCTO	
0.13	11.5	6	1	2	24	4.69	0.90	ZAPATO	
0.07	6	9	1	2	24	4.69	0.57		
1.13	6	9	1	2	24	4.69	3.16	DUCTO	[illegible]
0	6	9	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.52	16	12	1	2	24	4.69	4.34	REDUCCION	
1.13	15	12	1	2	24	4.69	7.63	DUCTO	
0.2	15	12	1	2	24	4.69	1.97	[illegible]	Circulación
0.35	15	12	1	2	24	4.69	4.02		

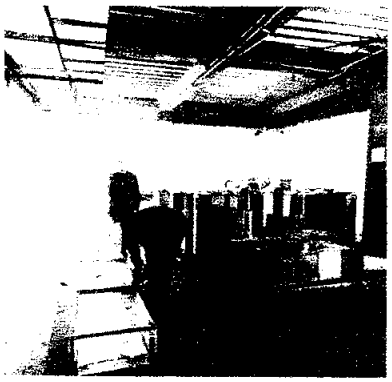


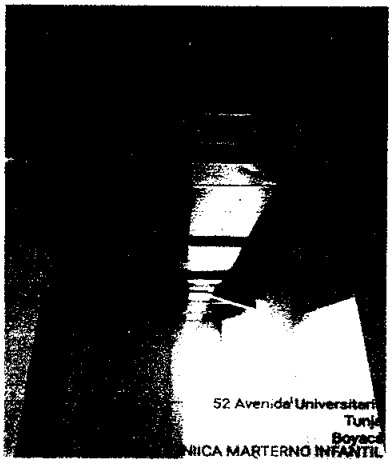
52 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
NICA MARTERNO INFANTIL






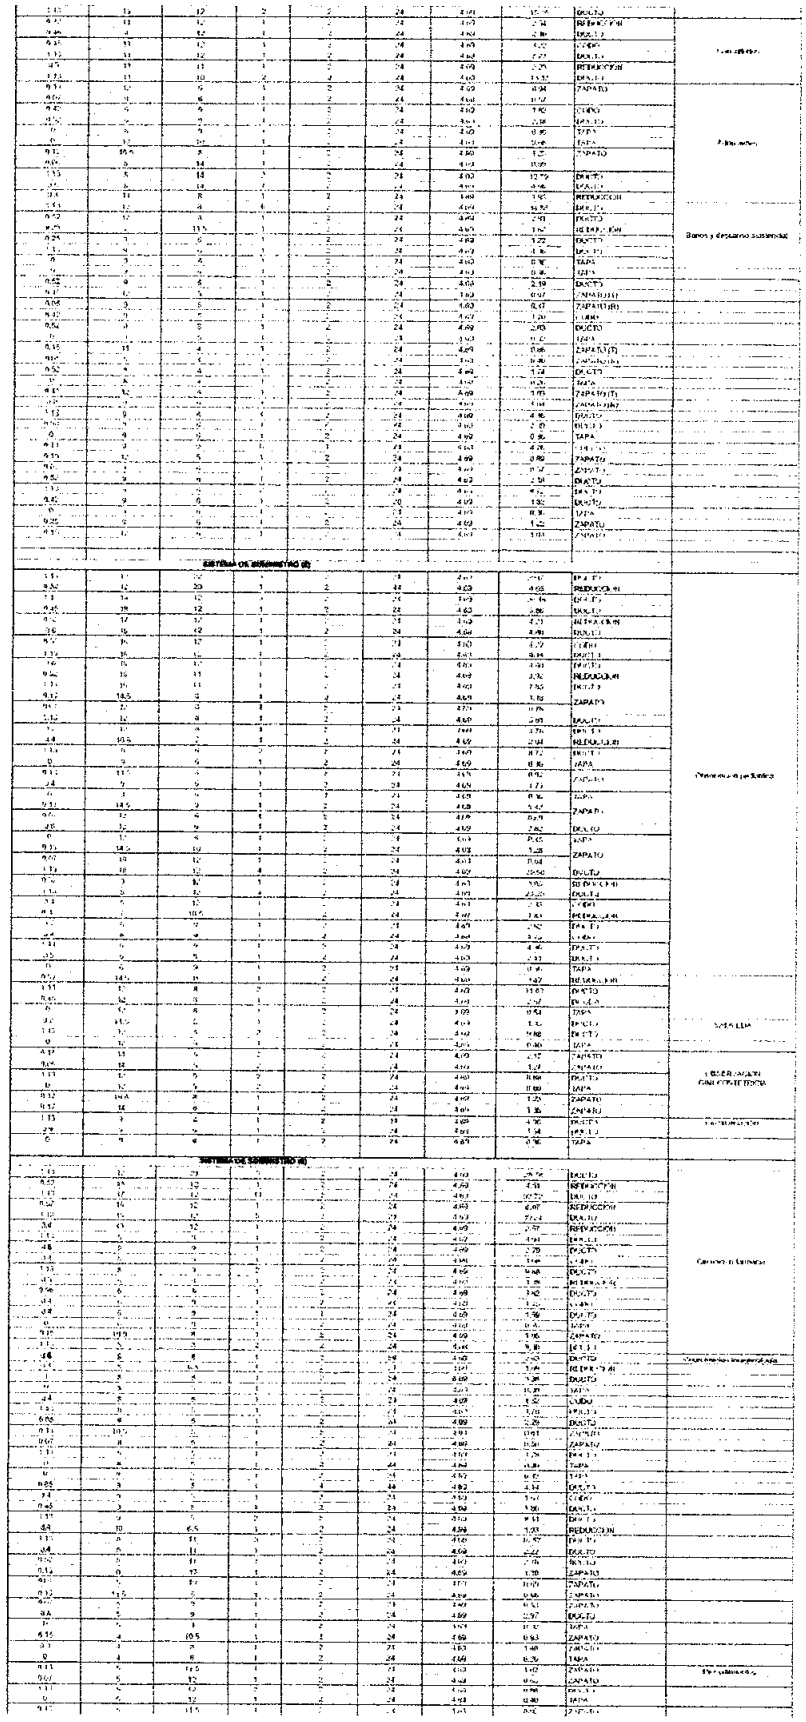


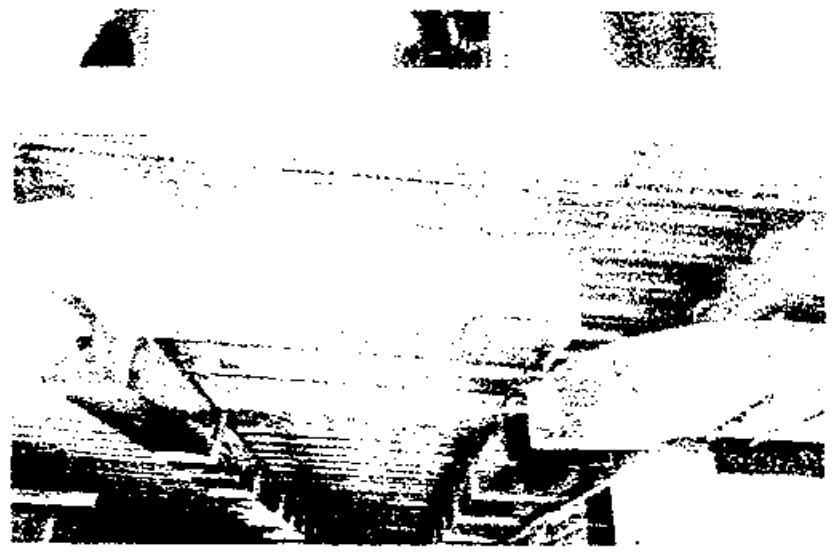




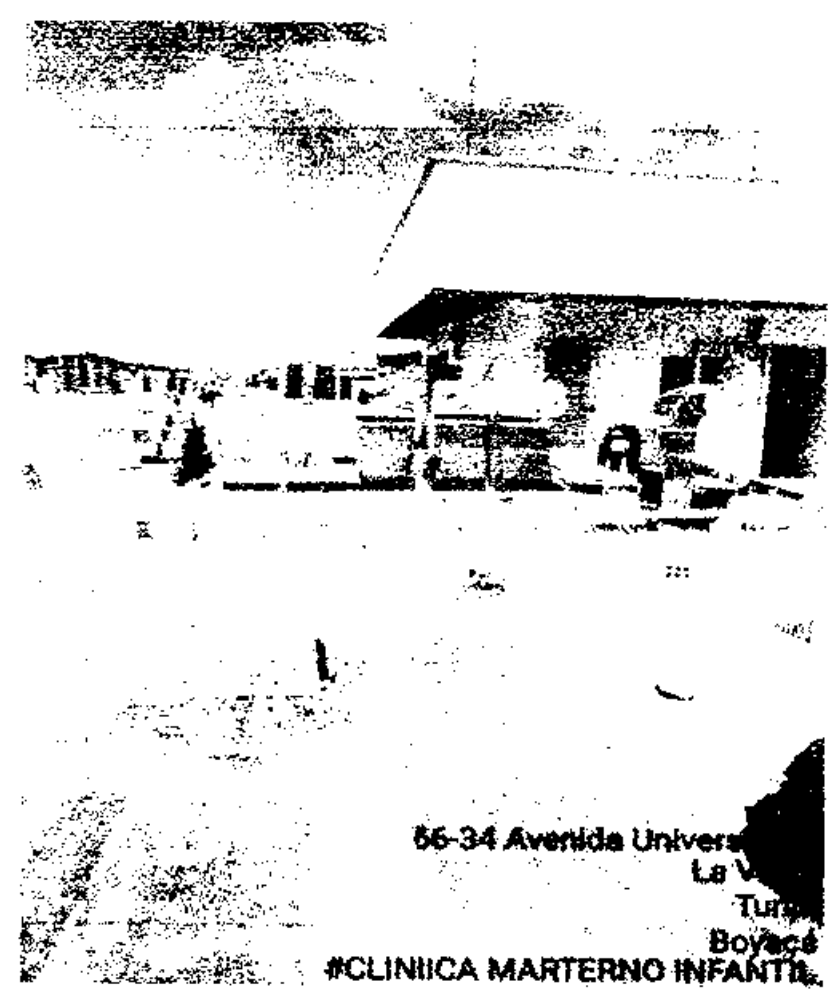




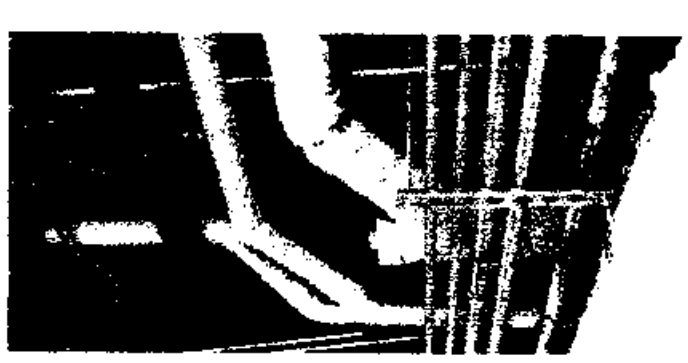

[illegible]	6	2	1	2	24	[illegible]	[illegible]	ZAPATO	
1.13	6	1	2	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	[illegible]
[illegible]	6	9	1	2	24	[illegible]	[illegible]	CODO	
0.52	4	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0	4	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	TAPA	
1.13	5	5	1	2	24	4.69	4.78	DUCTO	
0	5	5	1	2	24	[illegible]	[illegible]	TAPA	
0.27	6	4	1	1	24	[illegible]	5.06	CUELLO	
0.15	6	2	1	1	24	[illegible]	[illegible]	CUELLO	
0.29	8	8	1	1	24	[illegible]	1.34	CUELLO	
0.33	10.5	8	1	2	24	[illegible]	0.62	ZAPATO	
[illegible]	8	8	1	2	24	4.60	0.58	ZAPATO	
0.52	5	8	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
1.13	9	8	2	2	24	4.60	[illegible]	DUCTO	
0.4	6	6.5	1	2	24	[illegible]	[illegible]	REDUCCION	
1.13	5	5	2	2	24	4.69	7.56	DUCTO	
0.6	5	5	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0	5	5	1	2	24	[illegible]	0.40	TAPA	
0.4	6	5		2	24	[illegible]	0.40	CODO	
0.27	12	12	1	1	24	[illegible]	1.60	CUELLO	
0.15	6	6	1	1	24	[illegible]	[illegible]	CUELLO	
0.27	9	9	4	1	24	4.60	4.20	CUELLO	
0.15	12	12	4	1	24	[illegible]	4.30	CUELLO	
SISTEMA DE SUMINISTRO (56)									
1.13	20	12	2	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	[illegible]
0.52	20.5	12	1	2	24	4.60	4.72	REDUCCION	
1.13	19	12	1	2	24	4.60	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0.52	19	12	1	2	24	4.65	8.72	DUCTO	
0.52	13	11	1	2	24	4.64	1.46	REDUCCION	[illegible]
0.52	[illegible]	[illegible]	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
1.13	10	6	1	2	24	4.69	5.23	DUCTO	
0	10	[illegible]	1	2	24	[illegible]	0.47	TAPA	
[illegible]	11.5	4	1	2	24	4.60	0.69	ZAPATO	
[illegible]	7	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	ZAPATO	
[illegible]	[illegible]	4	1	2	24	4.60	[illegible]	DUCTO	
0	[illegible]	4	1	2	24	[illegible]	0.29	TAPA	
0.33	11.5	6	1	2	24	4.63	0.92	ZAPATO	
[illegible]	7	6	1	2	24	[illegible]	0.57	ZAPATO	
1.13	9	6	2	2	24	4.64	8.72	DUCTO	
[illegible]	9	6	1	2	24	[illegible]	2.57	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.60	0.36	TAPA	
[illegible]	11	6	1	2	24	[illegible]	1.11	ZAPATO	
1.13	12	6	2	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	[illegible]	0.40	TAPA	
0.42	15.5	9	1	2	24	[illegible]	1.60	ZAPATO	
1.13	11	9	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.7	11	9	1	2	24	4.66	4.14	DUCTO	
0.33	11.5	[illegible]	1	2	24	[illegible]	[illegible]	ZAPATO	[illegible]
[illegible]	7	5	1	2	24	4.60	0.57	ZAPATO	
1.13	4	5	5	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.42	7	5	1	2	24	4.60	2.18	DUCTO	
0.33	11.5	5	1	2	24	[illegible]	[illegible]	ZAPATO	
0.55	7	5	1	2	24	4.60	0.90	ZAPATO	
1.13	5	5	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
[illegible]	7	4	1	2	24	4.60	4.25	DUCTO	
0.52	[illegible]	5	1	2	24	[illegible]	[illegible]	REDUCCION	
1.13	4	[illegible]	2	2	24	[illegible]	7.56	DUCTO	
[illegible]	4	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.2	16	6	1	2	24	4.60	[illegible]	ZAPATO	
1.13	11	6	2	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
[illegible]	11.5	8	1	2	24	4.60	1.81	REDUCCION	
0.4	10	6	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.33	11.5	6	1	2	24	4.60	0.92	ZAPATO	
[illegible]	[illegible]	6	1	2	24	[illegible]	0.57	ZAPATO	
0.57	10	6	1	2	24	4.60	2.74	CODO	
[illegible]	10	6	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
1.13	10	6	3	2	24	4.63	[illegible]	DUCTO	
[illegible]	[illegible]	6.5	1	2	24	[illegible]	[illegible]	REDUCCION	
1.13	9	5	3	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
[illegible]	9	5	1	2	24	[illegible]	[illegible]	CODO	
0.7	9	5	1	2	24	4.69	2.42	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	[illegible]	0.22	TAPA	
0.13	9	4	1	2	24	4.69	0.79	DUCTO	
SISTEMA DE RETORNO (1)									
0.52	12.5	10	1	2	24	4.69	1.27	REDUCCION	[illegible] hall y cafetería
1.13	11	10	5	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
4.4	13	13	1	2	24	4.60	[illegible]	AJUSTE	
0.57	11	10	1	2	24	4.63	1.11	CODO	
0.23	12.5	10	1	2	24	[illegible]	[illegible]	REDUCCION	
1.13	11	10	2	2	24	4.63	[illegible]	DUCTO	
1.13	14	10	5	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.5	14	14	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.52	14	16	1	2	24	[illegible]	[illegible]	CODO	
0.27	14	10	1	2	24	4.60	[illegible]	DUCTO	
0.2	16.5	10	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
1.13	16	10	11	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.52	16	16	2	2	24	4.60	[illegible]	CODO	
0.52	16	13	3	2	24	4.63	[illegible]	[illegible]	
0.4	16	10	2	2	24	4.69	[illegible]	CODO	SALA ESPERA
0.6	16	16	1	2	24	4.63	4.27	DUCTO	
0.13	16	14	1	2	24	4.60	1.12	DUCTO	
0.52	12	7	1	2	24	[illegible]	2.36	REDUCCIÓN	[illegible]
1.13	6	4	1	2	24	4.60	3.40	DUCTO	
0.52	5	4	1	2	24	4.60	1.74	DUCTO	
0	5	4	1	2	24	4.63	0.26	TAPA	
0.40	16	8	1	2	24	4.63	[illegible]	REDUCCION	FARMACIA
1.14	[illegible]	5	2	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.7	10	8	1	2	24	[illegible]	[illegible]	REDUCCION	
0	5	4	1	2	24	[illegible]	0.26	TAPA	
[illegible]	6	4	1	2	24	[illegible]	2.40	DUCTO	[illegible]
1.13	5	4	1	2	24	[illegible]	3.45	DUCTO	
0.7	8	4	1	2	24	[illegible]	1.40	DUCTO	
[illegible]	10.5	4	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
[illegible]	4.5	6	1	2	24	[illegible]	0.75	ZAPATO	[illegible]
1.05	6	6	1	2	24	[illegible]	0.40	ZAPATO	
1.13	4	6	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.4	6	6	1	2	24	4.60	1.40	DUCTO	
1.13	6	6	2	2	24	4.60	[illegible]	DUCTO	
0.15	10.5	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	ZAPATO	
0.36	6	4	1	2	24	4.60	1.94	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.64	[illegible]	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.60	[illegible]	ZAPATO	
[illegible]	5	4	1	2	24	[illegible]	1.40	[illegible]	
0.44	6	4	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	[illegible]	0.26	TAPA	
1.13	13	10	1	2	24	4.62	6.48	DUCTO	[illegible]
0.52	12.5	10	1	2	24	[illegible]	1.27	REDUCCION	
1	12	10	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
1.13	12	10	2	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.52	12	9	1	2	24	4.63	[illegible]	REDUCCIÓN	PROCEDIMIENTOS
0.4	12	9	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.47	12	8	2	2	24	4.62	5.14	CODO	
0.72	12	8	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.77	12	8	1	2	24	4.69	4.30	DUCTO	
0.61	12	8	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.5	12	8	1	2	24	4.69	1.60	DUCTO	
1.13	12	8	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.52	11	7.5	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
[illegible]	10	7	2	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
1.13	10	7	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	10	5	1	2	24	4.60	[illegible]	REDUCCIÓN	
1	10	5	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.45	10	5	1	2	24	[illegible]	[illegible]	CODO	
1.13	10	5	3	2	24	4.60	17.44	DUCTO	[illegible]
0.65	10	5	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.52	8	5.5	1	2	24	4.69	1.96	REDUCCIÓN	
1.13	6	4	4	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.60	0.22	TAPA	[illegible] PEDIÁTRICA
0.2	10.5	5	2	2	24	[illegible]	[illegible]	ZAPATO	
1.13	4	5	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.5	6	5	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0	6	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.4	[illegible]	4.5	1	2	24	[illegible]	[illegible]	REDUCCIÓN	
0.35	6	4	1	2	24	4.69	1.02	DUCTO	ROPA SUCIA
0	6	4	1	2	24	[illegible]	0.22	TAPA	
[illegible]	8.4		2	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
0.4	4	1	2	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0	4	1	2	2	24	4.69	0.44	TAPA	
0.2	11.5	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	ZAPATO	
1.13	12	6	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	12	2	1	2	24	[illegible]	[illegible]	TAPA	
0.15	4.5	5	1	2	24	4.69	0.77	ZAPATA	PROCEDIMIENTOS

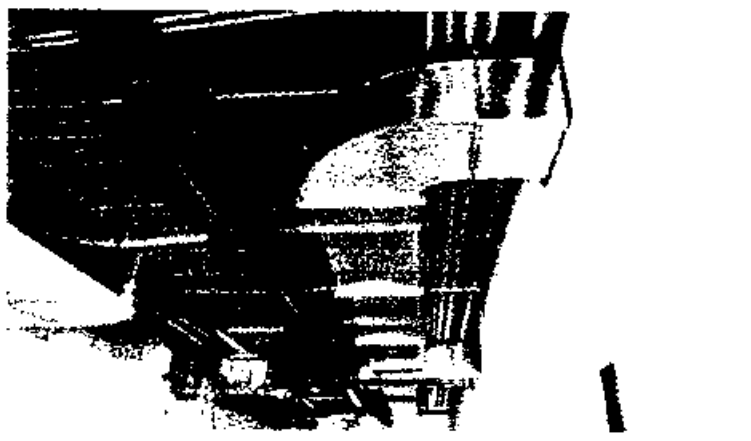




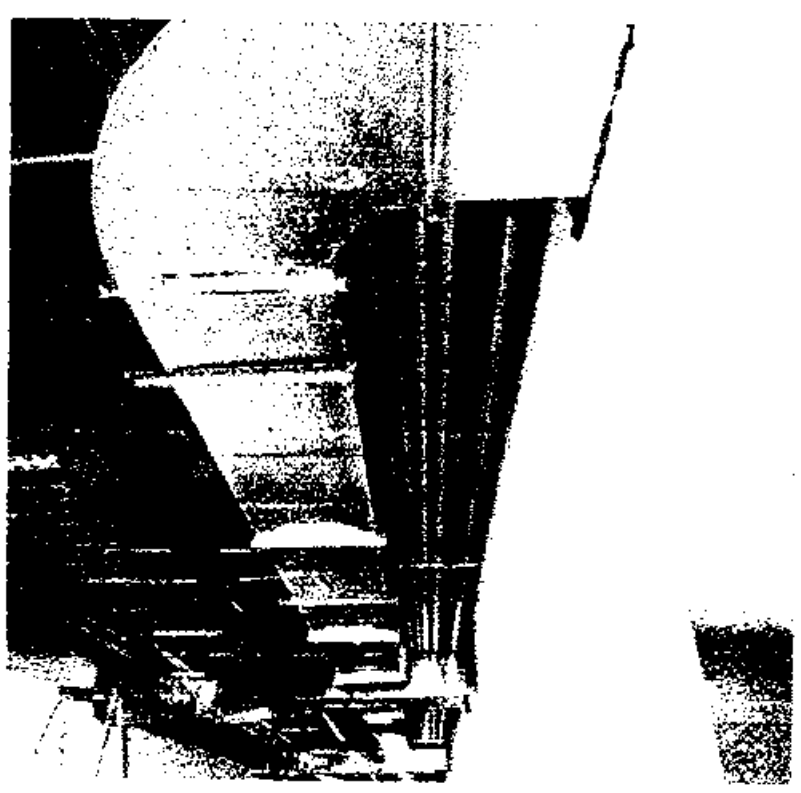



3.4	6	4	1	2	24	4.6[illegible]	5.17	DUCTO	
[illegible]	4	4	1	2	24	4.60	[illegible]	DUCTO	
0	4	4	1	2	24	[illegible]	0.22	TAPA	
0.12	15.5	4	1	2	24	4.60	[illegible]	ZAPATATO	
0.45	6	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
1.13	6	6	1	2	24	4.59	[illegible]	DUCTO	
0	6	6	1	2	24	4.60	[illegible]	TAPA	
0.21	10.5	4	2	2	24	4.60	2.47	ZAPATO	
2.1	5	4	2	2	24	4.60	2.86	DUCTO	
1.07	5	4	1	2	24	4.60	1.26	DUCTO	
1.13	5	4	1	2	24	4.60	1.46	DUCTO	
2.5	4	4	1	2	24	4.60	2.54	DUCTO	[illegible]
0	5	1	1	2	24	[illegible]	0.36	TAPA	
0.5	6	4	1	2	24	4.60	2.54	DUCTO	
0.15	10.5	4	1	2	24	[illegible]	0.25	ZAPATO	
3.4	6	4	1	2	24	5.60	5.17	DUCTO	
0.26	6	4	1	2	24	[illegible]	2.36	DUCTO	
0	4	4	1	2	24	4.60	0.22	TAPA	
SISTEMA DE RETORNO (2)									
[illegible]	19	10	5		24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	COCINETA
3.5	19	10	1	2	24	4.60	2.49	DUCTO	
[illegible]	19	10	2	2	24	[illegible]	[illegible]	CODO	
0.47	19	10	1	2	24	4.60	5.52	DUCTO	
1.13	19	10	2	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	[illegible]
3.4	19	9	1	2	24	4.60	1.27	REDUCCIÓN	
1.13	19	8	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.92	19	8	5	2	24	4.60	5.95	DUCTO	
0.52	19	8	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
3.5	19	8	1	2	24	4.60	5.23	DESVIO	
[illegible]	12.5	8	1	2	24	[illegible]	2.76	REDUCCIÓN	
1.51	16	8	1	2	24	4.60	4.90	DUCTO	
0.52	16	8	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0	16	8	1	2	24	4.60	0.56	TAPA	
0.12	10.5	8	1	2	24	[illegible]	[illegible]	ZAPATO	[illegible]
0.21	14	8	1	2	24	4.65	1.50	ZAPATO	
1.13	14	8	2	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
1.06	12	8	1	2	24	4.69	5.96	DUCTO	
1.13	14	8	5	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
2.85	14	8	1	2	24	4.60	4.95	DUCTO	ATENCIÓN URGENCIAS
1.13	14	8	1	2	25	[illegible]	6.90	DUCTO	
4.65	14	8	1	2	24	4.60	3.35	DUCTO	
0.57	14	8	1	2	24	[illegible]	[illegible]	CODO	[illegible]
1.13	14	8	2	2	24	4.60	12.75	DUCTO	
2.1	14	8	1	2	24	[illegible]	5.19	DUCTO	
1.13	14	8	2	2	24	4.02	12.79	DUCTO	
3.4	12	8	1	2	24	[illegible]	[illegible]	REDUCCIÓN	
1.13	12	8	4	2	24	4.60	24.24	DUCTO	
2.3	12	8	1	2	24	[illegible]	[illegible]	REDUCCIÓN	
1.13	10	4	2	2	24	4.60	10.46	DUCTO	
[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	2	24	[illegible]	[illegible]	REDUCCIÓN	
1.22	14	4	1	2	24	4.60	6.24	DUCTO	
1.97	6	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
1.13	8	4	6	2	24	4.60	23.32	DUCTO	
3.2	[illegible]	4	1	2	24	[illegible]	5.40	REDUCCIÓN	
1.13	6	4	1	2	24	4.60	1.40	DUCTO	
3.2	4	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.142	5	4	1	2	24	4.62	0.66	CODO	
[illegible]	5	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
1.13	8	4	1	2	24	4.60	3.40	DUCTO	
4.2	5	4	1	2	24	[illegible]	2.26	DUCTO	
0	0	4	1	2	24	4.60	0.26	TAPA	
1.6	10	4	1	2	24	[illegible]	5.64	ZAPATO	
0.4	6	4	1	2	24	4.60	1.40	ZAPATO	
4.4	6	4	1	2	24	[illegible]	1.80	DUCTO	[illegible] PEDIATRICA
0.15	9.5	4	1	2	24	4.60	0.71	ZAPATO	
0.42	6	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	ZAPATO	
0.43	6	4	1	2	24	4.60	1.24	DUCTO	
1.13	6	4	1	2	24	[illegible]	1.83	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.60	0.22	TAPA	
0.15	9.5	4	1	2	24	[illegible]	0.71	ZAPATO	SALA EDA
3.5	6	4	1	2	24	4.60	5.46	ZAPATO	
0.77	6	4	1	2	24	[illegible]	2.06	DUCTO	
1.13	6	4	4	2	24	4.60	3.22	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.60	0.27	TAPA	
1.13	6	4	3	2	24	4.60	8.72	DUCTO	[illegible]
0	6	4	1	2	24	4.60	0.22	TAPA	
4.15	9.5	4	1	2	24	4.60	0.71	ZAPATO	SALA ERA
0.55	6	4	1	2	24	4.60	0.76	ZAPATO	
0.75	6	4	1	2	24	4.60	2.06	DUCTO	
0.52	6	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
1.13	6	4	1	2	24	4.60	2.54	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.60	[illegible]	TAPA	
0.12	10.5	4	1	2	24	4.60	[illegible]	ZAPATO	CONSULTORIO # 2
0.57	6	4	1	2	24	[illegible]	0.41	ZAPATO	
4.45	6	4	1	2	24	[illegible]	2.46	DUCTO	
1.13	6	4	1		24	5.60	3.84	DUCTO	
0.45	6	4	1	2	24	4.60	1.54	CODO	
3.4	6	4	1	2	24	5.60	5.60	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.60	0.26	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.60	0.80	ZAPATO	CONSULTORIO # 1
0.66	6	4	1	2	24	[illegible]	0.46	ZAPATO	
3.5	6	4	5	2	24	4.60	2.63	DUCTO	
1.13	6	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	TAPA	
12	10.5	4	1	2	24	[illegible]	41.22	ZAPATO	BAÑOS CAFETERÍA
0.52	5	4	1	2	24	4.60	0.49	ZAPATO	
0.25	5	4	1	2	24	4.60	0.07	CODO	
0.26	6	4	1	2	24	4.60	2.72	DUCTO	
1.13	6	4	4	2	24	4.62	[illegible]	DUCTO	
0.72	7	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	REDUCCIÓN	
1.13	6	4	2	2	24	[illegible]	5.61	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.60	[illegible]	TAPA	
9.96	10	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	ZAPATO	BAÑO SALA ESPERA
0.12	6	4	1	2	24	4.60	0.20	ZAPATO	
1.13	5	4	1	2	24	[illegible]	4.07	DUCTO	
1	6	4	1	2	24	4.60	3.64	DUCTO	
1.4	6	4	1	2	24	[illegible]	4.07	DUCTO	
1.12	8	4	1	2	24	4.60	4.07	DUCTO	
0.5	5	4	1	2	24	4.60	1.21	REDUCCIÓN	
3.8	6	4	1	2	24	4.60	2.58	DUCTO	
0	6	4	4	2	24	[illegible]	[illegible]	TAPA	
0.5	10	4	4	2	24	4.60	2.90	ZAPATO	
[illegible]	10	4	1	2	24	[illegible]	2.55	ZAPATO	
0.52	14	10	1	2	24	4.60	3.49	DESVIO	PASILLO URG
0.84	14	10	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DESVIO	
0.52	14	10	5	2	24	4.69	7.49	DUCTO	
0.52	[illegible]	[illegible]	1	2	24	[illegible]	[illegible]	REDUCCIÓN	
PISO 4									
SISTEMA DE SUMINISTRO (1)									
0.15	10.5	4	2	2	24	4.62	1.06	ZAPATO	
0.66	5	4	6	2	24	[illegible]	[illegible]	ZAPATO	
1.13	8	4	5	2	24	4.69	17.44	DUCTO	
0.52	4	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0	4	4	2	2	24	2.09	0.50	TAPAS	
0.12	10.5	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	ZAPATO	
0.66	6	4	1	2	24	4.68	0.40	ZAPATO	
1.13	6	4	2	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
3.4	5	4	1	2	24	4.69	5.40	CODO	
2.4	1.5	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	REDUCCIÓN	
0.45	7	4	1	2	24	4.68	1.84	DUCTO	
0	4	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	TAPAS	
0.4	10	8	5	2	24	4.62	2.36	DUCTO	
0.57	10.5	4	1	2	24	[illegible]	0.61	ZAPATO	
0.66	8	6	1	2	24	4.60	0.47	ZAPATO	
0.47	14	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
1.12	10	5	1	2	24	4.60	4.16	DUCTO	
[illegible]	6	4	1	2	24	[illegible]	1.40	REDUCCIÓN	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.60	0.53	ZAPATO	
4.45	6	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	ZAPATO	
0.54	6	4	1	2	24	4.62	1.90	DUCTO	
2.5	6	4	1	2	24	[illegible]	1.90	CODO	
1	6	4	5	2	24	4.65	3.12	DUCTO	
0	5	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	TAPAS	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.60	0.63	ZAPATO	
0.66	6	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	ZAPATO	
1.13	6	4	2	2	24	4.60	6.98	DUCTO	
[illegible]	6	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	
0.4	5	4	1	2	24	4.60	1.40	CODO	
3.2	7	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	REDUCCIÓN	
0.52	6	4	1	2	24	4.60	[illegible]	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	[illegible]	0.22	TAPAS	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.64	0.84	ZAPATO	
0.66	5	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	ZAPATO	
1.13	5	4	2	2	24	4.60	8.14	DUCTO	
0.52	6	4	1	2	24	[illegible]	[illegible]	DUCTO	

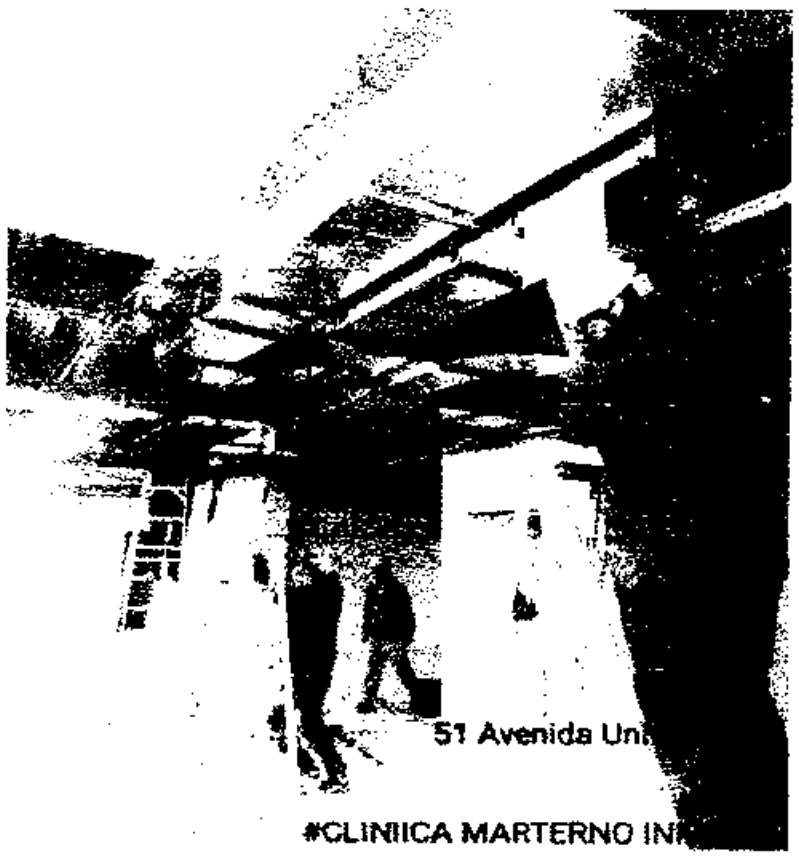





0	6	6	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPAS	
0.17	10.5	4	1	2	24	4.69	0.63	ZAPATO	
0.05	6	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO	
0.52	6	4	1	2	24	4.69	1.74	DUCTO	
0.4	6	4	1	2	24	4.69	1.40	CODO	
0.94	[illegible]	4	1	2	24	4.69	2.94	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPAS	
0.17	10.5	4	1	2	24	4.69	0.80	ZAPATO	
0.05	6	4	1	2	24	4.69	0.40	ZAPATO	
72	6	4	1	2	24	4.69	0.63	DUCTO	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.4	6	4	1	2	24	4.69	1.40	CODO	
0.6	[illegible]	4	1	2	24	4.69	1.61	REDUCCION	
0.6	6	4	1	2	24	4.69	1.64	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.2	TAPAS	
0.15	6	4	2	2	24	4.69	1.40	ZAPATO	
0.05	6	4	1	2	24	4.69	0.57	ZAPATO	
1.13	6	4	5	2	24	4.69	14.51	DUCTO	
0.03	6	4	1	2	24	4.69	1.26	DUCTO	
0.17	12.5	4	1	2	24	4.69	5.06	ZAPATO	
0.05	13	6	1	2	24	4.69	0.5	ZAPATO	
1.13	10	6	2	2	24	4.69	9.10	DUCTO	
0.4	6	4	1	2	24	4.69	1.52	REDUCCIÓN	
0.52	6	4	1	2	24	4.69	1.45	DUCTO	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0.4	6	4	1	2	24	4.69	3.17	CODO	
0.7	6	4	1	2	24	4.62	1.90	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPAS	
0.17	9	4	1	2	24	4.69	0.74	ZAPATO	
0.4	6	4	1	2	24	4.69	1.11	ZAPATO	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPAS	
1.13	6	4	4	2	24	4.62	11.6	DUCTO	
0.56	6	4	1	2	24	4.69	4.26	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPAS	
0.15	9	4	1	2	24	4.69	0.34	ZAPATO	
0.05	6	4	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
1.13	5	4	1	5	24	4.69	2.91	DUCTO	
0	5	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPAS	
SISTEMA DE RETORNO (1)									
1.13	21	12	8	2	24	4.69	80.53	DUCTO	Red principal de retorno piso 4 [illegible]
0.6	21	12	1	2	24	4.69	5.42	DESVÍO	
0	21	12	1		24	4.69	1.13	TAPA	
0.16	14.5	2	1	2	24	4.69	1.14	ZAPATO	
0.52	12	4	1	2	24	4.69	0.67	ZAPATO	
0.52	12	8	1	2	24	4.69	2.93	DESVÍO	
1.13	12	4	4	2	24	4.69	29.16	DUCTO	
0.52	4	8	1	2	24	4.69	2.18	REDUCCIÓN	
1.13	6	8	5	2	24	4.69	17.41	DUCTO	
0.52	8	4	1	2	24	4.69	1.64	DUCTO	
0.17	16.5	11	1	2	24	4.69	1.57	ZAPATO	
0.5	14	11	1	2	24	4.69	4.55	ZAPATO	
0.6	11	11	1	2	24	4.69	5.46	DUCTO	
0.52	11	11	1	2	24	4.69	3.65	DESVÍO	
1.13	11	11	7	2	24	4.69	71.55	DUCTO	
0.52	11.5	10.5	1	2	24	4.69	7.71	REDUCCIÓN	
1.13	11	10	4	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.75	11	10	1	2	24	4.69	4.40	DUCTO	
0.52	12.5	10	1	2	24	4.69	4.27	REDUCCIÓN	
1.13	12	10	5	2	24	4.69	35.97	DUCTO	
0.75	12	10	1	2	24	4.69	4.40	DUCTO	
0.52	10	10	1	2	24	4.69	2.48	REDUCCIÓN	
1.13	12	4	4	2	24	4.69	24.97	DUCTO	
0.75	12	4	1	2	24	4.69	1.60	DUCTO	
0.52	4	16	1	2	24	4.69	13.80	REDUCCIÓN	
1.13	5	4	5	2	24	4.69	12.41	DUCTO	
0.75	3	4	1	2	24	4.69	2.40	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.22	6	4	1	2	24	4.69	0.90	CODO	A.C. HABITACIONES 421 - 423
1.13	6	4	1	2	24	4.69	3.19	DUCTO	
0.6	3	4	1	2	24	4.69	1.97	DUCTO	
0.5	4	4	1	2	24	4.62	0.80	DUCTO	
0.43	5	4	1	2	24	4.69	1.43	CODO	
0	4	4	1	2	24	4.69	0.24	REDUCCIÓN	
0.52	6	4	1	2	24	4.69	1.45	DUCTO	
0	5	4	1	2	24	4.69	0.2	TAPA	
0.20	5	4	1	2	24	4.69	0.80	CODO	W.C. HABITACIONES 41[illegible] - 419
1.13	6	4	1	2	24	4.69	1.85	DUCTO	
0.6	8	4	1	2	24	4.69	1.97	DUCTO	
0.2	5	4	1	2	24	4.69	0.80	DUCTO	
0.41	5	4	1	2	24	4.69	1.41	CODO	
0.3	2	4	1	2	24	4.69	1.12	REDUCCIÓN	
0.6	6	4	1	2	24	4.69	1.64	DUCTO	
0	[illegible]	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
0.22	4	4	1	2	24	4.69	[illegible]	CODO	W.C. HABITACIONES 405 - 407
1.13	5	4	1	2	24	4.69	1.99	DUCTO	
0.6	8	4	1	2	28	4.69	1.97	DUCTO	
0.41	6	4	1	2	24	4.69	1.54	DUCTO	
0.81	5	4	1	2	24	4.69	1.40	CODO	
0.3	4	4	1	2	24	4.69	1.00	REDUCCIÓN	
0.62	6	4	1	2	24	4.69	1.90	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.2	TAPA	
0.22	6	4	1	2	24	4.69	0.86	CODO	W.C. HABITACIONES 402 - 404
1.13	6	4	1	2	24	4.69	1.87	DUCTO	
0.58	4	4	1	2	24	4.69	1.06	DESVÍO	
1	3	4	1	2	24	4.69	1.53	DUCTO	
1.13	4	4	2	2	24	4.69	6.91	DUCTO	
0.47	4	4	1	2	24	4.69	1.15	CODO	
0	5	4	1	2	24	4.69	0.20	REDUCCIÓN	
0.52	6	4	1	2	24	4.69	1.41	DUCTO	
0	4	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
PISO 2									
SISTEMA DE SUMINISTRO (1)									
1.13	20	12	1	2	24	4.69	9.30	DUCTO	
0.52	18	12	1	2	24	4.69	4.16	REDUCCIÓN	
1.13	16	12	4	4	24	4.69	32.56	DUCTO	
0.52	16	11	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
1.13	15	10	4	2	24	4.69	30.21	DUCTO	
0.52	15	9	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
0.4	14	8	1	2	24	4.69	2.52	DUCTO	
1.13	14	8	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.4	12	8	1	2	28	4.69	2.33	REDUCCIÓN	
0.3	10	8	1	2	24	4.69	2.15	DUCTO	
1.13	10	8	2	2	24	4.69	10.46	DUCTO	
0.6	10	8	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0.4	9.5	7	1	2	24	4.69	1.96	REDUCCIÓN	
0.52	9	6	1	2	24	4.69	2.18	DUCTO	
0	2	5	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
[illegible]	11	8	1	2	24	4.69	3.07	DUCTO	[illegible] CAMA 7
0.46	11	8	1	2	24	4.69	2.50	CODO	
0.17	12.5	2	1	2	24	4.69	1.17	ZAPATO [illegible]	
0.05	9	8	1	2	24	4.69	0.67	ZAPATO [illegible]	
1.13	4	4	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	9	9	1	2	24	4.69	2.71	DUCTO	
0.46	9	7	1	2	24	4.69	2.06	REDUCCIÓN	
0.42	2	4	1	2	24	4.69	1.72	CODO	
1.13	4	5	1	2	24	4.69	3.16	DUCTO	
0	4	6	1	2	22	4.69	0.36	TAPA	
0.125	14.5	4	1	2	24	4.69	0.74	ZAPATO [illegible]	[illegible] CAMA [illegible]
0.075	8	4	1	2	24	4.69	0.47	ZAPATO [illegible]	
1.13	6	4	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	5	4	1	3	28	4.69	0.26	TAPA	
0.17	11.5	6	1	2	24	4.69	1.00	ZAPATO	[illegible]
0.04	9	6	1	2	24	4.69	0.50	ZAPATO	
1.13	4	6	2	2	24	4.69	8.72	DUCTO	
0.6	7	6	1	2	24	4.69	2.47	DUCTO	
0.22	4	9	1	2	24	4.69	1.12	DUCTO	
0	4	5	1	2	24	4.69	0.36	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.65	ZAPATO	CENTRAL DE ENFERMERIA
0.15	9	4	1	2	24	4.69	0.77	ZAPATO	
0.6	6	4	1	2	24	4.69	2.54	DUCTO	
0	5	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
1.13	12	8	2	2	24	4.69	13.55	DUCTO	[illegible]
0.52	10.75	7.5	1	2	24	4.69	2.76	REDUCCIÓN	
1.13	7	7	1	2	24	4.69	4.06	DUCTO	
0	3	7	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.15	12.5	7	1	2	24	4.69	1.26	ZAPATO	
0.05	12	8	1	2	24	4.69	2.24	ZAPATO	
0.17	10.5	5	1	2	24	4.69	0.60	ZAPATO	[illegible]
0.27	5	6	1	2	24	4.69	1.42	ZAPATO	
1.02	6	7	2	2	24	4.69	2.90	DUCTO	
0.25	10	12	1	2	24	4.69	2.78	CODO [illegible]	PASA [illegible]
1.13	12	30	8	2	24	4.69	51.06	DUCTO [illegible]	









SISTEMA DE SUMINISTRO (7)									
1.13	21	10	1	2	24	4.60	9.92	DUCTO	
0.31	14.5	4	2	2	24	4.63	2.57	ZAPATO	
0.05	12	8	2	2	24	4.69	1.33	ZAPATO	
0.5	12	8	1	2	24	4.63	4.21	DUCTO	
1.13	12	8	1	2	24	4.63	5.81	DUCTO	
0.4	10.5	7	1	2	24	4.60	2.34	REDUCCIÓN	
0.3	9	6	1	2	24	4.63	1.49	DUCTO	
1.13	9	6	2	2	24	4.63	9.2	DUCTO	
0.52	9	6	1	2	24	4.60	2.18	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.60	0.36	TAPA	
0.9	12	8	1	2	24	4.60	4.32	DUCTO	
0.52	10.5	7	1	2	24	4.62	2.34	REDUCCIÓN	
0.52	9	6	1	2	24	4.60	2.58	DUCTO	
1.13	9	6	2	2	24	4.63	[illegible]	DUCTO	
0.64	9	8	1	2	24	4.60	2.88	DUCTO	
0.52	16.5	11	1	2	24	4.60	4.31	REDUCCIÓN	
1.13	24	10	3	2	24	4.62	22.07	DUCTO	
0.6	15	10	1	2	24	4.60	1.57	REDUCCIÓN	
1.13	12	8	5	2	24	4.63	19.12	DUCTO	
0.6	12	8	1	2	24	4.63	1.92	DUCTO	
0.52	11	7	1	2	24	4.60	2.67	REDUCCIÓN	
1.13	8	5	2	2	24	4.63	8.34	DUCTO	
0.52	5	4	1	2	24	4.60	1.00	REDUCCIÓN	
1.13	5	4	3	2	24	4.63	10.10	DUCTO	
0.4	6	2	1	2	24	4.63	1.40	CODO	
0.5	5	4	1	2	24	4.60	2.54	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.63	0.26	TAPA	
0.15	11.5	6	1	2	24	4.63	1.00	ZAPATO	
0.05	6	5	1	2	24	4.60	0.50	ZAPATO	
0.5	9	6	1	2	24	4.63	1.21	DUCTO	
1.13	9	6	1	2	24	4.62	4.36	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.63	0.36	TAPA	
0.15	11.5	4	1	2	24	4.69	1.00	ZAPATO	CENTRAL DE ESPUMAS [illegible]
0.22	9	6	1	2	24	4.63	[illegible]	ZAPATO	
0.52	9	6	1	2	24	4.69	2.19	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.63	0.36	TAPA	
0.15	10.5	5	1	2	24	4.69	0.89	ZAPATO	
0.15	6	5	1	2	24	4.63	0.75	ZAPATO	EXTRACCIÓN
1.13	5	5	1	2	24	4.62	1.28	DUCTO	
0	5	5	1	2	24	4.63	0.36	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.85	ZAPATO	
0.15	5	3	1	2	24	4.63	0.30	ZAPATO	[illegible]
0.52	8	4	1	2	24	4.62	1.34	DUCTO	
0	5	5	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
[redacted]									
1.13	12	10	2	2	24	4.60	12.79	DUCTO (AISLADO)	
0.5	12	10	1	2	24	4.65	1.34	CODO (AISLADO)	
0.025	12	10	3	2	24	4.62	0.10	DUCTO (AISLADO)	
1.13	12	10	2	2	24	4.63	12.79	REDUCCIÓN (AISLADO)	
0.52	11	10	1	2	24	4.60	3.45	DUCTO (AISLADO)	PASA INTERNAMENTE POR [illegible] DE QUIRÓFANO 1
1.13	10.5	10	1	2	24	4.63	[illegible]	DUCTO (AISLADO)	
0.2	11	10	1	2	24	4.60	1.18	CODO (AISLADO)	
0.42	11	10	1	2	24	4.63	2.00	DUCTO (AISLADO)	
1.13	13	10	1	2	24	4.60	5.61	DUCTO (AISLADO)	
0	11	10	1	2	24	4.63	[illegible]	TAPA (AISLADO)	
SISTEMA DE SUMINISTRO (3)									
1.13	22	12	1	2	24	4.60	9.06	DUCTO	
0.52	17	12	1	2	24	4.60	4.51	REDUCCIÓN	
1.13	16	12	2	2	24	4.60	16.28	DUCTO	
0.52	15	12	1	2	24	4.63	3.76	REDUCCIÓN	
1.13	12	12	2	2	24	4.60	13.96	DUCTO	
0.5	12	10	1	2	24	4.63	2.57	REDUCCIÓN	
1.13	12	8	5	2	24	4.49	25.07	DUCTO	
0.2	10	7	1	2	24	4.63	1.06	REDUCCIÓN	
1.13	5	6	1	2	24	4.69	4.07	DUCTO	
0.22	8	6	1	2	24	4.63	2.05	DUCTO	
0	5	6	1	2	24	4.63	0.31	TAPA	
0.31	25	12	1	2	24	4.63	[illegible]	DUCTO	
0.06	22	12	1	2	24	4.62	0.90	CODO	
1.13	22	12	2	2	24	4.63	15.77	DUCTO	[illegible]
0.72	22	12	1	2	24	4.63	6.56	DUCTO	
0.22	5	12	1	2	24	4.63	[illegible]	CODO	
0.6	12	12	1	2	24	4.63	5.46	DUCTO	
[redacted]									
1.13	12	10	2	2	24	4.63	12.79	DUCTO (AISLADO)	[illegible]
0.52	12	10	1	2	24	4.60	1.20	CODO (AISLADO)	
0.025	12	10	3	2	24	4.63	0.10	DUCTO (AISLADO)	
1.13	12	10	2	2	24	4.63	12.79	REDUCCIÓN (AISLADO)	
0.5	11	10	1	2	24	4.60	[illegible]	DUCTO (AISLADO)	
1.13	10.5	10	1	2	24	4.60	[illegible]	DUCTO (AISLADO)	[illegible] QUIRÓFANO 1 A 2
0.2	11	10	1	2	24	4.69	1.18	CODO (AISLADO)	
0.33	14	10	1	2	24	4.60	2.41	DUCTO (AISLADO)	
1.13	11	10	1	2	24	4.60	5.61	DUCTO (AISLADO)	
0	11	10	1	2	24	4.63	[illegible]	TAPA (AISLADO)	
SISTEMA DE SUMINISTRO (4)									
1.13	21	12	2	2	24	4.60	[illegible]	DUCTO	
0.52	21	12	1	2	24	4.63	3.96	DUCTO	
0.52	12.5	12	1	2	24	4.60	2.58	REDUCCIÓN	
1.13	14	14	5	2	24	4.63	[illegible]	DUCTO	
0.21	11	12	1	2	24	4.63	2.14	DUCTO	
0.52	15	10	1	2	24	4.63	[illegible]	REDUCCIÓN	
1.13	12	8	2	2	24	4.60	[illegible]	DUCTO	
0.65	12	8	1	2	24	4.60	[illegible]	DESVÍO	
1.13	12	8	1	2	24	4.64	5.81	DUCTO	
0.4	10.5	7	1	2	24	4.60	2.34	REDUCCIÓN	
1.05	9	6	1	2	24	4.67	4.11	DESVÍO	
1.13	9	6	1	2	24	4.60	[illegible]	DUCTO	
0.4	9	6	1	2	24	4.63	1.23	CODO	
1.13	9	6	3	2	24	4.69	11.05	DUCTO	
0.95	8	6	1	2	24	4.69	4.40	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.63	0.36	TAPA	
0.15	14	6	1	2	24	4.60	1.95	ZAPATO	
0.52	12	6	1	2	24	4.63	0.90	ZAPATO	[illegible] DE PARTOS
1.13	12	6	2	2	24	4.63	[illegible]	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4.60	0.40	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (8)									
1.13	23	12	4	2	24	4.63	[illegible]	DUCTO [illegible]	
0.6	23	12	1	2	24	4.69	4.30	CODO	
0.51	12	23	1	2	24	4.63	1.06	CODO	BAJA BUITRON FRENTE [illegible] NEO - INTENSIVOS
0.72	12	23	1	2	24	4.63	6.32	DESVÍO	
1	12	23	1	2	24	4.60	9.99	DUCTO	
0.52	12	23	1	2	24	4.63	3.70	DESVÍO	
1.13	12	23	2	2	24	4.60	20.55	DUCTO	
1.13	12	23	18	2	24	4.63	[illegible]	DUCTO	
0.77	12	23	1	2	24	4.60	[illegible]	CODO	
0.65	12	23	1	2	24	4.60	7.61	DUCTO	
1.13	12	23	5	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	12	20.5	1	2	24	4.63	4.72	REDUCCIÓN	
0.52	12	18	1	2	24	4.60	4.16	DUCTO	
1.13	12	18	2	2	24	4.63	17.41	DUCTO	
0.52	11	15.2	1	2	24	4.60	3.66	REDUCCIÓN	
0.5	14	13	1	2	24	4.69	2.18	DUCTO	
1.13	14	13	2	2	24	4.63	13.57	DUCTO	
0.4	14	11.5	1	2	24	4.60	2.56	REDUCCIÓN	
0.52	14	10	1	2	24	4.69	2.92	DUCTO	
0.52	12	7	1	2	24	4.63	[illegible]	REDUCCIÓN	
0.52	8	4	1	2	24	4.63	1.34	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.60	0.26	TAPA	
0.15	14.6	6	1	2	24	4.60	1.02	ZAPATO (I)	
0.41	12	5	1	2	24	4.60	2.65	ZAPATO (F)	
1.13	12	5	1	2	24	4.60	4.94	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.60	0.30	TAPA	
0.15	14.5	5	1	2	24	4.60	1.02	ZAPATO (I)	
[illegible]	12	5	1	2	24	4.63	2.91	ZAPATO (F)	
1.13	12	5	1	2	24	4.60	4.94	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.60	0.40	TAPA	
0.15	14	7	1	2	24	4.60	1.10	ZAPATO	
0.2	12	7	1	2	24	4.64	0.58	ZAPATO	
1.13	12	7	1	2	24	4.63	5.52	DUCTO	
0.52	12	4	1	2	24	4.63	2.02	REDUCCIÓN	UCI NEONATAL INTENSIVOS A [illegible]
0.21	12	3	1	2	24	4.63	1.72	DUCTO	
1.13	12	6	1	2	24	4.63	4.38	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.63	0.40	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.60	0.60	ZAPATO	
0.15	5	4	1	2	24	4.63	1.12	ZAPATO	
0	5	4	1	2	24	4.60	0.26	TAPA	



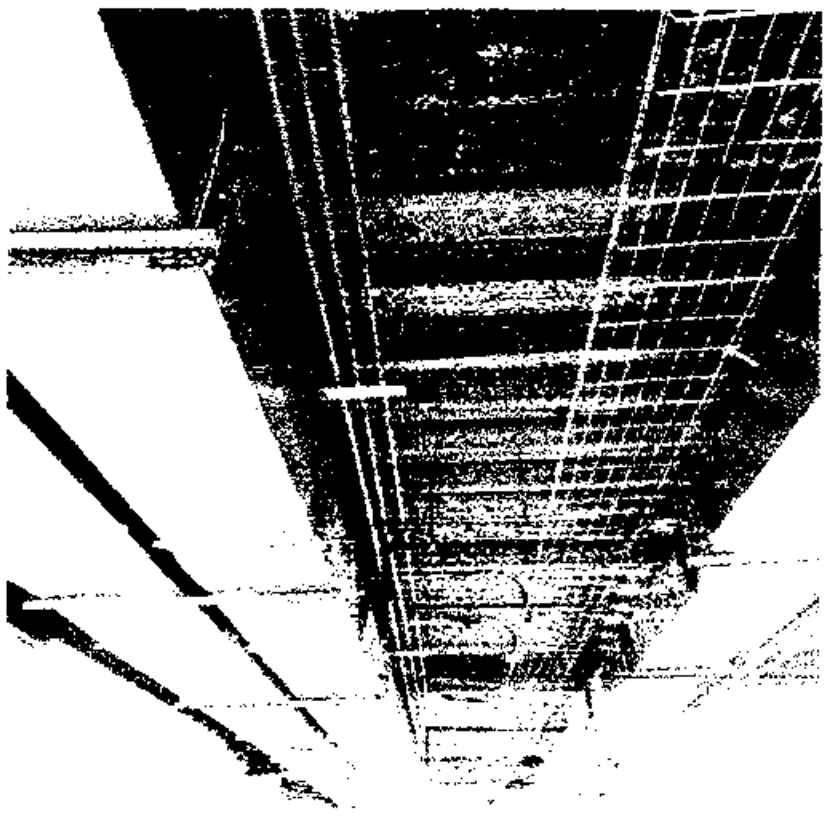

51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CLINIICA MARTERNO INFANTIL






53-51 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CLINI[illegible]TERNO INFANTIL







12 jul 2025 4:36:03 p.m.
No 50-65 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

0.15	14.5	7	1	2	24	4.69	1.2[illegible]	ZAPATO	
0.2[illegible]	12	7	1	2	24	4.69	2.13	ZAPATO	
1.13	12	7	4	2	24	4.69	10.57	DUCTO	UCI NEONATAL - INTERMEDIOS
0.7	12	7	1	2	24	4.69	3.58	DUCTO	
0.15	10.5	7	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
0.12	8	7	1	2	24	4.69	1.01	ZAPATO	
0	6	7	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0	12	7	1	2	24	4.69	0.56	TAPA	
0.15	14.5	5	1	2	24	4.69	1.12	ZAPATO	
0.12	12	5	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
1.13	12	5	3	2	24	4.69	4.94	DUCTO	[illegible]
0	12	5	1	2	24	4.69	0.46	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (6)									
1.13	22	12	7	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO (BOTTON)	
3.5	22	12	4	2	24	4.69	13.24	CODO	
0.53	22	12	1	2	24	4.69	5.42	DUCTO	
0.53	22	12	1	2	24	4.69	5.5[illegible]	DUCTO	
1.13	22	12	8	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
1	22	12	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
3.5	22	12	1	2	24	4.69	4.74	CODO	
3.7	22	12	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
1.13	22	12	8	2	24	4.69	58.94	DUCTO	
3.5	22	12	1	2	24	4.69	4.78	CODO	
1.13	22	12	7	2	24	4.69	50.12	DUCTO	
0.12	13	10.5	1	2	24	4.69	1.56	REDUCCIÓN	
0.12	22.5	12	1	2	24	4.69	2.22	ZAPATO (T)	UCI NEO - INTERMEDIOS
0.02	24	12	1	2	24	4.69	1.07	ZAPATO (R)	
3.7	20	12	1	2	24	4.69	6.5[illegible]	DUCTO	
1.13	20	12	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.42	19	13	1	2	24	4.69	3.06	REDUCCIÓN	
0.12	14	10	1	2	24	4.69	4.02	DUCTO	
1.12	14	10	1	2	24	4.69	6.34	DUCTO	
0	14	10	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0.12	14.5	8	1	2	24	4.69	1.10	ZAPATO (T)	
0.02	12	8	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (R)	
1.13	12	8	1	2	24	4.69	5.41	DUCTO	
0	12	8	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0.12	14.5	5	1	2	24	4.69	0.96	ZAPATO (T)	
0.02	12	5	1	2	24	4.69	0.57	ZAPATO (R)	
1.13	12	5	3	2	24	4.69	14.32	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.46	TAPA	
0.15	14.5	5	1	2	24	4.69	1.12	ZAPATO (T)	
0.13	12	5	1	2	24	4.69	2.03	ZAPATO (R)	
0.52	12	5	1	2	24	4.69	2.47	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.46	TAPA	
0.15	14.5	7	1	2	24	4.69	1.29	ZAPATO (T)	
0.12	12	4	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (R)	
1.13	12	9	2	2	24	4.69	11.05	DUCTO	
0.5[illegible]	12	9	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.13	10.5	5	1	2	24	4.69	0.81	ZAPATO (T)	
0.13	12	5	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (R)	
1.13	12	5	2	2	24	4.69	9.08	DUCTO	
0.12	14.5	4	1	2	24	4.69	1.07	ZAPATO (T)	
0.02	14	4	1	2	24	4.69	0.69	ZAPATO (R)	
0.52	14	4	1	2	24	4.69	2.10	DUCTO	
0	14	4	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0.13	14.3	5	1	2	24	4.69	1.02	ZAPATO (T)	
0.13	12	5	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (R)	
0.52	12	5	1	2	24	4.69	2.47	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.46	TAPA	
0.13	14.5	5	1	2	24	4.69	1.02	ZAPATO (T)	
0.13	12	5	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (R)	
1.12	12	6	2	2	24	4.69	9.08	DUCTO	
0	12	5	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.156	14.5	6	1	2	24	4.69	1.00	ZAPATO (T)	
0.025	12	6	1	2	24	4.69	0.57	ZAPATO (R)	
1.13	12	6	1	2	24	4.69	4.94	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4.69	0.40	TAPA	
0.27	5	6	1	2	24	4.69	3.30	DUCTO	
[illegible]	5	6	1	2	24	4.69	[illegible]	CODO	
1.13	5	6	2	2	24	4.69	8.51	DUCTO	
0	6	6	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.63	ZAPATO (T)	
[illegible]	6	4	1	2	24	4.69	0.16	ZAPATO (R)	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	DESCANSO UCI NEO
0	5	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
1.25	10.5	4	1	2	24	4.69	4.0[illegible]	ZAPATO (T)	
0.075	5	4	1	2	24	4.69	0.47	ZAPATO (R)	
3.4	5	4	1	2	24	4.69	1.40	DUCTO	
1.13	5	4	1	2	24	4.69	1.09	DUCTO	
0	5	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.12	12	4	1	2	24	4.69	0.71	ZAPATO (T)	
[illegible]	5	4	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (R)	[illegible]
1.13	5	4	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	5	4	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (7)									
1.13	22	12	7	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO (BOTTON)	
3.5	22	12	2	2	24	4.69	[illegible]	CODO	
1.13	22	12	6	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	19	12	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
1.13	16	12	5	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.23	16	12	1	2	24	4.69	2.47	DUCTO	
0.52	16	9	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
3.5	14	6	1	2	24	4.69	[illegible]	CODO	
1.13	12	12	1	2	24	4.69	4.14	DUCTO	SALA ESPERA
1.13	11	6	3	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.4	9	4.5	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
1.13	8	5	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
1.13	8	5	2	2	24	4.69	2.76	DUCTO	[illegible] ASISTENCIAL
3.4	5	5	1	2	24	4.69	1.52	DUCTO	
4.4	5	5	1	2	24	4.69	1.52	CODO	
0	5	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.12	10.5	5	1	2	24	4.69	[illegible]	CODO	
[illegible]	8	5	1	2	24	4.69	0.43	TAPA	
[illegible]	8	5	1	2	24	4.69	[illegible]	CODO	COORDINACIÓN [illegible]
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.15	14.5	10	1	2	24	4.69	1.40	ZAPATO (T)	
[illegible]	12	10	1	2	24	4.69	2.46	ZAPATO (R)	
1.13	12	10	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
[illegible]	12	10	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	DE SALA ESPERA A [illegible] AMBULATORIA
[illegible]	12	8	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
1.13	12	6	6	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
3.5	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	CODO	
0	12	6	1	2	24	4.69	0.43	TAPA	
[illegible]	14.5	6	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (T)	
0.075	12	6	1	2	24	4.69	0.71	ZAPATO (R)	
[illegible]	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4.69	0.43	TAPA	
0.15	14.5	6	1	2	24	4.69	1.17	ZAPATO (T)	SALA ESPERA
0.05	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (R)	
1.13	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.61	12	6	1	2	24	4.69	3.00	DUCTO	
0	6	6	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
[illegible]	[illegible]	12	1	2	24	4.69	[illegible]	CODO	SALA ESPERA
SISTEMA DE SUMINISTRO (8)									
1.13	22	12	7	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO (BOTTON)	
3.5	22	12	2	2	24	4.69	[illegible]	CODO	
0.57	22	12	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
1.13	22	12	[illegible]	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
3.5	22	12	3	2	24	4.69	14.34	CODO	
1.13	22	12	[illegible]	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
3.3	22	12	2	2	24	4.69	6.32	DUCTO	
1.13	22	12	[illegible]	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
3.5	22	12	2	2	24	4.69	9.46	CODO	
[illegible]	22	12	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
1.13	22	12	2	2	24	4.69	16.77	DUCTO	
0.52	21	12	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
0.53	21	12	1	2	24	4.69	4.57	DUCTO	
1.13	21	12	[illegible]	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	16	11	1	2	24	4.69	1.70	REDUCCIÓN	
1.13	16	9	4	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	12	9	1	2	24	4.69	2.62	DUCTO	
0.15	14.5	[illegible]	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
0.02	9	9	1	2	24	4.69	0.47	ZAPATO	
[illegible]	9	[illegible]	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
1.13	9	5	2	2	24	4.69	8.14	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0.15	14	6	1	2	24	4.69	1.03	ZAPATO	
[illegible]	9	6	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
3.6	9	6	1	2	24	4.69	2.47	DUCTO	

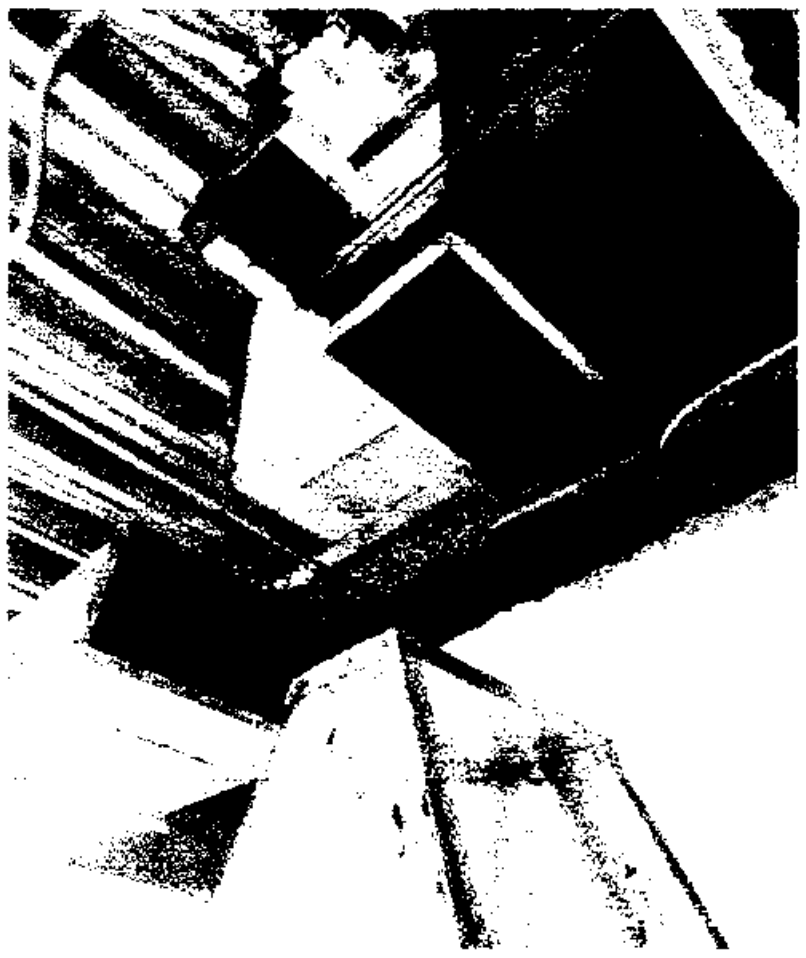


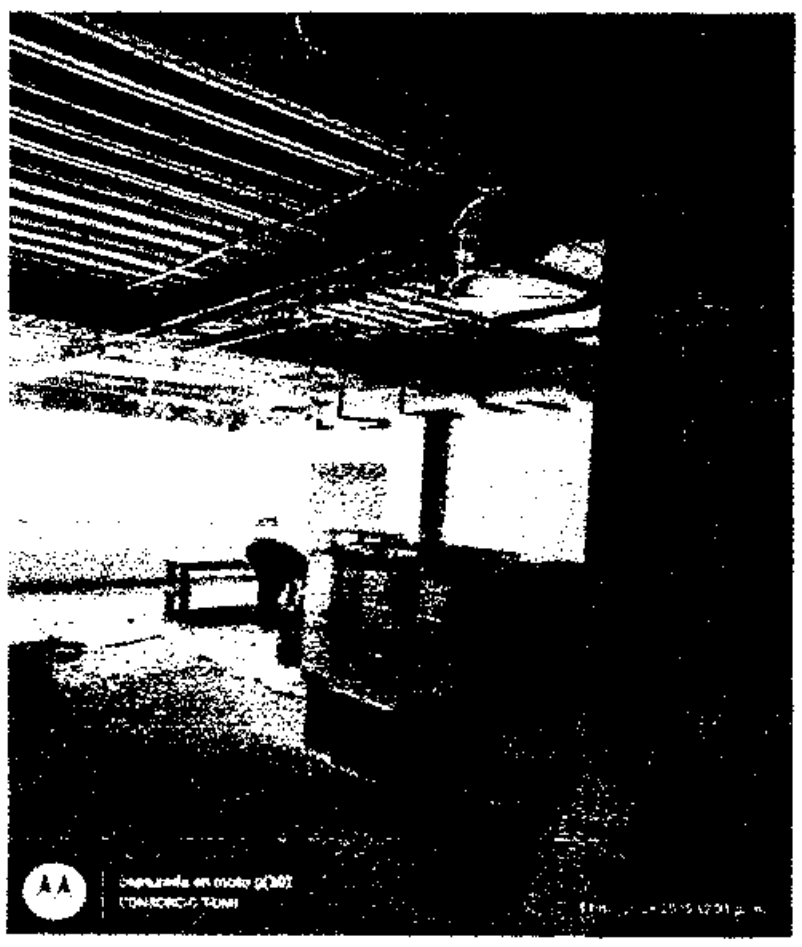



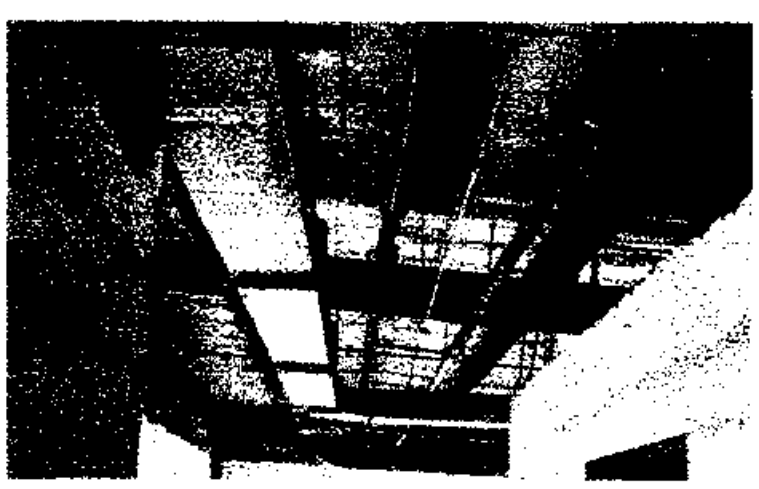

0.4	9	6	1	2	24	4.69	[illegible]	CODO	
1.13	9	6	1	2	24	4.69	4.46	DUCTO	
0.5	9	6	1	2	24	4.69	2.47	DUCTO	
0	9	6	1	2	24	4.69	0.16	TAPA	
0.31	10.5	8	1	2	24	4.69	1.46	ZAPATO	
0.4	14	8	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
1.13	14	8	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	14	8	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	14	8	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0.17	14.5	9	1	2	24	4.69	1.46	ZAPATO	
0.52	14	9	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
1.13	12	9	4	2	24	4.69	24.42	DUCTO	
0	12	4	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0.15	11.5	5	1	2	24	4.69	0.94	ZAPATO	FRENTE A QUIROFANOS 2 Y 1
0.37	7	5	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
0	9	5	3	2	24	4.69	0.97	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
SISTEMA DE RETORNO (1)									
0.47	12	12	1	2	24	4.69	[illegible]	ducto	
0.19	12	12	1	2	24	4.69	1.30	ducto	
1.13	12	12	10	2	24	4.69	[illegible]	ducto	
0.52	12	12	3	2	24	4.69	10.56	codo	
[illegible]	12	12	1	2	24	4.69	[illegible]	ajuste	
0.53	15.5	12	1	2	24	4.69	4.06	reducción	
1.13	14	12	1	2	24	4.69	2.56	ducto	
0.75	14	12	1	2	24	4.69	5.30	ajuste	
0.52	14	12	1	2	24	4.69	[illegible]	reducción	
1.13	13	12	2	2	24	4.69	14.52	ducto	
0.52	13	11.5	1	2	24	4.69	[illegible]	reducción	
0.74	13	11	1	2	24	4.69	4.35	ajuste	
0.5	13	11	1	2	24	4.69	[illegible]	codo	
1.13	13	11	4	2	24	4.69	27.40	ducto	
0.52	13	8.5	1	2	24	4.69	[illegible]	reducción	
1.13	13	8	7	2	24	4.69	42.73	ducto	
0	13	8	1	2	24	4.69	[illegible]	tapa	
0.13	14	5	1	2	24	4.69	1.70	zapato	
0.67	13	6	2	2	24	4.69	1.40	codo	
1.13	13	6	4	2	24	4.69	19.72	ducto	
0.3	8.5	6	1	2	24	4.69	[illegible]	reducción	
0.4	4	6	1	2	24	4.69	1.63	codo	
1.13	5	6	2	2	24	4.69	[illegible]	ducto	
1.13	8	6	2	2	24	4.69	8.34	ducto	
0.4	5	2	1	2	24	4.69	1.29	reducción	
1.13	6	4	10	2	24	4.69	34.32	ducto	
0.4	6	4	1	2	24	4.69	1.40	codo	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.83	zapato	
0.07	5	4	1	2	24	4.69	0.08	zapato	
1.13	5	4	7	2	24	4.69	24.42	ducto	
0.52	5	4	1	2	24	4.69	1.24	ducto	
0	4	4	1	2	24	4.69	0.26	tapa	
0.17	10.5	4	1	2	24	4.69	0.90	zapato	
0.02	5	4	1	2	24	4.63	0.47	zapato	
1.13	5	6	1	2	24	4.69	[illegible]	ducto	
0.3	8	3	1	2	24	4.69	1.02	reducción	
1.13	8	4	1	2	24	4.69	10.46	ducto	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	tapa	
0.69	13	12	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	RECUPERACIÓN PARTOS
5.5	13	12	2	2	24	4.64	7.30	DUCTO	
0.77	13	12	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	PASILLO INTERNO
0.22	17	12	1	2	24	4.69	2.90	DUCTO	
0.57	17	12	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
4.54	17	12	1	2	24	4.69	4.35	DUCTO	
0.13	5.5	6	1	2	24	4.69	0.76	ZAPATO	RECUPERACIÓN PARTO A-W-C
0.07	6	6	1	2	24	4.63	2.4	ZAPATO	
1.13	6	6	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.3	6	5	1	2	24	4.62	1.02	REDUCCIÓN	
1.01	6	4	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.63	0.27	TAPA	
[redacted]									
1.13	15	10	13	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO TABLERO	FRENTE A QUIRÓFANOS 1-2-3
SISTEMA DE RETORNO (2)									
0.45	19	15	1	2	24	4.69	3.22	codo	
1.13	15	10	1	2	24	4.69	[illegible]	ducto	
0.4	10.5	9	1	2	24	4.69	2.36	reducción	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	[illegible]	ducto	
0.52	6	4	1	2	24	4.69	1.24	ducto	
0.3	5	4	1	2	24	4.69	1.02	reducción	
0.36	5	4	1	2	24	4.69	1.29	ducto	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	3.20	ducto	
0.67	6	4	1	2	24	4.69	2.07	ducto	
0.4	6	7	1	2	24	4.69	1.39	codo	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	2.98	ducto	
	6	4	1	2	24	4.69	0.27	ajuste	
0.52	10	4	1	2	24	4.69	2.41	reducción	
1.13	12	8	7	2	24	4.69	46.35	ducto	
1.13	12	8	1	2	24	4.69	17.44	tapa	
0.01	12	8	2	2	24	4.69	[illegible]	reducción	
0.52	12	8	1	2	24	4.69	2.91	ducto	
0.44	12	8	1	2	24	4.69	2.55	ducto	
0.5	11	8	1	2	24	4.69	2.92	ajuste	
0.83	10	8	1	2	24	4.69	4.05	ajuste	
0.44	10	8	1	2	24	4.69	2.32	codo	
1.13	13	8	2	2	24	4.69	16.40	reducción	
0.32	10	7	1	2	24	4.69	1.06	reducción	
1	10	6	1	2	24	4.69	4.16	ducto	
0.4	6	4	1	2	24	4.69	[illegible]	reducción	
0.52	6	6	1	2	24	4.69	1.74	ducto	
0.4	6	6	1	2	24	4.69	1.40	codo	
1.13	6	6	1	2	24	4.69	3.40	ducto	
0	6	6	1	2	24	4.69	0.28	tapa	
0.15	5.5	4	1	2	24	4.69	0.71	zapato	
0.07	6	4	1	2	24	4.69	[illegible]	zapato	
1.13	5	4	1	2	24	4.69	2.91	ducto	
0.36	6	4	1	2	24	4.69	[illegible]	codo	
0.15	5.5	4	1	2	24	4.69	0.21	ZAPATO	DUCTO FINAL - TRABAJO LIMPIO Y SUCIO
0.07	6	4	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	2.91	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0.43	12.5	4	1	2	24	4.69	0.96	ZAPATO	
0.25	10	4	1	2	24	4.69	1.17	ZAPATO	
0.41	10	4	1	2	24	4.69	1.46	DUCTO	
1.13	10	4	1	2	24	4.69	4.07	DUCTO	
0.42	10	4	1	2	24	4.69	1.70	DUCTO	TRABAJO LIMPIO
0.52	10	4	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.39	10	4	1	2	24	4.69	1.50	DUCTO	
1.13	10	4	3	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	10	4	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	[illegible]
[illegible]	10	4	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	10	4	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	9	4	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
1.13	5	4	2	2	24	4.69	6.98	DUCTO	TRABAJO SUCIO
0.52	12	10	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	12	10	1	2	24	4.69	3.20	DUCTO	FRENTE ASCENSOR
0.07	12	10	1	2	24	4.69	[illegible]	CODO	
0.15	5.5	4	1	2	24	4.69	0.71	ZAPATO	
0.07	5	4	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	[illegible]
0	5	4	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
[redacted]									
1.13	12	10	4	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO [illegible]	[illegible] INTERNOS
[redacted]									
1.13	12	10	4	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO [illegible]	[illegible] INTERNOS
PISO 3									
SISTEMA DE SUMINISTRO (1)									
0.5	15	14	1	2	24	4.69	4.90	CODO	
1.12	15	14	7	2	24	4.69	65.71	DUCTO	
0.5	15	14	1	2	24	4.69	[illegible]	CODO	
0.4	15	12	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
0.52	14	12	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.2	14	12	1	2	24	4.69	1.80	DUCTO	
1.13	14	12	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	14	11	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
1.13	14	10	3	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	13	10	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCIÓN	
1.13	12	10	3	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	10.5	7.5	1	2	24	4.69	2.62	REDUCCIÓN	
1.13	9	5	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	9	5	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.42	9	5	1	2	24	4.69	[illegible]	CODO	

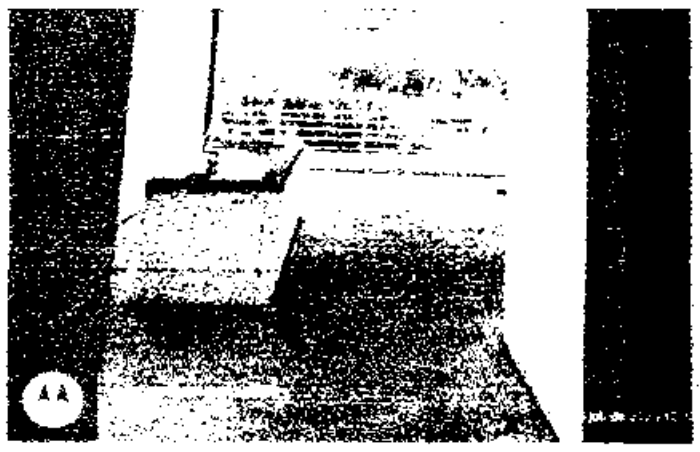










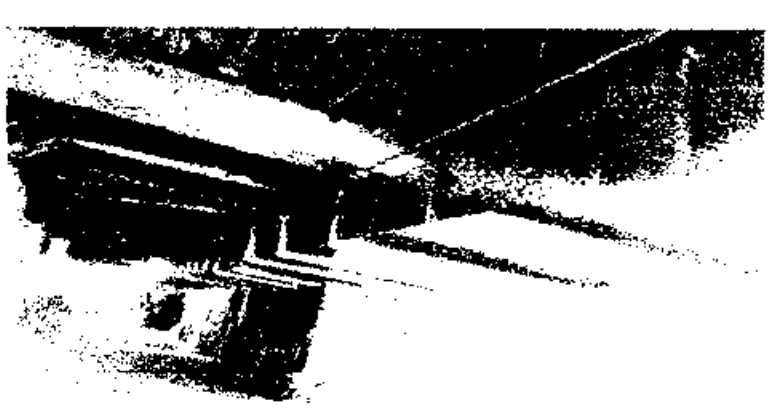



[illegible]	9	[illegible]	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0.15	11.5	[illegible]	1	2	24	4.69	1.17	ZAPATO	
[illegible]	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
0.8	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0.17	11.5	[illegible]	5	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
[illegible]	9	[illegible]	5	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
1.13	9	5	10	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	9	5	[illegible]	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
[illegible]	11.5	[illegible]	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (T)	[illegible]
[illegible]	11	6	1	2	24	4.69	0.77	ZAPATO (R)	
[illegible]	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	12	8	1	2	24	4.69	0.45	TAPA	
1.13	18	14	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	[illegible] PEDIATRICA
SISTEMA DE SUMINISTRO (2)									
1.13	16	14	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	16	13	1	2	24	4.69	4.31	REDUCCION	
1.13	16	12	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.2	16	12	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	15	12	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
1.13	14	12	2	2	24	4.69	15.11	DUCTO	
[illegible]	14	12	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	14	11	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
1.13	11	10	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	12	10	1	2	24	4.69	3.20	REDUCCION	
1.13	10	10	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.5	10	9	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
1.13	10	8	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.73	10	8	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	[illegible]	[illegible]	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
1.13	9	5	2	2	24	4.69	6.14	DUCTO	
[illegible]	9	[illegible]	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	11	14	1	2	24	4.69	[illegible]	[illegible]	[illegible] PEDIATRICA
[illegible]	16	14	1	2	24	4.69	1.11	DUCTO	
0.52	11	14	1	2	24	4.69	1.47	DUCTO	
0.15	11	5	5	2	24	4.69	4.37	ZAPATO (T)	CAMAS DE PEDIATRICA
0.15	[illegible]	5	5	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (R)	
0	7	7	5	2	24	4.69	1.62	TAPA	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	2	24	4.69	2.70	DUCTO	
0.73	9	7	1	[illegible]	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
[illegible]	[illegible]	6	1	2	24	4.69	2.61	DUCTO	
[illegible]	9	5	1	2	24	4.69	5.08	DUCTO	
0.5	[illegible]	[illegible]	1	2	24	4.69	2.47	DUCTO	
0.42	9	5	1	2	24	4.69	1.70	CODO	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	4	4	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
[illegible]	[illegible]	5	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.15	9	5	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (T)	
[illegible]	9	5	1	2	24	4.69	0.47	ZAPATO (R)	
1.13	9	5	1	2	24	4.69	4.07	DUCTO	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	9	5	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (3)									
1.13	11	10	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	12	8	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
1.13	12	[illegible]	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.45	12	5.5	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
1.13	5	[illegible]	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
SISTEMA DE SUMINISTRO (4)									
0.5	15	14	1	2	24	4.69	4.04	CODO	
1.13	16	14	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	15	14	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
1.13	17	14	4	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	15.5	12	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
1.13	14	10	4	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	12	10	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
1.13	10	10	4	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	10	10	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
1.13	15	14	2	2	24	4.69	15.19	DUCTO	SUBE LUDOTECA
0.14	14.5	5	4	2	24	4.69	4.46	ZAPATO	LUDOTECA
[illegible]	[illegible]	5	4	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
0.52	12.5	5	5	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
1.13	12	5	4	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	12	5	4	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
[illegible]	11	6	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
0.52	9	6	1	2	24	4.69	0.50	ZAPATO	
1.13	[illegible]	6	[illegible]	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	[illegible]	6	[illegible]	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (5)									
1.13	16	12	[illegible]	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	14	10.5	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
[illegible]	12	9	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
1.13	12	9	4	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	12	7.5	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
1.13	12	6	5	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.17	11.5	9	1	2	24	4.69	1.46	ZAPATO (T)	ENTRA EXTRACCION DE LECHE MATERNA
[illegible]	12	9	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (R)	
1.13	12	9	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
[illegible]	12	9	1	2	24	4.69	4.10	DUCTO	
[illegible]	12	8	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
0.42	12	7	1	2	24	4.69	[illegible]	CODO	
1.13	12	7	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	12	7	1	2	24	4.69	0.50	TAPA	
[illegible]	11	6	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (T)	ENTRA PREPARACION DE [illegible]
0.07	9	6	1	2	24	4.69	0.57	ZAPATO (R)	
1.13	9	6	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	6	6	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	[illegible]	6	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
1.13	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	ENTRA DESCANSO ENFERMERIA
0.5	12	6	1	2	24	4.69	2.53	CODO	
[illegible]	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
1	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	10.5	6	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
1.13	9	6	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	9	6	2	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
0.15	11.5	6	1	2	24	4.69	1.17	ZAPATO (T)	ENTRA INFORMACION ENFERMERIA
[illegible]	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (R)	
0.52	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
1.13	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
[illegible]	10.5	6	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (T)	
[illegible]	6	6	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (R)	
[illegible]	6	6	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	6	5	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
[illegible]	10.5	6	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	ENTRA COORDINACION PEDIATRIA
1.13	9	6	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
[illegible]	9	6	1	2	24	4.69	[illegible]	CODO	
0	9	6	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
SISTEMA DE SUMINISTRO (6)									
1.13	12	6	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	[illegible] PEDIATRICA
0.5	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	CODO	
0.52	12	6	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
1.13	10	6	4	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	9	4.5	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
1.13	9	[illegible]	[illegible]	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.5	4.5	7	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
1.13	6	4	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	0.22	TAPA	
[illegible]	10.5	4	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (T)	[illegible]
[illegible]	6	4	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO (R)	
1.13	6	4	2	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0	6	4	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	
SISTEMA DE RETORNO (1)									
1.13	14	4	10	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.5	14	4	1	2	24	4.69	[illegible]	CODO	
0.73	14	4	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.52	14	6.5	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	
0.52	11	9	1	2	24	4.69	[illegible]	REDUCCION	[illegible]
1.13	12	10	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
1.13	12	10	1	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	








4 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
A MARTERNO INFANTIL




No 50-65 Avenida Universitaria
Tunja
Boyacá
#CLINICA MARTERNO INFANTIL

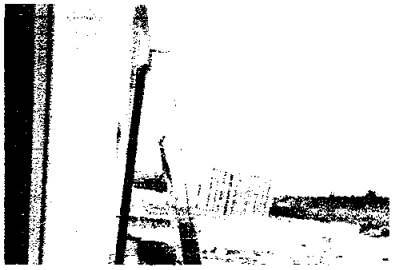

SISTEMA DE RETORNO (2)

SISTEMA DE RETORNO (1)



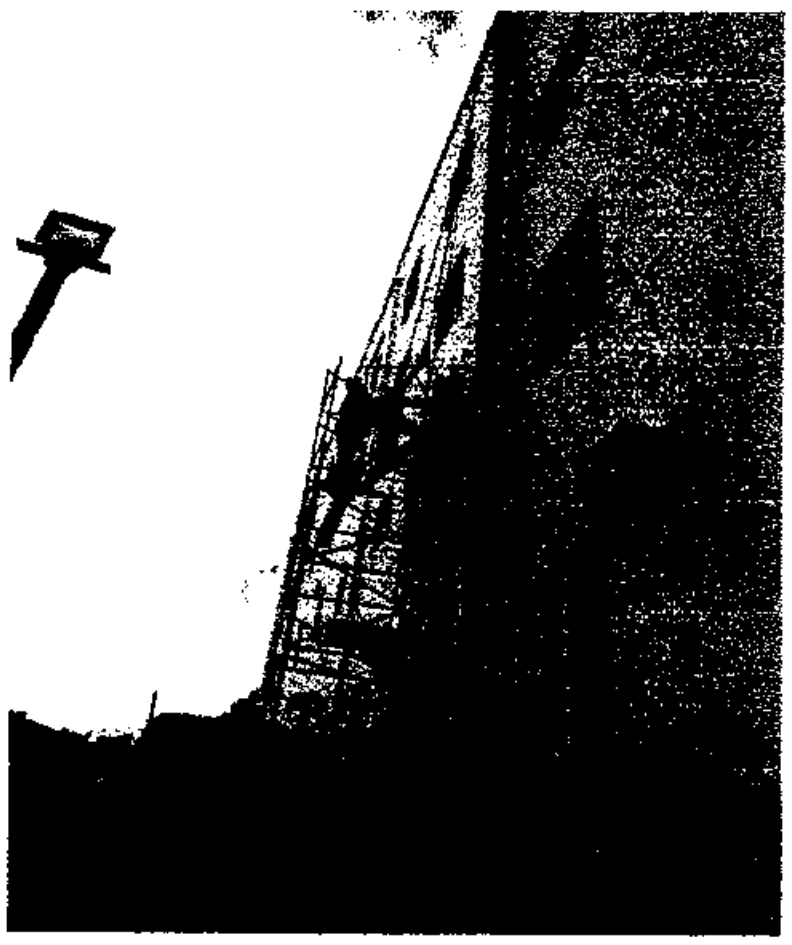



1.33	12	12	15	2	18	24.16	362.45	DUCTO	PARQUEADEROS 28 - 27 - 26 - 25 A PARQUEADERO 17
0.52	21.5	12	1	2	18	10.16	13.53	REDUCCIÓN	
1.33	21	12	5	2	24	4.69	47.95	DUCTO	
0.12	21.5	10	1	2	24	4.69	1.23	ZAPATO	
0.16	22	10	1	2	24	4.69	1.91	ZAPATO	
1.33	22	10	6	2	24	4.69	55.71	DUCTO	
0.54	22	10	1	2	24	4.69	4.00	DUCTO	
0.52	17	10	1	2	24	4.69	3.92	REDUCCIÓN	
1.33	17	10	3	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.78	15	10	1	2	24	4.69	2.90	DUCTO	
1.33	15	10	1	2	24	4.69	2.27	DUCTO	
0.74	15	10	1	2	24	4.69	5.54	DUCTO	
1.33	15	10	5	2	24	4.69	25.23	DUCTO	
0.53	15	10	1	2	24	4.69	3.69	DUCTO	PARQUEADEROS 33 - 36 A BODEGA DE SERVICIOS GENERALES
[illegible]	12.5	9	1	2	24	4.69	2.25	REDUCCIÓN	
1.33	14	6	5	2	24	4.69	26.16	DUCTO	
0.44	14	6	1	2	24	4.69	2.21	CODO	
1.33	14	6	4	2	24	4.69	20.93	DUCTO	
0.13	12.5	6	1	2	24	4.69	1.07	ZAPATO	
0.07	13	6	1	2	24	4.69	0.48	ZAPATO	
0.5	12	6	1	2	24	4.69	2.35	DUCTO	
1.33	12	6	1	2	24	4.69	3.80	DUCTO	
0.6	12	4	1	2	24	4.69	2.75	DUCTO	
1.33	12	8	7	2	24	4.69	40.59	DUCTO	FRENTE A CUARTO ELÉCTRICO A DEP. [illegible]
0.52	12	8	1	2	24	4.69	3.14	DUCTO	
0.5	14	7	1	2	24	4.69	1.67	REDUCCIÓN	
0.5	14	6	1	2	24	4.69	2.55	DUCTO	
0.98	10	4	1	2	24	4.69	3.62	DUCTO	
0.20	9.5	4	1	2	24	4.69	0.80	ZAPATO	
0.35	6	4	1	2	24	4.69	1.07	ZAPATO	BIENESTAR A [illegible] Y DEP. ALMACÉN
1.13	6	4	13	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	
0.38	6	4	1	2	24	4.69	1.07	CODO	
0.6	6	4	1	2	24	4.69	1.14	DUCTO	
0.36	6	4	1	2	24	4.69	1.05	CODO	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	2	24	4.69	2.15	REDUCCIÓN	
1.33	9	4	1	2	24	4.69	3.49	DUCTO	
0	8	4	1	2	24	4.69	[illegible]	TAPA	DEPARTAMENTO BIOMÉDICO
0.15	10.5	4	2	2	24	4.69	1.66	ZAPATO	
0.14	8	4	2	2	24	4.69	2.66	ZAPATO	
0	8	4	2	2	24	4.69	0.55	TAPA	
1.33	10	8	1	2	24	4.69	20.25	DUCTO	TALLER MANTENIMIENTO
0	10	8	1	2	24	4.69	0.47	TAPA	
0.35	12.5	4	1	2	24	4.69	[illegible]	ZAPATO	
0.08	10	4	1	2	24	4.69	0.47	ZAPATO	
[illegible]	10	5	1	2	24	4.69	2.96	DUCTO	
0.52	10	5	1	2	24	4.69	2.26	REDUCCIÓN	
[illegible]	10	5	1	2	24	4.69	2.75	DUCTO	
1.33	10	5	9	2	24	4.69	43.24	DUCTO	
[illegible]	8	5	1	2	24	4.69	4.07	REDUCCIÓN	
1.33	8	3	1	2	24	4.69	5.78	DUCTO	
0.75	8	3	1	2	24	4.69	3.22	DUCTO	
0	8	5	1	2	24	4.69	0.30	TAPA	
0.15	10.5	4	1	2	24	4.69	0.80	ZAPATO	CONSULTORIO DE DIETAS A CUARTO [illegible]
0.37	8	4	1	2	24	4.69	1.32	ZAPATO	
0	8	4	1	2	24	4.69	0.26	TAPA	
0.15	8.5	4	1	2	24	4.69	0.77	ZAPATO	
0.32	6	6	1	2	24	4.69	1.20	ZAPATO	
1.33	6	6	1	2	24	4.69	5.20	DUCTO	
0	6	6	1	2	24	4.69	0.25	TAPA	
0.15	17.5	10	1	2	24	4.69	1.44	ZAPATO	
0.30	15	10	1	2	24	4.69	2.60	ZAPATO	
1.33	15	10	1	2	24	4.69	7.27	DUCTO	
0	15	10	1	2	24	4.69	0.75	TAPA	
0.175	20	10	2	1	24	4.69	3.14	CUELLO	PARQUEADERO 29 A 22
0.17	17.5	10	1	2	24	4.69	1.70	ZAPATO	
0.35	15	10	1	2	24	4.69	2.80	ZAPATO	
1.33	15	10	1	2	24	4.69	7.25	DUCTO	
0	15	10	1	2	24	4.69	0.75	TAPA	
0.175	20	10	2	1	24	4.69	3.44	CUELLO	
0.175	20	10	2	1	24	4.69	3.44	CUELLO	
0.175	20	10	2	1	24	4.69	3.44	CUELLO	
0.1	12.5	10	1	2	24	4.69	1.44	ZAPATO	PARQUEADEROS 45, 35, 17
0.34	15	10	1	2	24	4.69	1.75	ZAPATO	
1.33	15	10	1	2	24	4.69	7.25	DUCTO	
0	15	10	1	2	24	4.69	0.75	TAPA	
0.175	20	10	2	1	24	4.69	3.14	CUELLO	
FACHADA ORIENTAL									
SISTEMA DE SUMINISTRO (1)									
0.66	22	12	2	2	24	4.69	12.15	CODO	ENTRE EJES [illegible]
0.46	12	22	2	2	24	4.69	5.00	CODO	
1.33	22	12	6	2	24	4.69	94.93	DUCTO	
SISTEMA DE SUMINISTRO (4)									
0.46	22	12	2	2	24	4.69	9.45	CODO	ENTRE EJES [illegible] - B
1.33	22	12	7	2	24	4.69	[illegible]	DUCTO	

OBSERVACIONES:

TOTAL	11,574.73 Kilogramo
ACUMULADO ANTERIOR	8,924.57 Kilogramo
PRESENTE ACTA	7,650.18 Kilogramo

Elaboro contratista:	Estefanía Carvajal Henao	FIRMA
Aprobó Interventoría:	Brenda Luz Hurtado	FIRMA

INTERVENTORÍA
UMI

Tunja, 16 de septiembre de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No 352 de 2025, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: CERTIFICACION ACTA PARCIAL No 4 CONTRATO DE OBRA No 345 DE 2025.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente nos permitimos certificar acta parcial No 3 del contrato de obra 345 de 2025 "CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", las actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025, correspondiente a los componentes técnicos, financieros, contables, SST y Ambientales lo anterior en cumplimiento a lo contemplado contractualmente.

Técnico.
Certifica que las cantidades presentadas en acta parcial son la ejecutadas en obra, de acuerdo con las memorias de cálculo presentadas y firmadas por la interventoría.

El porcentaje de tiempo transcurrido, avance de obra ejecutado y avance de obra programado son los indicados teniendo en cuenta programación de obra.

El seguimiento financiero es acorde a las actas parciales de obra.

Ambiental.

Certifica que las licencias y permisos ambientales se encuentran al día en la fecha de corte de la presente acta.
Certifica que el almacenamiento y disposición de materiales y residuos se ha realizado conforme a la normatividad legal ambiental vigente y el contratista cumple con los respectivos soportes de cumplimiento ambiental.

Que se verificaron cada una de las actividades del Plan de Manejo ambiental definidas por el contratista y se verifico el total cumplimiento y eficacia de las mismas en el periodo de la presente acta.

Seguridad Salud En El Trabajo

Informe a seguimiento mensual obra civil.
Indicadores clave de desempeño.
Cumplimiento normativo formación y capacitación.
Evaluación de la efectividad de la formación.

Lo anterior en cumplimiento a lo contemplado contractualmente.

Atentamente,

BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

INTERVENTORÍA
UMI

Tunja, 16 de septiembre de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No 352 de 2025, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Cordial Saludo.

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas las planillas y constatadas con el personal en obra, el Consorcio Terminación UMI identificado con NIT. 901.919.277-7 se encuentra al día y a PAZ Y SALVO en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes de todos sus empleados, de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES). Para el periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de agosto de 2025.

Atentamente,

BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

INTERVENTORÍA
UMI

Tunja, 16 de septiembre de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoria No 352 de 2025, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

Cordial Saludo.

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas cada una de las actividades ejecutadas en obra por el contratista Consorcio Terminación UMI en el periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de agosto de 2025, las mismas cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos.

Atentamente,

BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

INTERVENTORÍA
UMI

Tunja, 16 de septiembre de 2025

Señores
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
DR. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No 352 de 2025, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTRATISTA DE OBRA AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Cordial Saludo.

Por medio del presente certificamos que luego de verificadas las condiciones en obra y la documentación presentada por el contratista Consorcio Terminación UMI para el periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de agosto de 2025, se da cumplimiento a todo lo relacionado con los requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Atentamente,

BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

CERTIFICADO DE ADHERENCIA ISO 14001 DE 2015
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
MES DE AGOSTO 2025

El presente informe se genera luego de realizar revisión documental, operacional y verificación de la certificación del contratista CONSORCIO TERMINACIÓN UMI de los requisitos contractuales solicitados, socializados y pactados en el contrato 345 de 2025, cuyo objeto contractual es la "CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA".

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL- CUMPLIMIENTO ISO 14001 DE 2015				
REQUISITO		**CUMPLIMIENTO**		**SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2025**
		CUMPLE	**NO CUMPLE**	
FUENTES DE MATERIALES E INSUMOS				
1	Licencias ambientales de las canteras de la materia prima (Arena, Grava, etc.).	1		LICENCIA AMBIENTAL LUIS HERNANDO ACERO CUERVO: FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2007. LICENCIA MINERA DE JESUS MARIA REYES MOZO OOLA00023-21- EN PROCESO. LA ANTERIOR INFORMACIÓN ES AVALADA POR LA INTERVENTORIA EN SU INFORME MENSUAL. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
2	Almacenamiento del material de forma adecuada conforme a las características técnicas que debe tener el acopio de cada material (Fotografías)	**1**		SE ADJUNTAN EVIDENCIAS DE ACOPIO ADECUADAS – SE CORROBORAN POR MEDIO DE INSPECCION EN SITIO. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
3	Títulos Mineros de las canteras de material.	1		TITULO MINERO DE AGREGADOS EL VERGEL CUYO REPRESENTANTE LEGAL JESUS MARIA REYES MOZO CODIGO DEL EXPEDIENTE ARE-TIR-15241 EN CONCESION A NELSON ARCOS PACACIRA.

				Vigente para el mes de agosto del 2025.
4	Órdenes de compra o facturas de compra que acrediten el vínculo comercial con esas canteras.	1		ORDEN DE COMPRA AGREGADOS EL VERGEL. ORDEN DE COMPRA FERRECONSTRUCCIONES JL. S.A.S ORDEN DE COMPRA ARGOS. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
5	Demarcar las áreas con el nombre de material de acopio (Fotografías)	**1**		SE ADJUNTAN EVIDENCIAS DE ACOPIO ADECUADAS – SE CORROBORAN POR MEDIO DE INSPECCION EN SITIO. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
	Garantizar que el sitio de acopio cumpla con las condiciones de temperatura y humedad para garantizar la calidad de los materiales.	**1**		SE ADJUNTAN EVIDENCIAS DE ACOPIO ADECUADAS – SE CORROBORAN POR MEDIO DE INSPECCION EN SITIO. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
IMPACTOS AMBIENTALES Y CONTROLES DE MANEJO				
1	Matriz de aspectos e impactos ambientales, metodología CONESA. **Única vez al inicio del contrato.**	1		Se carga matriz de aspectos e impactos ambientales dentro del PAGA. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
2	Plan de Manejo Ambiental con cronograma de actividades definido al tiempo de duración de la obra, en este se deben contemplar todos los recursos de la matriz de aspectos e impactos y plantear las actividades que se ejecutaran para minimizar los impactos. **Mensualmente deberán ser reportadas las actividades y resultado de indicadores de las Fichas de Manejo Ambiental**	1		EVIDENCIAS DEL PAGA COMPLETAS – CARGADAS EN EL DRIVE DE INFORMACIÓN. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**

	Plan de Manejo de los residuos en donde se clasifiquen e identifiquen los tipos de residuos generados por la obra y la correcta forma de disponerlos	1		CONTRATO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y RESPECTIVA CERTIFICACION POR EL AREA DE INTERVENTORIA. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
3	ETIQUETAR LAS CANECAS, LOS CONTENEDORES Y LOS DIFERENTES ESPACIOS CONFORME A LOS RESIDUOS QUE SE PUEDEN DEPOSITAR EN ESTOS ESPACIOS. **Única vez al inicio del contrato.**	1		PUNTO ECOLOGICO EN BUEN ESTADO. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN CORRECTA DE ESCOMBROS				
1	Presentar ante la corporación autónoma regional de Boyacá el Plan de Manejo y solicitar apertura de expediente como gran generador de Residuos de Construcción y Demolición, realizar luego del inicio del trámite todos los informes normativos que exija la corporación para cumplir con el Plan de Manejo de este tipo de residuos. Cargar en el drive el Plan presentado, el radicado, y posteriormente el radicado de respuesta. **Única vez al inicio del contrato.**	1		Plan de RCD radicados a Corpoboyacá. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
2	Presentación de informes mensuales con información referente a Manejo de Residuos, Orden y Limpieza	1		Respuesta oportuna de informe de hallazgos de la inspección ambiental realizada el 21 de agosto del 2025. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
	INCLUIR EN EL INFORME FOTOGRAFIAS DEL CORRECTO ALMACENAMIENTO DE LOS ESCOMBROS	1		
3	Reportar semanalmente al área de gestión ambiental la salida de escombros que incluya el siguiente cuadro y cargar en el	1		Certificaciones de disposición final de los escombros. **Vigente para el mes de agosto del**

	drive el archivo Excel que contenga el cuadro y las respectivas actas de disposición final.			**2025.**
SUSTANCIAS QUIMICAS				
1	Fichas de seguridad de sustancias químicas empleadas	1		Se reciben 51 fichas de seguridad- Evidencia correos de notificación. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
VEHICULOS DE OBRA				
1	Relación de vehículos y respectiva revisión tecno mecánica de los mismos	1		Se recibe información y revisiones tecno mecánicas vigentes de los vehículos. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
CANINOS DE LA INSTITUCIÓN				
1	Documentos de vacunación y carta de responsabilidad de tenencia canina en caso de ser responsables de algún canino	1		SE ENTREGAN CARNETS DE VACUNACION DE RAFAEL-RAFAELA Y PILOTICO. **Vigente para el mes de agosto del 2025.**
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		**14**	**0**	**100%**

LA ANTERIOR INFORMACIÓN ES AVALADA Y CERTIFICADA POR LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO EN EL INFORME PRESENTADO PARA EL MES DE JULIO.

En conclusión, se puede observar que para el mes de **AGOSTO DE 2025** el contratista presenta adherencia de 100% al sistema de gestión ambiental.

Atentamente,

Laura Natalia Espinosa G

LAURA NATALIA ESPINOSA GRIMALDOS
Líder Sistema de Gestión Ambiental
E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Valeria Herrera T.

VALERIA HERRERA TINJACA
Sistema de Gestión Ambiental
E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja

CERTIFICADO DE ADHERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MES DE AGOSTO 2025

El presente informe se genera luego de realizar revisión documental, operacional de la empresa CONSORCIO TERMINACION UMI, de los requisitos contractuales solicitados, socializados y pactados en el contrato 345 de 2025, cuyo objeto contractual es ***"Construcción de la ampliación de urgencias de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja"***. A continuación, se detalla lo siguiente:

	ITEM A EVALUAR	C	N.C	NA
1	El consorcio terminación UMI presentar ATS Analís de trabajo seguro hasta la fecha de entrega de la información.	1		
2	El consorcio terminación UMI certificación de equipos de trabajo en alturas con fecha.	1		
3	El consorcio terminación UMI cuenta Inspecciones de arnés, esïinga, línea de vida	1		
4	El consorcio terminación UMI cuanta con registro de entrega de elementos de protección personal, estos son ergonómicos de acuerdo al peligro y/o factor de riesgo existente en su actividad, verificando que cumplan con la normatividad legal vigente y se realiza control.	**1**		
5	El consorcio terminación UMI Cuenta con registro de accidentes e incidentes presentar indicadores	1		
6	El consorcio terminación UMI cuenta con plan de seguridad vial (Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño, Plan anual de trabajo, Vías seguras administradas por la organización, Inspección de vehículos y equipos, Mantenimiento y control de vehículos seguros y equipos, Plan de capacitación de conductores,	1		
7	El consorcio terminación UMI cuenta inspección a herramientas	1		
8	El consorcio terminación UMI cuenta con Inspección de elementos de protección personal	1		
9	Inspección de maquinaria y equipos	1		
10	El consorcio terminación UMI Verifica el uso de elementos de protección personal	1		
11	El consorcio terminación UMI cuenta con Lista de asistencia de El consorcio	1		

Powered by CamScanner

	terminación UMI realiza capacitaciones, reinducción			
12	El consorcio terminación UMI cuenta con vacuna de tétano para sus trabajadores	1		
13	El consorcio terminación UMI Verifica la señalización del control de acceso en especial los que tienen que ver con cliente externo y la seguridad de personal ajeno a obra) esta es clara, pertinente, suficiente	1		
TOTAL		100%		

Por lo anterior se certifica CUMPLIMIENTO DE 100% con los criterios evaluados para el mes de AGOSTO 2025

RICARDO CASTRO

Elaboro JOSÉ RICARDO CASTRO
Profesional de apoyo SGSST
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Powered by CamScanner

Tunja, 16 de septiembre de 2025

Señores,
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de
Tunja Carrera 11 No 27-27
Tunja, Departamento de Boyacá

Asunto: Certificación de pago de seguridad social y aportes legales.

Cordial saludo,

Yo, Estefanía Carvajal Henao, identificada con C.C. 1.037.630.191, en mi condición de Representante Legal, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, certifico que el CONSORCIO TERMINACIÓN UMI, identificado con NIT. 901.919.277-7 se encuentra al día y a paz y salvo en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes de todos sus empleados, de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 202 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES). Correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de agosto de 2025.

La presente certificación se expide en Tunja a los 16 días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TERMINACIÓN UMI

Tunja, 16 de septiembre de 2025

Señores,
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de
Tunja Carrera 11 No 27-27
Tunja, Departamento de Boyacá

Asunto: Certificación de pago de seguridad social y aportes legales.

Cordial saludo,

Yo, Elizabeth Jein Arias Soto, identificada con C.C. 44.008.013, y con Tarjeta Profesional No. 207538-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, certifico que el CONSORCIO TERMINACIÓN UMI, identificado con NIT. 901.919.277-7 se encuentra al día y a paz y salvo en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes de todos sus empleados, de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 202 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES). Correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de agosto de 2025.

La presente certificación se expide en Tunja a los 16 días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

ELIZABETH JEIN ARIAS SOTO
CONTADORA
CONSORCIO TERMINACIÓN UMI


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

44.008.013
ARIAS SOTO

APELLIDOS

ELIZABETH JEIN

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ENE-1986**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

B- G.S RH

F SEXO

28-ENE-2004 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0100100-00392145-F-0044008013-20120809 00307449264 1 2031933



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
207538-T
ELIZABETH JEIN
ARIAS SOTO
C.C. 44008013
RESOLUCION INSCRIPCION 650 FECHA 30/09/2015
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
221765

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

Z 8 B F D 1 2 2 6 1 1 E 1 0 5 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELIZABETH JEIN ARIAS SOTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 44008013 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 207538-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

AGOSTO 2025

enlace

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-09, 01:25:28 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79806242

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 09/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO TERMINACION UMI		
Documento	NI901919277	**Dirección**	AV 51 #51 - 60 AVENIDA UNIVERSITARIA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2621938
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TUNJA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal	CARVAJAL HENAO ESTEFANIA	**Identificación**	CC 1037630191
Total Afiliados	61	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud				Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 1002329251	SERGIO ANDRES JR AN BALLESTA	01	00											X							0	5	5	5	5	(23030) PORVENIR	$ 237.250	$ 28.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 237.250	$ 9.500	0.040	$ 237.250	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 237.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.500
CC 1002329251	SERGIO ANDRES JR AN BALLESTA	01	03																		0	25	25	25	25	(23030) PORVENIR	$ 1.186.250	$ 142.350	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.186.250	$ 47.500	0.040	$ 1.186.250	$ 82.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.400
CC 1003984991	DEYNT STEVEN ACERO HERRERA	01	00																		0	30	30	30	30	(23030) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.000.000	$ 80.000	0.050	$ 2.000.000	$ 199.800	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.400
CC 1002985453	DEYNER STIVEN PIRACOCA ESPINOSA	01	00										X								0	4	4	4	4	(23030) PORVENIR	$ 189.800	$ 30.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 189.800	$ 0	0.000	$ 189.800	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.400
CC 1002985453	DEYNER STIVEN PIRACOCA ESPINOSA	01	00											X							0	2	2	2	2	(23030) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 94.900	$ 3.800	0.040	$ 94.900	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 1002985453	DEYNER STIVEN PIRACOCA ESPINOSA	01	00		X																6	24	24	24	24	(23030) PORVENIR	$ 1.139.800	$ 182.350	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.139.800	$ 45.600	0.040	$ 1.139.800	$ 79.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.139.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.850
CC 1006102201	DUBER HERNANDO BERNAL RODRIGUEZ	01	00	X																	0	4	4	4	4	(23030) PORVENIR	$ 189.800	$ 30.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 189.800	$ 7.600	0.040	$ 189.800	$ 13.300	(CCF10) COMFABOY	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900
CC 1076033129	EMILIO JOSE SILVA PACHECO	01	00																		0	30	30	30	30	(23030) PORVENIR	$ 1.780.000	$ 284.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.780.000	$ 71.200	0.040	$ 1.780.000	$ 124.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 1076156645	DAVID LEANDRO GUAREVEDO	01	00																		0	30	30	30	30	(23030) PROTECCION	$ 2.400.000	$ 384.000	EPS010 CRS SURA	$ 2.400.000	$ 96.000	0.040	$ 2.400.000	$ 167.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.700
CC 1026920478	ANDERSON GIOVANY LOPEZ RODRIGUEZ	01	00																		0	1	1	1	1	(23030) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 47.450	$ 0	0.000	$ 47.450	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
CC 1026920478	ANDERSON GIOVANY LOPEZ RODRIGUEZ	01	00		X																0	19	19	19	19	(23030) PORVENIR	$ 759.800	$ 121.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 759.800	$ 30.400	0.040	$ 759.800	$ 62.100	(CCF10) COMFABOY	$ 759.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 226.500
CC 1026949787	JUAN FELIPE NOVA FONSECA	01	00											X							0	5	5	5	5	(25-14) OCUPENSIONES	$ 237.250	$ 38.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 237.250	$ 9.500	0.040	$ 237.250	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 237.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.500
CC 1026920707	JUAN FELIPE NOVA FONSECA	01	00																		0	25	25	25	25	(25-14) OCUPENSIONES	$ 1.186.250	$ 190.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.186.250	$ 47.500	0.040	$ 1.186.250	$ 82.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.400
CC 1036553551	WILLIAM MICHEL SANCHEZ TORIBIO	01	00		X																0	30	30	30	30	(23030) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	EPS010 CRS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0.040	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1037630191	ESTEFANIA CARVAJAL HENAO	01	00																		0	30	30	30	30	(23030) PROTECCION	$ 4.000.000	$ 640.000	EPS010 CRS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	0.040	$ 4.000.000	$ 279.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.239.400
CC 1046015012	WILMAR ALEXANDER JIMENEZ RIVERA	01	00		X																0	15	15	15	15	(25-14) OCUPENSIONES	$ 950.000	$ 152.000	(EPS010) EPS SURA	$ 950.000	$ 38.000	0.040	$ 950.000	$ 59.850	(CCF04) COMFAMA	$ 950.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.850
CC 1049613956	ANDERSON ESTEBAN LAMEDA RACHE	01	00										X								0	1	1	1	1	(25-14) OCUPENSIONES	$ 47.450	$ 7.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 47.450	$ 0	0.000	$ 47.450	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
CC 1049613956	ANDERSON ESTEBAN LAMEDA RACHE	01	00	X																	0	24	24	24	24	(25-14) OCUPENSIONES	$ 1.139.800	$ 182.350	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.139.800	$ 45.600	0.040	$ 1.139.800	$ 79.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.139.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.850
CC 1049613956	OSCAR MAURICIO RATIVA SUAREZ	01	00																		0	30	30	30	30	(23030) PORVENIR	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.900.000	$ 76.000	0.040	$ 1.900.000	$ 133.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589.100

Enlace Operativo. Línea Expertos en PILA: Barrenquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 09/09/2025 **Empresa NI901919277 CONSORCIO TERMINACION UMI** **Planilla Nro: 79806242** **Periodo Cotización: agosto de 2025** **Periodo Servicio: septiembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1049617649	JOSE FERNANDO ALVITA MOLINA	6*	00	X																6	12	12	12	12	(220301) PORVENIR	$ 569.400	$ 91.200	EPS037 SANITAS	$ 569.400	$ 22.800	4.556	$ 569.400	$ 39.700	CCF10 COMFABOY	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.500
CC 1049619018	YEISON ALEXANDER BATIVA SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.920.000	$ 307.200	EPS037 NUEVA EPS	$ 1.920.000	$ 76.800	6.960	$ 1.920.000	$ 133.700	CCF10 COMFABOY	$ 1.920.000	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.600
CC 1049626551	JOSE ALBERTO VARGAS MORELO	6*	00															✓		0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 59.333	$ 9.600	EPS037 NUEVA EPS	$ 59.333	$ 0	0.000	$ 59.333	$ 0	CCF10 COMFABOY	$ 59.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.600
CC 1049626690	JOSE ALBERTO VARGAS MORELO	01	00	X																0	9	9	9	9	(231001) COLFONDOS	$ 474.667	$ 76.000	EPS037 NUEVA EPS	$ 474.667	$ 19.000	0.960	$ 474.667	$ 33.100	CCF10 COMFABOY	$ 474.667	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.100
CC 1049635557	ANDRES FELIPE LEGUIZAMON AGUILAR	01	00												✓					0	1	1	1	1	(220301) PORVENIR	$ 47.467	$ 7.600	EPS037 EPS SANITAS	$ 47.467	$ 0	0.000	$ 47.467	$ 0	CCF10 COMFABOY	$ 47.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
CC 1049635557	ANDRES FELIPE LEGUIZAMON AGUILAR	01	00	X																6	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.136.800	$ 182.000	EPS005 EPS SANITAS	$ 1.136.800	$ 45.600	3.960	$ 1.136.800	$ 79.300	CCF10 COMFABOY	$ 1.136.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 1049637057	FABIAN ANDRES HURTADO VARGAS	01	00																	6	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.710.000	$ 273.600	EPS010 EPS SURA	$ 1.710.000	$ 68.400	3.960	$ 1.710.000	$ 114.400	CCF10 COMFABOY	$ 1.710.000	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1049638614	JONAYKER DE DIAZ ARENAS	01	00													X				0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 189.800	$ 30.400	EPS037 NUEVA EPS	$ 189.800	$ 7.600	0.000	$ 189.800	$ 0	CCF10 COMFABOY	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.000
CC 1049638614	JONAYKER DE DIAZ ARENAS	01	00																	0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 1.233.700	$ 197.400	EPS037 NUEVA EPS	$ 1.233.700	$ 49.400	3.960	$ 1.233.700	$ 85.900	CCF10 COMFABOY	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.100
CC 1049640553	JONAD ALEXANDER RUIZ PEÑA	01	00														✓			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 178.000	$ 28.500	EPS041 NUEVA EPS S.A. MONILIDAD	$ 178.000	$ 0	0.000	$ 178.000	$ 0	CCF10 COMFABOY	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500
CC 1049640553	JONAD ALEXANDER RUIZ PEÑA	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.602.000	$ 256.400	EPS041 NUEVA EPS S.A. MONILIDAD	$ 1.602.000	$ 64.100	0.960	$ 1.602.000	$ 111.800	CCF10 COMFABOY	$ 1.602.000	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.100
CC 1049648851	MARCO ANTONIO MOLINA LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.780.000	$ 284.800	EPS035 EPS SANITAS	$ 1.780.000	$ 71.200	6.960	$ 1.780.000	$ 123.900	CCF10 COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 1049649850	HOYNER ARLEY DIAZ LOPEZ	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 808.650	$ 129.100	EPS017 FAMISANAR EPS	$ 808.650	$ 32.300	6.960	$ 808.650	$ 56.200	CCF10 COMFABOY	$ 808.650	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600
CC 1065651982	HARRINSON RIVERA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.780.000	$ 284.800	EPS037 NUEVA EPS	$ 1.780.000	$ 71.200	6.960	$ 1.780.000	$ 123.900	CCF10 COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 1049652579	EDWARDIS DE CASTILLO RUBIO	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 199.600	$ 31.900	EPS035 EPS SANITAS	$ 199.600	$ 7.900	6.960	$ 199.600	$ 13.900	CCF10 COMFABOY	$ 199.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.800
CC 1049656819	ANDRES FELIPE LOPEZ PINZON	61	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.420.500	$ 227.300	EPS041 NUEVA EPS S.A. MONILIDAD	$ 1.420.500	$ 57.000	6.960	$ 1.420.500	$ 99.100	CCF10 COMFABOY	$ 1.420.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1049657404	RICARDO DANIEL LOPEZ CASTELLANO	61	00																	6	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.780.000	$ 284.800	EPS041 NUEVA EPS S.A. MONILIDAD	$ 1.780.000	$ 71.200	6.960	$ 1.780.000	$ 123.900	CCF10 COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 1050093661	LUIS MIGUEL ROMERO MANQUEN	61	00																	0	30	30	30	30	(25-14) OCUPENSIONES	$ 1.428.500	$ 227.800	EPS017 FAMISANAR EPS	$ 1.428.500	$ 57.000	6.960	$ 1.428.500	$ 99.100	CCF10 COMFABOY	$ 1.428.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1050091640	NICOLAS ALEJANDRO ALVARADO SANCHEZ	01	00													✓				0	3	3	3	3	(25-14) OCUPENSIONES	$ 142.350	$ 22.800	EPS041 NUEVA EPS S.A. MONILIDAD	$ 142.350	$ 0	0.000	$ 142.350	$ 0	CCF10 COMFABOY	$ 142.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800
CC 1050091640	NICOLAS ALEJANDRO ALVARADO SANCHEZ	01	00	X																0	16	15	16	16	(25-14) OCUPENSIONES	$ 854.100	$ 136.700	EPS041 NUEVA EPS S.A. MONILIDAD	$ 854.100	$ 34.200	6.960	$ 854.100	$ 59.500	CCF10 COMFABOY	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.600
CC 1050096499	CRISTIAN JULIAN FAGUA BULLA	01	00														✓			6	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	EPS037 NUEVA EPS	$ 94.900	$ 0	0.000	$ 94.900	$ 0	CCF10 COMFABOY	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200
CC 1050096499	CRISTIAN JULIAN FAGUA BULLA	6*	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.328.600	$ 212.600	EPS037 NUEVA EPS	$ 1.328.600	$ 53.200	6.960	$ 1.328.600	$ 92.500	CCF10 COMFABOY	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.500
CC 1051067067	YESICA ALEJANDRA SILVA PACHECO	01	00	✓																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 189.600	$ 30.400	EPS032 SALUD TOTAL EPS	$ 189.600	$ 7.600	6.960	$ 189.600	$ 13.900	CCF10 COMFABOY	$ 189.600	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.500
CC 1051068068	ROBERSTEN ENRIQUE MORENO VANEGAS	01	00														✓			0	6	6	6	6	(25-14) OCUPENSIONES	$ 94.900	$ 15.200	EPS034 EPS-S COOSALUD MONILIDAD	$ 94.900	$ 0	0.000	$ 94.900	$ 0	CCF10 COMFABOY	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200
CC 1051068068	ROBERSTEN ENRIQUE MORENO VANEGAS	01	00	X																0	23	23	23	23	(25-14) OCUPENSIONES	$ 1.091.266	$ 174.700	EPS034 EPS-S COOSALUD MONILIDAD	$ 1.091.350	$ 43.700	6.960	$ 1.091.350	$ 76.000	CCF10 COMFABOY	$ 1.091.350	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.100
CC 1053329229	LUIS ARCADIO RUBIANO SUAREZ	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PROTECCION	$ 474.800	$ 76.000	EPS041 NUEVA EPS S.A. MONILIDAD	$ 474.800	$ 19.000	6.960	$ 474.800	$ 33.100	CCF10 COMFABOY	$ 474.800	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.100
CC 1056074695	WILMER CAMILO BARON PEÑA	01	00												✓					6	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 118.667	$ 19.000	EPS017 FAMISANAR EPS	$ 118.667	$ 0	0.000	$ 118.667	$ 0	CCF10 COMFABOY	$ 118.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 1056074695	WILMER CAMILO BARON PEÑA	01	00																	0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 1.661.334	$ 265.800	EPS017 FAMISANAR EPS	$ 1.661.334	$ 66.500	6.960	$ 1.661.334	$ 115.700	CCF10 COMFABOY	$ 1.661.334	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 514.600
CC 1056923505	CESAR FELIPE PEDROZO PATIÑO	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 189.600	$ 30.400	EPS017 FAMISANAR EPS	$ 189.600	$ 7.600	6.960	$ 189.600	$ 13.900	CCF10 COMFABOY	$ 189.600	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.500
CC 1056926513	DIEGO MIGUEL PEDREROS LEMUS	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 142.350	$ 22.800	EPS017 FAMISANAR EPS	$ 142.350	$ 5.700	0.000	$ 142.350	$ 0	CCF10 COMFABOY	$ 142.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500
CC 1056926513	DIEGO MIGUEL PEDREROS LEMUS	61	00														X			6	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	EPS017 FAMISANAR EPS	$ 94.900	$ 3.800	0.000	$ 94.900	$ 0	CCF10 COMFABOY	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 1056926513	DIEGO MIGUEL PEDREROS LEMUS	01	00													✓				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.466	$ 7.600	EPS017 FAMISANAR EPS	$ 47.466	$ 0	0.000	$ 47.466	$ 0	CCF10 COMFABOY	$ 47.466	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
CC 1056926513	DIEGO MIGUEL PEDREROS LEMUS	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 521.956	$ 83.600	EPS017 FAMISANAR EPS	$ 521.956	$ 20.900	6.960	$ 521.956	$ 36.400	CCF10 COMFABOY	$ 521.956	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.900
CC 1062479593	JAIR ROBERTO VILLARREAL RANGEL	61	00																	6	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS034 EPS-S COOSALUD MONILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6.960	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF10 COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1065525793	YEISMAR ARLEY RODRIGUEZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS034 EPS-S COOSALUD MONILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6.960	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF10 COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1066276967	CINDY JOHANA SUAREZ SERRANO	01	00																	9	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.400.000	$ 384.000	EPS032 SALUD TOTAL EPS	$ 2.400.000	$ 96.000	6.960	$ 2.400.000	$ 167.100	CCF10 COMFABOY	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
CC 1069351661	JULIAN DAVID SALAZAR SOTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS035 EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6.960	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF10 COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1100933306	MARCO FABIAN SANCHEZ SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS035 EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6.960	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF10 COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo. Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 09/09/2025 **Empresa NI901919277 CONSORCIO TERMINACION UMI** **Planilla Nro: 79806242** **Periodo Cotización: agosto de 2025** **Periodo Servicio: septiembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 11 [illegible]559	HAFER ARNULFO CONTRERAS MENDOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(720) PORVENIR	$ 1.427.500	$ 227.600	EPS037 NUEVA EPS	$ 1.427.500	$ 57.000	4.0%	$ 1.427.500	$ 99.100	CCF10 COMFABOY	$ 1.427.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.400
CC 1128428572	JUAN GABRIEL BERRIO VARGAS	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PROTECCION	$ 59.334	$ 9.500	EPS037 NUEVA EPS	$ 59.334	$ 0	0.000	$ 59.334	$ 0	CCF04 COMFAMA	$ 59.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500
CC 1128428572	JUAN GABRIEL BERRIO VARGAS	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PROTECCION	$ 1.720.667	$ 275.300	EPS037 NUEVA EPS	$ 1.720.667	$ 68.900	4.0%	$ 1.720.667	$ 119.900	CCF04 COMFAMA	$ 1.720.667	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.100
CC 15877344	HERNAN JINADERFER BURAVARI AMOS	01	00											X						0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 199.500	$ 30.400	EPS037 NUEVA EPS	$ 199.500	$ 0	0.000	$ 199.500	$ 0	CCF10 COMFABOY	$ 199.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.400
CC 15877344	HERNAN JINADERFER BURAVARI AMOS	01	00	X																0	31	31	31	31	(25-14) COLPENSIONES	$ 996.460	$ 151.800	EPS037 NUEVA EPS	$ 996.460	$ 39.900	4.0%	$ 996.460	$ 69.400	CCF10 COMFABOY	$ 996.460	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.700
CC 23034683	YASMIRLEDI LA DIAZ PEREZ	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PROTECCION	$ 47.450	$ 7.600	ESS030 EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 47.450	$ 0	0.000	$ 47.450	$ 0	CCF10 COMFABOY	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600
CC 23034683	YASMIRLEDI LA DIAZ PEREZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PROTECCION	$ 427.050	$ 68.400	ESS024 EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 427.050	$ 17.100	4.0%	$ 427.050	$ 27.600	CCF10 COMFABOY	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.400
CC 4081992	JOSENTE BURGOS BALDONADO	01	00																	0	30	30	23	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	CCF4065 EPS CALICOP	$ 1.423.500	$ 57.000	4.0%	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF10 COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.900
CC 44025519	ENRIQUE JULIO CARMACHO BETANCOUR	01	00																	0	30	30	23	30	(720) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS041 NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	4.0%	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF10 COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.900
CC 43402409	MARBOTH ELENA MEDINA RIVERA	01	00																	0	0	30	30	30	(RENAFI) RENTA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.900.000	$ 76.000	4.0%	$ 1.900.000	$ 132.300	CCF10 COMFABOY	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.300
CC 52445185	DORIS LOBATON TORRES	01	00																	0	30	30	23	30	(230301) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS017 FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4.0%	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF10 COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.900
CC 7120949	ERUS ANTONIO RIVERA PUERTANO	01	00																	0	30	30	23	30	(230301) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS037 NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4.0%	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF10 COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.900
CC 7164179	WILLIAM RODRIGUEZ PINEDA	01	00																	0	30	30	23	30	(230301) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS037 NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4.0%	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF10 COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.900
CC 7164375	LUIS EDUARDO VALENZUELA CAST BLANCO	01	00	X																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.480.334	$ 267.400	ESS024 EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.480.334	$ 59.400	4.0%	$ 1.480.334	$ 103.300	CCF10 COMFABOY	$ 1.480.334	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.500
CC 7165079	EUGENIO SORA ARAQUE	01	00	X																0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.424.000	$ 227.900	EPS037 NUEVA EPS	$ 1.424.000	$ 57.000	4.0%	$ 1.424.000	$ 99.200	CCF10 COMFABOY	$ 1.424.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.100
CC 7167397	JORGE ELIECER CORTES GONZALEZ	01	00																	0	30	30	23	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.900.000	$ 285.000	EPS010 EPS SURA	$ 1.900.000	$ 76.000	4.0%	$ 1.900.000	$ 132.300	CCF04 COMFAMA	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 7169157	JAIRO FERNANDO CARVAJAL PANADERO	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PROTECCION	$ 1.190.420	$ 190.500	EPS018 EPS SANITAS	$ 1.190.420	$ 47.600	4.0%	$ 1.190.420	$ 82.900	CCF10 COMFABOY	$ 1.190.420	$ 47.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.400
CC 7181512	ROBERT MOYAS DURAN	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 59.334	$ 9.500	ESS024 EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 59.334	$ 0	0.000	$ 59.334	$ 0	CCF10 COMFABOY	$ 59.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500
CC 7181512	ROBERT MOYAS DURAN	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.720.667	$ 275.300	ESS024 EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.720.667	$ 68.900	4.0%	$ 1.720.667	$ 119.900	CCF10 COMFABOY	$ 1.720.667	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.100
CC 7224576	CARLOS ANGUSTO BERRIO CANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.780.000	$ 284.800	ESS007 ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.780.000	$ 71.200	4.0%	$ 1.780.000	$ 123.900	CCF10 COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 7379276	GERMAN ALONSO GUTIERREZ BONILLA	01	00																	0	30	30	23	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS041 NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	4.0%	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF10 COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.900
CC 7959451	JOSE CARLOS JULIO LOPEZ BERNAL	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.900	$ 15.200	EPS037 NUEVA EPS	$ 94.900	$ 0	0.000	$ 94.900	$ 0	CCF10 COMFABOY	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200
CC 7959451	JOSE CARLOS JULIO LOPEZ BERNAL	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.328.600	$ 212.600	EPS037 NUEVA EPS	$ 1.328.600	$ 53.200	4.0%	$ 1.328.600	$ 92.500	CCF10 COMFABOY	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.000
CC 80048770	EDER GUSTAVO REINA GIAMPA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.780.000	$ 284.800	EPS018 EPS SANITAS	$ 1.780.000	$ 71.200	4.0%	$ 1.780.000	$ 123.900	CCF10 COMFABOY	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 9868499	NORBEY ANTONIO CORTES GONZALEZ	01	00																	0	30	30	23	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS010 EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	4.0%	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF10 COMFABOY	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.900
CC 9876475	OSCAR DU AN SANCHEZ MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	EPS010 EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	4.0%	$ 3.000.000	$ 208.800	CCF04 COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 85.525.588	$ 87.426.588	$ 97.426.588	$ 87.426.598	$ 13.688.800	$ 3.428.300	$ 5.912.400	$ 3.398.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.435.900	$ 0	$ 26.135.200

Enlace Operativo, Linea Expertas en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.

PAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34458551
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-09-16

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOHNNY HERRERA CASTAÑO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	73557984	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE PORTOBELO NO 49 39	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	ARJONA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4542	CORREO ELECTRÓNICO	OPERACIONES.PLANILLAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	6292615
FAX	6533606	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Administrador de pensiones

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		34458551

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-73557984	59	No	No	No	13	52	1701001	Salario	HERRERA CASTAÑO JOHNNY	$3.200.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 73557984																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 73557984	PROTECCION	30	$3.200.000	0.1600000	$512.000	$0	$0	$512.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 73557984	SANITAS	30	$3.200.000	0.1250000	$400.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.200.000	1	0.0052200	$16.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-73557984	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$512.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$512.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$400.000	$0	0	$0	0	$0	$400.000	0	$0	$0	$400.000	$0	0	$0	$0	$400.000	$0	$0	$400.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$16.800	0	$0	$0	$16.800	0	$0	$16.800	0	$0	$0	$16.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$400.000
PENSIONES	1	$512.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$16.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$928.800

DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

Banco Davivienda S.A certifica que el **CONSORCIO TEMINACION UMI** con Nit **901.919.277-7** tiene con el Banco la siguiente cuenta de ahorros Persona Jurídica:

Cuenta de Ahorros	**0371 0009 3436**
Fecha de Apertura	**05/06/2025**

Se expide por solicitud del cliente a los 05 días del mes de Junio del año 2025 dirigida **A QUIEN INTERESE**

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0371 - OFICINA SANTA TERESITA

FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A
