
ID	Task	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish
0		**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.**	**246 days**	**Mon 6/10/25**	**Thu 6/08/26**
1		**ACTA DE INICIO**	**0 days**	**Mon 6/10/25**	**Mon 6/10/25**
2		**PRECONSTRUCCIÓN**	**73 days**	**Mon 6/10/25**	**Mon 5/01/26**
3		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**73 days**	**Mon 6/10/25**	**Mon 5/01/26**
4		Localizacion y Replanteo	16 days	Mon 6/10/25	Fri 24/10/25
5		Cerramiento	25 days	Sat 25/10/25	Tue 25/11/25
6		Construcción de Campamento	30 days	Wed 26/11/25	Fri 2/01/26
7		Entrega de Estudios y diseños	15 days	Mon 6/10/25	Thu 23/10/25
8		Gestión de tramites y permisos necesarios	73 days	Mon 6/10/25	Mon 5/01/26
9		**Fin actividades preliminares**	**0 days**	**Mon 5/01/26**	**Mon 5/01/26**
10		**CONSTRUCCIÓN**	**147 days**	**Tue 6/01/26**	**Mon 6/07/26**
11		**INICIO ETAPA DE CONSTRUCCION**	**0 days**	**Tue 6/01/26**	**Tue 6/01/26**
12		Actividades previas al inicio de actividades, Movilizacion de Personal y Equipos	10 days	Wed 7/01/26	Mon 19/01/26
13		Demolicion de Concreto Estructural (Tablero, vigas, estribos y demas elementos desprendidos del puente)	25 days	Tue 20/01/26	Tue 17/02/26
14		Excavación Mecanica	15 days	Tue 20/01/26	Thu 5/02/26
15		Rellenos	13 days	Wed 18/02/26	Wed 4/03/26
16		Transporte de materiales a sitio Autorizado	38 days	Tue 20/01/26	Wed 4/03/26
17		**ESTRUCTURAS**	**137 days**	**Tue 6/01/26**	**Tue 23/06/26**
18		**CIMENTACION**	**68 days**	**Tue 6/01/26**	**Fri 27/03/26**
19		Instalación y figurado de acero de refuerzo fy=60000 psi.	18 days	Tue 6/01/26	Tue 27/01/26
20		Pilote d=100 cm con concreto tremie de 4000 psi.	25 days	Wed 28/01/26	Wed 25/02/26
21		Descabece de pilotes	10 days	Thu 26/02/26	Mon 9/03/26
22		Fundición de Concreto 1500 psi grava común para solados	30 days	Fri 20/02/26	Fri 27/03/26
23		**REDES PARA ESTRUCTURAS**	**10 days**	**Fri 6/02/26**	**Tue 17/02/26**
24		Instalación de Tuberia pvc para drenaje d=4" con filtro	7 days	Fri 6/02/26	Fri 13/02/26
25		Instalación de Geotextil nt 1600 para subdrenes/filtros	10 days	Fri 6/02/26	Tue 17/02/26
26		Instalación de Tuberia pvc para drenaje d=6" sin filtro	5 days	Fri 6/02/26	Wed 11/02/26
27		Instalación de Tuberia conduit pvc d= 1/2"	5 days	Fri 6/02/26	Wed 11/02/26
28		**SUBESTRUCTURA**	**56 days**	**Wed 18/02/26**	**Mon 27/04/26**
29		Fundición de Concreto grava común 4000 psi (280 kg/cm2) para estribos y superestructura.	31 days	Wed 18/02/26	Thu 26/03/26
30		Colocación de Relleno con grava entre 3/4" y 1/2" para filtros (relación 1:1)	15 days	Fri 27/03/26	Wed 15/04/26
31		Fundición de Concreto 3000 psi (21 mpa) Premezclado en grava común para losa de aproximación	20 days	Fri 27/03/26	Tue 21/04/26
32		Instalación de Apoyo elastomérico en neopreno reforzado dureza 60 para apoyo superestructura.	5 days	Wed 22/04/26	Mon 27/04/26
33		**SUPERESTRUCTURA**	**80 days**	**Sat 14/03/26**	**Tue 23/06/26**
34		Fundición de Concreto de 5000 psi premezclado para superestructura	30 days	Sat 14/03/26	Tue 21/04/26
35		Fundición de Concreto 4000 psi grava común premezclado para tablero puente	30 days	Wed 22/04/26	Thu 28/05/26
36		Instalación de Impermeabilizante para concreto	10 days	Fri 29/05/26	Wed 10/06/26
37		Instalación de Impermeabilización en laminas para tablero de superestructura	10 days	Fri 29/05/26	Wed 10/06/26
38		Postensionamiento para superestructura	10 days	Fri 29/05/26	Wed 10/06/26
39		Instalación de Junta de dilatacion elastomérica para desplazamiento min=+/- 65 mm a max =+/- 80 mm	7 days	Fri 29/05/26	Fri 5/06/26
40		Instalación de Barrera de seguridad lateral en concreto 3500 psi	10 days	Sat 6/06/26	Fri 19/06/26
41		Instalación de Baranda peatonal en acero	3 days	Wed 3/06/26	Fri 5/06/26
42		**PRUEBA DE CARGA**	**3 days**	**Sat 20/06/26**	**Tue 23/06/26**
43		Prueba de carga estática para puente vehicular	3 days	Sat 20/06/26	Tue 23/06/26
44		**PAVIMENTOS**	**35 days**	**Wed 18/02/26**	**Tue 31/03/26**
45		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**18 days**	**Wed 18/02/26**	**Tue 10/03/26**
46		Excavaciones varias sin clasificar con maquina	14 days	Wed 18/02/26	Thu 5/03/26
47		Instalación de Subbase Granular clase c (sbg_c)	4 days	Fri 6/03/26	Tue 10/03/26
48		Transporte y disposición final de escombros con una distancia de transporte 21 km	18 days	Wed 18/02/26	Tue 10/03/26
49		**PAVIMENTO**	**17 days**	**Wed 11/03/26**	**Tue 31/03/26**
50		Aplicación de Liga con emulsion asfaltica crr-1	4 days	Wed 11/03/26	Sat 14/03/26
51		Instalación de Mezcla Asfáltica Densa en Caliente MD12 con cemento asfáltico 60-70	9 days	Mon 16/03/26	Thu 26/03/26
52		Fundición de Losa de Concreto MR41	4 days	Fri 27/03/26	Tue 31/03/26
53		**SEÑALIZACIÓN,SEMAFORIZACIÓN Y DESVIOS**	**10 days**	**Wed 24/06/26**	**Mon 6/07/26**
54		Señalizacion y Demarcación	10 days	Wed 24/06/26	Mon 6/07/26
55		**FIN ACTIVIDADES DE OBRA**	**0 days**	**Mon 6/07/26**	**Mon 6/07/26**
56		**RECIBO FINAL DE OBRA**	26 days	Tue 7/07/26	Thu 6/08/26

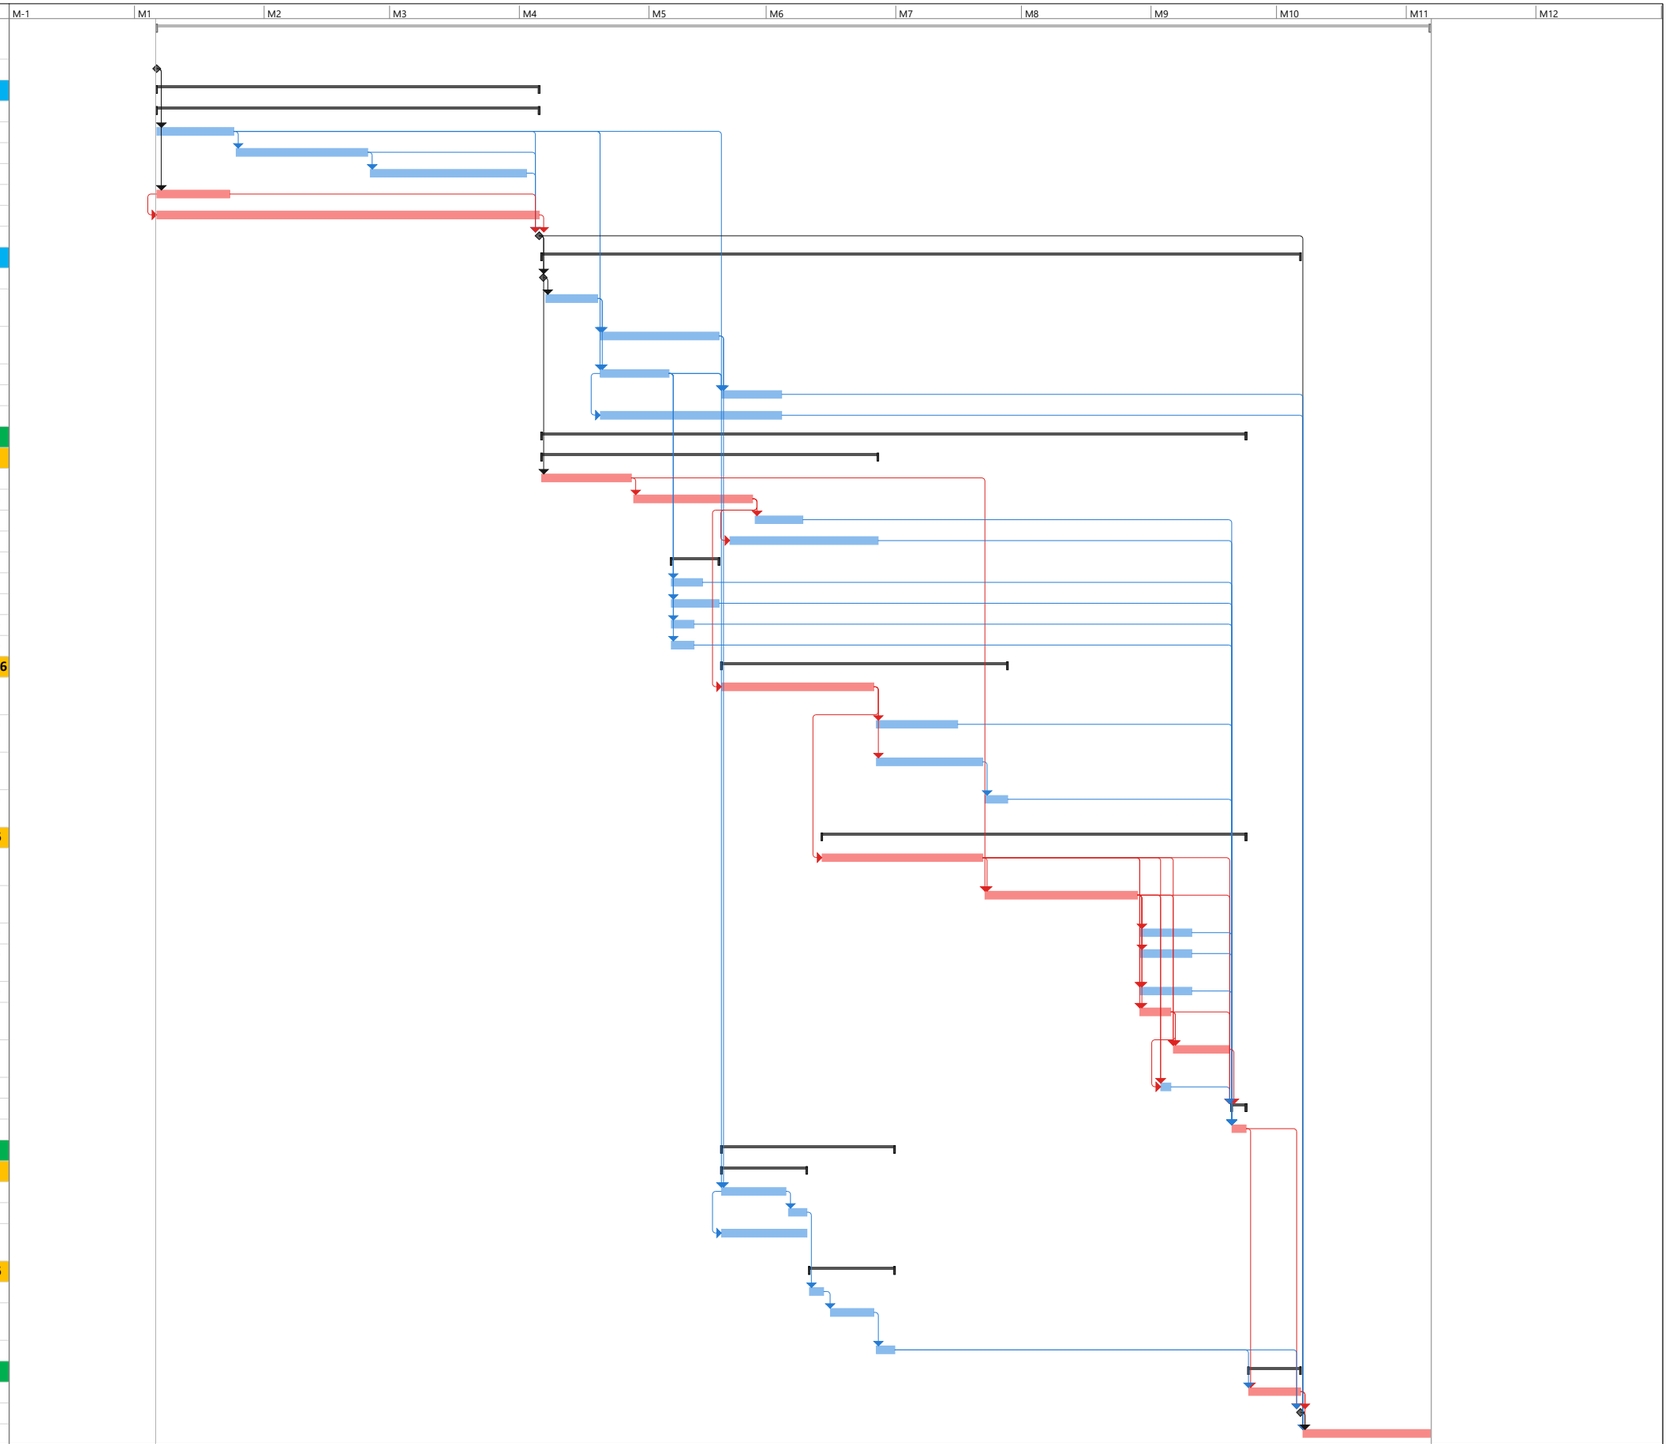

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL
Fecha: Mon 12/05/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual
