GS-2025-305491-MEVAL

2217793652

Informe No. 04

Medellín, 18 de octubre de 2025

Señor coronel
GUSTAVO ADOLFO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)
Calle 48 No. 45-58
Medellín - Antioquia

ASUNTO: Informe de supervisión No. 04 contrato de obra No. 12-6-10043-25 del 17/09/2025 al 17/10/2025

No. Comunicación Oficial o Acta de nombramiento:

Supervisor Técnico	No. AE-2025-079237-MEVAL de fecha 11/09/2025
Supervisor Jurídico	No. AE-2025-079688-MEVAL de fecha 05/09/2025
Supervisor Económico	No. AE-2025-082431-MEVAL de fecha 22/09/2025

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. **LOTE No. 1** *"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"*.

Contratista: CONVIAS S.A.S
Representante legal: GABRIEL JAIME GOMEZ ESCUDERO

Fecha de iniciación: 17/06/2025 Fecha Terminación: 29/11/2025

Prorroga: N/A

VERIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:

1. Personal de la Obra (cumplimiento geo numérico según contrato y propuesta)

- 01 residente de obra, 01 profesional administrativo y 01 Profesional en Salud Ocupacional.

2217793652

2. Verificación cumplimiento Programa de Calidad (según contrato)

Por parte de esta supervisión se exige al contratista, CONVIAS S.A.S, velar en todo momento el cumplimiento de las cláusulas PRIMERA – OBJETO, SEGUNDA - FINALIDADES DEL CONTRATO y DÉCIMA PRIMERA - OBLIGACIONES DEL CON TRATISTA, en las cuales se reitera el compromiso para con la POLICÍA NACIONAL – METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, de suplir las necesidades en los inmuebles priorizados como conforme a las condiciones técnicas definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad. Se le hace saber la importancia de cumplir con las condiciones técnicas exigibles en el apéndice técnico de los estudios previos del presente contrato en cuanto, el diseño e implantación de un modelo de aseguramiento de la calidad del servicio de mantenimiento prestado, como lo exige la norma NTC-ISO9002, la organización administrativa para el cumplimiento de las obligaciones contractuales en cuanto a ejecución física para el pago oportuno del presupuesto acorde con el cronograma contractual.

Así mismo se ratificó al contratista que la responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente de su competencia y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice por la Supervisión (Técnica, Jurídica y Económica) de la Policía Nacional o sus representantes, se hará para verificar su cumplimiento de la mismas, y no exime al Contratista de su obligación de acatarlas para cumplir con el objeto del contrato.

3. Seguimiento de la Programación de Obra, (Atrasos, Indicadores, causas)

Por parte de esta supervisión se está ejerciendo un control efectivo de las actividades realizadas en los diferentes frentes de trabajo que se encuentran activos para prevenir atrasos, novedades y/o generar las alertas tempranas sobre los factores que puedan afectar la debida ejecución física y presupuestal.

4. Seguridad Industrial (cumplimiento según contrato y normas legales)

Se verifica la entregar del Plan de manejo ambiental, Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; Matriz de Identificación de peligros, evaluación, valoración y gestión de los riesgos; Listado de personal a laborar, idoneidad y certificación laboral; proceso de ingreso del personal a laborar, Afiliación del personal a laborar en obra y metodología de pago de impuestos de acuerdo a la normatividad vigente, conforme a la ley 80 de 1993 y sus normas concordantes.

5. Compromisos pendientes del contratista y supervisor

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá unidad con delegación de gasto, cumple al contratista cada una de las obligaciones contenidas en la CLAUSULA DECIMA TERCERA - OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

GS-2025-305491-MEVAL

Contratista.

Se le exige al contratista CONVIAS S.A.S, el estricto cumplimiento de las condiciones contenidas en la cláusula DÉCIMA PRIMERA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA numerales del 1 al 63 y sus literales subsecuentes.

Se le exige al contratista el estricto cumplimiento de la CLAUSULA DECIMA CUARTA – RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO. el contratista se obliga con la POLICIA NACIONAL-METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, a no asumir ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de la policía nacional y bienes, conocidos o que llegasen a ser conocidos por el contratista, durante su desarrollo con posterioridad a la ejecución del contrato, así mismo observando la CLAUSULA DECIMA QUINTA - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICÍA NACIONAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones.

De igual forma estos compromisos

- Constante: Realizar los recorridos y seguimiento de las actividades de mantenimiento de acuerdo con las necesidades manifestadas y autorizadas por la Unidad.
- Disponer de los frentes de trabajo suficientes para cumplir con la fecha de terminación del contrato.
- Mantener en los frentes de trabajo la disponibilidad el material, la mano de obra, los equipos y herramientas necesarias para la ejecución de las actividades de mantenimiento.
- Realizar entrega completa de los cortes de obra (memorias y registro fotográfico), en cuanto el supervisor verifique las actividades realizadas.

6. Actas parciales de Obra (relacionar las generalidades)

CORTE No. 1

ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 85.606.325,46**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	$ 17.121.265,09
IMPREVISTOS	**1%**	$ 856.063,25
UTILIDAD	**5%**	$ 4.280.316,27
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	$ 813.260,09
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 23.070.904,70**
COSTO TOTAL		**$ 108.677.230,16**

2217793652

GS-2025-305491-MEVAL

ESTACIÓN DE POLICIA GIRARDOTA

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 116.908.489,81
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 23.381.697,96
IMPREVISTOS	1%	$ 1.169.084,90
UTILIDAD	5%	$ 5.845.424,49
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 1.110.630,65
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 31.506.838,00
COSTO TOTAL		$ 148.415.327,81

ESTACIÓN DE POLICIA SANTA CRUZ

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 26.031.504,25
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 5.206.300,85
IMPREVISTOS	1%	$ 260.315,04
UTILIDAD	5%	$ 1.301.575,21
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 247.299,29
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 7.015.490,39
COSTO TOTAL		$ 33.046.994,64

RESUMEN FACTURAS CORTE 1

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-1	11/08/2025	$ 108.677.230,16	$ 0,00	$ 108.677.230,16
FEV-2	11/08/2025	$ 148.415.327,81	$ 0,00	$ 148.415.327,81
FEV-3	11/08/2025	$ 33.046.994,64	$ 0,00	$ 33.046.994,64
TOTAL				$ 290.139.552,61

CORTE No. 2

COMANDO DE POLICÍA MEVAL. R-16

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 25.770.961,80
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 5.154.192,36
IMPREVISTOS	1%	$ 257.709,62
UTILIDAD	5%	$ 1.288.548,09
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 244.824,14
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 6.945.274,21
COSTO TOTAL		$ 32.716.236,01

2217793602

COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN R-16

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 25.762.633,84
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 5.152.526,77
IMPREVISTOS	1%	$ 257.626,34
UTILIDAD	5%	$ 1.288.131,69
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 244.745,02
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 6.943.029,82
COSTO TOTAL		**$ 32.705.663,66**

ESTACIÓN DE POLICÍA GIRARDOTA. R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 141.657.874,90
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 28.331.574,98
IMPREVISTOS	1%	$ 1.416.578,75
UTILIDAD	5%	$ 7.082.893,75
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 1.345.749,81
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 38.176.797,29
COSTO TOTAL		**$ 179.834.672,19**

ESTACIÓN DE POLICÍA GIRARDOTA. R-16

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 17.132.729,42
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 3.426.545,88
IMPREVISTOS	1%	$ 171.327,29
UTILIDAD	5%	$ 856.636,48
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 162.760,93
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 4.617.270,58
COSTO TOTAL		**$ 21.750.000,00**

ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA CRUZ. R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 150.903.505,09
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 30.180.701,02
IMPREVISTOS	1%	$ 1.509.035,05
UTILIDAD	5%	$ 7.545.175,25
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 1.433.583,30
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 40.668.494,62
COSTO TOTAL		**$ 191.571.999,71**

ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA CRUZ. R-16

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 52.739.665,50
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 10.547.933,10
IMPREVISTOS	1%	$ 527.396,65
UTILIDAD	5%	$ 2.636.983,27
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 501.026,82
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 14.213.339,84
COSTO TOTAL		**$ 66.953.005,34**

ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO. R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 93.145.212,52
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 18.629.042,50
IMPREVISTOS	1%	$ 931.452,13
UTILIDAD	5%	$ 4.657.260,63
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 884.879,52
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 25.102.634,78**
COSTO TOTAL		**$ 118.247.847,30**

ESTACIÓN DE POLICÍA MANRIQUE-UNDEMO. R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 173.296.573,45
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 34.659.314,70
IMPREVISTOS	1%	$ 1.732.965,73
UTILIDAD	5%	$ 8.664.828,67
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 1.646.317,45
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 46.703.426,55
COSTO TOTAL		**$ 220.000.000,00**

REGIÓN DE POLICÍA NO. 6. R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 11.680.287,44
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 2.336.057,49
IMPREVISTOS	1%	$ 116.802,87
UTILIDAD	5%	$ 584.014,37
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 110.962,73
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 3.147.837,46
COSTO TOTAL		**$ 14.828.124,90**

RESUMEN FACTURAS CORTE 2

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CO612	12/09/2025	$ 21.750.000,00	$ 0,00	$ 21.750.000,00
CO625	15/09/2025	$ 179.834.672,19	$ 0,00	$ 179.834.672,19
CO614	12/09/2025	$ 66.953.005,34	$ 0,00	$ 66.953.005,34
CO615	12/09/2025	$191.571.999,71	$ 0,00	$191.571.999,71
CO616	12/09/2025	$ 32.716.236,01	$ 0,00	$ 32.716.236,01
CO617	12/09/2025	$ 32.705.663,66	$ 0,00	$32.705.663,66
CO618	12/09/2025	$ 118.247.847,30	$ 0,00	$ 118.247.847,30
CO623	12/09/2025	$ 220.000.000,00	$ 0,00	$ 220.000.000,00
CO624	12/09/2025	$ 14.828.124,90	$ 0,00	$ 14.828.124,90
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 878.607.549,11**	**$ 0,00**	**$ 878.607.549,11**

GS-2025-305491-MEVAL

CORTE No. 3

Para el corte número 3, la documentación se encuentra en el grupo de contratos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, para revisión, aprobación y continuar el trámite con el grupo de financiera.

COMANDO POLICÍA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ. R-16

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 110.053.456,41
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 22.010.691,28
IMPREVISTOS	1%	$ 1.100.534,56
UTILIDAD	5%	$ 5.502.672,82
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 1.045.507,84
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 29.659.406,50
COSTO TOTAL		$ 139.712.862,91

REGIÓN DE POLICÍA No. 6. R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 46.767.920,51
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 9.353.584,10
IMPREVISTOS	1%	$ 467.679,21
UTILIDAD	5%	$ 2.338.396,03
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 444.295,25
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 12.603.954,59
COSTO TOTAL		$ 59.371.875,10

ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO. R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 55.184.283,92
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 11.036.856,78
IMPREVISTOS	1%	$ 551.842,84
UTILIDAD	5%	$ 2.759.214,20
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 524.250,70
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 14.872.164,52
COSTO TOTAL		$ 70.056.448,44

ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA CRUZ. R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 97.682.261,00
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 19.536.452,20
IMPREVISTOS	1%	$ 976.822,61
UTILIDAD	5%	$ 4.884.113,05
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 927.981,48
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 26.325.369,34
COSTO TOTAL		$ 124.007.630,34

2217793692

GS-2025-305491-MEVAL

COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN R-16

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 79.936.270,84**
ADMINISTRACIÓN	**20%**	$ 15.987.254,17
IMPREVISTOS	**1%**	$ 799.362,71
UTILIDAD	**5%**	$ 3.996.813,54
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	$ 759.394,57
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 21.542.824,99**
COSTO TOTAL		**$ 101.479.095,83**

RESUMEN FACTURAS CORTE 3

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CO635	14/10/2025	$ 59.371.875,10	$ 0,00	$ 59.371.875,10
CO636	14/10/2025	$ 139.712.862,91	$ 0,00	$ 139.712.862,91
CO637	14/10/2025	$ 101.479.095,83	$ 0,00	$ 101.479.095,83
CO638	14/10/2025	$ 70.056.448,44	$ 0,00	$ 70.056.448,44
CO639	14/10/2025	$ 124.007.630,34	$ 0,00	$ 124.007.630,34
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 494.627.912,62**	**$ 0,00**	**$ 494.627.912,62**

RELACIÓN DE ACTIVIDADES:

Durante el periodo objeto del presente informe se realizaron visitas técnicas a las instalaciones policiales priorizadas para el objeto de mantenimiento en la presente vigencia, con el fin de realizar los mantenimientos, así:

DISTRITO	INSTALACIÓN	NECESIDADES IDENTIFICADAS
No aplica	Comando De Policía MEVAL	• Mantenimiento de desmonte de Divisiones modulares acrílicas o en vidrio • Mantenimiento de redes hidrosanitarias • Mantenimiento de redes eléctricas • Mantenimiento de redes de voz y datos • Mantenimiento muros y mampostería • Mantenimiento de acabados de pintura • Mantenimiento de acabados de pisos • Mantenimiento de otros acabados • Aseo general y retiro de escombros.
1	Estación De Policía Santa Cruz	• Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material

2217793692

		• Suministro e Instalación de Bajante PVC • Suministro e instalación de lavamanos con grifería • Suministro e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con botón superior • Suministro e instalación de salida sanitaria 2" • Suministro e instalación de salida sanitaria 4" • Suministro e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua • Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos • Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores • Desmonte Puertas y Marcos • Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m.
No aplica	Colegio Santo Domingo de Guzmán	• Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores • Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio • Suministro e instalación de manto bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior • Reposición e instalación de marcos para inspección cielo raso 60x 60 en aluminio color por definir • Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento • Suministro e instalación de Panel Led redondo 24w • Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos

2217793662

GS-2025-305491-MEVAL

		• Suministro e instalación de división en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 • Aseo general permanente en las obras de mantenimiento.
No aplica	Región de policía Seis - Oficina Planeación	• Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana • Suministro e instalación de Panel Led redondo 9w • Suministro e instalación de Panel Led redondo 24w • Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w • Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar • Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos categoría 6A certificado, Reposición e instalación de cableado HDMI • Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 • Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos • Suministro e instalación de alistado de piso 4cm • Suministro e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra Suministro e instalación de división en vidrio templado 10 mm • Suministro e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente • Suministro e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir.
5	Estación de Policía San Antonio De Prado	• Suministro e Instalación de Cielorraso en Dry Wall • Adecuando Estructura Metálica Existente • Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra • Reposición e instalación de mesón en concreto • Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I, Reposición e instalación de marcos para inspección cielo raso 60x 60

2217793652

GS-2025-305491-MEVAL

		• Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" • Suministro e instalación de lavamanos con grifería • Suministro e instalación de lavaplatos con grifería • Suministro e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con botón superior • Suministro e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas • Suministro e instalación de Grifería ducha sencilla • Reinstalación de aparato sanitario existente • Suministro e instalación de Panel Led redondo 18w • Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 • Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm • Suministro e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y emboquilladlo de fraguado rápido • Suministro e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar.

Durante el periodo de ejecución se realizaron recorridos de verificación en las instalaciones intervenidas de las Estaciones de Policía San Antonio de Prado, Girardota, Santa Cruz, Colegio Santo Domingo de Guzmán, el Comando MEVAL y Región No. 6, con el objetivo de constatar el cumplimiento de las actividades ejecutadas conforme a las órdenes de trabajo y a las especificaciones técnicas establecidas.

Se supervisó el uso adecuado de herramientas, materiales y elementos de bioseguridad por parte del contratista, así como la correcta aplicación de los recursos y la priorización de las intervenciones definidas en el acta de inicio.

Registro fotográfico:

COMANDO DE POLICÍA MEVAL






2217793032

GS-2025-305491-MEVAL




ESTACIÓN DE POLICIA SANTA CRUZ:

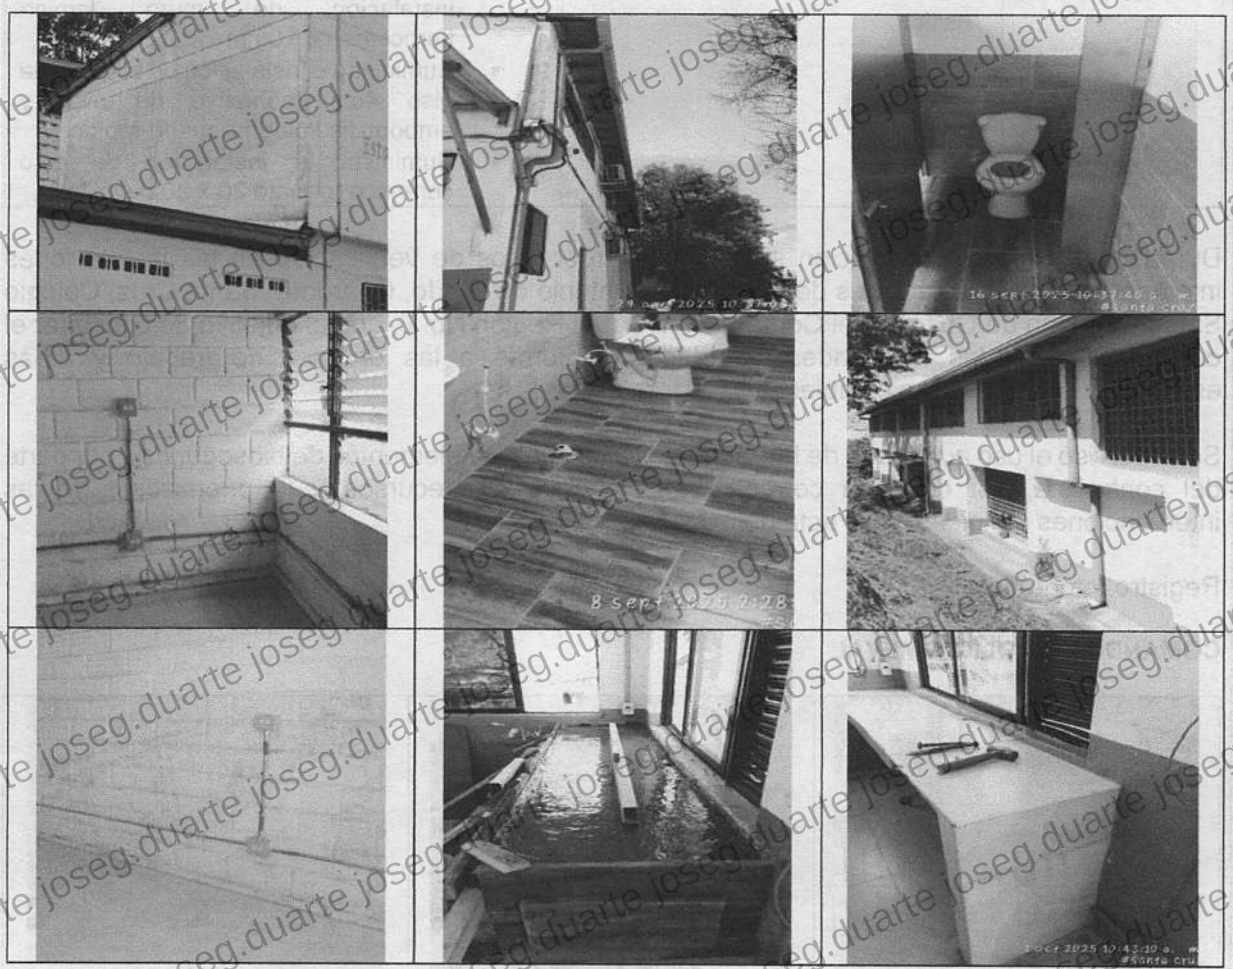

2217793692



COLEGIO SANTO DOMINGO GUZMÁN

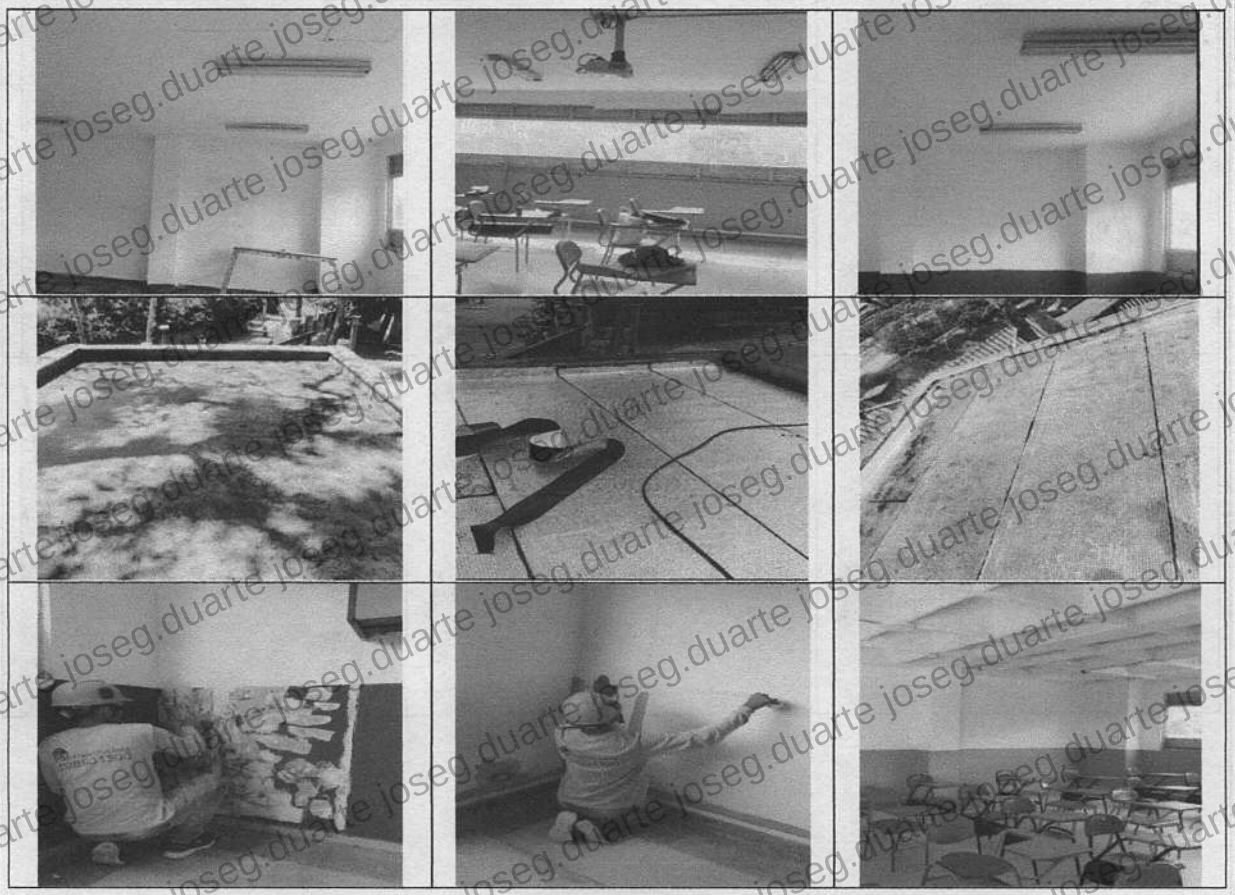

GS-2025-305491-MEVAL




REGIÓN DE POLICÍA SEIS - OFICINA PLANEACIÓN:



2217793692

joseg.duarte

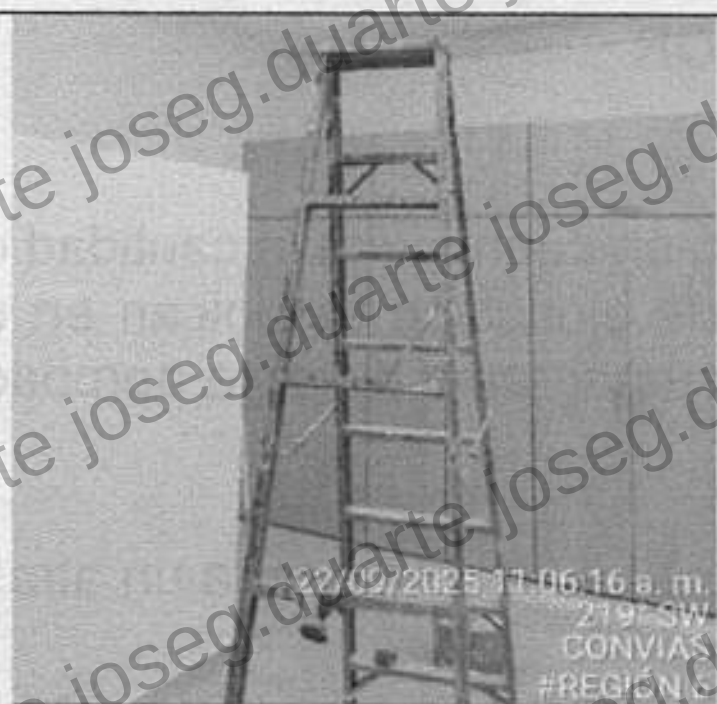





ESTACIÓN SAN ANTONIO DE PRADO



















RESULTADO APLICACIÓN INDICADOR

De acuerdo con los rangos establecidos en el indicador, y teniendo en cuenta que la cantidad de obras, se definen los proyectos u obras que con su porcentaje de ejecución se ubican en un semáforo, lo que permite establecer el grado de alerta, frente al cronograma de obra aprobado y/o proceso de entregas parciales a la supervisión.

EN SEMÁFORO VERDE: Refleja una alerta temprana, por cuanto su avance muestra un atraso entre el 0 y el 5% frente a lo programado.

CI=OBRAS SIN PROBLEMA = X <= 5%
OBRAS EN CURSO X

SEMÁFORO ROJO: Refleja incumplimiento frente a lo programado con un porcentaje superior al 5%, donde se debe analizar las causas individualmente cada una de las obras y los posibles riesgos las acciones adelantadas por el coordinador, con el propósito de efectuar los requerimientos correctivos a la unidad contratante de manera oportuna.

CI=OBRAS CON PROBLEMA = X >5%
OBRAS EN CURSO X

EJECUCIÓN
91.31%
PENDIENTE POR EJECUTAR
8.69%

RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

A la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con cada una de las actividades programadas para el desarrollo de la ejecución contractual, toda vez que no ha presentado retraso en los frentes de trabajo. Sin embargo, se recomendó al contratista prever posibles imprevistos que se presentan con la llegada de la ola invernal del cuarto trimestre del presente año, asimismo tener en cuenta los posibles imprevisto que se puedan presentar con las festividades regionales y la dinámica de los meses a fin de año, para evitar atrasos a futuro, de igual manera prever con tiempo la disponibilidad de los materiales en bodega para minimiza riesgos de desabastecimiento de materiales por demanda o incremento en el costo de los mismos.

DE CARÁCTER TECNICO:

1. Cumplimiento de Especificaciones técnicas, Diseños, Normas técnicas, cantidades, según contrato (resumido)

Se verifica que las actividades ejecutadas cumplan con los parámetros establecidos en el contrato, incluyendo especificaciones técnicas, cantidades y normas aplicables.

GS-2025-305491-MEVAL

2. Acciones adelantadas por el contratista y supervisor ante el cumplimiento al Carácter Técnico.

Por parte de esta supervisión se le exige al contratista que deberá cumplir en todo momento con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción local, nacional e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de mantenimiento bienes inmuebles. Se ha verificado en todo momento el cumplimiento del Objeto del contrato de conformidad con la cláusula décima, primera y decima segunda del contrato.

3. Calidad de la Obra, Equipos, Bienes, Insumos, Ensayos o Pruebas.

En contratista ha cumplido en cuanto al suministro de equipos, insumos y procedimientos para la aplicación de los materiales utilizados en los trabajos; igual manera cumplió las obligaciones con el personal de obra en cuanto al suministro de dotación herramienta y equipamiento para el adecuado desarrollo de las actividades.

4. Novedades, observaciones y recomendaciones de carácter técnico

Se recomienda al contratista, residente de obra, profesional administrativo adelantar las actividades de compra de materiales de primera calidad y certificado de la afiliación del personal del equipo de trabajo en las estaciones, hojas de vida, plan de manejo ambiental, plan de seguridad y salud en el trabajo, matriz de identificación de peligros, evaluación valoración y gestión de los riesgos.

5. Se debe anexar las memorias de cantidades de obra ejecutada.

El contratista al momento está cumpliendo con las condiciones establecidas en LAS CLÁUSULAS CUARTA y DÉCIMA, aportando memorias de cantidades de obra ejecutada de conformidad con el ítem correspondiente, como se indica en la cláusula, "Forma de pago", junto con los documentos soportes.

6. Información generalizada de la entrega física de los bienes, servicios u obras. Relacionar las generalidades de las actas parciales o el acta final de entrega al comandante de la unidad del inventario, manual de funcionamiento, recomendaciones para el mantenimiento, uso y cuidado del bien.

Se realizará una vez se dé por terminado el objeto del contrato, previa revisión técnica, apoyo administrativo a la supervisión técnica, los supervisores económicos y jurídicos nombrados para el presente proceso.

DE CARÁCTER FINANCIERO:

1. Valor inicial del contrato

La suma Mil ochocientos veintiún millones setecientos cuarenta y tres mil quinientos setenta y cinco con ocho centavos ($ 1.821.743.575,08). Moneda legal, incluida la administración,

2217793692

imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad, y demás impuestos y tributos legales necesarios para la ejecución del contrato. Distribuidos como se relaciona en el siguiente cuadro así:

RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	(M3-COSDO) MANTENIMIENTO A INSTALCIONES COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	16	$ 159.293.575,08	$ 159.293.575,08
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ	(MEVAL) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA POLICIA METROPOLITANA VALLE E ABURRÁ	16	$ 278.250.000,00	$ 278.250.000,00
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ- GRUPO DIALOGO Y MANTENIMIENTO ORDEN	UNDEMO-MEVAL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA POLICIA METROPOLITANA VALLE E ABURRÁ	10	$ 220.000.000,00	$ 220.000.000,00
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ	(MEVAL) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO - PLAN DIGNIDAD	10	$ 310.000.000,00	$ 310.000.000,00
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ	(MEVAL) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA - PLAN DIGNIDAD	10	$ 228.250.000,00	$ 228.250.000,00
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ	(MEVAL) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ESTACION DE POLICIA GIRARDOTA - PLAN DIGNIDAD	16	$ 21.750.000,00	$ 21.750.000,00
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ	(MEVAL) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ - PLAN DIGNIDAD	10	$ 330.000.000,00	$ 330.000.000,00
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ	(MEVAL) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ESTACION DE POLICIA SANTA CRUZ - PLAN DIGNIDAD	16	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REGIONAL 6	(REGION 6)) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	10	$ 74.200.000,00	$ 74.200.000,00
				VALOR TOTAL	$ 1.821.743.575,08

El presente contrato está amparado mediante los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 9725 de fecha 02/04/2025, expedido por el jefe de Presupuesto de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

2. Adiciones al contrato

No aplica.

GS-2025-305491-MEVAL

3. Control en la ejecución del Anticipo (Programa de inversión del anticipo en cumplimiento al contrato).

No aplica.

4. Relación de Pagos al Contratista, Deducciones y Ajustes. (Novedades que inciden o alteran el equilibrio económico o financiero del contrato.)

Se realizaron los tramites de pago al contratista conforme a los lineamientos de la cláusula cuarta prestando en cada periodo el formato Código: 1LF-FR-0208 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" con los demás documentos soportes, como lo establece la cláusula cuarta "forma de pago, a continuación, se presenta la relación de pagos por periodos facturados, así:

CORTE No. 1

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-1	11/08/2025	$ 108.677.230,16	$ 0,00	$ 108.677.230,16
FEV-2	11/08/2025	$ 148.415.327,81	$ 0,00	$ 148.415.327,81
FEV-3	11/08/2025	$ 33.046.994,64	$ 0,00	$ 33.046.994,64
valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 290.139.552,61**	**$ 0,00**	**$ 290.139.552,61**

CORTE No. 2

No. factura	Fecha Factura	valor factura	nota crédito o débito	valor neto
CO612	12/09/2025	$ 21.750.000,00	$ 0,00	$ 21.750.000,00
CO625	15/09/2025	$ 179.834.672,19	$ 0,00	$ 179.834.672,19
CO614	12/09/2025	$ 66.953.005,34	$ 0,00	$ 66.953.005,34
CO615	12/09/2025	$191.571.999,71	$ 0,00	$191.571.999,71
CO616	12/09/2025	$ 32.716.236,01	$ 0,00	$ 32.716.236,01
CO617	12/09/2025	$ 32.705.663,66	$ 0,00	$32.705.663,66
CO618	12/09/2025	$ 118.247.847,30	$ 0,00	$ 118.247.847,30
CO623	12/09/2025	$ 220.000.000,00	$ 0,00	$ 220.000.000,00
CO624	12/09/2025	$ 14.828.124,90	$ 0,00	$ 14.828.124,90
valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 878.607.549,11**	**$ 0,00**	**$ 878.607.549,11**

CORTE No.3

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CO635	14/10/2025	$ 59.371.875,10	$ 0,00	$ 59.371.875,10
CO636	14/10/2025	$ 139.712.862,91	$ 0,00	$ 139.712.862,91

2217793602

GS-2025-305491-MEVAL

CO637	14/10/2025	$ 101.479.095,83	$ 0,00	$ 101.479.095,83
CO638	14/10/2025	$ 70.056.448,44	$ 0,00	$ 70.056.448,44
CO639	14/10/2025	$ 124.007.630,34	$ 0,00	$ 124.007.630,34
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 494.627.912,62**	**$ 0,00**	**$ 494.627.912,62**

5. Relación y Revisión de Precios en nuevos APU´S, de acuerdo al requerimiento del contratista y concepto de viabilidad del supervisor para la autorización del ordenador del gasto.

No aplica.

6. Informe generalizado del balance financiero. Anexar cuando se requiera el balance parcial y en la entrega final se anexa el balance final.

No aplica.

7. Entrada de los bienes a los estados contables (si aplica, últimos informes).

No aplica.

DE CARÁCTER LEGAL:

1. Confirmación o verificación de Pólizas según contrato

El contrato cuenta con un mecanismo de cobertura de riesgo a cargo del contratista equivalente a la Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. 65-44-101239885 Expedida el 11/06/2025,

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 65-40-101082380 Expedida el 11/06/2025.

2. Confirmación o verificación en el Cumplimiento de Obligaciones Laborales (Pagos de personal, Aportes al Sistema de Seguridad Social, Aportes Parafiscales).

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa CONVIAS S.A.S, en cuanto a las afiliaciones, pago se seguridad social y parafiscales del personal antes de autorizar el inicio de las obras. Por parte de la supervisión se recomienda al contratista cumplir con responsabilidad la ley al momento de hacer los trámites administrativos para afiliaciones o desafiliaciones de trabajadores, pago de nómina y pago de impuestos, en el marco de este proceso contractual.

2217793652

GS-2025-305491-MEVAL

3. Reclamaciones del Contratista y Recomendaciones. (si aplica)

En el periodo correspondiente al presente informe, no se presentaron reclamaciones por parte del contratista CONVIAS S.A.S, por ninguno de los medios o canales de comunicaciones legales y autorizadas por la Policía Nacional, (e-mail, informes escritos, correos electrónicos certificados) a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, a través de la supervisión de este contrato.

4. Liquidación del Contrato. Debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato

Una vez se cumpla con los requisitos y tiempos estipulados contractualmente se procederá la liquidación bilateral o unilateral del contrato en caso de ser necesario.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto contratado, en el último comité de obra se presentó un balance general de la ejecución del contrato al señor Subcomandante de la unidad, donde se explicaron los ítems y actividades ejecutadas, se realizaron las aclaraciones y observaciones frente a los tramites de pagos de facturación exigidos por el contrista; igual forma se dejó constancia que los participantes del comité de obra y la supervisión, cumplieron los compromisos contenidos en el acuerdo de voluntades del contrato de Obra.

Se recomienda al Contratista aportar de manera oportuna y completa la siguiente información:

-Aportar el soporte verificable del pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que está obligado a pagar a los trabajadores que se encuentran vinculados en la ejecución de la obra.

- Aportar las planillas de la afiliación y pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

La anterior información es indispensable para verificar el cumplimiento a las obligaciones del contratista. Por lo tanto, se recomienda atender los requerimientos efectuados por el contratante de manera oportuna.

- Todas las partes participantes en el contrato deben aportar total disponibilidad para solucionar los inconvenientes que se puedan presentar, para esto se recomienda estar en consten comunicación y coordinación.

- Se recomienda, al funcionario responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo del equipo de trabajo del contratista reiterar al personal de mano de obra la importancia del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal – EPP.

Anexo: no

El contratista cumplió con lo establecido en	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud ocupacional y otros)

2217793692

GS-2025-305491-MEVAL

las cláusulas contractuales	**NO**___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Subcomisario **JOHN ALBERTO BARRIOS MALDONADO**
Supervisor Jurídico.

Subintendente **JOHN EDISON GOMEZ ORREGO**
Supervisor Económico.

Subintendente **JOVANNY CALLEJAS JARAMILLO**
Supervisor Técnico.

Nota: Una vez finalizada la ejecución del contrato, se debe diligenciar el Anexo No. 2 "Informe de Re-evaluación de Proveedores", del formato 2BS-FR-0019 y anexarlo al informe final.

2217793652

CONVÍAS S.A.S

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

NIT: 811 009 579-5

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

GABRIEL JAIME GÓMEZ ESCUDERO identificado con **98.562.644** en mi condición de representante legal de **CONVIAS S.A.S** identificada con **NIT 811009579-5**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

MARÍA ELENA BAEZ GIRALDO identificado con **43.052.822 DE MEDELLÍN**, y con tarjeta profesional **No. 86404-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONVÍAS SAS** identificada con **NIT 811009579-5,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **aburra sur**, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en ENVIGADO, a los 30 días del mes de septiembre de 2025.

MARÍA ELENA BAEZ GIRALDO
Revisor Fiscal
T.P. No. 86404-T.
CC. 43.052.822 de Medellín

GABRIEL JAIME GÓMEZ ESCUDERO
Representante Legal CONVÍAS SAS

2217793652

GS-2025-305491-MEVAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4397A54FB7C3FCA49

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ELENA BAEZ GIRALDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43052822 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 86404-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2217793652
