	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. MMO-LP-OP-01-2023 **Contratista:** CONSORCIO RURAL MOMIL 2023

Contrato de Interventoría No. 1826 DE 2023 **Interventoría:** IC INGENIO CIVIL S.A.S.

Objeto Contrato de Obra:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL, SEGUNDA ETAPA, EN VIRTUD AL CONVENIO 1135 DE 2021

INFORME MENSUAL No. 6 **MES O PERIODO:** DICIEMBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		9
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		10
2.1	Localización		10
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		12
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		12
2.4	Características técnicas del proyecto		12
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		19
3.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		19
3.2	Información general del contrato		19
3.3	Presupuesto de obra		20
3.4	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		22
3.5	Seguimiento Ítems no previstos		23
3.6	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		23
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		24
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	24
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	25
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	26
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	27
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	28
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	29
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	30
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	31
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		32
	• Seguimiento Programa de Obra		33
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	34
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	35
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	35
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	35
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		37
5.1	Información general del contrato		38
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		39
5.3	Informes especialistas y profesionales		40
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		42
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	42
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	44
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	46
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	48
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	51
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		54
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	54
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	54
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	54
7	**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**		57
8	**ANEXOS**		58
	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		58
	Registro fotográfico y video del avance de las obras		59
	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		64

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: NESTOR LEMUS VILLADIEGO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. DT-COR 43010 de fecha 26 de Julio de 2023

Revisó Jeus D Salgado H

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 10/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
PERIODO MES: DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: MMO-LP-OP-01-2023
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL, SEGUNDA ETAPA, EN VIRTUD AL CONVENIO 1135 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO RURAL MOMIL 2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 27 de Julio de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: -
FECHA DE REANUDACIÓN: -
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de noviembre de 2023
PLAZO ACUMULADO: 4 meses y 5 días

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.332.423.959,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1.332.423.959,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1826 DE 2023
INTERVENTOR: IC INGENIO CIVIL S.A.S.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NESTOR LEMUS VILLADIEGO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE CONSTRUCCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD
PAVIMENTACIÓN	Placa Huella	ML	822,5
AFIRMADO, SUBBASES, BASES GRANULARES	Subbase granular	M3	654,2
AFIRMADO, SUBBASES, BASES GRANULARES	Afirmado	M3	1.839
ESTRUCTURAS DE DRENAJE	Construcción de Box Culverts 3x2	UND	1,0

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE CONSTRUCCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD MES PRESENTE	CANTIDAD ACUMULADA
PAVIMENTACIÓN	Placa Huella	ML	0,00	822,50
AFIRMADO, SUBBASES, BASES GRANULARES	Subbase granular	M3	0,00	654,16
AFIRMADO, SUBBASES, BASES GRANULARES	Afirmado	M3	0	1839
ESTRUCTURAS DE DRENAJE	Construcción de Box Culverts 3x2	UND	0	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.302.560.488,00	$ -	$ 1.302.560.488,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.928.400,00	$ 3.026.396,00	$ 18.954.796,00
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIA (PAGA)	$ 10.908.675,00		$ 10.908.675,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 1.332.423.959,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 1.332.423.959,00	$ -	$ 1.332.423.959,00	$ 1.332.423.959,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIA (PAGA)	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO			**$ -**	**$ 1.332.423.959,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 1.332.423.959,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 1.332.423.959,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **17**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BERNARDO JOSE OTALVAREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 222202-263547 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
TERRRITORIAL CORDOBA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1826 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA.

MOMIL, CORDOBA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 06
PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023
IC INGENIO CIVIL S.A.S.
NIT. 901.701.928-6

REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1826 DE 2023



CAPÍTULO I. MUNICIPIO DE MOMIL

Convenio 1135 DE 2021 con prorroga hasta 31 de diciembre de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 06
PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023

IC INGENIO CIVIL S.A.S.
NIT. 901.701.928-6

ELABORÓ	REVISÓ
ING ORLANDO RODRIGUEZ	ING BERNARDO OTALVAREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN……9

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO…….....10

2.1 Localización…….....10

2.2 Municipios en la zona de influencia de ejecución del proyecto…….12

2.3 Inventario y Estado inicial de la Vía……..…….....…12

2.4 Características Técnicas del Proyecto…….....12

3.0 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA…….…….…….....19

3.1 Resumen mensual estado general del proyecto. …….....19

3.2 Información general del contrato de obra…….....19

3.3 presupuesto de obra según convenio…….……20

3.4 Descripción de las actividades ejecutadas por el Contratista durante el mes……..22

3.5 Seguimiento ítems no previsto……..23

3.6 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría……..23

REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA…….....23

4.10 Informe Semanal…….....……24

4.2 Maquinaria y equipo del contrato de obra…….....25

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra….....26

4.4 Informe financiero y presupuestal del contrato de obra……27

4.5 Estado general del tiempo……...28

4.6 Resumen ensayos de laboratorio…….....29

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros contrato de obra……....30

4.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra……....31

4.9 Otros documentos seguimiento mensual……...32

- Plan de inversión del anticipo contrato de obra…….……....33
- Seguimiento a la inversión anticipo del contrato de obra…….34
- Programa de inversión……34
- Seguimiento programa de inversiones……....34
- Actas comité de obra……..35
- Acta reunión……36

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……..37

5.1. Información general del contrato de interventoría…….38

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor……...39

5.3. Informe de especialistas y profesionales……....40

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA……...42

6.1. Equipo y vehículos contrato de interventoría……42

6.2. Personal, Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría….44

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría……..46

6.4. Seguimiento garantías contrato interventoría…….48

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría……51

6.6. Otros documentos seguimiento mensual……..54

- Plan de inversión de anticipo contrato de interventoría…….……54
- Seguimiento a la inversión del anticipo……..54
- Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado……...54

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……57

8. ANEXOS…….……58

8.1.1 Correspondencia enviada …..……..…58

8.1.2 Correspondencia recibida ……..…59

8.2 Registro fotográfico avance de obra……60

8.3 Bitácora de obra ……64

8.4 Soportes de Formatos…. ……94

I Soportes 4.3 Personal, control aportes contrato de obra……94

II Soportes 4.5 Estado general del tiempo……..……96

III Soportes 4.6 Ensayos de laboratorio-obra……..……...97

IV Soportes 4.7 Ensayos de laboratorio-Interventoría……..……..……98

V Soportes 6.1 Equipo y vehículos contrato de Interventoría……..……100

VI Soportes 6.2 Personal, Control aportes contrato de Interventoría……..……103

VII Soportes 6.4 Garantías contrato de Interventoría……..106

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.	Localización general del municipio de Momil Córdoba	10
Ilustración 2.	Localización general del proyecto de la vía a intervenir Sabaneta-Pereira	11
Ilustración 3.	Vista en planta placa huella- excavación viga riostra	13
Ilustración 4.	Sección transversal placa huella- subbase	13
Ilustración 5.	Sección transversal placa huella – dimensiones de elementos	14
Ilustración 6.	Vista en Planta Rampa de Acceso a placa huella	14
Ilustración 7.	Sección transversal y en planta de concreto viga riostra	15
Ilustración 8.	Sección transversal cunetas	15
Ilustración 9.	Sección transversal concreto ciclópeo	16
Ilustración 10.	Acero de refuerzo longitudinal placa huella	16
Ilustración 11.	Acero de refuerzo placa y vigas corte Longitudinal	17
Ilustración 12.	Acero de viga riostra	17
Ilustración 13.	Corte transversal viga riostra	17
Ilustración 14.	Box Culverts	18

1. INTRODUCCIÓN

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS a través de la Subdirección de Vías Regionales, suscribió con el municipio de Momil - Antioquia, EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1135 de 2021, el cual tiene por objeto el de: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

Teniendo en cuenta que el INVÍAS suscribió EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1135 de 2021 con el municipio de Momil- Córdoba, financiando el 100% del valor de los Convenios, con los municipios favorecidos. El Municipio mediante Licitación Pública, adjudicó el respectivo contrato y a su vez el INVÍAS contrató una Interventoría, que adjudicó, mediante contratación mínima cuantía a IC INGENIO CIVIL S.A.S. que debe seguir las principales actividades y obras a ejecutar en el municipio de MOMIL- CORDOBA.

En el marco del Convenio 1135 de 2021, la Alcaldía del Municipio de Momil, Córdoba, mediante proceso de licitación pública MMO-LP-OP-01-2023 adjudicó a CONSORCIO RURAL MOMIL 2023 por valor de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.332.423.959,oo) cuyo objeto es MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL, SEGUNDA ETAPA, EN VIRTUD AL CONVENIO 1135 DE 2021, el plazo de ejecución del contrato es de tres (3) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

Por el Contrato 1826 de 2023, la empresa IC INGENIO CIVIL S.A.S., en adelante La Interventoría, tiene la responsabilidad de **LA GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL** del convenio y del contrato mencionado anteriormente.

La supervisión del Contrato está a cargo del Ing. Néstor Lemus Villadiego de la oficina Territorial del INVIAS de Córdoba.

Este informe resumirá las actividades que se realizaron durante el mes de **Diciembre** de 2023, en el marco del respectivo contrato y en cumplimiento de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental, regulada por el Contrato 1826 de 2023.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización.

El Municipio de Momil se encuentra ubicado al norte del Departamento de Córdoba, pertenece a la subregión de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, entre las coordenadas geográficas a los 9º 14’ 16” de latitud Norte y los 75° 36’ 30” de longitud al oeste de Greenwich, con una altura de 17 metros sobre el nivel del mar; la precipitación promedio anual es de 1200 mm, comprendiendo un territorio cuyo relieve es plano en cercanías de la ciénaga y de serranías que forman los límites con el Departamento de Sucre, los Municipios de Purísima y San Andrés de Sotavento.

Su territorio comprende una extensión de 15.500 hectáreas, según constan en los datos suministrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi Seccional Córdoba, representando el 0.61% del total del departamento, de ellas un total de 4.000 comprenden territorios ubicados en la ciénaga

Ubicación de Momil dentro del Departamento de Córdoba



Ilustración 1.

Casco Urbano Municipio de Momil



Vía terciaria Momil-Sabaneta- Pereira.



Ilustración 2.

Cordenadas de inicio Vía Momil Pereira: 9°17'37.22"N 75°37'56.32"O
Coordenadas de fin Vía Momil Pereira: 9°17'49.54"N 75°38'22.93"O

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Los principales beneficiarios del proyecto, es la comunidad en general del Municipio de Momil, así como del municipio de Palmito Sucre, por ende, habitantes de la zona de influencia del Proyecto tales como Vereda Pereira, y el corregimiento de Sabaneta

2.3. Inventario y Estado inicial de la vía.

La vía para intervenir consta de 4.3 km, de los cuales se intervinieron 1.9 km en placa huellas, así como 9 obras transversales tipo box culverts, con mejoramiento en afirmado y en pedraplén, lo anterior fue realizado a través del mismo convenio 1135 de 2021, para el presente contrato se le hizo una adición al convenio indicado para el mantenimiento y rehabilitación del inicio de la vía a intervenir la cual se encuentra en afirmado en regular estado.

2.4. Características técnicas del proyecto.

El Proyecto consiste en la construcción de un (1) tramo de placa huella de 880 m esto en la vía terciaria Momil- Sabaneta – Pereira, así mismo consta de la construcción de un (1) box culverts de 3 m x 2 m

El Constructor es el CONSORCIO RURAL MOMIL 2023 cuyo representante legal es el ingeniero HENRY CARRASCAL CARRASCAL

A continuación, se muestra el abscisado de las obras a realizar:

PLACA HUELLA

Placa Huella	ABS INICIAL	ABS FINAL	LONG.
Tramo 1. Pereira	K0+000	K0+880	880 m

Tabla 1. Tramos de placa huella

OBRAS TRANSVERSALES

Descripción	Abscisa	Dimensión
Box Culverts	K1+000	3 x 2 m

Tabla 2. Ubicación de Obras Transversales Box Culverts

Dimensionamiento y refuerzo de placa huella

Excavación de vigas riostras.

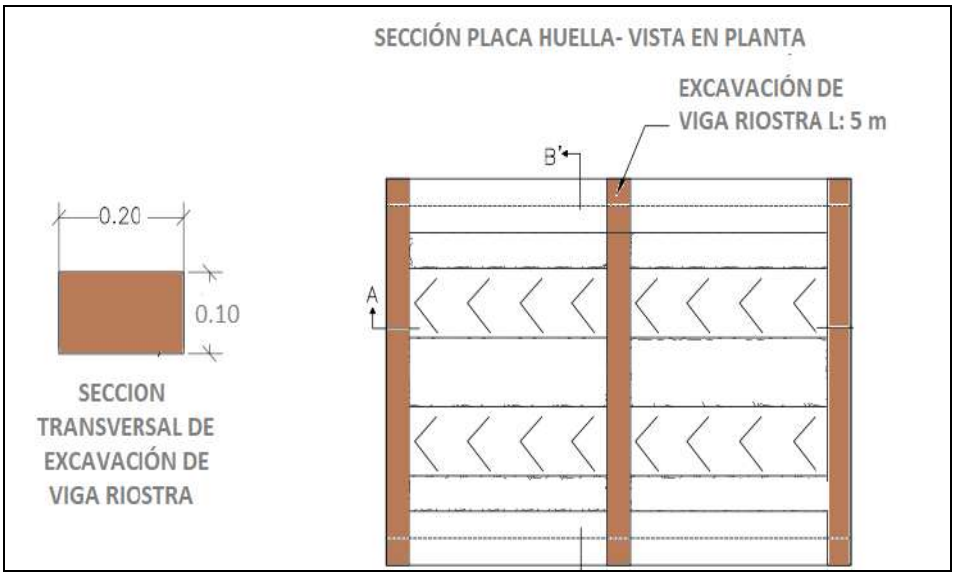


Ilustración 3.

Instalación de subbase granular clase c

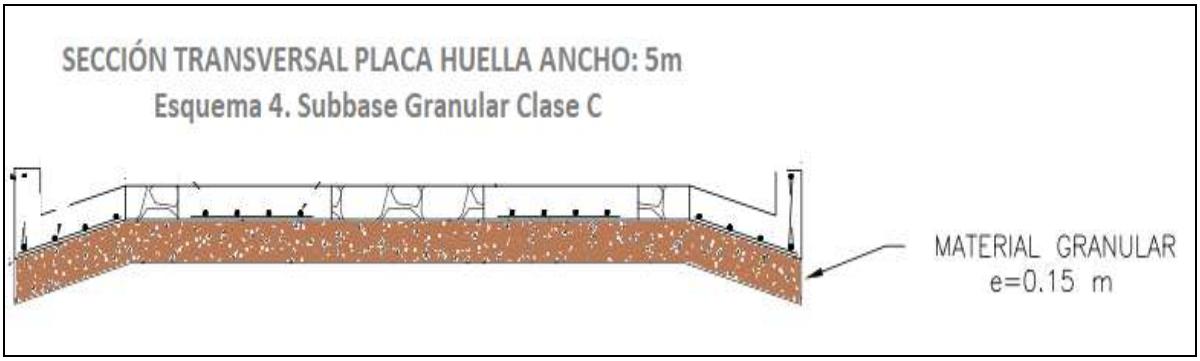


Ilustración 4.

Placa huella

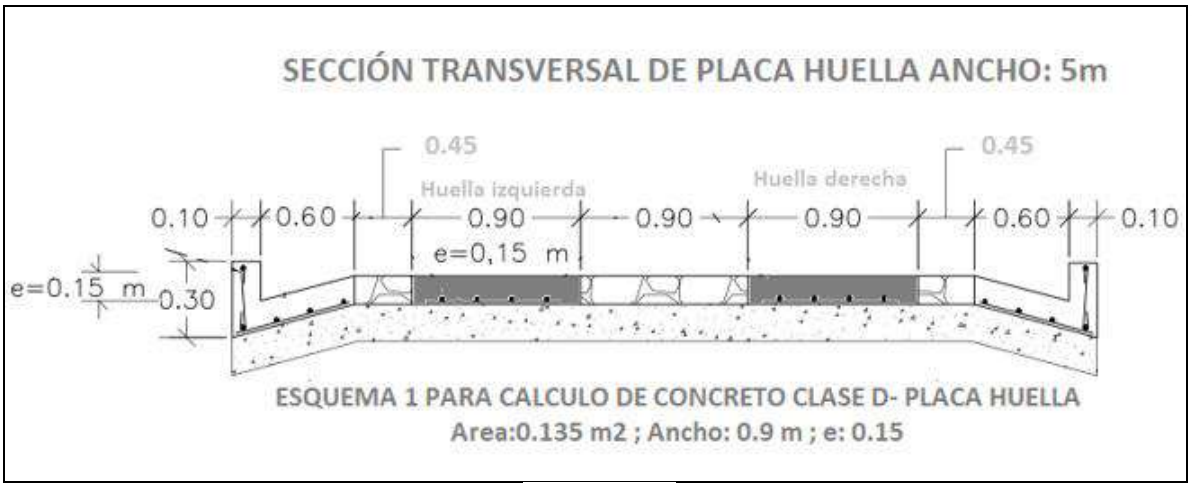


Ilustración 5.

Rampa de acceso placa huella.

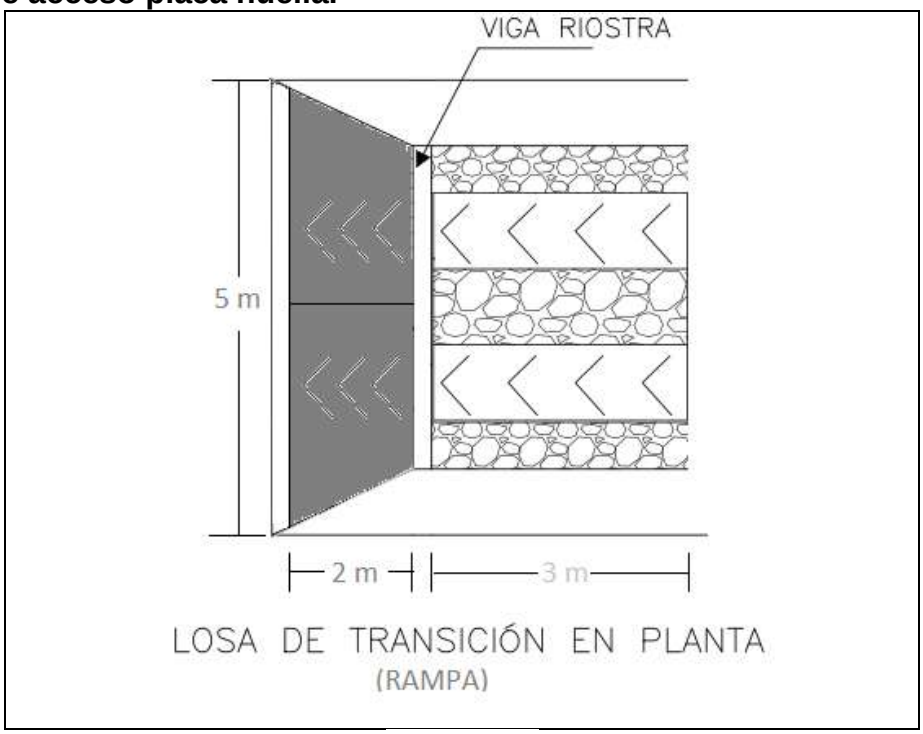


Ilustración 6.

Vigas riostras.

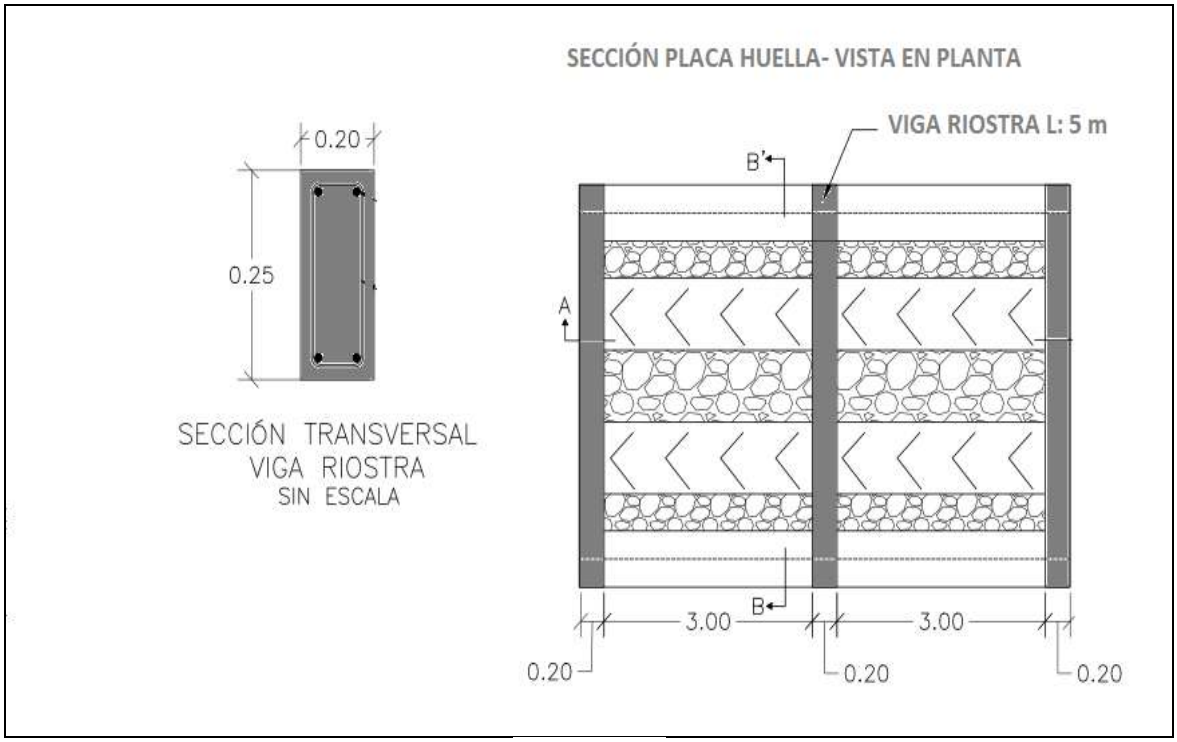


Ilustración 7.

Cunetas en concreto clase D.

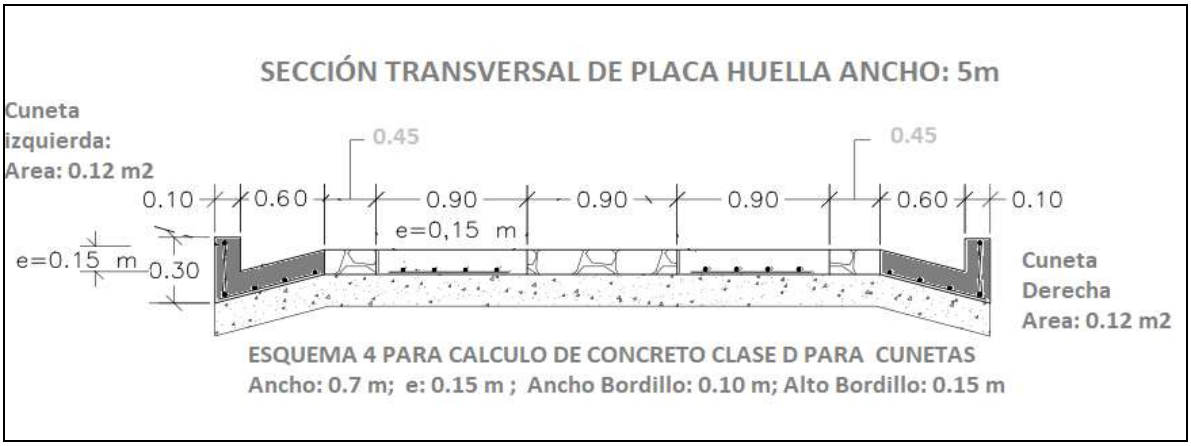


Ilustración 8.

Concreto clase G para concreto ciclópeo

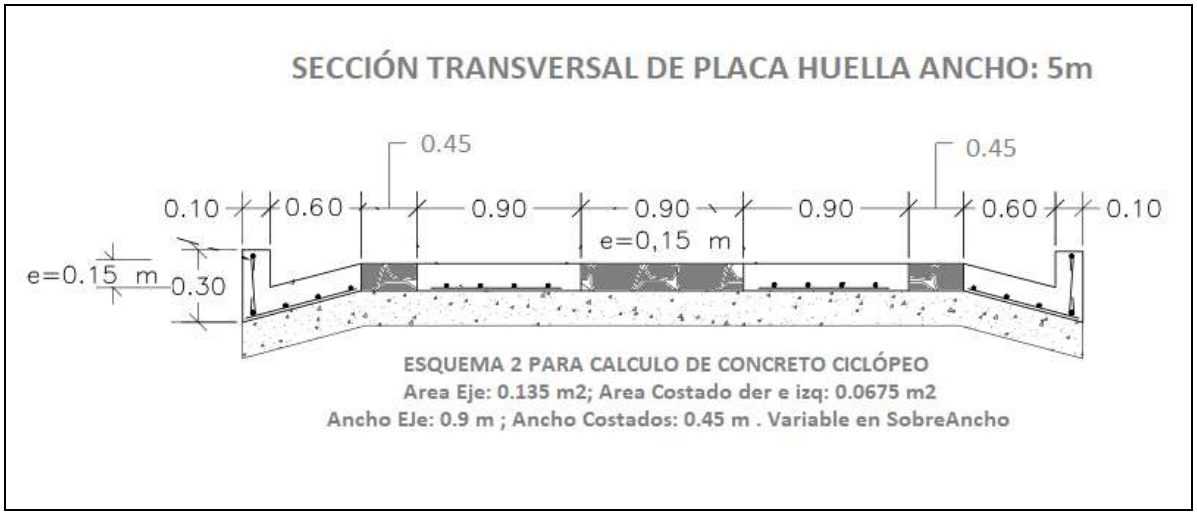


Ilustración 9.

Acero de refuerzo placa huella.

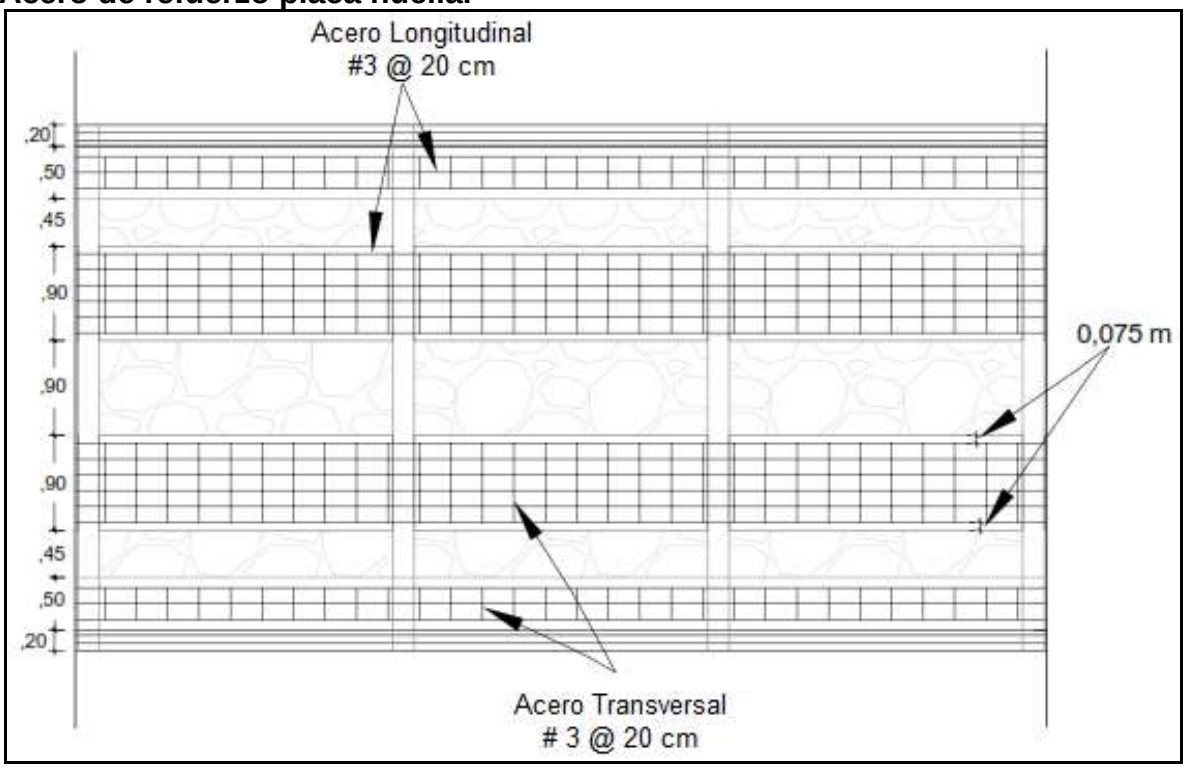


Ilustración 10.

Acero de refuerzo placa y vigas corte longitudinal

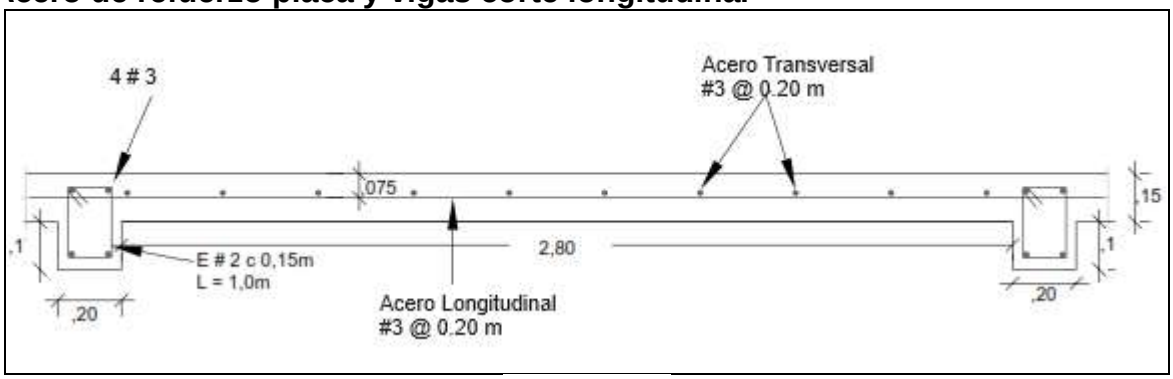


Ilustración 11.

Acero viga riostra

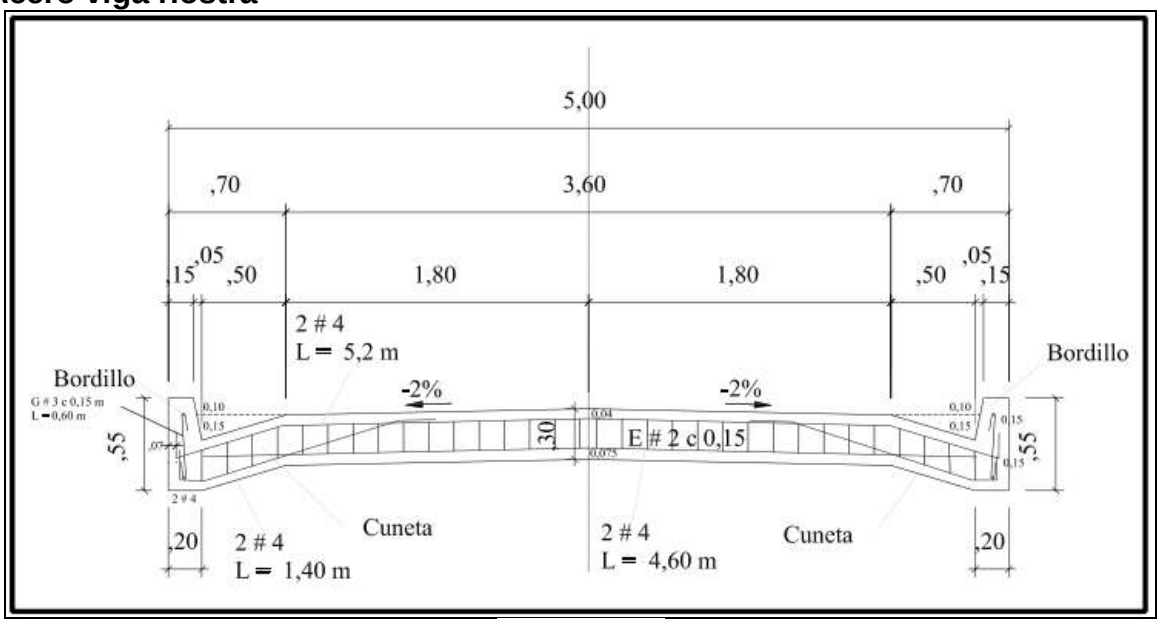


Ilustración 12.

Corte transversal viga riostra.

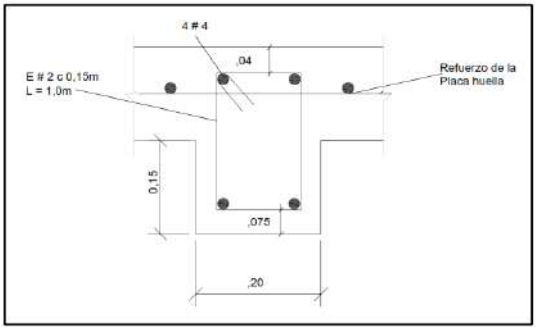


Ilustración 13.

BOX CULVERT.

Como lo que se quiere es drenar el flujo del agua de escorrentía superficial de la vía al cauce natural, se construirá un box culverts recomendado por la cartilla obras menores de drenaje estructuras viales Colombia Rural INVIAS.

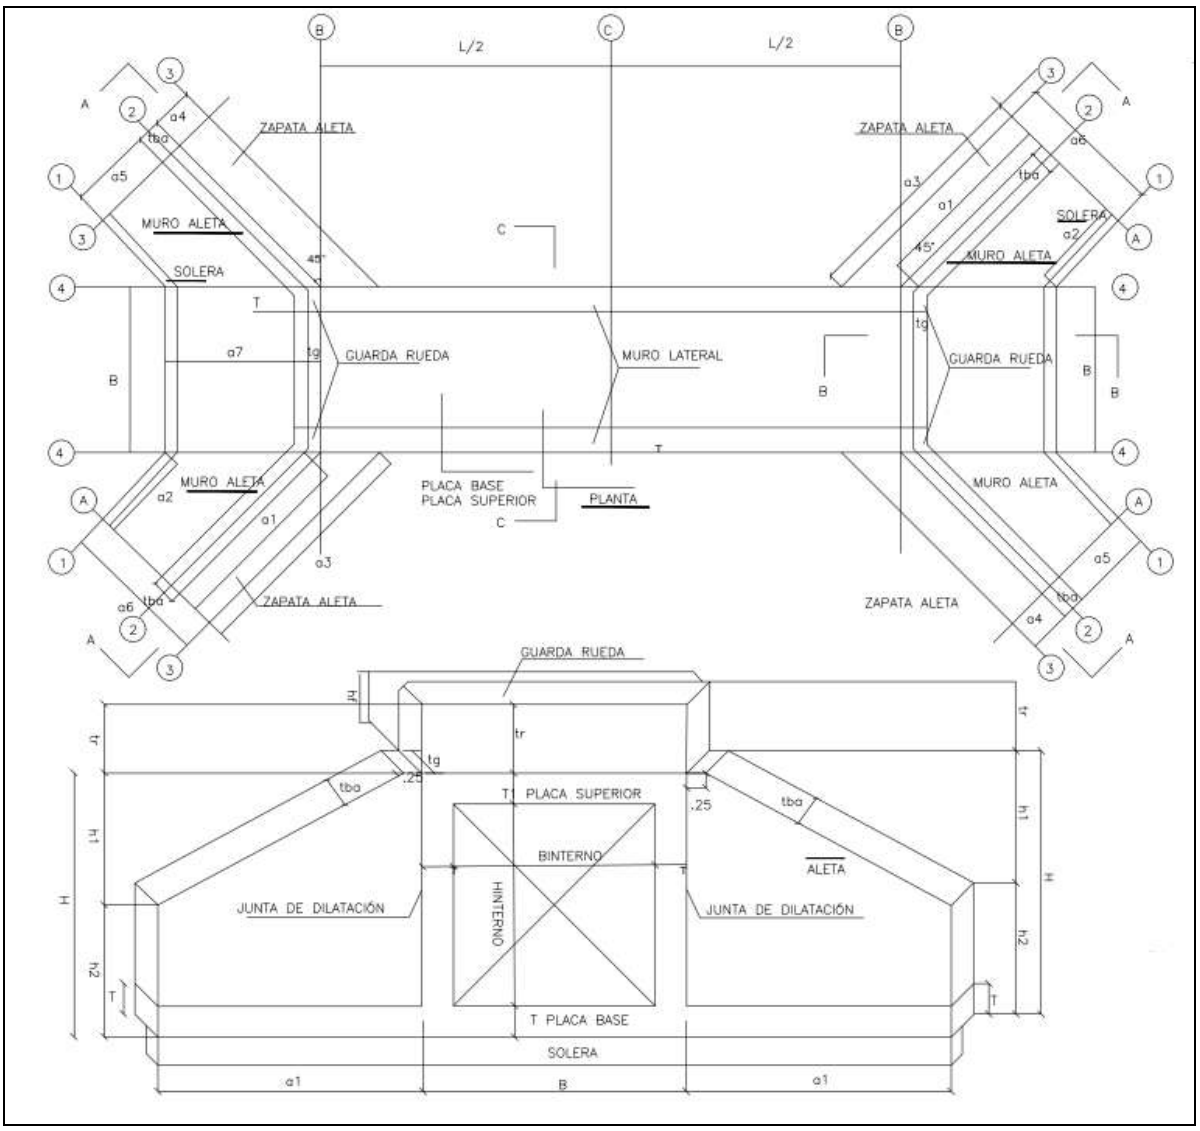


Ilustración 14.

Fuente: cartilla obras menores de drenaje estructuras viales Colombia Rural pág. 40.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1 Resumen mensual estado general del proyecto.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 se consigna la información referente al estado del proyecto en el periodo entre el 01 al 10 de diciembre de 2023.

3.2. Información general del contrato de obra.

VIA TERCIARIA	MOMIL-SABANETA-PEREIRA.
LICITACIÓN PÚBLICA No.:	MMO-LP-OP-01-2023
CONVENIO	1135-2021 con Prorroga a 31 de diciembre 2023
VALOR DEL CONVENIO (Vr. Adicionado)	$1.333.066.370,00 M/CTE
CONTRATO No.:	MMO-LP-OP-01-2023 de 11 de Julio de 2023.
CONTRATISTA:	CONSORCIO RURAL MOMIL 2023 NIT. 901.731.745-3
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL, SEGUNDA ETAPA, EN VIRTUD AL CONVENIO 1135 DE 2021
VALOR INICIAL:	$1.332.423.959
VALOR ADICIÓN:	N/A.
VALOR TOTAL:	$1.332.423.959
ANTICIPO:	Para el presente contrato la entidad no entregará al contratista anticipo a razón que contratista renunció a este que se estipulaba en el mismo.
FECHA DE INICIO:	27 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 de octubre de 2023
PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses
FECHA DE ADICIÓN:	25 de octubre de 2023
PLAZO DE ADICIÓN:	Un (1) mes y cinco (5) días
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2023
REPRESENTANTE LEGAL:	Henry Carrascal Carrascal
GESTOR DEL PROYECTO:	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Néstor Lemus Villadiego
INTERVENTOR CONTRATO:	IC INGENIO CIVIL S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	Bernardo Otalvarez Llorente.
MUNICIPIO BENEFICIADO:	Momil (Córdoba)
UNIDAD EJECUTORA:	Subdirección de Vías Regionales.

Tabla 3. Datos Generales Contratista obra.

3.3. Presupuesto de obra según el convenio.

COLOMBIA RURAL								
MUNICIPIO				VIA	Long (Km)	PR Inicial		PR Final
MOMIL				PEREIRA - SABANETA	4,43	PR0+000		PR4+432
SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA								
No	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I. EXPLANACIONES								
1	600.2.3	600		Excavaciones varias en material común en seco.	m3	35,20	$ 37.199,00	$ 1.309.404,80
2	210.2.2	210		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	2.376,00	$ 12.154,00	$ 28.877.904,00
Subtotal								$ 30.187.308,80
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m								
CONSTRUCCIÓN DE		1		BOX CULVERT 3X2(L =6m)				
3	600.2.3	600		Excavaciones varias en material común en seco a mano.	m3	40,00	$ 37.199,00	$ 1.487.960,00
4	201.6	200		Demolición de estructuras	m3	15,00	$ 196.968,00	$ 2.954.520,00
5	630.6	630		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	3,50	$ 666.075,00	$ 2.331.262,50
6	630,3	630		Concreto clase C (280 kg/cm2 ó 4000 PSI)	m3	42,50	$ 812.907,00	$ 34.548.547,50
7	640.1	640		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	5.173,60	$ 8.820,00	$ 45.631.152,00
8	610.2	610		Relleno para Estructuras con recebo	m3	35,00	$ 102.458,00	$ 3.586.030,00
Subtotal								$ 90.539.472,00
III. PLACA HUELLA SEGÚN DISEÑO								
CONSTRUCCIÓN		880,00		METROS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO				
9	311.1	311		Afirmado (Material para Mejoramiento)	m3	1.452,00	$ 108.639,00	$ 157.743.828,00
10	320.3	320		Subbase Granular Clase C.	m3	726,00	$ 180.638,00	$ 131.143.188,00
11	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	m3	237,60	$ 801.447,00	$ 190.423.807,20
12	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	m3	35,20	$ 801.447,00	$ 28.210.934,40
13	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	290,40	$ 801.447,00	$ 232.740.208,80
14	630.7	630		Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	m3	303,60	$ 596.970,00	$ 181.240.092,00
15	640.1	640		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	23.971,20	$ 8.820,00	$ 211.423.984,00
Subtotal								$ 1.132.928.042,40
IV. TRANSPORTE								
16	900.2	900		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	23.760,00	$ 1.812,00	$ 43.053.120,00
Subtotal								$ 43.053.120,00
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL								
SEÑALIZACIÓN				DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y SEÑALIZACIÓN VERTITICAL				
17	710.1	710		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	6,0	$ 565.426,00	$ 3.392.556,00
Subtotal								$ 3.392.556,00

COLOMBIA RURAL

MUNICIPIO	VIA	Long (Km)	PR Inicial	PR Final
MOMIL	PEREIRA - SABANETA	4,43	PR0+000	PR4+432

VI. CARACTERIZACIÓN VIAL								
18				Caracaterización del corredor	km	4,432	$ 700.000,00	$ 3.102.400,00
Subtotal								**$ 3.102.400,00**

SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 1.303.202.899,20**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	**$ 10.908.674,80**
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 15.928.400,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3.026.396,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 18.954.796,00**
VALOR ACTIVIDADES MEJORAMIENTO	**$ 1.333.066.370,00**

NOTA 1: El control de tráfico temporal (controladores de tráfico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista.

NOTA 2: Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor de A.I.U.

NOTA 3: . El archivo de presupuestos incluye el Análisis de Precios Unitarios (APU) de cada ítem dentro del mismo libro del presupuesto

NOTA 4: El A.I.U y su discriminación esta dada en porcentaje (%).

NOTA 5: Los valores de los Materiales de Obra y equipo se ajustan a los valores comerciales.

NOTA 6: Se cuenta con el análisis de costos para la revisión y/o ajustes a estudios y diseños

NOTA 7: Los presupuestos fueron elaborados por la Subdirección de la Red Terciaria y Ferrea del INVIAS

NOTA 8: Los costos de bioseguridad se encuentran incluidos en los gastos administrativos del contratista.

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	20%
IMPREVISTO	I=	5%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

Nombre: NESTOR ELEAN LEMOS VILLADIEGO
Supervisor
Territorial Córdoba

Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO

Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Director Territorial
Territorial Córdoba

El valor del contrato de obra quedó establecido en la suma de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($1.332.423.959,oo).

3.4. Descripción de las actividades ejecutadas por el contratista de obra durante el mes de diciembre de 2023.

Durante el presente periodo no se realizaron actividades de obra, ya que estas culminaron para la fecha del 30 de noviembre de 2023.

Contratista realiza aseo y limpieza en las áreas intervenidas.

Se está en proceso de liquidación reuniendo la documentación pertinente para ello, así mismo, se encuentra en tramite el acta final.

3.5. Seguimiento a ítems no previstos.

En el mes de noviembre y diciembre NO se gestionaron por parte del Contratista ítem no previstos toda vez que no surgió la necesidad de actividades de obras extras apartes de las contractuales.

3.6. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

En el mes de diciembre no se generaron Informes semanales. Las obras finalizaron en un 100% para la fecha de 30 de noviembre de 2023.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

4.1. Informe Semanal

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Durante el presente periodo no se generaron informes semanales. Las actividades finalizaron el día 30 de noviembre de 2023.

4.2. Maquinaria y equipo del contrato de obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. Durante el presente periodo no se presentaron actividades de obra, estas finalizaron el día 30 de noviembre de 2023.

4.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. A la fecha de elaboración del presente informe, el contratista no realizó actividades de obra, el contrato finalizo el día 30 de noviembre de 2023.

4.4. Informe financiero y presupuestal del contrato de obra

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se presenta el informe financiero y presupuestal del Contrato de obra

4.5. Estado general del tiempo

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. No se registró el estado general del tiempo en la zona del proyecto en el mes de diciembre de 2023, debido a que las obras finalizaron el día 30 de noviembre de 2023**.**

4.6. Resumen ensayos de laboratorio

Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1. Durante el presente periodo no se realizaron ensayos de laboratorio debido a que las obras finalizaron el día 30 de noviembre de 2023.

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros contrato de obra

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 se presenta el seguimiento a las garantías y seguros del Contrato de obra en el mes de diciembre de 2023.

4.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

Formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14. Durante el presente periodo no se registraron actividades de obra, las cuales finalizaron el 30 de noviembre de 2023.

4.9. Otros documentos de seguimiento Mensual

- **Plan de inversión del anticipo contrato de obra.**

El contrato de obra No. MMO-LP-OP-01-2023 contempla la entrega de anticipo, sin embargo, el contratista renunció a este en oficio Nro. 010.

- **Seguimiento a la inversión de anticipo del contrato de obra**

No aplica.

- **Programa de inversión**

El contratista presentó el programa de inversión con ejecución final hasta el 30 de noviembre de 2023. Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1 aprobado por la presente interventoría.

- **Seguimiento programa de inversiones.**

Formato MEPI-MN-IN-6-FR-2. Contratista ejecuta las obras en un 100% a la fecha de 30 de noviembre de 2023.

- **Actas comité de obra**

Durante el presente periodo no se realizó acta de comité de obra.

- **Actas de reunión.**

Durante el presente periodo no se realizó actas de reunión.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1826 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA



CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Convenio 1135 DE 2021 con prorroga hasta 31 de diciembre de 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 06
PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023
IC INGENIO CIVIL S.A.S.
NIT. 901.701.928-6

ELABORO
ING. BERNARDO JOSE OTALVAREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información general del contrato de interventoría

CONTRATO No.	**1826-2023**
OBJETO:	**“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA”**
VALOR INICIAL:	**$ 55.447.827,00**
VALOR ADICIÓN No	**N/A**
VALOR TOTAL	**$ 55.447.827,00**
ANTICIPO	**N/A**
FECHA DE INICIO:	**27 DE JULIO DE 2023**
PLAZO INICIAL:	**3 MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN	**27 DE JULIO DE 2023**
CONTRATISTA:	**IC INGENIO CIVIL S.A.S.**
REPRESENTANTE LEGAL:	**BERNARDO JOSE OTALVAREZ LL.**
DIRECCIÓN CONTRATISTA:	**CALLE 18 Nro 22-10 OFI -404**
GESTOR DEL PROYECTO:	***N/A***
SUPERVISOR DEL CONTRATO	***ING. NESTOR LEMUS VILLADIEGO***
MUNICIPIOS BENEFICIADOS	***MOMIL-CORDOBA***
UNIDAD EJECUTORA	***SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES***

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

En cumplimiento con las obligaciones de la interventoría se contempla en el presente período mensual las siguientes actividades:

Supervisión de los trabajos por parte de la dirección de la interventoría mediante el seguimiento de las obligaciones contraídas por el contratista de obra, control de calidad de las actividades de obra desarrolladas referente a los procedimientos constructivos, calidad de los materiales y producto terminado, teniendo en cuenta las Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS 2013; así como las recomendaciones y requerimientos establecidos en los estudios previos y ambientales del proyecto.

Seguimiento a la entrega de la documentación inicial para realizar el debido control de cada una de las actividades en obra.

Seguimiento del avance físico de las obras en el tiempo, teniendo en cuenta el programa de trabajo presentado por el contratista de obra.

En el período del 01 al 10 de diciembre de 2023 la Interventoría realizó las siguientes actividades:

- Revisión de documentación final entregada y solicitud de la documentación faltante.
- Envío y revisión de acta de recibo final
- Participación en reuniones con el contratista de obra, municipio Momil e INVIAS.
- Supervisión de las diferentes actividades de recolección de documentación para el cumplimiento de diseños, programas de trabajo (general y semanal).
- Inspección de las actividades Ambientales y Sociales que realiza el contratista de obra.
- Elaboración y revisión de comunicaciones y demás documentos enviados al Contratista y al Invías.

- Atención a consultas y requerimientos de todos los interesados en el Proyecto (Contratista de obra, comunidad, autoridades civiles, Dirección Territorial del Invías, Alcaldía y oficina central Invías etc.).

- Seguimiento y control financiero del Proyecto, con énfasis en las cantidades del Presupuesto oficial del Contrato y Monto de la vigencia del año 2023.

- Elaboración de informe informes semanales y mensual.

5.3. Informe de especialistas y profesionales.

Durante el mes de diciembre de 2023 se presentó informe de especialista en pavimento sobre diseño presentado y ajuste de este.
Así mismo se presentó informe de topografía del mes de diciembre para revison de planos record.

Los cuales se presentan a continuación:

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Equipo y vehículos contrato de interventoría

Durante el mes de diciembre de 2023 la interventoría registró el uso de vehículo automotor para el transporte de personal en el Municipio de Momil, así como equipo topográfico para chequeo actividades en campo esto en los 10 días del mes de diciembre.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 se registra el equipo y vehículos de la interventoría durante el mes de noviembre de 2023.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1826-2023

INTERVENTORÍA: IC INGENIO CIVIL S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. MMO-LP-OP-01-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO RURAL MOMIL 2023

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta	Duster 2,0 Modelo 2019 Placa HSL 102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					
Equipo topografico	Estacion Total GTS 105N TOPCON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-263547

Firma
Nombre: Néstor Lemus Villadiego
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:22202097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. Personal, Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

En cumplimiento del contrato de interventoría, IC INGENIO CIVIL S.A.S. ingresó el personal requerido en el contrato y el anexo técnico.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se registra el control del personal del contrato de interventoría durante el mes de diciembre de 2023.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 10/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCION TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1826 - 2023 **INTERVENTOR:** IC INGENIO CIVIL S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-23 **PROYECTO:** EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: MMO-LP-OP-01-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO RURAL MOMIL 2023

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFASUCRE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																													% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	BERNARDO JOSE OTALVAREZ	1.102.840.741	Director de Interventoria	$ 2.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				50%	IC INGENIO CIVIL S.A.S.	$ 1.160.000,00	$ 80.736	V	NUEVA EPS	9459833987	$ 46.400	COLFONDOS	9459833987	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
2	ORLANDO RODRIGUEZ MEDRANO	1.102.835.194	Residente de Interventoria	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				100%	IC INGENIO CIVIL S.A.S.	$ 2.000.000,00	$ 139.200	V	SALUD TOTAL	9459833987	$ 80.000	PORVENIR	9459833987	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
3	YORCELIS PIÑO BETTIN	1.102.867.608	Secretaria	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				100%	IC INGENIO CIVIL S.A.S.	$ 1.160.000,00	$ 80.736	V	EPS SURA	9459833987	$ 46.400	PROTECCION	9459833987	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
4	*VICTOR MANUEL BARRETO SALCEDO	1.101.816.024	Especialista en Pavimentos	$ 3.000.000	X	X	X	X																										30%	IC INGENIO CIVIL S.A.S.	$ 450.000,00	$ 31.320	V	SALUD TOTAL	9459833987	$ 18.000	PORVENIR	9459833987	$ 72.000	$ 18.000	$ -	$ -	
5	*ANGIE ZULAY ANGULO CHAMORRO	1.102.867.293	Profesional Social	$ 2.000.000	X	X	X																											20%	IC INGENIO CIVIL S.A.S.	$ 200.000,00	$ 13.920	V	SANITAS	9459833987	$ 8.000	COLFONDOS	9459833987	$ 32.000	$ 8.000	$ -	$ -	
6	*PAULO CESAR PALLARES JARAMILLO	1.017.198.288	Especialista Ambiental	$ 2.500.000	X	X	X																											20%	IC INGENIO CIVIL S.A.S.	$ 250.000,00	$ 17.400	V	EPS SURA	9459833987	$ 10.000	PROTECCION	9459833987	$ 40.000	$ 10.000	$ -	$ -	

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

En cumplimiento del contrato 1826 de 2023, la interventoría ha realizado un seguimiento al contrato de obra, representado en actividades que generan gastos presupuestales como lo son la implementación de los Especialistas, el control y seguimiento técnico de las actividades de obra.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 se registra el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría durante el mes de diciembre de 2023.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1826 - 2023 **INTERVENTOR:** IC INGENIO CIVIL S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 6 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: MMO-LP-OP-01-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO RURAL MOMIL 2023

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	619323	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 55.447.827	
		C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	ADICION	$ 26.443.969	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 81.891.796

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	jul-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	619323 de Fecha 5/06/2023	$ 55.447.827,00	$ 55.447.827,00		
2	ago-23	$ 14.703.406,50	$ 2.793.647	$ 17.497.053,50	$ -	$ 17.497.053,50	$ -	619323 de Fecha 5/06/2023	$ 37.950.773,50	$ 37.950.773,50		
3	sep-23	$ 14.953.406,50	$ 2.841.147	$ 17.794.553,50		$ 17.794.553,50	$ -	619323 de Fecha 5/06/2023	$ 20.156.220,00	$ 20.156.220,00		
4	oct-23	$ 16.428.813,00	$ 3.121.474,47	$ 19.550.287,47		$ 19.550.287,47	$ -	619323 de Fecha 5/06/2023	$ 27.049.901,53	$ 27.049.901,53		
5	nov-23	$ 16.448.813,00	$ 3.125.274,47	$ 19.574.087,47		$ 19.574.087,47	$ -	619323 de Fecha 5/06/2023	$ 7.475.814,06	$ 7.475.814,06		
6	dic-23	$ 6.282.108,29	$ 1.193.600,58	$ 7.475.708,87		$ 7.475.708,87		619323 de Fecha 5/06/2023	$ 105,19	$ 105,19		
TOTALES		**$ 68.816.547,29**	**$ 13.075.143,52**	**$ 81.891.690,81**	**$ -**	**$ 81.891.690,81**			**$ 105,19**	**$ 105,19**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 47.714.040	$ 9.065.668	$ 56.779.708
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 21.102.507	$ 4.009.476	$ 25.111.983
PROVISION FRENTE ADICIONAL			
VALOR TOTAL			$ 81.891.691,29

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Representante Legal IC INGENIO CIVIL
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-263547 COR

Firma:
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. Seguimiento garantías contrato interventoría

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se registra el seguimiento garantías Contrato de Interventoría en el mes de diciembre de 2023 actualizada con acta de inicio y prorroga al contrato.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1826-2023 **INTERVENTOR:** IC INGENIO CIVIL S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA
RURAL" EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA

FECHA DE INICIO: 27/07/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 55.447.827,00

VALOR ACUMULADO: $ 81.891.796,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NESTOR LEMUS VILLADIEGO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.189.179,60	6	6	2023	6	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 16.378.359,20	6	6	2023	6	9	2026
Calidad del servicio	10%	$ 8.189.179,60	6	6	2023	6	9	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101184166

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2023
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.189.179,60	27	7	2023	10	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A			N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 16.378.359,20	27	7	2023	10	12	2026
Calidad del servicio	10%	$ 8.189.179,60	27	7	2023	10	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101184166

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-263547

Firma
Nombre:NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Entre el 01 y10 de diciembre de 2023 el contratista continuo con las labores en obra, para lo cual se hace seguimiento al plan de calidad presentado, relacionado con el número de ensayos por mes, calibración de equipos, reportes de no conformidades, quejas y reclamos**.** Se adjunta el formato MEPI-MN-IN-15-FR-15.

FECHA: 10/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1826-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA

INTERVENTOR: IC INGENIO CIVIL S.A.S.

FECHA DE INICIO: 27/07/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4,5 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: MMO-LP-OP-01-2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO RURAL MOMIL 2023

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------- X NO ------ APROBADO: SI ---X--- NO ------- VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- **X** NO ------ APROBADO: SI ------- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ **16** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 16

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- **X** NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No hubo inconformidades en el mes toda vez que los ensayos realizados cumplieron con las especificaciones tecnicas requeridas

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:
No se presentaron quejas ni reclamos

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 = Concretos	**100%**	**Se realizaron 10 ensayos al respecto en el mes**
IG2: Índice de gestión 2 = Densidades	**100%**	**Se realizaron 17 Ensayos al respecto**
IG3: Índice de gestión 3 = Granulometría	**100%**	**Se realizaron 2 Ensayos al respecto, Afirmado y Subbase**
IG4: Índice de gestión 4 = Proctor modif.	**100%**	**Se realizaron 2 Ensayos al respecto, Afirmado y Subbase**
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Medidor Rapido de Humedad	PINZUAR	**1259/**	**2/09/2023**	**2/09/2023**	**2/09/2024**	
2	Balanza Digital	TRUMAX	YS 147918	**2/09/2023**	**2/09/2023**	**2/09/2024**	

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-263547 COR

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6. Otros documentos seguimiento mensual.

- **Plan de inversión de anticipo contrato de Interventoría**

El contrato de interventoría no aplica la entrega de anticipo MEPI-MN1-IN-3-FR-1.
Ver archivo adjunto-lista de anexos

- **Seguimiento a la inversión del anticipo**

No aplica. MEPI-MN-IN-3-FR-1.

- **Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado**

Se presenta el plan de cargas del contrato Nro 3 de interventoría según el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 .

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☑

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1826-2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA

INTERVENTOR: IC INGENIO CIVIL S.A.S.
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. Néstor Lemus Villadiego
RESOLUCIÓN No.: Oficio N° DT-COR-43010, Asunto: Orden de Inicio Contrato de Interventoría No.1826-2023 DE 27/07/2023

CONTRATO DE OBRA No.: MMO-LP-OP-01-2023 CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA MOMIL 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 10-12-2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/07/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 55.447.827,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 81.891.796,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 10-12-2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 10 DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 26.443.969,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 01/08/2023		AÑO 2023													
											MES 1 JUL 2023		MES 2 AGOSTO 2023		MES 3 SEPTIEMBRE 2023		MES 4 OCTUBRE 2023		MES 5 NOVEIMBRE 2023		MES 6 DICIEMBRE 2023		TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1		**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**																						
1,1	1	Director de Interventoría	$ 2.100.000		1,50	$ 3.150.000,00			1,50	$ 3.150.000	0	$ -	0,5	$ 1.050.000,00	0,5	$ 1.050.000,00	0,5	$ 1.050.000,00	0,5	$ 1.050.000,00	0,25	$ 525.000,00	**2,25**	**$ 4.725.000**
1,2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.000.000		3,00	$ 6.000.000,00			3,00	$ 6.000.000	0	$ -	1	$ 2.000.000,00	1	$ 2.000.000,00	1	$ 2.000.000,00	1	$ 2.000.000,00	0,33	$ 660.000,00	**4,33**	**$ 8.660.000**
1,3	1	Especialista Ambiental	$ 2.500.000		0,60	$ 1.500.000,00			0,60	$ 1.500.000	0	$ -	0,2	$ 500.000,00	0,2	$ 500.000,00	0,2	$ 500.000,00	0,2	$ 500.000,00	0,1	$ 250.000,00	**0,90**	**$ 2.250.000**
1,4	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 3.000.000		0,90	$ 2.700.000,00			0,90	$ 2.700.000	0	$ -	0,3	$ 900.000,00	0,3	$ 900.000,00	0,3	$ 900.000,00	0,3	$ 900.000,00	0,15	$ 450.000,00	**1,35**	**$ 4.050.000**
1,5	1	Profesional Social	$ 2.000.000		0,60	$ 1.200.000,00			0,60	$ 1.200.000	0	$ -	0,2	$ 400.000,00	0,2	$ 400.000,00	0,2	$ 400.000,00	0,2	$ 400.000,00	0,1	$ 200.000,00	**0,90**	**$ 1.800.000**
2		**PERSONAL ADMINISTRATIVO**				$ -																		
2,1	1	Secretaria	$ 1.160.000		3,00	$ 3.480.000,00			3,00	$ 3.480.000	0	$ -	1	$ 1.160.000,00	1	$ 1.160.000,00	1	$ 1.160.000,00	1	$ 1.160.000,00	0,33	$ 382.800,00	**4,33**	**$ 5.022.800**
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 18.030.000,00**				**$ 18.030.000,00**	**$**	**-**	**$**	**6.010.000,00**	**$**	**6.010.000,00**	**$**	**6.010.000,00**	**$**	**6.010.000,00**	**$**	**2.467.800,00**	**$**	**26.507.800**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**1,80**				**1,80**		**1,8**	**$**	**1,80**		**1,8**		**1,8**		**1,8**		**1,8**		**1,8**
		TOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 32.454.000,00**				**$ 32.454.000,00**	**$**	**-**	**$**	**10.818.000,00**	**$**	**10.818.000,00**	**$**	**10.818.000,00**	**$**	**10.818.000,00**	**$**	**4.442.040,00**	**$**	**47.714.040,00**

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2023													
											MES 1 JUL 2023		MES 2 AGOSTO 2023		MES 3 SEPTIEMBRE 2023		MES 4 OCTUBRE 2023		MES 5 NOVEIMBRE 2023		MES 6 DICIEMBRE 2023		TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR					H-M	VALOR
3		**OTROS COSTOS DIRECTOS**																						
3,1		**VIATICOS**																						
3,1,1	1	Especialistas, director y residentes	$ 90.000	DIA	6,00	$ 540.000,00			6,00	$ 540.000,00	0	$ -	1	$ 90.000,00	3	$ 270.000,00	2	$ 180.000,00	3,00	$ 270.000,00	2	$ 180.000,00	**11,00**	**$ 990.000,00**
4	1	**COSTOS ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA**																						
4,1	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 1.800.000	MES	3,00	$ 5.400.000,00			3,00	$ 5.400.000,00	0	$ -	1	$ 1.800.000,00	1	$ 1.800.000,00	1	$ 1.800.000,00	1,00	$ 1.800.000,00	0,33	$ 594.000,00	**4,33**	**$ 7.794.000,00**
4,2	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 400.000	MES	3,00	$ 1.200.000,00			3,00	$ 1.200.000,00	0	$ -	1	$ 400.000,00	1	$ 400.000,00	1	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00	0,33	$ 132.000,00	**4,33**	**$ 1.732.000,00**
5		**OTROS COSTOS**																						
5,1	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	$ 400.000	MES	3,00	$ 1.200.000,00			0,00	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -					**0,00**	**$ -**
5,2	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	$ 100.000	MES	3,00	$ 300.000,00			3,00	$ 300.000,00	0	$ -	1	$ 100.000,00	1	$ 100.000,00	1	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	0,33	$ 33.000,00	**4,33**	**$ 433.000,00**
5,3	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo,internet, etc.)	$ 100.000	MES	3,00	$ 300.000,00			3,00	$ 300.000,00	0	$ -	1	$ 100.000,00	1	$ 100.000,00	2	$ 200.000,00	2,00	$ 200.000,00	0,33	$ 33.000,00	**6,33**	**$ 633.000,00**
5,4	1	Veeduría Comunitaria (Pago Según Comprobante)	$ 70.000	MES	3,00	$ 210.000,00			3,00	$ 210.000,00	0	$ -	0	$ -	1	$ 70.000,00	2	$ 140.000,00	1,00	$ 70.000,00	1,13	$ 79.100,00	**5,13**	**$ 359.100,00**
N1	1	**Trabajos de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)**	$ 1.990.813	MES					1,00	$ 1.990.813,00			0,5	$ 995.406,50	0,5	$ 995.406,50	1	$ 1.990.813,00	1,00	$ 1.990.813,00	0,33	$ 656.968,00	**3,33**	**$ 6.629.407,00**
N2	1	**Ensayos de Laboratorios**	$ 400.000	Según Componente por mes					3,00	$ 1.200.000,00			1	$ 400.000,00	1	$ 400.000,00	2	$ 800.000,00	2,00	$ 800.000,00	0,33	$ 132.000,00	**6,33**	**$ 2.532.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación																						
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																				$ 88,00		
		Sub Total de Costos Directos				**$ 9.150.000,00**				**$ 11.140.813,00**	**$**	**-**	**$**	**3.885.406,50**	**$**	**4.135.406,50**	**$**	**5.610.813,00**	**$**	**5.630.813,00**	**$**	**1.840.156,00**		**$ 21.102.595,00**
*		**Provisión Frente Adicional**				**$ 4.990.813,00**				**$ 3.000.000,00**														
*		**Valor total básico**				**$ 46.594.813,00**				**$ 46.594.813,00**	**$**	**-**	**$**	**14.703.406,50**	**$**	**14.953.406,50**	**$**	**16.428.813,00**	**$**	**16.448.813,00**	**$**	**6.282.196,00**		**$ 68.816.635,00**
*		**IVA**				**$ 8.853.014,00**				**$ 8.853.014,00**	**$**	**-**	**$**	**2.793.647,00**	**$**	**2.841.147,00**	**$**	**3.121.474,00**	**$**	**3.125.274,00**	**$**	**1.193.617,00**		**$ 13.075.161,00**
*		**Valor total**				**$ 55.447.827,00**				**$ 55.447.827,00**	**$**	**-**	**$**	**17.497.053,50**	**$**	**17.794.553,50**	**$**	**19.550.287,00**	**$**	**19.574.087,00**	**$**	**7.475.813,00**		**$ 81.891.796,00**
*																								
*																								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
MAYORES CANTIDADES DE PERSONAL Y EQUIPOS A RAZON DE PRORROGA Nro 1 DEL CONTRATO DE OBRA APROBADO POR MUNICIPIO E INTERVENTORIA PARA CUMPLIR A FELIZ TERMINO EL PLAZO DEL CONTRATO

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre:BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 22202-263547

Firma:
Nombre: Néstor Lemus Villadiego
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202097095 COR
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Contratista finalizo actividades estipuladas dentro del contrato de obra, cumpliendo cada uno de los requerimientos técnicos especificados dentro de los diseños y todas aquellas recomendaciones realizadas por esta interventoría. Se construyeron aproximadamente 820 ML de Placa Huella y la estructura de Box Culvert, la cual quedo situada dentro del K1+000.

Recomendaciones

- Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y los alineamientos establecidos en la guía de INVIAS.

8. ANEXOS.

Los formatos MEPI del informe de interventoría se anexan en archivo adjunto al presente documento.

Los siguientes documentos se anexan en el cuerpo del presente informe, en el siguiente orden

8.1 RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el periodo correspondiente entre el 01 y el 30 de noviembre de 2023

8.1.1 correspondencia enviada

CORRESPONDENCIA ENVIADA-					
No. Consecutivo	Fecha del documento	Enviado a:	Asunto	Radicado INVIAS	Fecha del radicado
OFI-IC-012-23	09/10/2023	Consorcio Rural Momil 2023	Reiteración de Subsanación de Diseño de pavimento y estudios entregados		
OFI-IC-013-23	11/10/2023	Consorcio Rural Momil 2023	Reiteración de Instalación Valla Informativa		
OFI-IC-014-23	12/10/2023	Consorcio Rural Momil 2023	Aval de Prorroga Nro. 1 Contrato de Obra MMO-LP-OP-01-2023		
OFI-IC-015-23	12/10/2023	Consorcio Rural Momil 2023	Aprobación PAGA Versión 2		
OFI-IC-016-23	20/10/2023	Consorcio Rural Momil 2023	Solicitud Seguridad Social y Resultados de Laboratorios Septiembre.		

OFI-17-23	27/10/2023	Ellen Aicardy Galeano-INVIAS	Solicitud de Prorroga 1 y Adición 1 a Contrato de Interventoría 1826-2023		

8.1.2 correspondencia recibida


CORRESPONDENCIA RECIBIDA					
No. Consecutivo	Fecha del documento	Enviado a:	Asunto	Radicado INVIAS	Fecha del radicado
OFICIO 008	05/09/2023	IC INGENIO CIVIL S.A.S.	Actas de Vecindad		
OFICIO 010	05/09/2023	IC INGENIO CIVIL S.A.S.	Renuncio a Anticipo		
OFICIO 011	06/09/2023	IC INGENIO CIVIL S.A.S.	Actas de Entorno		
OFICIO 012	06/09/2023	IC INGENIO CIVL S.A.S.	Entrega de Apus		
OFICIO 013	07/09/2023	IC INGENIO CIVIL S.A.S.	PAGA Versión Nro. 2		
OFICIO-014	26/09/2023	IC INGENIO CIVIL S.A.S.	ACTA PARCIAL Nro:1		
OFICIO 015	11/10/2023	IC INGENIO CIVIL S.A.S.	Solicitud de Prorroga		
OFICIO 016	11/10/2023	IC INGENIO CIVIL S.A.S.	Solicitud Comité Virtual		

8.2 Registro fotográfico avance de obra

FOTO 01: Instalación formaleta estructura Box Culvert	FOTO 02: Fundida concreto clase C – Box Culvert
	
FUENTE: IC INGENIO CIVIL S.A.S.	*FUENTE: IC INGENIO CIVIL S.A.S.*
FOTO 03: Estructura Placa Huella	FOTO 04: Instalación formaletas para concreto ciclópeo
	
FUENTE: IC INGENIO CIVIL S.A.S.	*FUENTE: IC INGENIO CIVIL S.A.S.*

FOTO 05: Fundida Concreto Ciclópeo separadores	FOTO 06: Fundida Concreto clase D - Cunetas
	
FUENTE: IC INGENIO CIVIL S.A.S.	*FUENTE: IC INGENIO CIVIL S.A.S.*
FOTO 07: Instalación acero de refuerzo cunetas	FOTO 08: Fundida Concreto clase D - Cunetas.
	
FUENTE: IC INGENIO CIVIL S.A.S.	*FUENTE: IC INGENIO CIVIL S.A.S.*

FOTO 09: Fundida Concreto clase D – Cunetas - Bordillos.	FOTO 10: Fundida Concreto clase D – Cunetas - Bordillos.
	
FUENTE: IC INGENIO CIVIL S.A.S.	*FUENTE: IC INGENIO CIVIL S.A.S.*
FOTO 11: Fundida Concreto clase D – Rampa de acceso tramo final.	FOTO 12: Fundida Concreto clase D – Losa de acceso a placa huella
	
FUENTE: IC INGENIO CIVIL S.A.S.	*FUENTE: IC INGENIO CIVIL S.A.S.*

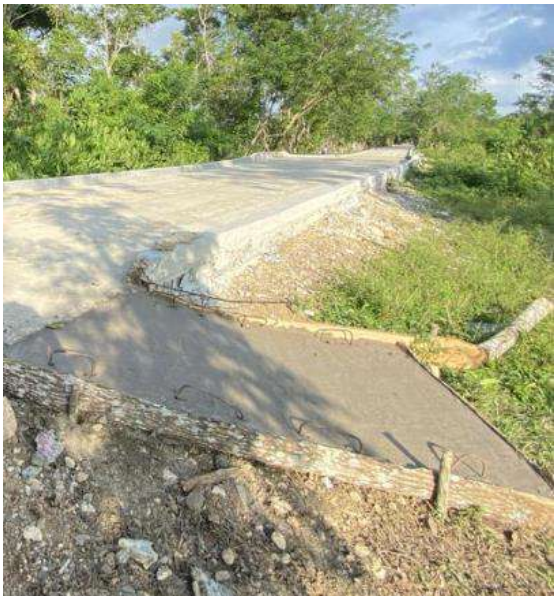FOTO 13: Fundida concreto clase D - Descoles	FOTO 14: Relleno espaldar de cunetas
	
FUENTE: IC INGENIO CIVIL S.A.S.	*FUENTE: IC INGENIO CIVIL S.A.S.*
FOTO 15: Fundida Concreto clase D – Losa de acceso a placa huella	FOTO 16: Estructura de Box Culvert
	
FUENTE: IC INGENIO CIVIL S.A.S.	*FUENTE: IC INGENIO CIVIL S.A.S.*

8.3 Bitácora de obra

01 de noviembre de 2023 (Miercoles)

Estado del tiempo: Lluvias moderadas

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:


* Nivel de topografia * Mezcladoras. * Minicargador * Vibiador de concreto * Herramientas menores.


Estado de avance

* Instalación formaleta losa superior Box Culvert
* Excavación manual vigas y wheras en el K0+300 al K0+200

Anotaciones especiales:

Ninguna



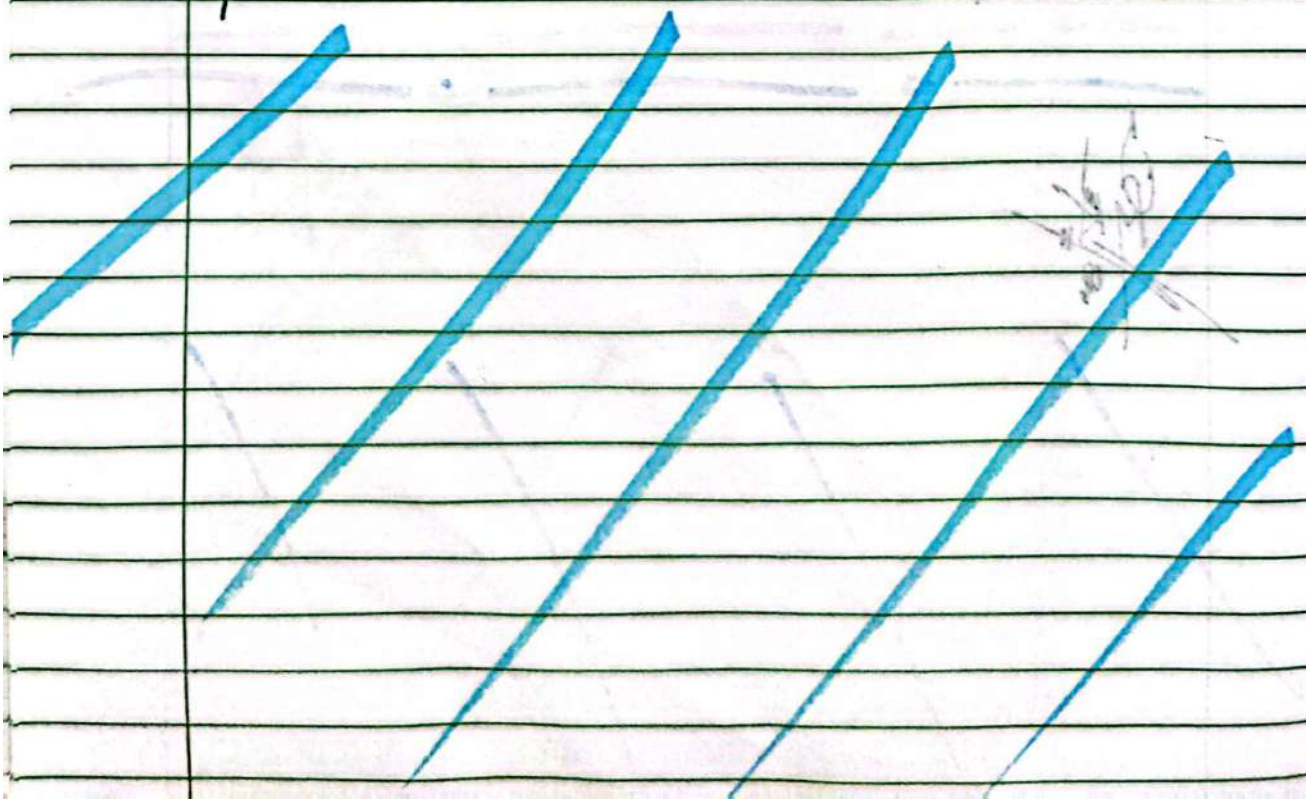

Powered by CamScanner

02 de noviembre de 2023 (Jueves)

Estado del tiempo: Seco

Recurso humano:

* Equipo administrativo 10 * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:


* Nivel de topografia * Mezcladoras * Minicargador * Vibrador de concreto * Herramientas menores.

Estado de avance:

* Instalación acero de refuerzo segun diseños en estructura de Box Culvert.
* Instalación formaleta losa superior Box Culvert

Anotaciones especiales

Ninguna



Powered by CamScanner

03 de noviembre de 2023 (Viernes)

Estado del tiempo: Lluvias moderadas

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:


* Nivel de topografia * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto * Herramientas menores.

Estado de avance:

* Fundida concreto Clase C en losa superior de estructura de Box Culvert.

Anotaciones especiales:

Ninguna.



Powered by CamScanner

04 de noviembre de 2023 (Sabado)

Estado del tiempo: Seco

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:


* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores.

Estado de avance:

* Curado losa superior de estructura de Box Culvert.
* Acarreo interno de material

Anotaciones especiales

Ninguna



Powered by CamScanner

05 de noviembre de 2023 (Domingo)


Estado del tiempo: Lluvias moderadas

Recurso humano:
Ninguno

Equipos y/o maquinaria:
Ninguno

Estado de avance:
Día no laboral.

Anotaciones especiales:
Ninguno.



Powered by CamScanner

06 de noviembre de 2023 (Lunes)

Estado del tiempo: Seco

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10.

Equipos y/o maquinaria:


* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores

Estado de avance:

* Fundida de bordillo en concreto clase D en K0+470 al K0+300

Anotaciones especiales

Ninguna.



Powered by CamScanner

07 de noviembre de 2023 (Martes)

Estado del tiempo: Lluvia moderada

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10.

Equipos y/o maquinaria.

* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores

Estado de avance:

* Instalación formaleta para estructura de placa huella en K0+200 al K0+000 carril izquierdo y derecho.
* Fundida concreto clase D para bordillos en K0+470 al K0+300 carril izquierdo.
* Fundida concreto clase C para bordillos en estructura de Box Culvert.
* Fundida concreto ciclopeo - separadores en tramo K0+120 al K0+013.4 carril derecho.

Anotaciones especiales:

Ninguna

Powered by CamScanner

08 de noviembre de 2023 (Miercoles).

Estado del tiempo: Seco

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10.

Equipos y/o maquinaria

* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores.

Estado de avance:

* Fundida en concreto ciclopeo - separadores en tramo K0+120 al K0+013.4 carril izquierdo.
* Fundida cuneta en concreto clase D en tramo K0+120 al K0+060 carril derecho
* Excavación manual cunetas en K0+120 al K0+013.4 en ambos carriles.
* Fundida concreto clase D para bordillos en el tramo K0+300 al K0+220 carril derecho e izquierdo.

Anotaciones especiales.

Ninguna.



Powered by CamScanner

09 de noviembre de 2023 (Jueves)

Estado del tiempo: Seco

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:


* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores.

Estado de avance:

* Fundida concreto clase D para bordillo en el tramo Km 300 al Km 220 en ambos carriles

Anotaciones especiales

Ninguna



Powered by CamScanner

10 de noviembre de 2023 (Viernes)

Estado del tiempo: Seco

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria


* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores.

Estado de avance:

* Fundida concreto clase 0 - cunetas en el tramo K0+120 al K0+060 carril izquierdo.

Anotaciones especiales

Ninguna.

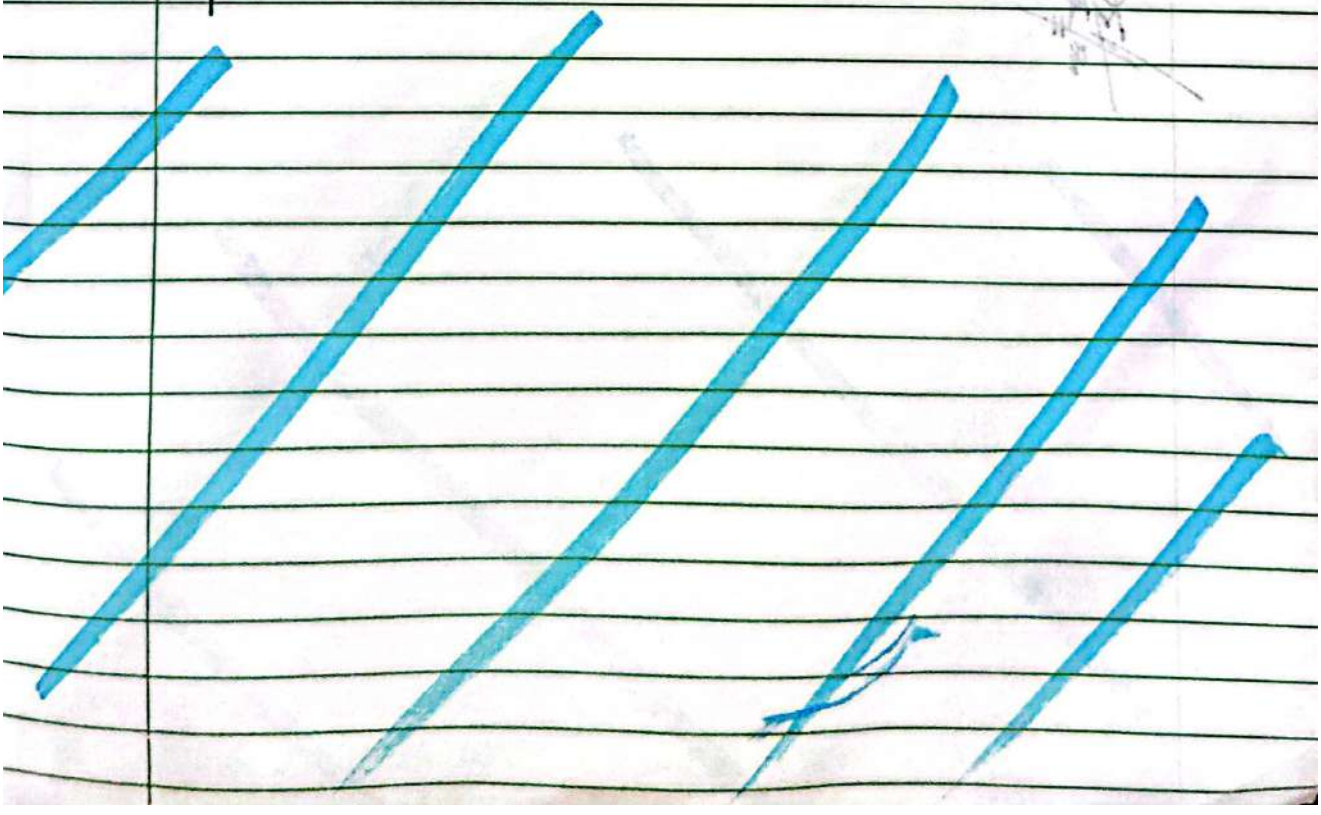

Powered by CamScanner

11 de noviembre de 2023 (Sabado)

Estado del tiempo: Lluvias moderadas

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10.

Equipos y/o maquinaria:


* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores.

Estado de avance:

* Fundida concreto ciclopeo - se paradores en el tramo K0+060 al K0+3.4 carril izquierdo.
* Fundida concreto clase D - Vigas riostras en el tramo K0+300 al K0+200.

Anotaciones especiales

Ninguna.



Powered by CamScanner

12 de noviembre de 2023 (Domingo)


Estado del tiempo: Seco

Recurso humano:
Ninguno

Equipos y/o maquinaria:
Ninguno

Estado de avance:
Día no laboral.

Anotaciones especiales:
Ninguno.



Powered by CamScanner

13 de noviembre de 2023 (Lunes)

Estado del tiempo: Lluvias moderadas

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros=10

Equipos y/o maquinaria:


* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores

Estado de avance:

* Excavación manual para vigas riostras y bordillos-cunetas.
* Fundida concreto clase D para bordillos en K0+220 al K0+180 carril izquierdo.

Anotaciones especiales

Ninguna.



Powered by CamScanner

14 de noviembre de 2023 (Martes)

Estado del avance: Lluvias moderadas

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:

* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto.
* Herramientas menores.

Estado de avance:

* Figuración y corte de acero de refuerzo segun diseño para estructura de placa huella - Cunetas, Vigas riostras.
* Fundida concreto clase D- Bordillos en K0+220 al K0+180 carril derecho.

Anotaciones especiales

Ninguna.



Powered by CamScanner

15 de noviembre de 2023 (Miercoles)

Estado del tiempo: Seco

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:


* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto * Herramientas menores.

Estado de avance:

* Fundida concreto clase D – Bordillos en Km 180 al Km 120 carril izquierdo.
* Fundida concreto ciclopeo – separadores en el tramo Km 060 al Km 013.4 carril izquierdo

Anotaciones especiales.

Ninguna



Powered by CamScanner

16 de noviembre de 2023 (Jueves)

Estado del tiempo: Lluvias moderadas

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:


* Nivel de Topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores

Estado de avance:

* Fundida concreto clase D - Cunetas en el tramo K0+060 al K0+010 carril izquierdo.
* Fundida concreto clase D - Vigas riostras en el K0+200 al K0+100.

Anotaciones especiales

Ninguna



Powered by CamScanner

17 de noviembre de 2023 (Viernes)

Estado del tiempo: Lluvia moderada

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:

* Nivel de topografía * Mini cargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores.

Estado de avance:

* Fundida concreto clase D - Bordillos en el tramo K0+120 al K0+060 carril izquierdo.
* Excavación manual para vigas riostras en el K0+100 al K0+010.

Anotaciones especiales

Ninguna.



18 de noviembre de 2023 (sabado)

Estado del tiempo: Lluvia moderada

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:


* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto * Herramientas menores

Estado de avance:

* Fundida concreto clase D - Vigas riostras en el tramo Km1+100 al Km1+110.

Anotaciones especiales

Ninguna.



Powered by CamScanner

19 de noviembre de 2023 (Domingo)

Estado del tiempo: Lluvia moderada

Recurso humano:

Ninguno.

Equipos y/o maquinaria:

Ninguno

Estado de avance

Día no laboral

Anotaciones especiales:

Ninguna



Powered by CamScanner

20 de noviembre de 2023 (Lunes)

Estado del tiempo: Lluvia moderada

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:

*Nivel de topografía *Minicargador * Mezcladoras *Vibrador de concreto


*Herramientas menores.

Estado de avance:

* Fundida concreto clase D - Bordillos en el tramo K0+120 al K0+010 carril derecho

Anotaciones especiales:

Ninguna



Powered by CamScanner

21 de noviembre de 2023 (Martes)

Estado del tiempo: Lluvia moderada

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:


* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores.

Estado de avance:

* Fundida concreto clase D – Bordillos en el tramo K0+080 al K0+010 carril derecho.

Anotaciones especiales

Ninguna

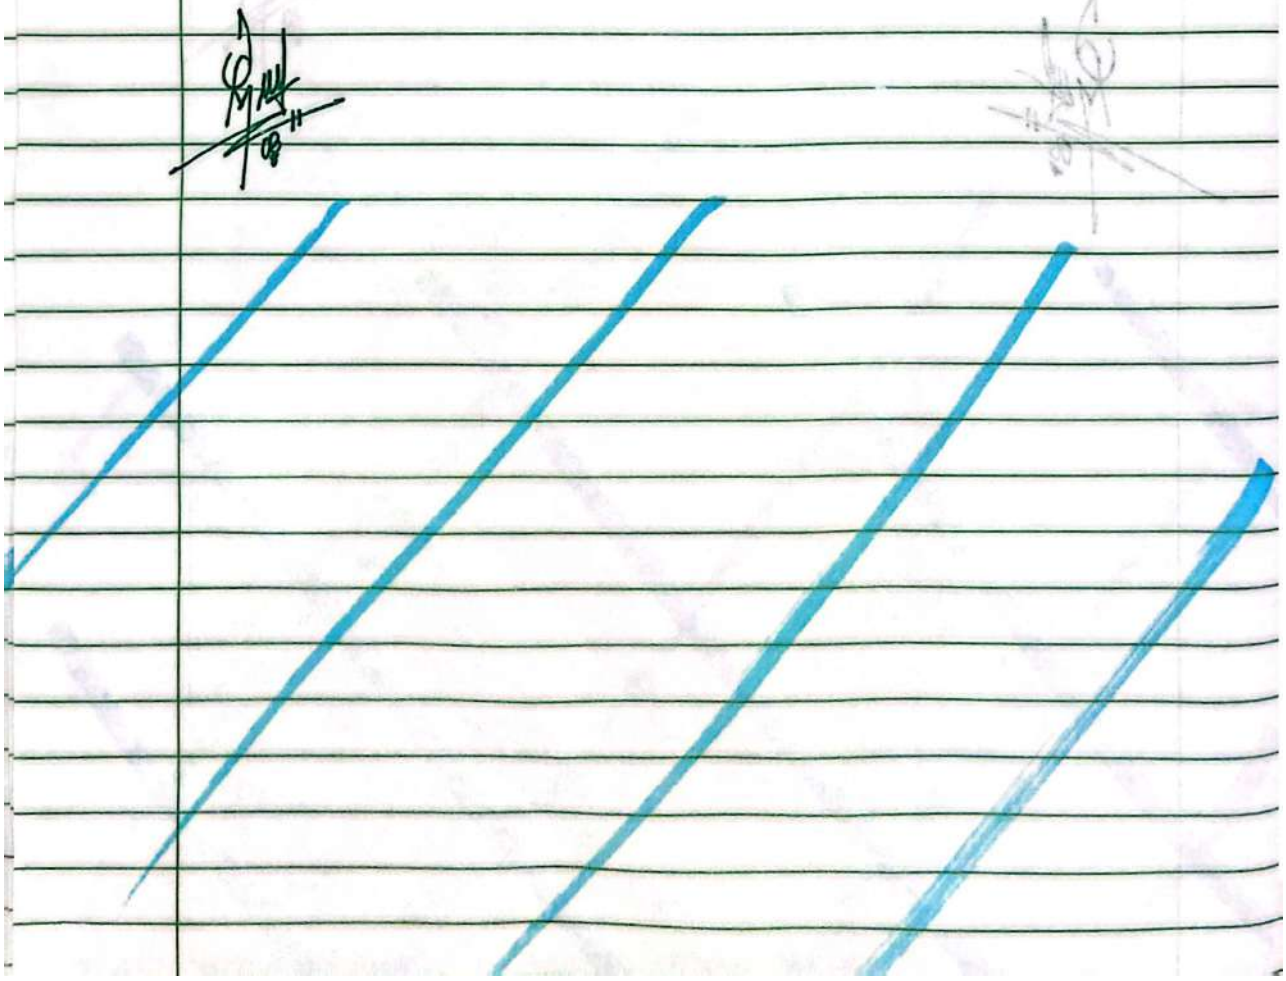

Powered by CamScanner

22 de noviembre de 2023 (Miercoles)

Estado del tiempo: Seco

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:

* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores.

Estado de avance:

* Fundida concreto clase D - Bordillos en el tramo K0+060 al K0+030 - Carril izquierdo.

Anotaciones especiales.

Ninguna.



Powered by CamScanner

23 de noviembre de 2023 (Jueves)

Estado del tiempo: Lluvia moderada

Recurso humano:

*Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:


* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores


Estado de avance:

Fundida concreto clase D= Bordillo en el tramo K0+040 al K0+010 carril izquierdo.

Anotaciones especiales.

Ninguna.





Powered by CamScanner

24 de noviembre de 2023 (Viernes)

Estado del tiempo: Seco

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:


* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores.

Estado de avance:

* Figuración y corte de acero de refuerzo segun diseño para estructura de losa de aproximación inicial y final de estructura de placa huella.

Anotaciones especiales:

Ninguna.

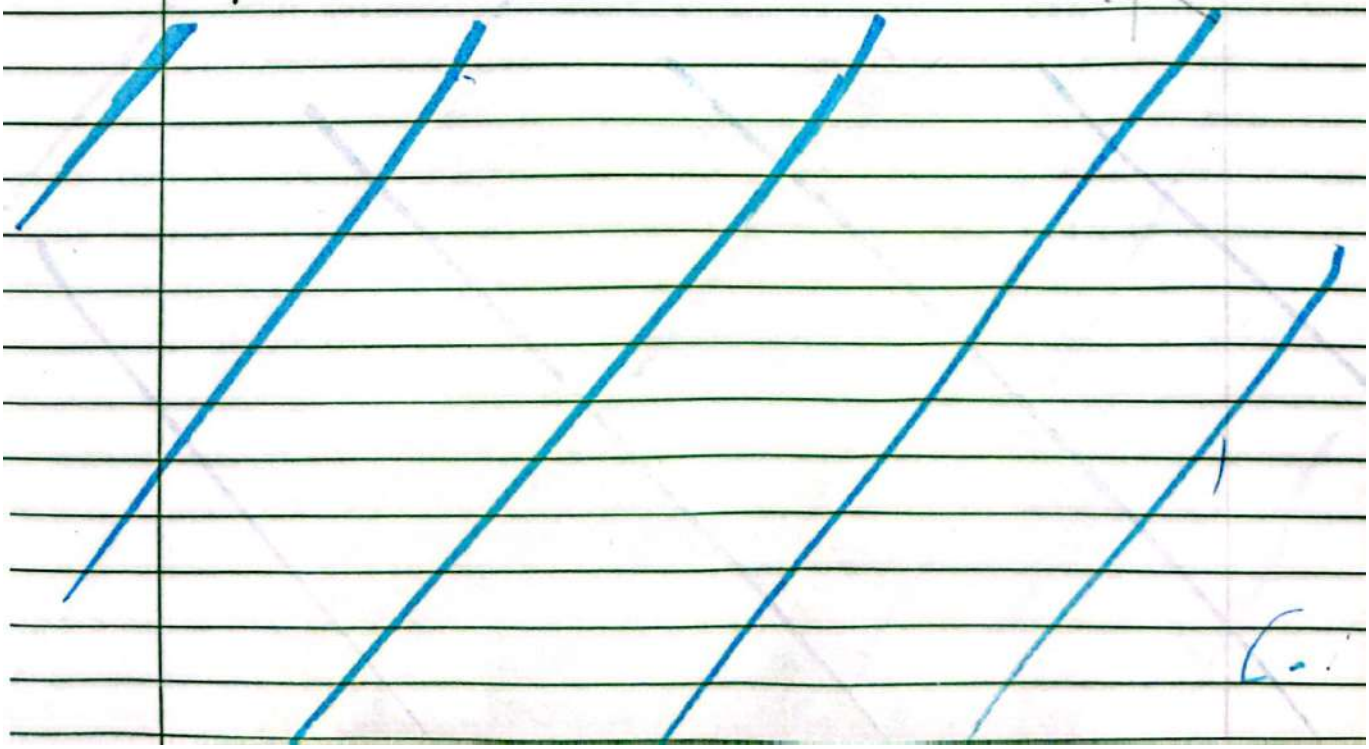

Powered by CamScanner

25 de noviembre de 2023 (Sabado)

Estado del tiempo: Seco

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:


* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores.

Estado de avance:

* Fundida de losa de aproximación final K0+820. en concreto clase D.
* Fundida de losa de aproximación inicial K0+000 en concreto clase D.

Anotaciones especiales

Ninguna.



Powered by CamScanner

26 de noviembre de 2023 (Domingo)

Estado del tiempo: Seco


Recurso humano:
Ninguno

Equipos y/o maquinaria:
* Nivel de topografia * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores.

Estado de avance:
Día no laboral.

Anotaciones especiales:
Ninguna.



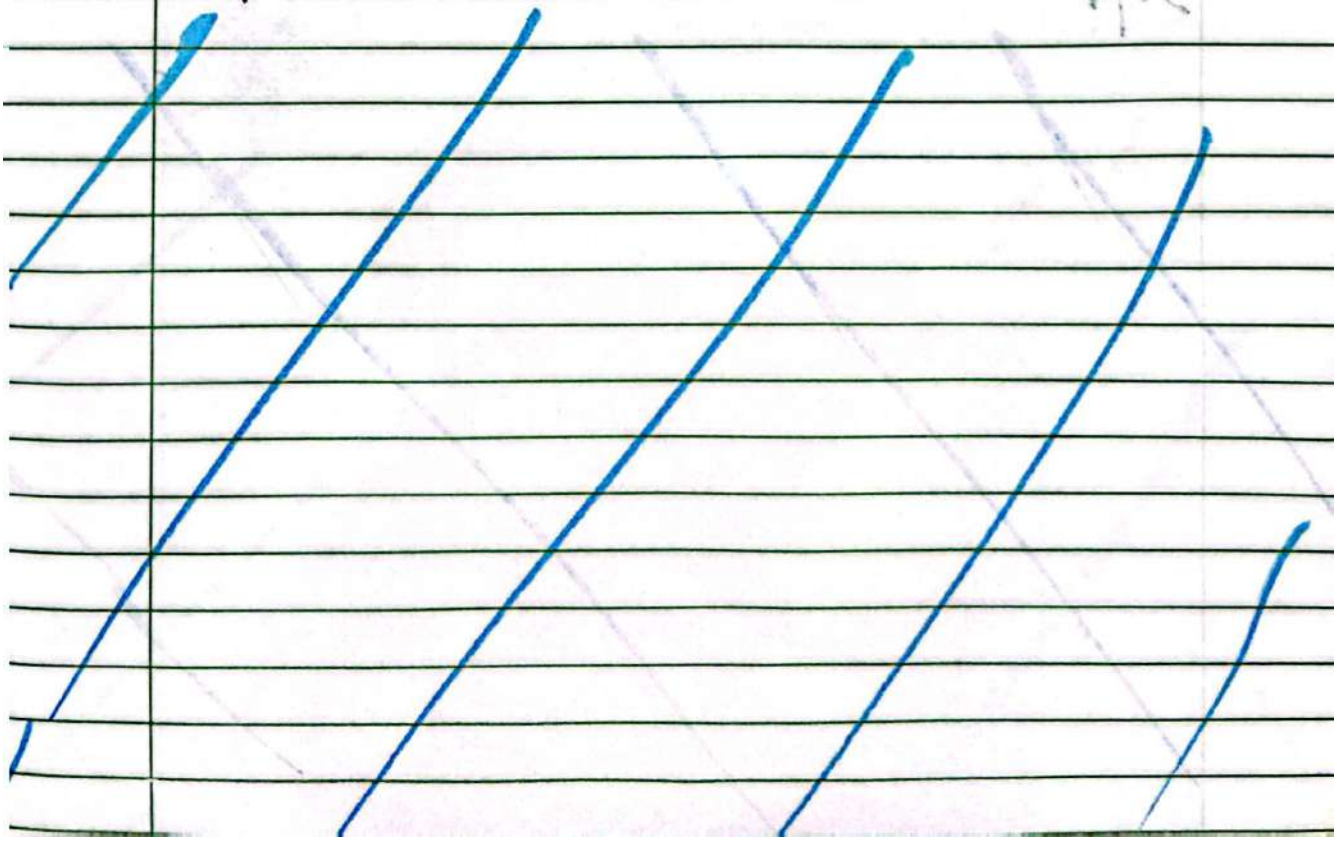

Powered by CamScanner

27 de noviembre de 2023 (Lunes)

Estado del tiempo: Seco

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria

* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores. * Compactador * Vibro compactador

Estado de avance:

* Fundida losa de apioximacion en K0+000 carril izquierdo
* Fundida concreto clase D - Descoles
* Delleno compactado con material de afirmado para espaldar cunetas.

Anotaciones especiales

Ninguna



Powered by CamScanner

28 de noviembre de 2023 (Martes)

Estado del tiempo: Seco

Recurso humano:
* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria
* Nivel de topografía * Minicargador * Mezcladoras * Vibrador de concreto
* Herramientas menores. * Compactador. * Vibrocompactador

Estado de avance:
* Fundida concreto clase D - Descoles
* Relleno espaldar cunetas en material de afirmado compactado
* Relleno compactado con material de recebo en zona de estructura de Box Culvert.

Anotaciones especiales:
Ninguna.



Powered by CamScanner

29 de noviembre de 2023 (Miercoles)

Estado del tiempo: Seco

Recurso humano.

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:

* Herramientas menores * Minicargador * Vibrador de concreto
* Herramientas menores * Compactador. * Vibrocompactador
* Mezcladoras

Estado de avance

* Fundida de bordillos en concreto clase D en el tramo K0+000.
* Relleno compactado con material de afirmado para espaldar de cunetas.
* Instalación de señalización vial.
* Relleno compactado con material de recebo en area de estructura de Box Culvert.

Anotaciones especiales

* Se realizo caracterización vial.

30 de noviembre de 2023

Estado del tiempo: Seco

Recurso humano:

* Equipo administrativo * Obreros = 10

Equipos y/o maquinaria:


* Herramientas menores * Minicargador * Compactador
* Herramientas menores.

Estado de avance.

* Instalación señalización vial.
* Relleno con material de afirmado para espaldar de cunetas.

Anotaciones especiales:

* CONTRATISTA finaliza actividades contractuales, contemplados dentro de la ultima modificación de cantidades realizada para garantizar una mayor estabilidad y durabilidad de las estructuras construidas



Powered by CamScanner

8.4 SOPORTES DE FORMATOS.

I. SOPORTES 4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES CONTRATO DE OBRA

N/A

II. SOPORTES 4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

N/A

III. SOPORTES 4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO -OBRA

N/A

IV. SOPORTES 4.7 ENSAYOS DE LABORATORIO-INTERVENTORIA

GEOMATD INGENIERIA S.A.S



RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INVIAS - E- 410 -

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL, SEGUNDA ETAPA, EN VIRTUD AL CONVENIO 1135 DE 2021**	
PETICIONARIO:	IC INGENIO CIVIL S.A.S.	901059315-8

ESTRUCTURA	*PESO*	*DIAMETRO*	*ALTURA*	*MUESTRA*	*FECHA DE TOMA*	*EDAD*	*FECHA DE ENSAYO*	*AREA*	*CARGA*	*RESISTENCIAS*			*%*	*OBSERVACION*
										OBTENIDAS		*REQ.*	*OBT.*	
	Kg	*Cm*	*Cm*	*Nº*	*d / m / a*	*Dias*	*D / M / A*	*cm2*	*KN*	*Kg/cm2*	*PSI*	*PSI*		
LOSA BOX CULVERT	12,342	15,1	30,1	7	19-oct-23	*7*	*26-oct-23*	179,08	382,4	213,5	3050	300	76	Box Culvert
BERMA-CUNETA / BORDILLO	12,382	15,1	30,1	8	25-oct-23	*7*	*1-nov-23*	179,08	298,9	170,2	2421	3000	81	K0+360 al K0+240
CICLOPEO	12,410	15,0	30,2	**3**	11-oct-23	*14*	*25-oct-23*	176,72	340,2	196,4	2793	3000	93	K0+240 al K0+180
PLACA HUELLA	12,520	15,3	30,2	**4**	12-oct-23	*14*	*26-oct-23*	183,85	348,1	189,3	2705	3000	90	K0+240 al K0+180
CICLOPEO	12,402	15,2	30,3	1	7-oct-23	*28*	*4-nov-23*	181,46	378,2	212,6	3024	3000	101	K0+310 al K0+250
BERMA-CUNETA / BORDILLO	12,341	15,2	30,3	6	14-oct-23	*7*	*21-oct-23*	181,46	298,2	167,6	2384	3000	79	K0+360 al K0+290
PLACA HUELLA	12,535	15,1	30,1	**2**	9-oct-23	*28*	*6-nov-23*	179,08	383,5	218,4	3107	3000	104	K0+240 al K0+180
BERMA-CUNETA / BORDILLO	12,415	15,1	30,4	9	26-oct-23	*14*	*9-nov-23*	179,08	353,0	201,1	2860	3000	95	K0+290 al K0+180
PLACA HUELLA	12,409	15,0	30,1	**5**	12-oct-23	*28*	*9-nov-23*	176,72	391,4	225,9	3213	3000	107	K0+240 al K0+180

OBSERVACIONES : _____

REALIZADO POR:

Daniel J. Almanza M.

ING. DANIEL JOSE ALMANZA MERCADO
T.P. 22202-339020COR

LOS RESULTADOS PRESENTES EN ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL Y SELLO

CRA 13 A No 22 C 36 BARRIO DE MAYO, GEOMATDINGENIERIASAS@GMAIL.COM, CEL. 3012549445 - 3122668540

V. SOPORTES 6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017362878

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HSL102	RENAULT	DUSTER	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	GRIS COMET	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	507 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
E412C142905	N	9FBHSR5B6KM633382

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FBHSR5B6KM633382	N	9FBHSR5B6KM633382	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MEDRANO CONTRERAS DORY LUZ	C.C. 64548637

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

ELINDAJE
****

POTENCIA HP
143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
PV0003201801532

I/E
I

FECHA IMPORT.
17/09/2018

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRÍCULA
05/12/2018

FECHA EXP. LIC. TTO.
05/12/2018

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INS MCPAL DE TYTO DE COROZAL

LT03003266104

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2022-12-26	2022-12-27	2023-12-26

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3308004994795000	HSL102	CAMPEROS O CAMIONET	PARTICULAR	1998	2019

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
5	RENAULT	DUSTER	WAGON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
E412C142905	9FBHSR5B6KM633382	9FBHSR5B6KM633382	0.51

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MEDRANO CONTRERAS, DORY LUZ	3012537507	CC	64548637	SINCELEJO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	33	999912190	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 512200	$ 266300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 780600

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VI. SOPORTES 6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES CONTRATO DE INTERVENTORIA.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901701928	6	IC INGENIOS CIVIL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	1MERA OBRA	kr 10 - 12	SINCELEJO-SUCRE	3014806359	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	310537195	9459833987	E	2023/12/07	2023/12/01	BANCOLOMBIA	0	$1,337,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1102840741	OTALVAREZ LLORENTE BERNARDO JOSE																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF41	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	1102867608	PINO BETTIN YORCELIS																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF41	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1102835194	RODRIGUEZ MEDRANO ORLANDO DAVID																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total	**Afiliados(3)**																						$4,320,000	$691,200			$4,320,000	$172,800			$4,320,000	$172,800			$4,320,000	$300,800		$0	$0		$1,337,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901701928	6	IC INGENIOS CIVIL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	1MERA OBRA	kr 10 - 12	SINCELEJO-SUCRE	3014806359	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	310537195	9459833987	E	2023/12/07	2023/12/01	BANCOLOMBIA	0	$1,337,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$691,200	$0	$0	$691,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$300,800	$0	$0	$300,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$300,800	$0	$0	$300,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$172,800	$0	$0	$172,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	$172,800	$0	$0	$172,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$172,800	$0	$0	$172,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				**3**	**$1,337,600**	**$0**	**$0**	**$1,337,600**

VII. SOPORTES 6.4 GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101184166	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	10	2023	27	07	2023	00:00	10	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
IC INGENIO CIVIL S.A.S	NIT: 901.701.928-6	CL 18 NRO. 22 - 10 INT 404	YARUMAL, ANTIOQUIA	3014806359

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2	CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN ACEPTACION DE OFERTA No. 1826-2023 SICO No. 18178 REFERENTE A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA,

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/07/2023	10/06/2024	$8,189,179.60	$8,189,179.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/07/2023	10/12/2026	$16,378,359.20	$16,378,359.20
CALIDAD DEL SERVICIO	27/07/2023	10/12/2024	$8,189,179.60	$8,189,179.60

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA No. 1826-2023 SICO No. 18178 SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS Y SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******24,000.00	$ *******8,000.00	$ *******6,080.00	$ **********38,080.00	$ *******32,756,718.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101184166

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
