CONSORCIO INTER – HATO 2024

Yopal, 01 de julio de 2025

OFICIO HT - 023

Yopal, 2025/07/02 15:23:16
RAD: 20250106498
Empresa de energia de casanare S.A.E.S.P.
Enerca
correspondencia

Ingeniero
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Líder supervisor e interventoría
Oficina Jurídica
prof3.juridica@enerca.com.co

Asunto: Entrega de informes semanales 17, 18, 19 y 20

Ref.: Contrato de consultoría 377 de 2024 que tiene por objeto: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a nuestras actividades contractuales, muy respetuosamente realizamos la entrega de los informes semanales del contrato en referencia, de la siguiente manera:

N° INFORME SEMANAL	PERIODO	FOLIOS
17	Del 01/06/2025 al 07/06/2025	4
18	Del 08/06/2025 al 14/06/2025	4
19	Del 15/06/2025 al 21/06/2025	4
20	Del 22/06/2025 al 30/06/2025	4

Es de aclarar que las semanas reportadas van de acuerdo al flujo de caja semanal.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

AUDENAR FLOREZ SANABRIA
R/L CONSORCIO INTER-HATO 2024
Contrato de consultoría No 377 de 2024

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		9	6	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850123

INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

Semana Número:	17	Del:	1/06/2025	Al:	7/06/2025	No:	17

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 4 Meses y 6 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO TERRAZAS
Nombre del Interventor: CONSORCIO INTER-HATO 2024
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Nombre Apoyo a la Supervisión: VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y ÁREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE						
CONTRATO No	002 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO TERRAZAS				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y ÁREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123	No. C.D.P.	6625	No R.P.	6625
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123-SSF	RUBRO	2.3.2.01.01.001.03.14.47	No. C.D.P.	66	No R.P.	66
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.052.944.564,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de diciembre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA DE INICIO	1	$ 4.421.177.826	40%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 4.421.177.826	40%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	3,89%	43,63%	OBRA EJECUTADA (%)	4,99%	41,84%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 430.242.167,73	$ 4.822.175.597,19	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 551.215.385,00	$ 4.625.041.245,00

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		9	6	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

	PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2024005850123
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.**						
CONTRATO No	377 DE 2024	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-HATO 2024				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123	No. C.D.P.	3525	No R.P.	3525
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123-SSF	RUBRO	2.3.2.02.02.008.47	No. C.D.P.	128	No R.P.	142
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.109.406.405,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de enero de 2026	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	377 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.	FECHA	9	6	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

	PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2024005850123
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continùan excavaciones mecanicas en la vereda Santa Maria.
Se continúa con la instalación de tubería de 2" en la vereda San Nicolás y posterior relleno de las excavaciones.
Se continúa con la instalación de tubería de 1/2" en la vereda Santa Maria y casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en la urbanización los Alcaravanes y posterior relleno de las excavaciones.
Se continua con la istalación de tuberia de 3/4" en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en la urbanización los Alcaravanes y posterior relleno de las excavaciones.
Se continúa con las excavaciones manuales en material común en la vereda Santa Maria de Hato Corozal.
Se inician las excavaciones manuales en material conglomerado en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en la urbanización los Alcaravanes.
Se continúa con la instalación de tubería de 1" en la vereda Santa Maria y casco urbano del municipio de Paz de ariporo en la urbanización los Alcaravanes y posterior relleno de las excavaciones.
Se inicia con la instalación de conexiones domiciliarias el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en la urbanización los Alcaravanes.
Cabe resaltar que las anteriores actividades son realizadas bajo el acompañamiento constante de la interventoría, desarrolladas bajo las normativas NTC 2505 instalaciones para suministro de gas destinadas a usos residenciales y comerciales, NTC 3728 gasoductos, líneas de transporte y redes de distribución de gas, ademas, de acuerdo al acto de gerencia No 219 del 12/09/2013 "manual de supervisión e interventoria de la empresa de energia de Casanare"

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción: Excavaciónes manuales en material conglomerado.



Descripción: Excavaciones mecánicas.

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta continuar excavaciones manuales y mecanicas en la vereda Santa Maria y con la instalaciòn de tuberia de 1", 1/2" y 3/4" en las veredas Santa Maria y San Nicolas y en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo; ademas, posterior relleno de las excavaciones.


CONTRATO No.:	377 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.	FECHA	9	6	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

	PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2024005850123
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

OBSERVACIONES

A la fecha de corte del presente informe semanal, se tiene un atraso del 1,78%, debido a las altas precipitaciones que se han presentado en las zonas de influencia.

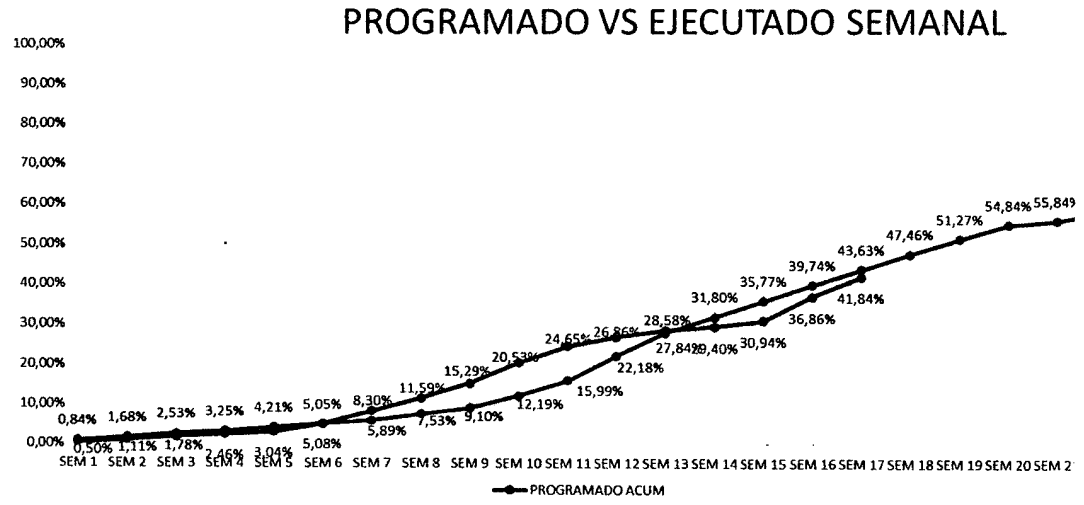

En constancia se firma.

Elaboró

CONSORCIO INTER-HATO 2024
R/L Audenar Florez Sanabria
INTERVENTOR

Revisó:

VICTOR MANUEL BERNAL LOREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Recibió:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

Enterado:

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		16	6	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850123

INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

Semana Número:	18	Del:	8/06/2025	Al:	14/06/2025	No:	18

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 4 Meses y 13 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO TERRAZAS
Nombre del Interventor: CONSORCIO INTER-HATO 2024
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Nombre Apoyo a la Supervisión: VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y ÁREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE							
CONTRATO No	002 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO TERRAZAS					
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y ÁREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123	No. C.D.P.	6625	No R.P.	6625	
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123-SSF	RUBRO	2.3.2.01.01.001.03.14.47	No. C.D.P.	66	No R.P.	66	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.052.944.564,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A					
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de diciembre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A			

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA DE INICIO	1	$ 4.421.177.826	40%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 4.421.177.826	40%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	3,84%	47,46%	OBRA EJECUTADA (%)	4,53%	46,37%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 423.893.898,48	$ 5.246.069.495,67	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 500.495.586,00	$ 5.125.536.831,00

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		16	6	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

		PROYECTO SGR	CODIGO BPIN: 2024005850123
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.**						
CONTRATO No	377 DE 2024	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-HATO 2024				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123	No. C.D.P.	3525	No R.P.	3525
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123-SSF	RUBRO	2.3.2.02.02.008.47	No. C.D.P.	128	No R.P.	142
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.109.406.405,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de enero de 2026	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ACTA PARCIAL N°1	ACTA N°2 PARCIAL N°1	2	$ 322.144.629	29,04%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 322.144.629	29,04%

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	377 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.	FECHA	16	6	2025


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

	PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2024005850123
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	


RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continùan excavaciones mecanicas en la vereda Santa Maria.
Se continúa con la instalación de tubería de 1/2" en la vereda Santa Maria y casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en la urbanización los Alcaravanes y posterior relleno de las excavaciones.
Se continua con la istalación de tuberia de 3/4" en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en la urbanización los Alcaravanes y posterior relleno de las excavaciones.
Se continúa con las excavaciones manuales en material común en la vereda Santa Maria de Hato Corozal.
Se continúa con las excavaciones manuales en material conglomerado en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en la urbanización los Alcaravanes.
Se continúa con la instalación de tubería de 1" en la vereda Santa Maria y casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en la urbanización los Alcaravanes y posterior relleno de las excavaciones.
Se realiza la instalación de una poliválvula de 1" en la vereda Santa Maria.
El dia 09 de junio de 2025, se firmó el acta parcial N°1 para el contrato de consultoria, con un valor a cobrar de $322.144.629, que corresponde al 29,04% del valor del contrato.
El dia 14 de junio de 2025, se realizó una reunión de socialización con la comunidad de la vereda Las Tapias del municipio de Hato Corozal, con el fin de dar a conocer el proyecto y tratar temas de personal y costos.
Cabe resaltar que las anteriores actividades son realizadas bajo el acompañamiento constante de la interventoria, desarrolladas bajo las normativas NTC 2505 instalaciones para suministro de gas destinadas a usos residenciales y comerciales, NTC 3728 gasoductos, líneas de transporte y redes de distribución de gas, ademas, de acuerdo al acto de gerencia No 219 del 12/09/2013 "manual de supervisión e interventoria de la empresa de energia de Casanare"

REGISTRO FOTOGRAFICO

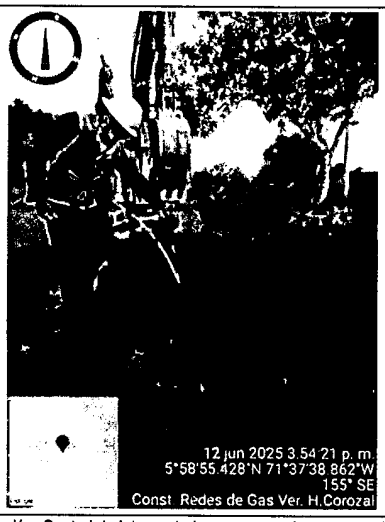

Descripción: Control de interventoria, en excavaciones mecanicas.

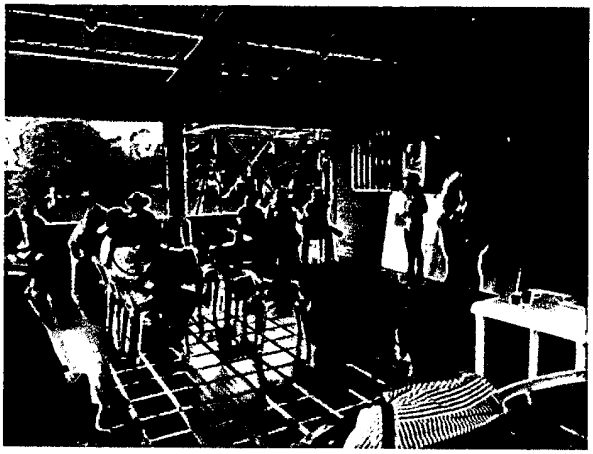

Descripción: Reunión de socialización en la vereda Las Tapias.

CONTRATO No.:	377 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.	FECHA	16	6	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION


PROYECTO SGR		CODIGO BPIN:	2024005850123
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta continuar excavaciones manuales y mecanicas en la vereda Santa Maria y con la instalaciòn de tuberia de 1", 1/2" y 3/4" en las veredas Santa Maria y San Nicolas y en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo; ademas, posterior relleno de las excavaciones y continuar con la construccion de conexiones domiciliarias.

OBSERVACIONES

A la fecha de corte del presente informe semanal, se tiene un atraso del 1,09%, debido a las altas precipitaciones que se han presentado en las zonas de influencia.

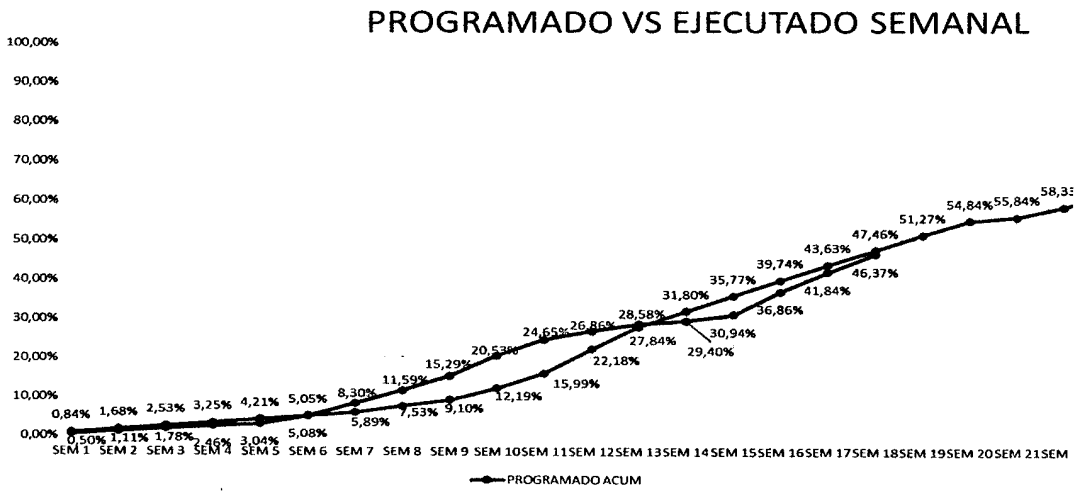

En constancia se firma.

Elaboró

CONSORCIO INTER-HATO 2024
R/L Audenar Florez Sanabria
INTERVENTOR

Revisó:

VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Recibió:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

Enterado:

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		23	6	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850123

INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

Semana Número:	19	Del:	15/06/2025	Al:	21/06/2025	No:	19

Tiempo transcurrido desde la Iniciación del contrato: 4 Meses y 20 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO TERRAZAS

Nombre del Interventor: CONSORCIO INTER-HATO 2024

Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO

Nombre Apoyo a la Supervisión: VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y ÁREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE						
CONTRATO No	002 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO TERRAZAS				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y ÁREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123	No. C.D.P.	6625	No R.P.	6625
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123-SSF	RUBRO	2.3.2.01.01.001.03.14.47	No. C.D.P.	66	No R.P.	66
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.052.944.564,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de diciembre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA DE INICIO	1	$ 4.421.177.826	40%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 4.421.177.826	40%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	3,81%	51,27%	OBRA EJECUTADA (%)	5,66%	52,03%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 421.307.728,48	$ 5.667.377.224,15	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 625.752.716,96	$ 5.751.289.547,96

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		23	6	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

	PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2024005850123
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.**						
CONTRATO No	377 DE 2024	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-HATO 2024				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123	No. C.D.P.	3525	No R.P.	3525
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123-SSF	RUBRO	2.3.2.02.02.008.47	No. C.D.P.	128	No R.P.	142
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.109.406.405,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de enero de 2026	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ACTA PARCIAL N°1	ACTA N°2 PARCIAL N°1	2	$ 322.144.629	29,04%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 322.144.629	29,04%

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		23	6	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

		PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2024005850123
INTERVENTORIA	X		APOYO SUPERVISION	

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS


Se continúan excavaciones mecanicas en la vereda Santa Maria y se inicia en la vereda Las Tapias.
Se continúa con la instalación de tubería de 1/2" en la vereda Santa Maria y casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en el barrio Senderos de Manare y posterior relleno de las excavaciones.
Se continua con la istalación de tuberia de 3/4" en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en Senderos de Manare y posterior relleno de las excavaciones.
Se continúa con las excavaciones manuales en material común en la vereda Santa Maria y Las Tapias.
Se continúa con las excavaciones manuales en material conglomerado en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en Senderos de Manare.
Se continúa con la instalación de tubería de 1" en la vereda Las Tapias y casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en Senderos de Manare y posterior relleno de las excavaciones.
Se continúa con la instalación de conexiones domiciliarias el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en Senderos de Manare.
Se realiza la instalación de la estructura por secciones y anclajes del cruce aéreo especial tipo marco H de 2", ubicado del punto de conexión del cruce del rio excatemente en punto llamado cuatro bocas que une la vereda de la Manga y Serrapio del municipio de Hato Corozal.
Cabe resaltar que las anteriores actividades son realizadas bajo el acompañamiento constante de la interventoría, desarrolladas bajo las normativas NTC 2505 instalaciones para suministro de gas destinadas a usos residenciales y comerciales, NTC 3728 gasoductos, líneas de transporte y redes de distribución de gas, ademas, de acuerdo al acto de gerencia No 219 del 12/09/2013 "manual de supervisión e interventoria de la empresa de energia de Casanare"


REGISTRO FOTOGRAFICO





Descripción: Control de interventoria en excavaciones manuales.

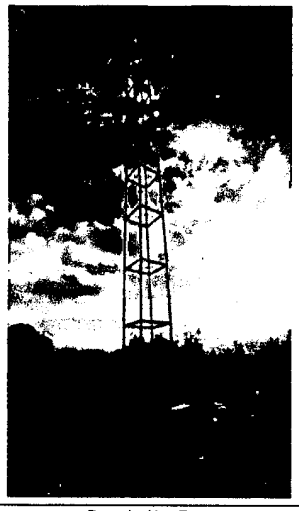

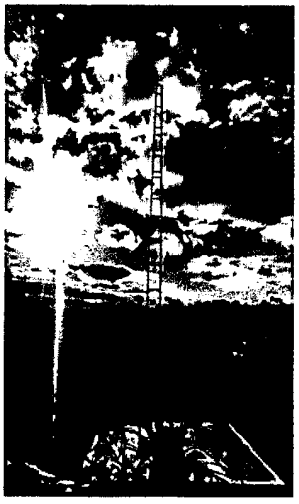

Descripción: Estructura para cruce aereo tipo marco H de 2".

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta continuar excavaciones manuales y mecanicas en la vereda Santa Maria y las Tapias y con la instalaciòn de tuberia de 1", 1/2" y 3/4" en las veredas Santa Maria y Las Tapias y en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo; ademas, posterior relleno de las excavaciones.


CONTRATO No.:	377 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.	FECHA	23	6	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

	PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2024005850123
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

OBSERVACIONES

A la fecha de corte del presente informe semanal, se tiene un adelanto del 0,76%.

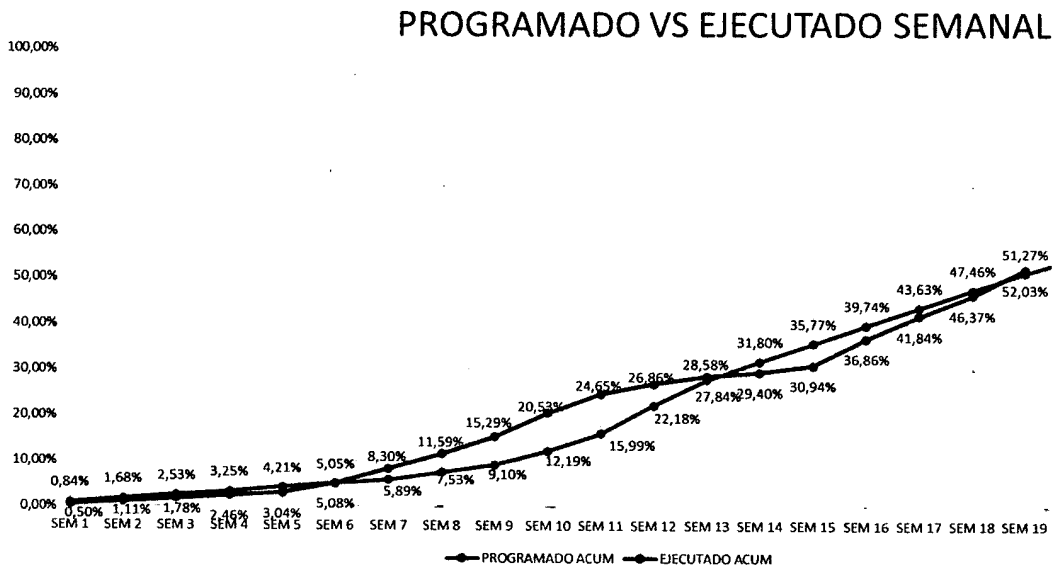

En constancia se firma.

Elaboró

CONSORCIO INTER-HATO 2024
R/L Audenar Florez Sanabria
INTERVENTOR

Reviso:

VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Recibió:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

Enterado:

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		1	7	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850123

INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

Semana Número:	20	Del:	22/06/2025	Al:	30/06/2025	No:	20

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 4 Meses y 29 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO TERRAZAS

Nombre del Interventor: CONSORCIO INTER-HATO 2024

Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO

Nombre Apoyo a la Supervisión: VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y ÁREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE						
CONTRATO No	002 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO TERRAZAS				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y ÁREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123	No. C.D.P.	6625	No R.P.	6625
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123-SSF	RUBRO	2.3.2.01.01.001.03.14.47	No. C.D.P.	66	No R.P.	66
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.052.944.564,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de diciembre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA DE INICIO	1	$ 4.421.177.826	40%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 4.421.177.826	40%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	4,56%	55,84%	OBRA EJECUTADA (%)	5,49%	57,53%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 504.367.132,20	$ 6.171.744.356,35	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 607.352.843,87	$ 6.358.642.391,83

CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		1	7	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

	PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2024005850123
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.**						
CONTRATO No	377 DE 2024	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-HATO 2024				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS MUNICIPIOS DE OROCUE Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123	No. C.D.P.	3525	No R.P.	3525
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0123-SSF	RUBRO	2.3.2.02.02.008.47	No. C.D.P.	128	No R.P.	142
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.109.406.405,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de enero de 2026	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ACTA PARCIAL N°1	ACTA N°2 PARCIAL N°1	2	$ 322.144.629	29,04%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 322.144.629	29,04%

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	377 DE 2024		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.	FECHA	1	7	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

	PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2024005850123
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continùan excavaciones mecanicas en la vereda Santa Maria y Las Tapias.
Se continúa con la instalación de tubería de 1/2" en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en el barrio Senderos de Manare y posterior relleno de las excavaciones.
Se continua con la istalación de tuberia de 3/4" en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en Senderos de Manare y posterior relleno de las excavaciones.
Se continúa con las excavaciones manuales en material común en la vereda Santa Maria y Las Tapias.
Se continúa con las excavaciones manuales en material conglomerado en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en Senderos de Manare.
Se continúa con la instalación de tubería de 1" en la vereda Las Tapias y casco urbano del municipio de Paz de Ariporo en Senderos de Manare y posterior relleno de las excavaciones.
Cabe resaltar que las anteriores actividades son realizadas bajo el acompañamiento constante de la interventoría, desarrolladas bajo las normativas NTC 2505 instalaciones para suministro de gas destinadas a usos residenciales y comerciales, NTC 3728 gasoductos, líneas de transporte y redes de distribución de gas, ademas, de acuerdo al acto de gerencia No 219 del 12/09/2013 "manual de supervisión e interventoria de la empresa de energia de Casanare"

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción: Control de interventoria en excavaciones mecánicas y manuales.



Descripción: Excavación manual en material conglomerado, casco urbano del municipio de Paz de Ariporo.

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta continuar excavaciones manuales y mecanicas en la vereda las Tapias y con la instalaciòn de tuberia de 1", 1/2" y 3/4" en la vereda Las Tapias y en el casco urbano del municipio de Paz de Ariporo; ademas, posterior relleno de las excavaciones.


CONTRATO No.:	377 DE 2024	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL Y PAZ DE ARIPORO, CASANARE.		1	7	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

	PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2024005850123
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

OBSERVACIONES

A la fecha de corte del presente informe semanal, se tiene un adelanto del 1,69%.

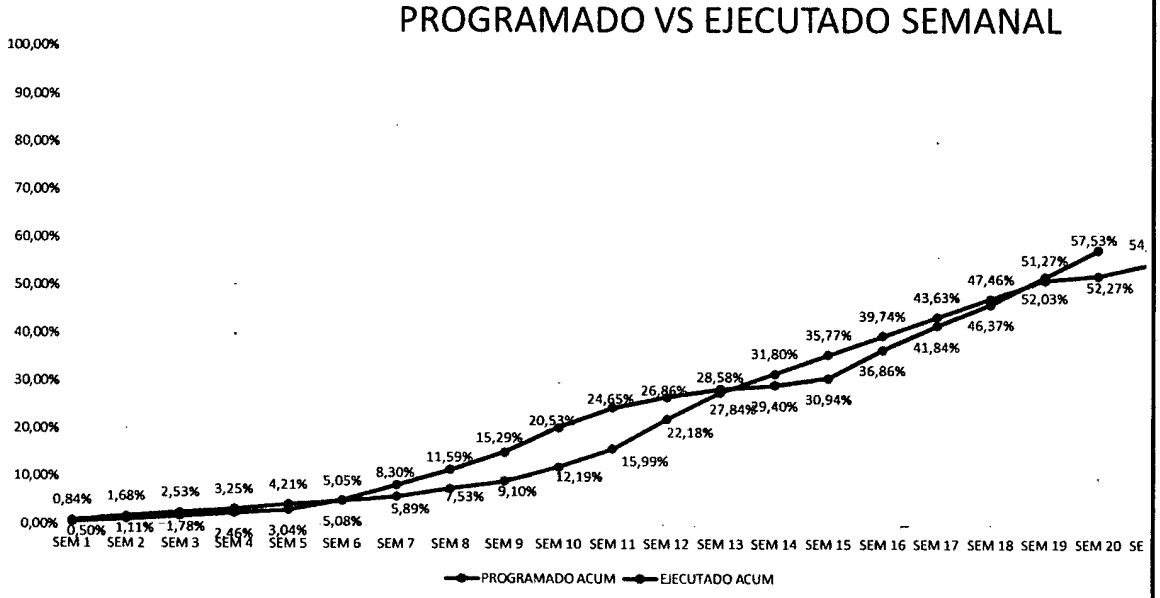

En constancia se firma.

Elaboró

CONSORCIO INTER-HATO 2024
R/L Audenar Florez Sanabria
INTERVENTOR

Revisó:

VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Recibió:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

Enterado:

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA
