Bogotá D.C. Agosto 15 de 2025

CTT-225- 1550-25

Señores:
CONSORCIO SOFAN C-046
Atención: Julio Cesar Bogotá
Director contratista
Carrera 13ª No 89-38
Email: oficinabogota@sofaningenieria.com

REFERENCIA: **CTO-225-2024-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE CONTENCION.**

Asunto: Aprobación – Informe gerencial 2 V2

Respetado Ingeniero

En atención a la entrega del Informe Gerencial N.º 2 – Versión 2, recibida el 01 de agosto de 2025, esta Interventoría informa que, tras la revisión de la documentación y anexos remitidos, se verifica que las observaciones previamente formuladas han sido atendidas, incorporando la información técnica, tablas, registros y soportes solicitados, conforme a lo establecido en el contrato y sus lineamientos.

En consecuencia, la Interventoría aprueba el Informe Gerencial N.º 2 – V2

No obstante, lo anterior, se recuerda que, en el caso que el Instituto De Caminos Y Construcciones De Cundinamarca – ICCU y/o la Interventoría requiera información adicional o requiera que el documento sea ajustado, esto debe ser atendido por el Consultor.

Atentamente

CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49

David Tierradentro
Director de interventoría

CONTRATO DE OBRA ICCU-245 de 2025

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN

INFORME MENSUAL No. 2 V2
1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

ÁREA GERENCIAL

CONSORCIO SOFAN C-046
NIT: 901.919.693-8

FOR-ADM-11

Bogotá - Cundinamarca, junio de 2025

CONTRATO DE OBRA ICCU-245 de 2025

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN.

INFORME MENSUAL No. 2 V2
1 AL 30 JUNIO DEL 2025

ÁREA GERENCIAL

CONSORCIO SOFAN C-046
NIT: 901.919.693-8

ELABORO	REVISO	APROBÓ INTERVENTORÍA
PAULA ANDREA DÍAZ DÍAZ Especialista PMP	**JULIO CESAR BOGOTÁ CARRILLO** Director de Obra	**LUIS EDUARDO PRIETO** Residente Interventoría

REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES
1	

Contrato de Obra No.	**ICCU-CTO-245 DE 2025**	**Contratista:**	**CONSORCIO SOFAN C-046**
Contrato de Interventoría No.	**ICCU-CTO-225 DE 2025**	**Interventoría:**	**CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49**
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN			
INFORME MENSUAL No.	**2**	**MES O PERIODO:**	**1 DE JUNIO 2025 A 30 DE JUNIO 2025**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES 6
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 6
3.2. CONECTIVIDAD, ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS 7
3.3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN TÉCNICA EJECUTADAS Y EN CURSO 8
3.4. PUNTOS PRIORIZADOS 8
4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 11
4.1. OBJETO DEL CONTRATO 11
4.2. DURACIÓN DEL CONTRATO 11
4.3. VALOR DEL CONTRATO 11
5. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 11
5.1. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA 11
5.2. SEGUIMIENTO COMPARATIVO ENTRE AVANCE PROGRAMADO VS. AVANCE REAL 13
5.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES 13
5.4. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT): 17
5.5. COMPONENTE AMBIENTAL: 18
5.6. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 21
5.7. COMPONENTE SOCIAL 23
5.8. GESTIONES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS 24
5.9. LIMITACIONES ENCONTRADAS 25
5.10. SEGUIMIENTO POR INDICADORES 26
6. RECURSO HUMANO 26
7. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO 27
7.1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO: 27
7.2. INVERSIÓN DEL ANTICIPO 28
7.3. GARANTÍAS Y SEGUROS 28
8. PLANES AMBIENTAL Y DE TRÁFICO 28
8.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO AL PAGA 28
8.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO AL PMT 29
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 29
10. ANEXOS 30

Listado de Ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 7

ILUSTRACIÓN 2. LOCALIZACIÓN DE CORREDOR VIAL A INTERVENIR 7

ILUSTRACIÓN 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO PR50+625 ILUSTRACIÓN 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO JUNIO PR50+625 9

ILUSTRACIÓN 5. SEÑALIZACIÓN PR50+625 10

ILUSTRACIÓN 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO PR49+060, 20-05-25 ILUSTRACIÓN 7. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA 10

ILUSTRACIÓN 8. SEGUIMIENTO AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 13

Listado Tablas

TABLA 2. LISTADO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA ÁREA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL..... 17

TABLA 3. LISTA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA PMT 18

TABLA 4. LISTADO DE ACTIVIDADES, COMPONENTE AMBIENTAL..... 18

TABLA 5. LISTADO CORRESPONDENCIA ENVIADA COMPONENTE AMBIENTAL..... 19

TABLA 6. LISTADO DE ACTIVIDADES, COMPONENTE SST..... 21

TABLA 7. LISTADO CORRESPONDENCIA ENVIADA COMPONENTE SST..... 23

TABLA 8. LISTADO DE ACTIVIDADES, COMPONENTE SOCIAL..... 23

TABLA 9. LISTADO CORRESPONDENCIA ENVIADA COMPONENTE SOCIAL..... 24

TABLA 10. PERSONAL DEL CONTRATISTA – CONSORCIO SOFAN C-046 26

TABLA 11. ESTADO FINANCIERO CONTRATO. 27

TABLA 12. GARANTÍAS Y AMPAROS PARA EL CONTRATO 28

TABLA 13. ESTADO FINANCIERO PAGA..... 29

TABLA 14. ESTADO FINANCIERO PMT 29

Anexos

ANEXO 1 – PROGRAMACIÓN

ANEXO 2 – CUADRO CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

ANEXO 3 – PLANTILLA DE SEGUIMIENTO

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU suscribió el contrato ICCU-CTO-245 de 2025, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN", como resultado del proceso de licitación pública ICCU-LP-046 de 2024, adjudicado mediante Resolución No. 115 del 11 de febrero de 2025. El contrato fue suscrito con el CONSORCIO SOFAN C-046, por un valor total de $30.559.916.220 M/CTE y un plazo de ejecución de catorce (14) meses, contados a partir del acta de inicio firmada el 21 de abril de 2025.

Durante el mes de junio de 2025, el proyecto ha ingresado a una fase operativa más activa, en la que se iniciaron intervenciones físicas en tramos priorizados, sin embargo, se han presentado limitaciones técnicas y administrativas, principalmente por la falta de permisos ambientales como el de Ocupación de Cauce (POC), necesario para la ejecución del box culvert en el PR 50+625, cuya gestión ha sido solicitada con carácter de urgencia al ICCU.

Este informe recoge los hechos relevantes del periodo, destacando la reorganización de actividades en campo ante los impedimentos para intervenir el punto inicialmente priorizado, lo que obligó a trasladar recursos al PR 48+960, así como los avances en la caracterización geotécnica, instalación de señalización y ejecución parcial del muro de contención. Asimismo, se incluyen los avances administrativos y las gestiones institucionales que han permitido mantener la continuidad operativa del proyecto.

2. GENERALIDADES

El contrato ICCU-CTO-245 de 2025, celebrado entre el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU y el CONSORCIO SOFAN C-046, se desarrolla bajo el modelo de precios unitarios fijos, con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento periódico y de contención sobre la Troncal del Tequendama y sus vías conectoras, localizadas en distintos municipios del departamento de Cundinamarca. La gestión del contrato está orientada al cumplimiento de metas asociadas a la rehabilitación funcional, estabilización y mejoramiento de la infraestructura vial secundaria y terciaria, en línea con los objetivos trazados por el Plan de Desarrollo Departamental.

Durante el mes de junio, el proyecto avanzó desde la fase inicial de alistamiento hacia una fase operativa con ejecución técnica parcial. No obstante, se presentaron restricciones administrativas y técnicas, principalmente por la falta del Permiso de Ocupación de Cauce (POC) para el PR 50+625, lo que impidió la intervención inmediata en este punto priorizado.

Ante dicha situación, y en cumplimiento de los lineamientos contractuales, el equipo técnico procedió con el traslado de recursos y maquinaria hacia otros sectores, especialmente al PR 48+960, con el fin de no detener el avance del contrato.

A lo largo del periodo, se realizaron las siguientes gestiones y actividades relevantes:

- Instalación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en los puntos autorizados.
- Ejecución de actividades preliminares y constructivas en el PR 48+960.
- Realización de sondeos geotécnicos en cuatro sectores críticos de la vía.
- Revisión técnica y priorización de tramos con deterioro funcional.
- Instalación de la valla informativa del proyecto.

Estas acciones han sido fundamentales para sostener la viabilidad técnica del proyecto, mientras se actualiza el Programa Detallado de Trabajo (PDT) con base en las observaciones de interventoría y la realidad de campo. La gestión gerencial ha priorizado el cumplimiento contractual y el avance progresivo del proyecto en el marco de las condiciones actuales.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Localización y descripción

El proyecto se ubica en departamento de Cundinamarca en la zona suroccidental provincia del Tequendama y su objetivo es realizar el mantenimiento de la red vial de la Troncal del Tequendama y sus vías conectoras, realizando actividades periódicas como mantenimiento de la estructura de pavimento por regular estado, reconstrucción parcial de los tramos en mal estado, construcción y reposición de pavimento en adoquín, construcción de estructuras de drenaje y subdrenaje longitudinal, actividades de seguridad vial.

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

✓ Mantenimiento vial.

✓ Atención sitios críticos

✓ Construcción de obras de drenaje longitudinal y transversal.
✓ Obras de seguridad vial.



Ilustración 1. Departamento de Cundinamarca

3.2. Conectividad, área de influencia y beneficios

La troncal del Tequendama y los demás tramos que conectan a esta, son vías de carácter secundario y terciario que pasa por los municipios de Municipios de Soacha, San Antonio del Tequendama, El Colegio, Anapoima, Viotá, Apulo y Tocaima, están conformadas por una calzada dos carriles (uno por cada sentido).

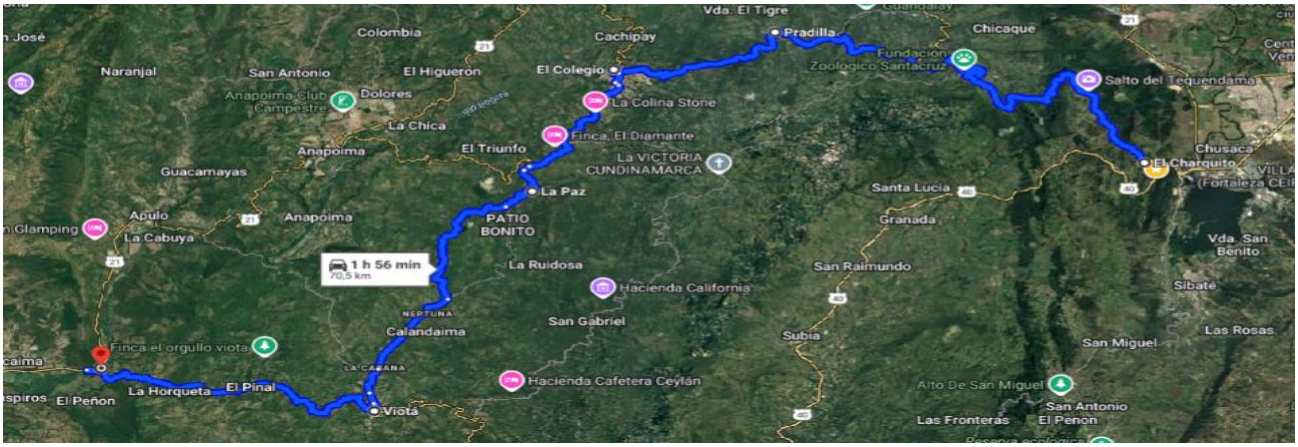


Ilustración 2. Localización de corredor vial a intervenir

3.3. Actividades de intervención técnica ejecutadas y en curso

Durante el mes de junio de 2025, el proyecto avanzó desde la fase preparatoria hacia el desarrollo de actividades técnicas y constructivas en campo. Estas acciones han sido ejecutadas en concordancia con la programación vigente y en coordinación con la interventoría. A continuación, se describen las principales actividades realizadas:

- **Inicio de obras en el PR 48+960**, con el replanteo del muro de contención, nivelación del terreno, excavaciones en talud, instalación de caisson, armado de acero y fundida de concreto.

- **Instalación de señalización temporal** conforme al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado, en los sectores donde se dio inicio a la intervención física.

- **Ejecución de sondeos geotécnicos** en distintos puntos del corredor vial, con el fin de caracterizar los perfiles de suelo.

- **Desarrollo de actividades de reconocimiento técnico**, inspección visual y priorización de tramos con deterioro estructural, deformaciones, pérdida de banca o fallas en drenaje.

- **Montaje y reubicación de la valla informativa del proyecto**, como parte de los elementos contractuales de divulgación.

Estas acciones evidencian el desarrollo progresivo de actividades constructivas conforme a las condiciones reales del terreno y a las prioridades técnicas identificadas en campo, lo cual resalta la necesidad de ajustar la planificación detallada para que refleje de manera precisa el estado actual y la evolución del proyecto.

3.4. Puntos priorizados

Como resultado del diagnóstico técnico inicial realizado en conjunto con la interventoría y el ICCU, se definieron dos puntos críticos como prioritarios para intervención inmediata dentro del alcance del contrato ICCU-CTO-245 de 2025: el PR 50+625, con la construcción de un box culvert, y el PR 48+960, con la construcción de un muro de contención.

Durante el mes de junio, las actividades programadas en el PR 50+625 no pudieron ser desarrolladas, debido a restricciones administrativas ajenas al contratista. En consecuencia, el frente de obra fue reorganizado y el equipo técnico procedió a intervenir el PR 48+960, dando continuidad a la ejecución del proyecto bajo el marco técnico previamente definido.

En este punto, se ejecutaron actividades como instalación del PMT, replanteo, nivelación de terreno, excavación en talud, instalación de caisson, armado de acero y fundida de concreto, logrando dar inicio efectivo a la atención de uno de los sectores más críticos del corredor vial.

Este ajuste operativo ha permitido mantener el avance técnico del contrato, en tanto se gestionan las condiciones necesarias para reactivar otros frentes de obra incluidos en la planificación del proyecto.

Estado de los puntos priorizados:

- **Punto 1: PR50+625**

Tipo de obra: Construcción de box culvert
Longitud: 8 Mts

Las condiciones actuales del sitio muestran un empeoramiento evidente en la pérdida de la banca, lo que representa un riesgo inminente para los usuarios del corredor vial. Se anexa a continuación el registro fotográfico comparativo entre mayo y junio, como evidencia del deterioro progresivo:



Ilustración 3. Registro Fotográfico PR50+625



Ilustración 4. Registro Fotográfico Junio PR50+625

Es importante dejar constancia de que, conforme a lo estipulado contractualmente, la obligación de instalar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) recae sobre el contratista únicamente al momento de iniciar físicamente las actividades de obra. En este caso, al no haber sido posible dar inicio a la intervención, no se encuentra vigente dicha obligación.

Sin embargo, al tratarse de un punto con alto grado de afectación y tránsito peatonal y vehicular constante, se ha evidenciado que la señalización preventiva existente en el sector es insuficiente, lo que incrementa el riesgo para la comunidad que transita por esta zona del corredor vial.

Por tal motivo, se deja constancia en el presente informe de la necesidad urgente de implementar medidas adicionales de señalización y prevención en este sector, en tanto se superan las condiciones que impiden el inicio de la intervención definitiva.



Ilustración 5. Señalización PR50+625

- **Punto 2: PR48+960**

Tipo de obra: Construcción de Muro



Ilustración 6. Registro Fotográfico PR49+060, 20-05-25



Ilustración 7. Registro Fotográfico avance de obra

Este punto también fue priorizado en los recorridos técnicos y sí logró ser intervenido conforme a la programación planteada. Las actividades ejecutadas incluyen la instalación del PMT,

replanteo y nivelación del terreno, excavaciones, armado y fundida de concreto, así como protección provisional del talud.

Esta intervención ha permitido mitigar el riesgo en uno de los sectores críticos del corredor, cumpliendo con los objetivos de atención prioritaria establecidos por la Entidad, tal como se evidencia en el registro fotográfico.

4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

4.1. Objeto del contrato

Realizar la “MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN”

4.2. Duración del contrato

El plazo máximo de acuerdo con las condiciones del contrato ICCU-245 de 2025 es de catorce (14) meses para la ejecución total de las obras.

4.3. Valor del contrato

El valor del Contrato es por la suma de TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($ 30.559.916.220), equivalentes a 21.468 SMLMV para el año de suscripción del contrato, correspondiente al 2025.

5. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

5.1. Seguimiento al cronograma de obra

Fecha de inicio del contrato: 21 de abril de 2025
Fecha de terminación del contrato: 20 de junio de 2026

Para este periodo, se han realizado las actividades de:

- **Inicio de obras en el PR 48+960**,
- **Inicio obras en PR50+625 (En espera de POC)**
- **Instalación de señalización temporal**
- **Ejecución de sondeos geotécnicos**
- **Desarrollo de actividades de reconocimiento técnico**
- **Montaje y reubicación de la valla informativa del proyecto**

Se ha identificado la priorización de 2 puntos críticos a intervenir EL PR 48+960 y el PR50+625 (BOX CULVERT) Sin embargo este ultimo no ha sido posible entrar a intervenirlo debido a que se necesita un permiso de ocupación de cauce (POC) que permita su intervención, a fecha de este informe nos encontramos a la espera de este permiso.

Para el mes de junio 2025 de acuerdo a las reuniones sostenidas con interventoría y el ICCU y a lo evidenciado en campo, lo planeado inicialmente sufre unos cambios que debe ser reflejados en la programación inicial y que permita realizar el seguimiento real de las obras, entre los cambios evidenciados se encuentran los siguientes:

Cambio en la intervención programada del mantenimiento vial; Este se había programado de abscisa mayor a la menor, sin embargo, el ICCU solicito que su intervención se realice de los abscisados menores a mayores.

Identificación de nuevos puntos críticos. Se identificaron 2 nuevos puntos críticos que no se encontraban relacionados en e PDT inicial.

Entrega de diseños y Permisos de Ocupación de Cauce Para la intervención de los puntos críticos, el ICCU debe entregar al contratista los diseños de las obras a realizar, y en 3 de los sitios críticos se debe tramitar PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE (POC).
Estos hitos es importante registrarlos en el PDT para realizar seguimiento y control e identificar las fechas criticas o necesarias para el ICCU nos entregue los diseños e inicar los tramites de PCO donde sea necesario.

Cambio de fecha inicial de la etapa de construcción. La entrega de diseños retrasó el inicio de las obras por tanto la fecha inicial de la etapa de construcción cambio de 20-05-2025 a 9-96-2025, como lo expresa la interventoría en su comunicado CTT-225-958-25 de junio 4 de 2025 Donde el primer mes del contrato correspondiente a identificación de puntos críticos, revisión de diseños y levantamiento, se extiende por 15 días más.

Párrafo extraído del comunicado CTT-225-958-25 de junio de 2024

colocando 15 días iniciales de trabajos de topografía y definición de actividades de intervención.

Ajustar la programación de frentes de obra para garantizar el despliegue simultáneo de los cuatro frentes requeridos.

Cambios en el flujo de caja o curva S. Se debe realizar un ajuste al flujo de caja a solicitud del ICCU porque se evidencian picos de facturación por encima de 6.000 millones, se debe distribuir mejor el flujo de caja para evitar estos picos.

Por tanto, fue necesario replantear el cronograma inicial, este fue entregado a interventoría mediante comunicado FOR-CO-03-ICCU046-116 el día 30 de junio del 2025, el cual se encuentra en revisión y con esta nueva programación se podrá realizar el seguimiento mas objetivo y real de las obras del contrato, mientras tanto la medición que se viene realizando con el programa anterior es una medición que no refleja la realidad de las obras.

5.2. Seguimiento comparativo entre avance programado vs. Avance real

Con el propósito de evaluar el desempeño del proyecto durante el mes de Junio de 2025, se presenta a continuación un análisis comparativo entre el avance físico programado y el avance realmente ejecutado, tomando como base la planificación oficial aprobada inicialmente por interventoría y los registros de seguimiento semanal. Sin embargo, como se comentó en el capítulo anterior esta medición se viene realizando en el programa inicial el cual se encuentra desactualizado y no refleja la realizad ni la secuencia constructiva programada para la obra, por lo que el % programado no es el actualizado, sin embargo a solicitud de interventoría reflejamos en el informe los datos comparativos con el programa hasta ahora aprobado.

Ilustración 8. Seguimiento Avance físico del proyecto

		PROGRAMADO		EJECUCION		INDICADORES		
				TOTALES			VARIACION	IEP
No.	FECHA	CPTP(Millones)	% PROG.	CPTR (Millones)	% EJEC	CRTR	% EJEC - % PROG.	CPTR/CPTP
Semana 1	25/05/2025	24,99	0,08%	12,50	0,04%	11,875	-0,04%	0,50
Semana 2	1/06/2025	153,38	0,51%	24,41	0,08%	23,1881381	-0,43%	0,16
Semana 3	8/06/2025	267,24	0,90%	63,61	0,21%	60,4329147	-0,68%	0,24
Semana 4	15/06/2025	464,85	1,56%	102,82	0,35%	97,6776914	-1,22%	0,22
Semana 5	22/06/2025	1.107,58	3,72%	142,02	0,48%	134,922468	-3,24%	0,13
Semana 6	29/06/2025	1.622,78	5,45%	181,23	0,61%	172,167247	-4,84%	0,11

Este análisis se realiza con base en la metodología PMI descrita en el Plan de Gerencia, y será actualizado mensualmente en la "Plantilla de Seguimiento" **(Ver Anexo 3. Plantilla de seguimiento-Panel de Control).**

Finalmente, a corte de este informe nos encontramos a la espera de la revisión y aprobación del programa de obra actualizado que permita realizar las mediciones reales del proyecto.

5.3. Actividades Técnicas, administrativas y gerenciales.

Durante el mes de junio de 2025, el equipo técnico y administrativo del CONSORCIO SOFAN C-046 llevó a cabo actividades enfocadas en la ejecución progresiva del contrato, la consolidación operativa de las intervenciones y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Técnicas:

- Avance progresivo hacia la activación de cuatro frentes de trabajo, definidos estratégicamente a lo largo del corredor vial con base en la priorización técnica establecida en las fases iniciales del contrato. Esta estrategia busca garantizar una ejecución simultánea y eficiente, acorde con la realidad operativa y los recursos disponibles.

- Desarrollo de actividades constructivas en el PR 48+960, incluyendo replanteo, nivelación del terreno, excavaciones, instalación de caisson y fundida de concreto.
- Realización de sondeos geotécnicos y levantamientos para diagnóstico estructural de sectores críticos.
- Radicación del Programa Detallado de Trabajo (PDT) (Radicado FOR-CO-03-ICCU046-099 del 18/06/2025) y atención a observaciones mediante alcance y justificación técnica (FOR-CO-03-ICCU046-104 y FOR-CO-03-ICCU046-109).

Administrativas:

- Radicación de comunicaciones técnicas, contractuales ante la interventoría.
- Seguimiento documental del avance físico y fotográfico de las actividades ejecutadas.
- Entrega de información soporte de componentes complementarios: ambiental, social, SST y PMT.
- Preparación de ajustes técnicos para la revisión del PDT conforme a la realidad de ejecución.

Gerenciales:

- Coordinación técnica y logística para el despliegue progresivo de equipos y recursos hacia los frentes priorizados.
- Participación en comités de seguimiento, mesas técnicas y espacios de articulación con la interventoría e ICCU.
- Evaluación de desviaciones frente a la programación original, generando insumos para su actualización técnica.

Estas actividades reflejan un avance técnico, operativo y administrativo coordinado, orientado a consolidar la ejecución del contrato en terreno, en paralelo con los ajustes requeridos al plan de trabajo formal aprobado.

Adicional se presenta la relación de correspondencia enviada **(Ver Anexo 2. Cuadro de correspondencia).**

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	COMPONENTE RESPONSABLE	ASUNTO
FOR-CO-03-ICCU046-0078	4/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Informe Tecnico No.1 21 abril al 31 mayo del 2025.
FOR-CO-03-ICCU046-0079	4/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Informe Gerencial No.1 21 abril al 31 mayo del 2025.

FOR-CO-03-ICCU046-0080	6/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Justificación para la realización de ensayos para obras de estabilización en la Troncal del Tequendama
FOR-CO-03-ICCU046-0085	9/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Solicitud de mesa de trabajo para planificación de actividades de mantenimiento periódico vía troncal del Tequendama
FOR-CO-03-ICCU046-0092	11/6/2025	SOFAN INGENIERIA SA.S.	ADMINISTRATIVO	ESTADO CAMION PRY 569
FOR-CO-03-ICCU046-0096	12/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1005-25, Implementación urgente del PMT con reguladores de tráfico – PR 50+625.
FOR-CO-03-ICCU046-0097	13/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Justificación técnica para ensayos de diagnostico y estabilización
FOR-CO-03-ICCU046-0098	13/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	RE CTT-225-958-25 Afectación en la ejecución por la falta de insumos tecnicos
FOR-CO-03-ICCU046-099	18/06/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Radicación de la programación PDT
FOR-CO-03-ICCU046-100	18/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Solicitud de entrega de diseños faltantes – Contrato ICCU-245-2025
FOR-CO-03-ICCU046-101	19/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Solicitud de aclaración sobre diseño de muro sobre pilotes en PR 49+000

FOR-CO-03-ICCU046-103	20/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Remisión de Informes de Vía y Caracterización del Terreno
FOR-CO-03-ICCU046-104	20/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Alcance comunicado FOR-CO-03-ICCU046-098 del 13 de junio del 2025.
FOR-CO-03-ICCU046-106	24/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1116-25, Radicación de la Programación PDT.
FOR-CO-03-ICCU046-109	25/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Respuesta comunicado CTT-225-1116-25, Justificación programación (PDT).
FOR-CO-03-ICCU046-113	27/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1126-25, Alcance a la comunicación CTT-225-1044-25 y Revisión entrega formal Informe de Medición de deflectometria y condición superficial Troncal Tequendama.
FOR-CO-03-ICCU046-114	27/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1028-25, Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-075 RE CTT-225-0952-25 Solicitud de señalización puntos críticos.

FOR-CO-03-ICCU046-115	30/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Respuesta comunicado CTT-225-1147-25, Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-079 Informe Gerencial.
FOR-CO-03-ICCU046-116	30/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Alcance a oficio FOR-CO-03-ICCU046-0109 del 25 de junio del 2025, Remisión de PDT.

Tabla 1. Listado de correspondencia enviada Área Técnica, administrativa y gerencial

5.4. Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Durante el mes de junio de 2025, el CONSORCIO SOFAN C-046 avanzó con la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en los sectores donde se ha iniciado físicamente la ejecución de obra, conforme a los diseños aprobados por la Entidad y la normativa vigente. Específicamente, en el PR 48+960, se efectuó la instalación completa del PMT, incluyendo elementos de señalización reglamentaria, preventiva y de obra, lo cual permitió garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios del corredor durante la intervención del tramo.

En el caso del PR 50+625, no se ha efectuado la instalación del PMT debido a que, de acuerdo con lo establecido contractualmente, la implementación de señalización corresponde únicamente al momento de iniciar actividades de obra. Al no haberse iniciado formalmente la intervención en este punto, no se ha activado la obligación del contratista en cuanto al montaje del PMT. No obstante, se deja constancia que la señalización actualmente presente en el sector es limitada e insuficiente, generando un alto riesgo para la comunidad que transita por la zona. Por tanto, se recomienda evaluar conjuntamente con la Entidad y la interventoría la implementación de medidas transitorias de señalización preventiva en los sectores de alto riesgo que aún no han sido intervenidos, con el fin de proteger a los usuarios del corredor y reducir la exposición a accidentes viales.

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	COMPONENTE RESPONSABLE	ASUNTO
FOR-CO-03-ICCU046-111	27/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	PMT	Respuesta comunicado CTT-225-1152-25, Traslado oficio ICCU-S-2025-0004129 Opción de Mejora al Plan de PMT.

Tabla 2. Lista de correspondencia enviada PMT

Adicionalmente, mediante comunicación FOR-CO-03-ICCU046-0111 del 27 de junio de 2025, el contratista informó a la interventoría y al ICCU que acoge la recomendación técnica planteada en el oficio CTT-225-1152-25, e implementará ajustes al PMT en sectores donde se ejecuten excavaciones profundas, conforme a la Resolución 45005 de 2024 y el Manual de Señalización Vial.

Dado que los elementos requeridos para esta mejora no estaban contemplados inicialmente en el PMT aprobado, el contratista ha procedido a emitir las órdenes de compra correspondientes para su adquisición oficial e iniciar su implementación en los tramos aplicables.

5.5. Componente Ambiental:

Durante el mes de junio de 2025, se desarrolló una serie de actividades en cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en el Contrato, así como en atención a los requerimientos realizados por la Interventoría y las entidades competentes. A continuación, se relacionan las principales gestiones, comunicaciones, visitas técnicas y acciones de seguimiento implementadas en el marco del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD), y los trámites relacionados con los Permisos de Ocupación de Cauce (POC), entre otros aspectos relevantes.

Tabla 3. Listado de Actividades, Componente Ambiental.

ACTIVIDADES
El día 03 de junio de 2025, se realizó la entrega por whatsapp la Descripción del Proyecto POC PR50+625 y la Fichas de Manejo Ambiental del POC PR50+625.
Mediante comunicado CTT-225-971-25 del 04 de junio de 2025, la Interventoría remite Aprobación del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA V3.
Mediante comunicado CTT-225-972-25 del 04 de junio de 2025, la Interventoría remite al ICCU Entrega del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) V3.
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0081 del 06 de junio de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite: ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°1
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0084 del 09 de junio de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite: Solicitud de recepción de material sobrante RCD a la Secretaria de Planeación y Dirección de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal de Anapoima.
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0086 del 09 de junio de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite: Solicitud de recepción de material sobrante RCD a la Secretaria de Planeación y Dirección de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal de San Antonio de Tequendama.
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0087 del 09 de junio de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite: Solicitud de recepción de material sobrante RCD a la Secretaria de Planeación y Dirección de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal de Viota.
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0088 del 09 de junio de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite: Solicitud de recepción de material sobrante RCD a la Secretaria de Planeación y Dirección de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal de El Colegio.

Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0090 del 10 de junio de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite a la Interventoría: Se informa sobre los sitios o tramos para los tramites de Permiso de Ocupación de Cauce POC con el ICCU y la AAC.
Mediante comunicado CTT-225-1033-25 del 11 de junio de 2025, la Interventoría remite Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0081 observaciones al informe mensual ambiental.
Mediante comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0094 del 11 de junio de 2025, el Consorcio Sofan C-046 remite a la Interventoría: Respuesta Comunicado CTT-225-1033-25 del 11 de junio de 2025, observaciones al informe mensual ambiental.
El día 12 de junio de 2025 se recibió correo electrónico de respuesta por parte del Director de Obras Públicas Secretaría de Planeación, para coordinar una visita técnica que permita verificar el estado actual de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Esta visita tiene como objetivo evaluar si dichos residuos se encuentran en condiciones óptimas para ser aprovechados en los trabajos viales que se adelantan en el municipio, esta visita se realizaría el viernes 13 de junio a las 10:00 a.m. o, en su defecto, el día lunes 16 de junio 4 pm.
Mediante comunicado CTT-225-1066-25 del 16 de junio de 2025, la Interventoría remite Aprobación del informe mensual Ambiental No.1 del contratista.
El día 20 de junio de 2025 se asistió de manera virtual sobre la afectación vía El Colegio – Viota vereda Calichana y tramite del POC en el PR50+625 del contrato ICCU 245 de 2025, donde asistieron funcionarios de la CAR Cundinamarca Provincia del Tequendama, Supervisores del ICCU, funcionarios de la Alcaldia Municipal de Anapoima e Interventoría.
El día 20 de junio de 2025, se atendió observación por parte de interventoría sobre acopio debe estar debidamente señalizado, demarcado y protegido.
El día 25 de junio de 2025, se atendió observación, sobre la instalación del punto ecológico.
Se asistió de manera virtual a los comités integrales del contrato ICCU 245 de 2025, los días 04, 11, 18 y 26 de junio de 2025.
Mediante comunicado CTT-225-1174-25 del 27 de junio de 2025, la Interventoría remite Solicitud de observaciones de campo frente a la gestión ambiental.
El día 27 de junio de 2025, se realizó inducción y capacitación al personal sobre el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA del Contrato ICCU 245 de 2025.

En complemento a las actividades desarrolladas, se ha llevado a cabo una gestión documental constante con la interventoría y demás entidades competentes, mediante la emisión y recepción de comunicaciones formales. A continuación, se presenta el cuadro resumen de la correspondencia enviada durante el periodo evaluado, como evidencia del cumplimiento de los compromisos contractuales y administrativos asumidos por el Contratista:

Tabla 4. Listado correspondencia enviada Componente Ambiental

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	COMPONENTE RESPONSABLE	ASUNTO

FOR-CO-03-ICCU046-0081	6/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Entrega informe Mensual Ambiental No 1
FOR-CO-03-ICCU046-0084	9/6/2025	YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ	AMBIENTAL	SOLICITUD DE RECEPCION DE MATERIAL SOBRANTE RCD
FOR-CO-03-ICCU046-0086	9/6/2025	JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO	AMBIENTAL	SOLICITUD DE RECEPCION DE MATERIAL SOBRANTE RCD
FOR-CO-03-ICCU046-0087	9/6/2025	JUAN ALEJANDRO CASTAÑO GAMEZ	AMBIENTAL	SOLICITUD DE RECEPCION DE MATERIAL SOBRANTE RCD
FOR-CO-03-ICCU046-0088	9/6/2025	JHERSON JAIR NIÑO VEGA	AMBIENTAL	SOLICITUD DE RECEPCION DE MATERIAL SOBRANTE RCD
FOR-CO-03-ICCU046-0090	10/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Se informa sobre los sitios o tramos para los tramites de Permiso de Ocupación de Cauce POC con el ICCU y la AAC.
FOR-CO-03-ICCU046-0094	11/06/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta Comunicado CTT-225-1033-25 del 11 de junio de 2025, observaciones al informe mensual ambiental
-	19/6/2025	CAR Corporacion Autónoma Regional CAR Corporacion Autónoma Regional	AMBIENTAL	CONCEPTO PAGO POC

5.6. Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Durante el mes de junio de 2025, se implementó diversas acciones orientadas al fortalecimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en cumplimiento del sistema de gestión SST y de los lineamientos contractuales. Estas actividades incluyeron procesos de inducción, suministro de elementos de protección personal, seguimiento a condiciones en obra, y gestión de recursos para la prevención y atención de emergencias. A continuación, se relacionan las principales acciones ejecutadas en los diferentes frentes de trabajo:

Tabla 5. Listado de Actividades, Componente SST

ACTIVIDADES
Inducciones al personal del CONSORCIO SOFAN C-046
Inducciones al personal de URBANUZ
Entrega de dotación y EPP
Notificación de riesgo a el personal
Charlas SST al personal en los diferentes frentes de trabajo
Gestionar la adquisición de los puntos de emergencia para el KM 48+900
Gestionar la adquisición de los puntos ecológicos para el KM 48+900
Inspecciones al kit de derrame
Divulgación de políticas a todo el personal
Radicar documentación en la CAR ubicada en el municipio de La Mesa Cundinamarca
Realizar pausas activas a todo el personal
Recibir dotación enviada de Bogotá
Inspeccionar puntos de emergencia y ecológico en el KM48+900
Gestionar hidratación para el personal
Acompañamiento de actividades críticas en los diferentes puntos de obra
Realizar informe de gestión SST mensual
señalización y demarcación en el KM48+900
Entrega y recepción de preoperacionales
Cierre de observaciones
Asistir a los comités

En complemento a las actividades desarrolladas, se ha llevado a cabo una gestión documental constante con la interventoría y demás entidades competentes, mediante la emisión y recepción de comunicaciones formales. A continuación, se presenta el cuadro resumen de la correspondencia enviada durante el periodo evaluado, como evidencia del cumplimiento de los compromisos contractuales y administrativos asumidos por el Contratista:

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	COMPONENTE RESPONSABLE	ASUNTO
FOR-CO-03-ICCU046-0077	4/6/2025	CONSORCIO TRONCAL	SST	Informe SST No.1 21 abril al 31 mayo del 2025.

		TEQUENDAMA 49		
FOR-CO-03-ICCU046-0083	8/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0072 DOCUMENTOS SEGURIDAD SOCIAL
FOR-CO-03-ICCU046-0089	10/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega de documentos SST personal operativo
FOR-CO-03-ICCU046-0091	11/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1017-25, OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 1 SST
FOR-CO-03-ICCU046-0095	12/06/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1057-25 OBSERVACIONES en el radicado FOR-CO-03-ICCU046-0089
FOR-CO-03-ICCU046-105	24/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentos SST, Personal Operativo y administrativo.
FOR-CO-03-ICCU046-107	24/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1059-25, Respuesta informe mensual SST.
FOR-CO-03-ICCU046-108	25/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentos SST, Personal Operativo y administrativo.
FOR-CO-03-ICCU046-110	25/6/2025	CONSORCIO TRONCAL	SST	Solicitud de ingreso del profesional Carlos

		TEQUENDAMA 49		Tinoco como inspector de obra y retiro de Pedro José Jaller.

Tabla 6. Listado correspondencia enviada Componente SST

5.7. Componente Social

En este periodo se priorizaron acciones relacionadas con la divulgación de ofertas laborales para mano de obra no calificada, la atención a la comunidad y el seguimiento a predios cercanos al área de intervención. A continuación, se detallan las actividades desarrolladas en este componente:

Tabla 7. Listado de Actividades, Componente Social

ACTIVIDAD
El contratista para el presente mes da cumplimento a las actividades propuestas en el plan de gestión social el cual se encuentra aprobado por interventoría y con visto bueno por parte de la supervisión social del contrato
Se lleva a cabo la divulgación de ofertas de trabajo para mano de obra no calificada, Boal y controladores de tránsito, se realiza la contratación de 5 controladores y 2 controladoras.
Realizar la inscripción de las vacantes disponibles, en la Agencia de servicio público de empleo (Controlador de tráfico)
Para el presente mes, dando desarrollo a las actividades constructivas, no se llevan a cabo reuniones de socialización.
Se realizan las actas de vecindad para los inmuebles ubicados cerca del área de influencia directa del proyecto, con el fin de verificar y dejar constancia del estado actual mediante registro de afectaciones y fotografías. KM 41+500. Incluyendo el espacio público
Se brinda un espacio físico para la atención de los requerimientos, quejas, inquietudes y peticiones de la comunidad relacionadas con el proyecto. Este espacio, conocido como Punto de Atención a la Comunidad (PAC) ubicado en el municipio del colegio – Cundinamarca
Se lleva a cabo acompañamiento al área técnica en el desarrollo de actividades, en los diferentes puntos habilitados por el contratista, es importante mencionar que, a la fecha del presente informe no se han recibido solicitudes quejas reclamos o sugerencias por parte de la comunidad, interventoría o entidad.

En complemento a las actividades desarrolladas, se ha llevado a cabo una gestión documental constante con la interventoría y demás entidades competentes, mediante la emisión y recepción de comunicaciones formales. A continuación, se presenta el cuadro resumen de la correspondencia enviada durante el periodo evaluado, como evidencia del cumplimiento de los compromisos contractuales y administrativos asumidos por el Contratista:

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	COMPONENTE RESPONSABLE	ASUNTO

FOR-CO-03-ICCU046-0076	3/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Informe social No.1 21 abril al 31 mayo del 2025.
FOR-CO-03-ICCU046-0082	7/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Atención al comunicado Oficio CTT-225-1014-25 Informe mensual social N°1
FOR-CO-03-ICCU046-0093	11/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	RESPUESTA COMUNICADO CTT-225-1009-25
-	12/06/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	COMUNICADO-COMPONENTE SOCIAL
-	12/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	ACTAS DE VECINDAD K49+000
-	16/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	ACTAS DE VECINDAD K49+000
FOR-CO-03-ICCU046-102	19/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1046-25 Informe Social N°1
-	24/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Solicitud de acompañamiento técnico - levantamiento de actas de vecindad K41+500

Tabla 8. Listado correspondencia enviada Componente Social

5.8. Gestiones logísticas y operativas

Durante el mes de junio de 2025, las gestiones logísticas y operativas del proyecto estuvieron enfocadas en el soporte a la ejecución física en los frentes activos, así como en la consolidación de recursos y servicios necesarios para mantener la operatividad del contrato. Estas acciones

han sido clave para garantizar el funcionamiento eficiente de los equipos técnicos, administrativos y de campo. A continuación, se relacionan las principales gestiones realizadas:

- Mantenimiento y operación del campamento base, incluyendo alojamiento y servicios básicos para el personal técnico y operativo.
- Alistamiento y dotación de la bodega de materiales, garantizando el suministro y almacenamiento adecuado de insumos requeridos para la ejecución en obra.
- Funcionamiento de la oficina de atención al público, en el marco del componente social, para la recepción de peticiones, quejas y requerimientos de la comunidad.
- Contratación y vinculación continua de personal técnico, administrativo, conforme a los perfiles requeridos por la ejecución y por los frentes en operación.
- Distribución de herramientas menores, EPP y señalización temporal, según necesidades específicas de los puntos priorizados.
- Gestión logística para el traslado de maquinaria y equipos entre frentes de trabajo, según las prioridades definidas por la planificación en campo.
- Recepción y procesamiento de elementos solicitados por mejora del PMT, derivados de la implementación de medidas adicionales de seguridad en zonas con excavaciones profundas.

Estas gestiones han permitido mantener la continuidad operativa del proyecto y responder de manera oportuna a los requerimientos técnicos, contractuales y comunitarios, apoyando la ejecución efectiva de las actividades en terreno.

5.9. Limitaciones encontradas

Durante el mes de junio de 2025, el desarrollo del proyecto presentó diversas limitaciones que incidieron en la ejecución de las actividades programadas. A pesar de los esfuerzos realizados por el contratista para mantener el avance del contrato, se evidenciaron restricciones tanto de tipo administrativo como operativo, que se relacionan a continuación:

- Imposibilidad de intervenir el punto crítico PR 50+625, debido a la falta de autorización para el inicio de obra, por falta del POC.
- Señalización deficiente en puntos aún no intervenidos, especialmente en sectores críticos como el PR 50+625, donde la responsabilidad de implementación del PMT no es exigible al contratista hasta el inicio de obra. Esta situación fue puesta en conocimiento de la entidad y la interventoría.
- Falta de definición y entrega de diseños estructurales complementarios, necesarios para la intervención de varios sectores priorizados (radicado FOR-CO-03-ICCU046-100 del 18/06/2025).
- Observaciones técnicas a la Programación Detallada de Trabajo (PDT) por parte de la interventoría, lo que implicó el ajuste de actividades y retrasos en la formalización del cronograma actualizado (FOR-CO-03-ICCU046-106 y 109).
- Tiempos de adquisición de elementos adicionales para señalización, derivados de la mejora voluntaria al PMT para excavaciones profundas, cuya implementación depende de la gestión de compra iniciada en junio.
- Retrasos en el desembolso del anticipo, Si bien el contrato establece que el inicio de actividades no está condicionado al desembolso del anticipo, su disponibilidad oportuna

resulta clave para garantizar el desarrollo continuo y eficiente del proyecto. El contratista ha dado cumplimiento a todos los requisitos para su trámite y, pese a no contar aún con estos recursos, ha iniciado la ejecución con recursos propios, como muestra de su compromiso contractual.

- Condiciones climáticas adversas, Se mencionan lluvias frecuentes en las mañanas, lo que ha dificultado la realización de inspecciones visuales en campo.

A pesar de estas limitaciones, el contratista ha adoptado medidas de mitigación para mantener el avance del proyecto, incluyendo la redistribución de frentes de trabajo, la radicación oportuna de justificaciones técnicas, y la coordinación constante con la interventoría para resolver las situaciones identificadas.

5.10.Seguimiento por indicadores

En línea con lo establecido en el Plan de Gerencia del Proyecto y con el fin de fortalecer el componente de seguimiento por metas, se ha estructurado una matriz de indicadores técnicos que permite evaluar el desempeño del contrato por fases, incorporando variables como avance físico programado y ejecutado, fechas de cumplimiento y posibles desviaciones. Esta herramienta de control se actualiza mensualmente y permite hacer seguimiento detallado a la ejecución del proyecto. El informe consolidado correspondiente al mes de junio de 2025 se encuentra en el archivo anexo. **(Ver Anexo 3. Plantilla de Seguimiento – Indicadores Mensuales).**

6. RECURSO HUMANO

Durante el periodo, el proyecto contó con el siguiente personal técnico y operativo vinculado al desarrollo de actividades:

Tabla 9. Personal del Contratista – Consorcio SOFAN C-046

Nombres y Apellidos	TIPO / DOCUMENTO	Cédula / ciudadanía No.	Cargo
Julieth Avendaño Sandoval	CC	1070332265	Auxiliar de trafico
Laura Rodriguez Gomez	CC	1005700126	Auxiliar de trafico
Felix Manuel Gonzalez Ramirez	CC	1070034893	Auxiliar de trafico
Nelson Molina Bejarano	CC	80388530	Auxiliar de trafico
Mario Morales Cano	CC	368894	Conductor
Luis Raul Ramirez Camacho	CC	1007770085	Operador de maquinaria
John Fredy Cifuentes Ramirez	CC	1024498865	Almacenista
Julian Eduardo Sanchez Angel	CC	1069403902	Operador de maquinaria
Jose Leonardo Crespo Sanchez	CC	1069402943	Auxiliar de trafico

Maikol Ivan Cruz Cruz	CC	1024590518	Auxiliar de obra
Rafael Moreno Yepez	CC	7958232	Auxiliar de obra
Simeon Arturo Marin Mendez	CC	93451240	Auxiliar de obra
Carlos Daniel Tinoco Sopo	CC	1073428676	Inspector Vial
Elefileth Ricardo Valderrama	CC	1102827156	Residente técnico
Francisco Alexander Ramirez	CC	79891992	Residente Ambiental
Eliana Barrios Garcia	CC	1067846724	Inspector Vial
David Andres Castellanos	CC	1013594757	Inspector Vial
Julio Cesar Bogotá	CC	79584147	Director de obra
Yadmin Gracy Parra	CC	35377240	Inspectora Social
Edison Aguilar Corchuelo	CC	3152286	Conductor
Adriana Manrique Zárate	CC	52295147	Residente SST
Katherine Guayacan Parra	CC	100072645	Residente Social
German Quintero Chavez	CC	93295779	Inspector Vial
Luis López	CC	5570315	Cadenero
Carlos Poveda	CC	79898295	topógrafo
Yeison Garavito	CC	1015423004	Residente técnico
Sergio Arturo Vargas	CC	1000618103	Inspector Vial
Cindy Nataly Aparicio	CC	1052393378	Administradora de obra

7. ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

7.1. Estado general del contrato:

A la fecha de corte del presente informe, el estado financiero del proyecto es el siguiente:

Contrato No. ICCU-CTO-245 DE 2025
Contratista: CONSORCIO SOFAN C-046
Objeto: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN

Valor inicial del contrato: $30.559.916.220
Fecha de inicio: 21 de abril de 2025
Fecha de terminación: 20 de junio de 2026
Plazo de ejecución inicial: 14 meses

Tabla 10. Estado Financiero Contrato.

CONCEPTO/ACTA	OBRA	PAGA	PMT	PROVISIÓN AJUSTES VARIACIÓN COSTOS INSUMOS	TOTALES
VALOR TOTAL INICIAL	$ 29.791.174.841,00	$ 266.141.379,00	$ 402.600.000,00	$ 100.000.000,00	$ 30.559.916.220,00
ANTICIPO	20%	N/A	N/A	N/A	
	$ 6.111.983.244,00				$ 6.111.983.244,00
POR EJECUTAR	**$ 29.791.174.841,00**	**$ 266.141.379,00**	**$ 402.600.000,00**	**$ 100.000.000,00**	**$ 30.559.916.220,00**

A la fecha, se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos contractuales exigidos para el trámite del anticipo, incluida la constitución del patrimonio autónomo. Actualmente, se está a la espera del desembolso de los recursos por parte de la entidad.

7.2. Inversión del anticipo

El anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato será amortizado de manera progresiva mediante descuentos aplicables a las actas parciales de ejecución, conforme a las condiciones contractuales. Aunque su entrega no condiciona el inicio del contrato, representa un soporte financiero fundamental para dar continuidad a las actividades técnicas, logísticas y operativas.

A la fecha de corte del presente informe, el contratista ha adelantado de manera oportuna y completa todos los trámites administrativos y financieros requeridos por la entidad para el desembolso del anticipo. En consecuencia, se encuentra a la espera de estos recursos, mientras ha sostenido el avance inicial con recursos propios.

7.3. Garantías y seguros

Tabla 11. Garantías y amparos para el contrato

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	21/04/25	22/10/26	$6.111.983.244.00
Buen manejo del anticipo	21/04/25	22/10/26	$ 6.111.983.224.00
Prestaciones sociales	21/04/25	21/06/29	$ 6.111.983.244.00
Calidad y Estabilidad de la obra	20/06/26	20/06/31	$ 8.937.352.452,30
RCE	21/04/25	20/06/26	$1.527.995.811.00

Fuente: Póliza No. 87833 Anexo 2 – 25529 Anexo 1

8. PLANES AMBIENTAL Y DE TRÁFICO

8.1. Seguimiento financiero al PAGA

Para el periodo correspondiente al mes de junio de 2025, no se ha generado facturación ante la entidad contratante por actividades específicas del componente ambiental.

Cabe resaltar que el presupuesto asignado en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), aprobado por interventoría y supervisión, corresponde a un valor global de

$266.141.379, el cual contempla todos los costos y gastos asociados con el componente ambiental, social y SST.

En este sentido, el seguimiento financiero del componente se mantendrá actualizado conforme se generen avances de facturación y ejecución presupuestal en los próximos periodos.

Tabla 12. Estado Financiero PAGA

CONCEPTO/ACTA	PAGA	TOTALES
VALOR TOTAL INICIAL	$ 266.141.379,00	$ 266.141.379,00
ANTICIPO	N/A	
POR EJECUTAR	**$ 266.141.379,00**	**$ 266.141.379,00**

8.2. Seguimiento financiero al PMT

Durante el presente periodo correspondiente al mes de junio de 2025, no se registra ejecución financiera asociada al componente de Plan de Manejo de Tráfico (PMT). Si bien se ha dado inicio a la implementación del PMT aprobado.

En este sentido, el seguimiento financiero del PMT se mantendrá actualizado conforme se generen avances de facturación y ejecución presupuestal en los próximos periodos.

Tabla 13. Estado Financiero PMT

CONCEPTO/ACTA	PMT	TOTALES
VALOR TOTAL INICIAL	$ 402.600.000,00	$ 402.600.000,00
ANTICIPO	N/A	
POR EJECUTAR	**$ 402.600.000,00**	**$ 402.600.000,00**

Actualmente nos encontramos en proceso de ejecución del Corte de Obra No. 1, el cual incluirá el cobro de los diferentes componentes del contrato, entre ellos el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), conforme a los avances físicos y a las actividades ejecutadas en campo. Una vez se culmine este corte y se radique la correspondiente factura ante la entidad contratante, se actualizará la información financiera de cada componente en los próximos informes.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- Durante el mes de junio de 2025, el proyecto avanzó hacia una fase operativa activa, con ejecución de actividades constructivas en el PR 48+960 y progresos significativos en la organización técnica y administrativa del contrato.
- Se evidenció un avance progresivo hacia la activación de los cuatro frentes de trabajo, lo cual permite una mayor cobertura del corredor y mejor aprovechamiento de los recursos técnicos y logísticos disponibles.
- Se mantuvo una gestión documental constante ante la interventoría y el ICCU, destacándose la radicación de la Programación Detallada de Trabajo (PDT), su respectiva justificación técnica y el seguimiento a observaciones realizadas.
- Persisten limitaciones externas que han impedido la intervención del PR 50+625, afectando la ejecución conforme a la programación inicialmente aprobada.
- El contratista acogió de manera proactiva las recomendaciones técnicas relacionadas con el mejoramiento del PMT para excavaciones profundas, iniciando el proceso de adquisición de elementos de señalización adicionales.

Recomendaciones:

- Avanzar con la actualización formal del PDT, ajustando la programación contractual a la realidad técnica y operativa evidenciada en campo, con base en los avances reales y las restricciones enfrentadas.
- Solicitar acompañamiento y coordinación con la Entidad para definir y agilizar la entrega de diseños pendientes que condicionan el inicio de nuevas intervenciones.
- Continuar con la implementación progresiva de los frentes de obra definidos, priorizando los sectores con mayor riesgo o afectación para la comunidad.
- Mantener el monitoreo constante sobre los puntos críticos no intervenidos y comunicar de manera oportuna cualquier agravamiento de las condiciones de seguridad vial.
- Consolidar la adquisición e implementación de los elementos adicionales de señalización aprobados, garantizando su disponibilidad para las próximas fases de ejecución.

10. ANEXOS

Consorcio SOFAN C-046


ANEXO No 1

PROGRAMACIÓN

Carrera 13A No 89-38 Oficina 414 Edificio Nippon Center, Bogotá D.C
(57)(1) 5377340 - 311 2412967
admoncto245@sofaningenieria.com

Consorcio SOFAN C-046

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% planeado 29-06-2025	% ejec. 29-06-2025	% físico completado	CPTP	CPTR
0	**0**	**ICCU-245-2025-MTO VIA TEQUENDAMA_CLS_30052025**	**287 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 20/06/26**	**5,45%**	**0,61%**	**1%**	**$ 1.622.778.176,84**	**$ 181.228.681,11**
1	**1**	**MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN**	**287 días**	**lun 21/04/25**	**sáb 20/06/26**	**5,45%**	**0,61%**	**1%**	**$ 1.622.778.176,84**	**$ 181.228.681,11**
2	**1.1**	**INICIO**	**0 días**	**lun 21/04/25**	**lun 21/04/25**	**100,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
3	**1.1.1**	**FIRMA DE CONTRATO**	**0 días**	**lun 21/04/25**	**lun 21/04/25**	**100,00%**	**0,00%**	**100%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
4	**1.1.2**	**ACTA DE INICIO**	**0 días**	**lun 21/04/25**	**lun 21/04/25**	**100,00%**	**0,00%**	**100%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
5	**1.2**	**PRELIMINARES - PLANIFICACION**	**20 días**	**lun 21/04/25**	**mar 20/05/2**	**100,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
6	**1.2.1**	**Campamento de obra**	**10 días**	**lun 21/04/25**	**mar 6/05/25**	**100,00%**	**0,00%**	**100%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
7	**1.2.2**	**Movilizacion de equipos**	**5 días**	**lun 21/04/25**	**lun 28/04/25**	**100,00%**	**0,00%**	**100%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
8	**1.2.3**	**caracterizacion de la via e identificacion de tramos a intervenir**	**20 días**	**lun 21/04/25**	**mar 20/05/25**	**100,00%**	**0,00%**	**100%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
9	**1.3**	**CONSTRUCCION**	**267 días**	**mar 20/05/2**	**sáb 20/06/26**	**5,45%**	**0,61%**	**1%**	**$ 1.622.778.176,84**	**$ 181.228.681,11**
10	**1.3.1**	**MANTENIMIENTO VIAL**	**266 días**	**mar 20/05/2**	**vie 19/06/26**	**5,83%**	**0,50%**	**0%**	**$ 1.445.577.179,89**	**$ 122.958.749,58**
41	**1.3.2**	**FIN MANTENIMIENTO VIAL**	**0 días**	**vie 19/06/26**	**vie 19/06/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
42	**1.3.3**	**PUNTOS CRITICOS**	**266 días**	**mar 20/05/2**	**vie 19/06/26**	**2,86%**	**2,14%**	**2%**	**$ 77.930.179,50**	**$ 58.269.931,53**
109	**1.3.4**	**FIN OBRAS DE PUNTOS CRITICOS**	**0 días**	**vie 19/06/26**	**vie 19/06/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
110	**1.3.5**	**DRENAJES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL**	**266 días**	**mar 20/05/2**	**vie 19/06/26**	**4,63%**	**0,00%**	**0%**	**$ 91.906.820,42**	**$ 0,00**
151	**1.3.6**	**FIN DRENAJES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL**	**0 días**	**vie 19/06/26**	**vie 19/06/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
152	**1.3.7**	**OBRAS DE SEGURIDAD VIAL**	**255 días**	**vie 6/06/25**	**sáb 20/06/26**	**3,13%**	**0,00%**	**0%**	**$ 7.363.997,03**	**$ 0,00**
178	1.3.8	FIN OBRAS DE SEGURIDAD VIAL	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	0,00%	0,00%	0%	$ 0,00	$ 0,00
179	**1.3.9**	**MANTENIMIENTO DE PARADEROS**	**60 días**	**mié 11/02/2**	**mar 12/05/2**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
181	**1.3.10**	**FIN MANTENIMIENTO DE PARADEROS**	**0 días**	**mar 12/05/2**	**mar 12/05/2**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
182	**1.4**	**CIERRE DE CONTRATO**	**0 días**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**	**0,00%**	**0,00%**	**0%**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
183	1.4.1	Acta de entrega final	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	0,00%	0,00%	0%	$ 0,00	$ 0,00
184	1.4.2	Desmovilizacion de equipos	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	0,00%	0,00%	0%	$ 0,00	$ 0,00
185	1.4.3	Fin del proyecto	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	0,00%	0,00%	0%	$ 0,00	$ 0,00

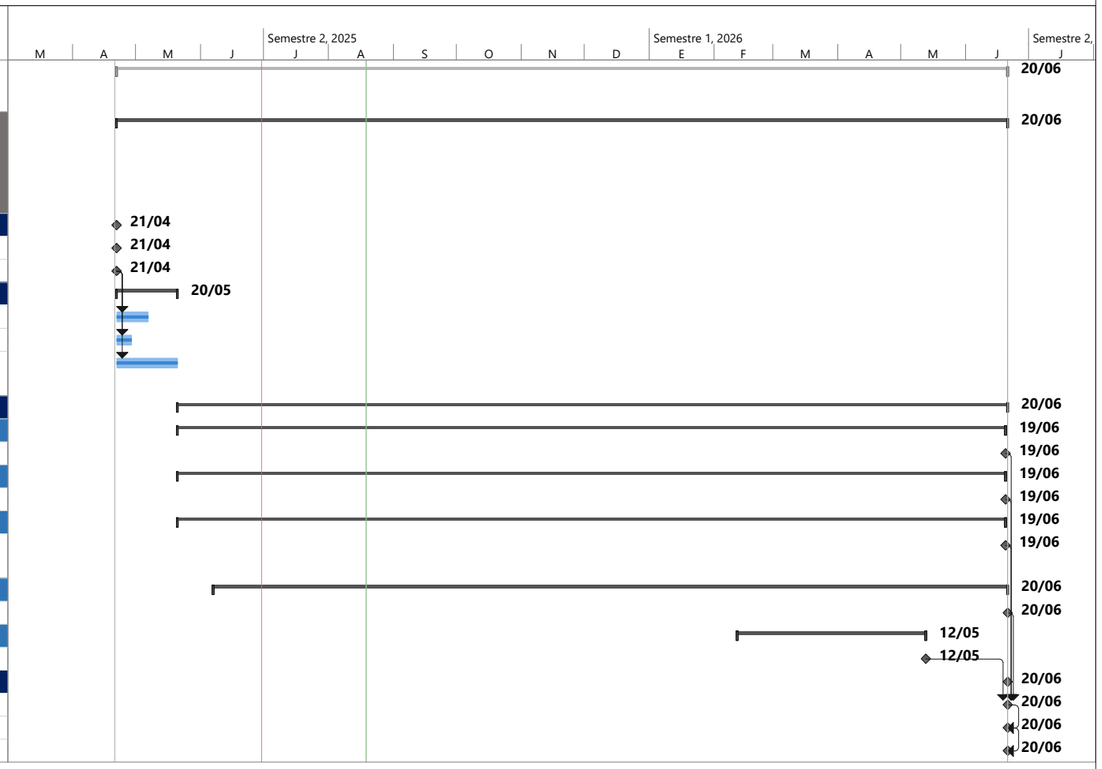

Proyecto: ICCU-245-2025-MTO
Fecha: mar 19/08/25

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		División crítica					
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite		Progreso					
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Tareas críticas		Progreso manual					

ING. PAULA DIAZ
Profesional PMP _____

ING. SUPERVISOR_____
Interventoria

Consorcio SOFAN C-046

ANEXO No 2

CUADRO CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Carrera 13A No 89-38 Oficina 414 Edificio Nippon Center, Bogotá D.C
(57)(1) 5377340 - 311 2412967
admoncto245@sofaningenieria.com

Consorcio SOFAN C-046

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FOR-CO-01
Versión 01

No.	CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	DIRIGIDO A	COMPONENTE RESPONSABLE	ASUNTO	TIPO				ANEXOS O FOLIOS	RESPUESTA	OFICIO DE RESPUESTA
						Ofic.	Fisico	Med. Mag	Correo		RESPONSABLE	
1	FOR-CO-03-ICCU046-001	26/3/2025	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA	SOCIAL	SOLICITID DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION	X			X	1	ARN	OFI25-007138
2	FOR-CO-03-ICCU046-002	12/3/2025	ICCU	ADMINISTRATIVO	CONSULTA SOBRE APLICACIÓN DE IMPUESTO TIMBRE	X			X	2	ICCU	22-04-25 CORREO elericardo@sofaningenieria.com
3	FOR-CO-03-ICCU046-003	18/3/2025	ICCU	ADMINISTRATIVO	RADICACION DE POLIZAS PARA REVISIÓN Y APROBACION	X			X	Poliza de cumplimiento (16 Folios) Poliza RCE (41 folios)	ICCU	08-04-25 CORREO elericardo@sofaningenieria.com
4	FOR-CO-03-ICCU046-004	31/3/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	REMISION DEL CONTRATO DE FIDUCIA PARA REVISIÓN Y APROBACION	X			X	21 Folios	INTERVENTORIA	01-04-25 CORREO elericardo@sofaningenieria.com
5	FOR-CO-03-ICCU046-005	3/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	REMISION DE TARJETA DE FIRMA DEL CONTRATO FIDUCIA PARA SU SUSCRIPCION	X			X	2 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-0593-25
6	FOR-CO-03-ICCU046-006	7/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Remisión Plan de Inversión del Anticipo V1 y Justificación Técnica, Jurídica y Financiera para la Asignación del 40% del Anticipo en la Adquisición de Maquinaria.	X			X	22 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-0650-25
7	FOR-CO-03-ICCU046-007	7/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Solicitud de entrega de estudios y diseños – Contrato ICCU-CTO-245 DE 2025	X			X	2 Folios	INTERVENTORIA	
8	FOR-CO-03-ICCU046-008	7/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST-SOCIAL-AMBIENTAL	Remisión de Programas para el plan de adaptación PAGA (SST-MANEJO AMBIENTAL-SOCIAL)	X			X	Programas + Anexos	INTERVENTORIA	CTT-225-0720-25
9	FOR-CO-03-ICCU046-009	7/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Remisón de solicitud de radicacion ante la ARN	X			X	3 Folios	N/A	N/A
10	FOR-CO-03-ICCU046-010	8/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CALIDAD	Radicación de documentos – Cumplimiento de compromisos adquiridos según Formato 7 del Pliego de Condiciones. (PLAN DE ASEGURAMEINTO DE CALIDAD)	X			X	36 Folios +Anexos	INTERVENTORIA	CTT-225-0748-25
11	FOR-CO-03-ICCU046-011	8/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Radicación Hoja de Vida del Profesional PMP y Contrato de Prestación de Servicios para el Programa de Gerencia de Proyectos.	X			X	Folios + Anexos	INTERVENTORIA	CTT-225-0704-25
12	FOR-CO-03-ICCU046-012	8/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Radicación Análisis de precios unitarios.	X			X	Excel y PDF	INTERVENTORIA	
13	FOR-CO-03-ICCU046-013	7/4/2025	ICCU	ADMINISTRATIVO	Radicación de Pólizas para Revisión y Aprobación V2.	X			X	Poliza de cumplimiento (3 Folios) Poliza RCE (41 folios) Anexos	ICCU	22-04-25 CORREO elericardo@sofaningenieria.com
14	FOR-CO-03-ICCU046-014	8/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	RADICACION Y NOTIFICACION DE POLIZAS	X			X	Poliza de Cumplimiento (3 Folios) Anexo (13 Folios) Poliza RCE (41 Folios)	N/A	N/A
15	FOR-CO-03-ICCU046-015	11/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	METODOLOGIA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	X			X	10 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-0983-25
16	FOR-CO-03-ICCU046-016	14/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Cumplimiento del numeral 27 – Cláusula 9 del Contrato ICCU-CTO-245 de 2025. Respuesta ARN	X			X	1 Folio	N/A	N/A
17	FOR-CO-03-ICCU046-017	15/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Respuesta comunicado CTT-225-0650-25, Atención al oficio FOR-CO-03-006 Remisión Plan de Inversión del Anticipo y justificación Técnica.	X			X	8 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-0686-25
18	FOR-CO-03-ICCU046-018	16/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	REMISION HOJAS DE VIDA PROFESIONALES PARTE 1	X			X	7 Carpetas	INTERVENTORIA	CTT-225-0745-25
19	FOR-CO-03-ICCU046-019	16/4/2025	PEDRO CASTILLO REINA	SOCIAL	SOLICITUD DE PRÉSTAMO AUDITORIO: REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	N/A	SECRETARIA	SOCIAL OK
20	FOR-CO-03-ICCU046-020	21/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Radicación de Acta de Inicio firmada por el contratista	X			X	1 Folio	INTERVENTORIA	N/A
21	FOR-CO-03-ICCU046-021	15/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Respuesta comunicado CTT-225-0686-25, Atención al oficio FOR-CO-03-017 Remisión Plan de Inversión del Anticipo.	X			X	1 Folio	INTERVENTORIA	CTT-225-0700-25
22	FOR-CO-03-ICCU046-022	28/4/2025	ICCU	ADMINISTRATIVO	Solicitud de pago del Anticipo	X			X	25 Folios	N/A	N/A
23	FOR-CO-03-ICCU046-023	24/4/2025	ICCU	ADMINISTRATIVO	Radicación Acta de Inicio – Entrega de original firmado	X			X	1 Folio	N/A	N/A
24	FOR-CO-03-ICCU046-024	24/4/2025	CONCEJO MUNICIPAL	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
25	FOR-CO-03-ICCU046-025	24/4/2025	CONCEJO MUNICIPAL	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
26	FOR-CO-03-ICCU046-026	24/4/2025	ALCALDE ANAPOIMA	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
27	FOR-CO-03-ICCU046-027	24/4/2025	ALCALDE SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
28	FOR-CO-03-ICCU046-028	24/4/2025	ALCALDE DE VIOTA	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
29	FOR-CO-03-ICCU046-029	24/4/2025	TRANSPORTE TEQUENDAMA	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
30	FOR-CO-03-ICCU046-030	24/4/2025	VEEDURIA CIUDADANA	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
31	FOR-CO-03-ICCU046-031	24/4/2025	ALCALDE DEL COLEGIO	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
32	FOR-CO-03-ICCU046-032	24/4/2025	ICCU	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
33	FOR-CO-03-ICCU046-033	24/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
34	FOR-CO-03-ICCU046-034	25/4/2025	ICCU	ADMINISTRATIVO	Remisión de garantías actualizadas conforme al Acta de Inicio	X			X	6 Folios	ICCU	CORREO elericardo@sofaningenieria.com
35	FOR-CO-03-ICCU046-035	25/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta oficio CTT-225-0671-25, traslado indicaciones valla informativa ICCU y manual de uso de logos	X			X	Logos	ICCU	14-05-25 CORREO admoncto245@sofanigenieria.com
36	FOR-CO-03-ICCU046-036	28/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	REMISION PLAN DE GERENCIA DE PROYECTOS	X			X	22 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-0851-25
37	FOR-CO-03-ICCU046-037	28/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-714-25 - Observaciones del Plan de Gestión Social	X			X	31 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-0848-25
38	FOR-CO-03-ICCU046-038	28/4/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Remisión Hoja de vida Profesionales. (Parte 2)	X			X	4 Carpetas	INTERVENTORIA	CTT-225-0745-25
39	FOR-CO-03-ICCU046-039	1/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-720-25 - Observaciones al PG-SST	X			X	60 Folios + 16 Anexos	INTERVENTORIA	CTT-225-0806-25
40	FOR-CO-03-ICCU046-040	6/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta Comunicado CTT-225-725-25 del 25 de abril de 2025, Observaciones al Programa Ambiental (PAGA).	X			X	178 Folios + 18 Carpetas	INTERVENTORIA	CTT-225-0841-25
41	FOR-CO-03-ICCU046-041	5/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CALIDAD	Respuesta Comunicado CTT-225-748-25 del 30 de abril de 2025, Observaciones al Plan de Calidad	X			X	46 Folios + 8 Carpetas	INTERVENTORIA	CTT-225-0914-25
42	FOR-CO-03-ICCU046-042	6/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-0763-25 Solicitud cumplimiento entrega documentos.	X			X	106 Folios + 4 Planos	INTERVENTORIA	CTT-225-0845-25
43	FOR-CO-03-ICCU046-043	7/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-0806-25, SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0039 Observaciones al PG-SST V2.	X			X	60 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-0838-25

44	FOR-CO-03-ICCU046-044	8/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-0745-25, Atención al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-018 y 038 Revisión Hojas de Vida Profesionales	X			X	Diploma Especialización P. Social (1 Folio) Carta de Intención Profesional	INTERVENTORIA	CTT-225-945-25
45	FOR-CO-03-ICCU046-045	9/5/2025	CONCEJO MUNICIPAL	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
46	FOR-CO-03-ICCU046-046	9/5/2025	CONCEJO MUNICIPAL	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
47	FOR-CO-03-ICCU046-047	9/5/2025	ALCALDE ANAPOIMA	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
48	FOR-CO-03-ICCU046-048	9/5/2025	ALCALDE SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
49	FOR-CO-03-ICCU046-049	9/5/2025	ALCALDE DE VIOTA	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
50	FOR-CO-03-ICCU046-050	9/5/2025	TRANSPORTE TEQUENDAMA	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
51	FOR-CO-03-ICCU046-051	9/5/2025	VEEDURIA CIUDADANA	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
52	FOR-CO-03-ICCU046-052	9/5/2025	ALCALDE DEL COLEGIO	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
53	FOR-CO-03-ICCU046-053	9/5/2025	ICCU	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
54	FOR-CO-03-ICCU046-054	9/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	SEGUNDA SOCIALIZACION DE INICIO DE OBRA	X			X	1 Folio	N/A	N/A
55	FOR-CO-03-ICCU046-055	16/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	VALLA INFORMATIVA COMPONENTE SOCIAL	X			X	1 Folio	N/A	N/A
56	FOR-CO-03-ICCU046-056	19/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-871-25	X			X	2 Folios		N/A
57	FOR-CO-03-ICCU046-057	19/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-849-25	X			X	1 Folio Metodologia (9 Folios)	INTERVENTORIA	CTT-225-983-25
58	FOR-CO-03-ICCU046-058	19/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	RE Solicitud de Diseño Def para Aten de Emerg– PR50+822	X			X	2 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-0894-25
59	FOR-CO-03-ICCU046-059	19/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	PMT	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-0853-25 CUMPLIMIENTO ENTREGA DE DOCUMENTOS	X			X	07. PRO-GH-05 ESTRUCTURA ADM DEL PROYECTO V2 (4 Folios) SOAT UQE 280 (1 Folio) SOAT UQE 281 (1 Folio) Carpeta OEB 473 Carpeta Pavimentadora	INTERVENTORIA	CTT-225-946-25
60	FOR-CO-03-ICCU046-060	19/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	REMISION HOJAS DE VIDA PROFESIONALES PARTE 3	X			X	3 CARPETAS	INTERVENTORIA	CTT-225-945-25
61	FOR-CO-03-ICCU046-061	20/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-892-25, Entrega Estudios y Diseños del ICCU.	X			X	1 Folio		N/A
62	FOR-CO-03-ICCU046-0062	20/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-851-25, Atención al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-036 Remisión plan de Gerencia de Proyectos.	X			X	1 Folio 2 anexos	INTERVENTORIA	CTT-225-0984-25
63	FOR-CO-03-ICCU046-0063	21/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	RESPUESTA AL COMUNICADO CTT-225-841-25, Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-OBSERVACIONES AMBIENTAL ENTREGA PAGA V2.	X			X	Paga V3	INTERVENTORIA	CTT-225-0971-26
64	FOR-CO-03-ICCU046-0064	21/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta a solicitud inclusión de apartado presupuesto Plan de Gestión social – Oficio CTT-225-896-25.	X			X	Plan Gestión social (39 folios)	INTERVENTORIA	CTT-225-0848-25
65	FOR-CO-03-ICCU046-0065	22/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	PMT	Remisión PMT actividades de Mantenimiento.	X			X	Informe (20 folios) Planos (4)	INTERVENTORIA	CTT-225-0991-26
66	FOR-CO-03-ICCU046-0066	22/5/2025	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR	TECNICO	Solicitud de información de recurso o cuerpo hídrico en el punto de referencia PR50+625 para iniciar el trámite de Permiso de Ocupación de Cauce POC	X				N/A	CAR	13252005810
67	FOR-CO-03-ICCU046-0067	22/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Remisión de documentos de vehículos, maquinaria pesada y maquinaria menor para revisión y aprobación.	X			X	Carpetas (6 und)	INTERVENTORIA	CTT-225-992-25
68	-	22/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	ACTA DE REUNIÓN - SOCIALIZACION INICIO D OBRA 05-05-2025				X	56 Folios	INTERVENTORIA	N/A
69	FOR-CO-03-ICCU046-0068	22/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Remisión hoja de vida profesional PMP – Solicitud de cambio de profesional asignado	X			X	1 Carpeta	INTERVENTORIA	CTT-225-993-25
70	FOR-CO-03-ICCU046-0069	23/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Solicitud de evaluación para ajuste dimensional del Box culvert – PR50+600.	X			X	N/A	INTERVENTORIA	REUNIÓN CON DISEÑADOR ICCU
71	FOR-CO-03-ICCU046-0070	25/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentación SST personal operativo y administrativo.	X			X	7 Carpetas	INTERVENTORIA	CTT-225-0941-25
72	FOR-CO-03-ICCU046-0071	27/5/2025	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR	AMBIENTAL	Entrega y radicación del programa de Manejo ambiental de Residuos de construcción y Demolición -PMARCD	X	X			1 Carpeta	CAR	13252005810
73	FOR-CO-03-ICCU046-0072	28/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta CTT-225-941-25, y entrega de Entrega documentación SST personal operativo y administrativo	X			X	5 Carpetas	INTERVENTORIA	CTT-225-1016-25
74	FOR-CO-03-ICCU046-0073	28/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Afectaciones en la ejecución por falta de insumos técnicos.	X			X	N/A	INTERVENTORIA	CTT-225-958-25
75	FOR-CO-03-ICCU046-0074	28/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Radicación de documentos de equipos de topografía	X			X	2 Carpetas	INTERVENTORIA	CTT-225-994-25
76	CORREO AMBIENTAL	30/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	RESPUESTA A OBSERVACIONES DESCRIPCION DEL PROYECTO Y FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL POC - BOX PR50+625				X	5 Documentos	INTERVENTORIA	N/A
77	CORREO AMBIENTAL	30/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	RADICACION DEL PMA-RCD DEL CTO ICCU 245 DE 2025				X	1 Documento	INTERVENTORIA	N/A
78	FOR-CO-03-ICCU046-0075	29/5/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-0952-25, Solicitud de señalización puntos críticos.	X			X	N/A	INTERVENTORIA	CTT-225-1028-25
79	FOR-CO-03-ICCU046-0076	3/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Informe social No.1 21 abril al 31 mayo del 2025.	X			X	Informe Social (24 Folios) Anexo (17)	INTERVENTORIA	CTT-225-1014-25
80	FOR-CO-03-ICCU046-0077	4/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Informe SST No.1 21 abril al 31 mayo del 2025.	X			X	Informe SST (22 Folios) Anexo (5)	INTERVENTORIA	CTT-225-1017-25
81	FOR-CO-03-ICCU046-0078	4/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Informe Tecnico No.1 21 abril al 31 mayo del 2025.	X			X	Informe Tecnico(23 Folios) Anexo (6)	INTERVENTORIA	
82	FOR-CO-03-ICCU046-0079	4/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Informe Gerencial No.1 21 abril al 31 mayo del 2025.	X			X	Informe Gerencial (25 Folios) Anexo (2)	INTERVENTORIA	
83	FOR-CO-03-ICCU046-0080	6/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Justificación para la realización de ensayos para obras de estabilización en la Troncal del Tequendama	X			X	2 Folios 2 Anexos	INTERVENTORIA	Respuesta Correo Ing David Tierradentro
84	FOR-CO-03-ICCU046-0081	6/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Entrega informe Mensual Ambiental No 1	X			X	Informe Técnico (25 Folios) Anexo (2)	INTERVENTORIA	CTT-225-1033-25
85	FOR-CO-03-ICCU046-0082	7/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Atención al comunicado Oficio CTT-225-1014-25 Informe mensual social N°1	X			X	Informe Social (25 Folios) Anexo (18)	INTERVENTORIA	CTT-225-1046-25
86	FOR-CO-03-ICCU046-0083	8/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0072 DOCUMENTOS SEGURIDAD SOCIAL	X			X	2 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-1042-25
87	FOR-CO-03-ICCU046-0084	9/6/2025	YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ	AMBIENTAL	SOLICITUD DE RECEPCION DE MATERIAL SOBRANTE RCD	X			X	2 Folios	YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ	

88	FOR-CO-03-ICCU046-0085	9/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Solicitud de mesa de trabajo para planificación de actividades de mantenimiento periódico vía troncal del Tequendama	X			X	2 Folios	INTERVENTORIA	CTT-225-1038-25
89	FOR-CO-03-ICCU046-0086	9/6/2025	JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO	AMBIENTAL	SOLICITUD DE RECEPCION DE MATERIAL SOBRANTE RCD	X			X	2 Folios	JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO	
90	FOR-CO-03-ICCU046-0087	9/6/2025	JUAN ALEJANDRO CASTAÑO GAMEZ	AMBIENTAL	SOLICITUD DE RECEPCION DE MATERIAL SOBRANTE RCD	X			X	2 Folios	JUAN ALEJANDRO CASTAÑO GAMEZ	
91	FOR-CO-03-ICCU046-0088	9/6/2025	JHERSON JAIR NIÑO VEGA	AMBIENTAL	SOLICITUD DE RECEPCION DE MATERIAL SOBRANTE RCD	X			X	2 Folios	JHERSON JAIR NIÑO VEGA	SIM No. 435-2025
92	FOR-CO-03-ICCU046-0089	10/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega de documentos SST personal operativo	X			X	1 Folio 3 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1057-25
93	FOR-CO-03-ICCU046-0090	10/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Se informa sobre los sitios o tramos para los tramites de Permiso de Ocupación de Cauce POC con el ICCU y la AAC.	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
94	FOR-CO-03-ICCU046-0091	11/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1017-25, OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 1 SST	X			X	18 Folios Informe(10 Anexos)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1059-25
95	FOR-CO-03-ICCU046-0092	11/6/2025	SOFAN INGENIERIA SA.S.	ADMINISTRATIVO	ESTADO CAMION PRY 569	X			X	2 Folios	N/A	N/A
96	FOR-CO-03-ICCU046-0093	11/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	RESPUESTA COMUNICADO CTT-225-1009-25	X			X	2 Folios	N/A	N/A
97	FOR-CO-03-ICCU046-0094	11/06/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Respuesta Comunicado CTT-225-1033-25 del 11 de junio de 2025, observaciones al informe mensual ambiental	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
98	-	12/06/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	COMUNICADO-COMPONENTE SOCIAL	X			X	2 Folios 1 Anexo Informe	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Se coordina Mesa de Trabajo
99	FOR-CO-03-ICCU046-0095	12/06/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1057-25 OBSERVACIONES en el radicado FOR-CO-03-ICCU046-0089	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1087-25
100	-	12/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	ACTAS DE VECINDAD K49+000	X			X	Registro Fotografico	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	Observaciones Correo
101	FOR-CO-03-ICCU046-0096	12/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1005-25, Implementación urgente del PMT con reguladores de tráfico – PR 50+625.	X			X	1 Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1088-25
102	FOR-CO-03-ICCU046-0097	13/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Justificación técnica para ensayos de diagnostico y estabilización	X			X	7 Folios (1 Anexo)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
103	FOR-CO-03-ICCU046-0098	13/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	RE CTT-225-958-25 Afectación en la ejecución por la falta de insumos tecnicos	X			X	1 Folio 4 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
104	-	16/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	ACTAS DE VECINDAD K49+000	X			X	1 Anexo	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
105	FOR-CO-03-ICCU046-099	18/06/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Radicación de la programación PDT	X			X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1116-25
106	FOR-CO-03-ICCU046-100	18/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Solicitud de entrega de diseños faltantes – Contrato ICCU-245-2025	X			X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
107	FOR-CO-03-ICCU046-101	19/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Solicitud de aclaración sobre diseño de muro sobre pilotes en PR 49+000	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
108	-	19/6/2025	CAR Corporacion Autónoma Regional CAR Corporacion Autónoma Regional	AMBIENTAL	CONCEPTO PAGO POC				X	N/A	CONSORCIO SOFAN C-046	
109	FOR-CO-03-ICCU046-102	19/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta al comunicado CTT-225-1046-25 Informe Social N°1	X			X	25 Folios 16 Anexos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
110	FOR-CO-03-ICCU046-103	20/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Remisión de Informes de Vía y Caracterización del Terreno	X			X	Informe Sondeos (40 Folios) Informe Auscultación (51 Folios)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
111	FOR-CO-03-ICCU046-104	20/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Alcance comunicado FOR-CO-03-ICCU046-098 del 13 de junio del 2025.	X			X	Informes + Registro fotografico	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
112	FOR-CO-03-ICCU046-105	24/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentos SST, Personal Operativo y administrativo.	X			X	6 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
113	FOR-CO-03-ICCU046-106	24/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1116-25, Radicación de la Programación PDT.	X			X	6 Archivos	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
114	-	24/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Solicitud de acompañamiento técnico - levantamiento de actas de vecindad K41+500				X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
115	FOR-CO-03-ICCU046-107	24/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1059-25, Respuesta informe mensual SST.	X			X	2 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
116	FOR-CO-03-ICCU046-108	25/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentos SST, Personal Operativo y administrativo.	X			X	1 Carpeta	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
117	FOR-CO-03-ICCU046-109	25/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Respuesta comunicado CTT-225-1116-25, Justificación programación (PDT).	X			X	4 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
118	FOR-CO-03-ICCU046-110	25/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Solicitud de ingreso del profesional Carlos Tinoco como inspector de obra y retiro de Pedro José Jaller.	X			X	1 Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
119	FOR-CO-03-ICCU046-111	27/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	PMT	Respuesta comunicado CTT-225-1152-25, Traslado oficio ICCU-S-2025-0004129 Opción de Mejora al Plan de PMT.	X			X	1 Folio	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
120	FOR-CO-03-ICCU046-112		CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL								
121	FOR-CO-03-ICCU046-113	27/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1126-25, Alcance a la comunicación CTT-225-1044-25 y Revisión entrega formal Informe de Medición de deflectometria y condición superficial Troncal Tequendama.	X			X	3 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
122	FOR-CO-03-ICCU046-114	27/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1028-25, Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-075 RE CTT-225-0952-25 Solicitud de señalización puntos críticos.	X			X	2 Folios	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
123	FOR-CO-03-ICCU046-115	30/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Respuesta comunicado CTT-225-1147-25, Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-079 Informe Gerencial.	X			X	Informe de gerebcia 26 folios (3 Anexos)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
124	FOR-CO-03-ICCU046-116	30/6/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Alcance a oficio FOR-CO-03-ICCU046-0109 del 25 de junio del 2025, Remisión de PDT.	X			X	Plan de Trabajo (Project) Flujo de caja y Curvas S	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
125	FOR-CO-03-ICCU046-117	1/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Entrega documentos SST, Personal Operativo y administrativo.	X			X	4 Carpetas	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CTT-225-1198-25
126	FOR-CO-03-ICCU046-118	3/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado CTT-225-1017-25, CTT-225-1059-25, CTT-225-1159-25, OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 1 SST.	X			X	Informe 21 Folios/ Anexo 12	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
127	FOR-CO-03-ICCU046-119	3/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1044-25, Solicitud inicio de trabajos de campo – Presentación de plan de contingencia para subsanar el atraso presentado en el oficio CTT-225-958-25	X			X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
128	FOR-CO-03-ICCU046-120	3/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1150-25, Solicitud de implementación de los cuatro (4) frentes de obra.	X			X	N/A	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
129	FOR-CO-03-ICCU046-121											

130	FOR-CO-03-ICCU046-122	5/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	Respuesta comunicado CTT-225-1124-25, INFORME TÉCNICO N°1 V2.	X			X	Informe Técnico (27 Folios) Anexo (7)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
131	FOR-CO-03-ICCU046-123	5/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICO	INFORME TÉCNICO N° 2.	X			X	Informe Técnico (31 Folios) Anexo (8)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
132	FOR-CO-03-ICCU046-124	5/7/2025	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	INFORME SST No. 2 1 al 30 junio del 2025.	X			X	Informe SST (20 Folios) Anexo (11)	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	
133												

Consorcio SOFAN C-046

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FOR-CO-02
Versión 02

CONSEC.	FECHA RECIBIDO	TIPO			REMITENTE	DIRIGIDO A	ASUNTO	ANEXOS O FOLIOS	REQUIERE RESPUESTA			RESPUESTA	
		OFICIO	MEDIO MAG.	E-MAIL					SI	NO	RESPONSABLE	FECHA	CONSECUTIVO
OFI25-007138	10/4/2025	X		X	AGENCIA PARA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION	SOCIAL	PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACION P REINTEGRACION	1		X			
CTT-225-0593-25	3/4/2025	X			CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0005, REMISION TARJETA FIRMADA CONTRATO FIDUCIA	2		X			
-	8/4/2025			X	ICCU-SINDY OLMOS ALARCON	ADMINISTRATIVO	APROBACION POLIZAS INICIALES DEL CONTRATO	1		X			
-	11/4/2025			X	ICCU-SINDY OLMOS ALARCON	SOCIAL	DOCUMENTOS PARA SOCIALIZACION, MODELO VOLANTE, PIEZA PUBLICITARIA Y PRESENTACION	1	X		KATHERINE GUAYACAN	15/04/2025	RESPUESTA CORREO social245@sofaningenieria.com
CTT-225-0650-25	14/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0006, REMISION PLAN S	2	X		AREA TECNICA (ELEFILETH RICARDO)	21/04/2025	FOR-CO-03-ICCU046-017
CTT-225-0671-25	15/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	TRASLADO INDICACIONES VALLA INFORMATIVA ICCU Y MANUAL DE USO DE LOGOS	2	X		AREA TECNICA (ELEFILETH RICARDO)	25/04/2025	FOR-CO-03-ICCU046-035
CTT-225-0686-25	16/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0017, REMISION PLAN S	2	X		AREA TECNICA (ELEFILETH RICARDO)	24/04/2025	FOR-CO-03-ICCU046-021
-	21/4/2025			X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	REMISION ACTA DE INICIO	1	X		AREA TECNICA (ELEFILETH RICARDO)	21/04/2025	FOR-CO-03-ICCU046-020
CTT-225-0700-25	22/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0021, APROBACION PL	1		X			
CTT-225-0704-25	22/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0011, APROBACION HO	1		X			
-	22/4/2025			X	ICCU-SINDY OLMOS ALARCON	ADMINISTRATIVO	APLICACIÓN DECRETO 0175 DE 2025, IMPUESTO DE TIMBRE	2		X			
-	22/4/2025			X	ICCU-SINDY OLMOS ALARCON	ADMINISTRATIVO	APROBACION POLIZAS CON ACTA DE INICIO	1		X			
CTT-225-0714-25	24/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	OBSERVACIONES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL	2	X		KATHERINE GUAYACAN	12/05/2025	RESPUESTA CORREO social245@sofaningenieria.com
CTT-225-0720-25	25/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0008 OBSERVACIONES AL PG SST	1		X			
CTT-225-0723-25	25/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	OBSERVACIONES OFICIO Y VOLANTE DE CONVOCATORIA REUNION DE IN	1	X		KATHERINE GUAYACAN	25/04/2025 V1 Y 27/04/2025 V2	Correo electronido V1 / FOR-CO-03-ICCU046-018 V2
-	28/4/2025			X	VRC INGENIERIA	TECNICA	REMISION PMT ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	Informe - Planos (4)	X		TECNICA	28/04/2025	RESPUESTA CORREO elericardo@sofaningenieria.com
-	29/4/2025			X	VRC INGENIERIA	TECNICA	REMISION PMT ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO V2	Informe - Planos (4)	X		ELEFILETH RICARDO	22/05/2025	RESPUESTA CORREO elericardo@sofaningenieria.com
-	30/4/2025			X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	REMISION DE TRAFICO NUEVO SALTO 2024	1		X			
CTT-225-0725-25	25/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0008 OBSERVACIONES AMBIENTAL ENTREGA PAGA	4	X		FRANCISCO RAMIREZ	6/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-040
CTT-225-0733-25	28/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	REMISION PIEZAS DE CONVOCATORIA REUNION DE INICIO	1	X		KATHERINE GUAYACAN	24/04/2025	FOR-CO-03-ICCU046-024 a 033
-	29/4/2025			X	ICCU-SINDY OLMOS ALARCON	SOCIAL	APROBACION VOLANTE SOCIALIZACION INICIO DE OBRA	1		X			
-	29/4/2025			X	ICCU-MARIA RODRIGUEZ ROZO	SOCIAL	SOLICITUD REGISTRO FOTOGRAFICO PARA VALLA	1	X		ELEFILETH RICARDO	2/05/2025	RESPUESTA CORREO elericardo@sofaningenieria.com
CTT-225-0748-25	30/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	CALIDAD	OBSERVACIONES AL PLAN DE CALIDAD	2	X		ADMINISTRATIVO	6/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-046
CTT-225-0749-25	25/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	CONCEPTO RECORRIDO INICIAL TRONCAL TEQUENDAMA	17		X			
CTT-225-0763-25	30/4/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	SOLICITUD CUMPLIMIENTO ENTREGA DOCUMENTOS	1	X		ADMINISTRATIVO	6/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-042
-	5/5/2025			X	ALCALDIA MUNICIPAL EL COLEGIO	SOCIAL	SOLICITUD DE SOCIALIZACION EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO	1	X		KATHERINE GUAYACAN	6/05/2025	RESPUESTA CORREO social245@sofaningenieria.com
CTT-225-0745-25	6/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-018 Y 038 REVISION HOJAS DE VIDA PROFESIONALES	11	X		ELEFILETH RICARDO	13/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-044
CTT-225-0806-25	7/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0039 OBSERVACIONES AL PG SST V3	1	X		MARCELA PINTO	7/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-043
	12/5/2025			X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	REMISION DISEÑOS INTERVENCION K50+500	2	X		JULIO CESAR BOGOTA	19/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-058
CTT-225-0838-25	13/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	RESPUESTA COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0043 OBSERVACIONES AL PG SST V3	1		X			
CTT-225-0845-25	13/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	RESPUESTA COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0042 REVISION ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL	1		X			
CTT-225-0841-25	13/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-046 OBSERVACIONES AMBIENTAL ENTREGA PAGA V3	1	X		FRANCISCO RAMIREZ	21/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0063
CTT-225-0843-25	14/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	SOLICITUD ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	2		X			
CTT-225-0848-25	14/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	APROBACION PLAN DE GESTION SOCIAL	1		X			
CTT-225-0849-25	14/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-015 METODOLOGIA DE EJECUCION DEL CONTRATO	1	X		JULIO CESAR BOGOTA	19/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-057
CTT-225-0851-25	14/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-035 REMISION PLAN DE GERENCIA DE PROYECTOS	1	X		CRISTIAN GRIMALDOS	20/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0062
CTT-225-0671-25	14/5/2025	X		X	ICCU-MARIA RODRIGUEZ ROZO	SOCIAL	VALLA CON MEDIDA CORRESPONDIENTE SEGÚN DECRETO 00234 DE 200	1	X		KATHERINE GUAYACAN	11/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0093
CTT-225-0853-25	14/5/2025	X		X	ICCU-MARIA RODRIGUEZ ROZO	TECNICA	ATENCION AL OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-042 CUMPLIMIENTO ENTREGA DOCUMENTOS	1	X		ELEFILETH RICARDO	19/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0059
CTT-225-0871-25	16/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	GESTION VACANTES SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE CUNDINAMARCA	1	X		KATHERINE GUAYACAN	19/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-056
CTT-225-0892-25	19/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ICCU	5 Planos	X		JULIO CESAR BOGOTA	20/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-061
CTT-225-0893-25	19/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	ENTREGA DE CONCEPTO DE INTERVENTORIA ALCANTARILLA PR50+622	Informe - Documentos		X			
CTT-225-0894-25	19/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	Traslado oficio FOR-CO-03-ICCU046-058 Solicitud de Diseño Definitivo para A	1		X			
CTT-225-0896-25	20/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	INCLUSION APARTADO DE PRESUPUESTO EN PLAN DE GESTION SOCIAL	1	X		KATHERINE GUAYACAN	21/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0064
CTT-225-0905-25	21/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud de desglose y discriminación de AIU.	1	X		ELEFILETH RICARDO		
CTT-225-0914-25	28/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Atención al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-0041-Ajuste plan de calidad	1	X		ELEFILETH RICARDO	4/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0041
CTT-225-0918-25	23/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	Valla punto de atención a la comunidad Contrato 245- 2025	1	X		ICCU	4/06/2025	comunicacionesiccu@gmail.com
CTT-225-0938-25	27/5/2025	X		X	ICCU	ICCU	Entrega Plan de Gestión Social	Plan Gsocial		X			
CTT-225-0941-25	27/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0070_ Entrega documentacion S	1	X		ADRIANA ZARATE	28/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0072
CTT-225-0942-25	27/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Traslado REDISEÑO BOX CULVERT TRONCAL DEL TEQUENDAMA PR50+62	Diseños		X			
CTT-225-0945-25	28/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Atención al oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0044 y 0060 Revisión Hojas d	16 Folios		X			
CTT-225-0946-25	28/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Respuesta comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0059 , CUMPLIMIENTO ENTREGA DE DOCUMENTOS	1 Folio		X			
CTT-225-0947-25	28/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	Radicacion SG-SST emitido por le contratista y aprobado por interventoria	Plan GSST		X			
CTT-225-0952-25	28/5/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud de señalización puntos criticos	3 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA	29/05/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0075
1325200581O	29/5/2025	X		X	CORPORACIÓN AUTÒNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR	AMBIENTAL	Respuesta al radicado 132510000715: Solicitud de informacion de fuente hidric	10 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ	28/05/2025	Correo electronido ambiental@sofaningenieria.com
CTT-225-0958-25	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-073 Afectaciones en la ejecución por fa	5 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA	13/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0098
CTT-225-0983-25	5/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ADMINISTRATIVO	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-057 RE CTT-225-0849-25 METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO V3	1 Folio		X			
CTT-225-0984-25	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-060 RE CTT-225-0851-25 Remisión pla	1 Folio		X			
CTT-225-0971-26	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Aprobación del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA V3	1 Folio		X			
CTT-225-0972-26	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	Entrega del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA V3	1 Folio		X			
CTT-225-0991-26	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	PMT	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-065 Aprobación PMT ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	1 Folio		X			
CTT-225-992-25	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	MAQUINARIA Y EQUIPOS	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-067 Remisión Maquinaria y equipos	1 Folio		X			
CTT-225-993-25	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-068 Remisión cambio HV Profesional	2 Folios		X			
CTT-225-994-25	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	MAQUINARIA Y EQUIPOS	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-074 Radicación documentos Equipo de	1 Folio		X			
CTT-225-995-25	4/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	Entrega de informe Técnico PR50+625	1 Folios 1 Anexo		X			
CTT-225-1005-25	5/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	PMT	Implementación urgente del PMT con reguladores de tráfico – PR 50+625	2 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA	12/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0096
CTT-225-1009-25	5/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Cumplimiento instalacion Valla informativa	1 Folio	X		KATHERINE GUAYACAN	11/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0093
CTT-225-1014-25	6/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta FOR-CO-03-ICCU046-0076 - Observaciones Informe Social No 1	3 Folios	X		KATHERINE GUAYACAN	7/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0082
CTT-225-1016-25	7/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0072 DOCUMENTOS SEGURIDAD SOCIAL	1 Folio	X		ADRIANA ZARATE	8/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0083
CTT-225-1017-25	7/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU046-0077 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 1 SST	1 Folio+ Informe	X		ADRIANA ZARATE	11/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0091
CTT-225-1028-25	9/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-075 RE CTT-225-0952-25	2 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA	27/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-114
CTT-225-1031-25	9/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	Entrega Plan de Calidad	1 Folio		X			
CTT-225-1033-25	11/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0081 observaciones al informe	1 Folio	X		FRANCISCO RAMIREZ	11/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0094

CTT-225-1038-25	9/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-085 Solicitud de mesa de trabajo	1 Folio		X			
CTT-225-1042-25	10/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0083 ALCANCE DOCUMENTOS SEGURIDAD SOCIAL	1 Folio		X			
CTT-225-1044-25	9/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud inicio de trabajos de campo + Presentacion de plan de contingencia	1 Folio	X		JULIO CESAR BOGOTA	3/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-119
CTT-225-1046-25	10/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Respuesta FOR-CO-03-ICCU046-0082 - Observaciones Informe Social No 1	2 Folios	X		KATHERINE GUAYACAN	19/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-102
CTT-225-1049-25	11/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	ENTREGA PMT	1 Folio 2 Anexos		X			
CTT-225-1057-25	12/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0089 Entrega de documentación SST personal operativo	1 Folio	X		ADRIANA ZARATE	12/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0095
CTT-225-1059-25	12/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0091 Respuesta informe mensual 1 SST	1 Folio	X		ADRIANA ZARATE	24/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-107
CTT-225-1066-25	16/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Aprobación del informe mensual Ambiental No.1 del contratista	1 Folio		X			
CTT-225-1087-25	17/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0095 Entrega de documentación SST personal operativo	1 Folio		X			
CTT-225-1088-25	17/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-096 RE CTT-225-1005-25 Implementación urgente del PMT – PR 50+625.	2 Folios		X			
CTT-225-1116-25	19/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0099 – Solicitud de reprogramac	3 Folios	X		CRISTIAN GRIMALDOS	24/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-106
CTT-225-1120-25	19/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Reiteración solicitud de información – puntos de intervención con requerimient	1 Folio	X		ELEFILETH RICARDO	10/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-0090
CTT-225-1126-25	24/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Alcance a la comunicación CTT-225-1044-25 y Revisión entrega formal informe de Medición de deflectometría y condición superficial Troncal	5 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA	27/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-113
CTT-225-1146-25	24/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-0078 INFORME TECNICO N°1	2 Folios	X		YEISON GARAVITO	5/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-122
CTT-225-1147-25	24/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	GERENCIA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-079 Informe Gerencial	1 Folio	X		CRISTIAN GRIMALDOS	3/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-115
CTT-225-1148-25	25/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	ICCU	Traslado oficio FOR-CO-03-ICCU046-100 Solicitud Entrega Diseños	3 Folios		X			
CTT-225-1150-25	25/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Solicitud de implementación de los cuatro (4) frentes de obra	2 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA	3/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-120
CTT-225-1152-25	25/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	PMT	Traslado oficio ICCU-S-2025-0004129 Opción de Mejora al plan de PMT	4 Folios		X	ELEFILETH RICARDO	27/06/2025	FOR-CO-03-ICCU046-111
CTT-225-1149-25	25/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Atención al oficio FOR-CO-03-ICCU046-101 Diseño de muro sobre pilotes en	1 Folio		X			
CTT-225-1159-25	26/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0107 Respuesta informe mensual SST #1 V3	2 Folios	X		ADRIANA ZARATE	3/07/2025	FOR-CO-03-ICCU046-118
CTT-225-1160-25	26/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicados FOR-CO-03-ICCU046-0105 y FOR-CO-03-ICCU046-0108 Documentación personal	1 Folio		X			
CTT-225-1161-25	25/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST-SOCIAL	Observaciones recolectadas durante recorrido	3 Folios	X		ADRIANA ZARATE/KATHERIN		
CTT-225-1174-25	27/6/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	AMBIENTAL	Solicitud de observaciones de campo frente a la gestión ambiental.	2 Folios	X		FRANCISCO RAMIREZ		
CTT-225-1198-25	3/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SST	Respuesta comunicado FOR-CO-03-ICCU046-0117	1 Folio		X			
CTT-225-1199-25	3/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	TECNICA	Revisión Mutp PR48+900	17 Folios	X		JULIO CESAR BOGOTA		
CTT-225-1213-25	4/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Atención oficio FOR-CO-03-ICCU046-0102 Aprobación informe mensual	1 Folio		X			
CTT-225-1214-25	4/7/2025	X		X	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 49	SOCIAL	Solicitud reporte situación ocurrida el 03 de julio del 2025 con la comunidad.	1 Folio	X		KATHERINE GUAYACAN		
SIM No. 435-2025	4/7/2025	X		X	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	AMBIENTAL	RE SOFAN-FOR-CO-03-ICCU046-088 de fecha 9 de junio de 2025	1 Folio		X			

ANEXO No 3

PLANTILLA DE SEGUIMIENTO

Carrera 13A No 89-38 Oficina 414 Edificio Nippon Center, Bogotá D.C
(57)(1) 5377340 - 311 2412967
admoncto245@sofaningenieria.com

Consorcio SOFAN C-046

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL PROYECTO
FOR-ADM-18
Versión 1

CONTRATO: ICCU-CTO-245 DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN

MES 2 **PERIODO:** 1 JUNIO 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD	Indicador 1	Indicador 2	Resultado	ESTADO	OBSERVACIONES
Técnico	% rendimiento = % ejecutado / % planeado	%	0,61%	5,45%	11,2%		
Técnico	% rendimiento mes = % Ejecutado mes / % planeado mes	%	0,61%	5,45%	11,2%		
Técnico	Indice de ejecucion del programa (IEP = CPTR / CPTP)	%	181,23	1622,78	0,11		
Técnico	% Variacion= % ejecutado - % Programado	%	0,61%	5,45%	-4,84%		
Financiero mes	presupuesto ejec. mes / presupuesto prog. Mes	$	$ 181.228.681,11	$ 1.622.778.176,83	0,11		
financiero acumulado	presupuesto ejec. acum / presupuesto prog. Acum.	$	$ 181.228.681,11	$ 1.622.778.176,83	0,11		
facturacion	presupuesto facurado / presupuesto ejecutado.	$	$ -	$ 181.228.681,11	0,00		
amortizacion anticipo	anticipo amortizado / anticipo entregado	$	$ -	$ -	0,0%		
Administrativo	Disponibilidad de personal clave	%	100%	95%		Parcial	Algunos perfiles en proceso de vinculación.
Administrativo	Cumplimiento del cronograma de entregables	%	100%	100%		Cumplido	Entregables cumplidos conforme a cronograma.

COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD	PROGRAMADO	AVANCE	AVANCE ACUMULADO	ESTADO	OBSERVACIONES
AMBIENTAL			**6,75**	**6,75**	**24,60**		
COMPONENTE SOCIAL		%	**5,30**	**5,30**	**31,31**		
COMPONENTE SST		%	**6,70**	**6,70**	**19,64**		
PMT		%	**3,57**	**3,57**	**57,14**		
Legal	**Radicación de informes y obligaciones legales**	**%**	**7,14**	**7,14**	**14,29**	**Cumplido**	**Informes entregados en forma y tiempo.**

FECHA DE INFORME **29/06/2025**

CONTRATO **MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIÓDICAS CONTENCIÓN**

Consorcio SOFAN C-046

		PROGRAMADO				EJECUCION				INDICADORES			
		TOTAL CONTRATO				TOTALES					VARIACION	IEP	IEC
No.	FECHA	$ 29.791.174.841,00		CPTP(Millones)	% PROG.	SEMANA	ACUMULADO	CPTR (Millones)	% EJEC	CRTR	% EJEC - % PROG.	CPTR/CPTP	CPTR/CRTR
		semana	acumulado										
Semana 1	25/05/2025	$ 24.990.824,95	$ 24.990.824,95	24,99	0,08%	$ 12.500.000,00	$ 12.500.000,00	12,50	0,04%	11,875	-0,04%	0,50	1,05
Semana 2	1/06/2025	$ 128.389.189,85	$ 153.380.014,80	153,38	0,51%	$ 11.908.566,40	$ 24.408.566,40	24,41	0,08%	23,1881381	-0,43%	0,16	1,05
Semana 3	8/06/2025	$ 113.862.825,47	$ 267.242.840,27	267,24	0,90%	$ 39.205.028,04	$ 63.613.594,44	63,61	0,21%	60,4329147	-0,68%	0,24	1,05
Semana 4	15/06/2025	$ 197.605.612,71	$ 464.848.452,98	464,85	1,56%	$ 39.205.028,04	$ 102.818.622,48	102,82	0,35%	97,6776914	-1,22%	0,22	1,05
Semana 5	22/06/2025	$ 642.735.048,38	$ 1.107.583.501,36	1.107,58	3,72%	$ 39.205.028,04	$ 142.023.650,52	142,02	0,48%	134,922468	-3,24%	0,13	1,05
Semana 6	29/06/2025	$ 515.194.675,47	$ 1.622.778.176,83	1.622,78	5,45%	$ 39.205.030,59	$ 181.228.681,11	181,23	0,61%	172,167247	-4,84%	0,11	1,05
Semana 7	6/07/2025	$ 649.397.829,96	$ 2.272.176.006,79	2.272,18	7,63%								
Semana 8	13/07/2025	$ 229.136.656,57	$ 2.501.312.663,36	2.501,31	8,40%								
Semana 9	20/07/2025	$ 111.596.447,18	$ 2.612.909.110,54	2.612,91	8,77%								
Semana 10	27/07/2025	$ 108.146.607,75	$ 2.721.055.718,29	2.721,06	9,13%								
Semana 11	3/08/2025	$ 108.195.561,34	$ 2.829.251.279,63	2.829,25	9,50%								
Semana 12	10/08/2025	$ 161.463.987,87	$ 2.990.715.267,50	2.990,72	10,04%								
Semana 13	16/08/2025	$ 239.904.783,80	$ 3.230.620.051,30	3.230,62	10,84%								
Semana 14	24/08/2025	$ 159.470.508,18	$ 3.390.090.559,48	3.390,09	11,38%								
Semana 15	31/08/2025	$ 167.181.520,02	$ 3.557.272.079,50	3.557,27	11,94%								
Semana 16	7/09/2025	$ 166.726.148,84	$ 3.723.998.228,34	3.724,00	12,50%								
Semana 17	14/09/2025	$ 166.726.148,84	$ 3.890.724.377,18	3.890,72	13,06%								
Semana 18	21/09/2025	$ 924.423.858,54	$ 4.815.148.235,72	4.815,15	16,16%								
Semana 19	28/09/2025	$ 979.486.092,69	$ 5.794.634.328,41	5.794,63	19,45%								
Semana 20	5/10/2025	$ 1.013.712.033,24	$ 6.808.346.361,65	6.808,35	22,85%								
Semana 21	12/10/2025	$ 975.233.706,86	$ 7.783.580.068,51	7.783,58	26,13%								
Semana 22	19/10/2025	$ 143.427.117,65	$ 7.927.007.186,16	7.927,01	26,61%								

FECHA DE INFORME **29/06/2025**

CONTRATO

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDAD PERIÓDICAS Y DE CONTENCIÓN

Consorcio SOFAN C-046





