Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras
1		**MURO IPC**	**60 días**	
2		**PRELIMINARES**	**50 días**	
3		inicio	0 días	
4		LOCALIZACION Y REPLANTEO APARATO TOPOGRAFICIO	2 días	3
5		EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO 0 A 2 MTS	5 días	8
6		EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO 2 A 4 MTS	5 días	5
7		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	2 días	6
8		DEMOLICION DE MURO D0BLE E= 0.25 M	5 días	4
9		BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI E=0.05M	8 días	7
10		CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS	8 días	9
11		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	4 días	14
12		**CONCRETOS Y ACERO**	**43 días**	
13		CONCRETO (4000 PSI - 27,6 MPA) ESTRUCTURAS	10 días	15CC+5 días
14		CONCRETO MURO DE CONTENCION E DE 4000 PSI INCLUYE FORMALETA	10 días	13;15CC+10 días
15		ACERO FIGURADO 60000 PSI	15 días	9FC-6 días
16		GEODREM PLANAR H=2.0 D=100MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	10 días	6
17		ANDEN EN CONCRETO E=0,10 (INCLUYE NIVELACIÓN)	6 días	18FC-2 días
18		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	6 días	11

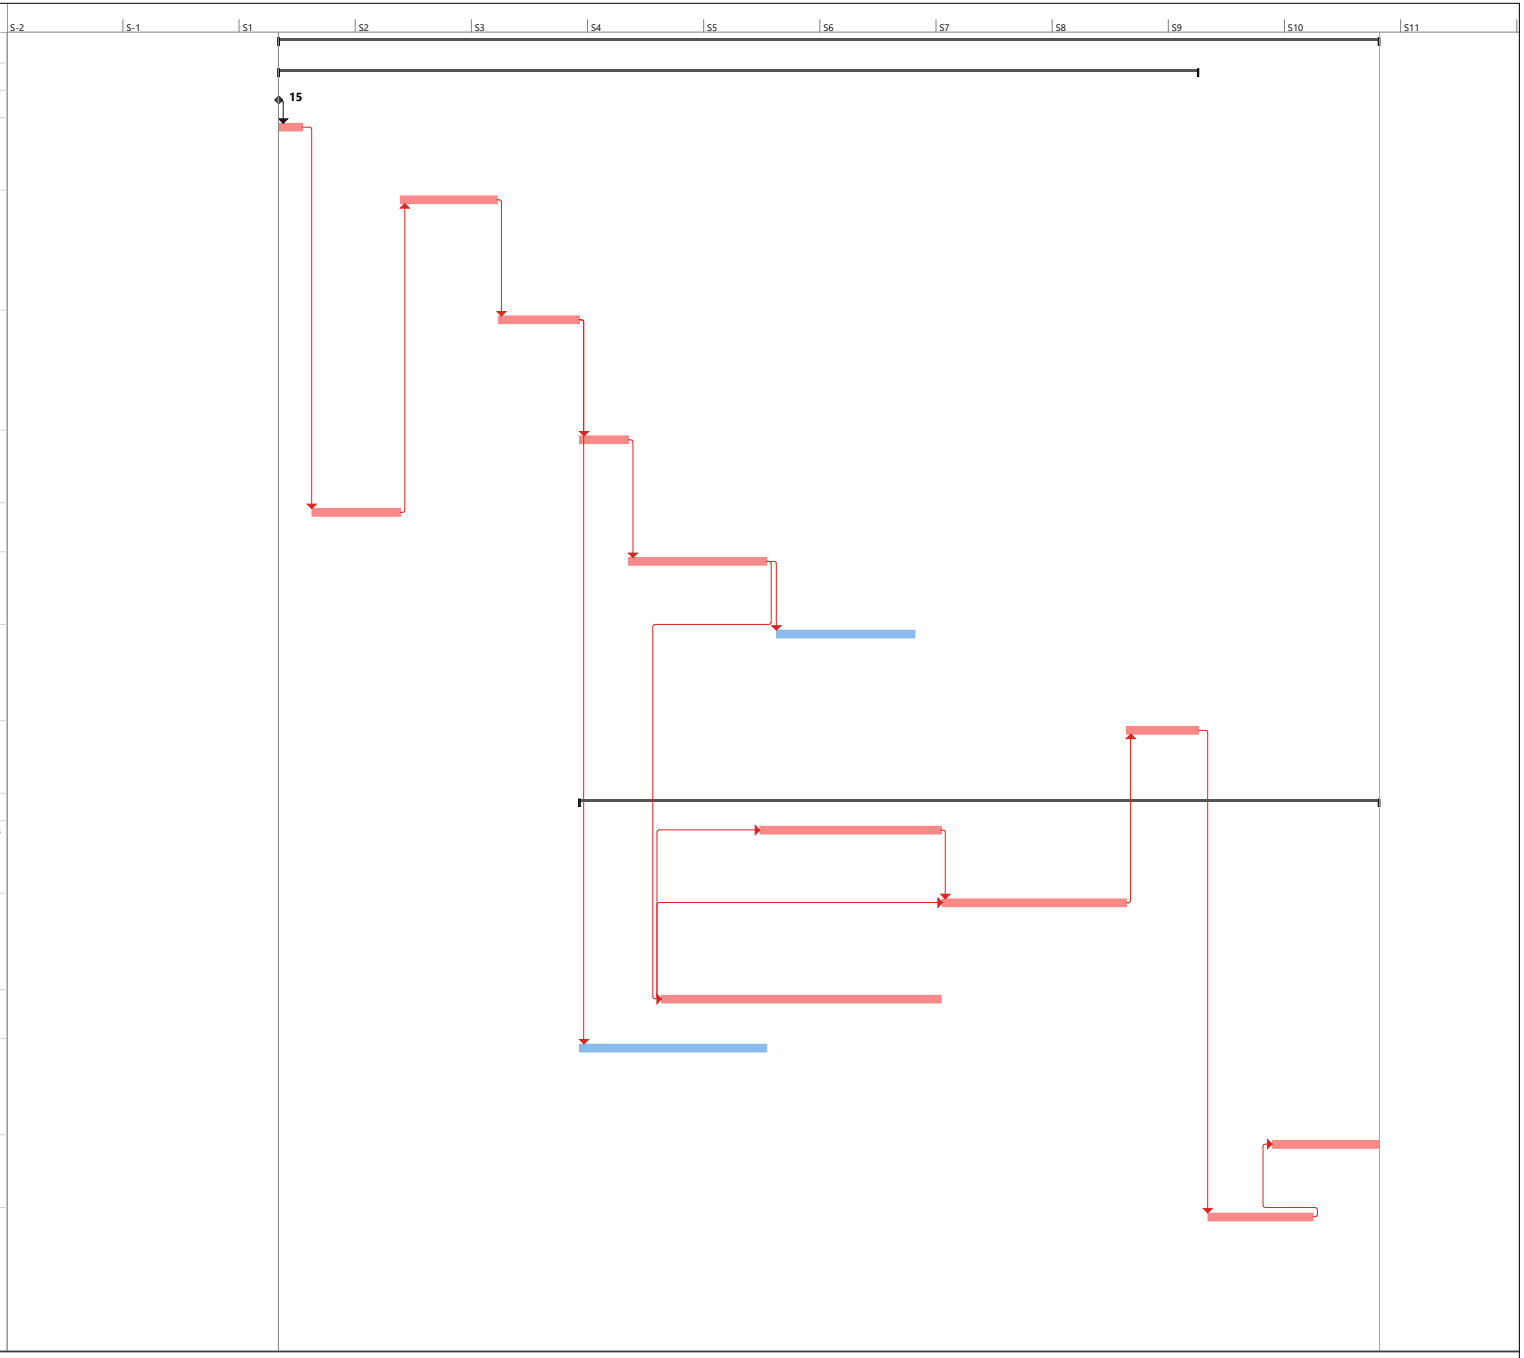

Proyecto: PROGRAMACION IPC
Fecha: mar 15/07/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
