
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
1		**PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PERMANENTE CENTRAL UBICADA EN LA CALLE 21 CON CARRERA 3.**	**34 días**
2		**PRELIMIANARES**	**14 días**
3		DESMONTE APARATOS SANITARIOS	2 días
4		DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	3 días
5		EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2 MTS EN SECO	3 días
6		DEMOLICION ESTRUCTURA CONCRETO CICLOPE	4 días
7		CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	2 días
8		**CONCRETOS**	**22 días**
9		CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M, PARA SOLADO DE LIMPIEZA Y SELLO DE CORTES EN CONCRETO EXISTENTE.	3 días
10		CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS (SIN REFUERZO)	6 días
11		CONCRETO 3000 PSI PARA VIGA AEREA (SIN REFUERZO)	5 días
12		CONCRETO 3000 PSI PARA VIGA DE CIMENTACION (SIN REFUERZO)	5 días
13		CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI PARA ZAPATA DE CIMENTACION (SIN REFUERZO)	3 días
14		**ACERO DE REFUERZO**	**12 días**
15		ACERO DE REFUERZO Fy: 4.200	12 días
16		**MANPOSTERIA**	**6 días**
17		MURO EN LADRILLO	3 días
18		PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 - 2 CM	3 días
19		**RED HIDROSANITARIA**	**8 días**
20		RELLENO CON MATERIAL TIPO 1 PARA ATRAQUE DE TUBERIA	2 días
21		SALIDA SANITARIA PVC-S Ø6"	3 días
22		RED SANITARIA PVC-S Ø6"	3 días
23		CAJAS DE INSPECCIÓN 60x60 EN CONCRETO f´c=210 psi	2 días
24		**BATERIA SANITARIA**	**3 días**
25		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ULTRA BLANCO	3 días
26		**CUBIERTA**	**10 días**
27		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ETERNIT ONDULADA P7 FIBROCEMENTO	10 días
28		**OBRA BLANCA**	**5 días**
29		VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE A 3 MANOS	5 días

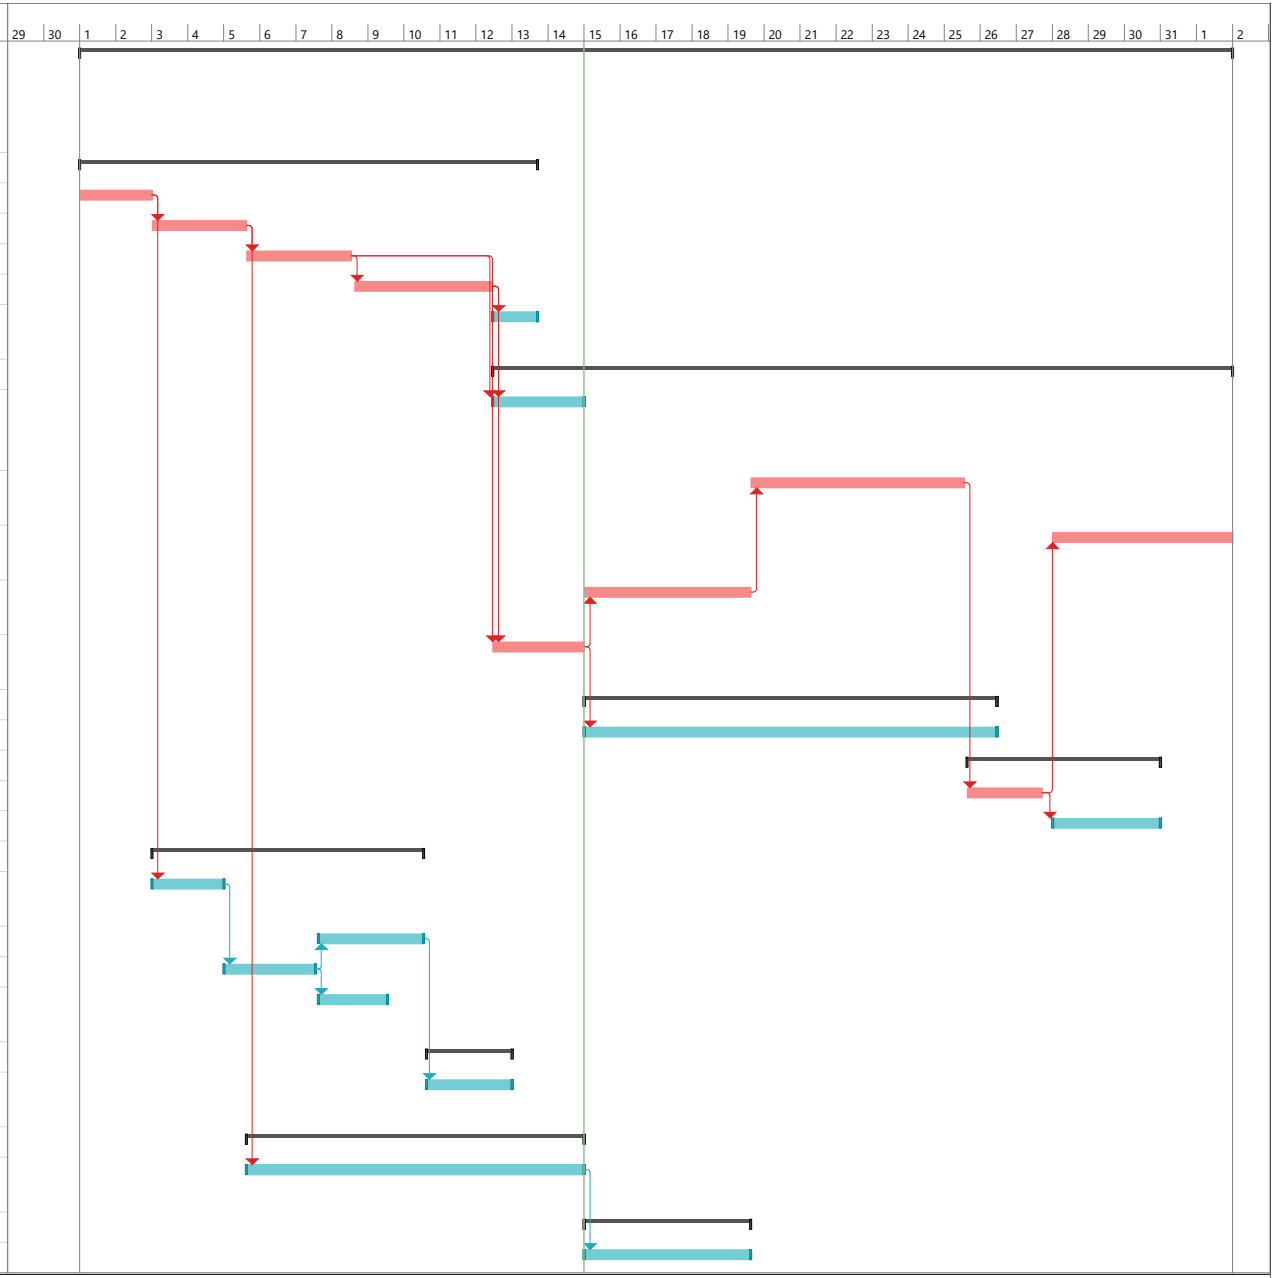

Proyecto: permanente
Fecha: mar 15/07/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
