MEDELLIN, 2025/09/23 4:46:03
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
Radicado No. 2025013385
Observación :&
Recibió : JUAN ESTEBAN CONGOTE RAMIREZ
Remitente : Ramiro Alexander Tuberquia Gomez
Destinatario : Daniel Alexander Perez Rojas

TERMINALES medellín Un viaje de cosas buenas

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín,

20250924133142161103833O
COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS
Septiembre 24, 2025 13:31
Radicado 00-038330

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá

Señor
DANIEL ALEXANDER PÉREZ ROJAS
Asesor
Dirección General
Supervisor del contrato N° 133 de 2024
Conmutador 57 (4) 385 6000 Ext. 703
www.metropol.gov.co
ÁREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ

Referencia: Sistema de bicicletas públicas del Área Metropolitana – EnCicla

Asunto: Presentación de ***"Informe de ejecución del mes de "JULIO" del contrato Interadministrativo N° 133 de 2024***

Periodo del Informe: 01 de julio al 31 de julio de 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente y de manera atenta, **TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.**, se permite allegar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el informe del asunto.

Quedo atento a cualquier inquietud.

RAMIRO ALEXANDER TUBERQUIA GÓMEZ
Asesor de Convenios y Proyectos
TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN
Teléfono: 4448020 Ext.: 166
conveniosyproyectos@terminalesmedellin.com
www.terminalesmedellin.com

Función	*Nombre y cargo*	*Firma*
Proyectó	Edwin Alonso Morales –Director administrativo de EnCicla	
	Sandra Milena Torres Rodas – Profesional Universitario contador de EnCicla	
	Valentina Orjuela Velásquez- Apoyo EnCicla	
Revisó	Edgardo Pérez Cano- Abogado Convenios y Proyectos	

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com

Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

Vb. Ruby &
Movilidad.
Anexo: 21 folios

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 133 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: JULIO
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE:	ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
NIT	890.984.423-3
CONTRATISTA:	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S. A
NIT:	890.919.291-1
REPRESENTANTE LEGAL:	OVIDIO ANTONIO BUITRAGO SIERRA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.571.785
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
VALOR INICIAL:	NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (9.806.828.427), INCLUIDA LA COMISIÓN PACTADA A TÍTULO DE HONORARIOS Y EL IVA DEL VALOR DE LOS HONORARIOS
ADICIONES:	**MODIFICACIÓN N°2.** SUSCRITA EL 11 DE MARZO DE 2025 POR VALOR DE **TRES MIL OCHENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($3.080.551.334)** **MODIFICACIÓN N°3.** SUSCRITA EL 26 DE JUNIO DE 2025 POR VALOR DE DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L. ($2.288.687.229)
VALOR MÁS ADICIONES:	**QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/L.** ($15.176.066.990)
DURACIÓN INICIAL:	HASTA OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
AMPLIACIONES:	**MODIFICACIÓN N°1.** SUSCRITA EL 17 DE DICIMBRE DE 2024 POR DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS **MODIFICACIÓN N°2.** SUSCRITA EL 11 DE MARZO DE 2025. POR TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS. **MODIFICACIÓN N°3.** SUSCRITA EL 26 DE JUNIO DE 2025. POR TRES (3) MESES
SUSPENSIONES:	NA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DIECISIETE (17) MESES
FECHA DE INICIO:	30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO ISO 37001 COMPROMISO PENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C Nº 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

1. INFORME TÉCNICO:

En cumplimiento al alcance del objeto del contrato Interadministrativo **No 133 de 2024,** para la operación integral del programa de EnCicla del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a continuación, se detallan las actividades y avances que se ha tenido durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de julio de 2025.

Distribución por municipios.

Para el mes de julio de 2025 la distribución de la prestación del servicio del sistema Encicla en los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se dio de la siguiente manera:

TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLÍN S.A.						
CONTRATO 133-2024						
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR MUNICIPIO						
PERIODO DE JULIO DE 2025						
MUNICIPIO	**MANUAL**	**AUTOMÁTICA**	**ELÉCTRICA**	**MIXTA**	**TOTAL GENERAL**	**PARTICIPACIÓN**
BARBOSA	0	2	0	0	2	1,56%
BELLO	2	4	0	0	6	4,69%
CALDAS	0	3	0	0	3	2,34%
COPACABANA	0	2	0	0	2	1,56%
ENVIGADO	0	13	0	0	13	10,16%
GIRARDOTA	0	3	0	0	3	2,34%
ITAGUI	0	10	0	0	10	7,81%
LA ESTRELLA	0	2	1	0	3	2,34%
MEDELLIN	14	56	3	3	76	59,38%
SABANETA	1	8	0	1	10	7,81%
TOTAL GENERAL	**17**	**103**	**4**	**4**	**128**	**100%**

Administración eficiente del sistema de bicicletas públicas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá – EnCicla

Las principales actividades dentro de este componente son:

1. Atender reuniones quincenales y mensuales con la supervisión para conocer el estado actual del contrato.
2. Garantizar la entrega de informes gerenciales cada que sean solicitados por la supervisión con el fin de tener un conocimiento constante de la ejecución del contrato.
3. Garantizar la prestación directa del servicio de balance de carga.

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440061
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

Personal de apoyo operativo.

Para el mes de **julio** se evidencia en la ejecución del contrato que la Corporación Balboa realizó los respectivos pagos de los salarios del personal asociado al proyecto bajo su cargo, así como las respectivas prestaciones sociales y las liquidaciones del personal retirado del proyecto.

Se presentaron 3 personas nuevas vinculadas al proyecto, de igual manera se presentó el retiro de nueve (9) personas.

PERSONAL ENCICLA JULIO				
TOTAL, APROBADOS POR MANDANTE	**CANTIDAD**	**RETIRADOS**	**CONTRATADOS**	**CARGO**
1	1	0	0	Analista de monitoreo
75	69	7	3	Anfitrión
5	4	1	0	Asistente de Servicio al Usuario
6	5	0	0	Auxiliar de Monitoreo
1	**1**	0	0	Auxiliar documental
1	1	0	0	Coordinador de logística y mantenimiento
1	1	0	0	Coordinador General de Operaciones
1	1	0	0	Coordinador tecnológico
1	1	0	0	Electrónico de mantenimiento
1	1	0	0	Gestor de Inventarios
1	1	0	0	Gestor Metalmecánico
15	15	1	0	Mecánico de Bicicletas
15	15	0	0	Mecánico de Estaciones automáticas
1	1	0	0	Profesional de personal, seguridad y salud en el trabajo
1	1	0	0	Profesional mecánico
5	1	0	0	Supernumerarios
7	7	0	0	Supervisor de Operaciones
138	**126**	**9**	**3**	

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO ESR RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

Y se presentaron las siguientes novedades por ausentismo:

TIPO DE NOVEDAD	CANTIDAD DE PERSONAS	DÍAS DE NOVEDAD
INCAPACIDAD	28	79
INCAPACIDAD ARL	1	10
LICENCIA NO REMUNERADA	7	9
LICENCIA REMUNERADA	2	2

Durante el periodo del informe se pagaron las siguientes liquidaciones:

CEDULA	NOMBRE	VALOR	FECHA DE PAGO
1001015178	MATEO QUINTERO D	$ 1.190.682,93	11/07/2025
1046903903	MARIA ALEJANDRA U	$ 899.385,71	11/07/2025
1098724874	EFRAIN ANDRES MIR	$ 1.387.680,69	11/07/2025
1122819686	YADIRYS ISABEL UR	$ 1.941.443,54	11/07/2025

Se presenta la suspensión de las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	TIPO DE NOVEDAD	FECHA APLICACION DE LA NOVEDAD
MIGUEL ANGEL PEREZ LADINO	1027740393	ANFITRIÓN	SUSPENSION	15/07/2025 Y 16/07/2025
MIGUEL ANGEL PEREZ LADINO	1027740393	ANFITRIÓN	SUSPENSION	20/07/2025
JUAN DAVID PINTO URIBE	1045077722	ANFITRIÓN	SUSPENSION	22/07/2025 Y 23/07/2025
JUAN DAVID PINTO URIBE	1045077722	ANFITRIÓN	SUSPENSION	27/07/2025
LUISA FERNANDA CABALLERO AMPUDIA	1193512052	ANFITRIÓN	SUSPENSION	22/07/2025 Y 23/07/2025
LUISA FERNANDA CABALLERO AMPUDIA	1193512052	ANFITRIÓN	SUSPENSION	27/07/2025
JUAN MANUEL SAENZ MURILLO	1033178313	ANFITRIÓN	SUSPENSION	29/07/2025 y 30/07/2025
PAULINA LEDESMA LOPEZ	1007333205	ANFITRIÓN	SUSPENSION	29/07/2025 y 30/07/2025

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO EMPRESA SOLIDARIA RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C Nº 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

Se presentan los siguientes ausentismos:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADNAIA	CARGO	TIPO DE NOVEDAD	FECHA APLICACION DE LA NOVEDAD	FECHA TERMINACION	DIAGNOSTICO	DIAS DE INCAPACIDAD
DARLY CAROLINA CONTRERAS SALAZAR	1037607721	SUPERVISOR DE OPERACIONES	INCAPACIDAD	20/06/2025	20/06/2025	N939	1
JULIO CESAR RAMIREZ GARCIA	1017236190	SUPERNUMERARIO	INCAPACIDAD	24/06/2025	23/07/2025	S822	30
ANLLI TATIANA GARCIA PALACIO	1001138002	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	18/06/2025	18/06/2025	H269	1
JUAN FELIPE ZAPATA TABARES	1000653817	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	19/06/2025	20/06/2025	J029	2
JULIAN ANDRES GONZALEZ ARANGO	1020401781	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	20/06/2025	21/06/2025	R104	2
PAULINA GUTIERREZ SILVA	1038092650	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	26/06/2025	27/06/2025	J00X	2
LILIANA BERENICE GAVIRIA PAVONY	1017175991	GESTOR DE INVENTARIOS	INCAPACIDAD	26/06/2025	27/06/2025	A083	2
PAULINA LEDESMA LOPEZ	1007333205	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	24/06/2025	25/06/2025	N390	2
DENNIS IGNOVIS OCHOA ARIAS	1152206321	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	25/06/2025	26/06/2025	K528	2
LUISA FERNANDA CABALLERO AMPUDIA	1193512052	ANFITRIÓN	LICENCIA NO REMUNERADA	16/06/2025	16/06/2025		1
LUISA FERNANDA CABALLERO AMPUDIA	1193512052	ANFITRIÓN	LICENCIA NO REMUNERADA	22/06/2025	22/06/2025		1
MIGUEL ANGEL PEREZ LADINO	1027740393	ANFITRIÓN	LICENCIA NO REMUNERADA	24/06/2025	24/06/2025		1
MIGUEL ANGEL PEREZ LADINO	1027740393	ANFITRIÓN	LICENCIA NO REMUNERADA	29/06/2025	30/06/2025		2
JUAN DAVID PINTO URIBE	1045077722	ANFITRIÓN	LICENCIA NO REMUNERADA	25/06/2025	25/06/2025		1
JUAN DAVID PINTO URIBE	1045077722	ANFITRIÓN	LICENCIA NO REMUNERADA	29/06/2025	30/06/2025		2
DARLY CAROLINA CONTRERAS SALAZAR	1037607721	SUPERVISOR DE OPERACIONES	INCAPACIDAD	27/06/2025	28/06/2025	A083	2
JUAN MANUEL SAENZ MURILLO	1033178313	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	26/06/2025	26/06/2025	R11X	1
JUAN DAVID BEDOYA HERNANDEZ	1001617064	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS	INCAPACIDAD	25/06/2025	26/06/2025	A084	2
MATEO QUINTERO DUQUE	1001015178	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	24/06/2025	24/06/2025	T784	1
YANNIS JULIANA PORRAS LOAIZA	1001227596	ANFITRION	INCAPACIDAD	28/06/2025	28/06/2025	K297	1
SALOME ECHEVERRY CASTRILLON	1018227316	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	3/07/2025	3/07/2025	J00X	1
JUAN PABLO ESTRADA	1033648694	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	2/07/2025	2/07/2025		1
LUIS GUILLERMO BALLEN PADILLA	1000534697	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD ARL	7/07/2025	16/07/2025	S832	10
DISSARY DANIELA MOSQUERA RIVAS	1076322569	ANFITRIÓN	LICENCIA REMUNERADA	12/07/2025	12/07/2025		1
JENNY ANDREA OROZCO TRIANA	34322251	COORDINADOR GENERAL	INCAPACIDAD	24/06/2025	27/06/2025	A047	4

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C Nº 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

JOSE JULIAN MEJIA RESTREPO	71292000	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	26/06/2025	27/06/2025	A090	2
CRISTINA ALEJANDRA MESA LONDOÑO	1128435604	AUXILIAR DE MONITOREO	LICENCIA NO REMUNERADA	19/07/2025	19/07/2025		1
PAULINA LEDESMA LOPEZ	1007333205	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	15/07/2025	15/07/2025		1
PAULINA LEDESMA LOPEZ	1007333205	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	20/07/2025	20/07/2025		1
CRISTIAN DANIEL GARCIA ACEVEDO	1000195179	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	18/07/2025	19/07/2025	A083	2
JORGE IVAN MUÑOZ GAVIRIA	98530029	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	18/07/2025	19/07/2025	J00X	2
JORGE IVAN MUÑOZ GAVIRIA	98530029	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	21/07/2025	22/07/2025	J019	2
PAULO HERNANDO OSSA	71277792	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS	INCAPACIDAD	15/07/2025	19/07/2025	M545	5
DIANA MARCELA VASQUEZ VELASQUEZ	1037545572	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	18/07/2025	19/07/2025	B349	2
JORGE IVAN MUÑOZ GAVIRIA	98530029	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	16/07/2025	16/07/2025	J989	1
MANUELA ARROYAVE SILVA	1033176888	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	15/07/2025	16/07/2025	K529	2
YEISON ESTIVEN ARANGO RENDON	1148697819	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS	LICENCIA REMUNERADA	25/07/2025	25/07/2025		1
SEBASTIAN ALVAREZ MESA	1020223522	ANFITRIÓN	INCAPACIDAD	17/07/2025	18/07/2025	A083	2

Comunicación de Voz y Datos:

Para este periodo el se retoma la prestación del servicio desde el Área Metropolitana Del Valle De Aburrá.

Mantenimiento preventivo y correctivo

Se realiza un análisis específico del alcance y de cada una de las obligaciones estipuladas contractualmente como a continuación se detalla:

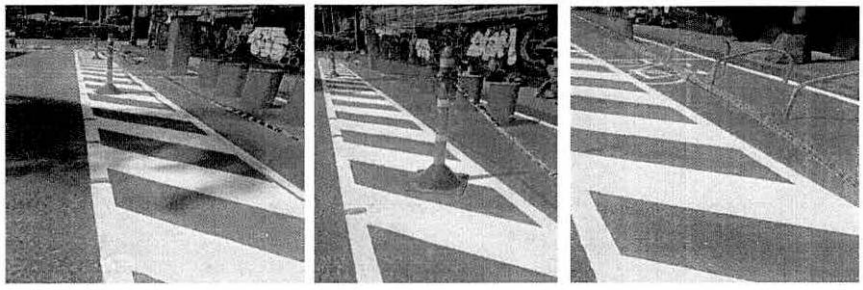
El contratista BIOTECNICOS S.A.S cumplió con el objeto y el alcance del contrato, de acuerdo con el **ACTA DE AVANCE N° 11** del contrato, Periodo del 17 de junio al corte del 19 de julio de 2025, donde se resume la ejecución las siguientes actividades del mantenimiento correctivo de estaciones manuales y automáticas del sistema EnCicla:

Estación Automática Guanteros:

- ✓ Pintura general del tótem completo, reparación metalmecánica del tótem implica recuperación de lámina deformada, oxidada y/o deteriorada con corte y/o reposición de material en zonas afectadas, mantenimiento y/o reposición de los sistemas de cierre del tótem (cerraduras chapas), latonería y pintura general 18 módulos completos, mantenimiento y/o reposición de los sistemas de cierre del módulo (cerraduras-chapas), instalación y/o ajuste de pernos de 1/2" para modulo.

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC 3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO EMPRESA FAMILIA SOLIDARIA RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia



Estación Automática Florida Nueva:

- ✓ Pintura general del tótem completo, reparación metalmecánica del tótem implica recuperación de lámina deformada, oxidada y/o deteriorada con corte y/o reposición de material en zonas afectadas, mantenimiento y/o reposición de los sistemas de cierre del tótem (cerraduras chapas), latonería y pintura general 8 módulos completos, suministro e instalación chapas de seguridad módulo e instalación y/o ajuste de pernos de 1/2" para modulo.



Estación Automática Teatro Metropolitano:

- ✓ Pintura general del tótem completo, reparación metalmecánica del tótem implica recuperación de lámina deformada, oxidada y/o deteriorada con corte y/o reposición de material en zonas afectadas, mantenimiento y/o reposición de los sistemas de cierre del tótem (cerraduras chapas), latonería y pintura general 14 módulos completos, suministro e instalación chapas de seguridad módulo e instalación y/o ajuste de pernos de 1/2" para modulo.



Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC 3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO POR SU COMPROMISO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

Pintura de pisos de las estaciones del sistema EnCicla

Se realiza un análisis específico del alcance y de cada una de las obligaciones estipuladas contractualmente como a continuación se detalla:

El Contratista Biotécnicos realiza el proceso de aplicación de pintura de piso de las estaciones del sistema EnCicla de acuerdo a las indicaciones del Área Metropolitana y como queda plasmado en el acta de avance N°6

Se realiza trabajos en la estación:


FLORIA NUEVA	
DESCRIPCION	CANTIDAD m2
PINTURA AZUL	82
PINTURA BLANCA	24
IMPRIMANTE	0





GUANTEROS	
DESCRIPCION	CANTIDAD m2
PINTURA AZUL	48
PINTURA BLANCA	27
IMPRIMANTE	24.7



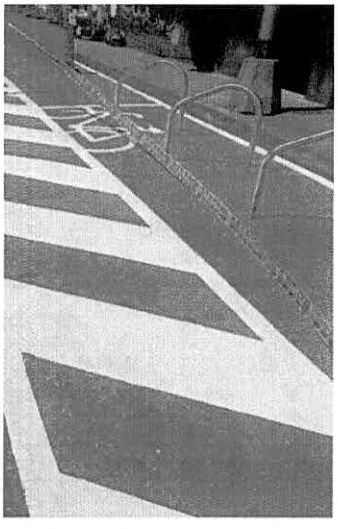

NOTA: *Se anexan actas de entrega de las estaciones intervenidas en el corte 10 y 11 de proceso de mantenimiento validadas por el equipo de mantenimiento del programa.*

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO EMPRESA SOLIDARIA RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

Lavado de Bicicletas.

Para el periodo del informe no se hace lavado de bicicletas.

Se realizó un estudio de mercado con el objetivo de identificar nuevos proveedores que cumplieran con los lineamientos técnicos y ambientales exigidos. Durante este proceso se encontraron varias empresas con la infraestructura adecuada; no obstante, algunas no cumplen completamente con los requisitos ambientales establecidos. Además, en términos financieros, varias de estas alternativas presentan costos significativamente elevados, incluso sin ajustarse a la normatividad vigente.

Las empresas que sí cumplen con los criterios técnicos y ambientales ofrecen el servicio en sus propias instalaciones, por lo que sería necesario implementar ajustes logísticos para el traslado de las bicicletas hacia dichos puntos.

Se comparte estudio de mercado con dos posibles candidatos para la ejecución de los lavados. Sin embargo, en reunión con el equipo técnico del programa se está optando por la opción de implementar un sistema que permita hacer el lavado de las bicicletas en el mismo centro de mantenimiento.

Costos asociados a desplazamientos y peajes.

No se tiene reporte de gastos de este rubro por parte del equipo de Encicla.

Elementos de Papelería y Aseo.

Se firman contratos para la adquisición tanto de insumos de aseo como de papelería y se hacen los respectivos requerimientos para la entrega al programa.

Herramientas de ferretería.

Se realizó estudio de mercado de acuerdo al requerimiento enviado y se compartió para la solicitud de modificación con la supervisión encargada del contrato para este suministro en terminales Medellín.

Se adelantó el procesos de solicitud de modificación en gestión contractual para ingresar a comité de contratación para su aprobación.

Repuestos bicicletas mecánicas.

Se firmó un nuevo contrato para el suministro de los repuestos del nuevo requerimiento y fueron entregados en el Centro de mantenimiento del sistema los repuestos que estaban para entrega inmediata. Gracias a la gestión de una nueva modificación del contrato interadministrativo se logró la modificación al contrato para la adquisición de los marcos necesarios para completar el plan de recuperación de la flota activa del sistema. se espera poder contar con estos marcos para el mes de septiembre de 2025.

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO POR SU COMPROMISO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

Se realiza la entrega del listado del requerimiento realizado por parte del equipo de EnCicla. Validando la cantidad y especificaciones técnicas.

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO O NECESIDAD	CANTIDAD REQUERIDA
ABRAZADERAS	1000
PIÑON 18 DIENTES Y32203420	250
CABLES DE FRENOS TRASEROS	25
FUNDA FRENO 2P	13
CABLE DE CAMBIOS	40
TERMINALES DE FUNDAS DE CAMBIOS	15000
TERMINALES DE FUNDAS DE FRENOS	15000
CADENAS	111
CORREAS DE AMARRE PLASTICAS NEGRAS DE 20CM	1000
CORREAS DE AMARRE PLASTICAS NEGRAS DE 30CM	1000
CURVAS DE FRENOS V-BRAKE	500
HOJA DE RIN 26	500
HOJA DE RIN 24	20
HOJA DE RIN 20	20
VARILLA LARGA DE GUARDABARROS	500
MANILARES O MANGOS LARGOS	500
MANUBRIOS	250
ANILLOS ESPACIADORES DE 1/8	1000
ABRAZADERA DE VARILLA DE MANUBRIO	500
VARILLA DE MANUBRIO	200
NEUMATICOS X 26 Pulgadas	500
NEUMATICOS X 24 Pulgadas	20
NEUMATICOS X 20 Pulgadas	20
PASTAS DE FRENOS	250
SILLINES	250
TENSIONADORES DE CADENA	500
KIT DE MANTENIMIENTO DE BUJES INTERNOS NEXUS 1000ML Y00298010	3

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO FEMSA RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

GRASA PARA BUJE DE MANZANAS NEXUS 2,5 KG Y04120900	4
LLANTAS 24 PULGADAS	40
LLANTAS 20 PULGADAS	40
ENCOCADO DE RODAMIENTOS SUPERIOR E INFERIOR DE DIRECCION	500
INFLADOR CON MANOMETRO	5
ARAÑA 1 1/8	1000
FRENOS VBRAKE T4000	91
VARILLA ROSCADA ZINC DE 1/4 X 50 CMS	50
BELCRANK	250
REVOSHIFT INTER 3V	250
VARILLA DE EMPUJE 3C40	250
BRAZO DE ANCLAJE	250
KIT DE GUARDABARROS DEL Y TRAS	250
CAÑAS 27.2	250
EMBIELADO NEXUS	250
TRIPLATO SHIMANO	20
TENSORES	15
DESCARRILADOR	15
PALANCAS	15
PEDALES	250
MANZANA INTER 3V	6
EJE DE CENTRO	250
TUERCA DE SEGURIDAD 3/16	3000
TUERCA DE SEGURIDAD 1/4	8000
RADIOS 26	400
RADIOS 24	10
RADIOS 20	10
ARANDELA DE 1-/4	5000
PATA DOBLE GATO	165
MICOS	800
PROTECTOR 26	1000
PROTECTOR 24	50
PROTECTOR 20	50
HOJAS DE PARCHE	200
BASE REDUCTORA	600
BIELA IZQ	150

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia



Vigilado SuperTransporte

icontec ISO 9001 SC-3419-1

icontec ISO 14001 SA-CER440081

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICADO EMPRESA COMPROMETIDA CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com

Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia



Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO RESPONSABILIDAD SOCIAL

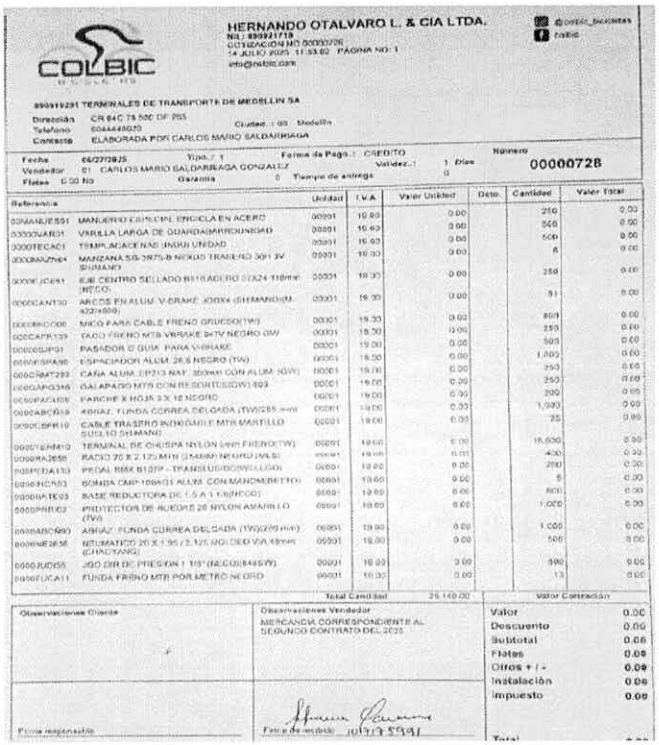
www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C Nº 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia



Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com

Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia



HERNANDO OTALVARO L. & CIA LTDA.
NIT: 890921718
COTIZACION NO 00000726
14 JULIO 2025 11:53:02 PAGINA NO: 1
info@colbic.com

COLBIC BICICLETAS

890919291 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
Dirección CR 64C 78 580 OF 265
Teléfono 6044449020
Contacto ELABORADA POR CARLOS MARIO SALDARRIAGA

Fecha 06/27/2025 Tipo... 1 Forma de Pago... CREDITO Número
Vendedor 01 CARLOS MARIO SALDARRIAGA GONZALEZ Validez... 1 Dias 00000728
Fletes 0.00 NO Garantia 0 Tiempo de entrega 0

Referencia		Unidad	I.V.A	Valor Unidad	Dcto.	Cantidad	Valor Total
0200ANJE551	MANUBRIO ESTILO PL ENCICLA EN ACERO	00001	19.00	0.00		250	0.00
0300SVAR01	VARILLA LARGA DE GUARDABARRO NEGRO	00001	19.00	0.00		500	0.00
0000TECA01	TEMPLA CADENA NAZ (NUDI) UNIDAD	00001	19.00	0.00		6	0.00
0000MANZNe4	MANZANA SG-3S7S-B NEXUS TRASERO 3(R) 3V SHIMANO	00001	19.00	0.00		250	0.00
0000EJCE51	EJE CENTRO SELLADO B118 ACERO 22X24 118mm (NEGO	00001	19.00	0.00		51	0.00
0000CANT30	ARCOS EN ALUM. V-BRAKE .030X4 (SHIMANO)(M. 4201x500)	00001	19.00	0.00		501	0.00
0000BKCO06	NICO PARA CABLE FRENO GRUESO(TW)	00001	19.00	0.00		250	0.00
0000CAPR139	TACO FRENO MTB V/BRAKE R47V NEGRO GW	00001	19.00	0.00		500	0.00
0000GUPG1	PASADOR O GUIA PARA V-BRAKE	00001	19.00	0.00		1,000	0.00
0000ESPA90	ESPACIADOR ALUM. 26,6 NEGRO (TW)	00001	19.00	0.00		250	0.00
0000CRMT293	CAÑA ALUM. EP213 NAT. 350mm CON ALUM. (GW)	00001	19.00	0.00		253	0.00
0000GAPG3S6	GALAPAGO MTB CON RESORTE(GW) 809	00001	19.00	0.00		200	0.00
0000PACA005	PARCHE X HOJA 3 X 1E NEGRO	00001	19.00	0.00		1,000	0.00
0000ABCR018	ABRAZ. FUNDA CORREA DELGADA (TW)(SB5 mm)	00001	19.00	0.00		35	0.00
0000CBPR10	CABLE TRASERO INDEXABLE MTB MARTILLO SUELTO SHIMANO	00001	19.00	0.00		15,000	0.00
0000TERM10	TERMINAL DE CHUSPA NYLON (sin FRENO(TW)	00001	19.00	0.00		400	0.00
0000RA2656	RADIO 20 X 2.125 MTB (SHIMANO NEGRO (VALE)	00001	19.00	0.00		250	0.00
0000PEDA133	PEDAL BMX B137P - TRANSLUCIDO(WELLGO)	00001	19.00	0.00		5	0.00
0000BKCR53	BOMBA CMP-10BAO1 ALUM. CON MANOMETRO	00001	19.00	0.00		500	0.00
0000BATE03	BASE REDUCTORA DE 1.5 A 1 1/8(NEGO)	00001	19.00	0.00		1,000	0.00
0000PRRU02	PROTECTOR DE RUEDAS 26 NYLON AMARILLO (TW)	00001	19.00	0.00		1,000	0.00
0000ABCR09	ABRAZ. FUNDA CORREA DELGADA (TW)(26 mm)	00001	19.00	0.00		500	0.00
0000NE2656	NEUMATICO 26 X 1.95 / 2.125 MOLDED V/A 43mm (CHAOYANG)	00001	19.00	0.00			
0000JUDI55	JGO DIR DE PRESION 1 1/8" (NEGO)(B445W)	00001	19.00	0.00		500	0.00
0000FUCA11	FUNDA FRENO MTB POR METRO NEGRO	00001	19.00	0.00		13	0.00

Total Cantidad 25,140.00 Valor Cotización


Observaciones Cliente

Observaciones Vendedor
MERCANCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CONTRATO DEL 2025

Valor	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	0.00
Fletes	0.00
Otros + / -	0.00
Instalación	0.00
Impuesto	0.00
Total	

Firma responsable

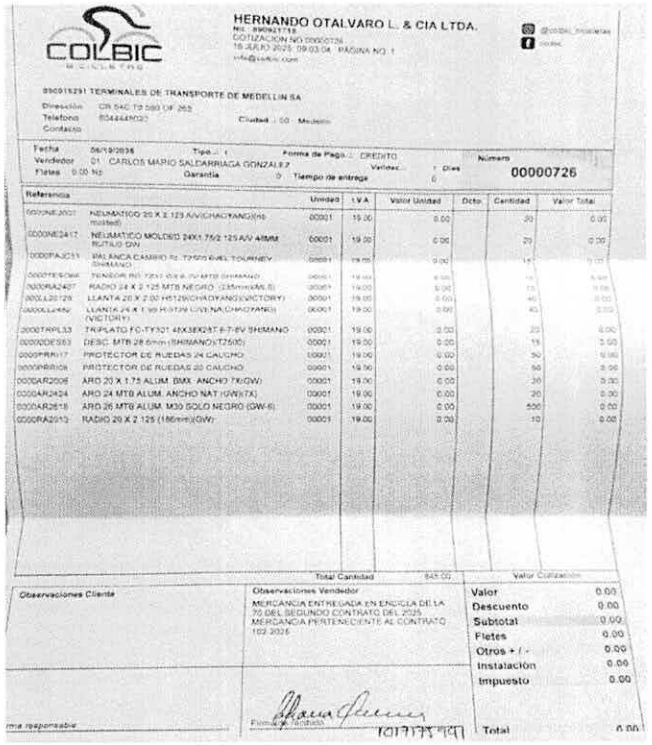Firma de recibido 1017175991



HERNANDO OTALVARO L. & CIA LTDA.
NIT: 890921718
COTIZACION NO 00000726
16 JULIO 2025 09:03:04 PAGINA NO: 1
info@colbic.com

COLBIC BICICLETAS

890919291 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
Dirección CR 64C 78 580 OF 265
Teléfono 6044449020
Contacto Ciudad... 00 Medellin

Fecha 06/19/2025 Tipo... 1 Forma de Pago... CREDITO Número
Vendedor 01 CARLOS MARIO SALDARRIAGA GONZALEZ Validez... 1 Dias 00000726
Fletes 0.00 NO Garantia 0 Tiempo de entrega 0

Referencia		Unidad	I.V.A	Valor Unidad	Dcto.	Cantidad	Valor Total
0000NE2007	NEUMATICO 20 X 2.125 KAYCHAO/TANG((no molded)	00001	19.00	0.00		20	0.00
0000NE2417	NEUMATICO MOLDED 24X1.75/2.125 A/V 48MM RITALO GW	00001	19.00	0.00		20	0.00
0000PAJC51	PALANCA CAMBIO RL-T2500 6VEL TOURNEY SHIMANO	00001	19.00	0.00		12	0.00
0000TENS06	TENSOR RD-T251 6/7/8 -7V MTB SHIMANO	00001	19.00	0.00		15	0.00
0000RA2407	RADIO 24 X 2.125 MTB NEGRO (25mm)(ALS)	00001	19.00	0.00		10	0.00
0000LL2072S	LLANTA 20 X 2.00 HS126(CHAOYANG)(VICTORY)	00001	19.00	0.00		40	0.00
0000LL2456	LLANTA 24 X 1.95 HS125 (UV) NA(CHAOYANG) (VICTORY)	00001	19.00	0.00		40	0.00
0000TRPL33	TRIPLATO FC-TY301 48X38X28T 6-7-8V SHIMANO	00001	19.00	0.00		20	0.00
0000DESE63	DESC. MTB 28.6mm (SHIMANO)(TZ500)	00001	19.00	0.00		15	0.00
0000PRRU17	PROTECTOR DE RUEDAS 24 CAUCHO	00001	19.00	0.00		50	0.00
0000PRRU06	PROTECTOR DE RUEDAS 20 CAUCHO	00001	19.00	0.00		50	0.00
0000AR2006	ARO 20 X 1.75 ALUM. BMX ANCHO 7X(GW)	00001	19.00	0.00		30	0.00
0000AR2424	ARO 24 MTB ALUM. ANCHO NAT (GW)(7X)	00001	19.00	0.00		20	0.00
0000AR2618	ARO 26 MTB ALUM. M30 SOLO NEGRO (GW-6)	00001	19.00	0.00		500	0.00
0000RA2612	RADIO 26 X 2.125 (186mm)(GW)	00001	19.00	0.00		10	0.00

Total Cantidad 845.00 Valor Cotización


Observaciones Cliente

Observaciones Vendedor
MERCANCIA ENTREGADA EN ENCICLA DE LA 70 DEL SEGUNDO CONTRATO DEL 2025
MERCANCIA PERTENECIENTE AL CONTRATO 102 2025

Valor	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	0.00
Fletes	0.00
Otros + / -	0.00
Instalación	0.00
Impuesto	0.00
Total	0.00

ma responsable

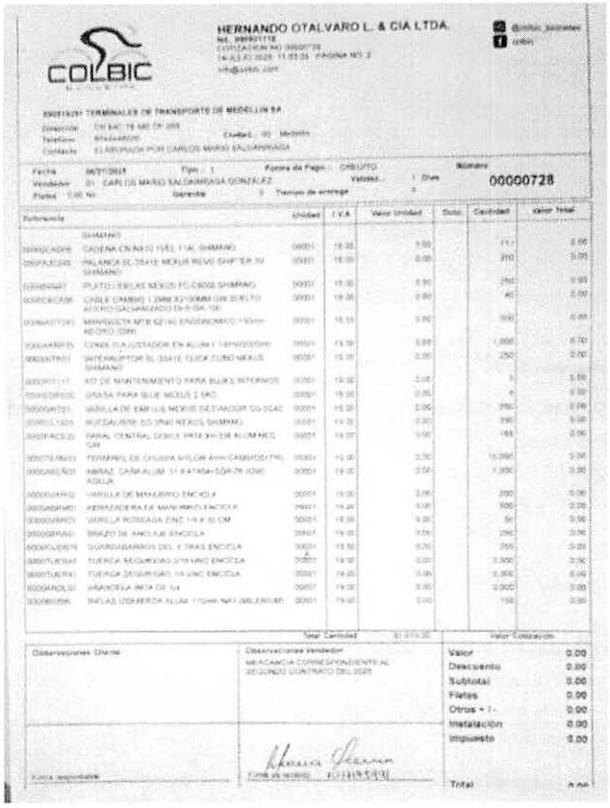Firma de recibido 1017175991



HERNANDO OTALVARO L. & CIA LTDA.

COLBIC BICICLETAS

890919291 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN SA
Dirección CR 64C 78 580 OF 265
Teléfono 6044449020
Contacto ELABORADA POR CARLOS MARIO SALDARRIAGA

Fecha 06/27/2025 Tipo... 1 Forma de Pago... CREDITO Número
Vendedor 01 CARLOS MARIO SALDARRIAGA GONZALEZ Validez... 1 Dias 00000728
Fletes 0.00 NO Garantia 0 Tiempo de entrega 0

Referencia		Unidad	I.V.A	Valor Unidad	Dcto.	Cantidad	Valor Total
	SHIMANO						
0000CADE06	CADENA CN-M310 (VELT)(K SHIMANO	00001	19.00	0.00		11	0.00
0000PAJC06	PALANCA EL-ST410 NEXUS REVO SHIFTER 3V SHIMANO	00001	19.00	0.00		370	0.00
0000PLUT07	PLUTO I EJES NEXUS FC-C600 SHIMANO	00001	19.00	0.00		250	0.00
0000CABC06	CABLE CAMBIO 1.2MM X2100MM GW (DELITO ACERO GALVANIZADO EN 6 DIA 100	00001	19.00	0.00		40	0.00
0000MANT06	MANIJUELA MTB EZ10 ERGONOMICO 170mm NEGRO (GW)	00001	19.00	0.00		500	0.00
0000AMRE05	CONEX.O AJUSTADOR EN ALUM.(TW)(GW)	00001	19.00	0.00		1,000	0.00
0000INTR01	INTERRUPTOR EL-SS410 CLICK CUBO NEXUS SHIMANO	00001	19.00	0.00		250	0.00
0000RT1	KIT DE MANTENIMIENTO PARA BUJES INTERNOS	00001	19.00	0.00		5	0.00
0000GRAS02	GRASA PARA BUJE NEXUS 1 MG	00001	19.00	0.00		4	0.00
0000VAR01	VARILLA DE EMPUJE NEXUS DE ENGANCHE SG-3C40	00001	19.00	0.00		250	0.00
0000CUBO05	BUJE/CUERPO SG-3R40 NEXUS SHIMANO	00001	19.00	0.00		250	0.00
0000PACE20	PARAL CENTRAL DOBLE PATA 3X-E8 ALUM NEG GW	00001	19.00	0.00		151	0.00
0000TERM20	TERMINAL DE CHUSPA NYLON 4mm CAMBIO(TW)	00001	19.00	0.00		10,000	0.00
0000ABCR05	ABRAZ. CAÑA ALUM. 31.8 ATA64+SQA-26 (GW) AGUJA	00001	19.00	0.00		1,000	0.00
0000VARP01	VARILLA DE MANUBRIO ENCICLA	00001	19.00	0.00		200	0.00
0000ABRM01	ABRAZADERA DE MANUBRIO ENCICLA	00001	19.00	0.00		500	0.00
0000VAR01	VARILLA ROSCADA ENC 19 X 10 CM	00001	19.00	0.00		50	0.00
0000BRAZ01	BRAZO DE ANCLAJE ENCICLA	00001	19.00	0.00		250	0.00
0000PJDE70	GUARDABARROS DEL Y TRAS ENCICLA	00001	19.00	0.00		250	0.00
0000TUER04	TUERCA SEGURIDAD 3/8 HEX ENCICLA	00001	19.00	0.00		2,000	0.00
0000TUER41	TUERCA SEGURIDAD 1/4 UNC ENCICLA	00001	19.00	0.00		2,000	0.00
0000ARDL01	ARANDELA INOX DE 1/4	00001	19.00	0.00		2,000	0.00
0000REFL06	REFLAS DELANTERA ALUM. 110mm NAT (BELEMOR)	00001	19.00	0.00		150	0.00

Total Cantidad 61,615.00 Valor Cotización

Observaciones Cliente

Observaciones Vendedor
MERCANCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CONTRATO DEL 2025

Valor	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	0.00
Fletes	0.00
Otros + / -	0.00
Instalación	0.00
Impuesto	0.00
Total	0.00

Firma responsable

Firma de recibido 1017175991

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440881
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO POR SU COMPROMISO PENALGO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com

Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

Información asociada a Balance de carga.

Se adelanta la intervención metalmecánica y adecuación de la plataforma de elevación del cuarto de los 6 vehículos que prestan el servicio de balance de carga.

Por este motivo se tuvo por fuera de servicio uno los carros sin generar un mayor traumatismo en la operación.

Para este mes se prestaron 1511 horas de servicio.

Se continua con la intervención metalmecánica de los vehículos para mejorar su apariencia y seguridad en el cargue de las bicicletas.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

Terminales de Transportes Medellín S.A, ha continuado avanzando en realizar los estudios y celebrando los contratos necesarios para garantizar el cumplimiento oportuno del objeto contractual mediante los siguientes contratos derivados.

Contratos Derivados:

Contrato N° 093-2022 Corporación Balboa

Objeto: Servicio de apoyo administrativo para la operación de Terminales de Transporte de Medellín S.A, y los proyectos de ciudad administrados por la entidad. Suscrito el 27 de septiembre de 2022 con acta de inicio el 01 de octubre de 2022.

Plazo inicial: Tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas en el contrato por parte de la Secretaría General de Terminales de Transporte de Medellín S.A., sin superar el 31 de diciembre de 2022.

Modificación No. 40: suscrita el 27 de junio del 2025, se adiciono la suma de mil trescientos ocho millones setecientos veintitrés mil quinientos cuarenta pesos M/L ($ 1.308.723.540) incluido todos los gastos e impuesto que genere la ejecución del contrato, para un valor total del contrato de sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos con cuatro centavos M/L ($ 65.944.142.450,04).

Contrato N° 113 2024 con BIOTECNICOS S.A.S

Objeto: Realizar el diagnóstico inicial metalmecánico de las estaciones manuales y automáticas del sistema de bicicletas públicas EnCicla del área metropolitana del valle de aburra y la ejecución de los mantenimientos correctivos a las mismas

Plazo inicial: Tres (3) meses contados desde la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2024, previa aprobación de las pólizas.

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO PRIMALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

Modificación N°5: Suscrita con el 27 de junio de 2025 donde se prorroga el término del plazo del contrato en tres (3) meses desde el 01 de julio de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 ambas fechas inclusive y adición de presupuesto por **$243.989.508**

Acta de inicio: 22 de Julio de 2024

Póliza	Compañía Aseguradora	
	Seguros del Estado S. A	
Cumplimiento N°21-44-101446248	**Fecha de Inicio de la Vigencia**	**Fecha de terminación de la Vigencia**
	22/07/2024	31/03/2026
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales N°21-44-101446248	**Fecha de Inicio de la Vigencia**	**Fecha de terminación de la Vigencia**
	22/07/2024	30/09/2028
Calidad del Servicio N°21-44-101446248	**Fecha de Inicio de la Vigencia**	**Fecha de terminación de la Vigencia**
	22/07/2024	31/03/2026
Responsabilidad Civil Extracontractual N°21-40-101236202	**Fecha de Inicio de la Vigencia**	**Fecha de terminación de la Vigencia**
	22/07/2024	30/09/2025

Contrato N° 020-2025 con BIOTECNICOS S.A.S

Objeto: Contrato de obra para realizar la aplicación de pintura de pisos de las estaciones del sistema EnCicla administrado por terminales de transporte de Medellín s.a.

Plazo inicial: dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 15 de marzo de 2025, previa aprobación de las pólizas.

Modificación N°2: Suscrita con el 27 de junio de 2025 donde se hizo prórroga del plazo del contrato por tres (3) meses desde el 01 de julio de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025 ambas fechas incluidas y adición de presupuesto por **$ 32.534.362**

Póliza	Compañía Aseguradora	
	Seguros del Estado S. A	
Cumplimiento	**Fecha de Inicio de la Vigencia**	**Fecha de terminación de la Vigencia**
21-44-101462306	30/01/2025	31/03/2026
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	**Fecha de Inicio de la Vigencia**	**Fecha de terminación de la Vigencia**
N°21-44-101462306	30/01/2025	30/09/2028
Calidad del bien o servicio	**Fecha de Inicio de la Vigencia**	**Fecha de terminación de la Vigencia**
N°21-44-101462306	30/01/2025	31/03/2026
	Fecha de Inicio de la Vigencia	

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO ICONTEC FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

Responsabilidad civil extracontractual No.21-40-101248270		Fecha de terminación de la Vigencia
	30/01/2025	30/09/2025

Contrato N° 102-2025 con HERNANDO OTÁLVARO L Y CIA LTDA

Objeto: Adquisición de repuestos, partes e insumos para el mantenimiento y ensamble de las bicicletas mecánicas, para el correcto funcionamiento de las mismas de acuerdo a la operación integral del proyecto EnCicla de Área Metropolitana Del Valle De Aburrá.

Plazo inicial: Desde la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, previa aprobación de pólizas, hasta el 30 de junio de 2025.

Modificación N°1: Suscrita con el 27 de junio de 2025 donde se hizo prórroga del plazo del contrato por tres (3) meses desde el 01 de julio hasta el 30 de septiembre ambas fechas incluidas y adición de presupuesto por **$327.547.500**

Póliza	Compañía Aseguradora	
	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	
Cumplimiento No.M-4291613	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	10/06/2025	30/03/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos No.M-4291613	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	10/06/2025	30/03/2026

Contrato N° 067-2025 con GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S

Objeto: Suministro de insumos médicos para los botiquines y puntos de primeros auxilios de las terminales de transporte de Medellín s.a., y los proyectos de ciudad administrados por la entidad

Plazo inicial: Nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2025

Modificación N°1: Suscrita con el 15 de julio de 2025 donde se Adiciona el valor del contrato en la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DIEZ Y NUEVE PESOS M.L ($10.463.019) para un valor total del contrato de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CATORCE PESOS M.L ($44.192.014).

Póliza	Compañía Aseguradora	
	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Cumplimiento No.21-44-1014677307	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	08/04/2025	30/06/2026

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO PEMBLCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos No.21-44-1014677307	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	08/04/2025	30/06/2026

Contrato N° 115-2025 con IMPACTO EFECTIVO BTL-EVENTOS S.A.S

Objeto: Suministro de elementos de papelería y útiles de oficina para la operación de terminales de transporte de Medellín s.a. y los proyectos de ciudad administrados por la entidad

Plazo inicial: A partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de pólizas hasta el 31 de diciembre de 2025

Póliza	Compañía Aseguradora	
	SEGUROS MUNDIAL	
Cumplimiento No M- 100271112	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	18/07/2025	30/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos No M- 100271112	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	18/07/2025	30/06/2026

Contrato N° 116-2025 con INSUMOS Y MAS S.A.S

Objeto: Suministro de elementos e implementos de aseo y cafetería para la operación de terminales de transporte de Medellín s.a. y los proyectos de ciudad administrados por la entidad.

Plazo inicial: A partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de pólizas hasta el 31 de diciembre de 2025

Póliza	Compañía Aseguradora	
	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Cumplimiento No.14-44-101240849	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	22/07/2025	30/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos No.14-44-101240849	Fecha de Inicio de la Vigencia	Fecha de terminación de la Vigencia
	22/07/2025	30/06/2026

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración

Información General y Financiera del convenio o contrato CC856

1. Entidad administradora	TERMINALES DE TRANSPORTE MEDELLIN S.A.
2. Fecha de corte	DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025
3. Dependencia responsable	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
4. Número y fecha del convenio o contrato	133-2024
5. Objeto del convenio o contrato	Contrato Interadministrativo para la operación integral del programa Encicla del Area metropolitana del Valle de Aburra.
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	8.653.751.499
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	Adicion # 1- 11 de marzo/2025
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	2.793.961.808
9. Valor desembolsado por el ente distrital (Incluye recurso a administrar y honorarios cuando han sido desembolsados de manera conjunta)	10.452.623.546
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	752.225.294
11. Valor honorarios pagados	428.043.224
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	$2.426.894
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del	9.520.217.649
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	0
15. Saldo pendiente por ejecutar	932.405.897
16. Fecha acta de liquidación	

Relación de ejecución (solo recursos para administrar valores en pesos)

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
Personal Apoyo Operativo(Nómina del personal vinculado al proyecto)	$ 5.269.173.103	$ 495.280.615	$ 5.764.453.718	
Comunicaciones Voz y Datos	$ 19.207.282	$ -	$ 19.207.282	
Mantenimientos preventivo y correctivo	$ 3.377.016.365	$ 357.939.505	$ 3.734.955.870	
Otros Costos (Gatos Bancarios, elementos de aseo y papelería)	$ 1.600.778	$ -	$ 1.600.778	
22. Total ejecutado	$ 8.666.997.529	$ 853.220.120	$ 9.520.217.649	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordenador del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 3514/98)
Nombre: DANIEL ALEXANDER PEREZ ROJAS.	Nombre: LYDA PATRICIA SANCHEZ CARDONA.
C.C. 1.017.138.456	CC 43.687.440. TP 127424-T
Correo Electrónico: daniel.perez@metropol.gov.co	Correo Electrónico: contador@terminalesmedellin.com
Teléfono: 3856000 EXT703	Teléfono: 444 80 20 EXT 155

3. INFORME ADMINISTRATIVO:

Personal vinculado al proyecto:

Listado de personal vinculado al proyecto al cierre del mes de julio de 2025

NOMBRE	CÉDULA	FECHA INGRESO	CARGO
YHOAN SEBASTIAN SUAREZ SANCHEZ	1007053620	1/02/2025	ANALISTA DE MONITOREO
MARIA JOSE GAVIRIA MARIN	1023622779	2/05/2024	ANFITRION
JOHAN ALEXIS MALDONADO CALLEJAS	1026160040	2/05/2024	ANFITRION

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC 3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO EMPRESA RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

MANUELA RESTREPO MORENO	1040730002	2/05/2024	ANFITRION
SEBASTIAN AREVALO RODRIGUEZ	1007526137	11/04/2025	ANFITRION
BALLEN PADILLA LUIS GUILLERMO	1000534697	21/08/2024	ANFITRION
YERLIN YELISA RODRIGUEZ OCAMPO	1193542644	11/07/2025	ANFITRION
JOSE JULIAN MEJIA RESTREPO	71292000	2/05/2024	ANFITRION
PINTO URIBE JUAN DAVID	1045077722	20/09/2024	ANFITRION
JHON ALEJANDRO CASTAÑO SALAS	1152214862	2/05/2024	ANFITRION
PAULINA LEDESMA LOPEZ	1007333205	2/05/2024	ANFITRION
SEBASTIAN PULGARIN ESTRADA	1022145781		ANFITRION
JUAN MANUEL SAENZ MURILLO	1033178313	2/05/2024	ANFITRION
KEISY ALEXANDRA SEGURA BORJA	1001482270	2/05/2024	ANFITRION
DAVID EDUARDO HERNANDEZ AROCHA	1036683753	8/01/2025	ANFITRION
SALOME ECHEVERRY CASTRILLON	1018227316	2/05/2024	ANFITRION
MANUELA ARROYAVE SILVA	1033176888	17/02/2025	ANFITRION
EVELYN GOMEZ MARIN	1035237454	9/12/2024	ANFITRION
GARCIA GRISALES JUAN DAVID	1152445244	17/06/2024	ANFITRION
ANA SOFIA BERRIO VARGAS	1025889924	27/02/2025	ANFITRION
DAVILA MESA EMANUEL	1000903825	10/07/2024	ANFITRION
LUISA FERNANDA GIRALDO USUGA	1038262922	27/02/2025	ANFITRION
BRAYAN ZAPATA CHAVERRA	1001232944	1/07/2025	ANFITRION
JOSE DAVID URIBE SANCHEZ	1020302367	6/03/2025	ANFITRION
STIVEN MONTOYA OSPINA	1193093493	2/05/2024	ANFITRION
DIANA MARCELA VASQUEZ VELASQUEZ	1037545572	2/05/2024	ANFITRION
VELEZ OCAMPO MICHEL	1000645448	10/07/2024	ANFITRION
IVAN DARIO VALENCIA LEMA	1214727686	21/04/2025	ANFITRION
JUAN FELIPE ZAPATA TABARES	1000653817	3/05/2024	ANFITRION
FRANCYS LIZETH CORDOBA PEREA	1025640254		ANFITRION
HERNANDEZ VALENCIA CRISTIAN	1152716649	5/07/2024	ANFITRION
JUAN PABLO ESTRADA	1033648694	3/05/2024	ANFITRION
STIVEN FIGUEROA RUA	1036681132	21/04/2025	ANFITRION
GUTIERREZ SILVA PAULINA	1038092650	5/07/2024	ANFITRION
NATALIA ANDREA TIRADO MEJIA	1128415237	21/04/2025	ANFITRION
LEIDER FABIAN ALVAREZ ORREGO	71532284	3/05/2024	ANFITRION
YESSENIA OSSA MONTOYA	1152451051	21/04/2025	ANFITRION
JUAN DAVID ESTRADA BEDOYA	71312861	3/05/2024	ANFITRION
VALENTINA ESTRADA ORTIZ	1193201140	3/05/2024	ANFITRION
JAIME ANDRES GARCIA SARAZ	71224661	3/05/2024	ANFITRION
ANA MARIA GIRALDO SANCHEZ	1037647202	3/05/2024	ANFITRION
SAMUEL GARCIA TANGARIFE	1033489129	22/01/2025	ANFITRION

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO EMALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

SEBASTIAN ALVAREZ MESA	1020223522	22/01/2025	ANFITRION
SEBASTIAN GARCIA FRANCO	1035442317	22/01/2025	ANFITRION
DISSARY DANIELA MOSQUERA RIVAS	1076322569	2/05/2025	ANFITRION
LUISA FERNANDA CABALLERO AMPUDIA.	1193512052		ANFITRION
YANNIS JULIANA PORRAS LOAIZA	1001227596	3/05/2025	ANFITRION
JOSE DAVID SANCHEZ BETANCUR	1025886466	3/05/2025	ANFITRION
DORALBA DAZA ESPINOSA	1026556073	1/07/2025	ANFITRION
RICO FRANCO YULEY ANDREA	1023630317	20/09/2024	ANFITRION
SANDRA LUCIA TEJADA RUIZ	43728627	4/05/2024	ANFITRION
FERNANDO LEON MORA ROJAS	71667557	4/05/2024	ANFITRION
DENNIS IGNOVIS OCHOA ARIAS	1152206321	4/05/2024	ANFITRION
ARIAS PEREZ JUAN MANUEL	1035972905	11/09/2024	ANFITRION
POSADA LLANO JUAN GUILLERMO	15513985	11/09/2024	ANFITRION
OSORIO ACEVEDO PAULA ANDREA	1017156010	9/05/2024	ANFITRION
GARCIA ACEVEDO CRISTIAN DANIEL	1000195179	20/09/2024	ANFITRION
OCAMPO NOVOA VALENTINA	1000538287	1/06/2024	ANFITRION
RUA MENESES JUAN FELIPE	1000869431	16/05/2024	ANFITRION
SANTIAGO RENDON MOLA	1039683233	3/05/2024	ANFITRION
MUÑOZ GAVIRIA JORGE IVAN	98530029	18/05/2024	ANFITRION
NATALIA ORTEGA TIRADO	1066718239	17/06/2025	ANFITRION
JULIAN ANDRES GONZALEZ ARANGO	1020401781	18/01/2025	ANFITRION
ISMAEL ECHEVERRI CHAVERRA	1023630320	18/01/2025	ANFITRION
HERRERA BLANDON XIMENA	1001015160	2/12/2024	ANFITRION
FLORES ARARIYU LINDY ESTRELLA	1006913381	23/05/2024	ANFITRION
GARCIA PALACIO ANLLI TATIANA	1001138002	23/05/2024	ANFITRION
RAMOS MADERA MAIRA ALEJANDRA	1037611761	23/05/2024	ANFITRION
PEREZ LADINO MIGUEL ANGEL	1027740393	23/05/2024	ANFITRION
FELIPE SUAREZ BRAVO	1017262862	8/02/2025	ANFITRION
VALERIA NARANJO RESTREPO	1000416836	2/05/2024	Asistente de Servicio al Usuario
ANA GISSELA GARCES CUADRADO	1002023536	16/01/2025	Asistente de Servicio al Usuario
KATERINE MARIN ZAPATA	1035970989	3/05/2024	Asistente de Servicio al Usuario
SARA SUSANA RESTREPO ALVAREZ	1152205557	2/05/2024	Asistente de Servicio al Usuario
MARTA RUBI OSORIO ZAPATA	1037586292	3/05/2024	Auxiliar de Monitoreo
ADRIANA GOMEZ HERNANDEZ	1007697590	2/05/2024	Auxiliar de Monitoreo
CRISTINA ALEJANDRA MESA LONDOÑO	1128435604	2/05/2024	Auxiliar de Monitoreo
ANA MARIA TORRES CERVANTES	1214714443	2/05/2024	Auxiliar de Monitoreo
JUAN FELIPE LOPEZ AGUDELO	1017247540		Auxiliar de Monitoreo
MARIA ALEJANDRA MONTOYA VALENCIA	1037639031	2/05/2024	Coordinador tecnológico

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO PEMLCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

JORGE IVAN ALVAREZ VELASQUEZ	70350220	3/05/2024	Coordinador de logistica y mantenimiento
JENNY ANDREA OROZCO TRIANA	34322251	2/05/2024	Coordinador General de Operaciones
EMIRO ENRIQUE GALVIS JIMENEZ	77170681	3/05/2024	Electrónico de Mantenimiento
MAIKOL ANDRETTI RETREPO URAN	1001618435	2/05/2024	MECANICO DE BICICLETAS
YHON FREDI DE JESUS URAN GARCIA	1039463454	2/05/2024	MECANICO DE BICICLETAS
JUAN ALEJANDRO ARTEAGA MARIN	1001016340	2/05/2024	MECANICO DE BICICLETAS
JOSE DAVID ZAPATA VASQUEZ	71383901	2/05/2024	MECANICO DE BICICLETAS
DANIEL EDUARDO ZAPATA LONDOÑO	1036937570	2/05/2024	MECANICO DE BICICLETAS
EDWIN SANTIAGO VANEGAS RODRIGUEZ	1035917050	2/05/2024	MECANICO DE BICICLETAS
ACOSTA ARIAS KEVIN ALEXANDER	1152702860	2/08/2024	MECANICO DE BICICLETAS
WILMAR FERNEY BAENA LOPEZ	15516200	2/05/2024	MECANICO DE BICICLETAS
CABEZAS VELASQUEZ SEBASTIAN	1152204012	1/10/2024	MECANICO DE BICICLETAS
JULIAN ESTEBAN RENDON GIRALDO	1146441193	2/05/2024	MECANICO DE BICICLETAS
JOSE MANUEL MISAL SALAS	1020102961	2/05/2024	MECANICO DE BICICLETAS
JAVIER MAURICIO RINCON GOMEZ	1214717840	8/05/2024	MECANICO DE BICICLETAS
JUAN MANUEL COLORADO SANCHEZ	1020107872	2/05/2024	MECANICO DE BICICLETAS
PATIÑO SALDARRIAGA SERGIO ANTONIO	71229234	2/08/2024	MECANICO DE BICICLETAS
DUVAN EUCLIDES PEREZ SUAREZ	1103673046	21/03/2025	MECANICO DE BICICLETAS
JUAN DAVID FRANCO DIAZ	1017192097	2/05/2024	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS
LUIS FERNANDO MERCADO SILVA	1066527255	2/05/2024	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS
DERLY SORELLY SEGURO VARGAS	1036616196	2/05/2024	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS
JEFFERSON DE JESUS BEDOYA MACIAS	1017254486	2/05/2024	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS
ALEJANDRO ARIAS RAMIREZ	1001013727	10/06/2025	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS
RESTREPO FORERO TOMAS SEBASTIAN	1039464513	1/08/2024	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS
SALGADO TORO DIEGO	1128404471	16/08/2024	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS
JUAN DAVID BEDOYA HERNANDEZ	1001617064	2/05/2024	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS
MIGUEL ANGEL OSPINA GALVIS	1035437103	2/05/2024	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS
MESA GARCIA CRISTIAN CAMILO	1000869535	21/08/2024	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS
YEISON FERNEY AGUDELO MARIN	1214726146	3/05/2024	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS
EDGAR SAMUEL PALACIOS CORDOBA	71713340	2/05/2024	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS
JUAN PABLO TAMAYO GAVIRIA	1017214544	2/05/2024	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS
YEISON ESTIVEN ARANGO RENDON	1148697819	2/05/2024	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS
OSSA PAULO HERNANDO	71277792	26/06/2024	MECANICO ESTACIONES AUTOMATICAS
GAVIRIA PAVONY LILIANA BERENICE	1017175991	30/05/2024	GESTOR DE INVENTARIOS
CARLOS ARBEY VALENCIA RESTREPO	1146435402	2/05/2024	PROFESIONAL MECANICO

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC 3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO POR SU COMPROMISO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C Nº 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

RAMIREZ GARCIA JULIO CESAR	1017236190	1/06/2024	SUPERNUMERARIOS
ANGELICA MARIA MONTOYA VALENCIA	1039471114	2/05/2024	SUPERVISOR DE OPERACIONES
DARLY CAROLINA CONTRERAS SALAZAR	1037607721	2/05/2024	SUPERVISOR DE OPERACIONES
JORGE MARIO PULGARIN GIL	1035390720	2/05/2024	SUPERVISOR DE OPERACIONES
PADILLA TIRADO DERCI LILIANA	1133791006	18/11/2024	SUPERVISOR DE OPERACIONES
DAVID SALGADO TORO	71527188	3/05/2024	SUPERVISOR DE OPERACIONES
AMAZARA SERNA JULIANA	1022095753	1/08/2024	SUPERVISOR DE OPERACIONES
ASTRID LUCIA GOMEZ FRANCO	43741344	12/02/2025	SUPERVISOR DE OPERACIONES
LUIS FERNANDO ECHAVARRIA JIMENEZ	71372803	2/05/2024	GESTOR METALMECÁNICO
TAMAYO POSADA LAURA	1017220813	1/06/2024	Profesional de personal, seguridad y salud en el trabajo.
DIANA MARCELA SUAZA SERNA	1042061636	1/06/2025	Auxiliar documental

4. INFORME JURÍDICO:

Dando cumplimiento a uno de los aspectos relacionados en la cláusula SÉPTIMA - GARANTÍAS del **contrato interadministrativo No 133 de 2024,** el cual tiene por objeto **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ"**, administrado por **"TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.,** prestará garantía que avalará el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato, aceptada por el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, la cual cubrirá:

CUMPLIMIENTO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. Su vigencia será la del plazo del contrato y seis (6) meses más. El beneficiario debe ser el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. Su vigencia será la del plazo del contrato y seis (6) meses más. El beneficiario debe ser el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un veinte por ciento (20%) del valor del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantía de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (500SMMLV) y una vigencia a la del contrato. Deberá cubrir el daño patrimonial y extrapatrimonial (incluidos allí los perjuicios morales y fisiológicos o de daño a la vida de relación) y operar el principio de ocurrencia y de la indemnización integral. El beneficiario debe ser el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y terceros que se puedan ver afectados con las actividades que se desarrollan en el objeto contractual, de igual forma el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, también deberá ser asegurado de conformidad con el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

La Responsabilidad Civil Extracontractual sólo puede ser amparada mediante póliza de seguro y debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015:

- Modalidad de ocurrencia.

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com

Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

- Intervinientes.
- Amparos:
  a) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.
  b) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.
  c) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos del asociado y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.
  d) Cobertura expresa de amparo patronal.
  e) Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.

Estas garantías se pueden consultar en el link: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12708318

Estado de las garantías del contrato:

Seguro cumplimiento – Póliza única a favor de entidades estatales N° 3005738

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
La Previsora S.A Compañía de Seguros	3005738	Cumplimiento del contrato	01/07/2025	01/04/2026	$1.517.606.699.00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	01/07/2025	01/10/2026	$3.035.213.398.00
		Calidad del servicio	01/07/2025	01/04/2026	$1.517.606.699.00

Seguro responsabilidad civil N° 1026253

Nombre Aseguradora	N° póliza	Tipo de amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
La previsora S.A Compañía de Seguro	1026253	Predios, labores y operaciones	30/06/2026	31/10/2025	$758.803.349
		Perjuicios modalidad daño emergente			
		Perjuicios modalidad lucro cesante			

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO FENALCO SOLIDARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com
Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

		Cobertura R.C extracontractual derivada	30806/2025	31/10/2025	$758.803.349
		Cobertura perjuicios extrapatrimoniales			
		Cobertura R.C Contratistas y subcontratistas			
		Cobertura patronal			
		Cobertura R.C vehículos propios y no propios			

Atentamente,

RAMIRO ALEXANDER TUBERQUIA GÓMEZ

Asesor de Convenios y Proyectos
Terminales de Transporte Medellín
Teléfono: 4448020 Ext.: 166
conveniosyproyectos@terminalesmedellin.com
www.terminalesmedellin.com

ANEXOS: Se anexa CD con:

1.EGRESO 1015 AREA METROPOLITANA
2.EGRESO 1016 HERNANDO OTALVARO L Y CIA LTDA
3.EGRESO 1017 CORPORACION BALBOA
4.EGRESO 1020 BIOTECNICOS SAS
5.EGRESO 1021 BIOTECNICOS SAS

Función	*Nombre y cargo*	*Firma*
Proyectó	Edwin Alonso Morales –Director administrativo de EnCicla	
	Sandra Milena Torres Rodas – Profesional Universitario contador de EnCicla	
	Valentina Orjuela Velásquez- Apoyo EnCicla	
Revisó	Edgardo Pérez Cano- Abogado Convenios y Proyectos	

Vigilado SuperTransporte
icontec ISO 9001 SC-3419-1
icontec ISO 14001 SA-CER440081
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICADO PEFC RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.terminalesmedellin.com
Terminal del Norte
Carrera 64C N° 78 - 580 Local 265N
PBX: 604 444 80 20
informacion@terminalesmedellin.com

Código postal 050034
Nit. 890.919.291.1
Medellín - Colombia

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO** **En el marco del Contrato No. 133 de 2024**

Identificación de la estación			
Código interno	Universidad Nacional 1	**Nombre la estación**	Universidad Nacional 1
Municipio	Medellin	**Dirección**	




Verificación de características técnicas según contrato

ALCANCE: Realizar el mantenimiento, adecuaciones e instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de las redes eléctricas de las estaciones automáticas del sistema de bicicletas públicas EnCicla del Área Metropolitana de acuerdo a las necesidades.




Componente	Descripción	Cantidad	Cumple	Observaciones
1	Pintura general del habitáculo completo. La superficie debe quedar homogénea con pintura azul Pantone 3005C para la posterior aplicación de los adhesivos. El procedimiento de pintura será interno y externamente	1		
2	Preparación de superficies de habitáculo, para dicho proceso de recuperación de superficies se debe tener en cuenta la adecuada preparación, con la correcta eliminación del óxido, tratamiento con productos químicos que eliminen presencia de contaminantes, aplicación de masillas y anticorrosivo	1		
3	Latonería general del habitáculo incluye cambio de tuberías y laminas que sean requeridas, Pulido de superficies, trabajos de soldadura, reparaciones metalmecánicas generales	1		
4	Mantenimiento y o reposición elementos que componen el sistema de cierre de habitáculo incluye alineación de riel guía,cambio de rodamientos, ajuste oreposición de poleas, retiro de grasas existentes, lubricación del sistema reposición de platinas y bisagras que componen el sistema.	1		
5	Mantenimiento y/o reposición de niveladores de piso galvanizados valor unidad para habitáculos	8		
6	Reparaciones metalmecánicas en piso de habitáculo, proceso de preparación de superficies para retiro de oxido, aplicación de pintura electrostática negra, incluye cambio de tornillería de fijación.	1		
7	Cambio de lamina de techo habitaculo(policarbonato alveolar transparente de 6mm de espesor	1		
8	Traslado de habitáculo al taller del contratista para reparaciones avanzadas o traslado de habitáculo del taller a la estación o movimientos que ameriten cambio de ubicación de la estación. Por trayecto	2		
Observaciones Generales				

II. Evidencias de los elementos que componen la estación

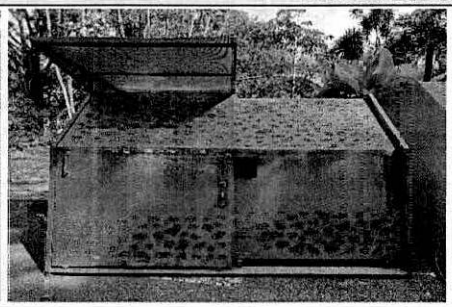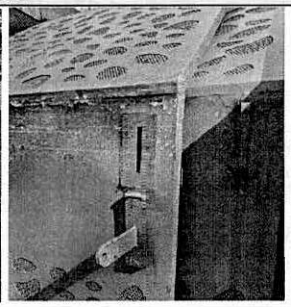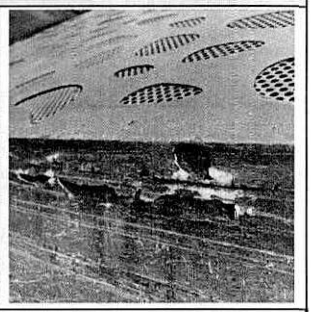FOTOS DEL ANTES

FOTOS DEL DESPUES

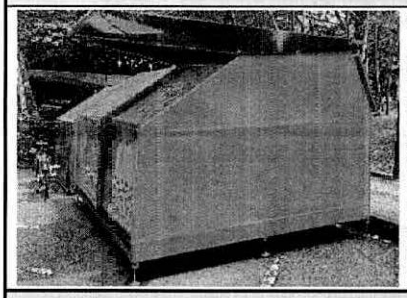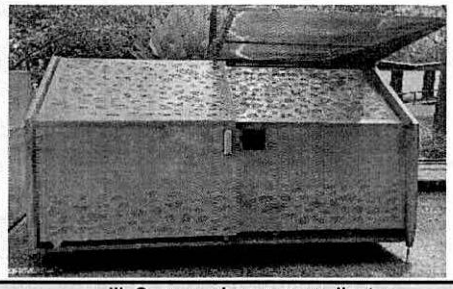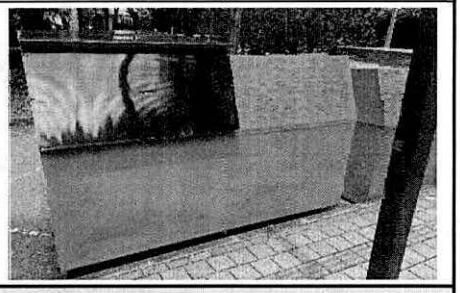III. Compromisos por pendientes

Actividad	Cumplido

IV. Constacia de información

Los abajo firmantes hacen constar que la estación y los trabajos se ejecutaron en su totalidad. Se recibe a satisfacción y con pendientes

Fecha verificación y recibo de estación	18/06/2025

Por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Nombre		Nombre	Carlos Arbey valencia Restrepo
Cargo		Cargo	Supervisor Mecanicos de bicicletas Corporacion BALBOA
Firma		Firma	Carlos A. Valencia R...

Por el contratista - BIOTECNICOS		Por el contratista - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN	
Nombre	Juan Pablo Jaramillo	Nombre	Edwin Alonso Morales Bedoya
Cargo	Ingeniero Biotecnicos	Cargo	Profesional Universitario Director
Firma		Firma	

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO** **En el marco del Contrato No. 133 de 2024**

Identificación de la estación			
Código interno	Floresta 3	**Nombre la estación**	Floresta 3
Municipio	Medellin	**Dirección**	Cl. 48 #79-46, Laureles - Estadio




Verificación de características técnicas según contrato

ALCANCE: Realizar el mantenimiento, adecuaciones e instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de las redes eléctricas de las estaciones automáticas del sistema de bicicletas públicas EnCicla del Área Metropolitana de acuerdo a las necesidades.



Componente	Descripción	Cantidad	Cumple	Observaciones
1	Pintura general del habitáculo completo. La superficie debe quedar homogénea con pintura azul Pantone 3005C para la posterior aplicación de los adhesivos. El procedimiento de pintura será interno y externamente	1		
2	Preparación de superficies de habitáculo, para dicho proceso de recuperación de superficies se debe tener en cuenta la adecuada preparación, con la correcta eliminación del óxido, tratamiento con productos químicos que eliminen presencia de contaminantes, aplicación de masillas y anticorrosivo	1		
3	Latonería general del habitáculo incluye cambio de tuberías y laminas que sean requeridas, Pulido de superficies, trabajos de soldadura, reparaciones metalmecánicas generales	1		
4	Mantenimiento y o reposición elementos que componen el sistema de cierre de habitáculo incluye alineación de riel guía,cambio de rodamientos, ajuste oreposición de poleas, retiro de grasas existentes, lubricación del sistema reposición de platinas y bisagras que componen el sistema.	1		
5	Mantenimiento y/o reposición de niveladores de piso galvanizados valor unidad para habitáculos	8		
6	Reparaciones metalmecánicas en piso de habitáculo, proceso de preparación de superficies para retiro de oxido, aplicación de pintura electrostática negra, incluye cambio de tornillería de fijación.	1		
7	Traslado de habitáculo al taller del contratista para reparaciones avanzadas o traslado de habitáculo del taller a la estación o movimientos que ameriten cambio de ubicación de la estación. Por trayecto	1		
Observaciones Generales				

II. Evidencias de los elementos que componen la estación

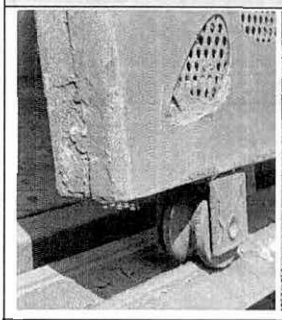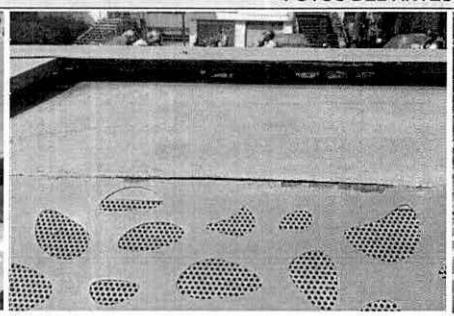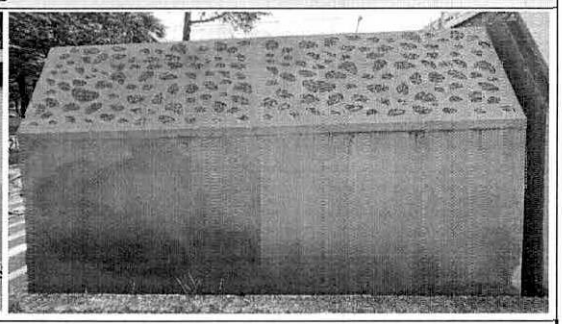FOTOS DEL ANTES

FOTOS DEL DESPUES

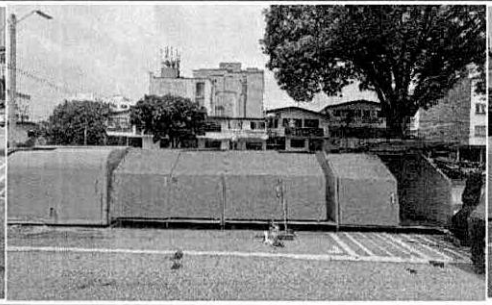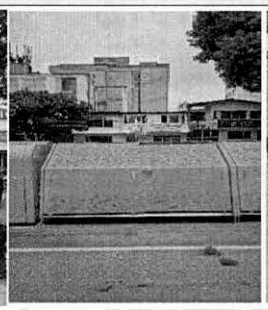
III. Compromisos por pendientes

Actividad	Cumplido

IV. Constacia de información

Los abajo firmantes hacen constar que la estación y los trabajos se ejecutaron en su totalidad. Se recibe a satisfacción y con pendientes

Fecha verificación y recibo de estación		27/05/2025	
Por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá			
Nombre		Nombre	Carlos Arbey valencia Restrepo
Cargo		Cargo	Supervisor Mecanicos de bicicletas Corporacion BALBOA
Firma		Firma	Carlos A. Valencia R.
Por el contratista - BIOTECNICOS		**Por el contratista - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN**	
Nombre	Juan Pablo Jaramillo	Nombre	Edwin Alonso Morales Bedoya
Cargo	Ingeniero Biotecnicos	Cargo	Profesional Universitario Director
Firma		Firma	Edwin

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO** **En el marco del Contrato No. 133 de 2024**

Identificación de la estación			
Código interno	Santa Ana	**Nombre la estación**	Santa Ana
Municipio	Medellin	**Dirección**	



Verificación de caracteristicas técnicas según contrato

ALCANCE: Realizar el mantenimiento, adecuaciones e instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de las redes eléctricas de las estaciones automáticas del sistema de bicicletas públicas EnCicla del Área Metropolitana de acuerdo a las necesidades.

Componente	Descripción	Cantidad	Cumple	Observaciones
1	Pintura general tótem completo. Eliminación de oxido, preparación de superficies, aplicación de pintura electrostática. Se debe tener en cuenta la adecuada preparación de superficies, con la correcta eliminación del óxido, tratamiento de superficie con productos químicos que eliminen los contaminantes, aplicación de masillas. La superficie debe quedar homogénea para la posterior instalación de los adhesivos.	1		
2	Reparación metalmecánica del tótem. Implica recuperación de lámina deformada, oxidada y o deteriorada con corte y/o reposición de material en zonas afectadas (lámina galvanizada y/o lamina HR según sea el caso	1		
3	Mantenimiento y/o reposición de los sistemas de cierre del tótem (cerraduras chapas)	1		
4	Latonería y pintura general módulo completo. Eliminación de oxido, preparación de superficies, aplicación de pintura electrostática. Se debe tener en cuenta la adecuada preparación de superficies, con la correcta eliminación del óxido, tratamiento de superficie con productos químicos que eliminen presencia de contaminantes, aplicación de masillas. La superficie debe quedar homogénea para la posterior aplicación de los adhesivos. El procedimiento de pintura será interno y externamente, incluye transportes para traslados a taller y sitio de instalación	19		
5	Mantenimiento y/o reposición de los sistemas de cierre del módulo (cerraduras chapas), incluye llave unificada y adecuaciones requeridas para reforzar el sistema	19		
6	Instalación y/o ajuste de pernos de 1/2" para modulo, con aplicación de epóxico SIKA ANCHORFIX -4 para estructura metálicas punto de anclaje o tótem	20		
Observaciones Generales	Estacion automática con tótem tipo2, 19 módulos sencillos con chapa tipo casino. Cuenta con todos los rieles de piso instalados y totalmente pintados. Solo se presenta novedad con la chapa del totem que tiene fallas y dificulta el cierre y la apertura. Se recibe con pendientes *(El mantenimiento correctivo se realiza para aumentar la vida util de la estacion)*			


II. Evidencias de los elementos que componen la estación

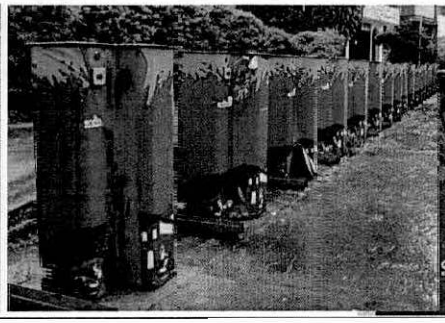FOTOS DEL ANTES


FOTOS DEL DESPUES







III. Compromisos por pendientes

Actividad	Cumplido
Cambiar la chapa de la puerta del totem	

IV. Constacia de información

Los abajo firmantes hacen constar que la estación y los trabajos se ejecutaron en su totalidad. Se recibe a satisfacción y con pendientes

Fecha verificación y recibo de estación	26/05/2026

Por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá			
Nombre		Nombre	Carlos Arbey valencia Restrepo
Cargo		Cargo	Supervisor Mecanicos de bicicletas Corporacion BALBOA
Firma		Firma	Carlos A. Valencia R...

Por el contratista - BIOTECNICOS		Por el contratista - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN	
Nombre	Juan Pablo Jaramillo	Nombre	Edwin Alonso Morales Bedoya
Cargo	Ingeniero Biotecnicos	Cargo	Profesional Universitario Director
Firma	JPJ	Firma	Edwin

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO** **En el marco del Contrato No. 133 de 2024**

Identificación de la estación			
Código interno	Primer Parque de Laureles	**Nombre la estación**	Primer Parque de Laureles
Municipio	Medellin	**Dirección**	Cl. 39d #73-95, Laureles - Estadio

Verificación de características técnicas según contrato

ALCANCE: Realizar el mantenimiento, adecuaciones e instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de las redes eléctricas de las estaciones automáticas del sistema de bicicletas públicas EnCicla del Área Metropolitana de acuerdo a las necesidades.

Componente	Descripción	Cantidad	Cumple	Observaciones
1	Pintura general tótem completo. Eliminación de oxido, preparación de superficies, aplicación de pintura electrostática. Se debe tener en cuenta la adecuada preparación de superficies, con la correcta eliminación del óxido, tratamiento de superficie con productos químicos que eliminen los contaminantes, aplicación de masillas. La superficie debe quedar homogénea para la posterior instalación de los adhesivos.	1		
2	Reparación metalmecánica del tótem. Implica recuperación de lámina deformada, oxidada y o deteriorada con corte y/o reposición de material en zonas afectadas (lámina galvanizada y/o lamina HR según sea el caso	1		
3	Mantenimiento y/o reposición de los sistemas de cierre del tótem (cerraduras chapas)	1		
4	Latonería y pintura general módulo completo. Eliminación de oxido, preparación de superficies, aplicación de pintura electrostática. Se debe tener en cuenta la adecuada preparación de superficies, con la correcta eliminación del óxido, tratamiento de superficie con productos químicos que eliminen presencia de contaminantes, aplicación de masillas. La superficie debe quedar homogénea para la posterior aplicación de los adhesivos. El procedimiento de pintura será interno y externamente, incluye transportes para traslados a taller y sitio de instalación	16		
5	Suministro e instalacion chapas de seguridad módulo	16		
6	Instalación y/o ajuste de pernos de 1/2" para modulo, con aplicación de epóxico SIKA ANCHORFIX -4 para estructura metálicas punto de anclaje o tótem	17		
Observaciones Generales	Estacion automática con tótem tipo1, 16 módulos dobles con chapa tipo casino. Falta instalar 1 Riel de Piso. Se recibe con pendientes. (El mantenimiento correctivo se realiza para aumentar la vida util de la estacion)			

II. Evidencias de los elementos que componen la estación
FOTOS DEL ANTES





FOTOS DEL DESPUES









III. Compromisos por pendientes	
Actividad	**Cumplido**
Instalar riel de piso faltante	

IV. Constacia de información			
Los abajo firmantes hacen constar que la estación y los trabajos se ejecutaron en su totalidad. Se recibe a satisfacción y con pendientes			
Fecha verificación y recibo de estación		4/06/2025	
Por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá			
Nombre		Nombre	Carlos Arbey valencia Restrepo
Cargo		Cargo	Supervisor Mecanicos de bicicletas Corporacion BALBOA
Firma		Firma	Carlos A. Valencia R...
Por el contratista - BIOTECNICOS		**Por el contratista - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN**	
Nombre	Juan Pablo Jaramillo	Nombre	Edwin Alonso Morales Bedoya
Cargo	Ingeniero Biotecnicos	Cargo	Profesional Universitario Director
Firma		Firma	

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO** **En el marco del Contrato No. 133 de 2024**

Identificación de la estación			
Código interno	Cacique Candela	**Nombre la estación**	Cacique Candela
Municipio	Medellin	**Dirección**	Cq. 73B #39-4, Laureles - Estadio


Verificación de características técnicas según contrato

ALCANCE: Realizar el mantenimiento, adecuaciones e instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de las redes eléctricas de las estaciones automáticas del sistema de bicicletas públicas EnCicla del Área Metropolitana de acuerdo a las necesidades.

Componente	Descripción	Cantidad	Cumple	Observaciones
1	Pintura general tótem completo. Eliminación de oxido, preparación de superficies, aplicación de pintura electrostática. Se debe tener en cuenta la adecuada preparación de superficies, con la correcta eliminación del óxido, tratamiento de superficie con productos químicos que eliminen los contaminantes, aplicación de masillas. La superficie debe quedar homogénea para la posterior instalación de los adhesivos.	1		
2	Reparación metalmecánica del tótem. Implica recuperación de lámina deformada, oxidada y o deteriorada con corte y/o reposición de material en zonas afectadas (lámina galvanizada y/o lamina HR según sea el caso	1		
3	Mantenimiento y/o reposición de los sistemas de cierre del tótem (cerraduras chapas)	1		
4	Latonería y pintura general módulo completo. Eliminación de oxido, preparación de superficies, aplicación de pintura electrostática. Se debe tener en cuenta la adecuada preparación de superficies, con la correcta eliminación del óxido, tratamiento de superficie con productos químicos que eliminen presencia de contaminantes, aplicación de masillas. La superficie debe quedar homogénea para la posterior aplicación de los adhesivos. El procedimiento de pintura será interno y externamente, incluye transportes para traslados a taller y sitio de instalación	10		
5	Suministro e instalacion chapas de seguridad módulo	10		
6	Instalación y/o ajuste de pernos de 1/2" para modulo, con aplicación de epóxico SIKA ANCHORFIX -4 para estructura metálicas punto de anclaje o tótem	11		
Observaciones Generales	Estacion automática con tótem tipo1, 10 módulos dobles con chapa de seguridad. (El mantenimiento correctivo se realiza para aumentar la vida util de la estacion)			

II. Evidencias de los elementos que componen la estación

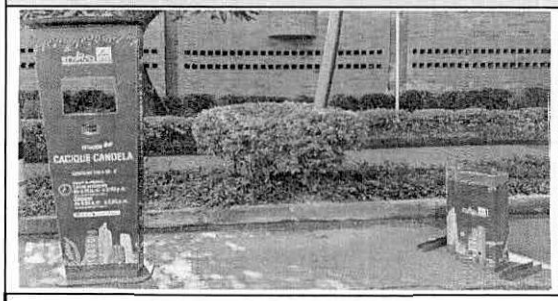
FOTOS DEL ANTES








FOTOS DEL DESPUES

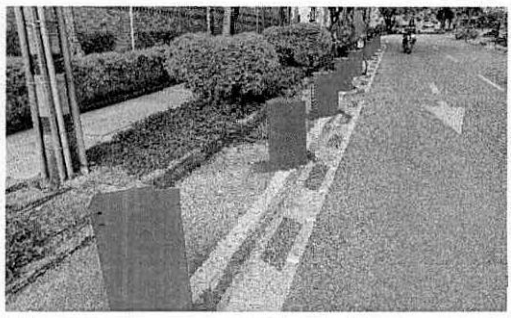


III. Compromisos por pendientes

Actividad	Cumplido

IV. Constacia de información

Los abajo firmantes hacen constar que la estación y los trabajos se ejecutaron en su totalidad. Se recibe a satisfacción y con pendientes

Fecha verificación y recibo de estación	6/06/2025

Por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Nombre		Nombre	Carlos Arbey valencia Restrepo
Cargo		Cargo	Supervisor Mecanicos de bicicletas Corporacion BALBOA
Firma		Firma	Carlos A. Valencia R...

Por el contratista - BIOTECNICOS		Por el contratista - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN	
Nombre	Juan Pablo Jaramillo	Nombre	Edwin Alonso Morales Bedoya
Cargo	Ingeniero Biotecnicos	Cargo	Profesional Universitario Director
Firma		Firma	

Alcaldía de Medellín — Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO**
	En el marco del Contrato No. 133 de 2024

Identificación de la estación			
Código interno	Guanteros	**Nombre la estación**	Guanteros
Municipio	Medellin	**Dirección**	Cra. 43 #38a Sur-20, Zona 9, Envigado, Antioquia


Verificación de características técnicas según contrato


ALCANCE: Realizar el mantenimiento, adecuaciones e instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de las redes eléctricas de las estaciones automáticas del sistema de bicicletas públicas EnCicla del Área Metropolitana de acuerdo a las necesidades.

Componente	Descripción	Cantidad	Cumple	Observaciones
1	Pintura general tótem completo. Eliminación de oxido, preparación de superficies, aplicación de pintura electrostática. Se debe tener en cuenta la adecuada preparación de superficies, con la correcta eliminación del óxido, tratamiento de superficie con productos químicos que eliminen los contaminantes, aplicación de masillas. La superficie debe quedar homogénea para la posterior instalación de los adhesivos.	1		
2	Reparación metalmecánica del tótem. Implica recuperación de lámina deformada, oxidada y o deteriorada con corte y/o reposición de material en zonas afectadas (lámina galvanizada y/o lamina HR según sea el caso.	1		
3	Mantenimiento y/o reposición de los sistemas de cierre del tótem (cerraduras chapas).	1		
4	Latonería y pintura general módulo completo. Eliminación de oxido, preparación de superficies, aplicación de pintura electrostática. Se debe tener en cuenta la adecuada preparación de superficies, con la correcta eliminación del óxido, tratamiento de superficie con productos químicos que eliminen presencia de contaminantes, aplicación de masillas. La superficie debe quedar homogénea para la posterior aplicación de los adhesivos. El procedimiento de pintura será interno y externamente, incluye transportes para traslados a taller y sitio de instalación	18		
5	Mantenimiento y/o reposición de los sistemas de cierre del módulo (cerraduras-chapas), incluye llave unificada y adecuaciones requeridas para reforzar el sistema.	18		
6	Instalación y/o ajuste de pernos de 1/2" para modulo, con aplicación de epóxico SIKA ANCHORFIX -4 para estructura metálicas punto de anclaje o tótem.	19		
Observaciones Generales				


II. Evidencias de los elementos que componen la estación

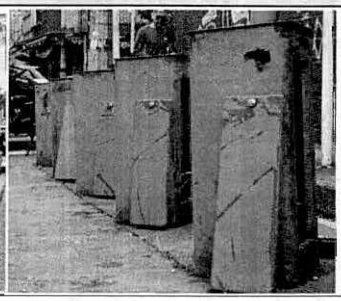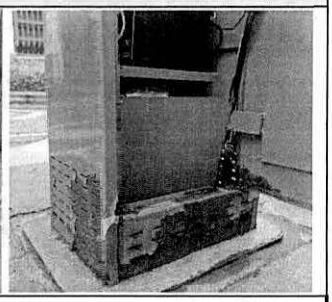FOTOS DEL ANTES



FOTOS DEL DESPUES

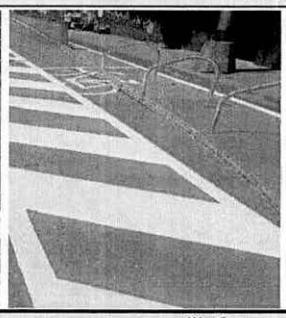
III. Compromisos por pendientes

Actividad	Cumplido

IV. Constacia de información

Los abajo firmantes hacen constar que la estación y los trabajos se ejecutaron en su totalidad. Se recibe a satisfacción y con

Fecha verificación y recibo de estación	17/07/2025

Por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá			
Nombre		Nombre	Carlos Arbey valencia Restrepo
Cargo		Cargo	Supervisor Mecanicos de bicicletas Corporacion BALBOA
Firma		Firma	Carlos A. Valencia R...

Por el contratista - BIOTECNICOS		Por el contratista - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN	
Nombre	Juan Pablo Jaramillo	Nombre	Edwin Alonso Morales Bedoya
Cargo	Ingeniero Biotecnicos	Cargo	Profesional Universitario Director
Firma		Firma	

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO** **En el marco del Contrato No. 133 de 2024**

Identificación de la estación			
Código interno	Florida Nueva	**Nombre la estación**	Florida Nueva
Municipio	Medellin	**Dirección**	Cl. 47 # 72-21, Laureles - Estadio, Medellín



Verificación de características técnicas según contrato

ALCANCE: Realizar el mantenimiento, adecuaciones e instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de las redes eléctricas de las estaciones automáticas del sistema de bicicletas públicas EnCicla del Área Metropolitana de acuerdo a las necesidades.

Componente	Descripción	Cantidad	Cumple	Observaciones
1	Pintura general tótem completo. Eliminación de oxido, preparación de superficies, aplicación de pintura electrostática. Se debe tener en cuenta la adecuada preparación de superficies, con la correcta eliminación del óxido, tratamiento de superficie con productos químicos que eliminen los contaminantes, aplicación de masillas. La superficie debe quedar homogénea para la posterior instalación de los adhesivos.	1		
2	Reparación metalmecánica del tótem. Implica recuperación de lámina deformada, oxidada y o deteriorada con corte y/o reposición de material en zonas afectadas (lámina galvanizada y/o lamina HR según sea el caso.	1		
3	Mantenimiento y/o reposición de los sistemas de cierre del tótem (cerraduras chapas).	1		
4	Latonería y pintura general módulo completo. Eliminación de oxido, preparación de superficies, aplicación de pintura electrostática. Se debe tener en cuenta la adecuada preparación de superficies, con la correcta eliminación del óxido, tratamiento de superficie con productos químicos que eliminen presencia de contaminantes, aplicación de masillas. La superficie debe quedar homogénea para la posterior aplicación de los adhesivos. El procedimiento de pintura será interno y externamente, incluye transportes para traslados a taller y	8		
5	Suministro e instalacion chapas de seguridad módulo.	8		
6	Instalación y/o ajuste de pernos de 1/2" para modulo, con aplicación de epóxico SIKA ANCHORFIX -4 para estructura metálicas punto de anclaje o tótem.	9		
Observaciones Generales				


II. Evidencias de los elementos que componen la estación

FOTOS DEL ANTES


FOTOS DEL DESPUES



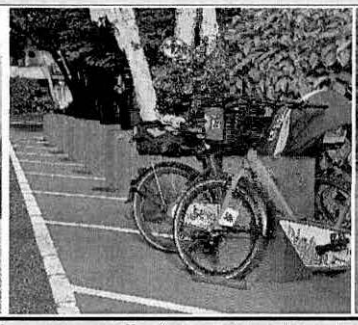


III. Compromisos por pendientes

Actividad	Cumplido

IV. Constacia de información

Los abajo firmantes hacen constar que la estación y los trabajos se ejecutaron en su totalidad. Se recibe a satisfacción y con

Fecha verificación y recibo de estación	15/07/2025

Por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá			
Nombre		Nombre	Carlos Arbey valencia Restrepo
Cargo		Cargo	Supervisor Mecanicos de bicicletas Corporacion BALBOA
Firma		Firma	Carlos A. Valencia R...

Por el contratista - BIOTECNICOS		Por el contratista - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN	
Nombre	Juan Pablo Jaramillo	Nombre	Edwin Alonso Morales Bedoya
Cargo	Ingeniero Biotecnicos	Cargo	Profesional Universitario Director
Firma		Firma	

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**ANEXO TÉCNICO ACTA DE RECIBO**
	En el marco del Contrato No. 133 de 2024


Identificación de la estación			
Código interno	Teatro Metropolitano	**Nombre la estación**	Teatro Metropolitano
Municipio	Medellin	**Dirección**	

Verificación de características técnicas según contrato

ALCANCE: Realizar el mantenimiento, adecuaciones e instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de las redes eléctricas de las estaciones automáticas del sistema de bicicletas públicas EnCicla del Área Metropolitana de acuerdo a las necesidades.

Componente	Descripción	Cantidad	Cumple	Observaciones
1	Pintura general tótem completo. Eliminación de oxido, preparación de superficies, aplicación de pintura electrostática. Se debe tener en cuenta la adecuada preparación de superficies, con la correcta eliminación del óxido, tratamiento de superficie con productos químicos que eliminen los contaminantes, aplicación de masillas. La superficie debe quedar homogénea para la posterior instalación de los adhesivos.	1		
2	Reparación metalmecánica del tótem. Implica recuperación de lámina deformada, oxidada y o deteriorada con corte y/o reposición de material en zonas afectadas (lámina galvanizada y/o lamina HR según sea el caso.	1		
3	Mantenimiento y/o reposición de los sistemas de cierre del tótem (cerraduras chapas).	1		
4	Latonería y pintura general módulo completo. Eliminación de oxido, preparación de superficies, aplicación de pintura electrostática. Se debe tener en cuenta la adecuada preparación de superficies, con la correcta eliminación del óxido, tratamiento de superficie con productos químicos que eliminen presencia de contaminantes, aplicación de masillas. La superficie debe quedar homogénea para la posterior aplicación de los adhesivos. El procedimiento de pintura será interno y externamente, incluye transportes para traslados a taller y sitio de instalación.	14		
5	Suministro e instalacion chapas de seguridad módulo.	14		
6	Instalación y/o ajuste de pernos de 1/2" para modulo, con aplicación de epóxico SIKA ANCHORFIX -4 para estructura metálicas punto de anclaje o tótem.	15		
Observaciones Generales				

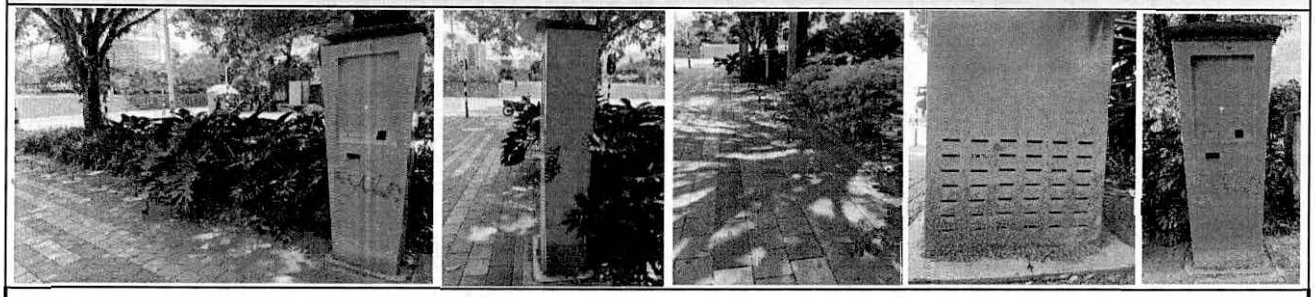II. Evidencias de los elementos que componen la estación
FOTOS DEL ANTES



FOTOS DEL DESPUES



III. Compromisos por pendientes	
Actividad	**Cumplido**

IV. Constacia de información	
Los abajo firmantes hacen constar que la estación y los trabajos se ejecutaron en su totalidad. Se recibe a satisfacción y con	
Fecha verificación y recibo de estación	18/07/2025

Por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá			
Nombre		Nombre	Carlos Arbey valencia Restrepo
Cargo		Cargo	Supervisor Mecanicos de bicicletas Corporacion BALBOA
Firma		Firma	Carlos A. Valencia R...
Por el contratista - BIOTECNICOS		**Por el contratista - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN**	
Nombre	Juan Pablo Jaramillo	Nombre	Edwin Alonso Morales Bedoya
Cargo	Ingeniero Biotecnicos	Cargo	Profesional Universitario Director
Firma		Firma	
