INFORME QUINCENAL No.20
PERIODO: 01/02/2025 – 15/02/2025

CONTRATO DE CONSULTORIA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC".

CLIENTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VERSIÓN: VA

BOGOTÁ D.C.

FEBRERO DE 2025

Control de Cambios					
Versión	**Realizada por**	**Revisada por**	**Aprobada por**	**Fecha**	**Cambios al documento anterior**
VA01	SAC	YFSS	NFRV	19/02/2025	Versión Inicial

Tabla de contenido

1 CAPÍTULO 1. COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 9
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 9
1.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 10
1.2.1 Firma acta de inicio: 10
1.2.2 Suspensión No. 1: 10
1.2.3 Prorroga No. 1 10
1.2.4 Actualización de Pólizas: 10
1.2.5 Hojas de vida personal de consultoría: 10
1.2.6 Solicitud de pago No. 1: 11
1.2.7 Radicación documentos para pago No. 1: 11
1.2.8 Otro si No.2 para aclaración del presupuesto: 11
1.2.9 Solicitud de suspensión No. 2: 11
1.2.10 Solicitud de pago No. 2 11
1.2.11 Suspensión No. 2 12
1.2.12 Solicitud de prorroga No. 2 12
1.2.13 Solicitud de pago No. 3 12
1.2.14 Prorroga No. 4 12
1.2.15 Solicitud de pago No. 4 13
1.2.16 Cuadro control legal y financiero: 13
1.2.17 Actas de comités técnicos: 13
1.2.18 Correspondencia enviada: 16
1.2.19 Correspondencia recibida: 23
1.2.20 Personal presentado por la Consultoría: 26
1.3 ANÁLISIS Y CONTROL AVANCE DE EJECUCIÓN 27
1.3.1 Programación y control de actividades de la consultoría 27
1.4 ASPECTOS TÉCNICOS 31
1.4.1 Visita de reconocimiento: 31
1.4.2 Levantamiento topográfico y de redes: 33
1.4.3 Levantamiento estructural y arquitectónico: 33
1.4.4 Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico, estructural, topográfico y de redes: 34
1.4.5 Elaboración del informe de análisis de información existente 34
1.4.6 Exploración en campo y obtención de muestras de geotecnia: 35
1.4.7 Ensayos de laboratorio sobre muestras de suelo obtenidas: 35
1.4.8 Estudio de suelos: 35
1.4.9 Inspección detallada y levantamiento de lesiones: 36
1.4.10 Ejecución del plan de ensayos de estudio patológico 36
1.4.11 Ensayos de laboratorio sobre muestras de materiales obtenidas: 37
1.4.12 Elaboración de informe de patología estructural: 37

1.4.13 Elaboración de informe de vulnerabilidad estructural:_____ 38
1.4.14 Elaboración de diagnóstico de cumplimiento Títulos J y K _____ 38
1.4.15 Análisis de las alternativas de reforzamiento (costo beneficio: reforzamiento u obra nueva) 38
1.4.16 Levantamiento topográfico y estudio de suelos Pedregal _____ 39
1.4.17 Diseño de muros de cerramiento de la Guyana _____ 39
1.5 ANÁLISIS Y CONTROL PRESUPUESTAL _____ 40
1.6 ANEXOS _____ 40

Lista de imágenes

Imagen 1. Visita reconocimiento EPMSC Tuluá 32
Imagen 2. Visita reconocimiento COPED Pedregal 32
Imagen 3. Visita reconocimiento EPMSC Puerto Berrío 32
Imagen 4. Visita reconocimiento EPMSC San Andrés 32
Imagen 5. Evidencia de metodologías EPMSC Puerto Berrío 32
Imagen 6. Evidencias de metodologías COPED Pedregal 32
Imagen 7. Evidencias de metodologías EPMSC Puerto Berrio 32
Imagen 8. Evidencias de metodologías EPMSC San Andrés 32
Imagen 9. Evidencia Plan de Manejo Ambiental 33
Imagen 10. Evidencia Plan de seguridad y salud ocupacional 33
Imagen 11. Levantamiento topográfico EPMSC Puerto Berrio 33
Imagen 12. Levantamiento topográfico EMPSC San Andrés 33
Imagen 13. Levantamiento topográfico EPMSC Tuluá 33
Imagen 14. Levantamientos EPMSC Puerto Berrio 34
Imagen 15. Levantamientos EPMSC Tuluá 34
Imagen 16. Levantamientos EPMSC San Andrés 34
Imagen 17. Informe diagnostico EPMSC Puerto Berrío 34
Imagen 18. Informe diagnostico EPMSC Tuluá 34
Imagen 19. Informe diagnostico EPMSC San Andrés 34
Imagen 20. Exploración geotécnica EPMSC Puerto Berrio 35
Imagen 21. Exploración geotécnica EPMSC San Andrés 35
Imagen 22. Evidencia estudio de suelos EPMSC Tuluá 35
Imagen 23. Evidencia estudio de suloes EPMSC Puerto Berrío 35
Imagen 24. Evidencia estudio de suelos EPMSC San Andrés 35
Imagen 25. Levantamiento de lesiones EPMSC Puerto Berrío 36
Imagen 26. Levantamiento de lesiones EPMSC Tuluá 36
Imagen 27. Levantamiento de lesiones EPMSC San Andrés 36
Imagen 28. Ensayos destructivos EPMSC Puerto Berrío 37
Imagen 29. Ensayos destructivos EPMSC Tuluá 37
Imagen 30. Ensayos destructivos EPMSC San Andrés 37
Imagen 31. Evidencia de informe de laboratorio EPMSC Puerto Berrío 37

Imagen 32. Evidencia de informe de laboratorio EPMSC Tuluá 37
Imagen 33. Evidencia informe de patología EPMSC Puerto Berrío 38
Imagen 34. Evidencia informe de patología EPMSC Tuluá 38
Imagen 35. Evidencia informe de patología EPMSC San Andrés 38
Imagen 36. Informe de vulnerabilidad EPMSC Puerto Berrío 38
Imagen 37. Informe de vulnerabilidad EPMSC Tuluá 38
Imagen 38. Informe de vulnerabilidad EPMSC San Andrés 38
Imagen 39. Evidencia de informe costo-beneficio EPMSC Puerto Berrío 39
Imagen 40. Evidencia presupuesto visitas intimas EPMSC San Andrés 39
Imagen 41. Exploración geotécnica COPED Pedregal 39
Imagen 42. Evidencia de Estudio de suelos COPED Pedregal 39
Imagen 43. Memorias de cálculo Muro de cerramiento COPED Pedregal 40
Imagen 44. Avance planos estructurales muro COPED Pedregal. 40
Imagen 45. Avance planos estructurales muro COPED Pedregal. 40
Imagen 46. Avance planos estructurales muro COPED Pedregal. 40

Lista de tablas

Tabla 1. Datos del contrato 9
Tabla 2. Control de documentos legales 13
Tabla 3. Relación de actas de comités 15
Tabla 4. Correspondencia enviada 22
Tabla 5. Correspondencia recibida 26
Tabla 6. Personal aprobado Consultoría 27
Tabla 7. Control de actividades de programación 31
Tabla 8. Control ejecución – Por establecimiento 31
Tabla 9. Control Financiero 40

1 CAPÍTULO 1. COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

A continuación, se presentan los datos generales del contrato

NUMERO DE CONTRATO	USPEC-CT-354-2023
FECHA DE CONTRATO	29/12/2023
CONTRATISTA	Consultoría y Construcciones Civiles SAS
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT	900.171.000-8
PROYECTO	1006-VUL REF EST PENIT Y CARCELARIOS-USPEC
VALOR	$599.965.769
PLAZO INICIAL	3 días
FECHA ACTA DE INICIO	29/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023 a 29/01/2024
PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1	29/01/2024 a 29/02/2024
PRORROGA No. 1	29/02/2024 a 19/07/2024
SUSPENSIÓN No. 2	08/07/2024 a 21/08/2024
OTRO SI No. 3 PRORROGA	Hasta el 29/11/2024
OTRO SI No. 4 MODIFICACIÓN Y PRORROGA	Hasta el 03/03/2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	03/03/2025
OBJETO	Consultoría técnica para la realización de los estudios y análisis de vulnerabilidad sísmica que permita determinar el tipo de reforzamiento estructural y/o ampliación requerida para la elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional a cargo del INPEC.

Tabla 1. Datos del contrato

El presente informe quincenal se realiza como parte del Contrato No. 354 del 29 de diciembre de 2023 que tiene por objeto CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC.

1.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.2.1 Firma acta de inicio:

El día 29-12-2023 se lleva a cabo la firma del acta de inicio por parte de la supervisión y la consultoría.

1.2.2 Suspensión No. 1:

El día 29-12-2023 se lleva a cabo la solicitud de suspensión del contrato de consultoría por termino de un mes con fecha de reinicio 29-01-2024. Teniendo en cuenta las dificultades para iniciar actividades en temporada de fin de año.

1.2.2.1 Prorroga a la Suspensión No. 1:

El día 26-01-2024 se lleva a cabo la solicitud de prórroga a la suspensión No. 1 del contrato, con fecha de reinicio 29-02-2024. Teniendo en cuenta que no se cuenta con personal técnico especializado para apoyo a la supervisión.

1.2.3 Prorroga No. 1

Los días 21-02-2024 y 26-02-2024 se realiza solicitud de prorroga al contrato de consultoría por un término de cuatro (4) meses y diecinueve (19) días, teniendo en cuenta que el plazo inicial es de tres (3) días, que no sería suficiente para el cumplimiento del objeto del alcance contractual, para tener nueva fecha de finalización 19 de julio de 2024.

1.2.4 Actualización de Pólizas:

El día 06-02-2024 se hace envío de las pólizas actualizadas para revisión de la entidad y ese mismo día se recibe aprobación, la cuales son subidas al SECOP II, seguido del reinicio del contrato se realiza la actualización de las pólizas; se envían para aprobación de la entidad el día 05-03-2024 y se cargan a SECOP II el día 11-03-2024, a la fecha se tienen actualizadas las pólizas correspondientes con la última modificación al contrato.

1.2.5 Hojas de vida personal de consultoría:

El 05/03/2024 se hace el envío a la supervisión del contrato mediante oficio de consultoría No. PY1006-OF-13-2024 los documentos del personal mínimo para la revisión del mismo.

1.2.6 Solicitud de pago No. 1:

El 29/04/2024 se hace envío de la solicitud a la supervisión del contrato mediante oficio OF13-PY1006-2024 de los documentos para el pago número 1 del proyecto en referencia.

1.2.7 Radicación documentos para pago No. 1:

El día 07/06/2024 se realizó el cargue de los documentos correspondientes a la plataforma INFODOC para la radicación del correspondiente pago No. 1, aún se está a la espera del pago por parte de la entidad.

1.2.8 Otro si No.2 para aclaración del presupuesto:

Se realizó solicitud de modificación del contrato por parte de la supervisión a gestión contractual de la USPEC el día 20/06/2024, sin embargo, esta no se encuentra tramitada en debida forma por parte de la entidad.

1.2.9 Solicitud de suspensión No. 2:

El día 21/06/2024 mediante oficio OF49-PY1006-2024 se realizó solicitud de suspensión del contrato por un término de 60 días calendario, teniendo en cuenta las situaciones presentadas en los establecimientos de San Andrés, Pedregal y Manizales.

El día 27/06/2024 mediante oficio OF54-PY1006-2024 se realiza reiteración a la solicitud de suspensión No. 2.

1.2.10 Solicitud de pago No. 2

El día 05/06/2024 se envió a la supervisión del contrato mediante oficio OF47-PY1006-2024 los documentos para solicitud del pago número 2 del proyecto. Sin embargo, no se ha recibido aprobación de los mismos para la radicación de la factura en SIIFNACION.

La aprobación de los documentos no se ha recibido por parte de la supervisión dado que se manifestó por parte de la entidad que no se podrá tramitar el pago hasta tanto quede en firme y en debida forma por parte de la entidad la modificación realizada para la forma de pago del contrato (OTROSI del contrato en referencia)

El día 20 de junio se recibe por parte de la supervisión la solicitud de modificación al contrato No. 354 de 2024 enviada al director de gestión contractual y el día 05 de julio se legaliza la modificación del contrato con respecto a la especificación de la forma de pago.

1.2.11 Suspensión No. 2

El día 08/07/2024 se realizó la firma de acta de suspensión del contrato por 45 días a partir de 8 de julio de 2024 al 21 de agosto de 2024, motivada por las diversas situaciones externas presentadas durante la ejecución del contrato.

1.2.12 Solicitud de prorroga No. 2

El día 06/08/2024 se envió solicitud a la supervisión solicitud de prórroga al contrato por un término de dos (2) meses y veintiocho (28) días hasta el 29 de noviembre de 2025, mediante oficio OF56-PY1006-2024.

El día 22/08/2024 se realizó reunión entre la supervisión del contrato y la consultoría, para la revisión de la solicitud de prórroga.

El día 26/08/2024 se realizó reiteración de la solicitud de prorroga del contrato mediante oficio OF57-PY1006-2024

El día 30/08/2024 se suscribió el Otro Si No. 3 de Prorroga al contrato No. USPEC-CT-354-2023, hasta el día 29 de noviembre de 2024

1.2.13 Solicitud de pago No. 3

El día 25/09/2024 se envió a la supervisión del contrato mediante oficio OF67-PY1006-2024 los documentos para solicitud del pago número 3 del proyecto. Y el 02/10/2024 se realizó carga de factura electrónica en el aplicativo SIIF Nación

El día 18/10/2024 se realiza nueva emisión de factura electrónica tras corrección de observaciones.

1.2.14 Prorroga No. 4

El día 29 de noviembre de 2024 se realiza emisión de memorando con radicado i-2024-004238 por parte de la Subdirección de construcción y conservación de la USPEC, para la realización de Otro Si al contrato USPEC-CT-354-2023, en que se solicita prorroga de la ejecución del contrato hasta el día 03 de marzo del año 2025 y se realiza modificación a los entregables y forma de pago del contrato

1.2.15 Solicitud de pago No. 4

El día 01/11/2024 se envió a la supervisión del contrato mediante oficio OF70-PY1006-2024 los documentos para solicitud del pago número 4 del proyecto. Y el día 07/11/2024 se realizó carga de factura electrónica FECO 252 en el aplicativo SIIF Nación.

1.2.16 Solicitud pago de facturas pendientes

El día 09 de enero de 2025, mediante oficio No. OF81-PY1006-2025 se realiza lo solicitud de pagos de las facturas pendientes correspondientes al contrato No. 354 de 2023, emitidas en los meses de octubre y noviembre de 2024 y el día 14 de febrero de 2025 se da respuesta a comunicado No. E-2025-000851, reiterando nuevamente la solicitud de pago oportuno teniendo en cuenta las obligaciones contractuales establecidas. A la fecha no se ha recibido respuesta de los oficios enviados y radicados.

1.2.17 Cuadro control legal y financiero:

CUADRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS LEGALES	
DOCUMENTO CONTRACTUAL	**FECHA DEL DOCUMENTO**
Contrato USPEC-CT-354	29 de diciembre de 2023
Acta de inicio	29 de diciembre de 2023
Suspensión No. 1	29 de diciembre de 2023
Prorroga a la suspensión No. 1	29 de enero de 2024
Reinicio	29 de febrero de 2024
OTRO SI No. 1	29 de febrero de 2024
OTRO SI No. 2	05 de julio de 2024
Suspensión No. 2	08 de julio de 2024
Tiempo de suspensión	45 días calendario
Reinicio suspensión No. 2	21 de agosto de 2024
OTRO SI No. 3	29 de noviembre de 2024
OTRO SI No. 4	03 de marzo de 2025
Plazo de ejecución actual	03 de marzo de 2025

Tabla 2. Control de documentos legales

1.2.18 Actas de comités técnicos:

COMITE	FECHA	HORA	LUGAR	OBJETIVO
No. 01	04-03-2024	4:00 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad ERON San Andrés
No. 02	05-03-2024	8:30am	Reunión presencial – USPEC – Edificio Elemento	Reunión de seguimiento Consultoría contrato 354 de 2023

No. 03	05-03-2024	4:00 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad CPMTUL
No. 04	05-03-2024	3:00 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad EPMS Puerto Berrio
No. 05	11-03-2024	2:30 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad EPMSC Manizales
No. 06	13-03-2024	9:00 am	Edificio Elemento – Archivo USPEC	Recolección de información existente
No. 07	21/03/2024	8:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 1
No. 08	05/04/2024	8:45 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 2
No. 09	11/04/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 3
No. 10	12/04/2024	2:30 pm	Reunión Virtual	Reunión virtual – revisión de presupuesto
No. 11	18/04/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 4
No 12	22/04/2024	3:00 pm	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 5
No. 13	25/04/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 6
No. 14	25/04/2024	2:30 pm	Reunión Virtual	Inquietudes cuenta 01 contrato
No. 15	26/04/2024	9:30 am	Reunión Virtual	Presentación avance Estudios de vulnerabilidad
No. 16	02/05/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 7
No. 17	09/05/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 8
No. 18	16/05/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 9
No. 19	23/05/2024	2:30 pm	Reunión Virtual	Revisión EPMSC Puerto Berrio
No. 20	30/05/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 10
No. 21	05/06/2024	7:00 pm	Reunión Virtual	Revisión cargue documentos Infodoc

No. 22	06/06/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 11
No. 23	13/06/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 12
No. 24	17/06/2024	3:15 pm	Reunión Virtual	Revisión análisis Costo Beneficio
No. 25	20/06/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 13
No. 26	27/06/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 14
No. 27	22/06/2024	9:30 am	Reunión Virtual	Revisión prorroga Contrato
No. 28	27/08/2024	11:00 am	Reunión Virtual	Revisión avance Establecimiento de San Andrés.
No. 29	02/09/2024	04:00 pm	Reunión Virtual	Revisión Áreas San Andrés
No. 30	13/09/2024	11:15 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 15
No. 31	20/09/2024	11:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 16
No. 32	27/09/2024	11:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 17
No. 33	03/10/2024	11:00 am	Reunión Virtual	Revisión Documentos Liquidación Contrato
No. 34	04/10/2024	3:15 pm	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 18
No. 35	15/10/2024	2:30 pm	Reunión Virtual	Revisión ejecución Estudio Pedregal
No. 36	17/10/2024	11:00 am	Reunión Virtual	Revisión ejecución COPED Pedregal
No. 37	25/10/2024	3:00 pm	Reunión virtual	Comité de seguimiento No. 19
No. 38	30/10/2024	8:00 pm	Reunión virtual	Revisión ejecución COPED Pedregal
No. 39	15/11/2024	4:00 pm	Reunión virtual	Comité de seguimiento No. 20
No. 40	18/11/2024	3:00 pm	Reunión virtual	Revisión pendientes modificaciones contrato 354 de 2023
No. 41	19/11/2024	9:00 am	Reunión virtual	Revisión de Diseño Visitas Intimas EPMSC San Andrés
No. 42	25/11/2024	3:00 pm	Reunión virtual	Reunión revisión Contrato 354 de 2023
No. 43	28/11/2024	10:30 am	Reunión virtual	Revisión contrato 354 de 2023
No. 44	06/12/2024	2:00 pm	Reunión virtual	Revisión tema Fiducia
No. 45	05/02/2024	10:00 am	Reunión virtual	Revisión estudio de suelos Pedregal

Tabla 3. Relación de actas de comités

1.2.19 Correspondencia enviada:

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF01-PY1006-2024	29/12/2023	Jhon Carlos Quintero Lamprea	Solicitud de suspensión	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
002	5/01/2022	INTERVENTORIA-Ing Abelardo Duarte Lozano universidad.militar@gmail.com	Solicitud modificación de fecha de entrega compromisos posteriores a la firma de acta de inicio	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF02-PY1006-2024	26/01/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga de la suspensión del contrato	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF03-PY1006-2024	21/02/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga No.1 del contrato en referencia	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF04-PY1006-2024	26/02/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga No.1 del contrato en referencia	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF05-PY1006-2024	26/02/2024	OCCRE-director Delroy Gordon Fox	Solicitud de la tarjeta de residencia temporal	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF06-PY1006-2024	1/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud reuniones de inicio directores de las unidades de servicios penitenciarios y carcelarios - USPEC	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF07-PY1006-2024	4/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega cronograma de visitas y solicitud de permisos de ingreso inicio de levantamientos	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF08-PY1006-2024	4/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Reiteración visitas, Entrega cronograma de visitas y solicitud de permisos de ingreso inicio de levantamientos	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF09-PY1006-2024	5/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud definición unidades estructurales de estudio	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF10-PY1006-2024	8/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de información existente en ERON San Andrés		X		X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF11-PY1006-2024	7/03/2024	ICANH-Instituto Colombiano de Antropología e Historia	Solicitud de información zonas de interés arqueológico	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF13-PY1006-2024	5/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega personal mínimo - CON 354 DE 2024	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF14-PY1006-2024	6/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega planes y programas complementarios y metodología de levantamientos	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF15-PY1006-2024	8/03/2024	SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje	Solicitud de perfiles profesionales	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF16-PY1006-2024	8/03/2024	MINCULTURA - Ministerio de Cultura	Solicitud de información zonas de interés cultural y/o patrimonial	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF17-PY1006-2024	14/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud permisos de ingreso establecimientos de reclusión del orden nacional ERON	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF18-PY1006-2024	18/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 1 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF19-PY1006-2024	21/03/2024	EPMSC-San Andrés Islas - Tn Freddy Martin Orozco Hurriago	Solicitud permisos de ingreso y radicación por parte de la INPEC a la OCCRE	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF20-PY1006-2024	1/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega planes de exploración estudio de suelos Tuluá y Puerto Berrío	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF21-PY1006-2024	1/04/2024	ICANH-Instituto Colombiano de Antropología e Historia	Solicitud de información zonas de interés arqueológico	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF22-PY1006-2024	2/04/2024	SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje	Solicitud perfiles profesionales	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF23-PY1006-2024	3/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informes diagnóstico establecimientos de Puerto Berrío, San Andrés Islas y Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF24-PY1006-2024	3/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega actualización del levantamiento de redes VA02	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF25-PY1006-2024	3/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 2 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF26-PY1006-2024	5/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega plan de exploración ensayos de patología VA	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF27-PY1006-2024	5/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega levantamiento arquitectónico y topográfico preliminar	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF28-PY1006-2024	11/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega plan de exploración ensayos de patología VA	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF29-PY1006-2024	12/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de permisos de ingreso establecimiento penitenciario y carcelario – Puerto Berrio	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF30-PY1006-2024	12/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de permisos de ingreso establecimiento penitenciario y carcelario – Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF31-PY1006-2024	16/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 2 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF32-PY1006-2024	24/04/2024	OCCRE-director Delroy Gordon Fox	Solicitud tarjeta de residencia temporal	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF33-PY1006-2024	30/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud pago No. 1 – Levantamientos Puerto Berrío y Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF34-PY1006-2024	3/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 4 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF35-PY1006-2024	3/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe diagnostico Títulos J y K – NSR-10	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF36-PY1006-2024	7/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud Pago No 1. – Levantamientos Puerto Berrio y Tuluá 29 de febrero de 2024 al 30 de abril de 2024	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF37-PY1006-2024	7/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe del estudio de patología Puerto Berrio, levantamientos y patología de Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF38-PY1006-2024	15/05/2024	OCCRE-director Delroy Gordon Fox	Respuesta a solicitud de permiso temporal Radicado No. 2024105001043	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF39-PY1006-2024	15/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe diagnóstico títulos J y K NSR-10 – Tuluá.	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF40-PY1006-2024	16/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 5 -VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF41-PY1006-2024	20/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud actas de reunión – Comités semanal	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF42-PY1006-2024	20/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega factura pago No. 1 Radicada en SIIF Nación	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF43-PY1006-2024	22/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe del estudio de patología Puerto Berrío. Levantamientos y patología de Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF44-PY1006-2024	24/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega estudio de vulnerabilidad sísmica Puerto Berrio y Tuluá, patología y ajustes de forma levantamientos correspondientes al establecimiento de Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
	27/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega levantamientos firmados y editables	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF45-PY1006-2024	29/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud revisión valores levantamientos – Establecimiento penitenciario y carcelario San Andrés Islas, debido a trámite tarjeta de residencia temporal OCCRE	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF46-PY1006-2024	06/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud adición por mayores cantidades EPMSC San Andrés	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF47-PY1006-2024	05/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Oficio remisorio Cuenta No. 2 – Estudio de suelos, ensayos de laboratorio e informe, estudio de caracterización y patología de los establecimientos de Puerto Berrio y Tuluá, 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF48-PY1006-2024	06/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 6 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF49-PY1006-2024	21/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de suspensión No. 2	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF50-PY1006-2024	13/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega actualización levantamiento de redes – Establecimiento de Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF51-PY1006-2024	13/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud adicional complemento establecimiento de San Andrés Islas	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF052-PY1006-2024	14/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud aclaración exención del IVA – EPMSC San Andrés	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF53-PY1006-2024	26/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega análisis costo / beneficio y chequeo muros de cerramiento – EPMSC Puerto Berrio	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF54-PY1006-2024	27/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Reiteración suspensión No. 2 del contrato No. 354 de 2023	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF55-PY1006-2024	28/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega actualización levantamiento de redes y arquitectónico – EPMSC Puerto Berrio	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF56-PY1006-2024	06/08/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga No. 2 del contrato en referencia	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF57-PY1006-2024	26/08/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Reiteración solicitud de prórroga No. 2 del contrato en referencia	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF58-PY1006-2024	26/08/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud actas de reunión – Comités semanales	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF59-PY1006-2024	26/08/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud permisos de ingreso Establecimiento Penitenciario y Carcelario – San Andrés Islas	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF60-PY1006-2024	26/08/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Avance Establecimiento Penitenciario y Carcelario – San Andrés Islas	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
	29/08/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Presentación establecimiento SAI	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF61-PY1006-2024	30/08/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega Plan de exploración de estudio patológico e Informe de análisis de información existente	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF62-PY1006-2024	06/09/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 9	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF63-PY1006-2024	11/09/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega Plan de exploración estudio de suelos	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF64-PY1006-2024	13/09/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Respuesta a observaciones Plan de exploración de patología e Informe de información existente – EPMSC San Andrés	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF65-PY1006-2024	17/09/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 10	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF66-PY1006-2024	23/09/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega levantamiento arquitectónico, estructural, redes y topográfico del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de San Andrés Islas	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF68-PY1006-2024	22/10/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega estudio de suelos, informa de patología estructural y diagnóstico de cumplimiento de Títulos J y K de NSR-10 del establecimiento penitenciario y carcelario de San Andrés Islas	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF69-PY1006-2024	22/10/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 12	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF71-PY1006-2024	31/10/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega Estudio de Vulnerabilidad Sísmica para el establecimiento penitenciario y carcelario de San Andrés Islas	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF72-PY1006-2024	12/11/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Valor de diagnósticos arquitectónicos Cto 354-2023	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF73-PY1006-2024	13/11/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Respuesta comunicado E-20254-0099794 Cumplimiento obligaciones contractuales ejecución alcance contractual de estudio en el Establecimiento COPED Pedregal	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF74-PY1006-2024	20/11/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Respuesta solicitud pertinencia utilización de información existente para ejecución de actividades en Pedregal	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF76-PY1006-2024	25/11/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Ajuste valor de diagnósticos arquitectónicos CTO 354-2023	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF75-PY1006-2024	26/11/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Propuesta técnica y económica para el diseño estructural de un módulo de visitas íntimas	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF77-PY1006-2024	09/12/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud permisos de ingreso establecimiento penitenciario y carcelario – COPED Pedregal	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF76-PY1006-2024	09/12/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega Plan de Exploración Geotécnica – EPMSC Pedregal	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF78-PY1006-2024	17/12/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Respuesta a observaciones plan de exploración geotécnica – EPMSC Pedregal	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
	18/12/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Pólizas actualizadas del contrato	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF79-PY1006-2024	28/12/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega diseño arquitectónico y estructural Celdas de Visita Intima	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF80-PY1006-2025	09/01/2025	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 13 a 17 – VA	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF81-PY1006-2025	09/01/2025	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de pago de facturas pendientes Cto 354 de 2023	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF82-PY1006-2025	31/01/2025	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega Estudio de Suelos Pedregal VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF83-PY1006-2025	06/02/2025	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 18 y 19 VA	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF84-PY1006-2025	14/02/2025	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Respuesta a comunicado con radicado No. E-2025-000851	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

Tabla 4. Correspondencia enviada

1.2.20 Correspondencia recibida:

FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
			DIGITAL	FISICO	SI	NO	
9/02/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Planimetría existente establecimientos CTO 354 DE 2023	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
23/02/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Definición de alcance detallado de programación Cto. 354 de 2023 para solicitud de prorroga	X			X	José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
5/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Informe piso 4 EPMSC Tuluá	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
8/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Confirmación-solicitud permisos de ingreso ERON'S	X			X	José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Planos escaneados EPMSC San Andrés	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
13/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Informe de sismoresistenica	X		X		Planeación Epctulua (planeacion.epctulua@inpec.gov.co)
18/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Información existente pedregal	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
22/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta Autorización permisos de ingreso por medio del INPEC a la OCCRE	X		X		Talento Human EPMSC San Andres (talentohumano.epcsanandres@inpec.gov.co)
1/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Recepción solicitud PQRSD - Consulta No. MC11273E2024	X		X		pqrsd@mincultura.gov.co
2/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	ICANH: No. Radicado	X			X	Formulario de google ICANH
5/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Aprobación plan de ensayos patología	X			X	José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
10/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta a MC08805E2024	X			X	Investigación y doc. Min cultura (investigacionydoc@mincultura.gov.co)
11/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Planimetría Vélez y Buga	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta a radicado CR 2024184200028262 CE 2024162000032631	X		X		ICANH (respuestas@icanh.gov.co)
16/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Lista chequeo pago	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
17/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta ciudadana Sena	X		X		servicioalciudadano@sena.edu.co
17/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta ciudadana Sena	X		X		servicioalciudadano@sena.edu.co

FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
			DIGITAL	FISICO	SI	NO	
26/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	RUT USPEC	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
26/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	PPTO CTO354-2023	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
6/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Observaciones pre factura pago 1	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
6/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Sentencia T-62	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
22/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Orden de pago en respuesta a solicitud del permiso temporal trabajador foráneo mediante radicado 20241050011923 con fecha de 15/05/2024	X			X	OCCRE-director Delroy Gordon Fox
26/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Infodoc – Radicado E-2024-003694	X		X		notificaciones@infodocumental.co
30/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Comités 05 Abr y 11 Abr	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
31/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Lista pago 02 y siguientes	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
4/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Actas de comité 22 Abr y 25 Abr	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
5/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Documentos para radicación Cta 1	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
6/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Documentos radicación de cuenta	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Borrador acta pago 1 y pago 2	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Borrador acta reunión 7-jun-24	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Borrador actas	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
21/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Documentos borrador otrosi y solicitud pendiente	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
24/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Valor referencia costo pabellón /m2 tipo sin capítulos de tecnología (cámaras de seguridad	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
3/07/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta a concepto jurídico Contrato 354-2023	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
5/07/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Borrador solicitud de suspensión	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
5/07/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Cuenta 2 Infodoc	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)

FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
			DIGITAL	FISICO	SI	NO	
5/07/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Infodoc – Radicado E-2024-005114	X		X		notificaciones@infocodumental.co
6/07/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Documentos para radicación actualizados de cuenta 02	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
08/07/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Acta de suspensión 02 contrato de consultoría 354 de 2023	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
12/08/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Gobernación de San Andrés Confirmación de Radicado No. 20241050018985-R	X			X	correspondenciasgdea@sanandres.gov.co
15/08/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Notificación Permiso temporal	X		X		arpomare@occre.gov.co
20/08/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Acta de reinicio 354 de 2023	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
22/08/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Programación actualizada	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
10/09/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Solicitud revisión y aprobación de pólizas Otrosi 2	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
12/09/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Observaciones Plan de exploración patología e informe de información existente	X			X	José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
16/09/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Aprobación planes de exploración EPMSC San Andrés	X			X	José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
03/10/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Carpeta compartida liquidación CTO 354-2023	X		X		Valeria Santis Vellojin (valeria.santis@uspec.gov.co)
09/10/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Informe Pedregal SCI	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
09/10/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Documentos radicación de cuenta 03 infodoc	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
23/10/2024	Consultoriauspec.354@gmail.com	Envío de Memorando con fecha 30 de mayo	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
29/10/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Of E-2024-009794 – Solicitud cumplimiento de las obligaciones contractuales – ejecución alcance contractual de estudio en el Establecimiento COPED Pedregal	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
01/11/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Ubicación definitiva de celdas intimas en el EPMSC San Andrés cumplimiento acción de Tutela	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
07/11/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Ubicación definitiva de celdas intimas en el EPMSC San Andrés cumplimiento acción de Tutela	X			X	José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
09/11/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Documentos para radicación de pago 04 en infodoc	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)

FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
			DIGITAL	FISICO	SI	NO	
12/11/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Of E-2024-010475 – Aprobación Informe de Soporte de pago No. 4 de consultoría – Rpta OF70-PY1006-2024	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
12/11/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Of E-2024-010524 – Reiteración solicitud cumplimiento de las obligaciones contractuales – ejecución alcance contractual de estudio en el Establecimiento COPED Pedregal	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
12/11/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta Solicitud pago de acuerdo al valor de diagnósticos arquitectónicos	X			X	José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
21/11/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Acta San Andrés Visitas Intimas	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
26/11/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Cuadro actualizado contrato	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
27/11/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Formato NP para revisión y firma	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
16/12/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Entrega de documentos propuesta estabilización COPED Pedregal	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/12/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta plan de exploración geotécnica COPED Pedregal	X			X	José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
18/12/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta plan de exploración geotécnica COPED Pedregal	X			X	José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
18/12/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta Pólizas contrato 354					José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)

Tabla 5. Correspondencia recibida

1.2.21 Personal presentado por la Consultoría:

No	APELLIDO	NOMBRE	CARGO
1	Rodríguez Vásquez	Nelson Fernando	Director del Proyecto
2	Pinilla Rodríguez	Juan Jacobo	Ingeniero Civil Especialista en Estructuras
3	Gómez Maldonado	Orlando	Ingeniero Civil Especialista en geotecnia
4	Bonilla Álvarez	Jhon Jairo	Arquitecto
5	Ortiz Fuentes	Fernando	Ingeniero Civil
6	Chico Rodríguez	Santiago Andrés	Ingeniero Civil
7	Cuellar Torres	Eduard Julián	Dibujante

8	Rodríguez Velásquez	Meiber	Profesional en seguridad y salud en el trabajo
9	Ramírez Farfán	Miguel Ángel	Topógrafo
10	Ramírez Manga	Alcibíades Segundo	Cadenero
11	Rojas Arroyave	Larryn	Perforador

Tabla 6. Personal aprobado Consultoría

1.3 ANÁLISIS Y CONTROL AVANCE DE EJECUCIÓN

1.3.1 Programación y control de actividades de la consultoría

A continuación, se presenta el control de programación de las actividades programadas para el periodo del informe.

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
01	Estudio de seguridad del personal	100%	100%
02	Visitas de reconocimiento a los establecimientos	100%	100%
03	Elaboración programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	100%	100%
04	Elaboración programa de seguridad industrial	100%	100%
05	Elaboración plan de manejo ambiental	100%	100%
06	Elaboración programa de arqueología preventiva	100%	100%
07	Elaboración del informe de análisis de información existente	100%	100%
08	Elaboración metodología levantamiento topográfico y puntos de redes	100%	100%
09	Levantamiento Topográfico y redes en campo Tuluá	100%	100%
10	Levantamiento en campo arquitectónico Tuluá	100%	100%
11	Levantamiento estructural en campo Tuluá	100%	100%
12	Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural Tuluá	100%	100%
13	Exploración de campo y obtención de muestras de suelos Tuluá	100%	100%

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
14	Ensayos de laboratorio de muestras de suelos Tuluá	100%	100%
15	Análisis y elaboración de informe estudio geotécnico Tuluá	100%	100%
16	Inspección detallada y levantamiento de lesiones Tuluá	100%	100%
17	Ejecución de plan de ensayos de estudio patológico Tuluá	100%	100%
18	Análisis de muestras obtenidas en laboratorio Tuluá	100%	100%
19	Elaboración informe patología y ajuste planos levantamiento Tuluá	100%	100%
20	Elaboración de estudio de vulnerabilidad sísmica Tuluá	100%	100%
21	Análisis de las alternativas de reforzamiento (Costo-beneficio) Tuluá	100%	100%
22	Selección de la alternativa de reforzamiento Tuluá	100%	100%
23	Diseño de reforzamiento estructura de alternativa seleccionada Tuluá	100%	100%
24	Diagnostico cumplimiento títulos J y K NSR10 Tuluá	100%	100%
25	Elaboración de planos arquitectónicos según modificaciones de reforzamiento y ajuste J y K Tuluá	100%	100%
26	Presupuesto y especificaciones de obra Tuluá	100%	100%
27	Levantamiento Topográfico y redes en campo Puerto Berrío	100%	100%
28	Levantamiento en campo arquitectónico Puerto Berrío	100%	100%
29	Levantamiento estructural en campo Puerto Berrío	100%	100%
30	Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural Puerto Berrío	100%	100%
31	Exploración de campo y obtención de muestras de suelos Puerto Berrío	100%	100%

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
32	Ensayos de laboratorio de muestras de suelos Puerto Berrío	100%	100%
33	Análisis y elaboración de informe estudio geotécnico Puerto Berrio	100%	100%
34	Inspección detallada y levantamiento de lesiones Puerto Berrío	100%	100%
35	Ejecución de plan de ensayos de estudio patológico Puerto Berrío	100%	100%
36	Análisis de muestras obtenidas en laboratorio Puerto Berrio	100%	100%
37	Elaboración de informe de patología y ajustes a planos levantamiento Puerto Berrio	100%	100%
38	Elaboración de estudio de vulnerabilidad sísmica Puerto Berrio	100%	100%
39	Análisis de las alternativas de reforzamiento (Costo-beneficio) Puerto Berrio	100%	100%
40	Selección de la alternativa de reforzamiento Puerto Berrio	100%	100%
41	Diseño de reforzamiento estructura de alternativa seleccionada Puerto Berrio	100%	100%
42	Diagnostico cumplimiento títulos J y K NSR10 Puerto Berrío	100%	100%
43	Elaboración de planos arquitectónicos según modificaciones de reforzamiento y ajuste Títulos J y K Puerto Berrio	100%	100%
44	Presupuesto y especificaciones de obra Puerto Berrio	100%	100%
45	Elaboración del informe de análisis de información existente	100%	100%
46	Entrega del informe de análisis de información existente	100%	100%
47	Trámite ante Sena y OCCRE	100%	100%
48	Elaboración metodología levantamiento topográfico, estructural, arquitectónico y de redes	100%	100%
49	Levantamiento Topográfico y redes en campo San Andrés	100%	100%

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
50	Levantamiento en campo arquitectónico San Andrés	100%	100%
51	Levantamiento estructural en campo San Andrés	100%	100%
52	Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural San Andrés	100%	100%
53	Gestión y aprobación de permisos de acceso a instalaciones para estudio geotécnico San Andrés	100%	100%
54	Elaboración plan de ensayos estudio geotécnico San Andrés	100%	100%
55	Exploración de campo y obtención de muestras de suelo San Andrés	100%	100%
56	Ensayos de laboratorio sobre muestras obtenidas San Andrés	76%	100%
57	Elaboración de informe de estudio geotécnico San Andrés	0%	90%
58	Gestión y aprobación de permisos de ingreso estudio patológico San Andrés	100%	100%
59	Inspección detallada y levantamiento de lesiones San Andrés	100%	100%
60	Elaboración de plan de ensayos estudio patológico San Andrés	100%	100%
61	Ejecución de plan de ensayos estudio patológico San Andrés	100%	100%
62	Análisis de muestras obtenidas en laboratorio San Andrés	100%	100%
63	Elaboración de informe de patología y ajuste de planos de levantamiento San Andrés	100%	100%
64	Elaboración de diagnostico de cumplimiento de Títulos J y K San Andrés	100%	100%
65	Elaboración de planos arquitectónicos Visitas Intimas San Andrés	100%	100%
66	Elaboración diseño estructural Visitas Intimas San Andrés	100%	100%

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
67	Elaboración presupuesto Visitas Intimas San Andrés	100%	100%
68	Levantamiento Topográfico Pedregal	100%	100%
69	Exploración en campo y obtención de muestras para estudio de suelos Pedregal	100%	100%
70	Ensayos de laboratorio sobre muestras obtenidas para estudio de suelos Pedregal	100%	100%
71	Análisis y elaboración de informe de estudio geotécnico Pedregal	100%	100%
72	Elaboración diseño estructural y arquitectónico muro de cerramiento Pedregal	86%	86%
73	Presupuesto y especificaciones Pedregal	52%	20%
	AVANCE GENERAL DEL PROYECTO	**98%**	**97%**

Tabla 7. Control de actividades de programación

Los porcentajes presentados en las Tabla 7 y en la Tabla 8 no incluyen el EPMSC Manizales, debido a las condiciones de esta sede. Por lo tanto, su cálculo se realizó considerando únicamente los cuatro establecimientos ejecutados y por ejecutar.

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
01	CPMSTUL Tuluá	100%	100%
02	EPMSC Puerto Berrío	100%	100%
03	EPMSC San Andrés	100%	100%
04	COPED Pedregal	87%	80%

Tabla 8. Control ejecución – Por establecimiento

1.4 ASPECTOS TÉCNICOS

1.4.1 Visita de reconocimiento:

Se realizaron visitas de reconocimientos de las sedes Tuluá, Puerto Berrio, San Andrés y Pedregal que hacen parte del contrato, en que se definen zonas de estudio y se realiza registro fotográfico, verificación de alturas y determinación del sistema estructural.



Imagen 1. Visita reconocimiento EPMSC Tuluá



Imagen 2. Visita reconocimiento COPED Pedregal



Imagen 3. Visita reconocimiento EPMSC Puerto Berrío



Imagen 4. Visita reconocimiento EPMSC San Andrés

1.4.1.1 Metodologías de levantamientos en campo (Topográfico, arquitectónico, estructural y de redes):

Se realizó la entrega de las Metodologías de levantamientos Topográfico, Arquitectónico, Estructural y de Redes para las sedes de Puerto Berrío, San Andrés, Tuluá y Pedregal de acuerdo al contrato.




Imagen 5. Evidencia de metodologías EPMSC Puerto Berrío



Imagen 6. Evidencias de metodologías COPED Pedregal



Imagen 7. Evidencias de metodologías EPMSC Puerto Berrio



Imagen 8. Evidencias de metodologías EPMSC San Andrés

1.4.1.2 Planes Complementarios:

Se realizó entrega de los planes complementarios, Plan de manejo ambiental, Plan de seguridad y salud ocupacional, programa de seguridad industrial mediante oficio de consultoría No. OF14-PY1006-2024.



Imagen 9. Evidencia Plan de Manejo Ambiental



Imagen 10. Evidencia Plan de seguridad y salud ocupacional

1.4.2 Levantamiento topográfico y de redes:

Se realizaron levantamientos topográficos y de redes en las sedes Tuluá y Puerto Berrio en la semana del 18 al 22 de marzo de 2024 mediante visitas de campo realizadas en esas fechas.

En la semana del 02 al 06 de septiembre de 2024 se realizó el levantamiento topográfico y redes del EPMSC San Andrés.




Imagen 11. Levantamiento topográfico EPMSC Puerto Berrio



Imagen 12. Levantamiento topográfico EMPSC San Andrés

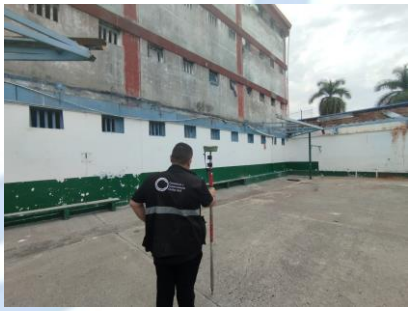


Imagen 13. Levantamiento topográfico EPMSC Tuluá

1.4.3 Levantamiento estructural y arquitectónico:

Durante las visitas realizadas a los EPMSC Tuluá y Puerto Berrio en la semana del 18 al 22 de marzo de 2024 se hicieron los respectivos levantamientos estructural y arquitectónico de las sedes.

Durante la semana del 02 al 06 de septiembre de 2024 se realizo el levantamiento estructural y arquitectónico del EPMSC San Andrés una vez fueron aprobadas las tarjetas de permiso de trabajo por la OCCRE.

1.4.4 Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico, estructural, topográfico y de redes:

Se realizó entrega final de los levantamientos topográficos, estructurales, arquitectónicos y de redes de los EPMSC Puerto Berrio y Tuluá el día 23 de mayo de 2024.

El día 23 de septiembre de 2024 se realizó la entrega de planos de levantamiento topográfico, estructural, arquitectónico y de redes del EPMSC San Andrés.

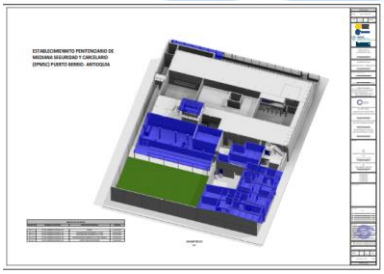


Imagen 14. Levantamientos EPMSC Puerto Berrio

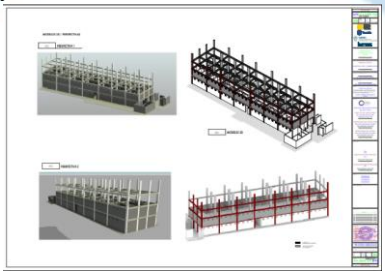


Imagen 15. Levantamientos EPMSC Tuluá

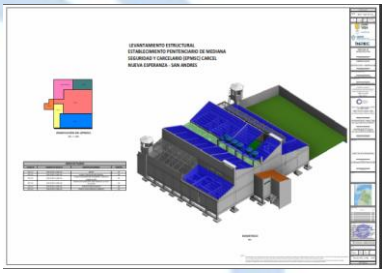


Imagen 16. Levantamientos EPMSC San Andrés

1.4.5 Elaboración del informe de análisis de información existente

El día 03 de abril de 2024 se entrega a la supervisión informes diagnostico y de información existente de los EPMSC San Andrés, Puerto Berrio y Tuluá.

El día 13 de septiembre de 2024 se hace entrega final de informe de análisis de la información existente del EPMSC San Andrés a la supervisión.



Imagen 17. Informe diagnostico EPMSC Puerto Berrío



Imagen 18. Informe diagnostico EPMSC Tuluá




Imagen 19. Informe diagnostico EPMSC San Andrés

1.4.6 Exploración en campo y obtención de muestras de geotecnia:

Se realizó la exploración geotécnica y obtención de muestras de suelo para evaluación en laboratorios de los EPMSC Puerto Berrío, Tuluá y San Andrés.



Imagen 20. Exploración geotécnica EPMSC Puerto Berrio



Imagen 21. Exploración geotécnica EPMSC San Andrés

1.4.7 Ensayos de laboratorio sobre muestras de suelo obtenidas:


Se finalizó la realización de ensayos en laboratorio de suelos de las muestras correspondientes a las sedes de Puerto Berrio y Tuluá

A la fecha del informe, las muestras obtenidas por geotecnia en el establecimiento de San Andrés fueron sometidas a ensayos de laboratorio y se encuentran en análisis de resultados por parte del equipo.

1.4.8 Estudio de suelos:

El día 22 de mayo de 2024 se realiza la entrega de los estudios de suelos correspondientes a los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Puerto Berrio y Tuluá


El día 21 de octubre de 2024 se realiza la entrega del estudio de suelos correspondiente al EPMSC San Andrés.


Consultoría y Construcciones Civiles SAS www.cycciviles.com

ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL EPMSC – TULUÁ

CONTRATO DE CONSULTORIA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC".


Imagen 22. Evidencia estudio de suelos EPMSC Tuluá


Consultoría y Construcciones Civiles SAS www.cycciviles.com

ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL EPMSC – PUERTO BERRIO

CONTRATO DE CONSULTORIA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC".

Imagen 23. Evidencia estudio de suloes EPMSC Puerto Berrío


Consultoría y Construcciones Civiles SAS USPEC Página | 1 www.cycciviles.com

ESTUDIO DE SUELOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC".

UNIDAD: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO (EPMSC) – SAN ANDRÉS

Imagen 24. Evidencia estudio de suelos EPMSC San Andrés

1.4.9 Inspección detallada y levantamiento de lesiones:

Durante las visitas realizadas en la semana del 18 al 22 de marzo de 2024 se realizó el levantamiento detallado de lesiones y la inspección total de las áreas de estudio del EPMSC Puerto Berrío y el EPMSC Tuluá, que sirvieron de insumos para los estudios de patología y vulnerabilidad sísmica.

En la semana del 02 al 06 de septiembre de 2024 se realizó la inspección y levantamiento de lesiones del área de estudio del EPMSC San Andrés islas como insumo para la patología y la vulnerabilidad.



Imagen 25. Levantamiento de lesiones EPMSC Puerto Berrío



Imagen 26. Levantamiento de lesiones EPMSC Tuluá



Imagen 27. Levantamiento de lesiones EPMSC San Andrés

1.4.10 Ejecución del plan de ensayos de estudio patológico

Los ensayos no destructivos en los EPMSC Puerto Berrío y Tuluá se realizaron en la semana del 18 al 22 de marzo de 2024 y los ensayos destructivos se realizaron en la semana del 22 al 26 de abril de 2024 en el EPMSC Puerto Berrío y en la semana del 29 de abril al 03 de mayo de 2024 en el EPMSC Tuluá.

Los ensayos destructivos y no destructivos del EPMSC San Andrés se realizó entre el 02 al 17 de septiembre de 2024.



Imagen 28. Ensayos destructivos EPMSC Puerto Berrío



Imagen 29. Ensayos destructivos EPMSC Tuluá



Imagen 30. Ensayos destructivos EPMSC San Andrés

1.4.11 Ensayos de laboratorio sobre muestras de materiales obtenidas:

Se realizaron los ensayos de laboratorio de las muestras correspondientes a las sedes de Puerto Berrio, Tuluá y San Andrés, las cuales fueron analizadas para la realización del estudio de patología y caracterización estructural.



Imagen 31. Evidencia de informe de laboratorio EPMSC Puerto Berrío



Imagen 32. Evidencia de informe de laboratorio EPMSC Tuluá

1.4.12 Elaboración de informe de patología estructural:

Los días 07 de mayo, 23 de mayo y 21 de octubre se realizaron las entregas de los establecimientos EPMSC Puerto Berrío, EPMSC Tuluá y EPMSC San Andrés respectivamente.



Imagen 33. Evidencia informe de patología EPMSC Puerto Berrío



Imagen 34. Evidencia informe de patología EPMSC Tuluá



Imagen 35. Evidencia informe de patología EPMSC San Andrés

1.4.13 Elaboración de informe de vulnerabilidad estructural:

El día 23 de mayo de 2024 se realizó entrega de los informes de vulnerabilidad sísmica de los EPMSC Puerto Berrío y Tuluá. Por su parte, la entrega del informe correspondiente al EPMSC San Andrés fue entregado el día 31 de octubre de 2024.




Imagen 36. Informe de vulnerabilidad EPMSC Puerto Berrío



Imagen 37. Informe de vulnerabilidad EPMSC Tuluá



Imagen 38. Informe de vulnerabilidad EPMSC San Andrés

1.4.14 Elaboración de diagnóstico de cumplimiento Títulos J y K


El día 30 de abril de 2024 se hizo entrega del informe de diagnóstico de los títulos J y K del establecimiento penitenciario de Puerto Berrio.

El diagnóstico de la sede Tuluá fue entregado el día 10 de mayo de 2024.

El día 21 de octubre de 2024 se hizo entrega del informe diagnostico de los títulos J y K del EPMSC San Andrés.

1.4.15 Análisis de las alternativas de reforzamiento (costo beneficio: reforzamiento u obra nueva)

El día 26 de junio de 2024 se realizó entrega del informe de análisis de costo/beneficio para el establecimiento de Puerto Berrio. Por su parte, el presupuesto del pabellón de visitas intimas del EPMSC San Andrés fue entregado el día 30 de diciembre de 2024.


Consultoría y Construcciones Civiles SAS

USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS


Página | 1

www.cycciviles

INFORME DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC".

Imagen 39. Evidencia de informe costo-beneficio EPMSC Puerto Berrío


CONTRATO DE CONSULTORÍA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"

PRESUPUESTO DE OBRA - PABELLÓN DE VISITAS INTIMAS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL


Imagen 40. Evidencia presupuesto visitas intimas EPMSC San Andrés

1.4.16 Levantamiento topográfico y estudio de suelos Pedregal

La semana del 6 de enero al 10 de enero de 2025 se realizaron las labores de levantamiento topográfico y extracción de muestras de suelo para la realización del estudio de suelos. Las muestras obtenidas se llevaron a laboratorio y se encuentra en proceso la realización del informe de análisis y estudio de suelos. Que se entregó el día 31 de enero de 2025 a la supervisión.



Imagen 41. Exploración geotécnica COPED Pedregal


Consultoría y Construcciones Civiles SAS

www.cycciviles.com


ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL EPMSC – PEDREGAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC".

Imagen 42. Evidencia de Estudio de suelos COPED Pedregal

1.4.17 Diseño de muros de cerramiento de la Guyana

Se ha realizado avance en el diseño estructural de muros de cerramiento de la Guyana con la emisión de memorias preliminares y planos preliminares de construcción. Que serán entregados de manera definitiva el 28 de febrero de 2025.

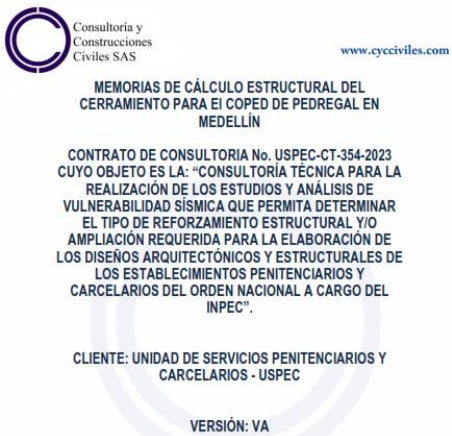
Consultoría y Construcciones Civiles SAS

www.cycciviles.com

MEMORIAS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL CERRAMIENTO PARA EI COPED DE PEDREGAL EN MEDELLÍN

CONTRATO DE CONSULTORIA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC".

CLIENTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VERSIÓN: VA

Imagen 43. Memorias de cálculo Muro de cerramiento COPED Pedregal

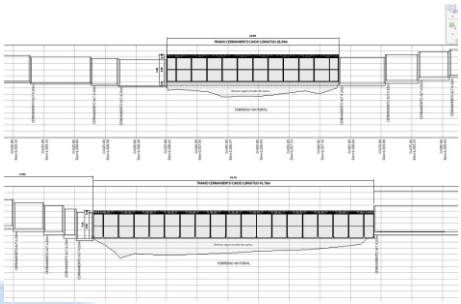


Imagen 44. Avance planos estructurales muro COPED Pedregal.

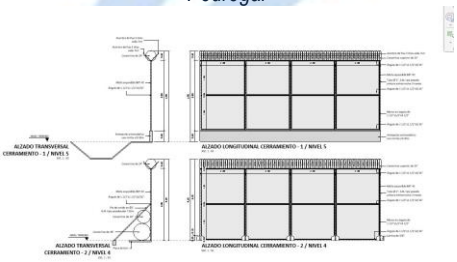


Imagen 45. Avance planos estructurales muro COPED Pedregal.



Imagen 46. Avance planos estructurales muro COPED Pedregal.

1.5 ANÁLISIS Y CONTROL PRESUPUESTAL

CUADRO DE CONTROL PRESUPUESTAL	
DOCUMENTO CONTRACTUAL	**VALOR CONTRATO**
Valor total del contrato	$599.965.769
Valor factura 1	$ 36.162.122
Valor factura 2	$ 91.565.742
Valor por pagar a la Consultoría	$472.237.905

Tabla 9. Control Financiero

1.6 ANEXOS

Anexo 1 Certificación pago de obligaciones laborales..... 41
Anexo 2 Certificación de cumplimiento obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales..... 42

Anexo 1 Certificación pago de obligaciones laborales

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **HÉCTOR ENRIQUE FONSECA MEJÍA** identificado con cedula de ciudadanía **N° 9.274.911** de **Mompós** y con **Tarjeta Profesional Nº 159477-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal**, certifico que **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS** identificada con **Nit 900.171.000-8** debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, se encuentra al día durante los últimos 6 meses con el pago de los aportes parafiscales, obligaciones laborales de sus empleados y correspondientes a los sistemas de seguridad social integral de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, legalmente exigibles conforme al cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados. Decreto 862 de 2013. Artículo 8.	Si (X)	No ( )

Dada en Bogotá D.C., el 16 de febrero de 2025.

Revisora Fiscal
HÉCTOR ENRIQUE FONSECA MEJÍA
CC. No. 9.274.911 de Mompòs

Anexo 2 Certificación de cumplimiento obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901686815	8	ESTUDIOS Y OBRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 93B N 17-42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7499195	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319474693	9482912519	E	2025/03/06	2025/03/07	BANCO DAVIVIENDA	1	$8,513,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)																							$33,081,921	$5,359,100			$33,081,921	$1,324,000			$32,588,470	$1,304,100			$33,081,921		$170,400		$0	$0		$8,157,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (13 Afiliados)																							$33,081,921	$5,359,100			$33,081,921	$1,324,000			$32,588,470	$1,304,100			$33,081,921		$170,400		$0	$0		$8,157,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)																							$33,081,921	$5,359,100			$33,081,921	$1,324,000			$32,588,470	$1,304,100			$33,081,921		$170,400		$0	$0		$8,157,600
1	CC	1019057755	ACUÑA TOCARRUNCHO SEBASTIAN																		23020 1	30	$1,971,000	$315,400	EPS005	30	$1,971,000	$78,900	CCF24	30	$1,971,000	$78,900	14-11	30	$1,971,000	0.522%	$10,300	30	$0	$0	Si	$483,500
2	CC	1012380103	ALTURO TIQUE KATHERINE		X																25-14	30	$1,441,240	$230,600	EPS037	30	$1,441,240	$57,700	CCF24	30	$1,441,240	$57,700	14-11	30	$1,441,240	0.522%	$7,600	30	$0	$0	Si	$353,600
3	CC	1000258070	ALVAREZ SALINAS PAULA JULIANA											X							23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$1,900	CCF24	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$9,500
4	CC	1000258070	ALVAREZ SALINAS PAULA JULIANA											X							23030 1	2	$112,667	$18,100	EPS008	2	$112,667	$4,600	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$112,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$22,700
5	CC	1000258070	ALVAREZ SALINAS PAULA JULIANA		X																23030 1	27	$1,521,000	$243,400	EPS008	27	$1,521,000	$60,900	CCF24	27	$1,521,000	$60,900	14-11	27	$1,521,000	0.522%	$8,000	27	$0	$0	Si	$373,200
6	CC	1010223803	CARRION GONZALEZ CHARON DAIHAN													X					23030 1	1	$80,300	$12,900	EPS008	1	$80,300	$3,300	CCF24	1	$80,300	$3,300	14-11	1	$80,300	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,500
7	CC	1010223803	CARRION GONZALEZ CHARON DAIHAN																		23030 1	29	$2,328,700	$372,600	EPS008	29	$2,328,700	$93,200	CCF24	29	$2,328,700	$93,200	14-11	29	$2,328,700	0.522%	$12,200	29	$0	$0	Si	$571,200
8	CC	1001328720	CLAVIJO RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
9	CC	1000337430	CUELLAR TORRES EDUARD JULIAN																		23030 1	30	$1,971,000	$315,400	EPS008	30	$1,971,000	$78,900	CCF24	30	$1,971,000	$78,900	14-11	30	$1,971,000	0.522%	$10,300	30	$0	$0	Si	$483,500
10	CC	1072675178	ESTUPIÑAN GALLEGO VALENTINA																		23100 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS017	30	$2,400,000	$96,000	CCF24	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	Si	$588,600
11	CC	1014300142	MEJIA GONZALEZ JUAN DIEGO																		23030 1	30	$1,690,000	$270,400	EPS002	30	$1,690,000	$67,600	CCF24	30	$1,690,000	$67,600	14-11	30	$1,690,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$414,500
12	CC	1022336174	RODRIGUEZ SARMIENTO GLORIA MERYBEL											X							25-14	2	$333,334	$53,400	EPS008	2	$333,334	$13,400	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$333,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$66,800
13	CC	1022336174	RODRIGUEZ SARMIENTO GLORIA MERYBEL																		25-14	28	$4,666,667	$746,700	EPS008	28	$4,666,667	$186,700	CCF24	28	$4,666,667	$186,700	14-11	28	$4,666,667	0.522%	$24,400	28	$0	$0	Si	$1,144,500
14	CC	14139624	RODRIGUEZ VASQUEZ NELSON FERNANDO																		25-14	30	$6,556,800	$1,114,700	EPS001	30	$6,556,800	$262,300	CCF24	30	$6,556,800	$262,300	14-11	30	$6,556,800	0.522%	$34,300	30	$0	$0	Si	$1,673,600
15	CC	1053349852	SIERRA SALINAS YURI FERNANDA																		23030 1	30	$2,185,600	$349,700	EPS005	30	$2,185,600	$87,500	CCF24	30	$2,185,600	$87,500	14-11	30	$2,185,600	0.522%	$11,500	30	$0	$0	Si	$536,200
16	CC	1001118922	SORUCO ALBA JOSHUA JACOB		X																23030 1	30	$1,690,000	$270,400	EPS001	30	$1,690,000	$67,600	CCF24	30	$1,690,000	$67,600	14-11	30	$1,690,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$414,500
17	CC	1019130442	VILLANUEVA GIL ANGIE MARCELA																		23030 1	30	$2,086,163	$333,800	EPS005	30	$2,086,163	$83,500	CCF24	30	$2,086,163	$83,500	14-11	30	$2,086,163	0.522%	$10,900	30	$0	$0	Si	$511,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BTA- IBAGUE (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Centro de Trabajo: BTA- IBAGUE (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
18	CC	1006126862	GONZALEZ BUSTAMANTE ANGEL ANDRES																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total			**Afiliados(14)**																				$34,505,421	$5,586,900			$34,505,421	$1,381,000			$34,011,970	$1,361,100			$34,505,421		$177,900		$0	$0		$8,506,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901686815	8	ESTUDIOS Y OBRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 93B N 17-42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7499195	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319474693	9482912519	E	2025/03/06	2025/03/07	BANCO DAVIVIENDA	1	$8,513,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$5,586,900	$3,800	$0	$5,590,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$384,000	$300	$0	$384,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,373,200	$1,700	$0	$2,374,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,514,300	$1,600	$0	$2,515,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$315,400	$200	$0	$315,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$177,900	$200	$0	$178,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$177,900	$200	$0	$178,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$1,361,100	$1,000	$0	$1,362,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$57,000	$100	$0	$57,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	13	$1,304,100	$900	$0	$1,305,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$1,381,000	$1,200	$0	$1,382,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$329,900	$300	$0	$330,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$442,900	$300	$0	$443,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$96,000	$100	$0	$96,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,700	$100	$0	$57,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$124,600	$100	$0	$124,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$329,900	$300	$0	$330,200
TOTAL				**14**	**$8,506,900**	**$6,200**	**$0**	**$8,513,100**
