

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predecesoras	% completado
1	**1**		**Contrato de Consultoría No. 075-2025**	**81 días**	**4/15/2025**	**8/14/2025**			**14%**
2	**1.1**		**Visita a Campo y Plan de Trabajo**	**10 días**	**4/15/2025**	**4/30/2025**			**70%**
3	1.1.1		Acta de inicio	1 día	4/15/2025	4/15/2025	4		100%
4	1.1.2		Visita a Campo	1 día	4/16/2025	4/16/2025	6,14,21,28,35,43		100%
5	**1.1.3**		**Cronograma de Trabajo**	**8 días**	**4/21/2025**	**4/30/2025**			**63%**
6	1.1.3.1		Entrega por parte de la Consultoría Cronograma de Trabajo Versión uno	2 días	4/21/2025	4/22/2025	7	4	100%
7	1.1.3.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	4/23/2025	4/24/2025	8	6	100%
8	1.1.3.3		Entrega por parte de la Consultoría Cronograma de Trabajo Versión dos (Ajustes por	2 días	4/25/2025	4/28/2025	9	7	50%
9	1.1.3.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	4/29/2025	4/29/2025	10	8	0%
10	1.1.3.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	4/30/2025	4/30/2025	11	9	0%
11	1.1.3.6		Entrega de Cronograma de Trabajo ante la entidad Contratante	0 días	4/30/2025	4/30/2025	166	10	0%
12	**1.2**		**Metodologías de Trabajo para cada componente**	**9 días**	**4/21/2025**	**5/2/2025**			**56%**
13	**1.2.1**		**Metodología Estudio de Topografía**	**9 días**	**4/21/2025**	**5/2/2025**			**56%**
14	1.2.1.1		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Topografía Versión uno	3 días	4/21/2025	4/23/2025	15	4	100%
15	1.2.1.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	4/24/2025	4/25/2025	16,79	14	100%
16	1.2.1.3		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Topotrafía Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	4/28/2025	4/29/2025	17	15	0%
17	1.2.1.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	4/30/2025	4/30/2025	18	16	0%
18	1.2.1.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	5/2/2025	5/2/2025	19	17	0%
19	1.2.1.6		Entrega Metodología Estudio de Topografía ante la entidad Contratante	0 días	5/2/2025	5/2/2025	166	18	0%
20	**1.2.2**		**Metodología Estudio de Geotécnia**	**9 días**	**4/21/2025**	**5/2/2025**			**56%**
21	1.2.2.1		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Geotécnia Versión uno	3 días	4/21/2025	4/23/2025	22,102	4	100%
22	1.2.2.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	4/24/2025	4/25/2025	23	21	100%
23	1.2.2.3		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Geotécnia Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	4/28/2025	4/29/2025	24	22	0%
24	1.2.2.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	4/30/2025	4/30/2025	25	23	0%
25	1.2.2.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	5/2/2025	5/2/2025	26	24	0%
26	1.2.2.6		Entrega Metodología Estudio de Geotécnia ante la entidad Contratante	0 días	5/2/2025	5/2/2025	166	25	0%
27	**1.2.3**		**Metodología Estudio de Tránsito**	**9 días**	**4/21/2025**	**5/2/2025**			**56%**
28	1.2.3.1		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Tránsito Versión uno	3 días	4/21/2025	4/23/2025	29	4	100%
29	1.2.3.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	4/24/2025	4/25/2025	30,70	28	100%
30	1.2.3.3		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Tránsito Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	4/28/2025	4/29/2025	31	29	0%
31	1.2.3.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	4/30/2025	4/30/2025	32	30	0%
32	1.2.3.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	5/2/2025	5/2/2025	33	31	0%
33	1.2.3.6		Entrega Metodología Estudio de Tránsito ante la entidad Contratante	0 días	5/2/2025	5/2/2025	166	32	0%
34	**1.2.4**		**Metodología Estudio Geométrico de Vías**	**9 días**	**4/21/2025**	**5/2/2025**			**56%**
35	1.2.4.1		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio Geométrico de Vías	3 días	4/21/2025	4/23/2025	36	4	100%
36	1.2.4.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	4/24/2025	4/25/2025	37	35	100%
37	1.2.4.3		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio Geométrico de Vías Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	4/28/2025	4/29/2025	38	36	0%
38	1.2.4.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	4/30/2025	4/30/2025	39	37	0%
39	1.2.4.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	5/2/2025	5/2/2025	40	38	0%
40	1.2.4.6		Entrega Metodología Estudio Geométrico de Vías ante la entidad Contratante	0 días	5/2/2025	5/2/2025	166	39	0%
41	**1.2.5**		**Metodología Estudio de Pavimentos**	**9 días**	**4/21/2025**	**5/2/2025**			**56%**
42	1.2.5.1		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Pavimentos Versión	3 días	4/21/2025	4/23/2025	43	4	100%
43	1.2.5.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	4/24/2025	4/25/2025	44	42	100%
44	1.2.5.3		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Pavimentos Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	4/28/2025	4/29/2025	45	43	0%
45	1.2.5.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	4/30/2025	4/30/2025	46	44	0%
46	1.2.5.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	5/2/2025	5/2/2025	47	45	0%
47	1.2.5.6		Entrega Metodología Estudio de Pavimentos ante la entidad Contratante	0 días	5/2/2025	5/2/2025	166	46	0%
48	**1.2.6**		**Metodología Estudio de Urbanismo**	**9 días**	**4/21/2025**	**5/2/2025**			**56%**
49	1.2.6.1		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Urbanismo Versión uno	3 días	4/21/2025	4/23/2025	50	4	100%
50	1.2.6.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	4/24/2025	4/25/2025	51	49	100%
51	1.2.6.3		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Urbanismo Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	4/28/2025	4/29/2025	52	50	0%
52	1.2.6.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	4/30/2025	4/30/2025	53	51	0%
53	1.2.6.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	5/2/2025	5/2/2025	54	52	0%
54	1.2.6.6		Entrega Metodología Estudio de Urbanismo ante la entidad Contratante	0 días	5/2/2025	5/2/2025	166	53	0%
55	**1.2.7**		**Metodología Estudio Hidráulico**	**9 días**	**4/21/2025**	**5/2/2025**			**56%**
56	1.2.7.1		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio Hidráulico Versión uno	3 días	4/21/2025	4/23/2025	57	4	100%
57	1.2.7.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	4/24/2025	4/25/2025	58	56	100%
58	1.2.7.3		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio Hidráulico Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	4/28/2025	4/29/2025	59	57	0%
59	1.2.7.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	4/30/2025	4/30/2025	60	58	0%
60	1.2.7.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	5/2/2025	5/2/2025	61	59	0%
61	1.2.7.6		Entrega Metodología Estudio Hidráulico ante la entidad Contratante	0 días	5/2/2025	5/2/2025	166	60	0%
62	**1.2.8**		**Metodología Estudio Costos y Presupuestos**	**9 días**	**4/21/2025**	**5/2/2025**			**56%**
63	1.2.8.1		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio Costos y Presupuestos	3 días	4/21/2025	4/23/2025	64	4	100%
64	1.2.8.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	4/24/2025	4/25/2025	65	63	100%
65	1.2.8.3		Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio Costos y Presupuestos Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	4/28/2025	4/29/2025	66	64	0%
66	1.2.8.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	4/30/2025	4/30/2025	67	65	0%

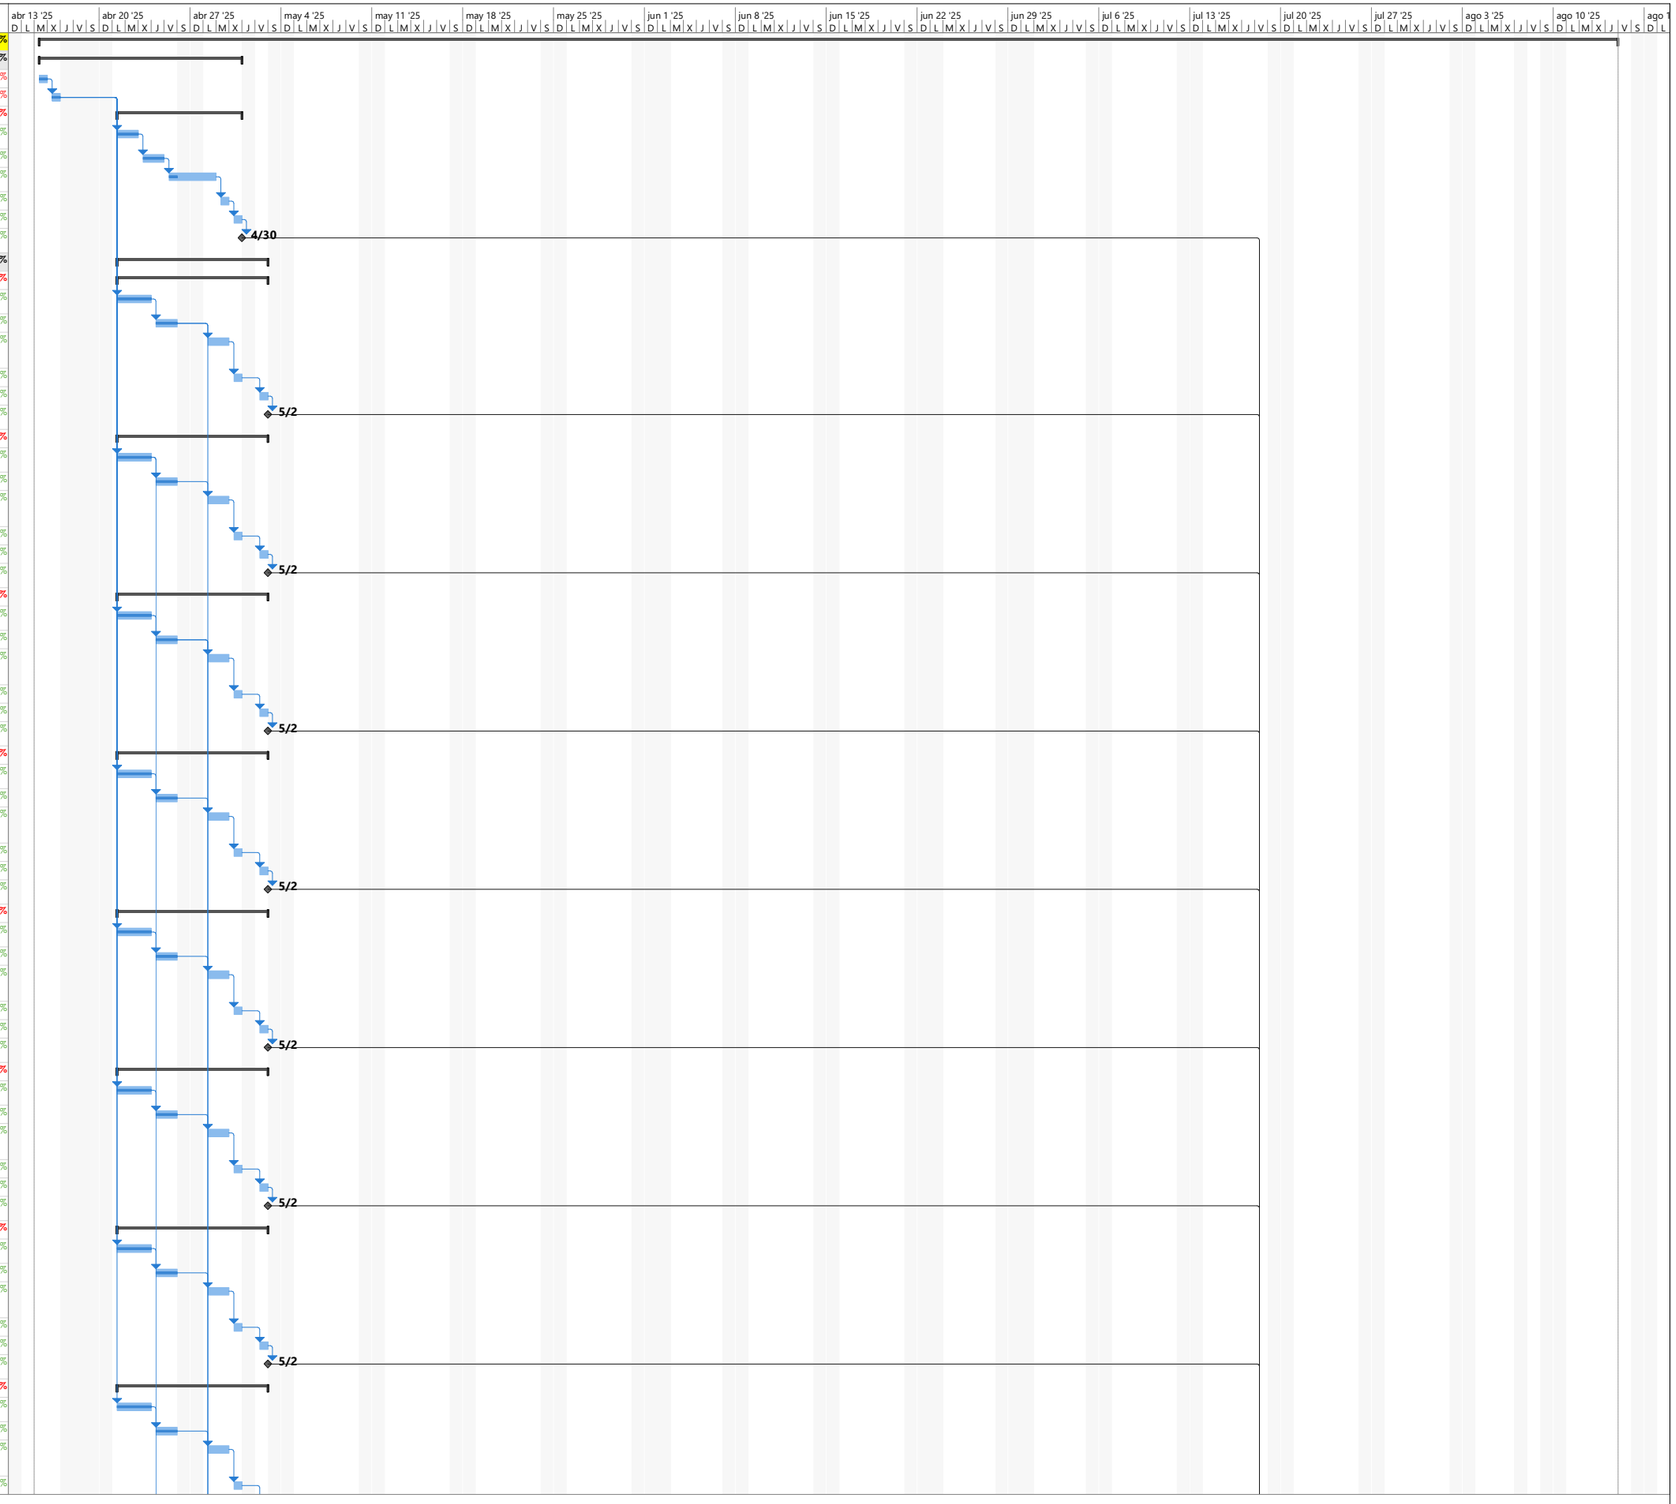

Proyecto: Cronograma Contrato
Fecha: 10/20/2025

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual


Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predecesoras	% completado
67	1.2.8.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	5/2/2025	5/2/2025	68	66	0%
68	1.2.8.6		Entrega Metodología Estudio Costos y Presupuestos ante la entidad Contratante	0 días	5/2/2025	5/2/2025	166	67	0%
69	**1.3**		**Volumen I Estudio de Transporte**	**41 días**	**4/28/2025**	**6/26/2025**			**0%**
70	1.3.1		Trabajos de Campo (Aforos)	8 días	4/28/2025	5/8/2025	72FC+7 días,1	29	0%
71	**1.3.2**		**Informe Estudio de Tránsito**	**26 días**	**5/20/2025**	**6/26/2025**			**0%**
72	1.3.2.1		Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Transito Versión uno	20 días	5/20/2025	6/17/2025	73,104FC-7 días	70FC+7 días	0%
73	1.3.2.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	6/18/2025	6/19/2025	74	72	0%
74	1.3.2.3		Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Transito Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	6/20/2025	6/24/2025	75	73	0%
75	1.3.2.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	6/25/2025	6/25/2025	76	74	0%
76	1.3.2.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	6/26/2025	6/26/2025	77	75	0%
77	1.3.2.6		Entrega Estudio de Tránsito ante la entidad Contratante	0 días	6/26/2025	6/26/2025	166	76	0%
78	**1.4**		**Volumen II Estudio de Topografía, Trazado y Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad Vial**	**54 días**	**4/28/2025**	**7/16/2025**			**0%**
79	1.4.1		Trabajo en campo (Levantamiento Topográfico de los cuatro tramos)	15 días	4/28/2025	5/19/2025	81,137FC-7 días	15	0%
80	**1.4.2**		**Informe Estudio de Topografía**	**29 días**	**5/20/2025**	**7/2/2025**			**0%**
81	1.4.2.1		Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Topografía Versión uno	23 días	5/20/2025	6/20/2025	82,88,95,121,1	79	0%
82	1.4.2.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	6/24/2025	6/25/2025	83	81	0%
83	1.4.2.3		Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Topografía Versión dos (Ajustes por	2 días	6/26/2025	6/27/2025	84	82	0%
84	1.4.2.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	7/1/2025	7/1/2025	85	83	0%
85	1.4.2.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	7/2/2025	7/2/2025	86	84	0%
86	1.4.2.6		Entrega Estudio de Topografía ante la entidad Contratante	0 días	7/2/2025	7/2/2025	166	85	0%
87	**1.4.3**		**Informe Estudio de Trazado y Diseño Geométrico**	**16 días**	**6/24/2025**	**7/16/2025**			**0%**
88	1.4.3.1		Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Trazado y Diseño Geométrico Versión uno	10 días	6/24/2025	7/8/2025	89,121CC-10 días	81	0%
89	1.4.3.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	7/9/2025	7/10/2025	90,129FC-5 día	88	0%
90	1.4.3.3		Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Trazado y Diseño Geométrico Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	7/11/2025	7/14/2025	91	89	0%
91	1.4.3.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	7/15/2025	7/15/2025	92	90	0%
92	1.4.3.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	7/16/2025	7/16/2025	93	91	0%
93	1.4.3.6		Entrega Estudio de Trazado y Diseño Geométrico ante la entidad Contratante	0 días	7/16/2025	7/16/2025	166	92	0%
94	**1.4.4**		**Informe Estudio de Señalización y Seguridad Vial**	**16 días**	**6/24/2025**	**7/16/2025**			**0%**
95	1.4.4.1		Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Señalización y Seguridad Vial Versión uno	10 días	6/24/2025	7/8/2025	96,121CC-10 días	81	0%
96	1.4.4.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	7/9/2025	7/10/2025	97,129FC-5 día	95	0%
97	1.4.4.3		Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Señalización y Seguridad Vial Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	7/11/2025	7/14/2025	98	96	0%
98	1.4.4.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	7/15/2025	7/15/2025	99	97	0%
99	1.4.4.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	7/16/2025	7/16/2025	100	98	0%
100	1.4.4.6		Entrega Estudio de Trazado y Diseño Geométrico ante la entidad Contratante	0 días	7/16/2025	7/16/2025	166	99	0%
101	**1.5**		**Volumen III Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento**	**51 días**	**4/24/2025**	**7/9/2025**			**6%**
102	1.5.1		Trabajo en campo (Apiques y Ensayos de Laboratorio de los cuatro tramos)	10 días	4/24/2025	5/8/2025	104,137FC-7 días	21	20%
103	**1.5.2**		**Informe Estudio de Geotécnia y Diseño del Pavimen**	**21 días**	**6/9/2025**	**7/9/2025**			**0%**
104	1.5.2.1		Entrega por parte de la Consultoría Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento Versión	15 días	6/9/2025	7/1/2025	105,121CC-10 días	102,72FC-7 días	0%
105	1.5.2.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	7/2/2025	7/3/2025	106,129FC-5 d	104	0%
106	1.5.2.3		Entrega por parte de la Consultoría Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	7/4/2025	7/7/2025	107	105	0%
107	1.5.2.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	7/8/2025	7/8/2025	108	106	0%
108	1.5.2.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	7/9/2025	7/9/2025	109	107	0%
109	1.5.2.6		Entrega Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento ante la entidad Contratante	0 días	7/9/2025	7/9/2025	166	108	0%
110	**1.6**		**Volumen IV Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación**	**28 días**	**6/24/2025**	**8/1/2025**			**0%**
111	1.6.1		Inventario y Diagnóstico de obras Hidráulicas	10 días	6/24/2025	7/8/2025	113	81	0%
112	**1.6.2**		**Informe Estudio Hidrología, Hidráulica y Socavación**	**18 días**	**7/9/2025**	**8/1/2025**			**0%**
113	1.6.2.1		Entrega por parte de la Consultoría Estudio Hidrología, Hidráulica y Socavación Versión uno	12 días	7/9/2025	7/24/2025	114	111	0%
114	1.6.2.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	7/25/2025	7/28/2025	115,121CC-10	113	0%
115	1.6.2.3		Entrega por parte de la Consultoría Estudio Hidrología, Hidráulica y Socavación Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	7/29/2025	7/30/2025	116	114	0%
116	1.6.2.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	7/31/2025	7/31/2025	117	115	0%
117	1.6.2.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	8/1/2025	8/1/2025	118	116	0%
118	1.6.2.6		Entrega Estudio Hidrología, Hidráulica y Socavación ante la entidad Contratante	0 días	8/1/2025	8/1/2025	166FC-22 días	117	0%
119	**1.7**		**Volumen V Estudio Espacio Público Urbanismo**	**16 días**	**7/11/2025**	**8/1/2025**			**0%**
120	**1.7.1**		**Informe Estudio Espacio Público_ Urbanismo**	**16 días**	**7/11/2025**	**8/1/2025**			**0%**
121	1.7.1.1		Entrega por parte de la Consultoría Estudio Espacio Público Urbanismo Versión uno	10 días	7/11/2025	7/24/2025	122	81,88CC-10 días,95CC-10	0%
122	1.7.1.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	7/25/2025	7/28/2025	123,129FC-5 d	121	0%
123	1.7.1.3		Entrega por parte de la Consultoría Estudio Espacio Público Urbanismo Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	7/29/2025	7/30/2025	124	122	0%
124	1.7.1.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	7/31/2025	7/31/2025	125	123	0%
125	1.7.1.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	8/1/2025	8/1/2025	126	124	0%
126	1.7.1.6		Entrega Estudio Espacio Público Urbanismo ante la entidad Contratante	0 días	8/1/2025	8/1/2025	166FC-22 días	125	0%
127	**1.8**		**Volumen VI Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios y Presupuestos**	**16 días**	**7/22/2025**	**8/13/2025**			**0%**
128	**1.8.1**		**Informe Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto**	**16 días**	**7/22/2025**	**8/13/2025**			**0%**
129	1.8.1.1		Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios y Presupuestos Versión uno	10 días	7/22/2025	8/4/2025	130	89FC-5 días,96FC-5 días,105FC-5	0%
130	1.8.1.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	8/5/2025	8/6/2025	131	129	0%

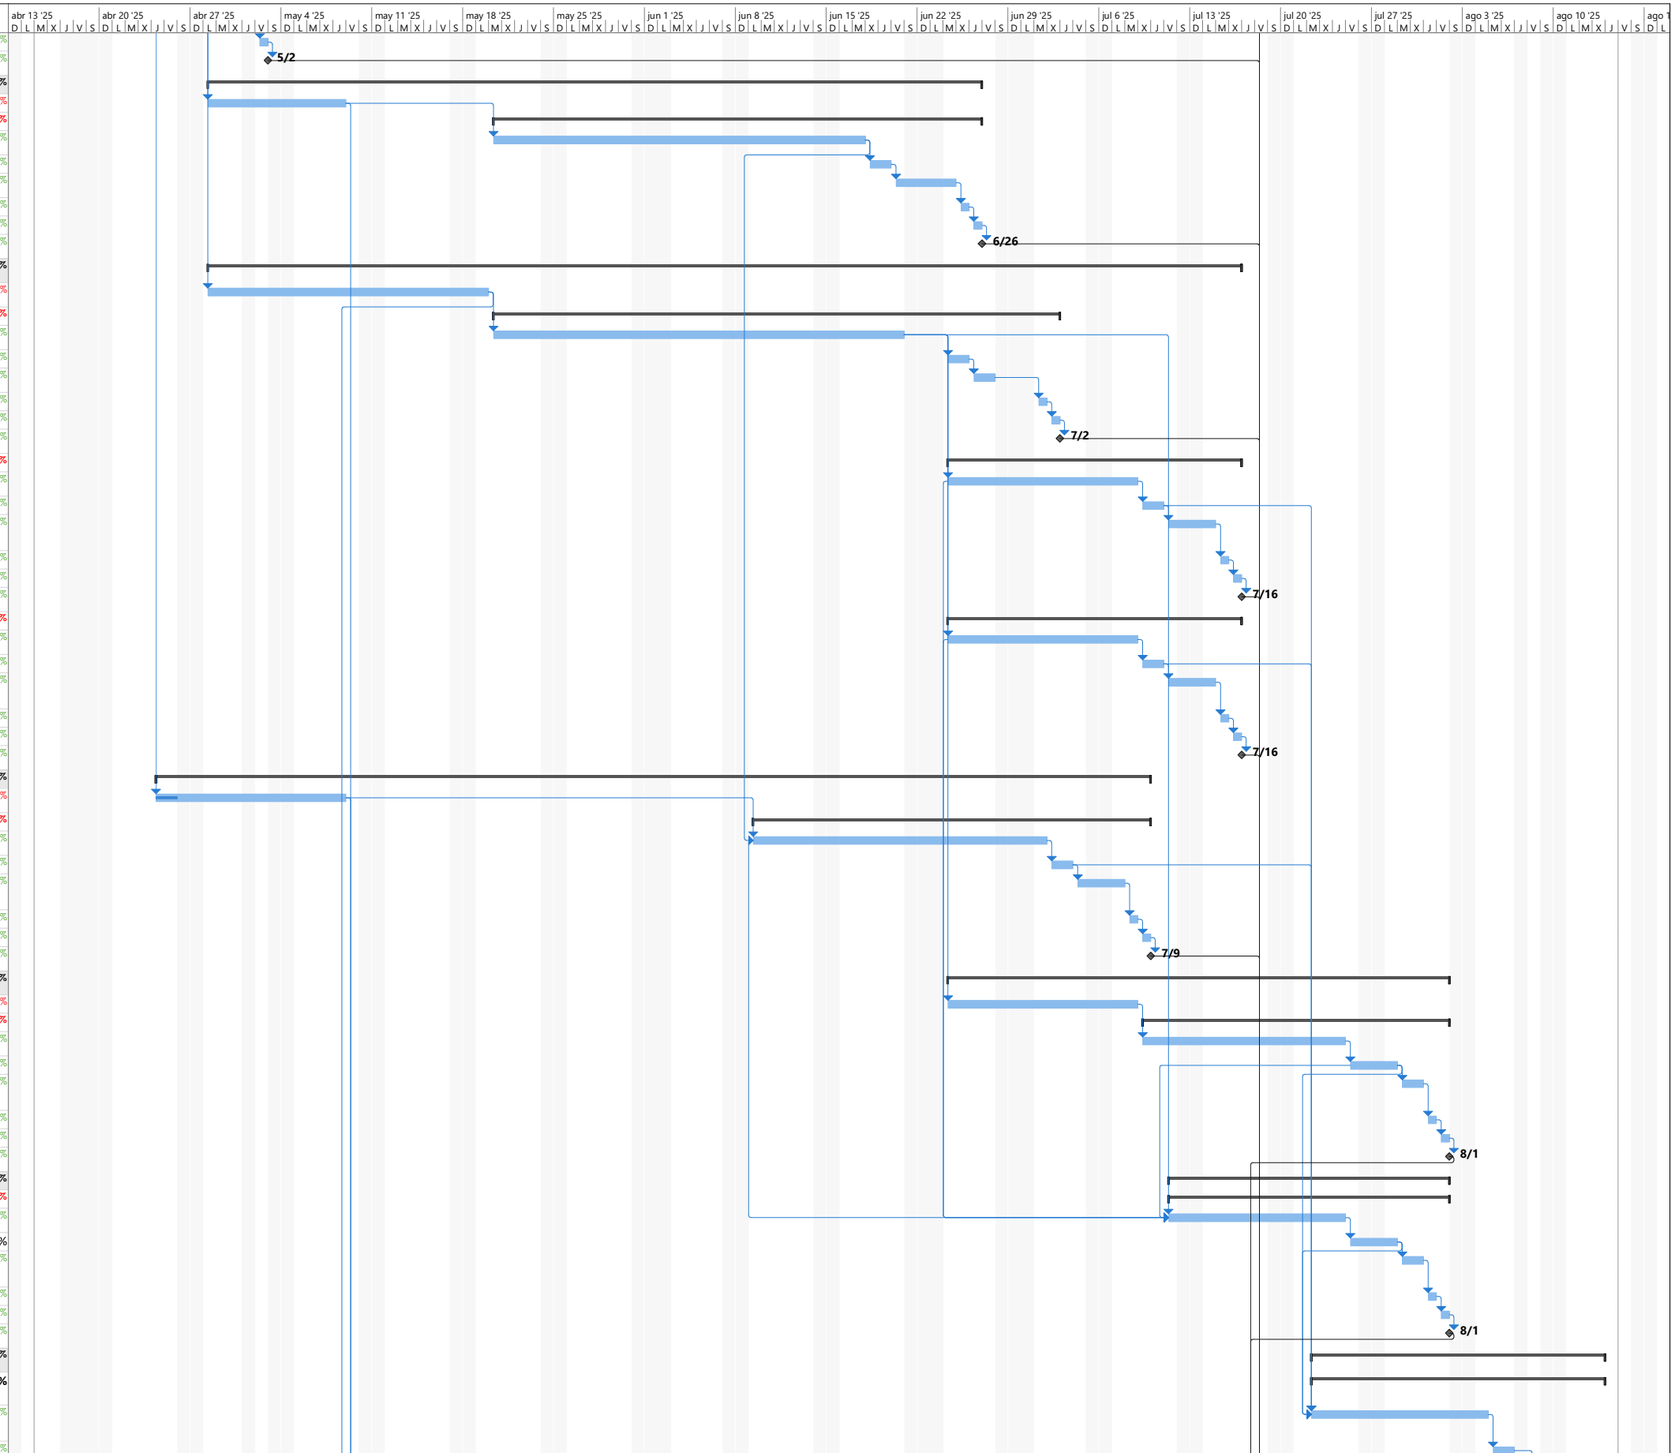

Proyecto: Cronograma Contrato
Fecha: 10/20/2025

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Sucesoras	Predecesoras	% completado
131	1.8.1.3		Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios y Presupuestos Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	8/8/2025	8/11/2025	132	130	0%
132	1.8.1.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	8/12/2025	8/12/2025	133	131	0%
133	1.8.1.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	8/13/2025	8/13/2025	134	132	0%
134	1.8.1.6		Entrega Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios y Presupuestos ante la entidad Contratante	0 días	8/13/2025	8/13/2025	166FC-22 días	133	0%
135	**1.9**		**Informes Mensuales de Seguimiento**	**63 días**	**5/9/2025**	**8/11/2025**			**0%**
136	**1.9.1**		**Informe Mensual Número uno Periodo 15-04-2025 al 14-05-2025**	**11 días**	**5/9/2025**	**5/23/2025**			**0%**
137	1.9.1.1		Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número uno Versión uno	5 días	5/9/2025	5/15/2025	138	70FC-7 días,79FC-7	0%
138	1.9.1.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	5/16/2025	5/19/2025	139	137	0%
139	1.9.1.3		Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número uno Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	5/20/2025	5/21/2025	140,144FC+12 días	138	0%
140	1.9.1.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	5/22/2025	5/22/2025	141	139	0%
141	1.9.1.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	5/23/2025	5/23/2025	142	140	0%
142	1.9.1.6		Entrega Informe Mensual Número uno ante la entidad Contratante	0 días	5/23/2025	5/23/2025	166	141	0%
143	**1.9.2**		**Informe Mensual Número dos Periodo 15-05-2025 al 14-06-2025**	**11 días**	**6/10/2025**	**6/25/2025**			**0%**
144	1.9.2.1		Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número dos Versión uno	5 días	6/10/2025	6/16/2025	145	139FC+12 días	0%
145	1.9.2.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	6/17/2025	6/18/2025	146	144	0%
146	1.9.2.3		Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número dos Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	6/19/2025	6/20/2025	147,151FC+9 días	145	0%
147	1.9.2.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	6/24/2025	6/24/2025	148	146	0%
148	1.9.2.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	6/25/2025	6/25/2025	149	147	0%
149	1.9.2.6		Entrega Informe Mensual Número dos ante la entidad Contratante	0 días	6/25/2025	6/25/2025	166	148	0%
150	**1.9.3**		**Informe Mensual Número tres Periodo 15-06-2025 al 14-07-2025**	**11 días**	**7/8/2025**	**7/22/2025**			**0%**
151	1.9.3.1		Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número tres Versión uno	5 días	7/8/2025	7/14/2025	152	146FC+9 días	0%
152	1.9.3.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	7/15/2025	7/16/2025	153	151	0%
153	1.9.3.3		Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número tres Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	7/17/2025	7/18/2025	154,158FC+4 días	152	0%
154	1.9.3.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	7/21/2025	7/21/2025	155	153	0%
155	1.9.3.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	7/22/2025	7/22/2025	156	154	0%
156	1.9.3.6		Entrega Informe Mensual Número tres ante la entidad Contratante	0 días	7/22/2025	7/22/2025	166FC-10 días	155	0%
157	**1.9.4**		**Informe Mensual Número cuatro Periodo 15-07-2025 al 14-08-2025**	**11 días**	**7/25/2025**	**8/11/2025**			**0%**
158	1.9.4.1		Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número cuatro Versión uno	5 días	7/25/2025	7/31/2025	159,166CC-5 días	153FC+4 días	0%
159	1.9.4.2		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	8/1/2025	8/4/2025	160	158	0%
160	1.9.4.3		Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número cuatro Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	8/5/2025	8/6/2025	161	159	0%
161	1.9.4.4		Revisión por parte de la Interventoría	1 día	8/8/2025	8/8/2025	162	160	0%
162	1.9.4.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	8/11/2025	8/11/2025	163	161	0%
163	1.9.4.6		Entrega Informe Mensual Número cuatro ante la entidad Contratante	0 días	8/11/2025	8/11/2025	166FC-22 días	162	0%
164	**1.10**		**Volumen VII Informe Final Ejecutivo**	**19 días**	**7/18/2025**	**8/14/2025**			**0%**
165	**1.10.1**		**Informe Final Ejecutivo Periodo 15-04-2025 al 14-08-2025**	**19 días**	**7/18/2025**	**8/14/2025**			**0%**
166	1.10.1.1		Entrega por parte de la Consultoría Informe Final Ejecutivo Versión uno	9 días	7/18/2025	7/30/2025	167	11,19,26,33,40,47 días,126FC-22	0%
167	1.10.1.2		Revisión por parte de la Interventoría	4 días	7/31/2025	8/5/2025	168	166	0%
168	1.10.1.3		Entrega por parte de la Consultoría Informe Final Ejecutivo Versión dos (Ajustes por	3 días	8/6/2025	8/11/2025	169	167	0%
169	1.10.1.4		Revisión por parte de la Interventoría	2 días	8/12/2025	8/13/2025	170	168	0%
170	1.10.1.5		Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	8/14/2025	8/14/2025	171	169	0%
171	1.10.1.6		Entrega Informe Final Ejecutivo cuatro ante la entidad Contratante	0 días	8/14/2025	8/14/2025	172	170	0%
172	1.11		Fin del Contrato de Consultoría No. 075-2025	0 días	8/14/2025	8/14/2025		171	0%

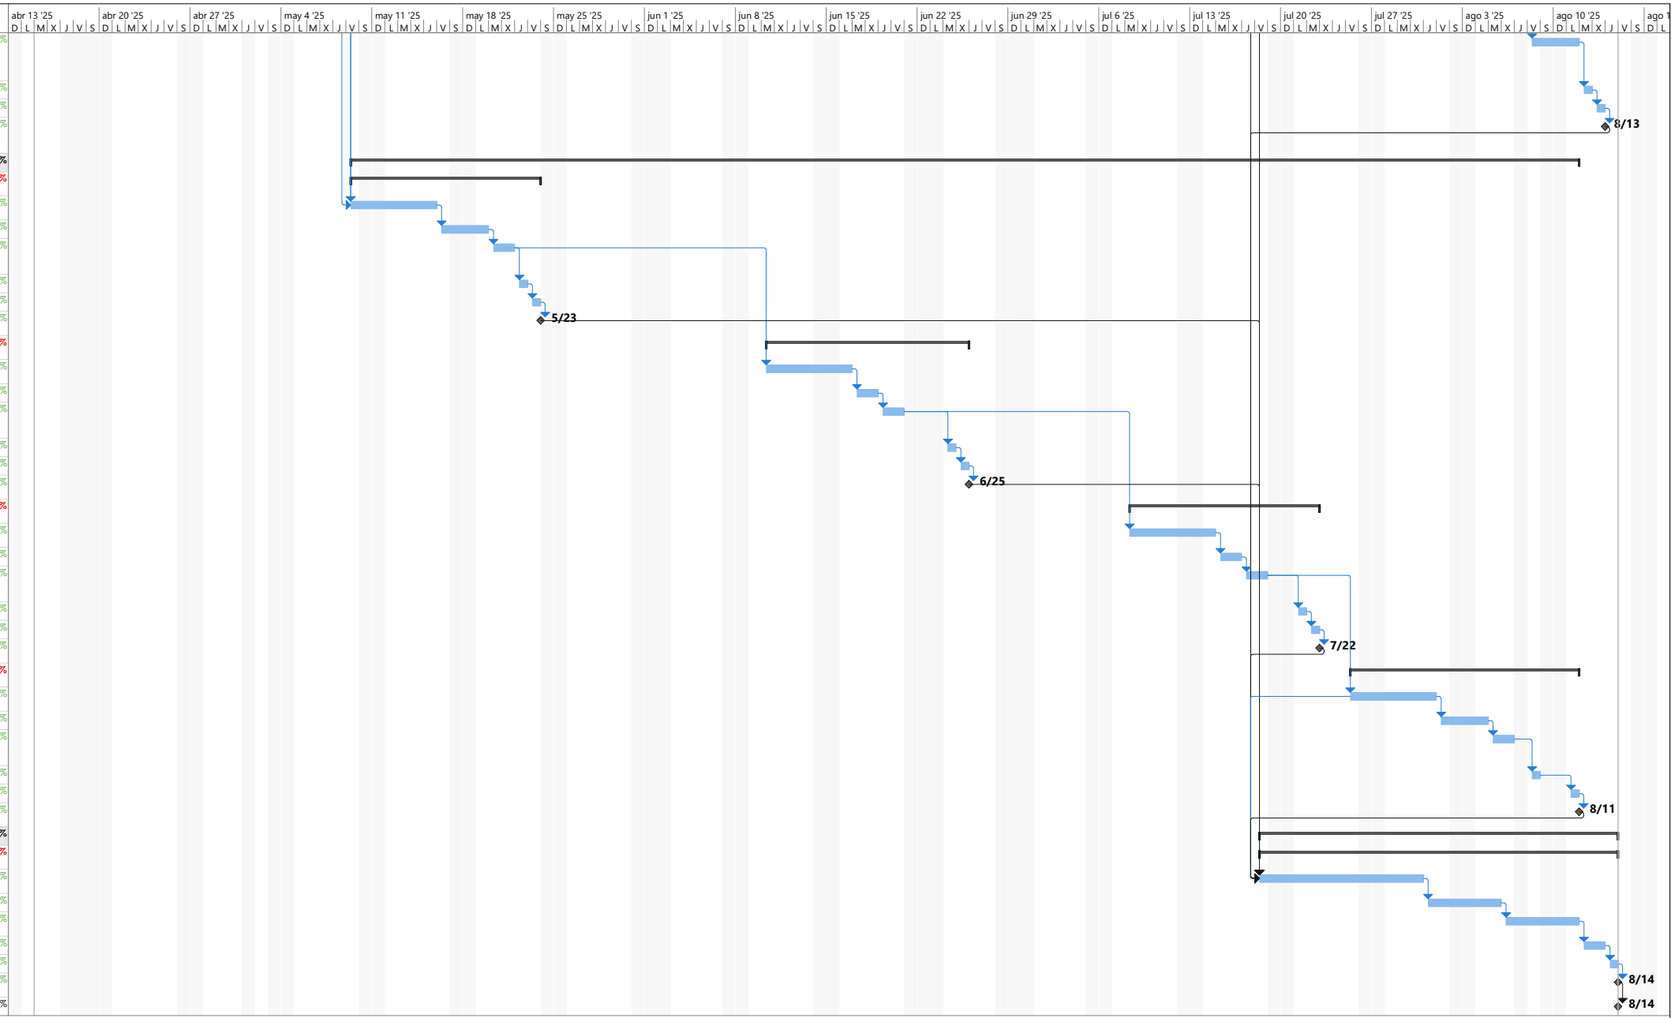

Proyecto: Cronograma Contrato
Fecha: 10/20/2025

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso
