Fecha		
15	Junio	2025
DD	MM	AA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
LA EMPRESA PÚBLICA DE MUNICIPAL DE SOACHA
EPUXUA

TÉCNICA
CONSTRUCCIONES
DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No. 075 de 2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA No. 9 **DEL** 9/06/2025 **AL** 15/06/2025

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO 61.00

NOMBRE DEL DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS SUPERVISORES LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PAVIMENTACIÓN DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3279 - 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (Físico)	5.00%	49.00%	Obra Ejecutada (Físico)	5.00%	49.00%
Valor de Proyecto Programado (Financiero $)	$ 32,499,395.70	$ 318,494,077.86	Valor de Proyecto Ejecutado (Financiero $)	$ 32,499,395.70	$ 318,494,077.86
Valor de Proyecto Programado (Financiero %)	5.00%	49.00%	Valor de Proyecto Ejecutado (Financiero %)	5.00%	49.00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	INGENIERIA Y GESTIÓN VÍAL S.A.S. –	Interventor	GEO INTERVENTORÍAS S.A.S
Contrato No.	075 de 2025	Contrato No.	076 de 2025
Valor Inicial	$ 649,987,914.00	Valor Inicial	$ 45,500,000.00
Valor Actualizado	$ 649,987,914.00	Valor Actualizado	$ 45,500,000.00
Plazo Inicial	4 meses	Plazo Inicial	4 meses
Plazo Actualizado	4 meses	Plazo Actualizado	4 meses
Fecha de Iniciación	15/04/2025	Fecha de Iniciación	15/04/2025
Fecha de Terminación	14/08/2025	Fecha de Terminación	14/08/2025
No. de empleos generados	10	No. De empleos generados	3

Generalidades:
El proyecto se encuentra en su fase de Estudios y Diseños, desarrollándose dentro del plazo establecido en el contrato suscrito entre las partes el 15 de abril de 2025, con una duración de cuatro (4) meses, según lo estipulado en el contrato de obra No. 075 de 2025, con el objetivo de garantizar la finalización del mismo.

El presente informe corresponde a la semana número nueve (9) del proyecto, la cual coincide con la semana correspondiente a la etapa de estudios y diseños.

B. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Topografía:

Se continua con las actividades administrativas relacionadas con el procesamiento de información en el software AutoCAD, específicamente mediante la elaboración de la nube de puntos correspondiente a las zonas de estudio definidas en el alcance del contrato. Esta labor constituye un insumo fundamental para el desarrollo de los planos base y la estructuración de los diseños geométricos preliminares.

Geotecnia:

Se continua con los ensayos de laboratorio sobre las muestras de suelo recolectadas en las zonas de estudio, con el propósito de identificar su clasificación y evaluar sus propiedades mecánicas relevantes, insumo importante para los Diseños de Pavimento.

Hidráulica:

Se continua con la recopilación de información hidrológica e hidráulica proveniente del IDEAM y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), con el fin de contar con insumos técnicos necesarios para el análisis de las condiciones actuales de escorrentía y drenaje en las zonas de estudio.

Tránsito:

Se continua con el procesamiento de los datos recopilados durante los conteos vehiculares en las zonas de estudio, constituyendo un insumo fundamental para el diseño de estructuras de pavimento.


Quince (15) días del mes de Junio de 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

DIRECTOR DE CONSULTORÍA
ING. LUIS FABIAN CASTILLA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ING. LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO

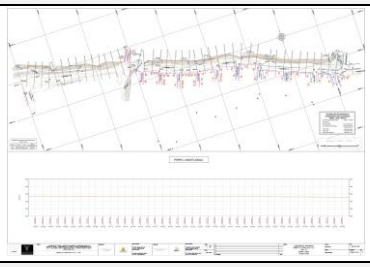


Fotografía 1: Levantamiento Topográfico Carrera 17 entre Calle 26 y Calle 22



Fotografía 2: Levantamiento Topográfico Carrera 17 entre Calle 26 y Calle 22

COORDENADAS PLANAS CARTESIANAS EPOCA 2018.0			
VERTICE	NORTE	ESTE	COTA GEOMETRICA
GPS1	99000.847	85363.187	2547.966
GPS2	99101.569	85095.056	2546.990

Fotografía 3: Levantamiento Topográfico Carrera 17 entre Calle 26 y Calle 22

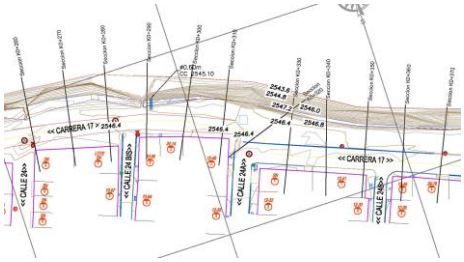

Fotografía 4: Levantamiento Topográfico Carrera 17 entre Calle 26 y Calle 22
