

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completac
1	**1**	**Contrato de Consultoria No. 075-2025**	**107 días**	**mar 15/04/25**	**dom 21/09/25**	**94%**
2	**1.1**	**Visita a Campo y Plan de Trabajo**	**10 días**	**mar 15/04/25**	**mié 30/04/25**	**100%**
3	1.1.1	Acta de inicio	1 día	mar 15/04/25	mar 15/04/25	100%
4	1.1.2	Visita a Campo	1 día	mié 16/04/25	mié 16/04/25	100%
5	**1.1.3**	**Cronograma de Trabajo**	**8 días**	**lun 21/04/25**	**mié 30/04/25**	**100%**
6	1.1.3.1	Entrega por parte de la Consultoría Cronograma de Trabajo Versión uno	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	100%
7	1.1.3.2	Revisión por parte de la Interventoría	2 días	mié 23/04/25	jue 24/04/25	100%
8	1.1.3.3	Entrega por parte de la Consultoría Cronograma de Trabajo Versión dos (Ajustes por	2 días	vie 25/04/25	lun 28/04/25	100%
9	1.1.3.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	mar 29/04/25	mar 29/04/25	100%
10	1.1.3.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	100%
11	1.1.3.6	Entrega de Cronograma de Trabajo ante la entidad Contratante	0 días	mié 30/04/25	mié 30/04/25	100%
12	**1.2**	**Metodologías de Trabajo para cada componente**	**9 días**	**lun 21/04/25**	**vie 2/05/25**	**100%**
13	**1.2.1**	**Metodología Estudio de Topografía**	**9 días**	**lun 21/04/25**	**vie 2/05/25**	**100%**
14	1.2.1.1	Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Topografía Versión uno	3 días	lun 21/04/25	mié 23/04/25	100%
15	1.2.1.2	Revisión por parte de la Interventoría	2 días	jue 24/04/25	vie 25/04/25	100%
16	1.2.1.3	Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Topofrafía Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25	100%
17	1.2.1.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	100%
18	1.2.1.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	100%
19	1.2.1.6	Entrega Metodología Estudio de Topografía ante la entidad Contratante	0 días	vie 2/05/25	vie 2/05/25	100%
20	**1.2.2**	**Metodología Estudio de Geotécnia**	**9 días**	**lun 21/04/25**	**vie 2/05/25**	**100%**
21	1.2.2.1	Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Geotécnia Versión uno	3 días	lun 21/04/25	mié 23/04/25	100%
22	1.2.2.2	Revisión por parte de la Interventoría	2 días	jue 24/04/25	vie 25/04/25	100%
23	1.2.2.3	Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Geotécnia Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25	100%
24	1.2.2.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	100%
25	1.2.2.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	100%
26	1.2.2.6	Entrega Metodología Estudio de Geotécnia ante la entidad Contratante	0 días	vie 2/05/25	vie 2/05/25	100%
27	**1.2.3**	**Metodología Estudio de Tránsito**	**9 días**	**lun 21/04/25**	**vie 2/05/25**	**100%**
28	1.2.3.1	Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Tránsito Versión uno	3 días	lun 21/04/25	mié 23/04/25	100%
29	1.2.3.2	Revisión por parte de la Interventoría	2 días	jue 24/04/25	vie 25/04/25	100%
30	1.2.3.3	Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Tránsito Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25	100%
31	1.2.3.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	100%
32	1.2.3.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	100%
33	1.2.3.6	Entrega Metodología Estudio de Tránsito ante la entidad Contratante	0 días	vie 2/05/25	vie 2/05/25	100%
34	**1.2.4**	**Metodología Estudio Geométrico de Vías**	**9 días**	**lun 21/04/25**	**vie 2/05/25**	**100%**
35	1.2.4.1	Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio Geométrico de Vías	3 días	lun 21/04/25	mié 23/04/25	100%
36	1.2.4.2	Revisión por parte de la Interventoría	2 días	jue 24/04/25	vie 25/04/25	100%
37	1.2.4.3	Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio Geométrico de Vías Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25	100%
38	1.2.4.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	100%
39	1.2.4.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	100%
40	1.2.4.6	Entrega Metodología Estudio Geométrico de Vías ante la entidad Contratante	0 días	vie 2/05/25	vie 2/05/25	100%
41	**1.2.5**	**Metodología Estudio de Pavimentos**	**9 días**	**lun 21/04/25**	**vie 2/05/25**	**100%**
42	1.2.5.1	Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Pavimentos Versión	3 días	lun 21/04/25	mié 23/04/25	100%
43	1.2.5.2	Revisión por parte de la Interventoría	2 días	jue 24/04/25	vie 25/04/25	100%
44	1.2.5.3	Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio de Pavimentos Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25	100%
45	1.2.5.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	100%
46	1.2.5.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	100%
47	1.2.5.6	Entrega Metodología Estudio de Pavimentos ante la entidad Contratante	0 días	vie 2/05/25	vie 2/05/25	100%
48	**1.2.6**	**Metodología Estudio Hidráulico**	**9 días**	**lun 21/04/25**	**vie 2/05/25**	**100%**
49	1.2.6.1	Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio Hidráulico Versión uno	3 días	lun 21/04/25	mié 23/04/25	100%
50	1.2.6.2	Revisión por parte de la Interventoría	2 días	jue 24/04/25	vie 25/04/25	100%
51	1.2.6.3	Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio Hidráulico Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25	100%
52	1.2.6.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	100%
53	1.2.6.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	100%
54	1.2.6.6	Entrega Metodología Estudio Hidráulico ante la entidad Contratante	0 días	vie 2/05/25	vie 2/05/25	100%
55	**1.2.7**	**Metodología Estudio Costos y Presupuestos**	**9 días**	**lun 21/04/25**	**vie 2/05/25**	**100%**
56	1.2.7.1	Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio Costos y Presupuestos	3 días	lun 21/04/25	mié 23/04/25	100%
57	1.2.7.2	Revisión por parte de la Interventoría	2 días	jue 24/04/25	vie 25/04/25	100%
58	1.2.7.3	Entrega por parte de la Consultoría Metodología Estudio Costos y Presupuestos Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25	100%
59	1.2.7.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	100%
60	1.2.7.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	vie 2/05/25	vie 2/05/25	100%
61	1.2.7.6	Entrega Metodología Estudio Costos y Presupuestos ante la entidad Contratante	0 días	vie 2/05/25	vie 2/05/25	100%
62	**1.3**	**Volumen I Estudio de Transporte**	**45 días**	**lun 28/04/25**	**jue 3/07/25**	**100%**
63	1.3.1	Trabajos de Campo (Aforos)	8 días	lun 28/04/25	jue 8/05/25	100%
64	**1.3.2**	**Informe Estudio de Tránsito**	**30 días**	**mar 20/05/25**	**jue 3/07/25**	**100%**
65	1.3.2.1	Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Transito Versión uno	20 días	mar 20/05/25	mar 17/06/25	100%
66	1.3.2.2	Revisión por parte de la Interventoría	4 días	mié 18/06/25	mar 24/06/25	100%
67	1.3.2.3	Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Transito Versión dos (Ajustes por Observaciones)	4 días	mié 25/06/25	mar 1/07/25	100%
68	1.3.2.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	mié 2/07/25	mié 2/07/25	100%
69	1.3.2.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	jue 3/07/25	jue 3/07/25	100%
70	1.3.2.6	Entrega Estudio de Tránsito ante la entidad Contratante	0 días	jue 3/07/25	jue 3/07/25	100%
71	**1.4**	**Volumen II Estudio de Topografía, Trazado y Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad Vial**	**63 días**	**lun 28/04/25**	**mar 29/07/25**	**100%**
72	1.4.1	Trabajo en campo (Levantamiento Topográfico de los cuatro tramos)	15 días	lun 28/04/25	lun 19/05/25	100%
73	**1.4.2**	**Informe Estudio de Topografía**	**33 días**	**mar 20/05/25**	**mar 8/07/25**	**100%**
74	1.4.2.1	Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Topografía Versión uno	23 días	mar 20/05/25	vie 20/06/25	100%
75	1.4.2.2	Revisión por parte de la Interventoría	4 días	mar 24/06/25	vie 27/06/25	100%
76	1.4.2.3	Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Topografía Versión dos (Ajustes por	4 días	mar 1/07/25	vie 4/07/25	100%
77	1.4.2.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	lun 7/07/25	lun 7/07/25	100%
78	1.4.2.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	mar 8/07/25	mar 8/07/25	100%
79	1.4.2.6	Entrega Estudio de Topografía ante la entidad Contratante	0 días	mar 8/07/25	mar 8/07/25	100%
80	**1.4.3**	**Informe Estudio de Trazado y Diseño Geométrico**	**25 días**	**mar 24/06/25**	**mar 29/07/25**	**100%**
81	1.4.3.1	Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Trazado y Diseño Geométrico Versión uno	15 días	mar 24/06/25	mar 15/07/25	100%
82	1.4.3.2	Revisión por parte de la Interventoría	4 días	mié 16/07/25	lun 21/07/25	100%
83	1.4.3.3	Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Trazado y Diseño Geométrico Versión dos (Ajustes por Observaciones)	4 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25	100%
84	1.4.3.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	lun 28/07/25	lun 28/07/25	100%
85	1.4.3.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	mar 29/07/25	mar 29/07/25	100%
86	1.4.3.6	Entrega Estudio de Trazado y Diseño Geométrico ante la entidad Contratante	0 días	mar 29/07/25	mar 29/07/25	100%
87	**1.4.4**	**Estudio de Señalización y Seguridad Vial**	**25 días**	**mar 24/06/25**	**mar 29/07/25**	**100%**
88	1.4.4.1	Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Señalización y Seguridad Vial Versión uno	15 días	mar 24/06/25	mar 15/07/25	100%
89	1.4.4.2	Revisión por parte de la Interventoría	4 días	mié 16/07/25	lun 21/07/25	100%
90	1.4.4.3	Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Señalización y Seguridad Vial Versión dos (Ajustes por Observaciones)	4 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25	100%
91	1.4.4.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	lun 28/07/25	lun 28/07/25	100%

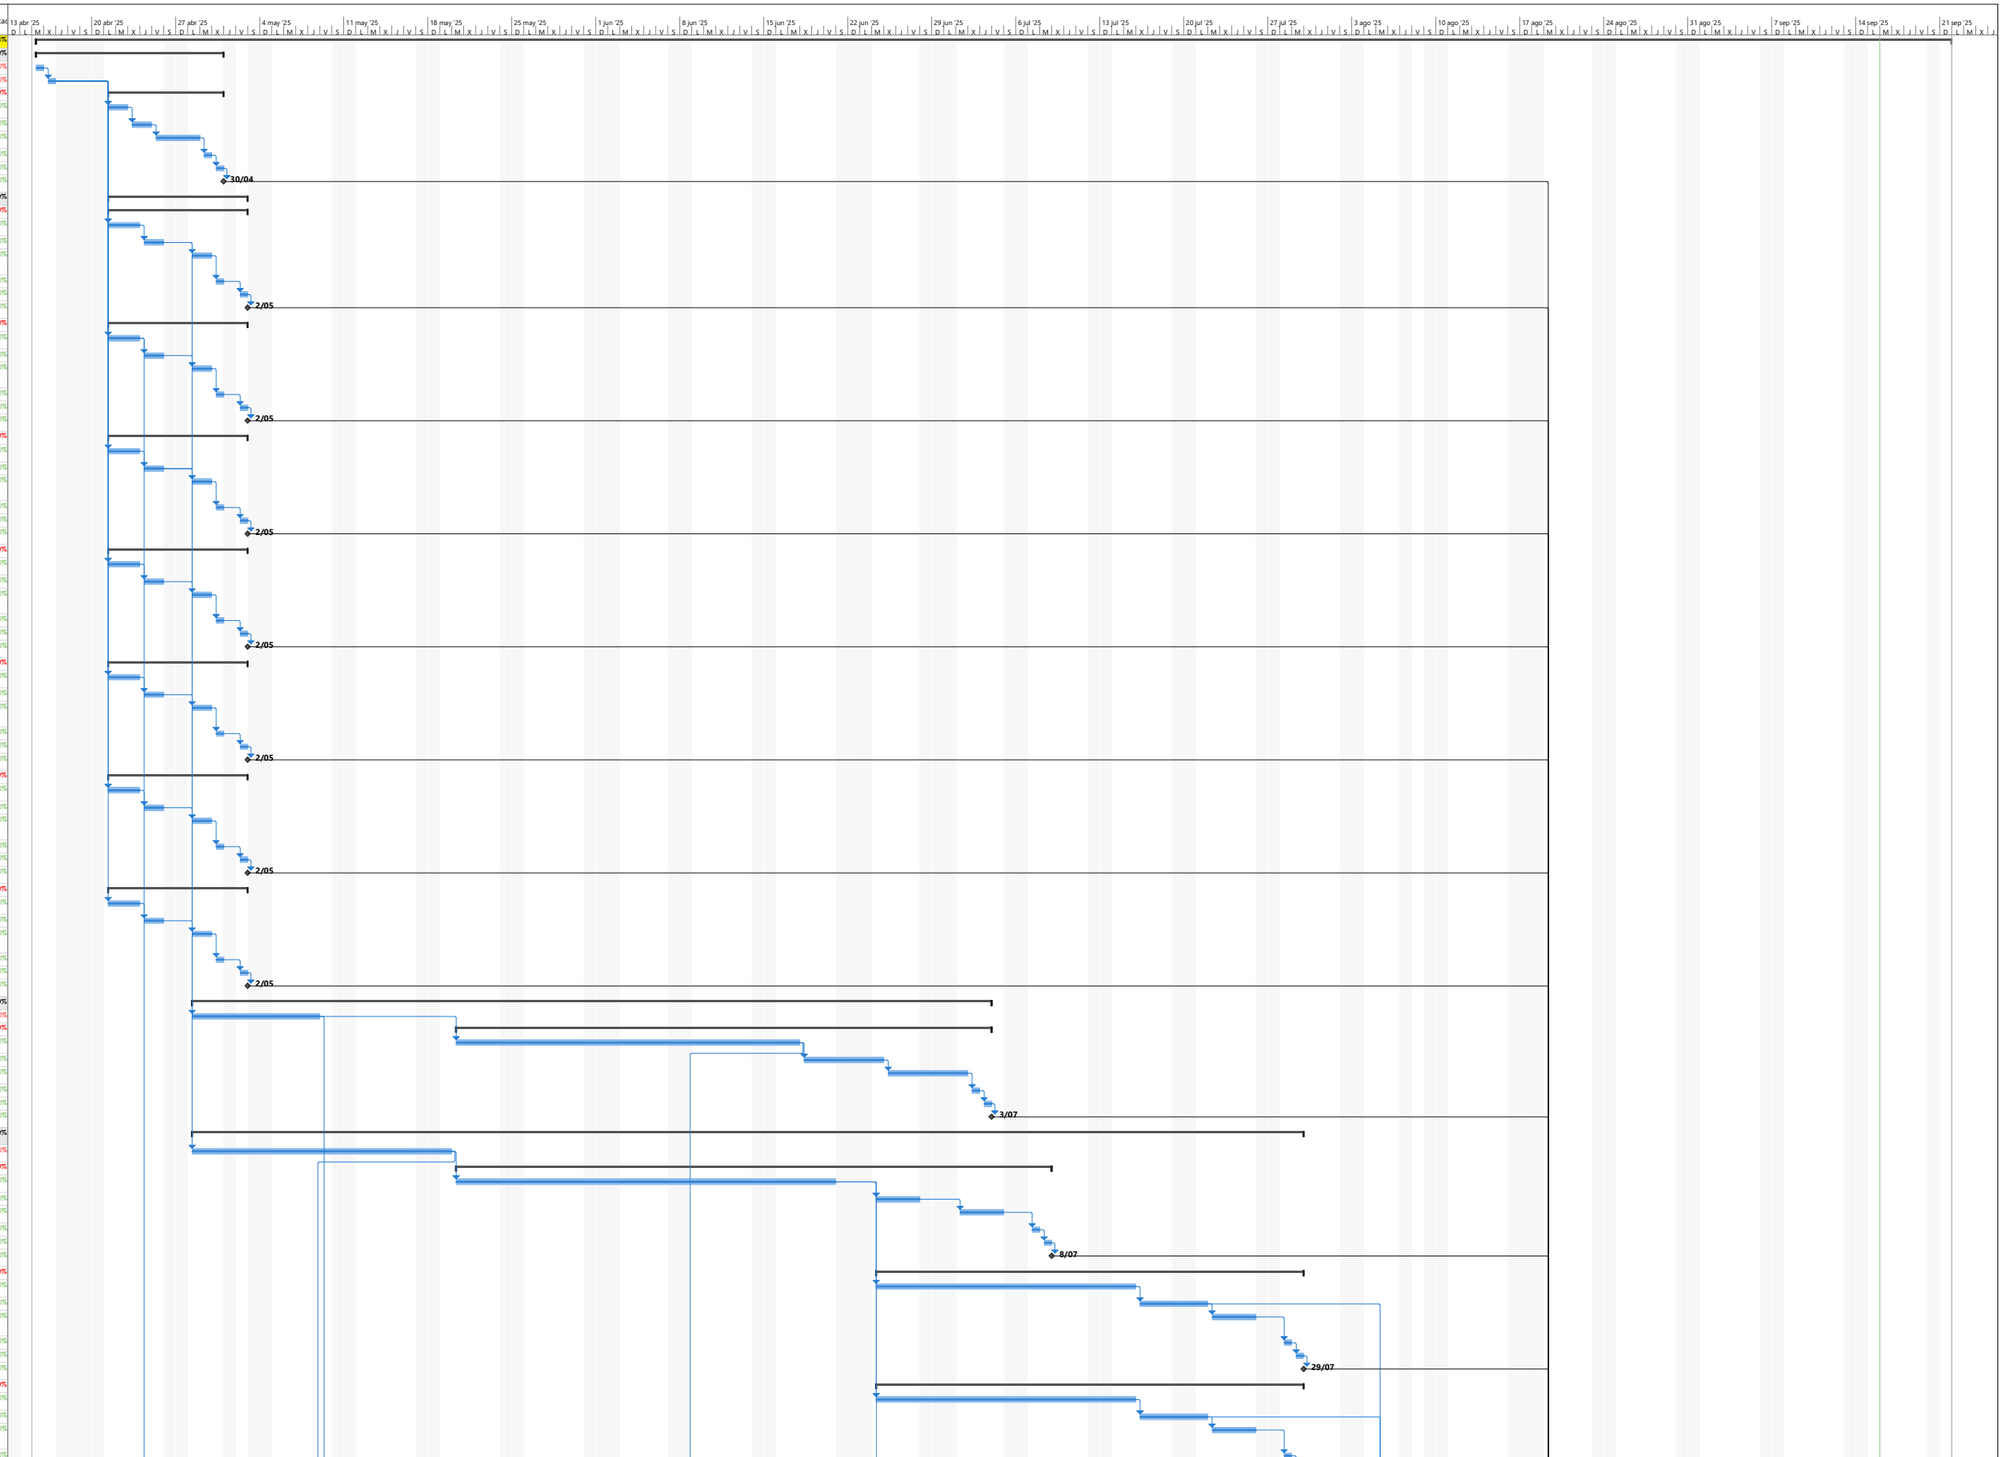

Proyecto: Cronograma Contrato
Fecha: mar 16/09/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completad
92	1.4.4.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	mar 29/07/25	mar 29/07/25	100%
93	1.4.4.6	Entrega Estudio de Trazado y Diseño Geométrico ante la entidad Contratante	0 días	mar 29/07/25	mar 29/07/25	100%
94	**1.5**	**Volumen III Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento**	**55 días**	**jue 24/04/25**	**mar 15/07/25**	**100%**
95	1.5.1	Trabajo en campo (Apiques y Ensayos de Laboratorio de los cuatro tramos)	10 días	jue 24/04/25	jue 8/05/25	100%
96	**1.5.2**	**Informe Estudio de Geotécnia y Diseño del Pavimen**	**25 días**	**lun 9/06/25**	**mar 15/07/25**	**100%**
97	1.5.2.1	Entrega por parte de la Consultoría Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento Versión	15 días	lun 9/06/25	mar 1/07/25	100%
98	1.5.2.2	Revisión por parte de la Interventoría	4 días	mié 2/07/25	lun 7/07/25	100%
99	1.5.2.3	Entrega por parte de la Consultoría Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento Versión dos (Ajustes por Observaciones)	4 días	mar 8/07/25	vie 11/07/25	100%
100	1.5.2.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	lun 14/07/25	lun 14/07/25	100%
101	1.5.2.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	mar 15/07/25	mar 15/07/25	100%
102	1.5.2.6	Entrega Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento ante la entidad Contratante	0 días	mar 15/07/25	mar 15/07/25	100%
103	**1.6**	**Volumen IV Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación**	**35 días**	**mar 24/06/25**	**mié 13/08/25**	**100%**
104	1.6.1	Inventario y Diagnóstico de obras Hidráulicas	10 días	mar 24/06/25	mar 8/07/25	100%
105	**1.6.2**	**Informe Estudio Hidrología, Hidráulica y Socavación**	**25 días**	**mié 9/07/25**	**mié 13/08/25**	**100%**
106	1.6.2.1	Entrega por parte de la Consultoría Estudio Hidrología, Hidráulica y Socavación Versión uno	15 días	mié 9/07/25	mar 29/07/25	100%
107	1.6.2.2	Revisión por parte de la Interventoría	4 días	mié 30/07/25	lun 4/08/25	100%
108	1.6.2.3	Entrega por parte de la Consultoría Estudio Hidrología, Hidráulica y Socavación Versión dos (Ajustes por Observaciones)	4 días	mar 5/08/25	lun 11/08/25	100%
109	1.6.2.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	mar 12/08/25	mar 12/08/25	100%
110	1.6.2.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	mié 13/08/25	mié 13/08/25	100%
111	1.6.2.6	Entrega Estudio Hidrología, Hidráulica y Socavación ante la entidad Contratante	0 días	mié 13/08/25	mié 13/08/25	100%
112	**1.7**	**Volumen VI Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios y Presupuestos**	**25 días**	**mar 5/08/25**	**mié 10/09/25**	**71%**
113	**1.7.1**	**Informe Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto**	**25 días**	**mar 5/08/25**	**mié 10/09/25**	**71%**
114	1.7.1.1	Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios y Presupuestos Versión uno	15 días	mar 5/08/25	mié 27/08/25	100%
115	1.7.1.2	Revisión por parte de la Interventoría	4 días	jue 28/08/25	mar 2/09/25	50%
116	1.7.1.3	Entrega por parte de la Consultoría Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios y Presupuestos Versión dos (Ajustes por Observaciones)	4 días	mié 3/09/25	lun 8/09/25	20%
117	1.7.1.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	mar 9/09/25	mar 9/09/25	0%
118	1.7.1.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	mié 10/09/25	mié 10/09/25	0%
119	1.7.1.6	Entrega Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios y Presupuestos ante la entidad Contratante	0 días	mié 10/09/25	mié 10/09/25	0%
120	**1.8**	**Informes Mensuales de Seguimiento**	**81 días**	**vie 9/05/25**	**vie 5/09/25**	**100%**
121	**1.8.1**	**Informe Mensual Número uno Periodo 15-04-2025 al 14-05-2025**	**12 días**	**vie 9/05/25**	**lun 26/05/25**	**100%**
122	1.8.1.1	Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número uno Versión uno	6 días	vie 9/05/25	vie 16/05/25	100%
123	1.8.1.2	Revisión por parte de la Interventoría	2 días	lun 19/05/25	mar 20/05/25	100%
124	1.8.1.3	Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número uno Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	mié 21/05/25	jue 22/05/25	100%
125	1.8.1.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	100%
126	1.8.1.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	lun 26/05/25	lun 26/05/25	100%
127	1.8.1.6	Entrega Informe Mensual Número uno ante la entidad Contratante	0 días	lun 26/05/25	lun 26/05/25	100%
128	**1.8.2**	**Informe Mensual Número dos Periodo 15-05-2025 al 14-06-2025**	**12 días**	**mié 11/06/25**	**vie 27/06/25**	**100%**
129	1.8.2.1	Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número dos Versión uno	6 días	mié 11/06/25	mié 18/06/25	100%
130	1.8.2.2	Revisión por parte de la Interventoría	2 días	jue 19/06/25	vie 20/06/25	100%
131	1.8.2.3	Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número dos Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	mar 24/06/25	mié 25/06/25	100%
132	1.8.2.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	jue 26/06/25	jue 26/06/25	100%
133	1.8.2.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	vie 27/06/25	vie 27/06/25	100%
134	1.8.2.6	Entrega Informe Mensual Número dos ante la entidad Contratante	0 días	vie 27/06/25	vie 27/06/25	100%
135	**1.8.3**	**Informe Mensual Número tres Periodo 15-06-2025 al 14-07-2025**	**12 días**	**jue 10/07/25**	**vie 25/07/25**	**100%**
136	1.8.3.1	Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número tres Versión uno	6 días	jue 10/07/25	jue 17/07/25	100%
137	1.8.3.2	Revisión por parte de la Interventoría	2 días	vie 18/07/25	lun 21/07/25	100%
138	1.8.3.3	Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número tres Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	mar 22/07/25	mié 23/07/25	100%
139	1.8.3.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	jue 24/07/25	jue 24/07/25	100%
140	1.8.3.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	vie 25/07/25	vie 25/07/25	100%
141	1.8.3.6	Entrega Informe Mensual Número tres ante la entidad Contratante	0 días	vie 25/07/25	vie 25/07/25	100%
142	**1.8.4**	**Informe Mensual Número cuatro Periodo 15-07-2025 al 14-08-2025**	**12 días**	**mié 30/07/25**	**vie 15/08/25**	**100%**
143	1.8.4.1	Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número cuatro Versión uno	6 días	mié 30/07/25	mié 6/08/25	100%
144	1.8.4.2	Revisión por parte de la Interventoría	2 días	vie 8/08/25	lun 11/08/25	100%
145	1.8.4.3	Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número cuatro Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	mar 12/08/25	mié 13/08/25	100%
146	1.8.4.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	jue 14/08/25	jue 14/08/25	100%
147	1.8.4.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	vie 15/08/25	vie 15/08/25	100%
148	1.8.4.6	Entrega Informe Mensual Número cuatro ante la entidad Contratante	0 días	vie 15/08/25	vie 15/08/25	100%
149	**1.8.5**	**Informe Mensual Número cinco Periodo 15-08-2025 al 14-09-2025**	**12 días**	**jue 21/08/25**	**vie 5/09/25**	**100%**
150	1.8.5.1	Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número cinco Versión uno	6 días	jue 21/08/25	jue 28/08/25	100%
151	1.8.5.2	Revisión por parte de la Interventoría	2 días	vie 29/08/25	lun 1/09/25	100%
152	1.8.5.3	Entrega por parte de la Consultoría Informe Mensual Número cinco Versión dos (Ajustes por Observaciones)	2 días	mar 2/09/25	mié 3/09/25	100%
153	1.8.5.4	Revisión por parte de la Interventoría	1 día	jue 4/09/25	jue 4/09/25	100%
154	1.8.5.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	vie 5/09/25	vie 5/09/25	100%
155	1.8.5.6	Entrega Informe Mensual Número cinco ante la entidad Contratante	0 días	vie 5/09/25	vie 5/09/25	100%
156	**1.9**	**Volumen VII Informe Final Ejecutivo**	**25 días**	**mar 19/08/25**	**dom 21/09/25**	**31%**
157	**1.9.1**	**Informe Final Ejecutivo Periodo 15-04-2025 al 14-08-2025**	**25 días**	**mar 19/08/25**	**dom 21/09/25**	**31%**
158	1.9.1.1	Entrega por parte de la Consultoría Informe Final Ejecutivo Versión uno	13 días	mar 19/08/25	jue 4/09/25	60%
159	1.9.1.2	Revisión por parte de la Interventoría	5 días	vie 5/09/25	jue 11/09/25	0%
160	1.9.1.3	Entrega por parte de la Consultoría Informe Final Ejecutivo Versión dos (Ajustes por	4 días	vie 12/09/25	mié 17/09/25	0%
161	1.9.1.4	Revisión por parte de la Interventoría	2 días	jue 18/09/25	vie 19/09/25	0%
162	1.9.1.5	Aprobación del producto por Interventoría.	1 día	dom 21/09/25	dom 21/09/25	0%
163	1.9.1.6	Entrega Informe Final Ejecutivo cuatro ante la entidad Contratante	0 días	dom 21/09/25	dom 21/09/25	0%
164	1.10	Fin del Contrato de Consultoría No. 075-2025	0 días	dom 21/09/25	dom 21/09/25	0%

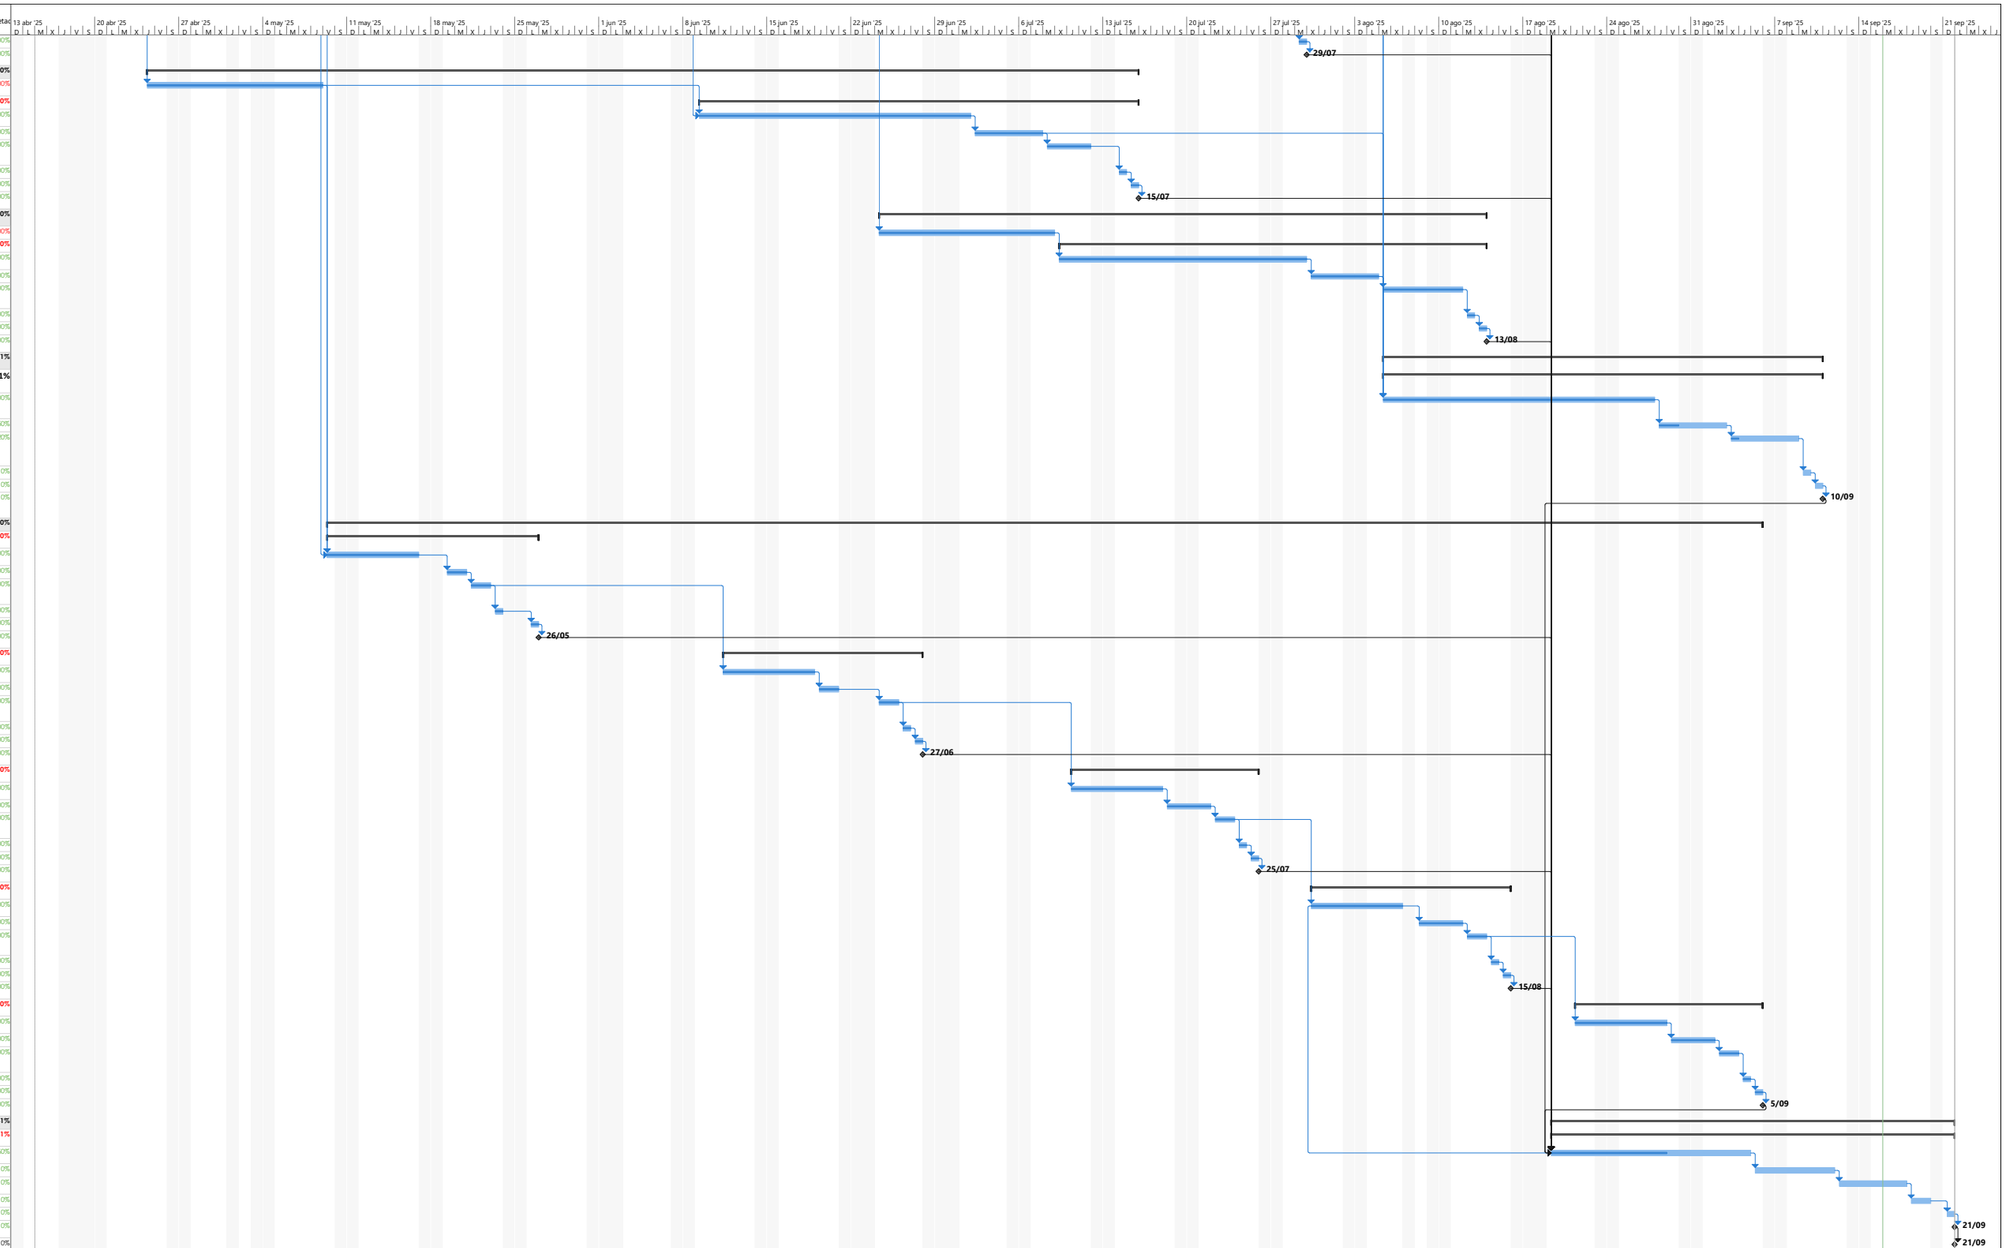

Proyecto: Cronograma Contrato
Fecha: mar 16/09/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
