INFORME TÉCNICO SEMANAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN CONTRTAO 024 DE 2025

(30 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2025)

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA, HUILA

CONSORCIO PROVILL
CONTRATISTA DE OBRA 024 DE 2025

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA HUILA
OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRTAIVA DE NEIVA
AGOSTO 2025

AVANCE DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Presentar informe sobre el avance de ejecución de las actividades descritas y programas para ejecutar por medio del contrato 024 de 2025.

1. ANTECEDENTES

La ingeniera Valentina Fiesco Hoyos de la seccional Administrativa de Neiva, Huila, en su calidad de supervisora del Contrato de Obra No. 024 de 2025 y en cumplimiento de las obligaciones inherentes a dicho rol, verifica que los informes semanales sobre las actividades ejecutadas en los Palacios de Justicia de Neiva, Huila, se encuentren debidamente ajustados a la problemática identificada. Esta verificación se realiza con base en el levantamiento previo de necesidades que dio origen a la contratación mencionada.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la visita se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Recorrido interno del Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva, Huila, donde se identificaron y priorizaron los frentes de intervención.
2. Tomar registros fotográficos de lo evidenciado.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- **Impermeabilización de terraza piso 11**
  Se continuo con la impermeabilización de la terraza ubicada en el piso 11 mediante la instalación de membrana de PVC.
- **Adecuación en oficina 306B**

Se dio continuidad a la adecuación de la oficina disciplinaria con la aplicación de pintura vinilo tipo I en todos en los muros, instalación de canaleta metálica,

suministro e instalación de puntos eléctricos nuevos, desmonte y reubicación de puntos eléctricos existentes y desmonte de puertas de madera (ingreso oficina del juez, ingreso a baño e ingreso a archivo)

- **Señalización horizontal – Sótano**
  Terminación de trabajos de señalización horizontal en el sótano y numeración de parqueaderos.
- **Aplicación de impermeabilizante acrílico – Plazoleta**
  Se continuo con la aplicación de pintura impermeabilizante en alfajía de los antepechos de la plazoleta.
- **Oficina segundo piso**
  Demolición de muro en drywall, retiro de cielo raso de fibra minera, retiro de lampatas, retiro de puntos eléctricos y retiro de cable UTP.
- **Desmonte de buitrones de ductos de aire acondicionado**
  Desmonte de buitrones pertenecientes al sistema de aire acondicionado en desuso y su respectivo retiro y disposición final.



Evidencia fotografica 1. Impermabilización terraza piso 11






Evidencia fotografica 2. Adecuación oficina 306B




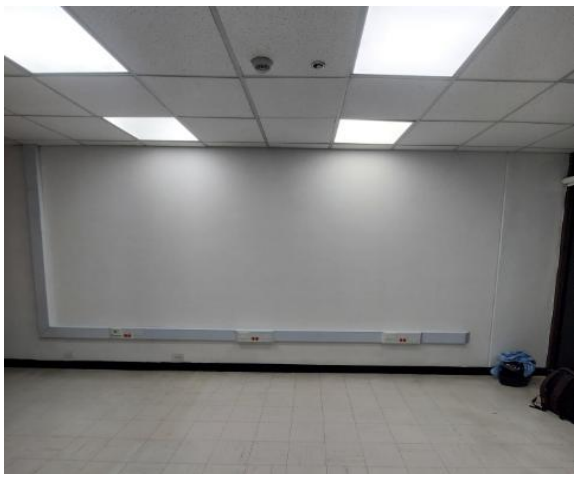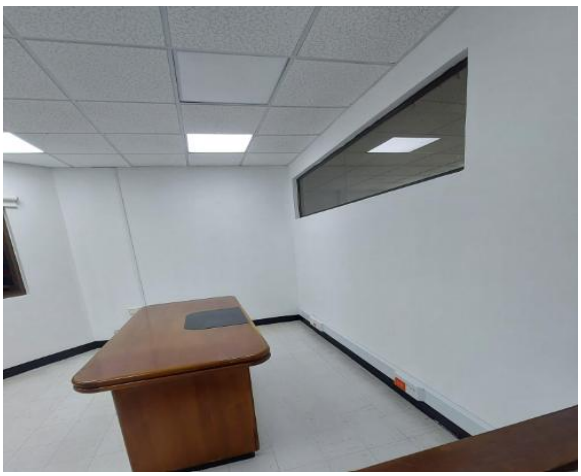

Evidencia fotografica 3. Señalización horizontal - sotano






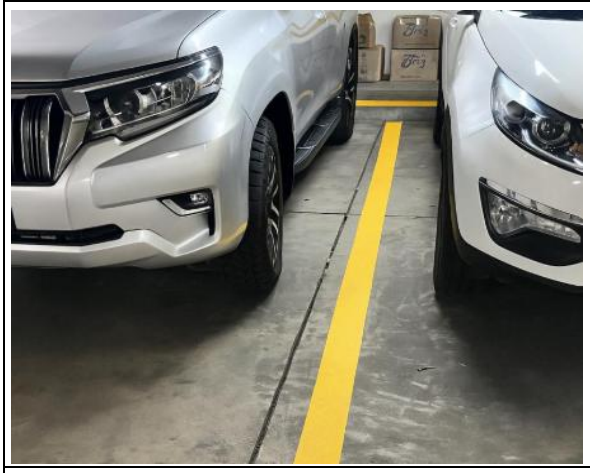

Evidencia fotografica 5. Aplicación de impermeabilizante acrílico – Plazoleta





Evidencia fotografica 6. Adecuación oficina segundo piso

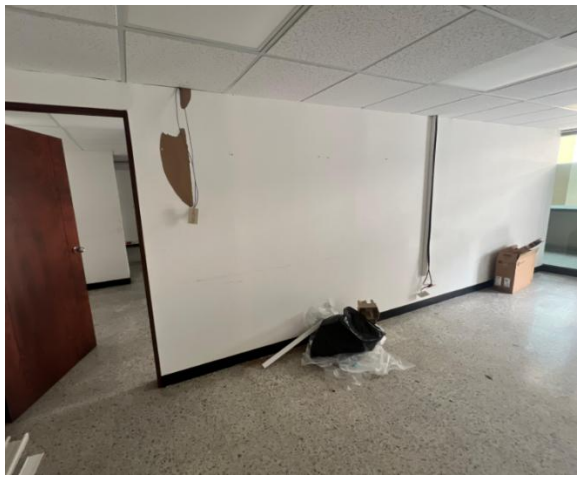


Evidencia fotografica 7. Desmonte de buitrones de ductos de aire acondicionado



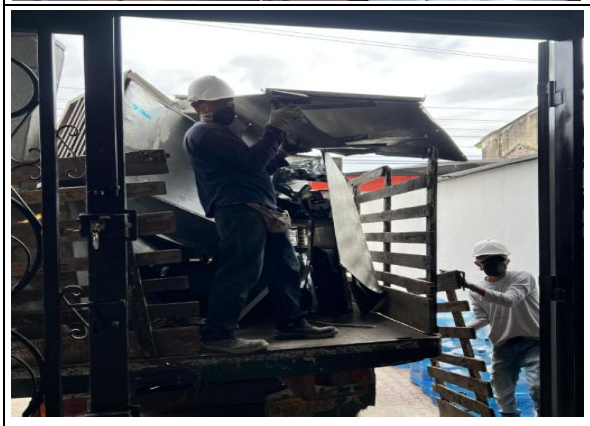


4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas en el Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva - Departamento del Huila, se concluye:

1) No se presentaron observaciones en el desarrollo de las actividades de esta semana.
2) Se observa un avance optimo en las actividades contempladas, logrando cumplir con los objetivos previstos para desarrollar en la semana

5. RECOMENDACION

Seguir con las buenas prácticas de seguridad y continuar con el desarrollo de las actividades hasta la finalización del contrato.

Cordialmente;

FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA
