INFORME TÉCNICO SEMANAL EN LA FASE DE EJECUCIÓN CONTRTAO 024 DE 2025

(6 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO DE 2025)

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA, HUILA

CONSORCIO PROVILL
CONTRATISTA DE OBRA 024 DE 2025

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA HUILA
OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRTAIVA DE NEIVA
AGOSTO 2025

INFORME TÉCNICO SEMANAL

AVANCE DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Presentar informe sobre el avance de ejecución de las actividades descritas y programas para ejecutar por medio del contrato 024 de 2025.

1. ANTECEDENTES

La ingeniera Valentina Fiesco Hoyos de la seccional Administrativa de Neiva, Huila, en su calidad de supervisora del Contrato de Obra No. 024 de 2025 y en cumplimiento de las obligaciones inherentes a dicho rol, verifica que los informes semanales sobre las actividades ejecutadas en los Palacios de Justicia de Neiva, Huila, se encuentren debidamente ajustados a la problemática identificada. Esta verificación se realiza con base en el levantamiento previo de necesidades que dio origen a la contratación mencionada.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la visita se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Recorrido interno del Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva, Huila, donde se identificaron y priorizaron los frentes de intervención.
2. Tomar registros fotográficos de lo evidenciado.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- **Impermeabilización de terraza piso 11 y piso 3**
  Se continuo y se dio finalización con la impermeabilización de la terraza ubicada en el piso 11 y la terraza del piso 3 mediante la instalación de membrana de PVC

ISO 9001 icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 059 - 4

- **Adecuación en oficina 306B**

  Se dio continuidad a la adecuación de la oficina disciplinaria con el suministro e instalación de puertas (ingreso oficina del juez, ingreso a baño e ingreso a archivo), suministro e instalación de chapas, además se realizó el suministro e instalación de sand blasting de toda la división de aluminio y vidrio ya existente en la oficina continua.

- **Oficina segundo piso**

  Se realizó el suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral con su estructura, instalación de punto de cable y punto de datos, instalación de punto de corriente normal, punto de corriente regulada, salidas de iluminación y suministro e instalación de lámparas led de 60x60

- **Cuarto de almacenamiento – sótano**

  Suministro e construcción de muro de mampostería con ladrillo No. 4, pañete para tapar huecos generados por el retiro de buitrones, salidas de iluminación.

- **Terraza piso 3**

En esta zona con el objetivo de mejorar la zona para la instalación de la membrana de PVC se realizó el retiro de buitrones, el desmonte de puntos y tuberías de cableado inútiles, el sellamiento de hueco con mampostería con ladrillo No. 4 y la instalación de una cubierta en lamina de policarbonato.

ISO 9001 icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 059 - 4


Evidencia fotografica 1. Impermabilización terraza piso 11







Evidencia fotografica 2. Adecuación oficina 306B

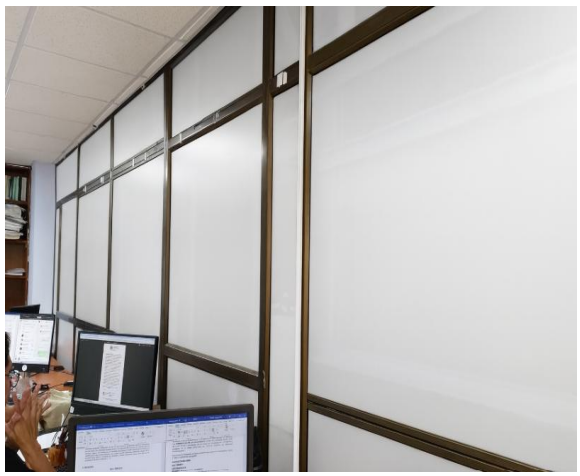


Evidencia fotografica 3. Adecuación oficina segundo piso

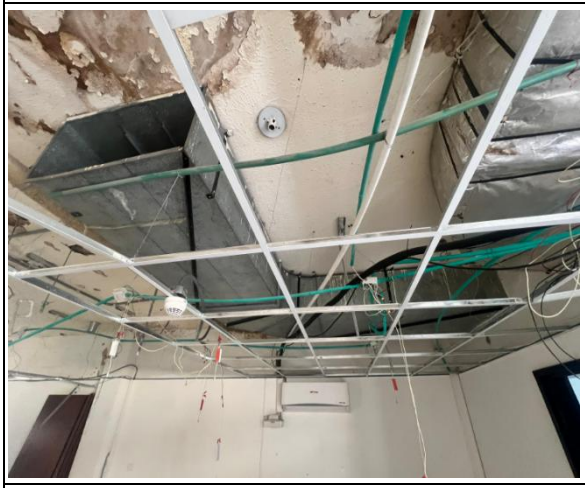


Evidencia fotografica 4. Cuarto de almacenamiento sotano







Evidencia fotografica 5. Terraza piso 3








4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas en el Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva - Departamento del Huila, se concluye:

1) No se presentaron observaciones en el desarrollo de las actividades de esta semana.
2) Se observa un avance optimo en las actividades contempladas, logrando cumplir con los objetivos previstos para desarrollar en la semana

5. RECOMENDACION

Seguir con las buenas prácticas de seguridad y continuar con el desarrollo de las actividades hasta la finalización del contrato.

Cordialmente;

FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA
