ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

ECOVIAS SAS



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°31

01 - 31 DE AGOSTO- DE 2025

Versión 01
Bogotá, D.C. 15 septiembre de 2025

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1975 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		N°. DE COPIAS
Copia N°.1	Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	1 (Original)
Copia N°.2	Biblioteca del Proyecto	1 (Copia)

CONTROL DE VERSIONES

ÍNDICE VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	FOLIOS

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN



TITULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 31			
PERIODO:	**1 al 31 de agosto de 2025**			
NUMERO DE REVISIÓN			1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN	Nombre:	José Plata Giraldo		
	Firma:			
	Fecha:	15/09/2025		
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Ermy A. Hurtado R.		
	Firma:			
	Fecha:	15/09/2025		
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
				
	Fecha:	15/09/2025		

TABLA CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 10

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 13

2.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 13
2.1.1 Descripción / alcance y meta física inicial 13
2.1.2 Descripción / Alcance y meta física actualizada 15
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 16
2.2.1 Localización de las obras 16
2.2.2 Localización del campamento y/o oficinas 21
2.3 ANTECEDENTES 22
2.4 ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS 23
2.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 24

3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 28

4 CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95 29

4.1 GENERALIDADES 29
4.1.1 Datos del contrato 478 del 10/02/2022. 29
4.1.2 Pólizas o garantías del contrato de obra. 30
4.1.3 Otrosí, Adición y Prórroga 33
4.1.4 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra 34
4.1.5 Actas De Modificaciones De Cantidades De Obras 36
4.1.6 ítems o precios no previstos 36
4.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO 37
4.2.1 Etapa de Pre-construcción 37
4.2.2 Etapa de construcción 37
4.2.3 Valores ejecutados 40
4.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 46
4.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA 46
4.4.1 Control de personal de obra 46
4.4.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra 48
4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 48
4.5.1 Informe financiero y presupuestal 48
4.5.2 Forma de pago del contrato 48
4.5.3 Actas de recibo parcial de obra 49
4.6 ANTICIPO DE OBRA 50
4.6.1 Datos generales del anticipo de obra 50
4.6.2 Órdenes de pago o de giro 50
4.6.3 Plan de inversión del anticipo vs inversión del anticipo 53
4.6.4 Reintegro de rendimientos financieros 53
4.6.5 Amortización del anticipo 54
4.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 54
4.8 FUENTE DE MATERIALES 54
4.9 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO 55
4.10 SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO 55
4.11 PROGRAMA DE OBRA Y DE INVERSIONES 55
4.12 ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y DE INVERSIONES 56
4.13 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA 57
4.13.1 Actas de comité de obra o actas de reunión 57
4.13.2 Bitácora de obra 57
4.14 GESTIÓN AMBIENTAL 58
4.15 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST) 58
4.16 GESTIÓN SOCIAL 58
4.17 ESTADO DEL CONTRATO 58

5 CONTRATO DE OBRA Nº. 479 DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL. 59

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 59
5.1.1 Datos del contrato 479 del 10/02/2022. 59
5.1.2 Pólizas o garantías del contrato de obra 60
5.1.3 Otrosí, Adición y prórroga 62
5.1.4 Suspensiones y reinicios al contrato de obra 63
5.1.5 Actas de Modificaciones de Cantidades de obra 65
5.1.6 Ítems o precios no previstos 66
5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO Y ACUMULADAS 67
5.2.1 Etapa de Preconstrucción 67
5.2.2 Etapa de construcción 67
5.2.3 Valores ejecutados 72
5.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 79
5.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA 79
5.4.1 Control de personal de obra 79
5.4.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra 80
5.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 80
5.5.1 Informe financiero y presupuestal 80
5.5.2 Forma de pago del contrato 81
5.5.3 Actas de recibo parcial de obra 81
5.6 ANTICIPO DE OBRA 82
5.6.1 Datos generales del anticipo de obra 82
5.6.2 Órdenes de pago o de giro 83
5.6.3 Plan de inversión anticipo vs inversión del anticipo 86
5.6.4 Reintegro de rendimientos financieros 87
5.6.5 Amortización del anticipo 88
5.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 88
5.8 FUENTE DE MATERIALES 88
5.9 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO 89
5.10 SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO 90
5.11 PROGRAMA DE OBRA Y DE INVERSIONES 90
5.12 ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y DE INVERSIONES 90
5.13 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA 91
5.13.1 Actas de comité de obra o actas de reunión 91
5.13.2 Bitácora de obra 91
5.14 GESTIÓN AMBIENTAL 92
5.15 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST) 92
5.16 GESTIÓN SOCIAL 92
5.17 ESTADO DEL CONTRATO 92

6 CONTRATO DE SERVICIOS - 480 DEL 22/02/2022 SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S. 93

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 93
6.1.1 Datos del contrato 480 del 22/02/2022. 93
6.1.2 Pólizas o garantías contrato de servicios 94
6.2 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 95
6.2.1 Otrosí, Adición y Prórroga 95
6.2.2 Suspensión y Reinicio al Contrato de servicios 95
6.2.3 Ítems o Precios No Previstos 95
6.3 CONTROL DE EQUIPOS 95
6.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA 95
6.4.1 Personal contratista 95
6.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 95
6.5.1 Forma de pago del contrato 95
6.5.2 Actas parciales 96
6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA 96

6.6.1 Reuniones realizadas 96
6.7 REVISIÓN DOCUMENTACIÓN INICIAL 96
6.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS 96
6.9 GESTIÓN AMBIENTAL 97
6.10 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST) 97
6.11 GESTIÓN SOCIAL 97
6.12 ANOTACIONES DE LA INTERVENTORÍA 97
6.13 ESTADO DEL CONTRATO 100

7 PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ). 101

7.1 INFORMACIÓN GENERAL 101
7.1.1 DATOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ) 101
7.2 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 101
7.2.1 Etapa de Preconstrucción 101
7.2.2 Etapa de construcción 102
7.2.3 Valores ejecutados 106
7.2.4 Maquinaria y equipo de obra 108
7.2.5 Personal y control de aportes 110
7.3 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 110
7.4 FUENTE DE MTERIALES 110
7.5 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO 110
7.5.2 Estado de avance de obra 111
7.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA 113
7.6.1 Actas de comité de obra o actas de reunión 113
7.6.2 Bitácora de obra 114
7.7 GESTIÓN AMBIENTAL 115
7.8 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST) 115
7.9 GESTIÓN SOCIAL 116
7.10 ESTADO DEL PROYECTO 117

8 CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022 117

8.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 117
8.1.1 Datos del contrato de interventoría 117
8.2 PÓLIZAS O GARANTÍA CONTRATO INTERVENTORÍA 118
8.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 121
8.3.1 Otrosíes. Adiciones y Prórrogas 121
8.3.2 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoría 122
8.3.3 Actas modificativas al contrato de interventoría 122
8.4 SEGUIMIENTO REALIZADO POR INTERVENTORÍA 123
8.5 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 123
8.5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 123
8.6 CONTROL DE CORRESPONDENCIA 127
8.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO 134
8.8 EQUIPO Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA 134
8.8.1 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA 136
8.9 PERSONAL INTERVENTORÍA 136
8.10 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA. 138
8.10.1 Forma de pago del contrato. 138
8.10.2 Actas de costos / Recibos parcial de Interventoría 139
8.11 OTROS COMPONENTES 140
8.11.1 Gestión ambiental 140
8.11.2 Salud ocupacional y seguridad en el trabajo (SST) 141
8.11.3 Gestión social 142

8.11.4 Estado del contrato 143

9 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA 144

10 CONCLUSIONES 145

11 RECOMENDACIONES 147

12 ANEXOS 148

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 CIV Del Proyecto 13
Tabla 2 Alcance Del Proyecto 15
Tabla 3 Vereda de la Cuenca del Rio Sumapaz 15
Tabla 4 Vereda de la Cuenca del Rio Blanco 15
Tabla 5 Localización De Los Tramos 20
Tabla 6 Estado Inicial De Las Vías De La Localidad De Sumapaz 23
Tabla 7 Ficha técnica del proyecto 24
Tabla 8 Estado De Los Contratos 28
Tabla 9 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor CTO 478 29
Tabla 10 Datos Póliza 30
Tabla 11 Pólizas actualizadas a la fecha. 33
Tabla 12 Otrosí y Adición - Contrato de Obra 478 33
Tabla 13 Suspensiones y Reinicios Contrato de Obra 478 34
Tabla 14 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obra contrato 478 36
Tabla 15 Ítems No previstos contrato 478 36
Tabla 16 Actividades de Construcción contrato 478 37
Tabla 17 Valores Ejecutados Contrato 478 40
Tabla 18 Maquinaria y Equipo Contrato 478 46
Tabla 19 Control Personal en Obra Contrato 478 46
Tabla 20 Vigencias del Contrato 48
Tabla 21 Actas de Recibo Parcial de Obras 49
Tabla 22 Generales del Anticipo de Obra 50
Tabla 23 Órdenes de Pago o de Giro 51
Tabla 24 Plan de Inversión del Anticipo VS Inversión Anticipo 53
Tabla 25 Rendimientos financieros Anticipo de Obra 53
Tabla 26 Amortización Anticipo Contrato de Obra 478 54
Tabla 27 Avance del Contrato 478 56
Tabla 28 Actas de Comité de Obra y Reuniones 57
Tabla 29 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor CTO 479 59
Tabla 30 Datos de las Pólizas Contrato 479 60
Tabla 31 Pólizas Actualizadas a la Fecha Contrato 479 61
Tabla 32 Otrosíes y Adiciones Contrato de Obra 479 62
Tabla 33 Suspensiones y Reinicios Contrato de Obra 479 63
Tabla 34 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obra 65
Tabla 35 Ítem o Precios No Previstos 66
Tabla 36 Documentación Organizativa Inicial 67
Tabla 37 Actividades de Construcción Contrato 479 67
Tabla 38 Valores Ejecutados Contrato 479 73
Tabla 39 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 479 79

Tabla 40 Control de Personal de Obra 79
Tabla 41 Vigencias del Contrato de Obra 81
Tabla 42 Actas de Recibo Parcial de Obras 81
Tabla 43 Datos Generales del Anticipo 82
Tabla 44 Órdenes de Pago o Giro 83
Tabla 45 Plan de Inversión del Anticipo VS Inversión Anticipo 86
Tabla 46 Rendimientos Financieros Anticipo de Obra 87
Tabla 47 Amortización Anticipo Contrato de Obra 88
Tabla 48 Fuente materiales CEV 88
Tabla 49 Avance del Contrato 479 90
Tabla 50 Actas de Comité de Obra 91
Tabla 51 Contrato de Prestación de Servicios - SOLGEO S.A.S 93
Tabla 52 Datos de las Pólizas Contrato 480 94
Tabla 53 Pólizas Actualizadas del Contrato 94
Tabla 54 Relación de Actas Pagadas 96
Tabla 55 Actas de Comité de Obra y Reuniones 96
Tabla 56 Entrega de Productos Contrato de Servicios 480 97
Tabla 57 Suscripción, Legalización, Plazo Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá 101
Tabla 58 Actividades ejecutadas. 102
Tabla 59 Valores ejecutados 107
Tabla 60 Maquinaria y Equipo UAERMV 108
Tabla 61 Tabla Relación de lluvias 110
Tabla 62 Cantidades ejecutados en el periodo 113
Tabla 63 Actas de Comité de Obra 113
Tabla 64 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor 117
Tabla 65 Datos pólizas contrato interventoría 118
Tabla 66 Pólizas del contrato de interventoría 120
Tabla 67 Otrosíes, Adiciones y Prórrogas Contrato 161 - Interventoría 121
Tabla 68 Suspensiones y Reinicios al Contrato 161 - Interventoría. 122
Tabla 69 Actas de Modificaciones Costos de Interventoría 122
Tabla 71 Correspondencia enviada a contrato 478 128
Tabla 72 Correspondencia enviada a Contrato 479 128
Tabla 73 Correspondencia enviada a UAERMV 129
Tabla 74 Correspondencia enviada a FDRS 131
Tabla 75 Correspondencia recibida Contrato 478 132
Tabla 76 Correspondencia recibida Contrato 479 132
Tabla 77 Correspondencia recibida UAERMV 133
Tabla 78 Correspondencia recibida FDRS 134
Tabla 79 Certificados calibración Topografía 136
Tabla 80 Personal Contrato 161 ECOVIAS S.A.S - Interventoría 136
Tabla 81 Plan de cargas Interventoría 137
Tabla 82 Relación Actas parciales Contrato 161- Interventoría 139

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización general del proyecto (Localidad de Sumapaz) 17
Ilustración 2 Localización del proyecto 17
Ilustración 3 Localización CIV – 20036004, 20076282, 20036002, 20036005, 20076283 y 20036001 Las Animas (Cuenca Río Blanco – UPR4) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022 18
Ilustración 4 Localización CIV – 20076251, 20042003, 20042001, 20076258, 20042002, 20076254, 20076256, 20076255, 20076257, 20076259, 20076253, 20076252, 20076250 y 20042004 El Toldo – San Antonio (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022 18
Ilustración 5 Ilustración 5 Localización CIV – 20047005, 20047001, 20047002 y 20076233 Santo Domingo – Capitolio (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022 19
Ilustración 6 Localización CIV – 20025003, 20023004, 20023002, 20023003, 20076242, 20025001, 20025002 y 20023001 Tunal Bajo – Tunal Alto (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022 19
Ilustración 7 Ubicación Oficina – Campamento Consorcio Gaviones 95 21
Ilustración 8 Ubicación Oficina – Campamento Consorcio Estabilización Vial . 22
Ilustración 9 Ubicación Oficina - Campamento UAERMV 22

ANEXOS

ANEXO Nº. 01 DOCUMENTACIÓN CONTRATO 478 DEL 10/02/2022
1.A BITÁCORA PERIODO

ANEXO Nº. 02 DOCUMENTACIÓN CONTRATO 479 DEL 10/02/2022
2.A ACTA DE PRÓRROGA
2.B BITÁCORA DEL PERIODO

ANEXO N°. 03 DOCUMENTACIÓN ENTIDAD EJECUTORA UAERMV
3.A BITÁCORA DE OBRA DEL PERIODO.

ANEXO Nº. 04 DOCUMENTACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022
4.A INFORME COMPONENTE AMBIENTAL
4.B INFORME COMPONENTE SST
4.C INFORME GESTIÓN SOCIAL
4.D INFORMES SEMANALES

1 INTRODUCCIÓN

La localidad de Sumapaz tiene una red vial rural en regulares condiciones con superficie de afirmado en igual estado, sus anchos viales varían entre los 4,50 metros más hasta 7 metros más en promedio y con mínimas obras de arte, por lo cual es pertinente adelantar intervenciones a nivel de mantenimiento vial, con lo cual se pretende mejorar las condiciones de transporte de productos agrícolas generados en la región, transporte de comunidad en general y una fácil accesibilidad escolar.

En septiembre del 2019, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), presento la formulación para la implementación del proyecto de mejoramiento de vías terciarias en la localidad del Sumapaz, Bogotá D.C. con la intervención aproximadamente de 33.08 kilómetros de vía, con el propósito de solucionar la ineficiencia en la conectividad vial rural de Bogotá D.C. hacia el sector urbano y los municipios aledaños, la cual dificulta la intercomunicación terrestre de los habitantes rurales y con ello, aportar de manera significativa al desarrollo de las áreas rurales y a la mejora de la calidad de vida de la población de la ruralidad del Distrito Capital y en consecuencia de sus municipios colindantes. Teniendo en cuenta lo descrito en la ficha técnica de MGA del 29 de diciembre de 2019 según el código del proyecto BPIN 2018000050020, se tiene proyectado una población beneficiada de 8.281.030 personas.

Mediante este informe, se ofrece al lector un contexto más amplio en el desarrollo de las actividades NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL DE SUMAPAZ, desde el punto de vista técnico, administrativo, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo - SST de los sectores Animas Bajas, Capitolio, Laguna Verde, San Antonio y Tunales de la localidad de Sumapaz durante el periodo comprendido del **1 al 31 de agosto de 2025**, con el fin del cumplimiento del Plan de Desarrollo Local "Sumapaz en paz, más productiva y ambiental para todos" 2017- 2020.

A fin de ejecutar las actividades de interventoría, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz convocó el Concurso de Méritos Ni FDRS-CMA-182-2021, cuyo objeto es la REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR., mediante la Resolución Nº 008 del 04 de febrero de 2022.

Este proceso de Concurso de Méritos le fue adjudicado a **ECOVÍAS S.A.S**, mediante la Resolución NI. 008 del 04 de febrero de 2022 por un valor inicial del contrato de $3.104.380.144,00**,** en un plazo inicialmente establecido de quince (15) meses.

La entidad contratante frente a las necesidades de la región por mejorar las vías de acceso, adelanto el proceso de licitación púbica Nº LP-006-2021 con el fin de contratar lo que se requiere para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" y la ejecución de las obras viales por parte de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para el proyecto del Sistema General de Regalías – SGR identificado con código BPIN 2018000050020, El cual va a ser ejecutado por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV, mediante un modelo de ejecución mixta, que contempla dos procesos de obra independientes, los cuales se describen a continuación:

Obras hidráulicas (Subdrenes, Berma-cunetas, box culvert) y muros en gavión los cuales se ejecutarán mediante el contrato que surja de la Licitación pública Nº LP-006-2021, cuyo objeto es " CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁHULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO" MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020", Publicado por UAERMV el 5 de octubre de 2021, en la plataforma SECOP II, por un valor estimado de 24.641.217.103, es importante mencionar que dicho proceso licitatorio se adelantara por lotes, teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y se distribuirá de la siguiente manera: Lote 1- San Antonio I (K13 +820- K6+910), Capitolio y Laguna Verde, (Valor estimado de $12.013.390,090) y Lote 2 – San Antonio II (K6+910+K0+00), Unión Tunales y Animas Bajas (Valor estimado de 12.627.827.013)

Instalación de material granular y del fresado estabilizado en las vías, serán ejecutadas directamente por la UAERMV, por un valor aproximado de $32.927.529.354
El CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº. 478 DEL 10/02/2022 fue adjudicado al Consorcio Gaviones 95. "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON

CÓDIGOBPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.) el cual tendrá a cargo las obras hidráulicas (Subdrenes, Berma-cunetas, box culvert) y muros en gavión mencionadas en el objeto del contrato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº. 479 DEL 10/02/2022 fue adjudicado al Consorcio Estabilización Vial. "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") el cual tendrá a cargo las obras hidráulicas (Subdrenes, Berma- cunetas, box culvert) y muros en gavión mencionadas en el objeto del contrato.

Instalación del material granular y del fresado estabilizado en las vías, serán ejecutadas directamente por la UAERMV, el CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 deberá supervisar las actividades ejecutadas por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, conforme al proyecto Código BPIN 2018000050020 cuyo objeto es "Mejoramiento de las Vías Terciarías en Bogotá"

Respecto a los contratos de prestación de servicios mediante la comunicación 189-1-389 del 29 de noviembre de 2023 se hace entrega de contratos según Modificatorio N°. 2 del contrato CIN REGALIAS-161-2022, y se da respuesta a los comunicados 20237020009711 y 20237010010252.

El presente informe mensual de interventoría a cargo de **ECOVIAS S.A.S.,** describe el proyecto, la información de los contratos de ejecución y las actividades sobre su correspondiente contrato de interventoría, el avance de las obras ejecutadas y la gestión de interventoría para llevar a cabo el seguimiento técnico, administrativo, financiero hasta el período correspondiente al presente informe mensual.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1 Descripción / alcance y meta física inicial

El alcance de las obras a ejecutar para el Contrato de obra se encuentra definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico, en su numeral "*ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE*".

Actividades de pre-construcción

Como parte de esta etapa, se debe realizar la verificación técnica y revisión de los diseños entregados, el contratista de obra tendrá la obligación de validar, revisar y apropiarse de los Estudios, diseños y cantidades de obra entregados por el Fondo de Desarrollo Local FDL de Sumapaz, todas las observaciones que surtan a partir de la revisión por parte del contratista de obra deberán ser solicitadas al FDL (Fondo de Desarrollo Local del Sumapaz) a través de la Interventoría.

Etapa de Construcción

Se llevará a cabo la construcción de vías en aproximadamente 33,08 km lineales en la localidad de Sumapaz, los cuales se dividen TREINTA Y CINCO (35) segmentos viales pre – seleccionados divididos entre la Cuenca Rio Blanco y Cuenca Rio Sumapaz.

- Tramo Animas Bajas: Longitud 4280 m
- Tramo Laguna Verde: Longitud 2958.7 m
- Tramo San Antonio: Longitud 13820 m
- Tramo Capitolio: Longitud 4555.5 m
- Tramo Unión-Tunales: Longitud 7465,8 m

Relación de CIV del Proyecto

Tabla 1 CIV Del Proyecto

CIV CONTRATO		
N°.	**TRAMO**	**CIV**
1	LAGUNA VERDE (CUENCA RIO BLANCO – UPR4)	2003900
2		20039002
3		20039003
4	LAS ANIMAS (CUENCA RIO BLANCO – UPR4)	20036004
5		20076282
6		20036002

CIV CONTRATO		
N°.	**TRAMO**	**CIV**
7		20036005
8		20076283
9		20036001
10	SAN ANTONIO (CUENCA RIO SUMAPAZ – UPR5)	20076251
11		20042003
12		20042001
13		20076258
14		20042002
15		20042002
16		20076256
17		20076257
18		20076255
19		20076259
20		20076253
21		20076252
22		20076250
23		20042004
24	CAPITOLIO (CUENCA RIO SUMAPAZ – UPR5)	20047005
25		20047001
26		20047002
27		20076233
28	TUNAL ALTO (CUENCA RIO SUMAPAZ – UPR5)	20025003
29		20023004
30		20023002
31		20023003
32		20076242
33		20025001
34		20025002
35		20023001

Construcción de obras hidráulicas y gaviones

Se ejecutarán Obras hidráulicas y muros gaviones PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020" el cual se establece en dos grupos (GRUPO 1 y GRUPO 2), es importante tener en cuenta que durante la etapa de ejecución del contrato es posible identificar necesidades de intervención vial las cuales se pueden intervenir previa aprobación de la gerencia del proyecto. dichas acciones deberán estar en el marco de la cadena de valor validada por el SGR, en la etapa de aprobación del proyecto.

- Construcción / ampliación de alcantarillas
- Construcción de cunetas, sub-drenes y muros en gaviones
- Instalación de material granular
- Instalación de rodadura en fresado estabilizado.

Se estableció la intervención de 33,08 kilómetros de vías terciarias, distribuidos en los siguientes tramos de la localidad:

Tabla 2 Alcance Del Proyecto

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	OBJETIVO	CARACTERISTICAS
San Antonio I	Construcción de obras hidráulicas, Gaviones, y Estabilización con fresado.	Longitud 6910 m (K6 + 911 - K 13 + 820)
Capitolio		Longitud 4555.5 m (K0 +00 – K4 + 555.48)
Laguna verde		Longitud 2958.70 m (K0 +00 – K2 + 958.65)
San Antonio II	Construcción de obras hidráulicas, Gaviones, y Estabilización con fresado.	Longitud 6910 m (K0 +00 - K6 + 910)
Animas Bajas		Longitud 4280 m (K0 +00 – K4 + 281.94)
Unión Tunales		Longitud 7465,8 m (K0 +00 – K7 + 465.8)

Los tramos del proyecto están ubicados en las dos cuencas del municipio de Sumapaz como se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 3 Vereda de la Cuenca del Rio Sumapaz

N° TRAMO	NOMBRE DE TRAMO	NOMBRE DE CUENCA	LONGITUD TRAMO
9	San Antonio I	Río Sumapaz	6.910,00 m
6	Capitolio	Río Sumapaz	4.555,50 m
7	Laguna verde	Río Blanco	2.958,70 m
LONGITUD TOTAL			**14.424,20 m**

Tabla 4 Vereda de la Cuenca del Rio Blanco

N° TRAMO	NOMBRE DE TRAMO	NOMBRE DE CUENCA	LONGITUD TRAMO
9	San Antonio II	Río Sumapaz	6.910,00 m
5	Unión Tunales	Río Sumapaz	7.465,80 m
8	Animas Bajas	Río Blanco	4.280.00 m
LONGITUD TOTAL			**18.655.80 m**

2.1.2 Descripción / Alcance y meta física actualizada

A la fecha de corte del presente informe, el alcance inicialmente establecido y descrito en el numeral anterior no ha tenido modificaciones.

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.2.1 Localización de las obras

El proyecto está ubicado en Sumapaz la cual es la localidad número 20 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada sobre un macizo de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, al extremo sur del casco urbano de Bogotá.

La localidad de Sumapaz tiene los siguientes límites, según el Acuerdo 9 de 1986 del Concejo de Bogotá:

Noroeste: Pasca

Norte: Localidad de Usme

Noreste: Une

Oeste: Arbeláez, San Bernardo

Este: Gutiérrez

Suroeste: Cabrera

Sur: Colombia (Huila)

Sureste: Cubarral, Guamal (Meta)

La Localidad 20 lindera en sentido contrario a las manecillas del reloj, como sigue: partiendo al norte de la Laguna de Chisacá, en dirección sur por el divorcio de aguas hasta el nacimiento del río Pilar y por este aguas abajo hasta encontrar el río Sumapaz; se remonta dicho curso de agua hasta su nacimiento en el Alto de las Oseras, límite con el departamento del Huila; a continuación en dirección nordeste se sigue por la cumbre de la cordillera para encontrar el cerro Nevado del Sumapaz y luego al norte hallar el nacimiento del río Chochal en el alto de Torquita; se gira luego al oriente para encontrar la Sierra Leona de Santa Bárbara y posteriormente el Páramo del Gallo, sector del nacimiento del río del mismo nombre; por dicho río aguas abajo hasta la confluencia de la quebrada Tanques y por ella hasta su nacimiento; en dirección norte se encuentra el río Blanco y buscando el nacimiento de este último se llega al Portezuela; aguas arriba al río Portezuela confluye el río Pozo, por el que se sigue hasta su nacimiento en el sitio denominado Boca grande en la Cuchilla de Cauquillos; a continuación hacia el oeste y por el divorcio de aguas se arrima a la Laguna de Chizacá, punto de partida.

La Localidad 20 de Sumapaz se localiza sobre la cordillera Oriental, entre los 2.700 y 4.100 m s. n. m., donde se encuentra el Páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo. Una extensión del territorio es considerada como área de reserva natural desde el año 1977 por resolución del INDERENA.

En el Sumapaz se genera uno de los más importantes recursos hídricos de Colombia que forman parte de las cuencas de los ríos Magdalena y Orinoco.

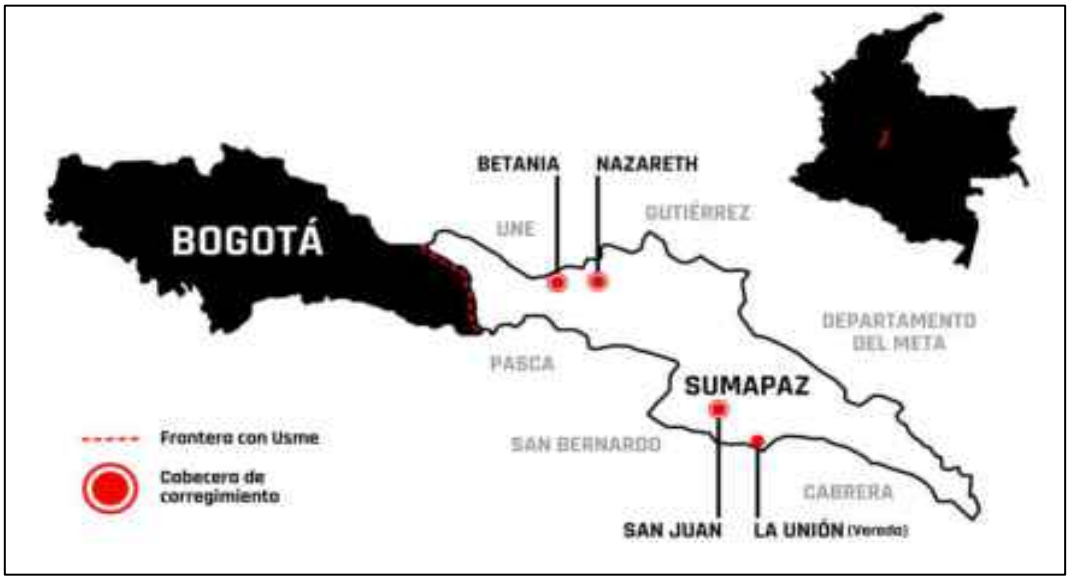


Ilustración 1 Localización general del proyecto (Localidad de Sumapaz)

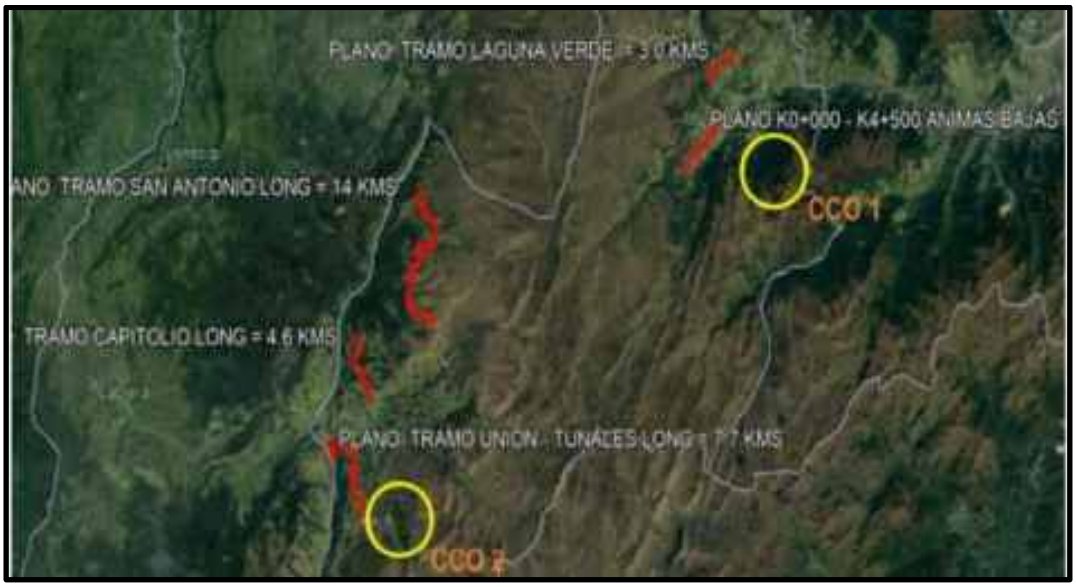


Ilustración 2 Localización del proyecto

Sumapaz produce también parte de los depósitos de agua que abastecerán a la Bogotá del futuro. Las 75.756 ha de la Localidad de Sumapaz con sus 35.928 ha de pajonal, 25.017 de frailejón y pajonal, 5.402 de bosque natural, 1856 de turbera y 106 de lagunas, además de sus 1.128 km de ríos y quebradas, conforman un conjunto natural que cumple un importante papel en el ciclo del agua, tanto regulando los flujos desde la montaña, como alimentando los depósitos subterráneos.

Acorde con el anexo técnico del contrato los segmentos a intervenir en el desarrollo del contrato serían los siguientes:



Ilustración 3 Localización CIV – 20036004, 20076282, 20036002, 20036005, 20076283 y 20036001 Las Animas (Cuenca Río Blanco – UPR4) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022



Ilustración 4 Localización CIV – 20076251, 20042003, 20042001, 20076258, 20042002, 20076254, 20076256, 20076255, 20076257, 20076259, 20076253, 20076252, 20076250 y 20042004 El Toldo – San Antonio (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022



Ilustración 5 Ilustración 5 Localización CIV – 20047005, 20047001, 20047002 y 20076233 Santo Domingo – Capitolio (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022



Ilustración 6 Localización CIV – 20025003, 20023004, 20023002, 20023003, 20076242, 20025001, 20025002 y 20023001 Tunal Bajo – Tunal Alto (Cuenca Río Sumapaz – UPR5) tomado de anexo técnico –Cto 161-2022

A continuación, se describe los frentes de trabajo acorde al Contrato de interventoría N°. CIN-REGALÍAS-161-2022 del 14/02/2022 para el presente periodo:

En la siguiente tabla se observa la localización por tramos:

Tabla 5 Localización De Los Tramos

TRAMO	VEREDA	PUNTO	ABCISA	ELIPSOIDALES		MAGNA_SIRGAS	
				LATITUD	LONGITUD	ESTE	NORTE
1	UNION-TUNALES	INICIO	K0+000	3°57'15,00413"	74°20'8,57726"	971324,288	929008,196
		FIN	K2+951,39	3°58'23,66157"	74°20'42,79571"	970269,355	932117,473
2	UNION-TUNALES	INICIO	K0+000	3°58'23,61470"	74°20'42,80898"	970268,945	931116,034
		FIN	K2+042,66	3°59'4,70976"	74°21'6,42207"	969540,933	932378,586
3	UNION-TUNALES	INICIO	K0+000	3°59'4,0245"	74°21'9,49511"	969446,128	932357,568
		FIN	K0+254,009	3°59'4,58649"	74°21'17,20487"	969208,302	932374,911
4	UNION-TUNALES	INICIO	K0+000	3°59'7,92971"	74°21'14,40663"	969294,657	932477,575
		FIN	K0+703,08	3°58'57,13488"	74°21'31,70969"	968760,777	932146,172
5	UNION-TUNALES	INICIO	K0+000	3°58'53,67945"	74°21'32,09895"	968748,732	932040,035
		FIN	K1+667,17	3°59'2,91601"	74°21'42,23541"	968436,137	932323,861
6	CAPITOLIO	INICIO	K0+000	4°0'17,92877"	74°20'29,73087"	970673,512	934627,277
		FIN	K4+555,48	4°1'55,53772"	74°21'3,49074"	969633,11	937625,867
7	LAGUNA VERDE	INICIO	K0+000	4°10'20,84222"	74°10'31,40611"	989132,433	953142,71
		FIN	K2+958,65	4°11'14,85303"	74°9'45,72219"	990541,537	954801,583
8	ANIMAS BAJAS	INICIO	K0+000	4°9'23,50798"	74°10'6,34926"	989905,001	951381,497
		FIN	K4+281,94	4°7'54,78787"	74°10'56,89428"	988345,765	948656,498
9	SAN ANTONIO	INICIO	K0+000	4°2'40,85478"	74°18'37,77219"	974128,395	939016,468
		FIN	K13+823,50	4°6'28,27641"	74°19'50,76241"	971879,144	946002,837

2.2.2 Localización del campamento y/o oficinas

A la fecha de corte del presente informe, se cuentan con las siguientes oficinas para el proyecto:

Contratista Gaviones 95: Av. carrera 19 N° 95-12/20 – TEL 6014327903 BOGOTA D.C

Contratista Estabilización vial: Carrera 17 N° 142–25 – TEL: 6017023060, BOGOTA D.C.

UAERMV: Calle 26 N° 69-76 piso Torre aire piso 3 - TEL: 6013779555 EXT 1001, BOGOTA D.C.

A continuación, se presenta la ubicación de las oficinas y campamentos de cada uno de los contratistas:



Ilustración 7 Ubicación Oficina – Campamento Consorcio Gaviones 95



Ilustración 8 Ubicación Oficina – Campamento Consorcio Estabilización Vial

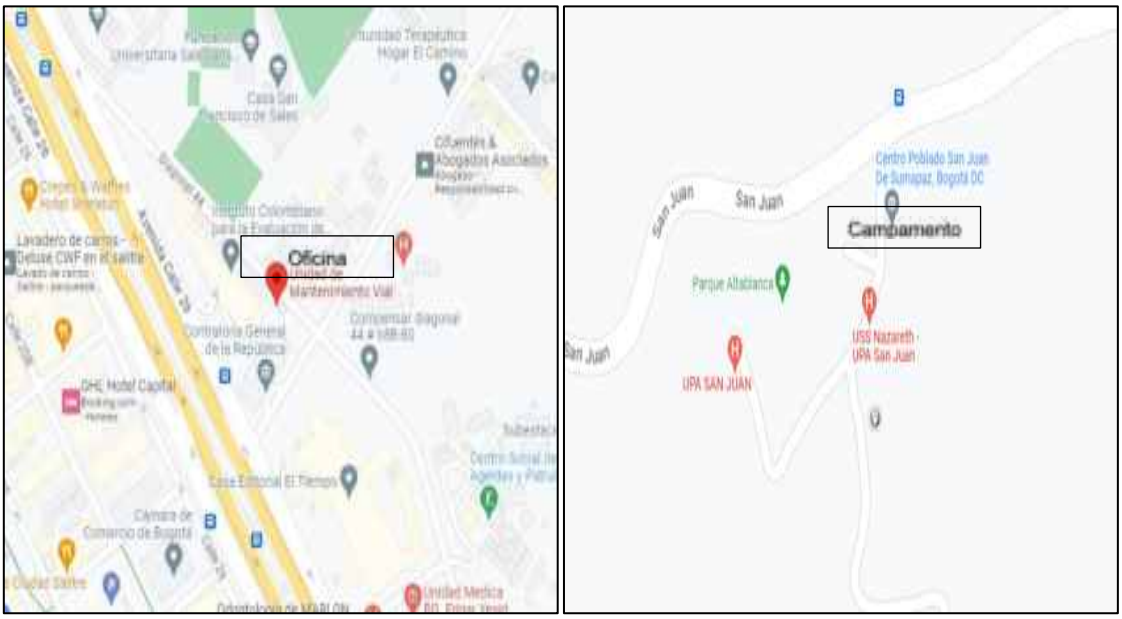


Ilustración 9 Ubicación Oficina - Campamento UAERMV

2.3 ANTECEDENTES

Las vías de la localidad de Sumapaz se caracterizan por su fácil deterioro físico, originado en los problemas de humedad ambiental y en el hecho de ser solamente recebadas, es decir que, aproximadamente 360,94 kilómetros de las vías existentes, no tienen estructura de pavimento, a excepción de las calles de los centros poblados, lo cual hace que las velocidades de desplazamiento sean menores y por ende los tiempos de un punto a otro sean mayores, lo que muchas

veces se traduce en la no prestación del servicio integrado de transporte dentro de la localidad o en trayectos de hasta 6 horas.

Adicionalmente, vale la pena aclarar que en los estudios previos del contrato de obra, la Entidad Contratante informa que en épocas de lluvias las vías pueden quedar inservibles para la circulación de vehículos, esto debido a la alta pluviosidad que caracteriza la región y demás factores climáticos, situaciones que genera que algunas veredas queden incomunicadas y dificulte el transporte y comercialización de los productos agropecuarios que se producen en la región, cuya economía gira en torno a la agricultura y la ganadería, las actividades escolares, la atención médica, la provisión de bienes y servicios, procedentes tanto del centro urbano de Bogotá como de los municipios vecinos.

Por lo anterior, se presenta la necesidad de intervenir la malla vial de la Localidad de Sumapaz por medio de reconstrucción y/o rehabilitación de las vías acorde con el Plan de Desarrollo Local 2017-2020 "SUMAPAZ EN PAZ, MÁS PRODUCTIVA Y AMBIENTAL PARA TODOS".

2.4 ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS

En la actualidad las vías a intervenir en Sumapaz para el presente contrato, en gran porcentaje se encuentran únicamente en afirmado, no cuentan con una estructura de pavimento, por esto presentan un fuerte deterioro, lo cual hace necesario una intervención para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región

La extensión de la malla vial de la localidad a intervenir es de 33.08 km-carril (Incluye vía rural principal y no principal), la cual se categoriza de la siguiente manera:

Tabla 6 Estado Inicial De Las Vías De La Localidad De Sumapaz

Tramo	Longitud (m)	Fresado Estabilizado Mal Estado (m)	Recebo en Mal estado (m)
Ánimas Bajas	4280	0	4280
Laguna Verde	2958,7	0	2958,7
San Antonio	13820	1000	12820
Capitolio	4555,5	0	4555,5
Unión - Tunales	7465,8	2000	5465,8
Total	33080,0	3000	30080

De igual forma, se evidencia existen tramos viales cuya superficie es en afirmado, esto se da debido a que en ciertos sectores se restringen las intervenciones al ser consideradas zonas de protección ambiental.

2.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla las siguientes características técnicas:

Tabla 7 Ficha técnica del proyecto

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS
LOTE N° 1 **CAPITOLIO**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 4555.50 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 9 alcantarillas. En concreto de 3500 PSI, diámetro Ø 34" 36". ✓ Construcción de Filtro: Dimensiones 0.60mx0.67m, material drenante 1" y 3", tubería perforada de 6" y geotextil NT 2500 con longitud aproximada de 5209 m ✓ Construcción de Cuneta: de 0.60Mx0.45mx 0.15m y una sección transversal de 0.14 m^2 longitud de 5209 m
LOTE N° 1 **LAGUNA VERDE**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 2958.70 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 9 alcantarillas: En concreto de 3500 PSI, diámetro Ø 34" 36". ✓ Construcción de Filtro: 3435 m, Dimensiones 0.60mx0.67m, material drenante 1" y 3", tubería perforada de 6" y geotextil NT 2500. ✓ Construcción de Cuneta: 3435 m, 0.60Mx0.45mx 0.15m y una sección transversal de 0.14 $m^{2.}$
LOTE N° 1 **SAN ANTONIO 1**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 6910 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 32 alcantarillas: En concreto de 3500 PSI, diámetro Ø 34" 36". ✓ Construcción de Filtro: 7160 m, Dimensiones 0.60mx0.67m, material

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS
		drenante 1" y 3", tubería perforada de 6" y geotextil NT 2500. ✓ Construcción de Cuneta: 7160 m, 0.60Mx0.45mx 0.15m y una sección transversal de 0.14 $m^{2.}$
LOTE N° 2 **LA UNION TUNALES SECTOR 1**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 1380 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 6 alcantarillas, en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: longitud 1380 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de Berma/ Cuneta: longitud con 1380 m, tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m)
LOTE N° 2 **LA UNION TUNALES SECTOR 2**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 3002,48 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 4 alcantarillas: en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: 3002,48 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar ✓ Construcción de Berma/ Cuneta: tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 3002,48 m.
LOTE N° 2	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 260 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS
LA UNION TUNALES SECTOR 3		✓ Construcción de Filtro: 260 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 260 m.
LOTE N° 2 **LA UNION TUNALES SECTOR 4**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 1640 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 2 alcantarillas: en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: 200 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 200 m.
LOTE N° 2 **LA UNION TUNALES SECTOR 5**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 1640 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 3 alcantarillas: en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: 1640 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 1640 m.
LOTE N° 2	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 4280 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS
ANIMAS BAJAS SECTOR 8		✓ Construcción de 3 alcantarillas, en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: 1640 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 1640 m.
LOTE N° 2 **SAN ANTONIO II SECTOR 9**	**Estructura de Rodadura En Fresado Estabilizado y obras Hidráulicas**	✓ Longitud total: 6910 m ✓ Numero de calzada: 1 ✓ Número de carriles: 1 ✓ Ancho carril: 4.60 m ✓ Fresado Estabilizado (espesor): 15 cm ✓ Base Granular clase B (espesor): 15 cm ✓ Construcción de 38 alcantarillas. en concreto de 3500 PSI, tubería de 24" y 36". ✓ Construcción de Filtro: 7159,90 m, Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar. ✓ Construcción de tipo 1. Área transversal 0,14m2 (0.50x.145x015) m. Resistencia concreto 3500psi. Tipo 2 Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi (0.60mX0.50mX0.15m) con una longitud aproximada de 7159,90 m.

3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

A continuación, se hace un recuento del estado de los contratos de Obra:

Tabla 8 Estado De Los Contratos

N°	CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PROCESO DE SELECCIÓN	ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL	PLAZO INICIAL (Meses)	PLAZO ACTUALIZADO (MESES)	% DE AVANCE DEL CONTRATO	FIN	ESTADO
1	478 DEL 10/02/2022	Contrato De Obra Publica	CONSORCIO GAVIONES 95	10/02/2022	LP – 006 – 2021	03 de marzo de 2022 nota 1: etapa pre-construcción 08 de agosto de 2022 nota 2: etapa construcción	07 de mayo de 2023, fecha terminación acta de inicio etapa 2 construcción	11	VEINTIDOS (22) MESES Y VEINTIDOS (22) DÍAS	27.91 %	25-10-2025	En ejecución
2	479 DEL 10/02/2022	Contrato De Obra Publica	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	10 /02/2022	LP – 006 – 2021	03 de marzo de 2022 nota 1: etapa pre-construcción 18 de Julio de 2022 nota 2: etapa construcción	17 de abril de 2023 modificatorio 1 nota: esta fecha es actualizada prorroga 01	11	VEINTIDOS (22) MESES	71,2 %	4-08-2025	En ejecución
3	480 DEL 22/02/2022	Contrato De Prestación De Servicios	SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S.	03/03/2022	LP–011–2021	3 de marzo de 2022	02/06/2023	15	QUINCE (15) MESES	33%	2/06/2023	FINALIZO TIEMPO CONTRACTUAL

Nota: de fecha 1 de abril de 2025 y una vez superadas todas las causales que dieron motivos a la suspensión del contrato 478, 479 y contrato de interventoría 161 de 2022, se da reinicio de actividades de obra.

4 CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95

4.1 GENERALIDADES

4.1.1 Datos del contrato 478 del 10/02/2022.

A continuación, se describen los aspectos contractuales del contrato de obra

Tabla 9 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor CTO 478

ENTIDAD CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
CONTRATO DE OBRA N°:	COP-478 del 10/02/2022
OBJETO:	"Contrato para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá", del sistema general de regalías - SGR identificado con código BPIN 2018000050020". contrato para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto " mejoramiento de vidas terciarias en Bogotá", del sistema general de regalías - SGR identificado con código BPIN 2018000050020. (san Antonio i (k13+820-k6+910), capitolio y laguna verde.)
PROCESO DE SELECCIÓN N°:	LP-006-2021
DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GAVIONES 95
NIT:	901.563.341-0
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	- PROMCIVILES (70%) S.A.S NIT 901.001.320-5
	- PROMOTORA PUGA LTDA (30%) NIT 830.024.796-9
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	Av. Carrera 19 número 95-12/20- BOGOTA D.C
TELÉFONO:	601-4327903
MODIFICATORIO N°.1	"El contrato consta de dos (2) tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, las cuales podrán realizarse de manera simultánea. Parágrafo 1. Los tramos o kilómetros que pasen a etapa de obra deberán contar con las respectiva apropiación y validación propia de las actividades de pre-construcción".
OTROS DATOS DEL CONTRATO	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10 de febrero de 2022
FECHA DE INICIO ETAPA PRECONSTRUCCION	3 de marzo de 2022
VALOR INICIAL:	$ 11.624.693.181,00 Incluido IVA sobre utilidad
VALOR ACTUALIZADO:	$ 11.624.693.181,00 Incluido IVA sobre utilidad
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	02 DE FEBRERO DE 2023
FECHA INICIO CONTRUCCIÓN	8 DE AGOSTO DE 2022
PRORROGA N°. 1	DOS (2) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS
SUSPENSIÓN N°. 1	21 DE ABRIL DE 2023 (DOS 02 MESES)
AMPLIACIÓN 1 – SUSPENSIÓN 1	UN (01) MES

AMPLIACIÓN 2 – SUSPENSIÓN 1	ONCE (11) DÍAS
AMPLIACIÓN 3 – SUSPENSIÓN 1	UN (1) MES
AMPLIACIÓN 4 – SUSPENSIÓN 1	UN (1) MES
AMPLIACIÓN 5 – SUSPENSIÓN 1	VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 6 – SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 7 – SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 8 – SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 9 – SUSPENSIÓN 1	DOS (2) MESES CALENDARIO
REINICIO 1	5 DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA 2.	NUEVE (9) MESES
SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2024
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE AGOSTO DE 2024
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES Y DIECISÉIS (16) DIAS PARTIR DEL 17 DE AGOSTO AL 1 DE OCTUBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 21 DE ENERO DE 2025
AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES A PARTIR DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2025
AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 2	1 MES Y 10 DÍAS A PARTIR DEL 21 DE FEBRERO AL 1 DE ABRIL DE 2025
REINICIO N°2	1 DE ABRIL DE 2025
PLAZO TOTAL ACTUALIZADO PRORROGA 2.	VEINTIDÓS (22) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	25 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR ANTICIPO:	$ 2.324.938.636
INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S
SUPERVISOR:	UAERMV

4.1.2 Pólizas o garantías del contrato de obra.

El contratista otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:

Tabla 10 Datos Póliza

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
AMPARO	**PÓLIZA N°**	**CERTIFICADO O ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**EXPEDIDA / MODIFICADA SEGÚN**
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	0	22-FEB-2022	CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	0	22-FEB-2022	CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	3	01-ABR-2022	ACTA DE INICIO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	3	31-MAR-2022	ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	4	27-JUL-22	MODIFICACIÓN Nº. 1 y PRÓRROGA Nº. 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	4	27-jul-22	MODIFICACIÓN N°. 1 y PRÓRROGA Nº. 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	6	8-may-2023	SUSPENSIÓN N° 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	5	8-may-2023	SUSPENSIÓN N° 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	9	31-jul-2023	AMPLIACIÓN 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	6	28-jul-2023	AMPLIACIÓN 1 Y 2 A LA SUSPENSIÓN 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	11	4-ago-2023	AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	7	2-ago-2023	AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1.
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	12	6-sep-2023	AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	8	6-sep-2023	AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	19	27-nov-2023	AMPLIACIÓN 9 SUSPENSIÓN 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	12	27-nov-2023	AMPLIACIÓN 9 SUSPENSIÓN 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	21	13-dic-2023	AMPLIACIÓN 10 SUSPENSIÓN 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	13	13-dic-2023	AMPLIACIÓN 10 SUSPENSIÓN 1
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	23	12-feb-2024	MODIFICACIÓN 2 PRÓRROGA 2

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	14	9-feb-2024	MODIFICACIÓN 2 PRÓRROGA 2
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	24	26-abr-2024	SUSPENSIÓN CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	15	26-abr-2024	SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	25	17-julio 2024	AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	16	17-julio 2024	AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	26	22-ago-2024	AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	17	22-ago-2024	AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	28	11-dic-2024	AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	19	11-dic-2024	AMPLIACIÓN 3 y 4 SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	29	12-feb-2025	AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	20	12-feb-2025	AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 2 CONTRATO
CUMPLIMIENTO	11-44-101183708	30	23-may-2025	AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 2 Y REINICIO CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	11-40-101045973	21	23-may-2025	AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 2 Y REINICIO CONTRATO

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados según contrato de obra:

Tabla 11 Pólizas actualizadas a la fecha.

AMPARO	REQUISITOS CONTRACTUALES		DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA		
	Vigencia contractual	% contractual	Desde	Hasta	Valor asegurado
CUMPLIMIENTO					
a). Cumplimiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	10%	3-mar-22	10-may-25	$ 1.162.469.319,00
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	100%	3-mar-22	10-may-25	$ 2.324.938.637,00
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Plazo del contrato y tres (3) años más.	5%	3-mar-22	10-nov-27	$ 581.234.660,00
d). Estabilidad y calidad de las obras.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.	20%	5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DIAS		$ 2.324.938.637,00
RESPONSABILIDAD CIVIL					
a). Predios labores y operaciones	Igual al período de ejecución del contrato.	5%	3-mar-22	10-nov-24	$ 581.234.660,00
b). Daño emergente y lucro cesante	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			$ 290.617.330,00
c) Perjuicios extrapatrimoniales	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			$ 290.617.330,00

4.1.3 Otrosí, Adición y Prórroga

En la siguiente tabla se muestra el otrosí o Modificatorio al contrato.

Tabla 12 Otrosí y Adición - Contrato de Obra 478

DOCUMENTO	FECHA	PRORROGA	VALOR	MOTIVO
MODIFICACIÓN Nº 1 y PRORROGA Nº 1	25/07/2022	2 meses y 22 días	N/A	Modificar el párrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato prorrogar el plazo del contrato.

DOCUMENTO	FECHA	PRORROGA	VALOR	MOTIVO
MODIFICACIÓN Nº 2 y PRORROGA Nº 2	8/02/2024	9 meses	N/A	Modificar el párrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato prorrogar el plazo del contrato.

En el presente periodo no se presentaron Otrosíes y/o modificaciones al contrato de obra 478.

4.1.4 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las suspensiones y/o reinicios al contrato de obra 478:

Tabla 13 Suspensiones y Reinicios Contrato de Obra 478

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento	Suspensión	Suspensión			
Suspensión N°. 1	-	21-abr-23	21-abr-23	20-jun-23	DOS (2) MESES	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 1	20-jun-23	21-jun-23	20-jul-23	UN (1) MES	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 2	19-jul-23	21-jul-23	31-jul-23	ONCE (11) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 3	1-ago-23	1-ago-23	31-ago-23	TREINTA Y UN (31) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 4	30-ago-23	1-sep-23	1-oct-23	TREINTA Y UN (31) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico.
Suspensión N°. 1	Ampliación 5	29-sep-23	2-oct-23	23-oct-23	VEINTIDÓS (22) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico.
Suspensión N°. 1	Ampliación 6	23-oct-23	24-oct-23	6-nov-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión Reinicio	**Ampliación o prórroga**	**Fecha documento**	**Suspensión**	**Suspensión**			
Suspensión N°. 1	Ampliación 7	03-nov-23	7-nov-23	20-nov-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 8	20-nov-23	21-nov-23	4-dic-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°. 1	Ampliación 9	4-dic-23	5-dic-23	4-feb-24	DOS (2) MESES		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Reinicio	N/A	5-Feb-24	N/A	N/A	N/A	5-Feb-2024	Se superan las causales que dieron lugar a la suspensión N° 1.
Suspensión 2	N/A	17-abr-24	17-Abr-24	16-Jun-24	DOS (2) MESES	17-jun-2024	Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión 2	Ampliación 1	17-jun-24	17-jun-24	17-ago-24	DOS (2) MESES		No se superan los motivos que motivaron la suspensión del contrato
Suspensión 2	Ampliación 2	1-ago-24	17-ago-24	1-oct-24	UN (1) MES Y DIECISÉIS DÍAS		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión 2	Ampliación 3	1-oct-24	1-oct-24	1-nov-24	UN (1) MES		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión 2	Ampliación 4	1-nov-24	1-nov-24	21-ene-25	DOS (2) MESES y VEITE (20) DÍAS		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión 2	Ampliación 5	24-ene-25	21-ene-25	21-feb-25	UN (1) MES		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión 2	Ampliación 6	22-feb-25	21-feb-25	1-abr-25	UN (1) MES Y DIEZ DÍAS	1-abr-2025	Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Reinicio 1	N/A	1-abr-25				1-abr-25	Se superan las causales que motivaron la suspensión.

4.1.5 Actas De Modificaciones De Cantidades De Obras

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a las cantidades de obra del presupuesto contractual del contrato de obra 478:

Tabla 14 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obra contrato 478

ACTA MODIFICATIVA Nº	FECHA	MOTIVO			
		AJUSTE MAYORES Y MENORES COSTOS	PRORROGA	ADICIÓN EN VALOR	COMENTARIOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.1.6 ítems o precios no previstos

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a la incorporación de ítems o precios no previstos inicialmente en la propuesta económica precontractual del contrato de obra 478:

Tabla 15 Ítems No previstos contrato 478

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (mar/2022)
NP-01	Construcción de berma cuneta de 0,60m de ancho y sección transversal de 0,16 m2, en concreto de 3500 PSI; (Incluye corte de dilatación cada 2,0m, curado e impermeabilización. No incluye acero de refuerzo	ML	$ 135.463,00
NP-03	Excavación manual en material común (incluye cargue)	M3	$ 31.915,00
NP-04	Construcción de filtro de drenaje. Dimensiones 060mX0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 3", tubería perforada de 6"y geotextil NT 2500 o similar.	ML	$ 176.724,00
NP-05	Limpieza de alcantarillas con diámetro menor o igual a Ø= 36"; Incluye limpieza de descoles hasta 5,0m y cargue. No incluye retiro de sobrantes ni disposición final.	UND	$ 71.495,00
NP-06	Limpieza y rocería de cunetas en tierra.	M2	$ 1.966,00
NP-07	Traslado de cerca en alambre de púas; (Incluye remoción de cerca e instalación definitiva).	ML	$ 8.801,00
NP-08	Protección de taludes tipo 1 con producto enrollado para control de erosión de tipo agro manto temporal. (Mezcla fértil)	M2	$ 34.891,00
NP-09	Descapote a máquina en material común (E=0,10m incluye cargue, no incluye disposición final de sobrantes).	M2	$ 2.394,00
NP-10	Conformación de taludes existentes (Incluye acarreo a acopio interno en el tramo)	M2	$ 1.395,00
NP-11	Construcción de filtro de drenaje. Dimensiones 0,60mX0,67m; incluye material granular drenante de 1" a 3", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar.	ML	$ 153.399,00
NP-12	Excavaciones varias en roca	M3	$ 67.754,00
NP-13	Protección de taludes tipo 2 con producto enrollado para control de erosión de tipo manto temporal. (Semilla)	M2	$ 25.408,00

Se dio aval a los ítems no previstos mediante comunicación 186-1-205 del 1 de marzo de 2024, para incluirlos dentro de la modificación N°3 al contrato de obra 478-2022, para el presente periodo no se tramitaron ítems no previstos.

4.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO

4.2.1 Etapa de Pre-construcción

En la siguiente tabla se mencionan actividades realizadas en la etapa de pre-construcción.

Tabla Documentación Organizativa Inicial Contrato 478

REQUERIMIENTO	REFERENCIA CONTRACTUAL	ESTADO DEL DOCUMENTO
D-27-2022-25	Comunicación apropiación parcial de estudios y diseños.	El día 9 de agosto de 2022 el contratista realiza la apropiación parcial mediante comunicación D-27-2022-25 a pesar de las entregas de los levantamientos topográficos y diseño geométrico realizados por parte de la entidad y revisados por la interventoría, se continuo con las actividades de obra con el único propósito de no suspender la ejecución del contrato, quedado pendiente por recibir la información definitiva de los estudios y diseños revisados y aprobados por la UAERMV y/o la interventoría.

4.2.2 Etapa de construcción

En la siguiente tabla se registran las actividades de obra de construcción del CONTRATO DE OBRA 478.

Tabla 16 Actividades de Construcción contrato 478

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
TRAMO CAPITOLIO	Sin actividades debido a reinicio del contrato	Se hicieron actividades de rocería o limpieza en el tramo se realiza traslado de cercas en los predios adyacentes a la vía descapote de material común Conformación, corte y perfilado de taludes. Excavación y construcción de filtros: se realiza la actividad de excavación y construcción de filtros; el cual es tipo francés de medidas 0.67m de profundo y 0.6m de ancho con material drenante de 1" a 3", y con tubería perforada de 4", lo anterior recubierto de geotextil no tejido calibre 2500 Actividades de filtro
TRAMO CAPITOLIO K1+000.00 - K0+690.00	Sin actividades	Excavación y construcción de filtros: se realiza la actividad de excavación y construcción de filtros; el cual es tipo francés de medidas 0.67m de profundo y 0.6m de ancho con material drenante de 1" a 3", y con tubería perforada de 4", lo anterior recubierto de geotextil no tejido calibre 2500

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
LAGUNA VERDE	Se encuentra sobre la excavación dos rocas que se rodean para dar continuidad al filtro. Se avanza con la excavación mecánica para el filtro francés del K0+470 -445 en este proceso se carga y se retira el material de excavación al acopio temporal ubicado en el K1+750 . Se encuentra sobre la excavación dos rocas que se rodean para dar continuidad al filtro. Se realiza la construcción del filtro francés del K0+490-K0+445 carril izquierdo, se avanza con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+404 - K0+390 carril izquierdo, el material producto de la excavación es transportado al acopio temporal ubicado en el K1+750 carril derecho Se realiza la excavación mecánica para el filtro francés del K0+394-K0+376 carril izquierdo, el material producto de la excavación es llevado al acopio temporal ubicado en el K1+750 carril *Se realiza la excavación mecánica para el filtro francés del K0+810-K0+830 carril derecho, en la cual se hizo un avance de 30 metros Cabe resaltar que en la excavación se encontró una roca cuyas dimensiones fueron 1.00 X 0.70 X 0.75 Se ejecuta la demolición en roca, el material producto de la excavación es llevado al acopio temporal ubicado en el K1+750 carril derecho, *Se realiza nivelación de filtro en la K 0+376 a la K0+404 *Se realiza la excavación mecánica para el filtro francés del K0+810-K0+790 carril derecho, en la cual se hizo un avance de 20 metros Cabe resaltar que en las excavaciones para instalación de Filtro, han sido tediosas por la aparición de rocas de gran dimensión. *Se ejecuta las demoliciones en varias rocas el material producto de la excavación es llevado al acopio temporal ubicado en el K1+750 carril derecho En la mañana se hace el alistamiento del sitio para hacer la excavación mecánica para instalación de tubería para la alcantarilla en el K0+132	Instalación de Cerramiento para delimitación y proyección Replanteo del tramo K1+400 Demolición de roca. K0+060 a K0+110 Instalación de geotextil. Instalación de material pétreo filtrante. Instalación de tubo perforado. K0+280 Excavación para filtro. Limpieza y conformación de excavación de forma manual Instalación de geotextil. Instalación de cama de material pétreo filtrante. Instalación de tubería perforada. Instalación de material pétreo filtrante. K0+295 Retiro y demolición de piedra en área de excavación para filtro. K0+279 a K0+180 Excavación para filtro. Limpieza y conformación de excavación de forma manual. Instalación de geotextil. Instalación de cama de material pétreo filtrante. Instalación de tubería perforada. Instalación de material pétreo filtrante.K0+279 a K0+180 Excavación para filtro. Limpieza y conformación de excavación de forma manual. Instalación de geotextil. Instalación de cama de material pétreo filtrante. Instalación de tubería perforada. Instalación de material pétreo filtrante. Se realizaron excavaciones e instalación de filtro Se realizaron excavaciones e instalación de filtro.

Durante el presente periodo, el contratista de obra adelantó actividades correspondientes a la excavación para filtros, así como excavación mecánica

para filtro francés en el tramo correspondiente a Laguna Verde. Dichas labores resultan necesarias para la adecuada ejecución del proyecto.

De igual forma, mediante comunicación radicada bajo el número 186-1-730 del 7 de julio de 2025, se remitió al contratista el requerimiento relacionado con un posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Entre las situaciones observadas se encuentran: la no presentación del cronograma de obra, la ausencia de las hojas de vida del personal para el reinicio de actividades, la no entrega de la relación del equipo mínimo de trabajo, la no presentación del informe de apropiación de los estudios y diseños, la omisión en la entrega de informes mensuales y la existencia de atrasos en la ejecución de las obras.

Para el periodo correspondiente a agosto de 2025, el contratista se encuentra adelantando actividades orientadas a superar el atraso en la obra. Se ha registrado un avance significativo en las excavaciones para la instalación de filtros, encontrando en el proceso formaciones rocosas que requieren demolición, lo cual implica mayores labores y esfuerzos en el desarrollo de las excavaciones.

4.2.3 Valores ejecutados

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los valores contractuales actualizados, valores ejecutados en el período, valores acumulados y los saldos:

Tabla 17 Valores Ejecutados Contrato 478

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
1	**ALCANTARILLAS**		**$ 6.053.645,00**		$ 3.667.900.766,43				**$ 0,00**		**$ 3.667.900.766,43**
1,01	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	M3	$ 8.744,00	1302,24	$ 11.386.786,56	0	$ 0,00	0	$ 0,00	1302,24	$ 11.386.786,56
1,02	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado. (Distancia de transporte aprox. 85 Km. Aprox.) A distancia mayor del acarreo libre (90 m), en sitio autorizado por la entidad ambiental competente	M3	$ 153.629,00	1302,24	$ 200.061.828,96	0	$ 0,00	0	$ 0,00	1302,24	$ 200.061.828,96
1,03	Retiro de tubería. Incluye cargue, retiro y disposición en sitio autorizado.	M	$ 582.150,00	67,77	$ 39.452.305,50	0	$ 0,00	0	$ 0,00	67,77	$ 39.452.305,50
1,04	Relleno en recebo común. (Suministro e instalación. Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	M3	$ 240.042,00	2035,54	$ 488.615.092,68	0	$ 0,00	0	$ 0,00	2035,54	$ 488.615.092,68
1,05	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado D=36" (900 mm)	M	$ 1.733.590,00	412,27	$ 714.707.149,30	0	$ 0,00	0	$ 0,00	412,27	$ 714.707.149,30

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
1,06	Demolición de estructuras en concreto reforzado. Incluye cargue y retiro a sitio autorizado	M3	$ 278.216,00	152,37	$ 42.391.771,92	0	$ 0,00	0	$ 0,00	152,37	$ 42.391.771,92
1,07	Concreto de limpieza grava común. Resistencia 2000 PSI (14 Mpa). Incluye transporte, suministro, colocación y curado.	M3	$ 704.070,00	83,67	$ 58.909.536,90	0	$ 0,00	0	$ 0,00	83,67	$ 58.909.536,90
1,08	Concreto. Resistencia 14 Mpa. (G) (Ciclópeo)	M3	$ 546.701,00	539,41	$ 294.895.986,41	0	$ 0,00	0	$ 0,00	539,41	$ 294.895.986,41
1,09	Acero de refuerzo: Incluye Suministro, Figurado y Fijación	KG	$ 7.632,00	108793,1	$ 830.308.939,20	0	$ 0,00	0	$ 0,00	108793,	$ 830.308.939,20
1,1	Junta fría en estructuras de concreto. e= 25 cm. Incluye adhesivo epóxido para pegar concreto fresco con endurecido y la instalación de cinta PVC para sellar e impermeabilizar juntas frías en estructuras de concreto.	M	$ 49.907,00	1164,6	$ 58.121.692,20	0	$ 0,00	0	$ 0,00	1164,6	$ 58.121.692,20
1,11	Concreto para Alcantarilla. Resistencia 24,5 Mpa hasta 28 Mpa. (3500 PSI - 4000 PSI)	M3	$ 874.482,00	991,38	$ 866.943.965,16	0	$ 0,00	0	$ 0,00	991,38	$ 866.943.965,16
1,12	Concreto para Box. Resistencia 24,5 Mpa hasta 28 Mpa. (3500 PSI - 4000 PSI)	M3	$ 874.482,00	71,02	$ 62.105.711,64	0	$ 0,00	0	$ 0,00	71,02	$ 62.105.711,64
2	**CUNETAS**		**$ 699.513,72**		$ 4.078.708.030,98				**$ 297.708.225,00**		**$ 3.780.999.805,20**

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
2,01	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	M3	$ 8.744,00	5180,7	$ 45.300.040,80	0	$ 0,00	1416,08	$ 12.382.238,00	3764,61	$ 32.917.802,30
2,02	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado. (Distancia de transporte aprox. 85 Km. Aprox.) A distancia mayor del acarreo libre (90 m), en sitio autorizado por la entidad ambiental competente	M3	$ 153.629,00	5180,7	$ 795.905.760,30	0	$ 0,00	1416,08	$ 217.551.569,00	3764,61	$ 578.354.191,46
2,03	Relleno en recebo común. (Suministro e instalación. Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	M3	$ 240.042,00	1552,03	$ 372.552.385,26	0	$ 0,00	282,34	$ 67.774.418,00	1269,68	$ 304.777.966,81
2,04	Acero de refuerzo: Incluye Suministro, Figurado y Fijación	KG	$ 7.632,00	81044,16	$ 618.529.029,12	0	$ 0,00	0	$ 0,00	81044,1	$ 618.529.029,12
2,05	Construcción de Berma / Cuneta, de 0,70 m de ancho y espesor 0,20 m. en Concreto reforzado de 3500 PSI. No incluye acero de refuerzo. Incluye corte de dilatación cada 2,0 m. suministro, instalación y conformación de la superficie de apoyo.	M	$ 149.245,00	15051,9	$ 2.246.420.815,50	0	$ 0,00	0	$ 0,00	15051,9	$ 2.246.420.815,50

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
2,06	Construcción de berma/cuneta de 0,60 m de ancho y espesor 0,15 m. En concreto reforzado de 3000 PSI No incluye acero de refuerzo. Incluye corte de dilatación cada 2 m.	M	$ 140.221,72		$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
3	**SUBDRENES**		**$ 474.667,00**		**$ 3.402.237.579,65**				**$ 94.033.451,00**		**$ 3.308.204.127,89**
3,01	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	M3	$ 8.744,00	6208,1	$ 54.283.626,40	0	$ 0,00	579,12	$ 5.063.825,00	5628,98	$ 49.219.801,12
3,02	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado. (Distancia de transporte aprox. 85 Km. Aprox.) A distancia mayor del acarreo libre (90 m), en sitio autorizado por la entidad ambiental competente	M3	$ 153.629,00	6208,1	$ 953.744.194,90	0	$ 0,00	579,12	$ 88.969.626,00	5628,98	$ 864.774.568,42
3,03	Construcción de filtro de Drenaje. Dimensiones 0,50 m x 1,0 m. Incluye material granular drenante entre 1" y 3", tubería perforada de 4" y geotextil NT 3000 o similar.	M	$ 156.147,00	15333,05	$ 2.394.209.758,35	0	$ 0,00	0	$ 0,00	15333,0	$ 2.394.209.758,35
3,04	Construcción de filtro de Drenaje. Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 3", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar	M	$ 156.147,00	15333,05		0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
4	**MURO GAVIONES**		**$ 1.616.114,65**		**$ 160.321.032,72**				**$ 0,00**		**$ 160.321.032,72**
4,01	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	M3	$ 8.744,00	338,24	$ 2.957.570,56	0	$ 0,00	0	$ 0,00	338,24	$ 2.957.570,56
4,02	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado. (Distancia de transporte aprox. 85 Km. Aprox.) A distancia mayor del acarreo libre (90 m), en sitio autorizado por la entidad ambiental competente	M3	$ 153.629,00	133,54	$ 20.515.616,66	0	$ 0,00	0	$ 0,00	133,54	$ 20.515.616,66
4,03	Relleno en recebo común. (Suministro e instalación. Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	M3	$ 240.042,00	75	$ 18.003.150,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	75	$ 18.003.150,00
4,04	Concreto. Resistencia 14 Mpa. (G) (Ciclópeo)	M3	$ 546.701,00	25,5	$ 13.940.875,50	0	$ 0,00	0	$ 0,00	25,5	$ 13.940.875,50
4,05	Gaviones de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1. Recubrimiento de Zinc. (galvanizado).	M3	$ 333.028,00	315	$ 104.903.820,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	315	$ 104.903.820,00
4,06	Conformación de Muro con Geocontainer - Geotextil 2,20 x 1,10 x 0,60 = 1,45 m³ (HYDROBLOCK o equivalente). Incluye lleno con material de sitio, compactación manual y cierre.	M	$ 333.970,65			0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00

ITEM	DESCRIPCION	V/RES CONTRACTUALES				EJECUTADOS PRESENTE MES		V/R PAGADO		PENDIENTE EJECUTAR	
		UND	V/R UNITARIO	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
SUBTOTAL DE OBRA					**$ 11.309.167.409,78**		**$ 0,00**		**$ 391.741.676,00**		**$ 10.917.425.732,24**
	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y SST	1,81%			**$ 204.695.930,00**		**$ 0,00**		**$ 7.090.524,00**		**$ 197.605.406,00**
	IMPLEMENTACIÓN DE PMT	0,78%			**$ 88.211.506,00**		**$ 0,00**		**$ 3.055.585,00**		**$ 85.155.921,00**
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19	0,20%			**$ 22.618.335,00**		**$ 0,00**		**$ 783.483,00**		**$ 21.834.851,00**
TOTALES					**$ 11.624.693.181,00**		**$ 0,00**		**$ 402.671.268,00**		**$ 11.222.021.910,24**
PORCENTAJE EJECUCIÓN ACUMULADA							**0,00%**		**3,46%**		**96,54%**
AMORTIZACION ANTICIPO		20%	$ 2.324.938.636,00				**$ 0,00**		**$ 80.534.254,00**		**$ 2.244.404.382,00**
AMORTIZACION EN GARANTÍA (NO APLICA)											
TOTAL, NETO A PAGAR									**$ 322.137.014,00**		**$ 8.977.617.528,24**

Para el presente periodo, se sigue validando el acta parcial N°3 a fecha de corte 31 de agosto de 2025 .

4.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria y equipo destinados a la ejecución de las obras:

Tabla 18 Maquinaria y Equipo Contrato 478

N°	TIPO DE EQUIPO	EQUIPO MÍN. REQUERIDO	CANT.	MARCA	MODELO	CAPACIDAD	COMENTARIOS
	EQUIPO PARA ACTIVIDADES EN OBRA						
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Durante el presente periodo, el contratista de obra adelantó actividades correspondientes a la instalación del cerramiento provisional, con el objetivo de delimitar el área de trabajo y facilitar el replanteo del tramo correspondiente a Laguna Verde. Dichas labores hacen parte de las actividades preliminares necesarias para la adecuada ejecución del proyecto.

Asimismo, mediante comunicación radicada bajo el número 186-1-730 de fecha 7 de julio de 2025, se remitió al contratista el requerimiento relacionado con el posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Entre las situaciones observadas se encuentran: la no presentación del cronograma de obra, la ausencia de las hojas de vida del personal para el reinicio de actividades, la no entrega de la relación del equipo mínimo de trabajo, la no presentación del informe de apropiación de los estudios y diseños, la omisión en la entrega de informes mensuales y la existencia de atrasos en la ejecución de las obras.

Durante el mes de agosto de 2025, se ha venido realizando seguimiento al Consorcio Gaviones 95 respecto de estas situaciones, con el fin de verificar la adopción de medidas encaminadas a superar los atrasos y atender los posibles incumplimientos señalados. Dicho seguimiento busca garantizar el desarrollo oportuno del contrato y la adecuada ejecución de las obras.

4.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA

4.4.1 Control de personal de obra

En la siguiente tabla se registran los datos del personal mínimo requerido y el personal dispuesto para el desarrollo del contrato de obra:

Tabla 19 Control Personal en Obra Contrato 478

LISTADO PERSONAL EN OBRA					
No.	**NOMBRE**	**CC**	**CARGO**	**INGRESO**	**RETIRO**
1	Luis Orlando Pulido	79,554,518	Director	5/04/2025	No Aplica

LISTADO PERSONAL EN OBRA					
No.	**NOMBRE**	**CC**	**CARGO**	**INGRESO**	**RETIRO**
2	Paul Alberto Rangel Páez	88,002,563	Residente SST	5/04/2025	No Aplica
3	Cesar Augusto Delgado	1,022,324,860	Residente Ambiental	5/04/2025	No Aplica
4	Jhon Gabriel Yate Botache	1,098,648,719	Residente Técnico	12/05/2025	No Aplica
5	Maximino Becerra Yacumal	4,743,041	Topógrafo	9/04/2025	No Aplica
6	Andrés Alberto García Posada	79,756,111	Residente Social	12/05/2025	No Aplica
7	Wilson Orlando Rodríguez Sanabria	74,334,263	Cadenero	5/04/2025	No Aplica
8	Arístires Pardo Niño	13,526,015	Oficial de Obra	6/04/2025	No Aplica
9	John Jairo Guerrero Cabrera	79,183,755	Conductor	12/05/2025	No Aplica
10	William Hernández Ortega	1,000,464,177	Ayudante de Obra	5/05/2025	No Aplica
11	Katherine Tovar	1,010,220,888	Talento Humano	5/05/2025	No Aplica
12	Leidy Johana Bastidas Arévalo	1,016,078,304	Secretaria	5/05/2025	No Aplica
13	Walter Andrés Albino Beltrán	1.013.627.988	Conductor	10/06/2025	No Aplica
14	Liz Maribel Murillo Naranjo	1.054.709.749	Profesional SISOMA	10/06/2025	No Aplica
15	Junior Yesid Rodríguez Jiménez	1.192.924.869	Conductor	24/06/2025	No Aplica
16	Osman Andrés Camacho González	14.327.218	Conductor	24/06/2025	No Aplica

Durante el presente periodo, el contratista de obra adelantó actividades correspondientes a la instalación del cerramiento provisional, con el objetivo de delimitar el área de trabajo y facilitar el replanteo del tramo correspondiente a Laguna Verde. Dichas labores hacen parte de las actividades preliminares necesarias para la adecuada ejecución del proyecto.

Asimismo, mediante comunicación radicada bajo el número 186-1-730 de fecha 7 de julio de 2025, se remitió al contratista el requerimiento relacionado con el posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Entre las situaciones observadas se encuentran: la no presentación del cronograma de obra, la ausencia de las hojas de vida del personal para el reinicio de actividades, la no entrega de la relación del equipo mínimo de trabajo, la no presentación del informe de apropiación de los estudios y diseños, la omisión en la entrega de informes mensuales y la existencia de atrasos en la ejecución de las obras.

Durante el mes de agosto de 2025, se ha venido realizando seguimiento al Consorcio Gaviones 95 respecto de estas situaciones, con el fin de verificar la adopción de medidas encaminadas a superar los atrasos y atender los posibles

incumplimientos señalados. Dicho seguimiento busca garantizar el desarrollo oportuno del contrato y la adecuada ejecución de las obras.

4.4.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra

Lo relacionado al control de aportes legales y de seguridad social se encuentra en el anexo N°4 .C informe SST de interventoría.

4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

4.5.1 Informe financiero y presupuestal

Para respaldar las obligaciones contraídas, la entidad contratante cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 921 del 17 de septiembre de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, del cual se reservará la suma de $ 11.624.693.181,00, del rubro 00AR-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ.

Lo anterior según lo estipulado en el Contrato de obra N° 478. de 2021 en el parágrafo primero de la cláusula séptima.

Tabla 20 Vigencias del Contrato

VIGENCIA	VALOR
2022	11.624.693.181,00
Valor Contrato	11.624.693.181,00

4.5.2 Forma de pago del contrato

Conforme con lo establecido en el Contrato de Obra, en su Cláusula octava – Forma de Pago, el valor del contrato se pagará así:

"*El proceso de selección es a precios unitarios sin formula de reajuste, teniendo en cuenta que, las cantidades de obra pueden variar de acuerdo con las intervenciones requeridas en cada tramo vial establecido de acuerdo al grupo, según sea determinado en la revisión a los diseños entregados, producto realizado previo al inicio de la ejecución de las obras.".*
Se pagarán al contratista las sumas a las que se refiere el valor del contrato así:

A.) Etapa de Construcción: *"Se ordenará el pago al contratista hasta el 95% del valor total de la etapa de construcción del contrato, pago que se hará mediante acta parciales de obra mensualmente; el saldo del 5% del valor total de la etapa*

de construcción será pagado contra la suscripción del acta de liquidación del contrato.".

"Parágrafo 1: Por ser la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, designada como ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías, en función del Acuerdo 099 de 31 de diciembre de 2019, expedido por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la Región Centro Oriente, deberá hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR, para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas, directamente desde la cuenta única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales.".

4.5.3 Actas de recibo parcial de obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las actas de recibo parcial de obras:

Tabla 21 Actas de Recibo Parcial de Obras

N°	FECHA	PERÍODO	COSTO DIRECTO	VALOR COMPONENTES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL PAGADO
1	14/12/2022	AGOSTO A OCTUBRE 2022	$ 391.741.676,00	$ 10.929.592,00	$ 402.671.268,00	$ 80.534.254,00	$ 322.137.014,00
2	14/12/2022	ENERO A 21 ABRIL 2023	$ 571.370.780,00	$ 0,00	$ 571.370.780,00	$ 114.274.156,00	$ 457.096.624,00
TOTAL			**$ 963.112.456,00**	**$ 10.929.592,00**	**$ 974.042.048,00**	**$ 194.808.410,00**	**$ 779.233.638,00**

Mediante oficio 186-1-162, del 22 de diciembre de 2022, la interventoría dio concepto favorable al Acta parcial 1 de obra presentada por el consorcio Gaviones 95, por un valor de $ 402.671.268. (periodo de agosto a octubre de 2022).

El día 27 de septiembre de 2024, se firmó el acta N°14 donde se da aval para el pago del acta de recibo parcial N°2 donde se reconocen las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 1de enero al 21 de abril del año 2024, por un valor de $ 457.096.624,00.

4.6 ANTICIPO DE OBRA

4.6.1 Datos generales del anticipo de obra

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de obra otorgado:

Tabla 22 Generales del Anticipo de Obra

ANTICIPO CONTRATO INICIAL	
Valor total anticipo	$ 2.324.938.636
Valor retenido por la entidad	$ 211.569.146,00
Valor ingresado al Fideicomiso	$ 2.113.369.220,00
Porcentaje	20%
Entidad Fiduciaria	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S. A
Nombre del Fideicomiso	Consorcio Gaviones 95
Fecha desembolso anticipo	Septiembre de 2022
Fecha de cierre del Fideicomiso	Aún está abierto

4.6.2 Órdenes de pago o de giro

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las órdenes de pago o de giro aprobadas:

Tabla 23 Órdenes de Pago o de Giro

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
ORDEN DE OPERACIÓN No 1	25/10/2022	RENTAL EP SAS	$ 303,530,069.00	1	No de Factura y fecha: Factura de venta 132 del 29/09/2023 y Factura de venta 133 del 29/09/2023. Factura de compra P001-81 del 30/09/2022 y factura de compra P001-80 del 30-09-2023 del consorcio Gaviones 95. Factura relacionada a orden de pago 288448-1 de Alianza fiduciaria. Concepto: Transporte y alquiler de maquinaria	En revisión mediante ofidio 186-0-16 del 18/10/2022.
ORDEN DE OPERACIÓN No 2	25/10/2022	CONSORCIO GAVIONES 95	$ 295,930,079.00	2	No de Factura y fecha: Factura de venta N°. 415 del 28/09/2022 de OMR Ingeniería y comercia y Factura de compra P-001-45 del Consorcio Gaviones 95 el 28/09/2022. Factura relacionada a orden de pago 288448-2 de Alianza fiduciaria. Concepto: Reembolso- Material hidráulico Geotextil y tubería	Aprobado mediante ofidio 186-0-16 del 18/10/2022.
ORDEN DE OPERACIÓN No 3	25/10/2022	CEMEX COLOMBIA	$ 100,000,000.00	2	No de Factura y fecha: Factura proforma 80029369625-6825445224 del 27/09/2022 de CEMEX Factura relacionada a orden de pago 288448-5 de Alianza fiduciaria. Concepto: Reembolso- Anticipo concreto y cemento	Aprobado mediante ofidio 186-0-16 del 18/10/2022.
ORDEN DE OPERACIÓN No 4	28/10/2022	CANTERA VILLA PAULA	$ 50,000,000.00	2	No de Factura y fecha: Factura proforma FPF-RC-93 del 26/09/2022 Factura relacionada a orden de pago 289948 de Alianza Concepto: Materiales- Anticipo triturado.	Aprobado mediante ofidio 186-0-16 del 18/10/2022.
ORDEN DE OPERACIÓN No 5	25/10/2022	CONSTRITURAR SAS	$ 10,000,000.00	2	No de Factura y fecha: Factura proforma N°. 198 de 2022 de 09/09/2022, Factura relacionada a orden de pago 289448-3 de Alianza Concepto: Materiales-anticipo granulares. (suministro de agregados pétreos)	Aprobado mediante ofidio 186-0-16 del 18/10/2022.
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	28/10/2022	CONSORCIO GAVIONES 95	$ 304,084,508.00	2	No de Factura y fecha: Orden de compra N°. 2. del 02/06/2022 de ALR Group SAS, Concepto: Tubería de 36" No de Factura y fecha: FPF-RC-88 del 19/06/2022 de Cantera Villa Paula SAS, Concepto: Triturado. No de Factura y fecha: FPF-RC-93 del 09/09/2022 de Cantera Villa Paula SAS, Concepto: Triturado. No de Factura y fecha: FPF-RC-93 del 28/09/2022 de Cantera Villa Paula SAS, Concepto: Triturado. No de Factura y fecha: FPF-RC-93 del 30/09/2022 de Cantera Villa Paula SAS, Concepto: Triturado. No de Factura y fecha: FPF-RC-107 del 10/10/2022 de Cantera Villa Paula	

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
					SAS, Concepto: Triturado. No de Factura y fecha: ODC 022 del 23/09/2022 de Cemex de Colombia SA Concepto: Concreto y cemento. No de Factura y fecha: ODC 025 del 10/10/2022 de Cemex de Colombia SA Concepto: Concreto y cemento. No de Factura y fecha: ODC 027 del 27/10/2022 de Tecnología de polietileno de Colombia SA. Concepto: Tubo alcantarillado 36" Factura relacionada a orden de pago 28102022 del 28/10/2022 de Alianza	
ORDEN DE OPERACIÓN No 7	28/10/2022	CEMEX COLOMBIA	$ 100,000,000.00	2	No de Factura y fecha: Proforma 80030488536-6926843674 del 28/10/2022, Factura relacionada a orden de pago 28102022 del 28/10/2022 de Alianza Concepto: Materiales-anticipo concreto y cemento. (cemento súper resistente y derecho a escombreras).	
ORDEN DE OPERACIÓN No 8	28/10/2022	CONSTRITURAR SAS	$ 10,000,000.00	2	No de Factura y fecha: Factura proforma N°. 207 de 2022 del 01/10/2022. Factura relacionada a orden de pago 28102022 del 28/10/2022 de Alianza Concepto: Materiales-anticipo granulares (Agregados pétreos)	
TOTAL			**$ 1,173,544.656,00**			

La interventoría realizará el seguimiento a los desembolsos del anticipo solicitados por el contratista firmando las órdenes de pago que estén acordes con el plan de inversión actualizado y aprobado, y con el lleno de los requisitos de los soportes correspondientes.

4.6.3 Plan de inversión del anticipo vs inversión del anticipo

A continuación, se relaciona el plan de inversión del anticipo del contra Nº 478:

Tabla 24 Plan de Inversión del Anticipo VS Inversión Anticipo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO 21 de octubre de 2022. 186-0-006		ACUMULADO TOTAL INVERSIÓN	SALDO
		%	Valor		
1	**Transporte y alquiler de maquinaria**	30.9	$ 718,406,039.00	$ 303.530.069,00	$ 414.875.970,00
2	**Materiales**	60	$ 1,394,963,181.00	$ 870.014.587,00	$ 524.948.594,00
	SUBTOTAL		**$ 2,113,369,220.00**	**$ 1,173.544.656,00**	**$ 939.824.564,00**
	Descuento entidad por contribución especial y estampillas	9.1	$ 211,569,416.00		
	TOTAL	100	**$ 2,324,938,636.00**		

4.6.4 Reintegro de rendimientos financieros

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses financieros generados y su respectiva devolución o reintegro a la entidad:

Tabla 25 Rendimientos financieros Anticipo de Obra

N°	PERIODO CAUSADO	CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA Nº04000003568	VALOR GIRO REALIZADO	FECHA DE GIRO
1	sep-22	$ 938.188,27	$ 938.188,27	11-oct-22
2	oct-22	$ 1.027.591,05	$ 1.027.591,05	9-nov-22
3	nov-22	$ 385.777,52	$ 385.777,52	7-dic-22
4	dic-22	$ 326.776,52	$ 326.776,52	10-ene-23
5	ene-23	$ 150.365,96	$ 150.365,96	7-feb-23
6	feb-23	$ 135.854,95	$ 135.854,95	8-mar-23
7	mar-23	$ 150.435,49	$ 150.435,49	12-abr-23
8	abr-23	$ 145.589,59	$ 145.589,59	11-may-23
9	may-23	$ 150.438,15	$ 150.438,15	16-jun-23
10	jun-23	$ 145.599,88	$ 145.599,88	24-jul-23
11	jul-23	$ 150.459,33	$ 150.459,33	31-ago-23
12	ago-23	$ 150.471,58	$ 150.471,58	29-sep-23
13	sep-23	$ 145.612,84	$ 145.612,84	17-oct-23
14	oct-23	$ 150.444,28	$ 150.444,28	22-nov-23
15	nov-23	$ 145.599,80	$ 145.599,80	19-feb-24
16	dic-23	$ 150.467,08	$ 150.467,08	19-feb-24
17	ene-24	$ 150.518,10	$ 150.518,10	19-feb-24

N°	PERIODO CAUSADO	CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA Nº04000003568	VALOR GIRO REALIZADO	FECHA DE GIRO
18	abr-24	$ 72.969,90	N/A	30-abr-24
19	may-24	$ 75.414,84	N/A	31-may-24
20	jun-24	$ 72.994,30	N/A	30-jun-24
21	jul-24	$ 77.413,33	$ 296.780,00	31-jul-24
22	ago-24	$ 78.152,14	$ 75.413,00	31-ago-24
23	sep-24	$ 72.968,70	N/A	N/A
24	oct-24	$ 75.394,43	$ 148.365,00	31-oct-24
25	nov-24	$ 72.963,02	$ 77.332,02	30-nov-24
26	dic-24	$ 75.389,19	$ 74.891,30	31-dic-24
27	ene-25	$ 75.394,84	$ 77.420,07	31-ene-25
28	feb-25	$ 68.095,48	$ 77.426,10	28-feb-25
29	mar-25	$ 75.393,78	$ 70.096,90	31-mar-25
	Total	**$ 5.492.734,34**	**$ 5.497.914,78**	
		Total, rendimiento	**$ 5.497.914,78**	

4.6.5 Amortización del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones de anticipo deducidas de las actas de recibo parcial de obras:

Tabla 26 Amortización Anticipo Contrato de Obra 478

VALOR CONTRATO	VALOR ANTICIPO	VALOR ACTA PARCIAL Nº 1	VALOR AMORTIZACIÓN
$11.624.693.108.51	$ 2,324,938,636.00	$ 402.671.268	$ 80.534.254
TOTAL			**$ 80.534.254**

4.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El reporte del estado del tiempo se encuentra de manera general para los frentes de obra en el numeral 7.3 del presente informe.

4.8 FUENTE DE MATERIALES

Durante el presente periodo, el contratista de obra adelantó actividades correspondientes a la instalación del cerramiento provisional, con el fin de delimitar y facilitar el replanteo del tramo correspondiente a Laguna Verde. Estas labores hacen parte de las actividades preliminares requeridas para la correcta ejecución del proyecto.

Se prevé que, para el siguiente periodo, el contratista inicie la ejecución de actividades de mayor representatividad presupuestal dentro del contrato,

asociadas a componentes estructurales hidráulicos y de avance físico significativo.

4.9 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el presente periodo, el contratista de obra adelantó actividades correspondientes a la instalación del cerramiento provisional, con el fin de delimitar y facilitar el replanteo del tramo correspondiente a Laguna Verde. Estas labores hacen parte de las actividades preliminares requeridas para la correcta ejecución del proyecto.

Se prevé que, para el siguiente periodo, el contratista inicie la ejecución de actividades de mayor representatividad presupuestal dentro del contrato, asociadas a componentes estructurales hidráulicos y de avance físico significativo.

4.10 SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente periodo y con fecha de corte del 31 de agosto de 2025, el contrato 478 de 2022, el contratista de obra adelantó actividades correspondientes a la instalación del cerramiento provisional, con el fin de delimitar y facilitar el replanteo del tramo correspondiente a Laguna Verde. Estas labores hacen parte de las actividades preliminares requeridas para la correcta ejecución del proyecto.

Se prevé que, para el siguiente periodo, el contratista inicie la ejecución de actividades de mayor representatividad presupuestal dentro del contrato, asociadas a componentes estructurales hidráulicos y de avance físico significativo.

4.11 PROGRAMA DE OBRA Y DE INVERSIONES

Con fecha 1 de abril de 2025, se reanudó el contrato de obra No. 478-2022, una vez superadas las causales que motivaron su suspensión. En dicha fecha, la interventoría remitió al contratista el Acta de Reinicio del contrato mediante la comunicación No. 186-1-638, en la cual se le solicitó retomar las actividades contractuales y allegar documentos esenciales para la ejecución, tales como la programación actualizada de obra, los documentos de ingreso del personal, y la actualización de pólizas y vigencias, entre otros.

Durante el presente periodo, el contratista de obra adelantó actividades correspondientes a la instalación del cerramiento provisional, con el objetivo de delimitar el área de trabajo y facilitar el replanteo del tramo correspondiente a Laguna Verde. Dichas labores hacen parte de las actividades preliminares necesarias para la adecuada ejecución del proyecto.

Asimismo, mediante comunicación radicada bajo el número 186-1-730 de fecha 7 de julio de 2025, se remitió al contratista el requerimiento relacionado con el posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Entre las situaciones observadas se encuentran: la no presentación del cronograma de obra, la ausencia de las hojas de vida del personal para el reinicio de actividades, la no entrega de la relación del equipo mínimo de trabajo, la no presentación del informe de apropiación de los estudios y diseños, la omisión en la entrega de informes mensuales y la existencia de atrasos en la ejecución de las obras.

Durante el mes de agosto de 2025, se ha venido realizando seguimiento al Consorcio Gaviones 95 respecto de estas situaciones, con el fin de verificar la adopción de medidas encaminadas a superar los atrasos y atender los posibles incumplimientos señalados. Dicho seguimiento busca garantizar el desarrollo oportuno del contrato y la adecuada ejecución de las obras.

4.12 ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y DE INVERSIONES

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes al resumen del avance financiero de las obras ejecutadas a la fecha:

Tabla 27 Avance del Contrato 478

Valor total del contrato:	$ 11.624.693.181,00	Programado o ejecutado MES	Programado o ejecutado ACUMULADO
Fecha de corte datos:	No aplica a la fecha		
PROGRAMADO / EJECUTADO			
Obra Programada	**Porcentaje**	No aplica a la fecha	91%
	Valor		$ 10.597.511.958,83
Obra Ejecutada	**Porcentaje**		8,84%
	Valor		$ 1.027.181.221,68
		Adelanto / Atraso	82,16% Atraso

El atraso que presenta contrato 478, es imputable al contratista dado que se reinició el contrato de obra el día 1 de abril de 2025, a la fecha del presente informe no ejecuto ni realizó actividades durante el periodo.

4.13 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA

4.13.1 Actas de comité de obra o actas de reunión

En la siguiente tabla se registran las diferentes reuniones y comités llevados a cabo durante el período:

Tabla 28 Actas de Comité de Obra y Reuniones

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTA N°	**FECHA**	**TEMAS TRATADOS**
54	1/08/2025	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes - Estado actas parciales del contrato
55	8/08/2025	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes
56	22/08/2025	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes - Estado actas parciales del contrato
57	29/08/2025	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes - Estado actas parciales del contrato

4.13.2 Bitácora de obra

Durante el presente periodo, el contratista de obra adelantó actividades correspondientes a la instalación del cerramiento provisional, con el fin de delimitar y facilitar el replanteo del tramo correspondiente a Laguna Verde. Estas labores hacen parte de las actividades preliminares requeridas para la correcta ejecución del proyecto.

Bitácora de obra Anexo 1.A

4.14 GESTIÓN AMBIENTAL

El seguimiento a la gestión ambiental se encuentra anexa al numeral N°.4A

4.15 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)

El seguimiento a la gestión ocupacional se encuentra anexa al numeral N°.4B

4.16 GESTIÓN SOCIAL

El seguimiento a la gestión social se encuentra anexa al numeral N°.4C

4.17 ESTADO DEL CONTRATO

Estado del contrato 478 del 20/05/2022: Para el presente periodo y con fecha de corte del 31 de agosto de 2025, el contrato 478 de 2022,el contratista de obra adelantó actividades correspondientes a la instalación del cerramiento provisional, con el fin de delimitar y facilitar el replanteo del tramo correspondiente a Laguna Verde. Estas labores hacen parte de las actividades preliminares requeridas para la correcta ejecución del proyecto.

Asimismo, mediante comunicación radicada bajo el número 186-1-730 de fecha 7 de julio de 2025, se remitió al contratista el requerimiento relacionado con el posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Entre las situaciones observadas se encuentran: la no presentación del cronograma de obra, la ausencia de hojas de vida del personal para el reinicio de actividades, la no entrega de la relación del equipo mínimo de trabajo, la no presentación del informe de apropiación de los estudios y diseños, l|a omisión en la entrega de informes mensuales y la existencia de atrasos en la ejecución de las obras.

Se espera que el Consorcio Gaviones 95 adopte las medidas necesarias para superar los atrasos y atender los posibles incumplimientos señalados, con el fin de garantizar el desarrollo oportuno del contrato.

5 CONTRATO DE OBRA Nº. 479 DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Datos del contrato 479 del 10/02/2022.

A continuación, se observan las generalidades del contrato 479 Consorcio Estabilización Vial:

Tabla Suscripción, Legalización, Plazo y Valor CTO 479

ENTIDAD CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
CONTRATO DE OBRA N°:	**COP- 479 del 10/02/2022**
OBJETO:	"Contrato para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto " mejoramiento de vías terciarias en Bogotá", del sistema general de regalías - SGR identificado con código BPIN 2018000050020 (san Antonio ii (k6+910-k0+000), unión tunales y animas bajas.").
PROCESO DE SELECCIÓN N°:	LP – 006 – 2021
DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL**
NIT:	**901.563.835-7**
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	- MAQUINAS AMARILLAS S.A.S (70%) NIT 901.460.130-0
	- TERRABLANCA S.A.S (30%) NIT 900.459.311-1
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	Carrera 17 N° 142 – 25 BOGOTA D.C.
TELÉFONO:	601-7023060
MODIFICATORIO N°.1	El párrafo segundo de la Cláusula Cuarta del Contrato 479 de 2022 - Plazo del Contrato y se adiciona un parágrafo más, estableciéndose de la siguiente manera:
	"El contrato consta de dos (2) tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCIÓN y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, las cuales podrán realizarse de manera simultánea. Parágrafo 1. Los tramos o kilómetros que pasen a etapa de obra deberán contar con las respectiva apropiación y validación propia de las actividades de preconstrucción".
OTROS DATOS DEL CONTRATO	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/02/2022
FECHA DE INICIO ETAPA PRECONSTRUCCION	3 de marzo de 2022
VALOR INICIAL:	$ 12.494.588.139,00 Incluido IVA sobre utilidad
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 12.494.588.139,00 Incluido IVA sobre utilidad
PLAZO INICIAL:	Once (11) meses
PRORROGA Nº. 1	Dos (2) meses y quince (15) días
PLAZO TOTAL ACTUALIZADO PORROGA 1.	Trece (13) meses y quince (15) días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 de febrero de 2023

FECHA INICIO CONTRUCCIÓN	18 de julio de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	14 de abril de 2023 dos (02) mes.
AMPLIACIÓN 1 - SUSPENSIÓN 1	UN (01) MES
AMPLIACIÓN 2- SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS
AMPLIACIÓN 3- SUSPENSIÓN 1	TREINTA Y DOS (32) DÍAS
AMPLIACIÓN 4- SUSPENSIÓN 1	DIECISÉIS (16) DÍAS
AMPLIACIÓN 5- SUSPENSIÓN 1	SIETzE (7) DÍAS
AMPLIACIÓN 6- SUSPENSIÓN 1	QUINCE (15) DÍAS
REINICIO N° 1	10 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA N°. 2	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2024
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE AGOSTO DE 2024
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES Y DIECISÉIS (16) DIAS PARTIR DEL 17 DE AGOSTO AL 2 DE OCTUBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES Y VEINTICINICO (25) DIAS A PARTIR DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE ENERO DE 2025
AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES A PARTIR DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2025
AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 2	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 27 DE FEBRERO AL 27 DE ABRIL DE 2025
REINICIO N° 2	1 DE ABRIL DE 2025
PRÓRROGA N° 3	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DE 2025
PRÓRROGA N° 3	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ACTUALIZADO	VEINTIOCHO (28) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	9 DE AGOSTO DE 2025
VALOR ANTICIPO:	Hasta un 20% del valor básico del contrato
INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S
SUPERVISOR:	UAERMV

5.1.2 Pólizas o garantías del contrato de obra

El contratista otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:

Tabla 29 Datos de las Pólizas Contrato 479

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**NACIONAL DE SEGUROS**			
AMPARO	**PÓLIZA N°**	**CERTIFICADO O ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**EXPEDIDA / MODIFICADA SEGÚN**
CUMPLIMIENTO	400038644	0	23-feb-22	Contrato

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**NACIONAL DE SEGUROS**			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	0	23-feb-22	Contrato
CUMPLIMIENTO	400038644	2	26-abr-22	Acta inicio
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	2	26-abr-22	Acta inicio
CUMPLIMIENTO	400038644	3	21-jul-22	Modificación N°. 1 y prórroga N°. 1 13/07/2022
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	3	21-jul-22	Modificación N°. 1 y prórroga N°. 1 13/07/2022
CUMPLIMIENTO	400038644	4	27-abr-23	Suspensión N°. 1 - 14/04/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	4	27-abr-23	Suspensión N°. 1 - 14/04/2023
CUMPLIMIENTO	400038644	5	18-ago-23	Ampliación 1,2 ,3 y 4 a la suspensión
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	5	22-ago-23	Ampliación 1,2 ,3 y 4 a la suspensión
CUMPLIMIENTO	400038644	7	13-oct-23	Prorroga N°. 2
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	7	13-oct-23	Prorroga N°. 2
CUMPLIMIENTO	400038644	11	4-abr-25	Reinicio 2
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	400038646	10	4-abr-25	Reinicio 2
CUMPLIMIENTO	400038644	15	12-jun.25	Prórroga N°3
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	400038646	11	12-jun.25	Prórroga N°3

Tabla 30 Pólizas Actualizadas a la Fecha Contrato 479

AMPARO	**REQUISITOS CONTRACTUALES**		**DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA**		
	Vigencia contractual	**% contra**	**Desde**	**Hasta**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO					
a). Cumplimiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	10%	3-mar-22	9-feb-26	$ 1.249.458.813,90
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	100%	3-mar-22	9-feb-26	$ 2.498.917.627,80

AMPARO	REQUISITOS CONTRACTUALES		DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA		
	Vigencia contractual	% contra	Desde	Hasta	Valor asegurado
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Plazo del contrato y tres (3) años más.	5%	3-mar-22	9-ago-26	$ 624.729.406,95
d). Estabilidad y calidad de las obras.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.	20%	26-jun-24	9-ago-30	$ 2.498.917.627,80
RESPONSABILIDAD CIVIL					
a). Predios labores y operaciones	Igual al período de ejecución del contrato.	5%	15-sep-23	9-ago-28	624,729,407.00
b). Contratistas y subcontratistas	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			312,364,703.00
c) Perjuicios extrapatrimoniales	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			312,364,703.00
d) Responsabilidad civil patronal	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			312,364,703.00
e) Vehículos propios y no propios	Igual al período de ejecución del contrato.	5%			312,364,703.00

5.1.3 Otrosí, Adición y prórroga

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosíes, adiciones en valor y prórrogas al contrato de Obra 479:

Tabla 31 Otrosíes y Adiciones Contrato de Obra 479

DOCUMENTO	FECHA	PRORROGA	VALOR	MOTIVO
MODIFICACIÓN Nº 1 y PRORROGA Nº 1 de 2022	13/07/2022	2 meses y 15 días	N/A	Modificar el párrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato prorrogar el plazo del contrato

MODIFICACIÓN Nº 2 y PRORROGA Nº 2 de 2022	10/10/2023	8 meses y 15 días	N/A	Modificar el párrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato prorrogar el plazo del contrato
MODIFICACIÓN N°3	30/11/2023	N/A	N/A	Modificar el formulario 1. Propuesta Económica Grupo 2.
PRÓRROGA N°3	09/06/2025	2 meses	N/A	Modificar el párrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato prorrogar el plazo del contrato
PRÓRROGA N°3	08/08/2025	4 meses	N/A	Modificar el párrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato prorrogar el plazo del contrato

Con fecha de corte del 8 de agosto de 2025, se da aval a la prórroga al contrato de obra 479 de 2025 por un término de 4 meses calendario; es decir desde el 10 de agosto de 2025 al 9 de diciembre de 2025, Anexo 2.A

5.1.4 Suspensiones y reinicios al contrato de obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las suspensiones y/o reinicios al CONTRATO DE OBRA 479:

Tabla 32 Suspensiones y Reinicios Contrato de Obra 479

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión / Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento	Suspensión	Suspensión			
Suspensión N°.1	-	21-abr-23	21-abr-23	20-jun-23	DOS (2) MESES	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°1	20-jun-23	21-jun-23	20-jul-23	UN (1) MES	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°2	19-jul-23	21-jul-23	31-jul-23	ONCE (11) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión / Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento	Suspensión	Suspensión			
Suspensión N°.1	Ampliación N°3	1-ago-23	1-ago-23	31-ago-23	TREINTA Y UN (31) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°4	30-ago-23	1-sep-23	1-oct-23	TREINTA Y UN (31) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico.
Suspensión N°.1	Ampliación N°5	29-sep-23	2-oct-23	23-oct-23	VEINTIDÓS (22) DÍAS	-	La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico.
Suspensión N°.1	Ampliación N°6	23-oct-23	24-oct-23	6-nov-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°7	3-nov-23	7-nov-23	20-nov-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°8	20-nov-23	21-nov-23	4-dic-23	QUINCE (15) DIAS		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Suspensión N°.1	Ampliación N°9	4-dic-23	5-dic-23	4-feb-24	DOS (2) MESES		La entrega completa y/o corregida y/o del diseño geométrico
Reinicio N°1	N/A	5-feb-24	N/A	N/A	N/A	5-feb-24	Se superan las causales que dieron lugar a la suspensión N° 1.
Suspensión N°2	-	17-abr-24	17-abr-24	17-jun-24	DOS (2) MESES	17/06/2024	Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión N°2	Ampliación N°1	17-jun-24	17-jun-24	17-ago-24	DOS (2) MESES		No se superan los motivos que motivaron la suspensión del contrato
Suspensión N°2	Ampliación N°2	1-ago-24	17-ago-24	1-oct-24	UN (1) MES Y DIECISÉIS DÍAS		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión / Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento	Suspensión	Suspensión			
Suspensión N°2	Ampliación N°3	1-oct-24	1-oct-24	1-nov-24	UN (1) MES		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión N°2	Ampliación N°4	1-nov-24	1-nov-24	21-ene-25	DOS (2) MESES y VEITE (20) DÍAS		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión N°2	Ampliación N°5	24-ene-25	21-ene-25	21-feb-25	UN (1) MES		Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Suspensión N°2	Ampliación N°6	22-feb-25	21-feb-25	1-abr-25	UN (1) MES Y DIEZ DÍAS	1-abr-25	Tramites y aprobaciones requeridas para la incorporación de recursos de la interventoría
Reinicio N°2	N/A	1-abr-24	N/A	N/A	N/A	1-abr-24	Se superan las causales que dieron lugar a la suspensión N°.2

5.1.5 Actas de Modificaciones de Cantidades de obra

Durante el desarrollo del contrato no se realizaron modificaciones de cantidades de obra al contrato Nº. 479.

Tabla 33 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obra

ACTA MODIFICATIVA N°	FECHA	MOTIVO			
		AJUSTE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	ÍTEMS NO PREVISTOS	ADICIONAL EN VALOR	COMENTARIOS
Balance N°1 cantidades	17-oct-23	Se realiza ajuste de las cantidades de acuerdo a la inclusión de ítems no previstos	Se realiza inclusión de ítems no previstos dado que se presentaron actividades en obra no contempladas	N/A	Se realiza inclusión de ítems no previstos, se realiza el balance de obra N° 1 dada la necesidad del ajuste a los precios de acuerdo con el índice de costos de la construcción de obras civiles esta actualización se realiza cada mes calendario

5.1.6 Ítems o precios no previstos

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a la incorporación de ítems o precios no previstos inicialmente en la propuesta económica precontractual del contrato de obra 479:

Tabla 34 Ítem o Precios No Previstos

Acta de precios no previstos						
Ítem	**Descripción**	**Un**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Valor total**	**Acta de modificación N°.**
NP-2	Construcción de filtro de Drenaje. Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar.	ml	11.215,22	$ 206.609,00	$ 2.317.165.389,00	N° 1
NP-3	Excavación Manual Zanjas (Incluye acarreo al acopio)	m3	417,56	$ 42.380,00	$ 17.696.193,00	N° 1
NP-4	Excavaciones varias en roca. Incluye cargue	m3	388,53	$ 89.661,00	$ 34.835.988,00	N° 1
NP-5	Limpieza de alcantarillas (incluye limpieza de tubería de 24", limpieza de descoles en una longitud de máximo 5 metros, incluye cargue de material) (No incluye transporte ni disposición en sitio autorizado).	UND.	59	$ 65.709,00	$ 3.876.831,00	N° 1
NP-6	Limpieza de alcantarillas (incluye limpieza de tubería de 36", limpieza de descoles en una longitud de máximo 5 metros, incluye cargue de material) (No incluye transporte ni disposición en sitio autorizado).	UND.	41	$ 148.414,00	$ 6.084.974,00	N° 1
NP-7	Limpieza y rocería de cunetas en tierra	m2	10.983,00	$ 2.612,00	$ 28.687.596,00	N° 1
NP-8	Traslado de cerca en alambre púas, incluye remoción de cerca, instalación parcial e instalación definitiva.	ml	14.704,19	$ 9.809,00	$ 144.233.430,00	N° 1
NP-9	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión de tipo manto temporal	m2	756,5	$ 33.808,00	$ 25.575.752,00	N° 1
NP-10	Disposición de escombros (RCD) en sitio autorizado	Viaje (12m3)	Por definir en Obra	$ 115.577,00	Por definir en Obra	N° 1
NP-11	Construcción para Berma/Cuenta tipo 1. Área transversal 0,14m2. Resistencia concreto 3500psi	ml	9.049,12	$ 155.086,00	$ 1.403.391.824,00	N° 1
NP-12	Construcción para Berma/Cuenta tipo 2. Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi	ml	1.476,00	$ 180.584,00	$ 266.542.524,00	N° 1

Para el presente periodo se tiene pendiente la aprobación de los ítems no previstos por parte de la Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación Y Mantenimiento Vial.

5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO Y ACUMULADAS

5.2.1 Etapa de Preconstrucción

En la siguiente tabla se mencionan actividades realizadas en la etapa de preconstrucción.

Tabla 35 Documentación Organizativa Inicial

REQUERIMIENTO	**REFERENCIA CONTRACTUAL**	**ESTADO DEL DOCUMENTO**
CEV/22-143	INFORME DEFINITIVO D6E APROPIACION DE DISEÑOS N°. 03 TRAMOS 1,2,3,4,5,8 Y 9	El 12 enero de 2023, hacen entrega del informe definitivo de apropiación de los diseños de los tramos No 1 al 5 Sector Tunales, 8 y 9 San Antonio y Animas Bajas. Teniendo en cuenta los diseños suministrados por la UAERMV. En el cual el Consorcio describe el resultado de la revisión de los diseños, los ajustes propuestos y los anexos correspondientes

5.2.2 Etapa de construcción

En la siguiente tabla se registran las actividades de obra de construcción del CONTRATO DE OBRA 479.

Tabla 36 Actividades de Construcción Contrato 479

UBICACIÓN / ABCISADO	**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS**
San Antonio, vereda El Toldo	K4+497 a K4+483 Alistamiento de módulos intermedios K4+444 a K4+400 Alistamiento de módulos intermedios. K4+463 Excavación para estructura de encole. K4+206 Izq Armado de refuerzo para estructura de encole. K1+550 Instalación de concreto In Situ para estructura de encole. **/ K4+333 a K4+475 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta. K4+463 HolaArmado de acero de refuerzo K4+206 Izq Instalación de concreto In Situ para base de estructura de encole K1+550 Desencofrado de estructura de encole. Revestimiento de porosidades	Se realizan construcción de filtro con instalación de geotextil NT 2500, tubería perforada 4", relleno con material drenante 1"-3". Se realizó excavación mecánica para filtros Se realiza replanteo, excavaciones para filtros de las abscisas hasta, Se realizó excavación y retiro de material para la construcción de cunetas. Excavación para filtro 48*1,24*0,60 desde la abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde izquierdo. Instalación de geotextil, tubo perforado, material pétreo filtrante para filtro 48*1,24*0,60 desde la abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde izquierdo. Sello de filtro con b-200 88*0,60*0,20 desde la abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde izquierdo. Excavación para filtro 48*1,24*0,60 desde la abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde izquierdo.

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	**/ K4+397 a K4+442 Instalación de concreto In Situ para 11 módulos de cuneta. K4+482 a K4+497 Instalación de concreto In situ para 4 módulos de cuneta. K4+206 Izq Encofrado de estructura de descole. K4+464 Retiro de material de talud desprendido en lugar de excavación. **/ K4+390 a K4+375 Alistamiento nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta. K4+373 a K4+337 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta. K4+329 a K4+306 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta. K4+206 Izq Instalación de concreto In Situ para estructura de encole (doble poceta) K4+464 Instalación de concreto de baja densidad solado en estructura de encole **/ K4+300 a K4+329 Instalación de concreto In Situ para 6 módulos de cuneta. K4+373 a K4+337 Instalación de concreto In Situ para 10 módulos de cuneta. K4+375 a K4+390 Instalación de concreto In Situ para 5 módulos de cuneta. K4+206 Der Instalación de concreto de baja densidad (solado) para doble poceta. K4+464 Instalación de concreto In Situ para base de estructura de encole	Instalación de geotextil, tubo perforado, material pétreo filtrante para filtro 48*1,24*0,60 desde la abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde borde izquierdo. Sello de filtro con b-200 88*0,60*0,20 desde la abscisa K1+460 a la abscisa K1+425borde izquierdo. instalación de geotextil, tubo perforado, material pétreo filtrante para filtro 48*1,24*0,60 desde la abscisa K1+400 a la abscisa K1+335 borde izquierdo. Perfilación de Berna-Cuneta, retiro de remanente de fresado estabilizado de la abscisa K4+800 a la K4+680 , conformación de rasante. Extendido y compactación material de relleno B - 200 para conformación de cuneta de la abscisa K5+410 a la K+340. Se realizan trabajos de mejoramiento al material granular instalado de B-200 con el fin de alistar segmento libre para fundir cunetas. Sobre el K2+150 donde está ubicada la alcantarilla se trabajó en la protección de entibados de laterales, Se fundió placa de descarga en la alcantarilla . Se realizan trabajos de instalación de formaleta para fundir cunetas, limpieza de formaletas. Instalación de concreto reforzado para cuneta en concreto de 3.000 psi en sitio sobre el K+238, K5+225,K5+216. Sobre la abscisa K2+150 en la alcantarilla descole costado derecho de la vía continúan trabajos de figuración y amarre de acero para aletas.
Unión Tunales K0+150 a K2+271 y K2+270 a K2+395		Se hizo excavación para filtro y Se inició lleno del filtro. Se realiza instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k0+120 al k0+250 costado izquierdo. Se realiza instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k0+110 al k2+270 costado derecho.
Unión Tunales K1+554	* Se realiza alistamiento de 16 módulos entre k1+317 a k1+375. * Se realiza alistamiento para instalación de 6 módulos módulos intermedios entre k1+285 a k1+305.	Se realizó figurado del acero para la estructura del encole y descole de la alcantarilla ubicada en la abscisa. Se funde la estructura del encole de la alcantarilla ubicada en la abscisa k1+554

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	* Se evidencia que hace falta fundir 1 módulo en la+205, se solicita al área social poder realizar el acercamiento con el dueño del punto de agua para desviar la tubería y así poder fundir el módulo. **/ * Se realiza fundida de 2 módulos intermedios entre k1+290 a k1+300. * Se realiza fundida de 8 módulos normales entre k1+305 a k1+375. * Se evidencia que hace falta fundir 1 módulo en la+205, se solicita al área social poder realizar el acercamiento con el dueño del punto de agua para desviar la tubería y así poder fundir el módulo. **/ * Se realiza fundida de 9 módulos entre k1+350 a k1+380. Se recomienda mayor vibrado del concreto y mejorar la distribución del acero en las formaletas para evitar que el acero quede descubierto 0 expuesto. * Se retira formaletas en tramos ya fundidos del k1+305 al k1+345 * Se realiza alistamiento de 9 módulos intermedios entre k1+311 a k1+341. Se recomienda mayor vibrado del concreto y mejorar la distribución del acero en las formaletas para evitar que el acero quede descubierto o expuesto. * Se evidencia el alistamiento de 6 módulos intermedios entre k1+379 a k1+397 * Se realiza fundida de 8 módulos intermedios entre k1+310 a k1+340. Se recomienda mayor vibrado del concreto y mejorar la distribución del acero en las formaletas para evitar que el acero quede descubierto o expuesto. * Se evidencia la fundida de 7 módulos para cunetas entre k1+382 a k1+400. * Se realiza replanteo de bordes de vía entre k1+310 a k1+340. * Se realiza desencofrado de módulos de cunetas entre k1+345 a k1+380 9 UND. * Se evidencia que hace falta fundir 1 módulo en k1+205, se solicita al área social poder realizar el acercamiento con el dueño del punto de agua para	Se realiza revisión de excavación para construcción de filtro desde la abscisa K1+165-k1+285 Se realiza revisión de excavación para construcción de filtro desde la abscisa K1 +355-k1+290 costado izquierdo Instalación de geotextil, tubo perforado y material pétreo desde la abscisa k1+200 a la abscisa k1+155. Instalación de geotextil, tubo perforado y material pétreo para construcción de filtro desde la abscisa k1+155 a la abscisa k1+100.

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	desviar la tubería y así poder fundir el módulo.	
Unión Tunales K2+395	Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentias, limpieza de cunetas y barrido general. Esta actividad se reanuda desde tramo 4 k0+000 y hasta k0+230. * Se realiza alistamiento y encofrado de módulos intermedios. Se recomienda mejorar la pista existente con material granular. Esta actividad se desarrolla desde k1+340 a k1+435(20und). * Se realiza fundía de módulos una vez revisada y aprobada la pista existente. Se evidencia mejoramiento de material. K1+340 a k1+435(20und). * Se realiza desencofrado de módulos intermedios. Esta actividad se desarrolla desde k1+340 a k1+390(12und). * Se realiza fundía de módulos una vez revisada y aprobada la pista existente. Se evidencia mejoramiento del material. K1+395 a k1+435(8und). * Se realiza cimbrado y delineación de carpeta de fresado para corte de los módulos de cunetas. K1+900- k2+050. * Se realiza desencofrado de módulos intermedios. Esta actividad se desarrolla desde k1+395 a k1+430(8und). * Se realiza cimbrado y delineación de carpeta de fresado para corte de los módulos de cunetas. K1+910- k2+020 Se realiza fundida de módulos para cunetas. K1+910- k1+960. Costado izquierdo. * Se realiza desencofrado y retiro de formaletas de módulos para cunetas. K1+910- k1+960. Costado izquierdo. Adicionalmente se agrega material para el atraque de los hombros. * Se realiza barrido general de vía y cunetas. * Se realiza alistamiento de pista (compactación y extendido de material). K1+980 a K2+050. Costado izquierdo.	Se realizó armado y figurado de acero de la alcantarilla. Se fundió la zapata de la estructura del encole de la alcantarilla ubicada en la alcantarilla de la abscisa k2+395. Se termina con la instalación de la formaleta de aletas de descole de la alcantarilla k2+395 del tramo 1 y se funde en concreto de 3500 psi Excavación en borde de vía para la construcción de cuneta desde la abscisa K2+290 hasta la abscisa K2+330 Instalación de acero y formaleta desde la abscisa K2+205 a la K2+270, instalación de concreto borde derecho. Vaciado de concreto para construcción de cuneta desde la abscisa k2+395 hasta la abscisa k2+360 borde izquierdo. Perfilado y compactación para construcción de cunetas desde la abscisa k2+390 hasta la abscisa k2+435 borde izquierdo y derecho. Vaciado de concreto para construcción de cunetas en intermedios de la abscisa k2+390 a la abscisa k2+420 costado derecho. Vaciado de concreto para construcción de cunetas intercaladas desde la abscisa k2+390 hasta la abscisa k2+420 costado derecho. Desencofrado de formaleta para construcción de cuneta desde la abscisa k2+530 a la abscisa k2+545 borde izquierdo. Desencofrado de formaleta para construcción de cuneta desde la abscisa k2+530 a la abscisa k2+579 borde derecho. Excavación y replanteo para construcción de cunetas desde la abscisa k2+590 hasta la abscisa k2+620 Instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k2+576 al k2+590 costado izquierdo. Instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k2+580 al k2+590 costado derecho. Tramo 2: * se instalan formaletas de los módulos de cunetas(12 und). Se recomienda realizar buen manejo de aguas para evitar pérdida de finos en módulos ya compactados. K0+800-k0+880. * Se realiza alistamiento de intermedios para posterior fundida. * K0+800-k0+880.

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
		* Después de la inspección realizada en campo, se aprueban 12 cunetas(módulos), para su vaciado de concreto. * Se realiza el vaciado con concreto de 12 módulos de cunetas. * Se realiza alistamiento de 10 módulos para vaciado de concreto desde K0+800 hasta K0+870. * Se realiza el vaciado con concreto a 16 módulos de cunetas. * Se realiza el retiro de 9 módulos ya fundidos y se realiza aplicación de antisol para su curado. K0+750 a k0+780. * Se realiza replanteo, alistamiento y nivelación de sitio para módulos del k0+800 al K0+880 * Se lleva a cabo compactación de base mejorada, según recomendación de interventoría Tramo 1 instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k2+735 al k2+775 costado izquierdo. instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k2+742 al k2+775 costado derecho.
Unión Tunales T1 K0+000 a K2+951.39 T2 K0+000 a K2+042,66 T3 K0+000 a K0+254,009 T4 K0+000 a K0+703,08 T5 K0+000 a K1+667,17		Se realiza instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k0+120 al k0+250 costado izquierdo. Se realiza instalación de formaleta, instalación de acero y vaciado de concreto para construcción de berma cuneta intercalada desde el k0+110 al k2+270 costado derecho. Se realiza excavación, instalación de geotextil, instalación de tubo perforado e instalación de material pétreo filtrante para construcción de filtro desde la abscisa k0840 a la abscisa k0+920 costado izquierdo. Se realiza excavación, instalación de geotextil, instalación de tubo perforado e instalación de material pétreo filtrante para construcción de filtro desde la abscisa k0+920 a la abscisa k0+950 costado izquierdo. Se realiza revisión de nivelación de material pétreo para construcción de filtro desde la abscisa K0+735-k0+860 lado izquierdo. Se realiza revisión por parte de topografía de nivelación de material pétreo para construcción de filtro desde la abscisa K0+000-k0+045 costado izquierdo. Se realiza revisión por parte de topografía de nivelación de material pétreo para construcción de filtro desde la abscisa K0+860-k0+980 costado izquierdo.

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
		Se realizó armado y figurado de acero de la alcantarilla. Se fundió la zapata de la estructura del encole de la alcantarilla ubicada en la alcantarilla de la abscisa K2+395. Se termina con la instalación de la formaleta de aletas de descole de la alcantarilla K2+395 del tramo 1 y se funde en concreto de 3500 PSI Se realizo levantamiento topográfico para verificación de la adaptación del diseño geométrico K0+ 890, realizando limpieza y alistando pista para la construcción de cunetas. Limpieza, excavación y compactación con apisonador desde K2+145 hasta K2+160 Excavación desde la abscisa K0+160 hasta la abscisa K0+240 Excavación y replanteo para cuneta desde la abscisa K2+175 hasta la abscisa K2+205 borde Izquierdo, Se dejó una ventana desde la abscisa K2+165 hasta la abscisa K2+175 Vaciado de concreta cuneta borde derecho desde la abscisa K0+065 hacia mayores intercalado cada dos metros. Excavación desde la abscisa K0+340 hasta la abscisa K0+365 Este tramo se realizó con martillo neumático. Y pasando el puente desde la abscisa K0+380 hasta la abscisa K0+420 Excavación para construcción de filtro desde la abscisa k0+950 hasta la abscisa k0+895. Instalación Geotextil, Instalación tubo perforado, instalación Material pétreo filtrante desde la abscisa K0+740 a la K0+765. Construcción de filtro, excavación, instalación de geotextil, instalación de tubo perforado e instalación de material pétreo desde la abscisa k1+400 a la abscisa k1+345 costado derecho. Limpieza de alcantarilla en la abscisa k0+130.

5.2.3 Valores ejecutados

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los valores contractuales actualizados, valores ejecutados en el período, valores acumulados y los saldos:

Tabla 37 Valores Ejecutados Contrato 479

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	$ 8.948,00	432,07	$ 3.866.162,36	524,74	$ 4.695.373,52	956,81	$ 8.561.535,88
A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	$ 157.212,00	432,07	$ 67.926.588,84	524,74	$ 82.495.424,88	956,81	$ 150.422.013,72
A29	Retiro de tubería. Incluye cargue, retiro y disposición en sitio autorizado.	m	$ 595.728,00	16,5	$ 9.829.512,00		$ 0,00	16,5	$ 9.829.512,00
A27	Relleno en recebo común (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	m3	$ 245.641,00	163,273	$ 40.106.739,53	89,74	$ 22.043.823,34	253,013 8001	$ 62.150.562,87
A10	Suministro e instalación de tubería para alcantarillado D=36" (900mm).	m	$ 1.774.025,00	59	$ 104.667.475,00	39	$ 69.186.975,00	98	$ 173.854.450,00
A14	Demolición de estructuras en concreto reforzado. Incluye cargue y retiro a sitio autorizado.	m3	$ 284.706,00	27,11	$ 7.718.379,66		$ 0,00	27,11	$ 7.718.379,66
A18	Concreto de limpieza grava común. Resistencia 2000 PSI (14 Mpa). Incluye transporte, suministro, colocación y curado.	m3	$ 720.491,00		$ 0,00	1,12	$ 806.949,92	1,12	$ 806.949,92
A20	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)	m3	$ 559.452,00	41,93	$ 23.457.822,36		$ 0,00	41,93	$ 23.457.822,36

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
A16	Acero de refuerzo; incluye Suministro, Figurado y Fijación.	Kg	$ 7.811,00	9179,19	$ 71.698.653,09	1576,4	$ 12.313.260,40	10755,59	$ 84.011.913,49
A02	Junta fría en estructuras de concreto e=25cm. Incluye adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido y la instalación de cinta PVC para sellar e impermeabilizar juntas frías en estructuras de concreto.	m	$ 51.072,00	105,9	$ 5.408.524,80	4	$ 204.288,00	109,9	$ 5.612.812,80
A01	Concreto para Alcantarilla. Resistencia 24,5Mpa hasta 28Mpa (3500psi - 4000psi).	m3	$ 894.878,00	85,33	$ 76.359.939,74	54,97	$ 49.191.443,66	140,3	$ 125.551.383,40
	CUNETAS								
A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	$ 8.948,00	3851,48	$ 34.463.043,04	498,45	$ 4.460.130,60	4349,93	$ 38.923.173,64
A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	$ 157.212,00	5103,35	$ 802.307.860,20	782,07	$ 122.950.788,84	5885,42	$ 925.258.649,04
A27	Relleno en recebo común (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	m3	$ 245.641,00	3477,19	$ 854.140.428,79	1166,29	$ 286.488.641,89	4643,48	$ 1.140.629.070,68
A16	Acero de refuerzo; incluye Suministro, Figurado y Fijación.	Kg	$ 7.811,00	8052,46	$ 62.897.765,06	10070,6	$ 78.661.456,60	18123,06	$ 141.559.221,66

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
A03	Construcción de Berma/Cuneta de 0,70m de ancho y espesor 0,20m, en Concreto reforzado de 3500 psi; no incluye acero de refuerzo, incluye corte de dilatación cada 2,00m, suministro, instalación y conformación de la superficie de apoyo.	m	$ 152.726,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
	SUBDRENES								
A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	$ 8.948,00	2056,58	$ 18.402.277,84	315,91	$ 2.826.762,68	2372,49	$ 21.229.040,52
A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	$ 157.212,00	4441,43364	$ 698.246.665,41	753,87	$ 118.517.410,44	5195,30364	$ 816.764.075,85
A03	Construcción de filtro de Drenaje. Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 3", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar.	m	$ 159.789,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
	MURO GAVIONES								
A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	$ 8.948,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	$ 157.212,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
A27	Relleno en recebo común (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación. No incluye transporte)	m3	$ 245.641,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
A20	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)	m3	$ 559.452,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
A19	Gaviones de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	$ 340.796,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS								
NP-2	Construcción de filtro de Drenaje. Dimensiones 0,60m x 0,67m; Incluye material granular drenante entre 1" y 2", tubería perforada de 4" y geotextil NT 2500 o similar.	ml	$ 206.609,00	9328,4	$ 1.927.331.395,60	1875,28	$ 387.449.725,52	11203,68	$ 2.314.781.121,12
NP-3	Excavación Manual Zanjas (Incluye acarreo al acopio)	m3	$ 42.380,00	343,06	$ 14.538.882,80	329,47	$ 13.962.938,60	672,53	$ 28.501.821,40
NP-4	Excavaciones varias en roca. Incluye cargue	m3	$ 89.661,00	3636,72	$ 326.071.951,92	721,58	$ 64.697.584,38	4358,3	$ 390.769.536,30

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NP-5	Limpieza de alcantarillas (incluye limpieza de tubería de 24", limpieza de descoles en una longitud de máximo 5 metros, incluye cargue de material) (No incluye transporte ni disposición en sitio autorizado).	UND.	$ 65.709,00	12	$ 788.508,00		$ 0,00	12	$ 788.508,00
NP-6	Limpieza de alcantarillas (incluye limpieza de tubería de 36", limpieza de descoles en una longitud de máximo 5 metros, incluye cargue de material) (No incluye transporte ni disposición en sitio autorizado).	UND.	$ 148.414,00	2	$ 296.828,00		$ 0,00	2	$ 296.828,00
NP-7	Limpieza y rocería de cunetas en tierra	m2	$ 2.612,00	7058,26	$ 18.436.175,12		$ 0,00	7058,26	$ 18.436.175,12
NP-8	Traslado de cerca en alambre púas, incluye remoción de cerca, instalación parcial e instalación definitiva.	ml	$ 9.809,00	2578,64	$ 25.293.879,76		$ 0,00	2578,64	$ 25.293.879,76
NP-9	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión de tipo manto temporal	m2	$ 33.808,00	100	$ 3.380.800,00	1850	$ 62.544.800,00	1950	$ 65.925.600,00
NP-10	Disposición de escombros (RCD) en sitio autorizado	Viaje	$ 115.577,00		$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00
NP-11	Construcción para Berma/Cuenta tipo 1. Área transversal 0,14m2. Resistencia concreto 3500psi	ml	$ 155.086,00	1396,6	$ 216.593.107,60	2231,86	$ 346.130.239,96	3628,46	$ 562.723.347,56
NP-12	Construcción para Berma/Cuenta tipo 2. Área transversal 0,16m2. Resistencia concreto 3500psi	ml	$ 180.584,00	466	$ 84.152.144,00		$ 0,00	466	$ 84.152.144,00

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
SUBTOTAL DE OBRA		**$ 12.155.451.055,00**			$ 5.498.381.510,52		$ 1.729.628.018,23		$ 7.228.009.528,75
	GESTION AMBIENTAL	1,81%	$ 220.013.664,10		$ 63.200.303,44		$ 31.306.267,13		$ 94.506.570,57
	IMPLEMENTACIÓN DE PMT	0,78%	$ 94.812.518,23		$ 27.235.489,89		$ 13.491.098,54		$ 40.726.588,43
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19	0,20%	$ 24.310.902,11		$ 2.770.973,56				$ 2.770.973,56
TOTALES		**$ 12.494.588.139,43**			**$ 5.591.588.277,00**		**$ 1.774.425.384,00**		**$ 7.366.013.661,00**
PORCENTAJE EJECUCIÓN ACUMULADA					**44,75%**		**14,20%**		**58,95%**
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR									**41,05%**
AMORTIZACION ANTICIPO		20%	$ 2.498.917.627,89		$ 1.118.317.655,00		$ 354.885.077,00		$ 1.473.202.732,00
Total pagado después de amortización					$ 4.473.270.622,00		$ 1.419.540.307,00		$ 5.892.810.929,00

Para el presente periodo se presenta un avance financiero acumulado del 58,95%, se encuentra en revisión el acta N°8 y realizan mesas de trabajo entre CEV , UAERMV y la Interventoría, para la revisión de las mismas.

5.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria y equipo destinados a la ejecución de las obras:

Tabla 38 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 479

N°	TIPO DE EQUIPO	Equipo mín. requerido	CANT.	MARCA	MODELO	CAPACIDAD	COMENTARIOS
1	ESTACIÓN TOTAL	SI	1	HITARGET	HTS-420R S/N: H232590	N/A	CALIBRACIÓN VIGENTE HASTA 3-09-2025
2	NIVEL AUTOMÁTICO	SI	1	TOPCON	AT-B4A S/N: JY5238	N/A	CALIBRACIÓN VIGENTE HASTA 23-10-2025

5.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA

5.4.1 Control de personal de obra

En la siguiente tabla se relaciona el personal que se presentó cambio o modificación para el reinicio de actividades de obra:

Tabla 39 Control de Personal de Obra

Personal Consorcio Estabilización Vial			
N°	**Nombre del personal de obra**	**N° identificación**	**Cargo**
1	Ing. Hernando Laverde	1,032,362,624	Director de obra
2	Ing. Alejandra Cangrejo	1.020.732.799	Coordinadora de proyectos
3	Ing. Richard Betancourt Rodríguez	1.069.751.169	Residente técnico
4	Gloria Liliana Sepúlveda Garzón	52.499.577	Coordinadora HSEQ
5	Elvia Alejandra Limas Plazas	11.022.351.286	Profesional Social
6	Lorena Andrea Gómez Ramírez	1.032.388.748	Profesional ambiental
7	Luis David Franco Muñoz	1.010.233.913	Ing. Topógrafo
8	Francisco Javier Molina Rey	1.003.486.864	Aux. cadenero
9	Francy Yolima Sanabria Penagos	1.001.170.073	Aux. de operaciones
10	Diana Cristina Avellaneda Hernández	1.002.548.039	Aux. de operaciones
11	Marly Yudeyby Cruz Guzmán	1.003.671.153	Aux. de operaciones
12	Elvia María Camargo López	1.023.029.173	Aux. de operaciones
13	Hermes Guerrero Vargas	79.815.760	Operario de minicargador
14	Ferney Castro	12.277.155	Operario de minicargador

Personal Consorcio Estabilización Vial			
N°	**Nombre del personal de obra**	**N° identificación**	**Cargo**
15	Jorge Leonardo Tejedor Aguilar	1.055.552.094	conductor de volqueta
16	Rafael Niño Galindo	3125436	conductor de volqueta
17	Pablo David Plazas Novoa	79.583.074	conductor de volqueta
18	Julián Mauricio Preciado Mosos	1110466774	Supervisor de obra
19	Sebastián Perilla Castiblanco	1007912209	Supervisor de obra
20	Cesar Agusto Moscote Polo	1079934649	Maestro de obra
21	Luis Alfredo Moscote Polo	1079937109	Oficial
22	Leonel Saavedra Reyes	13959536	Oficial
23	Duván Alexander Peñaloza Valbuena	10075190465	Ayudante de obra
24	Manuel Darío Saumeth Pardo	1120738400	Ayudante de obra
25	Samuel Delgado Naranjo	1.007.297.818	Ayudante de obra
26	Yulian David Romero Poveda	1022946347	Ayudante de obra
27	Edison Ancizar Díñate Susa	1023036214	Ayudante de obra
28	Habiasney Pineda Cruz	1069230764	Ayudante de obra
29	Lenin José Moscote Polo	1128178531	Ayudante de obra
30	Libier Duván Ramírez Robayo	1022925239	Ayudante de obra
31	Luis Hernando Ramirez Peñaloza	3125436	Ayudante de obra
32	Anderson Fabian Runza Susa	1069751058	Ayudante de obra
33	Miller Andrés Ramírez Peñaloza	3125370	Ayudante de obra
34	José Yeferson Viuche Viuche	1006093160	Ayudante de obra
35	Julián Manuel Quiroga Palacios	1001287552	Ayudante de obra
36	Elkin Steven Caro Peñaloza	1032656213	Ayudante de obra
37	Edgar Mancilla Salas	91447428	Laboratorista
38	Luis Fernando Acevedo Pulido	1031170075	Operario

5.4.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra

Para el presente periodo, el contratista remitió las planillas de seguridad social, esta se encuentra en revisión

5.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

5.5.1 Informe financiero y presupuestal

Para respaldar las obligaciones contraídas, la entidad contratante cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 921 del 17 de septiembre de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, del cual se reservará la suma de $12.494.588.139, del rubro 00AR-2402-0603-2018-00005-0020 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ.

Lo anterior según lo estipulado en el Contrato de obra No 479 de 2021 en el parágrafo primero de la cláusula séptima.

Tabla 40 Vigencias del Contrato de Obra

VIGENCIA	VALOR
2022	12.494.588.139,00
Valor Contrato	12.494.588.139,00

5.5.2 Forma de pago del contrato

Conforme con lo establecido en el Contrato de Obra, en su Cláusula OCTAVA – Forma de Pago, el valor del contrato se pagará así:

"El presente proceso de selección es a precios unitarios sin formula de reajuste, teniendo en cuenta que, las cantidades de obra pueden variar de acuerdo con las intervenciones requeridas en cada tramo vial establecido de acuerdo al grupo, según sea determinado en la revisión a los diseños entregados, producto realizado previo al inicio de la ejecución de las obras.".

"Se pagarán al contratista las sumas a las que se refiere el valor del contrato así: A.) Etapa de Construcción: Se ordenará el pago al contratista hasta el 95% del valor total de la etapa de construcción del contrato, pago que se hará mediante acta parciales de obra mensualmente; el saldo del 5% del valor total de la etapa de construcción será pagado contra la suscripción del acta de liquidación del contrato.".

"Parágrafo 1: Por ser la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, designada como ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías, en función del Acuerdo 099 de 31 de diciembre de 2019, expedido por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la Región Centro Oriente, deberá hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR, para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas, directamente desde la cuenta única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales.".

5.5.3 Actas de recibo parcial de obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las actas de recibo parcial de obras.

Tabla 41 Actas de Recibo Parcial de Obras

ACTA N°	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO ACTA
Nº.1	$ 524.185.578,30	$ 104.837.115,66	$ 419.348.462,64
Nº.2	$ 597.781.674,00	$ 119.556.335,00	$ 478.225.339,00

ACTA N°	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO ACTA
Nº.3	$ 302.174.608,00	$ 60.434.922,00	$ 241.739.686,00
Nº.4	$ 2.006.652.038,00	$ 401.330.408,00	$ 1.605.321.630,00
Nº.5	$ 257.878.866,00	-	$ 257.878.866,00
Nº.6	$ 2.160.794.379,00	$ 432.158.876,00	$ 1.728.635.503,00
Nº.7	$ 336.780.963,00	-	$ 336.780.963,00
Nº.8	$ 1.743.119.117,00	$ 348.623.823,00	$ 1.394.495.294,00
Nº.9	$ 286.398.725,00	-	$ 286.398.725,00
Nº.10	$ 572.278.107,00	$ 114.455.621,00	$ 457.822.486,00
TOTAL	**$ 8.788.044.055,30**	**$ 1.581.397.100,00**	**$ 7.206.646.954,64**

Para el presente periodo se presenta un avance financiero acumulado del 58,95%, se encuentra en revisión el acta N°7 y se vienen llevando a cabo mesas de trabajo entre CEV , UAERMV y la Interventoría .

5.6 ANTICIPO DE OBRA

5.6.1 Datos generales del anticipo de obra

En la siguiente tabla se muestra los datos del anticipo:

Tabla 42 Datos Generales del Anticipo

ANTICIPO CONTRATO INICIAL	
Valor total anticipo	$ 2.498.917.628
Valor retenido por la entidad	$ 227.516.124
Valor ingresado al Fideicomiso	$ 2.271.516.124
Porcentaje	20%
Entidad Fiduciaria	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S. A
Nombre del Fideicomiso	15192
Fecha desembolso anticipo	21 ABRIL DE 2021
Fecha de cierre del Fideicomiso	Cerrado

5.6.2 Órdenes de pago o de giro

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las órdenes de pago o de giro aprobadas:

Tabla 43 Órdenes de Pago o Giro

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	19/10/2022	MEXICHEM COLOMBIA SAS	$ 45,981,600.00	3	No de Factura y fecha: WBG14415 de 29/07/2022 Concepto: Geotextil no tejido 2500 3.5	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	19/10/2022	MEXICHEM COLOMBIA SAS	$ 16,553,376.00	3	No de Factura y fecha: WBG14522 de 03/08/2022 Concepto: Geotextil no tejido 2500 3.5	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	19/10/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 519,022,906.45	3	No de Factura y fecha: Cuenta de cobro 01/08/2022 Concepto: FC FEFB20936 HIERRO FIGURADO 3/8348939FC FEFB20960 HIERRO FIGURADO 3/81724846701FC NAC007001 DRAINPIPE 4"HD/2LARGO (m):50/100ALTO FC FEFB21149 HIERRO RECTO 1/22022-0998 OC MAQ2804	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	19/10/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 68,421,000.00	1	No de Factura y fecha: 3584 de 05/09/2022 Concepto: Servicio de transporte por carretera Bogotá anticipo del 20% transporte de material y escombro contrato N°. 479.	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 6	19/10/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 43,337,711.00	2	No de Factura y fecha: 3584 de 05/09/2022 Concepto: Servicio	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
					de alquiler de maquinaria y equipo.	octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 7	18/10/2022	TERRABLANCA S.A.S	$ 27,455,185.00	3	No de Factura y fecha: Factura 1464 de 10/05/2022 Concepto: Tubo alcantarillado 900mm SN-4 HEDPE	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 8	19/10/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 104,124,125.00	3	No de Factura y fecha: Factura de venta 1472 del 31/05/2022, TECNOLOGÍA DE POLIETILENO DE COLOMBIA. No de Factura y fecha: Factura de venta 1471 del 26 de mayo de 2022, TECNOLOGÍA DE POLIETILENO DE COLOMBIA. No de Factura y fecha: FACTURA ELECTRÓNICA 2028143881 de 03/08/2022 Concepto: Reembolso tubería alcantarillado, y cemento.	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 8	19/10/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 12,000,000.00	4	No de Factura y fecha: Cuenta de cobro del 18/07/2022 Concepto: ANTICIPO AL SUBCONTRATO DE OBRA No SCO-007-2022, EL CUAL TIENE COMO OBJETO MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS TALES COMO ALCATARILLAS, CUNETAS Y SUBDRENES PARA LOS TRAMOS 1 AL 3 PARA EL	APROBADA - oficio 186-0-015 - 11 de octubre del 2022

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
					DESARROLLO DEL CONTRATO No 479 de 2022 Contrato proveedor: SCO 007-2022	
ORDEN DE OPERACIÓN No 9	25/11/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 309,301,480.00	2	No de Factura y fecha: 3727 del 04/11/2022 Concepto: Alquiler de maquinaria y equipo para el contrato 479 de 2022. Contrato proveedor: SCO 008-2022, SCO 010-2022	APROBADA - oficio 186-0-019 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 9	25/11/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 572,269,480.00	1	No de Factura y fecha: 3730 del 08/11/2022 Concepto: Transporte de material de construcción y excavación contrato No 479 de 2022. Contrato proveedor: SCO 009-2022	APROBADA - oficio 186-0-019 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 9	25/11/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 198,833,171.00	3	No de Factura y fecha: Factura 3729 del 04 de noviembre de 2022. Concepto: Suministro de materiales para el contrato 479	APROBADA - oficio 186-0-019 - 11 de octubre del 2022
ORDEN DE OPERACIÓN No 9	25/11/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 137,077,400.00	3	No de Factura y fecha: Cuenta de cobro del 09/09/2022, Factura E56657 del 23/09/2022 Concepto: Reembolso de costos/gastos correspondientes	APROBADA - oficio 186-0-019 - 11 de octubre del 2022

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
					al periodo de agosto de 2022, concepto: SISMO R 1/2 x 12 m (Varillas de 7" pulgada)	
ORDEN DE OPERACIÓN No 9	25/11/2022	MAQUINAS AMARILLAS SAS	$ 75,153,376.00	3	No de Factura y fecha: Cuenta de cobro 10 de octubre de 2022, factures 2116 del 12/09/2022, 2153 del 22/09/2022 y 2217 del 13/10/2022 Construtriturar SAS Concepto: Reembolso de material Triturado de 1.5" y de 2"a 3"	APROBADA - oficio 186-0-019 - 11 de octubre del 2022
TOTAL			**$2.129.530.810,45**			

La interventoría realizará el seguimiento a los desembolsos del anticipo solicitados por el contratista firmando las órdenes de pago que estén acordes con el plan de inversión actualizado y aprobado, y con el cumplimiento de los requisitos de los soportes correspondientes.

5.6.3 Plan de inversión anticipo vs inversión del anticipo

Se relaciona en la siguiente tabla la inversión y saldos que quedan del anticipo a corte del presente Informe:

Tabla 44 Plan de Inversión del Anticipo VS Inversión Anticipo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN APROBADO 04 DE ENERO DE 2023 186-0-026		ACUMULADO TOTAL INVERSIÓN	SALDO
		%	VALOR		
1	**Transporte de material**	28.2	$ 640.690.480	$ 640.690.480	$ 0
2	**Alquiler de maquinaria y equipos**	15.5	$ 352.639.191	$ 352.639.191	$ 0
3	**Compra de materiales y accesorios**	50.3	$ 1.143.651.595	$ 1.124.201.139,45	$ 19.450.455,55
4	**Pago de salarios y jornales**	6	$ 134.534.858	$ 12.000.000	$ 122.534.858

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN APROBADO 04 DE ENERO DE 2023 186-0-026		ACUMULADO TOTAL INVERSIÓN	SALDO
		%	VALOR		
	SUB TOTAL	**N/A**	**$ 2.271.516.124**	**$ 2.129.530.810**	**$ 141.985.314**
	Descuento entidad por contribución especial y estampillas	**N/A**	**$ 227.401.504**	**$ 227.401.504**	**$ 0**
	TOTAL		**$ 2.498.917.628**	**$ 2.356.932.314**	**$ 141.985.314**

5.6.4 Reintegro de rendimientos financieros

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses financieros generados y su respectiva devolución o reintegro a la entidad:

Tabla 45 Rendimientos Financieros Anticipo de Obra

PERIODO CAUSADO	CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA Nº04000003568	VALOR GIRO REALIZADO	FECHA DE GIRO
ago-22	$ 1.129.431,87	$ 1.129.431,87	7-sep-22
sep-22	$ 1.210.245,49	$ 1.210.245,49	7-oct-22
oct-22	$ 1.057.632,62	$ 1.057.632,62	4–nov-22
nov-22	$ 618.912,62	$ 618.912,62	13-dic-22
dic-22	$ 37.556,13	$ 37.556,13	6-ene-23
ene-23	$ 37.496,36	$ 37.496,36	6-feb-23
feb-23	$ 33.867,41	$ 33.867,41	3-mar.23
mar-23	$ 37.495,37	$ 37.495,37	4-abr-23
abr-23	$ 36.286,08	$ 36.286,08	5-may-23
may-23	$ 37.496,01	$ 37.496,01	6-jun-23
jun-23	$ 36.286,56	$ 36.286,56	5-jul-23
jul-23	$ 37.495,70	$ 37.495,70	8-ago-23
ago-23	$ 37.496,67	$ 37.496,67	5-sep-23
sep-23	$ 36.286,09	$ 36.286,09	9-oct-23
oct-23	$ 37.496,90	$ 37.496,90	3-nov-23
nov-23	$ 36.285,47	$ 36.285,47	4-dic-23
dic-23	$ 31.482,75	$ 31.482,75	24-ene-24
ene-24	$ 7,90	$ 7,90	31-ene-24
TOTAL	$ 4.489.258,00	$ 4.489.258,00	
TOTAL RENDIMIENTO		$ 4.489.258,00	

5.6.5 Amortización del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones de anticipo deducidas de las actas de recibo parcial de obras:

Tabla 46 Amortización Anticipo Contrato de Obra

ACTA N°	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO ACTA
Nº.1	$ 524.185.578,30	$ 104.837.115,66	$ 419.348.462,64
Nº.2	$ 597.781.674,00	$ 119.556.335,00	$ 478.225.339,00
Nº.3	$ 302.174.608,00	$ 60.434.922,00	$ 241.739.686,00
Nº.4	$ 2.006.652.038,00	$ 401.330.408,00	$ 1.605.321.630,00
Nº.5	$ 257.878.866,00	-	$ 257.878.866,00
Nº.6	$ 2.160.794.379,00	$ 432.158.876,00	$ 1.728.635.503,00
Nº.7	$ 336.780.963,00	-	$ 336.780.963,00
Nº.8	$ 1.743.119.117,00	$ 348.623.823,00	$ 1.394.495.294,00
Nº.9	$ 286.398.725,00	-	$ 286.398.725,00
Nº.10	$ 572.278.107,00	$ 114.455.621,00	$ 457.822.486,00
TOTAL	**$ 8.788.044.055,30**	**$ 1.581.397.100,00**	**$ 7.206.646.954,64**

5.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El reporte del estado del tiempo se encuentra de manera general para los frentes de obra en el numeral 7.3 del presente informe.

5.8 FUENTE DE MATERIALES

Las fuentes de los materiales dispuestos en obra por el CEV, son de proveedores y escombreras que figuran en el directorio de proveedores de materiales de construcción, por lo anterior cuentan con la respectiva Licencia Ambiental y Permiso Minero para desarrollar la actividad.

Para el presente periodo ingresaron los siguientes materiales en el desarrollo del contrato de la obra:

Tabla 47 Fuente materiales CEV

ITEM	RAZON SOCIAL	CATEGORIA	MATERIAL	CANTIDAD (M3)	CANTIDAD (TON)	PERMISO AMBIENTAL
jul-25						
1	AGREGADOS DE ORIENTE SAS	**Agregados pétreos**	Arena	90	148,397	RES 500.41-17-0120 Corporinoquia de 26/01/2017 Registro Minero: EXP:IGJ-08051X hasta 02/02/2045
2			Grava	90	148,397	

ITEM	RAZON SOCIAL	CATEGORIA	MATERIAL	CANTIDAD (M3)	CANTIDAD (TON)	PERMISO AMBIENTAL
jul-25						
3	MAQUINAS AMARILLAS	**Agregados pétreos**	Recebo	15	24,733	Informe Técnico 00259 de 2022 Rad.2022IE24021 Informe Técnico 00876 de 2025 Rad 2025IE59007. Rad 2019EE100840
4		**Agregados pétreos**	Triturado	15	24,733	
TOTAL				**210**	**346,259**	

De la tabla anterior se actualizan los datos faltantes a cerca del material usado en obra.

5.9 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el presente periodo y en vista del reinicio del contrato, Consorcio Estabilización Vial viene llevando a cabo actividades de construcción de cunetas y de excavaciones para filtros, estos documentos serán remitidos y plasmados para el siguiente informe.

Los ensayos tomados en el presente periodo son:

Resultados de las tomas de densidades de campo por medio del método cono y arena en el Tramo 2 unión tunales y en el tramo 9 san Antonio el toldo. Durante este periodo se realizaron pruebas de densidades en tramo 2 por el método de cono y arena en el tramo comprendido desde la abscisa K0+705 hasta la abscisa K0+942 por el borde Izquierdo, ubicado en el tramo 2 Unión Tunales.

También se realizaron pruebas de densidades en tramo 9 por el método de cono y arena en el tramo comprendido desde la abscisa K5+145 hasta la abscisa K5+410 por el borde Derecho, ubicado en el tramo 9 San Antonio el toldo.

5.10 SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente periodo se vienen realizando actividades para el tramo de san Antonio y Unión tunales de los cuales se indica el % de ejecución:

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A
TRAMO SAN ANTONIO	71,00%	51,08%	-19,92%
TRAMO UNIÓN-TUNALES	71,00%	51,08%	-19,92%

5.11 PROGRAMA DE OBRA Y DE INVERSIONES

Al corte del presente informe se viene haciendo seguimiento al cronograma de obra de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico, para el presente periodo se actualiza el programa de obra e inversiones adaptado para la terminación de obra con fecha del 9 de agosto del año 2025.

5.12 ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y DE INVERSIONES

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes al resumen del avance financiero de las obras ejecutadas a la fecha:

Tabla 48 Avance del Contrato 479

Valor total del contrato:	$ 12.494.588.139,00		
Fecha de corte datos:	31-jul-25	Programado o ejecutado	Programado o ejecutado
PROGRAMADO / EJECUTADO		MES	ACUMULADO
Obra Programada	Porcentaje		86,80%
	Valor		$ 10.845.302.504,65
Obra Ejecutada	Porcentaje		71,20%
	Valor		$ 8.896.146.754,97
		Adelanto / Atraso	15,60%

El atraso presentado a la anterior tabla obedece a la necesidad de implementar ítems no previstos para la culminación de las obras por parte del consorcio Estabilización Vial.

5.13 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA

5.13.1 Actas de comité de obra o actas de reunión

En la siguiente tabla se registran las diferentes reuniones y comités llevados a cabo durante el período:

Tabla 49 Actas de Comité de Obra

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
N°	**FECHA**	**TEMAS TRATADOS**
76	1-ago-25	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes - Estado actas parciales del contrato
77	8-ago-25	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes
78	15-ago-25	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes - Estado actas parciales del contrato
79c	28-ago-25	- Recorrido obra - Actualización PMT implementación en campo. - Envió documentación maquinaria y personal del componente SST Solicitud de profesional SST - Presentación personal para el reinicio de la obra - Cronogramas y planes de trabajo - Estado informes mensuales componentes - Estado actas parciales del contrato

5.13.2 Bitácora de obra

La bitácora de obra para el contrato 479 de 2022, se encuentra anexa en el numeral 2.B

5.14 GESTIÓN AMBIENTAL

El seguimiento a la gestión ambiental se encuentra anexa al numeral N°. 4A

5.15 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)

El seguimiento a la salud ocupacional y seguridad en el trabajo se encuentra anexa al numeral N°. 4B

5.16 GESTIÓN SOCIAL

El seguimiento a la gestión social se encuentra anexa al numeral N°. 4C

5.17 ESTADO DEL CONTRATO

Para el presente periodo el contrato 479 de 2022, el contratista Consorcio estabilización Vial realizó actividades de topografía, excavación, perfilación, instalación geotextil y de tubería perforada para filtro e instalación de material drenante.

6 CONTRATO DE SERVICIOS - 480 DEL 22/02/2022 SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S.

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

6.1.1 Datos del contrato 480 del 22/02/2022.

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato de Servicios N° 480 del 10/02/2022.

Tabla 50 Contrato de Prestación de Servicios - SOLGEO S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
CONTRATO N°.	**480 DEL 10/02/2022**
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE DOS (2) COMISIÓN DE TOPOGRÁFICAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO, CONTROL, MEDICIÓN, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S – SOLGEO S.A.S
NIT	900.087.400-1
REPRESENTANTE LEGAL	ANDREA SABOGAL GUERRERO
DIRECCIÓN - CIUDAD	Cl 42 27 A 6 1, oficina 403 Bogotá.
TEELEONO	601-660 92 10
CORREO	solgeosas@gmail.com
DATOS DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 639.793.440,00 Incluido IVA sobre utilidad
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 639.793.440,00 Incluido IVA sobre utilidad
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) MESES
PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	03 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE JUNIO DE 2023
INTERVENTORIA	ECOVIAS S.A.S

6.1.2 Pólizas o garantías contrato de servicios

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato:

Tabla 51 Datos de las Pólizas Contrato 480

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS EQUIDAD			
AMPARO	PÓLIZA N°	CERTIFICADO O ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	EXPEDIDA / MODIFICADA SEGÚN
CUMPLIMIENTO	63-44-101012306	0	24- FEB-2022	CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	63-40-101022720	0	24- FEB-2022	CONTRATO

Tabla 52 Pólizas Actualizadas del Contrato

AMPARO	**REQUISITOS CONTRACTUALES**		**DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA**		
	Vigencia contractual	**% contractual**	**Desde**	**Hasta**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO					
a). Cumplimiento del contrato	A partir de la suscripción del contrato, el plazo del contrato y seis meses mas	10%	22/02/2022	9/12/2023	$ 63.979.344,00
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Plazo del contrato y 3 años mas	5%	22/02/2022	9/06/2026	$ 31.989.672,00
d). Calidad del Servicio	Suscripción del contrato y un año más partir de la entrega final del servicio	20%	22/02/2022	9/06/2024	$ 127.958.699,00
RESPONSABILIDAD CIVIL					
a). Predios labores y operaciones	Igual al periodo de ejecución y cuatro	200 SMMLV	22/02/2022	9/06/2023	$ 200.000.000,00

6.2 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

6.2.1 Otrosí, Adición y Prórroga

Durante el desarrollo del contrato no se presentaron otrosí, adición o prorrogas al contrato de prestación de servicios.

6.2.2 Suspensión y Reinicio al Contrato de servicios

Durante el desarrollo del contrato no se presentaron suspensiones y reinicios al contrato de prestación de servicios.

6.2.3 Ítems o Precios No Previstos

El contrato 480 de 2022 no contó con ítem no previstos, teniendo en cuenta que es un contrato de prestación de servicios, el cual se denomina *"CONTRATAR EL SERVICIO DE DOS (2) COMISIONES TOPOGRÁFICAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO, CONTROL, MEDICIÓN, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020"* **(Tomado del contrato 480 entre SOLGEO S.A.S y la UAERMV)**

6.3 CONTROL DE EQUIPOS

Contrato terminado el 2 de junio de 2023.

6.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA

6.4.1 Personal contratista

Contrato terminado el 2 de junio de 2023.

6.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

6.5.1 Forma de pago del contrato

Del contrato 480 entre SOLGEO S.A.S y la UAERMV se establece la siguiente forma de pago:

> *"La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, ordenará el pago al CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades vencidas por el valor*

adjudicado de las dos (2) comisiones topográficas por periodo de mes vencido, previa verificación a satisfacción por el Interventor del contrato de la siguiente manera" **(Tomado del contrato 480 entre SOLGEO S.A.S y la UAERMV)**

6.5.2 Actas parciales

A continuación, se describe lo pagado en actas para el contrato 480 de 2022

Tabla 53 Relación de Actas Pagadas

ACTA PARCIAL	PERIODO	VALOR	APROBADO COMUNICADO
1	3-mar-22 AL 2-abr-22	$42.652.896,00	186-1-056 del 23-mayo-22
2	3-abr-22 al 2-may-22	$42.652.896,00	186-1-056del 23-mayo-22
3	3 may-22 al 2jun-22	$42.652.896,00	186-1-061 del 6-junio-22
4	3-jun-22 al 2-jul-22	$42.652.896,00	186-1-71 del 7-julio-22
5	3-jul-22 al 2-ago-22	$42.652.896,00	186-1-093 del 19-agosto-22
TOTAL		$ 213.264.480,00	

6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA

6.6.1 Reuniones realizadas

En la siguiente tabla se registran las diferentes reuniones y comités llevados a cabo durante el período:

Tabla 54 Actas de Comité de Obra y Reuniones

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTA N°	**FECHA**	**TEMAS TRATADOS**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

No se realizaron reuniones para el presente periodo.

6.7 REVISIÓN DOCUMENTACIÓN INICIAL

Se llevó a cabo la revisión de la documentación inicial del contrato de prestación de servicios 480 del 10/02/2022, correspondiente a la documentación previa a la firma del acta de inicio y con la firma de esta.

6.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS

No se realizaron actividades en el presente periodo, contrato terminado el 2 de junio de 2023

A continuación, se relaciona la entrega de productos a la fecha del presente informe por parte del contratista de topografía a la interventoría:

Tabla 55 Entrega de Productos Contrato de Servicios 480

FECHA RECIBIDO	PRODUCTO
17/05/2023	Entrega radiación Km 1 Ánimas Bajas
19/05/2023	Entrega radiación Km 2 Ánimas Bajas
23/05/2023	Entrega radiación Km 3 Ánimas Bajas
25/05/2023	Entrega radiación Km 4 Ánimas Bajas

6.9 GESTIÓN AMBIENTAL

Durante la ejecución del contrato, SOLGEO S.A.S hizo uso adecuado y eficiente de los recursos, dando cumplimiento al PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental), documento interno de la UAERMV

6.10 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)

Contrato terminado el 2 de junio de 2023.

6.11 GESTIÓN SOCIAL

No aplica, dado que es un contrato de prestación de servicios.

6.12 ANOTACIONES DE LA INTERVENTORÍA

- Soluciones Geoespaciales SAS al momento de realizar las actividades de topografía, no se percató que había colocado los deltas con referencias temporales (estacas), esa actividad de referenciación y amojonamiento ha debido ejecutarse con suficientes referencias de control (permanentes y suplementarias) al momento de realizar la poligonal y nivelación de los tramos a intervenir. La problemática derivada de esto se evidencia al momento que inician las actividades de localización y replanteo los contratistas hidráulicos, al no encontrar las referencias que permitan el amarre correspondiente.

- Soluciones Geoespaciales SAS, debe garantizar que los productos elaborados por el personal (comisiones de topografía) cumplan con el objetivo para el cual fueron contratados, no siendo otro que la información topográfica requerida para la ejecución de la totalidad de las obras

contempladas en el alcance del proyecto de regalías, de tal forma que esta debe ser consistente y permanente en el tiempo.

- Las diferencias encontradas en la topografía al momento de realizar la localización y replanteo deben ser corregidas por la firma Soluciones Geoespaciales SAS sin costo adicional al contrato.

- El plazo transcurrido en la ejecución de actividades correctivas no puede ser contabilizado para reconocimiento económico, toda vez que es obligación del contratista Soluciones Geoespaciales SAS atender estos requerimientos, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

- Los atrasos de los contratos 478 y 479 de 10/02/2022 por repetición de actividades de topografía, son totalmente atribuibles a la firma Soluciones Geoespaciales SAS

- La interventoría en comité de seguimiento semanal de obra N°. 3 del contrato de obra pública 479 de 10/02/2022, celebrado el 11 de agosto de 2022 informó a la UAERMV y a los demás asistentes, la necesidad de suspender el contrato de prestación de servicios 480 de 22/02/2022, solicitud que se hace teniendo en cuenta la entrega y terminación de los levantamientos de topografía programados (última entrega 29 de julio de 2022). La UAERMV no atendió lo solicitado por la interventoría.

- La información cargada en el drive no evidencia el seguimiento diario a los contratos de obra 478 y 479 de 10/02/2022.

- Los trabajos que se vienen realizando desde el mes de agosto de 2022, corresponden a correcciones del levantamiento inicial.

- Importante aclarar que, las certificaciones para liberación de pago que fueron remitidos mediante oficios con consecutivo que se relacionan a continuación:

  - ✔ 186-1-056 de fecha 23 de mayo de 2022 (actas parciales 1 y 2).
  - ✔ 186-1-061 de fecha 06 de junio de 2022 (acta parcial 3).
  - ✔ 186-1-071 de fecha 07 de julio de 2022 (acta parcial 4).
  - ✔ 186-1-093 de fecha 19 de agosto de 2022 (acta parcial 5).

Se expidieron de conformidad a la revisión que consistió básicamente en comprobar la información del levantamiento, debidamente organizado y con los datos o información requerida (carteras de campo, datos crudos, Rinex,

coordenadas, descripciones, esquemas, formatos, hojas de campo, imágenes y la revisión de parámetros a partir de la estructura digital y teniendo en cuenta la información entregada, error angular, error en distancia, error permitido, precisión etc..) ejecutada en oficina por las comisiones de topografía de la interventoría a los productos parciales y finales que, en cada una de las entregas realizadas por parte de SOLGEO S.A.S., se incluyeron en el link o drive colocado.

Dando respuesta al oficio 20230428 de 28 de abril de 2023, La topografía de la interventoría reviso los documentos entregados por el Contratista Soluciones Geoespaciales de los tramos San Antonio I y II en campo, del tramo San Antonio reviso 6 km dando concepto favorable a las observaciones hechas el 24 de abril 2023, a la revisión documental.

Dando respuesta al comunicado 20230428 recibido el 28 de abril de 2023, la topografía de la interventoría revisa el producto 20230327 donde el contratista SOLUCIONES GEOESPACIALES SAS Entrega 5 km San Antonio 1, dando visto bueno a las observaciones remitidas el pasado de 24 abril de 2023, con respeto a lo documental.

La topografía de la interventoría reviso el producto 20230317 Entrega 4 km San Antonio 1 del contratista SOLUCIONES GEOESPACIALES SAS, Recibido el 28/04/2023 mediante documento "20230428 Respuesta a Interventoría Entrega km 4, 5 y 6" donde da respuesta a las observaciones enviadas por la interventoría mediante correo electrónico el 25/04/2023, siendo atendidas y subsanadas de manera correcta, las observaciones remitidas por la interventoría el pasado 24 de abril de 2023, en el campo documental.

Lo anterior en cumplimiento a lo señalado en la CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO del contrato de prestación de servicios N°. 480 del 22 de febrero de 2022, que indica lo siguiente:

"CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, ordenará el pago al CONTRATISTA el valor del contrato en mensualidades vencidas por el valor adjudicado de las dos (2) comisiones topográficas por periodo de mes vencido, previa verificación a satisfacción por el Interventor del contrato de la siguiente manera:
PARÁGRAFO PRIMERO: Por ser la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, designada como ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías, en función del Acuerdo 099 de 31 de diciembre de 2019, expedido por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la Región Centro Oriente, deberá hacer uso del Sistema de

Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR, para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas, directamente desde la cuenta única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales, de esta manera, la UAERMV realizará la gestiones de ordenación del gasto, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realice el giro final".

De esta manera corresponde al representante legal de la UAERMV o a su delegado del nivel directivo, ordenar el gasto sobre las apropiaciones que se hayan incorporado al presupuesto de la Entidad en su capítulo independiente para regalías. Esto en función de la Circular Externa 023 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con lo anterior, la UAERMV gestionará el giro a través del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando mensualmente el pago al CONTRATISTA del servicio prestado de las dos (2) comisiones topográficas; verificados a satisfacción por el Interventor del contrato, y, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el gerente del proyecto de la UAERMV.

Se cancelará mensualmente por periodo de mes vencido el servicio, con la presentación de la factura; se requerirá para el pago de la factura, Certificación de cumplimiento de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003. Previa suscripción de preacta y acta por parte del contratista y el Interventor del contrato en los formatos establecidos por la entidad, la cual exige, además, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría de la UAERMV.

Las facturas deberán ser presentadas por el valor mensual de servicio prestado, y verificados a satisfacción por el Interventor del contrato.
Posteriormente, y verificando el cumplimiento de los requerimientos descritos, el Interventor del contrato efectuará la correspondiente certificación para que se proceda a la orden de transferencia realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, previos los descuentos de ley; dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega por parte del contratista de los requisitos ya mencionados.

6.13 ESTADO DEL CONTRATO

Estado del contrato 480 del 10/02/2022**: Finalizado tiempo contractual, sin recibo de los productos a satisfacción.**

7 PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

7.1 INFORMACIÓN GENERAL

7.1.1 DATOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

A continuación, se observan las generalidades del Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá a cargo de la UAERMV:

Tabla 56 Suscripción, Legalización, Plazo Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá

NOMBRE PROYECTO	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).
DATOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA	
ENTIDAD EJECUTORA	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV**
NIT:	**900127032**
GERENTE DEL PROYECTO	JULIO CESAR PINZÓN REYES
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	CALLE 26 N°. 69-76 BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO:	601-3779555
OTROS DATOS DEL PROYECTO	
VALOR INICIAL DEL PROYECTO:	$ 76.864.101.256
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO:	$ 80.542.350.280
FECHA INICIO ETAPA CONSTRUCCIÓN	17 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA DE EJECUCIÓN DE OBRA ACTUALIZADA:	30 DE DICIEMBRE DE 2026
INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S

7.2 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

7.2.1 Etapa de Preconstrucción

El proyecto con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL a la fecha se encuentra haciendo

ajustes a la implantación del diseño geométrico para implementar en la ejecución de las obras, validando el componente topográfico, la no entrega de estos productos ha derivado en la demora el inicio de actividades por parte de los contratistas hidráulicos, así como para la UAERMV.

A corte del presente informe falta la adaptación del diseño geométrico de San Antonio, Laguna verde y Animas Bajas.

7.2.2 Etapa de construcción

Para el presente periodo se registran las actividades de obra realizadas a los tramos viales por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIA en la siguiente tabla:

Tabla 57 Actividades ejecutadas.

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
TRAMO UNIÓN TUNALES	Actividades realizadas Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentías en tramo 5, de limpia y se retira RCD teniendo en cuenta que allí había una alcantarilla proyectada. K1+420 a k1+590 Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentías, limpieza de cunetas y barrido general. Esta actividad se reanuda desde tramo 2 k1+555 y hasta tramo 3 k0+230. Se realiza retiro de señalizaciones que van a ser reemplazadas. Esta actividad se realiza en el mismo abscisado y con el apoyo del retrocargador. Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentias, limpieza de cunetas y barrido general. Esta actividad se reanuda desde tramo 4 k0+000 y hasta k0+230. Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentias, limpieza de cunetas y barrido general. Esta actividad se reanuda desde tramo 4 k0+230 y hasta k0+710. Se realiza demolición de roca existente con acción mecánica del martillo demoledor del minicargador. K0+900. Se realiza demolición de roca existente con acción mecánica del martillo demoledor del minicargador. K0+900. Se realiza riego de liga(riego de adherencia) con emulsión asfáltica, con el fin de terminar de salar la pista granular. K0+635 a k0+750. Se realiza extendida de fresado estabilizado aprox 0.05. k0+635 a k0+750.	Localización y replanteo del terreno (K2+030 a K0+120) Apiques para filtro cada 10m (K2+030 a K0+120) Corte y nivelación de subrasante (K2+060 a K2+120) Nivelación de la subrasante del tramo 02, se está trabajando desde el k0+000 hasta k0+230, k0+250 hasta k0+410 del tramo 02. Instalación de base granular (K2+030 a K2+170) K2+240 – K2+360, k0+110 a k0+140, k0+110 a k0+140, k0+120 a k0+140 del ramo 02, k0+105 hasta k0+220, k0+100 y k0+300 del tramo 02. k0+147 y k0+258 tramo 2, k0+258 hacia mayores, k0+280 y k0+370 tramo 2, k0+250 y k0+370 Nivelación de la subrasante (Corte de subrasante y relleno con material RAP) Extendida y compactación de base granular tipo B (e=15cm) Extendida y compactación de Fresado estabilizado "MBR" (e=15cm) Fresado estabilizado instalado hasta la abscisa K2+310, k2+670 – k2+780, k2+050 tramo 01 y k0+120 tramo 02, k2+950 del tramo 01 y k0+105 del tramo 02, 0+160 y k0+210 tramo 2 Se extiende material RAP desde k0+000 hasta k0+160 del tramo 02, k0+300 y k0+400 Céreo de nivel de subrasante desde k0+190 hacia mayores Se realiza recorrido del segmento 2 en conjunto entre las comisiones de topografía de la UAERMV y la interventoría donde se evidencia en campo los deltas y placas topográficas, k0+250 y k0+370 del tramo 02 Se corrige base granular desde k0+000 hasta k0+110, tramo 02. Instalación y compactación de base granular entre abscisas k0+110 a k0+140, k0+110 a k0+140, k0+120 a

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
		k0+140 del ramo 02, k0+105 hasta k0+220, k0+100 y k0+300 del tramo 02. k0+147 y k0+258 tramo 2, k0+258 hacia mayores, k0+280 y k0+370 tramo 2, k0+250 y k0+370 Imprimación entre abscisask2+950 del tramo 01 y k0+120 del tramo 02, k0+110 y k0+160, k0+110 y k0+0+168 del tramo 02 Se realiza céreo de MBR instalado el día anterior entre abscisas k2+670 – k2+780, Extendido, compactación y céreo base granular entre k2+905 y k0+110 (tramo 2), k2+050 tramo 01 y k0+120 tramo 02, k2+950 del tramo 01 y k0+105 del tramo 02, 0+160 y k0+210 tramo 2, Compactación de MBR con compactador sobre neumáticos entre abscisas k2+670 y k2+780, entre abscisas k2+670 y k2+770, k2+780 del tramo 01 hacia mayores y k2+780 y k2+950 del tramo 01, k2+155 hasta k2+250. Se extiende material RAP desde k0+000 hasta k0+160 del tramo 02, k0+300 y k0+400 Se realiza nivelación de la subrasante del tramo 02, se está trabajando desde el k0+000 hasta k0+230, k0+250 hasta k0+410 del tramo 02. Realiza replanteo de vía sobre el k0+300 del tramo 2. Humectación y compactación de fresado estabilizado entre abscisas k2+780 y k2+950 Se realizan ensayos de densidades entre abscisas k0+110 y k0+250 del tramo 02, k0+250 y k0+400 del tramo 02. Se realiza manejo de aguas escorrentías en el K0+605 a K0+630. Se recomienda realizar una excavación más profunda debido a que el relleno de los hombros es superior al nivel de la subrasante, esto genera que el agua se filtre a la carpeta de base granular. Se realiza perfilación de subrasante a nivel de cota desde k0+710 a k0+740. Se realiza extendida de base granular con cereo aproximado 0.08 entre K0+710 a k0+740. Se realiza compactación de base granular. Se realiza perfilación de subrasante a nivel de cota desde k0+715 a k0+860. Se realiza extendida de base granular con cereo aproximado 0.08 entre K0+715 a k0+850. Se realiza compactación de base granular Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+625 a k0+720. Se revisan cortes y rellenos de vía.

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
		* Se realiza compactación de base granular. Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+720 a k0+790. Se revisan cortes y rellenos de vía. Se realiza manejo de aguas escorrentías y retiro de talud que se desprende en el k0+480 a k0+500. Está actividad se realiza manualmente para evitar que la actividad mecánica afecte el desplazamiento. Se realiza intervención de hombro izquierdo del k0+650 a k0+670, donde se escarificación y remplazo del material saturado. 20x.80x0.15 * Se realiza compactación de base granular. Se realiza replanteo y materialización de niveles entre k0+705 a k0+770. esto teniendo en cuenta la modificación del hombro. Se realiza manejo de aguas escorrentías y retiro de talud que se desprende en el k0+705 a k0+710. Está actividad se realiza manualmente para evitar que la actividad mecánica afecte el desplazamiento. Se realiza excavación mecánica para conformar la zanja-cuneta en el tramo k0+001 a k0+015. Se realiza mezcla heterogénea (cemento, grava, recebo y agua). Para realizar cuneta de conducción de agua escorrentías. Se realiza compactación de base granular.
TRAMO CAPITOLIO	Actividades realizadas Se evidencia escarificado de pista de fresado estabilizado, sin embargo pasan las volquetas y vuelve a sellar el material. Posteriormente se evidencia un riego con agua para humedecer las capas y pegarlas. Sin embargo se deja en claro que esta actividad no está aprobada siempre y cuando no se realice riego con liga que asegure la fractura del material y pegue de las capas. Esta actividad queda en stanby hasta que se corrija. Actividad desarrollada en k3+430 a k3+215. Se realiza corte de carpeta de fresado estabilizado y retiro de material proveniente de dicha excavación. Esta actividad se realiza en k3+590 a k3+680 costado izquierdo y de k3+630 a k3+680 costado derecho 1. Se realiza la limpieza de cunetas para construcción de estas, se desarrollo en abscisas del k1+710 a k1+770 costado izquierdo a menores. 2. Se realiza limpieza y extracción de material proveniente de la acción de escorrentías de las cunetas a la alcantarilla del k1+760. 3. Se realiza la apertura de huecos, puesta y entierro de postes y posterior	Limpieza de alcantarillas en abscisa k0+790 hacia menores. Reparación de "fallos" de forma manual con ayuda del minicargador en k4+080, k4+100, k3+740, k3+570, k3+500, k3+765 Conformación de subrasante entre k1+435 a k1+470. Replanteo del diseño geométrico de k1+635 hacia menores, k1+500 hacia menores. Así mismo, replantea niveles de rasante de vía de k1+635 – k1+500, k1+120 hacia menores, k1+100 – k1+070, k1+300 y k1+400, Relleno y nivelación de subrasante con material seleccionado B200 entre abscisas k1+525 y k1+635 Humectación de base granular entre abscisas k1+525 y k1+635, k1+525 y k1+635 Conformación y nivelación de la subrasante con material seleccionado desde k1+254 hasta k1+330. Jueves 26 de octubre: Limpieza de vía y manejo de aguas en k3+500 Limpieza de alcantarillas en abscisa k0+790 hacia menores. Reparación de "fallos" de forma manual con ayuda del minicargador en k4+080, k4+100, k3+740, k3+570, k3+500, k3+765 Conformación de subrasante entre k1+435 a k1+470. Replanteo del diseño geométrico de k1+635 hacia menores, k1+500 hacia menores. Asi mismo, replantea niveles de rasante de vía de k1+635 – k1+500, k1+120 hacia menores, k1+100 – k1+070, k1+300 y k1+400, Relleno y nivelación de subrasante con material seleccionado B200 entre abscisas k1+525 y k1+635

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	templado de cuerdas para cerca en k3+590 a k3+620. Costado izquierdo hacia mayores. 4. Llegan 2 viajes de rajón. 1. Se realiza la limpieza de cunetas para construcción de estas, se desarrolló en abscisas del k1+765 a k1+680 costado izquierdo a menores. 2. Se realiza limpieza y extracción de material proveniente de la acción de escorrentías de las cunetas a la alcantarilla del k1+760. Se recoge material y se dispone en acopio de RCD. 3. Se realiza perfilación de subrasante y traslado de material para intervención de fallo en k4+060 a k4+100 Se realiza la limpieza de cunetas para construcción de estas, se desarrolló en abscisas del k1+510 a k1+380 costado izquierdo a menores. Se realiza retiro de fallo existente y traslado de material para la intervención en k4+080 a k4+085.(1.5x5x.60). Se realiza retiro de material remanente saturado. 3. Se agrega rap como acción de protección de la subrasante. K0+060-k0+100. Se realiza riego de liga entre capas de fresado estabilizado con tiempo de ruptura de 2 horas en el trayecto del k3+450 a k0+215. Se realiza extendida de fresado estabilizado y cereo aprox. K3+450 a k3+215. Se realiza extendida y la compactación de fresado estabilizado entre K3+450 a k3+275. Se realiza cereo a nivel de cota.	Humectación de base granular entre abscisas k1+525 y k1+635, k1+525 y k1+635 Conformación y nivelación de la subrasante con material seleccionado desde k1+254 hasta k1+330. Perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k2+200 al k3+150. Conformación con piedra reutilizada (rajón) entre las abscisas del K2+1600 al K2+170, costado izquierdo a mayores Instalación de material RAP, entre las abscisas del k2+200 al k2+260. Remocion de material de escombro (limpieza de cunetas) entre las abscisas del K2+150 al K2+260, en ambos costados Perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k3+180 al k3+230. Retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+345 al K3+325 y k3+213 al k3+205. Remoción de material de escombro (limpieza de cunetas) entre las abscisas del K2+080 al K2+105, en ambos costados Perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k3+280 al k3+385. Se realiza extendida de base granular y cerró a nivel entre k3+280 a k3+385. Retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+320 al K3+350. Perfilación de subrasante y retiro material remanente saturado por lluvias entre las abscisas del k3+400 al k3+405. Se realiza extendida de base granular y cerró a nivel entre k3+320 a k3+340. Retiro de fallo y conformación de cajón con (rajón) entre las abscisas del K3+400 al K3+405 4.6 x.60.
SAN ANTONIO	Actividades realizadas K2+990 a K2+830 Manejo de agua lluvias en ambos costados. K0+040 Trasiego de material RCD K0+720- K0+800-K1+200. Conservación de acciones de movilidad mediante de conformación de fresado en crudo RAP K0+040 Trasiego de material RCD K2+940 a K2+920 Perfilacion de subrasante K0+040 Trasiego de material RCD K2+920 a K2+910 Perfilacion de subrasante K2+940 a K2+910 Extendida de fresado en crudo RAP para renovelacion de subrasante. K0+040 Trasiego de material RCD K2+910 a K2+870 Perfilacion de subrasante K2+910 a K2+870 Extendida de fresado	Humectación y compactación de base granular entre abscisas k0+410 y k0+600. Corte de subrasante realizado el día anterior entre abscisas k6+370 y k6+250. Aunque el personal de obra recibió el diseño geométrico ajustado, topógrafo de la UMV tuvo que realizar ajustes que deben ser enviados al diseñador geométrico para que quede en planos récord. Reparación de fallo en abscisa k6+100 con medidas 11m x 2.5m x 0.45m. Comisión de topografía de interventoría realiza revisión de subrasante entre abscisas k6+250 y k6+110. Se replantea borde de vía y niveles entre abscisas k6+150 y k6+080. K3+090 a K6+980 a K9+230 Traslado de Campamento y unidades sanitarias portátiles. K9+100 a K9+071 (ancho 4,60m) Perfilación de material saturado. Conformación de piedra Rajón existente entre reutilizada. Sello de Rajón con material Arcilloso existente. K9+071 a K9+100 Manejo de aguas lluvias. Identificación de puntos críticos para la movilidad. K6+950 Instalación de campamento

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
	en crudo RAP para renivelación de subrasante. K0+040 Trasiego de material RCD Se realiza demolición de roca existente con acción mecánica del martillo demoledor del minicargador. K0+900. Se realiza hidratación de pista de base granular para poder realizar compactación y sello del material. Sin embargo se evidencia que el vibro compactador de 4 TN es ineficiente. Se evidencia barrido general de pista para eliminar materia vegetal y partículas granulares gruesa. K0+450 a k0+750. Se evidencia escarificación de fresado estabilizado para la transición y unión de tramos de fresado. K0+420 a k0+450. De realiza riego de liga(riego de adherencia), sobre la pista de base granular existente. Se maneja un tiempo de ruptura de 1 hora. K0+450 a k0+750. Se realiza extendida de fresado estabilizado aproximado a capa de 0.05. Se realiza compactación mecánica con equipo trasladado desde tramo San Antonio (8tn). K2+870 a K2+840 Perfilación de subrasante K2+870 a K2+840 Extendida de fresado en crudo RAP para renivelación de subrasante. K0+040 Trasiego de material RCD Se requiere dar cumplimiento al compromiso generado en el predio de la señora Nidia Hernández, conformación de ingreso, para permitir que el contratista construya los módulos de cuneta. Se evidencia en tramo maquinaria de contrato asignada a frente San Antonio 1 la cual se entregó al contratista sin embargo aún no se retira del frente K2+840 a K2+820 Perfilación de subrasante K2+840 a K2+820 Extendida de fresado en crudo RAP para renivelacion de subrasante. K0+040 Trasiego de material RCD	K8+640 a K8+630 izq Manejo de aguas lluvias. K2+860 a K2+740 Acción de movilidad apoyo el toldo

7.2.3 Valores ejecutados

Para el periodo del presente informe se cuenta con los siguientes valores ejecutados de obra:

Tabla 58 Valores ejecutados

ITEM	CÓDIGO ACTIVIDAD UMV	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1		**BASES**				
1,1	A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	1803,63	$ 7.396	$ 13.339.647
1,2	A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	1803,63	$ 190.164	$ 342.985.495
1,3	A27-A	Nivelación y Mejoramiento de subrasante con material seleccionado. No incluye transporte.	m3	0	$ 245.717	$ 0
1,4	A15-A	Base granular clase B (BG_B). Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación.	m3	3869,25	$ 363.096	$ 1.404.909.198
1,5	A34	Recuperación de subrasante con material pétreo en puntos de baja o nula capacidad portante. Incluye sello con material seleccionado.	m3	0	$ 340.820	$ 0
2		**RODADURA EN FRESADO**				
2,1	A24-A	Acopio, mezclado, extendida, compactación y nivelación de material fresado (RAP). Incluye estabilización con emulsión CRL-1 al 2,4% y cemento al 2%. (Incluye transporte y trasiegos)	m3	3738,63	$ 460.657	$ 1.722.226.080
	TOTAL, COSTO DIRECTO					**$ 3.483.460.421**
				Administración	27,87%	$ 970.840.419
				Imprevistos	5,00%	$ 174.173.021
				TOTAL, AI	**32,87%**	**$ 1.145.013.440**
		TOTAL, OBRA				**$ 4.628.473.861**
	P01	**VALOR PARA LA GESTION AMBIENTAL PAGA**				$ 136.323.523,11

ITEM	CÓDIGO ACTIVIDAD UMV	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1		**BASES**				
	T01	**VALOR PARA PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - PMT**				$ 39.734.397,70
	S01	**VALOR GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**				$ 34.698.958,27
	VALOR MES OBRA + COMPONENTES					**$ 4.839.230.740,08**

Las cantidades de obra relacionadas en la tabla anterior corresponde a los frentes de obra de Unión Tunales y Capitolio para el periodo de agosto 2025.

7.2.4 Maquinaria y equipo de obra

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria y equipo destinados a la ejecución de las obras viales:

Tabla 59 Maquinaria y Equipo UAERMV

MAQUINARIA UAERMV agosto 2025				
EQUIPO/ VEHICULO	**MARCA**	**FIJA EN OBRA**	**INTERMITENTE EN OBRA**	**UBICACIÓN**
Retroexcavadora	John Deere	X		TUNALES
Motoniveladora	Caterpillar	X		TUNALES
Vibro compactador 8 ton.	Ingersoll Rand	X		TUNALES
Carro Tanque para humedecimiento	JBC	X		TUNALES
Minicargador con martillo	Bob Cat	X		TUNALES
Retroexcavadora	Terex	X		CAPITOLIO
Motoniveladora	Rhino	X		CAPITOLIO
Vibro compactador 8 ton.	Ingersoll Rand	X		CAPITOLIO
Carro Tanque para humedecimiento	Chevrolet	X		CAPITOLIO

MAQUINARIA UAERMV agosto 2025				
EQUIPO/ VEHICULO	**MARCA**	**FIJA EN OBRA**	**INTERMITENTE EN OBRA**	**UBICACIÓN**
Vibro compactador doble rodillo tandem 4ton.	Hamm	X		CAPITOLIO
Minicargador con martillo	Mactrack	X		CAPITOLIO
Volqueta sencilla	Fotón	X		CAPITOLIO
Motoniveladora	Caterpillar	X		SAN ANTONIO
Vibro compactador 8 ton.	Caterpillar	X		SAN ANTONIO
Vibro compactador	Amman	X		SAN ANTONIO
Retroexcavadora	Caterpillar	X		SAN ANTONIO
Retroexcavadora	Loking	X		SAN ANTONIO
Minicargador con martillo	Bob Cat	X		SAN ANTONIO
Minicargador con martillo	Bob Cat	X		SAN ANTONIO
Volqueta sencilla	Fotón	X		SAN ANTONIO
Camioneta Placa JOU555	Ford	X		**TODOS**
Camioneta Placa KRL416	Renault	X		**TODOS**
Camioneta Placa GET696	SSANGYONG	X		**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**

7.2.5 Personal y control de aportes

7.2.5.1 Control personal obra

Durante el presente periodo la UAERMV, realizó el reporte del personal de la UMV, SINTRAUNIOBRAS, contrato 936 (maquinaria), conductores camioneta y vigilancia, para un total de 111 trabajadores, anexo numeral 4B

7.2.5.2 Control de aportes legales y seguridad social

Durante el presente periodo la UAERMV realiza la entrega de las planillas de Seguridad Social, estas se encuentran en revisión dado que se reciben de manera tardía.

7.3 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se presenta el estado del tiempo en la siguiente tabla:

Tabla 60 Tabla Relación de lluvias

FECHA	U. TUNALES	CAPITOLIO	SAN ANTONIO	ESTADO DEL CLIMA
14/08/2025	11:00 am – 2:30 pm	11:00 am – 2:30 pm	11:00 am – 2:30 pm	Lluvias moderadas
19/08/2025	12:00 am – 2:40 pm	12:00 am – 2:40 pm	12:00 am – 2:40 pm	Lluvias moderadas
22/08/2025	2:00 pm – 3:40 pm	2:00 pm – 3:40 pm	2:00 pm – 3:40 pm	Lluvias moderadas

7.4 FUENTE DE MTERIALES

La entidad ejecutora cuenta con suministro de material por parte de las INVESASKK SAS de las canteras de Monteolivo e Incomineria, se solicitaron los certificados de material en los comités de seguimiento realizados en el presente mes, los comités de seguimiento se relacionan en el numeral 7.6.1.

7.5 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO

La Unidad de Mantenimiento Vial no ha entregado la documentación correspondiente a los ensayos de laboratorio dado que la entrega del informe mensual del componente técnico se encuentra pendiente, se espera que para el siguiente periodo entregue la totalidad de la documentación.

7.5.1.1 Cronograma del Obra

Para el presente periodo se tiene que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL presenta un atraso al cronograma de obra, del cual se tiene que para el tramo Unión Tunales se tiene un avance programado de 100%, una ejecución del 42% para un atraso del 58%; Para el tramo Capitolio se tiene un avance programado de 54%, una ejecución de 62% para un atraso del 8%, para el tramo San Antonio un avance programado del 21%, una ejecución del 10.81%, para un atraso del 10.19%.

7.5.2 Estado de avance de obra

Durante el presente periodo la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL ejecuto las siguientes actividades:

TRAMO UNION TUNALES
Actividades:

- Se realiza el perfilamiento subrasante entre k0+625 a k0+700.
- Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante k0+625 a k0+680. 55x4.6x.10.
- Se realiza aproximación de base del k0+665 a k0+700. (35×4.6×0.08)m
- Se lleva a cabo replanteo de borde de vía para cunetas
- Se realiza manejo de aguas escorrentías en k0+550 costado izquierdo.
- Se lleva a cabo replanteo de borde de vía para cunetas k+205 a k0+400.
- Se lleva a cabo aproximación de base granular en K0+455 - K0+510
- Se lleva a cabo replanteo de borde de vía para cunetas k+280 a k0+415

TRAMO CAPITOLIO

Actividades:

- Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+590 a K3+440.
- Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+590 a K3+440.
- Se realiza cereo aproximado de fresado 0.08mts.
- Se realiza extendida de base granular para protección de subrasante entre K3+400 a K3+370. Se realiza cerro aproximado.
- Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+590 a K3+440.
- Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+590 a K3+440.
- Se realiza cereo a nivel de fresado 0.07mts.

- Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+540 a K3+490.
- Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+540 a K3+490.
- Se realiza cereo a nivel de fresado 0.08mts.
- Se realiza corte de junta para base estabilizada en k3+550.
- Se realiza extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica en K3+490 a K3+475.
- Se realiza imprimación mecánica sobre fresado en K3+490 a K3+475.
- Se realiza cereo a nivel de fresado 0.08mts.

TRAMO SAN ANTONIO - TOLDO

Actividades:

- K3+150 a K3+130 Perfilacion subrasante. K3+150 a K3+130 Extendida de base. K3+130 a K3+115 Trasiego de RCD. K3+120 y K3+335 Limpieza de Alcantarillas
- K3+130 a K3+120 Perfilacion subrasante K3+130 a K3+120
- K1+420 a K1+390
- Perfilacion de exceso de material saturado y barro.
- K3+130 a K3+120
- Conformación con Rajón. (para habilitar paso en vía y retomar actividad el día siguiente)
- K1+100 a K1+180 Perfilación de exceso de material saturado y barro.
- K1+180 a K1+170 Excavación de fallo e:0.40 Instalación de Rajón e:0.30 Sello con RAP e:0.18 (se instala este espesor para proteger vía.)
- K1+400 a K1+390 Reproceso excavación de fallo para recuperación de movilidad. Excavación e:0.60 Mejoramiento con Rajón e:0.40 Sello con RAP e:0.20
- K1+400 a K1+415 Reproceso excavación de fallo. Excavación e= 0,60
- Mejoramiento Rajón en=0,50 Sello B-200 e= 0,10
- Instalación de Base Granular e=0,15 K2+800 a K2+793
- Acción de movilidad instalación de Rajón e: 0,20.
- K2+330 a K2+340 A: 4,00 Acción de movilidad Excavación e:0,40 Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15
- K2+600-K2+400-K2+250 Aseo orden y limpieza de acopios
- K2+620 a K2+610 A: 4,60 Acción de movilidad Excavación e:0,40
- Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15
- K9+500 a K9+400 der
- Manejo de aguas lluvias.

- K2+870 a K2+720 Perfilacion de material saturado (queda acopiado en vía)
- K3+148 a K3+138 A: 3,50 Acción de movilidad Excavación e:0,40 Mejoramiento Rajon e: 0,25 Sello con Rap e:0,15

Tabla 61 Cantidades ejecutados en el periodo

ITEM	CÓDIGO ACTIVIDAD UMV	DESCRIPCIÓN	UN	CANT
1		**BASES**		
1,1	A09	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue.	m3	158,46
1,2	A17	Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 85 Km aprox.). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	m3	126,19
1,3	A27-A	Nivelación y Mejoramiento de subrasante con material seleccionado. No incluye transporte.	m3	121,02
1,4	A15-A	Base granular clase B (BG_B). Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación.	m3	168,71
1,5	A34	Recuperación de subrasante con material pétreo en puntos de baja o nula capacidad portante. Incluye sello con material seleccionado.	m3	
2		**RODADURA EN FRESADO**		
2,1	A24-A	Acopio, mezclado, extendida, compactación y nivelación de material fresado (RAP). Incluye estabilización con emulsión CRL-1 al 2,4% y cemento al 2%. (Incluye transporte y trasiegos)	m3	306,46

7.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA

7.6.1 Actas de comité de obra o actas de reunión

En la siguiente tabla se registran las diferentes reuniones y comités llevados a cabo durante el período:

Tabla 62 Actas de Comité de Obra

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTA N°	**FECHA**	**TEMAS TRATADOS**
50	1/08/2025	- Avance de obra - Documentación y acciones faltantes UAERMV para inicio y continuidad de las obras - Informes mensuales pendientes - Entregar hojas de vida de maquinaria - Actividades obra - Seguimiento a cronograma obra
51	8/08/2025	- Avance de obra - Documentación y acciones faltantes UAERMV para inicio y continuidad de las obras - Informes mensuales pendientes - Entregar hojas de vida de maquinaria - Actividades obra

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTA N°	**FECHA**	**TEMAS TRATADOS**
		- Seguimiento a cronograma obra
53	22/08/2025	- Avance de obra - Documentación y acciones faltantes UAERMV para inicio y continuidad de las obras - Informes mensuales pendientes - Entregar hojas de vida de maquinaria - Actividades obra - Seguimiento a cronograma obra
54	28/08/2025	- Avance de obra - Documentación y acciones faltantes UAERMV para inicio y continuidad de las obras - Informes mensuales pendientes - Entregar hojas de vida de maquinaria - Actividades obra - Seguimiento a cronograma obra

Las actas de reunión antes mencionadas se anexarán en el informe mensual del siguiente periodo, ya que, se encuentran en revisión y firmas por las partes que intervinieron.

7.6.2 Bitácora de obra

Se anexa copia de la bitácora de obra de fecha de inicio de labores de obra del 1 al 31 de Agosto del 2025 donde se indican las labores realizadas y las indicaciones dadas por la interventoría. Anexo bitácora de obra 3.A

7.7 GESTIÓN AMBIENTAL

- Se requiere que la UAERMV atienda con prontitud las observaciones/requerimientos de la interventoría, especialmente en lo concerniente al manejo del líquido para imprimación asfáltica, solicitud realizada durante el comité de seguimiento semanal

- En lo concerniente al manejo del material resultante de excavaciones, se hace necesario que el material sea retirado a la mayor brevedad (sin superar las 72 horas), debido a que se presentan obstrucciones para el tránsito de los habitantes del sector, solicitud dada en el comité de seguimiento semanal

- Es necesario que la UAERMV retire el material de RCD que se encuentra en los bordes de la vía, como también en la limpieza de los encoles y descoles en las alcantarillas, solicitud dada en el comité de seguimiento semanal

- Se requiere la protección y cubrimientos del material acopiado para evitar pérdidas por material debido a las altas lluvias

- No se realizaron hallazgos de elementos arqueológicos que se tuvieran que reportas ante el ICANH.

El informe Ambiental se encuentra anexo al numeral 4A

7.8 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)

Para el presente periodo la UAERMV, presentó el 06 de julio de 2025, el informe mensual del mes de junio de 2025, el cual tiene fecha límite hasta el 05 de mayo de 2025, este se encuentra en revisión.

Durante el presente periodo la UAERMV, realizó el reporte del personal de la UMV, SINTRAUNIOBRAS, contrato 936 (maquinaria), conductores camioneta y vigilancia, para un total de 111 trabajadores.

La interventoría, en su labor de verificación y aprobación de la maquinaria, equipos y vehículos que presenta la UAERMV, para la operación en el proyecto, efectúa una comprobación de los documentos legales de cada uno, para determinar su operatividad en el frente de trabajo, para el presente periodo la UAERMV, presenta documentos del contrato 936, y documentación de

maquinaria de misionalidad, esta debe ir adjunta en el informe del periodo reportado.

En conjunto con la revisión realizada por la parte técnica de la maquinaria, equipos y vehículos, el componente SST, deberá realizar la verificación de las afiliaciones y pagos de planillas de seguridad social integral que esté vigente, con afiliación a ARL, con el riesgo correspondiente al nivel de riesgo expuesto, exámenes médicos ocupacionales vigentes y sin restricciones al cargo de los operadores de estos.

El informe SST se encuentra anexo al numeral 4.B

7.9 GESTIÓN SOCIAL

Para el periodo del presente informe, se realiza las siguientes actividades representativas:

Tramo Unión Tunales

A la fecha de cierre del presente informe la profesional social de la entidad ejecutora continua en la implementación del punto de atención al usuario como lo establece el PAGA (Plan de acción de la guía ambiental -PAGA). No se evidencia aviso informativo, Cuenta con los volantes informativos, el PMT, y el afiche informativo. Así mismo realiza atención móvil, con el fin de recepcionar en el frente de obra todas las inquietudes de la comunidad.

Frente de Capitolio

En el tramo de Capitolio, la interventoría da aval para que se implemente el punto de atención a la comunidad móvil, por cuanto que no se evidencia un predio cercano donde realizará atención en una carpa móvil de la UAERMV, cuenta con los volantes informativos, el PMT, y el afiche informativo.

Frente San Antonio El Toldo

En el tramo de San Antonio, la interventoría da aval para que se implemente el punto de atención a la comunidad móvil, por cuanto que no se evidencia un predio cercano donde realizará atención en una carpa móvil de la UAERMV, cuenta con los volantes informativos, el PMT, y el afiche informativo. La interventoría solicita un oficio donde se justifique su ubicación, dando alcance a lo establecido en el Plan de gestión social.
El informe de gestión social se encuentra en el anexo 4.C

7.10 ESTADO DEL PROYECTO

A la fecha el ejecutor UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, se encuentra activo y en ejecución.

8 CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022

8.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

8.1.1 Datos del contrato de interventoría

En la siguiente tabla se muestran las generalidades del Contrato 161 del 14 de febrero de 2022:

Tabla 63 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor

ENTIDAD CONTRATANTE:	**FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ**
CONTRATO DE OBRA N°:	CIN-REGALIAS-161-2022 del 14/02/2022
OBJETO:	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, social y jurídica, a la ejecución del proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" con código BPIN "2018000050020" financiado con recursos del sistema general de regalías SGR.
PROCESO DE SELECCIÓN N°:	FDRS-CMA-182-2021
DATOS DEL INTERVENTOR:	
CONTRATISTA INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S
NIT:	890.104.625-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	CARRERA 45 N° 85-50 - BARRANQUILLA
TELÉFONO:	3126700442
CORREO	Intersumapaz.ecovias@gmail.com
MODIFICATORIO Nº.1	MODIFICAR EL ANEXO Nº1 ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA DE OBRA, MODIFICACIÓN ALCANCE DEL CONTRATO.
OTROS DATOS DEL CONTRATO	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE INICIO	03 DE MARZO DE 2022
VALOR INICIAL:	$ 3.104.380.144,00 Incluido IVA.
ADICION N°. 1	$ 66.865.059, 00 Incluido IVA
ADICION N°. 2	$ 119.900.452,00 Incluido IVA
ADICION N°. 3	$ 3.682.565.081,00 Incluido IVA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 6.973.710.736,00 Incluido IVA.
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	02 DE JUNIO DE 2023
PRÓRROGA Nº. 1 y MODIFICACIÓN N°. 2	2 MESES
PRÓRROGA N°. 2 y MODIFICATORIO N°. 3	4 MESES Y 29 DÍAS
PRÓRROGA N°. 3	2 MESES
PRÓRROGA N°. 4	1 MES
PRÓRROGA N°. 5	20 DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN 1	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2024
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 1	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2024
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 1	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS PARTIR DEL 17 DE AGOSTO AL 1 DE OCTUBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 3 SUSPENSIÓN 1	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2024
AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN 1	UN (1) MES Y VEINTICINCO (25) DÍAS A PARTIR DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 26 DE ENERO DE 2025
AMPLIACIÓN 5 SUSPENSIÓN 1	UN (1) MES A PARTIR DEL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2025
AMPLIACIÓN 6 SUSPENSIÓN 1	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE ABRIL DE 2025
REINICIO N°1	1 de abril de 2025
PRÓRROGA N°. 6 ADICIÓN N° .3	NUEVE (9) MESES DESDE EL 4 DE ABRIL DE 2025 AL 4 DE ENERO DE 2026
PLAZO ACTUALIZADO	TREINTA Y CUATRO (34) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	4 DE ENERO DE 2026
VALOR ANTICIPO:	N/A
SUPERVISOR:	DIEGO GARCIA BEJARANO

8.2 PÓLIZAS O GARANTÍA CONTRATO INTERVENTORÍA

El contratista otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:

Tabla 64 Datos pólizas contrato interventoría

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
AMPARO	**PÓLIZA N°**	**CERTIFICADO O ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**EXPEDIDA / MODIFICADA SEGÚN**
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	0	21-feb-22	CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	0	21-feb-22	CONTRATO
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	1	7-mar-22	MODIFICACIÓN N°.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	1	7-mar-22	MODIFICACIÓN N°.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	2	7-mar-22	ACTA DE INICIO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	2	7-mar-22	ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	6	28-jul-23	MODIFICACIÓN N°. 2 y PRÓRROGA N°. 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	7	28-jul-23	MODIFICACIÓN N°. 2 y PRÓRROGA N°. 1
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	7	23-08-23	MODIFICACIÓN N° 4 Y PRÓRROGA N° 2
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	8	22-08-23	MODIFICACIÓN N° 4 Y PRÓRROGA N° 2
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	10	17-01-2024	PRÓRROGA N° 3
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	9	29-12-23	PRÓRROGA N° 3
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	11	5-03-24	PRÓRROGA N° 4 ADICIÓN N° 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	11	5-03-24	PRÓRROGA N° 4 ADICIÓN N° 1
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	14	1-04-2024	PRÓRROGA N° 5 ADICIÓN N° 2
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	12	1-04-2024	PRÓRROGA N° 5 ADICIÓN N° 2
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	15	14-04-2025	REINICIO N°1
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	16	14-04-2025	REINICIO N°1
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	17	23-04-2025	PRÓRROGA N° 6 ADICIÓN N° 3
CUMPLIMIENTO	85-44-101115012	18	23-04-2025	PRÓRROGA N° 6 ADICIÓN N° 3
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	13	23-04-2025	REINICIO N°1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	85-40-101051606	14	23-04-2025	PRÓRROGA N° 6 ADICIÓN N° 3

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados de conformidad con la Cláusula Décima séptima del contrato de interventoría:

Tabla 65 Pólizas del contrato de interventoría

AMPARO	REQUISITOS CONTRACTUALES		DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA		
	Vigencia contractual	% contractual	Desde	Hasta	Valor asegurado
CUMPLIMIENTO					
a). Cumplimiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	10%	3-mar-22	04-feb-26	$ 697.371.073,60
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Plazo del contrato y tres (3) años más.	5%	3-mar-22	04-ene-29	$ 348.685536,60
c). Calidad del servicio	Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.	30%	2-ago-23	21-abr-2029	$ 2.092.113.220,80
RESPONSABILIDAD CIVIL					
a). Predios labores y operaciones	Igual al período de ejecución del contrato.	No debe ser inferior a Trescientos (300) SMMLV.	3-mar-22	4-ene-26	$ 427.050.000,00

8.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.3.1 Otrosíes. Adiciones y Prórrogas

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosíes, adiciones en valor y prórrogas al contrato de interventoría:

Tabla 66 Otrosíes, Adiciones y Prórrogas Contrato 161 - Interventoría

DOCUMENTO	FECHA	PRORROGA	VALOR	MOTIVO
Modificatorio Nº 1	27-diciembre-2022	—	—	*(…) El alcance de la interventoría objeto del presente proceso, no incluye Contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, los cuales serán supervisadas directamente por la UAERMV. (Tomado de acta de modificatorio N° 1 contrato CIN-REGALÍAS-161-2022)*
Prórroga N°. 1 y modificación N°. 2	2-junio-2023	2 meses	—	Prórroga 2 meses y modificación forma de pago como se indica a continuación: *(…) Prorrogar el contrato por un plazo de 2 meses, tiempo en el cual se continuará con la revisión, verificación en campo y aprobación de los productos del Contrato No. 480 de 2022, correspondiente a la topografía, así como la revisión y aprobación de la documentación previa al inicio de actividades de Obra de la UAERMV, relativas a las obras hidráulicas que actualmente se encuentran suspendidas (Tomado de acta de modificatorio N° 2 contrato CIN-REGALÍAS-161-2022)*
Modificación N°3	14-jul-2023	-	—	Modificar el formulario electrónico de la plataforma SECOP de la cláusula 17 del contrato garantías.
Prórroga N°. 2 y Modificación N°. 4	2-ago-2023	4 meses 29 días	—	Prorrogar el contrato por un término de 4 meses y 29 días a partir del día 3 de agosto del año 2023.
Prórroga N°. 3	29-dic-2023	2 meses	—	Prorrogar el contrato por un término de 2 meses.
Prórroga N°. 4 y Adición N° 1	20-feb-2024	1 meses	$66.865.059	Prorrogar el contrato por un término de 1 mes, adicionar al contrato el valor de $66.865.059
Prórroga N°.5 y Adición N° 2	26-mar-2024	20 días	$119.900.452,00	Prorrogar el contrato por un término de 20 días, adicionar al contrato el valor de $119.900.452,00

DOCUMENTO	FECHA	PRORROGA	VALOR	MOTIVO
Prórroga N°.6 y Adición N° 3	2-abr-2025	9 meses	$ 3.682.565.08,00	Prorrogar el contrato por un término de 9 meses, adicionar al contrato el valor de $ 3.682.565.08,00

8.3.2 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoría

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las suspensiones y reinicios del contrato de interventoría:

Tabla 67 Suspensiones y Reinicios al Contrato 161 - Interventoría.

Documento Acta			Fecha inicio Suspensión	Fecha fin Suspensión	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio Suspensión Reinicio	Motivo Ampliación o prórroga
Suspensión Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento					
Suspensión N°.1	-	17-abr-24	17-abr-24	15-jun-24	Dos (2) meses	16-06-24	Búsqueda de recursos para ejecución contrato interventoría
Reinicio N°1	-	1-abr-25	-	-	-	1-abr-25	-

Para el presente periodo no se realizaron modificaciones contractuales.

8.3.3 Actas modificativas al contrato de interventoría

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a los costos del presupuesto contractual del contrato de interventoría:

Tabla 68 Actas de Modificaciones Costos de Interventoría

ACTA MODIFICATIVA N°	FECHA	MOTIVO			
		AJUSTE MAYORES Y MENORES COSTOS	PRÓRROGA	ADICIONAL EN VALOR	COMENTARIOS
MODIFICACIÓN N°. 2	26 de mayo de 2023	N/A	1	N/A	Se ajustan las tarifas de los profesionales de acuerdo con la lista de precios de referencia del IDU, adicionalmente se ajustan la dedicación de los profesionales dadas las necesidades en campo.
MODIFICACIÓN N°. 4	2 de agosto de 2023	N/A	2	N/A	Se ajusta la cantidad de personal de acuerdo a simultaneidad de los tres ejecutores de obra.

8.4 SEGUIMIENTO REALIZADO POR INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona los contratos y proyectos a los cuales la interventoría realiza control y seguimiento en el presente informe:

- CONTRATO DE OBRA PUBLICA 478 DEL 10/02/2022 Consorcio Gaviones 95 En ejecución.

- CONTRATO DE OBRA PUBLICA 479 DEL 10/02/2022 Consorcio Estabilización Vial, En ejecución.

- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 480 DEL 22/02/2022 Soluciones Geoespaciales S.A.S, finalizado tiempo contractual.

- Proyecto de la entidad ejecutora UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL para el PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ), se realiza seguimiento de actividades de obra iniciadas desde el 17 de julio de 2023. En ejecución.

8.5 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

8.5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contrato de interventoría Nº. CIN-161 del 14/02/2022, en el periodo comprendido entre 1 de 31 de agosto de 2025, se realiza el seguimiento a los contratos activos indicados en el informe mensual,

A continuación, se describen las actividades realizadas por el personal de la interventoría:

8.5.1.1 Actividades realizadas componente Topográfico.

El componente topográfico realiza las siguientes actividades durante el periodo del presente informe:

8.5.1.1.1 Actividades en campo y oficina

TRAMO UNIÓN TUNALES

- Control y revisión: Perfilamiento de la subrasante entre las progresivas K0+625 a K0+700.
- Control y revisión: Extendida de base granular como protección de subrasante entre K0+625 a K0+680 (dimensiones: 55×4.6×0.10 m).
- Control y revisión: Aproximación de base granular desde K0+665 hasta K0+700 (35×4.6×0.08 m).
- Control y revisión: Replanteo de borde de vía para ejecución de cunetas.
- Control y revisión: Manejo de aguas por escorrentía en el costado izquierdo de la progresiva K0+550.
- Control y revisión: Replanteo de borde de vía para cunetas entre K0+205 a K0+400.
- Control y revisión: Aproximación de base granular en el tramo comprendido entre K0+455 y K0+510.
- Control y revisión: Replanteo de borde de vía para cunetas entre K0+280 a K0+415.

TRAMO CAPITOLIO

- Control y revisión: Extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica entre K3+590 y K3+440.
- Control y revisión: Imprimación mecánica sobre fresado entre K3+590 y K3+440.
- Control y revisión: Cereo aproximado del fresado con espesor de 0.08 m.
- Control y revisión: Extendida de base granular como protección de subrasante entre K3+400 a K3+370 y conformación del cerro.
- Control y revisión: Extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica entre K3+540 a K3+490.
- Control y revisión: Imprimación mecánica sobre fresado entre K3+540 y K3+490.
- Control y revisión: Cereo a nivel de fresado con espesor de 0.07 m.
- Control y revisión: Extendida de carpeta de fresado sobre emulsión asfáltica entre K3+490 a K3+475.
- Control y revisión: Imprimación mecánica sobre fresado entre K3+490 y K3+475.
- Control y revisión: Cereo a nivel de fresado con espesor de 0.08 m.
- Control y revisión: Corte de junta para base estabilizada en la progresiva K3+550.

TRAMO SAN ANTONIO – TOLDO

- Control y revisión: Perfilación de subrasante entre K3+150 a K3+130 y extendida de base en el mismo tramo.
- Control y revisión: Trasiego de RCD entre K3+130 y K3+115.
- Control y revisión: Limpieza de alcantarillas en las progresivas K3+120 y K3+335.
- Control y revisión: Perfilación de subrasante entre K3+130 a K3+120.
- Control y revisión: Perfilación de exceso de material saturado y barro entre K1+420 a K1+390.
- Control y revisión: Conformación con rajón entre K3+130 a K3+120 para habilitar el paso y retomar labores al día siguiente.
- Control y revisión: Perfilación de material saturado entre K1+100 a K1+180.
- Control y revisión: Excavación de fallo entre K1+180 a K1+170 (e=0.40 m), instalación de rajón (e=0.30 m) y sello con RAP (e=0.18 m) para protección de vía.
- Control y revisión: Reproceso de excavación de fallo entre K1+400 a K1+390 para recuperación de movilidad. Excavación (e=0.60 m), mejoramiento con rajón (e=0.40 m), y sello con RAP (e=0.20 m).
- Control y revisión: Reproceso de excavación de fallo entre K1+400 a K1+415. Excavación (e=0.60 m), mejoramiento con rajón (e=0.50 m), sello con B-200 (e=0.10 m).
- Control y revisión: Instalación de base granular (e=0.15 m) entre K2+800 a K2+793.
- Control y revisión: Acción de movilidad mediante instalación de rajón (e=0.20 m).
- Control y revisión: Excavación de movilidad entre K2+330 a K2+340 (A=4.00 m), excavación (e=0.40 m), mejoramiento con rajón (e=0.25 m), sello con RAP (e=0.15 m).
- Control y revisión: Aseo, orden y limpieza de acopios entre K2+600, K2+400 y K2+250.
- Control y revisión: Acción de movilidad entre K2+620 a K2+610 (A=4.60 m), excavación (e=0.40 m), mejoramiento con rajón (e=0.25 m), y sello con RAP (e=0.15 m).
- Control y revisión: Manejo de aguas lluvias entre K9+500 a K9+400 costado derecho.
- Control y revisión: Perfilación de material saturado entre K2+870 a K2+720 (material queda acopiado en vía).
- Control y revisión: Acción de movilidad entre K3+148 a K3+138 (A=3.50 m), excavación (e=0.40 m), mejoramiento con rajón (e=0.25 m), y sello con RAP (e=0.15 m).

8.5.1.1.2 Observaciones realizadas durante el periodo

Debido a que se evidencia diferencias en la información de altimetría que genera el equipo de topografía de la UAERMV en campo con respectos a la información entregada por el contratista soluciones geoespaciales sas de los deltas del tramo san antonio 2, se realiza la recomendación y se resalta la importancia de realizar procedimientos topograficos manteniendo precisiones mínimas, lo anterior para evitar reprocesos y cambios en las obras que ejecutan el consorcio estabilización y la UAERMV.

Para el tramo 4 el consorcio estabilización vial realizó el precedimiento de poligonal abierta con puntos de control, lo anterior con el fin de generar información X, Y para los deltas de este tramo, para lo cual se logró evidenciar fallas en el procedimiento realizado, por parte de la interventoría se hacen la respectivas observaciones para que se implementes buenas practicas para el desarrollo de estas actividades.

8.5.1.1.3 Observaciones Especialista diseño Geométrico y de tráfico.

Para el presente periodo el especialista de diseño geométrico y de gráfico realizó la revisión del PMT presentado para el contratista Gaviones 95 para el contrato de obra 478-2022, del cual se emite informe avalando y revisando los documentos para la remisión del PMT.

8.5.1.2 Profesional Residente Técnico y Director.

Para el presente periodo, el director y residente de obra realizaron el debido acompañamiento a las actividades de obra, así como también el acompañamiento a las diferentes mesas técnicas y comités de seguimiento semanal realizados en el los numerales 4.13.1 para Gaviones 95, 5.13.1 para Consorcio estabilización Vial y 7.6.1 para la entidad ejecutora UAERMV.

Se presenta el avance y actividades realizadas semanalmente, prueba de esto se encuentran los informes semanales en el numeral 4.D.

Adicionalmente se realizan las siguientes actividades

- Respuesta a los requerimientos de los ejecutores del proyecto.
- Recorridos de obra.
- Asistencia comités de obra .
- Elaboración de comunicaciones.

8.5.1.3 Profesional de calidad:

El profesional de calidad para el periodo del presente informe realizó el acompañamiento en la elaboración de informes mensuales.

8.5.1.4 Especialista en Geotecnia y Pavimentos

Para el presente periodo el especialista de Geotecnia y Pavimentos realizó la revisión del informe de apropiación a los diseños N°.9, remitido por el Consorcio Estabilización Vial para el contrato de obra 479-2022, del cual se emite informe revisando y avalando los documentos para su implementación en campo.

8.5.1.5 Especialista Estructural

El profesional no desempeño labores en el presente periodo.

8.5.1.6 Especialista Hidráulico

Para el presente periodo, el especialista hidráulico mediante comunicación 186-1- 684 del 29 de mayo de 2025, emite concepto a la comunicación remitida por el contratista Consorcio Gaviones 95 donde remiten el ajuste a la geometría de la cuneta.

8.5.1.1 Profesional Jurídico

Para el presente periodo el profesional jurídico de la interventoría realizo el acompañamiento correspondiente a los conceptos emitidos hacia las diferentes entidades y/o contratistas, así como la verificación jurídica a los documentos suscritos, suspensiones, reinicios y demás.

8.6 CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Para el manejo y control de correspondencia acorde con el sistema de gestión de calidad, se han establecido consecutivos independientes para los oficios que se emiten y reciben en la oficina o campamento del proyecto cercana a las obras y para los oficios que se emiten y reciben en la oficina central en Barranquilla, por lo que se diferencia con el número central del código consecutivo de correspondencia:

Correspondencia enviada y recibida por:

Contrato 478

Contrato 479

Entidad ejecutora UAERMV

Fondo Desarrollo Local de Sumapaz.

A continuación, se relaciona la correspondencia generada por la interventoría para el presente periodo y recibida por parte de los contratistas.

Tabla 69 Correspondencia enviada a contrato 478

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-789	6-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta comunicado D-43- 2025-37. Observaciones informe ambiental No 15-V2
186-1-793	7-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Llamado de atención por instalación de Pasacalles y vallas informativas móviles.
186-1-794	7-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta a comunicado D40 - 2025.
186-1-795	7-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta a comunicado D42-2025. 22 de julio del 2025.
186-1-796	7-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta a informes mensuales N° 10, 11, 12, entregados por correo electrónico el 21 de julio del 2025 y N° 13. entregados por correo electrónico 24 de julio
186-1-798	7-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Observaciones Componente ambiental Acopios temporales de RCD- G95.
186-1-799	7-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Observaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo - G95.
186-1-801	9-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta a comunicado D-44, "Solicitud de copia de grabaciones comités de obra.".
186-1-802	9-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta a comunicado D-46, "Plan de Manejo de Transito Frente de obra Capitolio.". 05-ag-25.".
186-1-807	13-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Solicitud de diligenciamientos formatos RCD enviados por la Unidad de mantenimiento vial UMV. Radicado No. 20251920102621.
186-1-810	13-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Llamado de atención por cierre vial Laguna Verde.
186-1-817	21-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta comunicado D-49- 2025-37. Entrega informe ambiental No 15 junio de 2025 V2 -Aval.
186-1-818	21-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Traslado de FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS. (Valla informativo móvil y pasacalles).
186-1-821	22-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta a correo electrónico del 12 de agosto del 2025 "informe mensual social N° 15" Correo electrónico del 7 de agosto del 2025. "informe social N° 16". Consorcio Gaviones 95.
186-1-832	26-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta comunicado D-41. "Rta. Comunicado 186-0-076.".
186-1-838	27-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta a entrega de "actas de vecindad de San Antonio 1, Capitolio, Laguna Verde" Actas de compromiso de Tramo vial de Capitolio" Consorcio Gaviones 95
186-1-839	27-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Presunto incumplimiento por la no instalación de Pasacalles y vallas informativas móviles informativos.
186-1-840	27-ago.-2025	CONSORCIO GAVIONES 95	Respuesta a correo electrónico del 20-08-2025 con asunto "informe mensual social N° 13 V 1". Del Consorcio Gaviones 95.

Tabla 70 Correspondencia enviada a Contrato 479

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-785	1-ago.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Observaciones componente ambiental frentes de obra Unión Tunales y San Antonio II

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-797	6-ago.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta comunicado CEV/22-449. Informe del componente ambiental No 3 V2 -Aval
186-1-800	11-ago.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta comunicación CEV/22-456 Hoja de vida Profesional SST 2
186-1-805	13-ago.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Solicitud de diligenciamientos formatos RCD enviados por la Unidad de mantenimiento vial UMV, Radicado No. 20251920102621.
186-1-809	13-ago.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta comunicado CEV/22-455. Observaciones Informe del componente ambiental No 21 V1
186-1-811	13-ago.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta a comunicado CEV/22-454 Informe del componente Social No.21 V-1. del 5 de agosto del 2025.
186-1-828	25-ago.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Concepto favorable Acta Parcial de obra No. 8. Remitida mediante comunicado CEV/22-445.
186-1-829	26-ago.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Concepto favorable Acta Parcial de obra No. 9. Remitida mediante comunicado CEV/22-447.
186-1-831	27-ago.-2025	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL	Respuesta comunicado CEV/22-459. Informe del componente Ambiental No.21 V02-Aval

Tabla 71 Correspondencia enviada a UAERMV

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-788	6-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Traslado derecho de petición "vía el toldo San Antonio" Radicado FDRS No. 20257010011792.
186-1-790	6-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta comunicado 20251920096501. Observaciones componente Ambiental y SST
186-1-791	6-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta comunicado 20251920096631 Implementación de acopios con medidas de manejo ambiental
186-1-792	6-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Manejo de personal sin ejecución de obra
186-1-808	13-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE	Respuesta comunicado 20251920103011. Observaciones componente ambiental y SST

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	
186-1-812	13-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta al Radicado: 20251920101991 UAERMV 05- 08 -2025
186-1-813	14-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta correo electrónico del día 06/08/2025. Observaciones Informe Ambiental 14 julio 2025.
186-1-814	19-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta comunicado 20251920097221 del 29-07-25, Observación al concepto de interventoría sobre la solicitud de adición y prórroga al contrato 479 de 2022.
186-1-815	19-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Incumplimiento parcial a compromisos del recorrido del 17 de julio de 2025, UMV
186-1-816	20-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta al Radicado: 20251900097231 UAERMV con asunto: "Traslado radicado UAERMV No. 20251120114702 del 15 de julio de 2025 Solicitud Consorcio Gaviones 95, contrato 478 de 2022."
186-1-819	21-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta comunicado 20251900099291, Rta. oficio No.186-1-680 "Solicitud de Dotación de dotación personal de operadores de maquinaria.".
186-1-820	22-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta comunicado 20251920102621. Solicitud información, diligenciamiento matrices soporte de gestión de RCD en el proyecto.
186-1-823	25-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta comunicado 20241920070811. "Programación Actualizada (Versión 12),(…)
186-1-824	25-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta comunicado 20241920104161 y 20241900127071. "Actualización vigencia de garantías contrato 480 de 2022, (…) y Traslado de comunicados 20241120149312 y 20241120150812.
186-1-825	25-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta comunicado 20241900128211. Respuesta al comunicado con radicado UMV No. 20231120139542 consecutivo ECOVIAS SAS 186-349. "Adaptación Diseño Geométrico tramo capitolio.". y 20241900128161 Respuesta al comunicado con radicado UMV No. 20231120138002 y 20251920004271 consecutivo ECOVIAS SAS 186-344 y 186-387, Adaptación Diseño Geométrico FRENTE UNIÓN TUNALES (Eje 02)." …

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-826	25-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Respuesta comunicado 20251920004241. Rta. radicado UMV No. 20231120153062 consecutivo ECOVIAS SAS 186-1-398. (…)
186-1-827	25-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Rta. comunicado R-UMV-20251920004231, consecutivo ECOVIAS SAS 186-1-443.(…)
186-1-830	26-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Rta. comunicado R-UMV-20251900097231, Traslado radicado UAERMV No. 20251120114702 del 15 de julio de 2025 Solicitud Consorcio Gaviones 95, contrato 478 de 2022.
186-1-833	26-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Observaciones componente ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo SST, UMV.
186-1-834	27-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Rta comunicado No. 20251920107041 del 19-08-2025 - Respuesta comunicación No 186-1-254 Solicitud de documentación, información e informes UAERMV, radicado No 20231120100822.
186-1-835	26-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Rta a comunicado No. 20241920165913, con asunto: Respuesta oficio No. 186-1-537, (Radicado No. 20241120039372), referente a observaciones de los informes mensuales del componente SST de los meses de noviembre y diciembre del 2023 y febrero del 2024.
186-1-837	27-ago.-2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	Rta. comunicado R-UMV-20241920032011, Imprecisiones en los puntos de topografía.

Tabla 72 Correspondencia enviada a FDRS

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
186-1-787	5-ago.-2025	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	Alcance y atención observaciones comunicación 186-1-686 - Contrato 161-2022, informe mensual de interventoría N°.27, periodo 1 al 30 de abril de 2025. Acta parcial N°.26.
186-1-803	11-ago.-2025	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	Respuesta 20257020012241, "Traslado derecho de petición "vía el toldo San Antonio" Radicado FDRS No. 20257010011792.°
186-1-804	12-ago.-2025	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	Contrato 161-2022, informe mensual de interventoría N°.29, periodo 1 al 30 de junio de 2025. Acta parcial N°.28.

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	**FECHA DEL DOCUMENTO**	**ENTIDAD DESTINATARIA**	**ASUNTO TRATADO**
186-1-806	28-ago.-2025	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	Remisión hoja de vida Secretaría ECOVIAS S.A.S
186-1-822	22-ago.-2025	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	Contrato CIN-161-2022, informe mensual de interventoría N°.30, periodo 1 al 31 de julio de 2025. Acta parcial N°.29.
186-1-836	27-ago.-2025	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	Rta a comunicado No. 20251900109701 del 21-08-2025 Respuesta al oficio No. 186-1-706 (Radicado 20251120096292), referente a un llamado de atención por transporte indebido de personal en obra.

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por destinatario

Tabla 73 Correspondencia recibida Contrato 478

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1295	4-ago-25	Consorcio Gaviones 95	Respuesta al comunicado y 186-1-774 de fecha 30.07.2025 con asunto "Reiteración incumplimiento a entregados y comités de obra Cto 478 de 2022"	D-36-2025-37
186-3-1296	4-ago-25	Consorcio Gaviones 95	Solicitud de copias de grabaciones comités de obra	D-44-2025-37
186-3-1298	5-ago-25	Consorcio Gaviones 95	Plan de Manejo de Transito Frente de obra Capitolio	D-46-2025-37
186-3-1302	6-ago-25	Consorcio Gaviones 95	Informe visita tramo vial Capitolio. Incumplimiento compromisos por parte de la Unidad de Atención de Emergencias Mantenimiento Vial	D-47-2025-37
186-3-1303	8-ago-25	Consorcio Gaviones 95	Respuesta a los comunicados 186-1-730 del 9 de julio de 2025 con asunto Posibles incumplimientos del Consorcio Gaviones 95 al contrato de Obra N° 478 de 2022 y 186-1-774 del 30 de julio de 2025 con asunto Reiteración incumpliendo a entregables y comités de obra Cto. 478 de 2022 y a solicitudes realizadas en comités de obra.	D-48-2025-37
186-3-1309	12-ago-25	Consorcio Gaviones 95	Respuesta comunicado 186-1-789. Observaciones informe ambiental No 15-V2	D-49-2025-37
186-3-1321	22-ago-25	Consorcio Gaviones 95	Informe Mensual SST #17julio - Cto. 478 del 2022 Gaviones".	D-50-2025-37

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por parte del contratista Estabilización vial para el presente periodo.

Tabla 74 Correspondencia recibida Contrato 479

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1290	1-ago-25	Consorcio Estabilización Vial	Solicitud de aprobación de ítems no previstos	CEV/22-451

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1291	1-ago-25	Consorcio Estabilización Vial	Alcance oficio CEV/22-448 Solicitud de prórroga No. 4 del contrato de obra	CEV/22-452
186-3-1294	4-ago-25	Consorcio Estabilización Vial	Respuesta oficio 20251920097221 – Solicitud de adición	CEV/22-453
186-3-1299	5-ago-25	Consorcio Estabilización Vial	Informe mensual social No 21	CEV/22-454
186-3-1300	5-ago-25	Consorcio Estabilización Vial	Informe mensual ambiental No 21	CEV/22-455
186-3-1306	8-ago-25	Consorcio Estabilización Vial	Hojas de vida Profesional SST 2	CEV/22-456
186-3-1307	8-ago-25	Consorcio Estabilización Vial	Informe mensual SST No 21	CEV/22-457
186-3-1310	14-ago-25	Consorcio Estabilización Vial	Actualización de polizas	CEV/22-458
186-3-1314	20-ago-25	Consorcio Estabilización Vial	Respuesta oficio 186-1-809 Informe ambiental No 21 V2	CEV/22-459
186-3-1316	21-ago-25	Consorcio Estabilización Vial	Respuesta oficio 186-1-770 Informe social No 20 V2	CEV/22-460
186-3-1323	26-ago-25	Consorcio Estabilización Vial	Radicación de Acta No 20 de la preacta de corte No 8	CEV/22-461
186-3-1324	26-ago-25	Consorcio Estabilización Vial	Respuesta oficio 186-1-811 Informe social No 21 V2	CEV/22-462
186-3-1325	28-ago-25	Consorcio Estabilización Vial	Radicación de Acta No 21 de la preacta de corte No 9	CEV/22-463

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por parte del contratista UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL para el presente periodo:

Tabla 75 Correspondencia recibida UAERMV

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1301	5-ago-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Respuesta radicado UAERMV No. 20251120101242 - 186-1-713 Respuesta a observaciones del informe mensual social N.º 12 correspondiente al mes de mayo de 2025.	20251920101991
186-3-1304	8-ago-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Solicitud de información, diligenciamiento matrices soporte de gestión de RCD en el proyecto.	20251920102621
186-3-1305	8-ago-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	respuesta a comunicación No. 186-1-650 – radicado UAERMV No 20251120068562, relacionado con observaciones a los Componentes Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo – SST.	20251920103011
186-3-1308	12-ago-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Entrega y recibo de la carpeta de acabado en fresado estabilizado en los tramos viales en intervención Unión-Tunales y Capitolio.	20251920104011

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
186-3-1312	19-ago-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Respuesta comunicación No 186-1-254 Solicitud de documentación, información e informes UAERMV, radicado No 20231120100822.	20251920107041
186-3-1317	21-ago-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Respuesta a comunicado UAERMV 20251120133222 de 8 de agosto de 2025, con asunto: "Traslado derecho de petición "vía el toldo San Antonio Radicado FDRS No. 20257010011792	20251920109321
186-3-1318	21-ago-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Comunicación oficial - Respuesta comunicado 20251120088292 UMV, Consecutivo interno 186-1-690 ECOVIAS. Adaptación diseño geométrico frente 08 – ANIMAS BAJAS – Segmento 02	20251920109381
186-3-1319	22-ago-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Respuesta al oficio No. 186-1-706 (Radicado 20251120096292), referente a un llamado de atención por transporte indebido de personal en obra.	20251900109701
186-3-1320	22-ago-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Comunicaciones Oficiales_documentos facilitativos - Inconsistencias formato de preacta de seguimiento GCON-FM-027 contrato de obra pública No. 479 de 2022	20251900109661
186-3-1326	29-ago-25	Unidad Administrativa Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Respuesta a comunicación No. 186-1-777 (Radicado UMV 20251120127172), Reiteración diligenciamiento de preoperacionales en maquinaria amarilla	20251920114491

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por parte del contratista Fondo de Desarrollo Local para el presente periodo:

Tabla 76 Correspondencia recibida FDRS

Al periodo del presente informe no se recibió correspondencia por parte del Fondo de Desarrollo Rural de Sumanapaz.

8.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

El registro fotográfico de las actividades realizadas para el periodo, anexo 4.D

8.8 EQUIPO Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA

El equipo disponible de la interventoría se describe a continuación:

Equipo de oficina:

- ✓ Equipos de Computación de Escritorio y Portátiles

- ✓ Equipos de Escáner e Impresión.
- ✓ Dotación de oficina
- ✓ Alquiler de camioneta
    - Alquiler camioneta incluye conductor 3
- ✓ Alquiler campamento
    - Oficina 3
- ✓ Alquiler equipos de computo
    - Portátil 12 unidades
- ✓ Alquiler de impresora
    - Impresora 2
- ✓ Servicios públicos
    - Energía y aseo
- ✓ Alquiler de equipo topografía
    - Estación mira y nivel (2)

Sede de la interventoría:

Oficina como sede de la interventoría Bogotá Urbana y Rural Sumapaz.

8.8.1 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

Tabla 77 Certificados calibración Topografía

EQUIPO	MODELO	SERIE
Nivel electrónico marca HI TARGET	HT-32	331090106
Nivel automático marca KOLIDA	KL-32	1205599
Estación Total HI TARGET	HTS-420R	H236518
Estación Total KOLIDA	KTS442UT	K156143

8.9 PERSONAL INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona el personal que participo para el presente periodo.

Tabla 78 Personal Contrato 161 ECOVIAS S.A.S - Interventoría

N°	PROFESIONAL	NOMBRE
1	Directora de Interventoría	Ermy Alcier Hurtado Romero
2	Residente de interventoría	Luiggi Pugliese Mercado
3	Residente de interventoría	José Antonio Plata Giraldo
4	Residente de interventoría	Jose Luis Usuga Gomez
5	Residente social	Eva Isabel Bernal Yasso
6	Residente SST	Jesús Antonio Rincón Benavides
7	Profesional Ambiental	Yesenia Hernández Ramírez
8	Ingeniero Auxiliar	David Leonardo Ochoa Vanegas
9	Secretaria	Yenifer Dayana Plaza Gomez
10	Topógrafo	Julián David Ortiz Henao
11	Topógrafo	Edwin Alvear Ortega
12	Cadenero 1	Jhon Jaider Hernández Crúzate
13	Cadenero 1	Herson Smith Roa Linares
14	Cadenero 1	Orlando Sandoval Pavon
15	Inspector	Brayan Geovanny Mendoza Diaz
16	Inspector	Jeisy Loana Altamar Rodríguez
17	Inspector	Carlos Julio Macana Sechagua
18	Abogada	Eliana Melissa Gil Vega
19	Especialista En Geotecnia	Dani Ricardo Acevedo Vergara
20	Especialista En Pavimentos	Dani Ricardo Acevedo Vergara
21	Especialista En Diseño Geométrico	Walter Alfonso Pautt Torres
22	Especialista En Trafico	Walter Alfonso Pautt Torres
23	Especialista Hidráulico	Ignacio Segundo De La Hoz De Castro
24	Especialista Estructural	Manuel De Jesús Alarcón Badillo

Tabla 79 Plan de cargas Interventoría

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR"					
CARGO / OFICIO	**CANT.**	**SALARIO BASE AJUSTADO**	**DEDICACION (%)**	**DEDICACION (MESES)**	**VALOR TOTAL**
PERSONAL PROFESIONAL					
Director de Interventoría	1	$ 10.640.000,00	100%	1,00	$ 10.640.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	3	$ 9.060.000,00	100%	1,00	$ 27.180.000,00
Profesional Ambiental	1	$ 8.172.000,00	90%	1,00	$ 7.354.800,00
Profesional Social	1	$ 7.287.000,00	100%	1,00	$ 7.287.000,00
Profesional SST	1	$ 7.287.000,00	100%	1,00	$ 7.287.000,00
Especialista en Geotécnia	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Especialista en Pavimentos	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Especialista Hidraúlico	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Especialista Estructural	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Especialista en Tráfico	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Especialista en diseño Geométrico	1	$ 9.060.000,00	20%	1,00	$ 1.812.000,00
Abogado	1	$ 7.287.000,00	20%	1,00	$ 1.457.400,00
PERSONAL TÉCNICO					
Topógrafo	2	$ 3.555.000,00	100%	1,00	$ 7.110.000,00
Laboratorista	0	$ 3.149.000,00	50%	1,00	$ 0,00
Inspector	3	$ 3.555.000,00	100%	1,00	$ 10.665.000,00
Tecnico auxiliar de Ingenieria	1	$ 3.410.000,00	100%	1,00	$ 3.410.000,00
Secretaria	1	$ 1.920.000,00	100%	1,00	$ 1.920.000,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
Cadenero I	2	$ 2.204.000,00	100%	1,00	$ 4.408.000,00
Cadenero II	0	$ 1.920.000,00	100%	1,00	$ 0,00
					$ 99.591.200,00
FACTOR MULTILICADOR				**2,36**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 235.035.232,00
OTROS COSTOS DIRECTOS					
Alquiler de Camioneta (Incluye conductor) Código IDU 9165	3	$ 8.352.000,00	100%	1,00	$ 25.056.000,00
Alquiler de oficinas (Sumapaz)	3	$ 2.470.867,00	100%	1,00	$ 7.412.601,00
Alquiler de equipos de computo	12	$ 198.320,00	100%	1,00	$ 2.379.840,00
Alquiler de impresora	2	$ 390.137,00	100%	1,00	$ 780.274,00
Papeleria	2	$ 650.229,00	100%	1,00	$ 1.300.458,00
Caja menor	2	$ 390.137,00	100%	1,00	$ 780.274,00
Laboratorios y pruebas	0	$ 19.506.847,00	45%	1,00	$ 0,00
Alquiler de equipo de topografía (estación, mira y nivel) Código IDU 9115	2	$ 4.716.913,00	100%	1,00	$ 9.433.826,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 47.143.273,00
FACTOR MULTILICADOR				**1,15**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 54.214.765,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO PARA LA INTERVENTORIA					289.249.997,00
IVA SOBRE EL VALOR BASE DE LA INTERVENTORIA				19,00%	54.957.499,00
Periodo del 1 al 31 de agosto de 2025					**344.207.496,00**

8.10 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA.

8.10.1 Forma de pago del contrato.

Teniendo en cuenta la **Prorroga N°.1 y Modificación N°2**, al contrato de interventoría donde se estipulo:

"CLÁUSULA SEGUNDA*. Modificar la* ***CLÁUSULA 8*** *del contrato "FORMA DE PAGO", la cual quedará de la siguiente manera: 1****. 90% DEL VALOR DEL CONTRATO ASÍ****: El FDRS pagará al INTERVENTOR, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el FDRS y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, probados por el contratista y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. La cuenta de Cobro debe ser refrendada por el representante del interventor y el Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el FDRS a través del Supervisor. La cuenta deberá presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos*".

1. 10% DEL VALOR DEL CONTRATO DISTRIBUIDOS ASÍ:

A. UN PAGO DEL 5% CON:

• Recibo a satisfacción de las obras de malla vial, obras hidráulicas y demás que sean requeridas. • Entrega de informe final de interventoría.
• Entrega de planos récord al momento del pago. Conforme lo mencionado en los estudios previos y anexo 1 – anexo técnico.

B. EL 5% RESTANTE CON: • Suscripción acta de liquidación contrato de obra e interventoría.

8.10.2 Actas de costos / Recibos parcial de Interventoría

La siguiente tabla contiene la relación de actas parciales de la interventoría.

Tabla 80 Relación Actas parciales Contrato 161- Interventoría

ACTA N°	FECHA	PERÍODO	VALOR BÁSICO ($)	I.V.A. ($)	VALOR TOTAL ACTA ($)	Estado
1	24/06/2022	3 al 31 mar 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
2	24/06/2022	01 al 30 abr de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
3	10/08/2022	01 al 31 May de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
4	10/08/2022	01 al 30 jun de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
5	26/06/2023	01 al 31 jul de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
6	26/06/2023	01 al 30 ago. de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
7	26/06/2023	01 al 30 sep de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
8	28/06/2023	01 al 30 oct de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
9	28/06/2023	01 al 30 nov de 2022	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
10	28/06/2023	01 al 30 dic de 2022	$ 95.866.838	$ 18.214.699	$ 114.081.537	Pagada
11	28/06/2023	01 al 31 ene de 2023	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
12	5/07/2023	01 al 28 feb de 2023	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
13	5/07/2023	01 al 31 mar de 2023	$ 55.901.203	$ 10.621.229	$ 66.522.432	Pagada
14	5/07/2023	01 al 30 abr de 2023	$ 55.901.199	$ 10.621.228	$ 66.522.427	Pagada
15	23/08/2023	3 jun al 2 de jul de 2023	$ 120.484.194,12	$ 22.891.997	$ 143.376.191	Pagada
16	8/09/2023	3 jul al 2 de ago de 2023	$ 124.655.621,01	$ 23.684.568	$ 148.340.189	Pagada
17	25/09/2023	3 al 31 de ago de 2023	$ 152.297.324,10	$ 28.936.492	$ 181.233.815	Pagada
18	13/10/2023	1 al 30 de sep de 2023	$ 163.938.636,00	$ 31.148.341	$ 195.086.977	Pagada
19	29/11/2023	1 al 31 de oct de 2023	$ 163.938.636,00	$ 31.148.341	$ 195.086.977	Pagada
20	7/12/2023	1 al 30 de nov de 2023	$ 163.938.636,00	$ 31.148.341	$ 195.086.977	Pagada
21	18/01/2024	1 al 31 de dic de 2023	$ 163.938.636,00	$ 31.148.341	$ 195.086.977	Pagada
22	28/02/2024	1 al 31 de enero de 2024	$ 178.574.851,26	$ 33.929.222	$ 212.504.073	Pagada
23	22/02/2024	1 al 29 de febrero de 2024	$ 191.812.047,06	$ 36.444.289	$ 228.256.336	Pagada
24	22/02/2024	1 al 31 de marzo de 2024	$ 195.036.915,13	$ 37.057.014	$ 232.093.929	Pagada
25	22/02/2024	1 al 16 de abril de 2024	$ 104.013.185,71	$ 19.762.505	$ 123.775.691	Pagada
26	15/05/2025	1 al 30 de abril de 2025	$ 239.497.906,72	$ 45.504.602	$ 285.002.509	Pagada
27	15/06/2025	1 al 31 de mayo de 2025	$ 281.833.474,79	$ 53.548.360	$ 335.381.835	Pagada
28	16/10/2025	1 al 30 de junio de 2025	$ 281.833.474,79	$ 53.548.360	$ 335.381.835	Pendiente
29	16/10/2025	1 al 31 de julio de 2025	$ 261.845.730,25	$ 49.750.689	$ 311.596.419	Pendiente
30	16/10/2025	1 al 31 de agosto de 2025	$ 260.324.996,64	$ 49.461.749	$ 309.786.746	Pendiente
Total			$ 3.610.221.742	$ 685.942.137	$ 4.605.950.624	
Total, Facturas Pagadas					**$ 3.649.185.624**	
Total, Facturas Pendiente Pago					**$ 956.765.000**	

8.11 OTROS COMPONENTES

8.11.1 Gestión ambiental

Para el presente se precisa lo siguiente A continuación, se hace una relación de los productos que están pendientes por entregar por parte de la UAERMV así:

Tramo CAPITOLIO

- Acopio de combustible no tiene identificación ni señalización según SGA.
- Falta orden y aseo en tramo
- Alcantarilla K4+456 con acumulación de material.
- Material base granular y MBR no lo están cubriendo en su totalidad.
- Una de las unidades sanitarias sin agua para el lavado de manos.
- Punto ecológico en orden.
- Se observan señales verticales tiradas a un lado de la vía en K4+260.

Solicitud:

- Se le reitera la importancia del agua potable para el lavado de manos y así evitar focos de contaminación en los trabajadores.
- Se le solicita a la UAERMV, exigir al contratista que realiza el aseo a las unidades sanitarias realizar el mantenimiento y reparación de las mismas en los tiempos acordados.
- Se solicita a la UAERMV, realizar permanentemente limpieza y retiro de material y RCD en alcantarillas y en vía.

Tramo UNIÓN TUNALES

- Material RCD en K0+150 y 200, sin retirar.
- Se observa señales transito verticales a un lado de la vía en tramo 5
- Alcantarilla K2+390 con acumulación de material instalado en la vía
- Se observa de RCD, en K2+623 producto de la limpieza de zanja descole alcantarilla
- RCD al lado de la vía sin señalización adecuada
- Material base granular cubierto en acopio
- Unidades sanitarias sin agua para el lavado de manos.
- Acopio de combustible de la AUERMV, en orden y etiquetado.

Solicitud:

- Se solicita a la UAERMV, el retiro de material RCD, y material retirado de alcantarillas que hay a lo largo del tramo.

- Se solicita el retiro de restos de MBR del canal descole de alcantarilla en K2+623

SAN ANTONIO TOLDO

- Se observa derrame de emulsión asfáltica en K5+490.
- Canecas de emulsión vacías en vía.
- Una de las dos unidades sanitarias sin agua para el lavado de manos
- Retroexcavadora marca DEERE, presenta escape de hidráulico en brazo de uña
- Se observa RCD sin señalizar en K5+,840,400,965

Solicitud:

- Se solicita a la UAERMV, mantener debidamente etiquetado el acopio de sustancias químicas según SGA.
- Dotar de agua a las unidades sanitarias para el lavado de manos
- Se solicita el retiro de RCD del tramo y/o la señalización del mismo.
- Se solicita el retiro de inmediato de canecas y no dejarlas al lado de las cantarillas donde posiblemente genere contaminación y exponiendo a que los lugareños puedan tomar estas canecas las cuales necesitan un manejo ambiental adecuado.
- Se solicita la limpieza de emulsión asfáltica en el punto observado

El informe del componente ambiental se encuentra anexo al numeral 4.A

8.11.2 Salud ocupacional y seguridad en el trabajo (SST)

- Se realiza mesas de trabajo con la UAERMV y el CEV, para acordar temas relacionados con requerimientos pendientes de comités y en los comunicados, enviados.

- Seguimiento de las actividades en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantados por la UAERMV y de acuerdo con su plan de trabajo de la Etapa de Construcción.

- Durante el periodo objeto del presente informe se dio seguimiento a la accidentalidad para el contrato de obra, no se presentaron accidentes o incidentes en el periodo, según lo reportado por la parte de la UAERMV y el CEV.

- Seguimiento al suministro de elementos de protección personal de la UAERMV, reposición por deterioro, inspección y entrega oportuna.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el COPASST, conformación y actas de reuniones.

- Revisión de las planillas de pago de Seguridad Social, donde se refleje el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las obligaciones de Seguridad Social del contrato de obra.

- El Residente SST de la Interventoría intervino en los comités integrales y en aquellos espacios donde se solicitó su participación.

- La interventoría lleva control en la bitácora del componente SST, en la cual se realiza las anotaciones de novedades en terreno, con el fin de socializarlas con la profesional SST de la UAERMV y CEV.

- La Interventoría reporta el uso de dos vehículos tipo camioneta durante el periodo reportado, los cuales realizan el transporte de los profesionales de la interventoría para las actividades de recorridos a obra y asistencia a comités.

Adicionalmente se anexa el informe del componente SST en el numeral 4.B

8.11.3 Gestión social

El área social de la Interventoría realizó las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por la entidad ejecutora, en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico. Mediante:

- Recorridos
- Comités de seguimiento integral
- Comités de seguimiento social
- Verificación de documentación.
- Llamados de atención
- Bitácora social
- Lista de chequeo.

Se anexa el informe social de interventoría en el numeral 4.C

8.11.4 Estado del contrato

Estado del contrato N°. 161 del 14/02/2022. **En ejecución de actividades de obra a contratos 478, 479 y seguimiento actividades de obra a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.**

9 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA

Para el presente periodo, la interventoría realizo el seguimiento y control de los contratos relacionados en el informe, así mismo se realizó a través de la correspondencia el control y seguimiento a las observaciones presentadas por los contratistas, a partir del 1 de abril de 2025 los contratos 478, 479 y 161.

El presente documento corresponde a la versión V1, del informe mensual Nº. 31, en este informe se tomaron en consideración las observaciones realizadas por la supervisión del FDRS a los informes anteriores.

Se continua con los requerimientos por parte del componente SST, a la UAERMV en cuanto a la entrega de la documentación referente a la afiliación del personal de obra, así como las hojas de vida de la maquinaria que se encuentra en obra, adicional de los productos entregados para la adaptación de los diseños, todo esto en vista del reinicio del contrato.

El contrato 478 de 2022, Consorcio Gaviones 95 para el presente periodo reinicio el día 1 de abril de 2025, sin embargo, se evidencia en campo que no realizó actividades de obra.

Se el contrato 479 de 2022, Consorcio Estabilización Vial, para el presente reinicia actividades de obra el día 1 de abril de 2025, se realizaron actividades de excavación, perfilación, instalación geotextil y de tubería perforada para filtro e instalación de material drenante.

10 CONCLUSIONES

- El contrato 478 de 2022, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025 el contratista de obra no realizó actividades de obra, presenta un avance ejecutado del 17.91%.

- El contrato 479 de 2022 para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2025, realizó actividades de excavación, perfilación, instalación geotextil y de tubería perforada para filtro e instalación de material drenante, se presenta un avance general ejecutado del 71,2% y programado del 96,8, de lo anterior se evidencia un atraso del 25.6% el cual se ha informado en los diferentes comités de seguimiento semanal.

- Para la ejecución por parte de la UAERMV presenta un atraso al cronograma de obra, del cual se tiene que para el tramo Unión Tunales se tiene un avance programado de 100%, una ejecución del 42% para un atraso del 58%; Para el tramo Capitolio se tiene un avance programado de 54%, una ejecución de 62% para un atraso del 8%, para el tramo San Antonio un avance programado del 21%, una ejecución del 10.81%, para un atraso del 10.19%.

- La interventoría da respuesta y realizó observaciones a los documentos enviados por el contratista hidráulico y la UAERMV, donde se revisó y se emitió observaciones a los productos como lo fueron informes mensuales, adaptación de los diseños geométricos, revisión de adaptación, de ítems no previstos y de actas parciales.

- Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, se realizaron comités de obra con los ejecutores, donde se realizaron observaciones y precisiones tales como:

    - Caracterización de los materiales
    - Documentación y acciones faltantes UAERMV para inicio y continuidad de las obras
    - Avance de obra
    - Coordinación de personal, maquinaria y comisión de topografía.
    - Implementación laboratorio 100%
    - Programación semanal de actividades por componente
    - Entrega del plan de inspección de ensayos.
    - Documentación de las canteras que están suministrando el material pétreo.
    - Entrega de los informes mensuales de cada componente.

- Con el inicio de obras del 17 de julio de 2023 por parte de UAERMV la interventoría mediante múltiples comunicaciones solicita al contratista para que entregue la documentación referente al ingreso de personal, hoja de vida de la maquinaria empleada para la ejecución de las obras, dicho requerimiento a fecha de corte del presente informe sigue sin ser atendido en su totalidad.

- La UAERMV con los inconvenientes que ha tenido en cuanto al suministro de la maquinaria y materiales pétreos, no ha podido avanzar en la ejecución por los bajos rendimientos que se están presentando lo que posiblemente ocasionara que no se culmine a tiempo todas las actividades contempladas de obra

- Por otra parte, se le ha reiterado a la UAERMV que las demoras en la entrega de las adaptaciones de los diseños geométricos están repercutiendo en el avance de la ejecución de las obras hidráulicas en los diferentes tramos, y que si los atrasos relacionados en el presente comunicado llegan afectar la terminación de las obras hidráulicas y la terminación de la ejecución de obra a cargo de la UAERMV los tiempos adicionales que se tomen y afecten el cronograma deberán ser asumidos por la UAERMV.

11 RECOMENDACIONES

- Se sugiere a la entidad FDRS, comunicar a la UAERMV que es urgente que entregue los conceptos hidráulicos para dar celeridad a la continuación de las obras, estos se vienen reiterando en cada comité de seguimiento realizado semanalmente.

- Se sugiere nuevamente a la entidad hacer saber a la UAERMV sobre la recomendación hecha, de dar mayor celeridad a la realización de ajustes a los diseños geométricos de los tramos viales. De igual manera, tener mayor responsabilidad con el cumplimiento de los compromisos establecidos en los comités de seguimiento, así como también el cumplimiento de los cronogramas remitidos, dado que al evaluar el avance de obra se evidencia un claro atraso en la ejecución de obra.

- Se sugiere a la entidad informar a la UAERMV y a su diseñador geométrico realizar visitas a campo con el fin de evidenciar de primera mano las observaciones realizadas por contratistas de obra e interventoría a fin de poder realizar los respectivos ajustes de manera eficaz y eficientemente. Lo anterior, evitando así los constantes reprocesos en la obtención de diseños geométricos definitivos para los tramos viales del proyecto.

12 ANEXOS

ANEXO NO. 01
DOCUMENTACION CONTRATO 478
DEL 10/02/2022

1.A BITÁCORA DE OBRA

23-07-2025	Retiro de Capa vegetal, actividad de delimpieza
28-07-2025	Construcción de filtro con demolición de roca, se generan sobrecanchos en la excavación debido a la presencia de rocas de gran volumen.
29-07-2025	Actividades: excavación para construcción de filtro desde la abscisa K0+620 hasta el K0+410 con presencia de roca en la excavación.
30-07-2025	Excavación con demolición de roca para construcción de filtro
31-07-2025	Excavación con demolición de roca para construcción de filtro.
1-08-2025	Se continua con excavación y demolición en roca para construcción de filtro desde las abscisas K0+620 a K0+540, demolición manual y mecanica de roca.
2-08-2025	Excavación de alcantarilla - se evidencia material rocoso en excavación para construcción de filtro, se perfila talud de excavación para evitar derrumbe en K0+405.

Powered by CamScanner

3-08-2025 Se culmina excavación para instalación de tubería de 36" - 6,90 metros lineales, se realiza instalación de cama de triturado por un grosor de 20 cm.

4-08-2025 Se culmina la actividad de relleno sobre el tubo con B200 hasta la rasante de la vía.

5-08-2025 Excavación para construcción de filtro

6-08-2025 Excavación para construcción de filtro

7-08-2025 Realizar excavación para filtro desde la abscisa K0+820 se encuentra presencia de rocas en la excavación, demolición de roca con martillo hidráulico.

8-08-2025 Excavación para construcción de filtro con demolición de roca.

9-08-2025 Se inicia excavación para construcción de alcantarilla, se realiza apuntalamiento de talud.

10-08-2025 Se realiza instalación de tubería de 36" de 1,5 ml, se culmina con relleno con B200, se deja señalizado la intervención según lo estipulado por la interventoría.

Powered by CamScanner

11-08-2025 Se realiza instalación de material de afirmado con B200, y nivelación de triturado.

12-08-2025 Se realiza instalación de afirmado B200 y nivelación de triturado.

13-08-2025 Se inicia con actividad de excavación de alcantarilla KO+306, demolición de tubería antigua de 24"

14-08-2025 Instalación de tubería de 36" y relleno de excavación hasta el nivel de la rasante de la vía.

15-08-2025 Personal Contratista: 1 Residente técnico, 1 residente ambiental, 1 Residente social, Profesional SST, 1 Topografo, 1 Cadenero, 1 Oficial, 5 auxiliares de Obra, 2 auxiliares de trafico, 1 Operador, 2 conductores.
Personal Interventoria, 1 Inspecto, 1 Topografo.
Actividades Relleno con B200 desde el KO+187 Hasta el KO+209.

19-08-2025 Personal Contratista: 1 Residente técnico, 1 Res ambiental, 1 Res. Social, 1 Profesional SST, 1 Topográfo, 1 Cadenero, 1 Oficial, 5 Aux de Obra, 2 auxiliares de trafico, 2 operadores, 1 Conductor
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador, 1 Retro-cargador, 1 Volqueta, 1 Canguro, 1 Retroexcavadora,

Powered by CamScanner

1 Camión
Personal Interventoría: 1 Inspector, 1 Topografo.
Actividades excavación para construcción de filtro.

20 OBRERS Personal Contratista: 1 Ing Técnico, 1 Ing Ambiental, 1 Res. Social, 1 Profesional SST, 1 Topografo 1 Cadenero, 1 Oficial, 2 auxiliares de trafico, 8 auxiliares de Obra, 2 Operador, 1 Conductor
Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador, 1 Volqueta sencilla, 1 Compactador ne umático, 1 Retroexcavadora, 1 Camión.
Personal interventoría: 1 Inspector, 1 Topográfo
Se continua con excavación para filtro con presencia de roca, demolición manual de roca.

21-08-2023 Personal Contratista: 1 Ing Técnico, 1 Ing Ambiental, 1 Res. Social, 1 Profesional SST, 1 Topográfo, 1 Cadenero, 1 Oficial, 2 auxiliares de tráfico, 8 auxiliares de Obra, 2 Operadores, 1 Conductor.
Maquinaria y Equipo: 1 Retro excavadora, 1 Minicargador, 1 Volqueta sencilla, 1 Compactador neumatico, 1 Retroexcavadora, 1 Camión
Personal Interventoria: 1 Inspector, 1 Topografo
Actividades: Excavación de cónstrucción con presencia de roca, excavacion para construcción de filtro

22-08-2023 Personal Contratista 1 Residente técnico, 1 Res Ambiental, 1 Res Social, 1 Topografo, 1 Cadenero, 8 aux de Obra, 2 aux de tráfico, 2 operadores, 1 Conductor

Powered by CamScanner

Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador, 1 Volqueta sencilla, 1 Canguro Max retro, Camion
Personal Interventoria: 1 Inspector, 1 Topografo
Actividades Excavación en derrumbe con presencia de roca.

23-08-2023 Personal contratista: 1 residente técnico, 1 Residente ambiental, 1 residente social, 1 Profesional SST, 1 Topografo, 1 Cadenero, 1 Oficial, 2 auxiliares de tráfico, 5 auxiliares de Obra 2 Operadores 1 Conductor.
Maquinaria y Equipo: Retroexcavadora 1 Minicargador, 1 Volqueta Sencilla, 1 Canguro 1 Camión.
Personal Interventoría: 1 Inspector, 1 Topografo
Actividades: excavación e instalación de geotextil, instalación de material petreo de 1 1/2".

24-08-2023 Personal Contratista: 1 residente técnico, 1 Residente ambiental, 1 residente social, 1 Profesional SST, 1 Topografo, 1 Cadenero, 1 Oficial, 2 auxiliares de tráfico, 5 auxiliares de Obra, 2 operadores, 1 Conductor
Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador, 1 Volqueta sencilla, Canguro, 1 Camión.
Personal Interventoría: 1 Inspector, 1 Topografo
Actividades; excavación, instalación de geotextil e instalación de material petreo de 1" a 1 1/2"

Powered by CamScanner

25-08-2025 Personal del Contratista 1 Residente Técnico, 1 Tecnico 1 Residente Ambiental, 1 Res Social, 1 Profesional SST, 2 oper 1 Oficial, 5 auxiliares de Obra, 2 aux tráfico, 1 cadenero
Personal Interventoría: 1 inspector, 1 Topógrafo
Actividades: Construcción de filtro, excavación e instalación de geotextil e instalación de material triturado de 1" a 1½".
Nota se presenta daño mecánico del minicargador caterpilar, Retroexcavadora caterpilar, arreglan minicargador a las 2:00 pm.

26-08-2025 Personal del Contratista: 1 Res Técnico, 1 Res ambiental, 1 Res Social, 1 profesional SST, 1 Oficial, 5 auxiliares, cadena de Obra, 2 aux de tráfico, 3 operadores, 2 conductores, tecnico
Maquinaria y Equipo Retroexcavadora, Minicargador Miniretroexcavadora, 1 Volqueta sencilla, 1 camion
Personal Interventoria: 1 Inspector, 1 Topógrafo
Actividades: En la mañana se realiza recorrido encontrando personal haciendo mejoramiento en la vía con rajón 2 ayudantes, 1 operador y el minicargador.
Se realiza construcción de filtro frances de KO+000 al KO+688 derecho.
En el KO+420 se hace retiro de material se traslada al K1+750 carril izquierdo.
la interventoría recibe tramo de filtro del KO+780 al KO+710. carril derecho.

27-08-2025 Personal de Obra 1 Residente Técnico, 1 Res Ambiental, 1 Res Social, 1 Topógrafo, 1 Cadenero, 1 Oficial, 2 Operadores 1 Conductor.
Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador 1 Mini retroexcavador, 1 Camión, 1 Volqueta sencilla

Powered by CamScanner

Personal Interventoría: 1 Inspector, 1 Topógrafo
Actividades: No se realizan actividades de Obra, se encuentra personal esperando se arregle o repare minicargador y retro excavadora.

28-08-2025 Personal Contratista: 1 Resi. Técnico, 1 Res. Ambiental, 1 Res Social, 1 Topógrafo, 1 Cadenero, 1 Oficial, 5 auxiliares de Obra, 2 aux de tráfico, 2 operadores, 1 Conductor
Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador, 1 Retroexcavadorauni, 1 Volqueta, 1 Camión, 2 operadores
Personal Interventoría: 1 Inspector, 1 Topógrafo.
ACTIVIDADES Construcción de filtro de K0+670 K0+623, excavación mecánica carril derecho, material de excavación se retira al acopio K1+750, se inicia actividades para construcción de filtro en excavación del K0+920 a K0+910. Se inicia demolición de roca con miniretro martillo desde K0+686, K0+678, K0+673, K0+672, K0+671. Se realiza entibado con camilla K0+689,50 a K0+679.

29-08-2025 Personal Contratista: 1 Residente técnico, 1 Res Ambiental, 1 Res Social, 1 Topografo, 1 Cadenero, 5 auxiliares de Obra, 2 aux de tráfico, 2 operadores, 2 conductores.
Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora, 1 Minicargador, 1 Miniretroexcavador, 1 Camión, 1 Volqueta sencilla.
Personal Interventoría: 1 Inspector, 1 Topografo.
Actividades Inicia instalación de B200 sobre el filtro frances de K0+790 a K0+758, carril derecho, se continua con demolición de roca con el martillo de miniretroexcavadora en K0+672 y K0+671, construcción de filtro instalación

Powered by CamScanner

de geotextil e instalacion de material petreo de 1" a 1 ½" desde K0+680 a K0+630, y se inicia construcción de filtro con excavación, instalación de geotextil e instalación de material petreo de 1" a 1 ½" de K0+920 a K0+910, el material petreo queda expuesto falta cocer el geotextil. Se realiza comite de Obra número 58 con recorrido de obra, presencia de dir Interventoría, Residente Técnico Interventoría, profesional SST, Resi ambiental, Topografo de Interventoría, Profesionales URBANU: Director de Obra, Res. Social, Res. Ambiental y Res SST.

Observaciones. Se evidencia material saturado B 200 por exceso de humedad, se debe garantizar la uniformidad de material en los tramos intervenidos.

30-08-2025 No se realizan actividades de Obra

31-08-2025 No se realizan actividades de Obra.

1-09-2025 Personal Contratista: 1 Residente ambiental, 1 Residente social, 1 Profesional SST, 1 Topógrafo, 1 Cadenero, 1 Opicual, 3 auxiliares de obra, 2 auxiliares de Tidrica, 2 operadores, 2 conductores.
Personal Interventoría: 1 Residente Técnico, 1 Residente ambiental, 1 Profesional SST, 1 Topografo, 1 Inspector.

- Se retoma actividad en dia con la llegada de la maquinaria hacia las 10:30am, continuando la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+910 - K0+850 Carril derecho, el material producto de la excavación es transportado en la volqueta sencilla al acopio temporal ubicado en el K1+750 Carril Izquierdo, en el proceso de excavación se encuentran varias rocas en el K0+899, 896 y 8

ANEXO NO. 02
DOCUMENTACION CONTRATO 479
DEL 10/02/2022

2.A ACTA DE MODIFICACIÓN

PRÓRROGA 4 AL CONTRATO NO. 479 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV Y CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

Entre el *Ordenador del Gasto delegado de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, JULIO CESAR PINZÓN REYES,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.578.511, actuando como Gerente del proyecto "Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" de conformidad a lo dispuesto en la Resolución 602 del 14 de julio de 2023, desempeñando el cargo de Subdirector de Intervención de la Infraestructura de la Entidad, según Resolución No. 456 de fecha 21 de junio de 2023, proferido por el Director General, y Acta de posesión 036 de fecha 22 de junio de 2023, quien en adelante y para efectos del presente acto se denominará la **UAERMV**, Entidad descentralizada del orden Distrital adscrita a la Secretaría de Movilidad, identificada con el NIT. No. 900.127.032-7, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, de una parte, y, por la otra **CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL identificado con NIT N° 901.563.835-7** y representado legalmente por **HERNANDO LAVERDE MANJARRES,** con cédula de ciudadanía **1.032.362.624**, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará genéricamente **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente Prórroga No. 4 al Contrato de Obra Pública No. 479 de 2022, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que la UAERMV y CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL suscribieron el contrato No. 479 el 11 de febrero de 2022, con el objeto "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020") GRUPO 2: "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.")., por un valor de DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($12.494.588.139).

1. Que en el contrato se pactó un plazo de ejecución inicial de ONCE (11) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, es decir, desde el 03 de marzo de 2022 hasta 02 de febrero de 2023.

2. Que el 14 de julio de 2022, las partes suscribieron Modificación No. 1 y Prórroga No. 1, por la cual se amplió el plazo del Contrato en dos (2) meses y quince (15) días más y se adiciona un parágrafo a la Cláusula Cuarta al Contrato de Obra Pública No. 479 de 2022, junto con documentos de justificación que formaron parte integral de la mencionada modificación.

3. Que el 10 de octubre de 2023, las Partes suscribieron Modificación No. 2 y Prórroga No. 2, por la cual se amplió el plazo del Contrato en (8) meses (15) quince días calendario, se modificó la cláusula 8 – "Forma de pago" y se adicionó un parágrafo más al Contrato de Obra Pública No. 479 de 2022, junto con documentos de justificación que formaron parte integral de la mencionada modificación.

4. Que el 29 de noviembre de 2023, las Partes suscribieron Modificación No. 3 por la cual se modificó la Cláusula 5 – "Valor del Contrato", suprimiéndose la siguiente expresión del párrafo

segundo “sin fórmula de reajuste” al Contrato de Obra Pública No. 479 de 2022, junto con documentos de justificación que formaron parte integral de la mencionada modificación.

5. Que el Contrato de Obra Pública No. 479 de 2022 ha sido suspendido de mutuo acuerdo por las partes conforme la siguiente relación:

ACTAS No.	TIEMPO (Días calendario)	FECHA
1	60 DÍAS	14/04/2023
2	30 DÍAS	15/06/2023
3	15 DÍAS	14/072023
4	32 DÍAS	28/07/2023
5	16 DÍAS	29/08/2023
6	7 DÍAS	14/09/2023
8	15 DÍAS	25/09/2023
9	2 MESES	17/04/2024
10	2 MESES	17/06/2024
11	1 MES Y 16 DIAS	16/08/2024
12	1 MES	01/10/2024
13	2 MESES y 20 DIAS	01/11/2024
14	1 MES	21/01/2025
15	1 MES Y 10 DÍAS	21/02/2025
16	ACTA REINICIO	01/04/2025

6. Que conforme el acta No. 17 de reiniciación del contrato, suscrita el 01 de abril de 2025, se consignó que la fecha actual de terminación contractual es el 09 de junio de 2025.

7. Que el 09 de junio de 2025 las partes suscribieron la Prórroga No. 3 al Contrato 479 de 2022, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución por el término de DOS (2) MESES, estableciendo como nueva fecha de terminación contractual el 09 de agosto de 2025.

PRÓRROGA 4 AL CONTRATO NO. 479 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV Y CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

8. Que mediante comunicados CEV/22-443 con radicado 20251120123202 de 24 de julio de 2025, CEV/22-448 con radicado 20251120127752 de 30 de julio de 2025 y CEV/22-452 de 1 de agosto de 2025 y CEV/22-453 con radicado 20251120132022 el Consorcio Estabilización Vial presentó solicitud de prórroga de cuatro meses (4) al plazo de ejecución del Contrato 479 de 2022 y la interventoría Ecovías S.A.S, mediante radicado **186-1-786** N° 20251120128312 avaló la misma.

9. Que mediante radicado No. 20251900219163 del 31 de julio de 2025 y alcance No. 20251920226023 del 8 de agosto de 2025, la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, remitió a la Gerencia de Contratación la solicitud de Prórroga No. 4 al Contrato No. 479 de 2022, con sustento en los documentos de justificación como a continuación se relaciona:

(…) " JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD: El contratista Consorcio Estabilización Vial mediante comunicado CEV/22-443 con radicado 20251120123202 de 24 de julio de 2025, CEV/22-448 con radicado 20251120127752 de 30 de julio de 2025 y CEV/22-452 de 1 de agosto de 2025, que hace parte fundamental del presente modificatorio, realizó solicitud de modificación contractual del contrato 479 de 2022, requiriendo la "prórroga del contrato por un plazo de cuatro (4) meses, con el fin de poder dar cumplimiento al objeto y alcance del mismo.". Dicho documento fue objeto de revisión y recomendación favorable por parte de la Interventoría mediante oficio 186-1-786 que hace parte fundamental del presente modificatorio, en los siguientes términos:

> *"Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría CINREGALÍAS-161-2022, de manera respetuosa nos permitimos dar concepto y trasladar el comunicado relacionado en el asunto, del contrato N°. 479 de 2022, prórroga del contrato de Obra, que tiene como objeto "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2.". (…)*
>
> *"Justificación técnica."*
> *Concepto: En cuanto al Fundamento Técnico, con lo argumentado y trazabilidad presentada por el Consorcio Estabilización Vial, en este numeral, está acorde a lo que aconteció en el contrato, y lo que origino que a la fecha el contrato 479 de 2022, requiera de una prórroga, debido que la entidad UAERMV.*
>
> *Concepto: En cuanto al ajuste al diseño de animas bajas de los 2.126 m que tiene la UAERMV que intervenir han entregado el ajuste de diseño de 689 m, lo demás está pendiente de entrega.*
>
> *Como se ha evidenciado en obra los rendimientos en la ejecución, nos han sido óptimos, por la deserción del personal lo cual a quedado argumentado en los comités de obra, también la lejanía de los tramos que hacen que no se cuenta con todos los suministros cuando se solicitan y la ola invernal que, afectado las vías, esto ha ocasionado dificultades en los accesos a los tramos en ejecución.*
>
> *Con respecto al PMT aprobado, esta autorizando el cierre completo de la vía para la ejecución, pero si se realiza el cierre completo esto afectaría la ejecución de obras a cargo de la UAERMV, y no se podría implementar otro frente de obra como lo manifiesta el contratista de obra.*
>
> *"Justificación Financiera.".*
>
> *(…)*

PRÓRROGA 4 AL CONTRATO NO. 479 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV Y CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

Teniendo en cuenta que el contrato no ha consumido todo el valor del contrato y que no se ha terminado de ejecutar las cantidades contempladas en el contrato de obra se requiere la prórroga para llegar parcialmente al objeto contractual. Como se relaciona en la justificación financiera.

JUSTIFICACIÓN JURIDICA
En cuanto a la prórroga, se tiene que el Consejo de Estado ha precisado que esta modificación contractual, contiene lo siguiente:

"(…) Por regla general, el vencimiento del plazo estipulado es una de las causas de terminación del contrato. Sin embargo, en cuanto no está prohibido, el plazo estipulado en el contrato se puede ampliar o prorrogar mediante acuerdo de las partes. No existe prohibición legal para la prórroga del plazo de los contratos estatales. "(…)

Lo anterior, teniendo en cuenta los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993, donde se permite la inclusión de las cláusulas que se estimen necesarias con el fin de alcanzar la satisfacción de los fines estatales (…)"

Así mismo, el contrato de obra se encuentra vigente, y a la fecha no se ha adelantado ningún proceso de incumplimiento al contratista de Obra del contrato 479 de 2022.

En concordancia con lo relacionado en el presente comunicado, muy respetuosamente se recomienda a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV, una prórroga por cuatro (4) mes, al contrato de obra 479-2022, que tiene como objeto " CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2".

La Prórroga deberá ser definida y evaluada según lo que la entidad estime conveniente, tomando en cuenta la estructuración del proyecto y los convenios que haya suscrito.

En virtud de lo anterior, para el trámite respectivo se anexan los siguientes documentos:
- *programación de obra por el tiempo de la prórroga*
- *Flujo de Caja.*

Los documentos relacionados están viabilizados por la interventoría se adjunta suscritos por el representante legal de la interventoría."

De acuerdo con las anteriores comunicaciones, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV como entidad contratante y en su calidad de ejecutor del proyecto de inversión pública, de acuerdo con la designación hecha por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la Región Centro Oriente consignada en el artículo 1 del Acuerdo 099 de 2019 y siendo el responsable de garantizar la adecuada ejecución, con base en las necesidades del proyecto, evalúa la solicitud de prórroga elevada por el contratista Consorcio Estabilización Vial, evidenciando que la misma obedece a la necesidad de contar con un término adicional que le permita culminar las actividades de obra civil pendientes, enmarcadas dentro del objeto contractual y respaldadas por la interventoría del contrato.

Es preciso destacar que a la fecha el contratista cuenta con las adaptaciones de diseño requeridas para la ejecución de los tramos San Antonio y Unión Tunales, para el cumplimiento del objeto contractual y que de ninguna manera el segmento faltante por la adaptación al diseño del tramo Animas

PRÓRROGA 4 AL CONTRATO NO. 479 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV Y CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

Bajas ha imposibilitado al contratista el desarrollo de sus trabajos. Vale la pena resaltar que esta actividad se ha desplazado en el tiempo debido a la ejecución de una obra de bioingeniería para la estabilización del talud (hecho sobreviniente) desarrollado en una parte de ese tramo de calzada, con la cual los trabajos de topografía y adaptación del diseño se realizarán y entregarán a interventoría durante el periodo de la prórroga objeto de esta justificación.

De acuerdo con lo señalado por la interventoría mediante concepto técnico radicado con el oficio No. 186-1-778, el contratista ha venido ejecutando las obras conforme a los diseños suministrados y las adaptaciones aprobadas durante la etapa de apropiación de los mismos, siendo tales intervenciones validadas mediante el modificatorio contractual No. 3. Sin embargo, pese a contar con tres frentes de obra activos, los avances en campo no han sido óptimos debido a múltiples factores operativos que afectan directamente el rendimiento de las actividades del contratista. Entre estos, se encuentran dificultades logísticas por la dispersión geográfica de los frentes, limitaciones en la disponibilidad de insumos y maquinaria, afectaciones climáticas, así como restricciones derivadas del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), que imposibilitan la habilitación de nuevos frentes de trabajo sin interferir con otras intervenciones en la zona.

En todo caso, la UAERMV manifiesta que el control de rendimientos, acciones que permitan la continuidad de los trabajos y el seguimiento a los cronogramas y plazos previstos es de total responsabilidad de la Interventoría.

Cabe destacar que, a la fecha, de acuerdo con la información entregada por la interventoría el valor reportado como valor ejecutado corresponde al acumulado del acta No. 17 de Control Financiero aprobado por la interventoría y pagado por la Entidad, existiendo a la fecha un saldo contractual pendiente de ejecución por valor de $3.246.846.043, el cual corresponde a actividades contractuales específicas de cunetas, alcantarillas y otras obras hidráulicas en los tramos San Antonio II y Unión Tunales.

La continuidad de estas intervenciones resulta fundamental para cumplir con el objeto del contrato, más aún cuando las condiciones de campo requieren que las mismas se realicen bajo una programación técnica secuencial que respete los ritmos de avance compatibles con las condiciones geográficas y sociales del entorno rural en que se ejecutan.

Así, con base en la información técnica suministrada por la interventoría, la UAERMV considera procedente otorgar una prórroga por cuatro (4) meses al contrato 479 de 2022, término estimado como razonable y proporcional para la culminación de las actividades en curso, garantizando continuidad en la ejecución del proyecto y la correcta finalización de las metas físicas previstas en la programación de obra por el tiempo de la prórroga viabilizada por Interventoría, tiempo razonable para el desarrollo de las actividades de contractuales objeto del contrato de acuerdo con la programación avalada por Interventoría." (…)

10. Que teniendo en cuenta que la solicitud de prórroga obedece a la necesidad de contar con un término adicional que le permita al contratista Consorcio Estabilización Vial culminar las actividades de obra civil pendientes enmarcadas dentro del objeto contractual y respaldadas por la interventoría del contrato, desde la gerencia del proyecto y ordenación del gasto de la UAERMV se considera procedente otorgar la prórroga.

11. Que de acuerdo con el control financiero entregado por la interventoría existe un saldo contractual pendiente de pago para las actividades en curso y la correcta ejecución de las actividades del objeto contractual de acuerdo con la programación avalada por la interventoría, que ejerce el pleno control de rendimientos, el seguimiento de los cronogramas, plazos previstos y acciones que permitan la continuidad de los trabajos.

PRÓRROGA 4 AL CONTRATO NO. 479 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV Y CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

12. Que a la fecha el contratista Consorcio Estabilización Vial cuenta con las adaptaciones de diseño requeridas para la ejecución de los tramos de San Antonio y Unión Tunales para el cumplimiento del objeto contractual y que de ninguna manera el segmento faltante por la adaptación al diseño del tramo Animas Bajas ha imposibilitado al contratista el desarrollo de sus trabajos.

13. Que en virtud a la ejecución de una obra de bioingeniería para la estabilización del talud (hecho sobreviniente) desarrollado en una parte del tramo de calzada Animas Bajas, los trabajos de topografía y adaptación del diseño se realizarán y se entregarán por parte de la UAERMV a la interventoría durante el período de la prórroga solicitada.

14. Que las obras que desarrolla el contratista hidráulico Consorcio Estabilización Vial, son predecesoras a las obras de calzada ejecutas por la UAERMV, el cual no presenta por parte de la interventoría ningún informe de incumplimiento.

15. Que en virtud del Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales al celebrar contratos buscan el cumplimiento de los fines estatales consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

16. Que el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, contempla que en virtud del principio de responsabilidad "Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato."

17. Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en relación con el contenido del contrato estatal dispone: "(…) En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.

18. Que la solicitud de Prórroga fue aprobada en la Sesión No. 27 del Comité de Contratación extraordinaria.

19. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a prorrogar el Contrato No. 479 de 2022, con base en las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: PLAZO DE EJECUCIÓN: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 479 de 2022 por el término de CUATRO (4) MESES, contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo pactado; es decir, hasta el 09 de diciembre de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS: El contratista deberá ampliar la vigencia de los amparos contenidos en la Garantía de Cumplimiento, de acuerdo con la presente prórroga, remitirlas a interventoría y cargarlas en la plataforma Secop II para su aprobación.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones no

PRÓRROGA 4 AL CONTRATO NO. 479 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV Y CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

modificadas a través del presente documento continúan vigentes.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., en la fecha indicada por medio de la plataforma Secop II.

Firmado Electrónicamente
JULIO CESAR PINZÓN REYES
Subdirector de Intervención de la Infraestructura*
UAERMV

Firmado Electrónicamente
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Contratista

Aplica Resolución No. 602 del 14 de julio de 2023

2.B BITÁCORA DE OBRA

Martes 2 de julio ... Clima: Seco

PERSONAL CEV: 1 Topógrafo, 1 cadenero, 2 oficiales, 6 ayudantes, 2 Aux. Tráfico, 1 conductor, 1 operario MIN 1 operario de Retro, 2 oficiales, 2 ayudantes

MAQUINARIA y EQUIPO: 1 Retro, 1 MIN, 1 TRAMPA, 1 cortadora 1 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 Generador eléctrico, 1 volqueta Doble

PERSONAL INTERVENTORÍA: 1 Res Técnico, 1 Inspector, 1 Res Social, 1 Res Ambiental, 1 Res SST, 1 Conductor

ACTIVIDADES

KM 1072 - KM 1078 Dem Concreto 14 módulos

Firma SST

CEV

Jueves 31 de julio de 2025 clima: seco

PERSONAL CEV: 1 Topógrafo, 1 cadenero, 2 oficiales, 6 ayudantes 2 Auxiliar de Tráfico, 1 conductor, 1 operario MIN, 2 operario de Retro, 2 oficiales, 2 ayudante.

MAQUINARIA/EQUIPO: 1 Retro, 1 MIN, 1 TRAMPA, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Res Técnico 1 Inspector, 1 Res SST, 1 Residente Social, 1 Residente Ambiental, 1 Conductor

ACTIVIDADES

KM 1074 - KM 1078 Dem Concreto para 14 modulos cuneta

KM 1+16 Armado de acero de refuerzo para zapata estructura de descole

Firma SST

CEV

Viernes 01 de agosto de 2025 Clima: Seco

Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 2 oficiales, 6 ayudantes, 2 Auxiliar de tráfico, 1 conductor, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 2 oficiales y 2 ayudantes.

Personal de maquinaria o equipos: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 vibrador de concreto y 1 volqueta doble

Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 topógrafo y 1 conductor.

Powered by CamScanner

Actividades: K3+950 a K3+900 del Alistamiento, nivelación y compactación de B-200. K4+464 Armado acero de refuerzo para zapata de estructura de descole.
Observaciones: El contratista realiza ajuste al acero armado de zapata, pues las medidas descritas en el detalle no son ejecutables en campo, la distorsión al implantar las medidas de los bordes descritas en el detalle se genera en la base menor de empalme de acero. La alcantarilla K4+206 queda en observación por posible afectación a la estructura de encole y la ruptura interna de la tubería novafort de 36".

Sábado 02 de agosto de 2025 Clima: Seco
Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 2 oficiales, 6 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, 1 conductor, 1 operador de minicargador, 1 operador de retro cargador, 1 oficial y 2 ayudantes.
Maquinaria: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 mezcladora; 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 generador electrico, 1 vibrador de concreto y 1 volqueta doble.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.
Actividades: Aseo y limpieza de obra.
Observaciones: se labora hasta medio dia.

Domingo 03 de agosto de 2025 Clima: Seco
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de CEV.

Lunes 04 de agosto de 2025 Clima: Seco
Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 2 oficiales, 6 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, 1 conductor, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 1 oficial y 2 ayudantes.

Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 Vibrador de concreto y 1 volqueta doble.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo, 1 conductor.
Actividades: K3+977 a K3+922 der instalación de concreto in sit para 15 modulos de cuneta. K4+464 armado acero de refuerzo para zapata de estructura de descole.
Observaciones: Aún se evidencia concreto al interior de la tubería 36" en alcantarilla borde derecho K4+206.

Esurias SAS

CEV

Martes 05 de agosto de 2025 Clima: seco
Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 2 opiciales, 6 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, 1 conductor, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 1 opicual y 2 ayudantes.
Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 Vibrador de concreto y 1 volqueta doble.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.
Actividades: K3+975 a K3+924 derecho instalacion de concreto in situ para 14 módulos de cuneta K4+464 entrega de acero de refuerzo para zapata de estructura de descole. Instalación de concreto in sito para zapata de estructura de descole.
Observaciones: En el armado de acero de refuerzo se identifica que los recubrimientos son de 0.05 m para cumplir con los detalles de ganchos y escuadras en las longitudes especificadas y deberia disminuir su longitud en el acero o generar un sobre ancho en el concreto para cumplir con recubrimiento de 0.075 m.

Esurias SAS

CEV

Miércoles 06 de agosto de 2025 Clima: Seco
Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 2 opiciales, 6 ayudantes, 2 aux-

Powered by CamScanner

ilares de tráfico, 1 conductor, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 1 oficiales. y 2 ayudantes.
Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 mezcladora 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 vibrador de concreto y 1 volqueta doble.
Personal de interventoría: 1 residente técnica, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.
Actividades: KS+410 a K3+920 aseo y limpieza de obra, K4+464 Armando de acero de refuerzo para placa contra-erosión, Instalación de concreto in sito para placa contra erosión.

Firma CEV

Jueves 07 de agosto de 2025 Clima: seco
No se realizan actividades en este frente por parte de CEV debido a cambio de subcontratista y personal de obra.

Firma CEV

Viernes 08 de agosto de 2025 Clima: Seco
No se realizan actividades en este frente por parte de CEV debido a cambio de subcontratista y personal de obra.

Firma CEV

Sábado 09 de agosto de 2025 Clima: seco
No se realizan actividades en este frente por parte de CEV debido a cambio de subcontratista y personal de obra.

Firma CEV

Domingo 10 de agosto de 2025 Clima: Seco
No se realizan actividades en este frente por parte de CEV.

Firma CEV

Powered by CamScanner

Lunes 11 de agosto de 2025 Clima: Seco

Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 inspector, 2 auxiliares de tráfico, 1 operador de retrocargador, 1 operador de minicargador, 1 oficial y 2 ayudantes.

Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 mezclador 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 vibrador de concreto y 1 volqueta doble.

Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo. y 1 conductor.

Actividades: K4+467 Armado de acero de refuerzo para aletas y cabezal. K4+206 Retiro de concreto embebido en tubería 36"

Observaciones: Se requiere implementar unidad de ejecución que continue la construcción de modulos de cuneta.

Ing. Residente SST

Ing. CEV

Martes 12 de agosto de 2025 Clima: Seco

Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 inspector, 2 auxiliares de tráfico, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor, 1 maestro, 4 oficiales y 2 ayudantes.

Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 volqueta doble, 1 placa vibratoria, 1 generador electrico, 1 cortadora.

Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.

Actividades: K4+464 Armado de acero de refuerzo para aletas y cabezal. K3+910 a K3+845 Cortes de pavimento.

Observaciones: ingresa personal para construccion de cunetas. En abscisa K3+690 durante actividad de replanteo se evidencia que los puntos materializados no son congruentes con la instalación de cresado. En abscisa K4+206 se evidencia afectación en tubería, se pone en consideración del área técnica el tratamiento adecuado en tal situación. Aún se genera tráfico con volqueta "cuatro manos" con 12 m³ de material.

Ing. Residente SST

Ing. CEV

Powered by CamScanner

Miércoles 13 de agosto de 2025 clima: Seco

Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 inspector, 2 auxiliares de tráfico, 1 operador con minicargador, 1 operador de retrocargador 1 conductor, 1 maestro, 4 oficiales, 2 ayudantes.

Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 volqueta doble, 1 placa vibratoria, 1 generador electrico. y 1 cortadora

Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.

Actividades: K4+464 Instalacion de formaleta para aletas y Cabezal de estructura de descole, K3+920 a K3+845 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en bermu- cuneta.

Observaciones: En tramo K3+920 a K4+845 se realiza lleno con material B-200 por 0.20m de espesor se usa material reutilizado en vía por sobre espesor 0.55m.

Ecovia S.A.S

CEV

Jueves 14 de agosto de 2025 Clima lluvia moderada

Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 inspector, 2 auxiliares de tráfico, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, conductor, 1 maestro, 4 oficiales y 2 ayudantes.

Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 Volqueta doble, 1 placa vibratoria, 1 generador electrico y 1 cortadora

Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.

Actividades: K4+464 instalación de concreto in sitio para estructura de descole cabezal y aletas, K3+920 a K3+845 Alistamiento de módulos de cuneta.

Observaciones: Se solicita al contratista garantizar la capa de B-200 como estrato final, aún cuando se permite realizar el lleno con material reciclado. Aún se evidencian puntos de replanteo que no corresponden con el diseño de vía, se solicita a CMV gestionar con el personal en campo la socialización de los cambios de alineamiento.

CEV

Powered by CamScanner

Viernes 15 de agosto de 2025 Clima: Seco
Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 inspector, 2 auxiliares de tráfico, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor, 1 maestro, 4 oficiales y 2 ayudantes.
Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 volqueta doble, 1 placa vibratoria, 1 generador electrico y 1 cortadora
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo, y 1 conductor.
Actividades: K4+466 aseo y limpieza de obra, K3+918 y K3+850 instalación de concreto in sitio para 17 módulos de cuneta.
Observaciones: Se socializa con el contratista la instalación de material fino que selle el material grueso en bermacuneta.

Sábado 16 de agosto de 2025 Clima: seco
Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 inspector, 2 auxiliares de tráfico 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor, 1 maestro, 4 oficiales y 2 ayudantes.
Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 Volqueta Doble, 1 placa vibratoria, 1 generador electrico y 1 cortadora.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo. y 1 conductor.
Actividades: Aseo y Limpieza general
Observaciones: se realizan actividades hasta medio dia.

Domingo 17 de agosto de 2025 Clima: Seco
No se realizan actividades en este frente de obra por parte del contratista CEV.

Lunes 18 de agosto de 2025 Clima: Seco
No se realizan actividades en este frente de obra por parte del contratista CEV
Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 inspector, 2 auxiliares de tráfico, 1

Powered by CamScanner

maestro, 4 oficiales y 2 ayudantes.
Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 Volqueta doble, 1 placa vibratoria, 1 generador electrico y 1 cortadora.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo, 1 conductor.
Actividades: Alistamiento nivelacion y compactación de B-200 en berma-cuneta K3+840 a K3+790
Observaciones: El material instalado se satura por lo cual se genera reproceso.

Martes 19 de agosto de 2025 Clima: lluvia moderada
Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 inspector, 1 auxiliar tráfico, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor de volqueta doble, 1 maestro, 2 oficiales y 1 ayudante.
Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 volqueta doble, 1 placa vibratoria, 1 generador electrica y 1 cortadora.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.
Actividades: K3+918 a K3+852 Alistamiento de formaletas para módulos de cuneta. K3+840 a K3+807 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en berma-cuneta.
Observaciones: Se pone en conocimiento del contratista la ruta critica para la construcción de alcantarillas y entrega de obra nueva, sin embargo se programa iniciar la ejecución de la alcantarilla ubicada en el K3+220. Se solicita el atraque y llena de la alcantarilla ubicada en el K4+464.

Miércoles 20 de agosto de 2025 clima: Seco
Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 inspector, 1 auxiliar de tráfico, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor de volqueta doble, 1 maestro, 2 oficiales y 1 ayudante
Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 volqueta doble,

Powered by CamScanner

1 placa vibratoria, 1 generador eléctrico y 1 cortadora.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.
Actividades de obra: K3+916 a K3+852 instalación de concreto in situ para 16 módulos de cuneta. K3+840 a K3+807 instalación de formaletas.
Observaciones: Se verifican espesores de B-200 entre abscisas K3+840 a K3+771 de 0.07m. Se solicita al contratista conservar los espesores de diseño en la construcción de cunetas.

Ferrovías SAS

CEV

Jueves 21 de agosto de 2025 Clima: Seco
Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 inspector, 1 auxiliar de tráfico 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor de volgueta doble, 1 maestro, 2 oficiales y 1 ayudante.
Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 volgueta doble, 1 placa vibratoria, 1 generador eléctrico y 1 cortadora
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.
Actividades: K3+840 a K3+771 instalación de concreto in sit para 17 módulos de cuneta. K3+222 inicia excavación de zanja de descole.
Observaciones: Se requiere realizar excavación manual en zanja de alcantarilla K4+464 para garantizar el desagüe de la escorrentía. Se solicita el retiro de tubería 36" acoplada en tramo conservando la que se usara para la construcción de alcantarillas.

Ferrovías SAS

CEV

Viernes 22 de agosto de 2025 Clima: lluvia moderada
Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 inspector, 1 auxiliar de tráfico, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor de volgueta doble, 1 maestro, 2 oficiales y 1 ayudante.
Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 volgueta doble, 1

Powered by CamScanner

placa vibratoria, 1 generador electrico. y 1 cortadora.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 topógrafo, 1 conductor.
Actividades: K3+838 a K3+773 instalación de concreto in situ para 16 módulos de cuneta K3+222 Aseo y limpieza de obra.
Observaciones: Aún no se da ingreso a las cuadrillas de retiros y construccion de alcantarillas. En acopio CEV K4+19: se evidencia afectación en cableado de energía para suministro en vivienda, la vivienda se encuentra sin luz, se requiere esclarecer la responsabilidad de los actores de intervención en vía.

Sábado 23 de agosto de 2025 Clima: Seco
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de el consorcio CEV.

Domingo 24 de agosto de 2025 Clima: Seco
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de el consorcio CEV.

Lunes 25 de agosto de 2025 Clima: Seco
Personal CEV: 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 inspector, 1 auxiliar de tráfico, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor de volqueta doble, 1 maestro, 2 oficiales y 2 ayudantes.
Maquinaria en obra: 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 Volqueta doble 1 placa vibratoria, 1 generador electrico y 1 cortadora.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.
Actividades: K3+770 a K3+705 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en borma-cuneta K4+484 Carga manual en alcantarilla.

Powered by CamScanner

Observaciones: se realiza zanja en alcantarilla K4+464 para evacuar el agua lluvia, la misma se puede colmatar por sedimento situación en la cual es responsabilidad del contratista habilitarla nuevamente.

Firmas SX

CGU

Martes 26 de agosto de 2025 Clima: Soleado

TRAMO 9 = Se inicia actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm.

CLIMA = Soleado

PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 2 Maestros, 3 oficiales 1 Ayudante, 1 operador de minicargador, 1 operador retro, 1 Conductor volqueta, Inspector, 1 comisión topografica.

PERSONAL ADMO = 1 Prof. SST, 1 Prof. social, 1 Prof. Ambiental.

PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. Social, 1 Prof. SST, 1 Inspector, 1 comisión topografica.

MAQUINAS Y EQUIPOS = 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 volqueta doble, 1 mezcladora, 1 Rana, 1 canguro, 1 planta electrica, 1 cortadora, 1 vibro para concreto.

ACTIVIDADES = Se realizo excavacion de Alcantarilla descole K 3+224, se realizo relleno de Alcantarilla Descole K 4+463, se alisto terreno y se Formaleto para cunetas tipo 1B. 17 modulos Fundidos con concreto 3500PSI. Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.

Firma SX

CGU

MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025

TRAMO 9 = Se inician Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm.

CLIMA = Soleado

PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 2 Maestros, 3 oficiales 2 Ayudantes, 1 operador minicargador, 1 operador retro, 1 conductor volqueta, 1 inspector, 1 comisión topografia, 1 Aux tecnico.

PERSONAL ADMO = 1 prof. SST, 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. social.

PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. Ambiental, 1 prof. social, 1 Prof. SST, 1 inspector, 1 comisión topografica.

Powered by CamScanner

MAQUINAS Y EQUIPOS = 1 minicargador, 1 Retrocargador, 1 Ra
1 mezcladora, 1 volqueta doble troque, 1 canguro, 1 cortad
1 planta electrica, 1 vibro para concreto.
ACTIVIDADES = se cuadro acopios en el tramo, se pro
excavacion de Alcantarilla descole K3+224, se realiza
armado y Fundida de cuneta tipo 1B con concreto 3500
PSI, 26 metros, se realizo orden y Aseo, se dejo
todo señalizado.

Ing. SST

JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025
TRAMO 9 = se inician actividades de 7:00Am. A 5:00p.
CLIMA = Soleado
PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 1 inspector, 2 oficial
2 Ayudantes, 1 Aux. de transito, 1 operador Retro, 1 operador
minicargador, 1 conductor volquete, 1 comision topografica.
PERSONAL APOYO = 1 Prof social, 1 Prof. SST, 1 Prof. Ambiental
PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. social, 1
SST, 1 Prof. Ambiental, 1 inspector, 1 comision topografica.
MAQUINAS Y EQUIPOS = 1 minicargador, 1 Retrocargador, 1 volqueta d
1 Mezcladora, 1 Rana, 1 Canguro, 1 vibro compactador, 1 planta
electrica, 1 vibro para concreto, 1 cortadora.
Actividades = se realizo Perfilado del descole K3+224 manual
mente, y se replanteo los puntos y ejes, se realizo desenco
y maquillaje de modulos y Alcantarilla K4+463. se realiz
Orden y Aseo, se dejo todo señalizado.

Ing. SST

VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025
TRAMO 9 = se inician actividades de 7:00Am. A 5:00p.
CLIMA = Soleado
PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 1 inspector, 2 oficiales
5 Ayudantes, 1 Aux. de transito, 1 operador Retro, 1 operado
minicargador, 1 conductor volqueta, 1 comision topografica.

Powered by CamScanner

PERSONA ADMO: 1 Prof. social, 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. SST.
PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. social, 1 Prof SST. 1 Prof. Ambiental, 1 inspector, 1 comision topografica.
MAQUINAS Y EQUIPOS: 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 mezcladora 1 volqueta doble, 1 Rana, 1 canguro, 1 cortadora, 1 planta electrica 1 vibro para concreto.
ACTIVIDADES = se realizo corte de Fresado borde de via 60metros. Se fundio solado Alcantarilla descole K3+224 y se figuro acero de zapata, se cuadro acopios y se Relleno detras de las cunetas. Se realizo orden y Aseo se dijo todo señalizado.

Conviasas

Diaz CEV

SABADO 30 DE AGOSTO DE 2025
TRAMO 9 = No se Realizo Actividades en el tramo

Conviasas

Diaz CEV

DOMINGO 31 DE AGOSTO DE 2025
TRAMO 9 = NO se realizo Actividades en el trama

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TRAMO 9 = Se inician Actividades de 7:00Am. A 5:00Pm.
CLIMA = lluvias de 1:00Pm. A 2:00Pm. Afectado Actividades.
PERSONAL OPERATIVO: 1 Residente tecnico, 1 inspector, 3 oficiales, 10 Ayudantes, 1 Aux. de trafico, 1 operador Retro, 1 operador minicargador, 1 conductor volqueta, 1 comision topografia.
PERSONAL ADMO: 1 Prof. Social, 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. SST.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. Social, 1 Prof. SST, 1 inspector, 1 comision topografia.
MAQUINAS Y EQUIPOS = 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 Mezcladora, 1 volqueta doble, 1 Rana, 1 canguro, 1 cortadora 1 planta electrica, 1 vibro para concreto.
ACTIVIDADES = se Armado y Figurado Zapata Descole K3+22[illegible] un 60%, se nivelo terreno para cunetas y relleno por detras de las cunetas y se cuadro acopios.

Powered by CamScanner

a RH356, se realizo ataque por detras de [illegible]
se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.
NOTA: Se evidencia que el cierre de PMT es muy largo, mal
vo por el cual los vehiculos que transitan por alli, pueden o exito
velocidades.

Residente SIS

Residente CEV

VIERNES 1 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 = se inician labores a las 7:00 Am. A 5:00 Pm.

CLIMA = soleado

PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 1 oficial, 5 Ayudantes, 2 Aux. de transito, 1 operador de minicargador.

PERSONAL ADMO = 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. social, 1 Prof. SST.

PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. SST, Prof. social, 1 Prof. Ambiental, 1 inspector, 1 comisio Topografia.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS = 1 Minicargador, 1 Mezcladora, 1 Rana, 1 vibro de concreto, 1 Planta electrica.

ACTIVIDADES = Se descofro modulos de Formaleta tipo B. Se compacto terreno y se saco densidades, se Armo Modulos para Fundir cunetas tipo 1B. se realizo Orden y Aseo, se dejo todo señalizado.

Residente SIS

Residente CEV

SABADO 2 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 = se inician labores a las 7:00 Am. A 12:00 Pm.

CLIMA = Soleado

PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 1 oficial, 2 Ayudantes 2 Aux. de transito, 1 operador de minicargador.

PERSONAL ADMO = 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. social, 1 Prof SST.

PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. SST, 1 Prof. social, 1 Prof. Ambiental, 1 inspector, 1 comisio topografico.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS = 1 Minicargador, 1 Mezcladora, 1 Rana, 1 vibro de concreto, 1 Planta electrica.

ACTIVIDADES = se realizo retape en las cunetas tipo 1B. Se realizo orden y aseo, se atraco por detras

Powered by CamScanner

de las cuetas, se dejo todo señalizado

DOMINGO 3 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 NO se realizo actividades

LUNES 4 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 : Se inicia labores a las 7:00Am. A 5:00Pm.

CLIMA: Soleado en la mañana, lluvias en la tarde intermitentes.

PERSONAL OPERATIVO: 1 Residente tecnico, 1 Oficial, 5 Ayudantes, 2 Aux. de trafico, 1 operador de minicargador.

PERSONAL ADMO: 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. Social, 1 Prof. SST.

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 Prof. SST, 1 Prof. Social, 1 Prof. Ambiental, 1 Inspector, 1 comisión topografica.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 minicargador, 1 Mezcladora, 1 Rana, 1 vibro de concreto, 1 Planta electrica.

ACTIVIDADES: Se realizo Armado de 22 modulos de cuneta tipo 1B, llego 500 bultos de Cemento. Se descargaron en el acopio, se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.

MARTES 5 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2: Se inicia labores a las 7:00Am. A 5:00Pm.

CLIMA: soleado

PERSONAL OPERATIVO: 1 Residente tecnico, 1 Oficial, 5 Ayudantes, 2 Aux. de trafico, 1 operador de minicargador.

PERSONAL ADMO: 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. Social, 1 Prof. SST.

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 Prof. social, 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. SST, 1 inspector, 1 comision topografico.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 Rana, 1 vibro de concreto, 1 Planta electrica.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES = Se realizo Armado de 7 modulos de cunetas tipo 1B, se Fundio cunetas con concreto 3500PSI 29 modulos, se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado

Evan SIS

CGV

MIERCOLES 6 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 = Se inicia labores a las 7:00 A.m. A 5:00 P.m.

CLIMA = Soleado

PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 1 oficial, 5 Ayudantes, 2 AUX. de transito, 1 operador de minicargador.

PERSONAL ADMO = 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. social, 1 Prof. SST

PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. SST, 1 Prof. social, 1 Prof. Ambiental, (1) inspector, (1) comision topografica.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS = 1 Minicargador, 1 mezcladora, 1 Rana, 1 vibro concreto, 1 planta electrica.

Actividades = Se realizo retiro de cunetas Fundidas y se desencofro Formaleta, Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado, se realizo cambio de contratista, se limpio Formaleta y se Recojio Herramientas.

Evan SIS

CGV

JUEVES 7 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 = FESTIVO NO SE REALIZO ACTIVIDADES

CGV

VIERNES 8 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 = No se realizo Actividades, personal en examenes Medicos

CGV

SABADO 9 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 = NO se realizo actividades

CGV

DOMINGO 10 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 = NO se realizo Actividades

CGV

Powered by CamScanner

LUNES 11 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 = Se inicia labores a las 7:00Am. A 5:00Pm.

CLIMA = soleado

PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 1 oficial, 4 Ayudantes, 2 Aux. de transito, 1 operador de minicargador.

PERSONAL ADMO = 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. Social, 1 Prof. SST.

PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. SST, 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. Social, 1 inspector, 1 comisia topografica.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS = 1 Minicargador, 1 Mezcladora, 1 Rana, 1 vibro para concreto, 1 Planta electrica.

ACTIVIDADES = Llego Herramienta, equipos nuevo contratista, se empezo a cuadrar terreno para sacar densidades y empezar armar Formaleta para cunetas tipo 1B. Se realizo induccion al personal, se cuadro acopios y se llevo por detras de las cunetas, se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.

Firma SIS

Ruiz CEU

MARTES 12 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 = Se inician labores a las 7:00Am. A 5:00Pm.

CLIMA = Soleado

PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 1 Oficial, 4 Ayudantes, 2 Aux. de transito, 1 operador de minicargador.

PERSONAL ADMO = 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. Social, 1 Prof. SST.

PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. SST, 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. Social, 1 inspector, 1 comisios topografica.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS = 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 Rana, 1 vibro para concreto, 1 Planta electrica.

ACTIVIDADES = Se realizo armado de 40 metros de cuneta Modulos intermedios y se Fundio 24 metros de modulos intermedios con concreto 3500PSI cuneta tipo 1B. Se realizo orden y Aseo, Se deja todo señalizado.

Firma CRS

Ruiz

MIERCOLES 13 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 = se inicias labores a las 7:00Am. a 5:00Pm.
CLIMA = lluvias de 1:00Pm. A 3:30Pm. Afectando Actividades.
PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 1 oficial, 4 Ayudantes, 2 AUX de trafico, 1 operador de minicargador.
PERSONAL ADMO = 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. Social, 1 Prof. SST.
PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof Ambiental, 1 Prof. SST, 1 Prof. Social, 1 inspector, 1 comisio topografica.
EQUIPOS Y MAQUINARIA = 1 minicargador, 1 Mezcladora, 1 Plan 1 vibro de concreto, 1 Planta electrica.
ACTIVIDADES = Se cuadro terreno para poder Fundir ya que Por las lluvias se Afecto el terreno, se arreglo Cuneta predio cuneta tipo batea, se Fundio 10 modulos intermedi con concreto 3500 PSI cuneta tipo TB. Se realizo Cuneton para realizar corte en borde de via. Se realizo orden y Aseo Se deja todo señalizado.

Firma SYS

Firma CGU

JUEVES 14 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 = Se inicias labores a las 7:00Am. A 5:00Pm.
CLIMA = Soleado
PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 1 oficial, 4 Ayudantes, 2 AUX. de trafico, 1 operador de minicargador.
PERSONAL ADMO = 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. Social, 1 Prof. S
PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. Ambiental 1 Prof. SST, 1 Prof. Social, 1 inspector, 1 comisios topografica
EQUIPOS Y MAQUINARIA = 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 Ro 1 vibro para concreto, 1 Planta electrica.
ACTIVIDADES = Se corto 100metros de Fresado, se excavo y replanteo para cunetas, se compacto para toma de densidades, Se Fundio una entrada a vivienda y se Fundio 2 Modulos Intermedios. se realizo orden y Aseo Se deja Todo señalizado.

Firma SYS

Firma CGU

Norma

Powered by CamScanner

JUEVES 15 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2: Se inicia labores a las 7:00Am. A 5:00Pm.

CLIMA: Soleado

PERSONAL OPERATIVO: 1 Residente tecnico, 1 Oficial, 4 Ayudantes, 2 Aux. de trafico, 1 operador de minicargador.

PERSONAL ADMO: 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. Social, 1 Prof. SST.

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. SST, 1 Profe social, 1 inspector, 1 comision topografica.

EQUIPOS Y MAQUINARIA: 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 Bana, 1 vibro Para concreto, 1 Planta electrica.

Actividades: Se corto 70 metros de Fresado y se compacto para sacar densidades y iniciar avanzar Formaleta pa cunetas. Se Fundieron 9 modulos de cunetas tipo IB con concreto 3500 PSI 78 metros y se lleno por detras de cunetas. Se realizo orden y Aseo. Se dejo todo señalizado.

Edy Rivas S.AS

Ruiz CEV.

SABADO 16 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2: Se inicia labores a las 7:00Am. A 5:00Pm.

CLIMA: Soleado.

PERSONAL OPERATIVO: 1 Residente tecnico, 1 Oficial, 4 Ayudantes, 2 Aux. de trafico, 1 operador de minicargador.

PERSONAL ADMO: 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. Social, 1 Prof. SST.

.....: 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 Bana, 1 vibro Para concreto, 1 Planta electrica.

.....: 1 Residente tecnico, 1 Prof. SST, 1 Prof Social, 1 Prof. Ambiental, 1 inspector, 1 comision topografica.

ACTIVIDADES: Se desencofro cunetas se limpio Formaleta y se alisto terreno para sacar densidades. se avanzo 9 modulos intermedios y 8 modulos, se realizo orden y Aseo. Se dejo todo señalizado. Se realizo cimbrada y corte de Fresado. Se organizo Acopios.

Edy Rivas S.AS

Ruiz CEV.

DOMINGO 17 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 = No se realizo Actividades en el tramo.

LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 = Festivo no se realizo Actividades en el tra.

MARTES 19 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 = Se inician Actividades a las 7:00Am. A 5:00p.

CLIMA = Soleado

PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 1 oficial, 4 Ayudant, 1 operador de minicargador, 2 Aux. de trafico.

PERSONAL ADMO = 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. social, 1 Prof. SST

PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. Ambiental 1 Prof. social, 1 Prof. SST, 1 inspector, 1 comision topografica

MAQUINAS Y EQUIPOS = 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 Rana, 1 vibro para concreto, 1 cortadora, 1 Planta electrica.

ACTIVIDADES = Se cundio Acopio para Fundir las Abajo del tramo, se cundio material para contener detras de las cunet se alzo modulos y modulos intermedios para Fundir cunet tipo TB, se Fundio 76 modulos 32 metros de cuneta con concreto 3500PSI. se realizo orden y Aseo, se dejo to señalizado.

MIERCOLES 20 DE AGOSTO DEL 2025

TRAMO 2 = Se inician Actividades a las 7:00Am. A 5:00p..

CLIMA = Soleado

PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 1 oficial, 4 Ayudant 1 operador de minicargador, 2 Aux. de trafico.

PERSONAL ADMO = 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. social, 1 Prof. SST.

PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. social 1 Prof. SST, 1 Prof. ambiental, 1 inspector, 1 comision topografica.

MAQUINAS Y EQUIPOS = 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 Rana

Powered by CamScanner

1 vibro para concreto, 1 cortadora, 1 planta electrica.
ACTIVIDADES = Se Desencofro 16 modulos de Formaleta cuneta tipo 1B y se Alisto Pista terreno, nivelacion y compactacion para Sacar densidades. Se Armo 16 metros de cuneta tipo 1B. se Armo y Fundio con concreto 3500 PSI Entrada a predio 5 metros se realizo orden y Aseo. se dejo todo señalizado.

Edwar SAS

CEV

JUEVES 21 DE AGOSTO DEL 2025
TRAMO 2 = Se Inician Actividades a las 7:00Am A 5:00Pm.
CLIMA = Soleado
PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 1 Oficial, 4 Ayudantes 1 operador de minicargador, 2 AUX. de trafico.
PERSONAL ADMO = 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. social, 1 Prof. SST.
PERSONAL ENTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. Ambiental 1 Prof. SST, 1 Prof social, 1 inspector, 1 comision topografica.
MAQUINAS Y EQUIPOS = 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 Rana, 1 vibro para concreto, 1 cortadora, 1 Planta electrica.
Actividades = Se cuadro Acopios, Se Arma modulos de cunetas tipo 1B. y se Fundio con concreto 3500 PSI 20 metros y una entrada a predio. Se realizo excavacion manual de terreno para conformar cunetas. Se realizo orden y Aseo. Se dejo todo señalizado.

Edwar SAS

CEV

VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2025
TRAMO 2 = Se Inician Actividades a las 7:00 Am. A 5:00Pm.
CLIMA = Soleado
PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 1 oficial, 4 Ayudantes 1 operador de minicargador, 2 Aux. de trafico.
PERSONAL ADMO = 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. social. 1 Prof. SST.
PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. Ambiental 1 Prof. SST, 1 Prof. social, 1 inspector, 1 comision topografica.

1 vibro para concreto, 1 cortadora, 1 Planta electrica.
ACTIVIDADES: Se realizo compactacion de terreno para toma de densidades. Se realizo desencofrado de Formaleta, se realizo armado de modulos de cuneta tipo 1B. Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.

Ing. Residente
Provias DS

SABADO 23 DE AGOSTO DEL 2025
TRAMO 3: NO se realizo Actividades en el tramo.

DOMINGO 24 DE AGOSTO DEL 2025
TRAMO 3: NO se realizo Actividades en el tramo.

LUNES 25 DE AGOSTO DEL 2025
TRAMO 3: Se inician Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm.
CLIMA: Soleado
PERSONAL OPERATIVO: 1 Residente tecnico, 1 oficial, 4 Ayudantes 1 operador de minicargador, 2 Aux. de topografia.
PERSONAL ADMO: 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. Social, 1 Prof. SST.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. sst, 1 Prof. social, 1 inspector, 1 comision de topografia.
MAQUINAS Y EQUIPOS: 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 Rana, 1 vibro para concreto, 1 cortadora, 1 planta electrica.
ACTIVIDADES: Se relleno por detras de las cunetas contenoi, se desarmo la carpa y se armo en otro punto, se realizo cambio de Acopio, se realizo Armado de Formaleta para cunetas tipo 1B, se Fundio 14 metros de cunetas, con concreto 3500PSI. se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.

Ing. Residente
Provias DS

MARTES 26 DE AGOSTO DEL 2025
TRAMO 3: Se inician Actividades, a las 7:00Am. A 5:00Pm.

Powered by CamScanner

CLIMA = Soleado
PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 1 oficial, 4 Ayudantes, 1 operador de minicargador, 2 Aux. de trafico
PERSONAL ADMO = 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. social, 1 Prof. SST
PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. social, 1 Prof. SST, 1 inspector, 1 comision topografico.
MAQUINAS Y EQUIPOS = 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 Rana, 1 planta electrica, 1 cortadora, 1 vibro para concreto.
ACTIVIDADES = Se rompio piedras con porro y sincel, se realizo compactado de terreno para cunetas y sacar densidades, se fundio 24 metros de Cuneta tipo 1B con concreto 3500PSI. Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.

Firmas SMS

CGU

MIERCOLES 27 DE AGOSTO DEL 2025
TRAMO 2 = Se inician Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm.
CLIMA = Soleado
PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 1 oficial, 4 Ayudantes, 1 operador de minicargador, 2 Aux de trafico.
PERSONAL ADMO = 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. social, 1 Prof. SST.
PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. social, 1 Prof. SST, 1 inspector, 1 comision topografica.
MAQUINAS Y EQUIPOS = 1 m cargador, 1 mezcladora, 1 Rana, 1 vibro para concreto, 1 cortadora, 1 planta electrica.
ACTIVIDADES = Se realizo desarmado y limpieza de Formaleta de cuneta tipo 1B. Se armo modulos intermedios y se fundieron con concreto de 3500 PSI. Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.

Firmas SMS

CGU

JUEVES 28 DE AGOSTO DEL 2025
TRAMO 2 = Se inicia. Actividades a las 7:00Am. A 5:00Pm.
CLIMA = Soleado
PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico 1 Oficial, 5 Ayudantes

1 operador de minicargador, 2 Aux. de transito.
PERSONAL ADMO = 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. Social, 1 Prof. SST
PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. Ambiental 1 Prof social, 1 Prof. SST, 1 inspector, 1 comisio topografia.
MAQUINAS Y EQUIPOS = 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 Rana, 1 planta electrica, 1 contadora, 1 vibro para concreto.
ACTIVIDADES = Se realizo nuevo Acopio en tramo 5. se realizo corte en tramo 5, 150metros. Se realizo relleno de material por detras de las cunetas, se Fundio modulos de cunetas tipo 1B, 16 metros de concreto 3500PSI. Se realizo orden y Aseo, se dejo todo señalizado.

Firmas SST

D_RZ
CEV

VIERNES 29 DE AGOSTO DEL 2025
TRAMO 2-5 = Se inician Actividades de 7:00Am. A 5:00Pm.
CLIMA = soleado
PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 2 Oficiales, 6 Ayud 1 operador de minicargador, 2 AUX. de transito.
PERSONAL ADMO = 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. social, 1 Prof. SST.
PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. Ambiental 1 Prof. social, 1 Prof. SST, 1 inspector, 1 comisio topografica.
MAQUINAS Y EQUIPOS = 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 Rana, 1 planta electrica, 1 contadora, 1 vibro para concreto
ACTIVIDADES = Se bajo material a tramo 5 en todas nuevos Acopios, se realizo 6metros de excavacion para cunetas tipo 1B. se compacto para realizar densidades, se Armo y Fundio 12 metros de cuneta tipo 1B. concreto 3500 PSI, se realiza orden y Aseo, se deja todo señalizado.

Firmas SST

D_RZ
CEV

SABADO 30 DE AGOSTO DEL 2025
TRAMO 2-5 = Se inician Actividades de 7:00Am. A 10:00Pm
el [illegible]

PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 2 oficiales, 4 Ayudantes, 1 operador de minicargador, 2 A de trafico.
PERSONAL ADMO = 1 Residente SST, 1 Prof. Ambiental, 1 Prof social
PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. Social, 1 Prof. SST, 1 Inspector, 1 comisión topografica.
MAQUINAS Y EQUIPOS = 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 Planta electrica 1 Rana, 1 cortadora, 1 Vibro para concreto.
ACTIVIDADES = se realizo excavacion manual conformar cuneta Tipo 1B 60 metros, se Maquillo cuadros cuneta tipo 1B. se realizo orden y Aseo. Se dejo todo señalizado.

Firma SST

Firma CEV.

Domingo 31 DE AGOSTO DEL 2025
TRAMO 2-5 = NO se realizo Actividades

Firma SST

Firma CEV

Lunes 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
TRAMO 2-5 = se inicia actividades de 7:00Am. A 5:00Pm.
CLIMA = lluvias de 2:00Pm. A 4:00Pm. Afectando actividades.
PERSONAL OPERATIVO = 1 Residente tecnico, 3 oficiales, 5 Ayudantes 1 operador de minicargador, 2 Aux. de trafico.
PERSONAL ADMO = 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. social, 1 Prof. SST
PERSONAL INTERVENTORIA = 1 Residente tecnico, 1 Prof. Ambiental, 1 Prof. social, 1 Prof. SST, 1 inspector, 1 comisión topografica.
MAQUINAS Y EQUIPOS = 1 minicargador, 1 Mezcladora, 1 cortadora, 1 Rana, 1 Planta electrica, 1 Vibro para concreto.
ACTIVIDADES = se Fundio Cuneta tipo 1B Concreto 3500 PSI 10 metros, se maquillo 80 metros de Cunetas, se alisto 50 metros de terreno para sacar Cunetas y sacar densidades. Se excavo manualmente 60 metros con Forma, terreno para cunetas, se realizo orden y Aseo, Se dejo todo señalizado

Firma SST

Firma CEV

Powered by CamScanner

ANEXO NO. 03 DOCUMENTACIÓN ENTIDAD EJECUTORA UAERMV

3.A BITÁCORA DE OBRA DEL PERIODO.

- Compactacion y limpieza de Borde de Vía
  KJ+JJO – KJ+225
- Limpieza de cuneta KJ+810 – KJ+900

Obras 5 & 5

RAFAEL D. PEÑA F
U.T.V

Viernes 1 agosto 2025 Clima: Seco

PERSONAL UTV: 1 Residente Técnico, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 Res social, 1 Inspector, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Boal, 2 Aux de Topografía, 1 comisión de Topografía, 1 oper Mini, 1 operador de Motoniveladora, 1 operador de Retro, 1 operador de Vibro, 1 cont de cuneta

1 Cortador de adoquín eléctrico. 1 cortador de adoquín DT
MAQUINARIA y EQUIPO: 1 Motoniveladora. 2 vibro. 1 Mini. 1 Retro
1 adoquín sencillo
PERSONAL INTERVENTORÍA: 1 Res Técnico 1 Inspector, 1 Res
SST. 1 Res Social. 1 Residente Ambiental
ACTIVIDADES: K31+10 - K31+35 - Sello de Pavimento con
Fresado estabilizado granular. Retiro Transporte de mate
rial RCD
OBSERVACIONES: Se requiere vibro compactador Mixto

Flavian SAS

Sábado 2 agosto 2025
No se labora este día

Flavian SAS

Domingo 3 agosto 2025
Festivo

Flavian SAS

Lunes 4 agosto 2025 clima: soleado
PERSONAL UNO: 1 Inspector, 1 Oficial, 1 Total, 2 Ayudante
2 Auxiliar Tráfico, 1 Señalero Topografía, 1 operario vibro
1 operario Retro, 1 operario Motoniveladora, 1 operario de
mini, 1 cortador de adoquín eléctrico
MAQUINARIA y EQUIPO: 1 Motoniveladora, 1 Retro, 2 vibros
1 adoquín sencillo, 1 Minicargador
PERSONAL INTERVENTORÍA: 1 Res Técnico, 1 Inspector, 1 Res
SST, 1 profesional Social, 1 Res Ambiental
ACTIVIDADES: En K31+00 - K31+15 se evidencia compactación
del fresado estabilizado, previamente instalado, en una capa de
7 cms. Posterior a la descontaminación se riega agua para
juntar la otra capa pavimentada en asfalto. Se hace llamado
de atención al residente técnico ya que no se debe agua
rizar el material y 2° se debe utilizar un riego de liga
para juntar las 2 capas
OBSERVACIONES: Ingresa nuevo empleado de vigilancia

Miércoles 13 agosto de 2025 clima lluvias Moderadas: 11:00-01:00 pm
PERSONAL UAEMV: 1 Inspector, 1 Oficial, 1 Fcal, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 comision Topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 operario retrocargador, 1 operario volqueta sencillo, 1 operario motoniveladora, 1 operario minicargador
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional est, 1 profesional Ambiental, 1 Inspector, 1 topografo.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador Dynapac 8 Tn, 1 vibro compactador Ham 4 Tn, 1 volqueta sencillo, 2 minicargador.
ACTIVIDADES: Se realiza la limpieza de cunetas para construccion de estas, se desarrollo en abscisas del K4+510 a K4+360, costado izquierdo a menores.
se retiro un fallo existente. y traslado de material para la intervencion en K4+660 a K4+685 (1.5*5m.60)
se realizo retiro de material remanente saturado.
se agrego rap como accion de proteccion de la subrasante. K0+660 + K0+700.
NOTA: las actividades se apoyan con el grupo de trabajo de con Antonio 9.1 (1 Inspector, 2 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 oficial).

Jueves 14 de Agosto de 2025.
TRAMO: 6. CLIMA: SECO.
PERSONAL UAEMV: 2 Inspector, 2 OFICIAL, 2 Boal, 4 ayudantes, 4 ayudante de trafico., 1 comision topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 operario Retrocargador, 1 operario motoniveladora, 1 operario minicargador.

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 Inspector, 1 topografo.
EQUIPOS Y MAQUINARIA: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador de 8 Tn, 1 vibrocompactador 4 Tn, 1 volqueta sencilla, 2 minicargador.
ACTIVIDADES: Se realiza imprimacion entre capas de fresado estabilizado con tiempo de ruptura de 2 hrs en el trayecto de K3+450 a K4+215. De igual manera se realiza extendida de de fresado estabilizado y cereo aproximado. De K3+450 a K3+215.
NOTA: No se cuenta con material petreo para conformar carpeta de base granular.

Viernes 15 de Agosto de 2025.
Tramo 6. CLIMA: Seco.
PERSONAL UAERMV: 2 Inspectores, 2 oficiales, 1 Boal, 4 ayudantes, 4 auxiliares de trafico, 1 comisión topografica
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 operario retrocargador, 1 operario volqueta sencilla, 1 operario motoniveladora, 1 operario minicargador.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 Inspector, 1 topografo.
EQUIPOS Y MAQUINARIA: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador 8 Tn, 1 vibrocompactador 4 Tn, 1 volqueta sencilla, 2 minicargador.
ACTIVIDADES: Se realiza extendida y la compactacion de fresado estabilizado entre K3+450 a K3+275. Adicionalmente se realiza cereo a nivel de cota.
NOTA: Se evidencia que la actividad desarrollada presenta fallas e irregularidades en su ejecución. Es decir, no se realiza una actividad con el tiempo necesario y los operarios se desplazan hacia sus casas a las 2 pm. dejando la actividad a medias.

Sabado 16 de Agosto de 2025.
NO se ejecutan actividades.

Domingo 17 de Agosto de 2025.
NO se ejecutan actividades.

Lunes (Festivo) 18 de Agosto de 2025.
NO se ejecutan actividades.

Martes 19 de Agosto de 2025.
Tramo 6 CLIMA: Seco.
PERSONAL UAERMV: 2 Inspectores, 1 oficiales, 1 Boal, 4 ayudantes, 4 auxiliares de trafico, 1 comision topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 operario retrocargador, 1 conductor volqueta cencilla, 1 operario motoniveladora, 1 operario minicargador.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 Inspector, 1 topografico.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador 8 tn, 1 vibrocompactador 4 tn, 1 volqueta cencilla, 2 minicargador.
ACTIVIDADES: Se realizo la aplicación de material cernido sobre la carpeta de fresado estabilizado en el tramo comprendido entre las abscisas K3+950 y K3+275. Adicionalmente se efectuo la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo de la via entre las abscisas K1+425 y K1+260 en los sectores a menores.

Por otra parte se llevo a cabo la hidratacion del , riego estabilizado previamente instalado, con el fin de activar los aglutinantes y sellar la capa en el tramo comprendido entre las abscisas K3+440 a K3+276.

NOTA: No se cuenta con material petreo para desarrollar actividades de conformacion de carpeta de base Granular.

EDVIAL S.A.S

RAFAEL D. PEÑA F. U.M.V.

Miercoles 20 de Agosto de 2025.

Tramo 6 CLIMA: Seco.

PERSONAL UAERMV: 2 Inspectores, 2 Oficiales, 1 Boal, 4 ayudantes, 1 auxiliares de trafico, 1 comision topografica.

PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 operario retrocargador, 1 operario motoniveladora, 1 operario Minicargador, 1 conductor Volqueta sencilla.

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 Inspector, 1 topografo.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador 8Tn, 1 vibrocompactador 4 Tn, 1 volqueta sencilla, 2 minicargador.

ACTIVIDADES: Se realiza intervencion de fallo sobre via, se retira material remanente saturado y se agrega retal de concreto para su conformación K4+090 a K4+095 (5x1x.60). Adicionalmente se efectuo la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado derecho de la via, entre las abscisas K1+040 y K1+250, en los sectores a menores.

NOTA: No se evidencia material petreo para intervenir la ventana existente en el K4+060 a K4+100. Tampoco se evidencia material para el resto del tramo.

EDVIAL S.A.S

RAFAEL D. PEÑA F. U.M.V.

Norma

Jueves 21 de Agosto de 2025
Tramo 6. CLIMA: Lluvias Moderadas 02:30 a 05:00
PERSONAL UAERMV: 2 Inspectores, 2 oficiales, 1 Boal, 4 ayudantes, 4 auxiliares de trafico, 1 comisión Topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 operario retrocargador, 1 conductor volqueta sencillo, 1 operario motoniveladora, 1 operario Minicargador.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST, 1 Inspector, 1 topografo.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador 4 Tn, 1 vibrocompactador 8 Tn, 1 volqueta sencilla, 2 minicargador.
ACTIVIDADES: Se efectuo la limpieta del terreno para la construcion de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K1+050 y K1+000, en los sectores a menores. Adicionalmente se realizo humectacion y compactacion de Fresado estabilizado ya instalado.
NOTA: No se cuenta con material petreo para desarrollar actividades de conformacion de Base granular.

Viernes 22 de Agosto de 2025.
Tramo 6 CLIMA: Lluvias Moderadas 02:00-04:00
PERSONAL UAERMV: 2 Inspectores, 2 oficiales, 1 Boal 4 ayudantes, 4 auxiliares de trafico, 1 comisión topografica
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador. 1 operario Retrocargador, 1 conductor volqueta sencilla. 1 operario motoniveladora, 1 operario minicargador
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 profesional social, 1 Inspector, 1 topografo.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 motoniveladora, 1 retrocargad

1 vibrocompactador 1 Tn, 1 vibrocompactador 8 Tn, 1 volqueta sencilla, 2 minicargador.
ACTIVIDADES: Se efectuo la limpieza del terreno para la construccion de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K0+870 y K1+000 en los sectores a menores. Adicionalmente se realiza imprimación de capas de Fresado estabilizado entre K3+276 a K3+255. De igual manera se realiza extendida de Fresado estabilizado y cereo a nivel de terminado. Se realiza Humectación y compactación de Fresado estabilizado ya instalado.
NOTA: falta 1 ayudante de obra por permiso solicitado Adicionalmente no se cuenta con material petreo. para conformar carpeta de base granular.

Ecovias SAS — Ronal D. Peña F. U.M.V.

sabado 23 de Agosto de 2025
Tramo 6. = No se desarrollan actividades.

Ecovias SAS — Ronal D. Peña F. U.M.V.

Domingo 24 de Agosto de 2025
No se desarrollan actividades de obra.

Ecovias SAS — Ronal D. Peña F. U.M.V.

Lunes. 25 de Agosto de 2025
Tramo 6 CLIMA: Seco.
PERSONAL UAERMV: 2 Inspectores, 2 oficiales, 2 Bcal. 4 ayudantes, 1 auxiliares de trafico, 1 comisión topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador. 1 Operario minicargador, 1 operario motoniveladora, 1 conducto volqueta, 1 operario retrocargador.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 profesional social, 1 Inspector, 1 topografo.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 motoniveladora, 1 retrocarga

dor, 1 minicargador, 1 volqueta sencilla, 1 vibro compactador 8 Tn, 1 vibrocompactador 4 Tn.
ACTIVIDADES: Se efectuo la limpieza del terreno. para la construccion de cunetas enel costado izquierdo en abscisas Kot870 a Kot965 en los sectores hacia menores. Se realiza imprimacion de capa: de Frezado y cereo a nivel de terminado. Adicionalmente se realiza Humectacion y compactacion de frezado estabilizado ya instalado.
NOTA: Se evidencian detalles de terminacion de la carpeta de frezado. Se solicita realizar reparaciones para posterior entrega al area de topografia de la interventoria. Se evidencia contaminacion cruzada por acopio de material petreo junto con RCD en el Kot835. Adicionalmente se evidencia que no se cuentan con material petreo para desarrollar actividades.

Mi

Martes 26 de Agosto de 2025
TRAMO 6 CLIMA: Lluvias Moderadas 10:00 a 12:00
PERSONAL UAERMV: 2 Inspectores, 2 oficiales, 1 Ecal 4 ayudantes, 4 auxiliares de trafico, 1 comision topo grafica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador 1 operario motoniveladora, 1 operario minicargador, 1 operario Retrocargador, 1 operario Volqueta sencilla
PERSONAL INTERVENTCEIA: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 Inspector, 1 topografo.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 1 motoniveladora, 1 retrocargador 1 minicargador, 1 volqueta sencilla, 1 (b) vibrocompactador de 4 Tn, 1 vibrocompactador 8 Tn.
ACTIVIDADES: Se efectuo la limpieza del terreno para la construccion de cunetas enel costado izquierdo en abscisas Kot850 y Kot750 en los sectores a

Norma

menores. Por otra parte se realiza rectificación de niveles y remates de carpeta de Fresado estabilizado entre K3+215 a K3+260 (Hombros). De igual manera se realiza extendida de Fresado estabilizado y cereo a nivel de terminado. Adicionalmente se realiza humectación y compactación de Fresado estabilizado ya instalado.

NOTA: Se evidencia contaminación con material de Fresado en cuerpo de Agua. del K3+245. Se solicita extracción y retiro de material contaminante. Adicionalmente se evidencia que el ancho de via en este punto es de 3,9 mts. No se evidencia material petreo para desarrollar actividades. de conformación de carpeta de base granular.

Viernes 29 de Agosto de 2025.

Tramo 6. CLIMA: Seco.

PERSONAL UAERMU: 2 Inspectores, 2 Oficiales, 1 Boal, 4 aguidantes, 4 auxiliares de trafico, 1 comision topografica.

PERSONAL CONTRATO 436: 1 operario vibrocompactador, 1 operario minicargador, 1 operario Retrocargador, 1 operario motoniveladora, 1 conductor volqueta.

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental

MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 volqueta sencilla, 1 vibrocompactador 8 Tn y vibrocompactador 1 Tn.

ACTIVIDADES: Se efectua la limpieza del terreno. para la construcción de cunetas. en el costado izquierdo en abscisas K0+680 y K0+750, en los sectores a menores. Adicionalmente se realiza rectificación de niveles y remates de carpeta de Fresado estabilizado entre K3+215 a K3+260 (Hombros)

De igual manera se realiza aplicación de material cernido y compactación.
NOTA: NO se cuenta con material petreo para conformar carpeta de base granular.

Jueves 28 de Agosto de 2025.
Tramo 6 CLIMA: Seco.
PERSONAL UAERMV: 2 Inspectores, 2 oficiales, 1 Bcal 4 ayudantes, 4 auxiliares de trafico, 1 comisión topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 Operario vibrocompactador, 1 operario motoniveladora, 1 operario Retrocargador. 1 operario minicargador, 1 conductor volqueta sencilla.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST, 1 Inspector, 1 topografo.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 vibrocompactador 9 Tn, 1 vibrocompactador 8 Tn, 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 Retrocargador.
ACTIVIDADES: Se efectuo la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K0+680 y K0+500 en los sectores a menores.
NOTA: No se cuenta con material petreo para desarrollar actividades de conformación de via.

Viernes 29 de Agosto de 2025.
Tramo 6 CLIMA: Seco.
PERSONAL UAERMV: 2 Inspectores, 2 oficiales, 1 Bcal 4 ayudantes, 4 auxiliares de trafico, 1 comisión topografica.
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 operario minicargador, 1 conductor volqueta sencilla.

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental, 1 profesional SST, 1 Inspector, 1 Topografo.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 vibrocompactador, 8 Tn, 1 vibrocompactador 1 Tn, 1 motoniveladora, 1 minicargador, 1 volqueta sencilla.
ACTIVIDADES: Se efectuo la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K0+150 a K0+350, en los sectores a menores. Adicionalmente se realiza manejo de Aguas escorrentias por ambos costados en el K3+130 a K3+330. Adicionalmente se realiza limpieza de la alcantarilla situada en K3+240. se evidencia retiro de material Fresado.
NOTA: NO se cuenta con material petreo para conformar carpeta de base granular.

Sabado 30 de Agosto de 2025.
NO se desarrollan actividades.

Domingo 31 de Agosto de 2025.
NO se desarrollan actividades.

Lunes 01 de septiembre de 2025
Tramo 6 CLIMA: Lluvias Moderadas. 01:00-08:30
PERSONAL UAERMU: 2 Inspectores, 2 oficiales, 1 Beal, 4 ayudantes, 4 auxiliares de trafico, 1 comisión topografica
PERSONAL CONTRATO 936: 1 operario vibrocompactador, 1 motoniveladora, 1 operario minicargador, 1 conductor volqueta sencilla.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional Ambiental,

7 profesional 001, 1 Inspector, 1 topografo.

Profesional SIAS

Profesional de Apoyo F
UNV

se requiere conformar el área para generar una operación fluida, al finalizar la obra se debe hacer el retiro total del material.

Rafael D. Peña F.
U.M.V.

Viernes 01 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: No
Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental.
Maquinaria en obra: 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador CAT, 1 vibrocompactador ammann, 1 minicargador, 1 retrocargador terex, 1 volqueta sencilla.
Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 1 operador de vibrocompactador, 1 operador de vibrocompactador, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 inspector SST, 1 topógrafo, 1 ayudante, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico. y 1 comisión topográfica.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.
Actividades: K3+210 a K3+150 sello de pavimento con fresado estabilizado cernido. K0+040 traslado de material RCD.
Observaciones: Se requiere vibrocompactador manto.

Rafael D. Peña F.
U.M.V.

Sábado 02 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: No
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV.

Rafael D. Peña F
U.M.V.

Domingo 03 de agosto de 2025 Clima: seco Vigilancia: No
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV.

Rafael D. Peña F
U.M.V.

Jones 04 de agosto de 2025 Clima: seco Vigilancia: No

Ingreso de personal a obra: 7:00 am

Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental.

Maquinaria en obra: 1 motoniveladora, 2 vibrocompactadores, 1 minicargador, 1 retrocargador. y 1 volqueta sencilla.

Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 2 operadores de vibrocompactador, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador y 1 conductor de volquetas.

Personal contrato 609: 1 inspector, 1 inspector SST, 1 ayudante, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico y 1 comisión topográfica.

Personal de interventoria: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.

Actividades: KZ+990 a KZ+836 Manejo de aguas lluvias en ambos costados. Retiro y Trasiego material RCD

Observaciones: Se requiere completar la unidad de ejecución pues solo se cuenta con un ayudante y el oficial presenta calamidad domestica.

Martes 05 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: No

Ingreso de personal a obra: 7:00 am

Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental.

Maquinaria en obra: 1 motoniveladora, 2 vibrocompactadores, 1 minicargador, 1 retrocargador y 1 volqueta sencilla.

Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 2 operadores de vibrocompactador, 1 conductor de tador, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor de volqueta sencilla.

Personal contrato 609: 1 inspector, 1 inspector SST, 1 ayudante, 1 BOAL, 1 comisión topográfica y 2 auxiliares de tráfico.

Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.

Actividades: KZ+830 a KZ+700 Manejo de aguas lluvias en ambos costados, Ret 040 Trasiego Material RCD

Observaciones: las actividades y el avance de obra se ven afectadas debido a falta de suministro de materiales pétreos.

Miércoles 06 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: 31/24h
Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal UAE RMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental
Maquinaria en obra: 1 motoniveladora, 2 vibrocompactadores, 1 minicargador, 1 retrocargador y 1 volqueta sencilla.
Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 1 operador de vibrocompactador, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 inspector SST, 1 ayudante, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico y 1 comisión topográfica.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.
actividades: K0+920 a K0+180 y K1+200 Conservación de accesos de movilidad mediante conformación de fresado en crudo RAP, K0+040 Traslado de material RCD.
Observaciones: Se ingresa el personal de vigilancia. Inicia nuevo contrato de vigilancia. Se establece día libre para entidades del distrito por cumpleaños de Bogotá, las unidades de ejecución laboran este día para compensar las horas de día viernes.

Elaura SAS
RAFAEL D PEÑA F
U.M.V.

Jueves 07 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: 31/24h
No se realizan actividades por parte de la UMV en este frente debido a festividad distrital

Elaura SAS
RAFAEL D PEÑA F
U.M.V.

Viernes 08 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: 31/24h
No se realizan actividades por parte de la UMV en este frente debido a intercambio de día laborable del 06-08-25.
No se presenta el personal de maquinaria en este frente.

Elaura SAS
RAFAEL D PEÑA F
U.M.V.

Sábado 09 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: 31/24h
No se realizan actividades por parte de la UMV en este frente de obra.

Elaura SAS
RAFAEL D PEÑA F
U.M.V.

Domingo 10 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: S1/24h
No se realizan actividades por parte de la UMV en este frente de obra.

Glova-SKS

Practicante de Apoyo F
U.M.V.

Lunes 11 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: S1/24h
Ingreso de personal a obra: 7:00am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST.
Maquinaria en obra: 2 motoniveladoras, 3 vibrocompactadores, 2 minicargadores, 3 retrocargadores, 1 volqueta sencilla y 1 volqueta doble.
Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 3 operadores de vibrocompactador, 2 operadores de minicargador, 3 operadores de retrocargador y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 inspector SST, 2 ayudantes 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topográfica y 1 conductor de volqueto doble.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 topografo y 1 conductor.
Actividades: KZ1970 a KZ1920 Perfilacion de subrasante, Km040 Trasiego de material RCD
Observaciones: se asigna en apoyo kit de maquinaria del frente San antonio 1 para el frente toldo. El corte de subrasante supera los 0.30m lo cual afecta el avance de la actividad y retira la piedra que estabilizen el área generando puntos de baja capacidad portante.

Glova-SKS

Practicante de Apoyo F
U.M.V.

Martes 12 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: S1/24h
Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, (1)
Maquinaria en obra: 2 motoniveladoras, 3 vibrocompactadores, 2 minicargadores, 3 retrocargadores, 1 volqueta sencilla y 1 volgveta doble.
Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 3 operadores

de vibrocompactador, 2 operadores de minicargador, 3 operadores de retrocargador y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 inspector SST, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topográfica y 1 conductor de volqueta doble.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.
Actividades: KZ+920 a KZ+910 Perfilacion de sobrasante, KZ+940 a KZ+910 Extendida de fresado en crudo RAP para renivelacion de subrasante. KO+040 trasiego de RCD.
Observaciones: En reiteradas ocasiones se evidencia reparación e intervencion mecánica a vibrocompactador BOMAG al cual el personal de maquinaria asegura estar operativo, continuamente se observa este tipo de reparaciones en la maquinaria asignada al frente, sin embargo el personal de contrato 936 encubre las novedades asociadas a la maquinaria. Se asigna en apoyo Kit de maquinaria de frente san antonio 1 para el frente toldo.

SST

Residente de Frente U.M.V.

Miércoles 13 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: SI/24

Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.)
Maquinaria en obra: 2 motoniveladoras, 3 vibrocompactadores, 2 minicargadores, 3 retrocargadores, 1 volqueta sencilla y 2 volqueta doble.
Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 3 operadores de vibrocompactador, 2 operadores de minicargador, 3 operadores de retrocargador y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 inspector SST, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comision topográfica y 2 conductores de volqueta doble.
Personal de interventoria: 1 residente técnico, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1

Jderma

topografo y 1 conductor.
Actividades: K2+910 a K2+870 Perfilacion de subrasante, K2+910 a K2+870 Extendida de fresado en crudo RAP para renivelacion de subrasante. K0+040 trasiego de RCD.
Observaciones: Se renivela perfilacion con RAP a altura de diseño de subrasante, aún faltan las capas de base y fresado por instalar. Se requiere que el consorcio CEV inicie con la construcción de filtro entre abscisas K2+995 a K3+100 para que la UMV pueda continuar con la construccion de vía.

Viernes 14 de agosto de 2025 Clima: Lluvia moderada Vigilancia: Si/24h
Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental,
Maquinaria en obra: 2 motoniveladoras, 3 vibrocompactadores, 2 mini-cargadores, 3 retrocargadores, 1 volqueta sencilla y 2 volquetas dobles.
Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 3 operadores de vibrocompactador, 2 operadores de minicargador, 3 operadores de retro-cargador y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 inspector SST, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliar tráfico, 1 comisión topográfica y 2 conductores de volqueta doble.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo y conductor.
Actividades: K2+870 a K2+840 perfilacion de subrasante K2+870 a K2+840 Extendida de fresado en crudo RAP para renivelacion de subrasante. K0+040 trasiego de RCD.
Observaciones: Se requiere dar cumplimiento al compromiso generado en el predio de la señora Nidia Hernandez, conformacion de ingreso, para permitir que el contratista construya los módulos de cuneta. Se evidencia en el frame maquinaria de contrato asignada a frente San Antonio 1 la cual se entregó al contratista, sin embargo aún no se retira del frente.

Norma

Viernes 15 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: SI/24h
Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental.
Maquinaria en obra: 2 motoniveladoras, 3 vibrocompactadores, 2 minicargadores, 3 retrocargadores, 1 volqueta sencilla y 2 volquetas dobles.
Personal contrato 936: 1 operador de motoniveladora, 3 operadores de vibrocompactador, 2 operadores de minicargador, 3 operadores de retrocargador y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 inspector SST, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topográfica y 2 conductores de volqueta doble.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.
Actividades: K2+840 a K2+820 perfilacion de sobrasante.
K2+840 a K2+820 Extendida de presado en crudo RAP para renivelacion de subrasante K0+040 Traslado de RCD
Observaciones: Durante el desarrollo de actividad de perfilacion de subrasante se evidencia material de corte en alcantarilla K2+831 el cual debe ser dispuesto como RCD.

Rafael D. Peña F
U.M.V.

Sábado 16 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: SI/24h
No se realizan actividades por parte de la UMV en este frente de obra.

Rafael D. Peña F
U.M.V.

Domingo 17 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: SI/24h
No se realizan actividades por parte de la UMV en este frente de obra.

Rafael D. Peña F
U.M.V.

Lunes 18 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: SI/24h
No se realizan actividades por parte de la UMV en este frente de obra.

Rafael D. Peña F
U.M.V.

Norma

Martes 19 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: SI/24h
Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental.
Maquinaria en obra: 2 motoniveladoras, 3 vibrocompactadoras, 2 minicargadores, 3 retrocargadores, 1 volqueta sencilla y 2 volquetas dobles.
Personal contrato 936: 2 operadores de motoniveladora, 3 operadores de vibrocompactador, 2 operadores de minicargador, 3 operadores de retrocargador, 1 coadoctor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 inspector SST, 1 apicual, 2 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topográfica, y 2 conductor de volqueta.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.
Actividades: KZ+930 a KZ+830 Manejo de aguas lluvias en borde izquierdo K0+040 a K3+100 Señalizacion de: accesos K0+040 Transiego de RCD
Observaciones: Las actividades de perfilacion se ven afectadas por falta de suministro de ~~asfalto~~ triturado en estado RAP.

Rafael D. Ortiz F.
U.A.E.V.

Miércoles 20 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: SI/24h
Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental
Maquinaria en obra: 2 motoniveladoras, 3 vibrocompactadores, 2 minicargadores, 3 retrocargadores y 1 volqueta sencilla y 1 volqueta Doble
Personal contrato 936: 2 operadores de motoniveladora, 3 operadores de vibrocompactador, 2 operadores de minicargador, 3 operadores de retrocargador, 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 inspector SST, 1 apicual, 2 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topográfica, y 1 conductor de volqueta doble.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topografo

y 1 conductor
Actividades: KZ+820 a KZ+810 recopilacion de sobrante KZ1820 a KZ+810 extendida de rap para remediacion de sobran KO+040 traslego de material RCD.
Observaciones: continua la conformación de vía con RAP aún, se requiere el suministro de materiales pétreos para dar celeridad al desarrollo de actividades.

Firma SST

RAFAEL D PEÑA F
U.M.V.

Jueves 21 de agosto de 2025 clima: Seco
Personal UAERMV. 1 Topografo, 1 cadenero, 1 Inspector 1 Auxiliar de trafico, 1 operador de Motoniveladora, 1 operador de retroexcavador, 1 conductor volqueta, 1 maestro, 2 oficial 1 ayudante
Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora, 1 Motoniveladora 1 volqueta doble, 1 placa vibratoria, 1 generador eléctrico 1 carrotanque
Personal Interventoria, 1 Resi Tecnico, 1 Ingeniero, 1 Resi SST; 1 Resi Ambiental 1 Resi Social
Actividades: (KJ+840 - KJ+771 Instalacion de KZ+791,8 - KZ+799,3 Izq. Fabricación de Bordillo A: 3,00m² Excavacion de fondo 0,40m, Mejoramiento con recebo 0,25m, Sello con RAP 0,15m KZ+810 - KZ+790 Manejo de aguas lluvias KO+040 Traslado de Material

Firma SST

RAFAEL D PEÑA F
U.M.V.

Viernes 22 de agosto de 2025 clima: Seco
Personal UAERMV. 1 Resi Tecnico, 1 profesional SST. 1 prof Ambiental, 1 prof social, 1 Inspector, 2 oficial 2 ayudante, 1 Resi. 2 Aux de trafico, 1 comisión topografia, 1 operador MVN, 1 operador Motoniveladora 1 operador de Retro, 1 op Vibro, 1 conductor volqueta
MAQUINARIA y Equipo: 2 Motoniveladora, 2 Vibro, 1 Mini 2 Retro, 1 volqueta

Personal Interventoria: 1 Res Tecnico, 1 Inspector
1 Res Social, 1 Res SST, 1 Res Ambiental.
Actividades: K2+791,8 - K2+999,3 Derechos
Ancho de Movilidad: 1: 7.00 M2 Esp. Falla 0.40 m. Reparcheo en Rupia 0.25 M, Falla en PAP = 0.15 m
Retiro Trasiego de Material RCD

Rafael D Peña F
U.M.V.

Sabado 23 - Agosto - 2025
Sin Actividades por reportar

Rafael D Peña F
U.M.V.

Domingo 24 - Agosto - 2025
Festivo

Rafael D Peña F
U.M.V.

Lunes 25 Agosto 2025 Clima: Seco
Personal UMV: 1 Res. Tecnico, 1 Res. Social, 1 Res. SST, 1 Res Ambiental, 1 Inspector, 1 Oficial, 3 ayudante 1 Boal, 2 Aux. Trafico, 1 Comun topografia, 1 op Rana 1 op Retro, 1 op. Retro, 1 op. vibro, 1 cuad volqueta 1 cuad. camioneta, 3 cuad. volqueta doble
Maquinaria y Equipo: 2 Motoniveladora, 2 vibros, 1 Rana 2 Retro. 1 vdg. sencilla, 3 vdg. doble
Personal Interventoria: 1 Res Tecnico, 1 Inspector, 1 Res SST, 1 Res Ambiental, 1 Res Social
Actividades: K3+050 - K2+995 Derecha Manejo de agua lluvias

K2+860 - K3+120 Limpieza de Alcantarilla
Retiro Trasiego de Material

Rafael D Peña F
U.M.V.

Martes 26 Agosto 2025 clima: lluvia moderada 8:00 - 12:00 am
Personal UAERMV: 1 Res Técnico, 1 Res. Ambiental, 1 Res SST, 1 Res Social, 1 Inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 Topal, 2 Aux de tráfico., 1 comisión de topografía, 1 op mini, 1 ope Moto, 2 op Retro, 1 op. Vibro, 1 cond camioneta, 1 cond volqueta
MAQUINARIA Y EQUIPO: 2 Moto, 2 Vibro, 1 Mini, 2 retro, 1 volq. sencilla
Personal Interventoría: 1 Res. Técnico, 1 Inspector, 1 Res Social, 1 Res. Ambiental, 1 Res SST
ACTIVIDADES: Km 1+200 Cargue > retiro RCD, limpieza y aseo. (entrega) Km 1+903 limpieza de Alcantarilla Km 0+0. Tendido de material RCD

Firma S.I.S

Residente UAERMV

Miércoles 27 Agosto 2025 clima: lluvia moderada Vigilancia: SI / 24h
Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental
Maquinaria en obra: 2 motoniveladora, 2 vibrocompactador, 1 minicargador, 2 retrocargadores, 1 volqueta sencilla y 1 Volqueta doble.
Personal contrato 936: 2 operadores de motoniveladora, 2 operadores de vibrocompactador, 1 operador de minicargador, 2 operadores de retrocargador. y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 2 avanderos de tráfico, 1 comisión topográfica y 1 conductor de volqueta.
Personal de interventoría: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor.
Actividades: Excavación de pallo, Mejoramiento con Retal, Sello con RAP KZ+810 a KZ+821
Observaciones: El retal no se selecciona y se instala con el material de recibo del lugar en el que se carga, se socializa con el encargado de obra la mala practica.

Firma S.I.S

Residente UAERMV

Jueves 28 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: Si/24h
Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST
Maquinaria en obra: 2 motoniveladoras, 2 vibrocompactadores, 1 minicargador, 2 retrocargadores y 1 volqueta sencilla y 1 volqueta doble.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topográfica y 1 conductor de volqueta doble.
Personal contrato 936: 2 operadores de motoniveladora, 2 operadores de vibrocompactador, 1 operador de minicargador, 2 operadores de retrocargador, y 1 volqueta sencilla conductor.
Personal de interventoria: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 topógrafo y 1 conductor
Actividades: Excavación de fallo, mejoramiento retal), Sello con RAP K2+847 a K2+858
Observaciones: Persisten las malas prácticas en la recuperación de puntos de baja capacidad portante en vía, se pone en conocimiento del director de obra.

Firma 545

Firma D. Técnico UAERMV.

Viernes 29 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: Si/24h
Ingreso de personal a obra: 7:00 am
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST.
Maquinaria en obra: 2 motoniveladoras, 2 vibrocompactadores, 1 minicargador, 2 retrocargadores, 1 volqueta sencilla y 1 volqueta doble
Personal contrato 936: 2 operadores de motoniveladora, 2 operadores de vibrocompactador, 1 operador de minicargador, 2 operadores de retrocargador y 1 conductor de volqueta sencilla.
Personal contrato 609: 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, 1 comision topográfica. y 1 conductor de volqueta doble.
Personal de interventoría: 1 rebidente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 topografo y 1 conductor.
Actividades: K0+700 - K1+350 - K1+700 - K2+600 Adecuación, orden

y limpieza de acopios.
Observaciones: las actividades se ven afectadas por la falta de suministro de materiales petreos.

Sábado 30 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: Si/24h
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV.

Domingo 31 de agosto de 2025 Clima: Seco Vigilancia: Si/24h
No se realizan actividades en este frente de obra por parte de la UMV

Lunes 01 de septiembre de 2025 Clima: lluvia-moderada Vigilancia: Si/24
Ingreso de personal a obra: 7:00
Personal UAERMV: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST.
Maquinaria en obra:

unes 01 de agosto 2025.

Tramo 5 Tunal.

Clima: Seco

* Personal UMV: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal 1 tecnologa SST, 1 comisión topografica, 1 operador vibrocompactador, 1 operador Retro cargador, 1 operario carrotanque, 1 operario minicargador.
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 Profesional SST 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 Topografo
* Maquinaria y equipos de obra: 1 vibrocompactador case 4th (vereda), 1 minicargador 1 Retro cargador, 1 motoniveladora, 1 carro tanque
* Actividades de obra: * Se realiza jornada de aseo (Barrido de carpeta de fresado, limpieza de cunetas y recolección de basural) esta actividad empieza desde tramo 2 Km 0+0 a Km 0+500, se cubren los señales instalados.

Edwin S. Ruiz

Rafael D. Peña F.
U. M.V.

bado 02 de agosto 2025

No se reportan actividades.

Edwin S. Ruiz

Rafael D. Peña F.
U. M.V.

unes 4 de agosto 2025

Tramo 5 Tunal

Clima: Seco

* Personal UMV: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal, 1 tecnologo SST 1 comisión topografica, 1 operador vibrocompactador, 1 operador Retro cargador, 1 operario carrotanque, 1 operario minicargador.
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental 1 profesional SST, 1 inspector, 1 topografo
* Maquinaria y equipos de obra: 1 vibrocompactador case 4th (vereda), 1 minicargador 1 retro cargador, 1 motoniveladora, 1 carro tanque.
* Actividad de obra: * Se realiza jornada de aseo (Barrido de carpeta de fresado, limpieza de cunetas y recolección de basural), esta actividad se lleva acabo en en tramo 2 abscisa Km 0+250 a Km 0+500, se cubren señales instaladas.

Edwin S. Ruiz

Rafael D. Peña F.
U. M.V.

Martes 5 de agosto 2025

Tramo 5 Tunales

Clima: Seco

* Personal UNV: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de tráfico, 1 Boal, 1 tecnologo sst, 1 comisión topografica, 1 operador vibrocompactador, 1 operador retro cargador, 1 operario carro tanque, 1 operador minicargador
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional sst, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topografo
* Maquinaria y equipos de obra: 1 v.brocompactador (use 4th (varado) 1 Retro cargadora, 1 minicargadora, 1 motoniveladora, 1 carro tanque
* Actividades de obra: * Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentias en Tramo 5. Se limpia y retira RLD tenido la alcantarilla proyectada. actividad realizada en K11+920 a K11+940.

Edwin SAS

Rafael D Reyes F
U. M.V.

Miercoles 6 de agosto 2025

Tramo 5 tunales

Clima: Seco

* Personal UNV: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal 1 tecnologo sst, 1 comisión topografica, 1 operador vibrocompactador, 1 operador retro cargador, 1 operador carro tanque, 1 operador mini cargador
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental 1 profesional sst, 1 inspector, 1 topografo
* Maquinaria y equipos de obra: 1 vibrocompactador (use 4th (varado), 1 Retro cargador, 1 mini cargador, 1 motoniveladora (varado), 1 carro tanque
* Actividades de obra: Se realiza jornada de manejo aguas cunetas, limpieza de cunetas y barrido general. Actividad realizada en tramo 2 K12+153 hasta Tramo 3 K01+230 * Se realiza retiro de señalizacion que se implementara Esta actividad se realizo en el mismo alcance y con apoyo del retro cargador.

Edwin SAS

Rafael D Reyes F
U.M.V.

Viernes 8 de agosto

No se reportan actividades. No se evidencian operarios de maquinaria pesada.

Edwin SAS

Rafael D Reyes F
U.M.V.

Sabado 9 de agosto

No se reportan actividades.

Rafael D Reyes F U.M.V.

Jueves 11 de agosto

Tramo 5 túneles

Clima: Seco

* Personal UMV: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de tráfico, 1 Boal, 1 tecnólogo SST, 1 comisión topográfica, 1 operador v. bocompactador, 1 operador carro tanque, 1 operador retro cargador, 1 operador minicargador.
* Personal interventoría: 1 Residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 topógrafo.
* Maquinaria y equipos de obra: 1 Vibrocompactador case 4th (varado), 1 Retro cargador, 1 minicargador, 1 motoniveladora, 1 carro tanque.
* Actividades de obra: * Se realiza jornada de manejo aguas de escorrentías, limpieza de cunetas y barrido general. Esta actividad se realiza desde tramo 4 K0+000 y hasta K0+830.

RAFAEL D. PEREZ F.
U.M.V.

Viernes 12 de agosto 2025

Tramo 5 túneles

Clima: Seco

* Personal UMV: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de tráfico, 1 Boal, 1 tecnólogo SST, 1 comisión topográfica, 1 operador v. bocompactador, 1 operador retro cargador, 1 operador carro tanque, 1 operario minicargador.
* Personal interventoría: 1 Residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional SST, 1 inspector, 1 topógrafo.
* Maquinaria y equipos de obra: 1 Vibrocompactador Dynapac 4th (varado), 1 Retro cargador, 1 minicargador, 1 motoniveladora, 1 carro tanque.
* Actividades de obra: Se realiza jornada de manejo aguas escorrentías, limpieza de cunetas y barrido general. esta actividad se realiza desde tramo 4 K0+830 hasta K0+710.

RAFAEL D. PEREZ F.
U.M.V.

Miercoles 13 de agosto 2025

Tramo 5 tunales

Clima: lluvias moderadas 11:00 a.m a 3:00 p.m.

* Personal UMV: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de tráfico, 1 Boal, 1 tecnologo sst, 1 comisión topografica, 1 operador vibro compactador 1 operador Retro cargada, 1 operador carro tanque, 1 operador minicargador.
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional sst, 1 profesional social 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topografo.
* Maquinaria y equipos de obra: 1 vibro compactador Dynapac 4th (varide) 1 Retro cargador, 1 minicargador, 1 motoniveladora, 1 carro tanque.
* actividades de obra: * Se realza demolicion de roca existente con acción mecanica del martillo demoledor del mini cargador. en km0+900

Dynapac SAS

RAFAEL D. PEÑA F
U.M.V.

Jueves 14 de agosto 2025

Tunal Tramo 5

Clima: Seco

* Personal UMV: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal 1 tecnologa sst, 1 comisión topografica, 1 operador de vibrocompactador, 1 operador retro cargador, 1 operador carro tanque, 1 operador minicargador
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental 1 profesional sst, 1 inspector, 1 topografo
* Maquinaria y equipos de obra: 1 vibrocompactador Dynapac 4th (varide) 1 Retro cargador, 1 minicargador, 1 motoniveladora, 1 carro tanque
* actividades de obra: * Se realiza demolición de roca existente con accion mecanica del martillo demoledor del minicargador, km0+900 * Se realize hidratación de pista de base granular para poder realizar compactación y sello del material. Sin embargo se evidencia que el vibrocompactador de 4th es ineficiente.
* Se evidencia barrido general de pista para eliminar materia vegetal y particulas granulares gruesas, km0+950 a km0+750 * Se escarificación de fresado estabilizado para la transición y union de tramos de fresado km0+900 a km1+950 * Se realiza riego de Liga, sobre la pista de base granular existente, Se maneja un tiempo de ruptura de 1 hora km0+950 a km0+750
* Se realiza extendida de fresado estabilizado aprox a capa de 0,05 m se realiza compactación mecanica con equipo trasladado desde tramo San antonio 8 km

RAFAEL D PEÑA F U.M.V.

Viernes 15 de agosto 2025

Tunal Tramo 5

Clima: Seco

* Personal UMV: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal 1 tecnologo sst, 1 comisión topografica, 1 operador de vibrocompactador, 1 operador retro cargador, 1 operador carro tanque, 1 operador minicargador.
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional sst 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topografo
* maquinaria y equipos de obra: 1 vibrocompactador Dynapac 4th (varado) 1 Retro cargador, 1 minicargador, 1 motoniveladora, 1 carro tanque.
* Actividades de obra: * Se realiza demolicion de roca existente con acción mecanica del martillo demoledor del minicargador Kot400. * Se realiza riego de liga con emulsión asfaltica, con el fin de terminar de sellar la pista granular Kot 635 a Kot750, * Se realizo extendido de fresado estabilizado Aprox 0,05 de Kot635 a Kot750

RAFAEL D PEÑA F
U.M.V.

Sabado 16 de agosto 2025

No se reportan actividades

RAFAEL D. PEÑA F
U.M.V.

Martes 19 de agosto 2025

Tunal Tramo 5

Clima: Seco

* Personal UMV: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal 1 tecnologo sst, 1 comisión topografica, 1 operador vibrocompactador, 1 operador retro cargador, 1 operador carro tanque, 1 operador minicargador.
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental, 1 profesional sst, 1 inspector, 1 topografo
* Actividades de obra: Se realiza demolición de roca existente con acción mecanica del martillo demoledor del minicargador, Kot490. * Se realiza compactación de carpeta de fresado estabilizado. Kot720 a Kot750

RAFAEL D. PEÑA F.
U.M.V.

Miércoles 20 de agosto 2025

Tunal Tramo 5

Clima: Seco

* Personal U.M.V: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de tráfico (1 con
1 Boal, 1 tecnologo sst, 1 comisión topografica, 1 operador vibrocompactador
1 operador retro cargador, 1 operador carro tanque, 1 operador minicargador
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional
1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topografo.
* Maquinaria y equipos de obra: 1 vibrocompactador Dynapac 4th (comb
1 vibrocompactador Dynapac 8th, 1 Retro cargador, 1 minicargador
1 motoniveladora 1 carro tanque.
* Actividades de obra: * Se realizo demolición de vía existente con acc
mecanica del martillo demoledor del minicargador Rotto * Se realiza
manejo de aguas escorrentias, excavación y retiro de material remov
Saturado por lluvias. Esta actividad se lleva a cabo en el tramo
5 K1+490 a 1+380

Jueves 21 de agosto 2025.

Tunal Tramo 5

Clima: Seco

* Personal UMV: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Bo
1 tecnologo sst, 1 comisión topografica, 1 operador vibrocompactador,
1 operador de Retro cargador, 1 operador carro tanque, 1 operador minicargador
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional sst
1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topografo
* Maquinaria y equipos de obra: 1 vibrocompactador Dynapac 4th (combo)
1 vibrocompactador Dynapac 8th, 1 Retro cargador, 1 minicargador.
1 motoniveladora, 1 carro tanque
* Actividades de obra: * Se realiza demolición de vía existente con
accion mecanica del martillo demoledor del minicargador Rotto
* Se realiza manejo de aguas escorrentias excavacion y retiro de material
remanente saturado por lluvias, esta actividad se realiza en tramo 5 K1+1
a K1+360. Nota: la excavación es mas de 50cm. Motivo por el cual
el filtro esta quedando expuesto y sin material de recubrimiento. Se
recomienda realizar la actividad con la motoniveladora.

Viernes 22 de agosto 2025

Tunel Tramo 5

Clima: Lluvias moderadas 2:00 pm a 3:30 pm

* Personal U4V: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal 1 tecnologa sst, 1 comisión topografica, 1 operador de vibrocompactador, 1 operador de retrocargador, 1 operador carro tanque, 1 operador minicargador.
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional ambiental 1 profesional sst, 1 inspector, 1 topografo.
* Maquinaria y equipos de obra: 1, vibrocompactador Dynapac 9 th (varado) 1 vibrocompactador Dynapac 8th, 1 Retro cargador, 1 minicargador, 1 motoniveladora 1 carro tanque
* Actividades de obra: * Se realiza demolición de roca existente con accion mecanica del martillo demoledor del minicargador Km+400 * Se realiza imprimación de material en capas de trasado estabilizado. Esta actividad se lleva a cabo en Km+420 a Km+435
* Se realiza extendida de trasado estabilizado entre Km+420 a Km+435 No se completa toda la pista, que se imprime, debido a que se varo la volqueta asignada al tramo

Sabado 23 de agosto 2025

No se reportan actividades

Lunes 25 de agosto 2025

Tunel Tramo 5

Clima: Seco.

* Personal U4V: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal 1 tecnologa sst, 1 comisión topografica, 1 operarro de vibrocompactador, 1 operador retro cargador, 1 operador carro tanque, 1 operador minicargador.
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional sst 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topografo
* Maquinaria y equipos de obra: * 1 vibrocompactada Dynapac 9th (varado) 1 vibrocompactador Dynapac 8 th, 1 Retro cargador, 1 minicargador, 1 motoniveladora 1 carro tanque
* Actividades de obra: * Se realiza emprimación de material en capas de

fresado estabilizado. Esta actividad se lleva a cabo en Ko+540 a Ko+940
* Se realiza extendida de fresado, estabilizado entre Ko+990 a Ko+990
Se humecta y se sella con un vibrocompactador Dynapac de 4 th.

Martes 26 de agosto 2025
Tunal Tramo 5
Clima: Seco
* Personal UMV: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico 1 Boal, 1 tecnologo sst, 1 comision topografica, 1 operador de vibrocompactador, 1 operador de retro cargada, 1 operador carro tanque, 1 operador mini cargador
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional sst 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topografo
* Maquinaria y equipos de obra: 1 vibrocompactador Dynapac 4th (vereda) 1 vibrocompactador Dynapac 8th, 1 Retro cargador, 1 mini cargador, 1 motoniveladora 1 carro tanque
* Actividad de obra: * Se realiza imprimación de material en capas de fresado estabilizado, esta actividad se llevo a cabo en Ko+530 a Ko+600
* Se realiza extendida de fresado estabilizado entre Ko+530 a Ko+600. Se humecta y se sella con vibro de 8 th
Nota: No se cuenta con material petreo para realizar actividades de conformación de via.

Miercoles 27 de agosto 2025
Tunal Tramo 5
Clima: Seco.
* Personal UMV: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal 1 tecnologo sst, 1 comisión topografica, 1 operador de vibrocompactador 1 operador de retro cargador, 1 operador carro tanque, 1 operador de mini cargador
* Personal interventoria: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profesional sst 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topografo
* Maquinaria y equipos de obra: 1 vibrocompactador Dynapac 4th (vereda) 1 vibro compactador Dynapac 8th, 1 Retro cargador, 1 mini cargador 1 motoniveladora, 1 carro tanque:
* Actividades de obra:

Edwin S.K.S

RAFAEL D. PEÑA F
U.M.V.

Jueves 28 de Agosto 2025
Tunal tramo 5
CLIMA: SECO.
PERSONAL UMV: 1 oficial, 1 Inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal, 1 tecnologo SST, 1 comision topografica, 1 operario vibrocompactador, 1 operario retrocargador, 1 operario carro tanque, 1 operario minicargador.
PERSONAL INTEVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 profesional social, 1 profecional Ambiental, 1 profesional SST, 1 Inspector, 1 topografo.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 vibrocompactador Dynapac 9tn[varado] - 1 vibrocompactador Dynapac 8tn, 1 Retrocargador, 1 mini cargador, 1 Motoniveladora, 1 carro tanque.
Actividad de obra: se realiza imprimación de material en capas de fresado estabilizado. Esta actividad se lleva a cabo en K0+650 a K0+750. Adicionalmente se realiza extendida de fresado estabilizado, se humecta y se sella con vibrocompactador de 8 Tn. De igual manera se cerca a nivel de terminado.
NOTA: se evidencia que el sello y compactacion del fresado lo hacen desendiendo, motivo por el cual se corre el material.

Edwin S.K.S

RAFAEL D. PEÑA F
U.M.V.

Viernes 29 de Agosto de 2025
Tunal tramo 5 CLIMA: SECO.
PERSONAL UMV: 1 oficial, 1 Inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 Boal, 1 tecnologo SST, 1 comision Topografico, 1 operario vibrocompactador, 1 operario retrocargador, 1 operario carro tanque, 1 operario minicargador.
PERSONAL INTEVENTORIA: 1 Residente tecnico, 1 profesional Ambiental, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 Inspector, 1 topografo.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 vibrocompactador Dynapac 1 Tn (varado), 1 vibrocompactador 8 Tn, 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 motoniveladora, 1 carro tanque.
ACTIVIDADES OBRA: Se realiza rectificación de bordes de vía y niveles de terminado de carpeta de Fresado estabilizado. Actividad desarrollada entre K0+420 a K0+680. De igual manera se realiza aplicación de material cernido sobre carpeta de fresado. Se realiza entre K0+680 a K0+950. Se humecta y se sella con vibrocompactador de 8t.

Sabado. 30 de Agosto de 2025.
No se desarrollan actividades.

Domingo. 31 de Agosto de 2025.
No se desarrollan actividades.

lunes 01 de septiembre 2025
Tunal Tramo 5
Arma: Seco

* Personal UMV: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de tráfico, 1 Qual, 1 tandem SST, 1 comisión topografía, 1 operador vibrocompactador, 1 operador retro cargador, 1 operador de carro tanque, 1 operador de mini cargador
* Personal interventoría: 1 Residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 inspector, 1 topógrafo.
* Maquinaria y equipos de obra: 1 vibrocompactador Hamm 4th, 1 vibrocompactador Dynapac 8th, 1 Retro cargador, 1 mini cargador, 1 motoniveladora, 1 carro tanque
* Actividades de obra: * Se realiza la demarcación de bordes de vía y nivel de terminado de carpeta de fresado estabilizado. K0+680 a K0+950 * Se realiza Traslado de maquinaria desde tramo 5 y hasta Tramo 1, se realiza traslado de Vibrocompactador Hamm 4th y del minicargador Bobcat en grúa.

ANEXO NO. 04 DOCUMENTACION CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022

4.A INFORME COMPONENTE AMBIENTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

ECOVIAS SAS



INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
N° 31

DEL 01 al 31 DE AGOSTO - DE 2025

Versión 01
Bogotá, D.C. agosto 2025

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		N°. DE COPIAS
Copia N°.1	Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	1 (Original)
Copia N°.2	Biblioteca del Proyecto	1 (Copia)

CONTROL DE VERSIONES

ÍNDICE VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFCACIÓN	FOLIOS
01	08/09/2025	Emisión del documento	123

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN



TITULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 31			
PERIODO:	**01 al 31 de agosto de 2025**			
NUMERO DE REVISIÓN			1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN Profesional Ambiental	Nombre:	Yesenia Hernández Ramirez		
	Firma:			
	Fecha:	08/09/2025		
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Ermy A. Hurtado R.		
	Firma:			
	Fecha:	08/09/2025		
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
	Firma:			
	Fecha:	08/09/2025		

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
2. Objeto del proyecto. 9
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 10
4. OBJETIVOS. 12
4.1 General 12
4.2 Específicos 12
5. GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA: 13
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV 13
5.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental. 13
5.2 Capacitación ambiental al personal de obra. 14
5.3 Cumplimiento de los requerimientos legales 16
5.4 Manejo Integral de materiales de construcción 19
5.5 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales 24
5.6 Manejo y disposición final de escombros y RCD 29
5.7 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos. 33
5.8 Manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales 37
5.9 Control de emisiones atmosféricas 37
5.10 Manejo de aguas superficiales 39
5.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales 41
5.12 Protección de ecosistemas sensibles 45
5.13 Protección de fauna en obra 45
5.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio 46
5.15 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo 50
5.16 Manejo del descapote y cobertura vegetal. 55
5.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural. 55
6. CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL CTO. 479 DE 2022. 56
6.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental. 56
6.2 Capacitación ambiental al personal de obra. 57

6.3 Cumplimiento de los requerimientos legales 59
6.4 Manejo Integral de materiales de construcción 61
6.5 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales 64
6.6 Manejo y disposición final de escombros y RCD 67
6.7 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos. 70
6.8 Manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales 73
6.9 Control de emisiones atmosféricas. 74
6.10 Manejo de aguas superficiales 76
6.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales 78
6.12 Protección de ecosistemas sensibles 80
6.13 Protección de fauna en obra 81
6.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio 81
6.15 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo 84
6.16 Manejo del descapote y cobertura vegetal. 86
6.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural. 86
7. CONSORCIO GAVIONES 95 CTO. 478 DE 2022 87
7.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental. 87
7.2 Capacitación y concienciación para el personal de obra 88
7.3 Cumplimiento de los requerimientos legales 90
7.4 Manejo Integral de materiales de construcción 91
7.5 Explotación de fuentes de materiales 94
7.6 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales 95
7.7 Manejo y disposición final de escombros y RCD 97
7.8 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y peligrosos. 101
7.9 Manejo de aguas superficiales 104
7.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales 106
7.12 Manejo del descapote y cobertura vegetal. 108
7.13 Protección de fauna en obra 109
7.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio 109
7.16 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo 111
6.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural. 113

8. gestion realizada por la interventoria..... 114
9. CONCLUSIONES..... 120

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas ubicación de los tramos del proyecto. 11
Tabla 2. Estado actual de la malla vial. 11
Tabla 3 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV 13
Tabla 4. Conformación del grupo Socioambiental UMV 14
Tabla 5 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV 15
Tabla 6 Capacitaciones realizadas UMV 15
Tabla 7 Permisos de ocupación de cauce otorgados por la CAR 17
Tabla 8 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV 18
Tabla 9 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción UMV 20
Tabla 10 Relación de Proveedores y cantidades UMV 21
Tabla 11 Verificación cumplimiento ficha de señalización UMV 25
Tabla 12 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD UMV 29
Tabla 13. Relación de material RCD evacuado UMV 31
Tabla 14 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV 34
Tabla 15 Reporte de residuos generados UMV 36
Tabla 16 Cumplimiento general medida de manejo UMV 38
Tabla 17 Cumplimiento general medida de manejo UMV 40
Tabla 18 Cumplimiento general medida de manejo UMV 42
Tabla 19 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio UMV 46
Tabla 20 Ubicación de acopios Tunales 48
Tabla 21 Ubicación acopios San Antonio-Toldo 49
Tabla 22 Ubicación acopios Capitolio 49
Tabla 23 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo UMV 50
Tabla 24 Relación de vehículos UMV 51
Tabla 25 Relación de maquinaria UMV 52
Tabla 26 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV 56
Tabla 27 Conformación del grupo socioambiental CEV 56
Tabla 28 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV 57
Tabla 29 Capacitaciones realizadas CEV 58
Tabla 30 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV 60
Tabla 31 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción CEV 61

Tabla 32 Relación de Proveedores y cantidades CEV 63
Tabla 33 Verificación cumplimiento ficha de señalización CEV 64
Tabla 34 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD CEV 68
Tabla 35 Relación de material RCD dispuesto CEV 69
Tabla 36 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV 70
Tabla 37 Reporte de residuos generados CEV 73
Tabla 38 Cumplimiento general medida de manejo CEV 74
Tabla 39 Cumplimiento general medida de manejo CEV 76
Tabla 40 Cumplimiento general medida de manejo CEV 79
Tabla 41 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio CEV 81
Tabla 42 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo CEV 84
Tabla 43 Relación de vehículos CEV 85
Tabla 44 Relación de maquinaria CEV 85
Tabla 45 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95 87
Tabla 46 Conformación del grupo socioambiental Gaviones 95 87
Tabla 47 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95 88
Tabla 48 Capacitaciones realizadas Gaviones 95 89
Tabla 49 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95 90
Tabla 50 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción Gaviones 95 .. 91
Tabla 51 Relación de Proveedores y cantidades Gaviones 95 93
Tabla 52 Verificación cumplimiento ficha de señalización Gaviones 95 95
Tabla 53 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD Gaviones 95 98
Tabla 54 Relación de material RCD dispuesto Gaviones 95 100
Tabla 55 Verificación cumplimiento ficha manejo de residuos sólidos convencionales Gaviones 95 102
Tabla 56 Reporte de residuos generados Gaviones 95 104
Tabla 57 Verificación cumplimiento ficha manejo de aguas superficiales Gaviones 95 105
Tabla 58 Verificación cumplimiento ficha manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales Gaviones 95 106
Tabla 59 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio Gaviones 95 109
Tabla 60 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo Gaviones 95 111
Tabla 61 Relación de vehículos Gaviones 95 112
Tabla 62 Relación de maquinaria Gaviones 95 112
Tabla 63 Relación de correspondencia enviada y recibida 118

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Ubicación de los tramos del proyecto. 10
Imagen 2. Jurisdicción el territorio CAR-Municipios de Cundinamarca y Bogotá rural 11
Imagen 3 Plano de PMT aprobado UMV 28
Imagen 4 Plano de PMT aprobado CEV 67
Imagen 4 Plano de PMT aprobado Consorcio Gaviones 97

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Capacitación Ambiental UMV 16
Ilustración 2 Manejo de materiales de Construction Capitolio UMV 23
Ilustración 3 Manejo de materiales de Construction Tunales UMV 24
Ilustración 4 Manejo de materiales de Construction San Antonio UMV 24
Ilustración 5 Señalización campamentos UMV 26
Ilustración 6 Señalización emergencia en frente de obra UMV 26
Ilustración 7 PMT implementado Tunales UMV 27
Ilustración 8 PMT implementado Capitolio UMV 27
Ilustración 9 PMT implementado San Antonio UMV 28
Ilustración 10 Acopios de RCD San Antonio UMV 32
Ilustración 11 Acopios de RCD Capitolio UMV 33
Ilustración 12 Acopios de RCD Tunales UMV 33
Ilustración 13 Puntos ecológicos Tunales / Capitolio UMV 35
Ilustración 14 Centro de acopio temporal de Respel San Antonio/ Tunales UMV 36
Ilustración 15 cubrimiento de materiales San Antonio / Capitolio UMV 39
Ilustración 16 manejo aguas superficiales Tunales/Capitolio UMV 41
Ilustración 17 Unidades Sanitarias Capitolio / Tunales UMV 43
Ilustración 18 Unidades Sanitarias San Antonio UMV 44
Ilustración 19 Kit atención derrames San Antonio / Tunales UMV 44
Ilustración 20 Campamentos Tunales UMV 47
Ilustración 21 Campamentos Capitolio UMV 47
Ilustración 22 Campamentos San Antonio UMV 48
Ilustración 23 Equipos en obra Tunales UMV 53
Ilustración 24 Equipos en obra Capitolio UMV 54
Ilustración 25 Equipos en obra San Antonio UMV 54
Ilustración 26 Capacitación Ambiental CEV 59
Ilustración 27 Manejo de materiales de Construction Tunales / San Antonio CEV 64
Ilustración 28 Señalización en obra CEV 65
Ilustración 29 PMT Implementado San Antonio CEV 66

Ilustración 30 PMT Implementado Tunales CEV 66
Ilustración 31 Acopios de RCD San Antonio/Tunales CEV 70
Ilustración 32 Puntos ecológicos San Antonio / Tunales CEV 72
Ilustración 33 Cubrimiento de materiales CEV 76
Ilustración 34 delimitación de alcantarillas CEV 78
Ilustración 35 Kit Control de derrames CEV 80
Ilustración 36 Campamentos Tunales CEV 83
Ilustración 37 Campamentos San Antonio CEV 83
Ilustración 38 Equipos en obra CEV 86
Ilustración 39 Capacitación Ambiental Gaviones 95 89
Ilustración 40 Manejo de materiales de Construction Gaviones 95 predio identificado como acopio 94
Ilustración 41 Actividades en obra Gaviones 95 96
Ilustración 42 PMT Implementado Laguna Verde Gaviones 95 96
Ilustración 43 Acopios de RCD Gaviones 95 101
Ilustración 44 Puntos ecológicos Gaviones 95 103
Ilustración 45 Unidades Sanitarias Gaviones 95 107
Ilustración 46 Kit control de derrames Gaviones 95 107
Ilustración 47 Campamento Gaviones 95 111
Ilustración 48 Equipos en obra Gaviones 95 113
Ilustración 49 participación en comités integrales 115
Ilustración 50 participación en comités integrales 116
Ilustración 51 Recorridos de obra 116

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes.

La localidad de Sumapaz está ubicada sobre la Cordillera Oriental, allí tiene lugar el Parque Nacional Natural Sumapaz, su extensión es de 154.000 hectáreas con alturas sobre el nivel del mar que oscilan entre 1.500 y 4.360 metros y temperaturas entre 2 y 19 grados centígrados, las veredas de la localidad se intercomunican entre sí y con la zona urbana de Bogotá mediante una red de vías carreteables y peatonales. El transporte de los productos de la región se realiza a lomo de mula, salvando grandes distancias hasta donde pueden ser embarcados en vehículos. La localidad está ubicada en zona del páramo más grande del mundo lo que hace que la pluviosidad sea alta en gran parte del año y esto influye en la disminución de visibilidad y exige precaución en la conducción de vehículos, las alturas de la localidad sobre el nivel del mar varían entre 2200msnm y 3900msnm en las vías de la localidad.

La Localidad de Sumapaz tienen una red vial rural en regulares condiciones con superficie de afirmado en regular estado, las vías de la localidad cuentan con anchos variables de 4,50 hasta 7mts en promedio y con mínimas obras de arte que considerando que el mantenimiento de vías es altamente oneroso, frente a los presupuestos locales, la SDP-IDU consideran que es pertinente adelantar intervenciones a nivel de mantenimiento vial, con lo cual se pretende mejorar las condiciones de transporte de productos agrícolas generados en la región, trasporte de comunidad en general y una fácil accesibilidad escolar.

2. OBJETO DEL PROYECTO.

El desarrollo del proyecto busca mejorar la infraestructura de la red vial terciaria, con el fin de optimizar la intercomunicación, movilidad y el tránsito al interior de la localidad, hacia los centros poblados y la zona urbana con el fin de impulsar y fortalecer el concepto de ciudad región, mediante el mantenimiento y rehabilitación de la red vial terciaria en mal estado de la ruralidad de Bogotá D.C, en la localidad de Sumapaz, La implementación de las soluciones planteadas permitirá mejorar la intercomunicación terrestre en la población rural al disponer de infraestructura mejorada para tal fin.

El proyecto cuyo objeto es "MEJORAR LA INTERCOMUNICACION Y ACCESIBILIDAD TERRESTRE DE LOS HABITANTES RURALES DE LA LOCALIDAD DEL SUMAPAZ".

Las obras buscan lograr beneficios económicos y sociales, originados en los ahorros en tiempo para los usuarios, en costos de operación de los vehículos y mayor oportunidad y calidad de los productos agrícolas y agroindustriales de dichos municipios.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El lugar de ejecución del contrato es en la ciudad de Bogotá D.C., localidad 20 (Sumapaz). La localidad de Sumapaz se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, con los siguientes límites:


- *Por el Norte*: con la localidad de Usme, Bogotá D.C.
- *Por el Sur*: con el Departamento de Huila.
- *Por el Oriente*: con los municipios de Chipaque, Une, Gutiérrez del departamento de Cundinamarca y San Juan de Cubarral en el departamento del Meta.
- *Por el Occidente*: con los municipios de Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera del departamento de Cundinamarca.

Imagen 1. Ubicación de los tramos del proyecto.



Fuente: Anexo Técnico.

Imagen 2. Jurisdicción el territorio CAR-Municipios de Cundinamarca y Bogotá rural

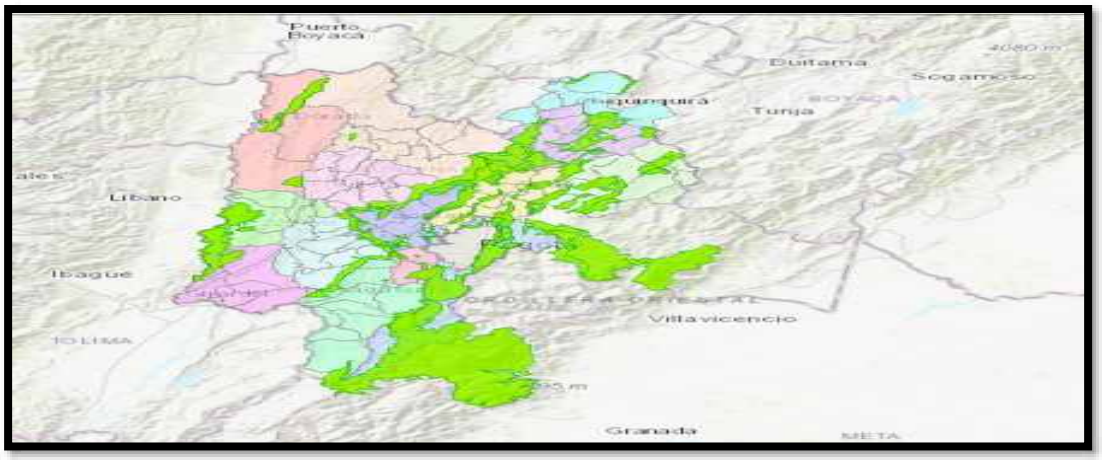

Fuente: https://www.car.gov.co/vercontenido/2430

Tabla 1. Coordenadas ubicación de los tramos del proyecto.

TRAMO	LONGITUD (m)	Coordenadas eje inicio		Coordenadas eje fin	
		ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
1. Unión Tunales	940	71.323,05	28.973,98	70.263,94	31.071,71
2. Unión Tunales	2042,66	70.267,12	31.082,64	69.538,72	32.345,68
3. Unión Tunales	250	69.443,88	32.324,65	69.209,96	32.342,85
4. Unión Tunales	703,8	69.292,34	32.444,70	68.757,63	32.113,11
5. Unión Tunales	1530	68.746,24	32.006,96	68.433,47	32.290,91
8. Animas bajas	1870	89.909,19	51.357,74	88.350,20	48.633,31
9. San Antonio II K6+910 - K0+000	6910	74.127,41	38.986,50	71.879,91	45.974,27

Fuente: Anexo Técnico.

La extensión total de la malla vial de la localidad es de 357,25 km-carril (incluye rural principal y no principal), la cual se categoriza de la siguiente manera.

Tabla 2. Estado actual de la malla vial.

Bueno Km-Carril	Regular Km-Carril	Malo Km-Carril	Total Km-Carril
28.32	113.02	215.92	357.25

Fuente: Anexo Técnico

Malla vial rural principal cuenta con una extensión total de 222,96 km-carril donde solo 18,94 km-carril, se encuentran en buenas condiciones, lo cual corresponde al 9% del estado total de la malla vial.

4. OBJETIVOS.

4.1 General

Presentar el informe de gestión ambiental correspondiente a las actividades constructivas ejecutadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2025 por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV, CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL y CONSORCIO GAVIONES 95. en el desarrollo del contrato de interventoría No. 161 de 2022, por medio de la descripción de las actividades ejecutadas desde el componente ambiental con el fin de evidenciar el cumplimiento a satisfacción del seguimiento, control y verificación a la ejecución de los contratos de obra No. 479 de 2022, 478 de 2022 y UAERMV.

4.2 Específicos

- Supervisar las actividades ambientales ejecutadas por los contratistas de obra y entidad ejecutora en desarrollo de los programas del PAGA.
- Revisar y dar concepto a los informes ambientales remitidos por los contratistas de obra y entidad ejecutora.
- Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente por parte de los contratistas de obra y entidad ejecutora.
- Presentar el informe de cumplimiento a los programas ambientales implementados por los contratistas de obra y entidad ejecutora.
- Especificar y detallar el seguimiento ejecutado por la interventoría de las actividades realizadas por los contratistas de obra y entidad ejecutora dentro del componente ambiental durante el periodo del presente informe.

5. GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA:

A continuación, se hará una descripción de las actividades realizadas propias de interventoría y del seguimiento a las actividades ejecutadas por la entidad ejecutora Unidad de mantenimiento via y los contratistas de obra durante el periodo que abarca este informe mensual de actividades de Interventoría, es decir, del 01 al 31 de agosto de 2025. Lo anterior de acuerdo a las fichas presentadas en el PAGA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV

En el periodo se realizaron actividades de manejo de aguas, excavaciones, traslado de materiales pétreos, retiro de residuos de excavación RCD hacia acopios principales y hacia sitio de disposición final autorizado, delimitación de alcantarillas en los tramos en intervención, jornadas de orden, aseo y mejoramiento de acopios en general, inspecciones en campo, charlas y capacitaciones, implementación de PMT, actividades de topografía, retiro de fallos, instalación de materiales pétreos y carpeta de fresado estabilizado.

5.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental.

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 3 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con el grupo de gestión socioambiental conformado.				
El personal socioambiental se encuentra en el lugar donde se desarrollan las actividades de obra.				

Fuente: Ecovias SAS

La interventoría realizó requerimiento de actualización al documento PAGA, este documento se encuentra avalado por la interventoría mediante el oficio 186-1-704. A continuación, se presenta la conformación del grupo de gestión Socioambiental (véase tabla No4).

Tabla 4. Conformación del grupo Socioambiental UMV

NOMBRE	CARGO
Rafael Darío Peña	Director de obra
Camilo Rojas	Coordinador de obra
Jorge Luis Aldana	Coordinador de obra
Ruby Ruiz	Residente social
Paola Vidal	Profesional ambiental
Jhoanna Ortiz	Profesional en seguridad y salud en el trabajo

Fuente: Ecovias

De acuerdo con la anterior tabla se evidencia que la entidad ejecutora cumple con el personal requerido socioambiental, el cual se encuentra en obra realizando las funciones asignadas. En el informe de la entidad ejecutora se encuentra como soporte el acta de conformación del grupo socioambiental.

Indicador:
Número de profesionales contratados x100% 6 / 6 * 100 = 100%
Número total de profesionales propuestos

Número de capacitaciones Ejecutadas x100% 0 / 0 * 100 = 0 %
Número de Capacitaciones programadas

Número de requerimientos ambientales cumplidos x100% 0 / 0 * 100 = 0 %
Número de requerimientos ambientales generados

5.2 Capacitación ambiental al personal de obra.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la capacitación y educación ambiental del personal vinculado al proyecto**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 5 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza la jornada de capacitación mensual programada.				
Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.				

Fuente: Ecovias SAS

De igual manera se verificó el cumplimiento según el cronograma de capacitaciones desde el componente ambiental, que se realizaron las siguientes capacitaciones al personal:

Tabla 6 Capacitaciones realizadas UMV

COMPONENTE	TEMA	TIPO	FECHA
Ambiental	Manual de buenas prácticas y procedimientos ambientales y Leyes de normatividad sobre protección de fauna y flora	Capacitación	26/08/2025 Tunales 27/08/2025 Capitolio 25/08/2025 Antonio Toldo-
Ambiental	Manejo seguro de hidrocarburos y atención inmediata a derrames. Protección de Coberturas Vegetales: Restricción al Parqueo de Maquinaria	Sensibilización	12/08/2025

Fuente: Cronograma de capacitaciones UAERMV.

La UAERMV se encargó de realizar la capacitación ambiental los días 12, 25, 26 y 27 de agosto de 2025 al personal, abarcando los temas mencionados en la tabla anterior y fueron dictadas por la profesional ambiental de la UAERMV, con el fin de generar conciencia a los trabajadores. Adicionalmente, el componente ambiental realiza diariamente recomendaciones relacionadas con la adecuada clasificación de residuos sólidos y el orden y aseo.

Ilustración 1 Capacitación Ambiental UMV





Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicador:

Número de capacitaciones Ejecutadas x 100% 3 / 2 * 100 = 150 %
Número de Capacitaciones programadas

Número de personas capacitadas x 100% 41 / 98 * 100 = 41.83 %
Número de personas laborando

5.3 Cumplimiento de los requerimientos legales

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA.** "Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental". Para este período no se gestionaron licencias y/o permisos ambientales para el proyecto.

Cabe resaltar que, para la ejecución de la obra de acuerdo al tipo de intervención a realizar, se contempla conservar el ancho de vía existente, lo cual indica que no se requiere de aprovechamiento forestal, por ende, no se hace necesario tramitar permiso de aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR.

En cuanto a los proveedores de materiales cuentan con los permisos y licencias ambientales vigentes aplicables para esta actividad al igual que los sitios destinados para la disposición final de materiales generados en obra.

De igual manera para la disposición final de residuos peligrosos RESPEL, se realiza con gestores autorizados que cuentan con los permisos ambientales respectivos para este tipo de disposición final. En el periodo no se realizó disposición al respecto.

Respecto al proveedor de unidades sanitarias móviles, cuenta con permisos de vertimientos de residuos líquidos conforme la legislación ambiental aplicable.

Se cuenta con los permisos de ocupación de cause para las actividades de obra que así lo requieren los cuales fueron tramitados por la UMV ante la autoridad ambiental competente CAR y se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, a continuación, se presenta una relación de los 26 permisos.

Tabla 7 Permisos de ocupación de cauce otorgados por la CAR

Ítem	Tramo - Eje	Resolución DJUR No.	No obra	X	Y	Tipo de estructura
1	6	DJUR No. 50217000407	9	69832.2633	36041.6394	Alcantarilla
2	7	DJUR No. 50207101514	1	89036.9370	53545.9021	Alcantarilla
3	7	DJUR No. 50207101619	5	89626.2609	54058.6332	Alcantarilla
4	7	DJUR No. 50207101516	4	893.950.076	539.639.805	Alcantarilla
5	7	DJUR No. 50207101593	7	90157.8506	54548.8398	Alcantarilla
6	7	DJUR No. 50207101511	11	89121.4578	53145.7027	Alcantarilla
7	7	DJUR No. 50207101472	12	88969.1424	53639.6127	Alcantarilla
8	7	DJUR No. 50207101513	13	90060,359	54353.3766	Alcantarilla
9	7	DJUR No. 50207101510	1	89146.9021	53294.6516	Box Culvert
10	8	DJUR No. 50207101805	3	88437.0723	49357.8023	Alcantarilla
11	9	DJUR No. 50207101708	1	73975.3255	39031.5353	Alcantarilla
12	9	DJUR No. 50217000280	2	73878.5675	39095.0290	Alcantarilla
13	9	DJUR No. 50217000382	3	73789.2318	39088.8337	Alcantarilla
14	9	DJUR No. 50217000346	4	73620.8499	39054.7930	Alcantarilla

Ítem	Tramo - Eje	Resolución DJUR No.	No obra	X	Y	Tipo de estructura
15	9	DJUR No. 50217000300	14	72819.9388	39345.5892	Alcantarilla
16	9	DJUR No. 50217000400	28	72110.4257	41229.3950	Alcantarilla
17	9	DJUR No. 50217000405	30	72215.5387	41396.2893	Alcantarilla
18	9	DJUR No. 50217000404	31	72320.0143	41389.3555	Alcantarilla
19	9	DJUR No. 50217000301	50	73217.5781	43664.2644	Alcantarilla
20	9	DJUR No. 50217000282	51	73088.1471	43736.1109	Alcantarilla
21	9	DJUR No. 50217000291	52	72863.0448	43836.3417	Alcantarilla
22	9	DJUR No. 50217000290	54	72576.6176	43942.3628	Alcantarilla
23	9	DJUR No. 50217000285	57	72342.2990	44308.9482	Alcantarilla
24	9	DJUR No. 50217000284	60	72007.3719	44556.6936	Alcantarilla
25	9	DJUR No. 50217000292	62	72130.0204	44757.7796	Alcantarilla
26	9	DJUR No. 50217000318	1	72475.2651	44264.1579	Box Culvert

Fuente: UMV

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 8 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con los permisos de ocupación de cauce vigentes				
Los proveedores de materiales cuentan con las licencias ambientales y títulos mineros respectivos vigentes				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los sitios de disposición final de RCD cuentan con los permisos ambientales respectivos vigentes				
El proveedor de unidades sanitarias móviles, cuenta con permisos de vertimientos de residuos líquidos conforme la legislación ambiental aplicable.				
En el periodo del presente informe se realizaron requerimientos por parte de la autoridad ambiental competente.				

Indicadores:

Número de Permisos obtenidos / *100% = 26/26 * 100 = 100%
Número de permisos requeridos

N° requerimientos cumplidos/ x 100% = 0 / 0 * 100 = 0%
Total de Requerimientos generados por la autoridad ambiental

N° de fuentes de materiales utilizadas para el proyecto /* 100 = 1 / 1 * 100 = 100%
N°de fuentes con permisos ambientales al día

Es importante mencionar que respecto a los permisos de ocupación de cauce las resoluciones iniciales mencionan que se debe realizar un monitoreo de la calidad de las aguas de los puntos en intervención, 50 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo, de acuerdo a lo anterior se ha solicitado mediante comités de obra No 53, 54, 55, 56,57,58, esta actividad a la entidad ejecutora UMV de acuerdo a los cronogramas de intervención de las estructuras hidráulicas.

5.4 Manejo Integral de materiales de construcción

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de materiales de construcción en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 9 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios delimitados				
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Todos los vehículos de transporte de materiales cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.				
Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos de los proveedores autorizados.				

Fuente: Ecovias SAS

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"*Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra*".

Todos los materiales provienen de fuentes legales, es decir, que cuentan con permisos ambientales y/o mineros, aspecto que es verificado por la interventoría.

Durante el período se realizaron las siguientes actividades:

- Cubrimiento de materiales pétreos en el frente de obra Tunales, Capitolio y San Antonio, con el fin de evitar la dispersión de materiales y aumento de la concentración de material particulado en el área de influencia directa. Al respecto cabe mencionar que no todos los acopios RCD y pétreos se encuentran cubiertos, señalizados y demarcados. Algunos cumplen parcialmente con las medidas descritas en las fichas PAC-2.1-04 y PAC-2.4-07. Se evidencian jornadas de adecuación de acopios de manera semanal.
- Se verifico que los vehículos para el transporte de estos materiales cuentan con los documentos vigentes y realizan el cubrimiento de la carga al transportarla para evitar dispersión de materiales en las vías.

- Se evidencia que se mantienen las puertas de descarga de materiales herméticamente cerradas durante el trasporte.
- Se sugiere a la UMV que no se almacenen materiales cerca de cuerpos de agua o zonas verdes, según se describen en las fichas de manejo ambiental y permisos de ocupación de cauce POC. En el periodo se solicitó mantiene contención en polisombra para algunos acopios (Tunales, Capitolio y San Antonio) y evitar aporte de materiales a cauces o zonas verdes.
- En el periodo se envió comunicado 186-1-790; 186-1-791 y 186-1-808 cuyo asunto fue observaciones al componente ambiental para todos los frentes, donde se describen las condiciones de los acopios y se solicita adecuarlos.
- En bitácora del componente se encuentran las anotaciones realizadas al respecto.

A continuación, se relacionan los proveedores de materiales en el periodo con las respectivas cantidades:

Tabla 10 Relación de Proveedores y cantidades UMV

CONSOLIDADO DE MATERIAL USADO EN OBRA						
ITEM	**RAZON SOCIAL**	**CATEGORIA**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
may-25						
1	CANTERA MONTEOLIVOJULIA GOMEZ INVERSIONES Y EXPLOTACIONES MERKAKI SAS.	**Agregados petreos**	PE-BGB-SA-SGR BASE GRANULAR CLASE B (BG-B).	285	469,922	RESOLUCION DGEN No 20237000215 CAR de 30/03/2023. CONTRATO DE CONCESION MINERA EXP GKA-081 hasta 05/05/2039
2	AGREGADOS GUAYURIBA SAS	**Agregados petreos**	BASE TIPO B	696,36	1148,193	RESOLUCION NoPS-GJ.1.2.6.11.1224 CORMACARENA 17/08/2011. REGISTRO MINERO CONTRATO DE CONCESIÓN L685 HA6-111 A.N.M HASTA 27/12/2039.
			RAJON	107,71	177,598	
3	UMV MISIONALIDAD	**Agregados petreos**	FRESADO	326,75	538,762	MATERIAL SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA
			MBR	614,29	1012,872	
			RETAL DE CONCRETO	0	0,000	
TOTAL				**2030,11**	**2877,425**	
jun-25						
1	CANTERA MONTEOLIVOJULIA GOMEZ INVERSIONES Y EXPLOTACIONES MERKAKI SAS.	**Agregados petreos**	PE-BGB-SA-SGR BASE GRANULAR CLASE B (BG-B).	pendiente	#¡VALOR!	RESOLUCION DGEN No 20237000215 CAR de 30/03/2023. CONTRATO DE CONCESION MINERA EXP GKA-081 hasta 05/05/2039
2	AGREGADOS GUAYURIBA SAS	**Agregados petreos**	BASE TIPO B	652,18	1075,347	RESOLUCION NoPS-GJ.1.2.6.11.1224 CORMACARENA 17/08/2011. REGISTRO MINERO CONTRATO DE CONCESIÓN L685 HA6-111 A.N.M HASTA 27/12/2039.
			RAJON	63,94	105,427	
3	UMV MISIONALIDAD	**Agregados petreos**	FRESADO	344,59	568,177	MATERIAL SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA
			MBR	263,09	433,796	
			RETAL DE CONCRETO	35,16	57,974	
TOTAL				**1358,96**	**2240,721**	
jul-25						
1		**Agregados petreos**	Según lo reportado por la UMV, para este periodo no hubo ingreso de materiales pétreos debido a que el contrato de materiales en el momento se está adjudicando			
3	UMV MISIONALIDAD	**Agregados petreos**	FRESADO			MATERIAL SUMINISTRADO POR LA UMV. No se reportan cantidades puesto que la UMV no ha consolidado la informacion
			MBR			
			RETAL DE CONCRETO			
TOTAL				**0**	**0,000**	
ago-25						
1		**Agregados petreos**	Según lo reportado por la UMV, para este periodo no hubo ingreso de materiales pétreos debido a que el contrato de materiales en el momento se está adjudicando			
3	UMV MISIONALIDAD	**Agregados petreos**	FRESADO			MATERIAL SUMINISTRADO POR LA UMV. No se reportan cantidades puesto que la UMV no ha consolidado la informacion
			MBR			
			RETAL DE CONCRETO			
TOTAL				**0**	**0,000**	
Nota: El valor en toneladas que se relaciona se toma del cuadro de conversion de la SDA						
	PENDIENTE POR CERTIFICADO					

Fuente: Informe UMV

Nota: debido a que la entidad ejecutora UMV no ha realizado la consolidación de materiales empleados y no se cuenta con el certificado respectivo el reporte de estas cantidades se realizará mes vencido, de igual manera en el informe entregado de agosto, no se encuentran cantidades de julio, lo cual fue solicitado a la UMV.

Indicador:

N de proveedores que cumplan la normatividad / No. de proveedores empleados x100% 0 / 0 *100= 100 %

En el momento se está adjudicando el contrato de materiales pétreos para el proyecto.

No. De requerimientos atendidos x100% No requerimientos reportados por la interventoría 1 / 1*100 = 100 %

Volumen material certificado x100% Volumen material usado en el mes 642.54 / 1358.96 *100 = 47.30 %

Nota: No se cuenta con información suministrada por la UMV para el cálculo de este indicador para el mes de agosto 2025, sin embargo, se presenta el indicador con las cantidades reportadas en el mes de junio de 2025, que es el último mes del cual se cuenta con información.

Ilustración 2 Manejo de materiales de Construction Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 3 Manejo de materiales de Construction Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 4 Manejo de materiales de Construction San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

5.5 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la implementación de señalización en los frentes de trabajo y en el campamento de obra**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 11 Verificación cumplimiento ficha de señalización UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con el respectivo PMT aprobado e implementado				
Los frentes de trabajo cuentan con la señalización preventiva, informativa y de emergencia correspondiente y en buen estado.				
Los elementos de atención de emergencia y control de derrame se encuentran señalizados				
Los acopios de materiales se encuentran señalizados				
Se cuenta con las vallas informativas en obra				

Fuente: Ecovias SAS

A la fecha por parte del contratista de obra se cuenta con la instalación de un campamento de obra adecuado, por lo que se ha implementado a la fecha la señalización preventiva, informativa y de emergencia necesaria; se contempla un plan de manejo de tránsito típico con un total de 8 señales por frente de obra.

Durante las jornadas de inspección y seguimiento realizadas en el mes de agosto de 2025 por parte del componente Ambiental de la interventoría se pudo evidenciar la señalización que se mantiene instalada hasta la fecha y se tomó el respectivo registro fotográfico, el cual es presentado a continuación:

Ilustración 5 Señalización campamentos UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 6 Señalización emergencia en frente de obra UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- ✓ **PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**

La entidad ejecutora cuenta con la aprobación de los Planes de Manejo de Tránsito para la ejecución de las actividades de obra, de acuerdo con los seguimientos realizados, se evidenció que cuentan con señalización vertical móvil instalada en cada uno de los frentes activos la cual costa de 8 señales (señales de via cerrada a 200 mts y 100mts, banderero, 30, barricada y 2 auxiliares de tráfico) los auxiliares cuentan con los elementos necesarios en cuanto a dotación y EPP además radios de comunicación y chalecos reflectivos.

Ilustración 7 PMT implementado Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 8 PMT implementado Capitolio UMV




Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 9 PMT implementado San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Imagen 3 Plano de PMT aprobado UMV

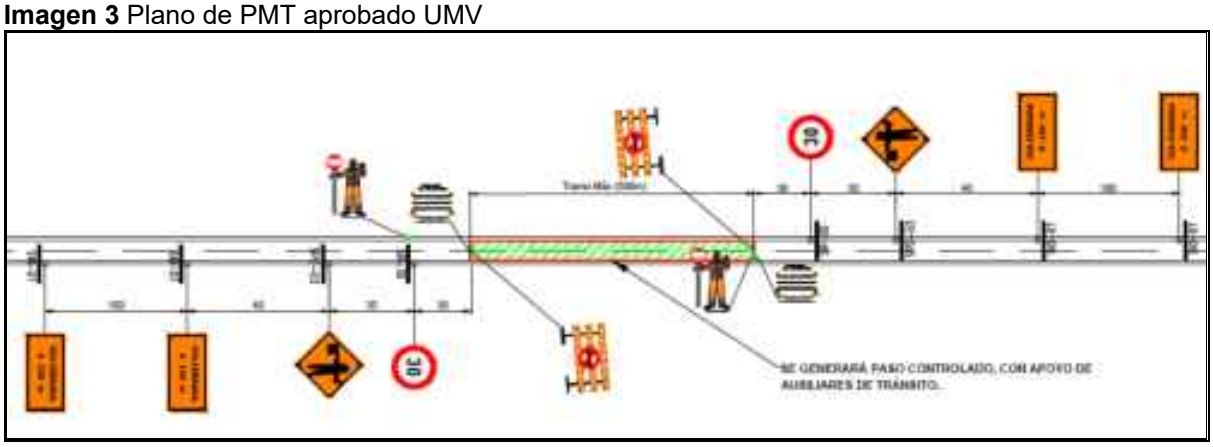

Fuente: Ecovias

Indicador:

No de Frentes de obra señalizados adecuadamente x100 = 3 / 3 * 100 = 100 %
No total de Frentes de obra

No de Señales instaladas x100% = 24 / 24 * 100 = 100 %
No de Señales requeridas en el PMT

5.6 Manejo y disposición final de escombros y RCD

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición de residuos de construcción y demolición RCD en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 12 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios RCD delimitados				
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Los RCD se evacuan hacia sitio de disposición en el tiempo indicado en el PAGA				
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los sitios de disposición cuentan con permisos ambientales vigentes				
Se cuenta con todos los certificados disposición de residuos de construcción y demolición RCD				

Fuente: Ecovias SAS

A continuación, se hace una descripción del manejo y disposición final de los escombros realizado por la UAERMV y se presenta como soporte el registro fotográfico levantado en el mes de agosto de 2025 por esta interventoría en las actividades de seguimiento de los diferentes componentes.

Para la disposición de RCD se emplea un sitio de disposición final que cuenta con los debidos permisos ambientales vigentes, quien emite el certificado respectivo por las cantidades

gestionadas en este sitio. La UAERMV lleva un registro de las cantidades generadas y dispuestas en el periodo, sin embargo, este consolidado no fue presentado en la primera versión entregada a la interventoría por lo cual se procedió a realizar dicha solicitud. Al respecto es importante mencionar que se cuenta con el certificado de disposición de RCD del mes de abril, en cuanto a los de los meses de mayo, junio y julio no han sido presentados.

Para el periodo del presente informe el contratista de obra continuó la remoción del material de excavación proveniente de los sitios de intervención, mediante excavadoras, transportando el material retirado hasta los acopios temporales y posteriormente al sitio de disposición final. Durante la verificación realizada por la interventoría se evidencia que los vehículos empleados para el transporte son los aprobados, cuentan con los documentos vigentes completos y durante el procedimiento de transporte al salir del frente de obra cubren los volcos de las volquetas para evitar la dispersión de los materiales transportados y posibles regueros en las vías circundantes. Al respecto se realizaron observaciones al componente ambiental para realizar seguimiento al cumplimiento de esta medida. De igual manera se solicitó mejorar los acopios en cuanto a cubrimiento, señalización y delimitación, además de solicitar retiro de materiales hacia sitio de disposición final de lo cual se tiene evidencia mediante comités de obra desarrollados y anotaciones en bitácora del componente ambiental. De igual manera se solicitó en comités de obra el retiro hacia sitio de disposición final autorizado los RCD acopiados en los frentes de obra y que superan el tiempo máximo permitido. En el periodo se envió comunicados 186-1-790; 186-1-791 y 186-1-808 cuyo asunto fue observaciones al componente ambiental para todos los frentes, donde se describen las condiciones de los acopios y se solicita adecuarlos.

En cumplimiento de la Resolución 1257 de 2021, la entidad ejecutora remitió los soportes (certificados) de disposición final de RCD; el residuo producto de la excavación es entregado a la empresa máquinas amarillas identificado con NIT 900.459.311-1, la cual cuenta con autorización ambiental; durante el período se realizó disposición de material al sitio autorizado, en un volumen de 882 m3 que fueron llevados al lugar de disposición final. El número de PIN asignado para la obra es 22183.

A continuación, se presenta la relación de material dispuesto en el periodo.

Tabla 13. Relación de material RCD evacuado UMV

CONSOLIDADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION					
ITEM	**SITIO DE DISPOSICION**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	Excavacion	168	227,18	Resolución número 1480 de 2014 ANLA. Resolucion 228 de 2016 ANLA
2	GENERADO EN EL PERIODO	Excavacion	350	577,098	Pendiente por evacuar. 350-168= 182 m3
may-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	Excavacion	490	807,937	Resolución número 1480 de 2014 ANLA. Resolucion 228 de 2016 ANLA
2	GENERADO EN EL PERIODO	Excavacion	706,44	1164,814	Pendiente por evacuar. 706-490= 216 m3
TOTAL			706,44	1164,814	
jun-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	Excavacion	658	1084,943	Resolución número 1480 de 2014 ANLA. Resolucion 228 de 2016 ANLA
2	GENERADO EN EL PERIODO	Excavacion	766,28	1263,481	Pendiente por evacuar. 766-658= 108,28 m3
TOTAL			490	807,937	
jul-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	Excavacion	406	669,433	Resolución número 1480 de 2014 ANLA. Resolucion 228 de 2016 ANLA
2	GENERADO EN EL PERIODO	Excavacion	599,28	988,123	Pendiente por evacuar. 599,28-406= 193,28 m3
TOTAL			406	669,433	
ago-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	Excavacion	882	1454,286	Resolución número 1480 de 2014 ANLA. Resolucion 228 de 2016 ANLA
2	GENERADO EN EL PERIODO	Excavacion	419,49	691,676	retiro total del generado en el periodo
TOTAL			882	1454,286	
Nota: El valor en toneladas que se relaciona es el que aparece en el certificado de el sitio de disposicion final y el otro se toma del cuadro de conversion de la SDA					
	PENDIENTE POR CERTIFICADO				

Fuente: Ecovias SAS /Informe UMV

NOTA: de acuerdo a la tabla anterior en el periodo se dispusieron 882 m3 en máquinas amarillas.

Indicador:

$$\%\ Disposicion\ de\ RCD = \frac{\text{M3 } de\ RCD\ dispuestos\ durante\ el\ periodo \times 100}{\text{M3 } de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo}$$

$$\frac{882}{419.49} \times 100\% = 210.25\%$$

$$\%\ Disposición\ de\ RCD = \frac{\text{M3 } de\ RCD \text{ aprovechado } el\ periodo \times 100}{\text{M3 } de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo}$$

$$0 / 419.49 \times 100\% = 0\%$$

Requerimientos respondidos/ *100 = 1 / 0 * 100 = 0 %
requerimientos emitidos por autoridades, Interventoría y entidad contratante)

Ilustración 10 Acopios de RCD San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 11 Acopios de RCD Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 12 Acopios de RCD Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

5.7 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición final de residuos sólidos, convencionales, especiales y peligrosos**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que se cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 14 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con puntos ecológicos en sitio y en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO no aprovechables.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO aprovechables.				
Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición final de los RESPEL gestionados en el presente mes.				

Fuente: Ecovias

Desde la interventoría se realiza un seguimiento específico a la gestión ambiental realizada por parte de la entidad ejecutora de obra, abarcando de esta manera el manejo de residuos sólidos no aprovechables, aprovechables y de residuos peligrosos durante el periodo que correspondiente a cada uno de los informes mensuales.

Es importante mencionar que durante el presente periodo por parte de la interventoría se realiza una revisión y/o seguimiento de la generación de residuos (aprovechables, no aprovechables, peligrosos) a través de la verificación del formato de registro diligenciado por la entidad ejecutora y de la jornada de inspección y seguimiento ejecutada en el mes de agosto de 2025.

- **Residuos sólidos Convencionales**

Durante el periodo del presente informe por parte de la entidad ejecutora de obra se informa que se generaron residuos ordinarios ya que se cuenta a la fecha con tres campamentos de obra, los cuales fueron dispuestos y recolectados por el prestador de servicio de aseo de la localidad del Sumapaz (Empresa de Servicios Públicos PROMOAMBIENTAL – E.S.P), servicio de recolección prestado los días miércoles.

Por parte de Interventoría, con el fin de realizar un seguimiento a la generación de residuos se solicitó a la entidad ejecutora la planilla de generación de residuos en el presente mes el cual se encuentra adjunto en el informe respectivo.

- ✓ **Puntos Ecológicos**

Durante los recorridos del presente mes realizados por parte de Interventoría se identificó que los puntos ecológicos instalados en los campamentos se encontraran en condiciones adecuadas, como se puede evidenciar a continuación:

Ilustración 13 Puntos ecológicos San Antonio / Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- **Residuos peligrosos**

Durante el periodo del presente informe se generaron Residuos Peligrosos - RESPEL los cuales fueron almacenados temporalmente para su disposición final. Se presenta la planilla de generación de residuos peligrosos**,** diligenciada por el contratista de obra donde reporta la cantidad de residuos peligrosos generados en el mes de agosto de 2025.

Es importante mencionar que las empresas encargadas de realizar la gestión de los Residuos Peligrosos generados en el frente de trabajo cuentan con los documentos ambientales vigentes, para el periodo la UMV no entrego ningún volumen para certificar.

- ✓ **Centro de acopio temporal de residuos peligrosos - respel**

Durante las jornadas de inspección se verificó la instalación y mantenimiento del centro de acopio temporal de Residuos Peligrosos y combustibles y de la zona en la que se establecieron estibas plásticas y las canecas para abastecimiento de combustible los cuales se encontraban en buenas condiciones, en sitio se verifico la permanencia de las hojas de seguridad de los productos químicos y los rótulos según el SGA.

A continuación, se presenta el registro fotográfico del centro de acopio temporal de Residuos Peligrosos – RESPEL / combustibles.

Ilustración 14 Centro de acopio temporal de Respel San Antonio/ Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- **Reporte de Residuos Generados**

En la siguiente tabla a modo de seguimiento se presenta el tipo y la cantidad de residuos generados por la UAERMV de obra durante el mes de agosto de 2025. El reporte de los residuos generados es reportado y verificado durante este mes específicamente a través de las planillas de generación de residuos diligenciadas a manera de control por parte de la entidad ejecutora.

Tabla 15 Reporte de residuos generados UMV

CONSOLIDADO RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS					
PERIODO Mes/Año	**Tipo Residuo/ Cantidad / Unidad de medida**				
	Aprovechables (kg)	**No Aprovechables (Kg)**	**Orgánicos (kg)**	**RESPEL (Kg)**	**TOTAL**
Abril/2025	48	53,3	0	17	118,33
Mayo/2025	45,5	59,9	0	12,3	117,7
Junio/2025	34,3	55,5	0	6,40	96.2
Julio/2025	29	49.9	0	6	84.9
Agosto/2025	17,4	30,2	0	0	47,6

CONSOLIDADO RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS					
PERIODO Mes/Año	**Tipo Residuo/ Cantidad / Unidad de medida**				
	Aprovechables (kg)	**No Aprovechables (Kg)**	**Orgánicos (kg)**	**RESPEL (Kg)**	**TOTAL**
TOTAL	**174,2**	**248,8**	**0**	**43,5**	**465,73**

*Como residuos peligrosos en esta tabla se presenta la cantidad de elementos contaminados por RESPEL

Fuente: Ecovias

Con respecto a los respel durante el periodo se generaron 6 Kg de recipientes contaminados, los cuales también se mantienen almacenados hasta que se cuente con una cantidad suficiente para su recolección.

Volumen de residuos aprovechables x 100 = 17,4 / 47,6 * 100 =36,55 %
Volumen total de residuos generados

Volumen de residuos No aprovechables x 100 = 30,2 / 47,6 * 100 =63,44 %
Volumen total de residuos generados

Volumen de residuos peligrosos certificados x 100% = 0 / 47,6 * 100 = 0 %
Volumen total de residuos peligrosos generados

5.8 Manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales

Durante el periodo de ejecución de actividades, no se realizaron actividades de obra que afecten taludes.

Indicador:

N.º de derrumbes presentados para el periodo / x100% = 0 / 0 * 100 = 0%
Total, de derrumbes que requieren intervención.

5.9 Control de emisiones atmosféricas

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el control de emisiones atmosféricas. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 16 Cumplimiento general medida de manejo UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Los vehículos respetan los límites de velocidad para la circulación en los frentes de obra				
Para el presente mes se realizó humectación de via, se presenta la certificación del agua suministrada por proveedor autorizado,				

Durante el periodo la interventoría procedió a realizar seguimiento al cubrimiento de materiales pétreos empleados en los frentes de obra, con el fin de evitar al aumento de material particulado en el área de influencia de la obra. Para el control/prevención de dispersión de material particulado, para el periodo no se realizó humectaciones en diferentes tramos de las vías, debido a las constantes precipitaciones registradas en la zona, lo que ha contribuido a la disminución del material particulado generado por el tránsito de vehículos aledaños.

Igualmente, se verifica que los puntos de acopio de materiales pétreos se mantengan separados, cubiertos con plásticos, debidamente demarcados y señalizados, cumpliendo con lo establecido en la ficha PAC 2.1.04, con el propósito de prevenir afectaciones a los ecosistemas cercanos y a la población flotante del sector. Cabe mencionar al respecto que se solicitó adecuación de acopios con el fin de que permanezcan cubiertos.

La interventoría sugiere a la UAERMV que cuando circulen vehículos por las áreas de influencia indirecta de construcción, se deberá realizar a velocidades moderadas para que no se levanten en exceso partículas de polvo, de igual manera realizar los mantenimientos periódicos requeridos del equipo empleado en obra.

Se verifico que los vehículos cuentan con los certificados de revisión técnico mecánica vigente. Se evidencio que los vehículos destinados al transporte de materiales cuentan con carpas con el fin de evitar emisión de partículas por acción del viento. Es importante mencionar que no todos los acopios se encuentran cubiertos, lo cual fue comunicado a la entidad ejecutora quien

genero acciones para subsanar dichas observaciones en todos los frentes de obra, realizando jordanas de mantenimiento de acopios de manera semanal.

De igual manera se implementan las acciones respectivas en cuanto al manejo ambiental del ruido.

Indicador:

No de frentes humectados x100% = 3 / 3 * 100 = 100 %
No de frentes de obra

Volumen de agua utilizada al mes para humectación de vía = 0 M3
Volumen de agua utilizada al mes para actividades constructivas = 15 M3

N acopio de material adecuadamente cubiertos / x 100% = 13 / 15 * 100 = 86,66%
Total de puntos de acopio de material

Ilustración 15 cubrimiento de materiales San Antonio / Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

5.10 Manejo de aguas superficiales

De acuerdo al desarrollo de las obras fue necesario tramitar ante la autoridad ambiental los permisos de ocupación de cauce que se relacionan a continuación, los cuales fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2025 como último plazo otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante **AUTO DRBC No. 01256000051 de 6 FEB. 2025** y según lo estipulado en la misma Resolución, no se contemplan nuevas ampliaciones.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de aguas superficiales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que la entidad ejecutora de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 17 Cumplimiento general medida de manejo UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención.				
Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.				
Se cuenta en obra con punto de lavado de manos.				
Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra por parte de proveedor autorizado.				

Fuente: Ecovias SAS

Durante el período no se generaron afectaciones por actividades constructivas a los cuerpos de agua presentes en la zona de influencia del proyecto.

En los recorridos realizados por Interventoría, se evidenció que el lavado de manos se realiza en la zona de baños portátiles donde se encuentra gel antibacterial en cada una de las unidades sanitarias.

En el seguimiento realizado por la interventoría en el periodo a la UAERMV se evidencio el cumplimiento de las medidas de manejo indicadas en la ficha como es, disposición final adecuada de RCD en sitios autorizados, acopio temporal de los mismos cumpliendo con las distancias establecidas en el PAGA para cuerpos de agua, quebradas,etc., sin embargo, debido a las condiciones particulares del área de intervención (zona rural de paramo) no es posible cumplir estrictamente con la distancia mínima de 30 metros establecida por la normatividad ambiental vigente. Por lo tanto, se han implementado medidas de manejo y control para minimizar el riesgo de afectación a las fuentes hídricas como es el aislamiento de las alcantarillas por medo de polisombra, contención con polisombra en acopios para evitar caída de material en los cauces, respecto al lavado y mantenimiento de equipos se realiza en lugares adecuados para tal fin.

Por otro lado, durante el mes de agosto, se ha realizado la limpieza de algunas alcantarillas en el frente de obra capitolio y san Antonio, de parte de interventoría se ha solicitado manejo de aguas para evitar el aporte de sedimentos y materiales pétreos que por escorrentía son arrastrados hacia las alcantarillas con el fin de prevenir la colmatación de las mismas. Se evidencia polisombras desgastadas las cuales se solicitó realizar ajustes y cambios, actividad que ha iniciado la entidad ejecutora.

Ilustración 16 manejo aguas superficiales Tunales/Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicador:

No de requerimientos cumplidos / x 100% = 0 / 0 * 100 = 0 %
No de requerimientos establecidos por la interventoría

N de monitoreos ejecutados x100% = 0 / 0 * 100 = 0 %
N monitoreos programados

No se han realizado monitoreos

5.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que la entidad ejecutora cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 18 Cumplimiento general medida de manejo UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.				
Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.				
Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.				
Se realizan los mantenimientos de manera semanal los requeridos				
Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.				

Fuente: Ecovias

Como parte del cumplimiento a la Resolución 2400 de 1979, se tiene instalado en cada frente de obra unidades sanitarias portátiles (USP) para uso del personal en campo, distribuidas por género, al respecto la UMV cumple con la distribución de estas USP en cantidad por frente, se evidencia realización de mantenimientos una vez por semana, es necesario mencionar que en el periodo en dos oportunidades el proveedor no asistió a realizar la limpieza respectiva. Se solicito a la entidad el cumplimiento con la frecuencia de mantenimientos descritos en el artículo 17 de la resolución 2400 de 1979, el cual establece que debe realizarse dos veces por semana.

Se realizó una revisión de las unidades sanitarias ubicadas en los campamentos de obra a continuación se menciona lo encontrado durante estas inspecciones.

El contratista cuenta con unidades sanitarias portátiles en el campamento de obra.

Las unidades sanitarias son del proveedor Bamocol. Por parte de la interventoría se solicitó la documentación de la empresa proveedora y dicha documentación fue entregada en el informe de mayo de 2025.

La entidad ejecutora cuenta con 8 unidades sanitarias, distribuidas de la siguiente forma:

- 2 baños en el frente de obra tunales
- 2 baños en el frente de obra San Antonio – Toldo
- 2 baños en el frente de obra San Antonio
- 2 baños en el frente de obra Capitolio

Por parte de Interventoría a modo de seguimiento y control para la disposición final de los lodos generados en el campamento de obra se realiza la verificación del certificado entregado por la empresa Bamocol a la UMV, en el que se soporte que se realizó la disposición final a cada una de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP instaladas a la fecha en el frente de trabajo. En cuanto a este certificado aún no ha sido aportado por parte de la UMV, para el periodo se adjunta el correo soporte donde se solicita el certificado respectivo en el informe de la entidad ejecutora.

Al respecto en las jornadas de verificación se identificó que en el periodo el proveedor realizó mantenimiento a dichas unidades sanitarias de manera semanal, cabe mencionar que no asistió durante dos semanas, por lo cual se realizó la solicitud a la entidad ejecutora para que garantizara dichos mantenimientos.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las unidades sanitarias portátiles instaladas en obra.

Ilustración 17 Unidades Sanitarias Capitolio / Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 18 Unidades Sanitarias San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- ✓ **KIT DE CONTROL DE DERRAMES**

Durante la jornada de inspección ejecutada en agosto de 2025 se realizó la verificación al kit de derrames presente en el frente de trabajo específicamente en el sitio de acopio temporal de RESPEL ubicado en las carpas móviles de Capitolio, San Antonio y Unión Tunales, evidenciando que este se encuentra en sitio y en condiciones adecuadas.

Ilustración 19 Kit atención derrames San Antonio / Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicador:
N total de baños reportados en obra x100% 8 / 8 * 100 = 100 %
N de Baños requeridos

Volumen de la disposición de los lodos de los baños portátiles certificados = 13.200 lts para el mes de julio de 2025. Respecto a la información de agosto no se cuenta con la cantidad.

N° de mantenimientos realizados x 100% 2 / 8 * 100 = 25 %
N° de mantenimientos programados

5.12 Protección de ecosistemas sensibles

Según la caracterización ambiental del área del proyecto no se ve afectado ningún ecosistema sensible, sin embargo, por su cercanía a la zona del páramo de Sumapaz y el paso por áreas consideradas sensibles como son cuerpos de agua, se realizan actividades que conlleven a la minimización, control y mitigación de posibles impactos por las actividades del proyecto, lo cual es verificado por la interventoría. En las inducciones al personal se socializa que se encuentra prohibido que los trabajadores extraigan de estos ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales.

Indicador:
No. áreas sensibles protegidas x100% 0 / 0 * 100 = 0 %
No total de áreas sensibles identificadas

5.13 Protección de fauna en obra

Una de las medidas de manejo implementadas por la UAERMV para este componente es la sensibilización a los trabajadores lo cual se realiza inicialmente en el proceso de inducción y capacitaciones programadas de manera periódica. De igual manera se implementa en obra para conductores de vehículos respetar los límites de velocidad para disminuir el riesgo de atropellamiento de fauna silvestre. Se socializa que está completamente prohibido la caza o comercialización de especies.

Para el periodo se procedió a realizar la siguiente capacitación con el personal. "*Leyes y normatividad sobre protección de fauna y flora*", con un enfoque específico en la conservación de la flora silvestre presente en las zonas aledañas a los frentes de obra.

Indicador:

N° de capacitaciones programadas x 100% 1 / 1 * 100 = 100 %
N° Capacitaciones ejecutadas

5.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para las actividades de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de instalaciones temporales y sitios de acopio. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que la entidad ejecutora de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 19 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.				
Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal, ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).			8 baños	
El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias.				
El campamento cuenta con punto ecológico.				
El campamento se encuentra en condiciones adecuadas de aseo y orden.				
El campamento cuenta con señalización respectiva				

Fuente: Ecovias

La entidad ejecutora en obra cuenta con un campamento de obra en cada uno de los frentes de trabajo (Unión-tunales, Capitolio, San Antonio Toldo y San Antonio) el cual consta de una carpa móvil en la zona cercana a las áreas de intervención, adecuados con los elementos necesarios para la atención de emergencias y elementos para los trabajadores. Durante las jornadas de seguimiento e inspección realizadas por la interventoría en el mes de agosto de 2025, se realizó una verificación de los aspectos del área ambiental en cada uno de los campamentos.

Es importante mencionar que durante el recorrido por los campamentos se pudo evidenciar que cuenta con: punto ecológico, kit de emergencia, kit de derrames, unidades sanitarias en buenas condiciones y en sitio, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico.

Ilustración 20 Campamentos Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 21 Campamentos Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 22 Campamentos San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

De acuerdo a las inspecciones de campo, se tienen instalados tres campamentos temporales móviles tipo carpa, los cuales de acuerdo a las necesidades y avances de actividades constructivas van cambiando de ubicación. A continuación, se presenta una relación de los campamentos y acopios por frente de obra.

Tabla 20 Ubicación de acopios Tunales

ACOPIOS UNION TUNALES						
ITEM	**TIPO DE MATERIAL**	**ABSCISA**	**REQUIERE PERMISO**		**NOMBRE DEL PROPIETARIO**	**ESTADO**
			SI	**NO**		
1	Pétreos	K2+623	x		Arnidia Runza	Activo
2	RCD	K2+623	x		Arnidia Runza	Activo
3	Pétreos	K0+470	x		Yesid Susa	Activo
4	Pétreos	K0+760	x		Pablo Melo	Activo
5	Pétreos	K1+615	x		JAC	Activo
6	Pétreos	K0+470		x	Via	Activo
7	RCD	K0+590	x		Abiesnei Pineda	Activo
8	Pétreos	K1+130	x		Evangelino Mora	Activo
9	Pétreos	La Unión	x		Milena Susa	Activo

Fuente: Ecovias / Informe UMV

Tabla 21 Ubicación acopios San Antonio-Toldo

ACOPIOS SAN ANTONIO TOLDO						
ITEM	TIPO DE MATERIAL	ABSCISA	REQUIERE PERMISO		NOMBRE DEL PROPIETARIO	ESTADO
			SI	NO		
1	RCD	k0+690	x		Audel Tautiva	Activo
2	Pétreos	k2+620	x		Albino Torres	Activo
3	Pétreos-Campamento	k3+100	x		Luis Bustos	Activo
4	Pétreos	k3+890	x		Luis Bustos	Activo
5	Pétreos	k4+200	x		Nidia Hernández	Activo
6	RCD y pétreo	K 0+700		x	Via	Activo
7	Pétreos	K 1+060		x	Via	Activo
8	RCD y pétreo	K 1+270		x	Via	Activo
9	RCD y pétreo	K 1+350		x	Via	Activo
10	RCD	K 1+370		x	Via	Activo
11	RCD y pétreo	K 1+700		x	Via	Activo
12	RCD	K 2+290		x	Via	Activo
13	RCD	K 2+400		x	Via	Activo
14	RCD	K 2+600		x	Via	Activo
15	RCD y pétreo	K 2+700		x	Via	Activo
16	RCD	K 2+800		x	Via	Activo
17	RCD	K 2+850		x	Via	Activo
18	RCD	K 2+900		x	Via	Activo
19	RCD y pétreo	K 3+100		x	Via	Activo
20	RCD	K 3+120		x	Via	Activo
21	RCD	K 3+220		x	Via	Activo
22	RCD	K 5+240		x	Via	Activo
23	Pétreos	K 6+910		x	Via	Activo
24	RCD	K 9+100		x	Via	Activo

Fuente: Ecovias / Informe UMV

Tabla 22 Ubicación acopios Capitolio

ACOPIOS CAPITOLIO						
ITEM	TIPO DE MATERIAL	ABSCISA	REQUIERE PERMISO		NOMBRE DEL PROPIETARIO	ESTADO
			SI	NO		
1	Pétreos	k1+525	x		Emiro Poveda	Activo
2	Pétreos	k2+150	x		Jhon Peñaloza	Activo
3	Pétreos	k3+420	x		Gustavo Castaño	Activo
4	Campamento	k3+310	x		Adelmo Mora	Activo
5	RCD	k3+450	x		Gustavo Castaño	Activo
6	Pétreos	k3+610	x		Sadi Melo	Activo

Fuente: Ecovias / Informe UMV

Indicadores:

No. Campamentos manejados x 100% 3 / 3 * 100 =100 %
No. Campamentos establecidos

No actividades ejecutadas x 100% 15 / 15 * 100 =100 %
No de actividades programadas

No de requerimientos atendidos x 100% 2 / 2 * 100 =100 %
No total de requerimientos realizados por la interventoría

5.15 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo

Dentro de la revisión que realiza el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 23 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo UMV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con Plan de Manejo de Tránsito.				
Cuenta con el diligenciamiento de las fichas pre – operacionales de cada uno de los equipos.				
Cuenta con Stiker de identificación				
Se cuenta con certificado de revisión tecnicomecanica de los vehículos según aplique.				
No se evidencia lavado de vehículos en cuerpos de agua.				

Fuente: Ecovias

Dentro del informe de seguridad y salud en el trabajo se encuentran los soportes de los preoperacionales de los equipos empleados y activos en campo.

✓ RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Durante el presente periodo por parte del componente ambiental de la interventoría se hace la respectiva revisión de algunos de los preoperacionales de los vehículos y maquinaria presentes en obra.

Para el periodo de agosto se evidenciaron tres (3) derrames por parte de los contratistas de la maquinaria generalmente por el uso inadecuado del combustible para el abastecimiento de la maquinaria en el frente Tunales y San Antonio, lo cual fue informado a la profesional ambiental de la UMV con el fin de tomar las medidas correctivas necesarias, en cada uno de los tramos intervenidos se cuenta con áreas para el almacenamiento temporal de combustibles, canecas rotuladas, hojas de seguridad de los productos químicos y estibas plásticas. Para el periodo se mantienen con estibas plásticas y hojas de seguridad de productos químicos en puntos de acopio de sustancias en los frentes de obra. De igual manera en el periodo se envió comunicado 186-1-790 y 186-1-808 cuyo asunto fue respuesta a los comunicados recibidos por la entidad ejecutara con relación al llamado de atención; respecto al contratista de maquinaria para que implemente las medidas requeridas en cuanto al procedimiento de tanqueo de equipos en obra y evitar derrames de combustibles.

Se identificó que, en el presente periodo, la entidad ejecutora cuenta con los equipos presentes en campo los cuales se listan a continuación:

Tabla 24 Relación de vehículos UMV

EQUIPO	MARCA	PLACA	MODELO	PIN	VENCIMIENTO TECNICOMECANICA
VEHICULOS					
CAMIONETA	FORD	JOU555	2020	N/A	13/05/2025
CAMIONETA	RENAULT	LUW609	2023	N/A	29/04/2026
CAMIONETA	RENAULT	JTQ144	2021	N/A	20/02/2026
CAMIONETA	RENAULT	LZM113	2023	N/A	29/04/2026
CAMIONETA	SANGYONG	GET696	2019	N/A	15/05/2026
CAMIONETA	FORD	FVK271	2019	N/A	31/03/2026
CARROTANQUE	CHEVROLET	XCV275	2018	N/A	13/11/2025
VOLQUETA SENCILLA	FOTON	EQP440	2019	N/A	15/11/2025
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	LIS842	2023	22230	N/A

EQUIPO	MARCA	PLACA	MODELO	PIN	VENCIMIENTO TECNICOMECANICA
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	LIS843	2023	22229	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	LIS844	2023	22228	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	LIS845	2023	22227	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	LIS846	2023	22226	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	JQV208	2022	22222	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	JQV209	2022	22223	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	JQV210	2022	22224	N/A
VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	JQV211	2022	22225	N/A

Fuente: Ecovias SAS

Nota: Se aclara que, de las 9 volquetas reportadas, no todas trabajaron en el periodo por estar en mantenimiento.

Tabla 25 Relación de maquinaria UMV

MAQUINARIA		
No.	**EQUIPO**	**MARCA/REFERENCIA**
UNION TUNALES		
1	MOTONIVELADORA	KOMATSU
2	VIBROCOMPACTADOR 8 TON	DYNAPAC
3	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 4 TN	HAMM
4	VIBROCOMPACTADOR GRANULARES 8 TN	DYNAPAC
5	RETROCARGADOR	JHON DEERE
6	MINICARGADOR (CON MARTILLO)	BOB CAT
7	MINICARGADOR (CON MARTILLO)	BOB CAT
8	CARROTANQUE AGUA	CHEVROLET
9	VOLQUETA SENCILLA	FOTON
CAPITOLIO		
1	MOTONIVELADORA	RHINO
2	VIBROCOMPACTADOR 8 TON	BOMAG
3	RETROCARGADOR	CATERPILLAR
4	MINICARGADOR	BOB CAT
5	MINICARGADOR	MACTRACK
6	VOLQUETA SENCILLA	FOTON

MAQUINARIA		
No.	**EQUIPO**	**MARCA/REFERENCIA**
SAN ANTONIO TOLDO		
1	MOTONIVELADORA ARTICULADA	CATERPILLAR
2	MOTONIVELADORA	KOMATSU
3	VIBROCOMPACTADOR 8 TON	CATERPILLAR
4	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO	AMMANN
5	RETROCARGADOR	TEREX
6	MINICARGADOR	BOBCAT
7	RETROCARGADOR SOBRE LLANTAS	LUQUING
8	VOLQUETA SENCILLA	FOTON
9	CARROTANQUE AGUA	JBC

Fuente: Informe UAERMV

A continuación, se presenta un registro fotográfico de los equipos empleados:

Ilustración 23 Equipos en obra Tunales UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 24 Equipos en obra Capitolio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 25 Equipos en obra San Antonio UMV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- ✓ **MANTENIMIENTO**

Se realiza seguimiento y verificación del mantenimiento de vehículos, equipos o maquinaria mediante la revisión de los certificados correspondientes a las actividades realizadas durante el mes de agosto; estos certificados según informa la entidad ejecutora UMV serán adjuntados en el informe del próximo mes (septiembre 2025), dado que la información debe ser consolidada con base en las reparaciones efectuadas durante agosto de 2025. Al respecto la UMV adjunta soporte de correo remitido al contratista de maquinaria donde se solicitan los certificados de los mantenimientos realizados.

Indicadores:

No de vehículos con revisión técnico-mecánica/ *100% 6 / 15 * 100 =40 %
No de vehículos utilizados en el proyecto

Nota: *Actualmente solo 6 vehículos cuentan con la revisión de la técnica mecánica; los otros 9 vehículos restantes son modelo 2022 y 2023 por lo tanto todavía no aplica.*

N de derrames atendidos *100% 2 / 2 * 100 =100 %
N de derrames presentados

5.16 Manejo del descapote y cobertura vegetal.

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"Manejo de vegetación, no aplica para el contrato"

Para el presente período, no se realizaron actividades de remoción de cobertura vegetal, descapote, ni aprovechamiento forestal. Cabe mencionar que para el contrato no se cuenta con ningún tipo de permiso para realizar aprovechamiento forestal.

5.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural.

Durante el período no se realizaron hallazgos de elementos arqueológicos que se tuvieran que reportar ante el ICANH. A la fecha en el área de influencia del contratista de obra, no se presenta ningún hallazgo arqueológico fortuito, por lo que no se ha hecho necesario implementar esta medida de manejo ambiental. En el momento en el que se genere un hallazgo se reportará en el informe respectivo tanto de obra como de interventoría y se hará el seguimiento correspondiente.

6. CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL CTO. 479 DE 2022.

En el periodo se realizaron actividades de manejo de aguas, excavaciones, traslado de materiales pétreos, retiro de residuos de excavación RCD hacia acopios principales y hacia sitio de disposición final, construcción de cunetas, estructuras hidráulicas de encole y descole, implementación de PMT, implementación de medidas de manejo ambiental en acopios de materiales, señalización, realización de charlas y capacitaciones.

6.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental.

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 26 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con el grupo de gestión socioambiental conformado.				
El personal socioambiental se encuentra en el lugar donde se desarrollan las actividades de obra.				

Fuente: Ecovias SAS

La interventoría informa que el documento PAGA, se encuentra aprobado mediante oficio 186-1-679. A continuación, se presenta la conformación del grupo de gestión Socioambiental (véase tabla No27).

Tabla 27 Conformación del grupo socioambiental CEV

NOMBRE	CARGO
Hernando Laverde Manjarres	Director de obra
Alejandra Limas Plazas	Residente social
Lorena Andrea Gómez Ramirez	Profesional ambiental
Gloria Sepúlveda	Profesional en seguridad y salud en el trabajo

Fuente: Consorcio Estabilización Vial

De acuerdo con la anterior tabla se evidencia que el contratista cumple con el personal requerido socioambiental, el cual se encuentra en obra realizando las funciones asignadas.

Indicador:
Número de profesionales contratados x100% 4 / 4 * 100 = 100%
Número total de profesionales propuestos

Número de capacitaciones Ejecutadas x100% 4 / 4 * 100 = 100 %
Número de Capacitaciones programadas

Número de requerimientos ambientales cumplidos x100 7 / 10 * 100 = 70 %
Número de requerimientos ambientales generados

6.2 Capacitación ambiental al personal de obra.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la capacitación y educación ambiental del personal vinculado al proyecto**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 28 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza la jornada de capacitación mensual programada.				
Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.				

Fuente: Ecovias SAS

De igual manera se verificó el cumplimiento según el cronograma de capacitaciones desde el componente ambiental, que se realizaron las siguientes capacitaciones al personal:

Tabla 29 Capacitaciones realizadas CEV

COMPONENTE	TEMA	TIPO	FECHA
Ambiental	Manejo de arbolado y zonas verdes	Capacitación	13/08/2025
Ambiental	Emisiones atmosféricas y ruido	Capacitación	15/08/2025
Ambiental	Manipulación de sustancias químicas	Capacitación	25/08/2025
Ambiental	Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio	Capacitación	28/08/2025
Ambiental	Inducción medio ambiente	Inducción	01/08/2025 11/08/2025 26/08/2025 27/08/2025 28/08/2025

Fuente: Cronograma de capacitaciones Estabilización.

El Contratista se encargó de realizar la capacitación ambiental los días 13, 15, 25 y 28 de agosto de 2025 al personal, abarcando los temas mencionados en la tabla anterior y fueron dictadas por la profesional Ambiental y SST del Consorcio Estabilización vial, con el fin de generar conciencia a los trabajadores.

Ilustración 26 Capacitación Ambiental CEV





Fuente: Componente Ambiental CEV

Indicador:

Número de capacitaciones Ejecutadas x100% 4 / 4 * 100 = 100 %
Número de Capacitaciones programadas

Número de personas capacitadas x 100% 16 / 31 * 100 = 51 %
Número de personas laborando

6.3 Cumplimiento de los requerimientos legales

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA.** "Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental". Para este período no se gestionaron licencias y/o permisos ambientales para el proyecto.

Cabe resaltar que, para la ejecución de la obra de acuerdo al tipo de intervención a realizar, se contempla conservar el ancho de vía existente, lo cual indica que no se requiere de aprovechamiento forestal, por ende, no se hace necesario tramitar permiso de aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR.

En cuanto a los proveedores de materiales cuentan con los permisos y licencias ambientales vigentes aplicables para esta actividad al igual que los sitios destinados para la disposición final de materiales generados en obra.

De igual manera para la disposición final de residuos peligrosos RESPEL, se realiza con gestores autorizados que cuentan con los permisos ambientales respectivos para este tipo de disposición final. En el periodo no se realizó disposición al respecto.

Respecto al proveedor de unidades sanitarias móviles, cuenta con permisos de vertimientos de residuos líquidos conforme la legislación ambiental aplicable.

Se cuenta con los permisos de ocupación de cause para las actividades de obra que así lo requieren los cuales fueron tramitados ante la autoridad ambiental competente CAR y se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 30 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con los permisos de ocupación de cauce vigentes				
Los proveedores de materiales cuentan con las licencias ambientales y títulos mineros respectivos vigentes				
Los sitios de disposición final de RCD cuentan con los permisos ambientales respectivos vigentes				
El proveedor de unidades sanitarias móviles, cuenta con permisos de vertimientos de residuos líquidos conforme la legislación ambiental aplicable.				
En el periodo del presente informe se realizaron requerimientos por parte de la autoridad ambiental competente.				

Fuente: Ecovias SAS

Indicadores:

Número de Permisos obtenidos /*100% = 0 / 0 * 100% = 0 %
Número de permisos requeridos

N° requerimientos cumplidos/ x 100% = 0 / 0 * 100% = 0 %
Total de Requerimientos generados por la autoridad ambiental

N° de fuentes de materiales utilizadas para el proyecto / * 100 = 2 / 2 * 100% = 100 %
N°de fuentes con permisos ambientales al día

6.4 Manejo Integral de materiales de construcción

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de materiales de construcción en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 31 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios delimitados				
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Todos los vehículos de transporte de materiales cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.				
Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos de los proveedores autorizados.				

Fuente: Ecovias SAS

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"*Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra*".

Todos los materiales provienen de fuentes legales, es decir, que cuentan con permisos ambientales y/o mineros, aspecto que es verificado por la interventoría.

Durante el período se realizaron las siguientes actividades:

- Cubrimiento de materiales pétreos en el frente de obra Tunales y San Antonio, con el fin de evitar la dispersión de materiales y aumento de la concentración de material particulado en el área de influencia directa. Al respecto cabe mencionar que no todos los acopios RCD y pétreos se encuentran cubiertos, señalizados y demarcados. Algunos cumplen parcialmente con las medidas descritas en las fichas PAC-2.1-04 y PAC-2.4-07. Por lo cual en el periodo se solicitó adecuación de estos, las anotaciones quedan registradas en bitácora de obra.
- Se verifico que los vehículos para el transporte de estos materiales cuentan con los documentos vigentes y realizan el cubrimiento de la carga al transportarla para evitar dispersión de materiales en las vías.
- Se evidencia que se mantienen las puertas de descarga de materiales herméticamente cerradas durante el trasporte.
- Se sugiere al contratista que no se almacenen materiales cerca de cuerpos de agua o zonas verdes, según se describen en las fichas de manejo ambiental y permisos de ocupación de cauce POC.
- En el periodo se realizó solicitudes de adecuación de acopios de materiales pétreos y RCD durante los comités integrales realizados al igual que se dejó consignado en bitácora e informes semanales respectivos.

A continuación, se relacionan los proveedores de materiales en el periodo con las respectivas cantidades:

Tabla 32 Relación de Proveedores y cantidades CEV

CONSOLIDADO DE MATERIAL USADO EN OBRA						
ITEM	**RAZON SOCIAL**	**CATEGORIA**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25						
1	AGREGADOS DE ORIENTE SAS	**Agregados petreo**	Arena	30	49,466	RES 500.41-17-0120 Corporinoquia de 26/01/2017 Registro Minero: EXP:IGJ-08051X hasta 02/02/2045
2			Grava	30	49,466	
TOTAL				**60**	**98,931**	
may-25						
1	AGREGADOS DE ORIENTE SAS	**Agregados petreo**	Arena	30	49,466	RES 500.41-17-0120 Corporinoquia de 26/01/2017 Registro Minero: EXP:IGJ-08051X hasta 02/02/2045
2			Grava	30	49,466	
3	MAQUINAS AMARILLAS	**Agregados petreo**	Recebo	60	98,931	Informe Técnico 00259 de 2022 Rad.2022IE24021 Informe Técnico 00876 de 2025 Rad 2025IE59007. Rad 2019EE100840
TOTAL				**180**	**296,793**	
jun-25						
1	AGREGADOS DE ORIENTE SAS	**Agregados petreo**	Arena	60	98,931	RES 500.41-17-0120 Corporinoquia de 26/01/2017 Registro Minero: EXP:IGJ-08051X hasta 02/02/2045
2			Grava	60	98,931	
3	MAQUINAS AMARILLAS	**Agregados petreo**	Recebo	15	24,733	Informe Técnico 00259 de 2022 Rad.2022IE24021 Informe Técnico 00876 de 2025 Rad 2025IE59007. Rad 2019EE100840
TOTAL				**150**	**247,328**	
jul-25						
1	AGREGADOS DE ORIENTE SAS	**Agregados petreo**	Arena	90	148,397	RES 500.41-17-0120 Corporinoquia de 26/01/2017 Registro Minero: EXP:IGJ-08051X hasta 02/02/2045
2			Grava	90	148,397	
3	MAQUINAS AMARILLAS	**Agregados petreo**	Recebo	15	24,733	Informe Técnico 00259 de 2022 Rad.2022IE24021 Informe Técnico 00876 de 2025 Rad 2025IE59007. Rad 2019EE100840
4		**Agregados petreo**	Triturado	15	24,733	
TOTAL				**210**	**346,259**	
ago-25						
1	AGREGADOS DE ORIENTE SAS	**Agregados petreo**	Arena	75	123,664	RES 500.41-17-0120 Corporinoquia de 26/01/2017 Registro Minero: EXP:IGJ-08051X hasta 02/02/2045
2			Grava	75	123,664	
3	MAQUINAS AMARILLAS	**Agregados petreo**	Recebo	60	98,931	Informe Técnico 00259 de 2022 Rad.2022IE24021 Informe Técnico
TOTAL				**210**	**346,259**	
Nota: El valor en toneladas que se relaciona se toma del cuadro de conversion de la SDA						
	PENDIENTE POR CERTIFICADO					

Fuente: Ecovias SAS

Indicador:

No. de proveedores empleados x100% 2 / 2 *100= 100 %
N de proveedores que cumplan la normatividad

Volumen material certificado x100% 210 / 210 *100 = 100 %
Volumen material usado en el mes

Ilustración 27 Manejo de materiales de Construction Tunales / San Antonio CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

6.5 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la implementación de señalización en los frentes de trabajo y en el campamento de obra**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 33 Verificación cumplimiento ficha de señalización CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con el respectivo PMT aprobado e implementado				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con la señalización preventiva, informativa y de emergencia correspondiente y en buen estado.				
Los elementos de atención de emergencia y control de derrames se encuentran señalizados				
Los acopios de materiales se encuentran señalizados				
Se cuenta con las vallas informativas en obra				

Fuente: Ecovias SAS

A la fecha por parte del contratista de obra se cuenta con la instalación de un campamento de obra adecuado en cada uno de los tramos en intervención, por lo que se ha implementado a la fecha la señalización preventiva, informativa y de emergencia necesaria, se contempla un plan de manejo de tránsito con un total de 10 señales por frente de obra.

Durante las jornadas de inspección y seguimiento realizadas en el mes de agosto de 2025 por parte del componente Ambiental de la interventoría se pudo evidenciar la señalización que se mantiene instalada hasta la fecha y se tomó el respectivo registro fotográfico, el cual es presentado a continuación:

Ilustración 28 Señalización en obra CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- ✓ **PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**

El Contratista cuenta con la aprobación de los Planes de Manejo de Tránsito para la ejecución de las actividades de obra, de acuerdo con los seguimientos realizados, se evidenció que cuentan con señalización vertical móvil instalada en cada uno de los frentes activos la cual costa de 10 por tramo como se muestra en la imagen 4, los auxiliares cuentan con los elementos necesarios en cuento a dotación y EPP además radios de comunicación y chalecos reflectivos.

Ilustración 29 PMT Implementado San Antonio CEV




Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 30 PMT Implementado Tunales CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Imagen 4 Plano de PMT aprobado CEV

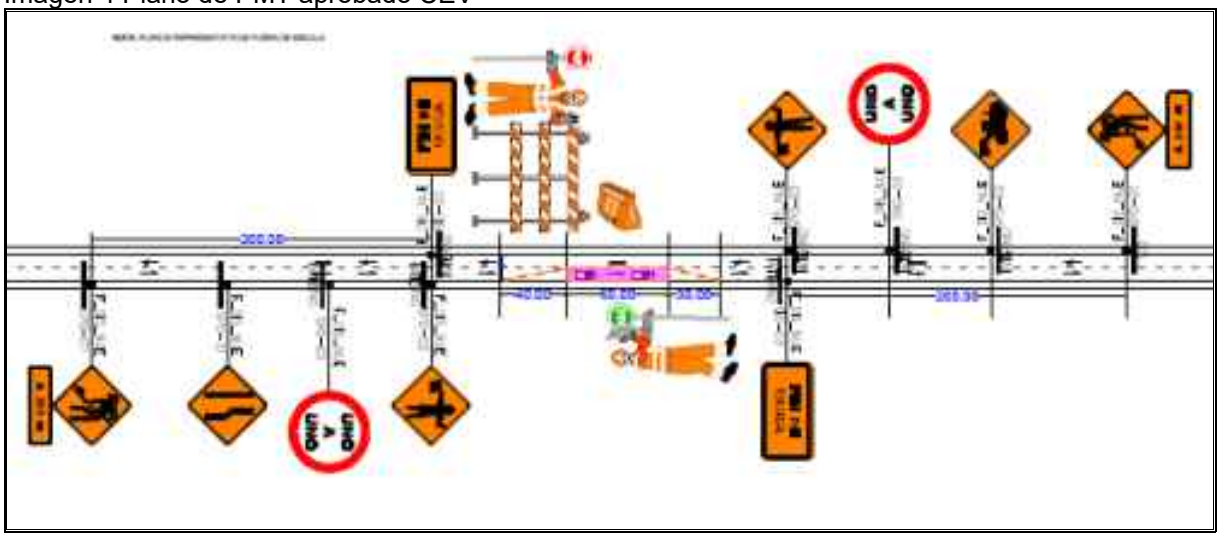

Fuente Ecovias

Indicador:

No de Frentes de obra señalizados adecuadamente x100 2 / 2 = 0 %
No total de Frentes de obra

No de Señales instaladas x100% 30 / 30 = 100 %
No de Señales requeridas en el PMT

6.6 Manejo y disposición final de escombros y RCD

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición de residuos de construcción y demolición RCD en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 34 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios RCD delimitados				
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Los RCD se evacuan hacia sitio de disposición en el tiempo indicado en el PAGA				
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los sitios de disposición cuentan con permisos ambientales vigentes				
Se cuenta con todos los certificados disposición de residuos de construcción y demolición RCD				

Fuente: Ecovias SAS

A continuación, se hace una descripción del manejo y disposición final de los escombros realizado por el Contratista y se presenta como soporte el registro fotográfico levantado en el mes de agosto de 2025 por esta interventoría en las actividades de seguimiento de los diferentes componentes.

Para la disposición de RCD se emplea un sitio de disposición que cuenta con los debidos permisos ambientales vigentes, quien emite el certificado respectivo por las cantidades gestionadas en este sitio. El contratista lleva un registro de las cantidades generadas y dispuestas en el periodo.

Para el periodo del presente informe el contratista de obra realizo disposición de materiales de RCD en sitio autorizado. Otra cantidad permanece acopiada en obra debido para su retiro posteriormente y adicionalmente está siendo empleada para el atraque de las cunetas. En cumplimiento de la Resolución 1257 de 2021, el contratista remite los soportes (certificados) de disposición final de RCD cuando se disponen; el material producto de la excavación es

entregado a la empresa maquinas amarillas identificada con NIT 900.459.311-1, la cual cuenta con autorización ambiental para hacer el manejo y disposición final de RCD.

A continuación, se presenta la relación de material dispuesto en el periodo.

Tabla 35 Relación de material RCD dispuesto CEV

CONSOLIDADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION					
ITEM	**SITIO DE DISPOSICION**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	No aplica para el periodo	0	0	Resolución número 1480 de 2014 ANLA. Resolucion 228 de 2016 ANLA
may-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	No aplica para el periodo	0	0	Resolución número 1480 de 2014 ANLA. Resolucion 228 de 2016 ANLA
TOTAL			**0**	**0,00**	
jun-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	No aplica para el periodo	0	0	Resolución número 1480 de 2014 ANLA. Resolucion 228 de 2016 ANLA
TOTAL			**0**	**0,00**	
jul-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	Excavacion	67	85,9	Resolución número 1480 de 2014 ANLA. Resolucion 228 de 2016 ANLA
TOTAL			**67**	**85,9**	
ago-25					
1	MAQUINAS AMARILLAS	Excavacion	60	76,96	Resolución número 1480 de 2014 ANLA. Resolucion 228 de 2016 ANLA
TOTAL			**60**	**76,96**	

Nota: El valor en toneladas que se relaciona es el que aparece en el certificado de el sitio de disposicion final.

Fuente: Ecovias SAS

Indicadores:

$$\%\ Disposicion\ de\ RCD = \frac{\text{M3 } de\ RCD\ dispuestos\ durante\ el\ periodo \times 100}{\text{M3 } de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo}$$

$$\frac{60}{60} \times 100\% = 100\%$$

$$\%\ Disposicion\ de\ RCD = \frac{\text{M3 } de\ RCD \text{ aprovechado } el\ periodo \times 100}{\text{M3 } de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo}$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Ilustración 31 Acopios de RCD San Antonio/Tunales CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

6.7 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición final de residuos sólidos, convencionales, especiales y peligrosos**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que se cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 36 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con puntos ecológicos en sitio y en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO no aprovechables.				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO aprovechables.				
Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición final de los RESPEL gestionados en el presente mes.				

Fuente: Ecovias

Desde la interventoría se realiza un seguimiento específico a la gestión ambiental realizada por parte del contratista de obra, abarcando de esta manera el manejo de residuos sólidos no aprovechables, aprovechables y de residuos peligrosos durante el periodo correspondiente al informe presentado.

Es importante mencionar que durante el presente periodo por parte de la interventoría se realiza una revisión y/o seguimiento de la generación de residuos (aprovechables, no aprovechables, peligrosos) a través de la verificación en campo mediante la jornada de inspección y seguimiento ejecutada en el mes de agosto de 2025.

- **Residuos sólidos Convencionales**

Durante el periodo del presente informe por parte del contratista de obra se informa que se generaron residuos ordinarios ya que se cuenta a la fecha con dos campamentos de obra, los cuales fueron dispuestos y recolectados por el prestador de servicio de aseo de la localidad del Sumapaz (Empresa de Servicios Públicos PROMOAMBIENTAL – E.S.P), servicio de recolección prestado los días miércoles.

Por parte de Interventoría, con el fin de realizar un seguimiento a la generación de residuos se solicitó al contratista la planilla de generación de residuos en el presente mes lo cual se presenta en la tabla 37 del presente informe.

- ✓ **Puntos Ecológicos**

Durante los recorridos del presente mes realizados por parte de Interventoría se identificó que los puntos ecológicos instalados en los campamentos se encontraban en condiciones adecuadas, al punto ecológico de Toldo le hace falta la tapa para la caneca blanca y se solicitó que estos permanezcan despejados, organizados y requieren mantenerlos con las bolsas respectivas, como se puede evidenciar a continuación:

Ilustración 32 Puntos ecológicos San Antonio / Tunales CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- **Residuos peligrosos**

Durante el periodo del presente informe no se entregaron Residuos Peligrosos - RESPEL al respectivo gestor para su disposición final. Se presenta la tabla 37 donde se relaciona la generación de residuos peligrosos**,** donde reporta la cantidad de residuos peligrosos generados en el mes de agosto de 2025. El gestor encargado de realizar la disposición final de estos residuos es RECIPROIL empresa aprobada por la SDA con la resolución 190 de 2011.

- ✓ **Centro de acopio temporal de residuos peligrosos - respel**

En el periodo se evidenció un área destinada al acopio de RESPEL puesto que se generó este residuo por parte del consorcio, específicamente bolsas de cemento. Estas se mantienen acopiadas para su entrega a gestor autorizado.

- **Reporte de Residuos Generados**

En la siguiente tabla a modo de seguimiento se presenta el tipo y la cantidad de residuos generados por el contratista de obra durante el mes de agosto de 2025. El reporte de los residuos generados es verificado durante este mes específicamente a través de las inspecciones realizadas en obra.

.

Tabla 37 Reporte de residuos generados CEV

CONSOLIDADO RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS					
PERIODO Mes/Año	**Tipo Residuo/ Cantidad / Unidad de medida**				
	Aprovechables (kg)	**No Aprovechables (Kg)**	**Orgánicos (kg)**	**RESPEL (Kg)**	**TOTAL**
Abril/2025	0	5	0	0	5
Mayo/2025	0	6	0	7	13
Junio/2025	0	5	0	8	13
Julio/2025	0	4	0	7	11
Agosto/2025	0	3	0	8	11
TOTAL	**0**	**23**	**0**	**33**	**53**

Como residuos peligrosos en esta tabla se presenta la cantidad de bolsas de cemento y elementos contaminados por RESPEL

Fuente: Ecovias

Indicadores:

Volumen de residuos Aprovechables x 100 = 0 / 11 * 100 = 0 %
Volumen total de residuos generados

Volumen de residuos No aprovechables x 100 = 3 / 11 * 100 =27 %
Volumen total de residuos generados

Volumen de residuos peligrosos certificados x 100% = 0 / 8 * 100 =0 %
Volumen total de residuos peligrosos generados

6.8 Manejo preventivo de eventos de inestabilidad de origen natural o antrópico en taludes viales

Durante el periodo de ejecución de actividades, no se realizaron actividades de obra que afecten taludes.

Indicador:

N.º de derrumbes presentados para el periodo / x100% = 0 / 0 * 100 = 0%
Total, de derrumbes que requieren intervención.

6.9 Control de emisiones atmosféricas.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el control de emisiones atmosféricas. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 38 Cumplimiento general medida de manejo CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Los vehículos respetan los límites de velocidad para la circulación en los frentes de obra				
Para el presente mes se realizó humectación de via, se presenta la certificación del agua suministrada por proveedor autorizado,				

Fuente: Ecovias SAS

Durante el periodo la interventoría procedió a realizar seguimiento al cubrimiento de materiales pétreos empleados en los frentes de obra, con el fin de evitar al aumento de material particulado en el área de influencia de la obra. Para el control/prevención de dispersión de material particulado, para el periodo no se realizó humectaciones en diferentes tramos de las vías, debido a las constantes precipitaciones registradas en la zona, lo que ha contribuido a la disminución del material particulado generado por el tránsito de vehículos aledaños.

Igualmente, se verifica que los puntos de acopio de materiales pétreos se mantengan separados, cubiertos con plásticos, debidamente demarcados y señalizados, cumpliendo con lo establecido en la ficha PAC 2.1.04, con el propósito de prevenir afectaciones a los ecosistemas cercanos y a la población flotante del sector**.**

La interventoría sugiere al consorcio que cuando circulen vehículos por las áreas de influencia indirecta de construcción, se deberá realizar a velocidades moderadas para que no se levanten en exceso partículas de polvo, de igual manera realizar los mantenimientos periódicos requeridos del equipo empleado en obra.

Se verifico que los vehículos cuentan con los certificados de revisión técnico mecánica vigente. Se evidencio que los vehículos destinados al transporte de materiales cuentan con carpas con el fin de evitar emisión de partículas por acción del viento. Cabe mencionar que no todos los acopios se encuentran cubiertos, lo cual fue comunicado al contratista quien genero acciones para subsanar dichas observaciones en todos los frentes de obra.

De igual manera se implementan las acciones respectivas en cuanto al manejo ambiental del ruido.

Indicador:

No de frentes humectados x100% = 0 / 0*100%= 0 %
No de frentes de obra

Volumen de agua utilizada al mes para humectación de vía = 0

N acopio de material adecuadamente cubiertos x 100% = 4/ 6*100% = 66 %
total de puntos de acopio de material

Ilustración 33 Cubrimiento de materiales CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

6.10 Manejo de aguas superficiales

De acuerdo al desarrollo de las obras fue necesario tramitar ante la autoridad ambiental los permisos de ocupación de cauce, los cuales fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2025 como último plazo otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante **AUTO DRBC No. 01256000051 de 6 FEB. 2025.**

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de aguas superficiales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 39 Cumplimiento general medida de manejo CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención.				
Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.				
Se cuenta en obra con punto de lavado de manos.				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra por parte de proveedor autorizado.				

Fuente: Ecovias SAS

Durante el período no se generaron afectaciones por actividades constructivas a los cuerpos de agua presentes en la zona de influencia del proyecto.

En el seguimiento realizado por la interventoría en el periodo al Consorcio se evidencio el cumplimiento de las medidas de manejo indicadas en la ficha como es, disposición final adecuada de RCD en sitios autorizados, acopio temporal de los mismos cumpliendo con las distancias establecidas en el PAGA para cuerpos de agua, quebradas,etc., sin embargo, debido a las condiciones particulares del área de intervención (zona rural de paramo) no es posible cumplir estrictamente con la distancia mínima de 30 metros establecida por la normatividad ambiental vigente. Por lo tanto, se han implementado medidas de manejo y control para minimizar el riesgo de afectación a las fuentes hídricas como es el aislamiento de las alcantarillas por medo de polisombra, respecto al lavado y mantenimiento de equipos se realiza en lugares adecuados para tal fin.

Por otro lado, durante el mes de agosto, no se ha realizado la limpieza de las alcantarillas, de parte de interventoría se ha solicitado manejo de aguas para evitar el aporte de sedimentos y materiales pétreos que por escorrentía son arrastrados hacia las alcantarillas con el fin de prevenir la colmatación de las mismas.

El agua para actividades de obra es suministrada a través de canecas y llevadas al frente de obra de predios cercanos que cuentan con autorización y de los cuales se procedió a levantar acta de autorización con los propietarios de los predios de acuerdo a la siguiente relación:

- En el frente Unión Tunales predio del señor Rafael Romero Km 1+860
- En el frente San Antonio-Toldo predio de la señora María Chavarro Km 3+850

Indicador:

No de requerimientos cumplidos / x 100% = 0 / 0 * 100 = 0 %
No de requerimientos establecidos por la interventoría

N de monitoreos ejecutados /x100% = 0 / 0 * 100 = 0 %
N monitoreos programados

Volumen de agua utilizada al mes para actividades constructivas = 3 M3

Ilustración 34 delimitación de alcantarillas CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

6.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 40 Cumplimiento general medida de manejo CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.				
Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.				
Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.				
Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.				

Fuente: Ecovias

Como parte del cumplimiento a la Resolución 2400 de 1979, según los acuerdos realizados desde el área social del proyecto actualmente se hace uso de los baños aledaños a las zonas de intervención de la obra, de acuerdo a ello se realiza verificación y seguimiento al buen uso y correcto funcionamiento de las unidades sanitarias con el fin de reforzar el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico.

El Contratista de obra cuenta con 2 unidades sanitarias para el servicio de los trabajadores alquiladas en viviendas cercanas a la obra, distribuidas de la siguiente forma:

- 1 baño en el frente de obra tunales predio de la señora Diana Cifuentes k1+790
- 1 baño en el frente de obra San Antonio- Toldo predio de la señora Nidia Hernández María Chavarro K 4+206 k3+850.

De estos dos lugares se cuenta con las actas de autorización respectivas.

- ✓ **KIT DE CONTROL DE DERRAMES**

Durante la jornada de inspección ejecutada en agosto de 2025 se realizó la verificación al kit de derrames presente en el frente de trabajo específicamente ubicado en las carpas, evidenciando que este se encuentra en sitio y en condiciones adecuadas. Además, se realiza la verificación de los elementos del kit de derrames en medio de los recorridos realizados por el Componente ambiental de Interventoría.

Ilustración 35 Kit Control de derrames CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicador:
N total de baños reportados en obra x100% = 2 / 2 * 100 = 100 %
N de Baños requeridos

Volumen de la disposición de los lodos de los baños portátiles certificados = 0

N° de mantenimientos realizados x100% = 3 / 3 * 100 = 100 %
N° de mantenimientos programados

El contratista no conto con USP en el periodo.

6.12 Protección de ecosistemas sensibles

Según la caracterización ambiental del área del proyecto no se ve afectado ningún ecosistema sensible, sin embargo, por su cercanía a la zona del páramo de Sumapaz y el paso por áreas consideradas sensibles como son cuerpos de agua, se realizan actividades que conlleven a la minimización, control y mitigación de posibles impactos por las actividades del proyecto, lo cual es verificado por la interventoría. En las inducciones al personal se socializa que se encuentra prohibido que los trabajadores extraigan de estos ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales.

Indicador:
No. áreas sensibles protegidas/ x100% = 0 / 0 * 100 = 0 %
No total de áreas sensibles identificadas

6.13 Protección de fauna en obra

Una de las medidas de manejo implementadas por el contratista para este componente es la sensibilización a los trabajadores lo cual se realiza inicialmente en el proceso de inducción y capacitaciones programadas de manera periódica. De igual manera se implementa en obra para conductores de vehículos respetar los límites de velocidad para disminuir el riesgo de atropellamiento de fauna silvestre. Se socializa que está completamente prohibido la caza o comercialización de especies. Para el periodo el contratista realizo capacitaciones al respecto en manejo de arbolado y zonas verdes.

Indicador:
N° de capacitaciones programadas x 100% = 1 / 1 * 100 = 100 %
N° Capacitaciones ejecutadas

6.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para las actividades de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de instalaciones temporales y sitios de acopio. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 41 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.				
Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal,				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).				
El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias.				
El campamento cuenta con punto ecológico.				
El campamento se encuentra en condiciones adecuadas de aseo y orden.				
El campamento cuenta con señalización respectiva.				

Fuente: Ecovias

El contratista de obra cuenta con un campamento de obra en cada uno de los frentes de trabajo el cual consta de una carpa móvil en la zona cercana a las áreas de intervención, adecuados con los elementos necesarios para la atención de emergencias y elementos para los trabajadores. Durante las jornadas de seguimiento e inspección realizadas por la interventoría en el mes de agosto de 2025, se realizó una verificación de los aspectos del área ambiental en cada uno de los campamentos.

Es importante mencionar que durante el recorrido por los campamentos se pudo evidenciar que cuenta con: punto ecológico, kit de emergencia, kit de derrames, al respecto se solicitó una jornada de orden y aseo en los mismos; como se evidencia en el siguiente registro fotográfico.

Ilustración 36 Campamentos Tunales CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 37 Campamentos San Antonio CEV



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

De acuerdo a las inspecciones de campo, se tiene instalado dos campamentos temporales móviles tipo carpa.

Indicadores:

No. Campamentos manejados x 100% = 2 / 2 * 100 =100 %
No. Campamentos establecidos

No actividades ejecutadas x 100% = 33 / 33 * 100 =100 %
No de actividades programadas

No de requerimientos atendidos x 100% = 2/ 3 * 100 =66 %
No total de requerimientos realizados por la interventoría

6.15 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo

Dentro de la revisión que realiza el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 42 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo CEV

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con Plan de Manejo de Tránsito.				
Cuenta con el diligenciamiento de las fichas pre – operacionales de cada uno de los equipos.				
Cuenta con Stiker de identificación				
Se cuenta con certificado de revisión tecnicomecanica de los vehículos según aplique.				
No se evidencia lavado de vehículos en cuerpos de agua.				

Fuente: Ecovias

Dentro del informe de seguridad y salud en el trabajo se encuentran los soportes de los preoperacionales de los equipos empleados y activos en campo.

- ✓ **RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA**

Durante el presente periodo por parte del componente ambiental de la interventoría se hace la respectiva revisión de algunos de los preoperacionales de los vehículos y maquinaria presentes en obra.

Se identificó que, en el presente periodo, el contratista cuenta con los equipos presentes en campo los cuales se listan a continuación:

Tabla 43 Relación de vehículos CEV

EQUIPO	MARCA	PLACA	MODELO	PIN	VENCIMIENTO TECNICOMECANICA
VEHICULOS					
VOLQUETA	CHEVROLET	SRN910	2008	6399	02/08/2025
VOLQUETA	CHEVROLET	SRN912	2008	6573	02/10/2025
VOLQUETA	FOTON	JRR702	2021	19423	03/10/2025
CAMIONETA	FORD	KXY360	2023	N/A	N/A
CAMIONETA	FORD	GPY162	2020	N/A	21/01/2026
CAMIONETA	NISSAN	FSW675	2019	N/A	21/01/2026
CAMIONETA	FORD	KXT299	2023	N/A	N/A

Fuente: Informe Consorcio Estabilización vial y Ecovias SAS

Tabla 44 Relación de maquinaria CEV

MAQUINARIA			
No.	**EQUIPO**	**MARCA/REFERENCIA**	**MODELO**
1	MINICARGADOR	CASE E200	2018
2	MINICARGADOR	CASE SR200B	2024
3	RETROCARGADOR	JHON DEERE 310SJ	2011

Fuente: Informe Consorcio Estabilización vial

A continuación, se presenta un registro fotográfico de los equipos empleados:

Ilustración 38 Equipos en obra CEV





Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicadores:

No de vehículos con revisión técnico-mecánica/ *100% 4 / 4 * 100 = 100 %
No de vehículos utilizados en el proyecto

N de derrames atendidos *100% 0 / 0 * 100 = 0 %
N de derrames presentados

6.16 Manejo del descapote y cobertura vegetal.

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"Manejo de vegetación, no aplica para el contrato"

Para el presente período, no se realizaron actividades de remoción de cobertura vegetal, descapote, ni aprovechamiento forestal. Cabe mencionar que para el contrato no se cuenta con ningún tipo de permiso para realizar aprovechamiento forestal.

6.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural.

Durante el período no se realizaron hallazgos de elementos arqueológicos que se tuvieran que reportar ante el ICANH. A la fecha en el área de influencia del contratista de obra, no se presenta ningún hallazgo arqueológico fortuito, por lo que no se ha hecho necesario implementar esta medida de manejo ambiental. En el momento en el que se genere un hallazgo se reportará en el informe respectivo tanto de obra como de interventoría y se hará el seguimiento correspondiente.

7. CONSORCIO GAVIONES 95 CTO. 478 DE 2022

Durante el período, El consorcio realizo actividades de localización y replanteo, excavaciones para construcción de filtro, relleno, señalización, traslado de materiales pétreos, retiro de residuos de excavación RCD hacia acopios temporales, acopio de materiales pétreos.

7.1 Conformación de grupo de gestión social y ambiental.

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 45 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con el grupo de gestión socioambiental conformado.				
El personal socioambiental se encuentra en el lugar donde se desarrollan las actividades de obra.				

Fuente: Ecovias SAS

La interventoría informa que el documento PAGA, se encuentra aprobado mediante oficio 186-1-705. A continuación, se presenta la conformación del grupo de gestión Socioambiental (véase tabla No 46).

Tabla 46 Conformación del grupo socioambiental Gaviones 95

NOMBRE	CARGO
Andrés García Posada	Residente social
Cesar Augusto Delgado Avellaneda	Profesional ambiental
Paul Rangel Páez	Profesional en seguridad y salud en el trabajo
Liz Maribel Murillo Naranjo	Profesional en seguridad y salud en el trabajo

Fuente: Consorcio Gaviones 95

Indicador:

Número de profesionales contratados x100% 4 / 4 * 100 = 100%
Número total de profesionales propuestos

Número de requerimientos ambientales cumplidos x100% 0 / 0 * 100 = 0 %
Total de requerimientos ambientales generados

7.2 Capacitación y concienciación para el personal de obra

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la capacitación y educación ambiental del personal vinculado al proyecto**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 47 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza la jornada de capacitación mensual programada.				
Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.				

Fuente: Ecovias SAS

De igual manera se verificó el cumplimiento según el cronograma de capacitaciones desde el componente ambiental, que se realizaron las siguientes capacitaciones al personal:

Tabla 48 Capacitaciones realizadas Gaviones 95

COMPONENTE	TEMA	TIPO	FECHA
Ambiental	Sensibilización sobre cuidado y uso adecuado del recurso agua	Capacitación	20/08/2025
Ambiental	Sensibilización sobre aspectos ambientales relevantes y legislación aplicada en obra	Capacitación	26/08/2025

Fuente: Informes semanales Gaviones 95

El Contratista se encargó de realizar la capacitación ambiental los días 20 y 26 de agosto de 2025 al personal, abarcando los temas mencionados en la tabla anterior y fueron dictadas por el profesional ambiental del Consorcio Gaviones 95, con el fin de generar conciencia a los trabajadores.

Ilustración 39 Capacitación Ambiental Gaviones 95



Fuente: Componente Ambiental Gaviones95

Indicador:
Número de capacitaciones Ejecutadas x100% 2 / 2 * 100 = 100 %
Número de Capacitaciones programadas

Número de personas capacitadas / x 100% 9 / 9 * 100 = 100%
Número de personas en el frente de obra.

7.3 Cumplimiento de los requerimientos legales

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA.** "Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental". Para este período no se gestionaron licencias y/o permisos ambientales para el proyecto.

Cabe resaltar que, para la ejecución de la obra de acuerdo al tipo de intervención a realizar, se contempla conservar el ancho de vía existente, lo cual indica que no se requiere de aprovechamiento forestal, por ende, no se hace necesario tramitar permiso de aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR.

En cuanto a los proveedores de materiales cuentan con los permisos y licencias ambientales vigentes aplicables para esta actividad al igual que los sitios destinados para la disposición final de materiales generados en obra.

De igual manera para la disposición final de residuos peligrosos RESPEL, se realiza con gestores autorizados que cuentan con los permisos ambientales respectivos para este tipo de disposición final. En el periodo no se realizó disposición al respecto.

Se cuenta con los permisos de ocupación de cause para las actividades de obra que así lo requieren los cuales fueron tramitados ante la autoridad ambiental competente CAR y se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista realice y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 49 Verificación cumplimiento medida de manejo ambiental Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con los permisos de ocupación de cauce vigentes				
Los proveedores de materiales cuentan con las licencias ambientales y títulos mineros respectivos vigentes				
Los sitios de disposición final de RCD cuentan con los permisos ambientales respectivos vigentes				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
El proveedor de unidades sanitarias móviles, cuenta con permisos de vertimientos de residuos líquidos conforme la legislación ambiental aplicable.				
En el periodo del presente informe se realizaron requerimientos por parte de la autoridad ambiental competente.				

Fuente: Ecovias SAS

Indicadores:

Número de Permisos obtenidos / *100% = 0 / 0 * 100 = 0%
Número de permisos requeridos

N° requerimientos cumplidos/ x 100% = 0 / 0 * 100 = 0%
Total de Requerimientos generados por la autoridad ambiental

N° de fuentes de materiales utilizadas para el proyecto /* 100 = 1 / 1 * 100 = 0%
N°de fuentes con permisos ambientales al día

7.4 Manejo Integral de materiales de construcción

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo materiales de construcción en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 50 Verificación cumplimiento ficha manejo de materiales construcción Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios delimitados				
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Todos los vehículos de transporte de materiales cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.				
Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos de los proveedores autorizados.				

Fuente: Ecovias SAS

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"*Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra*".

Todos los materiales provienen de fuentes legales, es decir, que cuentan con permisos ambientales y/o mineros, aspecto que es verificado por la interventoría.

Durante el período se realizaron las siguientes actividades:

- Cubrimiento de materiales pétreos en el frente de obra laguna verde, con el fin de evitar la dispersión de materiales y aumento de la concentración de material particulado en el área de influencia directa. Al respecto cabe mencionar que no todos los acopios de pétreos se encuentran cubiertos, señalizados y demarcados. Algunos cumplen parcialmente con las medidas descritas en las fichas PAC-2.1-04 y PAC-2.4-07, en lo referente a los materiales que generan emisión de partículas como el recebo fueron los que se evidenciaron sin cubrir.
- Se verifico que los vehículos para el transporte de estos materiales cuentan con los documentos vigentes y realizan el cubrimiento de la carga al transportarla para evitar dispersión de materiales en las vías.
- Se evidencia que se mantienen las puertas de descarga de materiales herméticamente cerradas durante el trasporte.
- Se sugiere al contratista que no se almacenen materiales cerca de cuerpos de agua o zonas verdes, según se describen en las fichas de manejo ambiental y permisos de ocupación de cauce POC.

- En el periodo se contó con 1 acopio de triturado.
- Es importante mencionar que en el periodo se procedió a solicitar al contratista mantener acopios con medidas de manejo ambiental, señalización, cubrimiento y delimitación.

A continuación, se relacionan los proveedores de materiales en el periodo con las respectivas cantidades:

Tabla 51 Relación de Proveedores y cantidades Gaviones 95

CONSOLIDADO DE MATERIAL USADO EN OBRA						
ITEM	**RAZON SOCIAL**	**CATEGORIA**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25						
1	No aplica para el periodo	**Agregados petreo**	No aplica	0	0,000	No aplica para el periodo
TOTAL				**0**	**0**	
may-25						
1	CONSTRITURAR	**Agregados petreo**	Triturado	50	82,44	Res CAR 0407/2022
TOTAL				**50**	**82,44**	
jun-25						
1	No aplica para el periodo	**Agregados petreo**	No aplica	0	0,000	El consorcio no reporto adquisicion de materiale speteos
TOTAL				**0**	**0**	
jul-25						
1	CONSTRITURAR	**Agregados petreo**	Triturado	210	346,26	Res CAR 0407/2022. No se reportan cantidades, puesto que el contratista no ha realziado la entrega del informe respectivo.
			Recebo B200	105	173,13	
TOTAL				**315**	**519,39**	
ago-25						
1	CONSTRITURAR	**Agregados petreo**	Triturado	285	469,92	Res CAR 0407/2022. No se reportan cantidades, puesto que el contratista no ha realziado la entrega del informe respectivo.
			Recebo B200	150	247,33	
1	CANTERA VILLA PAULA MINER GROUP SAS	**Agregados petreo**	Triturado	90	148,40	Res CAR 1334-2002
TOTAL				**525**	**865,65**	
Nota: El valor en toneladas que se relaciona se toma del cuadro de conversion de la SDA						
	PENDIENTE POR CERTIFICADO					

Fuente: Ecovias SAS / Informe Consorcio Gaviones 95

Nota: Las cantidades descritas salen del reporte realizado por el contratista, aunque se aclara que el informe mensual de agosto no ha sido entregado de manera oficial.

Indicadores:

Volumen de insumos utilizados / *100= 525 / 525 * 100 = 0%
volumen de insumos proyectados

Planes de acción implementadas en el periodo / x 100= 0 / 0 * 100 = 0%
planes de acción programados)

Ilustración 40 Manejo de materiales de Construction Gaviones 95 predio identificado como acopio



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

7.5 Explotación de fuentes de materiales

El Consorcio cuenta con proveedores autorizados y todos los materiales provienen de fuentes legales, es decir, que cuentan con permisos ambientales y/o mineros, aspecto que es verificado por la interventoría.

Indicadores:

No. de proveedores que cumplan la normatividad / x 100 = 1/1 * 100= 100 %
No requerimientos reportados por la interventoría

Número de requerimientos por actividades de explotación x 100= 0 / 0 * 100 = 0%
Número de requerimientos presentados

7.6 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para la implementación de señalización en los frentes de trabajo y en el campamento de obra**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 52 Verificación cumplimiento ficha de señalización Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con el respectivo PMT aprobado e implementado				
Los frentes de trabajo cuentan con la señalización preventiva, informativa y de emergencia correspondiente y en buen estado.				
Los elementos de atención de emergencia y control de derrame se encuentran señalizados				
Los acopios de materiales se encuentran señalizados				
Se cuenta con las vallas informativas en obra				

Fuente: Ecovias SAS

A la fecha por parte del contratista de obra se cuenta con la instalación de campamento de obra, se evidencio que se ha implementado a la fecha la señalización preventiva, informativa y de emergencia necesaria, se contempla un plan de manejo de tránsito con un total de 10 señales por frente de obra, el contratista para el periodo procedió a realizar implementación de PMT respectivo.

Durante las jornadas de inspección y seguimiento realizadas en el mes de agosto de 2025 por parte del componente Ambiental de la interventoría se pudo evidenciar que se ha implementado señalización en campamentos móviles en el área. Las actividades ejecutadas en el periodo básicamente corresponden a replanteo topográfico, excavación para filtro, lleno del mismo y descargue de materiales, se tomó el respectivo registro fotográfico, el cual es presentado a continuación:

Ilustración 41 Actividades en obra Gaviones 95



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- ✓ **PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO**


El Contratista cuenta con la aprobación de los Planes de Manejo de Tránsito para la ejecución de las actividades de obra, de acuerdo con los seguimientos realizados, se evidenció que cuentan con señalización vertical móvil instalada en el frente activo la cual costa de 10 por tramo como se muestra en la imagen 5, los auxiliares cuentan con los elementos necesarios en cuento a dotación y EPP además radios de comunicación y chalecos reflectivos.

Ilustración 42 PMT Implementado Laguna Verde Gaviones 95



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Imagen 5 Plano de PMT aportado Consorcio Gaviones

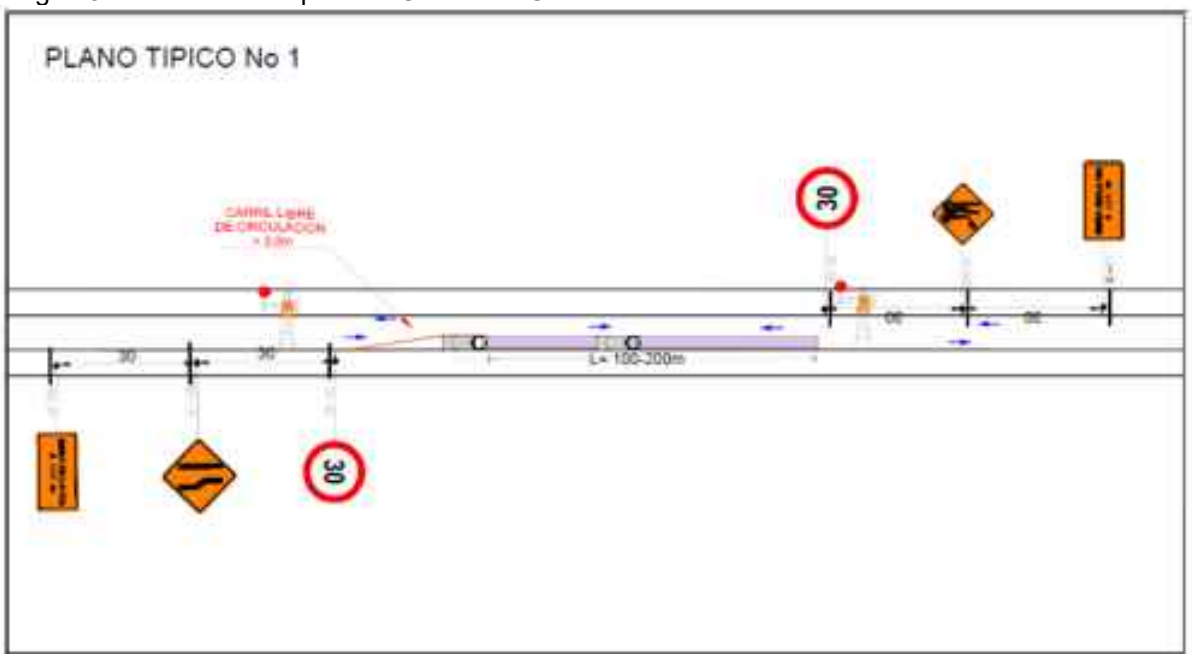

Fuente Ecovias

Indicadores:

No de Frentes de obra señalizados adecuadamente x100= 1/ 1 * 100 = 100%
No total de Frentes de obra

No de Señales instaladas x100%= 8 / 8 * 100 = 100%
No de Señales requeridas en el pmt

7.7 Manejo y disposición final de escombros y RCD

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición de residuos de construcción y demolición RCD en los frentes de trabajo**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 53 Verificación cumplimiento ficha manejo de RCD Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Los frentes de trabajo cuentan con los acopios RCD delimitados				
Los acopios se encuentran cubiertos con un material impermeable				
Los RCD se evacuan hacia sitio de disposición en el tiempo indicado en el PAGA				
Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.				
Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.				
Todos los sitios de disposición cuentan con permisos ambientales vigentes				
Se cuenta con todos los certificados disposición de residuos de construcción y demolición RCD				

Fuente: Ecovias SAS

En cumplimiento de la Resolución 1257 de 2021, el contratista en el periodo realizó disposición de residuos de construcción y demolición RCD en el periodo. Igualmente procedió a adecuar los acopios respectivos y acopiar temporalmente los RCD en estos lugares, al respecto se solicitó que estos deben permanecer con las medidas de manejo ambiental respectivas y que estos lugares deben emplearse exclusivamente para acopio de RCD mas no para conformación de estos residuos en estas áreas, todos los residuos de excavación deben ser llevados a sitio de disposición final autorizado, de igual manera se requiere que no se implementen acopios en terrenos con pendientes, que puedan generar deslizamientos, lo anterior debido a que se evidenciaron acopios en las abscisas K1+220 y K 1+740 cuyas características del terreno son con pendientes que dificultan el retiro de estos materiales posteriormente, al respecto en comités de obra No 55, 56, 57 y 58 se solicitó al contratista garantizar el retiro de estos materiales de excavación actividad a la cual se realiza seguimiento por parte de la interventoría. De igual manera es importante mencionar que se remitió el oficio 186-798 cuyo asunto fue observaciones en cuanto a los acopios activos de RCD en el periodo.

Como recomendación de parte de interventoría se sugiere que los acopios se ubiquen en terreno firme y nivelado, que evite derrames o deslizamientos; Lejano de fuentes hídricas, drenajes y áreas de interés ambiental; en caso de almacenamiento en zonas con pendientes, se deben realizar obras de estabilización para evitar deslizamientos y erosión; Prohibido el depósito sobre áreas verdes, cuerpos de agua o zonas no autorizadas; No afectar la vegetación o fauna silvestre del entorno; El área de acopio debe estar claramente delimitada, señalizada y controlada para prevenir el acceso no autorizado y garantizar seguridad.

Para la disposición de escombros se emplea un sitio de disposición que cuenta con los debidos permisos ambientales vigentes, quien emite el certificado respectivo por las cantidades gestionadas en este sitio. El contratista lleva un registro de las cantidades generadas y dispuestas en el periodo.

Para el periodo del presente informe el contratista de obra realizo disposición de materiales de RCD en sitio autorizado, no se reporta cantidad debido a que el contratista no ha entregado informe mensual por tal razón no se cuenta con este volumen retirado consolidado, los demás residuos permanecen acopiados en obra para su retiro posteriormente. En cumplimiento de la Resolución 1257 de 2021, el contratista remite los soportes (certificados) de disposición final de RCD en los informes mensuales respectivos; el material producto de la excavación es entregado a la empresa Cemex, la cual cuenta con autorización ambiental para hacer el manejo y disposición final de RCD.

A continuación, se presenta la relación de material dispuesto en el periodo con el fin de llevar la trazabilidad respectiva.

Tabla 54 Relación de material RCD dispuesto Gaviones 95

CONSOLIDADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION					
ITEM	**SITIO DE DISPOSICION**	**MATERIAL**	**CANTIDAD (M3)**	**CANTIDAD (TON)**	**PERMISO AMBIENTAL**
abr-25					
1	CEMEX	No aplica para el periodo	0	0	Resolucion SDA No 1280 – 2017. Resolucion ANLA No 1506 – 2006 y No 1480 – 2014
may-25					
1	CEMEX	No aplica para el periodo	0	0	Resolucion SDA No 1280 – 2017. Resolucion ANLA No 1506 – 2006 y No 1480 – 2014
TOTAL			**0**	**0,00**	
jun-25					
1	CEMEX	No aplica para el periodo	0	0	Resolucion SDA No 1280 – 2017. Resolucion ANLA No 1506 – 2006 y No 1480 – 2014
TOTAL			**0**	**0,00**	
jul-25					
1	CEMEX	Exacavacion	150	247,3275	Resolucion SDA No 1280 – 2017. Resolucion ANLA No 1506 – 2006 y No 1480 – 2014
TOTAL			**150**	**247,33**	
ago-25					
1	CEMEX	No se reportan cantidades, puesto que el contratista no ha realizado la entrega del informe respectivo.	0	0	Resolucion SDA No 1280 – 2017. Resolucion ANLA No 1506 – 2006 y No 1480 – 2014
TOTAL			**0**	**0,00**	

Fuente: Ecovias SAS /Informe Gaviones 95

Nota: No se reportan cantidades de residuos de excavación RCD para el mes de agosto, debido a que el contratista no ha remitido el informe mensual del periodo.

Indicadores:

$$\%\ Disposicion\ de\ RCD = \frac{\text{volumen}\ de\ RCD\ dispuestos\ durante\ el\ periodo}{\text{volumen}\ de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo} \times 100$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$\%\ Disposición\ de\ RCD = \frac{\text{volumen } de\ RCD \text{ aprovechado } el\ periodo \times 100}{\text{volumen } de\ RCD\ generados\ durante\ el\ periodo}$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Inspecciones realizadas x 100= 0 / 0 * 100 = 100%
Inspecciones programadas

Requerimientos respondidos x100= 0/0 *100= 0%
requerimientos emitidos por autoridades, Interventoría y entidad contratante

Ilustración 43 Acopios de RCD Gaviones 95



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

7.8 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y peligrosos.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo y disposición final de residuos sólidos, convencionales, especiales y peligrosos**.** Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que se cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 55 Verificación cumplimiento ficha manejo de residuos sólidos convencionales Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con puntos ecológicos en sitio y en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO no aprovechables.				
Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO aprovechables.				
Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.				
Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición final de los RESPEL gestionados en el presente mes.				

Fuente: Ecovias SAS

Desde la interventoría se realiza un seguimiento específico a la gestión ambiental realizada por parte del contratista de obra, abarcando de esta manera el manejo de residuos sólidos no aprovechables, aprovechables y de residuos peligrosos durante el periodo correspondiente a cada uno de los informes mensuales

Es importante mencionar que durante el presente periodo por parte de la interventoría se realiza una revisión y/o seguimiento de la generación de residuos (aprovechables, no aprovechables, peligrosos) a través de la verificación en campo y de la jornada de inspección y seguimiento ejecutada en el mes de agosto de 2025.

- **Residuos sólidos Convencionales**

Durante el periodo del presente informe por parte del contratista de obra se informa que se generaron residuos ordinarios ya que se cuenta a la fecha un campamento que funciona como oficina, estos residuos fueron dispuestos y recolectados por el prestador de servicio de aseo de la localidad del Sumapaz (Empresa de Servicios Públicos PROMOAMBIENTAL – E.S.P), servicio de recolección prestado los días miércoles.

Por parte de Interventoría, con el fin de realizar un seguimiento a la generación de residuos se solicitó al contratista la planilla de generación de residuos en el presente mes lo cual se

presenta en la tabla 56 del presente informe.

- ✓ **Puntos Ecológicos**

Durante los recorridos del presente mes realizados por parte de Interventoría se identificó que el punto ecológico instalado en el campamento se encontraba en condiciones adecuadas, se solicitó que estos permanezcan despejados, organizados y requieren mantenerlos con las bolsas respectivas, a continuación, se presenta un registro de lo evidenciado:

.

Ilustración 44 Puntos ecológicos Gaviones 95



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

- **Residuos peligrosos**

Durante el periodo del presente informe no se generaron ni entregaron Residuos Peligrosos - RESPEL al respectivo gestor para su disposición final. Se presenta la tabla 56 donde se relaciona la generación de residuos peligrosos**,** diligenciada por el contratista de obra donde reporta la cantidad de residuos peligrosos generados en el mes de agosto de 2025.

- ✓ **Centro de acopio temporal de residuos peligrosos - respel**

En el periodo no se evidenció un área destinada al acopio de RESPEL ni tampoco se generó este residuo por parte del consorcio.

- **Reporte de Residuos Generados**

En la siguiente tabla a modo de seguimiento se presenta el tipo y la cantidad de residuos generados por el contratista de obra durante el mes de agosto de 2025. El reporte de los residuos generados es verificado durante este mes específicamente a través de las inspecciones realizadas en obra.

Tabla 56 Reporte de residuos generados Gaviones 95

CONSOLIDADO RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS					
PERIODO Mes/Año	**Tipo Residuo/ Cantidad / Unidad de medida**				
	Aprovechables (kg)	**No Aprovechables (Kg)**	**Orgánicos (kg)**	**RESPEL (Kg)**	**TOTAL**
Abril/2025	0	2	0	0	2
Mayo/2025	0	4	0	0	4
Junio/2025	0	6	0	0	6
Julio/2025	0	7	0	0	7
Agosto/2025	0	8	0	0	8
TOTAL	**0**	**27**	**0**	**0**	**27**

Como residuos peligrosos en esta tabla se presenta la cantidad de filtros y elementos contaminados por RESPEL
Fuente: Ecovias

Indicador:
Cantidad de residuos recolectados, separados y dispuestos / x 100= 8 / 8 * 100 = 100%
cantidad de residuos generados (kg/mes).

Volumen de residuos peligrosos certificados / x 100%= 0 / 0 * 100 = 0%
Volumen total de residuos peligrosos generados

7.9 Manejo de aguas superficiales

De acuerdo al desarrollo de las obras fue necesario tramitar ante la autoridad ambiental los permisos de ocupación de cauce que se relacionan a continuación, los cuales fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2025 como último plazo otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, mediante **AUTO DRBC No. 01256000051 de 6**

FEB. 2025 y según lo estipulado en la misma Resolución, no se contemplan nuevas ampliaciones.

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de aguas superficiales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 57 Verificación cumplimiento ficha manejo de aguas superficiales Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención.				
Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.				
Se cuenta en obra con punto de lavado de manos.				
Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra por parte de proveedor autorizado.				

Fuente: Ecovias SAS

Por otro lado, durante el mes de agosto, se evidencio que se mantiene el aislamiento con polisombra de las alcantarillas que se encuentran ubicadas en el tramo en intervención laguna verde.

Durante el período no se generaron afectaciones por actividades constructivas a los cuerpos de agua presentes en la zona de influencia del proyecto, y de acuerdo a las actividades de obra realizadas no se requirió agua para las mismas. Sin embargo, se contó con punto de hidratación para el personal, cuyo volumen se reporta a continuación.

Indicador:

Personal:

Volumen de agua suministrado / *100= 40lts / 40 lts* 100 = 100%
Volumen de agua requerido

Actividades de obra:

Volumen de agua suministrado / *100= 0 / 0 * 100 = 0%
Volumen de agua requerido

7.11 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para el manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 58 Verificación cumplimiento ficha manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.				
Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.				
Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.				
Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.				

Fuente: Ecovias

Como parte del cumplimiento a la Resolución 2400 de 1979, se tiene concertado con personal de la comunidad el alquiler de baños de casas cercanas, de lo cual se cuenta con las actas respectivas desarrolladas por el componente social.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las unidades sanitarias usada en obra.

Ilustración 45 Unidades Sanitarias Gaviones 95



Fuente: Componente Ambiental Gaviones 95

- ✓ **KIT DE CONTROL DE DERRAMES**

Durante la jornada de inspección ejecutada en agosto de 2025 se realizó la verificación al kit de derrames presente en el frente de trabajo específicamente ubicado en la carpa, evidenciando que este se encuentra en sitio y en condiciones adecuadas. Además, se realiza la verificación de los elementos del kit de derrames en medio de los recorridos realizados por el Componente ambiental de Interventoría.

Ilustración 46 Kit control de derrames Gaviones 95



Fuente: Componente Ambiental Ecovias /Gaviones 95

Indicador:
N total de baños disponibles x100% = 1 / 1 * 100 = 100%
N de baños requeridos

Volumen de la disposición de los lodos de los baños portátiles certificados: No aplica

N° de mantenimientos realizados / *100= 4 / 4 * 100 = 100%
N° de mantenimientos programados

7.12 Manejo del descapote y cobertura vegetal.

De acuerdo al numeral 5 del **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA**.

"Manejo de vegetación, no aplica para el contrato"

Para el presente período, no se realizaron actividades de descapote de maleza, ni aprovechamiento forestal. Cabe mencionar que para el contrato no se cuenta con ningún tipo de permiso para realizar aprovechamiento forestal.

Según la caracterización ambiental del área del proyecto no se ve afectado ningún ecosistema sensible, sin embargo, por su cercanía a la zona del páramo de Sumapaz y el paso por áreas consideradas sensibles como son cuerpos de agua, se realizan actividades que conlleven a la minimización, control y mitigación de posibles impactos por las actividades del proyecto, lo cual es verificado por la interventoría. En las inducciones al personal se socializa que se encuentra prohibido que los trabajadores extraigan de estos ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales.

Indicador:

Volumen de material aprovechado / *100= 0 / 0 * 100 = 0%
volumen de material retirado

No. áreas sensibles protegidas / *100= 0 / 0 * 100 = 0%
No total de áreas sensibles identificadas

7.13 Protección de fauna en obra

Una de las medidas de manejo implementadas por el contratista para este componente es la sensibilización a los trabajadores lo cual se realiza inicialmente en el proceso de inducción y capacitaciones programadas de manera periódica. De igual manera se implementa en obra para conductores de vehículos respetar los límites de velocidad para disminuir el riesgo de atropellamiento de fauna silvestre. Se socializa que está completamente prohibido la caza o comercialización de especies.

Indicadores:

N° de individuos afectados= 0
N° de individuos rescatados= 0
N° de individuos relocalizados= 0

N° de capacitaciones programadas / *100%= 0 / 0 * 100 = 0%
N° Capacitaciones ejecutadas

7.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio

Durante la jornada de seguimiento se hace una verificación del cumplimiento de la medida de manejo planteada para las actividades de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de instalaciones temporales y sitios de acopio. Dentro de la revisión que hace el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 59 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos de obra y sitios de acopio Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.				
Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
elementos necesarios de aseo personal, ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).	1 baños			
El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias.				
El campamento cuenta con punto ecológico.				
El campamento se encuentra en condiciones adecuadas de aseo y orden.				
El campamento cuenta con señalización respectiva				

Fuente: Ecovias

El contratista de obra cuenta con un campamento de obra en el frente de trabajo Laguna Verde el cual consta de una carpa móvil en la zona cercana a las áreas de intervención, adecuados con los elementos necesarios para la atención de emergencias y elementos para los trabajadores. Durante las jornadas de seguimiento e inspección realizadas por la interventoría en el mes de agosto de 2025, se realizó una verificación de los aspectos del área ambiental en el campamento.

Es importante mencionar que durante el recorrido por el campamento se pudo evidenciar que cuenta con: punto ecológico, kit de emergencia, kit de derrames; como se evidencia en el siguiente registro fotográfico.

Ilustración 47 Campamento Gaviones 95



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

De acuerdo a las inspecciones de campo, se tiene instalado un campamento temporal móvil tipo carpa.

Indicadores:
Inspecciones realizadas / x 100= 1 / 1 * 100 = 100%
Inspecciones programadas

No de requerimientos atendidos x 100%= 1 / 2 * 100 = 50%
No total de requerimientos realizados por la interventoría

7.16 Manejo de Maquinaria, equipo y vehículo

Dentro de la revisión que realiza el componente ambiental de esta interventoría en el presente mes se verifica que el contratista de obra cuente y/o reporte lo mencionado a continuación:

Tabla 60 Manejo Maquinaria, equipo y vehículo Gaviones 95

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Cuenta con Plan de Manejo de Tránsito implementado				
Cuenta con el diligenciamiento de las fichas pre – operacionales de cada uno de los equipos.				
Cuenta con Stiker de identificación				

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA MEDIDA DE MANEJO				
CRITERIO POR VERIFICAR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**N/A**
Se cuenta con certificado de revisión tecnicomecanica de los vehículos según aplique.				
No se evidencia lavado de vehículos en cuerpos de agua.				

Fuente: Ecovias

Dentro del informe de seguridad y salud en el trabajo se encuentran los soportes de los preoperacionales de los equipos empleados y activos en campo.

- ✓ **RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA**

Durante el presente periodo por parte del componente SST y ambiental de la interventoría se hace la respectiva revisión de algunos de los preoperacionales de los vehículos presentes en obra.

Se identificó que, en el presente periodo, el contratista cuenta con los equipos disponibles los cuales se listan a continuación:

Tabla 61 Relación de vehículos Gaviones 95

EQUIPO	PLACA	PIN	Vencimiento Tecnicomecanica
VOLQUETA DOBLETROQUE	ETM925	18203	19/02/2026
CAMION PLATON	TSR567	NO APLICA	13/03/2026

Fuente: Informe Consorcio Gaviones 95

Tabla 62 Relación de maquinaria Gaviones 95

MAQUINARIA			
No.	**EQUIPO**	**MARCA/REFERENCIA**	**MODELO**
1	Minicargador	Caterpillar 236D EGP030	2014
2	Retrocargador	Caterpillar 428F – EGP016	2014
3	Excavadora	Caterpillar	2019

Fuente: Informe Consorcio Gaviones 95

A continuación, se presenta un registro fotográfico de los equipos disponibles:

Ilustración 48 Equipos en obra Gaviones 95



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Indicadores:

N° equipos con certificación técnico mecánico /x 100= 1 / 1* 100 = 0%
Número de equipos empleados

Número de accidentes por causa de equipo o maquinaria/ x 100 = 0 / 0 * 100 = 0%
Número de accidentes en el periodo

No de derrames atendidos/ *100= 0 / 0 * 100 = 0%
No de derrames presentados

6.17 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural.

Durante el período no se realizaron hallazgos de elementos arqueológicos que se tuvieran que reportar ante el ICANH. A la fecha en el área de influencia del contratista de obra, no se presenta ningún hallazgo arqueológico fortuito, por lo que no se ha hecho necesario implementar esta medida de manejo ambiental. En el momento en el que se genere un hallazgo se reportará en el informe respectivo tanto de obra como de interventoría y se hará el seguimiento correspondiente.

8. GESTION REALIZADA POR LA INTERVENTORIA

A continuación, se describen las actividades desarrolladas por la interventoría en desarrollo del contrato 161 de 2022 durante el periodo de informe con el fin de verificar y realizar seguimiento a las actividades propuestas y ejecutadas por los contratistas.

- Recorridos de obra a cada uno de los tramos en intervención
- Seguimiento a actividades realizadas por el componente ambiental de la entidad ejecutora.
- Seguimiento a actividades desarrolladas por el componente ambiental del Consorcio Estabilización Vial.
- Seguimiento a actividades desarrolladas por el componente ambiental del Consorcio Gaviones 95
- Solicitud y Revisión de informes mensuales contratistas (Consorcio Estabilización Vial y Consorcio Gaviones 95 y Entidad Ejecutora UAERM
- Verificación correcta implementación y cumplimiento de las medidas de manejo ambiental propuestas en el PAGA.
- Revisión documentos de vehículos (tecnicomecanica).
- Verificación de orden y aseo en el campamento y frentes de obra
- Verificación permanencia en campamento y frentes de obra del kit de atención de emergencias (camilla, botiquín, extintor y kit de atención de derrames).
- Seguimiento en obra de permanencia y mantenimiento de puntos ecológicos en los frentes de obra.
- Verificación en obra mediante los recorridos realizados del cumplimiento de las medidas de manejo ambiental para los acopios de RCD y materiales pétreos en cada uno de los frentes de obra.
- Verificación de la permanencia en cada frente de obra de unidades sanitarias necesarias para el personal de obra.
- Verificación permanencia en obra de la señalización preventiva, informativa y reglamentaria necesaria.
- Inspecciones de áreas en campo
- Revisión de registros de capacitación
- Revisión de certificaciones de proveedores de materiales
- Revisión de certificaciones de disposición de residuos de construcción y demolición RCD.
- Acompañamiento a capacitaciones en sitio.
- Verificación de la correcta disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos.
- La interventoría realizo un registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el periodo con el fin de evidenciar la gestión, avances, desarrollo e implementación del Cronograma de actividades y manejo ambiental en obra.
- Estructuración de oficios para la Entidad Ejecutora, Consorcio Estabilización y Consorcio Gaviones 95
- Participación en comités integrales de seguimiento

- Acompañamiento a reuniones con la comunidad
- Desarrollo de recorridos y mesas de trabajo con los profesionales ambientales de la entidad ejecutora y contratistas.
- Elaboración de informes semanales y revisión de los informes entregados por los contratistas y Entidad Ejecutora UAERM
- Revisión de informes mensuales informes entregados por los contratistas y Entidad Ejecutora UAERM
- Elaboración de informes mensuales de gestión del componente ambiental de interventoría
- Diligenciamiento de bitácoras
- Realización de la Calificación mensual a los contratistas y Entidad Ejecutora UAERM.

A continuación, se presenta un registro fotográfico de la asistencia a comités.

Ilustración 49 participación en comités integrales



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 50 participación en comités integrales



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Ilustración 51 Recorridos de obra



Fuente: Componente Ambiental Ecovias

Respecto al estado de los informes entregados por los contratistas y la entidad ejecutora UAERM en la siguiente tabla se presenta una relación de la aprobación de estos:

Tabla 63 Relación de aprobación informes y PAGA

FECHA	CONSECUTIVO	NUMERO Y PERIODO DE INFORME	ESTADO
INFORMES UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL UAERM			
16/06/2025	186-1-704	Aprobación PAGA V4	Aprobado
14/12/2023	186-1-414	Inf No 1 periodo 17 al 31 julio de 2023	Aprobado
14/12/2023	186-1-414	Inf No 2 periodo 1 al 31 agosto de 2023	Aprobado
14/12/2023	186-1-414	Inf No 3 periodo 1 al 30 septiembre de 2023	Aprobado

FECHA	CONSECUTIVO	NUMERO Y PERIODO DE INFORME	ESTADO
14/12/2023	186-1-414	Inf No 4 periodo 1 al 31 octubre de 2023	Aprobado
14/12/2023	186-1-414	Inf No 5 periodo 1 al 30 noviembre de 2023	Aprobado
17/05/2024	186-1-584	Inf No 6 periodo 1 al 31 diciembre de 2023	Aprobado
17/05/2024	186-1-584	Inf No 7 periodo 1 al 31 enero de 2024	Aprobado
17/05/2024	186-1-584	Inf No 8 periodo 1 al 29 febrero de 2024	Aprobado
24/04/2024	186-1-576	Inf No 9 periodo 1 al 31 marzo de 2024	Aprobado
17/07/2024	186-1-618	Inf No 10 periodo 1 al 30 abril de 2024	Aprobado
01/07/2025	186-1-731	Inf No 11 periodo 1 al 30 abril de 2025	Aprobado
09/06/2025	186-1-693	Inf No 12 periodo 1 al 31 mayo de 2025	Observado
11/07/2025	186-1-748	Inf No 13 periodo 1 al 30 junio de 2025	Observado
14/08/2025	186-1-813	Inf No 14 periodo 1 al 31 julio de 2025	Observado
FECHA	**CONSECUTIVO**	**NUMERO Y PERIODO DE INFORME**	**ESTADO**
INFORMES CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL CEV			
28/05/2025	186-1-679	Aprobación PAGA V5	Aprobado
27/06/2025	186-1-725	Inf No 1 periodo 18 al 31 julio de 2022	Aprobado
27/06/2025	186-1-725	Inf No 2 periodo 1 al 31 agosto de 2022	Aprobado
27/06/2025	186-1-725	Inf No 3 periodo 1 al 30 septiembre de 2022	Observado
27/06/2025	186-1-725	Inf No 4 periodo 1 al 31 octubre de 2022	Aprobado
27/06/2025	186-1-725	Inf No 5 periodo 1 al 30 noviembre de 2022	Aprobado
27/06/2025	186-1-725	Inf No 6 periodo 1 al 31 diciembre de 2022	Aprobado
27/06/2025	186-1-725	Inf No 7 periodo 1 al 31 enero de 2023	Aprobado
27/06/2025	186-1-725	Inf No 8 periodo 1 al 28 febrero de 2023	Aprobado
27/06/2025	186-1-725	Inf No 9 periodo 1 al 31 marzo de 2023	Aprobado
27/06/2025	186-1-725	Inf No 10 periodo 1 al 13 abril de 2023	Aprobado
08/03/2024	186-1-513	Inf No 11 periodo 1 al 31 octubre de 2023	Aprobado
08/03/2024	186-1-513	Inf No 12 periodo 1 al 30 noviembre de 2023	Aprobado
09/04/2024	186-1-554	Inf No 13 periodo 1 al 31 diciembre de 2023	Aprobado
16/07/2024	186-1-616	Inf No 14 periodo 1 al 31 enero de 2024	Aprobado
18/06/2025	186-1-709	Inf No 15 periodo 1 al 29 febrero de 2024	Aprobado
28/05/2025	186-1-671	Inf No 16 periodo 1 al 31 marzo de 2024	Aprobado
22/05/2025	186-1-700	Inf No 17 periodo 1 al 16 abril de 2024	Aprobado
27/05/2025	186-1-672	Inf No 18 periodo 1 al 30 abril de 2025	Aprobado
24/06/2025	186-1-712	Inf No 19 periodo 1 al 31 mayo de 2025	Aprobado
25/07/2025	186-1-765	Inf No 20 periodo 1 al 30 junio de 2025	Aprobado
27/08/2025	186-1-831	Inf No 21 periodo 1 al 31 julio de 2025	Aprobado
FECHA	**CONSECUTIVO**	**NUMERO Y PERIODO DE INFORME**	**ESTADO**
INFORMES CONSORCIO GAVIONES 95			
16/06/2025	186-1-705	Aprobación PAGA V3	Aprobado
27/06/2025	186-1-726	Inf No 1 periodo 1 al 31 agosto de 2022	Aprobado
27/06/2025	186-1-726	Inf No 2 periodo 1 al 30 septiembre de 2022	Aprobado
27/06/2025	186-1-726	Inf No 3 periodo 1 al 31 octubre de 2022	Aprobado
27/06/2025	186-1-726	Inf No 4 periodo 1 al 30 noviembre de 2022	Aprobado

FECHA	CONSECUTIVO	NUMERO Y PERIODO DE INFORME	ESTADO
27/06/2025	186-1-726	Inf No 5 periodo 1 al 31 diciembre de 2022	Aprobado
27/06/2025	186-1-726	Inf No 6 periodo 1 al 31 enero de 2023	Observado
27/06/2025	186-1-726	Inf No 7 periodo 1 al 29 febrero de 2024	Observado
27/06/2025	186-1-726	Inf No 8 periodo 1 al 31 marzo de 2024	Observado
27/06/2025	186-1-726	Inf No 9 periodo 1 al 13 abril de 2023	Aprobado
27/06/2025	186-1-726	Inf No 10 periodo 1 al 29 febrero de 2024	Aprobado
27/06/2025	186-1-726	Inf No 11 periodo 1 al 31 marzo de 2024	Observado
27/06/2025	186-1-726	Inf No 12 periodo 1 al 16 abril de 2024	Observado
24/06/2025	186-1-714	Inf No 13 periodo 1 al 30 abril de 2025	Aprobado
24/06/2025	186-1-715	Inf No 14 periodo 1 al 31 mayo de 2025	Aprobado
21/08/2025	186-1-817	Inf No 15 periodo 1 al 30 junio de 2025	Aprobado

De igual manera se presenta una relación de la correspondencia enviada y recibida en el periodo.

Tabla 64 Relación de correspondencia enviada y recibida

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITIDA A**
06/08/2025	186-1-790	Respuesta comunicado 20251920096501. Observaciones componente Ambiental y SST	Entidad Ejecutora UMV
06/08/2025	186-1-791	Respuesta comunicado 20251920096631 Implementación de acopios con medidas de manejo ambiental	Entidad Ejecutora UMV
13/08/2025	186-1-808	Respuesta comunicado 20251920103011. Observaciones componente ambiental y SST	Entidad Ejecutora UMV
14/08/2025	186-1-813	Respuesta correo electrónico del día 06/08/2025. Observaciones Informe Ambiental 14 julio 2025.	Entidad Ejecutora UMV
22/08/2025	186-1-820	Respuesta comunicado 20251920102621. Solicitud información, diligenciamiento matrices soporte de gestión de RCD en el proyecto.	Entidad Ejecutora UMV
26/08/2025	186-1-833	Observaciones componente ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo SST, UMV.	Entidad Ejecutora UMV
01/08/2025	186-1-785	Observaciones componente ambiental frentes de obra Unión Tunales y San	Consorcio Estabilización Vial.

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITIDA A**
		Antonio II	
06/08/2025	186-1-766	Respuesta comunicado CEV/22-449. Informe del componente ambiental No 3 V2 -Aval	Consorcio Estabilización Vial.
13/08/2025	186-1-805	Solicitud de diligenciamientos formatos RCD enviados por la Unidad de mantenimiento vial UMV, Radicado No. 20251920102621.	Consorcio Estabilización Vial.
13/08/2025	186-1-809	Respuesta comunicado CEV/22-455. Observaciones Informe del componente ambiental No 21 V1	Consorcio Estabilización Vial.
27/08/2025	186-1-831	Respuesta comunicado CEV/22-459. Informe del componente Ambiental No.21 V02-Aval	Consorcio Estabilización Vial.
06/08/2025	186-1-789	Respuesta comunicado D-43- 2025-37. Observaciones informe ambiental No 15-V2	Consorcio Gaviones 95
07/08/2025	186-1-798	Observaciones Componente ambiental Acopios temporales de RCD- G95.	Consorcio Gaviones 95
13/08/2025	186-1-807	Solicitud de diligenciamientos formatos RCD enviados por la Unidad de mantenimiento vial UMV. Radicado No. 20251920102621.	Consorcio Gaviones 95
21/08/2025	186-1-817	Respuesta comunicado D-49- 2025-37. Entrega informe ambiental No 15 junio de 2025 V2 -Aval.	Consorcio Gaviones 95
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITIDA POR**
08/08/2025	20251920102621	Solicitud de información, diligenciamiento matrices soporte de gestión de RCD en el proyecto.	Entidad Ejecutora UMV
08/08/2025	20251920103011	Respuesta a comunicación No. 186-1-650 – radicado UAERMV No 20251120068562, relacionado con observaciones a los Componentes	Entidad Ejecutora UMV

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**REMITIDA A**
		Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo – SST.	
05/08/2025	CEV/22-455	Informe Mensual Ambiental No 21 – V1	Consorcio Estabilización Vial
20/08/2025	CEV/22-459	Respuesta oficio 186-1-809 Informe ambiental No 21 V2	Consorcio Estabilización Vial
12/08/2025	D-49-2025-37	Respuesta comunicado 186-1-789. Observaciones informe ambiental No 15 V2.	Consorcio Gaviones 95

Fuente: Ecovias

A continuación, se presenta un listado de todos los documentos complementarios que hacen parte del informe mensual No. 31 de actividades de interventoría para dar cumplimiento a satisfacción del seguimiento, control y verificación a la ejecución de los contratos de obra 478/479 de 2022 y el de la Entidad Ejecutora UAERMV.

A No 1 Registro de Bitácora

A No 2 Calificaciones mensuales (listas de chequeo)

A No 3 Actas componente ambiental

A No 4 Correspondencia enviada / Correspondencia Recibida

9. CONCLUSIONES

- Durante el periodo de este informe, la UMV cuenta con tres campamentos de obra ubicados en cada uno de los frentes de intervención: La unión-tunales; Capitolio y San Antonio.
- Durante el periodo de este informe, el Consorcio Estabilización vial cuenta con dos campamentos de obra ubicados en cada uno de los frentes de intervención: La unión-tunales y San Antonio.
- Durante el periodo de este informe, el Consorcio Gaviones 95 cuenta con un campamento de obra ubicado en el frente de intervención laguna Verde.
- En el periodo no se realizó disposición de Residuos Peligrosos de parte de ningún contratista ni entidad Ejecutora UMV.
- Interventoría llevó a cabo jornadas de inspección y seguimiento en el frente de obra y campamentos de la UMV, Consorcio Estabilización vial y consorcio Gaviones 95 con el fin de verificar las actividades del componente ambiental.
- Interventoría realiza la verificación de los vehículos y maquinaria presentes en obra

y el diligenciamiento de los preoperacionales de estos equipos, junto con el componente SST.

- Se realiza el seguimiento y acompañamiento a diferentes actividades realizadas por la entidad ejecutora y Contratistas en cada uno de los frentes de obra activos en el periodo.
- Se requirió a la Entidad Ejecutora para que implemente todas las medidas de manejo ambiental descritas en las fichas PAGA en cuanto a acopios de materiales pétreos y RCD.
- Se solicito a la Entidad ejecutora evacuar los residuos de excavación depositados en acopios temporales hacia sitios de disposición final autorizados en el menor tiempo posible con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la ficha de manejo respectiva, lo anterior debido a que en el periodo se evidencio acopios en obra que superaban el tiempo máximo permitido que son 72 horas.
- Se requirió al Consorcio Estabilización vial para que implemente todas las medidas de manejo ambiental descritas en las fichas PAGA en cuanto a acopios de materiales pétreos y RCD.
- Se verifico el diligenciamiento de la planilla de control de residuos sólidos, registro que es fundamental para el cálculo de los indicadores de cumplimiento descritos en la ficha de manejo ambiental respectiva de parte de la entidad ejecutora, respecto a los contratistas se genera una tabla dentro del informe donde se discrimina las cantidades de residuos generados.
- La Entidad ejecutora y Contratistas cuentan con el Plan de adaptación de la guía ambiental PAGA avalado por la interventoría.
- Interventoría llevó a cabo jornadas de inspección y seguimiento en los frentes de obra y campamentos de la UMV, Consorcio Estabilización Vial y Consorcio Gaviones con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas de manejo del componente ambiental.
- Durante el periodo del presente informe, Interventoría se encargó de verificar la gestión de los residuos sólidos generados en el frente de obra y el campamento de los contratistas y entidad ejecutora.
- Para el periodo se requirió a la entidad ejecutora mejorar en cuanto a las medidas de manejo ambiental que se toman durante la actividad de suministro de combustible ya que se evidenciaron derrames en los frentes San Antonio, tunales y Capitolio.
- Durante el periodo se evidencio implementación de PMT de parte de la entidad ejecutora UMV, Consorcio Estabilización vial y Consorcio Gaviones 95 en los tramos en intervención a su cargo.
- En el periodo se registraron derrames de combustibles en el tramo Tunales, Capitolio y San Antonio a cargo de la entidad ejecutora UMV una vez informados se tomaron las medias respectivas necesarias para recolectar por medio de material absorbente y retiro del terreno contaminado, almacenando los RESPEL para realizar la disposición final por medio de gestor autorizado, en cuanto a los contratistas no

se evidenciaron derrames en el periodo.

- Se evidencio el cumplimiento de los cronogramas de capacitación presentados, los soportes de esta actividad se encuentran en el informe de la entidad ejecutora y cada uno de los contratistas del presente periodo.
- Respecto al estado de los informes de la entidad ejecutora UMV el informe No 12 de mayo de 2025 se encuentra con observaciones comunicado 186-1-693, este no ha sido entregado con los ajustes requeridos. El informe No 13 de junio de 2025 se encuentra con observaciones comunicado 186-1-748, este no ha sido entregado con los ajustes requeridos. El informe No 14 de julio de 2025 se encuentra con observaciones comunicado 186-1-813, este no ha sido entregado con los ajustes requeridos.
- En cuanto a los informes del Consorcio estabilización vial, el informe No 21 de julio de 2025, se encuentra aprobado por parte de interventoría.
- En relación a los informes del Consorcio Gaviones 95, el informe No 15 V2 de junio de 2025 se encuentra aprobado comunicado 186-1-817. El informe No 16 de julio de 2025 y No 17 de agosto de 2025 no han sido entregados por el Consorcio.

A. 1
REGISTRO DE BITACORA

BITACORA ENTIDAD EJECUTORA UMV

Yesenia HR
01-08-2025

RAFAEL D. PEÑA F
UMV

Se realiza participación en comite integral con el fin de realizar seguimiento a la actividades desarrollods por el componente se desciben los compromisos y se desarrolla otros temas los cuala quedan registrados en el acta respectiva

Yerenia HR Jessica Paola Vidal T.

RAFAEL PEÑA F.
UMV

02-08-2025.
La Entidad Ejecutora no realizo actividades constructivas en el frente de obra.
Jerente HR. Jessica Paola Vidal T
03-08-2025
La Entidad ejecutora no realizo actividades constructivas en el frente de obra.
Jerente HR. Jessica Paola Vidal T
04-08-2025.
San Antonio! Se evidencia Vibio en Kotolo con fuga, se informo ala Profesional quien tomo las medidas correctivas necesarias. Se evidencia acopio de RCD Kotolo donde adecuaron parte de este material en el sitio, se recomienda. que cuando realicen la clausura del acopio garanticen el retiro de la mayor cantidad de material allí acopiado.
Capitolio: K 3+300 se requiere la adecuación de la polisombra que aisla la alcantarilla y limpieza de esta ya que fueron depositados allí material de Resaca, se evidencio que colocaron un entibado para evita más caido del material a la alcantarilla.
Jerente HR. Jessica Paola Vidal T.
05-08-2025.
tunales: Se evidencia implementación de acopio sobre costado de Via en tramo 5, se recomienda evacuarlo en el menor tiempo posible y dejarlo delimitado y cubierto. Acopios de Petreo en la Unión requiere mejora delimitación y para el acopio de RCD adecuar cubrimiento y delimitación. Se evidencia que en el tramo se encuentra haciendo manejo de aguas, limpieza de cunetas, PMT implementado con auxiliares de tráfico. en el frente se evidencian 2 unidades sanitarias, un campamento movil, punto Ecologico y Kit control de derrames, CAPITOLIO: K 3+800 se encuentra un acopio de RCD sin delimitar ni cubrir, se cuenta en tramo con 2 unidades sanitarias portatiles activas, Campamento movil en sitio con punto Ecologico
Jerente HR Jessica Paola Vidal T

Powered by CamScanner

06-08-2025 San Antonio
En recorrido se evidencia retiro de RCD hacia acopio principal K0+040, sin embargo se sugiere recolectar el remanente de residuos de excavación que quedan en los acopios que estan clausurando para dar un correcto aspecto de Orden y aseo en el tramo. En campo se cuenta con los elementos necesarios de emergencia y kit Control de derrames, punto ecologico, punto de acopio de sustancias quimicas, dos Unidades sanitarias moviles con gel antibacterial y PMT correctamente implementado. se Sugiere continuar con el retiro de RCD hacia sitio de disposicion final autorizado ya que hay acopios que superan el tiempo maximo de permanencia en obra. Se evidencian acopios delimitados y cubiertos
Yerenia HR. Jessica Prada Vidal P.
07-08-2025
La Entidad Ejecutora no realizo actividades constructivas en obra
Yerenia HR Jessica Prada Vidal P.
08-08-2025
La Entidad ejecutora no realizo actividades constructivas en los frentes de obra. Participacion en comite Integral.
Yerenia HR Jessica Prada Vidal P.
09-08-2025
La Entidad Ejecutora no realizo actividades constructivas en el frentes de obra
Yerenia HR. Jessica Prada Vidal P.
10-08-2025
La Entidad Ejecutora no realizo actividades Constructivas en el frente de obra
Yerenia HR. Jessica Prada Vidal P.
11-08-2025 Capitolio
se evidenda acopios del K 0+830 con contencion y señalizado y cubierto, K 3+300 acopio de RCD con contencion y cubierto, K 4+105 acopio de RCD delimitado y cubierto esta ubicado al costado de Via, se recomienda

evacuar en el menor tiempo posible hacia sitio de disposicion final autorizado, Acopio K 3+600 de petreo con medidas de manejo ambiental cubierto y delimitado se identifica proteccion de alcantarilla a lo largo del tramo en intervencion. Se recomienda verificar aseo de unidades sanitarias portatiles ya que estan expeliendo olores desagradables. Se cuenta con PMT implementado y dos auxiliares de trafico en sitio. Cuipo dotados con elementos requeridos.

Jovenia HA Jessica Paola Vidal P. 12-08-2025 San Antonio

En recorrido de obra se evidencia que se encuentran realizando actividad de retiro de RCD hacia acopio principal K0+040. Se realiza actividad de instalacion de contencion en el acopio de RCD y Petreo del K2+900, actividad de limpieza de alcantarilla del K 1+420 continua pendiente, se requiere realizar limpieza de la alcantarilla 3+120 la cual se encuentra parcialmente colmatada en el tubo de desague, se evidencian acopios cubiertos, delimitados se sugiere continuar con el retiro de los acopios de RCD que se encuentran a los costados de via hacia acopio principal y de igual manera dar celeridad a la evacuacion de RCD hacia sitio de disposicion final autorizados. La interventoria recibe respuesta de Vales comunicados los cuales se encuentran en revision para dar respuesta. En cuanto al comunicado 20251920102621 la Interventoria realiza tramite de traslado oficial a los dos Contratistas hidraulicos para los fines respectivos lo cual es informado a la UMV, de igual manera se da respuesta de manera oficial a la entidad ejecutora del tramite realizado.

Jovenia HA. Jessica Paola Vidal P. 13-08-2025 Tunales.

En recorrido por el frente de obra se evidencia un acopio de RCD ubicado en el K 1+500 tramo 5 al costado de via, se encuentra con medidas de manejo como es cubrimiento con material impermeable y delimitacion

Powered by CamScanner

con doble cinta, sin embargo se recuerda que este acopio se obstaculiza al costado de via por lo cual se sugiere evacuarlo de este punto en el menor tiempo posible. En cuanto a los acopios de petreos y RCD obtenidos en la Unión se encuentran señalizados y cubiertos sin embargo este RCD lleva en este punto el tiempo maximo permitido en obra por lo cual se requiere su evacuación hacia sitio final autorizado. En el frente en intervención se evidencia protección de alcantarilla con polvombra, permanencia en sitio de Caipa movil, 2 USP y punto de acopio de sustancias quimicas Organizado

Yerenia HR. Jessica Paola Vidal P.
14-08-2025 Capitolio.

En recorrido de obra se evidencia actividad de extendido de fresado, en el sitio se evidencian alcantarilla protegidas acopio de RCD 3+400 delimitado, con retención en la parte posterior, acopio de Petreo 3+600 con medida de manejo, Campamento movil en sitio con punto ecologico y Kit control de derrames, PMT implementado con auxiliares de trafico y señales verticales moviles.

San Antonio: K 3+400 se requiere retiro del RCD que se encuentra a los costados de via, y mantener acopios con medidas de manejo mientras se realiza la evacuación.

Yerenia HR Jessica Paola Vidal P.
15-08-2025

Se realiza participación en comite integral donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente se dexnben los compromisos y se desarrollan otros temas) los cuales quedan registrados en el acta respectiva.

Yerenia HR. Jessica Paola Vidal P.
16-08-2025 Jessica Lagos

La entidad ejecutora no realizo actividades constructivas en los frentes de obra.

Yerenia HR Jessica Paola Vidal P.
17-08-2025.

La entidad ejecutora no realizo actividades constructivas en los

Frentes de obra.
Yerenia HR Jessica Pada Vidal P.
18-08-2025
La entidad ejecutora no realizo actividades constructivas en los Frentes de obra
Yerenia HR Jessica Pada Vidal P.
19-09-2025. Laguna Verde.
Se realizo recorrido con el componente ambiental del CG9S, tecnicos y ingeniero, con el fin de verificar las estructuras hidraulicas que cuentan con POC y que van hacer intervenidas. Se identifican 8 estructuras en el tramo que cuentan con POC, de los cuales solo 4 van hacer intervenidas ubicadas en el ko1625, k1+488, K2+479 y K2+790. Se recomienda realizar la intervencion de las alcantarillas antes del 31 de diciembre del 2025 ya que hasta esta fecha nos otorgo los permisos la CAR.
Yerenia HR Jessica Pada Vidal P.
20-08-2025 Union Tunales
En recorrido por el frente de obra se evidencia acopio de RCDs al costado de la via en el segmento 5, el cual cumple con las medidas de manejo ambental. Sin embargo, se recomienda al inspector de obra evacuarlos para sitio de disposición y el otro material acoplado en el acopio ubicado en el poblado la Unión. Se evidencia Proteccion de alcantarillas en el área de intervencion con polisombra, Cuneta en estado de orden y aseo, Punto ecologico organizado y con sus respectivas bolsas, kit antiderrames y de emergencia completo y Punto de sustancias quimicas organizado y con sus Fichas de seguridad. Manejo de aguas en el segmento 5.
Yerenia HR Jessica Pada Vidal P.
21-08-2025 Toldo.
Se evidencia mantenimiento de las 2 unidades sanitarias por Parte del contratista. Se realizo traslado de 14m³ de RCDs hacia Sitio de disposición final a escombrera. Se ubica campamento organizado, Punto ecologico limpio y con sus respectivas bolsas de basura, kit antiderrames y de emergencia completo y en sitio, PTI correctamente implementado. limpieza del encole y descole de la alcantarilla en el K3+100, quedando Pendiente la limpieza del tubo.
Yerenia HR Jessica Pada Vidal P.

Powered by CamScanner

22-08-2025
Se realizo participacion en comite integral donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente. Se describe los compromisos y desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva
Yesenia HR. Jessica Paola Vidal P.
25-08-2025.
la entidad ejecutora no realizo actividades constructivo en los frentes de obra.
Yesenia HR Jessica Paola Vidal P.
24-08-2025
la entidad ejecutora no realizo actividades constructivas en los frentes de obra
Yesenia HR Jessica Paola Vidal P.
25-08-2025 Capitolio.
En recorrido se evidencia PMT implementado, campamento movil en tramo, punto ecologico organizado, kit control de derrames en sitio, acopio de retal de concreto se solicito delimitar, se encontro que en el acopio de petreos K01835 se encontraba una parte de RCD, se evidencian alcantarillas protegidas del tramo en intervencion
Yesenia HR Jessica Paola Vidal P.
26-08-2025 Tunales.
en el recorrido se sugiere acordar el acopio del K01735 donde se encuentra ubicado la contencion con polisombra, se evidencio retiro de RCD del costado de via K 11500 sin embargo se mantiene un remanente que no fue abarcado, en el frente se encuentra un campamento movil con punto ecologico, Kit control de derrames, punto de acopio de sustancias quimicas y 2 UDP
Yesenia HR Jessica Paola Vidal P.
27-08-2025 San Antonio
En recorrido por el frente de obra se evidencio en el acopio principal de RCD K 0+040 estos de plasticos, los cuales se hace necesario su retiro, de la misma manera a lo largo del tramo de

Powered by CamScanner

encuentran restos de cintas de señalitan y plasticos de los acopios que se han implementado a lo costado de via, por lo cual se solicita generar una jornada para su retiro, en el frente se evidencia cuipeo instalado, el punto ecologico no cuenta con bolsas. K 27+700 se solicita retiro el RCD, K 27+500 colimites acopio de total de Concreto, K 27+350 se evidencia limpieza de alcantarilla, aún permanecen tapada la alcantarilla del K 3+150 y 11+250. En general para todo el frente se ha evidenciado el retiro de RCD sin embargo se solicita continuar con la evacuación de estos residuos de excavación (RCD) para dejar el frente limpio y retirar los remanentes que han quedado en los acopios e iniciar con el retiro de los residuos que se encuentran del K 3+700 hacia mayores.

Yerenia HR Jessica Padilla Vidal P

28-08-2025

Participación en comite integral de obra donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el Componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva. Se realiza recorrido de obra por los frentes de tunales, Capitolio y San Antonio.

Yerenia HR. Jessica Padilla Vidal P.

29-08-2025. Capitolio

Se realiza recorrido donde se evidencia PMT implementado, con señales verticales moviles, dos auxiliares de trafico en sitio, campamento movil en sitio con elementos necesarios, acopios con medida de manejo, se requiere implementar cuerpos de agua que rocen polvos por abastecer

Yerenia HR Jessica Padilla Vidal P

30-08-2025.

La entidad Ejecutora no realiza actividades constructivas en el frente de obra

Yerenia HR Jessica Padilla Vidal P.

31-08-2025

La Entidad ejecutora no realizo actividades constructivas en el frente de obra.

Yerenia HR. Jessica Padilla Vidal

RESIDENTE F
I.N.N.

BITACORA
CONSORCIO
ESTABILIZACION VIAL

01-8-2025 tunales
se realiza Participain en comite integral de obra con el fin de realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se desciben los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva. En el frente de obra se evidencia PMT implementado, caipa delimitada en sitio con kit control de derrames.
Yeyenia HR CEV Lorenabarrera
02-08-2025 San Antonio
El Contratista realiza actividades de orden y aseo en obra
Yeyenia HR. Lorenabarrera
03-08-2025 CEV
El Contratista no desarrollo actividades constructivas en obra
Yeyenia HR. CEV
04-08-2025 San Antonio.
En recorrido se evidencia campamento movil en sitio con punto ecologico, kit control de derrames, se recomienda mejora el punto de acopio de sustancias quimicas ya que el suelo presenta contaminain por combustible, adecuar una estibas para colocar la canecas y demas recipientes, se adiciona jornada de recolección de gravilla y arena en el K2+400 y K2+20.

Powered by CamScanner

se cuenta con PMT implementado y dos auxiliares de tráfico se recomienda mejorar señalización de acopio de RCD de K 5+240.

Yesenia HR. Ccev Lorena Gomez

06-08-2025 Túnales.

En recorrido se recomienda realizar limpieza de vía en el tramo en intervención ya que se evidencia material suelto, se solicita recolectar restos de plástico que se encuentran en el tramo, jornada de adecuación en el área de campamento, RCD Acopiado en este punto sin cubrir y la delimitación esta caída. Kit control de derrames en sitio. y punto ecológico, se recomienda mantener estos elementos despejados.

Yesenia HR. Ccev Lorena Gómez

06-08-2025 San Antonio.

En recorrido se evidencia ejecución de jornada de orden y aseo desde el K 4+600 hacia menores, se recomienda recolectar todos los residuos de plástico, cintas de señalización, maderas, acero, dejar acopios demarcados y cubiertos. En sitio se encuentra capa en elementos requeridos, Kit control de derrames y punto ecológico, de igual manera se recomienda la señalización de obras hidráulicas en ejecución, tubería y acero acopiado al lado de vía. PMT implementado con auxiliares de tráfico en sitio. Se informa que el contratista realizo entrega de informe No 21 del periodo de Julio de 2025. el cual se encuentra en revisión por parte de interventoría.

Yesenia HR. Ccev Lorena Gomez

07-08-2025.

El Contratista no desarrollo actividades Constructivas en los frentes de obra.

Yesenia HR. Ccev Lorena Gomez

08-08-2025

El contratista no desarrollo actividades constructivas en los frentes de obra. Participación en comité integral de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas,

Powered by CamScanner

por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva.
Yesenia HR. CEV Lorena Gama
09-08-2025
El contratista no realizo actividades constructivas de obra en los frentes de trabajo.
Yesenia HR. CEV Lorena Gama
10-08-2025
el contratista no realizo actividades constructivas en los frentes de obra
Yesenia HR CEV Lorena Gama
11-08-2025 tunales.
En recorrido se evidencia PMT correctamente implementado con señales verticales moviles en sitio y dos auxiliares de trafico en el frente de obra, camper movil en el tramo en intervención con elementos de emergencia completos, kit control de derrames y punto ecologico, se recomienda mantener con medidas de manejo los materiales petreos acopiados en el tramo CEV Lorena Gama
En cuanto al informe No 21, la revisión arroja observaciones las cuales seran remitidas de manera oficial al contratista para la atención de las mismas.
Yesenia HR CEV Lorena Gama
12-08-2025 San Antonio
En recorrido por el frente de obra se evidencia que los acopios de materiales petreos requieren adecuar cubrimiento y delimitación, en general todos. el acopio principal de RCD del K5+400 requiere que se cubra completamente. Se Sugiere recolectar el RCD producto de la demolicion de encole del K 4+200 o se proceda a delimitar, de igual manera se recomienda desarrolla una jornada supervisada de orden y aseo del K5+500 hacia menores recolectando acero, plastico, residuos de cinta de Señalizacion, bolsas de cemento, y demas residuos presentes en el area, respecto al

PMT se encuentra implementado, se recomienda colocar una caipa movil en sitio donde se ubiquen los elementos basicos en obra Kit control de derrames, Kit de emergencia, punto ecologico, hidratacion y demas señalizacion respectiva.
Agencia HR. Leon Lorena Gomez
13-08-2025 tunales.
Se realiza recorrido en el tramo en intervencion donde se evidencia PMT implementado, 2 auxiliares de trafico, se solicita limpieza de via del tramo en ejecucion ya que se evidencia material suelto y a la salida del punto de Acopio de material se observa via con material de excavacion. llegada de material recebo, el cual proceden a cubrir se recomienda dejar con medida de manejo ambiental, en el sitio permanece caipa movil, punto ecologico y Kit control de derrames, se recomienda realizar el ataque directo del material en las cunetas ya terminadas, generar jornada de orden y aseo al finalizar la actividad de fundida.
Agencia HR Leon Lorena Gomez
14-08-2025 San Antonio.
Se realiza recorrido de obra donde se evidencian acopio de petreos delimitados y cubiertos los del K 4+200, K4+100 K 3+800, se sugiere ubicar la caipa movil donde se ubiquen los elementos de emergencia, Kit control de derrames, punto de hidratacion, PMT implementado, se sugiere realizar jornada de orden y aseo en el tramo del 5+400 en adelante, Verificar orden en el K 2+300 y 1+500.
Agencia HR. Leon Lorena Gomez
15-08-2025
Participacion en Comite integral de obra donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva, el Contratista informa que se encuentra diligenciando los formatos solicitados por la UMV de RCD.
Agencia HR. Leon Lorena Gomez

16-08-2025 funales
el Contratista realizo jornada de orden y aseo en el tramo en intervencion
Yerenia HR. Lorena Gomez CEV
17-08-2025
El Contratista no desarrollo actividades constructivas en el frente de obra.
Yerenia HR Lorena Gomez CEV
18-08-2025
El Contratista no desarrollo actividades constructivas en el frente de obra.
Yerenia HR. Lorena Gomez CEV
19-08-2025. San Antonio
En recorrido de obra se evidencia PMT correctamente implementado, con señales verticales moviles, aun no se cuenta con campamento movil, donde ubican los Kit de emergencia, Control de derrames, punto ecologico, punto de hidratacion y demas elementos de obra, se sugiere dar prioridad a este tema. Con respecto a la acopios se evidencian delimitados, se recomienda siempre mantenerlos con las medidas de manejo ambiental respectivas.
Yerenia HR. Lorena Gomez CEV
20-08-2025 funales.
En recorrido se solicito dejar materiales petreos cubiertos y señalizados (Glavilb), acopio de RCD de igual manera mantener con medidas de manejo, estos dos acopios se encuentran en el tramo en intervencion, al finalizar jornada el CEV envio registro fotografico de las actividades realizadas al igual que de la limpieza de la via. En la Caja movil se evidencia permanencia de Kit Control de derrames y punto ecologico con bolsas respectivas, se recomienda almacenar bolsas roja que contienen bolsas de Cemento con medidas de manejo ambiental, se recomienda continuar con la actividad de Atraque de cunetas con material de excavacion.
Yerenia HR. Lorena Gomez CEV

Powered by CamScanner

27-08-2025 San Antonio.
En recorrido se evidencio retiro de material arbustivo (Bimbalos) de la abscisa 4+808, los restos vegetales fueron dejados a borde de via, se solicito retirar y dar manejo adecuado, de igual manera se recomendo aislar el area de intervencion para evita afectacion a Vegetacion adicional que no lo requiera. y levanto el acta respectiva antes de continua con dichos trabajos.
Se recomendo mantener acopios con medida de manejo ambiental. Se implementa acopio de recebo en la curva y de Grafilla en el K 3+800, se recomienda dejar acopio delimitado. Se Sugiere implementar de manera Urgente la Capa movil para el tramo.
Yerenia HR. [signature] [signature] Lorena Gomez CEV

22-08-2025
Participacion en comite integran de obra donde se realiza seguimiento a la actividades desarrolladas por el Componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva.
Yerenia HR. [signature] [signature] Lorena Gomez CEV
23-08-2025.
El Consorcio no desarrollo actividades constructivas en los frentes de obra
Yerenia HR [signature] [signature] Lorena Gomez CEV
24-08-2025
El Contratista no desarrollo actividades constructivas en los frentes de obra
Yerenia HR. [signature] Lorena Gomez
25-08-2025 San Antonio.
En el tramo se evidencia implementacion de Capa movil, se requiere que los elementos de Emergencia Kit control de derrames, punto ecologico se localicen en un lugar Visible y no cubierto con plastico, se requiere adicion de algunos acopios como el del K 4+200, 4+350, RCD: 5+250 y 4+20

se requiere genera una jornada de Orden y aseo en el frano del 3+600 al menores; retirar señaliza cano de acopio ya clausurados ejem K 2+500.
Yeseria HR. CEV Lorena Gomez
26-08-2025 Turaleo.
Acopio 0+870 se requiere adecuar y retirar letreros, K 1+100 se encuentra un acopio de RCD que requiere adecuacion, K 1+700 acopio requiere cubrimiento. K2+050 el acopio requiere adecuacion ya que se encuentra muy cerca de una alcantarilla. se requiere implementar proteccion y retirar bolsas rojas, se encuentra el PMT implementado de manera correcta con 2 unidades de trafico, Kit de emergencia y control de derrames en tramo.
Yeseria HR. CEV Lorena Gómez
27-08-2025 San Antonio
K 3+220 realizaron excavacion para construccion de alcantarillas, donde se evidencia retiro de material vegetal, se requiere adecuar el area, colocar una polisombra para aislar y dar un adecuado manejo a los individuos arboreos presentes en el area, tener precaucion con raices y ramas. K 5+25 acopio de RCD requiere adecuacion y limpieza de via, se requiere jornada de orden y aseo el K 5+700 hacia menores, K 4+200 acopio de RCD requiere adecuacion y limpieza de via, K 3+800 se solicita recolectar restos de cinta de señalizacion y plasticos. K 1+400 se requiere limpieza de alcantarilla para facilitar el flujo normal del agua que se encuentra en el canal, K 2+500 adecuar este acopio de pretreo debe clausurado retirar la señal informativa y recoger cinta de señalizacion que se encuentren en arbustos, K 2+250 recolectar restos de amares plasticos, en general se requiere mantener medidas de manejo ambiental en todos los acopios del tramo
Yeseria HR. CEV Lorena Gómez

28-08-2025
Participación en comite integral donde se describen las actividades desarrolladas por el componente, se realiza seguimiento a los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectivo. previo al comite se desarrolla recorrido por el frente de obra tunales y San Antonio donde se realizan ciertas recomendaciones que quedan registradas en el acta.
Yurenia HR. CEO Lorena Gómez
29-08-2025 tunales.
Se evidencia que el RCD acopiado en el 11+900 se reutiliza para el atraque de la cunetas, se sugiere la instalación de polisombra para aislar la alcantarilla del K 21+030 donde pasa un cuerpo de agua y limpieza de esta estructura. Caja movil en sitio la cual se sugirio cubrir lateralmente, en esta permanecen el Kit control de derrames, punto ecologico y PMT. se evidencia implementado.
Yurenia HR. CEO Lorena Gomez
30-08-2025 tunales
se realiza jornada de orden y aseo, se evidencia campamento movil en sitio con elementos requeridos y PMT implementado
Yurenia HR CEO Lorena Gómez
31-08-2025
El contratista no desarrollo actividades constructivas en los frentes de obra
Yurenia HR. CEO Lorena Gómez

BITACORA
CONSORCIO GAVIONES
95

01-08-2025 Laguna Verde.
Se realiza participación en comite integral con el fin de realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se dexriben los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva. En recorrido en el frente de obra, se identifican acopio de RCD que requiere que se implementen la medidas de manejo ambiental. se evidencia implementación de acopio RCD K 1+770 se sugiere al Contratista evaluar la ubicación de este acopio en este sector pues es un terreno que presenta inclinación, ademas lo mismo se solicita con el acopio del 1+220 ya que es evidente que los materiales de excavación se estan acopiando a la parte posterior lo que dificulta su evacuación posterior hacia sitio de disposición final autorizado
Yerenia HA

02-08-2025 Laguna Verde.
Se requiere mejorar la disposición de material producto de la excavación realizada en los acopios temporales un ejemplo es el Acopio del K 11+770, se sugiere evaluar la ubicación de este acopio y clausurarlo ya que se establece en una zona con especies nativas y variedad de avifauna.
En sitio permanece una cuipa movil con elementos necesarios, kit control de derrames, señalización informativa preventiva y de emergencia instalada. Se evidencia punto ecologico organizados, con bolsas respectivas y señalizados, se realiza revisión del informe No 15 V2 Entregado por el contratista, del cual las observaciones serán remitidas de manera oficial.
Yurenia HR (Cont)
03-08-2025 Laguna Verde.
El contratista realiza desde el dia anterior 02-08 la excavación para instalación de tubería de 36" los RCD son acopiados temporalmente en el K 01+400 para excavación posterior dando prioridad a la actividad de instalación de tubo y paso vehicular. Se debe brindar medidas de manejo ambiental en este acopio mientra es retirado. Se requiere retirar los remanentes de RCD de acopios temporales K 0+000 y K 0+140
Yurenia HR. (Cont)
04-08-2025 Laguna Verde.
Se realiza recorrido de obra donde se identifica PMT implementado con señales verticales y dos auxiliares de trafico en sitio, tramo de excavación para tubo en intervención se mantiene señalizado con doble cinta señalización informativa, preventiva y reglamentaria instalada en sitio, Se recomienda al profesional ambiental Verificar los equipos en obra que presenten fugas de combustibles y violentas de manera inmediata estos deberán procederse con los elementos que se encuentran en el Kit control de derrames.
Yurenia HR (Cont)

05-06-2025 Laguna Verde.
Se realiza la Calificación mensual correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio del 2025, la cual es Socializada al profesional ambiental. En el tramo en intervención se cuenta con un campamento movil, punto ecologico Organizado y señalizado, excavaciones delimitadas, se recomienda mantener acopios de RCD delimitados y cubiertos. Acopio de petreo principal con medidas de manejo implementada.
Yesenia HR (Cont.)

06-08-2025 Laguna Verde.
En el tramo se evidencia PMT correctamente implementado con señales verticales moviles, dos auxiliares de trafico, se evidencia kit control de derrames ubicado en el Patiocargador, punto ecologico activo con bolsas respectivas, señalización ubicada a lo largo del tramo en intervención, se sugiere evacuar residuos de excavación hacia sitio de disposición final autorizado.
Yesenia HR (Cont.)

07-08 2025 Laguna Verde
En el tramo en intervención se cuenta con la permanencia de un campamento movil, señalización preventiva, informativa y reglamentaria instalada, excavación de Filtro delimitada en el tramo K 0+000 a K 0+410 con doble cinta y delineadores tubulares intercalados con estacas de madera. Se evidencia punto ecologico organizado con bolsas respectivas y señalizado
Yesenia HR. (Cont.)

08-08-2025 Laguna Verde.
Se realiza Participación en comité integral con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas, los cuales quedan registrados en el acta respectiva.
Yesenia HR. (Cont.)

09-08-2025 Laguna Verde.
En obra se encuentran desarrollando actividades de

Construcción de filtro y excavación mecánica para instalación de tubería para la alcantarilla K0+132, se recomienda hacer la evacuación de las aguas de excavación hacia acopio principal o sitio de disposición final autorizado, se cuenta con PMT implementado.
Yerenia HR. (Cont)
10-08-2025 Laguna Verde.
En obra se culmina con la actividad de instalación de tubería y acerado en el K0+132, se cuenta con caja dotada de elementos como Kit de Emergencias completo y señalizado, permanencia de excavación para filtro delimitada.
Yerenia HR. (Cont)
11-08-2025 Laguna Verde.
Se realiza recorrido de obra con el profesional ambiental donde se levante un acta respectiva, en general se solicita adecuación de acopio de RCD K 1+750, 1+400 requieren cubrimiento y el K 1+220 se procedió a colocar cerca, el contratista informa que en este punto no se realizara más disposición de RCD y se procederá con el retiro hacia sitio de disposición final para posterior clausura del acopio y entrega al propietario.
Se Sugiere iniciar con el proceso de disposición final del RCD en sitio autorizado ya que en el tramo se dificulta obtener espacios adecuados para habilitar acopios temporales.
Igualmente se recomienda para acopio instalados al costado de viga mientras se evacuan deben permanecer con la medida de manejo ambiental respectiva, se recomienda colocar las bolsas respectivas al punto Geológico.
Yerenia HR. (Cont)
12-08-2025
En el tramo en intervención se advierte que permanecen las excavaciones para filtro delimitadas con doble cinta y delineadores tubulares intercalados con estacas de madera desde el K0+000 al K 4+100, a partir de este punto no cuenta con solo estacas de madera.

se cuenta con PMT correctamente implementado, con señales verticales moviles y dos auxiliares de trafico en sitio, permanencia en sitio cuipa movil. se continua con el acopio de RCD en K 1+750, se sugiere al profesional ambiental darle manejo adecuado a las aguas de excavación generadas en el frente de obra y inicar con el proceso de evacuación hacia sitio de disposición final autorizado.

Jerenia HR (cont)

13-08-2025 Laguna Verde.

Se evidencia acopio principal de petreo con medidas de manejo ambiental implementadas, delimitación, señalización con polisombra, el material producto de la excavación L0+906, es transportado en volqueta y ubicado en el acopio temporal K0+420, se recomienda al contratista hacer un adecuado manejo de aguas en la zona. se solicita al contratista realizar evacuación de residuos de excavación hacia sitio de disposición final autorizado ya que se encuentran acopios ubicados al costado de via.

Jerenia HA (cont)

14-08-2025 Laguna Verde

Se evidencia PMT implementado con señales verticales moviles y dos auxiliares de trafico, señalización de obra ubicada en el tramo. cuipa movil en sitio, señales de emergencia ubicados en cuipa. excavación delimitada cabe mencionar que a partir del K0+450, se encuentran delimitada la excavación con madera, lo cual se solicita reemplazar por delineadores tubulares, se requiere delimitar y cubrir los acopios de RCD y evacuar estos residuos hacia sitio de disposición final autorizado.

Jerenia HR (cont)

15-08-2025.

Participación en comite integral de obra, donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas, los cuales quedan registrados en el

acta respectiva, se remite citación para recorrido de Verificación de permiso de ocupación de cauce PDC en el tramo Laguna Verde; este se llevara a cabo el día 19 de Agosto a la 8:30 am, con la participación de la entidad ejecutora UMV, interventoría y contratista
Yerenia HR
16-08-2025
El contratista no desarrollo actividades constructivas en el frente de obra
Yerenia HR.
17-08-2025
El contratista no desarrollo actividades constructivas en el frente de obra
Yerenia HR.
18-08-2025
El contratista no desarrollo actividades constructivas en el frente de obra
Yerenia HR.
19-08-2025 Laguna Verde
Se realiza recorrido por el tramo con el fin de Verificar las alcantarilla que poseen permiso de ocupación de Cauce PDC en total en el tramo se encuentran 8 estructuras hidráulicas con este permiso, del recorrido se levanta acta respectiva la cual es socializada a todas las participantes.
Las estructuras para intervenir por parte del Consorcio se ubican en las abscisas K 0+625, K 1+488, K 2+479, K 2+790 Bonulver. De igual manera en el recorrido se requiere el retiro y disposición final del material RCD que se encuentra en el acopio desde la semana pasada en el K 0+420 costado derecho el cual se encuentra al costado de vía, obstruyendo la cuneta natural y ocasionando empozamientos en este punto, es un material que se encuentra sin cubrir. En la actividad de evacuación se implementa otro acopio en la vía por falta de Volqueta K 0+760 costado izquierdo
Yerenia HR.

20-08-2025 Laguna Verde.
Se evidencia que el RCD del K 0+410 ubicado al costado de vía continua sin evacuar ni cubrir, se requiere dar prioridad a evacuación de RCD hacia sitio de disposición final autorizado, se requiere aislar los individuos arbóreos ubicados en el acopio de RCD K 1+750, en este mismo punto mejorar la protección de la alcantarilla. Se requiere que todos los acopios de RCD permanezcan cubiertos y los acopios de pétreos que generan material particulado también requieren cubrimiento, se sugiere no emplear madera de la zona para la delimitación de la excavación de filtro, esta actividad debe hacerse con delineadores tubulares.
Yerenia HR. (Coord)

21-08-2025 Laguna Verde.
Se evidencia cargue de RCD de la abscisa. K 0+420, permanencia en frente de carga movil, Kit control de derrames, punto ecologico, señalización de Emergencia, preventiva y informativa en sitio, PMT implementado con señales verticales moviles y dos auxiliares de tráfico.
Yerenia HR. (Coord)

22-08-2025
Se realiza participación en comite integral de obra, donde se ejecuta seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva.
Yerenia HR. (Coord)

23-08-2025 Laguna Verde.
se realiza evacuación del K 0+200 los residuos son llevados al acopio temporal del 1+750, se solicita dejar este acopio con las medidas de manejo respectivas, se evidencia material de RCD en el acopio del 0+420 el cual se sugiere evacuación ya que este se encuentra al costado de vía, el acopio principal de material pétreo se encuentra delimitado, y señalizado.

Powered by CamScanner

24-08-2025 Laguna Verde
En el tramo se evidencia excavacion mecanica del 0+100 - 0+630 cuneta derecha, se encuentra roca en el proceso por lo cual se imposibilita continuar. En el tramo permanece caipa movil con elementos requeridos, señalizacion instalada en el frente de obra
Yesenia HR
25-08-2025 Laguna Verde
se realiza recorrido de obra donde se solicita al contratista rotular la cuneta de transporte de combustible, continua con evacuar de RCD del acopio localizado en el 0+420 en el cual se encuentra bastante material aún, se requiere adecuacion de proteccion de alcantarilla del K 1+750 de igual manera en este mismo punto adecuar el acopio de RCD, no deja material invadiendo parte de via y mantener con medidas de manejo, bindi protemi q albergs presente en el area y no colocar mas material al fondo del acopio ya que se encuentra cerca un cuerpo de agua.
Yesenia HR
26-08-2025 Laguna Verde.
El contratista realiza retiro de material RCD que se encuentra en el acopio del 0+420 cuneta derecha el cual es transportado al acopio temporal ubicado en el K 1+750. Se evidencia que se mantiene Kit control de derrame en Caipo, punto ecologico señalizado, el dia anterior se solicito colocar las bolas respectivas, delimitar de excavacion un otros de madera se requiere implementar delineadores tubulares. PMT implementado con señales verticales moviles y 2 auxiliares de trafico en el tramo.
27-08 Yesenia HR
27-08-2025 Laguna Verde.
Se evidencia permanencia de caipa movil en sitio, Kit de Contra derrames, punto ecologico,

PMT implementado, señalización de emergencia, preventiva e informativa instalada, delimitación de excavación desde el K 0+000 a 0+390 con delineadores tubulares, y doble cinta, de este punto en adelante la delimitación se realiza con estaca de madera por lo cual se solicita activar.
Yerenia HR. Coord.
28-08-2025 Laguna Verde
Se mantiene acopio de pétreo principal, con delimitación, señalización, se requiere que los pétreos que están sujetos a emisión de partículas se mantengan cubiertos.
Se mantienen activos acopio de RCD de 1+220 y 1+740.
Se evidencia permanencia de campamento movil en sitio, con punto ecológico y kit control de derrames.
Se requiere implementar delineadores tubulares en la delimitación de excavación para filtro.
Yerenia HR. Coord.
29-08-2025 Laguna Verde.
Participación en comité integral donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva. Se realiza recorrido por el frente de obra donde se evidencia que aún se encuentra en el K 0+120 RCD que requieren relocalización, el Acopio del K 1+740 requieren inicia un retiro hacia sitio de disposición final autorizado.
Yerenia HR. Coord.
30-08-2025.
El Contratista no realizo actividades constructivas en el frente de obra
Yerenia HR. Coord.
31-08-2025.
El Contratista no realizo actividades constructivas en el frente obra
Yerenia HR. Coord.

Powered by CamScanner

A. 2

REGISTROS CALIFICACION MENSUAL AMBIENTAL

CALIFICACION MENSUAL ENTIDAD EJECUTORA UMV

BOGOTÁ	**"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".**	ECOVIAS SAS

FECHA ELABORACION: 02/09/2025 CALIFICACION COMPONENTE AMBIENTAL


PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 ENTIDAD EJECUTORA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CALIFICACION
		100%	50%	0,0%	N/A	
Programa 1 Gestión del proyecto						
1	El personal ambiental permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal ambiental cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional ambiental asistió a los comités de seguimiento integral a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
5	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecida en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
6	Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
7	Se cuenta con los permisos ambientales requeridos para la realización de las actividades en obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 2 Manejo de actividades constructivas						
8	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
9	Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
10	Los RCD se evacuan hacia sitio de disposicion en el tiempo indicado en el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
11	El campamento de obra y sitios temporales cuentan con la señalizacion, preventiva, informativa y de emergencia de acuerdo a lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
12	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
13	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
14	Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
15	Se cuenta con todos los certificados de disposición de escombros RCD.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
16	Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO Aprovechables, no aprovechables y reciclables.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

17	Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
18	Se cuenta con puntos ecológicos organizados, limpios, señalizados, cubiertos y en adecuadas condiciones.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
19	Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
20	Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición final de los RESPEL gestionados en el presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
21	Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
22	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
Programa 3 Gestión hídrica						
23	Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal, ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
24	Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
25	Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
26	Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
27	Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
28	Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
29	Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
30	Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
Programa 4 Biodiversidad y servicios ecosistémicos						
31	Se respeta el 100% de las rondas de protección de fuentes hídricas	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
32	La instalación de infraestructura como campamentos, equipos, maquinaria o materiales no se realiza cerca a los cuerpos de agua superficiales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
33	Los vehículos respetan los limites de velocidad en zonas identificadas como mayor probabilidad de atropellar fauna silvestre.	3	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
34	Ningún trabajador del proyecto atenta contra la integridad física de los individuos de fauna encontrados en el área de influencia de la obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 5 Manejo de instalaciones temporales						
35	El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

36	El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias como: Extintores, botiquines, camillas, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
37	El campamento se encuentra debidamente señalizado y ordenado	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
38	El campamento cuenta con punto ecológico.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
39	Se cuenta con los registros de preoperacionales de vehículos y maquinaria correctamente diligenciados	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
40	Se cuenta con los documentos de los equipos que se encuentran en obra y los listados completos de los mismos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
41	Los vehiculos que tranmsportan RCD cuentan con el PIN respectivo	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Reportes						
42	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz, la información del PAGA .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
43	Tiene disponibilidad el Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría de todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
44	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
45	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
46	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	50%
TOTAL CALIFICACIÓN MES DE AGOSTO						82%

OBSERVACIONES	No aplica para el periodo

	
	Profesional Ambiental de Interventoría ECOVIAS SAS
ACEPTÓ	
	Profesional Ambiental de LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

CALIFICACION MENSUAL

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

BOGOTÁ	**CONTRATO DE OBRA 479 DE 2022 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.) suscrito con la UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022**	ECOVIAS SAS

FECHA DE ELABORACION: 02/09/2025 CALIFICACION COMPONENTE AMBIENTAL



PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CALIFICACION
		100%	50%	0,0%	N/A	
Programa 1 Gestión del proyecto						
1	El personal ambiental permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal ambiental cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional ambiental asistió a los comités de seguimiento integral a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
5	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecida en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
6	Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
7	Se cuenta con los permisos ambientales requeridos para la realización de las actividades en obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 2 Manejo de actividades constructivas						
8	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
9	Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
10	Los RCD se evacuan hacia sitio de disposicion en el el tiempo indicado en el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
11	El campamento de obra y sitios temporales cuentan con la señalizacion, preveniva, informativa y de emergencia de acuerdo a lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
12	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
13	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
14	Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
15	Se cuenta con todos los certificados de disposición de escombros RCD.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
16	Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO Aprovechables, no aprovechables y reciclables.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
17	Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
18	Se cuenta con puntos ecológicos organizados, limpios, señalizados, cubiertos y en adecuadas condiciones.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

19	Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
20	Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición final de los RESPEL gestionados en el presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
21	Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
22	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
Programa 3 Gestión hídrica						
23	Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal, ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
24	Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
25	Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
26	Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
27	Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
28	Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
29	Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
30	Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 4 Biodiversidad y servicios ecosistémicos						
31	Se respeta el 100% de las rondas de protección de fuentes hídricas	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
32	La instalación de infraestructura como campamentos, equipos, maquinaria o materiales no se realiza cerca a los cuerpos de agua superficiales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
33	Los vehículos respetan los limites de velocidad en zonas identificadas como mayor probabilidad de atropellar fauna silvestre.	3	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
34	Ningún trabajador del proyecto atenta contra la integridad física de los individuos de fauna encontrados en el área de influencia de la obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 5 Manejo de instalaciones temporales						
35	El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
36	El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias como: Extintores, botiquines, camillas, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
37	El campamento se encuentra debidamente señalizado y ordenado	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
38	El campamento cuenta con punto ecológico.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
39	Se cuenta con los registros de preoperacionales de vehículos y maquinaria correctamente diligenciados	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

40	Se cuenta con los documentos de los equipos que se encuentran en obra y los listados completos de los mismos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
41	Los vehiculos que tranmsportan RCD cuentan con el PIN respectivo	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Reportes						
42	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz, la información del PAGA .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
43	Tiene disponibilidad el Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría de todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
44	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
45	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
46	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	100%
TOTAL CALIFICACIÓN MES DE AGOSTO						93%

OBSERVACIONES	No aplica para el periodo

ELABORÓ	
	Profesional Ambiental de Interventoría ECOVIAS SAS
ACEPTÓ	
	Profesional Ambiental del CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL

CALIFICACION MENSUAL CONSORCIO GAVIONES 95

BOGOTÁ SUMAPAZ	**"CONTRATO No. 478 de 2022 objeto "LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.). GRUPO 1. suscrito con la UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022**	ECOVIAS SAS

FECHA DE ELABORACION: 02/09/2025 CALIFICACION COMPONENTE AMBIENTAL

PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CONSORCIO GAVIONES 95

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CALIFICACION
		100%	50%	0,0%	N/A	
Programa 1 Gestión del proyecto						
1	El personal ambiental permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal ambiental cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional ambiental asistió a los comités de seguimiento integral a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
5	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecida en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
6	Se cuenta con los soportes de la jornada de capacitación ejecutada, como listas de asistencia, actas, registro fotográfico, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
7	Se cuenta con los permisos ambientales requeridos para la realización de las actividades en obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 2 Manejo de actividades constructivas						
8	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
9	Todos los proveedores de materiales cuentan con permisos ambientales y/o mineros vigentes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
10	Los RCD se evacuan hacia sitio de disposicion en el tiempo indicado en el PAGA	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
11	El campamento de obra y sitios temporales cuentan con la señalizacion, preveniva, informativa y de emergencia de acuerdo a lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
12	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente y lo ofertado en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
13	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
14	Se cuenta con todos los certificados de adquisición de materiales pétreos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
15	Se cuenta con todos los certificados de disposición de escombros RCD.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
15	Se realiza de manera correcta la disposición de los RESO Aprovechables, no aprovechables y reciclables.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
17	Cuenta con el registro de la cantidad y tipo de residuos generados en el mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
18	Se cuenta con puntos ecológicos organizados, limpios, señalizados, cubiertos y en adecuadas condiciones.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

19	Se cuenta con un área de almacenamiento temporal de RESPEL en condiciones adecuadas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
20	Cuenta con el manifiesto de recolección, transporte y disposición final de los RESPEL gestionados en el presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
21	Se implementa las medidas definidas en el PAGA para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
22	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 3 Gestión hídrica						
23	Cuenta con un baño por cada quince trabajadores, dotados con todos los elementos necesarios de aseo personal, ya sean fijos o portátiles. Estos baños deben contar con las medidas pertinentes de mantenimiento periódico (2 veces por semana).	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
24	Las aguas provenientes de los baños portátiles se entregan a gestor autorizado de manera mensual.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
25	Se cuenta con el certificado de disposición final de lodos del presente mes.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
26	Cuenta con los certificados de los mantenimientos de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
27	Cuenta con kit de derrames en el frente de trabajo.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
28	Se mantienen los puntos de hidratación en los campamentos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
29	Se presenta la certificación del agua suministrada en el mes para actividades de obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	N/A
30	Se realiza el manejo del agua de escorrentía generada en los sitios de intervención	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 4 Biodiversidad y servicios ecosistémicos						
31	Se respeta el 100% de las rondas de protección de fuentes hídricas	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
32	La instalación de infraestructura como campamentos, equipos, maquinaria o materiales no se realiza cerca a los cuerpos de agua superficiales.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
33	Los vehículos respetan los limites de velocidad en zonas identificadas como mayor probabilidad de atropellar fauna silvestre.	3	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
34	Ningún trabajador del proyecto atenta contra la integridad física de los individuos de fauna encontrados en el área de influencia de la obra	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa 5 Manejo de instalaciones temporales						
35	El contratista cuenta con permisos y/o autorizaciones ante las autoridades competentes, dueños o representante legal del área a ocupar.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
36	El campamento cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias como: Extintores, botiquines, camillas, etc.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
37	El campamento se encuentra debidamente señalizado y ordenado	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
38	El campamento cuenta con punto ecológico.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
39	Se cuenta con los registros de preoperacionales de vehículos y maquinaria correctamente diligenciados	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

40	Se cuenta con los documentos de los equipos que se encuentran en obra y los listados completos de los mismos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
41	Los vehiculos que tranmsportan RCD cuentan con el PIN respectivo	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Reportes						
42	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz, la información del PAGA .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
43	Tiene disponibilidad el Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría de todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
44	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
45	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Ambiental	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
46	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	100%
TOTAL CALIFICACIÓN MES DE AGOSTO						94%

OBSERVACIONES	No aplica para el periodo
ELABORÓ	
	Profesional Ambiental de Interventoría ECOVIAS SAS
ACEPTÓ	
	Profesional Ambiental del CONSORCIO GAVIONES 95

A. 3

ACTAS COMPONENTE AMBIENTAL

ACTAS COMPONENTE AMBIENTAL ENTIDAD EJECUTORA UMV

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPO-F029
Versión: 6
Vigente: 21 de agosto de 2024
Caso: 1806-A-2018

Objeto de la reunión:	Mesa de trabajo Componente Ambiental Ecovia - Unidad de Mantenimiento Vial UTMV.
Fecha:	05 Agosto de 2025.
Lugar:	Oficina Santana
Dependencia:	Componente Ambiental
Hora de inicio:	10:00
Hora de finalización:	11:00
Nombre del Responsable:	Yerenia Hernandez Ecovia SAS
Modalidad de la reunión:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1072841808	Yerenia Hernandez A	Profesional Ambiental	Ecovia SAS			/						/	Smepa7.ambiental 161@gmail.com	Yerenia HA
CC	1030669188	Jessica Paola Vidal Pobete	Prof Ambiental	UAEMV			X						X	jessica.vidal@umv.gov.co	Jessica Paola Vidal P.

CONSENTIMIENTO: Dejo constancia de que, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, doy mi autorización previa, expresa e informada para que los datos personales suministrados en el presente documento sean tratados por la Secretaría Distrital de Gobierno y Alcaldías Locales, como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar y dar respuesta a las solicitudes de información, atención, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y demás trámites de su competencia, así como para el envío de comunicaciones relacionadas con estas gestiones. Declaro que he sido informado(a) sobre mis derechos como titular de los datos personales, entre ellos el derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos suministrados, a solicitar prueba de esta autorización, a ser informado sobre el uso que se le ha dado a los datos entregados, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización y a solicitar la supresión de los datos personales suministrados cuando sea procedente, de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno.


* Ver SAC-M002 Manual de Servicio al Ciudadano y Protocolo para personas con discapacidad. Disponible en Página Principal (protocolos de atención) / Gobierno Abierto de la Intranet.

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se desarrolla mesa de trabajo con la profesional Ambiental de la Entidad Ejecutora UTAX donde se tratan los siguientes temas:

1. Se desarrolla calificacion mensual del componente del periodo del 01 al 31 de Julio de 2021, donde se obtiene un resultado del 83% de cumplimiento de la lista aplicada, la cual contiene los programas descritos en el PMA aprobado, es dado que esta calificacion se desarrolla para dar cumplimiento al anexo tecnico de la interventoria, esta calificacion es aceptada por la entidad ejecutora quien procede a firmar el registro.
2. En cuanto a los informes semanales, estos se encuentran todos entregados a la fecha y completos.
3. Informes Mensuales: El informe de Mayo de 2021 y Junio de 2021 se encuentran observados por parte de interventoria, estos ajustes fueron atendidos por la UTAX quien manifiesta que el de Mayo ya fue contestado y se encuentra en proceso de envio a la interventoria, con respecto al de Junio de 2021 se encuentra en ajustes y obteniendo las calificaciones necesarias para la subsanacion. En cuanto al informe del mes de Julio de 2021 El contratista o entidad ejecutora informa que sera entregado posteriormente

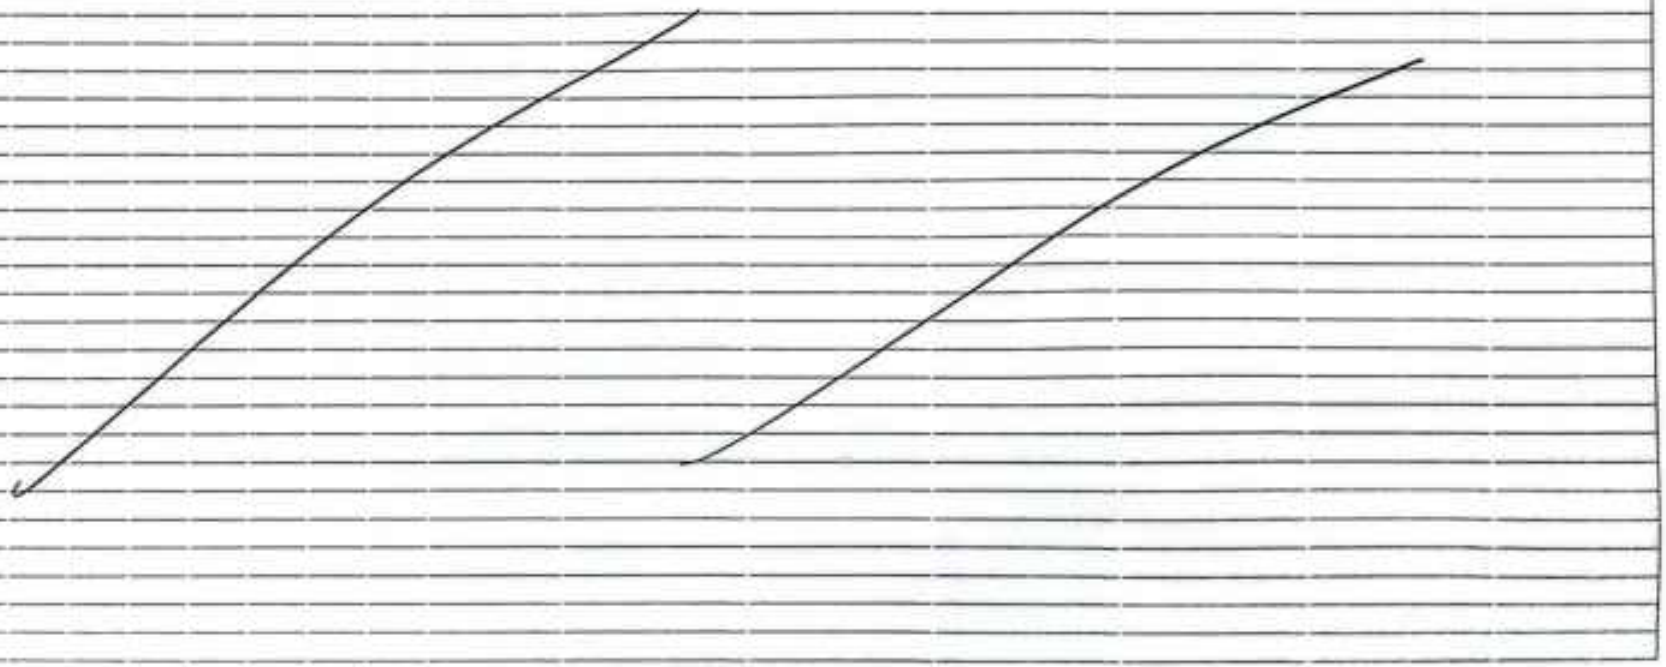

Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Remitir Calificacion firmada por todas las partes	Interventoria	08/08/2025

NOTA 1: [illegible]

NOTA 2: [illegible]

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GOB-SPO-Fr-[illegible]
Versión: 6
Vigente: 21 de agosto de 2024
Caso: HERCA: 70108

Objeto de la reunión:	Acta de recorrido Componente Ambiental Ecovia - UAEMV
Fecha:	20 de Agosto de 2025
Lugar:	Frentes de obra Tunales - Capitolio - San Antonio
Dependencia:	Componente Ambiental
Hora de inicio:	7:30 am
Hora de finalización:	2:30
Modalidad:	X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta
Nombre del Responsable:	Yesenia Hernandez - Ecovia).

FOLIO DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (sin abreviaturas)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
a	52784808	Yesenia Hernandez R	Prof Ambiental	Ecovia SAS			✓						✓	sumapaz.ambiental161@gmail.com	Yesenia HR.
cc	1030669198	Jessica Paola Vidal Pilache	Prof Ambiental	UAEMV			✓						✓	jessica.vidal@umv.gov.co	JessicaPaolaVidalP.

[illegible]

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza recorrido en los frentes de obra a cargo de la Entidad Ejecutor, UMV. Capitolio, Union-Tunales y San Antonio-Toldo.

CAPITOLIO

1. K 0+485 el retiro del material petreo que se encuentra en predio privado se encuentra en ejecución, aun se evidencia material en el predio.

2. K 0+835 se evidencia acopio de petreos el cual presenta caida de material a la parte posterior del mismo, este se mantiene con contención polisombra, una vez se clausure el acopio sera retirado el material y se realizara limpieza del area.

3. K 3+240 se solicita limpieza de la alcantarilla a la cual le cayo fresado, la UMV procedio a colocar entibado para evitar que la se continue cayendo el material ademas se adecuo la proteccion con polisombra, posteriormente se realizara la limpieza una vez termine la instalacion del fresado.

4. K 3+450 se evidencia retiro de material de excavacion RCD hacia sitio de disposicion final autorizado, el Acopio se encuentra con medida de manejo ambiental implementadas.

5. En el tramo no se evidenciaron derrames de combustible.

6. Se mantienen dos unidades Sanitarias portatiles del proveedor Bumecal, con gel antibacterial, en el periodo no se evidencio mantenimiento respectivo, se requiere que la UMV gestione lo necesario para garantizar los mantenimientos requeridos cumpliendo lo establecido en la Resolucion 2400

7. Se cuenta con un campamento movil, donde se encuentra Kit contra derrames y kit de emergencia rompleo, un punto Ecologico, organizado y con bolsa respectiva, hoja de seguridad de los productos quimicos en sitio y recipientes rotulados.

8. Se evidencia PMT implementado de manera correcta, 8 Señales moviles, 1 barricada y dos auxiliares de trafico en sitio.

9. Se encuentran Acopios de materiales petreos K 3+600, 2+500 y 0+835 con medidas de manejo ambiental.

UNION TUNALES.

1. K0+470 Acopio con contención donde cayeron petreos al costado posterior se encuentran coordinando con area SST para realizar limpieza de materiales de manera segura.

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

2. K 11500 tramo 5 se evidencio acopio de RCD al costado de vía, se solicita su retiro hacia sitio de disposicion final autorizado

3. Se solicita Verifica estado de funcionamiento de carrotanque ya que se evidencia la emisión de bastante humo, de igual manera se recomienda verificar y que no se transporte combustible en la cabina de este vehiculo.

4. Se cuenta con un campamento movil, donde se encuentra Kit control de derrames, punto ecologico organizado, punto acopio de combustible organizado, dos DSP con gel antibacterial, a este no se realizó mantenimiento en el periodo.

5. Se evidencia PMT implementado de manera correcta con 8 señales verticales moviles, una baliza y dos auxiliares de trafico en sitio.

SAN ANTONIO

1. K 0+040 Acopio principal de RCD delimitado y cubierto

2. K 11+470, 27+750, 31+150 se requiere limpieza de alcantarilla las cuales se encuentran colmatadas con materiales petreos y RCD, mantener con protección.

3. a lo largo del tramo se evidencian acopios de RCD ubicados al costado de vía los cuales han sido retirando, se recomienda evaluar remanentes para generar organización del tramo. Cabe mencionar que se evidencia la evacuación de bastante RCD hacia acopio principal y sitio de disposicion final. se recomienda continuar con dicha evacuación y evitar que nuevamente el tramo se sature de estos materiales. Se evidencian la mayoria de acopios con medida de manejo ambiental implementadas.

4. Se evidencia PMT implementado de manera correcta con 8 señales verticales moviles, una baliza y dos auxiliares de trafico en sitio

5. Se evidencian 4 unidades sanitaria portatiles del proveedor Bumocol con gel antibacterial, se informa por parte de la UMV que el dia 27 de Agosto se realizara mantenimiento respectivo el cual fue programado, se requiere a la UMV para que gestione lo necesario para garantizar los mantenimientos requeridos de acuerdo a la resolucion 2400

6. Se cuenta con un campamento movil, donde se encuentra Kit control de derrame, kit de emergencia completo, punto ecológico señalizado y organizado, se recomienda organizacion del punto de acopio de sustancias quimicas y verificar la rotulacion de los recipientes.

7. En el tramo no se evidenciaron derrames de combustible durante el recorrido.

8. Se sugiere continua con la Evacuacion de RCD

Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Garantizar mantenimiento semanales de las OSP.	UMV.	permanente.
2.	Retiro de RCD de todas las tramos	UMV	permanente.
3.	Mantener acopio de RCD y petres con medida de manga	UMV	permanente.
4.	Mantener Orden y aseo en todas las tramo y campamento	UMV	continuo.
5.	Limpieza de alcantarilla colmatadas en San Antonio.	UMV	03/09/2025
6.	Adecuar protección de alcantarillas en las tramos en intervención	UMV	continuo.
7.	Garantizar implementación de PMT en todas las frentes de obra	UMV.	permanente
8.	Hacer seguimiento a los derivados de combustible en equipos	UMV.	permanente.

NOTA 1: En caso de que una reunión virtual no pueda iniciar el siguiente día por cierre general de por las [illegible]

NOTA 2: Agregar o eliminar las filas con esos necesarios para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión

Powered by CamScanner

ACTAS COMPONENTE AMBIENTAL CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

BOGOTÁ | ALCALDÍA MAYOR GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código GDI-GPO-029
Versión 6
Vigente 21 de agosto de 2024
Caso ERDLA-30868

Objeto de la reunión: Mesa de trabajo Componente Ambiental Ecovia - Consorcio Estabilización Vial CEV

Fecha: 05 de Agosto de 2025

Hora de inicio: 9:00

Hora de finalización: 10:00

Modalidad: Presencial [ ] Virtual [X] Telefónica [ ] Mixta [ ]

Lugar: Oficina Santana

Dependencia: Componente Ambiental

Nombre del Responsable: Yesenia Hernandez Ecovia SAS

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (persona o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	52784808	Yesenia Hernández	Profesional Ambiental	Ecovia SAS			✓						✓	Ssmopar-ambiental 161 @gmail.com	Yesenia H.P.
CC	1032387487	Lorena Gomez	Prof Ambiental	CEV			X							Landingroup@ecovia.co	LorenaGomez

CONDICIONAMIENTO DE DATOS: Usted registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012, y demás normas reglamentarias aplicables, dos autoriza(n) a la Secretaría Distrital de Gobierno y a la Secretaría Distrital de Gobierno, y que, tratamiento proporcionada en virtud, completa, exacta, actualizada y verdadera. Si cambia o supone que incluyen información relacionada con el mismo, la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, tiene página web en www.gobiernobogota.gov.co y en su oficina de atención en [illegible] Manifiesta con esto los datos propios tratados a que el dueño tenga acceso, actualice y modifique los datos personales, o solicitar prueba de esta autorización salvo cuando se le haya dado los datos necesarios, y proteger quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a no usar con autorización o violentar la seguridad de los datos personales suministrados por y a terceros de forma o los mismos. De igual manera nos indica que los datos aquí recopilados serán usados para [illegible] de caracterización ciudadana y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.


* Ver ítem Guía Manual de Servicio Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad disponible en https://gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/guia-manual-de-servicio-diferencial-y-preferencial.pdf

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se desarrolla mesa de trabajo con la profesional Ambiental del consorcio Estabilización Vial CEV donde se tratan los siguientes temas.

1. Se desarrolla calificación mensual del componente del periodo del 01 al 31 de Julio del 2025, donde se obtiene un resultado del 94% del cumplimiento de la lista aplicada la cual contiene los programas descritos en el PAGA aprobado es claro que esta calificación se desarrolla para dar cumplimiento al anexo técnico de la interventoría, esta calificación es diligenciada por el consorcio CEV quien procede a firmar el registro
2. En cuanto a los informes semanales, estos se encuentran todos entregados y a la fecha estan completos
3. Informes Mensuales: el Informe No 2047 fue aprobado que corresponde al periodo del 01 al 30 de Junio. En cuanto al Informe No 27 del periodo del 01 al 31 de Julio de 2025 fue entregado el día 05 de Agosto la interventoría procederá a realizar la verificación respectiva y emitir oficialmente el concepto u observaciones a que haya lugar.

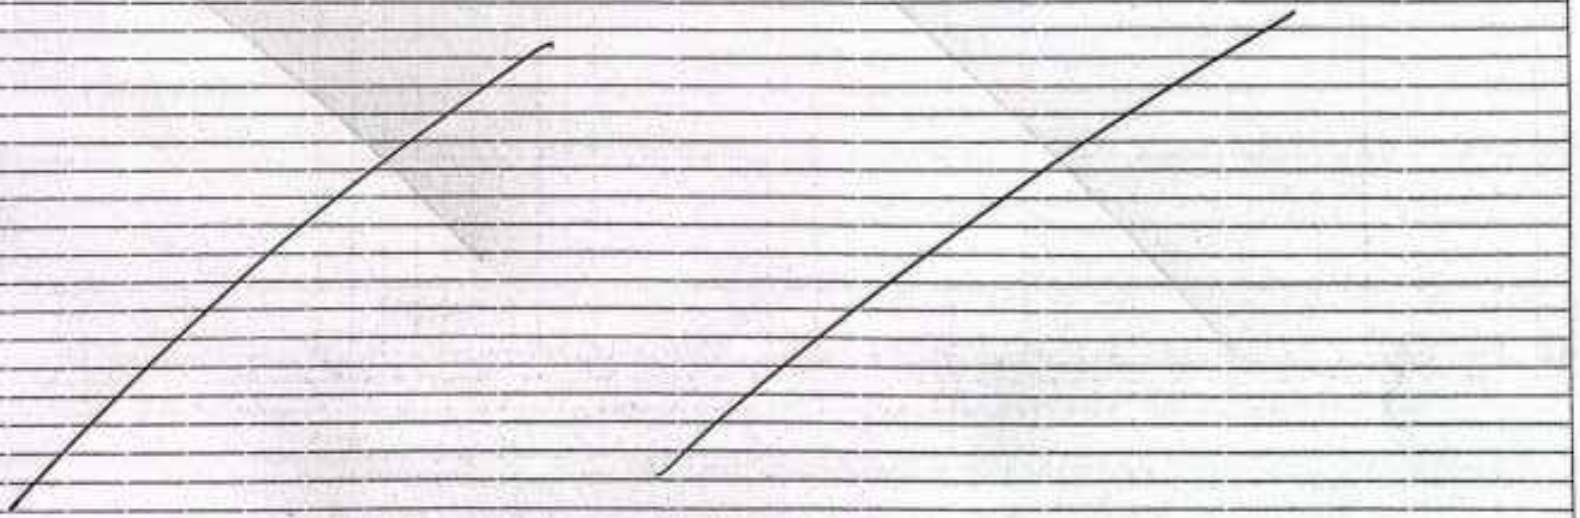

Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Remitir calificación con las firmas respectivas	Interventoría	08/08/2025

NOTA 1: Si a una de las actividades citadas no puede asignar el responsable del mismo, proceda a realizar el seguimiento de la misma y asigne la responsabilidad.
NOTA 2: Asegúrese de diligenciar los Planes con fechas reales para asignar las actividades y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F031
Versión: 8
Vigencia: 25 de agosto de 2024
Caso HOLA: 9068

Objeto de la reunión:	Acto de recorrido Componente ambiental Ecovias - Consorcio Estabilización Vial CEV.
Fecha:	21 de Agosto de 2025
Hora de inicio:	8:30
Hora de finalización:	4:30
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	Frente de obra, Unicentrales-San Antonio
Dependencia:	Componente Ambiental.
Nombre del Responsable:	Yaneth Hernandez R - ECOVIAS SAS.

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Sin Título o Jefe)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	52781808	Yaneth Hernandez R	Prof Ambiental	Ecovias SAS			✓						✓	Somapa7.ambiental.161@gmail.com	Yaneth HA.
CC	1032388748	Lorena Gomez	Prof Ambiental	CEU			X						X	andrugral@cual.com	LorenaGomez

CONSENTIMIENTO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, y demás normas reglamentarias aplicables, doy mi autorización y acepto la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, para el tratamiento y protección de mis datos personales registrados en la presente evidencia, los cuales fueron suministrados voluntariamente y son ciertos, completos, exactos, actualizados y verificables. Así mismo, manifiesto que mediante comunicación enviada al correo electrónico protecciondedatos@gobiernobogota.gov.co o a través del sistema de radicación de entrada de la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en el primer piso de la sede principal, ubicada en la Carrera 8 No. 8-79 o a través de la página web www.gobiernobogota.gov.co, puedo ejercer mis derechos como titular de los datos suministrados, a conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de esta autorización, a ser informado sobre el uso que se le ha dado a los datos suministrados, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización y solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiendo que los datos aquí consignados serán usados para servir de evidencia, de caracterización poblacional y en ciertos casos para el archivo a la oficina misional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

(*) Ver SIDEAP, Nivel Nacional de Nivel de Dificultad y Profesional para pertenecer este documento, dependiendo del tipo de [illegible]

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza recorrido en los frentes de obra a cargo del contrato Estabilización Vial CEV; Unión tunales y San Antonio - Toldo.

Unión tunales.

1. En frente se evidencia PMT implementado correctamente con señales verticales moviles y 2 auxiliares de tráfico en sitio

2. K 2+020 se recomendo dejar acopio de grava delimitado.

3. K 2+000 se sugiere implementar medida de manejo ambiental en acopio de material de excavación.

4. K 1+530 se solicita recolectar las bolsas rojas y dejarlas en un solo acopio señalizado

5. K 1+500 se requiere realizar limpieza de vía del frente en ejecución.

6. Se sugiere realimentar al personal para que no coloque elementos en el punto ecológico, ni en el KIT control de derrames, estos elementos deben permanecer despejados.

7. En el frente en ejecución se mantiene una Colpa movil donde se ubican los elementos como: KIT control de derrames, KIT de Emergencia completo, punto ecológico, punto de Hidratación, zona de almacenamiento de Herramientas menores, cinta reflectiva informativa y señalización informativa y de Emergencia instalada.

8. Se requiere que los acopios de materiales pétreos se mantengan con la medida de manejo ambiental, cuando no se estan empleando para actividades constructivas.

9. Mintransporte con preoperación correctamente diligenciado.

San Antonio - Toldo.

1. K 5+240; 4+900 se evidencian dos acopios de material de excavación RCD, delimitados y cubiertos, se requiere evaluar la posibilidad de inicia retiro hacia sitio de disposición final autorizado, durante el recorrido se informo que en el K 4+200 tambien se va habilitar este acopio para RCD, se sugiere mantener medida de manejo ambiental respectiva al igual que garantizar la limpieza de la vía.

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

2. K 5+200, 5+100, 5+150 se encuentran acopios de petreos con medidas de manejo ambiental implementadas

3. K 4+300, 4+400 se evidencian dos acopios de petreos que requieren mejora la delimitacion y el cubrimiento.

4. Se recomienda Señalita tubelg que se encuentra acopiados en varios puntos del tramo en intervencion. Ej. K 4+200, 5+300, 1+300.

6. Se sugiere continua con la reutilizacion del material para el ataque de la cunetas y depalo correctamente instalado.

7. Se encuentra un tanque en el K 6+770 el cual se ha solicitado su retiro en caso que no se emplee para actividades en el frente de obra ya que lleva en este lugar un tiempo considerable.

8 En este tramo no se cuenta con Caipa movil.

9. El Kit control de derrames y punto ecologico se encuentra en el K 4+100 cobijados con plastico, es necesario mantener estos elementos a la vista.

10. K 4+808 se realiza un retiro de material Vegetal necesario para el inicio de construccion de estructura hidraulica de encole y descole, este material se encontraba cubierto invadiendo una parte de la Via, por lo cual se solicita su adecuacion y manejo, de igual manera se recomienda aislar el area a intervenir con el fin de evitar afectaciones posteriores sobre la Vegetacion presente.

11. En el tramo se evidencia señales Verticales de PMT instaladas

12. Mantenimiento y Retroexcavadora con preoperacional correctamente diligenciado

13. se recomienda mantener medida de manejo ambiental implementadas en acopios de materiales petreos y acopios de ECO.

14. Se sugiere almacenar bolsas rojas en condiciones ambientales adecuadas

Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Mantener acopios de petreos y RCD con medida de manejo ambiental	CEV	permanente
2	Ubicar calpa movil en el tramo San Antonio-Toldo	CEV	26/08/2025
3	Mantener orden y aseo en los tramos y calpas	CEV	continuo.
4	Garantizar la implementacion de PMT en los tramos	CEV	permanente
5	mantener via limpia en la salida de acopios	CEV	continuo
6	Almacenar bolsas ropa en condiciones ambientales adecuadas	CEV	permanente

NOTA 1: [illegible]

NOTA 2: [illegible]

Powered by CamScanner

ACTAS COMPONENTE AMBIENTAL CONSORCIO GAVIONES 95

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Cara: HOJA No. 70903

Objeto de la reunión: Mesa de trabajo componente ambiental Ecovias - Consorcio Gaviones 95.

Fecha: 05/08/2025.

Lugar: Oficina Santana.

Dependencia: Componente Ambiental

Hora de inicio: 8:00

Hora de finalización: 9:00

Modalidad: [ ] Presencial [X] Virtual [ ] Telefónica [ ] Mixta

Nombre del Responsable: Jarenis Hernandez Ecovias SAS

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (familiar o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	52784808	Jarenis Hernandez R	Profesional Ambiental	Ecovias SAS			✓						✓	Jimapaz ambiental 16 1 @gmail.com	Jarenis HR.
CC	1032324860	Cesar A. Delgado A.	Gaviones 95	Ing. Residente Amb.			✓						✓	Cesardelgadoavendaño @gmail.com	CDGA.

CONSENTIMIENTO: De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, doy mi consentimiento y autorizo la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, a que la información proporcionada en forma completa, exacta, actualizada y verificable, sea incorporada y tratada por cualquier canal a la información relacionada con el presente documento y por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno. – Oficina de Atención al Ciudadano, dentro del horario de funcionamiento como página web en www.gobiernobogota.gov.co o en el teléfono de atención 3387000, directorio y en cualquier otro medio que el titular de los datos personales, o solicitar prueba de este consentimiento, a todas las autoridades sobre el uso que se le ha dado a los datos suministrados, y presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Igualmente la exactitud de los datos suministrados sea responsabilidad y a cambiar de forma gratuita los mismos. De igual manera autorizo que los datos aquí consignados sean usados para servir de estadísticas, de caracterizaciones poblacionales y en diferentes casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.


* Ver FAC-0002 Manual de Tratamiento de Datos Personales y Protocolo para gestionar este documento, disponible en https://gobiernobogota.gov.co/transparencia/gestion-del-conocimiento

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se desarrolla mesa de trabajo con el profesional Ambiental del Consorcio Gaviones a5 donde se tratan los siguientes temas:

1. Se desarrolla calificación mensual del componente del periodo del 01 al 31 de Julio del 2023, donde se obtiene un resultado del 97% de cumplimiento de la lista aplicada, la cual contiene los programas descritos en el PAGA. Es claro que esta calificación se desarrolla, para dar cumplimiento al anexo tecnico de la interventoria, esta calificacion es aceptada por el consorcio Gaviones a5 quien procede a firmar el registro.
2. En cuanto a los informes semanales, estos se encuentran todos entregados a la fecha (completos)
3. Informes mensuales: El No 15 de Junio se encuentra observado y pendiente la entrega por parte del Consorcio para dar aval al mismo. En cuanto al informe No 16 del periodo del 01 al 31 de Julio sera entregado posteriormente por el Contratista.

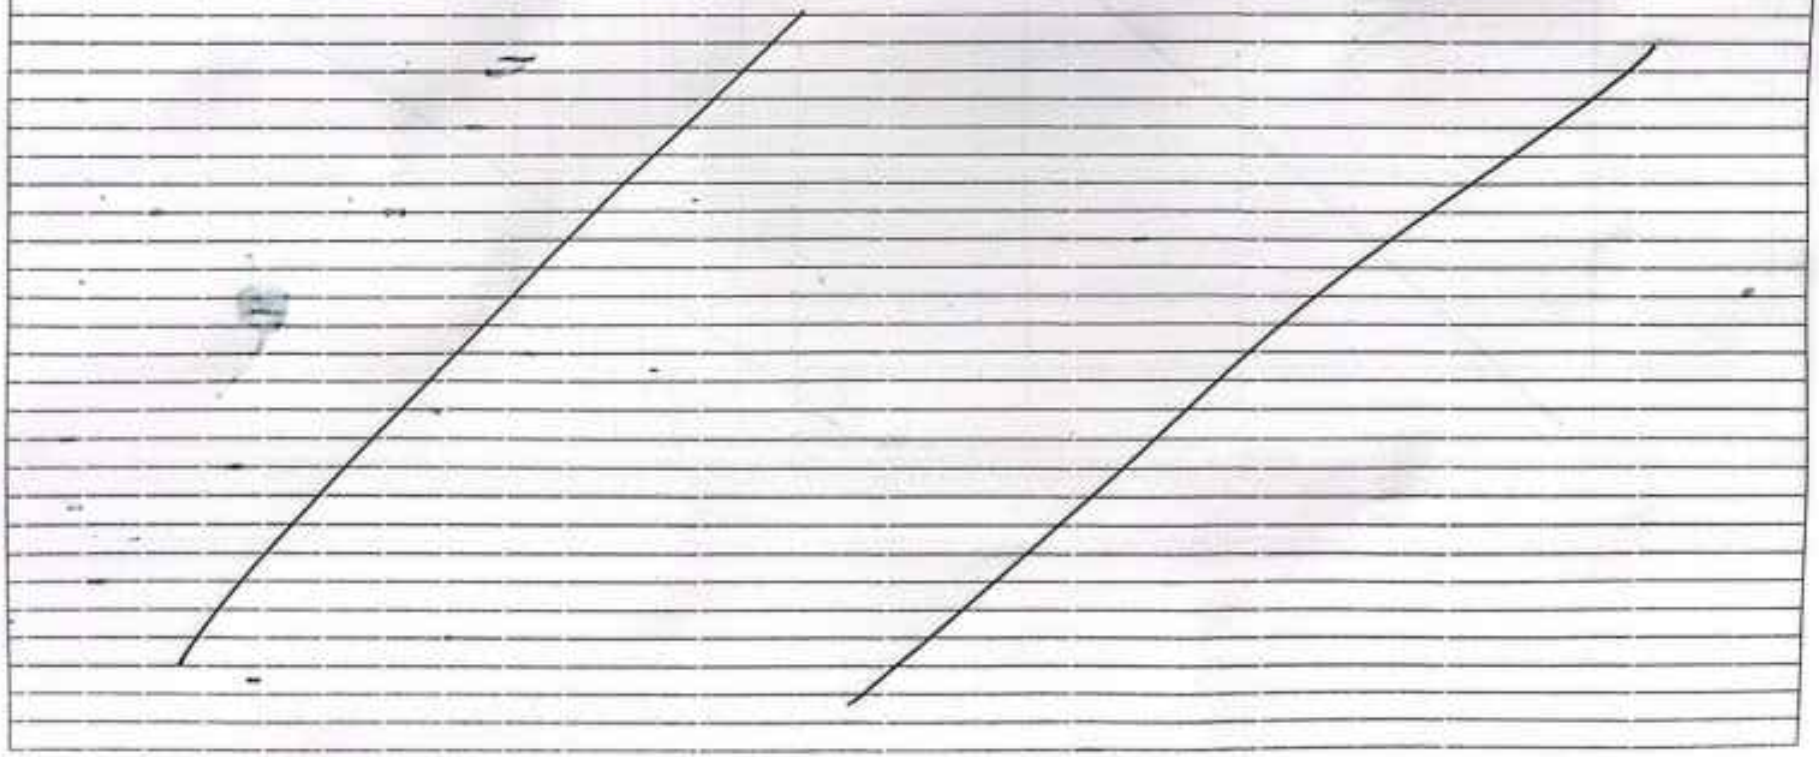

Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Remitir calificación con firma respectiva	Interventoría	08/08/2025

NOTA 1: En caso de no ser posible el cierre de la actividad en la fecha acordada, el responsable de la misma debe informar de manera oportuna a los demás participantes y justificar la nueva fecha propuesta.
NOTA 2: Asegurar que todas las filas con datos sean usadas para registrar los compromisos y los responsables de la acción.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso: HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Recorrido del Componente Ambiental Ecovias SAS - Gaviones 95
Fecha:	11 de Agosto de 2025
Lugar:	Laguna Verde
Dependencia:	Componente Ambiental
Hora de inicio:	8:30
Hora de finalización:	10:30
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Nombre del Responsable:	Yesenia Hernandez Ecovias SAS

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	52184808	Yesenia Hernandez A	Profesional Ambiental	Ecovias SAS			✓						✓	yangas.ambiental.161@gmail.com	Yenia HA
CC	1022321880	Cesar A. Delgado Avellaneda	Ing Residente Ambiental	C. Gaviones 95			✓							cesardelgadoavellaneda@gmail.com	Cesar Delgado

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas legales vigentes sobre el tema, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información y documentación suministrada por el titular mediante el uso de sus datos personales podrá ser ofrecida verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención a la Ciudadanía, dentro de los términos, bajo la página web www.gobiernobogota.gov.co y en la línea de atención 3308000. Manifiesta que esta es una fuente pública de información y que el titular tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de esta autorización, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar este consentimiento y a solicitar la supresión de los datos personales suministrados, una vez se cumpla la(s) finalidad(es) del tratamiento y sin perjuicio de la obligación de conservar la información por orden legal. De igual manera, autoriza que los datos aquí consignados sean usados para fines estadísticos, de caracterización poblacional y en desarrollo de la misionalidad de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC, 4040 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/manual_de_atencion_diferencial_y_preferencial_para_personas_con_discapacidad_0.pdf

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza recorrido del componente ambiental por el tramo en intervención en el frente de obra laguna Verde donde se evidencia lo siguiente:

1. Señalización Informativa, preventiva y de Emergencia ubicada en el tramo en intervención
2. Delimitación de Excavación con doble cinta y delineadores tubulares intercalados con estacas del K 0+000 al K. 0+400
3. Campamento movil en sitio ubicado en la abscisa 0+420
4. Se requiere señalización de tubería ubicada en K 0+290.
5. En el campamento se evidenas kit de emergencia completo (camilla, botiquin y extintor)
6. En campamento se identifica permanencia del punto ecologico con señalización sin embargo no se evidencian las bolsas respectivas, se requiere ubicarlas.
7. se identifican los siguiente) acopios temporales de RCD:

7.1. K0+000 el RCD fue recolectado y contenido el area
7.2 K0+150 Acopio al costado de Vía señalizado, se sugiere mejorar delimitación, cubrir y evacuar en el menor tiempo posible
7.3 K0+420 acopio al costado de vía, sin señalizar, delimitar y requiere cubrimiento se sugiere la evacuación a sitio de disposición final autorizado.
7.4. K 0+ 11220 se evidencia acopio delimitado, segun informa el contratista en este punto no se van a llevar mas residuos de excavación al respecto se recomienda evacuar estos RCD hacia sitio de disposición final Autorizado.
7.5. K 11+440 Acopio, ubicado en predio privado, se evidencia señalizado, se requiere ubicar cubrimiento e iniciar evacuación hacia sitio de disposición final.
7.6. K 1+750 acopio ubicado en predio privado propietario Bonifacio Martinez, se evidencia delimitado, requiere ubicar señalización y cubrimiento, de igual manera se debe garantizar retiro de los residuos de excavación una vez clausurado el acopio, se recomienda dar manejo a los individuos arboreos que se encuentran en el area de influencia directa, aislarlos.

8. Se evidencia un acopio principal de materiales petreos, ubicado en un predio privado sobre la vía principal de aceso hacia Nazareth, el cual se encuentra delimitado, señalizado segun los medidas de manejo ambiental requeridas implementadas.

9. En todo el tramo se evidencian las alcantarillas protegidas con polisombra y cinta de señalización.

10. En cuanto a Unidades sanitarias, cuentan con acta de autorización de la señora Marcela Martinez para el uso del personal de la obra.


11. En cuanto al Kit Control de derrames, se encuentra ubicado en el Retrocargador.

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

12. Se recomienda Mantener acopio con medida de manejo ambiental.

13. El contratista informa evaluación de RCD hacia sitio de disposición final en el transcurso de la semana.

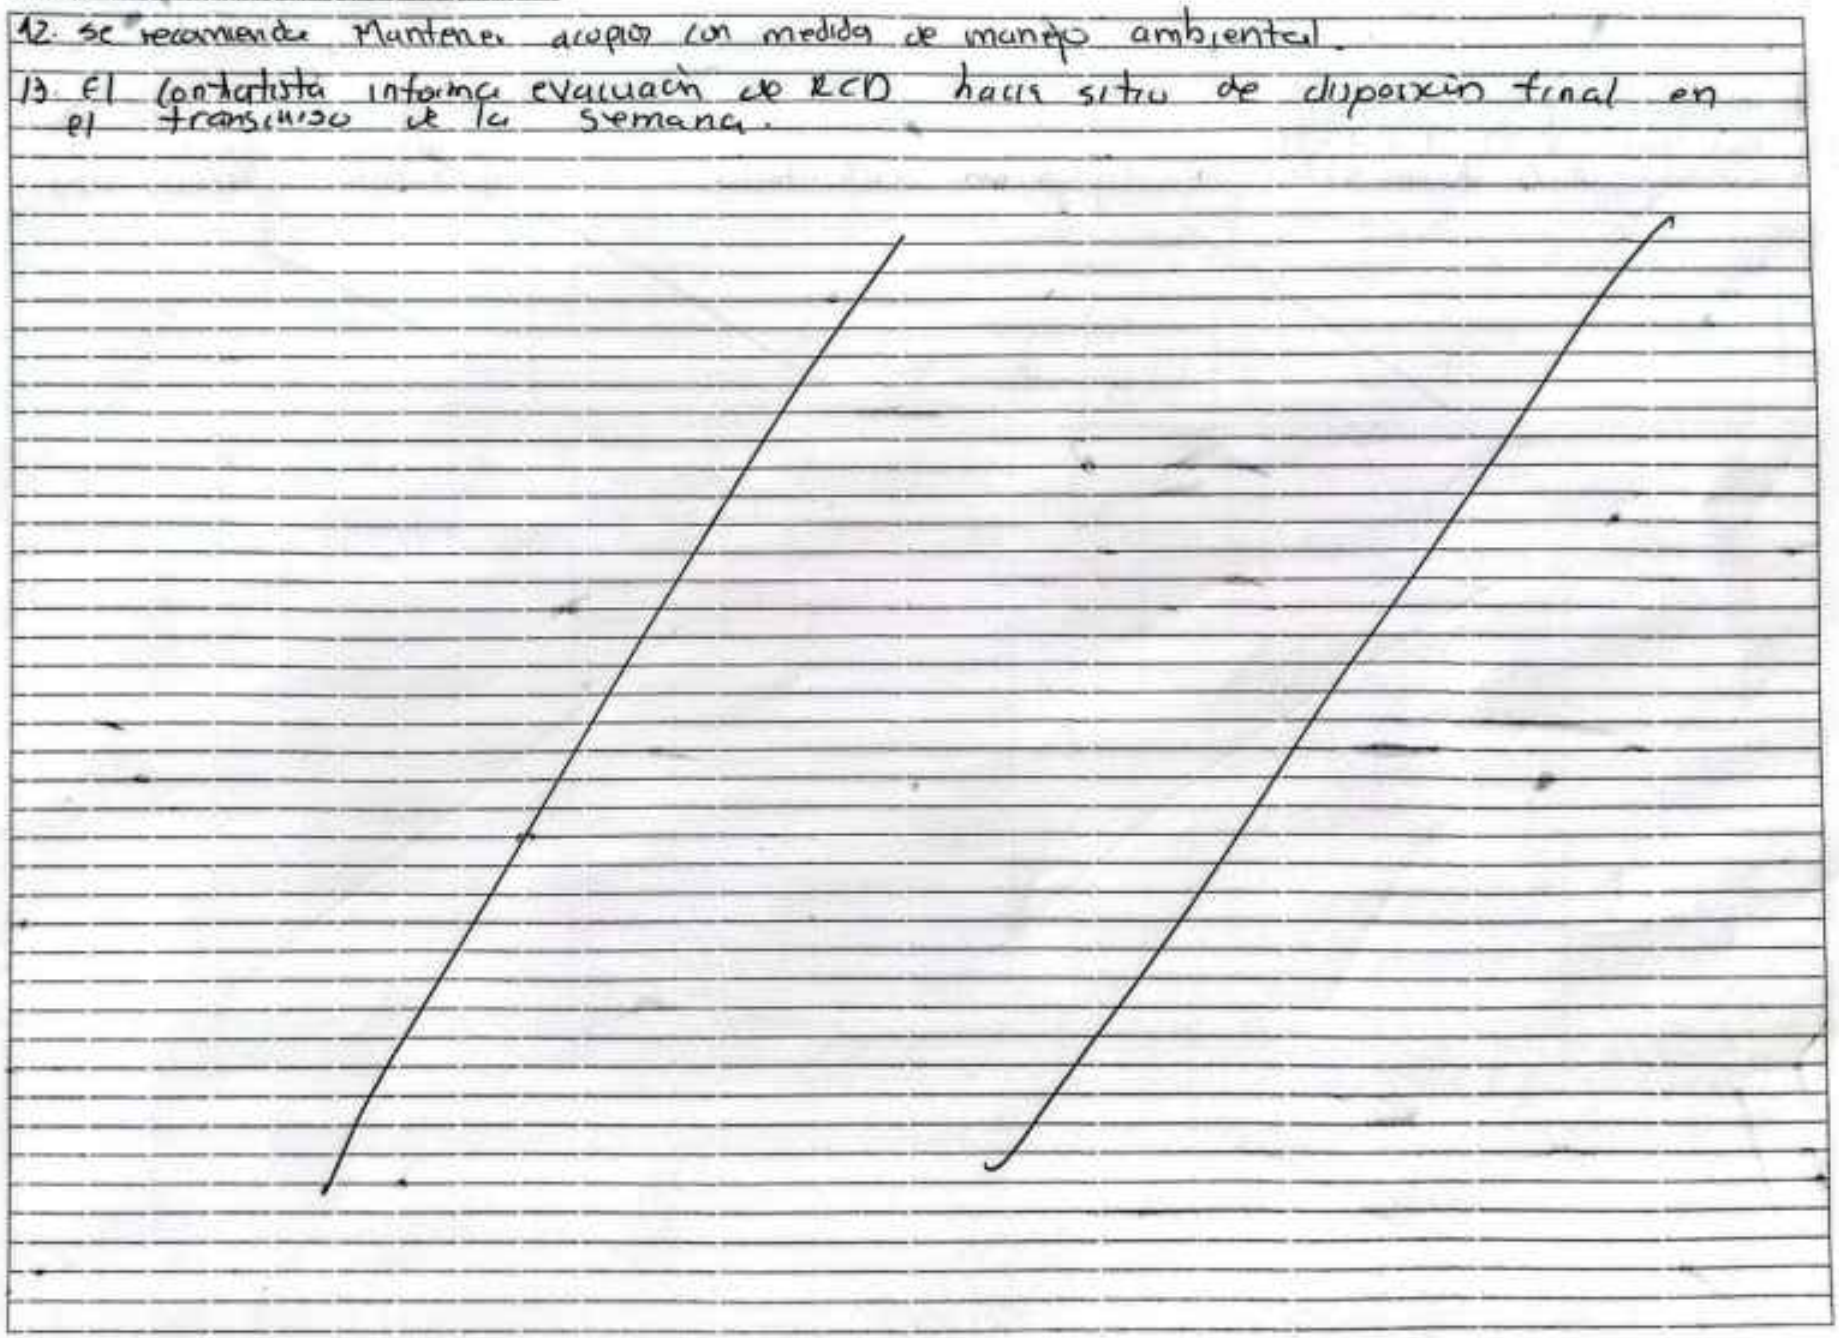

Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Adecuación punto ecologico	Contratista	11/08/2025
2.	Evacuar RCD K0+150	Contratista.	13/08/2025.
3	Evacuar RCD hacia sitio de disposicion autorizado	Contratista	15/08/2025

NOTA 1: En caso de no ser cumplido en la fecha acordada el objeto de un compromiso generado por los participantes de la reunión, se generará la siguiente

NOTA 2: Agregar o eliminar las filas con este texto antes de diligenciar los compromisos y los responsables de la reunión

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código GDI GPD-F029
Versión 4
Vigente 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 9868

Objeto de la reunión:	Recorrido Verificación Permisos de ocupación de cauce - Canalización Gaviones 95
Fecha:	19 de Agosto de 2025
Lugar:	Laguna Verde.
Dependencia:	Componente Ambiental.
Hora de inicio:	8:30
Hora de finalización:	10:30
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Nombre del Responsable:	Yeenia Hernandez Ecovias SAS.

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (completos y legibles)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
	79681482	Carlos David Rojas	Inspector	Ecovias SAS				✓						carlosjesusrojas@gmail.com	
	1053887037	Hector Smith Roa	Topografo	Ecovias SAS										hsroa73@gmail.com	Hector Smith Roa
	1013666330	Edwin Alvarez O.	Topografo	Ecovias SAS			/								
	1030669188	Jessica Paola Uribe P	Profesional Ambiental	UAERMV			x							jessica.uribe@umv.gov.co	
	52784808	Yeenica Hernandez R	Profesional Ambiental	Ecovias SAS			-							sumapaz.ambiental.16@gmail.com	Yeenia HR.
	1022324860	Cesar A. Delgado Andrade	Ing. Residente Amb.	C. Gaviones 95.			/							cesardelgado@gmail.com	
	79'958.784	Jorge Aldana	Residente técnico	UAERMV											

CONSENTIMIENTO: Quien suscribe este documento, acepta lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, y demás normas reglamentarias que traten, dicha ley que consiste en recoger la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, a que la información proporcionada es cierta, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier cambio o actualización relacionada con el mismo deberá ser informado a la mayor brevedad a la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como mecanismo de mantenimiento esta página web en www.gobiernobogota.gov.co y en el teléfono en Bogotá 195 opción 1 o en los puntos presenciales donde el titular de los datos personales, solicitar prueba de esta consentimiento, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la información sobre el uso que se le ha dado a los datos suministrados, y presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a menos que el tratamiento se realice la autoridad de los datos personales mantenidos dice y a menos de fuerza mayor o los mismos. De igual manera autorizo que los datos aquí consignados serán usados para fines estadísticos, de caracterización poblacional y en ciertos casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Tipo de Vinculación: Carrera (Asesor), Provisional, Libre nombramiento y remoción, Contratista

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza recorrido con el fin de Verificar las estructuras Hidraulica que se encuentran en el frente Laguna Verde que cuentan con permiso de ocupación de cauce (POC)

1. K 0+625 alcantarilla, estructuras de encole y descole, No pasa ninguna fuente hidrica, estructuras nuevas, esta seria intervenida por el Consorcio

2. K 0+920 alcantarilla existente estructura de encole y descole construidas, pasa fuente hidrica, presenta sedimentos en boca del tubo, el agua fluye normal

3 K 1+488 alcantarilla nueva, estructuras de encole y descole, pasa fuente Hidrica, esta sera intervenida por el Consorcio

4. K 1+747 alcantarilla existente, estructuras de encole y descole construidas se evidencia cuerpo de agua innominado, el cual en el momento no presenta flujo, es evidente la presencia de sedimentos, no seria intervenida por el Consorcio

5. K 2+361 alcantarilla existente, estructuras de encole y descole construidas, no pasa cuerpo de agua, se evidencia presencia de sedimentos, en el momento no se evidencian agua fluyendo por el tubo, no seria intervenida por el Consorcio

6. K 2+479 alcantarilla nueva, estructuras de encole y descole para construir, pasa un cuerpo hidrico innominado, encole y descole a 13 mts, se aclara que hay una estructura construida en la cual se evidencia presencia de sedimento ϕ 24", esta seria intervenida por el Consorcio

7. K 2+790 Estructura hidraulica a construir un Box culver, pasa un cuerpo Hidrico innominado el cual fluye normalmente. esta seia intervenida por el Consorcio

8. K 2+945 alcantarilla existente de encole y descole construidas, pasa una fuente hidrica innominada, se evidencia presencia de sedimentos, esta no seria intervenida por el Consorcio Cavasa 95.

Se recomienda realizar la intervencion de las alcantarillas que tienen POC antes del 31 de diciembre del 2025 ya que hasta esa fecha se cuenta con los permisos vigentes por parte de la CAR.

De igual manera teniendo en cuenta la informacion antes descrita se solicita a la entidad ejecutora UMV, tomar las acciones pertinentes para realizar los monitoreos de calidad de agua que se requieren segun las resoluciones de aprobacion de los permisos POC.

En el tramo en intervencion se encuentran un total de 8 alcantarillas con POC las cuales se mencionan anteriormente.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Adelantar las gestiones para las monitoreos de calidad del agua de acuerdo a los parametros dexistes en la resolucion inicial y de aprobacion de la permiso de ocupacion de cauce	UMV.	Comite No 57. Seguimiento
2.	Construir la estructura hidraulica antes de la fecha 31 de diciembre de 2025 plazo maximo establecido por la autoridad ambiental competente CAR.	Consorcio Bayona 95	mas 31 diciembre de 2025.

Powered by CamScanner

A. 4
CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

ENTIDAD EJECUTORA
UMV

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-813

Bogotá D.C. 14 de agosto de 2025

Señores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. JULIO CESAR PINZÓN-GERENTE DEL PROYECTO
Gerente del proyecto
julio.pinzon@umv.gov.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
rafael.pena@umv.gov.co
Bogotá D.

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Respuesta correo electrónico del día 06/08/2025. Observaciones Informe Ambiental 14 julio 2025.

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

De acuerdo a lo anterior una vez revisada la información remitida concerniente al informe mensual Ambiental No. 14 del periodo del 01 al 31 de julio de 2025 se tienen los siguientes comentarios por parte de interventoría que requieren de la atención por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial UMV:

1. Informe Ejecutivo página No 18 tabla No 4 relación los proveedores de materiales pétreos, con cantidades y permisos ambientales respectivos. Es necesario contar con el dato de proveedor Monteolivo.

2. Informe Ejecutivo página No 18 tabla No 4, no se evidencia certificado emitido por el proveedor Guayuriba sas ni Monteolivo, de los cuales se relacionan suministro de materiales pétreos en el mes de junio de 2025.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-813

3. Anexo No 8, para el próximo informe se debe presentar el RUCOM actualizado.

4. Informe Ejecutivo pagina 21 indicador 2, es necesario ajustar ya que se evidencian según la tabla No 4, tres proveedores de materiales (Monteolivo, Guayuriba y UMV).

5. Informe Ejecutivo pagina 24, tabla 5, es necesario consolidar toda la información de cantidades de RCD generados y dispuestos, para llevar la trazabilidad de la información. De igual manera se requiere se presenten los certificados de la disposición realizada de parte de la empresa Maquinas Amarillas. A la fecha ya se debe contar con dicha información y en la tabla no se presentan cantidades del mes de junio de 2025. Revisar y consolidar información reportada.

6. Informe Ejecutivo ficha manejo y disposición final de escombros, no se evidencia el soporte o certificación de los 406 m3 llevados a sitios de disposición en el mes de junio y julio de 2025, se requiere adjuntar dicho soporte.

7. Es necesario adjuntar el soporte de solicitud de certificado de RCD del volumen dispuesto en el mes de julio de 2025.

8. No se evidencia anexo V el cual debe anexarse según la resolución 1257 de 2021.

9. Informe Ejecutivo pagina 25 no se presentan cantidades en el indicador No 3.

10. Anexo No 13, se requiere adjuntar además de los vales que se encuentran en este anexo, el certificado de los mantenimientos realizados, este soporte debe ser expedido por la empresa Bamocol. Dado que estos soportes se manejan mes vencido para el periodo de informe deben adjuntarse los correos enviados realizando la solicitud respectiva.

11. Anexo No 14 revisar ya que en este soporte se mencionan que realizan dos aseos semanales y solo se está ejecutando 1.

12. Informe Ejecutivo ficha emisiones atmosféricas y ruido, se relaciona un consumo de 15 m3 de agua para actividades de obra, por lo cual se requiere adjuntar el certificado de la empresa encargada de suministrar dicha agua en el próximo informe. Así mismo no se evidencia en el presente informe el certificado del agua suministrada y relacionada en el mes de junio que corresponde a 20 M3.

13. Verificar cantidad de acopios reportados para el tramo el Toldo, pues en el periodo se evidenciaron una cantidad mayor de acopios.

14. No se evidencia soporte de mantenimientos realizados a la maquinaria y equipos relacionados del periodo ni anteriores, es necesario adjuntar el correo soporte de solicitud.

Generales

15. No se evidencian los anexos No 10 y 12, revisar y anexar la información respectiva.

16. Revisar el documento para que los títulos de las fichas no queden al finalizar las hojas en caso tal pasar a la siguiente página.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-813

17. Para la entrega de la siguiente versión, se requiere consolidar el informe en un solo PDF.

De acuerdo a lo anterior, se solicita su colaboración para la realización de la corrección, ajuste y/o complementación de la información requerida, relacionando en el comunicado de remisión cada una de las observaciones con la justificación, aclaración o indicación de la acción ejecutada y el lugar en el cual se localiza la evidencia según corresponda (anexo, documento, pagina, numeral), lo anterior en un período no mayor a (3) tres días calendario posterior al recibido del presente comunicado.

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: Jose Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoecovias.com
NIT 890.304.625-1

186-1-820

Bogotá D.C. 22 de agosto de 2025

Señores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: Ing. JULIO CESAR PINZÓN-GERENTE DEL PROYECTO
Gerente del proyecto
julio.pinzon@umv.gov.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
rafael.pena@umv.gov.co
Bogotá D.

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Respuesta comunicado 20251920102621. Solicitud información, diligenciamiento matrices soporte de gestión de RCD en el proyecto.

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UAERMV.

De acuerdo a lo anterior; la interventoría informa que procedió a trasladar solicitud a los dos contratistas hidráulicos respecto al requerimiento enviado por la Unidad de Mantenimiento Vial UAERMV, mediante comunicado 20251920102621 de fecha 08 de agosto de 2025, donde la Entidad Ejecutora Unidad de Mantenimiento vial, solicita a la interventoría requerir a los contratistas hidráulicos del Proyecto Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá – BPIN 2018000050020, con el fin que remitan a la UAERMV la información referente a los dos archivos en Excel diligenciados con la información completa que requiere la Secretaria Distrital de Ambiente SDA.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
info@ecovias.com
NIT 890.304.625-1

186-1-820

En virtud de lo anteriormente señalado, se adjuntan los dos oficios remitidos a los contratistas; Consorcio Estabilización Vial comunicado 186-1-805 del 13 de agosto de 2025 y Consorcio Gaviones 95 comunicado 186-1-807 del 13 de agosto de 2025; donde se requiere la remisión de lo requerido según lo indicado en el asunto del presente comunicado. Igualmente es importante hacer la aclaración que, dado que esta información fue solicitada en agosto de 2025, se debe dar un tiempo prudente para que los contratistas organicen y entreguen lo solicitado, puesto que es una información que se requiere desde el inicio de los contratos 478 y 479.

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Comunicado 186-1-805, Comunicado 186-1-807 en ocho (8) Folios

C.C: Jose Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com

Elaboro: YHR
Recibido: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA
Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 805

Bogotá D.C. 13 de agosto de 2025.

Señor
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Atn: Dr. HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
cevsumapaz@gmail.com
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túnales y Animas Bajas.") GRUPO 2

Asunto: Solicitud de diligenciamientos formatos RCD enviados por la Unidad de mantenimiento vial UMV, Radicado No. 20251920102621.

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del consorcio Estabilización Vial.


De acuerdo a lo anterior se traslada solicitud enviada por la UMV mediante comunicado 20251920102621 de fecha 08 de agosto de 2025, donde la Entidad Ejecutora Unidad de Mantenimiento vial, solicita ala interventoría requerir a los contratistas hidráulicos del Proyecto Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá – BPIN 2018000050020, con el fin que remitan a la UAERMV la siguiente información:

- Diligenciamiento de los datos en los archivos Excel adjuntos: El contratista consorcio Estabilización Vial se requiere el diligenciamiento completo y preciso de los campos requeridos en los archivos Excel anexos a esta comunicación, los cuales contienen la estructura de información solicitada por la Secretaría Distrital de Ambiente. Como se muestra a continuación:

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 805

- Anexo 1. Ejemplo

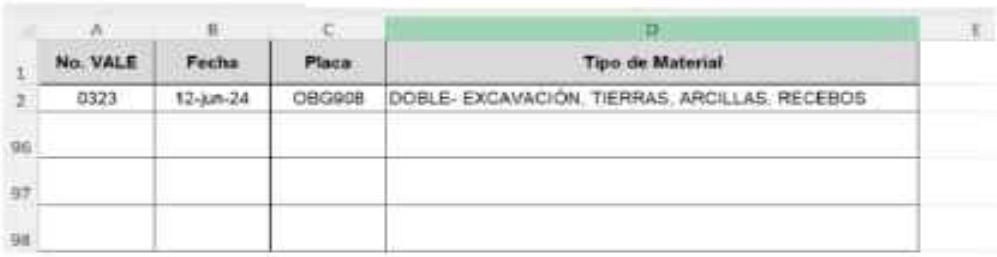

	A	B	C	D	E
1	No. VALE	Fecha	Placa	Tipo de Material	
2	0323	12-jun-24	OBG998	DOBLE- EXCAVACIÓN, TIERRAS, ARCILLAS, RECEBOS	
96					
97					
98					

- Anexo 2. Ejemplo



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	fecha_transpo	placa_transpo	pin_transpo	clasif_sitio	etapa_RC	responsable_despacho	nombre_sitio_recep	dir_sitio_recep
2	2024-04-01	CLO324	17682	3	2	WILLIAM NOVOA	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 28
3	2024-04-01	CLO492	17685	3	2	EDWIN SIERRA	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 28
388								
389								
390								
391								
392								
393								
394								
395								
396								

Cualquier duda que se tenga al respecto favor contacta a Jessica Paola Vidal jessica.vidal@umv.gov.co.

De acuerdo a lo descrito anteriormente se adjunta el comunicado 20251920102621 de fecha 08 de agosto de 2025 enviado por la UMV; junto con los dos formatos en Excel para su pronto diligenciamiento, lo anterior para los fines respectivos.

Sin otro particular

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: Comunicado UMV No. 20251920102621 y Formatos en cuatro (4) folios

C.C: Jose Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

Bogotá D.C., viernes 08 de agosto de 2025

Ingeniero:
LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal ECOVÍAS S.A.S.
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla (Atl)
intersumapaz.ecovias@gmail.com

Referencia: Proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”, del Sistema General de Regalías -SGR- identificado con código BPIN 2018000050020. (Localidad 20 de Sumapaz).

Asunto: Solicitud de información, diligenciamiento matrices soporte de gestión de RCD en el proyecto.

Cordial saludo,

En atención al asunto y considerando los compromisos normativos que desde la Entidad se tienen con la Secretaría Distrital de Ambiente, solicitamos su amable colaboración para requerir a los contratistas hidráulicos del Proyecto Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá – BPIN 2018000050020, con el fin que remitan a la UAERMV la siguiente información:

- Diligenciamiento de los datos en los archivos Excel adjuntos: Agradecemos gestionar con los contratistas el diligenciamiento completo y preciso de los campos requeridos en los archivos Excel anexos a esta comunicación, los cuales contienen la estructura de información solicitada por la Secretaría Distrital de Ambiente. Como se muestra a continuación:

  ✓ Anexo 1. ejemplo



	A	B	C	D	E
1	No. VALE	Fecha	Placa	Tipo de Material	
2	0323	12-jun-24	OBG908	DOBLE- EXCAVACIÓN, TIERRAS, ARCILLAS, RECEBOS	
96					
97					
98					

  ✓ Anexo 2. ejemplo



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	fecha_tiempo	placa_tiempo	pin_tiempo	clasif_sitio	etapa_RC	responsable_despacho	nombre_sitio_recep	dir_sitio_recep
2	2024-04-01	OLO324	17682	3	2	WILLIAM NOVOA	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
3	2024-04-01	OLO492	17685	3	2	EDWIN SIERRA	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20

Cualquier duda que se tenga al respecto favor contacta a Jessica Paola Vidal jessica.vidal@umv.gov.co.

Cordialmente,

C.C Diego Ramiro García Bejarano - Alcalde Local Sumapaz cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

Documento 20251920102621 firmado electrónicamente por:	
JULIO CESAR PINZÓN REYES	Subdirector de Intervención de la Infraestructura SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA julio.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 08-08-2025 11:50:39
Revisó:	RAFAEL DARÍO PEÑA FLÓREZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - rafael.pena@umv.gov.co
	GLORIA ROCIO BOTERO SANCHEZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - gloria.botero@umv.gov.co
Proyectó:	JESSICA PAOLA VIDAL POLOCHE - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - jessica.vidal@umv.gov.co
26975e134fdb0db354cd8a0de9851b3443cd59f0e390361ac47a59a0a5b4a3fe Codigo de Verificación CV: 5e4cb Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

Anexos: 3 folios

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1- 807

Bogotá D.C. 13 de agosto de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
info@promotorapuga.com
Bogotá D.C
.

Referencia: "CONTRATO No. 478 de 2022 objeto "LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.). GRUPO 1.

Asunto: Solicitud de diligenciamientos formatos RCD enviados por la Unidad de mantenimiento vial UMV. Radicado No. 20251920102621.

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95.

De acuerdo a lo anterior se traslada solicitud enviada por la UMV mediante comunicado 20251920102621 de fecha 08 de agosto de 2025, donde la Entidad Ejecutora Unidad de Mantenimiento vial, solicita ala interventoría requerir a los contratistas hidráulicos del Proyecto Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá – BPIN 2018000050020, con el fin que remitan a la UAERMV la siguiente información:

- Diligenciamiento de los datos en los archivos Excel adjuntos: De parte del contratista Consorcio Gaviones 95 se requiere el diligenciamiento completo y preciso de los campos requeridos en los archivos Excel anexos a esta comunicación, los cuales contienen la estructura de información solicitada por la Secretaría Distrital de Ambiente. Como se muestra a continuación:

Bogotá D.C., viernes 08 de agosto de 2025

Ingeniero:
LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal ECOVÍAS S.A.S.
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla (Atl)
intersumapaz.ecovias@gmail.com

Referencia: Proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”, del Sistema General de Regalías -SGR- identificado con código BPIN 2018000050020. (Localidad 20 de Sumapaz).

Asunto: Solicitud de información, diligenciamiento matrices soporte de gestión de RCD en el proyecto.

Cordial saludo,

En atención al asunto y considerando los compromisos normativos que desde la Entidad se tienen con la Secretaría Distrital de Ambiente, solicitamos su amable colaboración para requerir a los contratistas hidráulicos del Proyecto Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá – BPIN 2018000050020, con el fin que remitan a la UAERMV la siguiente información:

- Diligenciamiento de los datos en los archivos Excel adjuntos: Agradecemos gestionar con los contratistas el diligenciamiento completo y preciso de los campos requeridos en los archivos Excel anexos a esta comunicación, los cuales contienen la estructura de información solicitada por la Secretaría Distrital de Ambiente. Como se muestra a continuación:

  ✓ Anexo 1. ejemplo



	A	B	C	D	E
1	No. VALE	Fecha	Placa	Tipo de Material	
2	0323	12-jun-24	OBG908	DOBLE- EXCAVACIÓN, TIERRAS, ARCILLAS, RECEBOS	
96					
97					
98					

  ✓ Anexo 2. ejemplo



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	fecha_tiempo	placa_tiempo	pin_tiempo	clasif_sitio	etapa_RC	responsable_despacho	nombre_sitio_recep	dir_sitio_recep
2	2024-04-01	OLO324	17682	3	2	WILLIAM NOVOA	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
3	2024-04-01	OLO492	17685	3	2	EDWIN SIERRA	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20

Cualquier duda que se tenga al respecto favor contacta a Jessica Paola Vidal jessica.vidal@umv.gov.co.

Cordialmente,

C.C Diego Ramiro García Bejarano - Alcalde Local Sumapaz cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

Documento 20251920102621 firmado electrónicamente por:	
JULIO CESAR PINZÓN REYES	Subdirector de Intervención de la Infraestructura SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA julio.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 08-08-2025 11:50:39
Revisó:	RAFAEL DARÍO PEÑA FLÓREZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - rafael.pena@umv.gov.co
	GLORIA ROCIO BOTERO SANCHEZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - gloria.botero@umv.gov.co
Proyectó:	JESSICA PAOLA VIDAL POLOCHE - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - jessica.vidal@umv.gov.co
26975e134fdb0db354cd8a0de9851b3443cd59f0e390361ac47a59a0a5b4a3fe Codigo de Verificación CV: 5e4cb Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

Anexos: 3 folios

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: infoatecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1- 807

- Anexo 1. Ejemplo

	A	B	C	D	E
1	**No. VALE**	**Fecha**	**Placa**	**Tipo de Material**	
2	0323	12-jun-24	OBG908	DOBLE- EXCAVACIÓN, TIERRAS, ARCILLAS, RECEBOS	
96					
97					
98					

- Anexo 2. Ejemplo



Cualquier duda que se tenga al respecto favor contacta a Jessica Paola Vidal jessica.vidal@umv.gov.co.

De acuerdo a lo descrito anteriormente se adjunta el comunicado 20251920102621 de fecha 08 de agosto de 2025 enviado por la UMV; junto con los dos formatos en Excel para su pronto diligenciamiento, lo anterior para los fines respectivos.

Sin otro particular

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: : Comunicado UMV No. 20251920102621 y Formatos en cuatro (4) folios

C.C: Jose Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-833

Bogotá D.C. 26 de agosto de 2025

Señores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. JULIO CESAR PINZÓN-GERENTE DEL PROYECTO
Gerente del proyecto
julio.pinzon@umv.gov.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
rafael.pena@umv.gov.co
Bogotá D.

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Observaciones componente ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo SST, UMV.

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UAERMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, SGSST y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UAERMV

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría en recorridos realizados a los frentes de obra durante la semana del 18 al 22 de agosto de 2025 evidencio lo siguiente:

1. Frente de obra Tunales, Carrotanque SZO472, se evidencio transportando combustible en la cabina mediante galones sin rotular practica incorrecta e insegura, de igual manera trasladando galones desocupados en la parte trasera del mismo vehículo (véase fotografías 1 y 2). De acuerdo a lo anterior se solicita a la Unidad de mantenimiento Vial realizar el seguimiento respectivo para garantizar el cumplimiento de la normatividad respectiva; *Norma Técnica Colombiana NTC 1692 "Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado". Decreto 1496 de 2018 tiene por objeto adoptar el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y decreto 1079 de 2015.* Se recuerda que el transporte de combustible debe

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

realizarse en vehículos adecuados que cuenten entre otros con los siguientes elementos exigidos por la normativa vigente. A continuación, se cita los elementos según la normatividad:

- Requisitos generales del vehículo

  - ✓ Estar homologado como vehículo para transporte de mercancías peligrosas (Clase 3 – líquidos inflamables según la ONU).
  - ✓ Carrocería o tanque construido con materiales aprobados y certificados.
  - ✓ Cumplir con revisiones técnico–mecánicas y de emisiones vigentes.
  - ✓ Poseer SOAT y pólizas de responsabilidad civil extracontractual específicas para transporte de mercancías peligrosas.

- Equipos y elementos obligatorios a bordo

  - ✓ Extintores (mínimo dos, adecuados para líquidos inflamables, con capacidad según el peso bruto del vehículo).
  - ✓ Botiquín de primeros auxilios.
  - ✓ Kit de carretera reglamentario (cruceta, señales reflectivas, linterna, herramientas básicas).
  - ✓ Kit de derrames (pala, escoba, material absorbente, recipientes de seguridad, limpiadores, bolsa roja, chaleco reflectivo, etc).
  - ✓ Conos o triángulos reflectivos adicionales.
  - ✓ Linterna antiexplosiva.

- Señalización y rotulación

  - ✓ Rótulos de riesgo clase 3 – Líquidos Inflamables con el número ONU correspondiente (ej. gasolina: UN 1203, ACPM/diésel: UN 1202).
  - ✓ Paneles de seguridad en laterales y parte posterior del vehículo.
  - ✓ Avisos de “PELIGRO – INFLAMABLE” en sitios visibles.
  - ✓ Señal reflectiva perimetral.

- Documentación obligatoria

  - ✓ Manifiesto de carga (con datos de remitente, destinatario, tipo y cantidad de combustible).
  - ✓ Hoja de seguridad (MSDS) de la sustancia transportada.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-833

- ✓ Plan de contingencia en caso de accidente o derrame.
- ✓ Licencia de tránsito y tarjeta de operación vigente.
- ✓ Copia del certificado de capacitación del conductor en transporte de mercancías peligrosas
- ✓ Licencia de conducción categoría C2 o C3 según el vehículo.
- ✓ Uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP): casco de seguridad, guantes dieléctricos, botas, chaleco reflectivo, gafas de seguridad.

2. Se evidencia derrame de combustible en maquina Bobcat ubicada en el frente de obra tunales se reitera la necesidad de continuar con las medidas preventivas necesarias para evitar que se continúen presentando este tipo de incidentes. Véase fotografías 3 y 4.

3. Se sugiere a la entidad ejecutora programar a la mayor brevedad el mantenimiento preventivo del carro tanque de irrigación con placa JTR530, dado que se evidenció que las llantas traseras presentan un avanzado estado de desgaste. Esta acción permitirá garantizar condiciones seguras de operación y prevenir posibles incidentes en la ejecución de las actividades. Véase fotografías 5 y 6.

4. Se recomienda a la entidad ejecutora reforzar el control interno con sus operadores; frente a la situación observada, toda vez que se continúa evidenciando que los operadores no diligencian los formatos preoperacionales a primera hora del día. Es importante reforzar esta práctica con el fin de garantizar la verificación previa de las condiciones de los equipos y vehículos antes de iniciar las labores, minimizando riesgos en la operación. Véase fotografías 7 y 8.

5. Se requiere a la entidad ejecutora tomar medidas correctivas inmediatas respecto a la Volqueta Fotón WMB318, toda vez que se evidenció que el vehículo no cuenta con botiquín de primeros auxilios, el extintor se encuentra vencido y no posee el kit de carretera reglamentario, incumpliendo con los elementos mínimos exigidos para la operación segura y conforme a la normatividad vigente; Código Nacional de Tránsito Terrestre – Ley 769 de 2002, Artículo 30, que establece los elementos de prevención y seguridad que deben portar los vehículos. Véase fotografías 9 y 10.

6. Se requiere a la entidad ejecutora realizar revisión al carro tanque asignado a la operación en el frente Tunales SZO472, toda vez que se evidenció la emisión excesiva de humo por el sistema de escape, lo cual genera contaminación atmosférica y posibles riesgos para la salud de los trabajadores y la comunidad aledaña; La situación descrita está regulada por la siguiente normatividad, la cual debe ser tenida en cuenta: Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre, Artículo 28 y 30, que establecen la obligación de mantener los vehículos en condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad óptimas. Resolución 910 de 2008 (MinAmbiente) y sus modificaciones, que fijan los estándares de emisión de contaminantes para fuentes móviles terrestres. Decreto 1076 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relativo a prevención y control de la contaminación atmosférica. Véase fotografías 11.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-833

	
Foto 1: Transporte de combustible en cabina	Foto 2: Traslado de galones en carrotanque

	
Foto 3: Derrame de combustible	Foto 4: Derrame de combustible

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-833

	
Foto 5: Llantas desgastadas de carrotanque	Foto 6: Llantas desgastadas de carrotanque
	
Foto 7: Llantas desgastadas de carrotanque	Foto 8: Llantas desgastadas de carrotanque

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-833

	
Foto 9: Volqueta operando sin elementos básicos de emergencias	Foto 10: Volqueta con extintor vencido



Foto 11: carrotanque con emisiones

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-833

De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita a la entidad ejecutora tomar las medidas correctivas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de la subsanación en un término no mayor a tres días calendarios posterior al recibo del presente comunicado.

Atentamente,



ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: Jose Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: YHR - JAR
Reviso : EHR

CONSORCIO
ESTABILIZACION VIAL

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1-765

Bogotá D.C. 25 de julio de 2025.

Señor
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
cevsumapaz@gmail.com
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túnales y Animas Bajas.") GRUPO 2

Asunto: Respuesta a comunicado CEV/22-439 Informe del componente Ambiental No.20 V02-Aval

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del Consorcio. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Estabilización Vial, remite el Informe Mensual ambiental No 20 V2 se tienen los siguientes comentarios:

- Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Ambiental realizados mediante el comunicado 186-1-746 del 11 de julio de 2025 al informe mensual No. 20 V1 que comprende el periodo de 01 al 30 de junio de 2025, se evidencia que fueron atendidas las observaciones realizadas por lo tanto se da aval al mismo en versión 2 puesto que cumple con los requerimientos mínimos del anexo técnico del componente ambiental.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: infoll@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1-765

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Sin otro particular

Atentamente,



ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: N/A

C.C: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS -lauram.rojas@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto -julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605) 357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1-766

Bogotá D.C. 25 de julio de 2025.

Señor
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
cevsumapaz@gmail.com
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túnales y Animas Bajas.") GRUPO 2

Asunto: Llamado de atención por no asistencia a comités de obra y falta de presencia en campo del profesional ambiental.

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización vial.

De acuerdo a lo anterior nos permitimos manifestar nuestra preocupación frente a la reiterada incomparecencia del profesional Ambiental aprobado a los comités de obra programados semanalmente, así como por la ausencia de este en las actividades de campo ejecutadas en los frentes de obra.

La participación activa en los comités de obra es fundamental para garantizar la articulación entre las partes, la toma de decisiones oportunas y la solución eficiente de inconvenientes propios del desarrollo de los trabajos a cargo del componente ambiental.

Asimismo, la presencia del profesional ambiental en obra es indispensable para ejercer la aplicación, cumplimiento y supervisión de las medidas de manejo ambiental descritas en el Plan de adaptación de la guía ambiental PAGA aprobado y las demás normas ambientales conforme a lo establecido en el contrato y en la normatividad vigente.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: infoal@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1-766

Por lo anterior, se le solicita tomar las medidas necesarias para asegurar su participación en los espacios de seguimiento contractual y su presencia activa en la obra, de manera que se garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales y del anexo técnico el cual describe textualmente lo siguiente: "*Numeral 7. Información sobre el personal profesional. Ítem a. Requisitos de personal. donde se exige una dedicación del 100 % en la etapa de construcción para el profesional ambiental aprobado".*

En caso de persistir esta situación, se procederá con las medidas contractuales correspondientes que implicarían solicitar cambio del profesional ambiental aprobado, o iniciar proceso de incumplimiento del contrato.

Sin otro particular

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: N/A

C.C: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS -lauram.rojas@gobiernobogota.gov.co-cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto -julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1- 775

Bogotá D.C. 29 de julio de 2025.

Señor
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Atn: Dr. HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
cevsumapaz@gmail.com
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túnales y Animas Bajas.") GRUPO 2

Asunto: Solicitud atraque correcto de cunetas frentes Unión Tunales y San Antonio-El Toldo.

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del Consorcio. De acuerdo a lo anterior se ha evidenciado durante las visitas de supervisión a los frentes de obra Unión Tunales y San Antonio El Toldo, que las cunetas construidas presentan deficiencias en el atraque o anclaje al terreno natural, lo cual puede comprometer su estabilidad estructural y funcional frente a las condiciones de escorrentía y carga hidráulica.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se solicita realizar de manera inmediata el atraque técnico correcto de las cunetas construidas, cumpliendo con lo establecido en las normas técnicas vigentes del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). El atraque deberá garantizar una correcta compactación, profundidad de anclaje y conformación de los taludes o bordes según diseño que permita que las aguas de escorrentía lleguen a la cuneta.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1- 775

Adicionalmente, los residuos generados durante la excavación para la ejecución de estos trabajos deben ser reutilizados técnicamente en el mismo proceso de atraque siempre que cumplan con las condiciones técnicas requeridas. En caso de no ser aptos para su aprovechamiento, estos materiales deberán ser retirados del sitio de obra y transportados a un sitio de disposición final debidamente autorizado, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

A continuación, se presenta un registro fotográfico del estado actual de los tramos:

Frente San Antonio: El consorcio cuenta con un tramo de intervención que abarca desde la abscisa K 6+740 hasta K 4+075, donde se evidencia que han realizado atraque de cunetas en algunos sectores, el material instalado no ha quedado adecuadamente colocado lo que no garantiza que las aguas de escorrentía lleguen a las cuentas, lo que genera lo expuesto en párrafos anteriores. De acuerdo a esto se requiere hacer una revisión de todo el tramo intervenido.



Foto 1: Atraque de cunetas que requiere adecuación K 5+310



Foto 2: Atraque de cunetas que requiere adecuación K 5+340



Foto 3: Atraque de cunetas que requiere adecuación K 5+340



Foto 4: Atraque de cunetas que requiere adecuación K 5+410

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: infoslecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1- 775

	
Foto 5: Atraque de cunetas que requiere adecuación K 4+800	Foto 6: Atraque de cunetas que requiere adecuación K 4+970

	
Foto 7: Atraque de cunetas que requiere adecuación K 4+850	Foto 8: Atraque de cunetas que requiere adecuación K 4+750

En otros tramos se evidencia socavación del material instalado y las aguas de escorrentía que no se canalizan por las cunetas construidas abscisa K 5+810; K 6+400 a K 6+00, igualmente verificar todo el tramo construido.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1- 775

	
Foto 1: Atraque de cunetas que requiere adecuación K 5+810	Foto 2: Atraque de cunetas que requiere adecuación K 6+400

Frente Unión Tunales: El consorcio cuenta con 4 tramos intervenidos (tramo 1 abscisa 0+000 a 2+969, tramo 2 en intervención abscisa 0+000 a 2+057; tramo 3 abscisa 0+000 a 0+254; tramo 4 abscisa 0+000 a 0+714). donde se evidencia que han realizado atraque de cunetas en algunos sectores, el material instalado no ha quedado adecuadamente colocado lo que no garantiza que las aguas de escorrentía lleguen a las cuentas, lo que genera lo expuesto en párrafos anteriores.

De acuerdo a esto se requiere hacer una revisión y adecuaciones en todo el tramo intervenido.

	
Foto 1: Atraque de cunetas que requiere adecuación tramo 2 K 0+710	Foto 2: Atraque de cunetas que requiere adecuación tramo 2 K 0+730

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1- 775

	
Foto 3: Atraque de cunetas que requiere adecuación tramo 2 K 0+810	Foto 4: Atraque de cunetas que requiere adecuación tramo 2 K 0+830
	
Foto 5: Atraque de cunetas que requiere adecuación tramo 2 K 0+870	Foto 6: Atraque de cunetas que requiere adecuación tramo 2 K 0+950
	
Foto 7: Atraque de cunetas que requiere adecuación tramo 2 K 1+050	Foto 8: Atraque de cunetas que requiere adecuación tramo 2 K 1+130

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: infoslecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1- 775

	
Foto 1: Atraque de cunetas que requiere adecuación tramo 2 K 1+270	Foto 2: Atraque de cunetas que requiere adecuación tramo 2 K 1+340

Agradecemos atender esta solicitud de forma prioritaria, remitiendo a esta interventoría el respectivo informe técnico de actividades, registro fotográfico y evidencia de disposición final de RCD (si aplica). De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita al Consorcio tomar las medidas correctivas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de los ajustes implementados en un término no mayor a tres días calendarios posterior al recibo del comunicado.

Sin otro particular

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: N/A

C.C: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS - Lauram.rojas@gobiernobogota.gov.cocdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1-785

Bogotá D.C. 01 de agosto de 2025.

Señor
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Atn: Dr. HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
cevsumapaz@gmail.com
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túnales y Animas Bajas.") GRUPO 2

Asunto: Observaciones componente ambiental frentes de obra Unión Tunales y San Antonio II

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del Consorcio.

De acuerdo a lo anterior se ha evidenciado durante las visitas de supervisión a los frentes de obra Unión Tunales y San Antonio las siguientes observaciones que requieren la atención por parte del contratista de obra:

Frente San Antonio:

1. K 5+450 a K 4+900 Se evidencia material de excavación el cual fue ubicado sobre la zona verde, el consorcio envió soportes de una limpieza realizada en el mes de junio de 2025 sin embargo es evidente que existe un remante de este material en este sector, por lo cual

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1-785

se requiere realizar la limpieza respectiva y completa garantizando que el área quede en igual o mejores condiciones de las inicialmente reportadas; lo anterior para evitar afectaciones sobre la vegetación nativa de paramo que se encuentra en el sector. Véanse fotografías 1 y 2.

2. K 5+410 y K 5+340 se evidencian restos de madera abandonados, se requiere recolección de los mismos y jornada de aseo en el tramo. Véanse fotografías 3 y 4.

3. K 5+410; K 5+240 y K 4+200 se encuentran piezas de acero sin delimitar, es necesario recolectar estos residuos y acopiarlos en una sola área debidamente señalizada y delimitada. Véanse fotografías 5 y 6.

4. K 5+240 y K 4+970 se evidencian dos acopios de residuos de construcción y demolición RCD los cuales requieren que se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.4-07 (cubrimiento y señalización). Adicionalmente garantizar condiciones óptimas en la via de acceso. Véanse fotografías 7 y 8.

5. K 4+200 y K 4+300 se encuentran bolsas rojas las cuales contienen los residuos peligrosos (bolsas de cemento), se recomienda que estas bolsas se almacenen de acuerdo a las medidas de manejo ambiental respectivas que incluyen que estén delimitadas, señalizadas y bajo techo. Véanse fotografías 9 y 10.

6. Se requiere que los acopios de materiales pétreos permanezcan con las medidas de manejo ambiental siempre que no se estén empleando para actividades de obra. K 4+300 y K 4+140 materiales sin cubrir. Véanse fotografías 11 y 12.

7. K 2+800 se evidencia acopio de triturado sin medidas de manejo ambiental, requiere adecuación. Véanse fotografías 13.

8. K 2+840 se requiere retirar del área los residuos solidos acopiados al costado de la via; la llanta que se encuentra en el descole y los rollizos ubicados al costado de via. Véanse fotografías 14, 15 y 16.

9. K 2+140 se evidencia acero ubicado en predio privado sin delimitar. Véanse fotografía 17
10. K 4+200 se encuentra tubería acopiada en predio privado sin delimitar. Véanse fotografía 18.

11. K 2+840 se requiere verificar la terminación del talud donde se construyo la estructura hidráulica de encole ya que se encuentra en predio privado y el propietario había solicitado dejar en adecuadas condiciones de seguridad para evitar accidentes con personas y animales. Véanse fotografía 19.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1-785

12. K 1+150 se evidencia remantes de materiales pétreos (gravilla y arena), empleados para construcción de estructuras hidráulicas de encole y descole, estas ya fueron terminadas por lo cual se requiere el retiro ya que se encuentran al costado de via sin las medidas de manejo ambiental respectivas y sin la adecuada señalización lo que puede ocasionar accidentes con los actores de la via. Véanse fotografía 20.

	
Foto 1: Material excavación acopiad en zona verde K 5+240	Foto 2: Material excavación acopiad en zona verde K 5+340
	
Foto 3: Se requiere recolección de madera K 5+410	Foto 4: Se requiere recolección de madera K 5+310

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1-785

	
Foto 5: Se requiere recolección de acero K 5+240	Foto 6: Se requiere recolección de acero K 4+200.
	
Foto 7: Acopio de RCD k 5+240 requiere cubrimiento y señalización	Foto 8: Acopio de RCD k 4+970 requiere cubrimiento y señalización
	
Foto 9: Residuos peligrosos incorrectamente almacenados K 4+300	Foto 10: Residuos peligrosos incorrectamente almacenados K 4+200

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1-785

	
Foto 11: Materiales pétreos sin cubrir K 4+300	Foto 12: Materiales pétreos sin cubrir K 4+140
	
Foto 13: Acopio sin delimitar K 2+800	Foto 14: Residuos sólidos sin recolectar K 2+840
	
Foto 15: Llanta sin recolectar K 2+840	Foto 16: Rollizos sin recoger ni delimitar K 2+840

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1-785

	
Foto 17: Acero en predio privado sin delimitar K 2+140	Foto 18: Tubería en predio privado sin delimitar K 4+400

	
Foto 19: se requiere ajustar talud K 2+840	Foto 20: Acopio de pétreos que requiere retiro K 1+550

Frente Unión Tunales:

1. Tramo 2 K 0+710 a K 0+910 se requiere realizar un barrido general de la via, puesto que se evidencian restos de materiales granulares en la carpeta asfáltica que con el paso de vehículos puede verse afectada. Lo mismo ocurre en el Tramo 2 K 1+400 en adelante hasta llegar a la carpa donde se encuentran materiales producto de la fundida de cunetas. Se requiere implementar de manera inmediata la limpieza para evitar que se presenten accidentes con los actores de la via. Véanse fotografías 21,22,23 y 24.

2. Tramo 2 K 1+340 a K 1+540 se evidencian residuos de excavación que, al momento de realizar la adecuación del terreno para la fundida de cunetas, se cayeron al predio privado donde se encuentra vegetación conformada por pastos, se recomienda realizar su retiro

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

una vez terminen con dicha actividad. De igual manera se evidencia esta afectación en otros sectores del tramo 2 K 0+810, por lo cual se requiere realizar una revisión integral en todo el frente en ejecución. Véanse fotografías 25, 26, 27 y 28.

3. Se requiere que los acopios de materiales pétreos permanezcan con las medidas de manejo ambiental siempre que no se estén empleando para actividades de obra. Tramo 2 K 1+550 materiales sin cubrir. Véanse fotografía 29.

	
Foto 21: requiere limpieza de via tramo 2 K 0+870	Foto 22: requiere limpieza de via tramo 2 K 0+810
	
Foto 23: requiere limpieza de via tramo 2	Foto 24: requiere limpieza de via tramo 2

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-785

	
Foto 25: requiere retiro de material de excavación.	Foto 26: requiere retiro de material de excavación

	
Foto 27: requiere retiro de material de excavación.	Foto 28: requiere retiro de material de excavación


Foto 29: Acopio que requiere medidas de manejo ambiental

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: infoll@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1-785

Es importante mencionar que una vez clausurados los acopios de materiales pétreos o residuos de construcción y demolición RCD los predios destinados para esta actividad deben dejarse en igual o mejores condiciones de las inicialmente registradas y contar con el soporte respectivo de recibo a satisfacción por parte del propietario, lo mismo aplica para acopios ubicados en espacios públicos en este caso costado de via.

De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita al Consorcio tomar las medidas correctivas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de los ajustes implementados en un término no mayor a tres días calendarios posterior al recibo del comunicado.

Sin otro particular

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: N/A

C.C: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS - Lauram.rojas@gobiernobogota.gov.cocdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.304.625-1

186-1- 797

Bogotá D.C. 06 de agosto de 2025.

Señor
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Atn: Dr. HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
cevsumapaz@gmail.com
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túnales y Animas Bajas.") GRUPO 2

Asunto: Respuesta comunicado CEV/22-449. Informe del componente ambiental No 3 V2 -Aval

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del Consorcio. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Estabilización Vial, remite el Informe Mensual ambiental No 3 V2 se tienen los siguientes comentarios:

- Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Ambiental realizados mediante comunicado 186-1-264 del 09 de agosto de 2023, mesa de trabajo realizada el día 12 de junio de 2025 y el comunicado 186-1-725 del 27 de junio de 2025 al informe mensual No. 3 V1 que comprende el periodo de 01 al 30 de septiembre de 2022, se evidencia que fueron atendidas las observaciones realizadas por lo tanto se da aprobación al mismo en versión 2 puesto que cumple con los requerimientos mínimos del anexo técnico del componente ambiental.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoeecovias.com
NIT 890.304.625-1

186-1- 797

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Sin otro particular

Atentamente,



ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: N/A

C.C: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS -Lauram.rojas@gobiernobogota.gov.co cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co, Jose Miguel Ruiz – jmruiz@gobiernobogota.gov.co

UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA
Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 805

Bogotá D.C. 13 de agosto de 2025.

Señor
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Atn: Dr. HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
cevsumapaz@gmail.com
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túnales y Animas Bajas.") GRUPO 2

Asunto: Solicitud de diligenciamientos formatos RCD enviados por la Unidad de mantenimiento vial UMV, Radicado No. 20251920102621.

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del consorcio Estabilización Vial.


De acuerdo a lo anterior se traslada solicitud enviada por la UMV mediante comunicado 20251920102621 de fecha 08 de agosto de 2025, donde la Entidad Ejecutora Unidad de Mantenimiento vial, solicita ala interventoría requerir a los contratistas hidráulicos del Proyecto Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá – BPIN 2018000050020, con el fin que remitan a la UAERMV la siguiente información:

- Diligenciamiento de los datos en los archivos Excel adjuntos: El contratista consorcio Estabilización Vial se requiere el diligenciamiento completo y preciso de los campos requeridos en los archivos Excel anexos a esta comunicación, los cuales contienen la estructura de información solicitada por la Secretaría Distrital de Ambiente. Como se muestra a continuación:

Carrera 45 Nº 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1- 805

- Anexo 1. Ejemplo

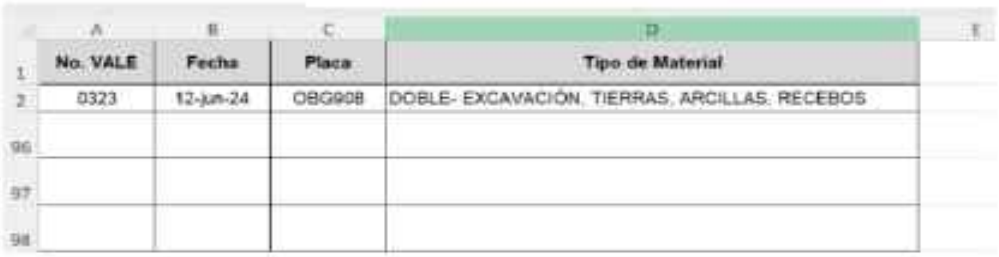

	A	B	C	D	E
1	No. VALE	Fecha	Placa	Tipo de Material	
2	0323	12-jun-24	OBG998	DOBLE- EXCAVACIÓN, TIERRAS, ARCILLAS, RECEBOS	
96					
97					
98					

- Anexo 2. Ejemplo



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	fecha_transpo	placa_transpo	pin_transpo	clasif_sitio	etapa_RC	responsable_despacho	nombre_sitio_recep	dir_sitio_recep
2	2024-04-01	CLO324	17682	3	2	WILLIAM NOVOA	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 28
3	2024-04-01	CLO492	17685	3	2	EDWIN SIERRA	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 28
388								
389								
390								
391								
392								
393								
394								
395								
396								

Cualquier duda que se tenga al respecto favor contacta a Jessica Paola Vidal jessica.vidal@umv.gov.co.

De acuerdo a lo descrito anteriormente se adjunta el comunicado 20251920102621 de fecha 08 de agosto de 2025 enviado por la UMV; junto con los dos formatos en Excel para su pronto diligenciamiento, lo anterior para los fines respectivos.

Sin otro particular

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: Comunicado UMV No. 20251920102621 y Formatos en cuatro (4) folios

C.C: Jose Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

Bogotá D.C., viernes 08 de agosto de 2025

Ingeniero:
LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal ECOVÍAS S.A.S.
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla (Atl)
intersumapaz.ecovias@gmail.com

Referencia: Proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”, del Sistema General de Regalías -SGR- identificado con código BPIN 2018000050020. (Localidad 20 de Sumapaz).

Asunto: Solicitud de información, diligenciamiento matrices soporte de gestión de RCD en el proyecto.

Cordial saludo,

En atención al asunto y considerando los compromisos normativos que desde la Entidad se tienen con la Secretaría Distrital de Ambiente, solicitamos su amable colaboración para requerir a los contratistas hidráulicos del Proyecto Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá – BPIN 2018000050020, con el fin que remitan a la UAERMV la siguiente información:

- Diligenciamiento de los datos en los archivos Excel adjuntos: Agradecemos gestionar con los contratistas el diligenciamiento completo y preciso de los campos requeridos en los archivos Excel anexos a esta comunicación, los cuales contienen la estructura de información solicitada por la Secretaría Distrital de Ambiente. Como se muestra a continuación:

  ✓ Anexo 1. ejemplo



	A	B	C	D	E
1	No. VALE	Fecha	Placa	Tipo de Material	
2	0323	12-jun-24	OBG908	DOBLE- EXCAVACIÓN, TIERRAS, ARCILLAS, RECEBOS	
96					
97					
98					

  ✓ Anexo 2. ejemplo



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	fecha_tiempo	placa_tiempo	pin_tiempo	clasif_sitio	etapa_RC	responsable_despacho	nombre_sitio_recep	dir_sitio_recep
2	2024-04-01	OLO324	17682	3	2	WILLIAM NOVOA	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
3	2024-04-01	OLO492	17685	3	2	EDWIN SIERRA	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20

Cualquier duda que se tenga al respecto favor contacta a Jessica Paola Vidal jessica.vidal@umv.gov.co.

Cordialmente,

C.C Diego Ramiro García Bejarano - Alcalde Local Sumapaz cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

Documento 20251920102621 firmado electrónicamente por:	
JULIO CESAR PINZÓN REYES	Subdirector de Intervención de la Infraestructura SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA julio.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 08-08-2025 11:50:39
Revisó:	RAFAEL DARÍO PEÑA FLÓREZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - rafael.pena@umv.gov.co
	GLORIA ROCIO BOTERO SANCHEZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - gloria.botero@umv.gov.co
Proyectó:	JESSICA PAOLA VIDAL POLOCHE - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - jessica.vidal@umv.gov.co
26975e134fdb0db354cd8a0de9851b3443cd59f0e390361ac47a59a0a5b4a3fe Codigo de Verificación CV: 5e4cb Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

Anexos: 3 folios

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: infoslecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1- 809

Bogotá D.C. 13 de agosto de 2025.

Señor
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Atn: Dr. HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
cevsumapaz@gmail.com
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túnales y Animas Bajas.") GRUPO 2

Asunto: Respuesta comunicado CEV/22-455. Observaciones Informe del componente ambiental No 21 V1

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del consorcio Estabilización Vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del contratista.

De acuerdo a lo anterior una vez revisada la información remitida concerniente al informe mensual No 21 V1 del periodo del 01 al 31 de julio de 2025 se tienen los siguientes comentarios por parte de interventoría que requieren de la atención por parte del Consorcio Estabilización vial:

1. Informe ejecutivo pagina 19 ajustar lo descrito en el párrafo con relación a que no se realizó disposición de RCD ya que según lo que se relaciona en la tabla No 7 si se generó residuos de excavación.

2. Se requiere incluir registro fotográfico de capacitaciones donde aparezca la profesional ambiental aprobada.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: infoatecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1- 809

De acuerdo a lo anterior lo anterior, se solicita su colaboración para la realización de la corrección, ajuste y/o complementación de la información requerida, relacionando en el comunicado de remisión cada una de las observaciones con la justificación, aclaración o indicación de la acción ejecutada y el lugar en el cual se localiza la evidencia según corresponda (anexo, documento, pagina, numeral), lo anterior en un período no mayor a (3) tres días calendario posterior al recibido del presente comunicado.

Sin otro particular

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: N/A

C.C: Jose Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1- 831

Bogotá D.C. 27 de agosto de 2025.

Señor
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
Atn: Dr. HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
cevsumapaz@gmail.com
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túnales y Animas Bajas.") GRUPO 2

Asunto: Respuesta comunicado CEV/22-459. Informe del componente Ambiental No.21 V02-Aval

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del Consorcio. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Estabilización Vial, remite el Informe Mensual ambiental No 21 V2 se tienen los siguientes comentarios:

- Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Ambiental realizados mediante el comunicado 186-1-809 del 13 de agosto de 2025 al informe mensual No. 21 V1 que comprende el periodo de 01 al 31 de julio de 2025, se evidencia que fueron atendidas las observaciones realizadas por lo tanto se da aprobación al mismo en versión 2 puesto que cumple con los requerimientos mínimos del anexo técnico del componente ambiental.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1- 831

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Sin otro particular

Atentamente,



ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: N/A

C.C: Jose Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

CONSORCIO GAVIONES
95

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT 890104625-1

186-1-789

Bogotá D.C. 06 de agosto de 2025

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
info@promotorapuga.com
Bogotá D.C

Referencia: **"**CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.). GRUPO 1.*

Asunto: Respuesta comunicado D-43- 2025-37. Observaciones informe ambiental No 15-V2

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del Contratista.

De acuerdo a lo anterior una vez revisada la información remitida concerniente al informe mensual No 15 V2 del periodo del 01 al 30 de julio de 2025 se tienen los siguientes comentarios por parte de interventoría que requieren de la atención por parte del Consorcio Gaviones 95:

1. Informe ejecutivo pagina 11 indicador No 2 revisar y ajustar el número de trabajadores reportados totales en el frente de obra, ya que en cada registro de capacitación hay 6 trabajadores activos y son los mismos que firman en los dos registros, de acuerdo a lo anterior serian 6 y no 13.

2. Informe ejecutivo página 19 tabla 7 se menciona que en el periodo se generó un total de 30 M3 verificar la conversión a toneladas ya que el valor reportado no es correcto.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890104625-1

186-1-789

3. Informe ejecutivo pagina 28 tabla 14 las imágenes deben estar georreferenciadas. En general se requiere colocar todo el registro fotográfico georreferenciado. Lo anterior tenerlo presente para el próximo informe.

4. Se requiere en la primera hoja colocar el periodo de informe (01 al 30 de junio de 2025).

5. Se solicita unificar el PDF de tal manera que los anexos sean legibles. Es necesario cargar directamente el PDF del archivo original y no convertirlo a imagen teniendo en cuenta que lo anterior altera la calidad del contenido.

De acuerdo a lo anterior lo anterior, se solicita su colaboración para la realización de la corrección, ajuste y/o complementación de la información requerida, relacionando en el comunicado de remisión cada una de las observaciones con la justificación, aclaración o indicación de la acción ejecutada y el lugar en el cual se localiza la evidencia según corresponda (anexo, documento, pagina, numeral), lo anterior en un período no mayor a (3) tres días calendario posterior al recibido del presente comunicado.

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS -lauram.rojas@gobiernobogota.gov.co, cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co
José Miguel Ruiz – jmruiz@gobiernobogota.gov.co

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-798

Bogotá D.C. 07 de agosto de 2025

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
info@promotorapuga.com
Bogotá D.C

Referencia: *"*CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.). GRUPO 1.*

Asunto: Observaciones Componente ambiental Acopios temporales de RCD- G95.

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del Contratista.

De acuerdo a lo anterior se ha evidenciado durante las visitas de supervisión al frente de obra Laguna Verde las siguientes observaciones que requieren la atención por parte del contratista de obra en cuanto a los acopios temporales de los residuos de construcción y demolición RCD:

1. Abscisa K0+000 y K0+140 acopio de RCD donde se evidencia remanentes de residuos de excavación, es necesario retirar completamente estos materiales, conformar el terreno y dejarlo en adecuadas condiciones según lo acordado en acta de autorización. Véanse fotografías 1 y 2.

2. Abscisa K0+430 Acopio temporal de RCD, se encuentra ubicado al costado de via lo cual según PMT no es permitido ya que obstaculiza el tránsito vehicular, además técnicamente obstruye las cunetas y por ende el drenaje natural de aguas superficiales generando empozamientos, saturación del material, escorrentía por la via lo que conlleva a daños mayores en las vías en ejecución. Es importante que estos acopios permanezcan cubiertos y con las medidas de manejo ambiental respectivas, se requiere dar prioridad a la evacuación hacia sitio de disposición final autorizado de los residuos almacenados en estos acopios. Véanse fotografías 3 y 4.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoe@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-798

3. Abscisa K0+480 se encuentran realizando la actividad de excavación para instalación de filtro, parte de los residuos de excavación se depositaron en el predio privado, por lo cual se hace necesario la evacuación de este RCD y limpieza del área, lo anterior teniendo en cuenta que los propietarios de este terreno no aceptaron ninguna intervención dentro de este predio. Véanse fotografías 5 y 6.

4. Abscisa K1+220 Acopio temporal de RCD, se encuentra ubicado en predio privado, sin medidas de manejo ambiental se requiere implementar, delimitación, señalización y cubrimiento. De igual manera se recomienda que el RCD acopiado se contenga de tal manera que evite su caída hacia la parte posterior del almacenamiento temporal de residuos de excavación, lo anterior debido a que este acopio se encuentra localizado en un lugar con bastante pendiente, lo que dificulta su retiro posterior hacia sitio de disposición final autorizado. Se recomienda evaluar la ubicación de este almacenamiento temporal de residuos de excavación dadas las condiciones del terreno donde se encuentra puesto que estos acopios deben ubicarse en terreno firme y nivelado, que evite derrames o deslizamientos. Véanse fotografías 7 y 8.

5. Abscisa K1+440 Acopio temporal de RCD, acopio que se encuentra en predio privado, señalizado y delimitado, sin embargo, se recomienda brindar cubrimiento con material impermeable (plástico, lonas, etc.), para evitar saturación del material y evitar afectaciones en la via por escorrentía dadas las condiciones climáticas presentes en la zona. Es importante que estos acopios permanezcan cubiertos para evitar saturación de los materiales y garantizar que sean recibidos en el sitio de disposición final y su transporte se realice cumpliendo las medidas de manejo ambiental. Véanse fotografías 9 y 10.

6. Abscisa K1+750 Acopio temporal de RCD acopio que se encuentra en predio privado sin medidas de manejo ambiental se requiere implementar, delimitación, señalización y cubrimiento. Se recomienda evaluar la ubicación de este almacenamiento temporal de residuos de excavación dadas las condiciones del terreno donde se encuentra puesto que estos acopios deben ubicarse en terreno firme y nivelado, que evite derrames o deslizamientos. Véanse fotografías 11 y 12.

	
Foto 1: K0+000 remante de excavación	Foto 2: Material excavación acopiad en zona verde K5+340

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-798

	
Foto 3: K0+430 RCD acopiado a costado de via requiere adecuación y evacuación.	Foto 4: K0+430 RCD acopiado a costado de via requiere adecuación y evacuación.
	
Foto 5: K0+480 RCD en predio privado	Foto 6: K0+480 RCD en predio privado
	
Foto 7: K1+220 Acopio que requiere adecuación	Foto 8: K1+220 Acopio que requiere adecuación

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-798

	
Foto 9: K1+440 Acopio RCD que requiere cubrimiento	Foto 10: K1+440 Acopio RCD que requiere cubrimiento
	
Foto 11: K1+750 Acopio RCD que requiere adecuación.	Foto 12: K1+750 Acopio RCD que requiere adecuación

Con base en lo expuesto nos permitimos solicitar al Consorcio Gaviones 95 que los acopios de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) sean ubicados en terrenos técnicamente adecuados que cumplan con los requisitos ambientales y operativos establecidos en la normatividad vigente.
Es fundamental que estos sitios cuenten con condiciones que eviten impactos negativos al entorno, tales como escorrentías, emisiones de partículas o afectaciones al paisaje. Asimismo, los acopios deberán estar debidamente señalizados, organizados y contar con medidas de manejo que permitan su disposición temporal de manera segura. Asi mismo se sugiere al consorcio evacuar los residuos de excavación hacia sitio de disposición final autorizado en el menor tiempo posible.

Teniendo en cuenta lo anterior se cita la siguiente normatividad aplicable la cual debe ser acogida y cumplida por el contratista: Requisitos ambientales y operativos para acopios temporales de RCD (están establecidos principalmente en la Resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 de 2015 y Resolución 472 de 2017**):**

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-798

1. **Almacenamiento temporal adecuado:**
   - El generador debe habilitar zonas internas en el sitio de obra para el acopio temporal, con las siguientes condiciones mínimas:
     - No generar escorrentías hacia fuentes hídricas ni suelos vecinos.
     - No afectar la vegetación o fauna silvestre del entorno.
     - Evitar dispersión por viento (polvo) mediante cubrimiento o humectación.
     - Prohibido el depósito sobre áreas verdes, cuerpos de agua o zonas no autorizadas.

2. **Condiciones del terreno:**
   - Terreno firme y nivelado, que evite derrames o deslizamientos.
   - Lejano de fuentes hídricas, drenajes y áreas de interés ambiental.
   - En caso de almacenamiento en zonas con pendientes, se deben realizar obras de estabilización para evitar deslizamientos y erosión.

3. **Señalización y delimitación:**
   - El área de acopio debe estar claramente delimitada, señalizada y controlada para prevenir el acceso no autorizado y garantizar seguridad.

4. **Tiempo de permanencia:**
   - El almacenamiento temporal no debe convertirse en disposición final. Su permanencia está limitada al tiempo operativo necesario para su evacuación o aprovechamiento.

Es importante mencionar que una vez clausurados los acopios de materiales pétreos o residuos de construcción y demolición RCD los predios destinados para esta actividad deben dejarse en igual o mejores condiciones de las inicialmente registradas y contar con el soporte respectivo de recibo a satisfacción por parte del propietario, lo mismo aplica para acopios ubicados en espacios públicos en este caso costado de via.

De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita al Contratista tomar las medidas correctivas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de la subsanación en un término no mayor a tres días calendarios posterior al recibo del comunicado

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS -lauram.rojas@gobiernobogota.gov.co, cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co, Jose Miguel Ruiz – jmruiz@gobiernobogota.gov.co
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co
Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1- 807

Bogotá D.C. 13 de agosto de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
info@promotorapuga.com
Bogotá D.C
.

Referencia: "CONTRATO No. 478 de 2022 objeto "LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.). GRUPO 1.

Asunto: Solicitud de diligenciamientos formatos RCD enviados por la Unidad de mantenimiento vial UMV. Radicado No. 20251920102621.

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95.

De acuerdo a lo anterior se traslada solicitud enviada por la UMV mediante comunicado 20251920102621 de fecha 08 de agosto de 2025, donde la Entidad Ejecutora Unidad de Mantenimiento vial, solicita ala interventoría requerir a los contratistas hidráulicos del Proyecto Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá – BPIN 2018000050020, con el fin que remitan a la UAERMV la siguiente información:

- Diligenciamiento de los datos en los archivos Excel adjuntos: De parte del contratista Consorcio Gaviones 95 se requiere el diligenciamiento completo y preciso de los campos requeridos en los archivos Excel anexos a esta comunicación, los cuales contienen la estructura de información solicitada por la Secretaría Distrital de Ambiente. Como se muestra a continuación:

Bogotá D.C., viernes 08 de agosto de 2025

Ingeniero:
LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal ECOVÍAS S.A.S.
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla (Atl)
intersumapaz.ecovias@gmail.com

Referencia: Proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”, del Sistema General de Regalías -SGR- identificado con código BPIN 2018000050020. (Localidad 20 de Sumapaz).

Asunto: Solicitud de información, diligenciamiento matrices soporte de gestión de RCD en el proyecto.

Cordial saludo,

En atención al asunto y considerando los compromisos normativos que desde la Entidad se tienen con la Secretaría Distrital de Ambiente, solicitamos su amable colaboración para requerir a los contratistas hidráulicos del Proyecto Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá – BPIN 2018000050020, con el fin que remitan a la UAERMV la siguiente información:

- Diligenciamiento de los datos en los archivos Excel adjuntos: Agradecemos gestionar con los contratistas el diligenciamiento completo y preciso de los campos requeridos en los archivos Excel anexos a esta comunicación, los cuales contienen la estructura de información solicitada por la Secretaría Distrital de Ambiente. Como se muestra a continuación:

  ✓ Anexo 1. ejemplo



	A	B	C	D	E
1	No. VALE	Fecha	Placa	Tipo de Material	
2	0323	12-jun-24	OBG908	DOBLE- EXCAVACIÓN, TIERRAS, ARCILLAS, RECEBOS	
96					
97					
98					

  ✓ Anexo 2. ejemplo



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	fecha_tiempo	placa_tiempo	pin_tiempo	clasif_sitio	etapa_RC	responsable_despacho	nombre_sitio_recep	dir_sitio_recep
2	2024-04-01	OLO324	17682	3	2	WILLIAM NOVOA	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
3	2024-04-01	OLO492	17685	3	2	EDWIN SIERRA	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20

Cualquier duda que se tenga al respecto favor contacta a Jessica Paola Vidal jessica.vidal@umv.gov.co.

Cordialmente,

C.C Diego Ramiro García Bejarano - Alcalde Local Sumapaz cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

Documento 20251920102621 firmado electrónicamente por:	
JULIO CESAR PINZÓN REYES	Subdirector de Intervención de la Infraestructura SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA julio.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 08-08-2025 11:50:39
Revisó:	RAFAEL DARÍO PEÑA FLÓREZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - rafael.pena@umv.gov.co
	GLORIA ROCIO BOTERO SANCHEZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - gloria.botero@umv.gov.co
Proyectó:	JESSICA PAOLA VIDAL POLOCHE - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - jessica.vidal@umv.gov.co
26975e134fdb0db354cd8a0de9851b3443cd59f0e390361ac47a59a0a5b4a3fe Codigo de Verificación CV: 5e4cb Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

Anexos: 3 folios

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: infoatecovias.com
NIT: 890104 625-1

186-1- 807

- Anexo 1. Ejemplo

	A	B	C	D	E
1	**No. VALE**	**Fecha**	**Placa**	**Tipo de Material**	
2	0323	12-jun-24	OBG908	DOBLE- EXCAVACIÓN, TIERRAS, ARCILLAS, RECEBOS	
96					
97					
98					

- Anexo 2. Ejemplo



Cualquier duda que se tenga al respecto favor contacta a Jessica Paola Vidal jessica.vidal@umv.gov.co.

De acuerdo a lo descrito anteriormente se adjunta el comunicado 20251920102621 de fecha 08 de agosto de 2025 enviado por la UMV; junto con los dos formatos en Excel para su pronto diligenciamiento, lo anterior para los fines respectivos.

Sin otro particular

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: : Comunicado UMV No. 20251920102621 y Formatos en cuatro (4) folios

C.C: Jose Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-817

Bogotá D.C. 21 de agosto de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
info@promotorapuga.com
Bogotá D.C

Referencia: "CONTRATO No. 478 de 2022 objeto "LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.). GRUPO 1.

Asunto: Respuesta comunicado D-49- 2025-37. Entrega informe ambiental No 15 junio de 2025 V2 -Aval.

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte del contratista. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Gaviones 95, remite el Informe Mensual ambiental No 15 V2 se tienen los siguientes comentarios:

- Una vez surtidos los requerimientos y/o ajustes solicitados por la interventoría del componente Ambiental realizados mediante los comunicados 186-1-764 de 25 de julio de 2025 y 186-1-789 del 06 de agosto de 2025 al informe mensual No. 15 V2 que comprende el periodo de 01 al 30 de junio de 2025, se evidencia que fueron atendidas las observaciones realizadas por lo tanto se da aval al mismo en versión 2 puesto que cumple con los requerimientos mínimos del anexo técnico del componente ambiental.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-817

De igual manera se aclara al contratista que la documentación podrá ser objeto de modificaciones en caso de que las condiciones del proyecto así lo requieran y/o que la Entidad contratante lo solicite o lo requiera, lo cual debe ser atendido por el contratista.

El presente concepto de aprobación no exime al contratista de su responsabilidad sobre la información presentada, su veracidad e implementación de la documentación remitida.

Sin otro particular

Atentamente,



ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: N/A

C.C: Jose Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

ENTIDAD EJECUTORA
UMV

Bogotá D.C., viernes 08 de agosto de 2025

Ingeniero:
LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal ECOVÍAS S.A.S.
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla (Atl)
intersumapaz.ecovias@gmail.com

Referencia: Proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”, del Sistema General de Regalías -SGR- identificado con código BPIN 2018000050020. (Localidad 20 de Sumapaz).

Asunto: Solicitud de información, diligenciamiento matrices soporte de gestión de RCD en el proyecto.

Cordial saludo,

En atención al asunto y considerando los compromisos normativos que desde la Entidad se tienen con la Secretaría Distrital de Ambiente, solicitamos su amable colaboración para requerir a los contratistas hidráulicos del Proyecto Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá – BPIN 2018000050020, con el fin que remitan a la UAERMV la siguiente información:

- Diligenciamiento de los datos en los archivos Excel adjuntos: Agradecemos gestionar con los contratistas el diligenciamiento completo y preciso de los campos requeridos en los archivos Excel anexos a esta comunicación, los cuales contienen la estructura de información solicitada por la Secretaría Distrital de Ambiente. Como se muestra a continuación:

  ✓ Anexo 1. ejemplo



	A	B	C	D	E
1	No. VALE	Fecha	Placa	Tipo de Material	
2	0323	12-jun-24	OBG908	DOBLE- EXCAVACIÓN, TIERRAS, ARCILLAS, RECEBOS	
96					
97					
98					

  ✓ Anexo 2. ejemplo



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	fecha_tiempo	placa_tiempo	pin_tiempo	clasif_sitio	etapa_RC	responsable_despacho	nombre_sitio_recep	dir_sitio_recep
2	2024-04-01	OLO324	17682	3	2	WILLIAM NOVOA	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
3	2024-04-01	OLO492	17685	3	2	EDWIN SIERRA	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20

Cualquier duda que se tenga al respecto favor contacta a Jessica Paola Vidal jessica.vidal@umv.gov.co.

Cordialmente,

C.C Diego Ramiro García Bejarano - Alcalde Local Sumapaz cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

Documento 20251920102621 firmado electrónicamente por:	
JULIO CESAR PINZÓN REYES	Subdirector de Intervención de la Infraestructura SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA julio.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 08-08-2025 11:50:39
Revisó:	RAFAEL DARÍO PEÑA FLÓREZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - rafael.pena@umv.gov.co
	GLORIA ROCIO BOTERO SANCHEZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - gloria.botero@umv.gov.co
Proyectó:	JESSICA PAOLA VIDAL POLOCHE - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - jessica.vidal@umv.gov.co
26975e134fdb0db354cd8a0de9851b3443cd59f0e390361ac47a59a0a5b4a3fe Codigo de Verificación CV: 5e4cb Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

Anexos: 3 folios

Bogotá D.C., agosto 2025

Ingeniero:
LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal ECOVÍAS S.A.S.
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla (Atlántico)
intersumapaz.ecovias@gmail.com

REFERENCIA: Proyecto "Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá", del Sistema General de Regalías -SGR- identificado con código BPIN 2018000050020. (Localidad 20 de Sumapaz)

ASUNTO: respuesta a comunicación No. 186-1-650 – radicado UAERMV No 20251120068562, relacionado con observaciones a los Componentes Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo – SST.

En atención al oficio relacionado en el asunto, mediante el cual la Interventoría presenta observaciones relacionadas con la gestión de los componentes Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, la Unidad de Mantenimiento Vial – UMV se permite informar lo siguiente:

1. *En recorridos realizados durante el mes de abril de 2025 a los frentes de obra donde la UMV se encuentra ejecutando trabajos; se evidencia que se encuentran ubicadas unidades sanitarias portátiles USP suministradas por la empresa BOGA de la siguiente manera (Capitolio 2 USP, Unión Tunales 2 USP y San Antonio-toldo 4 USP 1 fuera de servicio), sin embargo, desde el 09 de abril no se les ha realizado el mantenimiento requerido para su correcto funcionamiento, los cuales deben ejecutarse dos veces por semana, es responsabilidad de la Entidad Ejecutora garantizar el cumplimiento de la resolución 2400 de 1979 donde se especifica que se deben contar con unidades sanitarias identificadas por genero una cada 15 trabajadores, con los respectivos mantenimientos semanales con el fin de garantizar el saneamiento básico a los trabajadores en obra. De igual manera lo contempla la ficha PAGA manejo de residuos líquidos domésticos. De acuerdo con lo anterior en los informes mensuales se debe remitir el certificado del mantenimiento y de la disposición del vertimiento.*
Se requiere que se tomen las medidas correctivas necesarias para subsanar este hallazgo ya que la inadecuada gestión de estas USP puede llegar a generar olores desagradables, aparición de vectores en el área y generar una emergencia por derrame de estos residuos en la zona, además afecciones en el personal que usa estos dispositivos al no están en condiciones higiénicas seguras.

Respuesta: se informa que el contrato No 507 de 2022 correspondiente al alquiler de unidades sanitarias mixtas, finalizó el pasado 24 de abril de 2025. Por lo tanto, se procedió con la solicitud formal de retiro de las unidades existentes, gestión que fue realizada ante el contratista

responsable el día 12 de mayo del 2025. Así mismo, se requirió al contratista el cumplimiento cabal de todas las obligaciones contractuales, tanto en términos de suministro como de mantenimiento y disposición final, conforme a los términos establecidos, como se evidencia en el ***anexo 1***.

Adicionalmente, se realizó la instalación de 8 unidades sanitarias nuevas el día 16 de mayo del 2025 por parte del contratista BAMOCOL, proceso para el cual ya se coordinó los aspectos logísticos y contractuales correspondientes.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

2. *Se recomienda a la Entidad ejecutora hacer seguimiento y llamado de atención al contratista de maquinaria con el fin de que cumpla con las medidas de manejo ambiental durante el suministro de combustible a los equipos en obra, lo anterior basados en los derrames de combustible que se han evidenciado durante el periodo y los cuales se citan a continuación:*

Frente de obra Unión Tunales abscisa K0+020, derrame evidenciado el 07 de abril, adicional a este se evidenciaron dos derrames más, uno en el área donde inicia la placa huella y el otro en el K0+10 causado por la ruptura de una manguera del minicargador.

Frente San Antonio Abscisa K3+500, derrame evidenciado el día 22 de abril en el área del campamento. El día 29 de abril en la vía principal Troncal Bolivariana a la altura de la vivienda de la señora Balbina Peñaloza se evidencio un derrame considerable de combustible, el cual no fue atendido de manera inmediata por el contratista generando riesgo vial en el área principalmente a los actores de la vía.

El contratista para el transporte seguro de combustible se recuerda que debe cumplir con la siguiente normativa:

- *Todos los recipientes o envases deberán tener sus etiquetas que identifiquen claramente el producto que contiene, cumpliendo las recomendaciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 "Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado". Decreto 1496 de 2018 tiene por objeto adoptar el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.*

- *Para el almacenamiento, uso y manejo de los residuos, de estas sustancias se deberán seguir las instrucciones de sus respectivas hojas de seguridad, y aplicar las normas que regulan esta actividad, dentro de las cuales se citan:*

  - *La ley 55 de julio 2 de 1993, por medio de la cual se aprobó el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.*

  - *El Decreto 1609 de julio 31 de 2002, por medio del cual se reglamentó el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Compilado por el decreto 1079 de 2015.*

  - *Decreto 1076 de 2015 y decreto 1630 de 2021.*

  - *El Decreto 4741 de diciembre 30 de 2005, por medio del cual se reglamentó parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.*

  - *Ley 9 de 1979 código sanitario*

- *Para el conductor de vehículo se requiere que tenga competencia de manejo de sustancias peligrosas.*

- *El vehículo debe contar con kit control de derrames, extintor de 20 libras, hojas de seguridad de los productos químicos transportados, y los demás documentos aplicables para el trasporte seguro y legal.*

Respuesta: Se informa a la interventoría que se realizó charla de seguridad con el personal encargado del transporte de combustible, con el fin de reforzar las competencias sobre el manejo seguro de sustancias peligrosas y la atención oportuna de contingencias ambientales. Ver ***Anexo 2***

De igual manera se solicitó al contratista de maquinaria el ajuste y fortalecimiento de su protocolo de manejo de combustibles y residuos peligrosos, así como la dotación completa de los kits de control de derrames, extintor y la disponibilidad de las hojas de seguridad en los vehículos utilizados para este fin.

Adicional a lo anterior, se realiza seguimiento más estricto desde el componente de SST y ambiental de la UMV, con el objetivo de verificar de manera continua el cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas.

Con relación a los derrames reportados, Desde la supervisión del contrato, se han realizado requerimientos oportunos y reiterativos al contratista de maquinaria con el fin de dar cumplimiento a las medidas ambientales establecidas para la operación de equipos en los distintos frentes de obra. Como parte de este seguimiento, el contratista ha provisto dos kits de control de derrames, los cuales han sido dispuestos para atender de forma inmediata cualquier eventualidad relacionada con el manejo de hidrocarburos. Estos kits han sido ubicados estratégicamente para cubrir de manera efectiva las zonas de intervención activa, lo que ha permitido mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas. El objetivo de dicho requerimiento fue solicitar apoyo en la gestión adecuada del almacenamiento, transporte y abastecimiento de combustible, en atención a los incidentes ocurridos durante el mes de abril de 2025, tal como se evidencia en el ***Anexo 3*****.**

Como respuesta a esta solicitud, el contratista remitió un informe en el que se detalla la atención brindada y se aclaran los incidentes presentados, lo cual se encuentra documentado en el ***Anexo 4*****.**

Respecto a la atención de los derrames, se procedió de la siguiente manera:

- El día 9 de abril de 2025, se realizó acompañamiento y atención inmediata al derrame reportado en el frente de obra Unión–Tunales. Para la contención y recolección del material derramado, se utilizaron los kits antiderrames disponibles en obra por parte de la UAERMV, con el apoyo de un trabajador de BOAL, se emplearon paños absorbentes de forma adecuada, con el fin de mitigar los impactos del incidente.

- El derrame ocurrido en San Antonio fue atendido de manera inmediata, llevando a cabo la recolección del material derramado y una jornada de orden y aseo en el área de RESPEL.

- En cuanto al incidente ocurrido en la vía principal Troncal Bolivariana, a la altura de la vivienda de la señora Balbina Peñaloza, el contratista procedió con el retiro de los vehículos y maquinaria involucrada, posterior a ello, se efectuó la limpieza y despeje de la vía el día 3 de junio de 2025.

Es importante mencionar que, los residuos recogidos fueron dispuestos de manera temporal en el dique de sustancias químicas del campamento San Juan, conforme a los protocolos establecidos para el manejo de residuos peligrosos. Esta acción se realizó con el fin de garantizar un almacenamiento seguro y controlado hasta su disposición final, lo anterior se encuentra soportado en el registro fotográfico:

EVIDENCIA FOTOGRAFICA













Desde el componente ambiental se realizó una jornada de sensibilización dirigida a los operadores, el objetivo fue promover el uso adecuado y responsable del combustible, así como prevenir futuros incidentes que puedan afectar el entorno. Esta actividad quedó documentada y

se evidencia en el ***Anexo 5***, donde se registran los temas abordados y la participación del personal operativo.

Por otra parte, en cuanto a los hechos puntuales señalados en su comunicación, se ha conminado al contratista de maquinaria a reforzar las acciones preventivas y correctivas, tanto en la operación como en el mantenimiento de la maquinaria, de la misma manera, se ha solicitado la reposición de elementos de contención en caso de haber sido utilizados, y se hace un seguimiento constante mediante el apoyo técnico en campo y la revisión de reportes diarios de operación.

Adicional a lo anterior se informa que, a la fecha el contratista ha dispuesto extintores, kits de control de derrames, rotulación adecuada de los recipientes, y hojas de seguridad de los productos utilizados, entre otros elementos exigidos por la normativa vigente. Así mismo, se ha avanzado en la capacitación del personal responsable del manejo y suministro de combustible, y en la estructuración de una logística que garantice mayor seguridad en el almacenamiento, transporte y uso de estos materiales.

Finalmente, desde la supervisión del contrato de maquinaria, se continúa realizando seguimiento a este proceso de implementación, reiterando su carácter obligatorio y procurando que cada acción esté alineada con lo establecido en la NTC 1692, el Decreto 1079 de 2015 y demás disposiciones aplicables al manejo de sustancias peligrosas y residuos en el marco de la operación de maquinaria.

3. *En cuanto a los formatos de preoperacionales suministrados por el contratista de maquinaria amarilla y vehículos se requiere que el formato sea acorde a la maquina o vehículo inspeccionado por lo cual se sugiere individualizar los registros de tal manera que sean aplicables a la inspección detallada que se debe ejecutar a cada equipo.*

Respuesta: El contratista de maquinaria entregó a los operadores los formatos de inspección preoperacional, los cuales fueron diseñados de manera específica para cada uno de los equipos dispuestos en obra. Esta individualización permite realizar una verificación diaria más precisa y acorde con las características técnicas y operativas de cada máquina y/o vehículo. Lo anterior garantiza el cumplimiento de los lineamientos de seguridad y funcionamiento establecidos para este tipo de inspecciones.

Desde la Entidad se realizó el acompañamiento para la entrega de dichos formatos a cada uno de los operadores que se encuentran en los frentes de obra. Ver ***Anexo 6***

4. *En general para todos los tramos en intervención Unión Tunales, Capitolio y San Antonio se reitera a la Entidad Ejecutora que es necesario mantener los acopios temporales de RCD de acuerdo a lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS) y así mismo retirar estos residuos hacia sitios de disposición final autorizados en un tiempo máximo de 72 horas según lo descrito en la ficha la cual describe textualmente " El tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y*

escombros en espacio público es de 72 horas, es el tiempo máximo para su disposición final en el lugar autorizado. De requerirse el almacenamiento temporal de escombros única y exclusivamente se realizará en los puntos de acopio, aprobados por la interventoría, cumpliendo de igual forma con la señalización, demarcación y protección (plástico, lonas, etc.)". Lo anterior debido a que en comités integrales No 39,40 y 41 se solicitó el retiro de residuos de excavación de acopios que llevan más del tiempo permitido y aun no se ha cumplido dicho requerimiento por parte de la UMV. Ejemplo acopio km 2+350, km 1+655 y km 0+730 en tramo San Antonio. véase foto 7 y 8.

Respuesta: se informa a la interventoría que, con el apoyo de la unidad Boal´s se viene adelantando la protección y señalización de los diferentes acopios que se encuentran en cada uno de los frentes de obra en intervención, cumpliendo con las medidas de manejo ambiental estipuladas en la ficha PAC-2.1-04, el retiro de RCDs se ha venido realizando simultáneamente en los diferentes segmentos viales, para el periodo de abril se realizó la disposición final de 168 m^3. Ver ***Anexo 6.*** (Se adjunta registro fotográfico de las gestiones realizadas en cada uno de los segmentos viales.)

REGISTRO FOTOGRAFICO UNION TUNALES	
	
REGISTRO FOTOGRAFICO SANTO DOMINGO/CAPITOLIO	
	

REGISTRO FOTOGRAFICO TOLDO/SAN ANTONIO	
	

Cordialmente,

C.C Diego Ramiro García Bejarano - Alcalde Local Sumapaz cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

Documento 20251920103011 firmado electrónicamente por:	
JULIO CESAR PINZÓN REYES	Subdirector de Intervención de la Infraestructura SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA julio.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 08-08-2025 14:55:37
Revisó:	RAFAEL DARÍO PEÑA FLÓREZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - rafael.pena@umv.gov.co
	GLORIA ROCIO BOTERO SANCHEZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - gloria.botero@umv.gov.co
Proyectó:	LEIDY YOHANA ORTIZ URREA - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - leidy.ortiz@umv.gov.co
b551c38e1a9e6e1348c97101ea67b108d1161d61a693a7d3ea0916c80101608c Codigo de Verificación CV: 84f74 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

Anexos: 6 folios

CONSORCIO
ESTABILIZACION VIAL

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-455

Bogotá D.C., 5 de agosto de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Informe mensual ambiental No 21

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del informe mensual del componente ambiental No 21, correspondiente al periodo del mes de julio del 2025.

El cual se puede descargar por medio del siguiente link

INFORME AMBIENTAL No 21 V1.pdf

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Archivo en PDF
HLM/ac

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-459

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Respuesta oficio 186-1-809 Informe ambiental No 21 V2

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del informe mensual del componente ambiental No 21, atendiendo las observaciones por medio del oficio 186-1-809, correspondiente al periodo del mes de julio del 2025.

El cual se puede descargar por medio del siguiente link

INFORME AMBIENTAL No 21 V2.pdf

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Archivo en PDF
HLM/ac

CONSORCIO GAVIONES
95

CONSORCIO GAVIONES 95
901.563.341-0

Bogotá D.C. 12 de Agosto de 2025.

Correspondencia Despachada
Consecutivo: D-49
Vigencia: 2025
Sede: CONSORCIO GAVIONES 95
Fecha de Radicación: 12/08/2025-03:25 PM
Asunto: Respuesta comunicado 186-1-789. Observaciones informe ambiental No 15-V2.
Anexos: DIGITAL
Documento: AMBIENTAL
Destinatarios Externos: ECOVIAS S.A.S-(BARRANQUILLA) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y
D-49-2025-37

Señores
ECOVIAS SAS
Atn.: Luiggi Pugliese Mercado
intersumapaz@ecoviasas.com
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla, Atlántico

Referencia: Contrato No. 478-2022 cuyo objeto es, *"GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)"*

Asunto: Respuesta comunicado 186-1-789. Observaciones informe ambiental No 15-V2.

Respetados señores,

Reciban un cordial saludo. En atención a las observaciones realizadas sobre el Informe ambiental 15 V2 presentado, nos permitimos dar respuesta a cada uno de los puntos señalados, con el ánimo de fortalecer la calidad de la información entregada y garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

Página 11 - Indicador No. 2 – Número de trabajadores reportados:
Se ha verificado que en los registros de capacitación aparecen seis (6) trabajadores activos que firmaron en ambos eventos, por lo cual se ajustará el número total reportado en el frente de obra para reflejar correctamente esta situación.

Página 19 - Tabla 7 – Conversión de m³ a toneladas:
Se reviso y se ajustó la conversión de los 30 m³ reportados en el informe verificando el factor de conversión adecuado con base en el tipo de material utilizado, y se corregirá el valor en toneladas para reflejar datos precisos.

Página 28 - Tabla 14 – Registro fotográfico georreferenciado:
Atendiendo la recomendación, se procederá a incluir imágenes georreferenciadas en el siguiente Informe.

Primera hoja – Periodo del informe:
Se incorporará claramente el periodo del informe (01 al 30 de junio de 2025) en la primera hoja del documento, para facilitar su identificación y seguimiento.

Unificación del PDF y calidad de los anexos:
Se acatará la instrucción de unificar el documento en un solo archivo PDF, garantizando que los anexos sean legibles y que se conserve la calidad del contenido original.

Agradecemos las recomendaciones brindadas, las cuales serán tenidas en cuenta para la elaboración y entrega del siguiente informe. Reiteramos nuestro compromiso con la mejora continua y el cumplimiento de los estándares requeridos.

Atentamente,

LUIS ORLANDO PULIDO GARCÍA
Representante
CONSORCIO GAVIONES 95
CC: Apoyo a la supervisión FDRS

4.B INFORME COMPONENTE SST

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

ECOVIAS SAS



INFORME MENSUAL SST DE INTERVENTORÍA
N° 31

DEL 01 al 31 DE AGOSTO - DE 2025

Versión 01
Bogotá, D.C. 10 de septiembre de 2025

ECOVIAS SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		N°. DE COPIAS
Copia N°.1	Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	1 (Original)
Copia N°.2	Biblioteca del Proyecto	1 (Copia)

CONTROL DE VERSIONES

ÍNDICE VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFCACIÓN	FOLIOS

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN




TULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 31			
PERIODO:	**01 al 31 de agosto de 2025**			
NUMERO DE REVISIÓN			1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN Residente de Interventoría	Nombre:	Jesús Antonio Rincón Benavides		
	Firma:			
	Fecha:	10/09/2025		
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Ermy A. Hurtado R.		
	Firma:			
	Fecha:	10/09/2025		
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
				
	Fecha:	10/09/2025		

TABLA CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 8

2 OBJETIVOS 11

2.1 OBJETIVO GENERAL 11

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11

3 CONTRATO DE OBRA N^{O}. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95 12

3.1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA 12

3.2 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN SGSST Y SUS PROGRAMAS 12

3.2.1 Informes semanales SST del contratista contrato 478 13

3.2.2 Informe mensual SST del contratista contrato 478 14

3.2.3 Personal 14

3.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social 14

3.2.5 COPASST 14

3.2.6 Comité de convivencia Laboral 14

3.2.7 Inspecciones de Seguridad 14

3.2.8 Acciones Preventivas 14

3.2.9 Rotación de personal 15

3.2.10 Medicina Preventiva y del Trabajo 15

3.2.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos 15

3.2.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias 15

3.2.13 Accidentalidad 15

3.3 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 16

3.3.1 Manejo de Baños 16

3.3.2 Punto de hidratación 16

3.3.3 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros 16

3.3.4 Plan de acción 16

3.3.5 Manejo de campamentos y almacenes 16

3.3.6 Permisos de trabajo para actividades especificas 17

3.3.7 Registro de maquinaria del contratista 17

3.3.8 Investigación de accidentes 18

3.3.9 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST del contratista 18

4 CONTRATO DE OBRA N^{O}. 479 DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL. 19

4.1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA 19

4.2 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN SGSST Y SUS PROGRAMAS 19
4.2.1 Informe mensual SST 20
4.2.2 Informes semanales SST. 20
4.2.3 Personal 20
4.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social 21
4.2.5 COPASST 21
4.2.6 Comité de convivencia Laboral 21
4.2.7 Inspecciones de Seguridad 21
4.2.8 Acciones Preventivas 21
4.2.9 Rotación de personal 22
4.2.10 Medicina Preventiva y del Trabajo 22
4.2.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos 23
4.2.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias 23
4.2.13 Accidentalidad 23
4.3 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 23
4.3.1 Manejo de Baños 23
4.3.2 Punto de hidratación 23
4.3.3 Elementos de protección personal 24
4.3.4 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros 24
4.3.5 Plan de acción 24
4.3.6 Manejo de campamentos y almacenes 24
4.3.7 Registro de maquinaria del contratista 25
4.3.8 Registro de maquinaria, vehículos y equipos del CEV 26
4.3.9 Permisos de trabajo para actividades especificas 27
4.3.10 Investigación de accidentes 27
4.3.11 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST del contratista 27

5 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV 28

5.1 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN SGSST Y SUS PROGRAMAS 28
5.1.1 Informes semanales SST de la UAERMV 29
5.1.2 Informe mensual SST 29
5.1.3 Personal 30
5.1.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social 30
5.1.5 COPASST 30
5.1.6 Comité de Convivencia Laboral 30
5.1.7 Inspecciones de Seguridad 30
5.1.8 Acciones Preventivas 30

5.1.9 Rotación de personal 32
5.1.10 Medicina Preventiva y del Trabajo 32
5.1.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos 32
5.1.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias 32
5.1.13 Accidentalidad 33
5.2 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 33
5.2.1 Manejo de Baños 33
5.2.2 Punto de hidratación 34
5.2.3 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros 34
5.2.4 Plan de acción 35
5.2.5 Manejo de campamentos y almacenes 35
5.2.6 Permisos y Análisis de trabajo para actividades especificas 36
5.2.7 Registro de maquinaria, vehículos y equipos de la UAERMV 36
5.2.8 Investigación de accidentes e incidentes 37
5.2.9 Plan Estratégico de Seguridad Vial 38
5.2.10 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST de la UAERMV 38

6 CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022 39

6.1 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA 39
6.2 AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 39
6.3 CAPACITACIONES, CHARLAS E INDUCCIONES INTERVENTORÍA 39
6.4 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN SG-SST 40
6.5 PERSONAL INTERVENTORÍA 41
6.6 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 42
6.7 ACCIDENTALIDAD 42
6.8 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN 42
6.9 COMITÉS DE SEGUIMIENTO 42

7 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SST DE LA INTERVENTORIA Y LA UAERMV 43

8 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA 44

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 44

10 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 44

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Comités de seguimiento de obra contrato 478 12
Tabla 2 Relación informes semanales entregados 13
Tabla 4 Maquinaria Contrato 479 Consorcio Gaviones 95 18
Tabla 5 Comités de seguimiento de obra contrato 479 19
Tabla 6 Relación informes semanales entregados 20
Tabla 8 Maquinaria Contrato 479 Consorcio Estabilización Vial 27
Tabla 9 Comités de seguimiento de obra UAERMV 28
Tabla 10 Relación informes semanales entregados 29
Tabla 11 Maquinaria y Equipo Contrato 936 37
Tabla 12 Vehículos del contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte cin-regalías-161-2022 41
Tabla 13 Personal Contrato 161 ECOVIAS S.A.S – Interventoría 41
Tabla 14 Comités de seguimiento de obra UAERMV 42
Tabla 15 Comités de seguimiento de obra CEV 42
Tabla 16 Comités de seguimiento de obra Gaviones 95 42

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Evidencia de Kit de seguridad en campamento 15
Ilustración 2 Campamento en terreno 17
Ilustración 3 Señalización de seguridad en excavación 17
Ilustración 4 Maquinaria en campo 18
Ilustración 5 Kit de emergencias Tramo San Antonio 21
Ilustración 6 Kit de emergencias Tramo Tunales 22
Ilustración 7 PMT en obra, Tramo Tunales 22
Ilustración 8 Punto de hidratación campamento San Antonio 24
Ilustración 9 campamento San Antonio 25
Ilustración 10 campamento Tunales 25
Ilustración 11 Maquinaria Tunales 26
Ilustración 12 Publicación políticas SST 30
Ilustración 13 Verificación PMT tramo San Antonio 31

Ilustración 14 Verificación PMT Tramo Tunales 31
Ilustración 15 Verificación PMT Tramo Capitolio 31
Ilustración 16 Elementos disponibles en caso de emergencia..... 32
Ilustración 17 Unidades sanitarias portátiles - Tramo Tunales 33
Ilustración 18 Unidades sanitarias portátiles – Tramo Capitolio 34
Ilustración 19 Unidades sanitarias portátiles - Tramo San Antonio..... 34
Ilustración 20 Campamento Capitolio..... 35
Ilustración 21 Campamento San Antonio 2 y 1..... 35
Ilustración 22 Campamento Unión Tunales..... 36

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

.1. DOCUMENTACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MANTENIMIENTO VIAL

1C. LISTADO DE PERSONAL UAERMV

2. DOCUMENTACION CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14-02-2022

1D. CAPACITACIONES E INDUCCIONES SST – INTERVENTORIA
2D. BITACORAS
3D. PREOPERACIONALES VEHÍCULOS INTERVENTORIA
4D. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES INTERVENTORIA
5D. COMUNICADOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2025
6D. FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP INTERVENTORÍA

1 INTRODUCCIÓN

Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la seguridad de la población en general que deben ser regulados a través del sistema de gestión integrado de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad. Por otro lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador el desarrollo personal y social, son promovidas a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra, de igual forma, las prácticas de control, prevención, mitigación y/o compensación de los múltiples impactos ambientales y de seguridad generados, durante los procesos constructivos. Los cuales deben ser generados y ejecutados por el contratista mediante el plan de seguridad y medio ambiente.

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratista, subcontratista, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de construcción, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto relacionado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se pude generar como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto grado de influencia de un proyecto constructivo en zonas urbanas. Por lo anterior, es de gran importancia tomar las medidas preventivas que ayuden a la integridad de la comunidad, dar cumplimiento a las buenas prácticas en obra, generar consciencia en el trabajador y la comunidad sobre el autocuidado.

En septiembre del 2019, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), presento la formulación para la implementación del proyecto de mejoramiento de vías terciarias en la localidad del Sumapaz, Bogotá D.C. con la intervención aproximadamente de 33.08 kilómetros de vía, con el propósito de solucionar la ineficiencia en la conectividad vial rural de Bogotá D.C. hacia el sector urbano y los municipios aledaños, la cual dificulta la intercomunicación terrestre de los habitantes rurales y con ello, aportar de manera significativa al desarrollo de las áreas rurales y a la mejora de la calidad de vida de la población de la ruralidad del Distrito Capital y en consecuencia de sus municipios colindantes. Teniendo en cuenta lo descrito en la ficha técnica de MGA del 29 de diciembre de 2019 según el código del proyecto BPIN 2018000050020, se tiene proyectado una población beneficiada de 8.281.030 personas.

Mediante este informe, se ofrece al lector un contexto más amplio en el desarrollo de las actividades NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL DE SUMAPAZ, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo - SST de los sectores Capitolio, y Tunales de la localidad de Sumapaz durante el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2025, con el fin del cumplimiento del Plan de Desarrollo Local "Sumapaz en paz, más productiva y ambiental para todos" 2017- 2020.

A fin de ejecutar las actividades de interventoría, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz convocó el Concurso de Méritos Ni FDRS-CMA-182-2021, cuyo objeto es la REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR., mediante la Resolución Nº 008 del 04 de febrero de 2022.

Este proceso de Concurso de Méritos le fue adjudicado a **ECOVÍAS S.A.S**, mediante la Resolución NI. 008 del 04 de febrero de 2022 por un valor inicial del contrato de $3.104.380.144,00**,** en un plazo inicialmente establecido de quince (15) meses.

La entidad contratante frente a las necesidades de la región por mejorar las vías de acceso, adelanto el proceso de licitación púbica Nº LP-006-2021 con el fin de contratar lo que se requiere para la ejecución de obras hidráulicas y muros gaviones para el proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" y la ejecución de las obras viales por parte de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para el proyecto del Sistema General de Regalías – SGR identificado con código BPIN 2018000050020, El cual va a ser ejecutado por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV, mediante un modelo de ejecución mixta, que contempla dos procesos de obra independientes, los cuales se describen a continuación:

Obras hidráulicas (Subdrenes, Berma-cunetas, box culvert) y muros en gavión los cuales se ejecutarán mediante el contrato que surja de la Licitación pública Nº LP-006-2021, cuyo objeto es " CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁHULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO" MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020", Publicado por UAERMV el 5 de octubre de 2021, en la plataforma SECOP II, por un valor estimado de 24.641.217.103, es importante mencionar que dicho proceso licitatorio se adelantara por lotes, teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y se distribuirá de la siguiente manera: Lote 1- San Antonio I (K13 +820- K6+910), Capitolio y Laguna Verde, (Valor estimado de $12.013.390,090) y Lote 2 – San Antonio II (K6+910+K0+00), Unión Tunales y Animas Bajas (Valor estimado de 12.627.827.013)

Instalación de material granular y del fresado estabilizado en las vías, serán ejecutadas directamente por la UAERMV, por un valor aproximado de $32.927.529.354

El CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº. 478 DEL 10/02/2022 fue adjudicado al Consorcio Gaviones 95. "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". CONTRATO PARA LA

EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGOBPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.) el cual tendrá a cargo las obras hidráulicas (Subdrenes, Berma- cunetas, box culvert) y muros en gavión mencionadas en el objeto del contrato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº. 479 DEL 10/02/2022 fue adjudicado al Consorcio Estabilización Vial. "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") el cual tendrá a cargo las obras hidráulicas (Subdrenes, Berma- cunetas, box culvert) y muros en gavión mencionadas en el objeto del contrato.

Instalación del material granular y del fresado estabilizado en las vías, serán ejecutadas directamente por la UAERMV, el CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 deberá supervisar las actividades ejecutadas por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, conforme al proyecto Código BPIN 2018000050020 cuyo objeto es "Mejoramiento de las Vías Terciarías en Bogotá"

Respecto a los contratos de prestación de servicios se está preparando oficio para entrega de contratos según Modificatorio N°. 2 del contrato CIN REGALIAS-161-2022, y para dar respuesta a los comunicados 20237020009711 y 20237010010252.

El presente informe mensual de interventoría a cargo de **ECOVIAS S.A.S.,** describe el seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se relacionan las actividades que se han desarrollado como parte de los controles y seguimientos que efectúa la interventoría a la seguridad y salud en el trabajo en la obra. El informe tiene como objetivo presentar el trabajo conjunto del contratista y la interventoría en pro del manejo de la seguridad en obra y de la conservación del medio ambiente laboral del período que corresponde del 1 al 31 de agosto de 2025.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El presente informe expone, la gestión en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo del PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR., mediante la Resolución Nº 008 del 04 de febrero de 2022., también lo relacionado con la gestión de la Interventoría CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022, adjudicado a **ECOVÍAS S.A.S**, mediante la Resolución NI. 008 del 04 de febrero de 2022 por un valor inicial del contrato de $3.104.380.144,00**,** en un plazo inicialmente establecido de quince (15) meses, y con un plazo final de (23) meses y (29) días, el presente informe que corresponde al periodo transcurrido entre el 01 al 31 de agosto de 2025, busca además, identificar de manera oportuna, hallazgos y/o inconvenientes asociados, haciendo seguimiento de las rutas críticas en el avance de los contratos para dar una solución a cada situación que lo amerite para la Etapa de Construcción.

2.2 Objetivos específicos

- Realizar seguimiento continuo a lo largo del proyecto y reportar sobre los avances y los resultados de la aplicación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

- Seguimiento a la UAERMV y contratistas hidráulicos, sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley.

- Verificar que se mantengan o mejoren las condiciones laborales para los trabajadores de la obra.

3 CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95

3.1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA

A continuación, la Interventoría presenta un resumen de la supervisión a las actividades adelantadas por el contratista Consorcio GAVIONES 95, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con la Etapa de Construcción, para el periodo de 01 al 31 de agosto de 2025, conforme a los compromisos contractuales.

3.2 Verificación de las actividades según SGSST y sus programas

Durante el presente periodo, la contratista realiza actividades de replanteo y construcción de filtros en tramo de Laguna Verde.

En visitas a obra no se evidencia profesional SST en campo, de parte del contratista.

Tabla 1 Comités de seguimiento de obra contrato 478

COMITÉS DE OBRA AGOSTO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
54	01 de agosto de 2025	Se evidencia extintor de camión con fecha de vencimiento a junio de 2025, por lo cual se solicitó subsanar esta observación. No se evidencia preoperacionales en maquinaria ni vehículo, se solicitará mediante comunicado esta observación. Documentos de volqueta SOAT y Revisión Tecnicomecanica, estaba como compromiso de entrega para el 28 de julio de 2025, lo cual no se cumplió. Se solicitó certificado de competencia de operación del minicargador y licencia de conducción del operador que está operando la máquina lo cual tampoco se cumplió. Se solicitó en comité socialización de puntos seguros en operación de maquinaria. Se enfatiza la marca en fotos de: Fecha, Hora, Georreferencia y lugar. Se solicitó en comité señalizar excavaciones con señales reflectivas.
55	08 de agosto de 2025	Se reiteró la señalización con señales reflectivas, esta observación se cumplió en una parte del tramo. Está pendiente por entrega de informes semanales de julio, se crea compromiso para el 08-08-2025. Documentos de volqueta SOAT y Revisión Tecnicomecanica, estaba como compromiso de entrega para el 28 de julio de 2025, lo cual no se cumplió. Se solicitó certificado de competencia de operación del minicargador y licencia de conducción del operador que está operando la máquina lo cual tampoco se cumplió.
56	15 de agosto de 2025	Se evidencia señalización de excavaciones con estacas, estas deben ser con señales reflectivas, en este caso debe ser con colombinas de señalización las cuales van con reflectivos. Documentos de volqueta sencilla placa SBA805: SOAT y Revisión Tecnicomecanica, estaba como compromiso de entrega para el 28 de julio de 2025, se solicitó el cambio de llantas traseras ya que presentan un avanzado estado de desgaste, lo cual no se cumplió. Se solicitó certificado de competencia de operación del minicargador y licencia de conducción del operador que está operando la máquina lo cual tampoco se cumplió. Pendiente entrega de informe SST, del mes de julio 2025. Pendiente entrega de informes semanales de primera semana de agosto 2025. Se realiza la observación de extintor vencido, de volqueta doble cabina placa TSR567

COMITÉS DE OBRA AGOSTO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
57	22 de agosto de 2025	Se subsana observación de extintor vencido, de volqueta doble cabina placa TSR567 Se reiteró la entrega de documentos de volqueta sencilla placa SBA805: SOAT y Revisión Tecnicomecanica, estaba como compromiso de entrega para el 28 de julio de 2025, lo cual no se cumplió, se reprogramó para el 22-08-2025, adicional se solicitó el cambio de llantas traseras ya que presentan un avanzado estado de desgaste. Se solicitó certificado de competencia de operación del minicargador y licencia de conducción del operador que está operando la máquina lo cual tampoco se cumplió. Se evidencia señalización de excavaciones con estacas, estas deben ser con señales reflectivas, en este caso debe ser con colombinas de señalización las cuales van con reflectivos, esta se está cumpliendo parcialmente. Se solicitó curso de alturas a trabajadores que realizan labores aborde de excavación superior a 2m de profundidad, adicional se solicitó mantener salidas seguras de emergencia de las mismas. Informes semanales al día. Fue entregado informe de julio el cual está en revisión.
58	28 de agosto de 2025	Se reiteró la entrega de documentos de volqueta sencilla placa SBA805: SOAT y Revisión Tecnicomecanica, estaba como compromiso de entrega para el 28 de julio de 2025, lo cual no se cumplió, se reprogramó para el 22-08-2025, este compromiso no se cumplió. Se subsana la observación de cambio de llantas traseras de volqueta sencilla. Se solicitó certificado de competencia de operación del minicargador y licencia de conducción del operador que está operando la máquina lo cual tampoco se cumplió. Se evidencia señalización de excavaciones con estacas, estas deben ser con señales reflectivas, en este caso debe ser con colombinas de señalización las cuales van con reflectivos, esta se está cumpliendo parcialmente. Se solicitó curso de alturas a trabajadores que realizan labores aborde de excavación superior a 2m de profundidad, adicional se solicitó mantener salidas seguras de emergencia de las mismas, queda como compromiso de entrega para el 04-09-2025. Informes semanales al día. Se realiza observación de diligenciamiento de preoperacional de minicargador ya que en recorrido no lo tenía. Se realiza observación de orden y aseo en campamento en terreno, ya que el kit de emergencias está obstaculizado.

3.2.1 Informes semanales SST del contratista contrato 478

Durante el presente periodo el contratista, presenta informes del periodo correspondiente, los cuales están en observación.

Tabla 2 Relación informes semanales entregados

INFORMES SEMANALES SST ENTREGADOS DE JULIO DE 2025			
FECHA DE 1ra ENTREGA	**FECHA DE 2da ENTREGA**	**PERIODO**	**RESPONSABLE DE ENTREGA**
11-08-2025		Del 04 al 10 de agosto de 2025	Paul Alberto Rangel Páez
25-08-2025		Del 11 al 17 de agosto de 2025	Paul Alberto Rangel Páez
25-08-2025		Del 18 al 24 de agosto de 2025	Paul Alberto Rangel Páez
05-09-2025		Del 25 al 31 de agosto de 2025	Paul Alberto Rangel Páez

3.2.2 Informe mensual SST del contratista contrato 478

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado informe SST correspondiente a agosto de 2025, al respecto se emitirá la solicitud formal.

3.2.3 Personal

Durante el presente periodo el contratista, no entregó reporte de personal, se solicitará esta información mediante comunicado.

3.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social

Durante el presente periodo el contratista, no presentó las planillas de seguridad social, en el informe mensual, estas deberán ser presentadas en el informe del periodo correspondiente.

3.2.5 COPASST

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado información acerca del COPASST, esta se solicitará junto con el informe mensual SST.

3.2.6 Comité de convivencia Laboral

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado información acerca del Comité de Convivencia Laboral, esta acta se solicitará junto con el informe mensual SST.

3.2.7 Inspecciones de Seguridad

Durante el presente periodo el contratista, no presenta soporte de Inspecciones de Seguridad, estas deben ir adjuntas en el informe del periodo correspondiente.

3.2.8 Acciones Preventivas

Durante el presente periodo el contrato 478, no presentó información acerca de acciones preventivas SST, como lo son capacitaciones e inspecciones de seguridad.



Ilustración 1 Evidencia de Kit de seguridad en campamento

3.2.9 Rotación de personal

Durante el presente periodo el contratista, no reporto rotación de personal.

3.2.10 Medicina Preventiva y del Trabajo

Durante el presente periodo el contratista, no presenta documentación al respecto, esta información deberá ir adjunto con el informe SST del periodo.

3.2.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos

Durante el presente periodo el contratista, no presenta información acerca de Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos SST, el cual debe ir en el informe del periodo correspondiente.

3.2.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado información acerca de Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias, al respecto el contratista deberá presentar en el informe SST dicha información.

3.2.13 Accidentalidad

Durante el presente periodo el contratista, no ha reportado accidentes en su equipo de trabajo.

3.3 Actividades de Seguridad Industrial

Las actividades de higiene industrial se encuentran ligadas a medir y controlar todos aquellos factores ambientales implícitos de cada labor, ya que estas características pueden generar en el trabajador algún efecto negativo ligado con el nivel de exposición a corto, mediano o largo plazo. Con el fin de prevenir esta afectación a la población trabajadora, se dio verificación y atención a los siguientes elementos por parte de la Interventoría:

3.3.1 Manejo de Baños

Durante el presente periodo el contratista, presentó acta de uso de baños, en casas de la zona donde realizan obra, esta fue gestionada por el componente social.

3.3.2 Punto de hidratación

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado evidencia de puntos de hidratación en obra.

3.3.3 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros

Durante el presente periodo el contratista, presentó Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros.

3.3.4 Plan de acción

Durante el presente periodo el Consorcio, no tiene planes de acción relacionadas a la matriz de riesgos, debido a que no hubo cambios en la misma.

3.3.5 Manejo de campamentos y almacenes

Durante el presente periodo, el contratista reportó dos campamentos en obra para el uso del personal permanente en obra, de los cuales uno es una carpa en terreno y el campamento que a la vez es oficina.



Ilustración 2 Campamento en terreno



Ilustración 3 Señalización de seguridad en excavación

3.3.6 Permisos de trabajo para actividades especificas

Durante el presente periodo el contratista, no ha presentado permisos de trabajo en actividades específicas.

3.3.7 Registro de maquinaria del contratista

Para el presente periodo el contratista no ha reportado maquinaria ni vehículos, esta información se solicitará junto con el informe SST del periodo correspondiente.

En recorrido de la interventoría, se evidencia la siguiente maquinaria y vehículos:

Tabla 3 Maquinaria Contrato 479 Consorcio Gaviones 95

EQUIPO/ VEHICULO	MARCA	SERIE/PLACA	MODELO	FIJA EN OBRA	INTERMITENTE EN OBRA	UBICACIÓN
Minicargador	CATERPILLAR			X		Laguna Verde
Volqueta doble cabina	HINO	TSR567			X	Laguna Verde
Volqueta	FORD	SBA805		X		Laguna Verde
Retroexcavadora	CATERPILLAR			X		Laguna Verde
Mini excavadora de oruga	CATERPILLAR			X		Laguna Verde



Ilustración 4 Maquinaria en campo

3.3.8 Investigación de accidentes

Durante el presente periodo el contratista, no ha tenido accidentes laborales, por ello no hay reporte.

3.3.9 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST del contratista

El contratista no ha presentado información acerca de Indicadores SST.

4 CONTRATO DE OBRA Nº. 479 DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.

4.1 Gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista

A continuación, la Interventoría presenta un resumen de la supervisión a las actividades adelantadas por el contratista Consorcio Estabilización Vial (CEV), en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con la Etapa de Construcción, para el periodo de 01 al 31 de agosto de 2025, conforme a las obligaciones contractuales.

4.2 Verificación de las actividades según SGSST y sus programas

Durante el presente periodo el contratista, adelanta labores en el tramo 2 Unión tunales de (levantamiento de detalles, construcción de cunetas), y Toldo - San Antonio 2, tramo 9 (levantamiento de detalles, construcción de cunetas).

Tabla 4 Comités de seguimiento de obra contrato 479

COMITÉS DE OBRA AGOSTO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
76	01 de agosto de 2025	Segundo SST está pendiente de aprobación de parte de la interventoría Señalización en alcantarillas al derredor 1 metro a la redonda (compromiso para 09-06-2025) No se ha cumplido 24-06-2025 Se solicita orden y aseo en campamentos y zona de mezclado Se observan trabajadores sin overol identitario en tramo San Antonio, (No se ha cumplido) Unidades sanitarias móviles (No se ha cumplido) Se solicitó curso de alturas a trabajadores que están realizando trabajo a una altura inferior a 2m No se recibió en las fechas acordadas las planillas de seguridad social del personal Se ha solicitado el uso de guarda de seguridad en mezcladora
77	08 de agosto de 2025	Se solicitó el segundo SST en terreno lo cual no se ha cumplido. Socializar el uso de guarda de seguridad de las mezcladoras Falta de orden y aseo en obra Se observan algunos trabajadores sin el uniforme aprobado por la alcaldía No se ha solucionado la contratación de unidades sanitarias portátiles en obra. Se solicitó en comité el certificado de curso de alturas para trabajadores que realizan actividades en excavaciones a más de 2m de profundidad. Se solicitó en comité la necesidad de contratar 2 auxiliares de tráfico más para cubrir el otro frente de obra en San Antonio. Pendiente informe mensual de julio 2025, compromiso de entrega el 08-08-2025. Kit de emergencias en orden
78	15 de agosto de 2025	Se solicita socializar con el personal el orden y aseo. Se solicita subsanar el tema de overoles en los trabajadores 2do SST, en obra Se solicitó el reforzamiento de los entibados, en comité. Contratación de auxiliares de tráfico en tramo San Antonio, solo hay 2 auxiliares las cuales no cubren los tres frentes de trabajo que hay Minicargador con llantas traseras en avanzado estado de desgaste. Queda de compromiso de cambio para el 25-07-2025

COMITÉS DE OBRA AGOSTO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
		Compromiso revisión de informes SST enviados para el 01 de agosto San Antonio no hay hidratación Se solicitó evidencia Se estuvieron realizando demolición de concreto filtrado en tubería de alcantarilla, lo cual se requiere un permiso en espacios confinados y que el personal esté capacitado para esta labor.
79	22 de agosto de 2025	Se solicita subsanar el tema de overoles en los trabajadores Se solicitó el reforzamiento de los entibados, en comité. Contratación de auxiliares de tráfico en tramo San Antonio, solo hay 2 auxiliares las cuales no cubren los tres frentes de trabajo que hay Minicargador con llantas traseras en avanzado estado de desgaste. Queda de compromiso de cambio para el 25-07-2025 Compromiso revisión de informes SST enviados para el 01 de agosto Se solicita socializar con el personal el orden y aseo ya que se evidencia pedazos varillas en el tramo San Antonio K6+210
80	28 de agosto de 2025	Se solicitó el reforzamiento de los entibados, en comité. Contratación de auxiliares de tráfico en tramo San Antonio, solo hay 2 auxiliares las cuales no cubren los tres frentes de trabajo que hay Queda de compromiso de cambio para el 25-07-2025 Compromiso revisión de informes SST enviados para el 01 de agosto Se solicita socializar con el personal el orden y aseo ya que se evidencia pedazos varillas en el tramo San Antonio K3+420

4.2.1 Informe mensual SST

Para el presente periodo el contratista realiza entrega de informe mensual SST correspondiente al mes de julio de 2025, el día 05 de septiembre de 2025, este se encuentra en revisión.

4.2.2 Informes semanales SST.

Durante el presente periodo el contratista, presentó informes de la semana 1, 2, 3 y 4 de agosto de 2025, mediante correo electrónico.

Tabla 5 Relación informes semanales entregados

INFORMES SEMANALES SST ENTREGADOS DE JULIO DE 2025			
FECHA DE 1ra ENTREGA	**FECHA DE 2da ENTREGA**	**PERIODO**	**RESPONSABLE DE ENTREGA**
11-06-2025		Del 04 al 10 de agosto de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda
25-06-2025		Del 11 al 17 de agosto de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda
25-08-2025		Del 18 al 24 de agosto de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda
01-09-2025		Del 25 al 31 de agosto de 2025	Gloria Liliana Sepúlveda

4.2.3 Personal

Durante el presente periodo el contrato 479, presenta listado de personal, el cual está en revisión.

4.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social

Durante el presente periodo el contratista, presenta planillas de seguridad social las cuales están adjuntas en el informe del periodo, estas están en revisión.

4.2.5 COPASST

Durante el presente periodo el contratista presenta acta de reunión del COPASST, la cual está para revisión en el informe del periodo.

4.2.6 Comité de convivencia Laboral

Durante el presente periodo el contratista, presenta información del Comité de Convivencia Laboral, la cual está para revisión en el informe del periodo correspondiente.

4.2.7 Inspecciones de Seguridad

Durante el presente periodo el contratista presenta soportes de inspecciones de seguridad, las cuales van en el informe presentado.

4.2.8 Acciones Preventivas

Durante el presente periodo, la interventoría ha evidenciado visualmente que el CEV, ha realizado entrega, reposición y uso adecuado de EPP, se mantiene la correcta implementación de PMT y puntos ecológicos como se evidencia en el registro fotográfico



Ilustración 5 Kit de emergencias Tramo San Antonio



Ilustración 6 Kit de emergencias Tramo Tunales



Ilustración 7 PMT en obra, Tramo Tunales

4.2.9 Rotación de personal

Durante el presente periodo se encuentra en revisión la rotación de personal del CEV.

4.2.10 Medicina Preventiva y del Trabajo

El contratista deberá entregar en el informe del mes, los soportes correspondientes a exámenes ocupacionales de trabajadores nuevos y demás actividades que se hayan hecho al respecto, dentro de los 5 primeros días del mes.

4.2.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos

Durante el presente periodo el contratista, presenta soportes de capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos, las cuales van adjuntos en el informe SST del periodo reportado.

4.2.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias

Para el presente periodo el contratista, reporta elementos completos de kit de emergencias, el cual va en el informe del periodo reportado.

4.2.13 Accidentalidad

Durante el presente periodo el contratista no presentó accidentes en su grupo de trabajo, por lo tanto, no hay reporte en cuanto al tema.

4.3 Actividades de Seguridad Industrial

Las actividades de higiene industrial se encuentran ligadas a medir y controlar todos aquellos factores ambientales implícitos de cada labor, ya que estas características pueden generar en el trabajador algún efecto negativo ligado con el nivel de exposición a corto, mediano o largo plazo. Con el fin de prevenir esta afectación a la población trabajadora, se dio verificación y atención a los siguientes elementos por parte de la Interventoría:

4.3.1 Manejo de Baños

Durante el presente periodo el contratista reporta uso de unidades sanitarias en los diferentes tramos "Tunales y San Antonio", estas unidades fueron gestionadas en préstamo, por el componente social, en las casas contiguas a los tramos en obra.

4.3.2 Punto de hidratación

Durante el presente periodo la interventoría, observa puntos de hidratación en obra.



Ilustración 8 Punto de hidratación campamento San Antonio

4.3.3 Elementos de protección personal

La Interventoría observa la entrega de dotación y EPP a personal nuevo y la reposición de EPP por deterioro al personal antiguo, en el informe del periodo correspondiente se deberán adjuntar los soportes correspondientes.

4.3.4 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros

Durante el presente periodo el contratista no presenta cambios en su matriz de riesgos y valoración de peligros, por lo tanto, no se solicita.

4.3.5 Plan de acción

Durante este periodo no se reportaron o evidenciaron hallazgos derivados de auditorías o inspecciones externas, por lo que no fue necesario realizar plan de acción.

4.3.6 Manejo de campamentos y almacenes

La interventoría verifica en este periodo la instalación de campamento administrativo, en el caserío de la Unión y dentro del mismo un almacén general para la operación del proyecto.

Se observa campamentos en los tramos Tunales y San Antonio, para resguardo de los trabajadores en caso de lluvias y lugar para instalación de kits de emergencias.



Ilustración 9 campamento San Antonio



Ilustración 10 campamento Tunales

4.3.7 Registro de maquinaria del contratista

Para el presente periodo el contratista, presenta reporte de formatos de mantenimiento de máquinas y vehículos en terreno, estos van adjuntos al informe del periodo reportado.



Ilustración 11 Maquinaria Tunales

4.3.8 Registro de maquinaria, vehículos y equipos del CEV

La interventoría, en su labor de verificación y aprobación de la maquinaria, equipos y vehículos que presenta el CEV, para la operación en el proyecto, efectúa una comprobación de los documentos legales de cada uno, para determinar su operatividad en el frente de trabajo, para el presente periodo el CEV, presentó documentos de maquinaria y vehículos que están utilizando en el proyecto los cuales deberán ir adjuntos en el informe del correspondiente periodo.

En conjunto con la revisión realizada por la parte técnica de la maquinaria, equipos y vehículos, el componente SST, deberá realizar la verificación de las afiliaciones y pagos de planillas de seguridad social integral que estén vigente, con afiliación ARL en riesgo correspondiente al nivel de riesgo expuesto, exámenes médicos ocupacionales vigentes y sin restricciones al cargo de los operadores de estos.

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria, vehículos y equipo, destinados a la ejecución de la obra, del CEV.

Tabla 6 Maquinaria Contrato 479 Consorcio Estabilización Vial

MAQUINARIA CEV/ AGOSTO 2025						
EQUIPO/ VEHICULO	**MARCA**	**SERIE/PLACA**	**MODELO**	**FIJA EN OBRA**	**INTERMITENTE EN OBRA**	**UBICACIÓN**
Retroexcavadora	JOHN DEERE	310SJ-KC368132	2019	X		El Toldo
Volqueta	CHEVROLET	SRN910	2008		X	Tunales / El Toldo
Volqueta	CHEVROLET	SRN912	2008		X	Tunales / El Toldo
Volqueta	FOTON	JRR702	2021		X	Tunales / El Toldo
Minicargador	CASE	SR200B	2024	X		Tunales
Minicargador	CASE	SR200	2018	X		Toldo
Camioneta	FORD	KXY 360	2022	X		Tunales/ El Toldo
Camioneta	FORD	KXT 299	2023	X		Tunales/ El Toldo
Camioneta	NISSAN FRONTIER	FSW675	2019	X		Tunales/ El Toldo
Camioneta	FORD	GPY162	2020	X		Tunales/ El Toldo

4.3.9 Permisos de trabajo para actividades especificas

Durante el presente periodo el CEV, no requirió diligenciamiento de permisos de trabajo, ya que las actividades que se están realizando no lo requieren.

4.3.10 Investigación de accidentes

Durante el presente periodo el CEV, no reporto accidentes laborales debido a la ausencia de los mismos.

4.3.11 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST del contratista

Durante el presente periodo el contratista, presentó reporte de los indicadores, los cuales van en el informe mensual SST.

5 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV

A continuación, la Interventoría presenta un resumen de la supervisión a las actividades adelantadas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con la Etapa de Construcción, para el periodo del 1 al 31 de julio de 2025, conforme a los compromisos contractuales.

5.1 Verificación de las actividades según SGSST y sus programas

Durante el presente periodo la UAERMV, tiene las siguientes actividades SST.

Tabla 7 Comités de seguimiento de obra UAERMV

COMITÉS DE OBRA AGOSTO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
50	01 de agosto de 2025	Pendiente por subsanar observaciones de los informes de abril y mayo de 2025. Basado en el comunicado se solicita informar que máquina fueron arregladas y cuales fueron retiradas y que máquinas que no tenían sticker les fue colocado Se subsana observación de stickers en máquinas del contrato. Vibro compactador doble rodillo de San Antonio, no tiene fuerza en la operación el cual si lo colocan en una pendiente este no tendría la garantía de sostenerse pudiendo ocasionar accidentes fatales Pendiente rotación de cartelera con las políticas SST Se realiza observación de camionetas sin diligenciar el preoperacional. Se verifica la planilla de seguridad social del conductor del carro tanque placa JTR530
51	08 de agosto de 2025	Camionetas sin preoperacional Carrotanque se verifico planilla de seguridad social el cual aparece con riesgo 1 Vibro compactador presenta fallas eléctricas no le funcionan las luces ni alarma de reversa Es evidente la presencia de dos vehículos más en obra de parte del contratista de maquinaria, por lo cual es necesario solicitar preoperacional de estos vehículos y demás documentos, así mismo se solicita la documentación de los conductores de los mismos Se estuvo realizan labores de aseo en tramo Tunales donde se evidencia de desplazamiento de maquinaria y en lo cual las auxiliares de tráfico no tenían paletas de pare y siga
52	15 de agosto de 2025	Camionetas sin preoperacional Paletas de pare y siga subsanado Retroexcavadora no tiene las guardas de seguridad en tramo Capitolio esta ya lleva hace más de un mes Unidades sanitarias en tramo 1 de san Antonio, Se reportó una volqueta Fotón en el informe de julio, la cual no la habíamos visto en los tramos ¿Desde cuándo está? Y ¿Por qué fue relacionada en dicho

COMITÉS DE OBRA AGOSTO DE 2025		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
		informe? Pendiente informe SST semanal de la 1ra semana de agosto, compromiso de entrega 15-08-25
53	22 de agosto de 2025	Camionetas sin preoperacional Informes semanales al día Informe mensual al día Se reitera observación de Carrotanque con llantas en avanzado desgaste, se emitirá comunicado al respecto Minicargador no tenía diligenciado el preoperacional y no tiene sticker el día 21-08-2025, se emitirá comunicado al respecto Vibro compactador de Tramo Tunales la alarma de reversa no está funcionando correctamente. Se observó transporte de combustible en carrotanque de irrigación en la cabina, lo cual se recuerda que esta no es la forma correcta ni segura de transportar este líquido inflamable, se emitirá comunicado al respecto Volqueta Fotón WMB318, no cuenta con preoperacional diligenciado de ningún día de esta semana y No cuenta con botiquín y el extintor está vencido desde el 2021, se emitirá comunicado al respecto Se observó plástico en el San Antonio K3+100 al lado del campamento. Basado en el accidente ocurrido el día 21-08-2025 con el camión de mantenimiento de unidades sanitarias, es conveniente solicitar documentación del vehículo además de planillas de seguridad social antes que ingresen a obra.

5.1.1 Informes semanales SST de la UAERMV

Durante el presente periodo la UAERMV, presentó informes semanales correspondientes a la 1ra, 2da, 3ra, y 4ta semana de agosto de 2025, estos están en revisión.

Tabla 8 Relación informes semanales entregados

INFORMES SEMANALES SST ENTREGADOS		
FECHA DE ENTREGA	**PERIODO**	**RESPONSABLE DE ENTREGA**
19-08-2025	Del 04 al 08 de agosto de 2025	LEIDY YOHANA ORTIZ
22-06-2025	Del 11 al 15 de agosto de 2025	LEIDY YOHANA ORTIZ
03-08-2025	Del 18 al 22 de agosto de 2025	LEIDY YOHANA ORTIZ
03-09-2025	Del 25 al 29 de agosto de 2025	LEIDY YOHANA ORTIZ

5.1.2 Informe mensual SST

Para el presente periodo la UAERMV, presentó un borrador del informe SST, mensual, el 03 de septiembre de 2025, el cual no venía con los anexos correspondientes, este tiene fecha límite hasta el día 05 de cada mes, por lo cual se emitirá comunicado con la solicitud respectiva.

5.1.3 Personal

Durante el presente periodo la UAERMV, realizó el reporte del personal de la UAERMV, SINTRAUNIOBRAS, contrato 936 (maquinaria), conductores camioneta y vigilancia, para un total de 99 trabajadores, se adjunta documento complementario C1.

5.1.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social

Durante el presente periodo la UAERMV, no realiza entrega planillas de Seguridad Social, estas se solicitarán mediante comunicado.

5.1.5 COPASST

Durante el presente periodo la UAERMV, no entrega acta de COPASST, esta se debe adjuntar en el informe SST, del periodo reportado.

5.1.6 Comité de Convivencia Laboral

Para el presente periodo la UAERMV no presenta acta de Comité de Convivencia Laboral, esta se debe adjuntar en el informe SST, del periodo reportado.

5.1.7 Inspecciones de Seguridad

Durante el presente periodo la UAERMV, no presenta soportes de inspecciones de seguridad, las cuales deben ir en el informe mensual SST del periodo reportado.

5.1.8 Acciones Preventivas

Durante el presente periodo, la interventoría ha evidenciado visualmente que la UAERMV ha realizado entrega, reposición y uso adecuado de EPP, se mantiene la correcta implementación de PMT y señalización en obra, como se evidencia en el registro fotográfico.



Ilustración 12 Publicación políticas SST



Ilustración 13 Verificación PMT tramo San Antonio



Ilustración 14 Verificación PMT Tramo Tunales



Ilustración 15 Verificación PMT Tramo Capitolio

5.1.9 Rotación de personal

Durante el periodo del presente informe la UAERMV, presentó rotación personal, el cual está relacionado en el listado de personal enviado.

5.1.10 Medicina Preventiva y del Trabajo

Durante el presente periodo la UAERMV, no hizo entrega de soportes de actividades en medicina preventiva, estas actividades deben ir en el informe mensual del componente SST.

5.1.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos

Durante el presente periodo la UAERMV, hizo entrega de los soportes de las capacitaciones, inducciones, reinducciones y/o entrenamientos, correspondientes al mes de agosto de 2025, el cual debe ir en el informe mensual SST.

5.1.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias

Durante el presente periodo la UAERMV, realiza entrega de evidencia de actividades relacionadas con el Plan de Emergencias, como lo es, charlas y equipamiento de elementos necesarios ante una emergencia.



Ilustración 16 Elementos disponibles en caso de emergencia

5.1.13 Accidentalidad

Durante el presente periodo no hubo incidentes ni accidentes laborales en el los grupos de trabajo.

5.2 Actividades de Seguridad Industrial

Las actividades de higiene industrial se encuentran ligadas a medir y controlar todos aquellos factores ambientales implícitos de cada labor, ya que estas características pueden generar en el trabajador algún efecto negativo ligado con el nivel de exposición a corto, mediano o largo plazo. Con el fin de prevenir esta afectación a la población trabajadora, se dio verificación y atención a los siguientes elementos por parte de la Interventoría:

5.2.1 Manejo de Baños

La Interventoría ha verificado la disponibilidad de 08 baterías sanitarias portátiles a disposición del personal operativo en tramo, las cuales están distribuidas así: 2 baterías sanitarias portátiles en Unión Tunales, 2 baterías sanitarias portátiles en tramo Capitolio y 4 baterías sanitarias en el Tramo San Antonio; dando cumplimiento a la Ley 09 del 1979 y la resolución 2400 de 1979, como se muestra en las ilustraciones a continuación.



Ilustración 17 Unidades sanitarias portátiles - Tramo Tunales



Ilustración 18 Unidades sanitarias portátiles – Tramo Capitolio



Ilustración 19 Unidades sanitarias portátiles - Tramo San Antonio

5.2.2 Punto de hidratación

Durante el presente periodo la UAERMV, no se evidencia puntos de hidratación para los trabajadores en obra

5.2.3 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros

.

Durante el presente periodo la UAERMV, no presenta cambios en su matriz de riesgos y valoración de peligros, por lo tanto, no se solicita.

5.2.4 Plan de acción

Durante este periodo no se reportaron o evidenciaron hallazgos derivados de auditorías o inspecciones externas, por lo que no fue necesario realizar plan de acción.

5.2.5 Manejo de campamentos y almacenes

Durante el presente periodo la UAERMV, tiene en los tramos de trabajo, 4 carpas, utilizadas como campamento y almacén auxiliar, distribuidas así: dos carpas en el tramo Unión – Tunales, una carpa para el tramo Capitolio y una carpa para el Tramo San Antonio.



Ilustración 20 Campamento Capitolio



Ilustración 21 Campamento San Antonio 2 y 1



Ilustración 22 Campamento Unión Tunales

5.2.6 Permisos y Análisis de trabajo para actividades especificas

Durante el presente periodo la UAERMV, No presentó permisos de trabajo debido a que las tareas que se realizan son rutinarias.

5.2.7 Registro de maquinaria, vehículos y equipos de la UAERMV

La interventoría, en su labor de verificación y aprobación de la maquinaria, equipos y vehículos que presenta la UAERMV, para la operación en el proyecto, efectúa una comprobación de los documentos legales de cada uno, para determinar su operatividad en el frente de trabajo, para el presente periodo la UAERMV, presenta documentos del contrato 936, y documentación de maquinaria de misionalidad, esta debe ir adjunta en el informe del periodo reportado.

En conjunto con la revisión realizada por la parte técnica de la maquinaria, equipos y vehículos, el componente SST, deberá realizar la verificación de las afiliaciones y pagos de planillas de seguridad social integral que esté vigente, con afiliación a ARL, con el riesgo correspondiente al nivel de riesgo expuesto, exámenes médicos ocupacionales vigentes y sin restricciones al cargo de los operadores de estos.

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria, vehículos y equipo, destinados a la ejecución de la obra, subcontrato 936 y de la UAERMV.

Tabla 9 Maquinaria y Equipo Contrato 936

MAQUINARIA UAERMV AGOSTO 2025				
EQUIPO/ VEHICULO	**MARCA**	**FIJA EN OBRA**	**INTERMITENTE EN OBRA**	**UBICACIÓN**
Retroexcavadora sobre llantas	John Deere	X		TUNALES
Motoniveladora	Komatsu	X		TUNALES
Carro Tanque para humedecimiento	Chevrolet	X		TUNALES
Minicargador con martillo	Bob Cat	X		TUNALES
Minicargador con martillo	Bob Cat	X		TUNALES
Vibro compactador doble rodillo tándem 4ton	Hamm	X		TUNALES
Vibrocompactador granulares 8 Ton.	Dynapac	X		TUNALES
Volqueta sencilla	Forland	X		TUNALES
Motoniveladora	Komatsu	X		TUNALES
Retroexcavadora	Caterpillar	X		CAPITOLIO
Motoniveladora	Rhino	X		CAPITOLIO
Vibro compactador 8 ton.	Bomag	X		CAPITOLIO
Minicargador	Bobcat	X		CAPITOLIO
Minicargador con martillo	Mactrack	X		CAPITOLIO
Volqueta sencilla	Forland	X		CAPITOLIO
Motoniveladora	Caterpillar	X		EL TOLDO
Motoniveladora	Komatsu	X		EL TOLDO
Vibro compactador 8 ton.	Caterpillar	X		EL TOLDO
Vibro compactador doble rodillo	Ammann	X		EL TOLDO
Retroexcavadora sobre llantas	Terex	X		EL TOLDO
Retroexcavadora sobre llantas	Luquing	X		EL TOLDO
Carro Tanque para humedecimiento	JBC	X		EL TOLDO
Volqueta sencilla	Fotón	X		EL TOLDO
Minicargador con martillo	Bob Cat	X		EL TOLDO
Camioneta Placa FVK271	Ford	X		**TODOS**
Camioneta placa JOU555	Ford	X		**TODOS**
Camioneta Placa LZM113	Renault	X		**TODOS**
Camioneta Placa LUW609	Renault	X		**TODOS**
Camioneta Placa JTQ144	Renault	X		**TODOS**
Camioneta Placa GET696	SSANGYONG	X		**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**
Volqueta doble troque	Internacional		X	**TODOS**

5.2.8 Investigación de accidentes e incidentes

Durante el presente periodo la UAERMV, no presentó investigación de incidente debido a la ausencia de los mismos.

5.2.9 Plan Estratégico de Seguridad Vial

Durante el presente periodo la UAERMV, no presentó evidencia de conformación de PESV, esta evidencia se debe adjuntar en el informe mensual SST.

5.2.10 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST de la UAERMV

Durante el presente periodo la UAERMV, presentó indicadores de Gestión en SST, los cuales van adjuntos con el informe mensual SST.

6 CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022

6.1 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA.

A continuación, se hará una descripción de las actividades adelantadas por la Interventoría en cuanto a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022, para el periodo del 01 al 31 de agosto de 2025, durante este periodo objeto del informe se dio continuidad a las capacitaciones relacionadas en el cronograma de trabajo.

No se presentaron accidentes de trabajo por parte del personal de la Interventoría.

6.2 Afiliación al sistema general de Seguridad Social

La descripción del personal de ECOVIAS S.A.S. firma interventora, presenta los soportes de afiliación al sistema de seguridad social, de los trabajadores directos, correspondiente a las afiliaciones y cotizaciones a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y Administradora de Riesgos Laborales (ARL), se adjunta copia de planillas de Seguridad Social correspondientes al mes de julio de 2025, en los documentos de soporte de factura de agosto de 2025, en el numeral 9 del cobro mensual de la interventoría.

6.3 Capacitaciones, charlas e inducciones Interventoría

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2025, se dio continuidad a las capacitaciones, charlas e inducciones, relacionadas con el cronograma de trabajo SST, a todo el personal contratado a la fecha por parte de ECOVIAS S.A.S. del contrato *"interventoría de obra pública de infraestructura de transporte cin-regalías-161-2022 fondo de desarrollo rural de Sumapaz y Ecovías S.A.S."*. Se adjuntan en el documento complementario No.1D.

Los temas tratados en las capacitaciones fueron:

- Capacitación
    - Primeros auxilios
    - Respeto a normas de tránsito
    - Riesgo biológico
    - Importancia del cuidado del sistema cardio vascular

Teniendo en cuenta que un grupo de la interventoría está en oficina y otro en campo, se remite las capacitaciones al correo electrónico y/o vía WhatsApp, de cada profesional.

6.4 Verificación de actividades según SG-SST

- Seguimiento de las actividades en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantados por la UAERMV y contratistas, de acuerdo con su plan de trabajo de la Etapa de Construcción.

- Durante el periodo objeto del presente informe se dio seguimiento a la accidentalidad para el contrato de obra, no se presentaron accidentes o incidentes en el periodo, según lo reportado por la parte de la UAERMV y contratistas.

- Seguimiento al suministro de elementos de protección personal, reposición por deterioro, inspección y entrega oportuna de la UAERMV y contratistas.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el COPASST, conformación y actas de reuniones.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el Comité de Convivencia Laboral, conformación y actas de reuniones.

- Revisión de las planillas de pago de Seguridad Social, donde se refleje el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las obligaciones de Seguridad Social del contrato de obra.

- El Residente SST de la Interventoría intervino en los comités integrales y en aquellos espacios donde se solicitó su participación.

- La interventoría lleva control en la bitácora del componente SST, en la cual se realiza las anotaciones de novedades en terreno, con el fin de socializarlas con la profesional SST de la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, de este último se entregó la bitácora correspondiente, al residente técnico para que realizaran las observaciones y firma, según comentarios de parte de la interventoría, pero a causa de no estar el profesional SST obra, y no recibir la autorización de parte del director de parte del contratista Gaviones 95, la bitácora no ha sido firmada, por lo cual se entiende como aceptada todas las observaciones que hay en su contenido, se adjunta documento complementario 2D.

- La Interventoría reporta el uso de tres vehículos tipo camioneta durante el periodo reportado, los cuales realizan el transporte de los profesionales de la interventoría para las actividades de recorridos a obra y asistencia a comités.

  Se adjunta preoperacionales de los vehículos en el documento complementario No.3D.

Tabla 10 Vehículos del contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte cin-regalías-161-2022

N°	TIPO DE EQUIPO	EQUIPO MÍN. REQUERIDO	CANT	MARCA	MODELO	CAPACIDAD
1	**VEHÍCULO PARA ACTIVIDADES EN OBRA**	**SI**	**1**	**CHEVROLET DIMAX**	**2007**	**5 pasajeros**
2	**VEHÍCULO PARA ACTIVIDADES EN OBRA**	**SI**	**1**	**RENAULT DUSTER OROCH**	**2022**	**5 pasajeros**
3	**VEHÍCULO PARA ACTIVIDADES EN OBRA**	**SI**	**1**	**RENAULT DUSTER OROCH**	**2023**	**5 pasajeros**

6.5 Personal Interventoría

Durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2025 se reportan veintisiete (27) trabajadores en total.

Tabla 11 Personal Contrato 161 ECOVIAS S.A.S – Interventoría

N°	PROFESIONAL	NOMBRE
1	Director De Interventoría	Ermy Alcier Hurtado R.
2	Residente De Interventoría 1	José Antonio Plata Giraldo
3	Residente De Interventoría 2	Luiggi Pugliese Mercado
4	Profesional Social	Eva Isabel Bernal
5	Profesional SST	Jesús Antonio Rincón B.
6	Profesional Ambiental	Yesenia Hernández Ramírez
7	Especialista en Geotecnia	Dani Ricardo Acevedo Vergara
8	Especialista en Pavimentos	Dani Ricardo Acevedo Vergara
9	Especialista Hidráulico	Ignacio Segundo De La Hoz
10	Especialista Estructural	Manuel de Jesús Alarcón
11	Especialista en Tráfico	Walter Alfonso Pautt
12	Especialista en diseño Geométrico	Walter Alfonso Pautt
13	Abogado	Eliana Melissa Gil
14	Topógrafo 1	Edwin Andrés Alvear Ortega
15	Topógrafo 2	Cesar Ali Martínez
16	Inspector 1	Brayan Geovanny Mendoza Diaz
17	Inspector 2	Carlos David Rojas
18	Inspector 3	Carlos Julio Macana
19	Técnico Auxiliar De Ingeniería	David Leonardo Ochoa Vanegas
20	Secretaria	Yenifer Dayana Plaza Gómez
21	Cadenero 1	Jhon Jaider Hernández
22	Cadenero 1	Herson Smith Roa Linares

6.6 Cronograma de Capacitaciones

Se realiza actualización y programación de temas SST del mes de agosto de año 2025, Se adjunta documento en el documento soporte No. 4D.

6.7 Accidentalidad

No se presentaron incidentes o accidentes en el equipo de trabajo de la Interventoría.

6.8 Elementos de Protección Personal (EPP) y Dotación

Para el periodo del 01 al 31 de agosto de 2025, se realizó entrega de EPP y dotación a personal de interventoría en obra. Se adjunta documento en el documento soporte No. 6D.

6.9 Comités de seguimiento

Durante el periodo evaluado del 01 al 31 de agosto de 2025, se realizaron cinco (05) comités de seguimiento de obra integrales, con la UAERMV, con el CEV y con el Consorcio Gaviones 95, donde se trataron temas relacionados con los compromisos del componente SST, Social y Técnico.

Tabla 12 Comités de seguimiento de obra UAERMV

COMITÉS SEGUIMIENTO DE OBRA CON LA UAERMV	
Comité No. 54	01 de agosto de 2025
Comité No. 55	08 de agosto de 2025
Comité No. 56	15 de agosto de 2025
Comité No. 57	22 de agosto de 2025
Comité No. 58	28 de agosto de 2025

Tabla 13 Comités de seguimiento de obra CEV

COMITÉS SEGUIMIENTO DE OBRA CON LA CEV	
Comité No. 76	01 de agosto de 2025
Comité No. 77	08 de agosto de 2025
Comité No. 78	15 de agosto de 2025
Comité No. 79	22 de agosto de 2025
Comité No. 80	28 de agosto de 2025

Tabla 14 Comités de seguimiento de obra Gaviones 95

COMITÉS SEGUIMIENTO DE OBRA CON C. GAVIONES 95	
Comité No. 54	01 de agosto de 2025
Comité No. 55	08 de agosto de 2025
Comité No. 56	15 de agosto de 2025
Comité No. 57	22 de agosto de 2025
Comité No. 58	28 de agosto de 2025

7 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SST DE LA INTERVENTORIA Y LA UAERMV

Queda programado a partir de avance de obra realizar:

- Seguimiento de las actividades en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantados por la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, de acuerdo con su plan de trabajo de la Etapa de Construcción.

- Seguimiento a la accidentalidad de la obra.

- Seguimiento al suministro, inspección y reposición de elementos de protección personal de la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, y personal subcontratado.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el COPASST, conformación, acta de reunión de acuerdo con el plan de trabajo presentado por la UAREMV, CEV y Consorcio Gaviones 95.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el Comité de Convivencia Laboral, conformación, acta de reunión de acuerdo con el plan de trabajo presentado por la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95.

- Se realizará seguimiento de cumplimiento de los pagos de seguridad social del personal de la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, y subcontratistas, además de personal directo de la Interventoría en el periodo, de acuerdo con la fecha de corte.

- Elaboración de los informes semanales a entregar cada lunes con el resumen de actividades adelantadas por la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, a la interventoría.

- Elaboración de los informes mensuales a entregar los cinco primeros días de cada mes, incluyendo todas las actividades referentes al Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantadas por la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95, a la interventoría.

8 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA

- Para el presente periodo, la interventoría realizó el seguimiento y control de temas acorde al componente SST en el informe, así mismo se realizó a través de la correspondencia el control y seguimiento a las observaciones presentadas por la UAERMV, CEV y Consorcio Gaviones 95.

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En cuanto a novedades de personal, la Interventoría recibió reportes de ingreso y de retiro de parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV, del Consorcio Gaviones 95 y del Consorcio Estabilización Vial, esta documentación debe ser entregado en el informe mensual.

- La interventoría realizó en el mes de agosto de 2025 los siguientes requerimientos, los cuales van adjuntos en el documento complementario 5D:

  Comunicados a la Unidad de Mantenimiento Vial:

  186-1-790 Rta. Comunicado 20251920096501 Observaciones componente ambiental y SST

  186-1-819 Rta. Comunicado 20251900099291, Rta. oficio No.186-1-680 "Solicitud de Dotación de dotación personal de operadores de maquinaria

  186-1-833 Observaciones componente ambiental y SST- UMV
  186-1-834 Rta Comunicado No. 20251920107041 del 19-08-25 - Rta. comunicación No 186-1-254 Solicitud de documentación, información e informes UAERMV

  186-1-835 Rta. Comunicado No. 20241920165913, con asunto Rta oficio No. 186-1-537, observaciones de los IM-SST 4,5 Y 6 UMV

  186-1-836 Rta Comunicado No. Rta 20251900109701 del 21-08-2025 Transporte indebido

  Comunicados al Consorcio Gaviones 95:

  186-1-799 Observaciones en obra de Seguridad y Salud en el Trabajo - G95

10 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

1. DOCUMENTACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MANTENIMIENTO VIAL

1C. LISTADO DE PERSONAL UAERMV

BOGOTÁ | UMV | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE AGOSTO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

UNIDADES EJECUTORAS Y OPERATIVAS VINCULADAS - CONTRATO 609 DE 2023 - PROYECTO REGALIAS SUMAPAZ

No. de Orden	NOMBRE DE LA UNIDAD	DENOMINACIÓN	COMPOSICION	CANTIDAD PERSONAS	FECHA DE INGRESO
1	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1**	**UEMRD1-REG-01**	**1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**4 personas**	**16-dic-24**
	CARLOS HERNAN RAMOS ERAZO	1087784620	INSPECTOR OBRA	1 personas	12-may-25
	JOSE YECID HERNANDEZ GUTIERREZ	80235605	OFICIAL I	1 personas	16-dic-24
	YEISON MAURICIO CASTELLANOS	1003670730	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
	DILAN ANDRES CANO ROMERO	1007101606	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	14-may-25
2	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1**	**UEMRD1-REG-02**	**1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**4 personas**	**13-ene-25**
	FIDEL DIAZ ZULUAGA	9807823	INSPECTOR OBRA	1 personas	13-ene-25
	RUBEN PEÑALOZA VALBUENA	1022979320	OFICIAL I	1 personas	13-ene-25
	YULIAND ROMERO POVEDA	1022946347	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	7-jul-25
			AYUDANTE DE OBRA	personas	
3	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1**	**UEMRD1-REG-03**	**1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**4 personas**	**13-ene-25**
	LUIS ANIBAL DURAN MONTERO	80434593	INSPECTOR OBRA	1 personas	13-ene-25
	ONOLASCO DELGADO VERGARA	80745216	OFICIAL I	1 personas	13-ene-25
	JUAN DAVID PENAGOS PABON	1069231247	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
	FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ	349277	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	9-jun-25
4	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1**	**UEMRD1-REG-04**	**1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**4 personas**	26-may-25
	OSCAR LEONARDO CAÑON MOJICA	80755852	INSPECTOR OBRA	1 personas	26-may-25
	LUIS TAMARA		OFICIAL I	1 personas	
				personas	11-ago-25
	ELKIN ESTIVEN CARO PEÑALOZA	1032656213	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	26-may-25
5	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 2**	**UEMRD2-REG-01**	**2 Ayudantes**	**1 personas**	**13-ene-25**
	JONATHAN ARVEY TORRES RODRIGUEZ	1069717922	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
	CRSTIAN CAMILO DIAZ	1022928625	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	25-ago-25
	UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 2	**UEMRD2-REG-02**	**2 Ayudantes**	**2 personas**	11-jun-26
				personas	
	ANDRES FELIPE GONZALEZ PRIETO	1072894591	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	11-jun-25
6	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO AYUDANTE - BOAL**	**UEMRDAB-REG-01**	**2 Boal´s**	**2 personas**	19-may-25
	BRAYAN STIVEN PORRAS PALACIOS	1022997635	AYUDANTE BOAL	1 personas	19-may-25
	LUIS HERNANDO RAMIREZ PEÑALOZA	3125436	AYUDANTE BOAL	1 personas	19-may-25
7	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3**	**UEMRD3-REG-01**	**2 Auxiliares de control de trafico**	**2 personas**	**16-dic-24**
	DORA EUNICES PEREZ BUSTOS	1072894823	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	16-dic-24
	JOHANNA CELEMIN NARANJO	1106949475	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	16-dic-24
8	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3**	**UEMRD3-REG-02**	**2 Auxiliares de control trafico**	**2 personas**	**13-ene-25**
	BLANCA ISABEL CASTELLANOS MORALES	1069231364	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
	LINA MARCELA PARADA PEÑALOZA	1022936290	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
9	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3**	**UEMRD3-REG-03**	**2 Auxiliares de control trafico**	**2 personas**	**13-ene-25**
	JESLY JULIANA GUZMAN MORA	1003486609	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
	DERLY XIOMARA MORA GUZMAN	1032656229	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	20-ago-25
	UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3	**UEMRD3-REG-04**	**2 Auxiliares de control trafico**	**2 personas**	11-jun-25
	ELVIA MARIA CAMARGO LOPEZ	1032029173	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	11-jun-25
	DIANA CRISTINAAVELLANEDA HERNANDEZ	1002548039	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	11-jun-25
10	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS DIURNA SGR**	**UELTD-REG-01**	**1 Topografo, 1 cadenero 1° y 1 cadenero 2°**	**2 personas**	**16-dic-24**
	JOSE DAVID LOPEZ BOBADILLA	80810144	TOPOGRAFO	1 personas	16-dic-24
	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	1003486903	CADENERO I	1 personas	16-dic-24
	JESUS ANTONIO GONZALEZ WILCHES	79400503	CADENERO II	1 personas	22-jul-25
11	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS DIURNA SGR**	**UELTD-REG-02**	**1 Topografo, 1 cadenero 1° y 1 cadenero 2°**	**3 personas**	**9-ene-25**
	GIOVANNY ALFREDO GIRALDO NAVARRO	79839669	TOPOGRAFO	1 personas	9-ene-25
	NEYER IVAN AGUDELO BARBOSA	80127396	CADENERO I	1 personas	9-ene-25
	JULIO ESNEYDER RAMIREZ GIL	1000454144	CADENERO II	1 personas	9-ene-25
13	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS DIURNA SGR**	**UELTD-REG-04**	**1 Topografo, 1 cadenero 1° y 1 cadenero 2°**	**2 personas**	3-jun-25
	JEISSON ORLANDO FONSECA TAMI	1030662359	TOPOGRAFO	1 personas	3-jun-25
			CADENERO I	personas	
	JUAN DAVID DELGADO VERGARA	1032656043	CADENERO II	1 personas	3-jun-25
14	**UNIDAD DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - DIURNA**	**UGSTD-REG-01**	**2 Tecnologos SST con curso de alturas**	**2 personas**	**16-dic-24**
	NEIDI JHOANNA NOVA BERMUDEZ	53049895	TECNOLOGO SST - CON CURSO DE ALTURAS	1 personas	16-dic-24
15	**UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A _Modificacion 02**	**UOTVHD-10A-Rur-M2**	**2 Conductores volqueta doble-troque _ Aliment. y Alojamiento**	**2 personas**	**16-dic-24**
	WILLIAN NEIRA MORENO	79816036	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	5-feb-25
	HERNAN DARIO HERRERA MORALES	80747512	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
16	**UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A**	**UOTVHD-10A**	**2 Conductores volqueta doble-troque.**	**2 personas**	**16-dic-24**
	WILMAN ALONSO MUÑOZ BAUTISTA	1022994231	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
	JAIRO ALBERTO ROZO HERNANDEZ	79801113	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
17	**UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A**	**UOTVHD-10A**	**2 Conductores volqueta doble-troque**	**2 personas**	**16-dic-24**
	RICARDO ALBA NIÑO	79363456	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
	RICAUTE CARDONA AGUIRRE	18222467	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
				42 personas	

INGENIERO SUPERVISOR ZONAL - CONTRATO 609 DEL 2023

1	**INGENIERO SUPERVISOR ZONAL**	**ING-IZ**	**1 Ingeniero inspector de zona**	**1 persona**	**16/12/2024**
	JULIO ALBEIRO HERNANDEZ CALDERON	1013662369	INGENIERO INSPECTOR ZONAL	1 personas	16-dic-24
				1 personas	

BOGOTÁ | UMV | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE AGOSTO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

CONTRATO No. 936 del 2024 CONSORCIO H Y C SERVICIOS DE MAQUINARIA						
FRENTE DE OBRA UNION-TUNALES						
1	**OPERADORES DE MAQUINAS Y CONDUCTOR DE VEHICULOS**	**GO-01_HYC**		**23**	**Personas**	
	EDGAR RAUL ESPITIA RODRIGUEZ	1106482733	OPERADOR CARRO TANQUE	1	persona	16-ene.-25
	ISMAEL OLMOS DIMATE	80269138	OPERADOR CARRO TANQUE	1	persona	21-abr.-25
	GREGORIO MERCHAN	79669879	OPERADOR MOTONIVELADORA	1	persona	24-jul.-25
	CAMILO GOMEZ TORRES	79445528	OPERADOR RETROESCAVADORA	1	persona	
	ARNULFO LOPEZ BURGOS	11435690	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	30-mar.-25
	LUIS ALEJANDRO MESA BAYONA	74183248	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	19-ago.-25
	FABIO ESPINOZA ARIAS	79249326	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	14-ago.-25
	CARLOS JAVIER LEMUS	1055229337	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	04-'8-2025
	SEBASTIAN BLANCO SANCHEZ	1025322582	SUPERVISOR MAQUINARIA	1	persona	15-ene.-25
	NILSON LOPEZ BURGOS	11435690	OPERADOR VOLQUETA SENCILLA	1	persona	14-abr.-25
	LUIS GABRIEL PEREZ CASTRILLO	1064786137	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	31-mar.-25
	ALONSO VARGAS PLAZAS	3232285	OPERADOR MOTONIVELADORA	1	persona	22-may.-25
	YEFERSON ALEXANDER RUEDA BARRANTES	1105670124	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	
	OCTAVIO ALFONZO MENDEZ	3214253	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	19-may.-25
	JUAN CARLOS SILVA	1032400140	OPERADOR RETROESCAVADORA	1	persona	16-jun.-25
	ERIBERTO JIMENEZ FERNANDEZ	3166130	OPERADOR MOTONIVELADORA	1	persona	5-feb.-25
	ERNESTO MEDINA MELO	11251471	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	21-abr.-25
	CRISTIAN CAMILO HURTADO GRAJALES	1053607177	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	16-jun.-25
	HENRY RUA	1067593903	OPERADOR RETROESCAVADORA	1	persona	10-mar.-25
	WILMER YOANY PEREZ CASTRO	1069231015	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	16-jun.-25
	LUIS HOYOS	1003501103	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	16-jun.-25
	LUIS EDUARDO LOPEZ GUERRERO	79249265	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	20-ene.-25
	JHAIR ANDRES ARAGON LAGUNA	1024578432	OPERADOR RETROESCAVADORA	1	persona	24-jul.-25
				23	persona	

CONTRATO No. 485 del 2022 MEGASEGURIDAD LTDA. SERVICIOS DE VIGILANCIA						
FRENTE DE OBRA UNION-TUNALES						
1	**GUARDAS DE SEGURIDAD - VIGILANTES**	**GO-01_MEG-SEG**		**12**	**Personas**	**15-ene-25**
	LEIDY BAQUERO ORJUELA	1069740888	VIGILANTE	1	persona	4-ago.-25
	ALBERTO VILLALBA VERGARA	79632496	VIGILANTE	1	persona	4-ago.-25
	DANIEL OCTAVIO GONZALEZ	1033793787	VIGILANTE	1	persona	4-ago.-25
	MAICOL ALEJANDRO PEÑALOZA MUÑOZ	1069231461	VIGILANTE	1	persona	4-ago.-25
	YAQUELIN LOPEZ MENESES	1032656446	VIGILANTE	1	persona	4-ago.-25
	ALCY PAIPA CUBILLOS	79726810	VIGILANTE	1	persona	4-ago.-25
	JAIME TORRES GARCIA	1022937601	VIGILANCIA	1	persona	21-ago.-25
	NIDIA HERNANDEZ PENAGOS	20824393	VIGILANCIA	1	persona	4-ago.-25
	BERNARDO PEÑALOZA PARADA	80253923	VIGILANCIA	1	persona	23-ago.-25
	ADRIANA POVEDA DELGADO	1003652964	VIGILANCIA	1	personas	4-ago.-25
	VIVIAN STEYSI CANO ROMERO	1001061206	VIGILANCIA	1	personas	4-ago.-25
	BALBINA PEÑALOZA VALBUENA	1022956902	VIGILANCIA	1	personas	4-ago.-25
				12	**personas**	

CONTRATO CAMIONETAS 4*4 VIAJANDO POR COLOMBIA 006 DE 2025						
3	EDISON FERNEY HURTADO GARCIA	1007519653	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	21-jul.-25
	BRAYAN ALEXIS PEÑALOZA CORTES	1022979929	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	21-jul.-25
	ELMER USECHE MOLINA	79590077	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	24-jun.-25
	MILLER CENTENO CORTES	1087124575	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	
	GONZALO RIOS MURCIA	80070964	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	4/08/2025
	RICARDO HERNANDEZ TORRES	10244512837	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	21/08/2025
				6	**persona**	

CONTRATISTAS UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL						
3	RAFAEL DARIO PEÑA FLORES	79105538	DIRECTOR DE OBRA	1	persona	28-nov.-24
	CAMILO ERNESTO ROJAS GARCIA	1010162306	RESIDENTE DE OBRA	1	persona	29-nov.-24
	JORGE LUIS ALDANA PERDOMO	79958784	RESIDENTE DE OBRA	1	persona	14-abr.-25
	JESICA PAOLA VIDAL POLOCHE	1030669188	RESIDENTE AMBIENTAL	1	persona	7-abr.-25
	RUBY DEL CARMEN RUIZ ARRIETA	1005551124	RESIDENTE SOCIAL	1	persona	4-abr.-25
	LEIDY YOHANA ORTIZ URREA	1069764358	RESIDENTE SST	1	persona	4-abr.-25
	JENNIFER CAROLINA VELA PAIVA	1018482183	PROFESIONAL ENCARGADO DE TRAZABILIDAS Y SEGUIMIENTO TECNICO	1	persona	2-dic.-24
	OMAR FERNEY PATIÑO TORRES	80197609	PROFESIONAL TRAZABILIDAD Y MAQUINARIA	1	persona	13-dic.-24
	YINA RUTH FONSECA ACOSTA	1069744056	APOYO ADMINISTRATIVO	1	persona	2-dic.-24
				9	persona	

TOTAL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO	**93**

Profesional SST LEIDY YOHANNA ORTIZ URREA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

	FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE AGOSTO 2025
PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025	

UNIDADES EJECUTORAS Y OPERATIVAS VINCULADAS - CONTRATO 609 DE 2023 - PROYECTO REGALIAS SUMAPAZ						
No. de Orden	**NOMBRE DE LA UNIDAD**	**DENOMINACIÓN**	**COMPOSICION**	**CANTIDAD PERSONAS**		**FECHA DE RETIRO**
	OSNAIDER PAEZ	1023031682	CADENERO I	1	personas	20/08/2025
	IVAN ARLEY TORRES LARA	1032656076	AYUDANTE DE OBRA	1	personas	25-082025
				2	personas	
CONTRATO No. 936 del 2024 CONSORCIO H Y C SERVICIOS DE MAQUINARIA						
	MANUEL FERNANDO MORA CAMACHO	1030631412	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	15/08/2025
	EDGAR ARMANDO DAZA	79249326	OPERADOR RETROESCAVADORA	1	persona	20/08/2025
				2	persona	
CONTRATO No. 485 del 2022 MEGASEGURIDAD LTDA. SERVICIOS DE VIGILANCIA						
	DUBER JULIO SANCHEZ VILLALBA	3171163	VIGILANCIA	1	persona	11/08/2025
	ADRIANA LUCIA MARTIN PALACIOS	1007297824	VIGILANCIA	1	persona	10/08/2025
				2	persona	

PERSONAL RETIRADO EN EL MES	**6**
TOTAL PERSONAL QUE ESTUVO VINCULADO AL PROYECTO EN EL MES	**99**

2. DOCUMENTACION CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14-02-2022

1D. CAPACITACIONES E INDUCCIONES SST – INTERVENTORIA

ORGANIZACIÓN BASE [ ] PROYECTO [X]

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 Código de proyecto: BPIN "2018000050020

Fecha: Del 01 al 31 de agosto de 2025 Sitio: BOGOTÁ - SUMAPAZ

Tema: CAPACITACIÓN EN: Primeros auxilios, Respeto a normas de tránsito, Riesgo biológico, Importancia del cuidado del sistema cardio vascular

Presentador del tema: Jesús Antonio Rincón Benavides

Objetivo de la capacitación: Dar a los trabajadores el conocimiento en cuanto a los diferentes riesgos en el trabajo

ITEM Asistentes:

	Nombre	Cargo	Firma	Observaciones / Comentarios sobre la capacitación
1	Emry Alcier Hurtado Romero	Directora Interventoría		
2	José Antonio Plata Giraldo	Residente Técnico 1		
3	Luiggi Pugliese Mercado	residente Técnico 2		
4	Yesenia Hernandez Ramírez	Profesional Ambiental		
5	Eva Isabel Bernal Yasso	Profesional Social		
6	Dani Ricardo Acevedo Vergara	Especialista en Geotecnia y pavimentos		
7	Ignacio Segundo De La Hoz	Especialista Hidráulico		
8	Manuel de Jesús Alarcón	Especialista Estructural		
9	Walter Alfonso Pautt	Especialista en Tráfico y diseño Geométrico		
10	Eliana Melissa Gil	Abogado		
11	Brayan Geovanny Mendoza Diaz	Inspector 1		
12	Carlos David Rojas	Inspector 2		
13	Carlos Julio Macana sechagua	Inspector 3		
14	David Leonardo Ochoa	Ingeniero de Apoyo		
15	Edwin Andrés Alvear Ortega	Topógrafo 1		
16	Cesar Ali Martinez	Topógrafo 2		
17	Yenifer Dayana Plaza Gómez	Secretaria		
18	Jhon Jaider Hernández	Cadenero 1°		
19	Herson Smith Roa Linares	Cadenero 1°		

Firma presentador del tema

2D. BITACORAS

01-08-2025
Se realiza participación en comité integral de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva. Túnales: En el frente de obra se evidencia PMT implementado, campamento movil en sitio, con kit control de derrames, Kit de emergencia completo y punto de Hidratación activo.
0 CER - 01-08-2025

02-08-2025 San Antonio
se evidencia jornada de orden y aseo en el tramo permanencia de cuipa, Kit de emergencia, PMT implementado y personal usando EPP respectivos.
02-08-2025 - Grupo CER

03-08-2025
El contratista no desarrollo actividades constructivas en obra. CER - 03-08-2025 - Grupo

04-08-2025 San Antonio
Se recomienda mantener via limpia en el tramo en intervención ya que se evidencia material suelto que puede ocasionar incidentes con los actores de la via. se requiere mejorar la señalización del acopio principal de excavación. genera una jornada de Orden y aseo en el K5+000 a K5+800.
Personal en obra: 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficiales, 6 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, 1 conductor de camioneta, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, Grupo encoles: 1 oficial, 2 ayudantes. Maquinaria y equipos en obra: 1 Retrocargador, 1 Minicargador, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa Vibradora, 1 generador electrico, 1 vibrador de concreto, 1 Volqueta doble, se recomienda tomar la medida de seguridad para realizar el retiro del concreto de la alcantarilla
04-08-2025 Grupo CER

05-08-2025 Tunales.
En recorrido realizado se evidencia reposición de paleta para y SIGA PMT implementado correctamente con señales Verticales y 2 auxiliares de trafico en sitio, Campamento movil en tramo, con Kit de Emergencia completo, punto de hidratación activo, personal haciendo uso de dotación Equipo minicargador con preoperacional, se evidencia area en el tramo sin señalizar lo cual es comunicado a la patronal del consorcio. Personal en obra: 1 inspector, 2 auxiliares de trafico, 5 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador. Maquinaria y equipos en obra: 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 placa vibratoria, 1 vibradora de concreto, 1 generador de energia, 1 carretera. 05-08-2025 Consorcio CEV

06-08-2025 San Antonio
Personal en obra: Grupo descoles: 1 topografo, 1 cadenero, 2 oficiales, 6 ayudantes, 2 auxiliares de trafico, 1 conductor de camioneta y/o Volqueta doble, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador. Grupo encoles: 1 oficiales, 2 ayudante). Maquinaria y equipos en obra: 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 cortadora, 1 apisonador, 1 placa vibratoria, 1 generador electrico, 1 vibrador de concreto, 1 Volqueta doble. En recorrido en el frente de obra se evidencia cinta en obra, kit de emergencia completo, PMT implementado con señales móviles y auxiliares de trafico, los equipos cuentan con preoperacionals diligenciados, punto de hidratación activo, se solicita jornada de orden y aseo en el tramo en intervención y recolección de acero dejado en diferentes tramos y dejar el area correctamente delimitada, especialmente la excavación. Consorcio -06-08-2025 CEV

07-08-2025
El contratista no desarrollo actividades constructivas en los frentes de obra.
07-08-2025 Consorcio CEV

08-08-2025
Participación en comite integral de obra, donde se realiza seguimiento a la actividades desarrollados por el componente, se dexaiben los compromisos y desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva.
El contratista no desarrollo actividades constructivas en el frente de obra. - 08-08-2025 Emprendimientos CEV

09-08-2025
El contratista no desarrollo actividades constructivas en los frentes de obra. 09-08-2025 Emprendimientos CEV

10-08-2025
El Contratista no desarrollo actividades constructivas en los frentes de obra. - 10-08-2025 Emprendimientos CEV

11-08-2025 Tunales.
En recorrido por el frente de obra, se evidencia personal haciendo uso de los EPP y dotacion respectiva, En campo se cuenta con la permanencia de los equipos de atencion de emergencia, camilla, botiquin extintor, cinteleria informativa, hidrotaion activa, acero señalizado, se solicita limpieza de via del tramo en intervención. Personal en obra: 1 inspector, 2 auxiliares de trafico, 5 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador. Maquinaria en obra 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 placa vibradora, 1 vibrador de concreto, 1 generador de energia, 1 cortadora. 11-08-2025 - Emprendimientos CEV

12-08-2025 San Antonio.
Personal en obra: 1 topografo, 1 cadenero, 1 inspector, 2 auxiliares de trafico, 1 operador de minicargador, 1 operador de retro cargador, 1 conductor de Volqueta doble, Grupo enredos: 1 oficial, 2 ayudantes: Maquinaria en obra: 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 Volqueta doble,

1 mezcladora, 1 vibrador de concreto, 1 placa vibratoria, en recorrido se evidencia personal sin el overol de la obra, se recomienda colocar adecuadamente la señala del PMT se evidencian 2 auxiliares de trafico en el tramo de conetas, se recomienda ubicar caipa en el tramo, donde se mantengan los equipos de Emergencia, hidratacion para el personal, cartelera informativa y demas elementos.
12-08-2025 - CEI - Compromiso
13-08-2025 Tunales.
En recorrido por el tramo se evidencia personal haciendo uso de la dotacion respectiva, se recomienda organizar las formaletas que ubican al lado de la via cuando las retiran colocar señalizacion ya que ocupan parte de la via y cuando dan transito los carros pasan muy cerca, lo cantera para evitar incidentes con todos los actores de la via, En el tramo en intervencion se requiere una jornada de limpieza de via. se identifica acero delimitado. En caipa se cuenta con punto de hidratacion activo. Kit de Emergencia, cartelera informativa - Personal en obra: 2 auxiliares de trafico, 5 ayudantes 1 oficial, 1 operador de minicargador. Maquinaria y equipos en obra: 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 placa vibratoria, 1 Vibrador de concreto, 1 generador de Energia, 1 cortadora.
13-08-2025 - Compromiso CEI
14-08-2025 San Antonio.
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia PMT implementado con dos auxiliares de trafico activos, se recomienda ubicar la caipa movil donde se ubiquen los elementos de Emergencia, el punto de hidratacion, y cartelera informativa. Se recomienda dotar al personal del overol respectivo de la obra, se identifica excavacion delimitada al igual que el tubo del K 41300. Personal en obra: 1 topografo, 1 Cadenero, 1 inspector, 2 auxiliar de tráfico, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor Volqueta, Grupo encales, 1 maestro, 4 oficiales, 2 ayudantes, Maquinaria y equipos de obra: 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 Volqueta

doble, 1 placa vibratoria, 1 generador electrico, 1 contador.
14-08-2025 - CEV - Enfermero
15-08-2025
Se realiza Participacion en comite integral de obra, donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas, los cuales quedan registrados en el acta respectiva.
Tunales: Personal en obra: 1 inspector, 1 oficial, 1 BOAL, 2 ayudantes, 2 auxiliar de trafico, 1 comision de topografia, 1 operario de Vibrocompactador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor de Volqueta sencilla, 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador. Maquinaria y equipos en obra: (1 ~~Motoniveladora~~) Rhino, 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 placa vibratoria, 1 ~~interpretadora~~, 1 generador electrico.
Enfermero 15-08-2025 CEV
16-08-2025
Se realiza jornada de Orden y aseo en los dos frentes de obra, y adecuacion general.
16-08-2025 CEV - Enfermero
17-08-2025
El contratista no realizo actividades constructivas en los frentes de obra - 17-08-2025 CEV Enfermero
18-08-2025
El contratista no realizo actividades constructivas en los frentes de obra 18-08-2025 CEV - Enfermero
19-08-2025 Tunales
En recorrido se evidencia, PMT implementado con Senales verticales moviles, dos auxiliares de trafico activos, se identifica la permanencia en frente de la Caipa movil donde se ubican los elementos de Emergencia respectivos (Camilla, botiquin y extintor), no se evidencia hidratacion para el personal, se recomienda mantener conos delimitados, el personal que se encontro en frente parkin

el overol o dotacion respectiva, se encuentra el minicargador con el soporte de preoperacional diligenciado. CER - Enfasis 19-08-2025

20-08-2025 San Antonio.
durante el recorrido, se evidencia personal con el overol respectivo. PMT implementado con señales verticales moviles, se recomienda instalar la valla movil donde se ubiquen los elementos de emergencia, el punto de hidratacion, la cinta de cinta informativa y los demas elementos de una manera visible. se recomienda dar celeridad al proceso de adquisicion de dotacion (overoles) Personal en obra. 1 topografo, 1 cadenero, 1 inspector, 1 auxiliar de trafico, 1 operador de minicargador, 1 operador de retrocargador, 1 operador de volqueta doble, 6 grupo encofrador, 1 maestro, 2 oficiales, 1 ayudantes. Maquinaria y equipos en obra: 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 volqueta doble, 1 placa vibradora, 1 generador electrico, 1 cortadora. 20-08-2025 CER Enfasis

21-08-2025 Tunales.
En recorrido de obra, se evidencio ausencia de auxiliares de trafico, senales verticales moviles del PMT instaladas, valla movil en sitio con elementos de emergencia señalados, el personal hace uso del overol del contrato, el minicargador cuenta con preoperacional diligenciado, se recomienda mantener orden y aseo en campamento movil, via del tramo en intervencion y area donde realizan las fundidas. Personal en obra: 2 auxiliares de trafico, 5 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador. Maquinaria y equipos en obra: 1 Minicargador, 1 Mezcladora, 1 placa vibratoria, 1 Vibrador de concreto, 1 generador de energia, 1 cortadora. 21-08-2025 CER - Enfasis

22-08-2025
Participacion en comite integral de obra, donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente de Seguridad y Salud en el trabajo, se describen los compromisos y

se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva
22-08-2025 - Enfermo CEV
23-08-2025
El contratista no realizo actividades constructivas en los frentes de obra 24-08-2025 - Enfermo CEV
24-08-2025
El Contratista no realizo actividades constructivas en los frente de obra. 24-08-2025 - Enfermo CEV
25-08-2025 San Antonio
El recorrido de obra se evidencia ubicación de una cuipa movil, donde se ubica el Kit control de emergencia camilla, botiquin y extintor, el contratista reporta entrega de EPP y dotación al personal, se realiza calistenia. en el frente se encuentra PMT implementado Personal en obra: 1 topografo, 1 cadenero, 1 inspector, 1 auxilia trafico, 1 operador de minicargador, 1 retrocargador, 1 conductor de Volqueta doble. Grupo encoles; -1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes. Maquinaria y equipo en obra: 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 Volqueta doble, 1 Placa vibratoria, 1 generador electrico, 1 cortadora.
25-08-2025 Enfermo CEV
26-08-2025 tunales
El Contratista reporta charla de OST de inicio de actividades, calistenia, actividades de orden y aseo, Se encuentra PMT correctamente implementado con dos auxiliares de trafico en sitio, la motoniveladora se encuentra con su guarda de seguridad, se reporta limpieza de Via, en frente cuentan con Kit de Emergencias y punto de hidratación activo: Personal en obra: 2 auxiliares de trafico, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador: Maquinaria, 1 mini, 1 motoniveladora, 1 placa Vibratoria, 1 Vibrador concreto, 1 cortadora, 1 generador.
26-08-2025 Enfermo

27-08-2025 TRAMO 9- SAN ANTONIO EL TOLDO

Se realiza acompañamiento 100% en obra por parte del contratista CEI- del profesional SST, personal en obra 1 inspector de obra- 1 topografo 1- cadenero 1 rotulo encargado - 2 oficiales - 4 ayudantes 1- auxiliar de transito se realiza charla SST, Coloctenia - Inspección minicargador - inspección retroexcavadora- se organiza campamento con elemento de emergencia botiquin, extintor, camilla, kit de derrames, punto ecologico, punto de hidratación, equipos y maquinaria en obra mezcladora concreto, cortadora - vibrocompactador - se realiza orden y aseo durante la actividad laboral - señalización control y verificación de PTT - se realiza cierre de hallazgos por interventoria, recoger hierro, cinta de señalización - excavación y retiro material petreo - demolición orden y aseo en todo el frente Firma Contratista CEI 27/8/25

28-08-25- Frente Tonal Bajo

Se realiza acompañamiento permanente por parte de contratista CEI del profesional SST en obra se realiza charla SST, coloctenia firma de permisos para apertura de actividades, se realiza inspección precperacional cortadora y minicargador, se verifica el uso de EPP, y se realiza verificación de l PTT - señalización en la actividad retiro de material - personal en obra - 1 residente tecnico - 1 maestro 7 - oficiales - 10 peones de aseo - 6 ayudantes de obra - 2 auxiliares de transito - maquinaria en obra 1- cortadora - rana - mezcladora - generador de energia - rodillo - se realiza charla en interventoria firma contratista - 28-08-2025 Firma CEI

29-08-2025

Se realiza acuerdo con el contratista para tratar temas de todos los componentes, en cuanto al componente SST se tienen observaciones de: orden y aseo en tramo San Antonio ya que se evidencia pedazos de varilla, plastico y cintas peligro botados, se subsana observación de uniformes en trabajadores, aún no subsanan contratación de unidades sanitarias, kit de emergencias en orden, se subsana observación de señalización en excavacion de mas de 50cm. en San Antonio Se solicitó cumplir con el pmt en cuestión de auxiliares de tráfico ya que en el momento solo hay 1 en San Antonio y en tunales faltan 2 para el 2do frente de obra, personal en obra tramo Tunales. tramo 2: 2 auxiliares A ayudantes, 1 oficial, 1 operador minicargador, 1 SST Maquinaria: 1 minicargador, 1 mezcladora, 1 placa vibratoria 1 Vibrador de concreto, 1 planta generadora de electricidad 1 Cortadora.

[signature] 29-08-2025 Compromiso - CEV

30-08-2025

Contratista no realiza labores en tramo

[signature] 30-08-2025 - Compromiso CEV

31-08-2025

Contratista no realiza labores en tramo.

[signature] 31-08-2025 - Compromiso CEV

2 operadores; Maquinaria y Equipo: 1 minicargador, 1 retrocargador, 1 Minirretro, 1 Volqueta sencilla, 1 Volqueta doble y 1 canguro

Paul Rangel

30-07-2025 Laguna Verde

En el tramo se evidencia permanencia de campamento movil donde se ubica camilla, botiquin y extintor, de igual manera se encuentra la señalitación preventiva, informativa y de emergencia instalada a lo largo del tramo y en Cuipa. El personal hace uso de la dotación respectiva. Personal en obra: 1 Residente ambiental, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 residente de obra, 1 topografo, 1 Cadenero, 1 oficial, 5 auxiliares de obra, 2 operadores; Maquinaria y Equipo: 1 minicargador, 1 retrocargador, 1 minirretro, 1 Volqueta Sencilla, 1 Volqueta doble, 1 canguro.

Paul Rangel

31-07-2025 Laguna Verde.

Se evidencia campamento con kit de seguridad. PMT en orden señalizacion en excavaciones personal con dotacion y EPP en orden se observa extintor de camion con fecha de vencimiento de Junio 2025. personal: 1 prof. ambiental, 1 prof. social, 1 inspector SST, 1 topografo, 1 cadenero, 1 oficial, 2 auxiliares, 5 ayudantes 1 operador retro, 1 conductor volqueta, 1 conductor camión, 1 operador minicargador sin operador este lo esta operando el cadenero se realiza observación al respecto si el trabajador tiene competencia para operarlo, 1 minirretro 1 retroexcavadora, 1 volqueta sencilla, 1 camión 1 canguro

Paul Rangel

01-08-2025 Laguna verde baja

Se realiza acompañamiento en campo por parte del profesional SST, Se cuenta con excavación y señalización, el personal cuenta con los epp adecuados, en el punto de trabajo se cuenta con camilla, botiquin y extintor.

Paul Rangel

02-08-2025.

Se realiza excavación para instalación de alcantarilla, se cuenta con señalización y limitación para evitar el acceso a la excavación, se cuenta con epp

adecuados, se cuenta con botiquin, extintor y camilla, debidamente, señalizada. el personal cuenta con punto de hidratación, PMT instalado de forma Correcta, personal en obra, 1 topografo, 1 residente tecnico, 1 residente ambiental 1 Cadenero primero, 2 auxiliares de trafico, 5 ayudantes de obra y 2 operarios de maquinaria amarilla multiple.

Paul Rangel.

03-08-2025 Laguna verde baja.

Se evidencia personal haciendo uso de dotacion respectiva. Se continua con excavación para instalacion de filtro tipo(frances) Frances, Se cuenta con señalizacion adecuada, se cuenta con botiquin camilla y extintor y su respectiva señalizacion, Se cuenta con acompañamiento en campo de profesional SST, 1 residente tecnico, 1 topografo, 1 residente ambiental, 5 ayudantes de obra, 2 auxiliares de tráfico, 1 Cadenero, 2operarios de maquinaria amarilla, se cuenta con PMT debidamente instalado, con Senales verticales respectivas, area de excavacion de filtro señalizada.

Paul Rangel

04-08-2025 Laguna verde baja.

Se evidencia personal de obra haciendo uso de dotacion respectiva. Se realiza acompañamiento en campo por parte del profesional SST, 1 residente ambiental, 1 residente técnico, 1 topografico, 1 cadenero, 2 operarios de maquinaria amarilla, 4 ayudantes de obra, 2 auxiliares de trafico. se cuenta con señalizacion en excavación, se cuenta con PMT, debidamente instalado, en el campamento se cuenta con camilla, botiquin, extintor y señalizacion de los equipos de emergencia, se cuenta con maquinaria en obra 1 Minicargador, 1 retrocargador, 1 volqueta Sencilla.

Paul Rangel

03-08-2025 Laguna Verde.

Personal en obra: 1 residente de obra. 1 residente ambiental, 1 residente Social, 1 profesional SST, 1 topografo, 1 cadenero, 3 auxiliares de obra, 2auxiliares de trafico, 2 conductores, 2 operadores.

Equipos en obra: 1 minicargador, 1 mini excavadora, 1 retrocargador, 1 volqueta, 1 camión. En el frente en intervencion se identifica un campamento movil con kit de Emergencia completo, señalizacion en obra preventiva, informativa y

de Emergencia instalado, filtro excavado señalizado y delimitado, personal con dotacion respectiva y PMT implementado. Paul Rangel

06-08-2025 · Laguna Verde.

En el tramo en intervención se identifica la permanencia de la Capa movil con los elementos de Emergencia respectivos (camilla, Botiquin y extintor); los cuales se encuentran señalizados. Personal hace uso de la dotacion respetiva, los equipos maquinaria no cuentan con sitio del Contrato, se cuenta con preoperacionales de los equipos en campo. Personal en obra 1 Residente de obra, 1 residente ambiental, 1 Residente Social, 1 profesional SST, 1 Topografo, 1 Cadenero, 3 auxiliares de obra, 2 auxiliares de trafico, 2 conductores, 2 operadores. Paul Rangel

07-08-2025 Laguna Verde

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 residente ambiental, 1 residente social, 1 profesional SST, 1 Topografo, 1 Cadenero, 3 auxiliares de obra, 2 auxiliares de trafico, 2 conductores, 2 operadores. En el area de intervencion la excavacion de filtro permanece delimitado con doble cinta y delineadores tubulares intercalados con estacas de madera. del K0+000 a K0+410. El resto de la excavacion esta delimitado con una sola cinta y estacas de madera. PMT implementado con señales moviles y auxiliares de trafico en sitio. Paul Rangel.

08-08-2025 Laguna Verde

Participacion en comite integral, donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva. Laguna Verde: Se encuentra personal haciendo uso de dotacion respectiva, elemento de Emergencia en sitio. Paul Rangel

09-08-2025 Laguna Verde
Personal en obra: 1 residente de obra, 1 residente ambiental, 1 residente social, 1 topografo, 1 cadenero, 1 oficial, 4 auxiliares de obra, 2 operadores: Maquinaria y equipos: 1 Mini-cargador, 1 Minirretro, 1 Volqueta sencilla, 1 cargue: se realiza actividad de excavacion mecanica para instalacion de tuberia para alcantarilla en el K0+132, la profesional SST realiza acompañamiento y diligenciamiento de ATS para la actividad, personal realiza uso de dotacion respectiva
Paul Rangel

10-08-2025 Laguna Verde
En el frente en intervencion se identifica campamento movil con elementos de emergencia completa, señalizacion informativa, preventiva y reglamentaria instalada a lo largo del frente en intervencion, las unidades sanitarias se encuentran en la casa de la señora marcela y estan en adecuadas condiciones de higiene.
Paul Rangel

11-08-2025 Laguna Verde
Se realiza recorrido por el frente de obra junto con la profesional SST del consorcio, se revisa ATS diligenciado para la actividad de excavacion mecanica, se requiere que den respuesta a oficio enviado solicitando adecuacion del componente. Se evidencian excavaciones para filtro delimitadas, campamento movil en sitio, señalizacion ubicada en el frente en intervencion Personal en obra: 1 Residente ambiental, 1 residente social, 1 profesional SST, 1 topografo, 1 cadenero, 4 auxiliares de obra, 2 auxiliares de trafico, 2 conductores, 2 operadores, Maquinaria: 1 minicargador, 1 miniexcavadora, 1 Retrocargador, 1 Volqueta sencilla, 1 cargue.
Paul Rangel

12-08-2025 Laguna Verde
Personal en obra: 1 residente ambiental, 1 residente social, 1 profesional SST, 1 topografo, 1 cadeneros 4 auxiliares de obra, 2 auxiliares de trafico, 2 conductores, 1 operador

Equipo y Maquinaria: 1 minirretro, 1 Retrocargador, 1 minicar
1 camion, 1 Volqueta sencilla, 1 canguro, En el frente
se evidencia acompañamiento a actividades constructivas
de la profesional SST, el personal en obra hace uso de
la dotación respectiva, los equipos cuentan con los programas
respectivos. Paul R

13-08-2025 Laguna Verde.
En el tramo se evidencia permanencia de campamento
movil, con el kit de emergencia (completo) camilla,
botiquin y extintor) señalizados, Excavación de filtro
delimitado con doble cinta desde la abscisa K0+000
a K0+410, Señalización instalada en el frente de
obra, PMT implementado con señalero vehicular movil
y dos auxiliares de tráfico: Personal en obra: 1 residente
ambiental, 1 residente social, 1 profesional SST, 1 topografo,
1 cadenero, 4 auxiliares de obra, 2 auxiliares de tráfico, 2
Conductores, 1 operador. Equipo y Maquinaria: 1 minirretro,
1 Retrocargador (Varado), 1 minicargador, 1 camion, 1 Volqueta
Sencilla, 1 Canguro; se solicita al Contratista tomar
medidas preventivas de seguridad con el personal que trabaja
cerca de la máquina y en la excavación ya que se encuentra
una máquina en movimiento Cargando la Volqueta y
no cuentan con un acceso seguro para bajar a la excavación.
Paul Rengi

14-08-2025 Laguna Verde.
Personal en obra: 1 residente ambiental, 1 residente social, 1
profesional SST, 1 topografo, 1 cadenero, 5 auxiliares de obra,
2 auxiliares de trafico, 2 conductores, 1 operador: Equipo
y maquinaria: 1 minirretro, 1 retrocargador, 1 minicargador,
1 camion, 1 volqueta Sencilla, 1 canguro. Se requiere
mejorar la señalización de los tramos intervenidos con delineadores,
verticales y doble cinta. Se evidencia permanencia de
señalizacion informativa, preventiva y de Emergencia en el
frente, permanencia en frente de Cuipo movil con elementos
requeridos, el personal que se evidencia durante el recorrido

hace uso de la EPP y dotación respectiva. Paul Rengel
Ayudante.

15-08-2025
Participan en comité integral de obra, donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva.
Ayudante Paul Rengel

16-08-2025
El contratista no desarrollo actividades constructivas en el frente de obra. Paul Rengel
Ayudante

17-08-2025
El contratista no desarrollo actividades constructivas en el frente de obra. Paul Rengel
Ayudante

18-08-2025
El contratista no desarrollo actividades constructivas en el frente de obra. Paul Rengel
Ayudante

19-08-2025 Laguna Verde
En recorrido por el tramo se evidencian cintas de delimitación de la excavación para filtros deteriorada, se requiere mejorar delimitación con delineadores tubulares y doble cinta. PMT implementado, con señales moviles verticales y dos auxiliares de tráfico en sitio ejerciendo sus funciones, en complemento se cuenta con Kit de emergencia completo. el personal hace uso de la dotación respectiva. Personal en obra: 1 residente social, 1 residente ambiental, 1 profesional SST, 1 cadenero, 1 topografo, 5 auxiliares de obra, 2 auxiliares de tráfico, 1 conductor, 2 operadores, Equipos y Maquina en obra: 1 minirretro, 1 minicargador, 1 Retrocargador, 1 camion, 1 canguro. Paul Rengel
Ayudante

20-08-2025 Laguna Verde.
Personal en obra: 1 residente ambiental, 1 residente social,

1 profesional SST, 1 cadenero, 1 topografo, 5 auxiliares de obra, 2 auxiliares de trafico, 1 conductor, 2 operadores equipo y maquinaria, 1 miniretro, 1 minicargador, 1 retrocargador, 1 camion, 1 canguro. SE evidencia permanencia de señalizacion informativa, preventiva y de emergencia instalada en el tramo en intervencion. se identifica personal hacen uso de la dotacion respectiva, se recomienda hacer cambio de conos de delimitacion deteriorados e instalacion de delineadores tubulares. Paul Rangel

21-08-2025 Laguna Verde.
En el tramo se evidenao permanencia de cuipo movil con kit de Emergencia completo y señalizado. señalizacion de Emergencia, preventiva e informativa instalada a lo largo del tramo en intervencion y campamento. El personal hace uso de la dotacion respectiva. Personal en obra, 1 residente ambiental, 1 residente Social, 1 profesional SST, 1 Cadenero, 1 topografo, 5 auxiliares de obra, 2 auxiliares de trafico, 2 Conductores, 2 operadores: Equipo y maquinaria, 1 miniretro, 1 minicargador, 1 retrocargador, 1 camión, 1 volqueta sencilla, 1 canguro. Paul Rangel

22-08-2025
Participacion en Comite integral de obra, donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el Componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva. En Comite se acordo dar respuesta al oficio radicado por parte de interventoria donde el Consorcio Gaviana 9T anexe todos los documentos soportes que evidencien el cumplimiento de los compromisos acordados en Comite. Igualmente se solicita no operar al Comite para dar cierre a los compromisos adquiridos. Paul Rangel

23-08-2025 Laguna Verde

Personal en obra: 1 residente de obra, 1 ambiental, 1 social, 1 profesional SST, 1 topografo, 1 cadenero. 5 auxiliares de obra, 2 auxiliares de trafico, 2 operadores, 2 conductores, Maquinaria: 1 Mini retro, 1 minicargador, 1 Retrocargador, 1 camion, 1 canguro, Se evidencia personal haciendo uso de dotacion respectiva, Se encuentran preoperacionales diligenciados, cuenta con 1 camioneta en sitio con elementos de emergencia Paul Rangel

24-08-2025 Laguna Verde

Se evidencia actividad de excavacion mecanica para filtro en el K0+700 - K0+1070 costado derecho, en el proceso de excavacion se descubren varias rocas de gran tamaño. lo que imposibilita continuar con la construccion de filtro. El Personal hace uso de la dotacion, en tramo se evidencia señalizacion informativa, preventiva y de emergencia instalada. se requiere implementar delineadores tubulares. Personal en obra: 1 residente de obra, 1 ambiental, 1 social, 1 profesional SST, 1 topografo, 1 cadenero, 4 auxiliares de obra, 1 auxiliar de trafico, 2 operadores, 2 conductores. Maquinaria: 1 mini retro, 1 minicargador, 1 retrocargador, 1 camion. Paul Rangel

25-08-2025 Laguna Verde.

Personal en obra: 1 residente de obra, 1 ambiental, 1 Social 1 profesional SST, 1 topografo, 1 cadenero, 5 auxiliares de obra, 2 auxiliares de trafico, 2 operadores, 2 conductores, Equipo: 1 mini retro, 1 mini cargador, 1 retrocargador, 1 camion Se evidencia personal haciendo uso de dotacion, cuenta movil en sitio con elementos de emergencia, camilla botiquin y extintor, Señales de Emergencia instalados en el tramo, los equipos verificados cuentan con preoperacional diligenciados, se solicita da respuesta a oficio radicado adjuntando los soportes de cumplimiento

Paul Rangel

26-08-2025 Laguna Verde.
En el tramo se mantiene Cuipa movil, con Kit de Emergencia Completo. se mantiene señalizacion de filtro intervenido del K0+000 a 0+870 con delineadores tubulares y doble cinta, se registra ademas el resto de excavacion que se encuentra con madera. El personal hace uso de la dotacion respectiva, se cuenta con las unidades sanitarias en el predio de la zona de maniobra, se evidencia permanencia de delimitacion de alcantarillas. Paul Rangel

27-08-2025 Laguna Verde.
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Residente ambiental, 1 residente social, 1 profesional SST, 1 Topografo, 1 cadenero 5 auxiliares de obra, 2 auxiliares de trafico, 2 operadores 2 conductores. Equipos: 1 miniretro, 1 minicargador, 1 Retro Cargador, 1 camion, 1 cunguro, en el tramo se evidencia permanencia de Cuipa movil, personal haciendo uso de la dotacion respectiva, señalizacion informativa, preventiva y reglamentaria instalada, Kit de Emergencia completo en Lapa. los equipos cuentan con preoperacional diligenciado y completo Paul Rangel

28-08-2025 Laguna Verde
En el tramo se mantiene campamento movil, con Kit de Emergencia (camilla, botiquin y extinta), se mantiene señalizacion del filtro intervenido con delineadores tubulares del 0+000 al 0+870, se encuentra PMT correctamente implementado con señales verticales moviles y dos auxiliares de trafico. Personal en obra: 1 residente de obra, 1 residente ambiental, 1 residente social, 1 profesional SST, 1 topografo, 1 cadenero, 5 auxiliares de obra, 2 auxiliares de trafico, 2 operadores, 2 conductores, Equipos y maquinaria en obra: 1 miniretro, 1 minicargador, 1 Retrocargador, 1 camion, 1 cunguro. Paul Rangel

29-08-2025 Laguna Verde.
Se realiza recorrido en tramo con las siguientes observaciones se observa kit de emergencias obstruido por canecas - se observe en tramo señalización con palos y cinta peligro lo cual se solicito la instalación intermitente de colombinas reflectivas se le solicitó preoperacionales a Camion doble Cabina, Volqueta sencilla, mini cargador, mini retroexcavadora y retroexcavadora. con lo cual solo cumple la volqueta doble cabina y mini retroexcavadora no ha sido enviado documentación de volqueta sencilla, no ha sido enviado el certificado de competencia del operador del minicargador el cual tambien debe tener licencia de conducción según Ley 769 Código Nacional de Tránsito - no han enviado curso de alturas de trabajadores los cuales realizan laboras en excavaciones. Personal en campo. Profesional Ambiental - Residente tecnico - profesional Social - 1 Topografo - 1 calenero. 5 aux. de obra - 2 auxiliares de trafico - 2 operadores de maquinaria 2 conductores de volqueta. no se evidencia presencia de profesional SST. Maquinaria en obra: 1 mini retroexcavadora - 1 excavadora - 1 minicargador - 1 volqueta sencilla - 1 volqueta doble cabina..

Paul Rangel

Cristian Ospino P.

30-08-2025
Contratista no realiza labores en campo

Paul Rangel

Cristian Ospino P.

31-08-2025
Contratista no realiza labores en campo

Cristian Ospino P.

Paul Rangel

- Se solicita al contratista de maquinaria realizar mantenimientos a los diferentes equipos que vienen presentando fallas.
De igual manera se ha venido haciendo seguimiento por parte d. la UMV del diligenciamiento y entrega de las planillas preoperacionales
- El mantenimiento a las unidades sanitarias se realiza el día 30 de Julio.
- Se dota a las unidades sanitarias del frente de dos rollos de papel higiénico.

01-08-2025 Tunales

Personal en obra: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de tráfico, 1 BOAL, 1 tecnólogo SST, 1 comisión de topografía, 1 operador de vibro, 1 Retro, 1 carrotanque, 1 minicargador.
Maquinaria y equipo en obra: 1 Vibro Case 4th (Vacío), 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 motoniveladora, 1 carrotanque, Se realiza jornada de aseo (barrido de cuneta de fresado, limpieza de cuneta y recolección de basura) esta actividad empieza en el tramo K2+030 hasta K2+300, el personal hace uso de dotación respectiva, en campamento movil se evidencia permanencia de elementos de emergencias, dos unidades sanitarias en sitio. Se mantiene señalización de obra en la vía en el tramo 5.

02-08-2025 Capitolio

En el frente de obra se evidencia permanencia de campamento movil con camilla, botiquin extintor, señalización de emergencias, punto de acopio de sustancias químicas organizado, hoja de seguridad en sitio, recipientes etiquetados, PMT implementado en el tramo con dos auxiliares de tráfico: Personal en obra: 1 inspector, 1 oficial, 1 BOAL, 2 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, 1 Comisión de topografía, 1 operador de Vibrocompactadores, 1 retrocargador Volqueta, 1 motoniveladora, 1 minicargador, Maquinaria: 1 Motoniveladora, 1 Retrocargador, 2 mini, 1 Vibro 8tn y 1 4th.

03-08-2025 San Antonio
La Entidad Ejecutora no desarrollo actividades Constructivas en los frentes de obra.

04-08-2025 San Antonio
Personal en obra: 1 residente tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 inspector, 1 ayudante, 1 BOAL, 2 auxiliares de trafico, 1 comision de topografia, 1 operador de minicargador 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 Vibrocompactador, 1 conductor de camioneta, 1 Volqueta dotoley 1 de sencilla Maquinaria Contrato 936: 1 motoniveladora, 1 Vibrocompactador, 1 Vibrocompactador Amun, 1 minicargador, 1 Retrocargador, 1 Volqueta Sencilla. En el frente se cuenta con PMT correctamente dimplementado. Se evidencian 2 USP en frente; 1 cuipa movil con Kit de Emergencia completo, Zona de almacenamiento de sustancias quimicas organizados, recipientes retulados, personal hace uso de dotacion respectiva.
Capitolio: Se encuentra extinter de retroexcavadora vencido de marzo de 2025, Vibrocompactador sin preoperacional, al igual que el Retrocargador.

05-08-2025 Tunales
En el frente en intervencion se evidencia pelmonenas de Cuipa movil con Kit de Emergencia activo y señalizado, punto de acopio de sustancias Quimicas organizados con hoja de Seguridad en sitio, recipiente retulada, 2 USP en sitio, personal hace uso de la dotacion respectiva. Personal en obra: 1 residente, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 BOAL, 1 tecnologo SST, 1 comision de topografia, 1 operador de Vibrocompactador, 1 operador de retrocargador, 1 operador de cuntanque, 1 operador de minicargador
Maquinaria: 1 Vibrocompactador Case (varado) 1 Retrocargador 1 minicargador, 1 cuntanque, 1 motoniveladora (Varada).

06-08-2025 Capitolio
En recorrido realizado se evidencia que el Vibrocompactador HAMM no tiene formato para preoperacional, se continua evidenciando falta de formatos en campo para el diligenciamiento por parte de los operadores, se sugiere contar con suficientes formatos para entregar a cada operador de cada equipo y así garantizar el diligenciamiento de estos en primera hora del día.
La entidad ejecutora informa que la retroexcavadora cuenta con Kit de emergencia completo. Personal en obra: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudante, 1 BOAL, 2 auxiliares de trafico, 1 comisión de topografía, 1 operador de Vibrocompactador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor de Volqueta, 1 operador de motoniveladora. 1 minicargador. Maquinaria en obra: 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 Vibro de 8ton, 1 Vibro de 4ton, 1 Volqueta sencilla 2 minicargador.

Rafael D. Peña F. U.M.V.

07-08-2025
La entidad Ejecutora no realiza actividades constructivas en los frentes de obra

Rafael D. Peña F. U.M.V.

08-08-2025
Participación en comité de obra integral donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva.
La Entidad Ejecutora no realiza actividades Constructivas en los frentes de obra.

Rafael D. Peña F. U.M.V.

04-08-2025
La entidad Ejecutora no realiza actividades Constructivas en los frentes de obra.

Rafael D. Peña F. U.M.V.

10-08-2025
La Entidad Ejecutora no realiza actividades constructivas en la fronta de obra

11-08-2025 San Antonio.
En general para toda la fronta de obra se sugiere realice translado de maquinaria con vehiculo acompañante o auxiliares de trafico. En el tramo en intervención se evidencia PMT implementado con auxiliares de trafico, cuenta movil en sitio con elementos reglamentarios, personal hace uso de dotación adecuadamente, 2 USP en el tramo. Personal en obra: 1 residente tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 inspector, 2 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión de topografía, 1 operador de minicargador, 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador, 1 camioneta, 1 Volqueta sencilla, 1 volqueta doble. Maquinaria contrato 936: 2 motoNeladoras, 2 vibrocompactadores, 1 Vibo, 2 minicargador, 3 Retrocargador, 1 Volqueta sencilla y una doble del proyecto.

12-08-2025 Tunales.
Personal en obra: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliar trafico, 1 BOAL, 1 tecnologo SST, 1 comision topografica, 1 operador de Vibo, 1 Retrocargador, 1 de carrotanque, 1 minicargador. Maquinaria 936: 1 Vibrocompactador (caso) (Variado), 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 motoniveladora, 1 carrotanque. En el tramo se evidencia permanencia de Apoyo movil, 2 USP, Zona de almacenamiento temporal de sustancias quimicas organicas, y señalizacion de equipos de emergencia, se recomienda garantizar que equipos (operadores) cuenten con la formacion para diligenciar preoperacionales, personal hace uso de la dotacion respectiva, PMT se evidencia implementado con señales moviles y portatiles y dos auxiliares de trafico.

13-08-2025 Capitolio.
Personal en obra: 1 inspector, 1 oficial, 1 BOAL, 2 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 comision de topografia, 1 operario de vibrocompactador, 1 operador de retrocargador, 1 conductor de Volqueta sencilla, 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador. Equipo y Maquinaria en obra: 1 Motoniveladora, 1 retrocargador, 1 Vibrocompactador 8th y 1 Vibro de 4tn, 1 Volqueta sencilla, 2 minicargador. En recorrido se evidencia un PMT implementado y a lo largo del tramo se evidencian 4 auxiliares de trafico, distribuidos en dos tramos diferentes. personal hace uso correcto de la dotacion respectiva, campamento movil en sitio, con 2 DSP en el tramo con gel antibacterial. Se evidencia equipos con diligenciamiento de preoperacionales.

14-08-2025 San Antonio
Se realiza recorrido de obra conjunto donde se evidencia que cuentan con PMT implementado, con señales verticales moviles y auxiliares de trafico en sitio, se realiza verificacion de la permanencia del kit control de emergencias en capa movil, en el tramo se encuentran 2 DSP con gel, el personal hace uso de la dotacion respectiva. Personal en obra: 1 residente tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 BOAL, 2 auxiliares trafico, 1 comision topografica, 1 operador de minicargador, 1 motoniveladora 1 retrocargador, 1 Vibrocompactador, 1 Conductor camioneta, 1 Conductor Volqueta sencilla, 1 de Volqueta doble; Maquinaria contrato 936: 2 Motoniveladoras, 2 vibrocompactador, CAT-B06MAG, 1 Vibrocompactador Hamm, 2 minicargador, 3 Retrocargador, Terex, Ludwig, Jhon Deere 1 Volqueta Sencilla, Maquinaria y equipos del proyecto, 2 Volqueta doble troque.

15-08-2025
Se realiza participacion en comite integral donde

se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva.

16-08-2025

La Entidad Ejecutora no desarrollo actividades constructivas en el frente de obra

17-08-2025

La Entidad Ejecutora no desarrollo actividades constructivas en el frente de obra

18-08-2025

La Entidad Ejecutora no desarrollo actividades constructivas en el frente de obra

19-08-2025 tunales.

En recorrido por el frente de obra se evidencia PMT implementado, el cual requiere adecuacion puesto que se esta interviniendo la abscisa K0+1+470 y no se evidencian instalados las señales de aproximacion, evaluar ya que se estan realizando cierres de tramos superiores a 200 metros, la Volqueta SVQ681 no traia diligenciado el apoyo preoperacional el conductor y la retrocargadora no contaba con formatos para diligenciar. Personal en el frente de obra. 01 oficial, 1 inspector, 1 ayudantes 2 auxiliares de trafico, 1 BOMB, 1 tecnologa SST, 1 comision topografia, 1 operador de Vibrocompactador, 1 Retrocargador, 1 operario de Carrotanque, 1 operador de minicargador, 1 Maquinaria en obra: 1 Vibrocompactador Dynapac (Utn) Varios, 1 Retrocargadora, 1 motoniveladora, 1 Carrotanque, se evidencia cambio de Retrocargador, se encuentran realizando demolicion mecanica de roca en el K0+900.

20-08-2025 Capitolio.
En recorrido realizado se evidencia en tramo una cuadrilla con kit de emergencia completo, canecas de almacenamiento de sustancias químicas organizadas y rotuladas, PMT implementado, personal hace uso de la dotación respectiva, 2 USP los cuales no cuentan con mantenimiento. Personal en obra: 1 inspector, 1 oficial, 1 BOAL, 2 ayudantes, 2 auxiliar técnico, 1 comisión topografía, 1 operador de vibrocompactador, 1 retrocargador, 1 conductor de volqueta sencilla, 1 operador de motoniveladora, 1 operador de minicargador. Maquinaria y equipos en obra: 1 Motoniveladora Rhino, 1 retrocargador John Deere, 1 Vibrocompactador Dynapac etn, 1 Vibrocompactador Hamm 4tn, 2 volqueta sencilla, 2 minicargadores.

21-08-2025 San Antonio
En recorrido realizado se evidencia volqueta foton WTMB318 que no cuenta con preoperacional diligenciado ningun dia de la semana, no posee botiquin y el extintor esta vencido, los equipos minicargador bobcat, Motoniveladora, 2Retrocargador contaban con preoperacional correctamente diligenciado, durante recorrido se evidencio mantenimiento de la 4 USP obras en el tramo. permanencia en sitio de campamento movil con kit de emergencia completo, PMT implementado y auxiliares de tratico en sitio. el personal hace uso de la dotación respectiva del contrato. Personal en obra: 1 residente tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 BOAL, 2 tratiros, 1 comisión topografia, 1 operador de minicargador, 1 motoniveladora, 2 retrocargador, 1 vibrocompactador, 1 conductor camioneta, 1 conductor volqueta doble y 1 de sencilla. Maquinaria y Equipos de obra del contrato 936. 2 Motoniveladoras, 2 vibrocompactadores, CAT, BOMAG, 1 Vibrocompactador Ammann, 2 minicargador bobcat, 3 Retrocargador, 1 volqueta sencilla. Maquina Proyecto: 2 Volqueta doble

22-08-2025
Participacion en comite integral de obra, donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente, se describen los compromisos y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en el acta respectiva.

23-08-2025
La entidad Ejecutora no realizo actividades constructivas en los frentes de obra

24-08-2025
La Entidad Ejecutora no realizo actividades constructivas en los frentes de obra

25-08-2025 Tunales
Personal en obra: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de trafico, 1 BOAL, 1 tecnologa SST, 1 comision de topografia, 1 operarios de Vibrocompactador, 1 de Retrocargador, 1 de carrotanque, 1 minicargador. Maquinaria y equipo en obra: 1 Vibrocompactador Dynapac Ltn Vorado, 1 Vibrocompactador de 8tn, 1 Retrocargador, 1 minicargador, 1 motoniveladora, 1 carrotanque. En el tramo se evidencia PMT implementado con señales Verticales moviles y 2 auxiliares de trafico cumpliendo sus funciones, se encuentra una Caipa de manera permanente donde se ubican los elementos de emergencias y cuadrilla de obra, y otra Caipa donde esta el punto de abrigo de Combustible y quimicos, 2 DSP con gel, personal hace uso de los EPP y dotacion respectiva.

26-08-2025 Capitolio.
El extinto del Vibrocompactador Bomag se encuentra desplazado aun no se han colocado las guardas del motor a la Retrocargador, se encuentra PMS completamente implementado con dos auxiliares de

trafico, caipa movil con elementos como kit de Emergencia. El personal hace uso de la dotacion respectiva. Personal en obra: 1 inspector, 1 oficial, 1 Boal, 2 ayudante, 2 auxiliar de trafico, 1 comision de topografia, 1 operador de vibro, 1 retrocargadora, 1 volqueta sencilla, 1 motoniveladora, 1 minicargador. Maquinaria: 1 Motoniveladora, 1 retrocargadora, 1 Vibro Dynapac 8-tn, 1 Vibro Hamm 11tn. 1 Volqueta sencilla. 2 minicargador.

Rafael D. Perez F.
U.M.V.

27-08-2025 San Antonio

Personal en obra: 1 residente tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental, 1 profesional social, 1 inspector, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 Boal, 2 auxilio trafico, 1 comision topografia, 1 operador minicargador, 1 motoniveladora, 2 retro cargador, 1 Vibrocompactador, 1 Conductor carrimeto, 1 Conductor Volqueta sencilla, 3 conductor Volqueta Doble. Maquinaria contratada 936; 2 motoniveladora, 1 Vibro CAT, 1 Vibro Ammann 1 minicargador, 2 Retrocargador, 1 Volqueta sencilla, 3 Volquetas del proyecto. Se evidencia PMT correctamente implementado, caipa movil en sitio, ZUSP, KIT de emergencia completo. personal haciendo uso de dotacion respectiva, se requiere mejora delimitacion de algunos acopios de RCD y petreos.

Rafael D. Perez F.
U.M.V.

28-08-2025.

Participamos en comite integral donde se desarrolla seguimiento al componente, se describen las compensaciones y se desarrollan otros temas los cuales quedan registrados en comite acta. Se realiza recorrido por los frentes de obra tunales, Capitolio y San Antonio

Rafael D. Perez F.
U.M.V.

29-08-2025 Tunales

En recorrido de obra se evidencia pmt. implementado de manera completa con señales verticales movibles y dos auxiliares de trafico, personal haciendo uso de la dotacion respectiva y EPP, de igual manera se

identifica caipa en sitio, con kit de emergencias completo. Personal en obra: 1 oficial, 1 inspector, 1 ayudante, 2 auxiliares de tráfico, 1 SISO, 1 tecnólogo SST, 1 comisión topográfica, 1 operador de vibro, 1 Retro 1 carrotanque, 1 de minicargador, Equipo en obra: Un Vibrocompactador Dynapac Vorado, 1 Vibro Dynapac de 1 retrocargador, 1 minicargador, 1 motoniveladora, 1 carrotanque.

30-08-2025

La entidad ejecutora no realizo actividades constructivas en el frente de obra

31-08-2025

La entidad ejecutora no realizo actividades constructivas en el frente de obra

Respuesta observaciones UMV

- Según observación presentada el día 04/08/2025 frente de obra [illegible] la retroexcavadora cuenta con extintor vigente con fecha de vencimiento de julio 2026, el extintor que presenta observación esta a la espera recarga del contratista que este se hizo responsable por el que esta y el cual se verá reflejado.
- Según observación presentada el día 06/08/2025 con referencia a [illegible] de los frentes preparacionales se realizo acompañamiento al sector de naranjos donde realizo retiro de frentes para el día [illegible] y así no sujeto presentado contingencias con el diligenciamiento del
- No se ejecutaron actividades el día 08/08/2025 ya que fue el día de capacitación del día 06/08/2025 ya fue día cero autorizado por entidad por consiguiente no se realizaron labores con actividades ejecutadas y
- Según siguiente presentada el día 11/08/2025 sobre acompañamiento realizaciones que se realizan con respectivo en cada frente de obra [illegible] actividades se cargan con las cantidades [illegible] los controles de frentes dentro del acompañamiento.

- Según observación presentada se informa al cliente que las actividades que se vienen ejecutando el día 19/03/2025 no se ha dejado de agua a fuera el cual se inicia acompañamiento por los avances de fachada y entrega la cual las 2 horas ejecutadas de actividad y procedimos a instalar el techo todo se avanza con PPTT y donde se viene desarrollando los actividades constructivas.
- Se solicita al contratista de seguridad dotar a la brigada especialmente del turno tarde un Kit de equipos de igual manera se solicita al contratista exigir el personal el diligenciamiento de los preparacionales.
- Se solicita al contratista de seguridad incluir cambio de señalética ya que el dispuesto en el abastecedor Berrio se encuentra deteriorada.
- En turno todo se viene realizando actividades de orden y aseo donde se incluye señalización y protección de aceros y instalación de plásticos y cinta peligro.

RAFAEL D PEÑA F
U.M.V.

3D. PREOPERACIONALES VEHÍCULOS INTERVENTORIA

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 04 al: 06 del mes de: Agosto del año: 2025
CONDUCTOR: Cristian Rios C.C. 1001 060 636 N° LICENCIA: 1001 060 636 FECHA VENCIMIENTO 22-03-2028
TIPO DE VEHICULO: Camioneta PLACA: UPA 609
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
SEGURO OBLIGATORIO: 27-10-2025 TECNOMECANICA: 05-11-2025 POLIZAS:

LEYENDA: **B: BUENO M: MALO** RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTRUCTURA DEL VEHICULO	/		/		/									
ESTADO DE LA COJINERIA	/		/		/									
VIDRIO PANORAMICO	/		/		/									
VIDRIO PANORAMICO TRACERO	/		/		/									
VIDRIOS LATERALES	/		/		/									
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO	/		/		/									
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO	/		/		/									
ESPEJOS RETROVISOR	/		/		/									
LUCES PRINCIPALES	/		/		/									
LUCES DE PARQUEO	/		/		/									
DIRECCIONALES	/		/		/									
LUCES DE FRENO / REVERSA	/		/		/									
ALARMA DE RETROCESO	/		/		/									
INDICADOR LUCES DE PARQUEO	/		/		/									
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE	/		/		/									
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	/		/		/									
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	/		/		/									
INDICADOR LUCES ALTAS	/		/		/									
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	/		/		/									
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	/		/		/									
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO	/		/		/									
TACOMETRO (R.P.M.)	/		/		/									
VELOCIMETRO	/		/		/									
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE	/		/		/									
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS	/		/		/									
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE	/		/		/									
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS	/		/		/									
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	/		/		/									
FRENO DE SERVICIO	/		/		/									
FRENO DE PARQUEO	/		/		/									
ESTADO DE LAS LLANTAS	/		/		/									
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		/		/									
AIRE ACONDICIONADO														
EXTINTOR DE INCENDIOS	/		/		/									
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA	/		/		/									
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	/		/		/									
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	/		/		/									
KIT DE HERRAIENTAS BASICAS	/		/		/									
KILOMETRAJE INICIAL	304.291		S		304.393									
KILOMETRAJE FINAL	304.393				304.504									

OBSERVACIONES

FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE

PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE

305.000 Km

MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO
INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA

Mantenimiento preventivo graduación de frenos

PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA DE CAMBIO
(Si no es batería, anotar cómo) lugar:

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 11 al: 15 del mes de: Agosto del año: 2025
CONDUCTOR: Cristian Ruiz C.C. 1001 060 636 N° LICENCIA: 1001 060 636 FECHA VENCIMIENTO: 22-05-2028
TIPO DE VEHICULO: Camioneta PLACA: VFO 609
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
SEGURO OBLIGATORIO: 27-10-2025 TECNOMECANICA: 05-11-2025 POLIZAS:

LEYENDA: **B: BUENO M: MALO**

RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LA CARNERIA	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS RETROVISOR	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES PRINCIPALES	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓						**FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE**
LUCES DE FRENO / REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓						
ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	✓		✓		✓		✓		✓						**PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE**
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES ALTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						365.000 Km
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO	✓		✓		✓		✓		✓						**MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO** (INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA)
TACOMETRO (R.P.M.)	✓		✓		✓		✓		✓						
VELOCIMETRO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓						Mantenimiento Preventivo
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS	✓		✓		✓		✓		✓						programación de Renol
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE	✓		✓		✓		✓		✓						
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE SERVICIO	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LAS LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓						**PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
AIRE ACONDICIONADO															
EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA	✓		✓		✓		✓		✓						**FECHA DE CAMBIO** (Bateria, Bateria, entre otros) Aceite
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS	✓		✓		✓		✓		✓						
KILOMETRAJE INICIAL	304628		304764		304811		304863		304908						
KILOMETRAJE FINAL	304764		304811		304963		304908		305025						

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA Semana del 19 al 22 del mes de: Agosto del año: 2025
CONDUCTOR: Cristian Rios C.C. 1001 060 636 N° LICENCIA: 1001 060 636 FECHA VENCIMIENTO 22-05-2028
TIPO DE VEHICULO Camioneta PLACA: UPA 609
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
SEGURO OBLIGATORIO: 27-10-2025 TECNOMECANICA: 05-11-2025 POLIZAS:

LEYENDA: **B: BUENO M: MALO** RECIVIDO POR EL INSPECTOR (ST): Cristian R.

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO			/		/		/		/						
ESTADO DE LA CARROCERIA			/		/		/		/						
VIDRIO PANORAMICO			/		/		/		/						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO			/		/		/		/						
VIDRIOS LATERALES			/		/		/		/						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO			/		/		/		/						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO			/		/		/		/						
ESPEJOS RETROVISOR			/		/		/		/						
LUCES PRINCIPALES			/		/		/		/						
LUCES DE PARQUEO			/		/		/		/						
DIRECCIONALES			/		/		/		/						FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
LUCES DE FRENO / REVERSA			/		/		/		/						
ALARMA DE RETROCESO			/		/		/		/						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO			/		/		/		/						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE			/		/		/		/						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE			/		/		/		/						PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE			/		/		/		/						
INDICADOR LUCES ALTAS			/		/		/		/						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR			/		/		/		/						310.000 Km
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR			/		/		/		/						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO			/		/		/		/						MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA
TACOMETRO (R.P.M.)			/		/		/		/						
VELOCIMETRO			/		/		/		/						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE			/		/		/		/						Mantenimiento Preventivo
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS			/		/		/		/						graduación de frenos.
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE			/		/		/		/						
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS			/		/		/		/						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA			/		/		/		/						
FRENO DE SERVICIO			/		/		/		/						
FRENO DE PARQUEO			/		/		/		/						
ESTADO DE LAS LLANTAS			/		/		/		/						
CINTURONES DE SEGURIDAD			/		/		/		/						PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO															
EXTINTOR DE INCENDIOS			/		/		/		/						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA			/		/		/		/						FECHA DE CAMBIO (Revisar bateria, antes verse) logo:
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO			/		/		/		/						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS			/		/		/		/						
KIT DE HERRAIENTAS BASICAS			/		/		/		/						
KILOMETRAJE INICIAL			305 047		305 263		305 321		305 414						
KILOMETRAJE FINAL			305 263		305 321		305 414		305 544						

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del 25 al 29 del mes de: Agosto del año: 2025
CONDUCTOR: Cristian Rios C.C. 1001 060 636 N° LICENCIA: 1001 060 636 FECHA VENCIMIENTO 22-03-2028
TIPO DE VEHICULO: Camioneta PLACA: UPQ 609
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :
SEGURO OBLIGATORIO: 27-10-2025 TECNOMECANICA: 05-11-2025 POLIZAS:

LEYENDA: **B: BUENO M: MALO** RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LA CARROCERIA	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS RETROVISOR	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES PRINCIPALES	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓						**FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE**
LUCES DE FRENO / REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓						
ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	✓		✓		✓		✓		✓						**PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE**
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES ALTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						310.000 Km
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO	✓		✓		✓		✓		✓						**MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO** INDICAR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA
TACOMETRO (R.P.M.)	✓		✓		✓		✓		✓						
VELOCIMETRO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS	✓		✓		✓		✓		✓						Mantenimiento Preventivo graduación de frenos
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE	✓		✓		✓		✓		✓						
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE SERVICIO	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LAS LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓						**PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
AIRE ACONDICIONADO															
EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA	✓		✓		✓		✓		✓						**FECHA DE CAMBIO** (fecha anterior, entre cinco) hojas
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
KIT DE HERRAIENTAS BASICAS	✓		✓		✓		✓		✓						
KILOMETRAJE INICIAL	305 293		305 307		305 753		305 805		305 857						
KILOMETRAJE FINAL	305 307		305 753		305 805		305 857		305 893						

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 04 al: 06 del mes de: AGOSTO del año: 2025

CONDUCTOR: Danna V. Rincón C.C. 1000251330 N° LICENCIA: 1000251330 FECHA VENCIMIENTO 16-11-2033

TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA PLACA: JXK361

FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

SEGURO OBLIGATORIO: SOAT 21-07-2026 TECNOMECANICA: N/A POLIZAS:

LEYENDA: B: BUENO M: MALO

RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO	✓		✓		✓										
ESTADO DE LA CARROCERIA	✓		✓		✓										
VIDRIO PANORAMICO	✓		✓		✓										
VIDRIO PANORAMICO TRACERO	✓		✓		✓										
VIDRIOS LATERALES	✓		✓		✓										
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO	✓		✓		✓										
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO	✓		✓		✓										
ESPEJOS RETROVISOR	✓		✓		✓										
LUCES PRINCIPALES	✓		✓		✓										
LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓										
DIRECCIONALES	✓		✓		✓										FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
LUCES DE FRENO / REVERSA	✓		✓		✓										
ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓										
INDICADOR LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓										
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE	✓		✓		✓										
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	✓		✓		✓										PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓										
INDICADOR LUCES ALTAS	✓		✓		✓										
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	✓		✓		✓										
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	✓		✓		✓										
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO	✓		✓		✓										MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO (INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA)
TACOMETRO (R.P.M.)	✓		✓		✓										
VELOCIMETRO	✓		✓		✓										
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE	✓		✓		✓										
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS	✓		✓		✓										
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE	✓		✓		✓										
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS	✓		✓		✓										
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	✓		✓		✓										
FRENO DE SERVICIO	✓		✓		✓										
FRENO DE PARQUEO	✓		✓		✓										
ESTADO DE LAS LLANTAS	✓		✓		✓										
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓										PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO	✓		✓		✓										
EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓										
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LLANTERINA	✓		✓		✓										FECHA DE CAMBIO (Llantas, batería, aceite, otros) (Lugar)
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	✓		✓		✓										
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	✓		✓		✓										
KIT DE HERRAIENTAS BASICAS	✓		✓		✓										
KILOMETRAJE INICIAL			98289		98431		98503								
KILOMETRAJE FINAL			98431		98503		98630								

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA: Semana del: 11 al: 15 del mes de: AGOSTO del año: 2025
CONDUCTOR: Duran V. Ruben C.C. 1000251330 N° LICENCIA: 1000251330 FECHA VENCIMIENTO 16-11-2033
TIPO DE VEHICULO CAMIONETA PLACA: JXK961
FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
SEGURO OBLIGATORIO SOAT 21-07-2026 TECNOMECANICA N/A POLIZAS

LEYENDA: **B: BUENO M: MALO** RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LA COJINERIA	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS RETROVISOR	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES PRINCIPALES	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓						**FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE**
LUCES DE FRENO / REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓						
ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	✓		✓		✓		✓		✓						**PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE**
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES ALTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO	✓		✓		✓		✓		✓						**MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO** INDICAR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA
TACOMETRO (R.P.M.)	✓		✓		✓		✓		✓						
VELOCIMETRO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE	✓		✓		✓		✓		✓						
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE SERVICIO	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LAS LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓						**PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
AIRE ACONDICIONADO	✓		✓		✓		✓		✓						
EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA	✓		✓		✓		✓		✓						**FECHA DE CAMBIO** [Cambio bateria, antes cerca] lugar
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
KIT DE HERRAIENTAS BASICAS	✓		✓		✓		✓		✓						
KILOMETRAJE INICIAL			98689		98815		98855		98887		98924				
KILOMETRAJE FINAL			98815		98855		98887		98924		97044				

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA Semana del: 19 al: 22 del mes de: AGOSTO del año: 2025

CONDUCTOR: DARWIN RINCON C.C. 1000251330 N° LICENCIA: 1000251330 FECHA VENCIMIENTO 16-11-2033

TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA PLACA: JXK361

FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

SEGURO OBLIGATORIO: SOAT 21-07-2026 TECNOMECANICA: N/A POLIZAS:

LEYENDA: B: BUENO M: MALO RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO			✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LA CARROCERIA			✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO			✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO			✓		✓		✓		✓						
VIDRIOS LATERALES			✓		✓		✓		✓						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO			✓		✓		✓		✓						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO			✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS RETROVISOR			✓		✓		✓		✓						
LUCES PRINCIPALES			✓		✓		✓		✓						
LUCES DE PARQUEO			✓		✓		✓		✓						
DIRECCIONALES			✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
LUCES DE FRENO / REVERSA			✓		✓		✓		✓						
ALARMA DE RETROCESO			✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO			✓		✓		✓		✓						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE			✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE			✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE			✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES ALTAS			✓		✓		✓		✓						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR			✓		✓		✓		✓						
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR			✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO			✓		✓		✓		✓						MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO (ACEITE, NOMBRE DEL TALLER Y FECHA)
TACOMETRO (R.P.M.)			✓		✓		✓		✓						
VELOCIMETRO			✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE			✓		✓		✓		✓						
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS			✓		✓		✓		✓						
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE			✓		✓		✓		✓						
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS			✓		✓		✓		✓						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA			✓		✓		✓		✓						
FRENO DE SERVICIO			✓		✓		✓		✓						
FRENO DE PARQUEO			✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LAS LLANTAS			✓		✓		✓		✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD			✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO			✓		✓		✓		✓						
EXTINTOR DE INCENDIOS			✓		✓		✓		✓						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA			✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO (Llantas, batería, aceite, correa) lugar
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO			✓		✓		✓		✓						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS			✓		✓		✓		✓						
KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS			✓		✓		✓		✓						
KILOMETRAJE INICIAL			99367		99502		99532		99580						
KILOMETRAJE FINAL			99502		99532		99580		99715						

ECOVIAS

INSPECCION GENERAL DEL VEHICULOS

FECHA Semana del 25 al 29 de mes de: AGOSTO del año: 2025

CONDUCTOR: Dennis V. Pinzón C.C. 1000251330 N° LICENCIA: 1000251330 FECHA VENCIMIENTO 16-11-2033

TIPO DE VEHICULO: CAMONETA PLACA: JXX361

FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

SEGURO OBLIGATORIO: SOAT 21-07-2026 TECNOMECANICA: N/A POLIZAS:

LEYENDA: B: BUENO M: MALO

RECIVIDO POR EL INSPECTOR SST:

ITEM PARA REVISAR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTRUCTURA DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LA CARROCERIA	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIO PANORAMICO TRACERO	✓		✓		✓		✓		✓						
VIDRIOS LATERALES	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES DE LIQUIDO LAVA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESPEJOS RETROVISOR	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES PRINCIPALES	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓						
LUCES DE FRENO / REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO DEL ACEITE
ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVEL LIQUIDO DE EMBRAGUE	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	✓		✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE CAMBIO DE ACEITE
INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR LUCES ALTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR TEMPERATURA DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
INDICADOR PRESION ACEITE MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE HIDRAULICO	✓		✓		✓		✓		✓						MANTENIMIENTO PREVENTO REALIZADO (INCLUIR NOMBRE DEL TALLER Y FECHA)
TACOMETRO (R.P.M.)	✓		✓		✓		✓		✓						
VELOCIMETRO	✓		✓		✓		✓		✓						
NIVELES Y ESTADO DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO Y TENSION DE LAS CORREAS	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DEL FILTRO DE AIRE	✓		✓		✓		✓		✓						
FUGA DE LIQUIDO DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓						
PITO SEÑAL DE ADVERTENCIA	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE SERVICIO	✓		✓		✓		✓		✓						
FRENO DE PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO DE LAS LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓						
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓						PROXIMA FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AIRE ACONDICIONADO	✓		✓		✓		✓		✓						
EXTINTOR DE INCENDIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
CONO/TRIANGULO/CUÑAS/GATO/LINTERNA	✓		✓		✓		✓		✓						
ORDEN Y ASEO DEL VEHICULO	✓		✓		✓		✓		✓						FECHA DE CAMBIO (Bateria, bateria, aceite caja) Lugar
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	✓		✓		✓		✓		✓						
KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS	✓		✓		✓		✓		✓						
KILOMETRAJE INICIAL	99790		99929		99957		100004		100047						

4D. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES INTERVENTORIA

ECOVÍAS S.A.S / Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cronograma de Capacitaciones SST. Registro SG-SST 009 / Versión 01	CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE PREVENCION SST 2025

ACTIVIDADES	Dirigido a	Ejecutada / Reprogramada	2025 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE
Plan de emergencias y simulacros	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Primeros auxilios	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
respeto entre compañeros de trabajo	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
cumplimiento politicas de la empresa.	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Manejo de extintores.	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Reportes de accidente laborales.	Administrativa- proyectos		se debe indicar durante la induccion y reinduccion al personal												COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Sismos y terremotos	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
manejo defensivo en Normas de transito	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Estilo de vida saludable	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Actos y Condiciones subestandar	Administrativa- proyectos		se deben registrar durante la induccion y reinduccion												COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Divulgacion reglamento de higiene	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
programas de prevencion vehicular(no uso de dispositos moviles, respeto exceso de velocidad, prevencion de no consumo de alcohol, no distraccion en las vias)	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Factores de riesgos y peligros en obras	proyectos - oficinas														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
respeto normas de transito	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Riesgo biomecanico y sus consecuencias	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Uso adecuado de epp	Administrativa- proyectos		se deben registrar durante la induccion y reinduccion												COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Trabajo seguro en excavaciones, confinados y alturas	proyectos		se deben registrar durante la induccion y reinduccion												COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Exposicion a picaduras y mordeduras de insectos y animales.	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Jornadas de Salud (semana de la salud)	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
programas de promocion y prevencion (visual,cardiovascular,auditivo)	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Riesgo publico (factor externo)	Administrativa- proyectos		se deben registrar durante la induccion y reinduccion												COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Riesgo biologico	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Manejo del estrés laboral	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
importancia de las pausas activas	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Actuacion en caso de tormentas electricas,huracanes entre otros fenomenos naturales	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Importancia de conocer al copasst y comité de convivencia de la empresa.	Administrativa- proyectos		se deben registrar durante la induccion y reinduccion												COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Seguridad de trabajos en oficina	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Importancia del cuidado del sistema cardio vascular	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
prevencion factores de riesgos en oficinas	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Higiene postural	Administrativa- proyectos														COORDINADOR SST-INSPECTORES SST
Mes	**Número de capacitaciones programadas** / **Número de capacitaciones ejecutadas**	**Porcentaje de cumplimiento (%)**	-			100%	100%	100%	100%	100%	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	#DIV/0!

5D. COMUNICADOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2025

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT 890104625-1

186-1-790

Bogotá D.C. 06 de agosto de 2025

Señores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. JULIO CESAR PINZÓN-GERENTE DEL PROYECTO
Gerente del proyecto
julio.pinzon@umv.gov.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
rafael.pena@umv.gov.co
Bogotá D.

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Respuesta comunicado 20251920096501. Observaciones componente Ambiental y SST

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría reitera lo solicitado en el oficio 186-1-694 del 10 de junio de 2025 con respecto a los siguientes temas:

1. Según oficio 20251920096501 se menciona que la fecha para realizar el acompañamiento por parte de interventoría al procedimiento empleado para ejecutar los suministros de combustible de maquinaria en sitio sería el 01 de agosto de 2025, fecha en la cual no fue posible lograr realizar este acompañamiento debido a las actividades de obra y también a causa de que el contratista C.I. Holding, titular del contrato 936 de 2024 no confirmo la participación. De acuerdo a lo anterior se solicita a la Unidad de mantenimiento Vial realizar el seguimiento respectivo para garantizar el cumplimiento de la normatividad respectiva; *Norma Técnica Colombiana NTC 1692 "Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado". Decreto 1496 de 2018 tiene por objeto*

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890104625-1

186-1-790

adoptar el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y decreto 1079 de 2015. De igual forma coordinar en frente de obra para realizar el acompañamiento respectivo en una nueva fecha con el fin de verificar lo descrito en el oficio; referente a que el contratista ya ha dispuesto extintores, kits de control de derrames, rotulación adecuada de los recipientes, y hojas de seguridad de los productos utilizados, entre otros elementos exigidos por la normativa vigente.

2. Respecto a los derrames evidenciados cabe mencionar que estos fueron atendidos, sin embargo, aún no se cuenta con el certificado de disposición de los residuos peligrosos. De igual manera se han presentado otros derrames que se han atendido de manera inmediata ejemplo San Antonio K4+150 derrame de combustible por falla en acople de manguera con máquina motoniveladora ocurrido el día 29 de julio de 2025, Tunales Vibrocompactador CASE derrame de hidráulico reportado el día 28 de julio de 2025, San Antonio K 0+040 Vibrocompactador Bomag fuga de combustible reportado el 04 de agosto de 2025, se reitera la necesidad de continuar con las medidas preventivas necesarias para evitar que se continúen presentando este tipo de incidentes. Véase fotografías 1 y 2.

3. Se evidencia que se procedió a individualizar los formatos preoperacionales de acuerdo al equipo inspeccionado sin embargo se reitera la necesidad de que los operadores realicen el diligenciamiento del formato a primera hora en la mañana dado que en revisiones realizadas por la interventoría en todos los frentes de obra se procede a solicitar este registro y en algunas oportunidades no cuenta con el diligenciamiento respectivo por parte de los operadores. De igual manera garantizar que todas las maquinas cuenten con formatos necesarios para desarrollar el registro. Se ha evidenciado que se realizan sensibilizaciones al respecto, pero de continuar con esta situación se sugiere tomar otro tipo de medidas correctivas. Véase fotografías 3 y 4.

4. Se menciona que cuentan con personal calificado para realizar las revisiones previas a los equipos antes de ser trasladados al frente de obra sin embargo los equipos continúan llegando en inadecuadas condiciones de funcionamiento, algunos funcionan durante la jornada laboral y quedan varados por fallas mecánicas, otros llegan y no funcionan y algunos no llegan en condiciones óptimas de operatividad lo que genera condiciones inseguras en obra. Lo anterior genera retrocesos en el desarrollo de las actividades constructivas. De acuerdo a lo anterior se reitera que es necesario que la Entidad Ejecutora UMV realice una verificación previa por parte de un profesional idóneo que garantice que los equipos, maquinaria y vehículos suministrados por el contratista de maquinaria los cuales son llevados a cada uno de los tramos en ejecución se encuentren en adecuadas condiciones de operatividad. Véase fotografías 5 y 6

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890.104.625-1

186-1-790

	
Foto 1: Derrame de hidráulico Vibrocompactador	Foto 2: Derrame de combustible por fuga en motoniveladora
	
Foto 3: Formato preoperacional sin diligenciar	Foto 4: Equipo sin formatos, llegó a obra el 29/07/2025
	
Foto 5: Vibrocompactador con fallas en san Antonio	Foto 6: Vibrocompactador varado en Tunales.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890.104.625-1

186-1-790

De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita a la entidad ejecutora tomar las medidas correctivas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de la subsanación en un término no mayor a tres días calendarios posterior al recibo del comunicado

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS -lauram.rojas@gobiernobogota.gov.cocdi sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Jose Miguel Ruiz – jmruiz@gobiernobogota.gov.co

Elaboro: YHR
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT 890104625-1

186-1-819

Bogotá D.C. 21 de agosto de 2025

Señores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. JULIO CESAR PINZÓN-GERENTE DEL PROYECTO
Gerente del proyecto
julio.pinzon@umv.gov.co

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Respuesta comunicado 20251900099291, Rta. oficio No.186-1-680 "Solicitud de Dotación de dotación personal de operadores de maquinaria.".

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UAERMV.

Teniendo en cuenta lo relacionado en el comunicado del asunto se tienes las siguientes presiones:

Una vez verificado en obra se evidencia que los operadores de maquinaria cuentan con la dotación requerida en el comunicado 186-1-680.

Atentamente,

ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: José Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS - jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

Elaboro: JAR
Revisado: EHR

ECOVIAS S.A.S.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-833

Bogotá D.C. 26 de agosto de 2025

Señores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. JULIO CESAR PINZÓN-GERENTE DEL PROYECTO
Gerente del proyecto
julio.pinzon@umv.gov.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
rafael.pena@umv.gov.co
Bogotá D.

Referencia: ***"PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).".***

Asunto: Observaciones componente ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo SST, UMV.

Respetados señores:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Ejecutora UAERMV.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, SGSST y PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UAERMV

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría en recorridos realizados a los frentes de obra durante la semana del 18 al 22 de agosto de 2025 evidencio lo siguiente:

1. Frente de obra Tunales, Carrotanque SZO472, se evidencio transportando combustible en la cabina mediante galones sin rotular practica incorrecta e insegura, de igual manera trasladando galones desocupados en la parte trasera del mismo vehículo (véase fotografías 1 y 2). De acuerdo a lo anterior se solicita a la Unidad de mantenimiento Vial realizar el seguimiento respectivo para garantizar el cumplimiento de la normatividad respectiva; *Norma Técnica Colombiana NTC 1692 "Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado". Decreto 1496 de 2018 tiene por objeto adoptar el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y decreto 1079 de 2015.* Se recuerda que el transporte de combustible debe

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

realizarse en vehículos adecuados que cuenten entre otros con los siguientes elementos exigidos por la normativa vigente. A continuación, se cita los elementos según la normatividad:

- Requisitos generales del vehículo

  - ✓ Estar homologado como vehículo para transporte de mercancías peligrosas (Clase 3 – líquidos inflamables según la ONU).
  - ✓ Carrocería o tanque construido con materiales aprobados y certificados.
  - ✓ Cumplir con revisiones técnico–mecánicas y de emisiones vigentes.
  - ✓ Poseer SOAT y pólizas de responsabilidad civil extracontractual específicas para transporte de mercancías peligrosas.

- Equipos y elementos obligatorios a bordo

  - ✓ Extintores (mínimo dos, adecuados para líquidos inflamables, con capacidad según el peso bruto del vehículo).
  - ✓ Botiquín de primeros auxilios.
  - ✓ Kit de carretera reglamentario (cruceta, señales reflectivas, linterna, herramientas básicas).
  - ✓ Kit de derrames (pala, escoba, material absorbente, recipientes de seguridad, limpiadores, bolsa roja, chaleco reflectivo, etc).
  - ✓ Conos o triángulos reflectivos adicionales.
  - ✓ Linterna antiexplosiva.

- Señalización y rotulación

  - ✓ Rótulos de riesgo clase 3 – Líquidos Inflamables con el número ONU correspondiente (ej. gasolina: UN 1203, ACPM/diésel: UN 1202).
  - ✓ Paneles de seguridad en laterales y parte posterior del vehículo.
  - ✓ Avisos de “PELIGRO – INFLAMABLE” en sitios visibles.
  - ✓ Señal reflectiva perimetral.

- Documentación obligatoria

  - ✓ Manifiesto de carga (con datos de remitente, destinatario, tipo y cantidad de combustible).
  - ✓ Hoja de seguridad (MSDS) de la sustancia transportada.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-833

- ✓ Plan de contingencia en caso de accidente o derrame.
- ✓ Licencia de tránsito y tarjeta de operación vigente.
- ✓ Copia del certificado de capacitación del conductor en transporte de mercancías peligrosas
- ✓ Licencia de conducción categoría C2 o C3 según el vehículo.
- ✓ Uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP): casco de seguridad, guantes dieléctricos, botas, chaleco reflectivo, gafas de seguridad.

2. Se evidencia derrame de combustible en maquina Bobcat ubicada en el frente de obra tunales se reitera la necesidad de continuar con las medidas preventivas necesarias para evitar que se continúen presentando este tipo de incidentes. Véase fotografías 3 y 4.

3. Se sugiere a la entidad ejecutora programar a la mayor brevedad el mantenimiento preventivo del carro tanque de irrigación con placa JTR530, dado que se evidenció que las llantas traseras presentan un avanzado estado de desgaste. Esta acción permitirá garantizar condiciones seguras de operación y prevenir posibles incidentes en la ejecución de las actividades. Véase fotografías 5 y 6.

4. Se recomienda a la entidad ejecutora reforzar el control interno con sus operadores; frente a la situación observada, toda vez que se continúa evidenciando que los operadores no diligencian los formatos preoperacionales a primera hora del día. Es importante reforzar esta práctica con el fin de garantizar la verificación previa de las condiciones de los equipos y vehículos antes de iniciar las labores, minimizando riesgos en la operación. Véase fotografías 7 y 8.

5. Se requiere a la entidad ejecutora tomar medidas correctivas inmediatas respecto a la Volqueta Fotón WMB318, toda vez que se evidenció que el vehículo no cuenta con botiquín de primeros auxilios, el extintor se encuentra vencido y no posee el kit de carretera reglamentario, incumpliendo con los elementos mínimos exigidos para la operación segura y conforme a la normatividad vigente; Código Nacional de Tránsito Terrestre – Ley 769 de 2002, Artículo 30, que establece los elementos de prevención y seguridad que deben portar los vehículos. Véase fotografías 9 y 10.

6. Se requiere a la entidad ejecutora realizar revisión al carro tanque asignado a la operación en el frente Tunales SZO472, toda vez que se evidenció la emisión excesiva de humo por el sistema de escape, lo cual genera contaminación atmosférica y posibles riesgos para la salud de los trabajadores y la comunidad aledaña; La situación descrita está regulada por la siguiente normatividad, la cual debe ser tenida en cuenta: Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre, Artículo 28 y 30, que establecen la obligación de mantener los vehículos en condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad óptimas. Resolución 910 de 2008 (MinAmbiente) y sus modificaciones, que fijan los estándares de emisión de contaminantes para fuentes móviles terrestres. Decreto 1076 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relativo a prevención y control de la contaminación atmosférica. Véase fotografías 11.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-833

	
Foto 1: Transporte de combustible en cabina	Foto 2: Traslado de galones en carrotanque

	
Foto 3: Derrame de combustible	Foto 4: Derrame de combustible

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-833

	
Foto 5: Llantas desgastadas de carrotanque	Foto 6: Llantas desgastadas de carrotanque
	
Foto 7: Llantas desgastadas de carrotanque	Foto 8: Llantas desgastadas de carrotanque

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-833

	
Foto 9: Volqueta operando sin elementos básicos de emergencias	Foto 10: Volqueta con extintor vencido



Foto 11: carrotanque con emisiones

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-833

De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita a la entidad ejecutora tomar las medidas correctivas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de la subsanación en un término no mayor a tres días calendarios posterior al recibo del presente comunicado.

Atentamente,



ERMY HURTADO ROMERO
Directora de Interventoría

Anexos: Sin anexos.

C.C: Jose Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: YHR - JAR
Reviso : EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890104625-1

186-1- 834

Bogotá D.C. 27 de agosto de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: Ing. JULIO CESAR PINZÓN-GERENTE DEL PROYECTO
Gerente del proyecto
julio.pinzon@umv.gov.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
rafael.pena@umv.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

Asunto: Rta comunicado No. 20251920107041 del 19-08-2025 - Respuesta comunicación No 186-1-254 Solicitud de documentación, información e informes UAERMV, radicado No 20231120100822.

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la **UAERMV**.

Una de las obligaciones de la Interventoría es “Verificar que se cumpla con la normatividad vigente en Colombia en cuestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que debe tener los contratistas y la **UAERMV,** dentro del tiempo de ejecución del contrato según referencia.

Con lo anterior, se evidencia en el contenido del documento, solo el listado de personal profesional contratado por parte de la **UAERMV**, en el periodo de julio de 2023, pero no se evidencia ningún otro documento adjunto los cuales los relacionan con los puntos 2,3,4,5 y 6.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1- 834

Como se evidencia en la captura de pantalla.



De acuerdo con lo descrito anteriormente, se solicita a la **UAERMV**, remitir los documentos que se mencionan en el comunicado. No. 20251920107041, en un término no mayor a tres días calendarios posterior al recibo del presente comunicado y de esta forma poder dar cierre al comunicado en mención.

Cordialmente:

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: N/A

Copia: Jose Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com

Elaborado: JAR
Revisado: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890104625-1

186-1- 835

Bogotá D.C. 26 de agosto de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. JULIO CESAR PINZÓN-GERENTE DEL PROYECTO
Gerente del proyecto
julio.pinzon@umv.gov.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
rafael.pena@umv.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

Asunto: Rta a comunicado No. 20241920165913, con asunto: Respuesta oficio No. 186-1-537, (Radicado No. 20241120039372), referente a observaciones de los informes mensuales del componente SST de los meses de noviembre y diciembre del 2023 y febrero del 2024.

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la **UAERMV**.

Una de las obligaciones de la Interventoría es “Verificar que se cumpla con la normatividad vigente en Colombia en cuestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que debe tener los contratistas y la **UAERMV,** dentro del tiempo de ejecución del contrato según referencia.

Según el comunicado relacionado en el asunto, mencionan en el contenido del documento, la subsanación a las observaciones, pero no hay documentos adjuntos, por lo cual no fue posible corroborar lo descrito. Sen debe aclara que el comunicado 20241920165913, fue radicado a interventoría cuanto el contrato de interventoría se encontraba suspendido.

A continuación, se presenta la trazabilidad de los informes que relaciona en el comunicado y que a la fecha continúan pendientes a los cuales no se le han subsanado en su totalidad las observaciones, y se les emitieron los comunicados:

- 186-1-152 con asunto: Respuesta a correo enviado por la UAERMV, el 21 y 23 de abril de 2025, Informe SST, No. 05 y 06, correspondiente a noviembre y diciembre de 2023, del 15-07-2025. Y radicado **20221120145422.**

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890.104.625-1

186-1- 835

- 186-1-444, con asunto: Respuesta a Radicado 20231920121911 con fecha del 19-11-2023 y radicado a interventoría el 27-12-2023 "*Respuesta a radicado No. 1861-330 Reiteración entrega de documentación pendiente y observación y de actos y condiciones inseguras componente SST–UAERMV",* del 09-01-2024

- 186-1-453, con asunto: Reiteración de entrega de Informes mensuales del componente SST No. 4, 5, 6 de 2023 y 7, 8, 9 y 10 de 2024, UAERMV, del 23-01-2024. Y radicado **20241120008472.**

- 186-1-488, con asunto: Reiteración de entrega de Informes mensuales No. 4, 5, 6 de 2023 y 7 de 2024, y documentación pendiente por entregar del componente SST – UAERMV, del 19-02-2024.

- 186-1-537, con asunto: Respuesta correo electrónico del 8-mar-24 "*INFORMES MENSUALES SST"* DIC 2023 y FEB 2024, entrega medio magnético del 08-marzo-2024 NOV-23, del 26-03-2024.

- 186-1-600 del 26-06-24, con asunto: Reiteración de entrega de Informes mensuales del componente SST No. 4, 5, 6 de 2023 y 7, 8, 9 y 10 de 2024, UAERMV, del 25-06-2024. Y radicado **20241120078442.**

- 186-1-752 Rta. correo UAERMV del 21 y 23 de abril de 2025, Informe Mensual SST, No. 05 y 06, noviembre y diciembre de 2023, del 15-07-25, y radicado **20251120115242.**

De acuerdo con lo descrito anteriormente, se solicita a la **UAERMV**, subsanar las observaciones de los informes en mención, en un término no mayor a tres días calendarios posterior al recibo del presente comunicado, debido que se son reiterativas las observaciones y los requerimientos realizados por la interventoría, estas entregas incompletas han generado que ya trascurrido más de un año y a la fecha no tengan aprobados los informes.

Cordialmente:

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría
Anexos: N/A

Copia: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS -lauram.rojas@gobiernobogota.gov.co-
cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

Elaborado: JAR
Revisado: EHR

ECOVIAS S.A.S.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoecoviassas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-836

Bogotá D.C. 27 de agosto de 2025

FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
Atn: Dr. DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
Alcalde Local de Sumapaz
Att. Ing. Jose Miguel Ruiz
Apoyo a la supervisión/interventoría contrato CIN-REGALIAS-161-2022
cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

Referencia: PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

Asunto: Rta a comunicado No. 20251900109701 del 21-08-2025 Respuesta al oficio No. 186-1-706 (Radicado 20251120096292), referente a un llamado de atención por transporte indebido de personal en obra.

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo.

Teniendo en cuenta a lo ,manifestado por la UAERMV, en el comunicado relacionado en el asunto done indican *"No obstante, lo anterior, la presente comunicación se copia a la Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS para que, dentro sus obligaciones como contratantes y supervisores contrato del interventoría, solicité a esta firma que también realice el debido cumplimiento de la normatividad vigente frente a la seguridad y salud en el trabajo, lo anterior teniendo en cuenta que el pasado 30 de mayo de 2025 se presentó transporte indebido de personal de obra de la firma interventora Ecovias SAS, sobre un tractor, en el tramo vial Tunal bajo, tal como se evidencia en el siguiente registro fotográfico.".*

Con relación a la observación sobre transporte indebido del personal de la interventoría, se realizó el llamado de atención verbal a las personas involucradas y se realizó la socialización de *"Transporte seguro en vehículos"*,


ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-836

Se adjunta el soporte de la socialización para que con esto el FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ, de respuesta al comunicado relacionado en asunto a la UAERMV. y que le solicite a esta de comunicar este tipo de prácticas inseguras en el momento justo para de esta forma tomar las medidas disciplinarias pertinentes

Cordialmente:



ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos: un (1) folio – Lista asistencia a sensibilización.

Copia: Jose Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com

Elaborado: JAR
Revisado: EHR

ORGANIZACIÓN BASE [ ] PROYECTO [X]

Proyecto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 Código de proyecto: BPIN "2018000050020

Fecha: Del 26 de agosto de 2025 Sitio: BOGOTÁ - SUMAPAZ

Tema: CHARLAS DE SST: Sencibilización sobre transporte seguro en vehículos.

Presentador del tema: Jesús Antonio Rincón Benavides

Objetivo de la capacitación: Concientizar a todos los trabajadores sobre la responsabilidad y compromiso del cuidado personal, basados en el transporte seguro.

Asistentes:

Nombre	Cédula	Cargo	Firma	Observaciones / Comentarios sobre la capacitación
Ermy Alcer Hurtado Romero	52375232	Directora Interventoría		
David Leonardo Ochoa	1026283241	Ingeniero de Apoyo		
Yesenia Hernandez Ramirez	52784808	Profesional Ambiental		
Eva Isabel Bernal Yasso	52071821	Profesional Social		
Emily Cruz Cruz	52228826	Residente Técnico		
Edgar Salamanca Cadena	79369733	Residente Técnico		
Edwin Andrés Alvear	1013666330	Topógrafo		
Herson Smith Roa	1053587037	Cadenero 1		
Cristian Rios	1001060636	Conductor		
Yenifer Plaza Gomez	1233891936	Secretaria		
Carlos David Rojas	79581482	Inspector		
Carlos Julio Macana sechagua	1023019741	Inspector		
Brayan Geovanny Mendoza Diaz	1012400416	Inspector		

Firma presentador del tema

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviassas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-799

Bogotá D.C. 07 de agosto de 2024.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
info@promotorapuga.com
Bogotá D.C

Referencia: *"*CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.).*

Asunto*:* *Observaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo - G95.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Consorcio Gaviones 95.

Por medio del presente comunicado la interventoría, realiza la solicitud de cumplimiento en normas SST, debido a la falta de gestión y cumplimiento en exigencias del componente en mención, lo cual es relacionado a continuación:

1. Preoperacionales,

   En inspección realizada el día 04 de agosto de 2025, se le solicitó al conductor de la volqueta placas SBA805, el preoperacional respectivo, a lo que el conductor respondió que este documento no se lo han suministrado por parte del contratista "**Consorcio Gaviones 95",** es de acotar que el contratista es responsable por el cumplimiento tanto en documentación como las practicas seguras dentro de la obra.

   Así mismo se solicitó los preoperacionales a los operarios de la demás maquinaria, pero estos respondieron que ya habían sido recogidos por la profesional SST, se

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoecoviasas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-799

solicita al contratista, no retirar este documento de los vehículos y maquinaria hasta no acabar la jornada laboral y así evitar posibles controversias al respecto.

Es de resaltar que diligenciar este documento es fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores y la eficiencia operativa. No solo se trata de cumplir con las normativas legales, sino de establecer una cultura de seguridad, identificando posibles fallas o daños en la maquinaria antes de su uso, lo que ayuda a prevenir accidentes laborales graves o incluso fatales.

2. Documentación

- Se solicita la documentación completa, SOAT, Revisión tecno mecánica y Registros de mantenimiento correctivo y preventivo, de la volqueta placas SBA805, además de documentación completa del conductor la misma, como lo es, la licencia de conducción y planilla de seguridad social, la cual debe como mínimo cumplir con nivel de riesgo 4, como lo indica el Código Nacional de Tránsito, ya que el día 01 de agosto de 2025 en comité integral, se le solicitó documentación al contratista Consorcio Gaviones 95, sin tener una respuesta positiva al respecto.

- Así mismo se solicita que todos los vehículos y maquinaria les sea instalado los sticker de identificación del contrato tal y como lo exige el manual de identificación visual de la UAERMV, que es el ente contratante.

- Se solicita presentar la licencia de conducción y certificación de competencia de operación de maquinaria, del operador del minicargador marca Caterpillar, esto según cumplimiento a la Resolución 1068 de 2015, compilada en la Resolución 20223040045295 de 2022, emitida por el Ministerio de Transporte. Esta resolución establece las categorías de licencias de conducción para vehículos de transporte de pasajeros y/o carga, tanto públicos como particulares, y define que, para operar maquinaria, incluyendo maquinaria pesada, se requiere como mínimo la licencia de conducción categoría B2

  Lo anterior basado en que el operador del minicargador fue presentado a la interventoría con la función de cadenero de topografía y en recorridos realizados en obra se observa al trabajador realizando las dos funciones.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-799

3. Condiciones inseguras:

- Se observa volqueta placa SBA805, con llantas traseras en avanzado estado de desgaste, generando una fuente de peligro tanto para el conductor y demás personas al derredor, por lo cual se solicita el cambio inmediato de las llantas en mención o el cese de actividades con este vehículo hasta que se subsane esta observación.

  La volqueta en mención no tiene kit de carreteras, como lo es: extintor de seguridad, herramienta menor ni botiquín de primeros auxilios, incumpliendo con la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito.



Foto 1: Volqueta SBA805 con observaciones



Foto 2: Volqueta SBA805 con desgaste avanzado en llantas.



Foto 3: Volqueta SBA805 con desgaste avanzado en llantas

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-799

- Se solicita la implementación adecuada en excavaciones en todo el tramo en ejecución de obra, con señalización debidamente iluminada o reflectiva, esto basado en que solo hay una parte donde se están utilizando colombinas adecuadas, pero en otro tramo no, incumpliendo con el anexo técnico, página 34, “Señalización en obra”



Foto 4: Deficiencia en el señalización de las excavaciones.

- Se observa extintor vencido a junio de 2025, de la volqueta doble cabina placa TSR567, incumpliendo con la normativa colombiana en seguridad vial.



Foto 5: Volqueta TSR567, incumpliendo con la normativa colombiana en seguridad vial



Foto 6: Extintor con fecha caducada

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-799

De acuerdo a lo descrito anteriormente se solicita a la **Consorcio Gavione 95**, tomar las medidas necesarias para subsanar las observaciones y remitir evidencias de la subsanación en un término no mayor a tres (03) días calendarios posterior al recibo del comunicado

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexo: N/A

C.C: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS -lauram.rojas@gobiernobogota.gov.co, cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co, Apoyo a la supervisión FDRS Jose Miguel Ruiz – jmruiz@gobiernobogota.gov.co UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: JAR
Reviso: EHR

6D. FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP INTERVENTORÍA

CONTRATO N° CIN-REGALIAS-161-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050030" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

ECOVÍAS S.A.S / Sistema de Gestion de seguridad y salud en el trabajo.
Formato de solicitud de dotacion y elementos de proteccion personal de ECOVIAS S.A.S. por proyectos
Registro SG-SST 005 / Versión 01

Nombre y Apellido	Cedula	Cargo	Camisa	Pantalón	Chaqueta	Tafia chaleco reflectivo	Zapatos	Botas de Seguridad Pantanera	Botas de Seguridad	Protector auditivo de espuma expandible	Impermeable (Color Amarillo)	Tapa Bocas N95	Casco de Seguridad con Barbuquejo	Firma del trabajador	Fecha de entrega
CARLOS JULIO MACANA	1023019741	Inspector			1			1		1	1		1		
CARLOS DAVID ROJAS	79581482	Inspector			1					1	1		1		
BRAYAN GEOVANNY MENDOZA DIAZ	1012400416	Inspector							1	1	1				
YESENIA HERNANDEZ RAMIREZ	52784808	Residente Ambiental			1				1	1	1		1		
JESÚS ANTONIO RINCÓN B.	79962654	Residente SST							1	1					
EMILY CRUZ CRUZ	52520298	Residente Técnico			1					1	1				
EDWIN ANDRÉS ALVEAR ORTEGA	1013666330	Topografo			1					1	1		1		
HERSON SMITH ROA LINARES	1053587037	Cadenero 1	2	2	1				1	1	1				
EDGAR SALAMANCA CADENA	79369733	Residente Técnico			1					1	1				

ECOVIAS SAS

Fecha de recibido en el proyecto:

Nombre del proyecto: "PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ) ".

4.C INFORME GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

ECOVIAS SAS



INFORME MENSUAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
No 31

1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Versión 01

Bogotá, D.C. agosto de 2025

ECOVIAS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		N°. DE COPIAS
Copia N°.1	Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz	1 (Original)
Copia N°.2	Biblioteca del Proyecto	1 (Copia)

CONTROL DE VERSIONES

ÍNDICE VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFCACIÓN	FOLIOS
01	10/09/2025	Primera versión	392

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN



TULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 31			
PERIODO:	**1 al 31 de agosto de 2025**			
NUMERO DE REVISIÓN			1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN Residente de Interventoría	Nombre:	Isabel Bernal Yasso		
	Firma:			
	Fecha:	10 /09/2025		
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Ermy A. Hurtado R.		
	Firma:			
	Fecha:	10/09/2025		
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
				
	Fecha:	10/09/2025		

TABLA CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 14

2. OBJETIVOS 15

2.1 OBJETIVO GENERAL 15

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15

3. NORMATIVIDAD 16

4. RECURSO HUMANO DE GESTION SOCIAL PARA LA INTERVENTORIA 19

5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 19

6. CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95 20

6.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 20

6.1.1 PERSONAL DEL COMPONENTE SOCIAL. 22

6.1.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 22

6.1.2.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO 22

6.1.2.2 RECORRIDOS 27

6.1.2.3 MESA DE TRABAJO 29

6.1.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 31

6.1.3.1 PROCESOS SENSIBILIZACIÓN 31

6.1.3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 33

6.1.3.1 REUNIONES PARTICIPATIVAS 33

6.1.3.1.1 REUNIONES DE INICIO 34

6.1.3.1.2 REUNIÓN DE AVANCE 34

6.1.3.1.3 REUNIÓN DE FINALIZACIÓN 34

6.1.3.1.4 REUNIONES EXTRAORDINARIAS. 35

6.1.3.1.5 REUNIONES COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANO. (VEEDURÍA) 35

6.1.3.1.6 VALLA INFORMATIVA MÓVILES 36

6.1.3.1.7 PASACALLES. 36

6.1.3.1.8. VOLANTE DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES 37

6.1.3.1.9 VOLANTES INFORMATIVOS Y/O CONVOCATORIAS 38

6.1.3.1.10 AFICHE INFORMATIVO 40

6.1.3.1.11 PUNTOS FIJOS INFORMATIVOS 40

6.1.3.1.12. ACTAS DE VECINDAD 41

6.1.3.1.13. ACTA DE COMPROMISO 42

6.1.3.1.14. ACTA DE GESTIÓN ADELANTADA 44
6.1.4. PROGRAMA DE CULTURA VIAL 45
6.1.5. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA 45
6.1.5.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONTRATACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE 45
6.1.5.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD 46
6.1.5.3 CONTRATACIÓN DE MUJERES 46
6.1.5.4 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 46
6.1.5.5 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. 47
6.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 48
6.2.1 LISTAS DE CHEQUEO DEL CONTRATISTA 48
6.2.2 REVISIÓN DOCUMENTAL 48
6.2.3 INFORMES MENSUALES 49
6.2.5. COMITÉS DE SEGUIMIENTO INTEGRAL 51
6.2.6 COMITÉS DE SEGUIMIENTO SOCIAL 53
6.2.7 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 53
6.2.8 ESTADO DEL CONTRATO 54
7. CONTRATO DE OBRA NO. 479 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL. 55
7.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 55
7.1.1 PERSONAL DEL COMPONENTE SOCIAL 55
7.1.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 56
7.1.2.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO 56
7.1.2.2 RECORRIDOS 58
7.1.2.3 MESA DE TRABAJO 61
7.1.3 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO. 62
7.1.3.1 PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN 62
7.1.4 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 64
7.1.4.1 REUNIONES PARTICIPATIVAS 64
7.1.4.1.1 REUNIÓN DE INICIO 65
7.1.4.1.2. REUNIÓN DE AVANCE 65
7.1.4.1.3. REUNIÓN DE FINALIZACIÓN 66

7.1.4.1.4. REUNIONES EXTRAORDINARIAS. 66
7.1.4.1.5. REUNIONES COMITÉ VEEDOR 68
7.1.4.1.6. VALLA INFORMATIVA MÓVILES 69
7.1.4.1.7. PASACALLES 69
7.1.4.1.8 VOLANTE DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES 70
7.1.4.1.9 VOLANTES INFORMATIVOS Y/O CONVOCATORIAS. 71
7.1.4.1.10 AFICHE INFORMATIVO. 72
7.1.4.1.11 PUNTOS FIJOS INFORMATIVOS. 73
7.1.4.1.11. ACTAS DE VECINDAD 74
7.1.4.1.12. ACTA DE COMPROMISO 75
7.1.5. PROGRAMA DE CULTURA VIAL 79
7.1.6. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA 80
7.1.6.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONTRATACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE 80
7.1.6.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD 80
7.1.6.3 CONTRATACIÓN DE MUJERES 81
7.1.6.4 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 81
7.1.6.5 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. 81
7.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 82
7.2.1 LISTAS DE CHEQUEO DEL CONTRATISTA: 83
7.2.2 REVISIÓN DOCUMENTAL 83
7.2.3 INFORMES MENSUALES 83
7.2.5. COMITÉS DE SEGUIMIENTO INTEGRAL 88
7.2.6 COMITÉS DE SEGUIMIENTO SOCIAL 89
7.2.7 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 89
CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 89
7.2.8 ESTADO DEL CONTRATO 90
8. CONTRATO DE SERVCIO - 480 – DEL 22/02/2022 SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S 90
8.1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL 90
8.2. ESTADO DEL CONTRATO 90

9. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)..... 91

9.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 91

9.1.1 PROGRAMA DE SERVICIO AL USUARIO. 91

9.1.1.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO 91

9.1.1.2 RECORRIDOS 93

9.1.2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 98

9.1.2.1 PROCESOS SENSIBILIZACIÓN 98

9.1.3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 101

9.1.3.1 REUNIONES PARTICIPATIVAS 101

9.1.3.1.1 REUNIONES DE INICIO 101

9.1.3.1.2 REUNIÓN DE AVANCE 102

9.1.3.1.3 REUNIÓN DE FINALIZACIÓN 102

9.1.3.1.4 REUNIONES EXTRAORDINARIAS. 102

9.1.3.1.5 REUNIONES COMITÉ VEEDOR. 103

9.1.3.1.6. VALLA INFORMATIVA MÓVIL 104

9.1.3.1.7 PASACALLES 104

9.1.3.1.7. VOLANTES DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES 105

9.1.3.1.9. AFICHE INFORMATIVO. 107

9.1.3.1.10. PUNTOS INFORMATIVOS FIJOS 108

9.1.3.1.11. Actas de vecindad 109

9.1.3.1.12. ACTA DE COMPROMISO 111

9.1.3.1.13. ACTA DE GESTIÓN ADELANTADA. 112

9.1.3.1.14. EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL. 112

9.1.4. PROGRAMA DE CULTURA VIAL 113

9.1.5. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA 113

9.1.5.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONTRATACIÓN POBLACIÓN VULNERABLE. 113

9.1.5.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD. 114

9.1.5.3 CONTRATACIÓN DE MUJERES 114

9.1.5.4 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 114

9.1.5.5 CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD. 115

9.1.6 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 116
9.1.6.1. LISTAS DE CHEQUEO DEL CONTRATISTA: 116
9.1.6.2 REVISIÓN DOCUMENTAL 116
9.1.6.3. INFORMES MENSUALES. 117
9.1.6.4. INFORME SEMANAL 120
9.1.6.5 COMITÉS DE SEGUIMIENTO INTEGRAL 120
9.1.6.6. COMITÉS DE SEGUIMIENTO SOCIAL 122
9.1.6.7 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 123
9.1.6.8 ESTADO DEL CONTRATO 124
10. CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022 124
10.1 ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA 124
10.1.1 ESTADO DEL CONTRATO 124
11. CONCLUSIONES 125
12. RECOMENDACIONES 126

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Profesional social de Interventoría. 19
Tabla 2: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social 21
Tabla 3: Profesional social Consorcio Gaviones 95 22
Tabla 4: Ubicación punto PAC Contrato No 478/2022 Consorcio Gaviones 95 23
Tabla 5: Consolidado de PQRS No 478/2022 Consorcio Gaviones 95 24
Tabla 6: Indicadores cumplimiento gestión social Programa de atención al usuario ... 30
Tabla 7. Consolidado acciones formación a empleados Consorcio Gaviones 95 32
Tabla 8. Indicadores de cumplimiento del Programa Educación y capacitación al personal vinculado al contrato. Consorcio Gaviones 95 33
Tabla 9: Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación comunitario. 35
Tabla 10: Consolidada entrega de piezas divulgativas _ agosto _ Consorcio Gaviones 95 38
Tabla 11: Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria, volantes. 40

Tabla 12: Consolidado Puntos satélites Consorcio Gaviones 95. 41
Tabla 13: Consolidado Actas de vecindad Consorcio Gaviones 95. 42
Tabla 14: Consolidado Actas de compromiso Consorcio Gaviones 95. 43
Tabla 15: Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria. 44
Tabla 16. Consolidado personal consorcio Gaviones 95 47
Tabla 17: Informes mensuales contrato de obra N° 478 Consorcio Gaviones 95 49
Tabla 18. Trazabilidad informe semanales Consorcio Gaviones 95 51
Tabla 19: Comité integral de seguimientos Consorcio Gaviones 95 51
Tabla 20: Correspondencia recibida y enviada Contrato 53
Tabla 21: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social 55
Tabla 22: Profesional social Contrato No 479/2022 Consorcio Estabilización Vial. 55
Tabla 23. Información Punto atención a la comunidad Contrato No 479/2022 Consorcio Estabilización Vial 56
Tabla 24: Recorrido Contrato No 479/2022, Consorcio Estabilización Vial. 58
Tabla 25: Indicadores de cumplimiento del Programa Atención al Usuario. 61
Tabla 26. Consolidado acciones formación a empleados Consorcio Estabilización vial 63
Tabla 27. Indicadores de cumplimiento del Programa Educación y capacitación al personal vinculado al contrato. Consorcio Estabilización vial. 64
Tabla 28. Indicadores de cumplimiento del Programa de Información y participación Comunitaria. 68
Tabla 29. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria. 70
Tabla 30. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria volantes 72
Tabla 31. Instalación Puntos informativos fijos Consorcio Estabilización Vial 73
Tabla 32. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria. 74
Tabla 33: Consolidado total actas de vecindad de apertura realizadas 75
Tabla 34: Consolidado de actas de compromiso tramo vial San Antonio El Toldo y tramo vial Unión Tunales 76

Tabla 35. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria. 79
Tabla 36. Consolidado personal consorcio Estabilización Vial 82
Tabla 37. Informes mensuales contrato de obra no. 479 – del 10/02/2022 Consorcio Estabilización Vial. 84
Tabla 38. Trazabilidad informe semanales Consorcio Estabilización Vial 87
Tabla 39. Comité integral de seguimientos Consorcio Estabilización Vial 88
Tabla 40: Correspondencia recibida y enviada Contrato 90
Tabla 41: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social 91
Tabla 42: Información Punto PAU móvil UAERMV 92
Tabla 43. Recorrido entidad ejecutora Unidad Administrativa especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV – Interventoría – Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz 94
Tabla 44. Indicadores de cumplimiento del Programa Atención al Usuario 97
Tabla 45. Consolidado acciones formación a empleados UAERMV 100
Tabla 46. Indicadores de cumplimiento del Programa Educación y capacitación al personal vinculado al contrato UAERMV 100
Tabla 47. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria 103
Tabla 48. indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria Frente Unión Tunales – Frente Capitolio – San Antonio El Toldo 105
Tabla 49. Entrega de volantes informativos frente de obra Unión Tunales -Capitolio- San Antonio El Toldo 106
Tabla 50. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria 107
Tabla 51. Consolidada instalación de afiches informativos UAERMV 108
Tabla 52. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria Frente de obra Unión Tunales 109
Tabla 53: Consolidado total actas de vecindad de apertura realizadas 110
Tabla 54. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria 112
Tabla 55. Consolidado personal UAERMV 115
Tabla 56. Trazabilidad Informes mensuales UAERMV 117

Tabla 57. Informes semanales 120
Tabla 58. Comité integral de seguimientos UAERMV 120
Tabla 59: Correspondencia recibida y enviada Contrato..... 123

LISTA DE REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Fotos 1: Punto de atención a la comunidad fijo, tramo vial de Laguna verde, Consorcio Gaviones 95..... 23
Fotos 2: Punto de atención a la comunidad móvil, tramo vial de Laguna verde, Consorcio Gaviones 95..... 24
Fotos 3: Recorrido Tramo Laguna Verde. Consorcio Gaviones 95. 28
Fotos 4: Registros grupo del grupo de WhatsApp comunidad de Laguna Verde..... 29
Fotos 5: Sensibilización del personal. Tramo vial de Laguna Verde. 32
Fotos 6: volantes Canales de atención al ciudadano 39
Fotos 7: volantes Excavación e instalación tubo de 36" abscisa K0+132 39
Fotos 8: Excavación e instalación tubo de 36" abscisa K0+ 305. 39
Fotos 9: Entrega de volantes informativos 39
Fotos 10: Casa del señor Fidel..... 41
Fotos 11: Casa de la señora Nancy 41
Fotos 12: Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 54. 52
Fotos 13: Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 55..... 52
Fotos 14: Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 56. 52
Fotos 15: Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 57 52
Fotos 16: Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 58. 52
Fotos 17: Punto de atención fijo a la comunidad CEV. 57
Fotos 18: Punto de atención fijo a la comunidad CEV 57
Fotos 19: Recorrido Conjunto verificación de actividades y avance de obra. 58
Fotos 20: Recorrido Conjunto verificación de actividades del componente social. 58
Fotos 21: Registros grupo de WhatsApp comunidad de San Antonio El Toldo y Unión Tunales. 60
Fotos 22: Sensibilización del personal de obra. CEV. 63
Fotos 23: Sensibilización de personal de obra. CEV. 63

Fotos 24: Reunión extraordinaria de Unión Tunales, San Antonio El Toldo. 67
Fotos 25: Instalación de valla informativa móvil Unión Tunales. 69
Fotos 26: Instalación de valla móvil San Antonio El Toldo. 69
Fotos 27: Instalación pasacalle Unión Tunales. 70
Fotos 28: Instalación pasacalle de San Antonio El Toldo. 70
Fotos 29: Volante informativo Convocatoria Laboral. 71
Fotos 30: Diseño afiche informativo. 72
Fotos 31: Punto satélite informativo Unión Tunales. 74
Fotos 32: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 76. 88
Fotos 33: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 77 88
Fotos 34: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 78. 89
Fotos 35: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 79. 89
Fotos 36: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 80 89
Fotos 37: Verificación de interventoría punto de atención fijo, Frente Unión Tunales. 93
Fotos 38: Verificación del punto móvil atención al usuario. Frente de Capitolio. 93
Fotos 39: Verificación del punto móvil atención al usuario. Frente de San Antonio El Toldo. 93
Fotos 40: Recorrido conjunto 94
Fotos 41: Pantallazo información a la comunidad en el grupo de WhatsApp en el frente de obra, Unión Tunales, Capitolios y San Antonio El Toldo. 97
Fotos 42: Sensibilización al personal de obra de Capitolio 100
Fotos 43: Sensibilización al personal de obra Unión Tunales. 100
Fotos 44: Verificación valla informativa Unión Tunales. 104
Fotos 45: Verificación valla informativa San Antonio el Toldo. 104
Fotos 46: Verificación instalación Pasacalles informativa Capitolio. 105
Fotos 47: Verificación instalación Pasacalles informativa Unión Tunales. 105
Fotos 48: Volante informativo cierre vial, Tramo vial de Unión Tunales. 107
Fotos 49: Afiches informativo Unión Tunales. 108
Fotos 50: Afiche informativo San Antonio. 108
Fotos 51: Comité de seguimiento integral No 51 CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá. 121
Fotos 52: Comité de seguimiento integral N° 52, CTO Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá. 121

Fotos 53: Comité de seguimiento integral No 53, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá 121
Fotos 54: Comité de seguimiento integral No 54. CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá..... 121
Fotos 55: Comité de seguimiento integral No 55, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá. 122
Fotos 56: Mesa de trabajo entidad ejecutora UMV e interventoría. 122

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Consorcio Gaviones 95

A1.

- *Comunicado 186- 1-794 del 7/08/2025.*
- *Correo electrónico entrega de cuenta de cobro al Consorcio Gaviones 95.*
- *Apertura de PQRS*

A2

- *Comunicado 186-1-795 el 7 agosto del 2025.*
- *Comunicado 186-1-793 el 7 de agosto del 2025.*
- *Comunicado 186-1-818 el 21 de agosto del 2025.*
- *Comunicado 186-1-839 el 27 de agosto del 2025.*

A3

- *Trazabilidad pantallazo de entrega y aprobación del volante informativo de invitación a reunión de comité de participación ciudadana y volante informativo de cierre vial de obra en el tramo vial de Laguna Verde.*
- *Comunicado 186-1-810 - 13 de agosto del 2025.*

A4

- *Comunicado 186-1-838 observaciones actas de vecindad de apertura.*

A5

- *Lista de chequeo mes de julio Consorcio Gaviones 95.*

A6

- *Copia Bitácora Consorcio Gaviones 95.*

A7

- *Comunicado 186-1-840- 27 de agosto del 2025.*
- *Comunicado 186-1-821- 22 de agosto del 2025.*

Consorcio Estabilización Vial

A 8

- *Lista de chequeo mes de agosto Consorcio Estabilización vial.*

A 9

- *Copia Bitácora Social Consorcio Estabilización Vial agosto.*

A 10

- *comunicado CEV/22-454*
- *comunicado CEV/22-460*
- *comunicado CEV/22-462*
- *Comunicado 186-1-811*

Unidad Administrativa especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV

A 11

- *Correos electrónicos trazabilidad de solicitud y aprobación piezas divulgativas volantes y comunicados informativos. UAERMV.*

A 12.

- *Lista de personal agosto UAERMV.*

A13

- *Lista de chequeo mes de agosto UAERMV.*

A 14

- *Copia Bitácora Social agosto UAERMV.*

A 15

- Correspondencia enviada y recibida.

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las actividades realizadas por el componente social de Interventoría **"ECOVIAS SAS"** a través del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022,** cuyo Objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR".** mediante la Resolución Nº 008 del 04 de febrero de 2022. El proceso de Concurso de Méritos le fue adjudicado a **ECOVÍAS S.A.S**, durante el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025 al hacer el seguimiento, verificación y acompañamiento al desempeño del componente social de del ejecutor del contrato Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), y de los contratista Consorcio Gaviones 95, Soluciones Geoespaciales SAS, mediante un modelo de ejecución mixta, que contempla dos procesos de obra independientes, los cuales se describen a continuación. Obras hidráulicas (Subdrenes, berma-cunetas, box culvert) y muros en gavión, se ejecutarán mediante los contratos que surja de la licitación pública No. LP-006-2021, cuyo objeto es "CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020" publicado, por la UAERMV e Instalación del material granular y del fresado estabilizado en las vías, serán ejecutadas directamente por la UAERMV.

El presente informe da a conocer las condiciones de avance de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), y los contratistas, cuyos contratos son: CONSORCIO GAVIONES 95 No 478 – 2022, CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL No 479 - 2022 y SOLUCIONES GEOESPACIALES SAS – SOLGEO SAS No 480- 2022, este último se encuentra en proceso de nulidad por tanto no se presenta información en el componente Social de acuerdo con lo estipulado contractualmente en el anexo técnico en la etapa de construcción.

Los anexos que se presentan están relacionados a la gestión de seguimiento y control de la Interventoría. Dando a conocer las condiciones de avance del CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 en el componente Social de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Describir la metodología para el acompañamiento a la supervisión y verificación del Área de Gestión Social, desarrollada por los ejecutores del contrato, para el pleno cumplimiento de las labores establecidas dentro del anexo técnico, fundamentado en los criterios de calidad, suficiencia y oportunidad, donde se evidencia los procedimientos implementados y se cuente con los soportes de resultado.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Revisar, aprobar y hacer el seguimiento a los planes de gestión social, de los Contratista, conforme a los documentos contractuales.

- ✓ Comprobar a través de seguimiento, acompañamiento, verificación y evaluación la labor desarrollada por el ejecutor, para establecer que la ejecución de las actividades del componente sociales se ajuste con los requerimientos contractuales del contrato.

- ✓ Informar a Fondo de desarrollo Local del Sumapaz, periódicamente el avance y dificultades que surjan con el desarrollo del proyecto, en cada una de las actividades de gestión social realizadas por el ejecutor.

- ✓ Revisar, conceptuar y aprobar los informes elaborados por el ejecutor, en virtud de lo estipulado contractualmente.

- ✓ Propender por el cumplimiento de la propuesta metodológica y el desarrollo de las actividades y tiempos propuestos por el consultor en el Plan de Gestión Social, para cada uno de los programas establecidos.

- ✓ Asesorar y acompañar al contratista durante las actividades que realice en las etapas de construcción.

3. NORMATIVIDAD

- ✓ Constitución Política de Colombia.

- ✓ Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

- ✓ Ley 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

- ✓ Ley 1882 de 2018 o Ley de Infraestructura

- ✓ Ley 1083 de 2006: Establece algunas normas sobre planeación urbana sostenible. Señala que para garantizar la accesibilidad de todas las personas a las redes de movilidad y transitar por las mismas en condiciones adecuadas, en especial a las niñas, niños y personas que presenten algún tipo de discapacidad, las vías públicas que se construyan al interior del perímetro urbano a partir de la vigencia de esta ley. Ley 1801 de 2016 o Código Nacional de Policía y Convivencia.

- ✓ Ley 80 de 1993: Estatuto general de contratación de la administración pública.

- ✓ Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.

- ✓ Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan de Desarrollo.

- ✓ Ley 388 de 1997: Ley de desarrollo territorial.

- ✓ Ley 134 de 1994: Mecanismos de participación ciudadana.

- ✓ Ley 190 de 1995: Normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

- ✓ Ley 489 de 1998: Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional.

- ✓ Ley 1618 de 2013: Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

- ✓ Ley 1437 de 2012: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

- ✓ Decreto 2820 de 2010, de la Presidencia de la República: Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, modificado por el Decreto 2041 de 2014.

- ✓ CONPES 3819 de 2014, por medio del cual establece los lineamientos de la Política nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia. Resolución 49906 del 6 de julio de 2015: Por la cual se adopta la Política de Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía, o la que haga sus veces.

- ✓ Acuerdo 584 de 2015: Adopción de los lineamientos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital.

- ✓ Acuerdo 79 de 2003: Código de Policía de Bogotá D.C.

- ✓ Acuerdo 142 de 2005: por medio del cual se adoptan mecanismos e instancias para apoyar y promover en el ámbito distrital las Veedurías Ciudadanas

- ✓ Acuerdo No. 645 de 2016: Por el cual se adopta el plan de desarrollo, económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2016-2020; Bogotá Mejor para Todos.

- ✓ Decreto Distrital 371 de 2010: Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.

- ✓ Decreto Distrital 529 de 2015.

- ✓ Decreto Distrital 162 de 2015: Por el cual se autorizan las intervenciones en los elementos constitutivos artificiales o construidos del espacio público y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Decreto Distrital 380 del 2015: Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Resolución 747 de 1998: Topes máximos para sueldos y demás gastos que se pueden pagar por contratos.

- ✓ Decreto Distrital 190 de 2004: Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá.

- ✓ Decreto Distrital 1660 de 2003: Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad.

- ✓ Decreto Distrital 197 de 2014: Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.

- ✓ Decreto Distrital 503 de 2011: Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital.

- ✓ Decreto Distrital 166 de 2010: Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Decreto Distrital 558 de 2018: Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Decreto Distrital 1078 de 2015 sobre Políticas y Lineamientos de Tecnología de la Información.

- ✓ Resolución 325 de 2015: Por medio de la cual se adopta el Plan Sectorial de Transversalidad de Género en el Sector Movilidad y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Directiva 001 de 2011 "Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital, promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas vulnerables marginales y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad".

- ✓ Resolución 979 de 2017 que establece como propósito central o Misión institucional del IDU "Generar bienestar en los habitantes de la ciudad mejorando la calidad de vida, mediante el desarrollo de infraestructura para la movilidad, contribuyendo a la construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna"

- ✓ Resolución 4940 del 18 de octubre de 2018, mediante la cual el IDU adopta su Política de Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía.

- ✓ Decreto 332 del 2020, el cual establece medidas afirmativas para promover la participación de la mujer en la ejecución de contratos del Distrito Capital.

4. RECURSO HUMANO DE GESTION SOCIAL PARA LA INTERVENTORIA

A continuación, se da conocer el perfil y la experiencia que hace parte del profesional social de la interventoría.

Tabla 1. Profesional social de Interventoría.

PROFESIONAL	CARGO	DEDICACIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Trabajadora Social Isabel Bernal Yasso. La hoja de vida de la profesional social fue aprobada por el fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz Radicado No. 20237020012741 Fecha: 14-08-2023	Profesional Social	100%	Profesional en trabajo social o sociología o sicología o profesiones afines. Acreditar experiencia general mínimo detres (3) años. Título de postgrado: No Aplica	Experiencia en el cargo de profesional social de un (1) año en proyectos de interventoría para la construcción y/o conservación y/o rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura vial (tomado de anexo técnico –Cto 161-2022)

Fuente: Propia

5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

En el marco de las actividades constructivas el plan de gestión social pretende implementar estrategias que minimicen el impacto que generan las labores constructivas, las cuales están enmarcadas en el Plan de Gestión Social y sus programas y se ejecutarán de acuerdo con los lineamientos del modelo establecido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL); las cuales se adaptan al alcance y la misionalidad de la UAERMV; lo anterior teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra financiado por recursos de orden nacional del Sistema General de Regalías.

De acuerdo a lo anterior la UAERMV presenta un plan de gestión social el cual es aprobado por la interventoría el 16 de noviembre del 2023.

Los Contratista Consorcio Estabilización vía presenta actualización el plan de gestión social el cual es aprobado por la interventoría el 29 de diciembre del 2023.

El Consorcio Gaviones 95, hace entrega del documento en el mes de marzo del 2025 y da aval mediante comunicado 186-1-683, el 29 de mayo del 2025 en su versión 4.

El plan de gestión social esta descrito bajo las fichas PAGA, enmarcado de acuerdo con los lineamientos del modelo establecido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL); y son adaptados al alcance y la misionalidad de la UAERMV.

Las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL) se enmarca en 4 programas los cuales se relacionan a continuación.

- ✓ MEDIDA DE MANEJO 1-PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO- PGS-6.1-16
- ✓ MEDIDA DE MANEJO 2- PROGRAMA EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO. PGS-6.2-17.
- ✓ MEDIDA DE MANEJO 3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA- PGS-6.4-18.
- ✓ MEDIDA DE MANEJO 4. PROGRAMA DE CULTURA VIAL- PGS-6.5-19.
- ✓ VINCULACIÓN MANO DE OBRA.

6. CONTRATO DE OBRA Nº. 478 DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95

6.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El contratista CONSORCIO GAVIONES 95, el plan de Gestión social se encuentra enmarcado de acuerdo con los lineamientos del modelo establecido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL); y son adaptados al alcance y la misionalidad de la UAERMV; teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra financiado por recursos de orden nacional del Sistema General de Regalías, De acuerdo a lo anterior la interventoría solicita realizar una actualización al documento.
A continuación, se presente la trazabilidad del documento.

Tabla 2: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social Contrato No 478/2022 Consorcio Gaviones 95.

FECHA	TRAZABILIDAD	APROBACIÓN
2 de octubre del 2023. 29 de febrero del 2024 El 19 de marzo del 2025	La interventoría mediante comunicado 186- 1- 309 del 2 de octubre del 2023, alcance donde indican que debe ser actualizado de acuerdo al Plan de Gestión Social implementado por la UAERMV, el cual se encuentra enmarcado con los lineamientos del modelo establecido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL). El consorcio reinicia el contrato el 5 de febrero del 2024, se realiza mesa de trabajo con el fin de dar respuesta a las inquietudes que se presenta en la actualización e implementación de las fichas PAGA, el 29 de febrero del año en curso. El 12 de marzo es radicado oficialmente con comunicado D 22-2024 – 37, el consorcio realizo entrega del plan de gestión social con las observaciones subsanadas V3. La interventoría da respuesta al comunicado mediante comunicado 186-1-538 el 1 de abril del 2024 con observaciones. El contrato entra en suspensión el 16 de abril del 2024. Queda pendiente entrega por parte del Consorcio en su versión 4, con las observaciones subsanadas. El Consorcio hace entrega del Plan de Gestión social con las observaciones subsanadas Es de aclarar que la interventoría reinicia las actividades del contrato el 1 de abril del 2025. La interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-683, el 29 de mayo del 2025. Donde la interventoría avala el documento en su versión 4.	29 de mayo del 2025 comunicado 186-1-683

Fuente: Propia

6.1.1 PERSONAL DEL COMPONENTE SOCIAL.

Tabla 3: Profesional social Consorcio Gaviones 95

PROFESIONAL	CARGO	DEDICACIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Psicólogo Andrés A. García	Profesional Social	100 %	Acreditar Experiencia General mínimo Cinco (5) Años.	Profesional Social en al menos tres (3) contratos de obra pública.

Fuente: Propia

6.1.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Este programa establece la instalación por parte del Contratista de un sistema de atención al ciudadano, en el que se registren de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos como: peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD), interpuestos por los ciudadanos de manera presencial, escrita, telefónicamente, correo electrónico y/o redes sociales.

6.1.2.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Los puntos de atención a la comunidad (PUNTO PAU) debe estar dotada de:

- Baño
- Línea telefónica exclusiva
- Cartelera informativa
- Computador con los programas necesarios
- Sillas y escritorio para la persona encargada de la atención.
- Espacio, sillas disponibles, chaquetas según el manual de identidad visual.

A la fecha de cierre del presente informe el contratista informo que el punto fijo de atención a la comunidad se encuentra ubicado en el predio de la señora Clara Martínez de la vereda Auras, que estableció un horario de atención de 8: 30 a.m. a 3: 00 p.m. el cual fue adecuado para realizar atención a la comunidad, la interventoría realizará seguimiento a su cumplimiento.

Tabla 4: Ubicación punto PAC Contrato No 478/2022 Consorcio Gaviones 95

PUNTO LAGUNA VERDE CONTRATO 478 -2022	
Punto Fijo vereda de Santa Rosa	Casa de la señora Clara Martínez
Punto móvil Vereda de Laguna Verde	Casa de la señora Marcela Martínez
Línea Telefónica	3143248985
Correo electrónico:	atencioncomunidadlvcg95@gmail.com

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Fotos 1: **Punto de atención a la comunidad fijo, tramo vial de Laguna verde, Consorcio Gaviones 95**

.





Fotos 2: **Punto de atención a la comunidad móvil, tramo vial de Laguna verde, Consorcio Gaviones 95.**

- ✓ **PQRS**

Durante el desarrollo del presente informe el Consorcio Gaviones 95, el consorcio realizó apertura a cuatro PQRS.
Las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 5: Consolidado de PQRS No 478/2022 Consorcio Gaviones 95

No PQRSD	Tramo Vial	Datos del contacto	Asunto	Fecha de apertura	Seguimiento	Estado	
						A	C
01	San Antonio 1	Wilfor Lara	Deuda adquirida por concepto de descargue de material en su predio, servicios de internet, y electricidad	16 /05/2025	El Ciudadano informe a la interventoría que el Consorcio Gaviones 95, tiene una presunta deuda por concepto de lo relacionado en el asunto. La interventoría solicita al consorcio el Paz y Salvo del ciudadano, mediante comunicado 186 – 1- 701 del 22 de mayo del 2025. El 28 de mayo del año en curso el Consorcio entrega respuesta, mediante comunicado D 19. El 28 de mayo del año en curso, la interventoría comunicada 186 – 1- 676, traslada al consorcio radicado 20251900012421 del 5-02-2025. Traslado Derechos de Petición de la comunidad de Sumapaz sobre	X	

					"Solicitud de cumplimiento de pagos pendientes." El 24 de junio del 2025, la interventoría mediante comunicado 186- 1- 716 da respuesta a al comunicado, D-3 del 3 de marzo del 2025 y D 19 del 28 de mayo del 2025. El 26 de junio del 2025, mediante comunicado 186-1-724 la interventoría Solicita documentación y actividades pendiente componente social Consorcios Gaviones 95. El 1 de julio del año en curso la interventoría con el comunicado 186 – 1-729, realizó Llamado de atención documentación pendiente componente social, Consorcios Gaviones 95. El 14 de julio, el Consorcio Gaviones 95 envía respuesta al comunicado 186- 1-716 El 22 de julio del 2025 el Consorcio Gaviones 95 da respuesta al Llamado de atención documentación pendiente componente social, Consorcios Gaviones 95.l comunicado 186-1- 729. Es de aclarar que los comunicados aquí relacionados fueron anexados en los informes de interventoría N° 19, N °20. El 7 de agosto del 2025, la interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-794, al comunicado D40. en dicho comunicado informan que el ciudadano no figura como acreedor del Consorcio Gaviones 95, la interventoría informa que revisará la información suministrada por el Consorcio Gaviones 95, con el fin de verificar la veracidad de la información y solicitará al ciudadano las pruebas correspondientes a la deuda que indica. Una vez el ciudadano aporte pruebas se harán llegar al Consorcio. El 21 de agosto del año en curso el ciudadano Wilfor Lara, hace llegar al		

					Consorcio Gaviones 95 la cuenta de cobro, solicitando el pago pendiente. A la fecha del presente informe el Consorcio no ha realizado el correspondiente pago. La interventoría realizará seguimiento y solicitará el comité de seguimiento integral y por comunicados el Paz y Salvo del ciudadano en mención.		
2	Laguna Verde	Ramiro Martínez	Arreglo de la cerca.	30 /07 /2025	El 30 de julio del año en curso el ciudadano informa que se presentó un incidente con el vehículo del Consorcio Gaviones 95, por cuanto que al realizar el giro para dirigirse al campamento de obra y punto de atención fijo golpeo la señal de tránsito restrictiva y un poste de la cerca, el 23-08- 2025, el profesional social realiza visita al predio, por cuanto que interventoría informa que se debe atender el caso y hacer los respectivos arreglos. El ciudadano manifiesta que no firma el formato de atención al ciudadano. El 02-08-2025 el profesional visita el predio del ciudadano en mención ubicado en la vereda de Auras, el señor Ramiro comenta la situación y solicita que allí se evitará realizar el giro. 08-08-2025: dos ayudantes de construcción se dirigen al predio a reparar la cerca y la señal de tránsito restrictiva, encontrando que ya tanto el poste de la cerca, como la señal habían sido reparados. La interventoría realizó visita al predio con el fin de verificar la información suministrada e evidencia que la cerca se encuentra amarada a la señal de tránsito, solicita se realice la reparación.	X	

3	Laguna Verde	Roldan Bautista	Afectación de tubo de 3 "	7/07/2025	El 07/'7/2025, la retroexcavadora de oruga, adecuando la abscisa K0+00, afecto el tubo de 3" que surte el agua de predios como el de Felisa Pardo, siendo administrador el señor Roldan Bautista, predio de la señora Diana Marcela Pardo y Virgilio Pardo. El 12/ 07 / 2025 El profesional social realiza visita con el fontanero y realizan un arreglo provisional. Se encuentra pendiente realizar el arreglo definitivo.	X	
4	Laguna Verde.	Humberto Contreras	Afectación de manguera	20/07/2025	La profesional social de la interventoría informa que fue afectada una manguera que surte el agua del predio, en la abscisa K1+750, el 20-08-2025, el Profesional del Consorcio se dirige a la abscisa, informa que el Consorcio realizará la reposición y queda un compromiso de 15 días para la reparación.	X	
Total, de PQRS 4							

Fuente: Propia

A1.

- ***Comunicado 186- 1-794 del 7/08/2025.***
- ***Correo electrónico entrega de cuenta de cobro al Consorcio Gaviones 95.***
- ***Apertura de PQRS***

6.1.2.2 Recorridos

El contrista está en la obligación de realizar recorridos, con el fin de verificar la atención con la comunidad, estableciendo puntos móviles, permitiendo canalizar de forma personalizada las manifestaciones de la comunidad.

La interventoría realizará seguimiento y verificación en recorridos a los compromisos adquiridos en el componente social.

Durante el periodo comprendido la interventoría realiza recorridos revisa las actividades a implementar en el tramo vial de Laguna Verde.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Fotos 3: **Recorrido Tramo Laguna Verde. Consorcio Gaviones 95.**

- **Línea WhatsApp:**

Durante este periodo, el contratista informa en el grupo de WhatsApp con la comunidad de frente de obra de Laguna Verde, con el fin informar las actividades relevantes a realizar durante el mes de agosto del 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

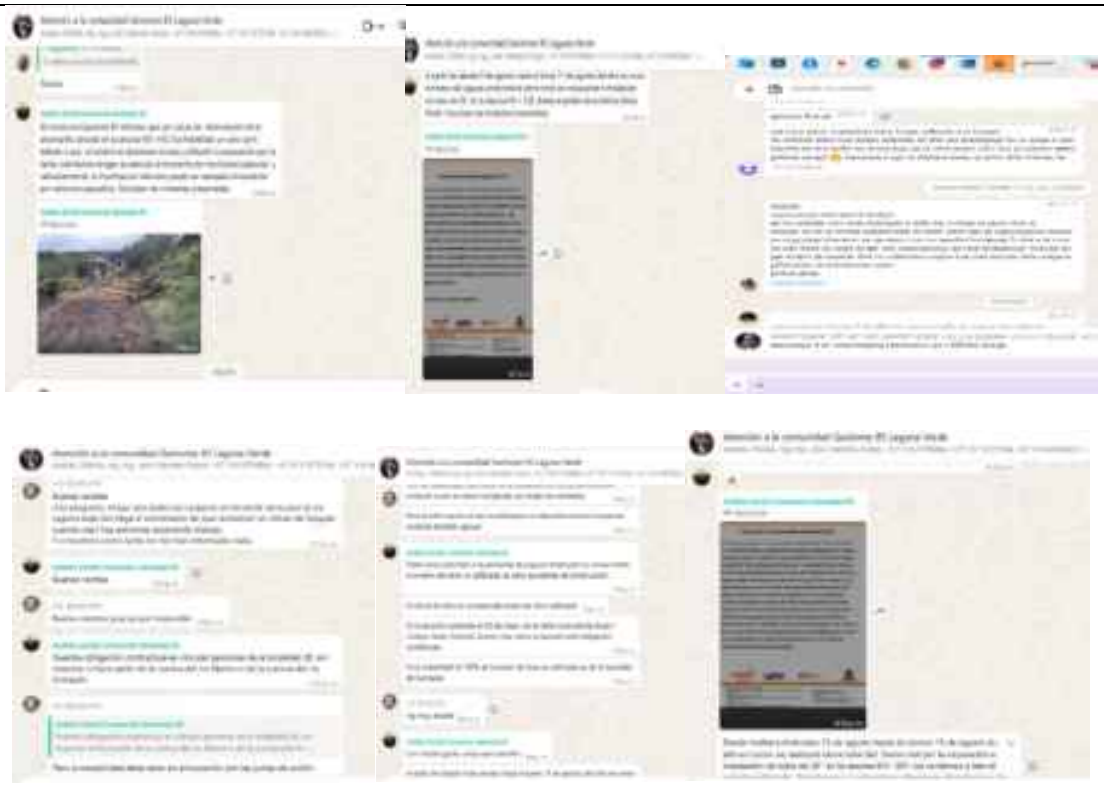

Fotos 4: **Registros grupo del grupo de WhatsApp comunidad de Laguna Verde.**

6.1.2.3 Mesa de trabajo

Durante el periodo comprendido no se realizan mesas de trabajo.

Tabla 6: Indicadores cumplimiento gestión social Programa de atención al usuario

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO		
INDICADOR	**FORMULA**	**CUMPLIMIENTO**
PRODUCTIVIDAD	Línea telefónica solicitada/Línea telefónica implementada 1 X 100 = 1	100 %
PRODUCTIVIDAD	Correo electrónico solicitado / Correo electrónico implementado 1 X 100 = 1	100%
PRODUCTIVIDAD	Formato de control de atenciones diligenciado/Formato de atenciones recibidas 0 x 100 =	100%
PRODUCTIVIDAD	Recorridos /Realizados 1 X100 = 1	100%
PRODUCTIVIDAD	Total, de equipamiento básico instalado / total de equipamiento básico requerido 1 x 100 = 1	100%
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Durante el periodo comprendido el Consorcio Gaviones 95, realizó adecuación del punto de atención fijo en el frente de obra de Laguna Verde. De igual manera dio adecuación al punto de atención fijo y móvil que se encuentra ubicado sobre el tramo vial en intervención.	

Fuente: Propia

6.1.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

6.1.3.1 Procesos Sensibilización

Se establecerá dentro de las sensibilizaciones al personal vinculado al proyecto en todas las áreas sobre temas relacionados con las medidas de manejo ambiental y social del proyecto.

La sensibilización al personal vinculado al proyecto contiene los siguientes elementos:

- Descripción técnica del proyecto

- Presentación de las obligaciones de gestión social de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

- Objetivos, alcances y operaciones de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

- Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales (política general en temas laborales, recursos humanos, condiciones de trabajo y términos de empleo organizaciones laborales, no discriminación e igualdad de oportunidades, reducción y mecanismos de protección de la fuerza laboral, mecanismo de atención a quejas y reclamos).

- Seguridad vial en obra

- Normas de convivencia con las comunidades laborales sociales y bióticas enfatizando en las limitaciones al personal procedente de otros lugares para la extracción de fauna, flora y demás recursos de los pobladores vecinos del área.

- Mensualmente se realizarán charlas de refuerzo de los conceptos ya incluidos y se complementará con información sobre el avance de las obras, problemas surgidos durante las mismas y soluciones encontradas a modo de lecciones aprendidas. De igual forma se reforzará en estas charlas, aquellos temas que se hayan detectado como de alta sensibilidad para las comunidades y para los colaboradores del proyecto.

Durante el desarrollo del presente informe el Consorcio Gaviones 95, realizó una sensibilización con el personal que se encuentra vinculado al proyecto el 26 de agosto del 2025. A continuación, se presenta la trazabilidad.

Tabla 7. Consolidado acciones formación a empleados Consorcio Gaviones 95

Fecha registro	Tema	Descripción
26 /08/2025	Comunicación efectiva en el ámbito de la obra civil	El componente social del Consorcio Estabilización vial, realizó sensibilizaciones a los trabajadores de obra y operarios en el tramo vial de Laguna Verde.

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotos 5: Sensibilización del personal. Tramo vial de Laguna Verde.

Tabla 8. Indicadores de cumplimiento del Programa Educación y capacitación al personal vinculado al contrato. Consorcio Gaviones 95

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	1 sensibilizaciones realizadas x100 / 1 sensibilizaciones requeridas x 100	100%
	24 trabajadores contratados/ 15 trabajadores sensibilizadas *100	62,5 %
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Durante el periodo comprendido el Consorcio Gaviones 95, realizó la sensibilización al personal de obra, se evidencia que el profesional sensibilizó a 15 trabajadores, la interventoría solicita que se bebe sensibilizar al 100 % del personal evidenciándolo en el informe del mes de octubre del año en curso.	

Fuente: Propia

6.1.3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Para el siguiente programa, la interventoría adelantará labores de verificación, supervisión, acompañamiento a los diferentes momentos establecidos para el programa, con el propósito de garantizar el cumplimiento de este, desde el seguimiento a las siguientes actividades.

6.1.3.1 Reuniones participativas

La interventoría verificará que las reuniones se realicen de acuerdo a los parámetros, requisitos y generalidades propuestos por el contratista (CONSORCIO GAVIONES 95) La Interventoría revisará y determinará la información a presentar en las reuniones, los formatos a aplicar, el lugar de la reunión, a tratar en las reuniones y el comité veedor.
El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del Proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

El Contratista deberá convocar a la población del área de influencia directa del proyecto, Alcaldías Local, Organizaciones de comerciantes Administradores, Juntas de Acción Comunal – JAC, entre otras.

Dichas reuniones, por ser masivas y tratarse de personas de veredas distantes pero pertenecientes al mismo sector o tramo, se realizarán de manera presencial serán convocados por el contratista.

6.1.3.1.1 Reuniones de inicio

Cuando se realicen las reuniones de inicio de obra, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando de la asistencia, así mismo se reportará los aciertos y desaciertos. El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

Durante el periodo comprendido no se realiza reuniones de inicio por no ser necesario. No aplica.

6.1.3.1.2 Reunión de avance

Cuando se realicen las reuniones de avance de obra cumpliendo con un 50%, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información y evidenciando el porcentaje de asistencia, así mismo se reportará los aciertos y desaciertos, si se cumplió con le estipulado para las reuniones de avance y con el resumen de la evaluación de desempeño que reporte el Contratista. Estas reuniones tienen como fin informa sobre el estado de avance de las obras constructivas y cronograma de ejecución de las actividades faltantes, cuando se complete la ejecución del 50% de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales, informar la fecha de finalización de las obras, y responderá las inquietudes de los asistentes.

No aplica por no ser necesario realizar reuniones de avance.

6.1.3.1.3 Reunión de Finalización

Se realizarán las reuniones de finalización de obra cuando se complete el 95% de las labores constructivas, la Interventoría hará el respectivo reporte donde presentara los resultados de finalización, consolidando la información de asistencia, así mismo se reportará los aciertos y desaciertos, si se cumplió con lo estipulado para las reuniones de finalización y con el resumen de la evaluación de desempeño que reporte el Contratista.

Las reuniones de finalización tienen como fin presentar a la comunidad, las entidades encargadas del contrato, cuando se complete el 95% de la ejecución de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales informa la fecha de finalización de obra, y responderá las inquietudes de los asistentes.

No aplica por no ser necesario realizar reuniones de finalización.

6.1.3.1.4 Reuniones Extraordinarias.

Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en los casos en que el desarrollo del contrato lo amerite, o que la comunidad, la Interventoría, la supervisión del Fondo de desarrollo Rural de Sumapaz lo solicitaron. Estas reuniones se llevaron a cabo con el fin de tratar asuntos no convencionales y que por su naturaleza o urgencia requerían un espacio para ser revisados. La Interventoría hará el respectivo reporte donde, consolida la información y evidencia el porcentaje de asistencia, así mismo se reportará los aciertos y desaciertos, si se cumplió con lo estipulado para las reuniones.

No aplica por no ser necesario realizar reuniones extraordinarias.

6.1.3.1.5 Reuniones Comité de participación Ciudadano. (veeduría)

La Interventoría realizará acompañamiento, al comité veedor conformado por la comunidad, supervisará las convocatorias y cumplimiento de las solicitudes de las reuniones que programe el comité, los temas a tratar y los compromisos establecidos en cada reunión.

Durante el periodo comprendido el Consorcio Gaviones 95, no realizó reuniones con el comité de participación ciudadana.

Tabla 9: Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación comunitario.

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	
Reuniones de Inicio	**CUMPLIMIENTO**
# de reuniones de inicio programadas en el periodo # de reuniones de inicio ejecutadas en el periodo # x100 #	NA

Reuniones Extraordinarias	
# de reuniones extraordinarias programadas en el periodo # de reuniones extraordinarias ejecutadas en el periodo # x100 #	NA
Reuniones de Finalización	
# de reuniones de finalización programadas en el periodo # de reuniones de finalización ejecutadas en el periodo # x100 **#**	NA
Reuniones Comité de participación Ciudadana	
#de reuniones de comité veedor programadas en el periodo # de reuniones de comité veedor ejecutadas en el periodo # x100 **#**	**NA**
ANALISIS DE LOS INDICADORES	A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio Gaviones 95 no realizó reuniones con la comunidad por no ser necesario.

Fuente: Propia

6.1.3.1.6 Valla Informativa Móviles

Para la etapa de construcción del contratista instalará las vallas informativas la cual se encuentra ubicada en el frente de obra.

La valla informativa móvil, por cuanto que esta se debe realizarse la instalación de acuerdo al anexo técnico donde indica, en la página 115, numeral 10 Señalización ***"Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes"***. Por lo anterior, en el informe separar y describir mes a mes el cumplimiento a la instalación vallas informativas móviles y la reposición de los pasacalles instalados por la UAERMV.

6.1.3.1.7 Pasacalles.

El numeral 5.4.2 se aclara que en los comités tanto sociales como integrales, la interventoría ha solicitado la reposición de los pasacalles el cual está establecida contractualmente en el anexo técnico**,** página 34***" Pasacalles Informativos de Inicio/Fin, El contratista deberá suministrar, instalar y mantener los pasacalles en el inicio/fin de cada tramo a intervenir según las dimensiones descritas en el PMT, previa aprobación por parte de la interventoría".*** por tanto el Consorcio realizará

reposición de pérdida o daño de las ya instaladas por la UAERMV, pero esto no indica que reemplace la valla informativa móvil.

De acuerdo a lo descrito anteriormente la interventoría solicita que el Consorcio realice reposición de pasacalle en el tramo vial de Capitolio e instale los pasacalles de Laguna Verde. A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio Gaviones 95, no ha hecho la reposición del pasacalle en el tramo vial de Santo Domingo – Capitolio y la instalación de tramo vial de Laguna Verde. Así mismo de las vallas informativas móviles del tramo vial de Laguna Verde.

Trazabilidad de los requerimientos realizados por interventoría.

La interventoría ha solicitado la reposición e instalación de los pasacalles y vallas móviles en reiteradas ocasiones mediante comunicados 186-1-742, 186-1-724, 186-1-729, 186-1-792, 186-1-793, 186-1-795, 186-1-818, 186-1-839 y en comités de seguimientos de obra integrales que se han realizado desde el reinicio del contrato del año en curso y el Consorcio ha indicado que se está a la espera por cuanto que ya se realizó la requisición y a la fecha de entrega de este comunicado no se ha realizado la instalación ni reposición de lo mencionado.

De igual manera la interventoría radico el comunicado 186-1-818, donde Traslado de FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS. (Valla informativo móvil y pasacalles) el cual la entidad contratante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, (UAERMV), realizó entrega, con el fin que se instalen de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas contractualmente.

A2

- ***Comunicado 186-1-795 el 7 agosto del 2025.***
- ***Comunicado 186-1-793 el 7 de agosto del 2025.***
- ***Comunicado 186-1-818 el 21 de agosto del 2025.***
- ***Comunicado 186-1-839 el 27 de agosto del 2025.***

6.1.3.1.8. Volante de información de actividades

Estas piezas de divulgación que incluyen información sobre la fecha de actividades de obra relevante como programación de cierres viales él debe incluir el número de la línea de atención a la ciudadanía y otros aspectos y características específicas que el Contratista, la Interventoría y el Fondo de Desarrollo rural del Sumapaz. Consideren pertinentes y relevantes. A continuación, se presenta la trazabilidad del volante informativo diseñados y entregados por el Consorcio, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría.

6.1.3.1.9 Volantes informativos y/o convocatorias

Los volantes se entregarán a la comunidad con información sobre contingencias, convocatorias e información de interés del proyecto, es decir, ante situaciones no previstas que afecten la cotidianidad de la población, se deberá informar inmediatamente a la población que resulte afectada.

El Consorcio hace entrega del volante informativo de inicio de obra en el tramo vial de Laguna verde. Una vez aprobado los volantes informativos por interventoría, son distribuido a la comunidad, los cueles se describen a continuación

El 13 de agosto del año en curso, la interventoría realiza un llamado de atención, mediante comunicado 186-1-810, por cuanto que se evidencia falta de gestión y cumplimiento en la entrega de piezas divulgativas entregadas a la comunidad, debido a que : el día 12 de agosto del 2025, el consorcio Gaviones 95, hace llegar a la interventoría un volante informativo por correo electrónico, donde notifica que "informa que el miércoles 13, jueves 14 y el viernes 15 de agosto del año en curso, el tramo vial Laguna Verde tendrá cierre total, debido a excavación e instalación de tubería de 36", por alcantarilla existente ubicada en la abscisa K0 +305, frente al predio de la familia Baquero el cierre total del tramo vial iniciara a partir de la 7:00 a.m. del miércoles 13 de agosto, hasta el viernes 15 de agosto a las 5:00 p.m."
La interventoría ha solicitado en reiteradas ocasiones que la entrega de información a la comunidad de cualquier actividad técnica sea de 5 a 3 días con anticipación. Así mismo se debe garantizar el paso de rutas escolares, ambulancias y el transporte del mercado.

Tabla 10: Consolidada entrega de piezas divulgativas _ agosto _ Consorcio Gaviones 95.

Fecha	Tipo de pieza divulgativa	Total
3 /08/2025	Canales de atención al ciudadano	15
8 /08/2025	Excavación e instalación tubo de 36" abscisa K0+132	14
13/08/2025	Excavación e instalación tubo de 36" abscisa K0+ 305	11
Total, piezas informativas entregadas agosto del 2025		**40**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr>
<td>
Fecha:07/08/2025 Contrato: COP – 478 – 2022 Localidad: Sumapaz
Excavación de alcantarilla abscisa K0+132
El Consorcio Gaviones 95 a través del contrato 478 de 2022 cuyo objeto es:"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN2018000050020 (San Antonio I(K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna Verde)" informa que el sábado 9 ,domingo 10 y lunes 11 de agosto del año en curso, el tramo vial Laguna Verde tendrá cierre total, debido a excavación e instalación de tubería de 36", por alcantarilla ubicada en la abscisa K0 +132, frente al predio de la señora Felisa Pardo. El cierre total del tramo vial iniciara a partir de la 7:00 a.m. del sábado 9 de agosto, hasta el lunes 11 de agosto a las 6:00 p.m.
Disculpen las molestias presentadas.
UMV
Información sobre el proyecto en:
Punto de atención a la comunidad: Vereda Santa Rosa Casa de Clara Martinez
Residente Social: Andrés García
Horario de atención: miércoles 8:00 a.m. a 3:00 p.m., viernes de 8:00 a.m. a 12: p.m.
Teléfono: 3142406585
Correo electrónico:atencioncomunidadvcg30@gmail.com
Interventoría: ECOVIAS SAS
Residente Social: Isabel Bernal
Correo:
interventoriaecovias@gmail.com</td>
<td>
Excavación de alcantarilla abscisa K0+305
El Consorcio Gaviones 95 a través del contrato 478 de 2022 cuyo objeto es:"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN2018000050020 (San Antonio I(K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna Verde)" informa que el miércoles 13, jueves 14 y el viernes 15 de agosto del año en curso, el barrio vial Laguna Verde tendrá cierre total, debido a excavación e instalación de tubería de 36", por alcantarilla ubicada en la abscisa K0 +305, frente al predio de la familia Busquez el cierre total del tramo vial iniciara a partir de la 7:00 a.m. del miércoles 13 de agosto, hasta el viernes 15 de agosto a las 6:00 p.m. Mediante miércoles 13 de agosto, la vía estará habilitada para el paso a las 7:00 a.m. En caso que retirarse de emergencia tengan que trasladarse por el tramo vial, se garantizará a un doble prioridad para permitir su movilización.
Disculpen las molestias presentadas.
UMV</td>
</tr>
<tr>
<td>Fotos 6: volantes Canales de atención al ciudadano</td>
<td>Fotos 7: volantes Excavación e instalación tubo de 36" abscisa K0+132</td>
</tr>
<tr>
<td>
CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN OBRA
informa los canales de atención al ciudadano por las obras habilitadas que se realizan en el tramo vial Laguna Verde:
PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD FIJO:
Se ubica en la vereda Nutria en la casa de la Señora Clara Martinez, su horario de atención es: miércoles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., viernes de 8:00 a.m. a 12: 00 p.m.
PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD MOVIL:
Se ubica en la vereda Laguna Verde en la casa de la Señora Marcela Martinez, Su horario de atención es: Jueves de 10:00 a.m. a 12: 00 p.m. martes: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. jueves: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Teléfono de Contacto:
Correo electrónico:
Grupo WhatsApp: Atención a la comunidad Veredas Alt.Laguna Verde
Profesional Social: Andrés A García
Gracias por participar
UMV</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fotos 8: Excavación e instalación tubo de 36" abscisa K0+ 305.</td>
<td>Fotos 9: Entrega de volantes informativos</td>
</tr>
</table>

Tabla 11: Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria, volantes.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	40 volantes entregados/ 40 volantes requeridos X100 =	100%
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Consorcio Gaviones 95, realiza diseño y entrega de volante informativo de invitación a reunión de comité de participación ciudadana Veeduría, los cuales son revisados y aprobados por la interventoría, son distribuidos por la comunidad, en el tramo vial de Laguna Verde, como se establece contractualmente.	

Fuente: Propia

A3

- ***Trazabilidad pantallazo de entrega y aprobación del volante informativo de invitación a reunión de comité de participación ciudadana y volante informativo de cierre vial de obra en el tramo vial de Laguna Verde.***
- ***Comunicado 186-1-810 - 13 de agosto del 2025.***

6.1.3.1.10 Afiche informativo

Son piezas de divulgación mediante las cuales se describen generalidades de la obra y datos de contacto del Contratista. Estos deben ser instalados en el Punto fijo de atención a la comunidad y en los Puntos fijos Información y se realizará su reemplazo cuando se encuentren deteriorados, contado con el aval de la interventoría.

Durante el desarrollo del presente informe el profesional social realizó entrega del afiche informativo nuevamente presenta observaciones, se encuentra pendiente entrega.

6.1.3.1.11 Puntos fijos informativos (Puntos satélites)

Para efectos del presente contrato, el ejecutor, instalaran los puntos de información, propuestos en el plan de gestión social, la interventoría realizará seguimiento en su instalación, estos permitirán una amplia divulgación de la información del contrato.

Durante el desarrollo del presente informe el profesional social realizó la instalación de dos puntos informativos (puntos satélites), los cuales están ubicados en:

Tabla 12: Consolidado Puntos satélites Consorcio Gaviones 95.

FECHA	TRAMO VIAL	**PREDIO – PROPIETARIO**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
3/08/2022	Tramo vial Laguna Verde.	Casa del señor Fidel Contacto Norbey Martínez	 ***Fotos 10:*** **Casa del señor Fidel**
8/07/2025	Tramo vial Laguna Verde.	Casa del señor Nancy Contacto Nancy Martínez	 ***Fotos 11:*** **Casa de la señora Nancy**
Total, puntos satélites 2			

6.1.3.1.12. Actas de vecindad

El acta de vecindad es un documento que se elabora por medio de una visita domiciliaria a cada uno de los predios que se encuentran en el área de influencia directa de la obra. El objetivo de esta actividad es establecer las condiciones físicas iniciales de los predios a fin de determinar variaciones en las mismas derivadas de la ejecución del proyecto.

Durante el desarrollo del presente informe la interventoría realizo observaciones a las actas de vecindad de apertura entregadas a la mano el 4 de agosto del 2025, por el Consorcio Gaviones 95 mediante el comunicado 186-1-838 el 27 de agosto del 2025. de:

Tabla 13: Consolidado Actas de vecindad Consorcio Gaviones 95.

TRAMO VIAL	ACTA DE VECINDAD DE APERTURA TOTAL	ENTREGA Y APROBACIÓN
San Antonio 1	13	Presentó observaciones Con comunicado 186-1-838
Capitolio	18	Presentó observaciones Con comunicado 186-1-838
Laguna verde	5	Presentó observaciones Con comunicado 186-1-838
TOTAL ACTAS DE VECINDAD DE APERTURA 36		

Fuente: Propia

Total, de actas de vecindad devueltas 36.

Durante el periodo del presente informe, no se realiza levantamiento de actas de vecindad de apertura.

A4

- ***Comunicado* 186-1-838 observaciones actas de vecindad de apertura.**

6.1.3.1.13. Acta de compromiso

Las actas de compromiso es un documento que se elabora en caso de ser necesario hacer algún compromiso o acuerdo con la comunidad, institución o comerciante, con el fin de realizar alguna actividad de obra que repercuta con la comunidad, el contratista levantará el acta de compromiso.

La Interventoría realizará el seguimiento del cumplimiento o no, de las actas de compromiso y se notificará en el informe correspondiente, se firma el acta por el componente social y técnico, cuando se le cumpla al propietario con los compromisos registrados en el acta.

Durante el desarrollo del presente informe el Consorcio Gaviones 95 realiza las siguientes actas de compromiso en el tramo vial de Laguna Verde, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 14: Consolidado Actas de compromiso Consorcio Gaviones 95.

FECHA	UBICACIÓN Y PROPIETARIO	DESCRIPCIÓN DEL ACTA	REGISTRO FOTOGRAFICO
01/08/2022	K1 +780	El señor Bonifacio Hernández, autoriza acopiar RCD y/o materiales de construcción de manera temporal, para lo anterior se realizará la desinstalación parcial del cercado, para el ingreso y uso del predio. El consorcio Gaviones 95, se compromete a entregar el predio nivelado en terreno natural y posterior a ello, la instalación de la cerca en que se encontraba inicialmente. La presente autorización no generará ningún reconocimiento económico al propietario	
/08/2025	K1 + 125	El señor Humberto Contreras autoriza que el Consorcio Gaviones 95 realice el giro en la abscisa K1 +225, el señor Humberto retirará el alambre de púa y los postes. El Consorcio Gaviones 95, Se compromete a no disponer esta área para acopiar RCDS (material de excavación) y/o materiales de construcción	
Total, actas de compromiso en el periodo 3			

En el periodo del presente informe el Consorcio Gaviones 95 hace entrega de 10 actas de compromiso de apertura de acopios de acuerdo al recorrido socio- ambiental realizado el 14 de mayo del año en curso, las actas entregadas coinciden con el recorrido realizado, no se evidencia el acta del K2+490. No se evidencian las actas de gestión adelantada cierre de acopios de estas mismas actas. La interventoría solicita realizar su entrega. Estas son devueltas al profesional social para que sean completadas y arregladas en su presentación

Ver anexo A4.

6.1.3.1.14. Acta de gestión adelantada

Las actas de gestión adelantada tienen como fin, abordar las inquietudes y resolver las dudas planteadas por la comunidad y brindar una respuesta clara a las preguntas planteadas.

La Interventoría realizará el seguimiento del cumplimiento o no, de las actas de compromiso y se notificará en el informe correspondiente. Se firma el acta por el componente social y técnico, cuando se le cumpla al propietario con los compromisos registrados en el acta. Durante el periodo comprendido no se realizan actas de compromiso por no ser necesario.

Durante el desarrollo del presente informe no se realiza esta actividad por no ser necesario.

La interventoría solicita hacer entrega de las actas de gestión adelantada de entrega de acopios de Capitolio.

Ver anexo A4.

6.1.3.1.15. Ejercicio de Control Social

Durante el periodo comprendido del presente informe, no se realiza reuniones del control de ejercicio de control social. Por no ser necesario.

Tabla 15: Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# actas de vecindad del frente de obra Capitolio realizadas / # actas de vecindad del frente de obra de Capitolio requeridas x 100	NA
	2 de acta de compromiso realizadas x100 / 2 acta de compromiso requeridas x 100	100%
	# actas de gestión adelantada realizadas x100 / # actas de gestión adelantada requeridas x 100	N/A

	# ejercicio de control social realizadas x100 / #ejercicio de control social requeridas x 100	NA
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Consorcio Gaviones 95, Durante el desarrollo del presente informe no se realizan reuniones con la comunidad, por no ser necesario.	

Fuente: Propia

6.1.4. PROGRAMA DE CULTURA VIAL

Este Programa tiene como fin generar nuevas actitudes de responsabilidad en relación con el manejo de la infraestructura vial y su entorno por parte de la población vecina u usuaria. Las sensibilizaciones de sostenibilidad y cuidados de las vías se realizarán al finalizar las intervenciones, con el fin de apropiar a la comunidad del cuidado y conservación de las vías a lo largo del tiempo. Por lo anterior, se darán a conocer las recomendaciones que la comunidad debe tener en cuenta para conservar las vías intervenidas permitiendo que sean sostenibles.

Las sensibilizaciones quedaran soportadas por un acta, lista de asistencia y registro fotográfico y se realizará una vez se termine el proceso constructivo.

No aplica. Por no ser necesario.

6.1.5. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA

Este programa busca generar oportunidades laborales a las comunidades donde se ejecute el proyecto, contratando a un porcentaje de la población de mano de obra no calificada, Vulnerable y mujeres esta última regida por el decreto 332/2020, donde indica que para el mes de junio del 2023 para proyecto de construcción se contrate un 13.8%, que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas. Esto facilitará que haya una mayor apropiación del trabajo realizado y se evitarán conflictos con la comunidad.

6.1.5.1 Mano de obra no calificada contratación población vulnerable

La contratación de población vulnerable, la interventoría verificará el cumplimiento en la contratación de población vulnerable contratado. Dado lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a la contratación de personal en situación de vulnerabilidad, establecido contractualmente en el Decreto 380 del 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "Por ***el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones".***

6.1.5.2 Mano de obra no calificada de la localidad

Contratación de mano de obra no calificada, la interventoría verificará el cumplimiento del 75% del personal no calificado de la localidad del Sumapaz beneficiada por la ejecución de las obras. De acuerdo a lo enunciado en el anexo técnico que a la letra dice "Teniendo en cuenta la base de datos suministrada por el Fondo de Desarrollo Local del Sumapaz (FDLS) se indicó que, aproximadamente el 75% de la mano de obra no calificada está disponible para la vinculación al proyecto. Por cuanto se hace necesario vincular al personal de mano de obra local según el porcentaje descrito, lo cual sugiere disponer de personal foráneo en un 25% aproximadamente".

6.1.5.3 Contratación de mujeres.

De acuerdo al Decreto Distrital 332 de 2020, "**VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO.** Sin perjuicio de la autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y organismos distritales, el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, según corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales de los procesos de selección pública y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales.

La vinculación de mujeres será diferenciada por rama, así:

Ramas de actividad económica	Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contratos		
	A partir del 1 º de junio de 2021	A partir del 1º de junio de 2022	A partir del 1 º de junio de 2023 en adelante
Construcción	6,8%	9,3%	13,8%

6.1.5.4 Contratación de trabajadores en condición de discapacidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal con discapacidad: "Que el numeral 7 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 establece que el Gobierno Nacional debe implementar mediante decreto reglamentario un sistema de preferencias aplicables a los procesos de adjudicación y celebración de contratos de organismos estatales para quienes vinculen laboralmente a personas con discapacidad

debidamente certificadas, en un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores, lo que se encuentra reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, establecer un sistema de preferencias como factor de desempate para los proponentes que acrediten por lo menos el 10% de su nómina personas con discapacidad en el respectivo proceso de contratación".

6.1.5.5 Contratación de trabajadores en condición de vulnerabilidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad tales como:

-Madres cabeza de hogar
-Desplazados
- Estratificación 0- 1

Estas condiciones deben ser demostradas mediante certificado que le acredite como persona vulnerable, para ser tenidas en cuenta durante el proceso de selección.

Así mismo en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad".

Para el cierre del presente informe el componente social reporta un total de 25 trabajadores entre mano de obra calificada 18 y no calificada 7 el cual pertenece a la localidad del Sumapaz. Es de aclarar que este personal reportado es comparado con el reporte que el contratista realiza al componente SST de interventoría reporte que están en revisión a la fecha de entrega del presente informe.

Tabla 16. Consolidado personal consorcio Gaviones 95

PERSONAL TOTAL	PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA	PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA	TOTAL, MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	TOTAL, MANO DE OBRA NO CLAIFICADA VULNERABLE	TOTAL, DE MUJERES CONTRATADAS
25	18	7	7	9	6
PORENTAJES		**PORCENTAJE % MONC**	**PORCENTAJE % MONCL**	**PORCENTAJE % VULNERABLE**	**PORCENTAJE % MUJERES**
		28 %	100 %	36 %	24 %

Fuente: Propia

De acuerdo a los indicadores se evidencia que el consorcio cumple con la contratación de mano de obra no calificada por cuanto que cuenta con (7) trabajador de la zona cumpliendo con el 100 % y de acuerdo con lo establecido contractualmente se debe contratar un 75 %.

6.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

El área social de la Interventoría realiza las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por el ejecutor y los contratistas en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico.

6.2.1 Listas de Chequeo del Contratista

A la fecha de cierre del presente informe la interventoría realiza la lista de chequeo donde evalúa la gestión realizada en el componente social basados en cada programa que establece las fichas PAGA, la calificación durante el periodo comprendido es de …. %. El profesional social no ha dado cumplimiento en la entrega de los productos establecido contractualmente.

A5

- ***Lista de chequeo mes de julio Consorcio Gaviones 95.***

6.2.2 Revisión documental

Durante el periodo de este informe se realizó la consulta de los documentos legales:

- Contratos de Interventoría y Contratistas
- Anexo técnico.
- Plan de gestión Social.
- Comunicados
- Informes mensuales.
- correspondencia

A6

- ***Copia Bitácora Consorcio Gaviones 95.***

6.2.3 Informes Mensuales

En la siguiente tabla se registran los informes mensuales presentados, por el contratista, en el periodo comprendido el Consorcio Estabilización vial el cual se describe su trazabilidad.

Tabla 17: Informes mensuales contrato de obra N° 478 Consorcio Gaviones 95

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
1	9 al 30 de agosto del 2022	El 14 de marzo del 2024, el Consorcio Gaviones 95 remite respuesta a interventoría a las observaciones realizadas por la interventoría, quien da respuesta a los informes mediante comunicado 186-1- 663 el 26 de mayo del 2025. Donde aprobación a los mismos por cuanto que se evidencia cumplen con los requerimientos mínimos del componente se aprueba los informes del 1 al 9 del 9 de agosto del 2022 al 22 de abril el 2023,
2	1 al 30 de septiembre del 2022	
3	1 al 31 de octubre del 2022	
4	1 al 30 de noviembre del 2022	
5	1 al 31 de diciembre del 2022	
6	1 al 31 de enero del 2023	
7	1 al 28 de febrero del 2023	
8	1 al 31 de marzo del 2023	
9	1 al 22 de abril de 2023	
10	5 de febrero al 28 de febrero del 2024	Pendiente aprobación, presenta observaciones por parte de interventoría mediante comunicado 186-1- 663 el 26 de mayo del 2025, el 26 de junio el profesional social hace entrega del informe con las observaciones subsanadas, el cual presenta nuevamente observaciones, a la fecha de cierre del presente informe el consorcio realizó entrega por correo electrónico, el 21 de julio 2025, la interventoría emite pre – aprobación por cuanto que se encuentra en documento sin firmas de los profesionales que aprueban y realizan el documento, 186-1-7967 el 7 de agosto de 2025.
11	1 al 31 de marzo del 2024	Pendiente aprobación presenta observaciones por parte de interventoría mediante comunicado 186-1- 663 el 26 de mayo del 2025, el 26 de junio el profesional social hace entrega del informe con las observaciones subsanadas, el cual presenta nuevamente observaciones, a la fecha de cierre del presente informe, el consorcio realizó entrega por correo electrónico el 21 de julio 2025, la interventoría emite pre – aprobación por cuanto que se encuentra en documento sin firmas de los profesionales que aprueban y realizan el documento, 186-1-7967 el 7 de agosto de 2025.

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
12	1 al 16 de abril del 2024	Pendiente aprobación, presenta observaciones por parte de interventoría a la fecha de cierre del presente informe el consorcio realizó entrega por correo electrónico, el 21 de julio 2025, la interventoría emite pre – aprobación por cuanto que se encuentra en documento sin firmas de los profesionales que aprueban y realizan el documento, 186-1-7967 el 7 de agosto de 2025.
13	1 al 30 de abril del 2025	Pendiente aprobación, a la fecha de cierre del presente informe el consorcio realizó entrega por correo electrónico, la interventoría realizo observaciones al informe V0 mediante comunicado 186-1-796 del 7 de agosto del año en curso. El consorcio el 20-08-2025 por correo electrónico hace entrega del informe V 1, La interventoría nuevamente realiza observaciones mediante *comunicado* 186-1-840, el 27 de agosto del 2025. Se encuentra pendiente entrega.
14	1 al 31 de mayo del 2025	El profesional social hace entrega del informe mensual social # 14 por correo electrónico el 16 de junio del año en curso, la interventoría emite respuesta y da observaciones mediante comunicado 186-1-718 el 24 de junio del 2025, a la fecha de cierre del presente informe no ha hecho entrega del mismo.
15	1 al 30 de junio del 2025	El profesional social realizó entrega del informe social por correo electrónico del 12 de agosto del 2025 "informe mensual social N° 15" V0, la interventoría realizo observaciones al documento mediante comunicado 186-1-821 el 22 de agosto del 2025, al cierre del presente informe se encuentra pendiente entrega.
16	1 al 31 de julio del 2025	El profesional social realizó entrega del informe social por correo electrónico del 7 de agosto del 2025 "informe mensual social N° 16" V0, la interventoría realizo observaciones al documento mediante comunicado 186-1-821 el 22 de agosto del 2025, al cierre del presente informe se encuentra pendiente entrega.
17	1 al 31 de agosto del 2025	Al cierre del presente informe el Consorcio no ha hecho entrega del documento.

Fuente: Propia

A7

- ***Comunicado* 186-1-840- 27 de agosto del 2025.**
- ***Comunicado* 186-1-821- 22 de agosto del 2025.**

6.2.4. Informes Semanales

Durante el desarrollo del presente informe el Consorcio Gaviones 95, el consorcio realizó entrega de los informes semanales, cumple con el requerimiento contractual.

Tabla 18. Trazabilidad informe semanales Consorcio Gaviones 95

N° SEMANA	PERÍODO
54	28 de junio al 3 de agosto del 2025
55	4 al 10 de agosto del 2025
56	11 al 17 de agosto del 2025
57	18 al 24 de agosto del 2025.
58	25 al 31 de agosto del 2025.

Fuente: Propia

Ver anexo técnico informes semanales

6.2.5. Comités de Seguimiento Integral

Durante el desarrollo del presente informe se realizan cuatro comités de seguimiento integral, los cuales relaciono a continuación.

Tabla 19: Comité integral de seguimientos Consorcio Gaviones 95

No COMITÉ	FECHAS
54	01/08/2025
55	08/08/2025
56	15/08/2025
57	22/08/2025
58	29/08/2025

Fuente: Propia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotos 12: **Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 54.**



Fotos 13: **Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 55.**



Fotos 14: **Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 56.**



Fotos 15: **Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 57**



Fotos 16: **Comité de seguimiento integral contrato 478 - 2022 No 58.**

6.2.6 Comités de Seguimiento social

Durante el desarrollo del presente informe no se realizan un comité de seguimiento social.

6.2.7 Correspondencia enviada y recibida.

Durante el desarrollo del presente el Consorcio Gaviones 95 no hace entrega de comunicados, la interventoría realizó entrega de comunicado, los cual se relaciona a continuación:

Tabla 20: Correspondencia recibida y enviada Contrato

Correspondencia recibida			Correspondencia enviada		
Consecutivo	**Asunto**	**Fecha**	**Consecutivo**	**Asunto**	**Fecha**
N/A	. N/A	N/A	186-1-794	Respuesta a al comunicado D40	07/08/2025
N/A	. N/A	N/A	186-1-793	Llamado de atención instalación pasacalles y vallas informativas móviles	07/08/2025
N/A	. N/A	N/A	186-1-895	Respuesta a comunicado D42-2025. 22 de julio del 2025.	07/08/2025
N/A	N/A	N/A	186-1-896	Respuesta a informes mensuales N° 10, 11, 12, entregados por correo electrónico el 21 de julio del 2025 y N° 13. entregados por correo electrónico 24 de julio	07/08/2025
N/A	. N/A	N/A	186-1-810	*Llamado de atención por cierre vial Laguna Verde.*	13/08/2025
N/A	. N/A	N/A	186-1-818	*Traslado de **FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS**. (Valla informativo móvil y pasacalles).*	21/08/2025

Consecutivo	Asunto	Fecha	Consecutivo	Asunto	Fecha
N/A	. N/A	N/A	186-1-821	*Respuesta a correo electrónico del 12 de agosto del 2025 "informe mensual social N° 15" Correo electrónico del 7 de agosto del 2025. "informe social N° 16". Consorcio Gaviones 95.*	22/08/2025
N/A	. N/A	N/A	186-1-839	*Presunto incumplimiento por la no instalación de Pasacalles y vallas informativas móviles informativos.*	27/08/2025
N/A	. N/A	N/A	186-1-838	*Respuesta a entrega de "actas de vecindad de San Antonio 1, Capitolio, Laguna Verde" Actas de compromiso de Tramo vial de Capitolio" Consorcio Gaviones 95.*	27/08/2025
N/A	. N/A	N/A	186-1- 840	Respuesta a correo electrónico del 20-08-2025 con asunto *"informe mensual social N° 13 V 1". Del Consorcio Gaviones 95.*	27/08/2025

Fuente: Propia

Ver A1, A2, A4,47

6.2.8 Estado del Contrato

Estado del contrato 478 del 20/05/2022: **Activo.**

7. CONTRATO DE OBRA No. 479 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL.

7.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El plan de gestión social se encuentra aprobado por la interventoría a continuación se presenta la trazabilidad a la aprobación al documento.

Tabla 21: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social Contrato No 479/20. Consorcio Estabilización Vial

FECHA	TRAZABILIDAD	APROBACIÓN
4 de mayo 2022. 1 de diciembre del 2024	La interventoría mediante comunicado 186-1-044 realiza aprobación. la interventoría solicita la actualización por cuanto que se encuentra enmarcadas con los lineamientos del modelo establecido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en las fichas PAGA (PLAN DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTAL); las cuales se adaptan al alcance y la misionalidad de la UAERMV, por tal motivo el documento debía ser actualizado con las fichas PAGA V4. El 1 de diciembre del 2023, el consorcio Estabilización vial hace entrega del Plan de gestión social V3, actualizado, mediante comunicado CEV/22-235. La interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-430, Donde la interventoría da aval al documento.	29 de diciembre de 2023.

Fuente: Propia

7.1.1 PERSONAL DEL COMPONENTE SOCIAL.

Tabla 22: Profesional social Contrato No 479/2022 Consorcio Estabilización Vial.

PROFESIONAL	CARGO	DEDICACIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Trabajadora Social Alejandra Limas P. aprobada por la interventoría el mediante comunicado 186-1-645 el 11 de abril del 2025.	Profesional Social	100 %	Acreditar Experiencia General mínimo Cinco (5) Años.	Profesional Social en al menos tres (3) contratos de obra pública.

Fuente: Propia

7.1.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Este programa establece la instalación por parte del Contratista de un sistema de atención al ciudadano, en el que se registren de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos como: peticiones, quejas, reclamos, denuncias sugerencias, felicitaciones, denuncias (PQRSFD), interpuestos por los ciudadanos de manera presencial, escrita, telefónicamente, correo electrónico y/o redes sociales.

7.1.2.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Los puntos de atención a la comunidad (PUNTO PAC) debe estar dotada de:

- Baño
- Línea telefónica exclusiva
- Cartelera informativa
- Computador con los programas necesarios
- Sillas y escritorio para la persona encargada de la atención.
- Espacio, sillas disponibles, chaquetas según el manual de identidad visual.
- Piezas de información, planos pertinentes para el proyecto, afiches y demás información pertinente para el proyecto.

Durante el periodo comprendido el Consorcio Estabilización vial, continúa con la instalación de un sistema de atención al ciudadano en el que se registren de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos peticiones, quejas, reclamos, denuncias sugerencias, felicitaciones, denuncias (PQRS), interpuestos por los ciudadanos por medio presencial, escrito, telefónico correo electrónico y/o redes sociales, el cual cuenta con los siguientes canales de comunicación.

Tabla 23. Información Punto atención a la comunidad Contrato No 479/2022 Consorcio Estabilización Vial

PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO CONTRATO DE OBRA No. 479 DE 2022	
Dirección	Vereda La Unión (pueblo) Cra 3 N.º 3- 43
Línea telefónica	3204461693
Correo electrónico	socialconsorcioev@gmail.com
Horario de atención	Miércoles de 7:30 a.m. a 12 del medio día.

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Fotos 17: **Punto de atención fijo a la comunidad CEV.**	***Fotos 18:*** **Punto de atención fijo a la comunidad CEV**

El contratista cuenta con puntos de atención de móvil a la comunidad, la carpa se ubicó en los tramos de obra activas (San Antonio El Toldo y Unión Tunales. Sin embargo, la profesional social hace recorridos por todo el tramo para recoger inquietudes de los residentes del área. Los horarios de atención móvil están designados de la siguiente manera:

- Unión Tunales: lunes de 9:00 am a 1:00 pm
- San Antonio El Toldo: martes de 9:00 am a 1:00 p.m.

La interventoría realiza recorridos con el fin de verificar el buen funcionamiento y cumplimiento en la atención a la comunidad de los puntos móviles, en los tramos viales activos.

Durante el periodo del presente informe, el consorcio, no se presentan PQRS.

7.1.2.2 Recorridos

El contrista está en la obligación de realizar recorridos, con el fin de verificar la atención con la comunidad, estableciendo puntos móviles, permitiendo canalizar de forma personalizada las manifestaciones de la comunidad, La interventoría realizará seguimiento y verificación en recorridos.

La interventoría durante el periodo comprendido realiza recorrido conjunto con el fin de verificar en campo las actividades del componente social ejecutadas.

Tabla 24: Recorrido Contrato No 479/2022, Consorcio Estabilización Vial.


ID	Fecha	Tramo	Observaciones	Registro fotográfico
1	1 de agosto del 2025 14 de agosto del 2025 28 de agosto del 2025	Frente de obra Unión Tunales y San Antonio El Toldo.	La interventoría realiza recorridos, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades del componente social.	 ***Fotos 19:*** **Recorrido Conjunto verificación de actividades y avance de obra.**  ***Fotos 20:*** **Recorrido Conjunto verificación de actividades del componente social.**

Fuente: Propia


Línea WhatsApp:


Durante este periodo, el contratista Consorcio Estabilización Vial cuenta con un grupo de WhatsApp que incluye personas de la comunidad en general, el cual es utilizado, para brindar información del contrato a la comunidad de forma instantánea, así mismo atender las solicitudes ciudadanas que se puedan presentar, durante el periodo comprendido el contratista hace entrega de información en el grupo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

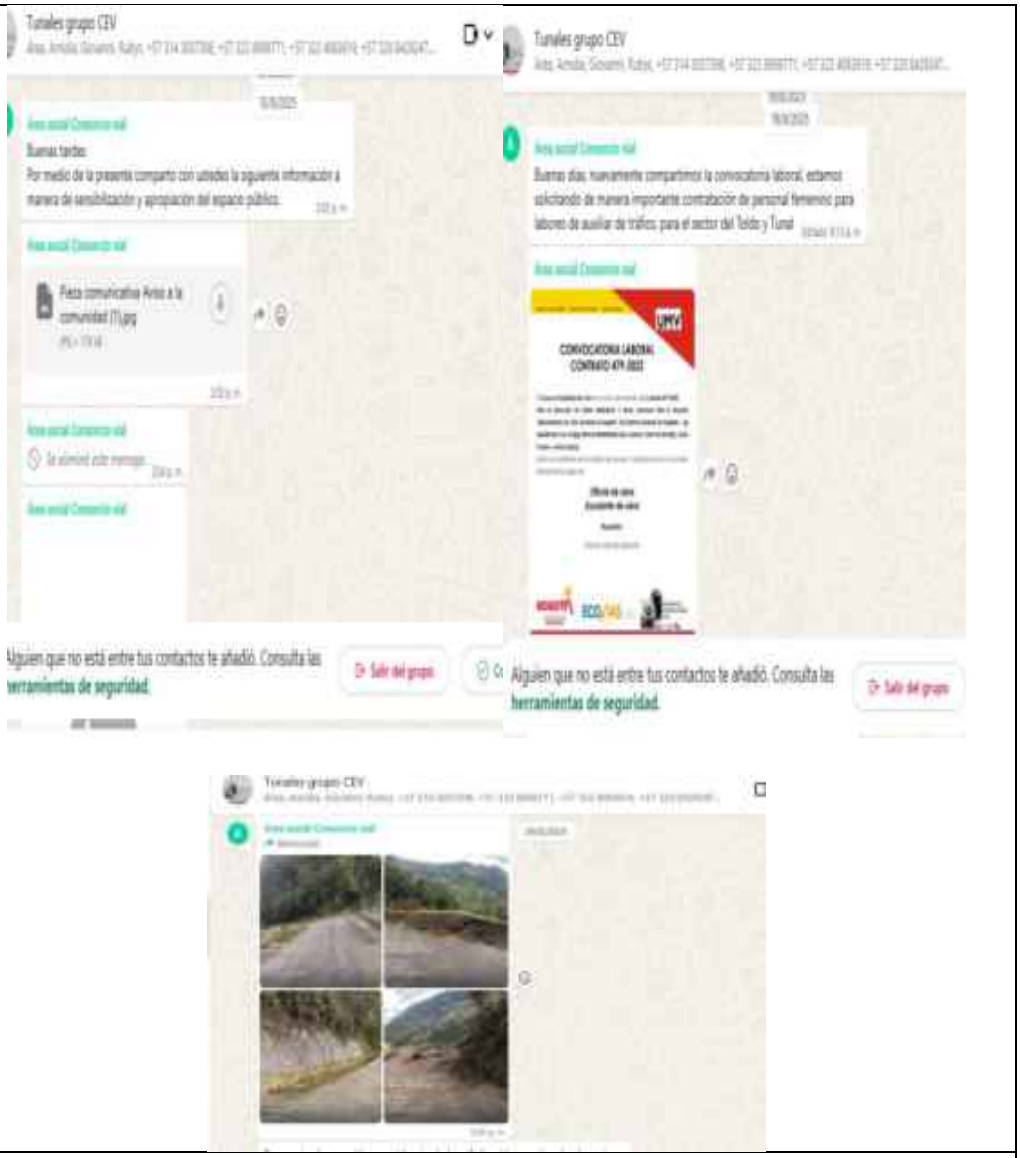

Unión Tunales

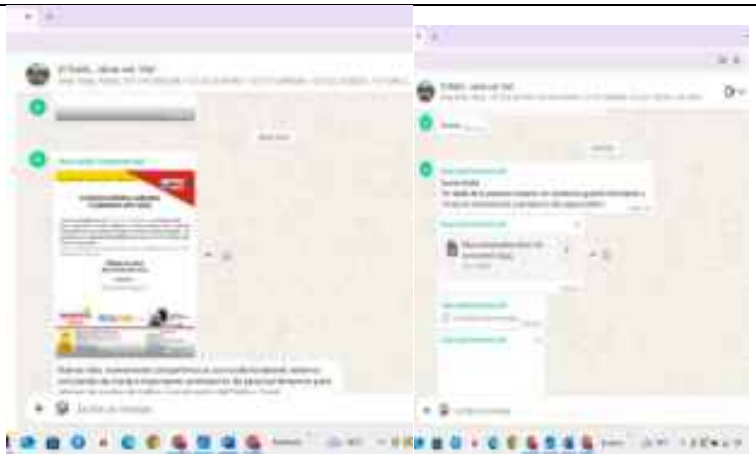

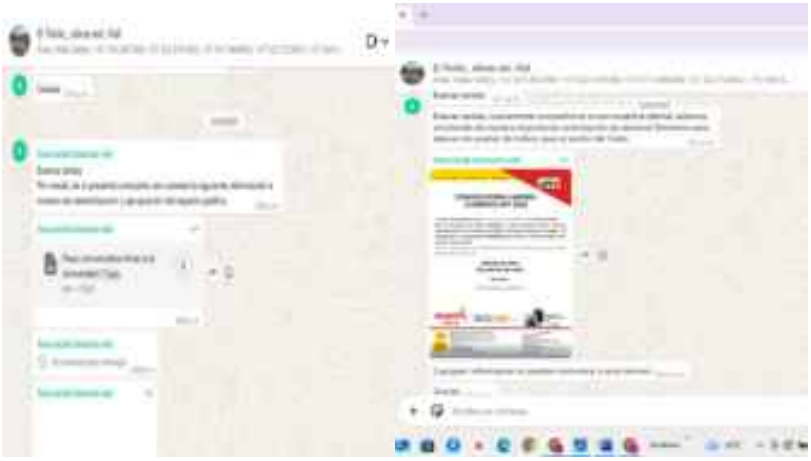



San Antonio El Toldo

Fotos 21: **Registros grupo de WhatsApp comunidad de San Antonio El Toldo y Unión Tunales.**

7.1.2.3 Mesa de trabajo

Durante el periodo comprendido no se realizan mesas de trabajo por no ser necesario.

Tabla 25: Indicadores de cumplimiento del Programa Atención al Usuario.

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO		
INDICADOR	**FORMULA**	**CUMPLIMIENTO**
PRODUCTIVIDAD	Línea telefónica solicitada/Línea telefónica implementada N° X 100 = N°	**100 %**
PRODUCTIVIDAD	Correo electrónico solicitado / Correo electrónico implementado N° X 100 = N°	**100 %**
PRODUCTIVIDAD	Formato de control de atenciones diligenciado/Formato de atenciones recibidas N° x 100 = N°	**NA**
PRODUCTIVIDAD	Recorridos /Realizados 4 X100 = 4	**100 %**
PRODUCTIVIDAD	Total, de equipamiento básico instalado / total de equipamiento básico requerido 1 x 100 = 1	**100 %**
ANALISIS DE LOS INDICADORES	EL Consorcio Estabilización Vial, del componente social realiza recorridos constantes con el fin de realizar acompañamiento al área técnica y atender de manera personalizada a la comunidad. Así mismo la interventoría y el Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz, realiza recorridos, con el fin de revisar los avances y cumplimientos de la ejecución del contrato. A la fecha de cierre del presente informe la interventoría evidencia en recorrido realizados que cuenta con el punto fijo el cual es adecuado para la atención de la comunidad y dos puntos móviles ubicados en el tramo vial de Unión Tunales y San Antonio el Toldo.	

Fuente: Propia

7.1.3 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO.

7.1.3.1 Procesos de sensibilización

Se establecerá dentro de las sensibilizaciones al personal vinculado al proyecto en todas las áreas sobre temas relacionados con las medidas de manejo ambiental y social del proyecto.

La sensibilización al personal vinculado al proyecto contiene los siguientes elementos:

- Descripción técnica del proyecto
- Presentación de las obligaciones de gestión social de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
- Objetivos, alcances y operaciones de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
- Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales (política general en temas laborales, recursos humanos, condiciones de trabajo y términos de empleo organizaciones laborales, no discriminación e igualdad de oportunidades, reducción y mecanismos de protección de la fuerza laboral, mecanismo de atención a quejas y reclamos).
- Seguridad vial en obra
- Normas de convivencia con las comunidades laborales sociales y bióticas enfatizando en las limitaciones al personal procedente de otros lugares para la extracción de fauna, flora y demás recursos de los pobladores vecinos del área.
- Mensualmente se realizarán charlas de refuerzo de los conceptos ya incluidos y se complementará con información sobre el avance de las obras, problemas surgidos durante las mismas y soluciones encontradas a modo de lecciones aprendidas. De igual forma se reforzará en estas charlas, aquellos temas que se hayan detectado como de alta sensibilidad para las comunidades y para los colaboradores del proyecto.

Durante el periodo comprendido el Consorcio realizo sensibilización con el personal que se encuentra contratado para el contrato.

Durante el desarrollo del presente informe el Consorcio Estabilización vial, realizó una sensibilización con el personal que se encuentra vinculado al proyecto el 27 de julio del 2025. A continuación, se presenta la trazabilidad.

Tabla 26. Consolidado acciones formación a empleados Consorcio Estabilización vial

Fecha registro	Tema	Descripción
27 /08/2025	Sensibilización al personal Precaución de la volqueta al descargar el material con el cableado eléctrico Charla ambienta: se recuerda nuevamente al personal de obra la importancia de tener conciencia ambiental y hacer una disposición adecuada de los residuos que se producen a durante la jornada laboral,	El componente social del Consorcio Estabilización vial, realizó sensibilizaciones a los trabajadores de obra y operarios en el frente de obra Unión Tunales y San Antonio El Toldo.

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotos 22: Sensibilización del personal de obra. CEV.



Fotos 23: Sensibilización de personal de obra. CEV.

Tabla 27. Indicadores de cumplimiento del Programa Educación y capacitación al personal vinculado al contrato. Consorcio Estabilización vial.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	1 sensibilizaciones realizadas x100 / 1 sensibilizaciones requeridas x 100	100%
	……trabajadores contratados/ **13**trabajadores sensibilizados *100	**%**
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Durante el periodo comprendido el Consorcio Estabilización Vial, realizó la sensibilización al personal de obra, se evidencia que el profesional sensibilizó a 13 trabajadores, la interventoría solicita que se bebe sensibilizar al 100 % del personal evidenciándolo en el informe del mes de octubre del año en curso.	

Fuente: Propia

7.1.4 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Para el siguiente programa, la interventoría adelantará labores de verificación, supervisión, acompañamiento a los diferentes momentos establecidos para el programa, con el propósito de garantizar el cumplimiento del mismo, desde el seguimiento a las siguientes actividades.

7.1.4.1 Reuniones participativas

La interventoría verificará que las reuniones se realicen de acuerdo a los parámetros, requisitos y generalidades propuestos por el contratista (CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL).

La Interventoría revisará y determinará la información a presentar en las reuniones, los formatos a aplicar, el lugar de la reunión, a tratar en las reuniones y el comité de participación ciudadana.

El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del Proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

El Contratista deberá convocar a la población del área de influencia directa del proyecto, Alcaldías Local, Organizaciones de comerciantes Administradores, Juntas de Acción Comunal – JAC, entre otras.

Dichas reuniones, por ser masivas y tratarse de personas de veredas distantes pero pertenecientes al mismo sector o tramo, se realizarán presencialmente serán convocados por el contratista.

7.1.4.1.1 Reunión de inicio

Cuando se realicen las reuniones de inicio de obra, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información se establecerá porcentaje de cumplimiento con le estipulado para las reuniones de inicio. El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

Durante el periodo comprendido el Consorcio Estabilización Vial no realiza reuniones de inicio por no ser necesario.

7.1.4.1.2. Reunión de avance

Cuando se realicen las reuniones de avance de obra cumpliendo con un 50%, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información se establecerá porcentaje de cumplimiento con le estipulado para las reuniones de avance. Estas reuniones tienen como fin informa sobre el estado de avance de las obras constructivas y cronograma de ejecución de las actividades faltantes, cuando se complete la ejecución del 50% de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales, informar la fecha de finalización de las obras, y responderá las inquietudes de los asistentes.

Durante el periodo comprendido el consorcio no realiza reuniones, por no ser necesario. No aplica.

7.1.4.1.3. Reunión de Finalización

Cuando se realicen las reuniones de finalización de obra cuando se complete el 95% de las labores constructivas, la Interventoría hará el respectivo reporte donde presentara los resultados de finalización, se hará el respectivo reporte consolidando la información se establecerá porcentaje de cumplimiento con le estipulado para las reuniones de finalización. Las reuniones de finalización tienen como fin presentar a la comunidad, las entidades encargadas del contrato, cuando se complete el 95% de la ejecución de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales, informa la fecha de finalización de obra, y responderá las inquietudes de los asistentes.

7.1.4.1.4. Reuniones Extraordinarias.

Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en los casos en que el desarrollo del contrato lo amerite, o que la comunidad, la Interventoría, la supervisión del Fondo de desarrollo Rural de Sumapaz lo solicitaron. Estas reuniones se llevaron a cabo con el fin de tratar asuntos no convencionales y que por su naturaleza o urgencia requerían un espacio para ser revisados.

La Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información se establecerá porcentaje de cumplimiento con le estipulado para las reuniones extraordinarias.

Durante el desarrollo del presente informe el Consorcio Estabilización vial realizó reuniones extraordinarias las cuales se relacionan a continuación:

- ✓ El 13 de agosto del año en curso, con el rector del Colegio Gimnasio Campestre Juan de la Cruz Valera, espacio en donde se trató la entrada del predio del señor Fernando Molina ubicado en diagonal a la sede educativa de Tunal bajo, dando su visto bueno para dejar la entrada de 13 metros aproximadamente, teniendo en cuenta que es un espacio de se utiliza de manera esporádica para el retorno o parqueo de las rutas escolares.

- ✓ El 25 de agosto del año en curso. El consorcio socializa con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Toldo y Tunal, la dificulta para la contratación de personal de la localidad, situación por la cual no se ha dado cumplimiento por parte del consorcio al porcentaje requerido en los pliegos del contrato.

- ✓ El 27 de agosto del año en curso. El consorcio socializo con el señor Fernando Molina el encuentro que se llevó a cabo con el rector del colegio Gimnasio Campestre Juan de la Cruz Valera para hablar acerca de los metros de la entrada al predio, y el aval que dio la interventoría y el acal que dio la interventoría a esta construcción.

- ✓ El 29 de agosto del año en curso la profesional social del Consorcio, realiza reunión con la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Toldo, para informarle acerca de la construcción de una alcantarilla en la abscisa K3+224, la cual queda colindando con el predio del señor Adelmo Flores a quien no fue posible contactar, por lo cual se requiere dejar este soporte de la gestión ante las directivas de la Junta de Acción Comunal.

- ✓ El 29 de agosto del año en curso, se socializa con la señora Nidia Hernández, la charla de sensibilización que se dio al personal de obra ante el uso inadecuado que le dieron a los potreros y el incidente el cual no se esclareció con el volcó de una volqueta y el cableado eléctrico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Fotos 24: **Reunión extraordinaria de Unión Tunales, San Antonio El Toldo.**

7.1.4.1.5. Reuniones Comité Veedor

La Interventoría verificará la inscripción, al comité veedor realizada, estas se realizarán mensualmente, se supervisará la asistencia y cumplimiento de la reunión, los temas a tratar y los compromisos establecidos en cada reunión.

Durante el periodo comprendido el consorcio no realiza reuniones, por no ser necesario. No aplica.

Tabla 28. Indicadores de cumplimiento del Programa de Información y participación Comunitaria.

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	
Reuniones de Inicio	**CUMPLIMIENTO**
# de reuniones de inicio programadas en el periodo # de reuniones de inicio ejecutadas en el periodo # x100 #	NA
Reuniones Extraordinarias	
5 de reuniones extraordinarias programadas en el periodo 5 de reuniones extraordinarias ejecutadas en el periodo 5 x100 5	100%
Reuniones de Finalización	
# de reuniones de finalización programadas en el periodo # de reuniones de finalización ejecutadas en el periodo 0 x100 0	NA
Reuniones Comité Veedor	
# de reuniones de comité veedor programadas en el periodo # de reuniones de comité veedor ejecutadas en el periodo 0 x100 0	NA
ANALISIS DE LOS INDICADORES	A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio Estabilización Vial, realiza cinco reuniones extraordinarias con la comunidad de los tramos viales de Unión Tunales y de San Antonio El Toldo.

Fuente: Propia

7.1.4.1.6. Valla Informativa móviles

Para la etapa de construcción del contrato se instará las vallas informativas la cual se encuentra ubicada en el frente de obra al inicio y finalizando el tramo.

En el periodo comprendido el Consorcio Estabilización Vial, realiza la instalación de dos (2) vallas móviles en Unión Tunales, en el inicio y final del tramo y en el tramo de San Antonio Toldo (2) en el inicio y final del tramo

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Fotos 25: **Instalación de valla informativa móvil Unión Tunales.**	***Fotos 26:*** **Instalación de valla móvil San Antonio El Toldo.**

7.1.4.1.7. Pasacalles

A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio cuenta con los tres pasacalles que estaban pendiente uno en el tramo de San Antonio El Toldo y dos en Tunales Bajo y Tunales Alto.

Durante el periodo comprendido la interventoría evidencia que se encuentran los pasacalles establecidos contractualmente en buenos condiciones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Fotos 27: **Instalación pasacalle Unión Tunales.**	***Fotos 28:*** **Instalación pasacalle de San Antonio El Toldo.**

Tabla 29. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	4 de vallas informativas instaladas x100 / 4 vallas informativas solicitadas.	100 %
	3 pasacalle instalados X 100/ 3 pasacalles solicitados.	100 %
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Consorcio Estabilización Vial, realiza la instalación de las vallas informativas móviles, cumpliendo con un 100% por cuanto que el tramo de San Antonio El Todo se encuentran completas. En cuanto a los pasacalles el Consorcio realiza reposición cuando se pierdan o deterioren. Solicitud realizada por interventoría en comités de seguimiento integral a la fecha de cierre del presente informe el consorcio realiza reposición.	

Fuente: Propia

7.1.4.1.8 Volante de información de actividades

Estas piezas de divulgación que incluyen información sobre la fecha de actividades de obra relevante como programación de cierres viales él debe incluir el número de la línea de atención a la ciudadanía y otros aspectos y características específicas que el Contratista, la Interventoría y el Fondo de Desarrollo rural del Sumapaz. Consideren pertinentes y relevantes.

7.1.4.1.9 Volantes informativos y/o convocatorias.

Los volantes se entregarán a la comunidad con información sobre contingencias, convocatorias e información de interés del proyecto, es decir, ante situaciones no previstas que afecten la cotidianidad de la población, se deberá informar inmediatamente a la población que resulte afectada.

Durante el periodo comprendido el Consorcio Estabilización no realizó entrega de volantes físicos, por no ser necesario.

En el grupo de la comunidad la profesional social del consorcio sube el volante de convocatoria laboral, con el fin de informar a la comunidad que se encuentran abierta la convocatoria de mano de obra no calificada. Es de aclarar que esta pieza informativa ya contaba con el aval de la interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotos 29: **Volante informativo Convocatoria Laboral.**

Tabla 30. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria volantes

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	2 volantes entregados/ 2 volantes requeridos X100 =	100%
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Consorcio Estabilización vial, realiza diseño y entrega de volante informativo de convocatoria laboral con el fin de convocar a el personal de la comunidad para trabajar como mano de obra no calificada en el proyecto, son revisados y aprobados por la interventoría y el Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz.	

Fuente: Propia

7.1.4.1.10 Afiche informativo.

Son piezas de divulgación mediante las cuales se describen generalidades de la obra y datos de contacto del Contratista. Estos deben ser instalados en el Punto fijo de atención a la comunidad y en los Puntos fijos Información y se realizará su reemplazo cuando se encuentren deteriorados, contado con el aval de la interventoría.

A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio de Estabilización Vial, realiza instalación de 4 afiche informativo en el punto fijo de atención a la comunidad, puntos de atención móvil y puntos satélites informativos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotos 30: **Diseño afiche informativo.**

7.1.4.1.11 Puntos fijos informativos. (Puntos satélites)

Para efectos del presente contrato, el ejecutor, instalará los puntos de información, propuestos en el plan de gestión social, la interventoría realizará seguimiento en su instalación, estos permitirán una amplia divulgación de la información del contrato.

A la fecha del presente informe el componente social del Consorcio Estabilización vial realizo la instalación de 4 puntos satélites en:

Tabla 31. Instalación Puntos informativos fijos Consorcio Estabilización Vial

Fecha	Frente de obra	Sitios de instalación	Descripción de la actividad
Frete Unión Tunales			
19/08/2025	Unión Tunales	Casa de la señora Anidia Runza presidenta de junta de acción comunal	100%
		Casa de la señora Diana Palacios.	100%
Frente de obra San Antonio El Toldo			
19/08/2025	San Antonio El Toldo	Predios del señor Luis Bustos.	100%
		Escuela Juan de la cruz Varela (sede de k)	100%
TOTAL 4			

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotos 31: **Punto satélite informativo Unión Tunales.**

Tabla 32. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	4 afiches informativos instalados X 100/ 4 afiches fijos solicitados x100	100%
	4 puntos informativos fijos (puntos satélites) instalados x100/ 4 puntos fijos informativos (puntos satélites) solicitados x 100 =	100%
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Consorcio Estabilización vial, instala los afiches y puntos satélites informativo cumpliendo con lo establecido contractualmente en el plan de gestión social.	

Fuente: Propia

7.1.4.1.11. Actas de vecindad

El acta de vecindad es un documento que se elabora por medio de una visita domiciliaria a cada uno de los predios que se encuentran en el área de influencia directa de la obra. El objetivo de esta actividad es establecer las condiciones físicas iniciales de los predios a fin de determinar variaciones en las mismas derivadas de la ejecución del proyecto.

Durante el periodo comprendido el contratista no realiza actas de vecindad de apertura por no ser necesario.

Tabla 33: Consolidado total actas de vecindad de apertura realizadas

TRAMO VIAL	ACTA DE VECINDAD DE APERTURA TOTAL	ENTREGA Y APROBACIÓN
San Antonio El Toldo	13	CEV/22-392 del 7 de mayo del 2025 186-1- 675 del 28 de mayo del 2025
Unión Tunales	14	CEV/22-409 del 5 de junio del 2025 186-1- 717 del 24 de junio del 2025
TOTAL ACTAS DE VECINDAD DE APERTURA 27		

Fuente: Propia

7.1.4.1.12. Acta de compromiso

Las actas de compromiso es un documento que se elabora en caso de ser necesario hacer algún compromiso o acuerdo con la comunidad, institución o comerciante, con el fin de realizar alguna actividad de obra que repercuta con la comunidad, el contratista levantará el acta de compromiso.

La Interventoría realizará el seguimiento del cumplimiento de los compromisos pactados en las actas de compromiso y se notificará en el informe correspondiente. Se firma el acta por el componente social y técnico, cuando se le cumpla al propietario con los compromisos registrados en el acta.

Durante el periodo comprendido el Consorcio realizó acta de compromiso, la cual se describen a continuación:

Tabla 34: Consolidado de actas de compromiso tramo vial San Antonio El Toldo y tramo vial Unión Tunales

Fecha registro	Dirección	Propietarios y/o encargado	Descripción
20/08/2025	Vereda San Antonio El Toldo	Ángel Albeiro Delgado	 Entrada predio.
20/08/2025	Vereda San Antonio El Toldo	John Fidel Castro	 Entrada predio.
28/08/2025	Vereda de Unión Tunales	Fernando Molina	 Entrada predio.

Fecha registro	Dirección	Propietarios y/o encargado	*Descripción*
27/08/2025	Vereda San Antonio El Toldo	Bernardo Peñaloza	 Estabilización del Talud adecuación del cercado de la alcantarilla
28/08/2025	Vereda Unión Tunales	Daniel mora	 Entrada al predio
29/08/2025	Vereda de San Antonio El Toldo	Marco Moreno	 Permiso construcción alcantarilla

Fecha registro	Dirección	Propietarios y/o encargado	*Descripción*
29/08/2025	Vereda de Unión Tunales	Adelmo Flores	  Permiso construcción alcantarilla
Total, actas de compromiso del periodo: 7			

Fuente: Propia

7.1.4.1.13 Acta de gestión adelantada

Las actas de gestión adelantada tienen como fin, abordar las inquietudes y resolver las dudas planteadas por la comunidad y brindar una respuesta clara a las preguntas planteadas.

La Interventoría realizará el seguimiento del cumplimiento a los compresos pactados y se notificará en el informe correspondiente. Se firma el acta por el componente social y técnico, cuando se le cumpla al propietario con los compromisos registrados en el acta.

Durante el periodo comprendido el Consorcio Estabilización Vial no ha realizado actas de gestión adelantada, por no ser necesario.

7.1.4.14. Ejercicio de Control Social

Durante el periodo comprendido del presente informe la Unidad de Mantenimiento Vial no realiza reuniones de control social, por no ser necesario.

Tabla 35. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# actas de vecindad de apertura realizadas / # actas de vecindad de apertura requeridas x 100	NA
	7 acta de compromiso realizadas x100 / 7 acta de compromiso requeridas x 100	100%
	# actas de gestión adelantada realizadas x100 / # actas de gestión adelantada requeridas x 100	NA
	# ejercicio de control social realizadas x100 / # ejercicio de control social requeridas x 100	NA
ANALISIS DE LOS INDICADORES	El Consorcio cumple con la implementación de las actividades establecidas en el programa de información y participación comunitaria, de acuerdo a lo establecido contractualmente en el plan de gestión social.	

Fuente: Propia

7.1.5. PROGRAMA DE CULTURA VIAL

Este Programa tiene como fin generar nuevas actitudes de responsabilidad en relación con el manejo de la infraestructura vial y su entorno por parte de la población vecina u usuaria. Las sensibilizaciones de sostenibilidad y cuidados de las vías se realizarán al finalizar las intervenciones, con el fin de apropiar a la comunidad del cuidado y conservación de las vías a lo largo del tiempo. Por lo anterior, se darán a conocer las recomendaciones que la comunidad debe tener en cuenta para conservar las vías intervenidas permitiendo que sean sostenibles.

Las sensibilizaciones quedaran soportadas por un acta, lista de asistencia y registro fotográfico y se realizará una vez se termine el proceso constructivo.

Durante el periodo comprendido el Consorcio no realiza sensibilización de sostenibilidad por no ser necesario, este programa se desarrolla al finalizar las obras.

7.1.6. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA

Este programa busca generar oportunidades laborales a las comunidades donde se ejecute el proyecto, contratando a un porcentaje de la población de mano de obra no calificada, Vulnerable y mujeres esta última regida por el decreto 332/2020, donde indica que para el mes de junio del 2023 para proyecto de construcción se contrate un 13.8%, que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas. Esto facilitará que haya una mayor apropiación del trabajo realizado y se evitarán conflictos con la comunidad.

Este programa busca generar oportunidades laborales a las comunidades donde se ejecute el proyecto, contratando a un porcentaje de la población de mano de obra no calificada, Vulnerable y mujeres esta última regida por el decreto 332/2020, donde indica que para el mes de junio del 2023 para proyecto de construcción se contrate un 13.8%, que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas. Esto facilitará que haya una mayor apropiación del trabajo realizado y se evitarán conflictos con la comunidad.

7.1.6.1 Mano de obra no calificada contratación población vulnerable

La contratación de población vulnerable, la interventoría verificará el cumplimiento en la contratación de población vulnerable contratado. Dado lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a la contratación de personal en situación de vulnerabilidad, establecido contractualmente en el Decreto 380 del 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. “Por ***el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones”.***

7.1.6.2 Mano de obra no calificada de la localidad

Contratación de mano de obra no calificada, la interventoría verificará el cumplimiento del 75% del personal no calificado de la localidad del Sumapaz beneficiada por la ejecución de las obras. De acuerdo a lo enunciado en el anexo técnico que a la letra dice “Teniendo en cuenta la base de datos suministrada por el Fondo de Desarrollo Local del Sumapaz (FDLS) se indicó que, aproximadamente el 75% de la mano de obra no calificada está disponible para la vinculación al proyecto. Por cuanto se hace necesario vincular al personal de mano de obra local según el porcentaje descrito, lo cual sugiere disponer de personal foráneo en un 25% aproximadamente”.

7.1.6.3 Contratación de mujeres.

De acuerdo al Decreto Distrital 332 de 2020, "**VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO.** Sin perjuicio de la autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y organismos distritales, el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, según corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales de los procesos de selección pública y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales.

La vinculación de mujeres será diferenciada por rama, así:

Ramas de actividad económica	Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contratos		
	A partir del 1 º de junio de 2021	A partir del 1º de junio de 2022	A partir del 1 º de junio de 2023 en adelante
Construcción	6,8%	9,3%	13,8%

7.1.6.4 Contratación de trabajadores en condición de discapacidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal con discapacidad: "Que el numeral 7 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 establece que el Gobierno Nacional debe implementar mediante decreto reglamentario un sistema de preferencias aplicables a los procesos de adjudicación y celebración de contratos de organismos estatales para quienes vinculen laboralmente a personas con discapacidad debidamente certificadas, en un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores, lo que se encuentra reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, establecer un sistema de preferencias como factor de desempate para los proponentes que acrediten por lo menos el 10% de su nómina personas con discapacidad en el respectivo proceso de contratación".

7.1.6.5 Contratación de trabajadores en condición de vulnerabilidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad tales como:

-Madres cabeza de hogar

-Desplazados
-Estratos 0 y 1

Estas condiciones deben ser demostradas mediante certificado que le acredite como persona vulnerable, para ser tenidas en cuenta durante el proceso de selección.

Así mismo en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad".

Para el cierre del presente informe el componente social reporta un total de 61 trabajadores entre mano de obra calificada 28 y no calificada 33 de los cuales pertenece 11 trabajadores son de la localidad del Sumapaz. Es de aclarar que este personal reportado es comparado con el reporte que el contratista realiza al componente SST de interventoría reporte que están en revisión a la fecha de entrega del presente informe.

***Tabla 36. Consolidado personal consorcio* Estabilización Vial**

PERSONAL TOTAL	PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA	PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA	TOTAL, MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	TOTAL, MANO DE OBRA NO CLAIFICADA VULNERABLE	TOTAL, DE MUJERES CONTRATADAS
61	28	33	11	11	7
PORENTAJES		**PORCENTAJE % MONC**	**PORCENTAJE % MONCL**	**PORCENTAJE % VULNERABLE**	**PORCENTAJE % MUJERES**
		49,90 %	33,33 %	18,03 %	11, 47 %

Fuente: Propia

De acuerdo a los indicadores se evidencia que el consorcio no cumple con la contratación de mano de obra no calificada por cuanto que cuenta con un 33,33 % y de acuerdo con lo establecido contractualmente se debe contratar un 75 %, la interventoría en comité de seguimiento solicita se dé cumplimiento a lo establecido contractualmente y justifique por qué no se ha logrado cumplir con el porcentaje establecido, con los soportes respectivos.

7.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

El área social de la Interventoría realiza las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por el ejecutor y los contratistas en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico.

7.2.1 Listas de Chequeo del Contratista:

A la fecha de cierre del presente informe la interventoría realiza la lista de chequeo donde evalúa la gestión realizada en el componente social basados en cada programa que establece las fichas PAGA. Con una calificación del 96 %

A 8

- ***Lista de chequeo mes de agosto Consorcio Estabilización vial.***

7.2.2 Revisión documental

Durante el periodo de este informe se realizó la consulta de los documentos legales:

- Contratos de Interventoría y Contratistas
- Anexo técnico
- Plan de Gestión Social
- Informes mensuales.
- Bitácora Social
- correspondencia

A 9

- ***Copia Bitácora Social Consorcio Estabilización Vial agosto.***

7.2.3 Informes Mensuales

En la siguiente tabla se registran los informes mensuales presentados, por el contratista, en el periodo comprendido el Consorcio Estabilización vial el cual se describe su trazabilidad.

Tabla 37. Informes mensuales contrato de obra no. 479 – del 10/02/2022 Consorcio Estabilización Vial.

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
1	Del 16 al 31 de julio del 2022	El 28 de noviembre del 2023, el consorcio Estabilización Vial remite respuesta a interventoría a las observaciones realizadas por la interventoría mediante comunicado CEV /22-232, la interventoría realiza nuevamente observaciones, las cuales son revisada en mesas de trabajo. Finalmente, el Consorcio hace entrega de los informes el 19 de diciembre del 2023 la interventoría realiza revisión, a los informes de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2022, y enero, febrero, marzo y abril de 2023 (informe del 1 al 10), la interventoría da aprobación a los mismos por cuanto
2	1 al 31 de agosto del 2022	
3	1 al 30 de septiembre del 2022	
4	1 al 31 de octubre del 2022	
5	1 al 30 de noviembre del 2022	
6	1 al 31 de diciembre del 2022	
7	1 al 31 de enero del 2023	que se evidencia cumplen con los requerimientos mínimos del componente, mediante oficio 186-1-431 del 29 de diciembre del 2023.
8	1 al 28 de febrero del 2023	
9	1 al 31 de marzo del 2023	
10	1 al 13 de abril de 2023	
11	10 al 31 de octubre del 2023	El 13 de diciembre del 2023, la interventoría da respuesta a la comunidad CEV/22-247 del 13 de diciembre de 2023, Informe 11 V1, donde realiza observaciones, mediante comunicado 186 -1- 406, el 14 de diciembre del año en curso el Consorcio Estabilización Vial da respuesta a las observaciones emitidas por la interventoría al informe 11 V1 mediante comunicado CEV /22-248, versión 2, la interventoría realiza observaciones nuevamente, las cuales son revisada en mesas de trabajo. Finalmente, el Consorcio hace entrega del informe mensual social 11 V3 el 19 de diciembre del 2023, por correo electrónico, la interventoría da aprobación al informe 11 V3, porque cumplen con los requerimientos mínimos del componente, mediante comunicado 186-1-431 del 29 de diciembre del 2023.
12	1 al 30 de noviembre del 2023	EL 14 de diciembre del 2023, la interventoría solicita la radicación del informe 12 mes de noviembre mediante comunicado 186-1- 410, el 14 de diciembre el consorcio Estabilización Vial da respuesta y radicado el informe mensual del mes de noviembre V1, mediante comunicado CEV /22-250, la interventoría realiza observaciones nuevamente, las cuales son revisada en mesas de trabajo. Finalmente, el Consorcio hace entrega del informe mensual social 12 V2 el 19 de diciembre del 2023, por correo electrónico, la interventoría da aprobación al informe 11 V3, porque

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
		cumplen con los requerimientos mínimos del componente, mediante comunicado 186-1-431 del 29 de diciembre del 2023.
14	1 al 31 de enero del 2024	El 7 de febrero del año en curso, el Consorcio hace entrega del informe mensual del mes de enero, mediante comunicado CEV/22-289, la interventoría realizo observaciones mediante comunicado 186-1-478 e 13 de febrero / 2024, el consorcio subsana observaciones y hace entrega de informe 14 v3 con comunicado CEV 22-306 del 29 de febrero del 2024, la interventoría realiza observaciones nuevamente y envía al Consorcio mediante comunicado 186-1- 531 el 20 de marzo del 2024. El 19 de mayo del 2025, el consorcio Estabilización Vial realiza entrega del informe por correo electrónico, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1- 673, el 28 de mayo del 2025. El 5 de junio del 2025 el consorcio hace entrega del informe mensual social 14 por correo electrónico, la interventoría hace entrega de observaciones nuevamente, mediante comunicado 186-1-711 el 18 de junio del 2025. Se encuentra pendiente respuesta, el consorcio da respuesta por medio del comunicado CEV/22-434, respuesta al Informe del componente Social No.14 V-5. El 28 de julio del 2025, la interventoría da aval, por que cumple con los requerimientos establecidos, mediante comunicado 186-1-768
15	1 al 29 de febrero del 2024	El 11 de marzo del año en curso, el Consorcio hace entrega del informe mensual del mes de febrero, mediante comunicado CEV/22-312, la interventoría realiza observaciones e informa al Consorcio mediante comunicado 186-1- 532 el 20 de marzo del 2024, se encuentra pendiente la subsanación de las observaciones El 19 de mayo del 2025, el consorcio Estabilización Vial realiza entrega del informe por correo electrónico, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1- 673, el 28 de mayo del 2025. El 5 de junio del 2025 el consorcio hace entrega del informe mensual social 15 por correo electrónico, la interventoría hace entrega de observaciones nuevamente, mediante comunicado 186-1-711 el 18 de junio del 2025, el consorcio da respuesta por medio del comunicado CEV/22-434, respuesta al Informe del componente Social No.15 V-5. El 28 de julio del 2025, la interventoría da aval, por que cumple con los requerimientos establecidos mediante comunicado 186-1-768.
16	1 al 31 de marzo del 2024	El 11 de abril del año en curso, el Consorcio hace entrega del informe mensual del mes de marzo, mediante comunicado CEV/22-332, la interventoría realiza observaciones por medio del comunicado el 24 de abril del 2024, 186-1-575 Respuesta a oficio CEV/22- 332 del 11 de abril del 2024, Entrega informe mensual social N° 16 V1. El 19 de mayo del 2025, el consorcio Estabilización Vial realiza entrega del informe por correo electrónico, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1- 673, el 28

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
		de mayo del 2025. El 5 de junio del 2025 el consorcio hace entrega del informe mensual social 16 por correo electrónico, la interventoría hace entrega de observaciones nuevamente, mediante comunicado 186-1-711 el 18 de junio del 2025, el consorcio da respuesta por medio del comunicado CEV/22-434, respuesta al Informe del componente Social No.16 V-4. El 28 de julio del 2025, la interventoría da aval, por que cumple con los requerimientos establecidos. mediante comunicado 186-1-768.
17	1 al 16 de abril del 2024	El 19 de mayo del 2025, el consorcio Estabilización Vial realiza entrega del informe por correo electrónico, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1- 673, el 28 de mayo del 2025. El 5 de junio del 2025 el consorcio hace entrega del informe mensual social 17 por correo electrónico, la interventoría hace entrega de observaciones nuevamente, mediante comunicado 186-1-711 el 18 de junio del 2025, el consorcio da respuesta por medio del comunicado CEV/22-434, respuesta al Informe del componente Social No.17 V-2. El 28 de julio del 2025, la interventoría da aval, por que cumple con los requerimientos establecidos. mediante comunicado 186-1-768.
18	1 al 30 de abril del 2025	El 5 de mayo del 2025, el consorcio hace entrega del informe mensual, mediante comunicado CEV/22-388, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1- 653, el 7 de mayo del año en curso, El 15 de mayo del año en curso el consorcio hace entrega del informe mediante comunicado CEV/22-400, el 29 de mayo del 2025, la interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-682 y emite que se subsanaron. El 28 de julio del año en curso con el comunicado
19	1 al 31 de mayo del 2025	El Consorcio hace entrega del informe mensual social mediante comunicado CEV/22- 408 el 5 de junio del 2025 V0, la interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-710 el 18 de junio del 2025, el consorcio da respuesta mediante comunicado CEV/22-431 el 9 de julio del 2025 informe 19 V2, la interventoría da aval, por que cumple con los requerimientos establecidos. mediante comunicado 186-1-771, el 28 de julio del 2025 - 186-1-769.
20	1 al 30 de junio del 2025	El Consorcio hace entrega del informe mensual social mediante comunicado CEV/22- 427 el 7 de julio del 2025 V1, la interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-770 el 28 de julio del 2025, presenta observaciones, el consorcio Estabilización vial hace entrega de las observaciones mediante comunicado CEV/22-460 el 21 de agosto del 2025, A la fecha de cierre del presente informe se encuentra en revisión par parte de interventoría.

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
21	1 al 31 de julio del 2025	El Consorcio hace entrega del informe mensual social mediante comunicado CEV/22- 454 el 5 de agosto del 2025 V1 la interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-811 el 13 de agosto del 2025, presenta observaciones, el consorcio Estabilización vial hace entrega de las observaciones mediante comunicado CEV/22-462 el 26 de agosto del 2025. A la fecha de cierre del presente informe se encuentra en revisión par parte de interventoría.
22	1 al 31 de agosto del 2025	A la fecha de cierre del presente informe se encuentra pendiente la entrega por parte del Consorcio Gaviones 95.

Fuente: Propia

A 10

- ***comunicado CEV/22-454***
- ***comunicado CEV/22-460***
- ***comunicado CEV/22-462***
- ***Comunicado 186-1-811***

7.2.4. Informes Semanales

En la siguiente tabla se registran los informes semanales presentados por la interventoría.

Tabla 38. Trazabilidad informe semanales Consorcio Estabilización Vial

N° SEMANA	PERÍODO
75	28 de julio al 3 de agosto del 2025
76	4 al 10 de agosto del 2025
77	11 al 17 de agosto del 2025
78	18 al 24 de agosto del 2025
79	25 al 31 de agosto del 2025

Fuente: Propia

Ver anexo técnico informes semanales.

7.2.5. Comités de Seguimiento Integral

Durante el desarrollo del presente informe se realizan cuatro comités de seguimiento integral, los cuales relaciono a continuación.

Tabla 39. Comité integral de seguimientos Consorcio Estabilización Vial

No COMITÉ	FECHAS
76	1/08/2025
77	8/08/2025
78	15/08/2025
79	22/08/2025
80	28/08/2025

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Fotos 32: Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 76.	***Fotos 33:*** **Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 77** .



Fotos 34: **Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 78.**



Fotos 35: **Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 79.**



Fotos 36: **Comité de seguimiento integral contrato 479 - 2022 No 80**

Ver anexo técnico informes semanales.

7.2.6 Comités de Seguimiento social y mesas de trabajo

Durante el desarrollo del presente informe no se realizan mesas de trabajo por no ser necesario.

7.2.7 Correspondencia enviada y recibida.

Correspondencia enviada y recibida.

Durante el desarrollo del presente informe se genera correspondencia la cual se relaciona a continuación:

Tabla 40: Correspondencia recibida y enviada Contrato

Correspondencia recibida			**Correspondencia enviada**		
Consecutivo	**Asunto**	**Fecha**	**Consecutivo**	**Asunto**	**Fecha**
CEV/22- 460	Respuesta oficio 186-1-770 Informe social No 20 V1	21/08/2025	**NA**	NA	NA
CEV/22-462	Respuesta oficio 186-1-770 Informe social No 21 V2	26/08/2025	**NA**	NA	NA
Consecutivo	**Asunto**	**Fecha**	**Consecutivo**	**Asunto**	**Fecha**
CEV/22-4	Entrega informe 21 V1	5/08/2025	**NA**	NA	NA
			186-1- 811	Respuesta a comunicado CEV/22-454 Informe del componente Social No.21 V-1. del 5 de agosto del 2025.	13/08/2025

Ver A10

7.2.8 Estado del Contrato

Estado del contrato 479 del 20/05/2022: **ACTIVO.**

8. CONTRATO DE SERVCIO - 480 – DEL 22/02/2022 SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S

8.1. Actividades de Gestión Social

No aplica, dado que es un contrato de prestación de servicios.

8.2. Estado del Contrato

Estado del contrato 480 del 10/02/2022**: Finalizado tiempo contractual, sin recibo de los productos a satisfacción.**

9. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS –SGT, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

9.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El documento se encuentra aprobado, para ser puesto en marcha durante la ejecución del contrato, a continuación, se presenta su trazabilidad.

Tabla 41: Trazabilidad aprobación Plan de Gestión Social UAERMV

FECHA	TRAZABILIDAD	APROBACIÓN
7 de noviembre del 2023	La entidad ejecutora realiza entrega del plan de gestión social mediante Radicado: **20231180117931** La interventoría realiza aprobación al documento mediante comunicado 186-1-374	16 de noviembre del 2025

Fuente: Propia

9.1.1 PROGRAMA DE SERVICIO AL USUARIO.

Este programa establece la instalación por parte de la entidad ejecutora de un sistema de atención al ciudadano, en el que se registren de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos como: peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias PQRS, interpuestos por los ciudadanos de manera presencial, escrita, telefónicamente, correo electrónico y/o redes sociales.

9.1.1.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Los puntos de atención a la comunidad (PUNTO PAU) debe estar dotada de:

- Baño

- Línea telefónica exclusiva
- Cartelera informativa
- Computador con los programas necesarios
- Sillas y escritorio para la persona encargada de la atención.
- Espacio, sillas disponibles, chaquetas según el manual de identidad visual.
- Piezas de información, planos pertinentes para el proyecto, afiches y demás información pertinente para el proyecto.

Durante el periodo objeto de este informe, la entidad ejecutora, continua con una línea de atención con correo electrónico los cuales relaciono a continuación.

Tabla 42: Información Punto PAU móvil UAERMV

PUNTO PAC UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV	
Horario de Atención	Tramo **unión túnales** se realizará atenciones a la comunidad ubicada la carpa móvil, en el predio del señor Dick Clavijo, K 0 + 050 a partir de las 8:00 am hasta las 3:00 pm, todos los martes. Tramo **capitolio: carpa ubicada en el predio de** Adelmo Mora se realizará atención jueves 8:00 am hasta las 3:00 pm. Tramo **san Antonio 2** se realizará atención en el predio del señor Luis Bustos a la comunidad los miércoles de 8:00 am hasta las 3:00 pm.
Línea Telefónica	3243024943 - 3226836208
Correo electrónico:	infosgr@dnp.gov.co atencionalciudadano@umv.gov.co rubys.ruiz@umv.gov.co
Profesional Social	Rubys Ruiz

Fuente: Propia

La interventoría realiza recorrido y evidencia que se tiene instaladas carpas móviles, con el fin de realizar atención a la comunidad y canalizar todas las inquietudes que se puedan generar en los tramos viales en ejecución.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotos 37: **Verificación de interventoría punto de atención fijo, Frente Unión Tunales.**



Fotos 38: **Verificación del punto móvil atención al usuario. Frente de Capitolio.**



Fotos 39: **Verificación del punto móvil atención al usuario. Frente de San Antonio El Toldo.**

9.1.1.2 Recorridos

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora está en la necesita realizar recorridos, con el fin de realizar atención personalizada a la comunidad estableciendo

puntos móviles. De igual manera hacen acompañamiento a las actividades técnicas de la obra.

Así mismo la interventoría realiza recorridos en los tramos activos, con el fin de verificar las actividades del componente social y los compromisos adquiridos.

A continuación, se presenta la trazabilidad de los recorridos realizados en el mes del presente informe.

Tabla 43. Recorrido entidad ejecutora Unidad Administrativa especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV – Interventoría – Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz.


ID	Fecha	Tramo	Observaciones	Registro fotográfico
1	1 de agosto del 2025 14 de julio del 2025 28 de agosto del 20205	Frente de obra Unión Tunales, Capitolio, San Antonio El Toldo.	La interventoría realiza recorridos conjunto con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades del componente social.	  ***Fotos 40:*** **Recorrido conjunto**

Fuente: Propia

- ✓ **Línea WhatsApp:**

Durante este periodo la entidad ejecutora, mantiene activos las cuentas del grupo de WhatsApp de los tres frentes de obra **(**Unión tunales, Capitolio, San Antonio El Toldo) que incluye personas de la comunidad en general, el cual es utilizado, para brindar información del contrato a la comunidad de forma instantánea, así mismo atender las solicitudes ciudadanas que se puedan presentar.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

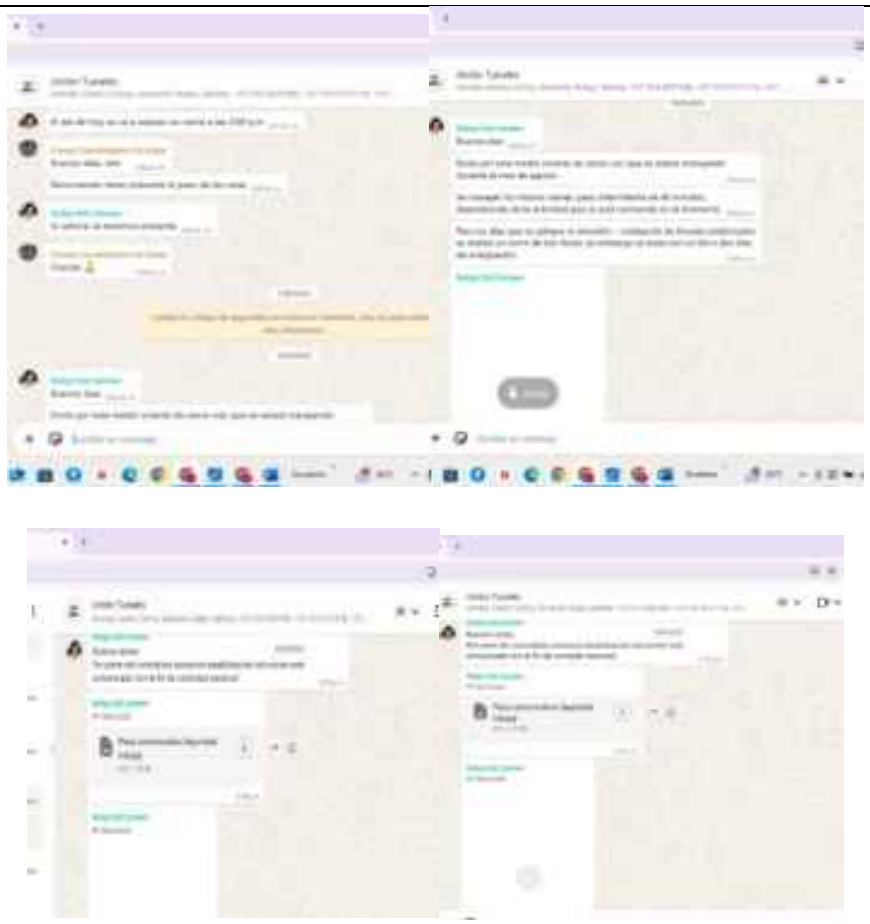




Frente de obra de Unión Tunales







Frente de obra San Antonio El Toldo

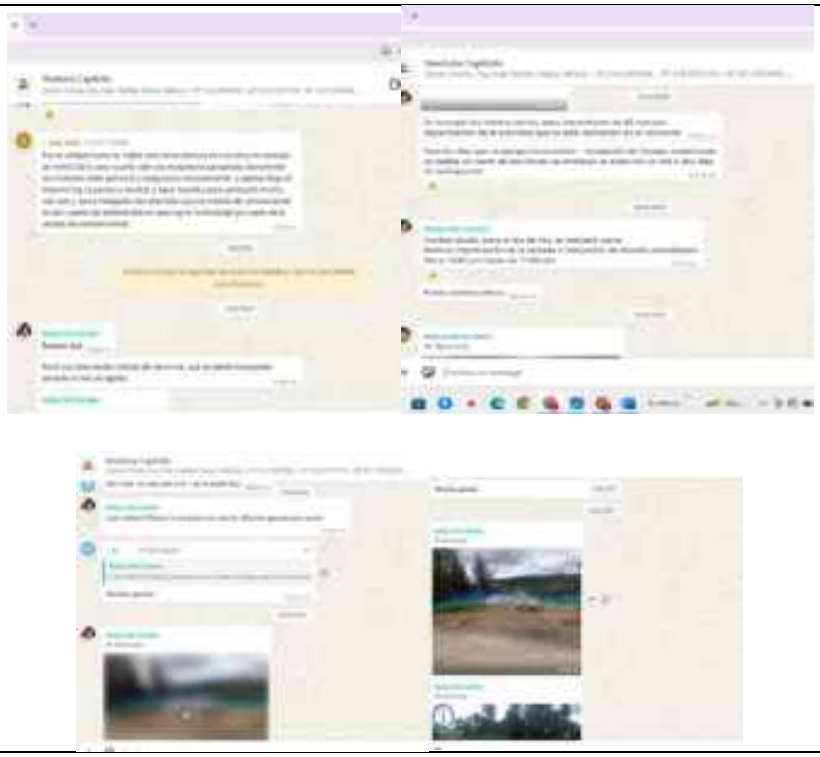

Capitolio

Fotos 41: **Pantallazo información a la comunidad en el grupo de WhatsApp en el frente de obra, Unión Tunales, Capitolios y San Antonio El Toldo.**

Tabla 44. Indicadores de cumplimiento del Programa Atención al Usuario

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO		
INDICADOR	**FORMULA**	**CUMPLIMIENTO**
PRODUCTIVIDAD	Línea telefónica solicitada/Línea telefónica implementada 1 X 100 = 1	**100 %**
PRODUCTIVIDAD	Correo electrónico solicitado / Correo electrónico implementado 1 X 100 = 1	**100 %**

PRODUCTIVIDAD	Formato de control de atenciones diligenciado/Formato de atenciones recibidas 1 x 100 = 1	**100%**
PRODUCTIVIDAD	Recorridos /Realizados 3 X100 = 3	**100%**
PRODUCTIVIDAD	Total, de equipamiento básico instalado / total de equipamiento básico requerido 3 x 100 = 3	**100%**
ANALISIS DE LOS INDICADORES	La UAERMV del componente social realiza recorridos constantes con el fin de realizar acompañamiento al área técnica y atender de manera personalizada a la comunidad. Así mismo la interventoría y el Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz, realiza recorridos, con el fin de revisar los avances y cumplimientos de la ejecución del contrato. En cuanto a la implementación del Punto de atención al usuario, A la fecha de cierre del presente informe la interventoría evidencia en recorrido realizados que cuenta con el punto móviles, el cual es adecuado para la atención de la comunidad, en el frente de Capitolio y San Antonio el Toldo cuentan con una carpa móvil, por cuanto la entidad no encuentra un lugar fijo, la interventoría verifica la información, para realizar atención con lo establecido contractualmente en las ficas PAGA. A la fecha no se presenta PQRSFD.	

Fuente: Propia

9.1.2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

9.1.2.1 Procesos Sensibilización

Se establecerá dentro de las sensibilizaciones al personal vinculado al proyecto en todas las áreas sobre temas relacionados con las medidas de manejo ambiental y social del proyecto.

La sensibilización al personal vinculado al proyecto contiene los siguientes elementos:

- Descripción técnica del proyecto

- Presentación de las obligaciones de gestión social de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

- Objetivos, alcances y operaciones de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

- Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales (política general en temas laborales, recursos humanos, condiciones de trabajo y términos de empleo organizaciones laborales, no discriminación e igualdad de oportunidades, reducción y mecanismos de protección de la fuerza laboral, mecanismo de atención a quejas y reclamos).

- Seguridad vial en obra

- Normas de convivencia con las comunidades laborales sociales y bióticas enfatizando en las limitaciones al personal procedente de otros lugares para la extracción de fauna, flora y demás recursos de los pobladores vecinos del área.

- Mensualmente se realizarán charlas de refuerzo de los conceptos ya incluidos y se complementará con información sobre el avance de las obras, problemas surgidos durante las mismas y soluciones encontradas a modo de lecciones aprendidas. De igual forma se reforzará en estas charlas, aquellos temas que se hayan detectado como de alta sensibilidad para las comunidades y para los colaboradores del proyecto.

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora realizó sensibilización al personal vinculado al proyecto, la información se verificó en los informes semanales reportados por el componente social.

Tabla 45. Consolidado acciones formación a empleados UAERMV

Fecha registro	Tema	Descripción
20, 21/08/2025	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL UAERMV	El componente social de la entidad ejecutora realizó sensibilizaciones a los trabajadores de obra y operarios en el frente de obra de San Antonio El Toldo, Capitolio, Unión Tunales.

Fuente: Propi

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Fotos 42: **Sensibilización al personal de obra de Capitolio**	***Fotos 43:*** **Sensibilización al personal de obra Unión Tunales.**

Tabla 46. Indicadores de cumplimiento del Programa Educación y capacitación al personal vinculado al contrato UAERMV

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	3 sensibilizaciones realizadas x100 / 3 sensibilizaciones requeridas x 100	100%

Fuente: Propia

9.1.3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Para el siguiente programa, la interventoría adelantará labores de verificación, supervisión, acompañamiento a los diferentes momentos establecidos para el programa, con el propósito de garantizar el cumplimiento del mismo, desde el seguimiento a las siguientes actividades.

9.1.3.1 Reuniones participativas

La interventoría verificará que las reuniones se realicen de acuerdo a los parámetros, requisitos y generalidades propuestos por la entidad ejecutora UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV.
La Interventoría revisará y determinará la información a presentar en las reuniones, los formatos a aplicar, el lugar de la reunión, a tratar en las reuniones y el comité veedor.

El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del Proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

La entidad ejecutora, deberá convocar a la población del área de influencia directa del proyecto, Alcaldías Rurales, Organizaciones de comerciantes Administradores, Juntas de Acción Comunal – JAC, entre otras.

Dichas reuniones, por ser masivas y tratarse de personas de veredas distantes pero pertenecientes al mismo sector o tramo, se realizarán presencialmente serán convocados por la entidad ejecutora.

9.1.3.1.1 Reuniones de inicio

Cuando se realicen las reuniones de inicio de obra, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información. El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, tráfico, duración, impactos y medidas de manejo previstas.
Durante el periodo comprendido no se realizan reuniones por no ser necesario.

9.1.3.1.2 Reunión de avance

Cuando se realicen las reuniones de avance de obra cumpliendo con un 50%, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información, asistencia, Esta reunión tiene como fin informa sobre el estado de avance de las obras constructivas y cronograma de ejecución de las actividades faltantes, cuando se complete la ejecución del 50% de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales, informar la fecha de finalización de las obras, y responderá las inquietudes de los asistentes.

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora no realiza reunión de avance por no ser necesario.

9.1.3.1.3 Reunión de Finalización

Se realiza reunión de finalización de obra cuando complete el 95% de las labores constructivas, la Interventoría hará el respectivo reporte donde presentara los resultados de finalización, consolidando la información, asistencia. Esta reunión tiene como fin presentar a la comunidad, los resultados obtenidos, cuando se complete el 95% de la ejecución de la obra verificando el cumplimiento de los compromisos contractuales, informa la fecha de finalización de obra, y responderá las inquietudes de los asistentes.

A la fecha de cierre del presente informe la entidad ejecutora no realiza reunión de finalización, por no ser necesario.

9.1.3.1.4 Reuniones Extraordinarias.

Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en los casos en que el desarrollo del contrato lo amerite, o que la comunidad, la Interventoría, la supervisión del Fondo de desarrollo Rural de Sumapaz lo solicite. Estas reuniones se llevaron a cabo con el fin de tratar asuntos no convencionales y que por su naturaleza o urgencia requerían un espacio para ser revisados. La Interventoría hará el respectivo reporte donde, consolida la información, asistencia.

Durante el desarrollo del presente informe la entidad ejecutora no realizó reuniones extraordinarias en los tramos viales activos por no ser necesario.

9.1.3.1.5 Reuniones comité veedor.

La Interventoría verificará la atención al comité veedor, los cuales son conformados por los mismos ciudadanos, ellos programan las reuniones que requieran. Las profesionales sociales UAERMV realizará acompañamiento a cada uno requerimientos del comité. La interventoría supervisará la asistencia y cumplimiento de la reunión, los temas a tratar y los compromisos establecidos en cada reunión.

Durante el periodo comprendido no se realizan reuniones con los comités de veeduría ciudadana de los frentes de obra activos, Unión Tunales y Capitolio.

Tabla 47. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	
Reuniones de Inicio	
# de reuniones de inicio programadas en el periodo / # de reuniones de inicio ejecutadas en el periodo = # x100 = NA / #	
Reuniones Extraordinarias	
# de reuniones extraordinarias programadas en el periodo / 1#de reuniones extraordinarias ejecutadas en el periodo = # X100 = 100% / #	
Reuniones de Finalización	
# de reuniones de finalización programadas en el periodo / # de reuniones de finalización ejecutadas en el periodo = # X100 = N/A / #	
Reuniones Comité Veedor	
1 de reuniones de comité veedor programadas en el periodo / 1 de reuniones de comité veedor ejecutadas en el periodo = # x 100 = N/A / #	
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar en el indicador la entidad ejecutora no realiza reunión con la comunidad, por no ser necesario.

Fuente: Propia

9.1.3.1.6. Valla Informativa Móvil

Para la etapa de construcción del contrato se instala las vallas informativas la cual se encuentra ubicada en el frente de obra.

En este periodo la interventoría realizo verificación a la instalación de la valla móvil establecida contractualmente en el documento PAGA, por cuanto que la entidad ejecutora se encuentra realizando labores técnicas, se evidencia cumplimiento en su ubicación, establecidos dos por cada frente de obra.

En recorrido realizado la interventoría evidencio que se encuentra las vallas móviles establecidas contractualmente. En San Antonio El Toldo y Tunal Alto y bajo, y Capitolio.

9.1.3.1.7 Pasacalles

La interventoría solicita que el Consorcio Gaviones 95 realice reposición de pasacalle faltante en el frente de obra Capitolio, por cuanto que de acuerdo al anexo técnico estable que: "El contratista deberá suministrar, instalar y mantener los pasacalles en el inicio/fin de cada tramo a intervenir según las dimensiones descritas en el PMT, previa aprobación por parte de la interventoría" y como ya la Unidad de mantenimiento vial realizó su instalación, el Consorcio realizarán reposición en caso de daño o perdida. A la fecha de cierre del presente informe el Consorcio no ha hecho la reposición del pasacalle en el tramo vial de la vereda Capitolio. Se encuentran al día en pasacalles de tramo vial Unión Tunales, San Antonio el Toldo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Fotos 44: Verificación valla informativa Unión Tunales.	**Fotos 45: Verificación valla informativa San Antonio el Toldo.**

	
Fotos 46: **Verificación instalación Pasacalles informativa Capitolio.**	***Fotos 47:*** **Verificación instalación Pasacalles informativa Unión Tunales.**

Tabla 48. indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria Frente Unión Tunales – Frente Capitolio – San Antonio El Toldo

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	6 de vallas informativas instaladas x100 / 6 vallas informativas solicitadas. 5 pasacalle instalados X 100/ **6** pasacalles solicitados.	100% 83.33 %
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar que la entidad ejecutora realiza la instalación de las vallas informativas cumpliendo con un 100% y pasacalles se cumple con un 83,33 % se encuentra pendiente la reposición de 1 pasacalles al consorcio Gaviones 96,	

Fuente: Propia

9.1.3.1.7. Volantes de Información de actividades

Estas piezas de divulgación que incluyen información sobre la fecha de actividades de obra relevante como programación de cierres viales él debe incluir el número de la línea de atención a la ciudadanía y otros aspectos y características específicas que el Contratista, la Interventoría y el Fondo de Desarrollo rural del Sumapaz. Consideren pertinentes y relevantes

- ✓ **Frente Unión Tunales, Capitolio y San Antonio El Toldo.**

La interventoría durante el periodo comprendido del presente informe, evaluó y revisó los volantes informativos, entregados por la entidad ejecutora, en ellos notifican los cierres a realizar, en el frente de obra de Capitolio y San Antonio El Toldo y Unión Tunales, con el fin de ser socializados a la comunidad.

A 11

- ***Correos electrónicos trazabilidad de solicitud y aprobación piezas divulgativas volantes y comunicados informativos. UAERMV.***

Tabla 49. Entrega de volantes informativos frente de obra Unión Tunales - Capitolio- San Antonio El Toldo

Fecha	Frente de obra	Descripción de la actividad	Total
14/08/2025	Unión Tunales	Cierres viales	4 volates en físico 1 virtual
12/08/2025	Santo DOMINGO Capitolio	Cierres viales	2 volates en físico 1 virtual
29/07/2025	San Antonio El Toldo	Cierres viales	2 volates en físico 1 virtual
Total, de volantes 11			

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotos 48: Volante informativo cierre vial, Tramo vial de Unión Tunales.

Tabla 50. Indicadores de cumplimiento del Programa información y participación Comunitaria

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	11 volantes entregados/ 11 volantes requeridos X100 =	100 %
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar la entidad ejecutora realiza entrega de volantes informativos de programación de cierres viales, manteniendo informada a la comunidad. Cumpliendo con un 100%	

Fuente: Propia

9.1.3.1.9. Afiche informativo.

Son piezas de divulgación mediante las cuales se describen generalidades de la obra y datos de contacto del Contratista. Estos deben ser instalados en el Punto fijo de atención a la comunidad y en los Puntos fijos Información y se realizará su reemplazo cuando se encuentren deteriorados, contado con el aval de la interventoría.

A la fecha de cierre del presente informe la Entidad Ejecutora realizó instalación de afiches informativos en los puntos informativos, distribuidos de la siguiente manera. Los cuales se relacionan a continuación.

Tabla 51. Consolidada instalación de afiches informativos UAERMV

FRENTE DE OBRA	PREDIO – PROPIETARIO	REGISTRO FOTOGRAFICO
UNIÓN TUNALES	ARNIDIA RUNZA	 ***Fotos 49:*** **Afiches informativo Unión Tunales.**
SAN ANTONIO EL TOLDO	**LUIS BUSTOS**	 ***Fotos 50:*** **Afiche informativo San Antonio.**

Fuente: Propia

9.1.3.1.10. Puntos informativos fijos

Para efectos del presente contrato, la entidad ejecutora, instalará puntos satélites de información, propuestos en el Plan de gestión social, la interventoría realizará

seguimiento en su instalación, estos permitirán una amplia divulgación de la información del contrato.

A la fecha del presente informe el componente social de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV). Implementa tres puntos satélites donde deja instalado afiche informativo, convocatoria a reunión de reinicio en los tramos de Unión Tunales, Capitolio y San Antonio, como se evidencia en la tabla ….

Tabla 52. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria Frente de obra Unión Tunales

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	3 afiches informativos instalados X 100/3 afiches fijos solicitados x100	100%
	3 puntos informativos fijos instalados x100/ 3 puntos fijos informativos solicitados x 100 =	100%

Fuente: Propia

9.1.3.1.11. Actas de vecindad

El acta de vecindad es un documento que se elabora por medio de una visita domiciliaria a cada uno de los predios que se encuentran en el área de influencia directa de la obra. El objetivo de esta actividad es establecer las condiciones físicas iniciales de los predios a fin de determinar variaciones en las mismas derivadas de la ejecución del proyecto.

- ✓ ***Frente Unión Tunales***

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV). hacer entrega de las actas de vecindad realizadas durante la etapa de construcción, las cuales son revisadas y aprobadas por la interventoría en el frente de obra de Unión Tunales, se evidencian 13 actas de vecindad, las cuales fueron relacionadas en el informe mensual 18, estas son revisadas y aprobadas por la interventoría. No aplica para el periodo comprendido.

- ✓ ***Frente Capitolio***

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV) hacer entrega de las actas de vecindad realizadas durante la etapa de construcción, las cuales son revisadas y aprobadas por la interventoría en el frente de obra Capitolio, se evidencian 18 actas de vecindad, las cuales son revisadas y aprobadas por la interventoría su reporte se refleja en el informe mensual social 20, estas son revisadas y aprobadas por la interventoría. No aplica para el periodo comprendido.

- ✓ ***Frente San Antonio El Toldo***

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV), realiza levantamiento de 10 actas de vecindad estas se encuentran todas firmadas por los propietarios y junta de acción de la comunidad, la interventoría realiza revisión y aprobación de las mismas. No aplica para el periodo comprendido.

- ✓ ***Frente San Antonio 1***

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV), realiza levantamiento de 9 actas de vecindad estas se encuentran todas 4 firmadas por los propietarios y 5 sin firmas por parte de los propietarios la interventoría realiza revisión y seguimiento para su terminación.

Durante el mes de Julio y julio del año en curso la Unidad de Mantenimiento vial realizó el levantamiento de 11 actas vecindad de apertura en el tramo vial san Antonio 1, con el fin de identificar el estado actual en el que se encuentran las propiedades.

Tabla 53: Consolidado total actas de vecindad de apertura realizadas

TRAMO VIAL	ACTA DE VECINDAD DE APERTURA TOTAL
San Antonio El Toldo	10
Unión Tunales	13
Capitolio	18
San Antonio 1	11
TOTAL ACTAS DE VECINDAD DE APERTURA 52	

9.1.3.1.12. Acta de compromiso

Las actas de compromiso es un documento que se elabora en caso de ser necesario hacer algún compromiso o acuerdo con la comunidad, institución o comerciante, con el fin de realizar alguna actividad de obra que repercuta con la comunidad, el contratista levantará el acta de compromiso.

La Interventoría realiza el seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos en las actas de compromiso y se notificará en el informe correspondiente. Se firma el acta por el componente social y técnico, son revisada y aprobadas por la interventoría.

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora realiza cuatro actas de compromiso las cuales relaciono a continuación.

- ✓ ***Frente Unión tunales***

La entidad ejecutora durante el periodo comprendido no realizó actas de compromiso por no ser necesario.

- ✓ ***Frente Capitolio***

La entidad ejecutora durante el periodo comprendido no realiza actas de compromiso por no ser necesario.

- ✓ ***Frente San Antonio El Toldo***

La entidad ejecutora durante el periodo comprendido no realiza actas de compromiso por no ser necesario.

- ✓ ***Frente San Antonio 1***

La entidad ejecutora durante el periodo comprendido no realiza actas de compromiso por no ser necesario.

9.1.3.1.13. Acta de gestión adelantada.

- ✓ ***Frente Unión Tunales***

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora no realizó en el frene de obra actas de gestión adelantada por no ser necesario.

- ✓ ***Frente Capitolio***

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora no realizó en el frene de obra actas de gestión adelantada por no ser necesario.

- ✓ ***Frente San Antonio El Toldo***

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora no realizó en el frene de obra actas de gestión adelantada por no ser necesario.

9.1.3.1.14. Ejercicio de control social.

Durante el periodo comprendido la entidad ejecutora, no realizan reuniones de control social, por no ser necesario.

Tabla 54. Indicadores de cumplimiento del Programa de información y participación comunitaria

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	# actas de vecindad de San Antonio realizadas / # actas de vecindad del tramo San Antonio 1 requeridas x 100	NA
	# acta de compromiso realizadas x100 / # acta de compromiso requeridas x 100	NA

	# actas de gestión adelantada realizadas x100 / # actas de gestión adelantada requeridas x 100	NA
	# ejercicio de control social realizadas x100 / # ejercicio de control social requeridas x 100	NA

Fuente: Propia

9.1.4. PROGRAMA DE CULTURA VIAL

Este Programa tiene como fin generar nuevas actitudes de responsabilidad en relación con el manejo de la infraestructura vial y su entorno por parte de la población vecina u usuaria. Las sensibilizaciones de sostenibilidad y cuidados de las vías se realizarán al finalizar las intervenciones, con el fin de apropiar a la comunidad del cuidado y conservación de las vías a lo largo del tiempo. Por lo anterior, se darán a conocer las recomendaciones que la comunidad debe tener en cuenta para conservar las vías intervenidas permitiendo que sean sostenibles.
Las sensibilizaciones quedaran soportadas por un acta, lista de asistencia y registro fotográfico y se realizará una vez se termine el proceso constructivo.

Durante el periodo comprendido el Consorcio no realiza sensibilización de sostenibilidad por no ser necesario, este programa se desarrolla al finalizar las obras.

9.1.5. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA

Este programa busca generar oportunidades laborales a las comunidades donde se ejecute el proyecto, contratando a un porcentaje de la población de mano de obra no calificada, Vulnerable y mujeres esta última regida por el decreto 332/2020, donde indica que para el mes de junio del 2023 para proyecto de construcción se contrate un 13.8%, que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas. Esto facilitará que haya una mayor apropiación del trabajo realizado y se evitarán conflictos con la comunidad.

9.1.5.1 Mano de obra no calificada contratación población vulnerable.

La contratación de población vulnerable, la interventoría verificará el cumplimiento en la contratación de población vulnerable contratado. Dado lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a la contratación de personal en situación de vulnerabilidad, establecido contractualmente en el Decreto 380 del 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones".

9.1.5.2 Mano de obra no calificada de la localidad.

Contratación de mano de obra no calificada, la interventoría verificará el cumplimiento del 75% del personal no calificado de la localidad del Sumapaz beneficiada por la ejecución de las obras. De acuerdo a lo enunciado en el anexo técnico que a la letra dice "Teniendo en cuenta la base de datos suministrada por el Fondo de Desarrollo Local del Sumapaz (FDLS) se indicó que, aproximadamente el 75% de la mano de obra no calificada está disponible para la vinculación al proyecto. Por cuanto se hace necesario vincular al personal de mano de obra local según el porcentaje descrito, lo cual sugiere disponer de personal foráneo en un 25% aproximadamente".

9.1.5.3 Contratación de mujeres.

De acuerdo al Decreto Distrital 332 de 2020, "VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO. Sin perjuicio de la autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y organismos distritales, el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la contratación, según corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, estudios y documentos previos y en las cláusulas contractuales de los procesos de selección pública y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligación del futuro contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen a continuación, y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales.

La vinculación de mujeres será diferenciada por rama, así:

Ramas de actividad económica	**Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contratos**		
	A partir del 1 º de junio de 2021	**A partir del 1º de junio de 2022**	**A partir del 1 º de junio de 2023 en adelante**
Construcción	6,8%	9,3%	13,8%

9.1.5.4 Contratación de trabajadores en condición de discapacidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal con discapacidad: "Que el numeral 7 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 establece que el Gobierno Nacional debe implementar mediante decreto reglamentario un sistema de

preferencias aplicables a los procesos de adjudicación y celebración de contratos de organismos estatales para quienes vinculen laboralmente a personas con discapacidad debidamente certificadas, en un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores, lo que se encuentra reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, establecer un sistema de preferencias como factor de desempate para los proponentes que acrediten por lo menos el 10% de su nómina personas con discapacidad en el respectivo proceso de contratación".

9.1.5.5 Contratación de trabajadores en condición de vulnerabilidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad tales como:

-Madres cabeza de hogar
-Desplazados

Estas condiciones deben ser demostradas mediante certificado que le acredite como persona vulnerable, para ser tenidas en cuenta durante el proceso de selección.

Así mismo en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad"

Tabla 55. Consolidado personal UAERMV

PERSONAL TOTAL	PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA	PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA	TOTAL, MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	TOTAL, MANO DE OBRA NO CLAIFICADA VULNERABLE	TOTAL, DE MUJERES CONTRATADAS
93	67	24	24	2	15
PORENTAJES		PORCENTAJE % MONC	PORCENTAJE % MONCL	PORCENTAJE % VULNERABLE	PORCENTAJE % MUJERES
		72,04 %	100 %	2,1 %	16,12 %

Fuente: Propia

De acuerdo a los indicadores se evidencia que la entidad ejecutora cumple con la contratación de mano de obra no calificada por cuanto que cuenta con un 100%, de acuerdo con lo establecido contractualmente se debe contratar un 75 %, la interventoría en comité de seguimiento solicita se continue con el cumplimiento a lo establecido contractualmente. Cuentan con 15 mujeres cumpliendo con un 12,84 %.

A 12.

- ***Lista de personal agosto UAERMV.***

9.1.6 ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

El área social de la Interventoría realiza las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por el ejecutor, en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico.

9.1.6.1. Listas de Chequeo del Contratista:

A la fecha de cierre del presente informe la interventoría realiza la lista de chequeo donde evalúa la gestión realizada en el componente social basados en cada programa que establece las fichas PAGA.

A13

- ***Lista de chequeo mes de agosto UAERMV.***

9.1.6.2 Revisión documental

Durante el periodo de este informe se realizó la consulta de los documentos legales:

- Contratos de Interventoría
- Contrato de la entidad ejecutora
- Anexo técnico
- Plan de Gestión Social
- Lista de chequeo
- Bitácora social
- Informes semanales
- Informes mensuales.
- Correspondencia.

A 14

- ***Copia Bitácora Social agosto UAERMV.***

9.1.6.3. Informes Mensuales.

En la siguiente tabla se registran los informes mensuales presentados, por la Unidad de Mantenimiento Vila (UAERMV), a continuación, se presenta la trazabilidad de los mismo.

Tabla 56. Trazabilidad Informes mensuales UAERMV

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
1	17 al 31 julio de 2023	El 9 de noviembre del 2023, mediante comunicado 186-1-369 la interventoría solicita entrega de los informes mensuales del componente social de la UAERMV. El 21 de noviembre del 2023observaciones subsanadas por correo electrónico en el mes de marzo del 2024, el 4 de abril el 2024 con comunicado 186-1-548, la interventoría da respuesta al radicado.20241920021591 del 29 de febrero de 2024.donde indica que las observaciones emitidas al informe del mes de julio del 2023, fueron subsanadas, se encuentra aprobado por interventoría, mediante comunicado 186-1-369, reitera la solicitud de los informes mensuales de julio, agosto, septiembre, octubre.
2	1 al 31 de agosto del 2023	La interventoría solicita hacer entrega del informe mensual del mes de agosto del año en curso, mediante el comunicado oficio186-1-336 el 18 de octubre del 2023, El 18 de octubre del 2023 la UAERMV, hace entrega del informe mensual del mes de agosto por correo electrónico, El 14 de noviembre la interventoría realizó observaciones al documento por correo electrónico, El 19 de marzo 2024 es entregado con observaciones subsanadas por parte de la UAERMV, el 4 de abril del 2024, la interventoría realiza observaciones mediante comunicado 186-1-547, 11 de abril del 2024, por correo electrónico envía informe con las observaciones subsanadas, se encuentra aprobado por interventoría
3	1 al 30 de septiembre del 2023	La interventoría solicita hacer entrega del informe mensuales del mes de septiembre del año en curso, los cuales fueron observados mediante el comunicado oficio186-1-336 el 18 de octubre del 2023, El 5 de diciembre del 2023 la UAERMV hace entrega del informe con las observaciones subsanadas, el 30 de diciembre del 2023 la interventoría realiza nuevamente observaciones al documento, el 19 de marzo del 2024 la UAERMV hace entrega del informe con las observaciones subsanadas por correo electrónico, la interventoría nuevamente realiza observaciones mediante comunicado 186-1-547 el 4 de abril del 2024. El 11 de abril del 2024, por correo electrónico envía informe con las observaciones subsanadas, se encuentra aprobado por interventoría.

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
4	1 al 31 de octubre del 2023	El 16 de noviembre del 2023 la UAERMV hace entrega del informe mensual del mes octubre del 2023, por correo electrónico, el mismo día la interventoría realiza observaciones por correo electrónico, el 23 de noviembre del 2023 la UAERMV hace entrega con las observaciones subsanadas, en comité de seguimiento social del 26 de octubre del 2023, la interventoría, da aval al informe, se encuentra aprobado por interventoría
5	1 al 30 de noviembre del 2023	El 5 de diciembre del 2023 la UAERMV hace entrega del informe mensual del mes de noviembre, la interventoría realiza observaciones el 12 de diciembre 2023 por correo electrónico, el 14 de diciembre la UAERMV hace entrega con las observaciones subsanadas, el 30 de noviembre del 2023 la interventoría realiza nuevamente observaciones, el 16 de febrero la UAERMV hace entrega del documento con las observaciones subsanadas por correo electrónico., el 4 de abril el 2024 con comunicado 186-1-548, la interventoría da respuesta al radicado.20241920021591 del 29 de febrero de 2024 de la UAERMV, donde indica que las observaciones emitidas al informe del mes de noviembre del 2023, fueron subsanadas, se encuentra aprobado por interventoría
6	1 al 31 de diciembre del 2023	El 5 de diciembre del 2023 la UAERMV hace entrega del informe mensual del mes de diciembre versión original, el 12 de diciembre del 2023, la interventoría realiza observaciones por correo electrónico, El 29 de diciembre del 2023, la UAERMV hace entrega del documento con las observaciones subsanadas el 4 de enero del 2024, la interventoría realiza observaciones por correo electrónico, el 16 de febrero el 2024 la UAERMV, hace entrega del documento con las observaciones subsanadas, por correo electrónico, El 4 de abril el 2024 con comunicado 186-1-548, la interventoría da respuesta al radicado.20241920021591 del 29 de febrero de 2024 de la UAERMV, donde indica que las observaciones emitidas al informe del mes de diciembre del 2023, fueron subsanadas. se encuentra aprobado por interventoría
7	1 al 31 de enero del 2024	El 6 de febrero del 2024 la UAERMV, hace entrega del informe mensual a la interventoría por correo electrónico, El 12 de febrero del 2024 la interventoría realiza observación al documento por correo electrónico, el 29 de febrero del 2024 la UMV, hace entrega con las observaciones subsanadas. y el 7 de marzo en comité de seguimiento social la interventoría da visto bueno, informando que una vez los informes anteriores pendientes se entreguen quedaría aprobados, El 4 de abril el 2024 con comunicado 186-1-548, la interventoría da respuesta al radicado.20241920021591 del 29 de febrero de 2024 de la UAERMV, donde indica que las observaciones emitidas al informe del mes de enero del 2024, fueron subsanadas, se encuentra aprobado por interventoría

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
8	1 al 29 de febrero del 2024	El 05 de marzo de 2024 la UAERMV, hace entrega del documento original, el 26 de marzo del 2024 la interventoría realiza observaciones al documento por correo electrónico, el 5 de abril del 2024, la UAERMV hace entrega del informe con las observaciones subsanadas, El 11 de abril del 2024 por correo electrónico, la interventoría realiza seguimiento y aprobación al informe última versión. Se encuentra a probado por interventoría.
9	1 al 31 de marzo del 2024	El 05 de abril de 2024 la UAERMV hace entrega del documento original, el 11 de abril la interventoría realiza observaciones al documento por correo electrónico, el mismo día la UAERMV subsana las observaciones y hace entrega con las observaciones subsanadas, el 24 de abril la interventoría emite observaciones al documento, por medio del comunicado 186-1- 574, La UAERMV subsanada las observaciones y entrega por correo electrónico el 29 de abril del 2024. Se encuentra aprobado por interventoría.
10	1 al 16 de abril el 2024	EL 23 de mayo del 2024, la interventoría realiza observaciones al informe mensual social 10, con observaciones, mediante comunicado dando respuesta a Respuesta a correo electrónico del 1 de mayo del 2024, "*Informe mensual social 10 mes abril 2024.".* UAERMAV El 7 de junio del 2024 mediante radicado: 20241920056681 la Unidad de mantenimiento vial da respuesta al documento subsanado las observaciones. El 18 de junio del 2024 la interventoría da aval al informe mediante comunicado 186-1- 599.
11	1 al 30 de abril del 2025	El 7 de mayo del año en curso, la profesional social realiza entrega del informe mensual de gestión social, la interventoría da respuesta mediante comunicado 186-1-664 del 19 de mayo del 2025, hace entrega del informe el 26 de agosto del año en curso en mesa de trabajo realizada en las instalaciones de la interventoría, por cuanto que el link enviado como anexo para revisar los informes no fue posible leerlos. Al cierre del presente informe se encuentra en revisión por parte de interventoría.
12	1 al 31 de mayo del 2025	La profesional social hace entrega del informe mensual por correo electrónico el 14 de junio del 2025, la interventoría realizó observaciones 186-1-713 el 24 de junio del 2025, hace entrega del informe el 26 de agosto del año en curso en mesa de trabajo realizada en las instalaciones de la interventoría, por cuanto que el link enviado como anexo para revisar los informes no fue posible leerlos. Al cierre del presente informe se encuentra en revisión por parte de interventoría.
13	1 al 30 de julio del 2025	La profesional social hace entrega del informe mensual por correo electrónico el 7 de julio del 2025. hace entrega del informe el 26 de agosto del año en curso en mesa de trabajo realizada en las instalaciones de la interventoría, por cuanto que el link enviado como anexo para revisar los informes no fue posible leerlos. Al cierre del presente informe se encuentra en revisión por parte de interventoría.

No DE INFORME	PERÍODO	OBSERVACIONES
14	1 al 31 de julio del 2025	A la fecha del presente la Unidad de Mantenimiento vial no ha hecho entrega del informe. hace entrega del informe el 26 de agosto del año en curso en mesa de trabajo realizada en las instalaciones de la interventoría, por cuanto que el link enviado como anexo para revisar los informes no fue posible leerlos. Al cierre del presente informe se encuentra en revisión por parte de interventoría.
15	1 al 31 de agosto del 2025	La profesional social de la entidad ejecutora realiza entrega del informe mensual social el 27 de agosto por correo electrónico, se encuentra en revisión por parte de interventoría.

Fuente: Propia

9.1.6.4. Informe semanal

En la siguiente tabla se registran los informes semanales presentados por la UAERMV, los cuales se relacionan a continuación, estos son revisado y avalados por la interventoría.

Tabla 57. Informes semanales

N° SEMANA	PERÍODO
54	28 de julio al 3 de agosto del 2025
55	4 al 10 de agosto del 2025
56	11 al 17 de agosto del 2025
57	18 al 24 de agosto del 2025
58	25 al 31 de agosto del 2025

Fuente: Propia

9.1.6.5 Comités de Seguimiento integral

A la fecha de cierre del presente informe la interventoría realiza 5 comités de seguimiento integral que a continuación se relacionan:

Tabla 58. Comité integral de seguimientos UAERMV

No COMITÉ	FECHAS
51	1/08/2025
52	8/08/2025
53	15/08/2025
54	22/08/2025
55	28/08/2025

Fuente: Propia

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fotos 51: Comité de seguimiento integral No 51 CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá.</td><td>Fotos 52: Comité de seguimiento integral N° 52, CTO Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fotos 53: Comité de seguimiento integral No 53, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá

.</td><td>Fotos 54: Comité de seguimiento integral No 54. CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá.</td></tr>
</table>



Fotos 55: Comité de seguimiento integral No 55, CTO Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá.

Ver anexo técnico actas de comité de seguimiento integral

9.1.6.6. Mesa de trabajo

Durante el periodo comprendido se realiza mesa de trabajo con la entidad ejecutora con el fin de aclarar los dudas y entrega de los informes mensuales 11, 12, 13,14,15, 16, 17.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotos 56: Mesa de trabajo entidad ejecutora UMV e interventoría.

9.1.6.7 Correspondencia enviada y recibida.

Durante el desarrollo del presente informe se genera correspondencia, durante el mes de mayo no se presenta correspondencia por parte de la Unidad de Mantenimiento vial.

Tabla 59: Correspondencia recibida y enviada Contrato

Correspondencia recibida			**Correspondencia enviada**		
Consecutivo	**Asunto**	**Fecha**	**Consecutivo**	**Asunto**	**Fecha**
Radicado: 20251920101991 UAERMV	Respuesta radicada UAERMV No. 20251120101242 - 186-1-713 Respuesta a observaciones del informe mensual social N.º 12 correspondiente al mes de mayo de 2025.	5/08/2025	.		
Radicado 20257020012241 FDRS	Traslado derecho de petición *"vía el toldo San Antonio"*	20/06/2025			
Radicado: 20251920105781 UAERMV	Respuesta al derecho de petición radicado UAERMV 20251120120202 sobre el estado de la vía El Toldo – San Antonio.	13/08/2025			
			186-1-788	Traslado derecho de petición *"vía el toldo San Antonio" Radicado FDRS No. 20257010011792*	6/08/2025
			186-1-812	Respuesta al Radicado: 20251920101991 UAERMV 05- 08 - 2025	13/08/2025
			186-1-803	Respuesta 20257020012241, "Traslado derecho	11/08/2025

				de petición "vía el toldo San Antonio" Radicado FDRS No. 20257010011792. °	

Fuente: Propia

A 15

- **Correspondencia enviada y recibida.**

9.1.6.8 Estado del Contrato

Estado del contrato 17 de julio de 2023, inicia la etapa de construcción **ACTIVO**

10. CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 14/02/2022

10.1 Actividades de Interventoría

El área social de la Interventoría realizó las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por la entidad ejecutora, en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico. Mediante:

- Recorridos
- Comités de seguimiento integral
- Comités de seguimiento social
- Verificación de documentación.
- Llamados de atención
- Correspondencia enviada y recibida
- Bitácora social
- Lista de chequeo.
- Informes mensuales
- Correspondencia
- Informes semanales.

10.1.1 Estado del Contrato

Estado del contrato 17 de julio de 2023, inicia la etapa de construcción. **ACTIVO.**

11. CONCLUSIONES

- Para el presente periodo, la interventoría ha realizo recorrido conjuntos, con el fin de verificar los requerimientos y cumplimiento de las actividades establecidas contractualmente en el componente, en la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, Consorcio Estabilización Vial.

- El área social de la entidad ejecutora y la interventoría, participaron de los comités de seguimiento integrales y sociales citados por la interventoría.

- Durante el periodo comprendido la interventoría implementa la lista de chequeo, donde se evalúa las actividades desarrolladas por el componente social en el periodo del presente informe la calificación presentada fue de 100 %, para UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.

- Durante el periodo comprendido la interventoría, realiza la lista de chequeo, donde evalúa las actividades desarrolladas por el componente social en el periodo del presente informe, estas no se han realizado en su totalidad, la interventoría realiza llamados de atención al incumplimiento de las entregas de los productos, la calificación presentada fue 100%, para el Consorcio Estabilización Vial.

- Durante el periodo comprendido la interventoría, realiza la lista de chequeo, donde evalúa las actividades desarrolladas por el componente social en el periodo del presente informe, estas no se han realizado en su totalidad, la interventoría realiza llamados de atención al incumplimiento de las entregas de los productos, la calificación presentada fue 91%, para el Consorcio Gaviones 95.

- La Interventoría la Unidad de mantenimiento vial y los Contratista, ha realizado un trabajo conjunto para cumplir con las actividades establecidas contractualmente en el componente social y realizar una adecuada atención a la comunidad.

- La interventoría ha venido realizando la verificación de la atención al ciudadano por parte del contratista en los canales de atención establecidos.

- La interventoría ha venido realizando el acompañamiento y seguimiento al contratista Consorcio Gaviones 95, Consorcio Estabilización vial y la Unidad de

Mantenimiento Vial realizadas en este periodo. En las obligaciones que se deben cumplir de acuerdo al Plan de gestión social, establecidas contractualmente.

12. RECOMENDACIONES

- Continuar implementando los acompañamientos de recorrido con interventoría, para la ejecución del Plan de Gestión Social conforme lo establecido contractualmente logrando los objetivos propuestos.

- Enfocar las actividades y labores del proyecto en pro de dar reconocimiento de los beneficios de las obras de la localidad de Sumapaz, informando constantemente a la comunidad sobre ello.

- Contar con información clara para mantener a la comunidad al tanto de los avances sobre las labores de los contratos de obra.

- Mantener buena comunicación con los profesionales de las otras áreas, con el fin de poder ir de la mano en la programación e información que el área social deba dar a la comunidad.

- Continuar implementando las mesas de trabajo con el fin de resolver todas las inquietudes, en cada uno de las actividades y productos a entregar para la ejecución del Plan de Gestión Social conforme lo establecido contractualmente logrando los objetivos propuestos.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

Consorcio Gaviones 95

A1.

- *Comunicado 186- 1-794 del 7/08/2025.*
- *Correo electrónico entrega de cuenta de cobro al Consorcio Gaviones 95.*
- *Apertura de PQRS*

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-794

Bogotá D.C. 7 de agosto de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
info@promotorapuga.com
Bogotá D.C

Referencia: **"**CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.).*

Asunto*:* Respuesta a comunicado D40 - 2025.

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio de Gaviones 95.

Por medio del presente comunicado la interventoría, da respuesta al comunicado relacionado en el asunto:

1. **Paz y Salvo y respuesta del derecho de Petición señor Wilfor Lara Sanabria**

La interventoría revisará la información suministrada por el Consorcio Gaviones 95, con el fin de verificar la veracidad de la información y solicitará al ciudadano las pruebas correspondientes a la deuda que indica el ciudadano le adeuda el Consorcio Gaviones 95.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-794

Una vez el ciudadano aporte pruebas se harán llegar al Consorcio.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexo: N/A

C.C: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS -lauram.rojas@gobiernobogota.gov.co
cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Jose Miguel Ruiz – jmruiz@gobiernobogota.gov.co

UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto – julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

Gmail **intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>**

Fwd: cuenta de cobro

1 mensaje

Intersumapaz Ecovias <intersumapaz.ecovias@gmail.com> 21 de agosto de 2025, 17:01
Para: intersumapazsocial161 <Intersumapazsocial161@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Luz Mery Patiño Pérez** <luzmerypatino53@gmail.com>
Date: jue, 21 ago 2025 a la(s) 2:38 p.m.
Subject: Fwd: cuenta de cobro
To: info@promotorapuga.com <info@promotorapuga.com>, intersumapaz.ecovias@gmail.com <intersumapaz.ecovias@gmail.com>

Cordial saludo
Me dirijo a ustedes con el fin de pedirles el favor que el pago de me sea enviado a mi familiar (cuñado), ya que no cuento con los documentos solicitados.

Muchas gracias por la colaboración

ATT: wilfor Lara
3151742689

---------- Forwarded message ---------
De: **JASBLEYDI DIMATE** <jasbleydidimate@gmail.com>
Date: jue, 21 ago 2025, 2:35 p. m.
Subject: cuenta de cobro
To: luzmerypatino53@gmail.com <luzmerypatino53@gmail.com>

--
Cordialmente,

Ermy Hurtado R.
Directora de Interventoría
ECOVIAS - SUMAPAZ

CamScanner 21-08-2025 14.13.pdf
4523K

FORMATO ATENCIÓN AL CIUDADANO

PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS

GESTIÓN SOCIAL

Atencion Ciudadana No.	01

Fecha:	30-07-2025	Lugar:	Vereda Auras	No. Contrato:	476-2022

Contratista:	CONSORCIO GAVIONES 95

Medio de Recepcción:	Escrita		Telefónica		Presencial	X

Datos de Consultante

Nombres y Apellidos:	Ramiro Martinez	Vereda:	Auras
Localidad / una:	Sumapaz	Punto referencia	Finca a PioCamou
Correo Electrónico:		Teléfono:	3223808773

Descripción de la Consulta

El treinta (30) de Julio presentamente el vehiculo del Consorcio Gaviones 95; el recibir el gilo para dirigirse al campamento de obra y Punto de atención a la Comunidad fido golpeo la señal de tránsito restrictiva y en poste de la Curva, aunque no se ha observado el Vidrio. Varios Vecinos de los mencionados afirman que Fue el vehiculo que se utiliza para la movilización del CG95, el sábado 02 de agosto se realizó visita y el señor Ramiro Comenta la situación y solicito que allí evitaramos Tocar el gilo.

Tipo de Consulta:	Pregunta		Queja	X	Reclamo	

Solicitud de Información		Derecho de Petición	

Resumen de respuesta al ciudadano (Si es pregunta o solicitud de información)

Aunque la queja no fue recibido formalmente por el Consorcio Gaviones 95 el 08 de agosto se dirigieron dos trabajadores al lugar en que sucedio el golpeo con el objetivo de indagar sobre la señal de tránsito restrictiva como el poste de Estacionamiento de la Curva. 23/08/2025. El Profesional social del Consorcio Gaviones 95, se dirige a la casa del señor Ramiro Martinez y se hace lectura de esta formato al Ciudadano quien afirma no firmar, testificando que no Fueron nosotros quien tocamos la señal de tránsito restrictiva, ni el poste de la Curva

FORMATO ATENCIÓN AL CIUDADANO

PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS

GESTIÓN SOCIAL

Atencion Ciudadana No.	02

Fecha:	07-08-2025	Lugar:	Kotoo	No. Contrato:	478-2022
Contratista:	CONSORCIO GAVIONES 95				

Medio de Recepcción:	Escrita		Telefónica	X	Presencial		

Datos de Consultante

Nombres y Apellidos:	Baldan Bautista	Vereda:	Laguna Verde
Localidad / Comuna:	Sumapaz	Punto referencia	Casas: felisa Pardo, Diana M Pardo, Virgilio Pardo.
reo Electrónico:		Teléfono:	3122574807

Descripción de la Consulta

El Jueves 07 de agosto de 2025, la retroexcavadora de obra: adecuando la abscisa Kotoo, afecto al tubo de 3" que surte de agua Predios como el de felisa pardo, siendo administrador el señor. Baldan Bautista, Predio de la señora Diana marcela pardo y Virgilio Pardo, se llamo al fontanero que reside en el Corregimiento de Nazareth señor Carlos A Aguan.

Tipo de Consulta:	Pregunta		Queja	X	Reclamo		

Solicitud de Información		Defecho de Petición	

Resumen de respuesta al ciudadano (Si es pregunta o solicitud de información)

El 13/08/2025: Realiza la primera visita al fontanero quien dice que por ahora se realiza una reparación preliminar no definitiva, Pues no Cuenta Con los elementos o materiales para reparar definitivamente este tubo.

Llama al teléfono de atención Ciudadana el señor: Baldan Bautista quien informa que el tubo Continúa afectado pues presenta escape de agua, el 21/08/2025 se realiza la segunda visita del fontanero, se le facilito una abrazadera sin embargo esta abrazadera queda muy Justa y no es efectiva.

El 26/8/2025, El señor Baldan Bautista. Vuelve a llamar informando que el P/ tubo, Presento nuevamente escape, se llamo al fontanero quien informa que el Viernes realiza

Nuevamente visita, con los materiales para reparar definitivamente este daño, Cabe aclarar

Firma del Ciudadano	

que esta queja a la fecha no ha sido definitivamente solucionada

Atención (Preguntas, Quejas, Reclamos, Solicitudes de Informacion)

Seguimiento a la consulta (Si es Queja, Reclamo, Derecho de Peticion)

Acciones a Seguir	Fecha Cumplimiento	Nombre responsable	Cargo del responsable
13/08/2025 I visita Fontanero	13/08/2025	Andrés A Garcia	Profesional social
II visita fontanero.	26/08/2025	Andrés A Garcia	Profesional social.

Cargo	Nombres y Apellidos	Fecha	Firma
Residente Tecnico del Contratista			
Profesional Social del Contratista			
Residente Tecnico de Interventoria			
Profesional Social de Interventoria			

FORMATO ATENCIÓN AL CIUDADANO

PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS

GESTIÓN SOCIAL

Atencion Ciudadana No.	03

Fecha:	20/08/2025	Lugar:	K1+750	No. Contrato:	478-2022

Contratista:	CONSORCIO GAVIONES 95

Medio de Recepcción:	Escrita		Telefónica	X	Presencial	

Datos de Consultante

Nombres y Apellidos:	Humberto Contreras	Vereda:	Laguna Verde
Localidad / Comuna:	Sumapaz	Punto referencia	Acopio Bonifacio Martinez.
Correo Electrónico:		Teléfono:	3112961230

Descripción de la Consulta

El Miércoles 20 de agosto. La profesional social de la interventoria informa a Andrés Garcia el daño de una manguera en el K1+750 sin embargo no informa el nombre del Ciudadano, ese mismo dia Andrés Garcia Visita la casa de Bonifacio Martinez. Y allí informan que el daño de la manguera no es en este sitio, al día siguiente la profesional social informa el nombre del Ciudadano.

Tipo de Consulta:	Pregunta		Queja	X	Reclamo	

Solicitud de Información		Derecho de Petición	

Resumen de respuesta al ciudadano (Si es pregunta o solicitud de información)

El Jueves 21 de agosto. Andrés Garcia. Visita al señor Humberto Contreras y se llega al acuerdo que se reponga la manguera para de esta forma cerrar esta queja en un plazo máximo de cinco dias el Ciudadano solicita que esta manguera no sea recortada e informa además que él tiene agua ya que realiza una adecuación.

A2

- *Comunicado 186-1-795 el 7 agosto del 2025.*
- *Comunicado 186-1-793 el 7 de agosto del 2025.*
- *Comunicado 186-1-818 el 21 de agosto del 2025.*
- *Comunicado 186-1-839 el 27 de agosto del 2025.*

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-793

Bogotá D.C. 7 de agosto de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
info@promotorapuga.com
Bogotá D.C

Referencia: *"*CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.).*

Asunto*:* Llamado de atención por instalación de Pasacalles y vallas informativas móviles.

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95.

Por medio del presente comunicado la interventoría, realiza un llamado de atención al componente social y técnico debido a la falta de gestión y cumplimiento que se ha presentado, en lo relacionado a continuación:

1. La interventoría ha solicitado la reposición de los pasacalles y vallas móviles el cual está establecida contractualmente en el anexo técnico***," Pasacalles Informativos de Inicio/Fin, El contratista deberá suministrar, instalar y mantener los pasacalles en el inicio/fin de cada tramo a intervenir según las dimensiones descritas en el PMT, previa aprobación por parte de la interventoría".*** por tanto el Consorcio realizará reposición de pérdida o daño de las ya instaladas por la UAERMV e instalará en los sitios que inicie actividades de obra por el Consorcio, pero esto no indica que reemplace la valla informativa móvil, por cuanto que esta también debe realizarse la instalación de acuerdo al anexo técnico donde indica, en la página 115, numeral 10 Señalización ***" Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas de inicio/fin de cada tramo, la***

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecovias.com
NIT 890.104.625-1

186-1-793

iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes".

La interventoría solicita su instalación de manera inmediata los pasacalles del tramo vial de Laguna Verde y reposición del pasacalle del tramo vial de Capitolio y la vallas informativas móviles de Laguna Verde, por cuanto que ha solicitado la reposición de los pasacalles y vallas móviles en reiteradas ocasiones mediante comunicados 186-1-742, 186-1-724, 186-1-729 y en comités de seguimientos de obra integrales que se han realizado desde el reinicio del contrato del año en curso y el Consorcio ha indicado que se está a la espera por cuanto que ya se realizó la requisición se informa que está establecida contractualmente como lo indica el anexo técnico.

Quedamos atentos a cualquier comentario que al respecto se presente y se recuerda al Consorcio Gaviones 95, dar cumpliendo con las obligaciones establecidas por el componente, requeridos para el buen desarrollo de las actividades.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexo: N/A

C.C: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS -lauram.rojas@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto – julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT 890104625-1

186-1-795

Bogotá D.C. 7 de agosto de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
info@promotorapuga.com
Bogotá D.C

Referencia: *"*CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.).*

Asunto*:* Respuesta a comunicado D42-2025. 22 de julio del 2025.

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Consorcio Gaviones 95.

Por medio del presente comunicado la interventoría, realiza respuesta al comunicado relacionado en el asunto.

1. **Informe mensual**

El contratista hace entrega de los informes el 12 abril del 2024, el 21 de julio de 2024, por correo electrónico y el 13 abril del 2025, entregado por correo electrónico el 24 de julio del año en curso, fueron revisado por interventoría presentaron observaciones, se encuentran a la espera de su entrega.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890104625-1

186-1-795

2. **Actas de vecindad**

Fueron entregados por el profesional social en una AZ el 21 de julio del 2025 en físico, se encuentran en revisión por parte de interventoría, es de aclarar que estas fueron solicitadas desde el mes de abril del 2025, fecha de reinicio del contrato.

3. **Actas de compromiso**

Se encuentra pendiente la entrega de actas de cierre de los acopios, compromiso adquirido desde el 14 de mayo del 2025, la interventoría solicita su entrega no se ha dado cumplimiento.

4. **Pasacalles**

La interventoría solicita su instalación de manera inmediata por cuanto que la interventoría ha solicitado la reposición de los pasacalles en reiterados ocasiones en los comités de seguimiento de obra integrales que se han realizado desde el reinicio del contrato del año en curso y han indicado que se está a la espera por cuanto que ya se realizó la requisición, se informa que está establecida contractualmente en el anexo técnico donde indica que***," Pasacalles Informativos de Inicio/Fin, El contratista deberá suministrar, instalar y mantener los pasacalles en el inicio/fin de cada tramo a intervenir según las dimensiones descritas en el PMT, previa aprobación por parte de la interventoría.***".

5. **Punto de atención fijo en Laguna Verde**

La interventoría en recorrido realizados ha verificado que fue subsanada la observación y realiza instalación de punto de atención fijo y punto de atención móvil.

6. **Informes semanales**

La interventoría realiza revisión de los anexos entregados en el archivo adjunto y evidencia que se encuentran completos, se recuerda al consorcio que estos deben ser entregados semana a semana dando reporte de lo ejecutado en el componente social.

7. **Paz y Salvo y respuesta del derecho de Petición**

Se revisará la información suministrada por el Consorcio con el fin de verificar la veracidad de la información.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890104625-1

186-1-795

8. **Volantes informativos de inicio de obra de Laguna Verde.**

La interventoría realizó revisión al volante y da aval para su distribución, se recuerda al consorcio realizar entrega de todos los comunicados con anticipación de 5 a 3 días, por cuanto que se deben revisar, avalar e informar con tiempo a la comunidad de cualquier actividad de la obra.

Quedamos atentos a cualquier comentario que al respecto se presente y se recuerda al Consorcio Gaviones 95, dar cumpliendo con las obligaciones establecidas por el componente, se requiere la producción de documentos y productos de calidad, articulados con el buen desarrollo de actividades.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexo: N/A

C.C: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS -lauram.rojas@gobiernobogota.gov.co cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co, Jose Miguel Ruiz – jmruiz@gobiernobogota.gov.co

UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890.104.625-1

186-1-818

Bogotá D.C. 21 de agosto de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
info@promotorapuga.com
Bogotá D.C

Referencia: *"*CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.).*

Asunto: *Traslado de* ***FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS****. (Valla informativo móvil y pasacalles).*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95.

Por medio del presente comunicado la interventoría, realiza entrega de las especificaciones Técnicas – Diseños requeridos, en cuanto a valla móvil y pasacalles el cual la entidad contratante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, (UAERMV). hace entrega por medio de correo electrónico, dando respuesta a la solicitud realizada por la Interventoría.

De acuerdo a lo anterior indican que: página 5 – 8 "Especificaciones Técnicas – Diseños requeridos, en cuanto a valla móvil. el contratista deberá prestar el servicio de los siguientes ítems como se indica a continuación:

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890104625-1

186-1-818

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Valla Informativa	5	Und	Las Vallas informativas tienen medidas de 150 cm de alto por 150 cm de ancho. Ángulos y estructura de hierro 1” X 1/8” pulgada calibre 18. Debe tener paso de aire de una altura de 40 cm del suelo al inicio de la lámina. Lamina Calibre 24. Cadena de 60 cm. Texto impreso sobre vinilo y laminado. La lámina debe estar tensada con pestañas a los cuatros lados reforzado. Ver Figura 1. Valla Informativa
2	Valla informativa con Reflectivo	5	Und	Las Vallas informativas tienen medidas de 150 cm de alto por 150 cm de ancho. Ángulos y estructura de hierro 1” X 1/8” pulgada calibre 18. Debe tener paso de aire de una altura de 40 cm del suelo al inicio de la lámina. Lamina Calibre 24. Cadena de 60 cm. Texto impreso sobre vinilo y laminado con **LETRAS REFLECTIVAS.** La lámina debe estar tensada con pestañas a los cuatros lados reforzado. Ver Figura 1. Valla Informativa.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890.104.625-1

186-1-818

“1.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-DISEÑOS REQUERIDOS”

“VALLAS”



“Figura 1. Valla Informativa”.

“Diseño Frontal de Vallas”



“Figura 1. Valla Informativa”

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890104625-1

186-1-818

Se debe incluir nombre del Consorcio, número del contrato, el correo electrónico y el número telefónico de atención a la comunidad establecida por el Consorcio, para realizar atención a la comunidad. Así mismo se encuentra el nombre de la interventoría y de la Unidad de Mantenimiento Vial. Ver Foto 1. Valla informativa móvil de Consorcio Estabilización Vial.



Foto 1 Valla informativa móvil de Consorcio Estabilización Vial.

PASACALLES" indican que: Página 8,9,10.

"Los pasacalles deben cumplir con lo establecido en manual de señalización vial de la resolución 1885 de 2015".

- ***Señalización de primer nivel:***

"Corresponde a la señalización informativa general (pasa vías en tela) que se ubican en diferentes puntos de la localidad sobre las vías principales de acceso al corredor intervenido, informando sobre la obra en forma general.

Esta señalización se debe entender como señalización promocional del cierre vial, la cual tiene como fin, poner en conocimiento a la comunidad la intervención a iniciar; únicamente debe contener información relacionada con la intervención, sin avisos publicitarios de ninguna índole".

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890104625-1

186-1-818

Figura 2. Señalización de Primer Nivel.

FUENTE:



ELABORACIÓN PROPIA TEXTO EJEMPLO.

“Las dimensiones serán definidas por el mensaje y el tipo de letra utilizado en cada caso, siguiendo las especificaciones dadas por el Manual de Señalización Vial vigente.
A continuación, se describen algunas recomendaciones para su diseño e implementación:

- Su dimensión no debe superar los ciento cinco (105) centímetros de ancho, por un largo igual o menor al ancho de la calzada a informar.
- La altura mínima sobre la calzada debe ser de cuatro metros con cincuenta centímetros (4,50m).
- Deberán ser elaborados en tela o materiales similares y sostenidos en la parte superior e inferior por una estructura rígida. No se podrá instalar un pasacalle elaborado con materiales reflectivos.
- El color de fondo del pasacalle debe ser naranja y las letras de mensaje de color negro. El mensaje será suministrado por la Entidad de acuerdo a las necesidades de las intervenciones.
- Los textos serán máximo de 2 renglones y los pictogramas utilizados deben ser diseñados de acuerdo al Manual de Señalización Vial – Ministerio del Transporte y estarán de acuerdo al mensaje a transmitir.
- Las letras de los textos deben ser en mayúsculas, se utilizará alfabeto tipo E, con altura de 30cm, los pictogramas, la separación entre letras y palabras deben ser las establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente – Ministerio de Transporte.
- No podrán ser ubicados sobre intersecciones viales, follaje de especies arbóreas, elementos de señalización vial, semáforos, sitios de interés cultural, entre otros.
- Todos los pasacalles deben contar con un soporte en los laterales del mismo con madera que permitan tener un soporte al pasacalle

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890.104.625-1

186-1-818

Figura 3. Despiece de Señalización de Primer Nivel.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Se adjunta registro fotográfico del pasacalle instalado por la Unidad de Mantenimiento Vial. Ver Foto 2 Pasacalle Unidad de Mantenimiento Vial.



Foto 2 Pasacalle Unidad de Mantenimiento Vial.

Se remiten la información bajo los parámetros de la UAERMV en su ***FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS.*** *"SERVICIO DE LITOGRAFIA Y/O TIPOGRAFIA PARA IMPRESIÓN DE PASACALLES, VALLAS INFORMATIVAS, PIEZAS DE DIVULGACIÓN E IMPRESOS PARA EL PROYECTO. "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". BOGOTÁ D.C., 2021,* con el fin de ser implementados por el Consorcio Gaviones 95.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890.104.625-1

186-1-818

Una vez se tengan los diseños de las vallas informativas móvil y del pasacalle, el Consorcio haga llegar a interventoría y a la Unidad de Mantenimiento vial el arte para revisión y aval, y poder ser implementados en los tramos viales a intervenir por ustedes.

Con lo relacionado se le recuerda al Consorcio Gaviones 95, dar cumpliendo con las obligaciones establecidas por el componente, requeridos para el buen desarrollo de las actividades, que el incumplimiento de estas puede ocasionar que se le adelanten posibles incumplimientos al contratista de obra.

Atentamente,



ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexo: Fichas Técnica Dieciséis (16) Folios

C.C: José Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS- jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com
Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-839

Bogotá D.C. 27 de agosto de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
info@promotorapuga.com
Bogotá D.C

Referencia: *"*CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde).*

Asunto*:* *Presunto incumplimiento por la no instalación de Pasacalles y vallas informativas móviles informativos.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Consorcio Gaviones 95.

Por medio del presente comunicado la interventoría, realiza un presunto incumplimiento al componente social y técnico debido a la falta de gestión y cumplimiento que se ha presentado, en lo relacionado a continuación:

1. La interventoría ha solicitado la reposición e instalación de los pasacalles y vallas móviles el cual está establecida contractualmente en el **ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)** página 34***" Pasacalles Informativos de Inicio/Fin, El contratista deberá suministrar, instalar y mantener los pasacalles en el inicio/fin de cada tramo a intervenir según las dimensiones descritas en el PMT, previa aprobación por parte de la interventoría".*** por tanto, la interventoría informa al Consorcio Gaviones 95 que debe realizará reposición en cuanto a pérdida o daño de las ya instaladas por la UAERMV e instalará en los sitios que inicie actividades de obra por el Consorcio, pero esto no indica que reemplace la valla informativa móvil, por cuanto que esta también debe realizarse la instalación de acuerdo a ANEXO 1- ANEXO TÉNCNICO donde indica, en la página 114, numeral 10 Señalización ***"Son de cargo del proponente favorecido todos los costos***

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-839

requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas de inicio/fin de cada tramo, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes".

De acuerdo a lo anterior la interventoría solicita la instalación de los pasacalles del tramo vial de Laguna Verde y reposición del pasacalle del tramo vial de Capitolio y las vallas informativas móviles de Laguna Verde y cuando se inicien actividades de obra en el tramo vial de Capitolio, como esta está establecido contractualmente en el anexo 1 – Anexo Técnico de obra.

Cabe aclarar que la interventoría ha solicitado la reposición e instalación de los pasacalles y vallas móviles en reiteradas ocasiones mediante comunicados 186-1-742, 186-1-724, 186-1-729, 186-1-792, 186-1-793 y en comités de seguimientos de obra integrales que se han realizado desde el reinicio del contrato del año en curso y el Consorcio ha indicado que se está a la espera por cuanto que ya se realizó la requisición y a la fecha de entrega de este comunicado no se ha realizado la instalación ni reposición de lo mencionado.

De igual manera la interventoría radico el comunicado 186-1-818, donde Traslado de FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS. (Valla informativo móvil y pasacalles) el cual la entidad contratante ***UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, (UAERMV),*** realizó entrega.

Quedamos atentos a cualquier comentario que al respecto se presente. Con lo relacionado se le recuerda al Consorcio Gaviones 95, dar cumpliendo con las obligaciones establecidas por el componente, requeridos para el buen desarrollo de las actividades. El incumplimiento de estas puede ocasionar que se le adelanten posibles incumplimientos al contratista de obra.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexo: N/A

C.C: José Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS- jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com
Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

A3

- *Trazabilidad pantallazo de entrega y aprobación del volante informativo de invitación a reunión de comité de participación ciudadana y volante informativo de cierre vial de obra en el tramo vial de Laguna Verde.*
- *Comunicado 186-1-810 - 13 de agosto del 2025.*

Gmail intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>

Canales de atención

3 mensajes

residente social cg95 <atencioncomunidadlvcg95@gmail.com> 1 de agosto de 2025, 21:48
Para: intersumapazsocial161@gmail.com

Cordial saludo.

Envío adjunto volante canales de atención al ciudadano en obra.

Atentamente,

Andrés A García

2 adjuntos

Puntos de Atención al Ciudadano.pptx
184K

Puntos de Atención al Ciudadano-1.pdf
221K

intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com> 2 de agosto de 2025, 10:07
Para: residente social cg95 <atencioncomunidadlvcg95@gmail.com>

Buenos días Andrés
Cordial saludo
Una vez revisado el volante informativo de puntos de atención a la comunidad, la interventoría da aval para fines pertienentes.

Cordialmente,
Isabel Bernal Yasso.
Profesional Social.

residente social cg95 <atencioncomunidadlvcg95@gmail.com> 2 de agosto de 2025, 10:29
Para: intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>

Muchas gracias.
[El texto citado está oculto]

Gmail **intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>**

Intervención alcantarilla K0+305

1 mensaje

residente social cg95 <atencioncomunidadlvcg95@gmail.com> 12 de agosto de 2025, 15:07
Para: intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>

Cordial saludo.

Envío adjunto volante para tu revisión y aprobación intervención alcantarilla abscisa K0+305.

Cordialmente,

Andrés A García

construcción de alcantarilla K0+305 -AGOSTO.pptx
185K

Gmail **intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>**

Volante abscisa K0 +132

2 mensajes

residente social cg95 <atencioncomunidadlvcg95@gmail.com> 7 de agosto de 2025, 17:24
Para: intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>

Buenas tardes.

Envío adjunto volante con el ajuste solicitado.

Atentamente,

Andrés A García

construcción de alcantarilla K0+132 -AGOSTO-1.pptx
185K

intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com> 7 de agosto de 2025, 19:26
Para: residente social cg95 <atencioncomunidadlvcg95@gmail.com>

Buenas noches Andrés
Cordial saludo

Una vez revisado el volante informativo de cierre vial en la abscisa K0 + 132, de Tramo vial de Laguna Verde, la interventoría da aval para fines pertinentes.
quedo atenta a comentarios.

Cordialmente,
Isabel Bernal Yasso.
Profesional Social.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-810

Bogotá D.C.13 de agosto de 2024.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
info@promotorapuga.com
Bogotá D.C

Referencia: *"*CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.).*

Asunto*:* *Llamado de atención por cierre vial Laguna Verde.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Gaviones 95.

Por medio del presente comunicado la interventoría, realiza un llamado de atención al componente social y técnico debido a la falta de gestión y cumplimiento en la entrega de piezas divulgativas entregadas a la comunidad por cuanto que:

El día 12 de agosto del 2025, el consorcio Gaviones 95, hace llegar a la interventoría un volante informativo por correo electrónico, donde notifica que "informa que el miércoles 13, jueves 14 y el viernes 15 de agosto del año en curso, el tramo vial Laguna Verde tendrá cierre total, debido a excavación e instalación de tubería de 36", por alcantarilla existente ubicada en la abscisa K0 +305, frente al predio de la familia Baquero el cierre total del tramo vial iniciara a partir de la 7:00 a.m. del miércoles 13 de agosto, hasta el viernes 15 de agosto a las 5:00 p.m."

La interventoría ha solicitado en reiteradas ocasiones que la entrega de información a la comunidad de cualquier actividad técnica sea de 5 a 3 días con anticipación. Así mismo se debe garantizar el paso de rutas escolares, ambulancias y el transporte del mercado.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-810

En reiterados comités la interventoría ha informado que se debe manejar unos planchones para garantizar el paso del transporte mencionado anteriormente, esta información es entregada a la comunidad en las reuniones realizada.

Con lo relacionado se le recuerda al Consorcio Gaviones 95, dar cumpliendo con las obligaciones establecidas por el componente, requeridos para el buen desarrollo de las actividades, que el incumplimiento de estas puede ocasionar que se le adelanten posibles incumplimientos al contratista de obra.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexo: N/A

C.C: Jose Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

A4

- *Comunicado 186-1-838 observaciones actas de vecindad de apertura.*

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-838

Bogotá D.C. 27 de agosto de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
info@promotorapuga.com
Bogotá D.C

Referencia: *"*CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde).*

Asunto*:* *Respuesta a entrega de "actas de vecindad de San Antonio 1, Capitolio, Laguna Verde" Actas de compromiso de Tramo vial de Capitolio" Consorcio Gaviones 95.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Consorcio Gaviones 95.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Social, de acuerdo con lo establecido contractualmente en el anexo técnico, contrato y el plan de gestión sociales fichas – PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV. En respuesta a la entrega de actas de vecindad de apertura de los tramos viales de:

- ✓ San Antonio: 13 actas de vecindad de apertura.
- ✓ Capitolio: 18 actas de vecindad de apertura.
- ✓ Laguna Verde: 5 actas de vecindad de apertura
- ✓ Capitolio: 16 actas de compromiso del frente de obra
  5 actas de Control de asistencia externa

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-838

los cuales fueron entregados a la mano el 4 de agosto del 2025 en una AZ, en respuesta a lo relacionado en el asunto, se tiene las siguientes observaciones:

Actas de vecindad de apertura

1. Se encuentran sin información en algunas casillas, subsanar.

2. Algunas actas se encuentran sin cierre, subsanar.

3. Las actas de Laguna verde se encuentran incompletas, de acuerdo al inventario entregado por la Unidad de Mantenimiento Vial, indican que el total de predios es de 16 por tal motivo el total de actas de apertura son 16 actas, como se muestra en la captura de pantalla.

	PROPIETARIOS LAGUNA VERDE	
1	María Claudia Martinez	3133749105
2	Raul Martinez Pabon	321 372 7699
3	Feliza Pardo Romero	3175737038
4	Arnolfo Martinez	
5	Pricila Hilarion	
6	Lucila Martinez	
7	Tirzon Martinez	
8	Fidel Martinez Hilarion	3223904187
9	Miriam Vaquero y Yaneth Vaquero	
10	Tobias Pabon	
11	Humberto Contreras	3112961230
12	Carlos Contreras	3102566923
13	Luia Alejandro Mrtinez	3336507685
14	Bonifacio Hernandez y Ana Ortega	3109759884
15	Carlos Rios	
16	Familia Garcia	

Actas de compromiso del frente de obra de Capitolio.

1. EL Consorcio Gaviones 95 hace entrega de 10 actas de compromiso de apertura de acopios de acuerdo al recorrido socio- ambiental realizado el 14 de mayo del año en curso, las actas entregadas coinciden con el recorrido realizado, no se evidencia el acta del K2+490. No se evidencian las actas de gestión adelantada cierre de acopios de estas mismas actas. La interventoría solicita realizar su entrega.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053203027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-838

2. El consorcio Gaviones 95 hace entrega de 6 actas de permisos de perfilación de Talud. No se evidencian las actas de gestión adelantada de estos permisos. La interventoría solicita realizar su entrega.

3. En general mejorar el pegue de las fotos, puesto que algunas se ven despegadas y hojas rotas.

Actas de control de asistencia externa.

1. El Consorcio hace entrega de 5 actas en el formato de control de asistencia externa, la descripción se encuentra incompleta, se encuentran sin firma del profesional, el formato está incompleto, sin fechas, sin hojas de firmas, revisar y subsanar.

2. El separador indica que son actas de compromiso de cierre de capitolio, verificar la información, no son actas de compromiso.

3. Se recuerda al Consorcio que los cierres de las actas de compromisos se realizan en actas de gestión adelantada.

4. La interventoría solicita mejorar con la presentación de los documentos por cuanto que algunas hojas se encontraron rotas, sucias, arrugadas, ni con enmendadura, ni corrector.

   Se recuerda que los formatos son documentos públicos.

Con lo relacionado anteriormente se solicita que el Consorcio Gaviones 95, allegue a la interventoría ajustes al informe por cuanto que se evidencia que no se completó lo solicitado, hacer entrega en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexo: Actas de vecindad de apertura San Antonio 13, Capitolio 13, Laguna Verde 5. Actas de compromiso 16 de Capitolio, Actas de control de asistencia externa. Cientos cincuenta (150) Folios.

C.C: José Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS- jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com
Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ACTAS DE VECINDAD INICIALES DE OBRA

SAN ANTONIO

CIV

20076253

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No: 01

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE	N/A			OTRO: TIPO DE INTERVENCIÓN	Obras Hidráulicas - Acta de vecindad.
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO	N/A		N/A		

FECHA	LOCALIDAD	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL 2018	BARRIO	NOMENCLATURA	PREDIO DE FUENTE	CC (NIT O IDENTIFICACIÓN)	FR
	Suba	27	Fuente del Mercado	Antonia Km 3 + 850 - Km 4 + 1	Antonia	80076203	?

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA)

Julio Armando Moreno											
1		1		3118647127		-					
			NO		1 Casa NO 2 Casa Si		Si				?

NOMENCLATURA		VIAS AFECTADAS		CARACTERÍSTICAS DE LA CASA		UNIDADES
			✓		NO	Ubicación Casa Km 3 + 480
	✓				NO	Inicio del Predio Total Km 3 + 850
Predio	✓					

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA)

Componente	Afectación		Descripción de la afectación
	SI	NO	Primera Casa madera - segunda casa en bahareque en multiples aplicaciones
	SI	NO	Predio Casa madera, segunda casa predio FLEX 100 - Predio Total de mampostería
	SI	NO	1 Casa Si, segundo no
	SI	NO	NA

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA)

Componente	Afectación		Descripción de la afectación
	SI	NO	NA
	SI	NO	Tala de Gnc. Primera Casa
	SI	✓	No aplica

RESPONSABLE PREDIO	Andrés Alberto García Andrés Alberto García C.C 79.256111	PROPIETARIO (PARA CTE)	Julio Armando Moreno 79378528
RESIDENTE TÉCNICO		RESIDENTE ACTUAL O ENCARGADO DE LA OBRA	

NOTA: Si alguna casilla del acta no aplica, marcar con la palabra NO APLICA.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otros

Este área se encuentra compuesto por dos casas, la primera casa se encuentra estructurada por un sistema en madera o madera activo se observa bodega de aguas lluvias (canaleta metálica), en la parte superior y cubierto en teja de zinc ingresa al predio piso en piso se observa en el denominado concreto pobre y otra parte en madera primera parte evaluada cocina, piso recubierto en concreto y madera, muros en madera y cielo raso expuesto viga en rollizos de madera cubierto en teja de zinc, alcoba N° 01 piso en madera, cubierto con tapeta plástico, muros en madera que expone papel de celoducto, esta alcoba expone ventanal marco metálico que expone ausencia de dos vidrios los demás vidrios son lisos y modificados puerta de acceso del predio en madera, cielo raso en madera, la cocina y esta habitación expone puerta de acceso en madera baño en el exterior expone puerta de acceso metálica, piso en baldosa, muros a una altura de 1,90 enchapados parte restante en pañeta-pintura, cubierto en teja de zinc, estado de baldosa tanto del piso como de los muros en buen estado, cabe anotar que el baño expone muros en pañeta-pintura y presenta ventana corrediza, marco en aluminio piso en concreto muro lateral externo, expone desgaste de pintura, cubierto en teja de zinc. casa N° 02, en bodega del corredor de acceso, alcoba N° 01 piso en tierra, muro recubrimiento en pañeta-pintura que, debido al paso de tiempo se observa conformados por listones de madera, cielo raso expone madera viga en madera rollizos y paral de madera, alcoba dos piso, muros y cielo raso en madera, alcoba 3 identificada con piso, muros y cielo raso en madera, apoyado en rollizos de madera.

Estado de cerca: → Kilometro y mangueras.

El señor Armando informa que su predio llega hasta el río pilar, informa que esta conformado o se divide aproximadamente 300 fanegadas y no tiene cerca en la totalidad del área, solo a dos veces de la cerca, en el costado izquierdo subiendo desde el río pilar se observan dos líneas eléctricas, luego se observa área sin cerca y nuevamente, se retoma dos líneas eléctricas, se observa costado izquierdo, parales de madera una sola línea eléctrica, en el costado derecho todavía no se observa cerca, costado izquierdo dos líneas eléctricas, continuamos el recorrido y en el costado izquierdo se observan dos líneas eléctricas y en el derecho una línea eléctrica, luego se observa costado derecho dos líneas de alambre de pua, costado izquierdo dos líneas de alambre de pua, parales de madera en buen estado, sin inclinación, cerca viva.

Julio Armando Gómez

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-018	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No.: 02

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, identificada con el NIT 900770750-7, en ejercicio de sus funciones y competencias establecidas en la Ley 1801 del 2016 y en el Acuerdo 761 de 2020, artículo 22 del presente acto administrativo, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Contrato de Obra No. 1625 de 2023 suscrito entre la UAERMV y el Consorcio Vías Capitales 2023, cuyo objeto es: "Rehabilitación y/o mantenimiento de la malla vial local e intermedia de la ciudad de Bogotá D.C. - Localidad Sumapaz", se procede a realizar la presente acta de vecindad, con el fin de identificar el estado de las edificaciones colindantes a la zona de intervención, con el fin de verificar el cumplimiento de la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra página web: www.rehabilitacionvial.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A			OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	drenajes hidráulicos
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	PREFIJO DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN MAT (CIM):	PK:
	Sumapaz	C. Río Sumapaz y San Antonio	K8 + 500		capitolio	20076253	

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del propietario o tenedor:	Wilfor Lara	# Teléfono:		Dirección:	K8 + 500				
No. de pisos del predio:	1	Frente: 1	# Celular:	3125838397					
Año aproximado de construcción del predio y/o la cerradura (según sea el caso):	1970	Edificación construida o remodelada recientemente:	NO	La estructura presenta fisuras internas o externas en fachada o al interior del predio:	NO	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	NO	No presenta humedad o grietas visibles:	NO

SERVICIOS PUBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Acueducto	X	1. Residencial	X	¿Habitan personas en condición de discapacidad?	NO	Impacto a la primera vivienda placa flotante en concreto, columnas en madera anclada al suelo
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía	X	3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	NO	
4. Gas	Movil	4. Institucional				
5. Teléfono	Prepa.	5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación: SI	Afectación: NO	Descripción de la afectación:
Estructura y columnas en ladrillo			En madera
Muros			En madera
Cubierta en teja			En madera
Ventanería			En madera

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación: SI	Afectación: NO	Descripción de la Afectación:
Andén en concreto			NA
Vía en pavimento flexible			Madera
Bordillo en concreto			NA

ABOGADO:	Andrea Alberto Ciaca Andrea Alberto Ciaca 79'756'111	PROPIETARIO / TENEDOR:	Wilfor lara 11245318
ARQUITECTO TÉCNICO:		RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA (SI APLICA):	

NOTA: La(s) persona(s) que aparece(n) en el presente documento autoriza(n) el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con los fines establecidos en el mismo.

Rubys Ruiz
R. Social
UAERMV.

(3)

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-018	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otras

Descripción de la fachada: fachada que expone madera, adosada a la fachada expone madera de la vía, Cubierta en teja de zinc, ingreso piso en concreto y madera, muro divisorio en madera izquierdo del ingreso, techo, no fue posible observar, tiene habitaciones y la cocina, debido a falta de llaves, cerrada en madera que expone bolsas de agua lluvias, canaleta: Cubierta en teja de zinc y cubierta en teja de zinc, habitado exteriormente / la vivienda.

segunda vivienda

construida en madera, expone Cubierta en teja de zinc, bolsas de agua lluvias, canaleta en PVC, ingreso al predio, cocina piso, muros y cielo raso en madera, segunda habitación piso en madera, cubierta con plástico, primera habitación, construida en madera, piso cubierta con plástico, muros cubiertos con grafiti, segunda habitación en madera, piso, muros y cielo raso, se observa en las mismas condiciones de la habitación anteriormente descrita, puerta de acceso en madera, baño piso, muros en madera cubierta con plástico, Cubierta en teja de zinc. puerta de acceso en madera

Bodega En madera, Cubierta en teja de zinc, ingreso a la bodega piso en madera, muros madera, cubierta en teja de zinc. apoyada en madera.

Estado de cerca: costado izquierdo expone, Cerca viva, una línea galvanizada costado derecho no presenta cerca.

* Respecto a la primera vivienda, se evidencia placa flotante en concreto, columnas de madera ancladas al suelo de manera independiente, con vigas de soporte, también se evidencia VIDRIOR para evidencia placa deteriorada por meteorización natural.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GAFRA-FM-010 VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 03

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, identificada con el NIT 899.999.081-6, actuando en su calidad de Gestor Catastral, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 y en el Decreto Nacional 1983 de 2019, que modifica el artículo 2.2.2.2.1 del Decreto 1170 de 2015, y en desarrollo de la Resolución 1040 de 2023 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, informa a la comunidad que se realizará el proceso de actualización catastral en el municipio de Sumapaz, Cundinamarca.

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN

MEJORAMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE	N.A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE	N.A	Situaciones imprevistas que dificulten la movilidad (Derrumbes)	?	OBRAS COMPLEMENTARIAS	obras hidráulicas
MEJORAMIENTO CONCRETO RÍGIDO	N.A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO	N.A				
CICLA	LOCALIDAD	Unidades Planeamiento Rural (UPR)	BARRIO	NO CONSTRUCTURA	PREDIO DE INTERVENCIÓN	CHIP O No CATASTRAL (SI APLICA)	PK
	Sumapaz	Cuenca del Rio Sumapaz	?		Sin Nombre	20076253	?

2. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (A) SEGÚN CORRESPONDA):

	Manuel Torres				K10 + 900
			pn/WL 3125838397		
APLICACIÓN PQRSDO	ONU ACTUAL		CARACTERÍSTICAS DE ACCESIBILIDAD		OBSERVACIONES
?	Residencial	?	¿Habitan personas en condición de discapacidad?	N.A	Evaluación Estado de la Vía.
	Comercial				
	Industrial	?	¿El predio cuenta con garaje privado?	N.A	
	Institucional				
	Lote	?			

3. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (A) SEGÚN CORRESPONDA):

Construcción	Afectación		Descripción de la afectación
	SI	NO	N/A.
	SI	NO	N/A.
	SI	NO	N/A.
	SI	NO	N/A.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (A) SEGÚN CORRESPONDA):

Infraestructura	Afectación		Descripción de la afectación
	SI	NO	?
	SI	NO	?
	SI	NO	?

RESPONSABLE SOCIAL	Andrés Alberto Garcia Posada C.C. 79.736.111	ACOMPAÑANTE COMUNITARIO	Pr Wilfor Lara 11245318
REPRESENTANTE LEGAL		RESIDENTE SOCIAL PARA ESTUDIOS DE SUELOS	

*NOTA: Si no desea firmar el acta, por favor manifiéstelo al responsable social para dejar constancia de la situación presentada.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otras

se realiza recorrido con el señor Wilfer Leiva por el predio del señor Manuel Tellez, realizando el recorrido de manera mayor a menor. se observa cerca viva tres alambres de pua y luego de ahí dos alambres de pua cerca viva.
También se realiza recorrido de menor a mayor y costado izquierdo.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 04 Construcción

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	UPZ:	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Hidráulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A	Pamplonita	N/A	

FECHA:	LOCALIDAD:	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (IDV):	PR:
	Sumapaz	Cerro Suroeste - San Antonio	K11+000	Izquierdo	20076253	

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (1) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Ocupante:	Teléfono:	Dirección:
X Colegio Gimnasio del Campo Sede Básica Ciclo Tres - San Antonio 1.	- 3003596402	K11+030

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
Agua		1. Residencial		¿Existen barreras de tipo físico, de arquitectura?	NO	No se encuentra con firma, fue el acta fue legalizada en dos días, el segundo día no se encontro ala Prof. Jemy Estepa.
Alcantarillado		2. Comercial				
Energía		3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	No	
Teléfono		4. Institucional	✓			
Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación
Cimentación (cimientos y sótano)	SI	NO	Deficiente natural
Fachada	SI	NO	Deficiente, algunos apoyos como lo es el Comedor, hay donde se inicio remodelación inicial - Piso en madera mal aislado y humedad por temporada invernal ventanas de diferentes materiales metálicos y aluminio.
Cubierta (techo)	X	NO	
Antejardín	SI	X	N.A

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación
Cuneta, sardinel, bordillo o separador	SI	NO	N.A.
Calzada (vía)	SI	NO	Diferentes tipos con desagoste natural
Andenes y/o zonas verdes	SI	NO	en. tierra.

RESIDENTE SOCIAL:	Andrés Garcia Andres Alberto Garcia 1973611	PROPIETARIO / TENEDOR:	Yenny Paola Estepa Yenny 1018406392
RESIDENTE TÉCNICO:		RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA O UNIDAD EJECUTORA:	

Firma Fecha

NOTA: 1. Anexar fotos de los daños preexistentes. Tener suscritos el resultado de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su Contratista.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD
	CÓDIGO: INFRA-FM-016 VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica entre otras

Fachada del Colegio Fachada en pañete-pintura de izquierda a derecha expone puerta de acceso metálica, expone un poco de óxido, expone también leve exterior metálica, vidrio martillado en buen estado luego expone otro área en pañete-pintura que expone puerta de acceso metálica, leve exterior vidrio liso en buen estado, luego expone dos ventanales, marcos metálicos leve exterior metálica, vidrios lisos y expone otro ventanal marco y leve exterior metálica, vidrios lisos en buen estado en el extremo derecho fachada que presenta pañete-pintura, puerta metálica, ventanal marco y leve exterior metálica, vidrios en buen estado, anden en granito e interiormente en concreto que expone multiples zonas placa de entrepiso recubierto con machimbre, en algunas áreas este recubrimiento se encuentra en mal estado. lateralmente expone ventanal marco y leve exterior metálica en pañete-pintura, vidrios en buen estado, lateralmente en pañete-pintura, desprendimiento de pintura frente inferior expone dos ventanales el primer ventanal expone vidrios martillados en buen estado, marco y leve exterior metálica el otro ventanal vidrios lisos, martillados, leve exterior metálica un vidrio presenta afectación, parte posterior en pañete-pintura expone puerta de acceso metálica anden en granito que expone fisuras, placa de entrepiso recubierta con machimbre, techo de cinc, expone ventana corrediza marco en aluminio y metálico en la parte superior ventana tipo proyectante en el extremo izquierdo expone puerta de acceso metálica vidrio superior martillado, en pañete-pintura, lateralmente construcción posterior en pañete-pintura dos vidrios pequeños martillados en buen condición, solo 1 poseen madera, muros pañete-pintura - placa, de entrepiso en machimbre cielo raso presenta manchas de humedad en la parte inferior por tal motivo pedido de pintura, solos 3 poseen madera muros pañete-pintura, placa de entrepiso recubierto con machimbre, pisos expone afectación muros sin fisuras, sin grietas, extremos izquierdo pisos en baldosas, muros pañete-pintura, placa de entrepiso recubierto con machimbre, Alcoba 1 cerrada pisos en baldosas, muros pañete-pintura placa de entrepiso recubierto con machimbre puerta de acceso metálica, expone vidrio superior martillado en buen estado pedido de quitado cielo raso manchas de humedad parte inferior y superior, Alcoba 3 pisos en madera, muros recubiertos con madera placa del entrepiso recubierto con machimbre.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - FAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otros

Centro de conectividad.
construcción prefabricada en material mixto, rampa de acceso en pvc y madera con recubrimiento de pintura, se denota desgaste natural cubierta en. zinc con recubrimiento de pintura.
cerradura lateral en pvc sin fisuras a la vista. Estructura elevada con cimientos en concreto. no se observa deterioro, ventanería en aluminio no presenta deterioro en marco y vidrio. Puerta de ingreso Metalica con recubrimiento de pintura sin deterioro
Internamente se observa piso en lamina pvc, deterioro natural, recubrimiento en pvc de columnas y vigas, buen estado.
se observa dos casos en madera, columnas y vigas en madera, deterioro natural, debido a la alta humedad de la localidad (lagos).
Cielo raso en Cartón y en madera, se observa tallado en zinc presenta deterioro natural, fisuras en puertas, paredes, cocineta. Construcción Inestable en madera, recubrimiento con pintura posterior, presenta deterioro, se evidencia desprendimiento de láminas de madera, ventanería en aluminio en la parte lateral con rejillas de ventilación posteriormente se decepa láminas de madera, cubierta en teja de zinc.
La parte posterior del Colegio - muros mampostería, presentando deterioro puerta metálica del baño que presenta oxidación en la parte inferior, piso en concreto con multiples fisuras.
Cocina al interior del Colegio piso en baldosa, desgastada por uso constante, muros salpicados a una altura estimada de 1.90 para resistir pintura que presenta fisuras laterales y rayas de humedad, recubrimiento en cielo raso en dry-wall y en techo que es el interior del colegio, ya que exteriormente el colegio cuenta con cocina, es una de las bases descritas en esta acta, construcción en madera.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



17

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio: techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otras

Evaluación Estado de la Caso:
Parcialmente localizado de manera a moyenne, inicialmente se observa alto nivel de material adhesivo, luego se observa tres (3) líneas de alambre de pua y un área específica expuesta malla galvanizada.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CODIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No: 05- Vivienda

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE AFECTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	NA	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras hidráulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	NA	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	NA				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	Sumapaz	C. Rio Sumapaz	S. Antonio	?	S. Antonio	200 76253	?

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario / Habitante:	Dora Elsa Morales Dimate	N° Teléfono:		Dirección:
N° Predio:	1	Estrato: 1	N° Celular: 3508590324	K10 1820

N° aproximado de construcciones del predio con destinación diferente a vivienda:		Edificación colindante con medianera o construcción:	Casa un Constado	La edificación presenta fisuras interiores o exteriores en fachada o al interior del predio:	No	La edificación presenta grietas mayores a 1 cm en fachada:	No	Se requiere Puntal o grietas mayores:	No

USO(S) DE PREDIO:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	?	1. Residencial		¿Habitan personas en condición de discapacidad?	No	Vivienda que presenta humedad en pared posterior y mampostería.
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	No	
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componente	Afectación		Descripción de la afectación:
Cubierta (Material y color)	SI	NO	
Muros	SI	NO	Desgaste por paso del tiempo muros pañetados pintura/prefabricados
Ventanas y puertas	SI	NO	Desgaste por uso constante.
Cerramiento	SI	NO	

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componente	Afectación		Descripción de la Afectación:
Cerramiento provisional o definitivo	SI	NO	NA.
Andenes	SI	NO	NA
Separadores	SI	NO	NA.

RESIDENTE SOCIAL:	Nombre: Andrés A Garcia Apellidos: Andrés A Garcia posada Identificación: 79.756.111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Nombre: Dora Elsa Morales Dimate Apellidos: Dora Elsa Morales D Identificación: 21.075.742
RESIDENTE TÉCNICO:	Nombre: Apellidos: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Nombre: Apellidos: Identificación:

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con sus datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otras

Predio que expone dos tipos de materiales. Fachada: muros en bloque a la vista que expone dos ventanales, marcos metálicos, vidrios en buen estado, lisos, puerta de acceso principal metálica, vidrio martillado en buen estado, reja externa metálica, se observa cubierta teja translúcida, apoyada en cercha metálica. Lateralmente costado derecho se observa extremo izquierdo, bloque a la vista, ventanal marco metálico, reja externa, vidrio en buen estado, cubierta en teja de asbesto cemento. Luego se observa predio prefabricado que expone dos ventanales marcos metálicos, reja externa metálica vidrios en buen estado. Posteriormente se observa predio prefabricado, dos ventanales marcos metálicos, reja externa también metálica cubierta en teja de asbesto-cemento. Lateralmente costado izquierdo expone predio prefabricado, en el extremo izquierdo expone ventanal marco metálico, reja externa, vidrio fijo roto. y en el extremo derecho vidrio pequeño martillado en buen estado, luego expone muros en bloque a la vista, ventanal marco metálico luego en extremo derecho se observa muros en bloque a la vista, ventanal marco metálico, reja externa, vidrio en buen estado, se observa chimenea de estufa de leña, en concreto en este tubo, de la chimenea.
Ingresa interna Área de sala-cocina: piso en baldosa, buen estado, muros pañete-pintura, cubierta placa de entrepiso en madera, existe un muro divisorio a media altura entre sala y cocina. Cocina piso en baldosa, muro lateral enchapado Mesón cocina también enchapado muros laterales frontal pañete pintura pañetado prefabricado, se evalua cada predio prefabricado piso en baldosa, muros prefabricados placa de entrepiso en madera baño sanitario metálico, piso enchapado, muros prefabricados red eléctrica tomacorriente en PVC, Alcoba 1 piso en baldosa, muros prefabricados placa de entrepiso en madera Alcoba 3 identicas características, se observa olor a humedad, en el predio construido en mampostería se observa desprendimiento de guarda escoba

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No: 05- Carca

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	NA	DIRECTIVO DE INTERVENCIÓN:	obras Hidráulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	NA	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	NA				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK:
	Ciudad Bolívar	Ciudad Bolívar	San Antonio	?	San Antonio	200253	?

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Doña Elsa Morales Dimaté	N° Teléfono:		Dirección:
N° Matrícula Inmobiliaria:		Estrato: 1	N° Móvil: 3508590324	K10 + 230

Área aproximada del predio (en metros cuadrados):	N/A	Edificación construida o temporalmente reconstruida:	N/A	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada:	N/A	La estructura presenta fisuras o grietas menores:	N/A	Observaciones:	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES:
1. Agua	?	1. Residencial	?	¿Habitan personas en condición de discapacidad?	NO	Acta de Carca Perimetral
2. Acueducto		2. Comercial				
3. Energía	x	3. Industrial	x	¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	NO	
4. Teléfono		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	NO	N/A
Muros	SI	NO	N/A.
Ventana y puerta	SI	NO	N/A
Cerramiento	SI	NO	N/A

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Configuración de andenes y sardineles	SI	NO	N/A.
Pavimentos	SI	NO	N/A.
Rampas de accesos	SI	NO	N/A

RESIDENTE SOCIAL:	Nombre: Andrés A. Garcia Nombre: Andrés Alberto Garcia Posada Identificación: C.C 79956111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Nombre: Doña Elsa Morales Dimaté Nombre: Doña Elsa Morales D. Identificación: 21.075.742
RESIDENTE TÉCNICO:	Nombre: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Nombre: Nombre: Identificación:

NOTA: Si hay otro tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-018	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otros

Se inicia recorrido con la señora Dora Morales con el fin de evaluar la cerca de su predio, costado izquierdo, la señora Dora informa que esta cerca esta más alejado de la fisura perimetral sin embargo unos metros adelante se observa dos hileras de alambre de pua, costado derecho tres hileras de alambre de pua, paralelas de madera y luego se observa costado izquierdo dos hileras de alambre de pua en regular estado, paralelas de madera costado derecho tres hileras de alambre de pua, paralelas de madera, a la altura de K10+414, en el costado izquierdo se observa tres hileras de alambre de pua, paralelas de madera, costado derecho, tres hileras de alambre de pua paralelas de madera, se observa costado izquierdo 3 hileras de alambre de pua, costado derecho tres hileras de alambre de pua, paralelas de madera, continúa presentando así; costado izquierdo tres hileras de alambre de pua costado derecho tres hileras de alambre de pua, paralelas de madera, a la altura de K10+820 no se observa cerca.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CODIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 06

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE	N/A		NA	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN	obras hidraulicas.
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO	N/A				

FECHA	LOCALIDAD	upz.	BARRIO	NOMENCLATURA	FECHA DE FIRMA	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN (VAL./DIV.)	PK
	Sumapaz	Fuente Nuevo Antonio		K10+230	Antonio	20016253	

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA)

Nombre del propietario	Nacho sanchez / Nolmar sanchez.				Predio prefabricado, tanque metalico, ubicado en Andesco Campesino.
No. de predio	1	1	3003975948		

USO DEL PREDIO	USO ACTUAL		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO		OBSERVACIONES
Residencial	X	Residencial	X	¿Hay vías de acceso peatonal?	NO	Acta N° 06: Es importante anotar que los tanques de acueducto Campesino, requieren impermeabilización
Comercial		Comercial			
Industrial	X	Industrial		¿Hay vías de acceso para vehículos?	NO	
Institucional		Institucional			
Lote	X	Otro ¿Cuál?			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA)

Propiedad	Afectación		Descripción de la Afectación
Muro Lateral Izquierdo	X	NO	Prefabricado con desgaste natural
Muro Lateral Derecho	X	NO	Prefabricado con desgaste natural.
Cubierta		NO	Muros Metalicos.
Antejardín		NO	NA.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO PÚBLICO (ANTEJARDÍN O VÍA) (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA)

Elementos	Afectación		Descripción de la Afectación
Andén		NO	NA.
Bordillo		NO	tanques de acueducto
Calzada Vía		NO	En tierra.

RESIDENTE ENTREGA	Andrea Garcia 79'736'111 C.C 79-736 111	VECINO/A QUE RECIBE	Nelly Moreno C.C. 20697127765 Predio Malo.
RESIDENTE RECIBE		FIRMA DE CONFORMIDAD DE APLICA	

* NOTA: Si hay errores con los datos aquí registrados favor dirigirse al responsable de esta acta de vecindad y una vez verificados se hará la corrección

(1)

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS
Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otras

Fachada vivienda prefabricada, expone tres ventanales marcos y reja externa metálica, puerto de acceso principal metálico, reja externa, cubierta en teja de asbesto cemento, cabe anotar que los (2) vidrios expone afectación, vidrios ubicados al costado izquierdo y derecho de la puerto de acceso principal lateral mente se observa dos ventanales marcos metálicos, reja externa metálica, se observa en los marcos rayas de oxidación algunas placas presentan faltamiento, posteriormente se observa tres (3) ventanales y marco metálico, reja externa metálica, muros en ciclopeo con concreto, se observa bolsones de aguas grises, lateralmente costado derecho identifica características descritas anteriormente, el predio tiene una longitud estimada de 8 metros, internamente se observa piso en concreto, muros prefabricados, cubierta en teja asbesto cemento apoyado en techo metálico, marcos de las puertas en metal puertas en madera, red metálico canalizado en tubo PVC. Expone tres habitaciones, cocina, baño, baño sin enchapa piso en concreto.

La descripción de la casa no la misma de la señora Dora Elsa Maglas, media de Robinson sanchez. el predio en encuentro en el predio de ella.

(2) VA.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO




REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

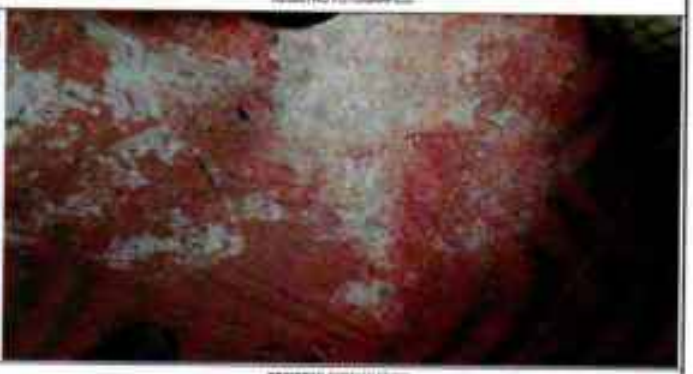

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No: 07

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	NA	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras Hidráulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	NA	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	NA				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PR
	Sumapaz	C. Rio Sumapaz	SAN Antonio	K10 + 230	SAN Antonio	76233	?

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:			N° Teléfono:	Dirección:
Mayo Pongos			3043460665	K10 + 230
En predio de (...años): 1	Estrato: 1			

Actualmente la infraestructura del (la) vía se encuentra:	SI	Edificación construida o remodelada recientemente:	NO	La estructura presenta fisuras mayores a 3 mm en fachada (Lat. interior del predio):	?	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada:	?	no presenta fisuras ni grietas visibles:	?

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES:
1. Agua	?	1. Residencial	X	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	NO	- Vivienda que presenta perdida de pintura - pintura en algunos muros de la Vivienda - Ventanas y techos
2. Acueducto		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	NO	
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Cimientos, columnas y vigas:	SI	NO	Desgaste por uso Constante
Paredes:	✓	NO	exposición Fisuras y grietas - perdida de pintura y pintura.
Techos y cubiertas:	SI	NO	Desgaste por uso Constante.
Ventanería:	SI	NO	N/A

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento, Bordillo o Sardinel:	SI	NO	NA
Pavimento:	SI	NO	NA
Portada de acceso:	SI	NO	NA

RESIDENTE SOCIAL:	Nombre: Andrés A Garcia Identificación: Andrés Alo-1o Garcia pozada 79176111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Nombre: Yanci Yamile Pardo Identificación: Yanci Yamile Pardo CC 1032401780
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA):	Firma: Nombre: Identificación:

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con sus datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

6. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado data cerámica,entre otros

Predio entechado por una bajanda en madera frontalmente, presente en el piso zona dura en concreto, expone cubierta tejo en zinc, apoyado en parales de madera, costado izquierdo expone en el extremo derecho madera y en el extremo izquierdo expone muro pañete-pintura que expone encopiado madera, de la luz, el muro presenta perdida de pañete-pintura, por tal motivo se observa alegue a la vista en la parte inferior frontalmente en el costado derecho se observa tablas de madera como cerramiento y en el extremo se observa muro en pañete-pintura que expone rastros de humedad. Lateralmente en el extremo derecho expone muro mampostería, pañete-pintura que expone inferiormente predio a la vista como base del predio presenta multiples fisuras y grietas no estructurales, por este motivo se observa perdida de pañete-pintura, que permite observar el alegue a la vista. tambien presenta dos ventanales, una ventana pequeña y en el extremo derecho ventanal marco metálico, vidrios en buen estado posteriormente expone muro en pañete, se observa alto grado de perdido de pañete permitiendo observar alegues a la vista externamente se observa el baño muros pañete-pintura, puerta de acceso metálico, cubierta en tejo de zinc. apoyado en parales de madera, baño piso en baldosa, ducha enchapado a una altura 1,60 metros, se observa perdido de piezas de baldosa.
internamente se observa piso en cemento semidado expone fisuras por desgaste, cocina piso en cemento semidado, muros pañete-pintura, muro frontal enchapado, placa de entrepiso cubierta con madera. Alcobas tres (3) no pudieron ser observadas

La descripción del estado de la casa es al mismo que se encuentra actualmente en la descripción del cercado de la señora. Nancy Yaneth Penagos. Ya que el predio de la señora Milyva Penagos (media de la señora Nancy) se encuentra desde la abscisa: Kg+650 hasta la abscisa: K10+350.

7

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO




REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

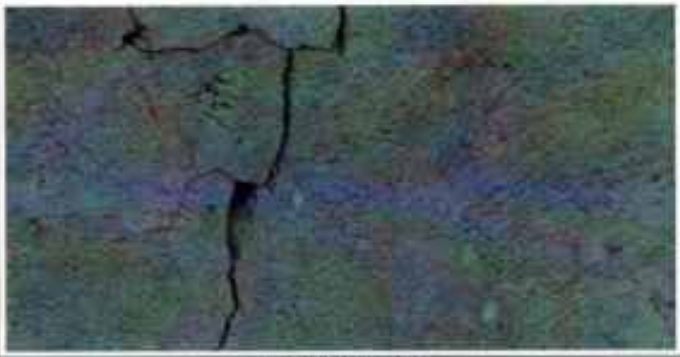

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-018	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CODIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 08 ramdo

INFORMACION RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACION PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A		N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	Obras Hidraulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N/A	REHABILITACION CONCRETO RIGIDO:	N/A				

FECHA	LOCALIDAD	UPZ	BARRIO	NOMENCLATURA	FRENTE DE OBRA:	CODIGO DE IDENTIFICACION VIAL (CIV):	PK
	Usaquén	492	C. Mesones - Antonio	K9 + 640	Capotillo	20076253	7

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA)

Nombre de Propietario o Poseedor	Nancy Yannett Pinto Reyes	Teléfono		Dirección	
No. de predio del predio	1	Lote 1	Celular 3043174305		K9 + 640.

¿Se requiere retiro de instalaciones del predio con el corredor vial o espacio público?	?	¿Este predio con edificio o construcción existente?	?	La edificación presenta fisuras o grietas?	?	La edificación presenta grietas mayores a 2 mm en elementos estructurales?		Se presenta filtración o goteras visibles	?

SERVICIOS PUBLICOS:		USO ACTUAL		CARACTERISTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES
Agua	X	1. Residencial		¿Hay personas en condición de discapacidad?	No	
Alcantarillado		2. Comercial				
Energía	X	3. Industrial		¿Es necesario cerrar la vía vehicular?	Si	Construcción / vacía
Gas Natural		4. Institucional				
Teléfono / Fibra Óptica	X	5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Cimentación visible / zócalo	SI	NO	Prefabricado - Desgaste natural
Muros	SI	NO	Prefabricado, - Chapas en algunas casas fachada, pisos de cantos
Ventanas y puertas	SI	NO	- Ventana, marco metálico
Cerramiento	SI	NO	- Balcones metálicos.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Cerramiento de predio / antejardín	SI	NO	NA
Andenes	SI	NO	Tela de Asbesto Cemento con desgaste natural
Bordillos de andén	SI	NO	Talludo natural

RESIDENTE SOCIAL	Andrés A García Andrés Alberto García 79.936.111	PROPIETARIO / ARRENDATARIO	Nancy Yannett Pinto Nancy Yannett Pinto 1042809128
RESIDENTE TÉCNICO		RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA (SI APLICA)	

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda por el asentamiento al respaldo de esta Acta de Vecindad, cite los daños asociados con su afectación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-018	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERIOR

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,pared azotea

Fachada del predio, vivienda antecedida por una baranda metálica, internamente se observa piso en baldosa, muros pañete-pintura, en la parte inferior expone enchape a una altura aproximada de 1 metro, expone cuatro ventanas marco metálico, extremo izquierdo expone ventanal marco metálico, vidrio, que presenta afectación luego expone otro ventanal, marco metálico, vidrios en buen estado. de izquierda a derecha expone puerta de acceso de dos hojas metálica que presenta vidrio fisurado. luego se observa dos ventanales del mismo marco metalico, vidrios en buen estado, en el extremo derecho se observa cocina que tiene acceso independiente presenta puerta de acceso principal metálica. vidrios en buen estado y en el extremo derecho ventanal, marco metalico vidrios en buen estado, las cuatro baldosas de baldosa de mt aproximado se encuentran en toda la fachada excepto en los muros laterales quedo escoba en baldosa. muros laterales pañete-pintura. Cubierta en teja de asbesto-cemento apoyado en techo metalica, instalación canalizada en PVC, se observa extremo construcción en madera dividido en dos espacios, en el costado izquierdo se encuentra parqueadero vehículo y en la parte derecha objetos varios, cubierta en teja de cinc y apoyado en techo de madera, lateralmente el predio expone pañete-pintura, parte inferior presenta descarte de pintura. y en el vidrio dos ventanas marco metálico, vidrio del ventanal extremo izquierdo expone afectación, posteriormente pañete-pintura, expone tres ventanales marcos metálicos vidrios en buen estado, en el extremo derecho se observa pintura longitudinal lateralmente pañete-pintura ventanal marco metálico vidrio en buen estado, el predio frontalmente expone bajante de aguas lluvias PVC. El predio en el extremo izquierdo exteriormente expone zona de lavado muro presenta riesgo de humedad. placa de entrepiso en PVC. red electrica canalizada en tubo PVC, posteriormente se observan múltiples fisuras leves longitudinales:

ingreso por la cocina: piso en baldosa, pañete-pintura muro izquierdo presenta fisuras leves, muro derecho 3 baldosas de enchape y mampostería, placa de entrepiso recubierta con PVC; piso-piso en baldosa, muros pañete-pintura, placa de entrepiso recubierta con PVC; puerta de acceso a esta área metálica; habitación derecha piso en baldosa, muros pañete-pintura, placa de entrepiso recubierta con PVC, puerta de Acceso habitación, en madera; cabe anotar que el predio presenta en sus muros placa deshabitada - bajo, piso y muros enchapado, placa de entrepiso en PVC:

(2)

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de cerámica,entre otras

Sala de ropas piso en baldosa, muros pared-pintura, placa de entrepiso recubierta con pisos difícil observación por multiples objetos volcados en esta área alcoba 3 puerta de alcoba en madera, piso en baldosa, muros pared-pintura, placa de cielo fibrolitado se observa dilatación muro derecho, habitación 3 piso en baldosa, muros pared-pintura (grafiti (ados). placa de entrepiso recubierto con pi(

-Por otra parte es importante señalar que el señor Nemecio Gonzalo es esposo de la señora Nancy yohanna pinto penagos.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFTA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No: 08 Garcia

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras hidráulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	NA	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	NA				

FECHA:	LOTE/LOBE:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	Lumo Park	C. Río Tunjuelo	Old Antonio Nariño	KR 1650 - KM 350	Antonio	200 7535	?

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:		# Teléfono:	Dirección:
Nancy Yaneth Prieto.		?	KR 1650 - KM 350.
NA	Estrato: 1	# Móvil: 3042174305	

Una vez inicie la intervención del predio con las cuentas NO TIENE	Edificación construida o remodelada recientemente	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada		No presenta fisuras o grietas visibles	

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua	?	1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	NA.	Evaluación estado del Cerrado.
2. Acueducto		2. Comercial	?			
3. Energía		3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	NA.	
4. Teléfono		4. Institucional				
5. Otro		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA: (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y muros)	SI	NO	NA
Fisuras	SI	NO	NA
Ventanas / puertas	SI	NO	NA
Cubierta	SI	NO	NA.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO: (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Andenes / Sardinel	SI	NO	NA.
Pavimento	SI	NO	NA
Parques / Zonas verdes	SI	NO	NA

RESIDENTE SOCIAL:	Nombre: Andrés Alberto Garcia Identificación: Andrés Alberto Garcia posada 79'756'111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Nombre: Nancy Yaneth Prieto Identificación: Nancy Yaneth Prieto cc 1014.89.94.280
RESIDENTE SST:	Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Nombre: Identificación:

*NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor relacionarlos al respaldo de esta Acta de vecindad con sus datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otros

Se realiza inspección con la señora Nancy Vanessa Pinto Arregoces Con el objetivo de evaluar el estado de la casa. 9:65a
Se realiza inspección a parte de la obra no terminada
Se nota de mayor a menor el grado de la zona a Nancy en ambos costados y la casa expone dos lineas de columbia de pvc y paletas de madera, en buen estado, costado izquierdo. El costado derecho expone 3 lineas de columbas de pvc y paletas de madera, en otros segmentos expone 2 lineas El costado izquierdo 9:80a expone casi dos columbas del pvc y una linea incompleta

Nancy Vanessa Pinto

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-018	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-018 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 09

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	REMBELLACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	SITUACIONES IRREVERTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N.A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	drenaje hidráulico.
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N.A	REMABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	N.A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	sumapaz	C. Rio sumapaz	san Antonio	K10 + 160	san Antonio	4007663	

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA)

Nombre de los Propietarios o Habitante:	Daira Molina / Daniel Molina	# Teléfono:	Dirección:
# predio del predio: N.A.	Manzana: 1	# Móvil: 3213019647.	K10 + 160

N.I.C. suministro de urbanización (si aplica) con la nomenclatura SDP-CHIP	N.A	Estratificación residencial o establecimiento residencial	N.A.	¿La edificación presenta fisuras, hundimientos o grietas en fachada o accesos del predio?	?	La estructura presenta grietas, hundimientos o fisuras en fachada		No presenta fisuras y grietas visibles	?

SERVICIOS PÚBLICOS		USO ACTUAL		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO		OBSERVACIONES
1. Agua	?	1. Residencial	?	¿Existen personas en condición de discapacidad?	N.A	- Predio - voluado. - retado de la Carca.
2. Alcantarillado		2. Comercio				
3. Energía	✓	3. Industrial	?	¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N.A.	
4. Telefonía		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA)

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación
Cubierta (columna y viga)	SI	NO	N.A
Puertas	SI	NO	N.A.
Ventana y puertas	SI	NO	N.A
Cerramiento	SI	NO	N.A.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA)

Componentes	Afectación		Descripción de la Afectación
Vía Peatonal (andén y sardinel)	SI	NO	N.A
Vía vehicular	SI	NO	N.A
Tiempo de ocupación	SI	NO	N.A

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrea A Garcia Nombre: Andrea Alexandra Garcia posada Identificación: C.C 79.756.111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: DR Nancy Yannely Pinto Nombre: Nancy Yannely Pinto Identificación: cc. 1072802280.
RESIDENTE TECNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otras

En el predio de la señora Sara Molina, existe una Cerca Viva por el alto Material arbustivo se dificulta observarlo. La señora Nancy Yaneth Prieto quien fue autorizada por el propietario de la finca manifiesta que es un predio pequeño y que la Cerca queda ubicada de la fachada principal hacia adelante que es pequeño el predio de Sara Molina, ya que queda en Colindancia con el predio de la señora Yaneth Prieto.

Al ingreso del predio hay observa Cerca viva dos lineas de alambre de pua.

se hace el recorrido de menor a mayor, en este recorrido se evidencia que la Cerca Cercana a la fachada perimetral expone tres lineas de alambre de pua, Cerca viva costado izquierdo.

Este predio se encuentra ubicado, detrás del predio de la señora Nancy Yaneth Prieto

Las Fotos presentadas exponen una Vivienda, no fue evaluada debido a que se encuentra ubicada de la fachada perimetral.

?

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 10

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N.A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	dotación hidráulicos
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N.A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	NA				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL UPZ:	BARRIO:	NOMENCLATURA:	PUENTE DE LÍNEA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	Sumapaz	C.no Sumapaz con Antonio	Desde K9+240 Hasta K11+240	Antonio	20076253		

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA)

Nombre de Propietario o Habitante:	o.g. Findo molina.						
		Estrato:	# Móvil: 3125655918.	K9 + 340 - K11 + 240			
Cerramiento:	N.A	Edificación construcción o infraestructura equipamiento:	N.A.	La edificación presenta grietas, fisuras o fallas en su estructura:		No. pisos de la edificación:	

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES:
Agua		1. Residencial		¿Existen barreras en el acceso de discapacitados?	N.A	Evolución estado del Cerco de dos predios K11+240 - K9+240
Alcantarillado		2. Comercial				
Energía		3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N.A.	
Telefonía		4. Institucional				
Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (vías, andenes y zonas...)	X	NO	NA
Fachada	X	NO	NA
Antejardines, cubiertas	X	NO	NA
Cerramiento	X	NO	NA.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento (andenes y zonas verdes)	X	NO	N.A
Pavimento	X	NO	N.A.
Arborización	X	NO	N.A.

RESIDENTE SOCIAL:	Nombre: Andrés A. García Identificación: Andrés Alberto García Pardo 79.796.111.	PROPIETARIO / HABITANTE:	Nombre: Pr Wilson lara CC 1123455318 Identificación: CC 1123455318.
RESIDENTE TÉCNICO:	Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA (SI APLICA):	Nombre: Identificación:

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en su vivienda, favor adscribirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD
	CÓDIGO: INFRA-FM-018 VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

A. DESCRIPCIÓN DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Suefre una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica entre otros

En recorrido realizado por el predio del señor Digifredo Molina, acompañado por el señor Wilfer Lara evidenciado por el señor Molina. El señor Wilfer Lara informa que el predio se denomina La Soledad, se observa abundante material arbustivo a.n. Cq. Cq, su ubicación es Km 1 + 340.

segundo predio del señor Digifredo Molina se ubica en el Kq+100 inicialmente en el costado izquierdo se observa dos hilos de alambre de pua rollizos de madera y en el costado derecho se observa Cerca viva con dos alambres de pua en el costado derecho también se observa trinchos, obras de Bioingeniería que tienen como objetivo contener la tierra en el costado izquierdo, se continúa observando dos alambres de pua rollizos de madera luego en el costado derecho se observa nuevamente trinchos y Biomanto luego en el costado izquierdo se observa ondina de alambre liso en el costado derecho se observa árbol mediano luego se observa en el costado derecho dos hilos de alambre pua y Cerca viva postes de madera en el costado izquierdo se continúa observando alambre liso.
En la abscisa Kq + 340 en el costado izquierdo se observa abundante material arbustivo y en el costado derecho se observa rollizos de madera dos hilos de alambre de pua, pero luego se presenta alambre liso.

Km 1 + 340 Costado derecho e izquierdo
Kq + 100 - Kq + 340 Costado derecho e izquierdo.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



47

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CODIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD N.: 11

INFORMACION RELATIVA A LA INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACION PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	OTRAS OBRAS IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	obras hidráulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CODIGO DE IDENTIFICACION VIAL (CIV):	PK
	Sumapaz	Cuenca del Piamonte	San Antonio	?	San Antonio	5007253	?

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:				Direccion:
orlando Bahoman.	?	?	?	K9 + 660

?	Edificación construida o remodelada recientemente:	?	La edificación presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:		La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada:	?	No presenta fisuras o grietas visibles:	?

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERISTICAS DE ACCESO		OBSERVACIONES:
1. Agua	?	1. Residencial	?	¿Habitan personas en condición de discapacidad?	N.A	Acta de vecindad relevando el estado de la Carca.
2. Telefonía fija		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N.A	
4. Telefonía		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la afectación:
Elementos ornamentales y otros	N	NC	N/A
Muros	N	NC	N/A.
Ventanas y puertas	N	NC	N/A.
Cerramiento	N	NC	N/A

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la afectación: N/A.
Andenes	N	NC	N/A.
Bordillos	N	NC	N/A.
Rampas de acceso	N	NC	N/A.

RESIDENTE SOCIAL	Andrés A Garcia. Andrés Alberto Garcia posada 79.736.111	PROPIETARIO / HABITANTE	Almeiro Sonabria C. 74 5K 567
RESIDENTE TECNICO		RESIDENTE SOCIAL ATENTEVENTORIA (SI APLICA)	

NOTA: Si hay otros tipos de daños no referenciados, favor describirlos al reverso de este Acta de vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otros

Predio ubicado. Manzana 0, mojones.
Costado derecho e izquierdo.

Costado izquierdo. Presenta en la totalidad de la Cerca cuatro dos líneas de alambre de pua. y en la parte superior Manguera.

Costado derecho. No se observa Cerca. Alto material arbustivo. a los montañosos; se observa trinchos para Contención de tierra.

El Costado izquierdo expone algunos postes inclinados
Costado derecho: Expone

Esta acta fue firmado por el señor Almiro sanabria encargado del predio.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No: 12

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (CANALIZACIÓN):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras hidráulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N.A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N.A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK:
	Sumapaz	C. Nazareth	Antonio	K8 + 392	Antonio	4007640	

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Poseedor:			Teléfono:	Dirección:
odúl Laia/Ruth Mery Laia				
No. de unidad de predio: 1		Piso: 1	Predio: 3d3307169	K8 + 392

REMUEVE / DEMUELE	USO ACTUAL	CARACTERÍSTICAS DE AUTOCONSTRUCCIÓN	OBSERVACIONES
	1. Residencial		
	2. Comercial	NO.	En este acto se encuentra estado de Viviendas y estado de Carca.
	3. Industrial		
Móvil P. Rato Cas	4. Institucional	N/A.	
	5. Lote		

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE FACHADA (SE DEBE MARCAR (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Características	Afectación		Descripción de la afectación:
	SI	NO	Casa Construida en madera
	SI	NO	Casa Construida en madera
	SI	NO	Casa Construida en madera
	SI	NO	Casa Construida en madera.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (SE DEBE MARCAR (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Características:	Afectación:		Descripción de la afectación:
	SI	NO	
	SI	NO	
	SI	NO	

RESPONSABLE SOCIAL:	Nombre: Indira A. García Andrea Alexandra García Posada C.C.: 79'756'111	FIRMA RESPONSABLE:	Nombre: Ruth Mery Laia Sanabria C.C.: 7.070.751.463
RESPONSABLE TÉCNICO:	Nombre: C.C.:	RESPONSABLE ENTIDAD INTERVENTORA DE LA VIA:	Nombre: C.C.:

NOTA: Si hay una tipo de duda en la vivienda, favor suscribirla al reverso de esta acta de vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otros

Predio que presenta, bodega en madera, vivienda tambien en madera, baño ubicado exteriormente y por último concha de tejo.
La bodega se encuentra construido en madera que presenta cubierta tipo teja de zinc, al momento de esta visita, no puede ser observado, se encuentra apoyado en Cilindros de concreto, aspero tambien tejas traslucidas, la teja en zinc en el extremo izquierdo expone afectación. La cubierta se encuentra apoyado en concha de madera.
La segunda construcción tambien se encuentra en madera, posteriormente se encuentra puerta de acceso principal en madera en la parte superior se observa canaleta de aguas lluvias en pvc. Frontalmente de observo fachada en madera, cubierta en teja de zinc, algunas piezas se observan oxidadas, para el acceso expone un sendero de acceso en concreto, zona de lavado y baño se encuentra ubicado exteriormente y presenta revestimiento en ladrillo tolete y geotextil, cubierta en tejas de zinc, desgastadas apoyada en cercha de madera piso en placa de concreto y teja, concha de tejo, presenta tolizos de madera, haciendo las veces de columnas y vigas no presenta muros, revestimiento en geotextil, en el extremo derecho se observa cercha en tolizos y postes de madera, exponiendo algunas tejas de zinc piso en recebo natural, ingreso unidad residencial piso en madera, muros y techo en madera presenta dos habitaciones piso y muros en madera techo tambien en madera. Cocina piso en madera, muros en madera, cubierta en teja de zinc apoyada en tolizos de madera.
Estado de la cerca:
realizando el recorrido de mayor a menor se observa en el costado izquierdo alambre liso que se encuentra instalado en los postes de los arboles, en el costado derecho material vibratorio.
A medida que se desciende hasta el K8+392 el alambre liso del costado izquierdo no es presentado, se dificil no se observa, inexistente, se realiza recorrido de menor a mayor y de mayor a menor.

Costado derecho y izquierdo.

- Es importante aclarar que el señor omar sanchez es esposo de la señora Ruth Mary Lara.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-018	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CODIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No. 13- Vivienda

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras Hidráulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PR:
	Sumapaz	Cerro del Mecuapa	San Antonio	K9 +800	San Antonio	3007625	?

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Ocupante:	Almeiro Sanabria	# Teléfono: ?	Dirección:
# Unidad de predio: 1	Estrato: 1	# Móvil: 3138630595	K9 +800.

Afectación predial: No requiere adquirir ni ocupar predios según el Art. 136	Colindancias, medidas y linderos con especificación	N/A.	¿La intervención presenta figuras inmersas a 1 m o en fachada o al límite del predio?	?	La edificación presenta grietas, fisuras o ? con el vecino?	0,	No presenta fisuras o grietas visibles	?

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
Agua	X	1. Residencial	X	¿Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A.	K9 +800. Fisuras grandes
Alcantarillado		2. Comercial				
Energía	X	3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje privado?	N/A.	
Teléfono		4. Institucional				
Gas	Pipeta X	5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Cubierta, canoas y bajantes	X	NC	Desgaste.
Muros	X	NC	Fisuras Fisuras leves y grietas.
Ventanas, puertas	X	NC	Ventana marco y lata externa metálica.
Otros	X	NC	N/A

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO: (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cumplimiento de Sardinel o Cordón	X	NC	N/A
Rampas	X	NC	N/A.
Franja de servicio	X	NC	N/A.

RESIDENTE SOCIAL:	Nombre: Andrés Alberto García Posada Identificación: 79796111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Nombre: Apellidos: Identificación:
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL (INTERVENTORÍA) (SI APLICA):	Firma: Nombre: Almeiro Sanabria L Identificación: 79514561

* NOTA: Si hay cotas bajo de daños en la vivienda, favor describirlas al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos técnicos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otros

Vivienda antegida pa Calamiento a madera. que en su fachada expone bastante de aguas lluvias: en pvc, Cubierta en techo de sin Chapeada en parte de madera muros paneta-pintura, manchas de exposición de humedad en la parte inferior. Frontalmente. Excepto a la fachada expone medidor de luz, lateralmente en pared pintura, expone dos ventanales metálicos, el ventanal costado derecho, expone marco y reja externo metálico en dos vidrios, los cuatro vidrios restantes martillados que se observan dos fisurados; el ventanal costado izquierdo marco metálicos, expone 6 vidrios lisos en buen estado se observa grieta longitudinal; en el extremo izquierdo parte inferior, se observa pintura leve, posteriormente se observa bloque, a la vista que presenta 3 ventanales, el del extremo izquierdo vidrios martillados y lisos, ventanal medial vidrios lisos en buen estado y extremo derecho presenta dos vidrios ausentes y vidrio afectado todos estos tres ventanales presentan marcos y metal roto, grabado en piedra ingreso interno; piso en cemento contrapiso con perdida de concreto por el paso del tiempo, hallo 1 piso en madera, muros paneta-pintura, dilatación existe muros, puerta de acceso en madera, cocina piso en baldosa presenta fisuras leves, muros paneta-pintura, plafon de este piso en madera puerta de acceso en madera, hallo 2 piso en madera muros paneta-pintura, fisuras de paneta leve, plafon de este piso tablones de madera cubiertos con papel pintado, hallo 3 piso en tablones de madera, muros paneta-pintura, plafon de entrepiso, cubierto con papel, se observa en madera, zona de lavado y baño piso en baldosa muros. Con una altura de 1.70 enchapado, parte restante paneta-pintura red electrica canalizado en tubo pvc, cubierta en zinc, apoyado en madera, se observa bodega en madera. Se formada:

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO


REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CODIGO: 1-FRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 13- C-, Ca

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras Hidráulicas.
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (IDIV):	Hb
	Sumapaz	Cuenca del Pasquilla - Santa Librada			Santa Librada	20076253	?

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre de Propietario o Poseedor:	Almyllo Sanabria			Dirección:
N° Identificación predio:	N/A	Estrato: 1	Teléfono: 3138630595	K7+570

Año aproximado de construcción:	Cerramiento, construcción o elementos complementarios:	La edificación presenta fisuras, grietas o daños en fachada o al interior del predio:	La estructura presenta grietas, fisuras o daños en fachada:	No presenta fisuras, ni grietas visibles

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua	NA	1. Residencial	NA	Presenta condición de discapacidad?	NA	Estado de Caica.
2. Alcantarillado	NA	2. Comercial	NA			
3. Energía	NA	3. Industrial	NA	Cuenta con parqueadero?	NA	
4. Teléfono	NA	4. Institucional	NA			
5. Gas	NA	5. Lote Baldío	NA			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Muro de cerramiento o fachada	SI	NO	N/A
Puertas	SI	NO	N/A
Ventanas y puertas	SI	NO	N/A
Cimentación	SI	NO	N/A

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO: (MARQUE CON (X), SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Cerramiento (muros y rejas)	SI	NO	N/A
Andenes/Vías	SI	NO	N/A
Parques y zonas verdes	SI	NO	N/A

RESIDENTE SOCIAL:	Nombre: Indira A Caica Identificación: Indira Alexandra Caica posada 79.756.114	PROPIETARIO / HABITANTE:	Nombre: Almyllo Sanabria Lopez Identificación: 79 519 582
RESIDENTE TÉCNICO:	Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL / INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN:	Nombre: Identificación:

* NOTA: Si hay otras obras de diseño en la vivienda, deben relacionarse al respaldo de esta acta de vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

6. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otros

se inicia el recorrido para evaluar el Cercado del predio del señor Almilio Sanabria, se inicia el recorrido en la abscisa K7+870, esta evaluación del estado de la Cerca se realiza de manera de mayor a menor, inicialmente en el costado izquierdo se observa dos lineas de alambre de pua, Cerca Viva. Y en el costado derecho se observa dos lineas de alambre de pua, Cerca Viva, luego en el costado izquierdo se observan tres lineas de alambre de pua Cerca Viva y en el costado derecho se dificulta la observación por material arbustivo, sin embargo se observa tres lineas de alambre de pua, Cerca Viva, Cabe anotar que el costado izquierdo varios postes inclinados. Luego en el costado derecho se observa una linea de alambre de pua, Cerca Viva, el Costado izquierdo Continúa presenta tres lineas de alambre de pua, Cerca Viva, luego en el Costado derecho se observa dos lineas de alambre de pua, Cerca Viva, luego por el alto nivel de material arbustivo no permite la observación en el costado derecho, luego el costado izquierdo presenta dos lineas de alambre de pua Cerca Viva.

En el K7+980: Costado derecho se observa montaña, costado izquierdo empieza dos lineas de alambre de pua, Cerca Viva, luego se observa que la Cerca presenta rollizos de madera y dos lineas de alambre de pua en el Costado izquierdo, y el Costado derecho continúa exponiendo área montañosa. Y en el Costado izquierdo se observa dos lineas de alambre de pua y rollizos de madera, algunos rollizos se observan inclinados. Luego en el costado izquierdo, se pierde la Cerca. pero nuevamente se observa retomada, rollizos de madera dos lineas de alambre de pua, en el costado derecho se continúa observando zona montañosa. En el Kilometro 8 se observa en el Costado izquierdo dos lineas de alambre de pua y rollizos de madera, en este punto unos metros adelante se observa el alambre de pua en el suelo tramo natural, Costado derecho área montañosa.

Costado izquierdo no se observa Cercano, Costado derecho, área montañosa

Luego se observa el ingreso al predio, este predio fue evaluado pasa a encontrarse el estado de la fronda perimetral, nuevamente se retoma la Cerca en el costado izquierdo, dos lineas de alambre de pua, Cerca viva, costado derecho alto nivel de material arbustivo sin embargo, en este costado se observa dos lineas un alambre liso y otro linea alambre de púa, luego se observa en el costado derecho dos lineas de alambre de pua, y en el costado izquierdo se pierde el

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otras

alambrado de pua y en el costado derecho presenta dos líneas de alambrado de pua, cerca viva. costado izquierdo no se observa cercado, luego nuevamente se remotado en el costado izquierdo. En el costado derecho nuevamente se observa como montículos. se llega al final del predio en el KB+392.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTAS DE VECINDAD INICIALES DE OBRA

CAPITOLIO

CIV

20047005

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No.: 01

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y el el Decreto 1074 del 2015, a través del presente avisa de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y propias propias de la actividad gremial, que estos son un insumo del diligenciamiento del formato y serán tratados con plena sumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.uaermv.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	NA	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de Vecindad - APP - Actividades H
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	NA	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	NA				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
13/07/2023	Suba	Casa Suba	Capitolio	K4 + 555	Capitolio	2004700	9102+855

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario y Habitante: Fabian Alfonso Lopez Mesa			# Teléfono: 3208488984	Dirección: Capitolio			
Núm. de piso del predio: 1	Estrato: 3		# Móvil: 3208488984				
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: 1984	Modificación	Edificación construida o remodelada recientemente:	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio: NO	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada: Si	No presenta fisuras ni grietas visibles: N/A		

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES:
1. Agua	✓	1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	NO	Institución Educativa
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía	✓	3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	NO	
4. Teléfonos		4. Institucional	X			
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	No tienen afectaciones visibles
Paredes	SI	X	Paredes en mampostería - Presenta Fisuras Puntuales.
Ventanas y puertas	SI	X	Ventanas y Puertas en buen estado
Cerramiento	SI	X	Presenta Cerramiento con Postes de madera y alambre

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	X	No tiene Confinamiento
Revestimientos	SI	NO	Recubrimiento natural, tierra - material vegetal
Rampas de acceso	SI	NO	No tiene Rampas.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrea A Garcia Nombre: Andrea Alberto Garcia posada. Identificación: CC 79.756.111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Nombre: Consuelo Romero Identificación: 1014714891
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

*NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

Rubye Ruiz
R. Social
UAERMV

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-018	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otras

Area de lavado: Presenta fisuras en paredes - baldosa con perdida de embaguillado por desgaste, lavadero en cemento con grietas. - área interna, piso en mineral agitado, enchapes al 60% - presenta deterioro

cenderos interiores: cubierta material Vegetal y Cemento

Patio: Presenta Fisuras y desprendimiento de material - losa fisurada.

Cancha extrema salón 1, presenta oxidación natural

Area de juegos: presenta deterioro natural en madera - concha presenta deterioro en muros gaviones de contención, presencia de oxido en los aros y tablero de basketball

Pared externa, area comedor: Presenta bloques con fisuras puntuales.

- por causa de las actividades constructivas adelantadas en agosto de 2022, hasta la Fecha: por el consorcio Gaviones qe el Colegio Juan de la Cruz Varela sede Capitolio, no tuvo ninguna afectación.

1064714881

Cerramiento: malla eslabonada
Estado de la cerca paralela de madera. 3 lineas de alambre de pua.
en el costado derecho:
K4+010 - K4+575 - Buen estado de la cerca.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. P2

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127022-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente acto da cumplimiento informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y ejercidas propias de la actividad pública, que todos con un especial deber de salvaguardar, de forma y bajo todos los unos cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra web en: www.uaermv.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A.	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	NA	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de Vecindad - IGP2 - Actividades Iniciales
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N.A.	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N.A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	Suma Paz	Ciudad Bolívar	Sto Domingo	Kr 1 540	Costado	20047100	71027656

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante: Fabian Alfonso Lopez Rosa		# Teléfono: //		Dirección: Predio Santa Ana.			
No. de predio del predio: 1	Estrato: 1	# Móvil: 3208488984					
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: 1990	Edificación construida o remodelada recientemente:	No	La estructura presenta fisuras mayores a 3 mm en fachada o al interior del predio	No	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada	No	No presenta fisuras ni grietas medias: No

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua	X	1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	No	Ninguna
2. Alcantarillado	X	2. Comercial				
3. Energía	X	3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	Si	
4. Teléfono		4. Institucional	X			
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	X	NO	Afectaciones naturales por deterioro Costado izquierdo del predio
Muros	SI	X	No presenta afectaciones externas.
Ventanas y puertas	SI	X	
Cerramiento	X	NO	Cerramiento con rollizos y alambre de Puo destemplado

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación
Confinamiento (vestido o bordillo)	SI	X	No Cuenta con Confinamiento
Recubrimiento	SI	X	Recubrimiento Natural
Principal de acceso	X	NO.	Ingreso Vehicular en material Vegetal y Roca natural

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrés Mauricio Garcia. Nombre: Andrés Mauricio Garcia Posada. Identificación: 79738711	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Consuelo Romero. Nombre: Consuelo Romero. Identificación: 1069714881
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de este Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

Rafael Rivas
R. Social
UAERMV.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otras

Entrada peatonal: se evidencia losa Fisura y dilatada - rampa peatonal dilatada, desprendimiento de material.

Sillas en Concreto: Presenta deterioro de concreto y oxidación natural.

Cerramiento Cancha de fútboll: Presenta Cerramiento en malla deteriora, oxidos con presencia de oxido. Losas dilatada, desnivel entre losas costado izquierdo.

Cocina: Pared izquierda con presencia de humedad - Fisura en pared.

Baño de niñas: se evidencia ausencia del orinal por desprendimiento.

Área de lavado: en chapa presenta desprendimiento

sendero peatonal: dilatación de losa afuera del comedor. - perdida de estructura en Concreto para sillas.

Almacen. Piso deteriorado en madera, Columnas en madera con deterioro natural. Vigas techo - canaletas deterioradas.

Comedor: Presenta fisura en pared del costado izquierdo - desprendimiento de material pared al lado de la puerta.

Por causa de las actividades constructivas adelantadas por el Consorcio Gloriosa. gs, desde agosto de 2022. hasta : 10 Fecha. : el Colegio. Juan de la Cruz Varela, sede santo Domingo, no presento ninguna afectación.

Colegio: su ubicación Km 550 — Costado derecho

Comedor Ramiro
1069714881.

=expansa = linea de alambre / costado derecho.
de pua unicamente en el ingreso, Cerca Viva.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: IMVI-FM-016	VERSIÓN: 12
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2022	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 03

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente acta de privacidad informa a los titulares de los datos personales almacenados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y acordes propias de la actividad general, que dará con un especial cuidado a la información del titular y hacer tratamiento con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.uaermv.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A.	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N.A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N.A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de Vecindad SGP / IDU: Boleda Norte
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N.A.	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N.A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (DIV):	PK
	Sumapaz	Pio Sumapaz	V. Capitolio	Kr 1 550	Capitolio	20041007	91037656

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:		# Teléfono:	Dirección:
Wilman Hurtado Palacios			Santo Domingo
No. de pisos del predio: 1	Estrato: 1	# Móvil: 3142907098	

Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: 1998	6 años	Edificación construida o remodelada recientemente	NO	La estructura presenta fisuras mayores a 3 mm en fachada o al interior del predio	NO	La estructura presenta grietas mayores a 5 mm en fachada	No	Ha presenta fallas o grietas visibles	No

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua	X	1. Residencial	X	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	No	Sin observaciones.
2. Alcantarillado		2. Comercial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	No	
3. Energía	X	3. Industrial				
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación
Cimentación (zapatas y vigas)	SI	X	
Muros	X	NO	Predio Prefabricado Con Fisuras Puntuales en Pared Frontal
Columnas y Dinteles	SI	NO	No aplica.
Cerramiento	SI	NO	Cerramiento en rollizos y alambre de Puas.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento (sardinel o similar)	SI	X	No tiene Confinamiento
Vía/Andenes	SI	NO	
Rampas de acceso	SI	X	No tiene rampa.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrés Garcia Nombre: Andrés Alberto Garcia Posada Identificación: CC 79'756'111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Wilman Hurtado P Nombre: Wilman Hurtado Palacios Identificación: 1022932247. Bogotá
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

* NOTA: SI hay algún tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

Ruby S Ruiz
R. Social
UAERMV.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otras

Cocina: Paredes en material Prefabricado sin revestimiento. Muros en concreto con despatillamiento.

Baño: Techo - Cielo raso con dilataciones puntuales. - encharpados.

Habitación 1 costado derecho: Cielo raso con desprendimiento de lámina

Comedor: No tiene revestimiento en paredes. se evidencia porosidad, baldosa en buen estado.

Conoleta Externa: En material de PVC desprendida.

Pared posterior: Presenta fisuras puntuales

Ubicación: Kot 55a, costado izquierdo. La cerca expone. Cerca viva, tres (3) lineas de alambre de pua.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No: 04

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UNIRMV, identificada con el NIT 900127033-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente acta de vecindad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad general, que estos son un requisito del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.vmv.gov.co.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras hidráulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (IDV):	PR
	Sumapaz	C. Río Sumapaz	Sto Domingo	Km 368	Capitolo	20096233	91027855

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante: Ismael Peñaloza

Teléfono:

Móvil: 3112152283

Dirección: El Prado – Sto Domingo (Obras Hidráulicas)

No. de pisos del predio:	1	Estrato:	1				
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: 1984		Edificación construida o remodelada recientemente:	NO	La estructura presenta fisuras mayores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	NO	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada:	NO	No presenta fisuras ni grietas visibles:	NO

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial	X	¿Habitan personas en condición de discapacidad?	NO	Ninguna
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía	X	3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	NO	
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	X	NO	Columnas y Vigas en Concreto presentan fisuras y dilataciones
Fachada	X	NO	Pared en bloque con deterioro puntual
Puerta y ventana	X	NO	Vidrio roto en pared lateral al ingreso y Puerta principal
Cerramiento	X	NO	Cerramiento en rollizos y alambre de Puas

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Confinamiento (sardinel o cuneta)	SI	X	Entrada sin confinamiento
Paso peatonales	X	NO	Paso Peatonal en Placa de Concreto
Rampas del acceso	X	NO	Rampa de acceso en material granular natural y Vegetación

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrea Garcia Nombre: Andrea Alberto Garcia posada Identificación: 1073567111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Nombre: Ismael Peñaloza Identificación: 80380698
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de este Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

Rubén Ruiz
R. Social
UAERMV

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerbeza entre otros

Casa N°1: Paredes, Puertas en madera con presencia de deterioro natural; techo de zinc con presencia de oxido

casa N°2 principal: paredes en bloque con deterioro puntual.

sala y vigas en metal con presencia de oxido, techo de zinc, paredes con recubrimiento. presencia de humedad

Habitaciones: Piso loseta en cuadra con recubrimiento, Fisurado y agrietado, piso en madera con descolocamiento y separaciones, quarda escoba en madera dilatada. Bordes marco puerta en madera. deteriorado.

Patio: Cimentación parcial en concreto y material vegetal, Paredes con deterioro en los bloques, lavadero mayolicado. Cerramiento en rollizos y madera.

Estado de la cerca:

Kg + 280 izquierdo 2 lineas - costado derecho 3 lineas de alambre de pua-postes de madera (cerca vieja)

Kg + 310 izquierdo dos lineas alambre de pua, derecho 3 lineas de alambre de pua postes de madera

Kg + 330 izquierdo, tres lineas de alambre de pua derecho: sin lineas.

Kg + 340 izquierdo, tres lineas, derecho dos lineas de alambre de pua para los de madera y 1 linea eléctrica.

Kg + 360 izquierdo 3 lineas, linea eléctrica, derecho tres lineas, Postes de madera.

Kg + 390 izquierdo 3 lineas, postes de madera, linea Eléctrica; Kg + 420: izquierdo tres lineas, postes de madera, derecho linea Eléctrica.

Kg + 430: izquierdo tres (3) lineas postes de madera, Right linea Electrica.

Kg + 440: izquierdo tres lineas y postes de madera, derecho linea eléctrica.

Kg + 280 hasta Kg + 440.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otros

El propietario informa que por causa de las actividades técnicas adelantadas por el Consorcio Calle Nueve 95, a partir de agosto del año del 2022 hasta abril-mayo 2023, El predio no presenta ninguna afectaciones interna, ni externas (física, material). Sin embargo, informa que por las actividades replicadas por la UMV, y del paso de los Volquetes y el vibro compactador el predio si ha presentado; desprendimiento y ruptura del piso de una de las habitaciones, Fisuramiento del baño de la cocina y desplazamiento de las puertas de la pieza; fisuramiento del muro de la pared del baño, aproximadamente.

- [illegible] c.c 80380698-

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: IMVI-FM-016	VERSIÓN: 12
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2022	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 05

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127532-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente acto da privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estatuto y demás propias de la actividad general, que estos son un soporte del cumplimiento de función y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web: www.uaermv.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	(Actividades Hidrosanitarias para Acta de Vecindad Cerramiento)
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	Sumapaz	Nio Sumapaz	V. Capitolio	K3+250	Capitolio	20041005	91027656

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante: Guido Ismael Sanabria Trujillo		# Teléfono:		Dirección: Vereda Capitolio			
Núm. de pisos del predio: 1	Estrato: 1	# Móvil: 3212442853					
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10 vigente:	Edificación construida o remodelada recientemente: NO	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio: NO		La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada: NO	No presenta fisuras o grietas visibles: NO		

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua	NO	1. Residencial	X	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	NO	Ninguna.
2. Alcantarillado	NO	2. Comercial				
3. Energía	NO	3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	Si	
4. Teléfono	NO	4. Institucional				
5. Gas	NO	5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA: (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componente:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	N/A.
Muros	SI	X	N/A.
Ventanas y puertas	SI	X	N/A.
Cerramiento	SI	X	N/A.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componente:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento (bareda o cerrilla)	SI	X	N/A.
Rampa vehicular	SI	X	N/A.
Rampas de acceso	SI	X	N/A.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrés A. Garcia Nombre: Andrés Alberto Garcia posada. Identificación: C.C 79'756'111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Nombre: Identificación:
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

*NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado data cerámica,entre otras – Agosto 2022

Fachada/Antejardin piso: en pavimento y tierra: muros en mampostería, sin afectaciones visibles. Cubierta en estructura metálica y zinc con anclajes en buen estado. Fachada costado derecho: Cerca en tabla de madera, sin afectaciones visibles, patio de lapso con cubierta en madera o plástico con deterioro por intemperie, parrilleo solario en buen estado. Fachada frontal en mampostería a la vista, ventanas en marco metálico y vidrio sin afectaciones visibles. Fachada costado izquierdo, mismas características en buen estado. Acceso a vivienda puerta en acero y vidrio en buen estado. sala comedor, piso en baldosa sin afectaciones visibles. Muros en pañete y pintura con fisuras normales por materiales. En general en buen estado. Techo en PVC sin afectaciones visibles. Habitaciones: piso en baldosa en buen estado, muros en pañete-pintura, en buen estado. Las habitaciones no cuentan con techos, puertas en PVC sin afectaciones visibles. Cerramiento en palo lleno y alambre de puas en regular estado.

Estado de Cerca 2024.

Estado de la Cerca: Cuatro hilos postes de madera, descripción del costado izquierdo.

Viernes 23 de Febrero de 2024, se realiza visita sin ser sido atendido.
Miércoles 27 de Marzo de 2024, se realiza visita sin ser sido atendido.
Jueves 11 de abril de 2024, se realiza visita sin ser sido atendido.

Predio que se da por visto.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: IMVI-FM-016	VERSIÓN: 12
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2022	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-018	VERSIÓN: 1
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No. 06

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UNIMAN, identificada con el NIT 900417000-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente acto de privacidad informa a los titulares de los datos personales que serán tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y propias de la actividad general, bajo estricto cumplimiento del principio de legalidad y demás principios que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra página web www.uniman.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Actividades Hidráulicas Acta de vecindad loza.
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PR
	Sumapaz	Río Sumapaz	Y Capitolio	1/3+480/Peatonal	Capitolio	200 47005	9803,3656

1. DATOS DEL PREDIO: MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA)

Nombre del Propietario o Habitante:	Nesta Castellanos		# Teléfono:		Dirección:	Vereda Capitolio	
No. de placa del predio:		Estrato:	1	# Celular:	313-3419889		
Año aproximado de construcción del predio con las normativas NSR-10: 1984		Edificación construida o remodelada recientemente:		La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en la losa o el interior del predio:		La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en la losa o el interior del predio:	No presenta fisuras o grietas visibles:

SERVICIOS PÚBLICOS		USO ACTUAL		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES
1. Agua	✓	1. Residencial	✓	¿Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Acta de Vecindad / se realiza acta de Vecindad Por Cerramiento del predio Unicamente
2. Acantarillado	✓	2. Comercial				
3. Energía	✓	3. Industrial				
4. Teléfonos: Móvil	✓	4. Institucional		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?		
5. Gas: P. Pato	✓	7. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA: (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	NO	N/A Al avaluar el Predio se observa desplazamiento de Piedra y Predio desnivel
Fachada	SI	NO	N/A
Ventanas y puertas	SI	NO	N/A Al avaluar el Predio Puertas con Presencia de oxido
Cerramiento	SI	NO	N/A Cerramiento malla metálica desplomada y Presencia de oxido

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO: (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	NO	N.A
Pavimentos	SI	NO	N.A
Rampas de acceso	SI	NO	N.A

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrea Alexandra Garcia Nombre: Andrea Alexandra Garcia posada Identificación: CC 49.756.111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Nesta Castellanos V Nombre: Nesta Castellanos. V Identificación: CC 348313
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA (SI APLICA):	Firma: Nombre: Identificación:

*NOTA: Se hay otros tipo de afectación la vivienda, favor diligenciar el reverso de este Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

Rubys Ruiz
R. Social
UAERMV

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, cielos, pisos, ventanas, escalas u otras características varias.

El propietario informo que por causa de las actividades adelantadas a partir de agosto de 2022 hasta abril-mayo 2023 para el corredor la garonera 95, el predio no tuvo ninguna afectación ni internamente, ni externamente. (Carga-material de obra.)

*Nestor Castellanos Vasquez

Estado de Cerca

se inicia recorrido en el K3+020, en el predio del señor Nestor Castellanos cerca abierta ambos costados, la cerca presenta las siguientes características, alambre de pua y postes realizados de arboles, la cerca presenta sectores con alambre liso (reciente) *Nestor Jady Castellanos C. El predio finaliza en K2+470. CC N 3048312 de Cabrera

Descripción de la cerca:

K2+480: izquierdo tres (3) hilos de alambre de pua. Derecho: dos hilos de alambre de pua, postes de madera.

K2+510 izquierdo dos (2) hilos postes de madera, derecho 0 hilos.

K2+580. izquierdo dos (2) hilos, postes de madera, derecho dos (2) hilos postes de madera.

K2+580. izquierdo dos (2) hilos, postes de madera, derecho dos hilos alambre de pua y hilos eléctrica.

K2+586: izquierdo dos (2) hilos, derecho 0 hilos.

K2+590: izquierdo dos hilos, Right dos hilos, alambre de pua - postes de madera.

K2+680. Derecho tres hilos izquierdo dos hilos alambre de pua postes de madera no de

K2+710: izquierdo. dos hilos, postes de madera, derecho tres hilos postes de made, hilos Eléctrico

K2+740 izquierdo. dos hilos, hilo eléctrico postes de madera derecho dos hilos y [illegible] eléctrico

K3+784: izquierdo hilo eléctrico derecho. dos hilos, postes de madera hilo eléctrico.

K3+820. izquierdo tres hilos, derecho 3 hilos postes de madera

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: ISVI-FM-016	VERSIÓN: 12
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2022	

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO




REGISTRO FOTOGRAFICO




REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-018	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



80

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 07

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900112032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente acto de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad general, que estos son un soporte del diligenciamiento de formato y serán tratados con plena cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.uaerm.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	Acta de Vecindad SGP/obras Individuales
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	Usme	Danubio	V. Capitolio	Ks 7 370	Capitolio	2007623	41027853

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Cuatro cortazo		# Telefono:		Dirección:	Capitolio	
# de pisos del predio:	1	Frentes: 1	# Móvil:	3214075813			
Predio apto/adecuado de conformidad con la normativa NSR-10: SI/NO		Edificación construida o remodelada recientemente:	No	La estructura presenta fisuras mayores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	No	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada:	No	No presenta fisuras o grietas visibles:	No

SERVICIOS PUBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial	X	¿Habitan personas en condición de discapacidad?	No	se realizaron dos (2) visitas para realizar el acta, la última visita se pagó por peticion del dueño del predio.
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía	X	3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	NO	
4. Teléfono		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	N/A.
Fachada	SI	X	N/A.
Ventanas y puertas	SI	X	N/A.
Otro	SI	X	N/A.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (sardinel o cordon)	SI	X	N/A.
Rampas	SI	X	N/A.
Rampas de acceso	SI	X	N/A.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrea A Garcia Nombre: Andrea Alberto Garcia Pozada Identificación: C.C 79'756'111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Nombre: Identificación:
APOYO TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

*NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de este Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

Rubys Ruiz
R. Social
UAERMV.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-018	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado data cerámica,entre otros

Fachada - Cerramiento en polo rollizo y alambre de pua, sin afectaciones visibles. Antejardin - zona verde, cobertura vegetal, casa, muros en mampostería y ventanas, puerta en hierro y vidrio en aparente buen estado. Costado derecho con predios metálicos.
se realizo cierre de fachada, debido a que se contacto a el dueño de la casa, en repetidas ocasiones y no se pudo concretar cita para realizar el acta.
10/10/2023
puerta de acceso en hierro y vidrio, sin afectaciones visibles
Cocina - piso: en concreto con fisuras normales en todo. Muro en mampostería a la vista. Techo en estructura metálica y teja de cinc, en buen estado. Ventanas: en hierro y vidrio sin afectaciones visibles. Alcoba N° 02, se evidencia vidrio fracturado en ventana lateral izquierdo en zona del baño. otras superficies en buen estado. Alcoba N° 03 se evidencia columnas con falta de concreto, barilla a la vista. se evidencia regata de luminaria en tubería metálica a la vista, al igual que el cableado de luminaria. En zona de comedor se evidencia piso en concreto nuevo sin afectaciones visibles. Techo sin afectaciones visibles, cerramiento frontal, en polo rollizo y alambre, sin afectaciones visibles. se evidencia cobertura vegetal a los costados de la vivienda sin afectaciones visibles.

El predio no presenta ninguna afectación por causa de las actividades técnicas adelantadas desde agosto de 2022 hasta abril de 2023.

Descripción, costado Cerco
K3 180-200 costado izquierdo 2 lineas - derecho tres lineas
K3 + 240 tres lineas postes de madera
K3 + 280 tres lineas postes de madera
K3 + 288 tres lineas postes de madera K3 + 320 tres lineas alambre de pua postes de madera. K3 + 330 tres lineas de alambre de pua - postes de madera.
K3 + 350 tres lineas de alambre de pua postes de madera K3 + 380 tres lineas de alambre de pua, K3 + 380 tres lineas, alambre de pua. K3 + 450 tres lineas alambre de pua K3 + 490 3 lineas alambre de pua postes de madera K3 + 534 tres lineas alambre de pua, postes de madera, K3 + 580 tres lineas alambre de pua, postes de madera K3 + 620 sin linea costado izquierdo K3 + 680 sin linea, K3 + 760 sin linea

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INVI-FSI-016	VERSIÓN: 12
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2022	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO




REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 08

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900121032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente acto le proporciona información a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad general, que serán con el respeto del ordenamiento del tratado y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.pereira.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	CTRO TIPO DE INTERVENCION:	Acta de Vecindad para Cerramiento.
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	Dumoper	Nio Dumoper	Verda Capitolio	K3 t 6 20	Capitolio	20076233	9 K 3855

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Jodi Malo Espinosa			# Teléfono		Dirección:	Vereda Capitolio		
No. de casa del predio:	1	Edificio:	1	# Móvil:	3223104288				
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10:	N/A	Edificación construida o remodelada recientemente:	N/A	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada:	N/A	No presenta fisuras o grietas visibles:	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Se realiza acta de vecindad para Cerramiento..
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Telefonía		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío	X			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA. (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas):	SI	X	N/A
Muros:	SI	X	N/A
Ventanas y puertas:	SI	X	N/A
Techo:	SI	X	N/A

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento (completo o parcial):	SI	NO	
Reubicamiento:	SI	NO	
Ramplon de acceso:	SI	NO	

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrés A Garcia Nombre: Andrés Alberto Garcia Posada Identificación: CC 79'756'111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Nombre: Identificación:
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerradura,entre otros

Seccionamiento se evidencia Seccionamiento en rollico y abombamiento de pisos sin afectaciones visibles. se observo que el Seccionamiento no presenta inicio de Seccionamiento abscisa Ks1630 a Ks1800
No ha sido posible establecer comunicación con el Ciudadano.
se encuentra al ubicarse su predio en la franja perimetral del tramo santo Domingo - Capitolio sin embargo, al consorcio Operaciones 95 no intervino la franja perimetral de este predio.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No.: 09.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UNIVIAL, identificada con el NIT 900137032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente anexo de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad promisional, que estos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra página web: www.univial.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de vecindad Cerramiento del Predio
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	Sumapaz	Pio sumapaz	V. Capitolio	Ks t 260	Capitolio	20036233	1102855

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Adelmo Mora		# Teléfono:		Dirección:	Vereda Capitolio			
No. de pisos del predio:	1	Cimbra: 1	# Movil:	3204607070					
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10, vigente:	N/A	Edificación construida o remodelada recientemente:	N/A	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada:	N/A	No presenta fisuras o grietas visibles	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES:
1. Agua:		1. Residencial	X	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	NO	Ninguna se realiza levantamiento de acta de vecindad por Cerramiento del Predio
2. Alcantarillado:		2. Comercial				
3. Energía:		3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	No	
4. Telefonía:		4. Institucional				
5. Gas:		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas):	SI	X	N/A.
Muros:	SI	X	N/A.
Ventanas y puertas:	SI	X	N/A.
Techos:	SI	X	N/A.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Confinamiento (sardinel y sardinel):	SI	X	N/A.
Pavimentos:	SI	X	N/A.
Rampas de acceso:	SI	X	N/A.

RESIDENTE SOCIAL:	Nombre: Andrés A. Garcia Nombre: Andrés Alberto Garcia Posada Identificación: CC 79'756.111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Nombre: Luis Adelmo Mora Identificación: 80'381.888.
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

*NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otros

En el K3+260, no se cuenta con Cerramiento, zona con alta Vegetación, de identificación individuos arbóreos arbustos, Cobertura Vegetal sin afectaciones.
En la K3+750 hasta mayores evidencia señal de tránsito con inclinación al predio
En el K3+667 se evidencia señal de tránsito sin afectaciones, Con buen anclaje al suelo
Desde el K3+630 hasta el K3+530, se evidencia predio con deformaciones y alto grado de material arbustivo sin contar con ningún tipo de cerramiento desde el K3 534 hasta el K3 580 no cuenta con Cerramientos.
En el K3+430 se evidencia techumbre con desnivel y deformaciones a la fecha el K3+430, ha perdido su Cerramiento. También se encuentra ubicada señal de tránsito anclada al suelo sin afectaciones visibles.
En la K3+420 se evidencia inicio de Cerramiento en polo rollizo y alambre de púas y se encuentra en el suelo parte del Cerramiento, el cual esta oxidado.

Descripción de todo lado Izq / derecho

K3+388 tiene linea de alambre de puas paralela de madera.
K3+320 sin linea.
K3+350 sin linea
K3+380 sin linea.
K3+450 sin linea
K3+490 sin Linea
K3+534 sin Linea.
K3+580 sin Linea
K3+630 sin Linea.
K3+680. sin Linea.
K3+760 sin Linea
K3+780 sin Linea.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



87

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 10

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente acuse de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y propias de la actividad gestional, que estos son un requisito del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.ivm.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de Vecindad.
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	Sumapaz	Nazareth	Verda Santo Domingo	Ko + 680	Capitolio	2004001	91027606

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Emilio Poveda			# Teléfono:		Dirección:	Vereda Santo Domingo
No. de pisos del predio:	1	Frentes:	1	# Móvil:	3114847598		
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10, Vigente:	N/A	Edificación construida o remodelada recientemente:	N/A	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada:	N/A	No presenta fisuras o grietas visibles:	N/A.

SERVICIOS PUBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Se realiza acta de Vecindad para Cerramiento del Predio. Unicamente
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	NO	N/A
Paredes	SI	NO	N/A.
Ventanas y puertas	SI	NO	N/A
Cubierta	SI	NO	N/A.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Cerramiento (andén o sardinel)	SI	NO	N/A.
Revestimientos	SI	NO	N/A
Rampas de acceso	SI	NO	N/A.

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrea Garcia Nombre: Andrea Alberto Garcia Posada Identificación: CC 79756111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Boyacá Nombre: Identificación:
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

NOTA: Si hay otro tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

Robys Ruiz
R. social
UAERMV.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica,entre otros

Inicio predio Ko+680 a Ki+829 cerramiento perimetral en polo tejico y alambre de pua. En abscisa Ki+465 a Ki+520 se evidencia cerramiento desplomado por perdida de la banca de la vía, demás restantes sin afectaciones y/o daños.

Descripción detallada de la cerca:

Ko+680: 3 lineas de alambre de pua a la izquierda / derecha 3 lineas alambre de pua
Ko+730 3 lineas de alambre de pua a la izquierda. / derecha 2 lineas alambre de pua.
Ko+785. 3 lineas de alambre de pua a la izquierda / derecha 2 lineas alambre de pua.
Ko+790. 3 lineas de alambre de pua a la izquierda / derecha 3 lineas alambre de pua
Ko+860. 3 lineas de alambre de pua a la izquierda / derecha 3 lineas alambre de pua
Ko+915. 3 lineas de alambre de pua a la derecha / izquierda 3 lineas alambre de pua.
Ko+960 3 lineas de alambre de pua a la derecha / izquierda 3 lineas alambre de pua
Ki+065. 3 lineas de alambre de pua a la izquierda / derecha 3 lineas alambre de pua
Ki+125. 2 lineas de alambre de pua a la izquierda / derecha 2 lineas alambre de pua
Ki+135. 3 lineas de alambre de pua a la izquierda / izquierda 3 lineas alambre de pua
Ki+195. 3 lineas de alambre de pua a la izquierda / derecha 0.
Ki+235. 2 lineas de alambre de pua a la izquierda / derecha 3 lineas alambre de pua
Ki+245. 2 lineas de alambre de pua a la izquierda / derecha 3 lineas alambre de pua
Ki+255. 3 lineas de alambre de pua a la izquierda / derecha 3 lineas alambre de pua
Ki+305. 3 lineas de alambre de pua a la izquierda / izquierda 2 lineas alambre de pua
Ki+340. 2 lineas de alambre de pua a la izquierda / derecha 0
Ki+355. 3 lineas de alambre de pua a la izquierda / derecha 0
Ki+390. 2 lineas de alambre de pua a la izquierda / derecha 0
Ki+435. 2 lineas de alambre de pua a la izquierda / derecha 0
Ki+440. 3 lineas de alambre de pua a la izquierda / derecha 0
Ki+510. 2 lineas de alambre de pua a la izquierda / derecha 0
Ki+545. 2 lineas de alambre de pua a la izquierda
Ki+615 3 lineas de alambre de pua izquierda / 2 lineas de alambre de pua a la derecha
Ki+635 3 lineas de alambre de pua izquierda / 2 lineas de alambre de pua a la derecha
Ki+690. 3 lineas de alambre de pua izquierda / 3 lineas de alambre de pua. a la derecha
Ki+710. 2 lineas de alambre de pua izquierda / 0 lineas.
Ki+760: 0 izquierda / 0 Derecha.
Ki+800. 3 izquierda / 0 Derecha.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-018	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No.: 11

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900.177033-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente avisa la ciudadanía informa a sus titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad general, que estos son un asunto del ordenamiento del Estado y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, en conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.uaermv.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de Vecindad Cerramiento del Predio
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	Sumapaz	Bio-sumapaz	Pasado-Glorioso	Kot 000	Capitolio	2004001	

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante: Alexandra Cifuentes Cifuentes

No. de cierre del predio: | Carrera:

Teléfono:

Móvil: 3125461614

Dirección: Kot 000 a la Kot 130 Vereda Santo Domingo

Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10 vigente:	N/A	Edificación construida o remodelada recientemente:	No	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	No	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada:	NO	No presenta fisuras o grietas visibles:	

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESOS:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Se realiza levantamiento de acta de vecindad por Cerramiento del predio Unicamente
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Telefonía		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío	X			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	N/A
Paredes	SI	X	N/A
Ventana y puertas	SI	X	N/A
Techo	SI	X	N/A

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento (portátil o similar)	SI	X	N/A
Revestimientos	SI	X	N/A
Rampas de acceso	SI	X	N/A

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrés A Garcia Nombre: Andrés Alberto Garcia posada Identificación: CC 79'756'111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Nombre: Identificación:
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

** NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerramiento,entre otros

Inicia desde la Ko+000 Hasta la Ko+130.
Ko+000 a la Ko+030 Cerca de alambre no tensionada.
Ko+030 a la Ko+050 Cerca deteriorada con una (1) sola alambre de púas
Ko+050 al Ko+080 Cerca de alambre de puas con tres (3) hilos con postes desadaptados.
Ko+080 hacia adelante, Cerca de alambre con dos (2) hilos algunas partes desadaptados y los hilos no tensionados.
Ko+130 Cerca de alambre y postes desadaptados y hilos desadaptado

Descripción estado de la Cerca:
- presenta cerramiento a partir de la abscisa Ko+056 Cerca viva. Postes de madera, tres (3) lineas de alambre de puas derecho sin alambre, izquierdo dos lineas de alambre de pua, Ko+140 Cerca viva, dos lineas de alambre de puo.

Pasa a que se invita al Ciudadano a firmar esta acta, el Ciudadano se niega a firmarla durante los dias:
Abril 13 de 2024
Abril 25 de 2024
Mayo 16 de 2024

en la visita con la profesional de la UMV, sin ser posible encontrarlo.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 12

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT. 900137022-7, en calidad de responsable del tratamiento de sus datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente acta de vecindad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y ajustes propios de la autoridad general, que éstos son en especial del cumplimiento del fallado y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.vivo.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DEFRAUDEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de vecindad Cerramiento del predio
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK:
	Sumapaz	Rio Sumapaz	Verde Capitolio	K4 + 610	Capitolio	2004005	91027695

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Carlos Julio Palacios		# Teléfono:		Dirección:	Verde capitolio			
N° de piso del predio:	1	Estrato: 1	# Móvil:	3142287453					
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10:	N/A	Edificación construida o remodelada recientemente:	N/A	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada:	N/A	No presenta fisuras o grietas visibles:	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Se hace levantamiento de acta de vecindad Por Cerramiento del predio
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Teléfono		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío	X			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	N/A
Muros	SI	X	N/A
Ventana y puertas	SI	X	N/A
Techo	SI	X	N/A

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento (sardinel o sardinel)	SI	X	N/A
Descolmatados	SI	X	N/A
Rampas de acceso	SI	X	N/A

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrés García Nombre: Andrés Alberto García posada Identificación: C.C 79.756.111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Carlos Palacios Nombre: Carlos Palacios Identificación: cc 79.819.241
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado dela cerámica,entre otros

En un predio que va desde el K3+090 hasta el K4+010 y otro área que va desde el K3+800 hasta el K3+900, cuenta con cerramiento perimetral en polo tejido y tres (3) hilos de alambre de puas. Se evidencia abscisa K3+800, ubicado en un talud por este costado el cerramiento esta suelto por el movimiento en masa, sin afectaciones viables.

Descripción detallada de la Cerca:

K3+810: Costado izquierdo 3 lineas de alambre de pua
K3+980: sin linea
K4+000: sin linea
K4+110: Costado izquierdo: 3 lineas de alambre de pua. Costado derecho: 3 lineas alambre de pua.
K4+160: Costado izquierdo: 3 lineas de alambre de pua Costado derecho: 3 lineas alambre de pua.
K4+200: Costado izquierdo: 3 lineas de alambre de pua. Costado derecho: 3 lineas de alambre de pua.
K4+230 Costado izquierdo: 3 lineas de alambre de pua Costado derecho: 3 lineas de alambre de pua.
K4+270 Costado izquierdo: 3 lineas de alambre de pua. Costado derecho: 3 lineas de alambre de pua.
K4+300: Costado izquierdo: 3 lineas de alambre de pua; costado derecho: 3 lineas de alambre de pua.
K4+350: Costado izquierdo: 3 lineas de alambre de pua, Costado derecho: 3 lineas de alambre de pua.
K4+340: Costado izquierdo: 3 lineas de alambre de pua, Costado derecho 3 lineas de alambre de pua.
K4+380: Costado izquierdo: 3 lineas de alambre de pua, Costado derecho: de alambre de pua.
K4+430: costado izquierdo: 0, Costado derecho: 3 lineas de alambre de pua.
K4+480: Costado izquierdo: 0, Costado derecho: 3 lineas de alambre de pua.
K4+510: Costado izquierdo: 0, Costado derecho: 3 lineas.
K4+575: final del proyecto.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 13

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT. 900.112.022-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones exigidas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente avisa de privacidad informa a los titulares de los datos personales suministrados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y durante el ejercicio de la actividad misional, que estos han sido recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos y en general tratados conforme a lo dispuesto en el objeto y finalidades establecidas en la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra página web: www.vias.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de vecindad Cerramiento del predio
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	Sumapaz	Río Sumapaz	Vereda Santo Domingo	K0 + 550	Predio	20019001	0+550

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Albertino Vargas Baquero		# Teléfono:		Dirección:	Vereda Santo Domingo			
No. de placa del predio:	1	Estrato:	# Móvil:	3213074382					
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: 1984		Edificación construida o remodelada recientemente:	NO	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	NO	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada:	N/A	No presenta fisuras o grietas visibles:	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua:		1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Se hace levantamiento de acta de vecindad para el cerramiento del predio.
2. Alcantarillado:		2. Comercial				
3. Energía:		3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Telefonía:		4. Institucional				
5. Gas:		5. Lote Baldío	X			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas):	SI	X	N/A
Paredes:	SI	X	N/A
Ventanas y puertas:	SI	X	N/A
Otro:	SI	X	N/A

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento (temporal o definitivo):	SI	NO	N/A
Revestimientos:	SI	NO	N/A
Rampas de acceso:	SI	NO	N/A

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrés A Garcia Nombre: Andrés Alberto Garcia posada Identificación: CC 79'756'111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Albertino VS Nombre: 90 39 86 1 Identificación:
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

** NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,arena otros

Predio inicial Ko+130 todo izquierdo hacia mayores Ko+680

Ko+130: Cercos desadaptados postes - hilos desadaptados
Ko+160 Hasta el Ko+310: hacia mayores, postes desadaptados, dos(2) hilos de alambre de púas
Ko+310: No se observa presencia de Cercos
Ko+390 se vuelve a observar presencia de Cercos de dos(2) hilos.
Ko+380 hasta el Ko+350: se detecta presencia de Cercos en buen estado y acceso a un predio
Ko+350. se encuentra presencia de Cercos en buen estado, Cerco de (3) tres hilos en buen estado
Ko+480 hasta el Ko+500 Cerco que se interrumpe en el Ko+500 por una Canción:
Ko+510 ingreso al predio no tiene uso.
Ko+515 a Ko+535 Cerco queda oculto por la vegetación, presencia de una señal de tránsito desadaptada.
Ko+535. Cerca interrumpida por acceso.

Descripción detallada de la Cerca:

Ko+140, Ko+160, Ko+165, Ko+180, Ko+185. Postes caídos.
Ko+240: dos líneas alambre de pua, luego se observa únicamente una línea en la observación. Ko+280.
Ko+290: se observan dos líneas de alambre de pua, costado izquierdo.
Ko+305: sin alambre de pua.
Ko+330: dos líneas de alambre de pua. - postes de madera Cerco Vivo
Ko+335. Tres líneas de alambre de pua. - postes de madera Cerco Vivo
Ko+350. Tres líneas de alambre de pua. - postes de madera Cerco Vivo
Ko+385. dos líneas de alambre de pua. - postes de madera Cerco Vivo
Ko+440. Tres líneas de alambre de pua. - postes de madera Cerco Vivo
Ko+445. 0 líneas.
Ko+460. Tres líneas de alambre de pua. - postes de madera Cerco Vivo
Ko+490. Tres líneas de alambre de pua - postes de madera Cerco Vivo
Ko+535. Tres líneas de alambre de pua - postes de madera Cerco Vivo
Ko+550. Tres líneas de alambre de pua - postes de madera Cerco Vivo
Ko+570. dos líneas de alambre de pua - postes de madera Cerco Vivo
Ko+580. Tres líneas de alambre de pua - postes de madera Cerco Vivo
Ko+635 Tres líneas de alambre de pua - postes de madera - Cerco Vivo
Ko+650 Tres líneas de alambre de pua - postes de madera - Cerco Vivo
Ko+680 Tres líneas de alambre de pua - postes de madera - Cerco Vivo.

La palabra desadaptado, Hace referencia a que el palo rollizo se encuentra inclinado.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 14

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900137020-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente acata la privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estatuto y estatutos propios de la entidad general, que estos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que usted consultar en nuestra portal web: www.uaermv.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA NOVEDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acto de vecindad Cerramiento del Predio
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK:
	Sumapaz	Bio Sumapaz	Capitolio	K3+3940 - K4+0,85	Capitolio	20076233	91026655

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nom del Propietario o Habitante:	Norberto Hurtado			# Teléfono:		Dirección:	Predio Capitolio		
No. de pisos del predio:	N/A	Estrato:	N/A	# Móvil:	3219368833				
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: (año)	N/A	Edificación construida o remodelada recientemente:	N/A	La estructura presenta fisuras mayores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada:	N/A	No presenta fisuras o grietas visibles:	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial		¿Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Se hace levantamiento de acto de vecindad por Cerramiento del predio
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas		5. Uso Baldío	X			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	N/A
Paredes	SI	X	N/A
Ventanas y puertas	SI	X	N/A
Cubierta	SI	X	N/A

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento (sencillo o reforzado)	SI	X	N/A
Andenes/vías	SI	X	N/A
Rampas de acceso	SI	X	N/A

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrés A García Nombre: Andrés Alberto García Posada Identificación: CC 1019758111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Norberto Hurtado Nombre: Identificación: CC 19175154
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

Rubys Ruiz
R. Social
UAERMV.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de cerámica,entre otros

Predio inicia desde el a la K3+800, se evidencia cerramiento perimetral en polo sencillo + hilos de alambre de puas. se evidencia cerramiento suelto debido a el movimiento en masa que presenta el talud.

Descripción de la Cerca:

K3+810: Costado derecho: 3 lineas de alambre de pua: postes de madera
K3+980: Costado derecho: 3 lineas de alambre de pua postes de madera
K4+000: Costado derecho 3 lineas de alambre de pua: postes de madera

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 15

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en ejercicio [illegible] identificada con el NIT 901113262-7, en relación con la(s) obra(s) ejecutada(s) en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el [illegible] suscrito con [illegible] y en desarrollo de las [illegible] delegada por la Dirección General, [illegible] Protección y Tratamiento de Datos Personales, que puede consultar en nuestra página web www.umv.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EN EJECUCIÓN):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras Hidraulicos
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA	LOCALIDAD	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ)	BARRIO	NOMENCLATURA	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	Sumapaz	Pio Sumapaz	Valle Domingo	Km 080	Capilla	2004001	91024666

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante: Fernando Daniel Vasquez

C.C. No. para el predio: | Email: | # Teléfono: 3133990589 | Dirección: Vereda Santo Domingo

Edificación construida o remodelada recientemente:		¿La estructura presenta fisuras, hundimientos o grietas en fachada o al interior del predio?		La estructura presenta grietas, fisuras o 3 con en fachada		No presenta fisuras o grietas visibles	

SERVICIOS PÚBLICOS		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua	/	1. Residencial	NA	¿Habitan personas en condición de discapacidad?	NA	Uso Actual Agricultura y ganadero
2. Alcantarillado	/	2. Comercial	NA	NA		
3. Energía	/	3. Industrial	NA	¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	NA	Se realiza levantamiento de acta de vecindad Por cerramiento del Predio
4. Teléfono		4. Institucional	NA	NA		
5. Gas: Pipeta	/	5. Uso Barrio	X			

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y viga)	SI	NO	N/A
Muros	SI	NO	N/A
Pañete y pintura	SI	NO	N/A
Cubierta	SI	NO	N/A

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Confinamiento, rampas y sardinel	SI	NO	N/A
Andenes	SI	NO	N/A
Rampas de acceso	SI	NO	N/A

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrea Garcia Nombre: Andrea Alejandra Garcia Posada Identificación: 1075611111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Fernando Daniel Nombre: 1139639 Identificación:
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CODIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otras

Iniciamos recorrido de mayor a menor se inicia recorrido en la abscisa Ko+806, costado izquierdo, se observa Cerco Viva conformado por tres (3) lineas de alambre de pua, a la altura de la abscisa Ko+745 se observa talud, continúa el predio con las mismas caracteristicas descritas anteriormente. Luego se observa la abscisa Ko+640 hasta la abscisa Ko+610, el señor Fernando Ramirez informa que este predio es de propiedad del señor: Julio Ramirez, hermano del señor Fernando, este predio presenta Cerco Viva, conformado por dos alambre de pua, sin arboles, tiene natural y su ubicación es en el costado izquierdo.
El señor Fernando Ramirez señala que la escuela de Santo Domingo hace parte del predio, pero fue donado por su padre para que allí se construyera la escuela. Luego el predio de mayor a menor no presenta Cerca, no presenta arboles, y se observa material arbustivo, se continúa recorrido en el Ko+550 costado izquierdo, se observa Cerco Viva conformado por tres alambres de pua, luego se observa talud en la abscisa Ko+450, en la parte superior de este talud se observa Cerco Viva más tres alambre de pua, sin arboles a la altura de la abscisa Ko+270, se observa Quebrada, se continúa recorrido en el Ko+180, se observa Cerco Viva, alambre de pua de tres lineas, sin arboles, material arbustivo finaliza en el Ko+080.

Descripción de la Cerca.

Ko+080: Cerco (o) lineas - costado derecho
Ko+180: Cerca Viva alambre de pua, tres lineas → costado derecho recorrido de menor a mayor.
Ko+450: Talud, tres lineas de alambre de pua, costado derecho.
Ko+550: Tres lineas de alambre de pua, Cerco Viva. Costado derecho.
Ko+640: Tres lineas de alambre de pua, Cerco Viva, Costado derecho.
Ko+650: Tres lineas de alambre de pua, Cerca Viva, Costado derecho.
Ko+745: Tres lineas de alambre de pua, Cerco Viva Costado derecho
Ko+806: Tres lineas de alambre de pua, Cerco Viva, Costado derecho.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 16

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UNIRMV, identificada con el NIT 900112022-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente avisa de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad general, que éstos son un soporte del cumplimiento del derecho y sano balance con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.unirmv.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	Levantamiento acta de vecindad - Cerramiento
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RIGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	Usme	Alfonso López	Verbenal	Kr 1 # 99Q	Capitolio	204001	9+03,7636

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante: Rosa Dimate		# Teléfono:		Dirección: Finca el Parque - Vereda Santo Domingo	
No. de predio con predio: N.A.	Consec: 1	# Móvil: 3113446560			
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: N/A	Edificación construida o remodelada recientemente: N/A	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio: N/A	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada: N/A	No presenta fisuras o grietas visibles: N/A	

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES
1. Agua		1. Residencial	N.A.	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	N.A.	se hace levantamiento de acta de vecindad para Cerramiento del predio
2. Alcantarillado		2. Comercial	N.A.			
3. Energía		3. Industrial	N.A.	¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N.A.	
4. Teléfonos		4. Institucional	N.A.			
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	NO	N/A
Muros	SI	NO	N/A
Ventana y puertas	SI	NO	N/A
Jardín	SI	NO	N/A

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento (sardinel o bordillo)	SI	NO	N/A
Recubrimientos	SI	NO	N/A
Rampas de acceso	SI	NO	N/A

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrés A Garcia Nombre: Andrés Alberto Garcia Identificación: C.C 79'736'111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Nombre: Rosa Dimate Identificación: 39632477
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

** NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.*

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de los cerramientos,entre otros

Desde el Km 960 hasta el Km 1000 exposición Caliza Viva conformada por rellenos de madera y dos (2) líneas de alambre de púa.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 17

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	NA	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras Hidráulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	TRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK:
	Sumapaz	C. Rio Sumapaz	V. Santo Domingo	Ko 1640	Capitolio	204Tec1	9+0366

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Nilson Lopez - Blanca Yaneth Soga	# Teléfono:	3	Dirección:	
No. de placa del predio:	N.A.	Correo:	# Móvil: 3125954602.		

Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10 / 1984:	N.A	Edificación construida o remodelada recientemente:	N.A	La estructura presenta fisuras menores a 2 mm en fachada o al interior del predio:	N.A	La estructura presenta grietas mayores a 2 mm en fachada o al interior del predio:		No presenta fisuras o grietas visibles:	

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua	N/A	1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	- Uso Agropecuario. - Se realiza acta de vecindad Por Cambiamento del Predio
2. Acueducto	N/A	2. Comercial				
3. Energía	N/A	3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Teléfonos	N/A	4. Institucional				
5. Gas	N/A	5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas):	SI	NO	N/A
Paredes:	SI	NO	N/A
Ventanas y puertas:	SI	NO	N/A
Cerramiento:	SI	NO	N/A

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel):	SI	NO	N/A
Revestimiento:	SI	NO	N/A
Rampas de acceso:	SI	NO	N/A

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrea A Clavijo Nombre: Andrea Alberto Clavijo posada Identificación: CC 79'396'111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Blanca Yaneth Soga H Nombre: Blanca Yaneth Soga H Identificación: 31973843
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA (SI APLICA):	Firma: Nombre: Identificación:

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

Rubys Ruiz
R. Social
UAERM.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CODIGO: INFRA-FR-016	VERSION: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2017	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, puertas, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otras

Se realiza recorrido con la señora Blanca Yaneth Sosa, esposa del señor Nilson López, al predio Va desde la abscisa Ko+6140 hasta la abscisa Ko+7229 se observa Cerco vivo, tres hileras de alambre de pua, y talud en el punto Ko+640 y Ko+720 Cerco en buen estado.

Blanca Yaneth Sosa H.

Descripción de los Cercos:

Ko+640: Tres hileras de alambre de pua - Cerco Viva
Ko+720 Tres hileras de alambre de pua - Cerco Viva.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



406

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No.: 18

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900137035-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente avisa de privacidad informa y los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estatuto y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un insumo del ofrecimiento del bienes y sean tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestra portal web: www.uaermv.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Acta de Vecindad Cerramiento del Predio
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	Sumapaz	Nazareth	Santo Domingo	Kr 61 D 10 a la Kr 61 D	Capitolio	20611001	91021636

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Julio Bonilla			# Teléfono # Móvil:	3225484224 3135910589	Dirección:	Vereda Santo Domingo		
No. de placa del predio:		Extras:	1						
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10 vigente:	N/A	Edificación construida o remodelada recientemente:	N/A	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	N/A	La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada:	N/A	No presenta fisuras o grietas visibles:	N/A

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua:		1. Residencial:		¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	N/A	Se hace levantamiento de acta para cerramiento del predio, firma el hermano, ya que el Propietario no se encuentra en el territorio
2. Alcantarillado:		2. Comercial:				
3. Energía:		3. Industrial:		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	N/A	
4. Teléfonos:		4. Institucional:				
5. Gas:		5. Lote Baldío:				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	NO	N/A
Muros	SI	NO	N/A
Cubierta y techos	SI	NO	N/A
Otros	SI	NO	N/A

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	NO	N/A
Mobiliarios	SI	NO	N/A
Rampas de acceso	SI	NO	N/A

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrea Garcia Nombre: Andrea Alberto Garcia Posada Identificación: C.C 79'756.111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Julio Bonilla Nombre: Julio Bonilla Identificación: 19191585
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Identificación:	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

Rubys Ruiz
R. Social
UAERMV.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-019	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:
Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otros
Cerramiento perimetral inicia en la abscisa Km 6+10, hasta la abscisa Km 6+40, en polo tollico y ambiente de pues en buen estado.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTAS DE VECINDAD INICIALES DE OBRA

LAGUNA VERDE

CIV

20039002

1

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-018 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No: 01

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	daños hidráulicos
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (ICV):	PK:
06-06-2024	SUMAPAZ	C-PZD Boquerón	Lajitas	?	Lajitas	4039002	?

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Raúl Martínez Pobón			# Teléfono:		Dirección:	?
No. de pisos del predio:	1	Estado:	Mural	# Móvil:	321 373 7699.		
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10 - Si/o:		Edificación construida o remodelada recientemente:	15'	La estructura presenta fisuras mayores a 1 mm en fachada o al interior del predio:	?	La estructura presenta grietas mayores a 1 mm en fachada o al interior del predio:	?
						La presenta fisuras o grietas visibles:	?

SERVICIOS PUBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERISTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua	✓	1. Residencial	✓	¿Hacen personas en condición de discapacidad?	No	Cerca: (tres) 3 hiladas de alambre de pua.
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía	✓	3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	Si	
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas: Pipeta	✓	5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas):	SI	NO	
Paredes:	SI	NO	Humedades parte inferior de muros con floreos leves.
Cerramiento y puertas:	SI	NO	Puertas en madera, desgastadas por uso constante.
Cerramiento:	SI	NO	Algunos ejes presentan cerramientos

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel):	SI	NO	
Recubrimiento:	SI	NO	
Rampas de acceso:	SI	✓	

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrés A García Nombre: Andrés Alberto García posada Identificación: 79'756'111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Nombre: Identificación: 1'121'82 [illegible]
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Oscar Mauricio Mayo Londoño Identificación: CC 1015412080 TARJETA 265015	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

*NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

2.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otras

Ingreso con evidencia en tejuela natural, en el costado izquierdo se observa aglomerado de ladrillo, cielo raso metal con polos y rellenos tres (3) áreas de alcobas con pisos tejuela natural, columnas y vigas en madera, cubierta en teja de zinc con desgaste natural, pared lateral derecho (costado izquierdo habitación) piso mineral, piso en concreto, cubierto mineral se observa fisura, ventanería malla en metal vidrios en buen estado, puerta de acceso en madera, piso mineral muros pañete-pintura, cielo raso, cubierta con machimbre presenta rastros de humedad, cubierta en zinc, piso exhibe fisura longitudinal, área común piso en concreto metalizado, vigas y columnas en madera pared costado izquierdo aglomerado, cubierta en plástico con desgaste, costado derecho presenta cableado metálico, en el costado derecho, 4 habitaciones piso en mineral con fisuras muros bloque a la vista cielo raso en madera con presencia de humedad, fisuras en los bloques. Alcoba 2 costado derecho piso en mineral, muros pañete-pintura, cielo raso cubierto con madera vigas de madera, muros rastros de humedad. Hall (corredor) en el mismo exhibe estado de luz cableado metálico, vidrio en buen estado, Alcoba 3 identicas características puerta en madera, ventanería malla metálico, ventanería mixta martillado y lisos. Vidrios, Alcoba 4 no se pudo observar identicas características. Alcoba 5 piso en madera, muros bloque a la vista, cubierta vigas en madera, teja de zinc, ventanería malla metálico, ventanería buen estado, vidrios martillados lisos, estable piso en tierra, cerramiento madera cubierta en teja de zinc, apoyada en madera, vigas en madera, piso de la vivienda (costado izquierdo) piso en concreto presenta cerramiento bloque a la vista externamente se observa plástico y cubierta plástico apoyado en cerca bolillos de madera, bajo piso en baldosa, muros frente a la vista, cielo raso exhibe madera, (cocina costado izquierdo piso en concreto con agrietamiento, muros bloque a la vista ventanería, mixto izquierdo malla metálico, vidrios en buen estado, cubierta cubierta con madera, vigas de madera, manposteria y rellenos en madera, puertas madera presenta también ventanería malla metálico vidrios OK.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



①

FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 02

La unidad administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UAERMV, identificada con el NIT 900.112.515-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 de 2015, y demás que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, informa que los datos personales recolectados a través de la presente acta serán objeto de tratamiento por parte de la UAERMV, en desarrollo de sus funciones delegadas por el Acuerdo 6 de 1990 y demás concordantes, cumplir con el objeto del Mejoramiento de Tramos y demás relacionados con estos cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias que rigen el tema de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que para consulta se encuentra publicada en el siguiente enlace: www.shd.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACION PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCION:	- Obras hidráulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RIGIDO:	N/A	REHABILITACION CONCRETO RIGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CODIGO DE IDENTIFICACION VIAL (CIV):	PK
06-06-2024	Sumapaz	C.P.U. Blanca Laguna Verde	?	?	Frente 2	2003902	?

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre de Propietario o Habitante:	Fidel Martinez Hidalgo			# Teléfono:	←	Dirección:	?		
No. de pisos del predio:	1	Estrato:	1	# Celular:	3223904187				
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: 1990	2023	Edificación construida o remodelada recientemente:	✓	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	NO	La estructura presenta grietas mayores a 7 mm en fachada o al interior del predio:	?	No presenta fisuras o grietas visibles:	?

SERVICIOS PUBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERISTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial	✓	¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	NO	
2. Acueducto	✓	2. Comercial				
3. Energía	✓	3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?	Si	
4. Teléfonos		4. Institucional				
5. Gas Pipeta	✓	5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	NO	No presenta afectación
Paredes	SI	NO	No presenta afectación
Ventana y puertas	SI	NO	No presenta afectación
Cerramiento	SI	NO	

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripcion de la Afectación:
Confinamiento (sardinel o cordon)	SI	NO	
Recubrimientos	SI	✓ NO	
Rampas de acceso	✓ SI	NO	Rampa de acceso en concreto.

RESIDENTE SOCIAL:	Nombre: Andrés Alberto García Posada Identificación: CC 79'756'111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Nombre: Fidel Martinez H Identificación: 79527509 BT
RESIDENTE TÉCNICO:	Nombre: Oscar Mauricio Mejia Londoño Identificación: CC 1015413086 T.P. 285260	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA (SI APLICA):	Nombre: Identificación:

¹ NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

(2)

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

6. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otras

Acceso al predio: Reja metálica, ingreso vehicular placa de concreto, muros mampostería, recubierto con cemento, exponen fisuras y vigas en perfilería metálica; cubierto en lámina de zinc, punto eléctrico soldado, aporreado en recibo metálico piso baldosa, tipo fino pegado, embaguillada, zona para puerta, ingreso al predio piso en baldosa, muros cocina, frontal y lateral derecho en baldosa, cubierta en PVC, mesón mampostería, recubierto con baldosa, ventanería malla metálica, vidrio en buen estado, muro pared-pintura desprendimiento de pintura, inicial; al lado de recibo. Alcoba 1, costado derecho piso en baldosa, muros pared-pintura, cielo raso en PVC, recubierto con PVC, puerta de acceso en madera. Alcoba 2, puerta de acceso en madera piso en baldosa, muros pared-pintura, placa de entre piso recubierto con PVC, buen estado. Habitación 3, costado derecho piso en baldosa, muros pared-pintura, placa de entre piso, recubierto con PVC, bajo piso y muros enchapados, placa de entrepiso recubierto con PVC, patio piso en baldosa, muros pared-pintura, cielo raso exposición teja mixta translúcida y metálica red eléctrica canalizada en tubo PVC. Alcoba 4, costado izquierdo piso en baldosa, muros pared-pintura, placa de entre piso recubierto con PVC, puerta de acceso en madera. Predio en buenas condiciones.

* solicito que la alcaldesa sea adecuada

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO





①

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

ACTA DE VECINDAD No. 03

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en ejercicio [illegible] en especial las responsabilidades establecidas en la Ley 1551 de 2012, y en el Decreto 1076 de 2015, a través del presente acta de protección [illegible] a los titulares de los bien inmuebles colindantes y vecinos por la Entidad, en relación con las futuras [illegible] con el fin de [illegible] posibles daños en la estructura por las [illegible] dentro de la ejecución [illegible] en el marco del cumplimiento del Artículo [illegible] Decreto 1076 de 2015 [illegible] de conformidad con el Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que para consultar los mismos puede [illegible] en el siguiente [illegible]

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras hidraulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
06-06-2024	Sumapaz	El Rio	Blanca Luz		L. Vial	2039003	

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Bonifacio Hernandez		# Teléfono:	Dirección:	?
No. de cédula del predio:		Estrato: Rural	# Móvil: 3043463224		

Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10 / EBPs:		Edificación construida o remodelada recientemente:		La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:		La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	?	No presenta fisuras o grietas visibles:	?

SERVICIOS PUBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERISTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua	//	1. Residencial		¿ Habitan personas en condición de discapacidad?	No	
2. Alcantarillado	//	2. Comercial				
3. Energía	//	3. Industrial		¿ El inmueble cuenta con garaje vehicular?		
4. Teléfonos	//	4. Institucional				
5. Gas	Pipeta	5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	NO	
Muros	X	NO	muros con bloque a la vista, con exposo desgaste
Ventana y puertas	SI	NO	marcos de madera metálicos, expuestos desgaste
Cerramiento	SI	NO	

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Confinamiento (sardinel o cajonal)	SI	NO	
Rasantamiento	SI	NO	
Rampas de acceso	SI	NO	

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andres A Garcia Nombre: Andres Alberto Garcia Posada Identificación: C.C 79796111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Nombre: Camilo Hernandez Identificación: 1020880349
RESIDENTE TECNICO:	Firma: Nombre: Identificación: C.C 1015413966 Contratista Tecnico Practicas	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

*NOTA: SI hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

(2)

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otros

ingreso al predio, cocina piso en concreto, muros en bloque a la vista. regata para red electrica (empalizado en tubo pvc) inicialmente se observa ingreso vehicular, bloche en palo rollizo con tres lineas de alambre de pua, terreno natural, cubierta teja mixta translucida y lámina fibrocemento pintura electrostatica, apoyada en viga con perfileria metálica. mayor mampostería son en etapas. faltan algunos pisos. fachada frontal marco metalico vidrio en buen estado, puerta de acceso en madera, alcoba 1 piso en concreto con mineral expone. fisurado, muros bloque a la vista, fisurados en bloques, cubierta metálica con pintura electrostatica apoyada en viga metálica, perfileria metálica expone fisuras totalmente, y lateralmente, marco metalico vidrios machillados en buen estado. puerta de acceso metálico vidrio machillado una piso, expone fisuramiento, alcoba 2 piso en concreto, muros bloque a la vista, cubierta metálica con pintura electrostatica apoyada en viga metálica expone ventanal marco metálico 2 pisos expone fisuramiento, puerta de acceso metálica, hall puerta de acceso expone vidrio fisurado, pared metálica externa, garaje piso en concreto pobre y tierra, cubierta mixta, en cinc metalico con pintura electrostatica y fibrocemento en el extremo izquierdo sin puerta y extremo derecho expone muro en bloque, baño piso en concreto, muros en bloques a la vista, cubierta metalica apoyada en vigas metalica puerta de acceso metalica. sala comedor piso en concreto, expone fisuras en vigas, muros en bloque a la vista expone ventanal frontal, malla metálica, resto exterior metálica ausencia de vidrio frontal.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No. 04

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UNIDAD, identificada con el NIT 901127057-7, en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente acto se entera del tratamiento de sus datos personales recolectados y obtenidos por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Proceso y recogidos dentro de la actividad misional para lo cual fue suscrita del diligenciamiento del formato y este Usuario con pleno conocimiento de los deberes y derechos constitucionales, legales y reglamentarios que rigen el tratamiento de datos personales de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que puede consultar en nuestra página web: www.umv.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	N/A	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	N/A	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obras Hidraulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	N/A	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	N/A				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
06-06-2024	Suba	C. Río Blanco Lagunaverde			Lagunaverde	200390	

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Humberto Contreras		# Teléfono:		Dirección:	?			
No. de casa del predio:	1	Costado: RURAL	# Móvil:	3129611230					
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: 1984		Edificación construida o remodelada recientemente:	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	?	La estructura presenta grietas mayores a 1 cm en fachada o al interior del predio:	?	No presenta fisuras o grietas visibles	?	

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua	✓	1. Residencial	✓	¿Habitan personas en condición de discapacidad?	Si	
2. Alcantarillado		2. Comercial				
3. Energía	✓	3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	Si	
4. Teléfono	✓	4. Institucional				
5. Gas	P.Pto ✓	5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	NO	NA
Paredes	SI	NO	NA
Cerramiento y puertas	SI	NO	NA
Cubrimiento	SI	NO	NA

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación:		Descripción de la afectación:
Cumplimiento (andén y calzada)	SI	✓	
Reductores	SI	✓	
Rompes de acceso	SI	✓	

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Nombre: Identificación:	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: Humberto Contreras Nombre: Identificación: 21 [illegible] 882
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Oscar Mauricio Moyano Identificación: 1015[illegible]3086 Cargo: Coordinador Técnico Programas	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

* NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS:

Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerradura,entre otras

Acceso vehicular, piso en gravilla, hacia el extremo derecho en adelante piso en tierra, cubierta en teja de zinc, apoyado en tellizos de madera, hacia el extremo derecho se observa construcción en bloque a la vista ventanal marco metálico vidrio, mixto, martillado y liso en buen estado cubierta en teja de zinc, expone chapeta de agua lluvias metálico. baño piso en baldosa, muros en bloque, del baño expone ducha enchapada, pared restante pañete-pintura. cubierta en teja de zinc, apoyada en tellizos de madera, red eléctrica conducida en tubo pvc. puerta de acceso metálico. cuarto de lavadora, puerta del acceso en madera, piso en concreto, muros en bloque a la vista, puerta expone desnivel frente a esta, área expone caja de agua lavaduelas. bajo piso en baldosa. muros, pañete-pintura, cubierta en pvc. expone claraboya, en acrílico, buen estado, cocina piso en baldosa, muros pañete-pintura, área del mismo enchapado cubierta expone madera. apoyado en tellizos de madera. puerta de acceso en madera. Alcoba 1 piso en baldosa área, muros pañete-pintura, cubierta machimbre (madera) sin fisuras, sin grietas, puerta de acceso en madera. Alcoba 2 piso en baldosa. muros pañete-pintura, plafón de este piso, recubierto con madera, puerta de acceso en madera. alcoba, tres (3) costado izquierdo piso en baldosa muros pañete-pintura, buen estado, cubierta en madera. sin fisuras sin grietas. alcoba 4) piso en baldosa, muros pañete-pintura, plafón de este piso recubierto con madera puerta de acceso en madera, buen estado.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CODIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



FORMATO ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: INFRA-FM-016 | VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023

ACTA DE VECINDAD No: 05

- Predio en Construcción

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante UNIMETRO, identificada con el NIT 900112522-7, en calidad de responsable en materia de las bases personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 del 2012 y en el Decreto 1074 de 2015, le invita a participar como titular de la información de las bases personales recolectadas y tratadas por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estatuto Orgánico de la Movilidad y siguiendo el marco de la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que puede consultar en nuestra página web: www.unimetro.gov.co

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE:	NA	SITUACIONES IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD (EMERGENCIAS):	NA	OTRO TIPO DE INTERVENCIÓN:	obras hidráulicas
MANTENIMIENTO CONCRETO RÍGIDO:	NA	REHABILITACIÓN CONCRETO RÍGIDO:	NA				

FECHA:	LOCALIDAD:	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ):	BARRIO:	NOMENCLATURA:	FRENTE DE OBRA:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV):	PK
	Suma Paz	2	L. Verde	?	L. Verde	2003002	?

1. DATOS DEL PREDIO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Nombre del Propietario o Habitante:	Miguel Contreras Pomeo			# Teléfono:	/	Dirección:			
No. de pisos del predio:	1	Sótano:	1	# Movil:	3102526923 Pad mdel propietario				
Año aproximado de construcción del predio con la normativa NSR-10: 1984		Edificación construida o remodelada recientemente:	Mulo	La estructura presenta fisuras menores a 3 mm en fachada o al interior del predio:		La estructura presenta grietas mayores a 3 mm en fachada o al interior del predio:	NA	No presenta fisuras o grietas visibles:	NA

SERVICIOS PÚBLICOS:		USO ACTUAL:		CARACTERÍSTICAS DE ACCESO:		OBSERVACIONES:
1. Agua		1. Residencial		¿Habitan personas en condición de discapacidad?	NA	Se proyecta contar con todos los servicios
2. Acueducto		2. Comercial				
3. Energía		3. Industrial		¿El inmueble cuenta con garaje vehicular?	NA	
4. Teléfonía		4. Institucional				
5. Gas		5. Lote Baldío				

2. DESCRIPCIÓN GENERAL EN FACHADA (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X	
Paredes	SI	X	
Ventanas y puertas	SI	X	
Cerramiento	SI	X	

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO: (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Confinamiento (bordillo o sardinel)	SI	X	NA
Rasantes/vías	SI	X	NA
Rampas de acceso	SI	X	NA

RESIDENTE SOCIAL:	Firma: Andrés A. Garcia Nombre: Andrés Alonso García Posada Identificación: 79.756.111	PROPIETARIO / HABITANTE:	Firma: EG. Nombre: Edgardo Contreras Identificación: 14.422.615
RESIDENTE TÉCNICO:	Firma: Nombre: Ing. Civil, Mauricio Mejía Cano Coordinador Predial Identificación: CC 10154123086	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA: (SI APLICA)	Firma: Nombre: Identificación:

*NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

4. DESCRIPCION DEL PREDIO - PAREDES INTERNAS
Realice una descripción detallada del estado estructural del predio, techos, paredes, pisos, ventanas, estado de la cerámica,entre otras
Predio en obra gris: se proyecta la construcción de tres apartaestudios, sala-comedor, cocina y garaje. Cubierta metálica (acordada de color) apoyada en cercha metálica, piso y muros: piso en concreto, muros pañete, pintura para ventanas y para pulir.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
	CÓDIGO: INFRA-FM-016	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2023	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



A5

- *Lista de chequeo mes de julio Consorcio Gaviones 95.*

CONSORCIO GAVIONES 95 CTO 478/22 GRUPO 1
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022

FECHA: 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025 COMPONENTE SOCIAL

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CONSOLIDADO
		100%	50%	0,0%	N/A	
1	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal social cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional social asistió a los comités de seguimiento integral y social a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de Gestion Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Plan de Gestión Social						
Programa de atención al Usurario						
5	Instaló el punto de atención al Usurario.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
6	El punto de atención ciudadano funcionó en el horario establecido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
7	El punto de atención al usuario cuenta con dotación mínima requerida.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
8	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRSFD .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
9	Realizó el respectivo seguimiento a las PQRSFD abiertas durante el período de evaluación.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
10	Dio respuesta a las PQRSFD de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
11	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRSFD solicitados por la Interventoría.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
12	El contratista cumplió con los recorridos programados por frente de obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa de información y participación comunitaria						
13	Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
14	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
15	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
16	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA

17	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
18	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
19	Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
20	Elaboró las actas de gestión adelantada con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
21	El contratista cumplió con los compromisos en los tiempos pactados con el ciudadano.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
22	Elaboró las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
23	Entregó las actas de vecindad y compromiso a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
24	El profesional hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actas establecidas contractualmente.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
25	Se entregó copia de las actas de compromiso y de vecindad a la comunidad, si son requeridas por la misma, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
26	El profesional social realizó el acompañamiento durante los registros fílmicos del estado inicial de las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
27	Se entregó el respectivo registro fílmico de las vías a la Interventoría para su revisión y aprobación de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
28	La entidad ejecutora realiza acompañamiento al comité veedor conformado por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
29	La entidad ejecutora convoca y realiza reuniónes de comité de participación comunitaria (veedor), de acuerdo a las solicitudes realizadas por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Programa de Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto						
30	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa del cultura vial						
31	Realiza sensibilización de sostenibilidad y cuidado de la vía con las temáticas y el tiempo establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Mano de obra no calificada						
32	Cumplió con el reporte en el informe mensual de personal de mano de obra no calificada local.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

33	Cumplió con el reporte en el informe mensual población en condición de vulnerable.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
34	Cumplió con el reporte en el informe mensual la contratación de mujeres en el proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Movilidad						
35	El contratista realiza socialización del PMT.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	NA
Información del proyecto						
36	Elaboró e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
37	Elaboró y distribuyó los volantes de inicio a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
38	Elaboró y distribuyó los volantes de finalización de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
39	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información de los cierres programados en la via a la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
40	Elaboró y distribuyó los volantes, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
41	Instaló el (los) Punto(s) informativos fijos de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
42	Realizó mantenimiento a (los) punto informativos y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
43	Instaló la (s) valla (s) informativa (s) móviles y pasacalles de acuerdo a los requisitos y tiempos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	0%
Reportes						
44	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rual del Sumampaz, la información del plan de gestión social .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
45	Tiene disponibilidad al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	50%
45	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Social	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
47	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
48	Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de de la Gestión social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
49	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	50%
TOTAL CALIFICACIÓN						**91%**

OBSERVACIONES	
ELABORÓ	
	Profesional social de Interventoría ECOVIAS SAS
	Isabel Bernal Yasso
ACEPTÓ	Profesional social del CONSORCIO GAVIONES 95
	Andres García

A6

- *Copia Bitácora Consorcio Gaviones 95.*

la Unidad de Mantenimiento vial ejercicio de Control Social, este presenta observaciones en dos ocasiones, finalmente es entregada en horas de la noche, no dando tiempo a revisión nuevamente, Se entrego a la UACRHV. en la exposición Se evidencio que no fueron atendidas las observaciones dadas por la interventoría.

Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T.P. 085535212-R

Andrea J Garcia

31/07/2025
Actividades realizadas
El Consorcio Suvenos 95 Participó en la reunión programada por el) la Unidad de mantenimiento vial Ejercicio de Control Social el cual se realizado en la Vereda de San Juan del Sumapaz.
La interventoría realizó llamado de atención Consorcio Suvenos 95 por cuanto (la) el consorcio no hace entrega de la presentación del ejercicio de control Social a tiempo. para revisión y aprobación y el componente técnico no realizó acompañamiento a la reunión mediante Comunicado 186-1-784

Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T.P. 085535212-R

Andrea J Garcia

1/08/2025
Actividades realizados
El Componente social realizó acompañamiento al comité de Seguimiento integral # 54 donde se encuentran los componentes SST. técnico, Social y ambiental, con el fin de realizar Seguimiento al proyecto

Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T.P. 085535212-R

Andrea J Garcia

2/04/2025.
Actividades realizadas
- El Contratista hacen entrega del volante informativo informando los canales de atención a la comunidad estos es revisado y avalado por la interventoria. para ser entregados a la comunidad. los cuales son distribuidos a la comunidad de Jaguar verde
- El profesional Social realizó atención al ciudadano dió apertura al la queja del Señor Ramiro Martinez quien manifesto que el vehiculo de obra le golpeo la Señal de transito. el profesional realizará seguimiento a la PQRS presentada.
- Se realizo mesa de trabajo con el Consorcio Caminos 95, y la interventoría con el fin revisar las observaciones del informe mensual # 14 V. con el fin de resolver dudas.

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T.P. 0[illegible]212-R

Andrés J. Garcia

3/08/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades en obra.

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T.P. 0[illegible]212-R

Andrés J. Garcia

4/8/2025
Actividades realizadas
- Se realiza recorrido de obra, con el fin de g resolver o dar respuestas a las inquietudes que tenga la comunidad
- Se realiza atención en el punto de atención fijo ubicado en la Vereda Santa Rosa.
- Se inicia la transcripción del acta de la reunión o comité de participación Ciudadana

• se envía a la profesional social de la interventoría informe semanal

La interventoría realiza recorrido con el fin de revisar las actividades establecidas en el Compret Social.

Andrés J. García

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T. P. 080535212-8

5/08/2025

• se realiza atención en el punto de atención fijo ubicado en la vereda Santa Rosa
• se realiza recorrido de obra
• se realiza revisión del estado de los puntos fijos por motivos.
• se insta a la parte técnica o componente técnico a imprimir la señal de tránsito y postes de cerco para ser ubicada

La interventoría realiza recorrido con el fin de verificar las actividades establecidas en el plan de gestión social. Isabel Bernal Yasno

Andrés J. García

Trabajo Social
T. P. 080535212-8

6/08/2025

• se realiza recorrido de obra
• se realiza atención en el punto móvil
• se continúa realizando el acta del comité de participación Ciudadana
• se inicia el informe Nº 16 correspondiente a las actividades realizadas del Componente social durante el mes de julio de 2025.

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T. P. 080535212-8

Andrés J. García

7/08/2025

• se realiza recorrido de obra
• se envía a la Profesional social de la interventoría Volante de aclaración e instalación tubo de 36" ubicado en la abscisa Km 1+134, se realiza ajuste solicitado por la Profesional social de la interventoría respecto frente al propietario de qué abscisa quedo esta predio, se informa (falta pared) no aprobado y enviado a

la Comunidad a través del grupo de WhatsApp.
se realiza recorrido con el fin de Verificar las actividades establecidas en el plan de gestión social.

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T. P. 0[illegible]535212-R

Andrés Felipe García

08/08/2025

- se entrega punto a punto Volante intervención Km 132 son entregados (11) Volantes.
- se actualizan con este Volante (Km 132) los puntos satélites de información.
- se envía informe N° 16 (Julio) Actividades sociales
- se realiza Comité integral N° 55, de hoja preventiva
- se recibe observaciones del informe N° 13 Abril de 2025.
- La intervención inicia a) contratista a instalar pasarella frente de obra Santo Domingo - Capitolio y Vallas móviles frente de obra Laguna Verde.

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T. P. 0[illegible]535212-R

Andrés Felipe García

09/08/2025

- se realiza recorrido de obra.
- se acompaña al componente técnica a la intervención punto (Km 134).

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T. P. [illegible]

10/08/2025

- se realiza recorrido de obra.
- se recibe por parte de la profesional social, nota a la lista de chequeo (91)

Isabel Bernal Yasno
Trabajo Social
T. P. [illegible]

11/08/2025
La interventoria realiza recorrido con el fin de Verificar las actividades contractuales Sociales

Andrea J. Garcia

Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T. P. 0805335212-R

12/08/2025
Actividades realizadas
El profesional Social hace entrega de nueve Piezas Divulgativas de acre vial puerta a puerta, por Cuanto que van a realizar excavación e instalación de tubos de 36" en la abscisa ubicada en Mot 1324 Mot 305.
así mismo realizo actualización del punto Satélite Ubicando el Volante informativo es de adjuntar que el volante es revisado por la interventoria. Contando con el aval para su distribución

Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T. P. 0805335212-R

Andrea J. Garcia

13/08/2025
Actividades realizadas
El profesional Social realizó atención al Ciudadano Ramiro Martinez por cuanto que informa que el Vehiculo del Concreto afecto la cerca del predio y la Señal de tránsito, la interventoria Solicita se realice apertura de PQR y se haga Seguimiento para el cierre.

Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T. P. 0805335212-R

Andrea J. Garcia

14/08/2025
Actividades realizadas
La interventoria realizó recorrido con el fin de verificar las actividades de gestión Social

Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T. P. 0805335212-R

Andrea J. Garcia

15/08/2025
Actividades realizadas
El Componente Social realizó acompañamiento y Participo en el comité de Seguimiento integral # , con el fin de hacer Seguimiento a cada uno de los Compromisos adquiridos por cada componente técnico, ambiental, Social SST.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Andrés Garcia

16/08/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Andrés Garcia

17/08/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Andrés Garcia

18/08/2025
Actividades realizadas
La interventoría realizó recorrido, con el fin de Verificar las actividades establecidas en el Componente Social se evidencia que no se tiene instalados las Vallas informativas y Pasacalles, la interventoría realiza su instalación de manera inmediata en reiterados ocasiones se ha realizado el llamado de atención

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Andrés Garcia

19/08/2025
Actividades realizados
El profesional Social realizó actualización y mantenimiento del puntos satélitos, los cuales se tienen para informar a la comunidad cada una de las actividades de obra.

Isabel Bernal Yasse
Trabajo Social
T.P. 0805335212-R

Andrea Garcia

20/08/2025.
Actividades realizados
El profesional Social realizo atención y adecuación del punto informativo dio cumpliendo con los horarios establecidos Horarios de 8:00 a.m a 3:00 p.m. El profesional instala cartelera informativa donde se ubicara volantes informativos plat. e información importante informativa de obra.

Isabel Bernal Yasse
Trabajo Social
T.P. 0805335212-R

Andrea Garcia

21/08/2025
Actividades realizados
La interventoria informa al profesional Social que el Señor Humberto Carreras solicita arreglo de manera por cuanto que se vio afectada por el desarrollo de la obra Mz 750.
El profesional Social informa que realizó visita y levanto una PQR#3 se compromete a realizar reparación en 15 dias La interventoria realizara Seguimiento.

Isabel Bernal Yasse
Trabajo Social
T.P. 0805335212-R

Andrea Garcia

22/08/2025
Actividades realizados
El Profesional Social informa que el arreglo que se realizo en el noto. en el predio Señor Roldan Bachata donde en taberna esta fue arreglada pero se evidencia que continua el daño. La interventoria Solicita se reforzé el arreglo

Andrea Garcia

si es necesario cambiar elemento para que sea efectivo el anclaje se hacen dos pagos # 2.

Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Andrés Felipe Garcia

24/08/2025
Actividades realizadas
La interventoria realizó recorrido con el fin de verificar las actividades establecidas contractualmente en el componente social. Se evidencia que no se ha realizado instalación de la valla informativa y Pasacalles. la interventoria en reiteradas ocasiones realizo llamado de atención y se instalación.

Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Andrés Felipe Garcia

22/08/2025
Actividades realizadas
La interventoria realizó acompañamiento y Participo en el comité de Seguimiento integral # , con el fin de realizar Seguimiento al proyecto verificando los compromisos adquiridos en cada uno de los componente técnico, Social, ambiental y SST.

Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Andrés Felipe Garcia

21/24/08/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades por(pq) no ser necesario.

Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T.P. [illegible]

Andrés Felipe Garcia

25/08/2025
Actividades realizadas
El Profesional Social realizó reunión con el señor Tobias Fabián en el Km+625 autorización realizó donde de la alcantarilla.

Isabel Bernal Yasser
Trabajo Social
T.P. [illegible]

Andrés Felipe Garcia

26/08/2025
Actividades realizados
El profesional social realizó citación ala comunidad en el punto informativo fijo. y movil. actualiza y mantiene los puntos satélites.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Andrés J. Garcia

27/08/2025
Actividades realizados
La interventoria realizó recorrido con el fin de verificar las actividades realizados en el componente.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

La interventoria hace entrega del comunicado 186-1-840 observaciones informe #13
Actividades realizados
-La interventoria realizó acompañamiento y participó en la verificación en las actividades establecidos contractualmente
La interventoría hace entrega del comunicado 186-1-839 informando un presunto incumplimiento a la no instalación de Pasacalle y vallas informativas, por cuanto que ala fecha no se ha realizado su instalación
La interventoria realizó entrega del comunicado 186-1-838 se hace entrega de actas de vecindad de Capitolio - Joaquin Verde, San Antonio 1. actas de compromiso de Capitolio. con observaciones para ser subsanados

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Andrés J. Garcia

28/08/2025
La interventoria realizó recorrido con el fin de verificar actividades establecidos en el componente Social

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Andrés J. Garcia

29/08/2025
Actividades realizadas
El Componente Social acompaño y participo en el comité de seguimiento Integral #58 con el fin de verificar las actividades establecidos en cada una de los Componentes ambiental, SST, técnico y Social.

Isabel Manuel Yunis
T.P. 080535212-R

Andrés J. Garcia

30/8/2025
Actividades realizados
No se realizan actividades de obra

Isabel Manuel Yunis
T.P. 080535212-R

Andrés J. Garcia

31/08/2025
Actividades realizados
No se realizan actividades de obra

Isabel Manuel Yunis

Andrés J. Garcia

A7

- *Comunicado 186-1-840- 27 de agosto del 2025.*
- *Comunicado 186-1-821- 22 de agosto del 2025.*

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890.104.625-1

186-1-796

Bogotá D.C. 7 de agosto de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
info@promotorapuga.com
Bogotá D.C

Referencia: *"*CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde.).*

Asunto*:* Respuesta a informes mensuales N° 10, 11, 12, entregados por correo electrónico el 21 de julio del 2025 y N° 13. entregados por correo electrónico 24 de julio

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Consorcio Gaviones 95.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Social, de acuerdo con lo establecido contractualmente en el anexo técnico, contrato y el plan de gestión social fichas – PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Gaviones 95, remite los Informes mensuales sociales

No. 10 V-5, 21 de julio del 2025,
No. 11 V-5, 21 de julio del 2025,
No. 12 V-5, 21 de julio del 2025,
No. 13 V-0, 21 de julio del 2025.

De los cuales se tiene las siguientes observaciones:

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890.104.625-1

186-1-796

Informes No 10 V-5, 21 de julio del 2025, No 11 V-5, 21 de julio del 2025, No 12 V-5, 21 de julio del 2025

1. Se encuentran sin firma del profesional social quien realiza el informe y del profesional técnico que revisa y aprueba los informes, subsanar. Se encuentran pre- aprobados, una vez sean radicados con las firmas se realizará visto bueno por parte de la interventoría.

Informes No 13 V-0, 24 de julio del 2025

1. Página 14, tabla 5 Datos generales del contratista actualizar información.

2. Página 15, tabla 6 Datos generales de interventoría actualizar información.

3. Página 16, tabla 7 actualizar información.

4. Página 16, tabla 8. Se evidencia cortada la información de la tabla ajustar.

5. Página 27, describir la trazabilidad del estado en que se encuentra el plan de gestión social.

6. Página 31, tabla 12 Indicador de gestión en la columna descripción del indicador subsanar No es 0, sería NA. Esta columna mide el porcentaje de cumplimiento. Observación para todos los informes de aquí en adelante.

7. Página 33, tabla 13 Indicador de gestión en la columna descripción del indicador subsanar No es 0, sería NA. Esta columna mide el porcentaje de cumplimiento. Observación para todos los informes de aquí en adelante.

8. Página 38, ejercicio de control social, realizar la descripción encaminado a que es la Unidad de mantenimiento vial quien realiza y programa este ejercicio. El Consorcio realiza participa y acompaña en la actividad.

9. Página 38 Actas de vecindad realiza una describir de cuantas actas de vecindad de apertura se ha realizado en cada tramo vial donde el consorcio ha hecho intervención y el estado en que se encuentran, (firmadas -entregadas – aprobadas)

10. Página 39, se evidencia un espacio en blanco.

11. Página 40, pasacalles realizar descripción de cuando se realizará la reposición del pasacalle de Capitolio.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890.104.625-1

186-1-796

12. Página 41, “Durante el mes de abril no fueron instaladas vallas móviles, ni pasacalles informativos, por no ser necesarios” …. Completar información justificar.

13. Página 41, se evidencia un espacio en blanco.

14. Página 42 Tabla 14. “Indicadores de gestión y participación comunitaria” subsanar titilo es de “información y participación comunitaria”. De igual manera en la columna descripción del indicador es donde se describe el cumplimiento porcentual No es 0, sería NA. Observación para todos los informes de aquí en adelante.

15. Página 49, tabla 15 indicador de gestión en la columna descripción del indicador es donde se describe el cumplimiento porcentual No es 0, sería NA. Observación para todos los informes de aquí en adelante.

16. Página 49, Vinculación de mano de obra, realizar descripción del personal que se vinculó al proyecto total cuanto personal se tenía entre mano de obra calificada, mujeres, mano de obra no calificada, mano de obra no calificada local, personal vulnerable, personal en condición de discapacidad y sacar porcentajes. (verificar información con el componente SST).
    Página 50 “El Consorcio Gaviones 95 durante el periodo comprendido contrato 7 mujeres, con el fin de dar cumplimiento al decreto establecido contractualmente, cumpliendo con un 46 %. En Bogotá urbana dos mujeres laboraron con el objetivo de ajustar los aspectos logísticos del contrato. Durante este periodo no fue contratada ninguna mujer”. Revisar información”

17. Página 50 evidencia espacio en blanco.

18. Página 51, informes de gestión y evaluación. escribir subtítulos
    Informes mensuales: realizar descripción del estado de los informes.
    Informes semanales: realizar descripción como se entregarán
    Comités de seguimiento: realizar descripción de cómo se realizarán
    Comités de seguimiento social: realizar descripción
    Mesas de trabajo: realizar descripción.
    Correspondencia enviada y recibida:
    Si no aplica se describe, pero no se quitan los subtítulos y dejarlos para todos los informes en adelante.

19. Ampliar las conclusiones

20. Bibliografía ampliar se encuentre también el anexo técnico, el contrato. Subsanar aplica para todos los informes de aquí en adelante.

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890.104.625-1

186-1-796

Con lo relacionado anteriormente se solicita que el Consorcio Gaviones 95, allegue a la interventoría lo solicitado en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexo: N/A

C.C: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS -lauram.rojas@gobiernobogota.gov.co, cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co, Jose Miguel Ruiz – jmruiz@gobiernobogota.gov.co
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DISEÑO, GESTIÓN, INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-840

Bogotá D.C. 27 de agosto de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
info@promotorapuga.com
Bogotá D.C

Referencia: ***"***CONTRATO No. 478 de 2022 objeto ***"****LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde).*

Asunto*:* Respuesta a correo electrónico del 20-08-2025 con asunto *"informe mensual social N° 13 V 1". Del Consorcio Gaviones 95.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Consorcio Gaviones 95.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Social, de acuerdo con lo establecido contractualmente en el anexo técnico, contrato y el plan de gestión sociales fichas – PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

En respuesta al comunicado 186-1-796 del 7 de agosto del año en curso donde presentan el informe mensual social N° 13 V-0. el cual presento observaciones. El Consorcio Gaviones 95 realizó en entrega de las observaciones subsanadas al informe 13 V1, el 20 de agosto del año en curso por correo electrónico, del cual se tiene las siguientes observaciones:

Informe mensual social N° 13 V1.

1. Página 2, Tabla revisión y aprobación se encuentra sin firmas de los profesionales que elaboraron, revisaron y aprobaron el informe. **No se subsanó**

2. Página 2 Control de versiones no presenta información. **No se subsanó**

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-840

3. Página 16 tabla 5 Datos generales del contratista actualizar información. **No se subsano**

4. Página 17, tabla 6 Datos generales de interventoría actualizar información. **No se subsano**

5. Página 18, tabla 7, personal de interventoría, actualizar información. **No se subsano**

6. Página 19, tabla 8. Se evidencia cortada la información, se evidencia que **Se ajustó.**

7. Página 30, describir la trazabilidad del estado en que se encuentra el plan de gestión social. **Se ajustó.**

8. Página 37, tabla 13 Indicador de gestión en la columna descripción del indicador subsanar No es 0, sería NA. Esta columna mide el porcentaje de cumplimiento. **Se ajustó.**

9. Página 35, tabla 13 Indicador de gestión en la columna descripción del indicador subsanar no es 0, sería NA. Esta columna mide el porcentaje de cumplimiento. **Se ajustó.**

10. Página 38, ejercicio de control social, realizar la descripción encaminado a que es la Unidad de mantenimiento vial quien realiza y programa este ejercicio. Consorcio realiza participo y acompaña en la actividad. **Se ajustó.**

11. Página 43, Actas de vecindad realiza una describir de cuantas actas de vecindad de apertura se ha realizado en cada tramo vial donde el consorcio ha hecho intervención y el estado en que se encuentran, (firmadas). **Se ajustó.**

12. Página 43, se evidencia un espacio en blanco. **Se ajustó.**

13. Página 45, pasacalles realizar descripción de cuando se realizará la reposición del pasacalle de Capitolio. **No se subsano.**

14. Página 46, “Durante el mes de abril no fueron instaladas vallas móviles, ni pasacalles informativos, por no ser necesarios” …. Completar información justificar. **Se ajustó.**

15. Página 41, se evidencia un espacio en blanco. **Se ajustó.**

16. Página 47 Tabla 14. “Indicadores de gestión y participación comunitaria” subsanar titilo es de “información y participación comunitaria”. De igual manera en la columna descripción del indicador es donde se describe el cumplimiento porcentual No es 0, sería N/A. **Se ajustó.**

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-840

17. Página 49, tabla 15 indicador de gestión en la columna descripción del indicador es donde se describe el cumplimiento porcentual No es 0, sería NA. **Se ajustó.**

18. Página 51, Vinculación de mano de obra, realizar descripción del personal que se vinculó al proyecto total cuanto personal se tenía entre mano de obra calificada, mujeres, mano de obra no calificada, mano de obra no calificada local, personal vulnerable, personal en condición de discapacidad y sacar porcentajes. (verificar información con el componente SST).

    Página 50 "El Consorcio Gaviones 95 durante el periodo comprendido contrato 7 mujeres, con el fin de dar cumplimiento al decreto establecido contractualmente, cumpliendo con un 46 %. En Bogotá urbana dos mujeres laboraron con el objetivo de ajustar los aspectos logísticos del contrato. Durante este periodo no fue contratada ninguna mujer". Revisar información". Por cuanto que en los informes mensuales 14,15,16, indican que el proyecto cuenta con las siguientes mujeres las cuales se relacionan:

    Cindy Katherine Tovar, 1.019220.88, Analista de Talento humano
    Leidy J Bastidas 1.016.078.304 secretaria.
    En el informe 13 V0 indican que cuentan con personal calificado y adjuntan listado, no se evidencia en este informe. **No se subsano.**

19. Página 51 evidencia espacio en blanco. **Se ajustó.**

20. Página 51, informes de gestión y evaluación. escribir subtítulos
    Informes mensuales: realizar descripción del estado de los informes.
    Informes semanales: realizar descripción como se entregarán
    Comités de seguimiento: realizar descripción de cómo se realizarán
    Comités de seguimiento social: realizar descripción
    Mesas de trabajo: realizar descripción.
    Correspondencia enviada y recibida. **Se ajustó.**

21. Ampliar las conclusiones. **Se ajustó.**

22. Bibliografía ampliar se encuentre también el anexo técnico contrato de obra.
    No subsano completo.

    "ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)".

    "ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)".

ECOVIAS S.A.S.
DISEÑO, GESTIÓN E INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-840

Con lo relacionado anteriormente se solicita que el Consorcio Gaviones 95, allegue a la interventoría la subsanación de las observaciones al informe, en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexo: N/A

C.C: José Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS- jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com
Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-821

Bogotá D.C. 22 de agosto de 2025.

Señores.
CONSORCIO GAVIONES 95
Atn: LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
Representante Legal
info@promotorapuga.com
Bogotá D.C

Referencia: *"*CONTRATO No. 478 de 2022 objeto **"***LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y Laguna verde).*

Asunto*:* *Respuesta a correo electrónico del 12 de agosto del 2025 "informe mensual social N° 15" Correo electrónico del 7 de agosto del 2025. "informe social N° 16". Consorcio Gaviones 95.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Consorcio Gaviones 95.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Social, de acuerdo con lo establecido contractualmente en el anexo técnico, contrato y el plan de gestión sociales fichas – PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV.

En respuesta a los correos relacionado en el asunto, donde el Consorcio Gaviones 95, remite los Informes mensuales sociales No. 15 V-1, del 12 de agosto del 2025, y No. 16 V-1, del 7 de agosto del 2025, de los cuales se tienen las siguientes observaciones:

Informe mensual social N° 15 V1.

1. Página 2, Tabla revisión y aprobación se encuentra sin firmas de los profesionales que elaboraron, revisaron y aprobaron el informe.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-821

2. Pagina 2 Control de versiones no presenta información.

3. Página 16 tabla 5 Datos generales del contratista actualizar información.

4. Página 17, tabla 6 Datos generales de interventoría actualizar información.

5. Página 17, tabla 7, personal de interventoría, actualizar información.

6. Página 34, Grupo de Whatssap describir las actividades realizadas en el mes del presente informe en este grupo.

7. Página 35, tabla 13 Indicador de gestión en la columna descripción del indicador subsanar no es 0, sería NA. Esta columna mide el porcentaje de cumplimiento. Observación para

8. Página 45, puntos fijos informativos, en “Actividades realizadas del 1 al 31 de mayo de 2025” subsanar las actividades descritas son del mes de junio del 2025.

9. Página 57, informes mensuales, ajustar descripción no es necesario contar que observaciones que interventoría ha realizado, describir que “a continuación se describe el estado en que se encuentran los informes sociales presentados a la interventoría y se presenta la tabla, así mismo en la descripción del estado describen que “ Se realizan ajustes, Por realizar, Es realizado”. cambiar por pendiente por entrega o radicados a interventoría.

10. Página 58 Tabla 22, estado de aprobación de los informes. De acuerdo a la fecha del presente informe corresponde a las actividades del mes de junio y están describiendo el informe del mes de julio informe 16, no corresponde. Subsanar.

11. Vinculación mano de obra, incluir una tabla, donde se describan los indicadores de cumplimiento de la contratación de personal.

12. Página 60, Tabla 24, el comité 47 y comité 48, no se realizó el comité por cuanto que ustedes no se presentan a los comités describirlo en la tabla en cuanto a la fecha del comité 47 fue el 14 de junio del 2025. Subsanar.

13. Página 61 correspondencia envida y recibida, la tabla correspondencia envida no se encuentra numerada, además hace falta los comunicados 186-1-716, 186-1-718. Y el comunicado que se relaciona en el informe 186-1-691 no corresponde al componente social.

14. Ajustar la redacción de las conclusiones.

15. Página 69, anexo 1 cerrar planilla

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-821

16. El anexo 4 es correspondencia recibida, subsanar título en el separador.

17. Los anexos se encuentran sin firma de interventoría y de la Unidad de Mantenimiento vial. Subsanar, cerrar todos documentos.

Informe mensual social N° 16 V1.

1. Página 2, Tabla revisión y aprobación se encuentra sin firmas de los profesionales que elaboraron, revisaron y aprobaron el informe.

2. Página 2 Control de versiones no presenta información.

3. Página 5, no se evidencia tabla de anexos.

4. Página 17. tabla 5 Datos generales del contratista actualizar información.

5. Página 18, tabla 6 Datos generales de interventoría actualizar información.

6. Página 16, tabla 7, personal de interventoría, actualizar información.

7. Página 34, Grupo de Whatssap describir las actividades realizadas en el mes del presente informe en este grupo.

8. Página 35, tabla 13 Indicador de gestión en la columna descripción del indicador subsanar no es 0, sería NA. Esta columna mide el porcentaje de cumplimiento.

9. Página 38 Programa de información y participación comunitaria, no se describe la reunión del Reuniones Comité de participación Ciudadano. (veeduría) reunión que se realizó el 18 de julio del 2025, en la vereda de Laguna Verde Tramo vial.

10. Página 43, Ejercicio de control social, describir cuando se realizó y que aporto el Consorcio a la Unidad de mantenimiento vial en la entrega de información a la comunidad. Los descrito en el informe en este numeral, no corresponde, esta información fue de la reunión del comité de participación ciudadana veeduría.

11. Página 43, levantamiento de actas de vecindad incluir la tabla con el consolidado de actas de vecindad realizadas en cada tramo vial que ha hecho intervención el Consorcio y su estado.

12. Página 44 tabla 16, Volantes divulgados durante el mes de Julio, no dejar cuadros vacíos indicar que NA y totalizar la cantidad de volantes entregados.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-821

13. Página 45, “El afiche informativo tendrá una medida de 42 cm de ancho por 29,7 cm de largo. Durante este periodo se realizó un nuevo afiche, sin embargo, a la fecha no ha sido aprobado por la profesional social de la firma interventora, ***afirma que no cumple con los colores representativos de Bogotá***”. Subsanar redacción esta afirmación no se ja dicho por parte de interventoría, la ultima versión entregada esta en revisión por parte de interventoría.

14. Página 45 tabla 17, Puntos fijos informativos instalados durante el mes de Julio no dejar cuadros vacíos indicar que NA.

15. Pagina 48 indicar por qué no fue instalada la valla informativa móvil

16. Pagina 48 tabla 16 Indicadores de Gestión y Participación comunitaria, revisar los indicadores en cuanto a reuniones comité de participación ciudadana (veeduría) y control social. así mismo revisar las cantidades descritas en actas de compromiso describen 5 actas, pero el informe se evidencia dos, los volantes informativos describen que se entregaron 20, pero suman 23.

17. Página 60, informes mensuales, ajustar descripción no es necesario contar que observaciones que interventoría ha realizado, describir que “a continuación se describe el estado en que se encuentran los informes sociales presentados a la interventoría y se presenta la tabla, así mismo en la descripción del estado describen que “ Se realizan ajustes, Por realizar, Es realizado”. cambiar por pendiente por entrega o radicados a interventoría.

18. En el informe mensual social N° 15 indican que respecto a la contratación de personal en condición de vulnerabilidad y personas en condición de discapacidad serán contratadas en el próximo mes, no se evidencia esta información.

19. Página 62, Tabla 25, el comité 50 y comité 52, no corresponde la fecha descrita se realizaron el 3 de julio y el 21 de julio del año en curso. Subsanar.

20. Página 64, Correspondencia enviada y recibida, no se relaciona el comunicado D40 del 14 de julio del 2025. Describir y anexar.

21. Conclusiones “Fue entregado a la Interventoría documentación que se tenía pendiente, debido a esto esta firma interventora envío oficios cuyo asunto fue llamado de llamado de atención por documentación pendiente del componente social”, cambiar redacción. No fue entregada la documentación.

22. Bibliografía ampliar se encuentre también el anexo técnico, Contrato de obra Pública N° 478 del 10/02/2022, Subsanar aplica para todos los informes de aquí en adelante.

23. Anexos, colocar separador a los documentos del anexo 2,

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-821

- ✓ Actas de Compromiso
- ✓ Acta de reunión Comité de Participación Ciudadana, planilla de asistencia, registro fotográfico.
- ✓ Formato entrega de volantes- volantes referentes
- ✓ Formato control de instalación afiche y/o volante informativo.

24. El formato entrega de volante totalizar la cantidad entregada.

25. Los anexos se encuentran sin firma de interventoría y de la Unidad de Mantenimiento vial. Subsanar.

Con lo relacionado anteriormente se solicita que el Consorcio Gaviones 95, allegue a la interventoría lo solicitado en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexo: N/A

C.C: José Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS- jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com
Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

Consorcio Estabilización Vial

A 8

- *Lista de chequeo mes de agosto Consorcio Estabilización vial.*

BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ	**CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.) suscrito con la UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022**	ECOVIAS S.A.S.

FECHA: 1 al 31 de agosto del 2025 COMPONENTE SOCIAL

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CALIFICACIÓN
		100%	50%	0,0%	N/A	
1	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal social cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional social asistió a los comités de seguimiento integral y social a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	El contratista entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de Gestion Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Plan de Gestión Social						
Programa de atención al Usurario						
5	Instaló el punto de atención al Usurario.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
6	El punto de atención ciudadano funcionó en el horario establecido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
7	El punto de atención al usuario cuenta con dotación mínima requerida.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
8	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRSFD .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
9	Realizó el respectivo seguimiento a las PQRSFD abiertas durante el período de evaluación.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
10	Dio respuesta a las PQRSFD de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
11	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRSFD solicitados por la Interventoría.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
12	El contratista cumplió con los recorridos programados por frente de obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Programa de información y participación comunitaria						
13	Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
14	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
15	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
16	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA

17	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
18	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
19	Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
20	Elaboró las actas de gestión adelantada con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
21	El contratista cumplió con los compromisos en los tiempos pactados con el ciudadano.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
22	Elaboró las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
23	Entregó las actas de vecindad y compromiso a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
24	El profesional hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actas establecidas contractualmente.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
25	Se entregó copia de las actas de compromiso y de vecindad a la comunidad, si son requeridas por la misma, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
26	El profesional social realizó el acompañamiento durante los registros fílmicos del estado inicial de las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
27	Se entregó el respectivo registro fílmico de las vías a la Interventoría para su revisión y aprobación de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
28	El contratista realiza acompañamiento al comité veedor conformado por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
29	el contratista convoca y realiza reuniónes de comité veedor, de acuerdo a las solicitudes realizadas por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Programa de Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto						
30	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa del cultura vial						
31	Realiza sensibilización de sostenibilidad y cuidado de la vía con las temáticas y el tiempo establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Mano de obra no calificada						
32	Cumplió con el reporte en el informe mensual de personal de mano de obra no calificada local.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

33	Cumplió con el reporte en el informe mensual población en condición de vulnerable.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
34	Cumplió con el reporte en el informe mensual la contratación de mujeres en el proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Movilidad						
35	El contratista realiza socialización del PMT.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	NA
Información del proyecto						
36	Elaboró e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
37	Elaboró y distribuyó los volantes de inicio a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
38	Elaboró y distribuyó los volantes de finalización de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
39	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información de los cierres programados en la via a la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
40	Elaboró y distribuyó los volantes, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
41	Instaló el (los) Punto(s) informativos fijos de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
42	Realizó mantenimiento a (los) punto informativos y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
43	Instaló la (s) valla (s) informativa (s) móviles de acuerdo a los requisitos y tiempos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Reportes						
44	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rual del Sumampaz, la información del plan de gestión social .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
45	Tiene disponibilidad al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
46	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Social	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
47	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
48	Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de de la Gestión social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
49	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	100%
TOTAL CALIFICACIÓN MES DE						**100%**

OBSERVACIONES	
ELABORÓ	
	Profesional social de Interventoría ECOVIAS SAS
	Isabel Bernal Yasso
ACEPTÓ	Profesional social del CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
	Alejandra Limas P.

A 9

- *Copia Bitácora Social Consorcio Estabilización Vial agosto.*

1/08/2025
Actividades realizados
El Comparente Social Participa en el comité de Seguimiento integral #35, con el fin de realizar Seguimiento a los compromisos adquiridos en cada uno de los componentes Social, SST ambiental y técnico.

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Alejandra Limas P.
C. E.V

2/08/2025
Actividades realizadas.
No se realizan actividades en obra.

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Alejandra Limas P.
C. E.V.

3/8/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades en obra.

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

Alejandra Limas P.
C. E. V.

4/8/2025
Actividades realizadas
Se realiza alerazón en punto fijo, no se recibe ningún requerimiento por parte de la comunidad. Se inicia con la elaboración del informe mensual

Alejandra Limas P
P. Social C.E.V

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

05-08-2025
Se realizan actividades administrativas para dar cumplimiento a la entrega estipulada del informe social mensual.

Alejandra Limas P
P Social C.E.V

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

06-08-2025
Se realiza atención movil en los tramos de obra, no se recibe ningún tipo de requerimiento
Alejandra Limas P
P. Social CEU

07-08-2025
No se realizan actividades de obra.
Alejandra Limas P
P. Social CEU.

08-08-2025
No se realizan actividades de obra.
Alejandra Limas P
P. Social CEU

09-08-2025
Actividades realizadas.
No se realizan actividades de obra.
Alejandra Limas P.
P. Social CEU.

10-08-2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades de obra.
Alejandra Limas P
P. Social CEU

11-08-2025
Actividades realizadas
La profesional social realiza atención móvil en el tramo Unidad Tunales, no se recibe ningún requerimiento por parte de la comunidad.
Alejandra Limas P
P. Social CEU.

12-08-2025
Se realiza atención móvil en el tramo San Antonio El Toldo, no se recibe requerimientos por parte de la comunidad. Se diseña volantes informativos con relación a la sensibilización vial y cuidado por parte de la comunidad en la obras que

de construcción de cunetas y alcantarillado.

Alejandra Limas P
P. Social CEU

13-08-2025

Actividades realizadas

Se envia piezas comunicativas a la interventoria, posterior a su aprobación se procede a su reproducción e instalación en los puntos satelite del tramo unión Tunales, asi mismo son enviadas a los grupos de whatsapp de cada tramo. Se realiza reunión con el rector del colegio Colegio campestre Juan de la Cruz Varela.

Alejandra Limas P
P. Social C.E.U

14-08-2025

Actividades realizadas

Se realiza alerción móvil en el tramo San Antonio El Toldo, se concerta encuentro con el Señor Bernardo Peñaloza para acordar en manejo del talud de la alcantarilla. Acompañamiento a recorrido técnico social.

Alejandra Limas P
P. Social CE.U

15-08-2025.

Actividades realizadas.

Asistencia al comité semanal de seguimiento por parte de la Interventoria, verificación de observaciones emitidas a los informes sociales 20 y 21 por parte de la Interventoria.

Alejandra Limas P
P. Social C.E.U.

16-08-2025

No se realizan actividades de obra.

Alejandra Limas P
P. Social C.E.U.

17-08-2025

No se realizan actividades de obra.

Alejandra Limas P
P. Social C.E.U.

18-08-2025

No se realizan actividades de obra.

Alejandra Limas P.
P. Social C.E.U.

19-08-2025

Alejandra Limas P.
P. Social. CE.U.

Actividades realizadas

Se realiza y hace envio del informe mensual, se hace recorrido en obra, no se reciben requerimientos por parte de la comunidad.

20-08-2025

Actividades realizadas

Se realiza recorrido móvil en el tramo unión Tunales, no se reciben requerimientos por parte de la comunidad, se hace levantamiento de acta de compromiso con el señor Anyél Alberto Delgado acerca de la entrada a predio, se hace acta de compromiso entrada predio Luis Rey, se corrige informe social número 20.

Alejandra Limas P
P. Social C.E.U

21-08-2025

Se envia informe número 20 versión 2, se realiza recorrido móvil en el tramo San Antonio El Toldo, se obsrva al propietario del predio existente en la abscisa K1+41808, a quien se le informa de las actividades realizadas. No se reciben requerimientos por parte de la comunidad.

Alejandra Limas P
P Social C.E.U

22 - 08 - 2025

Actividades realizadas:

Se hace recorrido en Unión Tunales, no se reciben requerimientos de la comunidad, asistencia al comité técnico de manera virtual. Se hace seguimiento al incidente del cableado de luz del predio de la señora Nidia Hernandez en la el tramo El Toldo.

Alejandra Lunas P
P. Social C-E-U

23 - 08 - 2025

No se realizan actividades de dara.

Alejandra Lunas P
P Social CEU

24 - 08 - 2025

No se realizan actividades de dara.

Prof. Social CEU
Alejandra Lunas P

25 - 08 - 2025

Actividades realizadas:

Se elabora y envia informe semanal, se realiza recorrido móvil en el tramo San Antonio El Toldo, se habla con la señora Nidia Hernandez, acerca del incidente con el cable de luz y bano.

Alejandra Lunas P
P. Social CEU.

26 - 08 - 2025

Actividades realizadas

Se realiza subsanación al informe social número 21, el cual es enviado a la interventoria, se realiza atención en punto presencial, no se reciben requerimientos por parte de la comunidad.

Alejandra Lunas P
Prof. Social CEU.

17-08-2025

Se realiza acta de compromiso para el arreglo del talud en la alcantarilla ubicada en el predio del señor Bernardo Peñalosa. Se hace charla de sensibilización con personal de obra acerca del riesgo electrico. Se hace acta de compromiso con el señor Fernando Molina del tramo Unión Tunales. Se realiza recorrido por los frentes de obra, no se recibe requerimientos por parte de la comunidad.

Alejandra Limas P
P. Social CEU

28-08-2025

Actividades realizadas:

Se hace acompañamiento en el recorrido técnico, social y ambiental por los tramos de obra (Unión Tunales y San Antonio El Toldo), posterior a esto se participa en el comité técnico integral. Se hace acta de compromiso en la entrada al predio del señor Daniel Mora de Unión-Tunales.

Alejandra Limas P.
P. Social C.E.U.

29-08-2025

Se realiza acta de reunión externa con la Junta de acción comunal del Tramo San Antonio El Toldo, se hacen actas de compromiso de la construcción de dos alcantarillas en este mismo sector. Se realiza recorrido en obra, no se reciben requerimientos por parte de la comunidad.

Alejandra Limas P
P. Social CEU.

30-08-2025

No se realizan actividades de obra.

Alejandra Limas P.
P. Social C.E.U.

31-08-2025
No se realizan actividades de obra.
Atendra Lunes P.
P. Social CE-U
01-09-2025

A 10

- *comunicado CEV/22-454*
- *comunicado CEV/22-460*
- *comunicado CEV/22-462*
- *Comunicado 186-1-811*

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-454

Bogotá D.C., 5 de agosto de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Informe mensual social No 21

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del informe mensual del componente social No 21, correspondiente al periodo del mes de julio del 2025.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Archivo en PDF
HLM/ac

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-460

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Respuesta oficio 186-1-770 Informe social No 20 V2

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del informe mensual del componente social No 20, atendiendo las observaciones por medio del oficio 186-1-770, correspondiente al periodo del mes de junio del 2025.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Archivo en PDF
HLM/ac

CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Nit: 901563835-7

CEV/22-462

Bogotá D.C., 26 de agosto de 2025

Señores
ECOVIAS SAS
Att: Luiggi Pugliese Mercado
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Obra No 479 de 2022
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.") – GRUPO 2
Asunto: Respuesta oficio 186-1-811 Informe social No 21 V2

Respetados señores,

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del informe mensual del componente social No 21, atendiendo las observaciones por medio del oficio 186-1-811, correspondiente al periodo del mes de julio del 2025.

Cordialmente,

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL

Con copia: - Archivo
Anexo: Archivo en PDF
HLM/ac

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-811

Bogotá D.C. 13 de agosto de 2025.

Señor
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VIAL
cevsumapaz@gmail.com
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO de OBRA PÚBLICA No. 479 DE 2022 CONTRATO PARALA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020) (San Antonio II (k6+910-k0+000), Unión Túneles y Animas Bajas.") GRUPO 2

Asunto: Respuesta a comunicado CEV/22-454 Informe del componente Social No.21 V-1. del 5 de agosto del 2025.

Respetado señor:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Estabilización Vial.

Una de las obligaciones de la Interventoría es "Verificar que el Contratista realice la Gestión Social, de acuerdo con lo establecido contractualmente en el anexo técnico, contrato y el plan de gestión social fichas – PAGA aportado por parte de la entidad ejecutora UMV. En respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el Consorcio Estabilización Vial, remite el Informe mensual sociales No 21 V-1, 5 de agosto del 2025, se tienen las siguientes observaciones:

1. Página 6: Los programas relacionados no corresponden a los establecidos en el en las fichas PAGA Plan de Gestión Social, ajustar.

   Programa de atención al usuario-
   Programa de Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto.
   Programa de Información y Participación Comunitaria.
   Programa de cultura vial.
   Vinculación de mano de obra.

2. Página 14, 6.1 ajustar título del programa "Programa de atención al usuario".

3. Página 16, 6.2 ajustar título del programa "Programa de Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto".

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-811

4. Página 20, 6.3 ajustar título del programa “Programa de Información y Participación Comunitaria”

5. Pagina 24, 6.4 Eliminar título, la información va en el título anterior.

6. Página 23 Tabla 5 Entrega de piezas comunicativas, no se evidencia entrega de comunicado en el mes de julio del año en curso, pero en los indicadores describen que se entregaron 2 volantes. Subsanar.

7. Página 28 Contratación de mano de obra. De acuerdo con la información descrita no coincide con la información suministrada por el componente SST. Donde se indica que en el mes de julio se tiene un total de 47 trabajadores de los cuales 25 son mano de obra calificada, 21 de mano de obra no calificada 21 de los cuales 9 pertenecen a la localidad, se evidencia cuatro trabajadores que no se encuentran en el listado de personal los cuales se relacionan a continuación:

Fabio Cesar Barón Diaz	Operario de minicargador
José Jefferson Viuche Viuche	Aux. de operaciones,
Julián Mauricio Preciado Mosos	Supervisor de obra
Kelvin Enrique Padilla Gómez	Ayudante de obra

Revisar y subsanar toda la información presentada en la numeral contratación de mano de obra revisar los porcentajes de cumplimiento

8. Pagina 36 y 37 tabla 16 trazabilidad de informes, la fecha de los informes 14,15,16,17 no coincide fueron aprobados el 28 de julio del 2025; el informe 18 fue aprobado mediante comunicado 186-1-769 el 28 de julio del 2025, el informe 19 fue aprobado el 28 de julio del 2025, el informe 20 presente observaciones mediante comunicado 186-1-770 el 28 de julio del 2025, el informe 13 es aprobado el 13 de febrero del 2024, mediante comunicado 186-1-1487. Verificar y subsanar toda la información de la aprobación de los informes.

9. Página 41, anexo 1 formato PQRS, completar información de los datos del formato (fecha, numero de requerimiento, número telefónico, numero de requerimiento) y anexa un registro fotográfico de la visita al predio para realizar atención al requerimiento ciudadano.

10. Página 68, formato acta de compromiso anexo 8, se encuentra sin foto. Subsanar.

11. Página 73 anexo 10, acta de compromiso, escribir los datos del ciudadano, número de identificación y describir por qué no se encuentra firmada por el ciudadano. completar datos del acta código de identificación vial, PK.

ECOVIAS S.A.S.

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
infoeecoviasas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-811

12. Página 75 Anexo 11, acta de compromiso, escribir los datos del ciudadano, número de identificación y describir por qué no se encuentra firmada por el ciudadano. completar datos del acta código de identificación vial, PK.

13. Página 77 Anexo 12, acta de compromiso, completar datos del acta código de identificación vial, PK.

14. Página 79 Anexo 13, acta de compromiso, completar datos del acta código de identificación vial, PK.

15. Página 82, Anexo 14, acta de compromiso, escribir los datos del ciudadano, número de identificación y describir por qué no se encuentra firmada por el ciudadano. completar datos del acta código de identificación vial, PK.

16. Central títulos de los separados.

17. En el ítem de seguimiento y control, incluir numeral correspondencia enviada y correspondencia recibida.

Con lo relacionado anteriormente se solicita al Consorcio Estabilización Vial, allegue a la interventoría lo solicitado en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoria

Anexo: N/A

C.C: Jose Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com
UAERMV-Julio Cesar Pinzón-Gerente del proyecto - julio.pinzon@umv.gov.co y correspondencia@umv.gov.co

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

Unidad Administrativa especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV

A 11

- *Correos electrónicos trazabilidad de solicitud y aprobación piezas divulgativas volantes y comunicados informativos. UAERMV.*

Gmail intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>

VOLANTES DE CIERRES VIALES MES DE AGOSTO

2 mensajes

Rubys Del Carmen Ruiz Arrieta <rubys.ruiz@umv.gov.co> 5 de agosto de 2025, 11:25
Para: intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com>
Cc: Astrid Lorena Morera Chacon <astrid.morera@umv.gov.co>, Rafael Dario Peña Florez <rafael.pena@umv.gov.co>

Cordial saludo

Estimada Isabel

Adjunto envío volantes de los tramos viales activos mes de agosto 2025

Atentamente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

RUBYS DEL CARMEN RUIZ
Contratista
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Unidad de Mantenimiento Vial
Teléfono: (+60-1) 3779555
Sede Administrativa: Calle 26 No. 69-76 piso 3 Edificio Elemento torre Aire

3 adjuntos

- **Capitolio (2).pdf** 6502K
- **Unioìn Tunales (2).pdf** 7341K
- **Toldo.pdf** 6475K

intersumapazsocial161 <intersumapazsocial161@gmail.com> 6 de agosto de 2025, 9:19
Para: Rubys Del Carmen Ruiz Arrieta <rubys.ruiz@umv.gov.co>

Buenos días Rubys
Cordial saludo
Una vez revisada las piezas informativos de volantes de cierres viales del: programados para el mes de agosto, Tramo vial de Capitolio, Unión Tunales y el Toldo, la interventoría da aval para fines pertinentes.

> Quedo atenta a sus comentarios.
>
> *Cordialmente,*
> *Isabel Bernal Yasso.*
> *Profesional Social.*

A 12.

- *Lista de personal agosto UAERMV.*

BOGOTÁ | UMV | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE AGOSTO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

UNIDADES EJECUTORAS Y OPERATIVAS VINCULADAS - CONTRATO 609 DE 2023 - PROYECTO REGALIAS SUMAPAZ

No. de Orden	NOMBRE DE LA UNIDAD	DENOMINACIÓN	COMPOSICION	CANTIDAD PERSONAS	FECHA DE INGRESO
1	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1**	**UEMRD1-REG-01**	**1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**4 personas**	**16-dic-24**
	CARLOS HERNAN RAMOS ERAZO	1087784620	INSPECTOR OBRA	1 personas	12-may-25
	JOSE YECID HERNANDEZ GUTIERREZ	80235605	OFICIAL I	1 personas	16-dic-24
	YEISON MAURICIO CASTELLANOS	1003670730	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
	DILAN ANDRES CANO ROMERO	1007101606	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	14-may-25
2	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1**	**UEMRD1-REG-02**	**1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**4 personas**	**13-ene-25**
	FIDEL DIAZ ZULUAGA	9807823	INSPECTOR OBRA	1 personas	13-ene-25
	RUBEN PEÑALOZA VALBUENA	1022979320	OFICIAL I	1 personas	13-ene-25
	YULIAND ROMERO POVEDA	1022946347	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	7-jul-25
			AYUDANTE DE OBRA	personas	
3	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1**	**UEMRD1-REG-03**	**1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**4 personas**	**13-ene-25**
	LUIS ANIBAL DURAN MONTERO	80434593	INSPECTOR OBRA	1 personas	13-ene-25
	ONOLASCO DELGADO VERGARA	80745216	OFICIAL I	1 personas	13-ene-25
	JUAN DAVID PENAGOS PABON	1069231247	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
	FERNANDO LOPEZ HERNANDEZ	349277	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	9-jun-25
4	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 1**	**UEMRD1-REG-04**	**1 Inspector, 1 Oficial, 2 ayudantes**	**4 personas**	26-may-25
	OSCAR LEONARDO CAÑON MOJICA	80755852	INSPECTOR OBRA	1 personas	26-may-25
	LUIS TAMARA		OFICIAL I	1 personas	
				personas	11-ago-25
	ELKIN ESTIVEN CARO PEÑALOZA	1032656213	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	26-may-25
5	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 2**	**UEMRD2-REG-01**	**2 Ayudantes**	**1 personas**	**13-ene-25**
	JONATHAN ARVEY TORRES RODRIGUEZ	1069717922	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	13-ene-25
	CRSTIAN CAMILO DIAZ	1022928625	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	25-ago-25
	UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 2	**UEMRD2-REG-02**	**2 Ayudantes**	**2 personas**	11-jun-26
				personas	
	ANDRES FELIPE GONZALEZ PRIETO	1072894591	AYUDANTE DE OBRA	1 personas	11-jun-25
6	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO AYUDANTE - BOAL**	**UEMRDAB-REG-01**	**2 Boal´s**	**2 personas**	19-may-25
	BRAYAN STIVEN PORRAS PALACIOS	1022997635	AYUDANTE BOAL	1 personas	19-may-25
	LUIS HERNANDO RAMIREZ PEÑALOZA	3125436	AYUDANTE BOAL	1 personas	19-may-25
7	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3**	**UEMRD3-REG-01**	**2 Auxiliares de control de trafico**	**2 personas**	**16-dic-24**
	DORA EUNICES PEREZ BUSTOS	1072894823	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	16-dic-24
	JOHANNA CELEMIN NARANJO	1106949475	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	16-dic-24
8	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3**	**UEMRD3-REG-02**	**2 Auxiliares de control trafico**	**2 personas**	**13-ene-25**
	BLANCA ISABEL CASTELLANOS MORALES	1069231364	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
	LINA MARCELA PARADA PEÑALOZA	1022936290	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
9	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3**	**UEMRD3-REG-03**	**2 Auxiliares de control trafico**	**2 personas**	**13-ene-25**
	JESLY JULIANA GUZMAN MORA	1003486609	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	13-ene-25
	DERLY XIOMARA MORA GUZMAN	1032656229	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	20-ago-25
	UNIDAD DE EJECUCIÓN DIURNA TIPO 3	**UEMRD3-REG-04**	**2 Auxiliares de control trafico**	**2 personas**	11-jun-25
	ELVIA MARIA CAMARGO LOPEZ	1032029173	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	11-jun-25
	DIANA CRISTINAAVELLANEDA HERNANDEZ	1002548039	AUXILIAR DE TRAFICO	1 personas	11-jun-25
10	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS DIURNA SGR**	**UELTD-REG-01**	**1 Topografo, 1 cadenero 1° y 1 cadenero 2°**	**2 personas**	**16-dic-24**
	JOSE DAVID LOPEZ BOBADILLA	80810144	TOPOGRAFO	1 personas	16-dic-24
	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO	1003486903	CADENERO I	1 personas	16-dic-24
	JESUS ANTONIO GONZALEZ WILCHES	79400503	CADENERO II	1 personas	22-jul-25
11	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS DIURNA SGR**	**UELTD-REG-02**	**1 Topografo, 1 cadenero 1° y 1 cadenero 2°**	**3 personas**	**9-ene-25**
	GIOVANNY ALFREDO GIRALDO NAVARRO	79839669	TOPOGRAFO	1 personas	9-ene-25
	NEYER IVAN AGUDELO BARBOSA	80127396	CADENERO I	1 personas	9-ene-25
	JULIO ESNEYDER RAMIREZ GIL	1000454144	CADENERO II	1 personas	9-ene-25
13	**UNIDAD DE EJECUCIÓN DE LABORES TOPOGRÁFICAS DIURNA SGR**	**UELTD-REG-04**	**1 Topografo, 1 cadenero 1° y 1 cadenero 2°**	**2 personas**	3-jun-25
	JEISSON ORLANDO FONSECA TAMI	1030662359	TOPOGRAFO	1 personas	3-jun-25
			CADENERO I	personas	
	JUAN DAVID DELGADO VERGARA	1032656043	CADENERO II	1 personas	3-jun-25
14	**UNIDAD DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - DIURNA**	**UGSTD-REG-01**	**2 Tecnologos SST con curso de alturas**	**2 personas**	**16-dic-24**
	NEIDI JHOANNA NOVA BERMUDEZ	53049895	TECNOLOGO SST - CON CURSO DE ALTURAS	1 personas	16-dic-24
15	**UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A _Modificacion 02**	**UOTVHD-10A-Rur-M2**	**2 Conductores volqueta doble-troque _ Aliment. y Alojamiento**	**2 personas**	**16-dic-24**
	WILLIAN NEIRA MORENO	79816036	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	5-feb-25
	HERNAN DARIO HERRERA MORALES	80747512	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
16	**UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A**	**UOTVHD-10A**	**2 Conductores volqueta doble-troque.**	**2 personas**	**16-dic-24**
	WILMAN ALONSO MUÑOZ BAUTISTA	1022994231	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
	JAIRO ALBERTO ROZO HERNANDEZ	79801113	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
17	**UNIDAD OPERATIVA DE TRANSPORTE VH PESADO DIURNA 10 A**	**UOTVHD-10A**	**2 Conductores volqueta doble-troque**	**2 personas**	**16-dic-24**
	RICARDO ALBA NIÑO	79363456	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
	RICAUTE CARDONA AGUIRRE	18222467	CONDUCTOR VH PESADO VOLQUETA DOBLE TROQUE	1 personas	16-dic-24
				42 personas	

INGENIERO SUPERVISOR ZONAL - CONTRATO 609 DEL 2023

1	**INGENIERO SUPERVISOR ZONAL**	**ING-IZ**	**1 Ingeniero inspector de zona**	**1 persona**	**16/12/2024**
	JULIO ALBEIRO HERNANDEZ CALDERON	1013662369	INGENIERO INSPECTOR ZONAL	1 personas	16-dic-24
				1 personas	

BOGOTÁ | UMV | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020. (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ)

FECHA DE ACTUALIZACION: 30 DE AGOSTO DE 2025

PERSONAL DIRECTO EN OBRA - CONTRATO No. 609 DEL 2025

CONTRATO No. 936 del 2024 CONSORCIO H Y C SERVICIOS DE MAQUINARIA						
FRENTE DE OBRA UNION-TUNALES						
1	**OPERADORES DE MAQUINAS Y CONDUCTOR DE VEHICULOS**	**GO-01_HYC**		**23**	**Personas**	
	EDGAR RAUL ESPITIA RODRIGUEZ	1106482733	OPERADOR CARRO TANQUE	1	persona	16-ene.-25
	ISMAEL OLMOS DIMATE	80269138	OPERADOR CARRO TANQUE	1	persona	21-abr.-25
	GREGORIO MERCHAN	79669879	OPERADOR MOTONIVELADORA	1	persona	24-jul.-25
	CAMILO GOMEZ TORRES	79445528	OPERADOR RETROESCAVADORA	1	persona	
	ARNULFO LOPEZ BURGOS	11435690	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	30-mar.-25
	LUIS ALEJANDRO MESA BAYONA	74183248	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	19-ago.-25
	FABIO ESPINOZA ARIAS	79249326	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	14-ago.-25
	CARLOS JAVIER LEMUS	1055229337	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	04-'8-2025
	SEBASTIAN BLANCO SANCHEZ	1025322582	SUPERVISOR MAQUINARIA	1	persona	15-ene.-25
	NILSON LOPEZ BURGOS	11435690	OPERADOR VOLQUETA SENCILLA	1	persona	14-abr.-25
	LUIS GABRIEL PEREZ CASTRILLO	1064786137	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	31-mar.-25
	ALONSO VARGAS PLAZAS	3232285	OPERADOR MOTONIVELADORA	1	persona	22-may.-25
	YEFERSON ALEXANDER RUEDA BARRANTES	1105670124	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	
	OCTAVIO ALFONZO MENDEZ	3214253	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	19-may.-25
	JUAN CARLOS SILVA	1032400140	OPERADOR RETROESCAVADORA	1	persona	16-jun.-25
	ERIBERTO JIMENEZ FERNANDEZ	3166130	OPERADOR MOTONIVELADORA	1	persona	5-feb.-25
	ERNESTO MEDINA MELO	11251471	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	21-abr.-25
	CRISTIAN CAMILO HURTADO GRAJALES	1053607177	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	16-jun.-25
	HENRY RUA	1067593903	OPERADOR RETROESCAVADORA	1	persona	10-mar.-25
	WILMER YOANY PEREZ CASTRO	1069231015	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	1	persona	16-jun.-25
	LUIS HOYOS	1003501103	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	16-jun.-25
	LUIS EDUARDO LOPEZ GUERRERO	79249265	OPERADOR MINICARGADOR	1	persona	20-ene.-25
	JHAIR ANDRES ARAGON LAGUNA	1024578432	OPERADOR RETROESCAVADORA	1	persona	24-jul.-25
				23	persona	

CONTRATO No. 485 del 2022 MEGASEGURIDAD LTDA. SERVICIOS DE VIGILANCIA						
FRENTE DE OBRA UNION-TUNALES						
1	**GUARDAS DE SEGURIDAD - VIGILANTES**	**GO-01_MEG-SEG**		**12**	**Personas**	**15-ene-25**
	LEIDY BAQUERO ORJUELA	1069740888	VIGILANTE	1	persona	4-ago.-25
	ALBERTO VILLALBA VERGARA	79632496	VIGILANTE	1	persona	4-ago.-25
	DANIEL OCTAVIO GONZALEZ	1033793787	VIGILANTE	1	persona	4-ago.-25
	MAICOL ALEJANDRO PEÑALOZA MUÑOZ	1069231461	VIGILANTE	1	persona	4-ago.-25
	YAQUELIN LOPEZ MENESES	1032656446	VIGILANTE	1	persona	4-ago.-25
	ALCY PAIPA CUBILLOS	79726810	VIGILANTE	1	persona	4-ago.-25
	JAIME TORRES GARCIA	1022937601	VIGILANCIA	1	persona	21-ago.-25
	NIDIA HERNANDEZ PENAGOS	20824393	VIGILANCIA	1	persona	4-ago.-25
	BERNARDO PEÑALOZA PARADA	80253923	VIGILANCIA	1	persona	23-ago.-25
	ADRIANA POVEDA DELGADO	1003652964	VIGILANCIA	1	personas	4-ago.-25
	VIVIAN STEYSI CANO ROMERO	1001061206	VIGILANCIA	1	personas	4-ago.-25
	BALBINA PEÑALOZA VALBUENA	1022956902	VIGILANCIA	1	personas	4-ago.-25
				12	**personas**	

CONTRATO CAMIONETAS 4*4 VIAJANDO POR COLOMBIA 006 DE 2025						
3	EDISON FERNEY HURTADO GARCIA	1007519653	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	21-jul.-25
	BRAYAN ALEXIS PEÑALOZA CORTES	1022979929	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	21-jul.-25
	ELMER USECHE MOLINA	79590077	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	24-jun.-25
	MILLER CENTENO CORTES	1087124575	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	
	GONZALO RIOS MURCIA	80070964	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	4/08/2025
	RICARDO HERNANDEZ TORRES	10244512837	CONDUCTOR CAMIONETA	1	persona	21/08/2025
				6	**persona**	

CONTRATISTAS UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL						
3	RAFAEL DARIO PEÑA FLORES	79105538	DIRECTOR DE OBRA	1	persona	28-nov.-24
	CAMILO ERNESTO ROJAS GARCIA	1010162306	RESIDENTE DE OBRA	1	persona	29-nov.-24
	JORGE LUIS ALDANA PERDOMO	79958784	RESIDENTE DE OBRA	1	persona	14-abr.-25
	JESICA PAOLA VIDAL POLOCHE	1030669188	RESIDENTE AMBIENTAL	1	persona	7-abr.-25
	RUBY DEL CARMEN RUIZ ARRIETA	1005551124	RESIDENTE SOCIAL	1	persona	4-abr.-25
	LEIDY YOHANA ORTIZ URREA	1069764358	RESIDENTE SST	1	persona	4-abr.-25
	JENNIFER CAROLINA VELA PAIVA	1018482183	PROFESIONAL ENCARGADO DE TRAZABILIDAS Y SEGUIMIENTO TECNICO	1	persona	2-dic.-24
	OMAR FERNEY PATIÑO TORRES	80197609	PROFESIONAL TRAZABILIDAD Y MAQUINARIA	1	persona	13-dic.-24
	YINA RUTH FONSECA ACOSTA	1069744056	APOYO ADMINISTRATIVO	1	persona	2-dic.-24
				9	persona	

TOTAL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO	**93**

Profesional SST LEIDY YOHANNA ORTIZ URREA

A13

- *Lista de chequeo mes de agosto UAERMV.*

BOGOTÁ ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ	**PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).". UAERMV CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022**	ECOVIAS SAS

FECHA: 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 COMPONENTE SOCIAL

ÍTEM	Parámetros Evaluados por Actividad	C1	C2	C3	C4	CALIFICACIÓN
		100%	50%	0,0%	N/A	
1	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
2	El personal social cumple con las funciones establecidas.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
3	El profesional social asistió a los comités de seguimiento integral y social a los cuales fue convocado.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
4	La entidad ejecutora entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de Gestion Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Plan de Gestión Social						
Programa de atención al Usurario						
5	Instaló el punto de atención al Usurario.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
6	El punto de atención ciudadano funcionó en el horario establecido.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
7	El punto de atención al usuario cuenta con dotación mínima requerida.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
8	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRSFD .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
9	Realizó el respectivo seguimiento a las PQRSFD abiertas durante el período de evaluación.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
10	Dio respuesta a las PQRSFD de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
11	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRSFD solicitados por la Interventoría.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
12	La entidad ejecutora cumplió con los recorridos programados por frente de obra.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa de información y participación comunitaria						
13	Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
14	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
15	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
16	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA

17	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
18	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
19	Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
19	Elaboró las actas de gestión adelantada con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
20	La entidad ejecutora cumplió con los compromisos en los tiempos pactados con el ciudadano.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
21	Elaboró las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
22	Entregó las actas de vecindad y compromiso a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
23	El profesional hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actas establecidas contractualmente.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
24	Se entregó copia de las actas de compromiso y de vecindad a la comunidad, si son requeridas por la misma, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
25	El profesional social realizó el acompañamiento durante los registros fílmicos del estado inicial de las vías.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
26	Se entregó el respectivo registro fílmico de las vías a la Interventoría para su revisión y aprobación de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
27	La entidad ejecutora realiza acompañamiento al comité veedor conformado por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
28	La entidad ejecutora convoca y realiza reuniónes de comité veedor, de acuerdo a las solicitudes realizadas por la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Programa de Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto						
29	Realiza las sensibilización con el personal vinculado al proyecto de acuerdo con la información establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Programa del cultura vial						
30	Realiza sensibilización de sostenibilidad y cuidado de la vía con las temáticas y el tiempo establecido en las fichas PAGA.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
Mano de obra no calificada						
31	Cumplió con el reporte en el informe mensual de personal de mano de obra no calificada local.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%

32	Cumplió con el reporte en el informe mensual población en condición de vulnerable.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
33	Cumplió con el reporte en el informe mensual la contratación de mujeres en el proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Movilidad						
34	El contratista realiza socialización del PMT.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	NA
Información del proyecto						
35	Elaboró e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
36	Elaboró y distribuyó los volantes de inicio a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
37	Elaboró y distribuyó los volantes de finalización de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
38	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información de los cierres programados en la via a la comunidad.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
39	Elaboró y distribuyó los volantes, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
40	Instaló el (los) Punto(s) informativos fijos de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
41	Realizó mantenimiento a (los) punto informativos y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
42	Instaló la (s) valla (s) informativa (s) móviles de acuerdo a los requisitos y tiempos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
Reportes						
43	Proporcionó a la Interventoría y/o al Fondo de Desarrollo Rual del Sumampaz, la información del plan de gestión social .	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
44	Tiene disponibilidad al Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz y la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución de actividades de obra del proyecto.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
45	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de Gestión Social	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
46	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe semanal de Gestión Social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	100%
47	Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de de la Gestión social.	Cumplió	Cumple parcialmente	No cumplió	N/A	NA
48	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la Interventoría y/ al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos.	Cumplió	Cumple parcialmente	No Cumplió	N/A	100%
TOTAL CALIFICACIÓN						**100%**

OBSERVACIONES	
ELABORÓ	
	Profesional social de Interventoría ECOVIAS SAS
	Isabel Bernal Yasso
ACEPTÓ	Profesional social de la UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV)
	Rubys Ruiz

A 14

- *Copia Bitácora Social agosto UAERMV.*

30/07/2025
Actividades realizadas
Tramo vial San Antonio El Toldo.
La profesional Social realizó atención a la Comunidad, con el fin de Coralizar las inquetudes de la misma.
La profesional Social realizo entrega de la presentación que será proyectada en la reunión del ejercicio de control Social la interventoria da aval para fines por tinentes.

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T.P. [illegible]

UMV.

RAFAEL D. PEÑA F.
U.M.V.

31/07/2025
Actividades realizadas
La entidad ejecutora realiza reunión del ejercicio de control Social con la Comunidad lideres, Ediles, Interventoria, Consorcios Estabilización Vial y Gaviones 95.
La interventoria realizó recorrido, con el fin de Verificar los Complimiento a las actividades Contempladas en el plan de gestión Social.

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T.P. [illegible]

UMV

RAFAEL D. PEÑA F.
U.M.V.

1/08/2025
Actividades realizadas
El Componente Social Participa en el Comité de Seguimiento integral #54, donde participan los Componente Social, Ambiental, SST y técnica y realizar Seguimiento al Contrato.

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T.P. [illegible]

UMV

RAFAEL D. PEÑA F.
U.M.V.

2/08/2025
No se realizan actividades de obra

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 0805335212-R

UMV

Rafael D. Peñaf
U.M.V.

3/8/2025
Actividades realizadas
No se realizan actividades en obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T. P. 0805335212-R

UMV.

Rafael D. Peñaf
U.M.V

4/08/2025
Actividades a realizar
La Entidad realiza atención al usuario en el tramo vial Santo Domingo – Capitolio con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.

UMV.

Rafael D. Peñaf
U.M.V.

- Actividades a realizar.
- La entidad realiza atención al usuario en el tramo vial Varon Tunales con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retro alimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.

UMV

Rafael D. Peñaf (U.M.V).

- Actividades a realizar.
- Informe mensual Interventoria
- La entidad llevo a cabo la elaboracion del Informe mensual correspondiente el cual fue presentado a la firma

Interventoría Ecovías S.A.S., con el fin de dar cumplimiento a los compromisos contractuales y mantener actualizada la información sobre el avance y desarrollo de las actividades ejecutadas en el Proyecto.

Isabel Bernal Yasa
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

UMV.

RAFAEL D. PEÑA F.
U.M.V.

5,6,7/08/2025.

Actividades realizadas.

Se realiza informe mensual, correspondiente a las obligaciones Contractuales. Proyecto: regalías Sumapaz.

- se realiza recorrido en los diferentes tramos viales activos (capellanía, Unión Fundadores, Toldo.) con el Fin de recepcionar inquietudes de la comunidad.

UMV.

Isabel Bernal Yasa
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

RAFAEL D. PEÑA F.
U.M.V.

9/08/2025

Actividades realizadas

No se realizan actividades

Isabel Bernal Yasa
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

RAFAEL D. PEÑA F.
U.M.V.

10/08/2025

Actividades realizadas

No se realizan actividades.

Isabel Bernal Yasa
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

RAFAEL D. PEÑA F.
U.M.V.

11/08/2025

Actividades realizadas.

12/08/2025

La profesional social de la UMV realizó atención en el tramo vial Santo Domingo con el fin de establecer un contacto cercano con los

residentes y usuarios de la zona. Brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada.

UMV.

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Actividad 2.

la profesional Social realiza la entrega predio a predio de Volantes informativos en los diferentes tramos viales Activos (para los cierres que se estaran manejando durante el mes de agosto).

UMV.

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Actividad 3.

- la profesional social realiza instalación de 1 volante informativo (Horarios de cierres viales) en el punto de atención al usuario (tramo vial capetlio).

UMV

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

Actividad 4.

la profesional social realiza sensibilización del Volante informativo (Horario de cierres viales) a la Comunidad de los diferentes tramos viales activos.

UMV

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

13-08-2025.

Actividades a realizar.

Actividad 1.

la profesional social realiza acompañamiento social en el frente de obra Jaen Turrales.

UMV

Isabel Bernal Yanes
Trabajo Social
T. P. 080535212-R

14 -08- 2025

Actividades a realizar.

La profesional Social Distribuye la información a través de los grupos vía whatsap, y realiza acompañamiento social en obra frente vial capitolio

UMV. Isabel Bernal Vera Trabajo Social T.P. 0605335212-0

15 -08- 25

Actividades a realizar.

Actividad 3.

La profesional Social participa del Comité Semanal realizado por la firma Interventora Teorias S.A.S. proyecto Regalias Sumapaz con el fin de revisar los compromisos asumidos para garantizar la ejecución de todas las actividades asignadas en los plazos establecidos.

UMV. Isabel Bernal Vera Trabajo Social T.P. 0605335212-0

16- 08- 2025

Actividades a realizar.

No se realizan actividades de obra

UMV.

17- 08- 2025

Actividades a realizar

No se realizan Actividades de obra

UMV Isabel Bernal Vera Trabajo Social T.P. 0605335212-0

18- -08- 2025.

Actividades a realizar.

No se realizan actividades

UMV Isabel Bernal Vera Trabajo Social T.P. 0605335212-0

19- 08 - 2025
Actividades a realizar.
La profesional social realiza acompañamiento social en obra. (turno rules act.

UMV.

20 - 08 - 2025
Actividades a realizar.
La profesional social realiza atención al usuario en el turno vial (Tunales, con el fin de establecer contacto cercano con los residentes usuarios de la zona.

UMV.

20- 08- 2025.
Actividades a realizar.
La profesional Social realiza Sensibilización mensual Sobre la estructura Organizacional de la UAERMV. con el equipo de obra Unión Tunales.

UMV.

21 - 08 - 2025.
Actividades a realizar
La Profesional social realiza atención al usuario en el turno vial Capet con el fin de estublecer un contacto cercano con los residentes y Usuarios de la zona.

UMV

22-08-2025.

Actividades a realizar.

La profesional Social participa de una reunión solicitud del Concejal Oscar Fernando Bastidas, vocero bancada Movimiento Alternativo indígena y Social- MAIS. con el fin de brindar información del Proyecto Regalías Sumapaz.

CIMV.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
C.C. 1.075235212-A

23-08-2025.

Actividad a realizar.

La profesional Social Social participa de los Comités Semanales Convocados por la firma Interventora Ecovias S.A.S.

CIMV.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
C.C. 1.075235212-A

23-08-25.

Actividades a realizar.

No se realizaron Actividades.

CIMV.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
C.C. 1.075235212-A

24-08-2025.

Actividades a realizar.

No se realizan actividades.

CIMV.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
C.C. 1.075235212-A

25/08/2025
Actividades realizados
La interventoría realizó recorrido con el fin de verificar las actividades realizadas con el componente. Social

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 0805335212-R

UMV.

26/08/2025
Actividades realizados
La profesional Social realizó atención a la Comunidad en el tramo vial de Unión tonalos, con el fin de conocer las inquietudes de la Comunidad.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 0805335212-R

UMV.

27/8/2025
Actividades realizados Capitolio
La profesional Social realizó atención a la Comunidad en Capitolio, con el fin de conocer inquietudes a la comunidad.
tramo vial Unión tonalos
La profesional Social realizó atención a la Comunidad en el tramo vial Unión tonalos, con el fin de conocer inquietudes de la Comunidad

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 0805335212-R

UMV.

28/08/2025
Actividades realizados
El Componente Social Participo y realizó acompañamiento al comité de seguimiento integral con el fin de verificar las actividades establecidas en cada componente. Social ambiental, fauna, SST.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 0805335212-R

UMV

29/08/2025
Actividades realizados
La profesional Social realiza recorrido con el fin de verificar mantenimiento en puntos informativos y moviles., la interventoria evidencia cumplimiento.
De igual manera la profesional Social realizó recorrido en el tramo 0 en el de Jerquera validar actividades realizadas por el Consorcio Puentes 90:, asi mismo participa en el comité de seguimiento integral en este punto de obra. o frente de obra.

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

UMV.

30/8/2025
Actividades realizados
NO Se realizan actividades en obra

Isabel Bernal Yasso
Trabajo Social
T.P. 080535212-R

UMV.

31/08/2025
NO Se realizan actividades en obra

UMV.

1/09/2025
Actividades realizados.

A 15

- Correspondencia enviada y recibida.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALÍAS-161-2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

Correspondencia enviada

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890104625-1

186-1-788

Bogotá D.C. 6 de agosto de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. JULIO CESAR PINZÓN-GERENTE DEL PROYECTO
Gerente del proyecto
julio.pinzon@umv.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

Asunto: Traslado derecho de petición *"vía el toldo San Antonio" Radicado FDRS No. 20257010011792.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la **UAERMV**.

Con el presente comunicado nos permitimos dar traslado del derecho de petición entablado por la junta de acción comunal de San Antonio El Toldo, Mantenimiento de la vía de San Antonio El Toldo vereda Toldo Localidad 20 de Sumapaz.

La interventoría solicita atender las peticiones indicada en el documento a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV).

Se recuerda que la respuesta debe ser como lo indica la ley, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la misma.

Cordialmente:

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos Derecho de Petición Junta de acción Comunal de San Antonio El Toldo y Radicado FDRS No. 20257010011792. (4 folios).

Copia: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS -lauram.rojas@gobiernobogota.gov.co-
cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
José Miguel Ruiz – jmruiz@gobiernobogota.gov.co

Elaborado: IBY
Revisado: EHR

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL TOLDO, LOCALIDAD 20 D.C.
Personería jurídica No 150 de 18 de mayo de 1976

Bogotá Sumapaz 19 de Mayo de 2025

Asunto

Vía El Toldo San Antonio

Señores

Alcaldía local de Sumapaz

Subred

Integración social

Secretaria de Educación

Unidad de Mantenimiento Vial

Junta Administradora Local

Comunidad Sumapceña Juntas de Acción de Acción Comunal

Cordial saludo, la comunidad de la vereda el Toldo, se manifiesta a través del siguiente escrito ante la preocupación que se viene presentando en nuestra vía Toldo - San Antonio.

1. La vía está en pésimo estádo no se ha mejorado con los pasos que están en mal estádo y no se ha tenido en cuenta las recomendaciones sugeridas por la comunidad.

2. Se nos están vulnerando los derechos a la salud muchas personas de nuestra comunidad no pueden salir en caso de una emergencia o a citas medicas.

- Vulneración en el Derecho a la Educación nuestros niños y niñas no están asistiendo a las sedes y están recibiendo una baja Calidad educativa

-A nuestra comunidad se le está vulnerando el Derecho al trabajo, muchas de las personas se están desplazando y corriendo el riesgo de un accidente de tránsito, lo más triste y preocupante de nuestros trabajadores del campo es que los agricultores no han podido sacar sus productos a la venta, no han podido ingresar los insumos agricolas para las siembras, los vehículos (camionetas,turbos,camiones) que han ingresado a sacar o a ingresar los productos se han quedado varados y ocasionando graves daños a sus

vehículos en donde los han tenido que sacar en grúas, en tractores y quien le responde a estos conductores por tales daños o a el campesinado.

Los carros que compran queso no pueden ingresar a las veredas nuestros productores de queso y leche se están quedando con sus productos.

- Se está vulnerando una alimentación sostenible los vehículos del mercado y abarrotes no están ingresando y hay personas que viven de este sustento.

3. En la vereda el toldo se está prestando el caso de que están sacando papa sobre el costado de la via y estos están ocasionando daño a la vía y por tal motivo puede estar causando daños en la vía.

A continuación adjunto fotografías evidenciando el problema descrito.

Quedamos atentos a sus prontas respuestas.

Atentamente

Jeinsth Andrea Tautiva Pinzón

Presidenta Junta de Acción Comunal vereda el Toldo.



JEINSTH ANDREA TAUTIVA PINZON
CC.1001170017
CEL: 3043570481
Presidenta de la JAC del Toldo

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1975 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6053205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviasas.com
NIT 890.104.625-1

186-1-812

Bogotá D.C. 13 de agosto del 2025.

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. JULIO CESAR PINZÓN-GERENTE DEL PROYECTO
Gerente del proyecto
julio.pinzon@umv.gov.co

Atn: Ing. RAFAEL DARIO PEÑA
Director de Obra
rafael.pena@umv.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

Asunto: *Respuesta al Radicado: 20251920101991* ***UAERMV*** *05- 08 -2025*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la **UAERMV**.

Una vez revisado el comunicado del asunto en referencia, no se evidencia un link que permita ver el anexo informe social No 12.

Con lo relacionado anteriormente se le solicita a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV, que revisen los documentos adjuntos cuando envíen un comunicado y que se pueda acceder al enlaces o anexos.

Teniendo en cuenta los relacionado anteriormente se le solicita a la UAERMV, allegue a la interventoría los anexos del comunicado relacionado en el asunto en un máximo de 3 días calendario, al recibo de la presente comunicación.

Cordialmente:

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexo: N/A

C.C: Jose Miguel Ruiz – Apoyo a la supervisión FDRS jmruiz@gobiernobogota.gov.co - cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Mónica Chapatecua Apoyo a la supervisión FDRS, monicachipatecua@gmail.com

Elaborado: IBY
Revisado: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1972 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 # 85 - 50
Teléfono 6055205027
Barranquilla - Colombia
info@ecoviassas.com
NIT 890.304.625-1

186-1-803

Bogotá D.C. 11 de agosto de 2025.

Señores.
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
Atn: Dr. DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
Alcalde Rural de Sumapaz
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-REGALIAS-161-2022 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.

Asunto: Respuesta 20257020012241*, "Traslado derecho de petición "vía el toldo San Antonio" Radicado FDRS No. 20257010011792.°.*

Respetados señor alcalde:

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo.

Con el presente comunicado nos permitimos informar que se realizó traslado al derecho de petición entablado por la Junta de Acción Comunal de San Antonio El Toldo, Mantenimiento de la vía de San Antonio El Toldo vereda Toldo Localidad 20 de Sumapaz, mediante comunicado 186-1-788 el 6 de agosto del 2025 a la **UAERMV**. Se está a la espera de la respuesta y será remitida a ustedes para fines pertinentes.

Cordialmente,

ERMY A. HURTADO R.
Directora de Interventoría

Anexos: Comunicado 186 -1- 788 del 6-08-25 8 (3 folios)

Copia: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS -lauram.rojas@gobiernobogota.gov.cocdi.
sumapaz@gobiernobogota.gov.co
José Miguel Ruiz – jmruiz@gobiernobogota.gov.co

Elaborado: IBY
Revisado: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT. 890104625-1

186-1-788

Bogotá D.C. 6 de agosto de 2025

Señores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV
Atn: Ing. JULIO CESAR PINZÓN-GERENTE DEL PROYECTO
Gerente del proyecto
julio.pinzon@umv.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". (LOCALIDAD 20 DE SUMAPAZ).

Asunto: Traslado derecho de petición *"vía el toldo San Antonio" Radicado FDRS No. 20257010011792.*

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría nos permitimos en el desarrollo de las actividades del proyecto de la referencia, indicar que esta Interventoría ha procedido a realizar el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la **UAERMV**.

Con el presente comunicado nos permitimos dar traslado del derecho de petición entablado por la junta de acción comunal de San Antonio El Toldo, Mantenimiento de la vía de San Antonio El Toldo vereda Toldo Localidad 20 de Sumapaz.

La interventoría solicita atender las peticiones indicada en el documento a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV).

Se recuerda que la respuesta debe ser como lo indica la ley, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la misma.

Cordialmente:

ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría

Anexos Derecho de Petición Junta de acción Comunal de San Antonio El Toldo y Radicado FDRS No. 20257010011792. (4 folios).

Copia: Laura Marcela Rojas Marroquí – Apoyo a la supervisión FDRS -lauram.rojas@gobiernobogota.gov.co-
cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
José Miguel Ruiz – jmruiz@gobiernobogota.gov.co

Elaborado: IBY
Revisado: EHR

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL TOLDO, LOCALIDAD 20 D.C.
Personería jurídica No 150 de 18 de mayo de 1976

Bogotá Sumapaz 19 de Mayo de 2025

Asunto

Vía El Toldo San Antonio

Señores

Alcaldía local de Sumapaz

Subred

Integración social

Secretaria de Educación

Unidad de Mantenimiento Vial

Junta Administradora Local

Comunidad Sumapceña Juntas de Acción de Acción Comunal

Cordial saludo, la comunidad de la vereda el Toldo, se manifiesta a través del siguiente escrito ante la preocupación que se viene presentando en nuestra vía Toldo - San Antonio.

1. La vía está en pésimo estádo no se ha mejorado con los pasos que están en mal estádo y no se ha tenido en cuenta las recomendaciones sugeridas por la comunidad.

2. Se nos están vulnerando los derechos a la salud muchas personas de nuestra comunidad no pueden salir en caso de una emergencia o a citas medicas.

- Vulneración en el Derecho a la Educación nuestros niños y niñas no están asistiendo a las sedes y están recibiendo una baja Calidad educativa

-A nuestra comunidad se le está vulnerando el Derecho al trabajo, muchas de las personas se están desplazando y corriendo el riesgo de un accidente de tránsito, lo más triste y preocupante de nuestros trabajadores del campo es que los agricultores no han podido sacar sus productos a la venta, no han podido ingresar los insumos agricolas para las siembras, los vehículos (camionetas,turbos,camiones) que han ingresado a sacar o a ingresar los productos se han quedado varados y ocasionando graves daños a sus

vehículos en donde los han tenido que sacar en grúas, en tractores y quien le responde a estos conductores por tales daños o a el campesinado.

Los carros que compran queso no pueden ingresar a las veredas nuestros productores de queso y leche se están quedando con sus productos.

- Se está vulnerando una alimentación sostenible los vehículos del mercado y abarrotes no están ingresando y hay personas que viven de este sustento.

3. En la vereda el toldo se está prestando el caso de que están sacando papa sobre el costado de la via y estos están ocasionando daño a la vía y por tal motivo puede estar causando daños en la vía.

A continuación adjunto fotografías evidenciando el problema descrito.

Quedamos atentos a sus prontas respuestas.

Atentamente

Jeinsth Andrea Tautiva Pinzón

Presidenta Junta de Acción Comunal vereda el Toldo.



JEINSTH ANDREA TAUTIVA PINZON
CC.1001170017
CEL: 3043570481
Presidenta de la JAC del Toldo

Correspondencia recibida

Bogotá D.C.,

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL TOLDO
Atn. Jeinsth Andrea Tautiva Pinzón
Presidenta JAC Vereda el Toldo
jtautivapinzon@gmail.com
Localidad 20 – Sumapaz
Ciudad

Asunto: Respuesta al derecho de petición radicado UAERMV 20251120120202 sobre el estado de la vía El Toldo – San Antonio.

Respetados señores:

En atención a la comunicación presentada por la Junta de Acción Comunal de la vereda El Toldo, mediante la cual se expone la situación actual de la vía El Toldo – San Antonio y las afectaciones que esta presenta para la comunidad, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, en el marco de sus competencias, se permite informar lo siguiente:

El proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá” tiene como objetivo intervenir y mejorar vías existentes para garantizar la intercomunicación de la Localidad de Sumapaz. El alcance del proyecto incluye un tramo vial que atraviesa la vereda El Toldo, identificado como “Tramo El Toldo a San Antonio”, cuyas coordenadas se presentan a continuación:

DENOMINACIÓN: TRAMO SAN ANTONIO				COORDENADAS ELIPSOIDALES		COORDENADAS MAGNA_SIRGAS	
TRAMO	**VEREDAS**	**PUNTO**	**ABSCISA**	**LATITUD**	**LONGITUD**	**ESTE**	**NORTE**
9	EL TOLDO A SAN ANTONIO	INICIO	K0+000	4°2'40,85478"	74°18'37,77219"	974128,395	939016,468
		FIN	K13+820	4°6'28,27641"	74°19'50,76241"	971879,144	946002,837

Como es de conocimiento de la Junta de Acción Comunal, en el marco de la ejecución del proyecto se han presentado situaciones ajenas a la UAERMV que han generado parálisis parcial y total de las obras. No obstante, esta Entidad ha realizado las gestiones correspondientes para lograr la reactivación del proyecto, como se evidencia actualmente en la zona.

La UAERMV inició intervenciones en este tramo vial durante el primer semestre de 2024, adelantando actividades de mejoramiento de la subrasante en puntos con baja o nula capacidad portante (sacada de fallos), debido al deterioro ocasionado tanto por el tránsito de vehículos de carga pesada propios de la zona, como por las volquetas empleadas en la construcción del muro en tierra armada ubicado en la vereda San Antonio, que conecta con el puente vehicular hacia el municipio de San Bernardo (Cundinamarca).

Bogotá D.C.,

Ingeniero:
LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal ECOVÍAS S.A.S.
Carrera 45 No. 85-50
Barranquilla (Atlant)
intersumapaz.ecovias@gmail.com
temporalsumapaz@gmail.com

Referencia: Proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”, del Sistema General de Regalías -SGR- identificado con código BPIN 2018000050020. (Localidad 20 de Sumapaz)

ASUNTO: Respuesta radicado UAERMV No. 20251120101242 - 186-1-713 Respuesta a observaciones del informe mensual social N.º 12 correspondiente al mes de mayo de 2025.

Cordial saludo,

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y de Mantenimiento Vial “UAERMV”, da respuesta a cada uno de los puntos observados en el radicado relacionado en el asunto, en los siguientes términos:

1. Se realizaron los ajustes correspondientes al documento del informe, entre los cuales se destacan:
   - Inclusión de firmas de revisión y aprobación.
   - Corrección de errores automáticos en el índice de contenido y numeración de tablas y anexos.
   - Verificación y actualización de los nombres propios institucionales y datos de funcionarios.
   - Unificación de cifras entre los componentes social y de SST, particularmente en el reporte de vinculación de mano de obra.
   - Reemplazo de imágenes insertadas por anexos PDF de alta calidad, tal como se solicitó.

- Ajustes de encabezados cortados, espacios en blanco, y otros aspectos de presentación.

2. Igualmente, se realizó la trazabilidad correspondiente al estado del informe mensual del área social No. 11, conforme a las observaciones de la Interventoría.

3. Con relación al Anexo 8: "*Excel vinculación mano de obra, listado de personal del proyecto",* se verificó su incorporación y visualización adecuada dentro del informe actualizado.

4. Se procedió con la revisión integral del documento, cuidando la coherencia entre el texto, los anexos, los separadores y el contenido referenciado, así como el cumplimiento de los estándares de presentación exigidos por la interventoría.

De acuerdo con lo anterior, se remite el informe mensual del componente social No.12 ajustado.

Cordialmente,

Anexo: informe social No 12

C.C Diego Ramiro García Bejarano - Alcalde Local Sumapaz cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

Documento 20251920101991 firmado electrónicamente por:	
JULIO CESAR PINZÓN REYES	Subdirector de Intervención de la Infraestructura SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA julio.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 05-08-2025 15:55:38
Revisó:	RAFAEL DARÍO PEÑA FLÓREZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - rafael.pena@umv.gov.co
Proyectó:	RUBYS DEL CARMEN RUIZ ARRIETA - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - rubys.ruiz@umv.gov.co
2b2eaad1dae5825f7a71fcbb9c68176edbed92b6ce2393442662fb8cca507489 Codigo de Verificación CV: 27bb3 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

Estas labores han tenido como finalidad mejorar la movilidad de los habitantes y permitir el tránsito de vehículos del contratista de obras hidráulicas, el cual ha ejecutado, a la fecha, 7.137 m de subdren y cinco (5) alcantarillas completas (incluyendo tubería y estructuras de encole y descole en concreto), obas que en todo caso son predecesoras de las intervenciones de calzada a cargo de la UAERMV.

En el segmento comprendido entre las abscisas K0+000 y K6+779,16, que cubre la vereda El Toldo, se han ejecutado 3.460 m de estructura de vía mejorada, con capa de rodadura en fresado estabilizado, capa de base granular y subrasante mejorada y nivelada con material granular seleccionado (tipo B).

Actualmente continúan las intervenciones en los puntos de baja o nula capacidad portante. A la fecha, se han intervenido y mejorado 35 fallos y puntos críticos, cuya identificación se realizó de manera conjunta con la comunidad, a fin de mejorar el acceso a la vereda.

En concordancia con lo manifestado por la Junta de Acción Comunal, la Entidad ha identificado que en algunos sectores de la vía se está llevando a cabo la extracción de papa sobre el costado de la calzada, actividad que puede ocasionar deterioro en la estructura vial y generar daños que afecten su estabilidad y funcionalidad. Por lo anterior, solicitamos a la Junta de Acción Comunal y a la Alcaldía Local de Sumapaz su apoyo y comunicación con la comunidad para prevenir que se continúe con este tipo de prácticas, evitando así afectaciones adicionales que puedan comprometer la vía y su adecuado uso.

Finalmente, la UAERMV reitera que ha atendido las solicitudes de la comunidad en el marco de sus competencias y recursos disponibles, procurando mantener la transitabilidad del corredor vial y avanzar en la ejecución del proyecto “Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá” con código BPIN 2018000050020, financiado con recursos del SGR.

Cordialmente,

Con copia a: Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, Diego Ramiro García Bejarano - Alcalde Local Sumapaz. cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co, alcalde.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Junta Administradora Local Jal.sumapaz20@gmail.com, jal.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Subred - peticionescomunitariasur@gmail.com

Documento 20251920105781 firmado electrónicamente por:	
JULIO CESAR PINZÓN REYES	Subdirector de Intervención de la Infraestructura SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA julio.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 13-08-2025 15:03:37

Revisó:	LADY ESTUPIÑAN BARRERA - Abogada Contratista - SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA - lady.estupinan@umv.gov.co

6f8a05ef83bbb77f84a82e9e1e4428b873ebc557959def655897aea871848d2c
Codigo de Verificación CV: 1415e Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

Bogotá D.C.,

Señores:
ECOVIAS S.A.S.
Atn: ERMY A. HURTADO R.
Directora Interventoría
Carrera 45 No. 85-50
(605) 3576115
Barranquilla –Atlántico

ASUNTO: Respuesta a comunicado UAERMV 20251120133222 de 8 de agosto de 2025, con asunto: "*Traslado derecho de petición "vía el toldo San Antonio Radicado FDRS No. 20257010011792""*

Respetados señores,

En respuesta a la comunicación del asunto, por la cual Ecovías da traslado a la UAERMV del derecho de petición elevado por la junta de acción comunal de San Antonio El Toldo, Mantenimiento de la vía de San Antonio El Toldo vereda Toldo Localidad 20 de Sumapaz, se informa que el documento enunciado fue recibido por la UAERMV bajo el radicado No. 20251120120202 de fecha 22 de julio de 2025, dando respuesta oportuna mediante comunicación 20251920105781 de 13 de agosto de 2024, el cual se adjunta a la presente comunicación.

Atentamente,

Con copia a:
Diego Ramiro García Bejarano - Alcalde Local Sumapaz cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

Documento 20251920109321 firmado electrónicamente por:	
JULIO CESAR PINZÓN REYES	Subdirector de Intervención de la Infraestructura SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA julio.pinzon@umv.gov.co Fecha firma: 21-08-2025 10:02:59
Revisó:	GLORIA ROCIO BOTERO SANCHEZ - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - gloria.botero@umv.gov.co
	LADY ESTUPIÑAN BARRERA - Abogada Contratista - SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA - lady.estupinan@umv.gov.co
c9023035e0b0f0cfd17690ccfb93c1c6f64f87a432b692ad7e68390f7f5b940e Codigo de Verificación CV: 2accd Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

Anexos: 1 folios

Bogotá, D.C.

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación:_____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

(702)

Señor
LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal
ECOVIAS S.A.S
intersumapaz.ecovias@gmail.com
temporalsumapaz@gmail.com
gerenciatecnica@ecoviasas.com
Ciudad,

Asunto: Traslado derecho de petición *"vía el toldo San Antonio"*

Referencia: Radicado FDRS No. ***20257010011792***

Cordial Saludo:

En atención al derecho de petición relacionado en el asunto, mediante el cual la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda, el Toldo solicita el mantenimiento de la vía de dicha vereda, como alcaldía se informa lo siguiente:

El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz (FDRS), en el ejercicio de sus funciones como supervisor del contrato de interventoría, trasladó dicha solicitud a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) mediante radicado No. 20257020012021 del 17 de junio de 2025, en tanto esta entidad es la encargada para la ejecución de las obras relacionadas con el proyecto "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" (CÓDIGO BPIN 2018000050020), financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), el cual contempla la intervención de la vía mencionada.

En este sentido, y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, el cual establece que:

"Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado, remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario, o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará.

Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente."

Así como con fundamento en el artículo 33 del Decreto 019 de 2012, que indica:

"Las autoridades deberán coordinar el ejercicio del derecho de petición en los casos en que ello sea necesario para dar una respuesta integral al ciudadano, evitando en lo posible remisiones y requerimientos adicionales. En estos casos, la respuesta deberá ser suscrita por la entidad que tenga mayor competencia sobre el asunto."

Se traslada a ustedes copia de dicha solicitud, con el fin de que, en su calidad de interventoría del proyecto, y en el marco de sus obligaciones contractuales de seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa, financiera, social y ambiental, adelanten las acciones pertinentes a que haya lugar y mantengan el debido conocimiento del requerimiento realizado por la ciudadanía.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier información adicional que consideren pertinente remitir en el marco de sus competencias.

Atentamente,

GARCIA BEJARANO DIEGO RAMIRO

Firmado digitalmente por GARCIA BEJARANO DIEGO RAMIRO

DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
Alcalde Local de Sumapaz
cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Anexos: Oficio Rad No. 20257010011792
Proyectó: Laura Marcela Rojas Marroquin / Profesional Infraestructura
José David Donoso Tovar / Apoyo a la Supervisión FDRS
Revisó: Diana Carolina Aristizábal/ Profesional Jurídico Infraestructura FDRS
Diana Lorena Hilarión/ Profesional Infraestructura FDRS
Gloria Esperanza Pirajón Tejedor / Promotora de la mejora FDRS
John Mauricio Linares/ Profesional de Despacho FDRS
Aprobó: Rafael Reinaldo Romero / Abogado de Despacho FDRS

4.D INFORMES SEMANALES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2025	20/04/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor-Supervisión actividades de Obra	Supervisor Interventoría - Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	111	25
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	7

SEMANA N. 58 **DEL** lunes, 4 de agosto de 2025 **AL** domingo, 10 de agosto de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO 1				Este frente de rabajo no reporta actividades
TRAMO SAN ANTONIO 2 EL TOLDO	21,00%	10,81%	-10,19%	K2+990 a K2+830 Manejo de agua lluvias en ambos costados. K0+040 Trasiego de material RCD **/** K0+720- K0+800-K1+200. Conservación de acciones de movilidad mediante de conformación de fresado en crudo RAP K0+040 Trasiego de material RCD
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	Se evidencia escarificado de pista de fresado estabilizado, sin embargo pasan las volquetas y vuelve a sellar el material. Posteriormente se evidencia un riego con agua para humedecer las capas y pegarlas. Sin embargo se deja en claro que esta actividad no está aprobada siempre y cuando no se realice riego con liga que asegure la fractura del material y pegue de las capas. Esta actividad queda en stanby hasta que se corrija. Actividad desarrollada en k3+430 a k3+215. **/** Se realiza corte de carpeta de fresado estabilizado y retiro de material proveniente de dicha excavación. Esta actividad se realiza en k3+590 a k3+680 costado izquierdo y de k3+630 a k3+680 costado derecho
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentías en tramo 5, de limpia y se retira RCD teniendo en cuenta que allí había una alcantarilla proyectada. K1+420 a k1+590 **/** * Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentias, limpieza de cunetas y barrido general. Esta actividad se reanuda desde tramo 2 k1+555 y hasta tramo 3 k0+230. * Se realiza retiro de señalizaciónes que van a ser reemplazadas. Esta actividad se realiza en el mismo abscisado y con el apoyo del retrocargador.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL	GLB	35.684.399.806,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNIÓN TUNALES
Personal disponible en tramo 05 1 oficial. 1 inspector . 1 Ayudante. 2 Auxiliares de tráfico. 1 Boal . 1 Tecnologa SST. 1 comisión topografíca(1 cadenero). 1 operario de Vibrocompactador. 1 Operador Retro cargador. 1 operario carro tanque
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 vibrocompactador 4 Ton . (varado) 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora. 1 minicargador. 1 carro tanque
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 04 de agosto de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Martes 05 de agosto de 2025. Clima: seco
.Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentías en tramo 5, de limpia y se retira RCD teniendo en cuenta que allí había una alcantarilla proyectada. K1+420 a k1+590
Miércoles 06 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentias, limpieza de cunetas y barrido general. Esta actividad se reanuda desde tramo 2 k1+555 y hasta tramo 3 k0+230.
* Se realiza retiro de señalizaciónes que van a ser reemplazadas. Esta actividad se realiza en el mismo abscisado y con el apoyo del retrocargador.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - * Se evidencia la instalación de nueva empresa de vigilancia. Ya se cuenta con vigilancia privada. * Las actividades se apoyan con el grupo de trabajo de San Antonio tramo 9.1(2 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topografíca). * Según información recibida y la inspección realizada, se puede evidenciar que no hay material para conformar carpeta de base granular y fresado estabilizado. * No se cuenta con emulsión para realizar riego de liga. Se evidencia que el vibrocompactador Case (4tn), esta varado. * Se requiere de un vibrocompactador mixto de 8 Ton para asegurar una buena compactación del material granular. * No se cuenta con material pétreo para realizar actividades de conformación de vía.**/** * Se evidencia que las auxiliares de tráfico no cuentan con los elementos para realizar control de trafico(paleta pare/siga). Se recomienda utilizarlos ya que están regulando el tránsito de vehículos sobre el tramo. Se evidencia que la motoniveladora y el vibrocompactador Case (4tn), estan varados. **/**

CAPITOLIO
Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 1 Oficial. 1 Boal. 2 Ayudantes. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión topografíca (sin topografo). 1 Operador vibrocompactador. 1 Operador retrocargador. 1 Conductor de volqueta. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Motoniveladora. 1 retrocargador. 1 Vibrocompactador 8tn. 1 Volqueta sencilla. 1 Vibrocompactador 4 Ton. 1 Minicargador
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 04 de agosto de 2025. Clima: seco
Se evidencia escarificado de pista de fresado estabilizado, sin embargo pasan las volquetas y vuelve a sellar el material. Posteriormente se evidencia un riego con agua para humedecer las capas y pegarlas. Sin embargo se deja en claro que esta actividad no está aprobada siempre y cuando no se realice riego con liga que asegure la fractura del material y pegue de las capas. Esta actividad queda en stanby hasta que se corrija. Actividad desarrollada en k3+430 a k3+215.
Martes 05 de agosto de 2025. Clima: seco
.Se realiza corte de carpeta de fresado estabilizado y retiro de material proveniente de dicha excavación. Esta actividad se realiza en k3+590 a k3+680 costado izquierdo y de k3+630 a k3+680 costado derecho
Miércoles 06 de agosto de 2025. Clima:
Npo se reportan actividades
Jueves 07 de agosto de 2025. Clima:
Día festivo
Viernes 08 de agosto de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Sábado 09 de agosto de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Domingo 10 de agosto de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO: - ** * * * Se evidencia la instalación de nueva empresa de vigilancia. Ya se cuenta con vigilancia privada. * Las actividades se apoyan con el grupo de trabajo de San Antonio tramo 9.1(2 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topografíca). * Según información recibida y la inspección realizada, se puede evidenciar que no hay material para conformar carpeta de base granular y fresado estabilizado. * No se cuenta con emulsión para realizar riego de liga. **/**

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 09 1 residente tecnico. 1 profesional SST. 1 profesional ambiental. 1 profesional social. 1 Inspector. 1 Oficiales. 1 Ayudante. 1 Boal. 2 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topografica. 1 operador minicargador. 1 Operadores de Motoniveladora. 1 Operadores de retrocargador. 1 operador de vibrocompactador. 1 Conductor camioneta. 1 conductor de volqueta sencilla. 3 conductor de volqueta doble
Maquinaria y equipos de obra 1 Motoniveladora. 1 Vibrocompactador. 1 Vibrocompactador 4 Ton.. 1 minicargador. . 1 Retrocargador Terex. .
Personal disponible de Interventoría: 1 residente técnico. 1 inspector de obra. 1 profesional ambiental. 1 profesional SST. 1 profesional social. 1 conductor

Actividades realizadas
Lunes 04 de agosto de 2025. Clima: seco
K2+990 a K2+830 Manejo de agua lluvias en ambos costados.
K0+040 Trasiego de material RCD
Martes 05 de agosto de 2025. Clima: seco
.K2+830 a K2+700 Manejo de agua lluvias en ambos costados.
K0+040 Trasiego de material RCD
Miércoles 06 de agosto de 2025. Clima: seco
K0+720- K0+800-K1+200. Conservación de acciones de movilidad mediante de conformación de fresado en crudo RAP
K0+040 Trasiego de material RCD
Jueves 07 de agosto de 2025. Clima:
día festivo
Viernes 08 de agosto de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Sábado 09 de agosto de 2025. Clima:
No se reportan actividades
Domingo 10 de agosto de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO :- Se requiere completar la unidad de ejecución pues solo se cuenta con un ayudante y el oficial presenta calamidad doméstica. **/** Las actividades y el avance de obra se ven afectadas debido a falta de suministro de materiales pétreos. **/** Se establece día libre para entidades del Distrito por cumpleaños de Bogotá, las unidades de ejecución laboran este día para compensar las horas del día viernes.

TRAMO SAN ANTONIO 1

Personal disponible en tramo: 1 inspector. 1 Oficial. 1 Ayudante. 1 Comisión Topografica. 1 Conductores camioneta. 1 Operador de Motoniveladora. 1 Operador de Minicargador . 1 conductor de volqueta
Maquinaria y equipos de obra: 1 Motoniveladora Komatsu . 1 Retrocargador Luding (Sin operador). 1 Vibrocompactador doble tándem Ammann (esta máquina nunca ha asistido actividades de obra en este frente). 1 Minicargador Bobcat. 1 volqueta sncilla (varada)
Personal disponible de Interventoría: 1 residente técnico. 1 inspector de obra. 1 profesionalambiental.1 profesional SST. 1 profesional social.1 conductor

Actividades realizadas
Lunes 04 de agosto de 2025. Clima:

Martes 05 de agosto de 2025. Clima:
.
Miércoles 06 de agosto de 2025. Clima:

Jueves 07 de agosto de 2025. Clima:

Viernes 08 de agosto de 2025. Clima:

Sábado 09 de agosto de 2025. Clima:

Domingo 10 de agosto de 2025. Clima:

Este frente de trabajo no reporta actividades

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 1 **/ ** La unidad ejecutora aún cuando dispone de maquinaria para la recolección de piedra en vía, realiza acopios pequeños a lo largo de la vía sin que los mismos lleguen a ser representativos, el personal de maquinaria no tiene actividad programada por lo cual dejan la maquinaria en el campamento encendida y sin actividad aparente. **/** El personal asignado a tramo no tiene actividad designada, sumado a la suspensión de actividades de maquinaria en horas de la mañana. Se solicita al encargado de obra disponer del personal en un frente de obra que se requiera la prestación del servicio, dejar claras las instrucciones y actividades que se deben desarrollar en tramo.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1.Actividades desarrolladas por el componente social.
Tramo de Unión Tunales.
⁻Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)
⁻Programa de información y participación comunitaria.
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Tunal Bajo
Y la carpa punto de atención móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento.

•Volantes informativos.

Durante la semana no se realiza entrega de volantes.

Tramo de San Antonio El Toldo.
⁻Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)
⁻Programa de información y participación comunitaria.
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los pasacalles, establecidos contractual.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
carpa móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento.

•Volantes informativos.

Durante la semana no se realiza entrega de volantes.
Tramo de Capitolio.
⁻Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa).
⁻Programa de información y participación comunitaria.

•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual, pero uno de ello presento deterioro, se está a la espera que el Consorcio Gaviones 95, realice la reposición.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
carpa móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento.

•Volantes informativos.

Durante la semana la profesional no realiza entrega de volantes informativos.

Tramo de San Antonio I
⁻Programa de información y participación comunitaria
•Actas de vecindad
No se realiza actividad durante la semana del presente informe.

•Volantes informativos.

Durante la semana la profesional no realiza entrega de volantes informativos.

2.RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV.
La interventoría realiza recorrido con el fin de realizar seguimiento a cada una de las actividades establecidas en el plan de Gestión Social.
3. COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERMV
La interventoría realiza el comité de seguimiento integral 55, con el fin de realizar seguimiento al desarrollo del contrato. el 8 de agosto del 2025, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social, con el fin de realizar seguimiento al proyecto.
5.INFORMES MENSUALES.
Se encuentra pendiente entrega de informe 11 con observaciones subsanadas. en comité de seguimiento integral la profesional social indica que mediate radicado # 20251120077662, la interventoría verifica la información suministrada no se evidencia información.
Se encuentra pendiente el informe mensual social 12, la profesional social se compromete a realizar entrega antes del comité integral.
La profesional social hace entrega del informe mensual social N° 13 del mes de junio del año en curso, dando cumplimiento a lo establecido contractualmente, presenta observaciones.
La profesional social hace entrega del informe mensual social N° 14 del mes de julio del año en curso, dando cumplimiento a lo establecido contractualmente, presenta observaciones.

6.INFORMES SEMANALES

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Personal UMV / 05-08-2025
1 Inspector. 1 Oficial. 1 Boal. 2 ayudantes. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión de topografía. 1 Operario Vibrocompactador. 1 Operador retrocargador.
1 Conductor de volqueta sencilla. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador. 1 vigilante

Maquinaria y equipos de obra: 1 Motoniveladora Rinho. 1 retrocargador Jhon Deere. 1 Vibrocompactador Dynapac 8tn. 1 vibrocompactador Hamm 4tn
1 Volqueta sencilla. 2 minicargador
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames),
•Trabajadores de Sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Unidades sanitarias en orden y aseo.
•Se observa maquinaria con sticker del contrato.
•Se evidencia falta de preoperacional en vibro compactador marca HAMM el día 06/08/2025
•Se evidencia falta de preoperacional en vibro compactador marca HAMM y en motoniveladora marca Rhino el día 06/08/2025
•Se observa etiquetado de sustancias químicas.
•PMT en orden
Observaciones SST Tramo Tunales tramo 5:

Personal UMV / 05-08-2025
1 oficial. 1 inspector. 1 Ayudantes. 2 Auxiliares de tráfico. 1 Boal
1 Tecnóloga SST. 1 comisión topográfico. 1 operario de Vibrocompactador
1 Operador Retro cargador. 1 operario carro tanque. 1 operario minicargador
1 vigilante
Maquinaria y equipos de obra: 1 vibrocompactador Case 4tn(varado). 1 Retro cargador. 1 minicargador. 1 motoniveladora(varada). 1 carro tanque
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Se observa maquinaria con sticker del contrato.
•PMT en orden
•Señalización SGA en acopio combustible en orden
•Se observan 2 unidades sanitarias en orden.
•Se observa la instalación de gel antibacterial en unidades sanitarias
•Se evidencia que las auxiliares de tráfico no cuentan con los elementos para realizar control de tráfico (paleta pare/siga). Se recomienda utilizarlos ya que están regulando el tránsito de vehículos sobre el tramo.

Observaciones SST Tramo San Antonio 9:
Personal UMV / 04-08-2025
1 residente técnico. 1 profesional SST. 1 profesional ambiental. 1 profesional social. 1 Inspector. 1 Ayudantes. Boal. 2 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topográfica
1 operador minicargador. 1 operador de motoniveladora. 1 Operadores de retrocargador. 1 operadores de vibrocompactador. 1 Conductores camioneta.
1 conductor de volqueta sencilla. 1 Conductor de Volqueta Doble. 1 Vigilante

Maquinaria y equipos de obra
1 Motoniveladora. 1 Vibrocompactador CAT. 1 Vibrocompactador Ammann
1 minicargador. 1 Retrocargador Terex. 1 Volqueta Sencilla
Observaciones SST:
•Personal de Sintrauniobras con EPP y overol en orden
•PMT en orden
•Se observa equipos de emergencia (camilla, Botiquín de primeros auxilios y kit antiderrames) se observa extintor despresurizado.
•Operadores de maquinaria contrato 936 de 2024, Consorcio HyC, con preoperacional
•Se observan acopios de material granular y pétreos con señalización y cubiertos
•Señalización de acopios de sustancias químicas y de seguridad, pero falta orden en este acopio
•Se observan 4 unidades sanitarias en terreno, en orden y aseo
•No se observa de gel antibacterial en una de las unidades sanitarias.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por la entidad ejecutora.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión del informe semanal enviado por la entidad ejecutora.
4.Se realizo solicitud de entrega de los informes de mayo y junio de 2025 con ajustes.
5.Revisión del informe No 14 correspondiente al periodo de julio de 2025 del cual salen observaciones
6.Participación del comité de seguimiento No 55; donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente.

Frente Capitolio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
-Evacuación de RCD a acopio temporal ubicado en el K 3+450
-K 3+240 se solicito limpieza de alcantarilla que al momento de realizar la instalación de fresado no fue protegida y fue colmatada con este material, en el periodo se procedió a colocar un entibado para evitar que se continue cayendo el material y se coloco la polisombra respectiva.
-K 0+835 se evidencia acopio de pétreos en el cual se presenta caída de materiales hacia el cauce y cuerpo de agua, se mantiene contención en polisombra en la parte posterior y posteriormente se realizará la limpieza de la ronda.
-K 3+220 se solicitó retiro de RCD conformado en el área donde se encuentra afectando el cauce del cuerpo de agua, se requiere limpieza, actividad en implementación.
-K 3+450 se evidencia implementación de acopio de RCD donde se ubicó polisombra como contención en la parte posterior del mismo para evitar caída de materiales
-Se verifico que donde realizaron la acción de movilidad k1+030 se requiere que el área de mantenga correctamente señalizada.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Mantener implementado lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
-Se verifico que la UMV mantiene el punto de acopio de RESPEL y combustibles señalizado y etiquetaron las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA.
-Se mantiene dos unidades sanitarias portátiles, del proveedor Bamocol, estas no poseen lavamanos, en el periodo se realizo mantenimiento respectivo.
-Se evidencia en el km 0+485 arrastre de materiales pétreos al predio privado, la limpieza inicio desde el pasado 06 de junio de 2025 en ejecución.
-Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos, esta actividad se inició con el apoyo de los BOAL. Esta es una actividad continua.
-Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
-Se mantiene punto ecológico activo y señalizado.
-Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
-Se mantiene recomendación al contratista de maquinaria que cuando se proceda a realizar reparaciones puntuales de equipos se tomen las medidas de manejo ambiental respectivas, como aislar el suelo con plástico para evitar posibles contaminaciones del suelo y agua por escorrentía.
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se cuenta con un campamento móvil dotado de elementos necesarios K 3+200
Frente Tunales
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo
-Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, el cual se mantiene ubicado para protegerlo de la acción de la lluvia con el fin de evitar proliferación de vectores y malos olores por descomposición de los residuos.
-Las canecas de almacenamiento de combustible se mantienen rotuladas de acuerdo con el sistema globalmente armonizado se sugiere se realice seguimiento a la permanencia de esta señalización y se mantenga el área ordenada.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Mantener implementado lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). Acopio ubicado en la unión donde se encuentran RCD y pétreos, se mantieneseñalizado y cubierto.
-Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
-Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
-Se cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
-Se evidencia realización de jornada de orden y aseo en el campamento y frente de obra.
-Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
-Se cuenta con dos unidades sanitarias en sitio del proveedor Bamocol, las cuales no cuentan con lavamanos, en el periodo se realizó mantenimiento.
-El acopio de Pétreos ubicado en el tramo 3 al cual se colocó contención se mantiene con medidas de manejo ambiental, sin embargo, se mantiene la solicitud reiterativa en comités del retiro de los materiales pétreos que se cayeron en el costado posterior actividad que aún no se ha realizado.
-Se evidencia que se implementó materiales de excavación RCD en el tramo 5 al costado de via. Se sugirió evacuar en el menor tiempo posible a sitio de disposición final, y mantener delimitado y cubierto.
-Se cuenta con un campamento móvil dotado de elementos necesarios. Tramo 5

Frente San Antonio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
-K 1+470 se solicita limpieza de alcantarilla que se encuentra colmatada por RCD acopiados al lado de via, se evidencia que el tubo se encuentra tapado, el área del encole y descole fue limpiado. Actividad que continua en ejecución,
-K 3+100 se mantiene solicitud de evacuación del RCD conformado.
-En el Km 3+100 se evidencian arboles afectados por disposición de material pétreo, requiere limpieza, adecuación y evaluar la instalación de contención de materiales. Se solicita dar prioridad a la evacuación de los RCD de este predio y conformar de manera correcta el área. En ejecución, se inicia con esta actividad el día 25 de junio.
-Se evidencia retiro de RCD acopiados al costado de la via en el k 3+120. Aún queda un remanente
-Implementación de acopio principal de pétreos y RCD en el K0+040, se mantiene con medidas de manejo ambiental cubrimiento y señalización.
-A lo largo del tramo se evidencia diferentes puntos de acopio de RCD que requieren adecuación y retiro hacia sitio autorizado, se sugiere no conformar estos materiales en sitio.
-La mayoría de acopios están implementados a costado de via, lo cual según ficha de manejo no es permitido ya que obstaculiza el tránsito vehicular, obstruye las cunetas y por ende el drenaje natural de aguas superficiales generando empozamientos, saturación del material, escorrentía por la via lo que conlleva a daños mayores en las vías en ejecución. Es importante que estos acopios permanezcan cubiertos para evitar saturación de los materiales y garantizar que sean recibidos en el sitio de disposición final y su transporte se realice cumpliendo las medidas de manejo ambiental.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). acopio km 2+350, km 1+655 y km 0+730.
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera. Se evidencia que de manera semanal se realizan jornadas de señalización y cubrimiento de acopios en general.
-Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD). Al respecto en el periodo se evidenció retiro de varios acopios y el material fue llevado a sitio de disposición final autorizado.
-En este frente se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo Vibrocompactador ubicado en el k0+040.
-El punto de acopio de RESPEL y combustibles se mantiene señalizado y etiquetadas las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA. El punto de acopio de sustancias químicas se mantiene adecuado y cubierto.
-Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, y protegido de la acción de la lluvia.
-Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT (señales 200 y 100 mts inicio de obra, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
-Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos. En implementación.
-En comité de obra No 55 se reiteró a la UMV evacuar hacia sitio de disposición final autorizado los materiales RCD almacenados en distintos acopios, lo anterior debido a que superan en tiempo máximo permitido para permanencia en obra.
-Se cuenta con cuatro unidades sanitarias portátiles del proveedor Bamocol, las cuales son poseen lavamanos, con mantenimiento en el periodo.
-Se sugiere realizar un adecuado manejo de aguas de escorrentía para evitar afectaciones en la via.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

Componente Técnico



Descripción Foto 1.

Frente San Antonio. K0+040 . Trasiego de material RCD



Descripción Foto 2.

Frente San Antonio. K0+040 . Trasiego de material RCD







Descripción Foto 3.

Frente San Antonio. K2+990 a K2+830 Manejo de agua lluvias en ambos costados.




Descripción Foto 4.

Frente San AntonioK2+990 a K2+830. Manejo de agua lluvias en ambos costados.



Descripción Foto 5

Frente Capitolio. Se evidencia escarificado de pista de fresado estabilizado, sin embargo pasan las volquetas y vuelve a sellar el material. Posteriormente se evidencia un riego con agua para humedecer las capas y pegarlas. Sin embargo se deja en claro que está actividad no está aprobada siempre y cuando no se realice riego con liga que asegure la fractura del material y pegue de las capas. Esta actividad queda en stanby hasta que se corrija. Actividad desarrollada en k3+430 a k3+215.

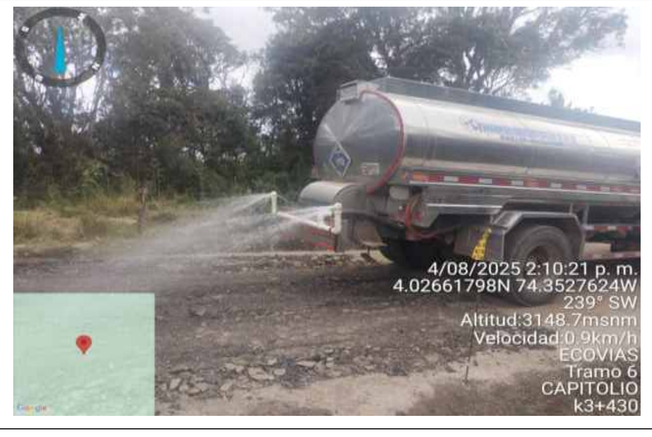

Descripción Foto 6

Frente Capitolio. Se evidencia escarificado de pista de fresado estabilizado, sin embargo pasan las volquetas y vuelve a sellar el material. Posteriormente se evidencia un riego con agua para humedecer las capas y pegarlas. Sin embargo se deja en claro que está actividad no está aprobada siempre y cuando no se realice riego con liga que asegure la fractura del material y pegue de las capas. Esta actividad queda en stanby hasta que se corrija. Actividad desarrollada en k3+430 a k3+215.

Componente Social



Descripción Foto 7

Recorrido conjunto



Descripción Foto 8

Comité de seguimiento integral # 55

Componente SST



Descripción Foto 9

Frente San Antonio. Se observa etiquetado en sustancuias quimicas



Descripción Foto 10

Frente Tunales Bajo. Inspección de maquinaria

Componente Ambiental



Descripción Foto 11

Frente Tunales. Acopio de RCD con medidas de manejo ambiental



Descripción Foto 12

Frente San Antonio. Vibrocompactador con fuga de combustible

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2025	20/04/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor-Supervisión actividades de Obra	Supervisor Interventoría - Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	111	25
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	7

SEMANA N. 59 **DEL** lunes, 11 de agosto de 2025 **AL** domingo, 17 de agosto de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			**EJECUTADO**	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO 1				NO SE RPORTAN ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE DE OBRA
TRAMO SAN ANTONIO 2 EL TOLDO	21,00%	10,81%	-10,19%	K2+940 a K2+920 Perfilacion de subrasante K0+040 Trasiego de material RCD **/** K2+920 a K2+910 Perfilacion de subrasante K2+940 a K2+910 Extendida de fresado en crudo RAP para renovelacion de subrasante. K0+040 Trasiego de material RCD **/** K2+910 a K2+870 Perfilacion de subrasante K2+910 a K2+870 Extendida de fresado en crudo RAP para renivelacion de subrasante.
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	1. Se realiza la limpieza de cunetas para construcción de estas, se desarrollo en abscisas del k1+710 a k1+770 costado izquierdo a menores. 2. Se realiza limpieza y extracción de material proveniente de la acción de escorrentías de las cunetas a la alcantarilla del k1+760. 3. Se realiza la apertura de huecos, puesta y entierro de postes y posterior templado de cuerdas para cerca en k3+590 a k3+620. Costado izquierdo hacia mayores. 4. Llegan 2 viajes de rajon. **/** 1. Se realiza la limpieza de cunetas para construcción de estas, se desarrollo en abscisas del k1+765 a k1+680 costado izquierdo a menores. 2. Se realiza limpieza y extracción de material proveniente de la acción de escorrentías de las cunetas a la alcantarilla del k1+760. Se recoge material y se dispone en acopio de RCD.
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentias, limpieza de cunetas y barrido general. Esta actividad se reanuda desde tramo 4 k0+000 y hasta k0+230. **/** Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentias, limpieza de cunetas y barrido general. Esta actividad se reanuda desde tramo 4 k0+230 y hasta k0+710. **/** Se realiza demolición de roca existente con acción mecánica del martillo demoledor del minicargador. K0+900. **/** * Se realiza demolición de roca existente con acción mecánica del martillo demoledor del minicargador. K0+900. * Se realiza riego de liga(riego de adherencia) con emulsión asfáltica, con el fin de terminar de salar la pista granular. K0+635 a k0+750. * Se realiza extendida de fresado estabilizado aprox 0.05. k0+635 a k0+750. **/**

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL	GLB	35.684.399.806,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNIÓN TUNALES
Personal disponible en tramo 05 1 oficial. 1 inspector . 1 Ayudante. 2 Auxiliares de tráfico. 1 Boal . 1 Tecnologa SST. 1 comisión topografíca(1 cadenero). 1 operario de Vibrocompactador. 1 Operador Retro cargador. 1 operario carro tanque. 1 operario minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 vibrocompactador 4 Ton . (varado) 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora. 1 minicargador. 1 carro tanque
Personal de interventoria disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 11 de agosto de 2025. Clima: seco
limpieza de cunetas y barrido general. Esta actividad se reanuda desde tramo 4 k0+000 y hasta k0+230.
Martes 12 de agosto de 2025. Clima: seco
Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentias, limpieza de cunetas y barrido general. Esta actividad se reanuda desde tramo 4 k0+230 y hasta k0+710.
Miércoles 13 de agosto de 2025. Clima: lluvias moderadas 11:00-01:00
Se realiza demolición de roca existente con acción mecánica del martillo demoledor del minicargador. K0+900.
Jueves 14 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza demolición de roca existente con acción mecánica del martillo demoledor del minicargador. K0+900.
* Se realiza hidratación de pista de base granular para poder realizar compactación y sello del material. Sin embargo se evidencia que el vibrocompactador de 4 TN es ineficiente.
* Se evidencia barrido general de pista para eliminar materia vegetal y partículas granulares gruesa. K0+450 a k0+750.
* Se evidencia escarificación de fresado estabilizado para la transición y unión de tramos de fresado. K0+420 a k0+450.
* De realiza riego de liga(riego de adherencia), sobre la pista de base granular existente. Se maneja un tiempo de ruptura de 1 hora. K0+450 a k0+750.
* Se realiza extendida de fresado estabilizado aprox a capa de 0.05. Se realiza compactación mecánica con equipo trasladado desde tramo San Antonio (8tn).
Viernes 15 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza demolición de roca existente con acción mecánica del martillo demoledor del minicargador. K0+900.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - * * Se evidencia que el vibrocompactador Case (4tn), esta varado. * Se requiere de un vibrocompactador mixto de 8 Ton para asegurar una buena compactación del material granular. * No se cuenta con material pétreo para realizar actividades de conformación de vía. **/** * Se evidencia la llegada de un vibrocompactador mixto de 8 Ton, esto con el fin de asegurar una buena compactación del material granular. * No se cuenta con material pétreo para realizar actividades de conformación de vía.

CAPITOLIO
Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 1 Oficial. 1 Boal. 2 Ayudantes. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión topografíca. 1 Operador vibrocompactador. 1 Operador retrocargador. 1 Conductor de volqueta. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Motoniveladora. 1 retrocargador. 1 Vibrocompactador 8tn. 1 Volqueta sencilla. 1 Vibrocompactador 4 Ton. 1 Minicargador
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 11 de agosto de 2025. Clima: seco
1. Se realiza la limpieza de cunetas para construcción de estas, se desarrolla en abscisas del k1+710 a k1+770 costado izquierdo a menores.
2. Se realiza limpieza y extracción de material proveniente de la acción de escorrentías de las cunetas a la alcantarilla del k1+760.
3. Se realiza la apertura de huecos, puesta y entierro de postes y posterior templado de cuerdas para cerca en k3+590 a k3+620. Costado izquierdo hacia mayores.
4. Llegan 2 viajes de rajon.
Martes 12 de agosto de 2025. Clima: seco
1. Se realiza la limpieza de cunetas para construcción de estas, se desarrollo en abscisas del k1+765 a k1+680 costado izquierdo a menores.
2. Se realiza limpieza y extracción de material proveniente de la acción de escorrentías de las cunetas a la alcantarilla del k1+760. Se recoge material y se dispone en acopio de RCD.
3. Se realiza perfilacion de subrasante y traslado de material para intervención de fallo en k4+060 a k4+100
Miércoles 13 de agosto de 2025. Clima: lluvias moderadas 11:00-01:00
1. Se realiza la limpieza de cunetas para construcción de estas, se desarrollo en abscisas del k1+510 a k1+380 costado izquierdo a menores.
2. Se realiza retiro de fallo existente y traslado de material para la intervencion en k4+080 a k4+085.(1.5x5x.60). Se realiza retiro de material remanente saturado.
3. Se agrega rap como acción de protección de la subrasante. K0+060-k0+100.
Jueves 14 de agosto de 2025. Clima: seco
1. Se realiza riego de liga entre capas de fresado estabilizado con tiempo de ruptura de 2 horas en el trayecto del k3+450 a k0+215.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO: - ** * Las actividades de apoyan con el grupo de trabajo de San Antonio tramo 9.1(1 inspector, 2 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico, 1 comisión topografíca). * Según información recibida y la inspección realizada, se puede evidenciar que no hay material para conformar carpeta de base granular y fresado estabilizado. * No se cuenta con emulsión para realizar riego de liga. **/** * Las actividades de apoyan con el grupo de trabajo de San Antonio tramo 9.1(1 inspector, 2 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico). * Según información recibida y la inspección realizada, se puede evidenciar que no hay material para conformar carpeta de base granular.

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 09 1 1 residente técnico. 1 profesional SST. 1 profesional ambiental. 1 profesional social. 1 Inspector. 2 Ayudantes (ingresa en apoyo ayudante). 1 BOAL. 2 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topográfica. 1 operador minicargador. 1 operador de motoniveladora. 1 Operadores de retrocargador. 1 operadores de vibrocompactador. 1 Conductores camioneta. 1 conductor de volqueta sencilla. 1 Conductor de Volqueta Doble.
Maquinaria y equipos de obra 2 Motoniveladora. 2 Vibrocompactador CAT-BOMAG. 1 Vibrocompactador Ammann. 2 minicargador. 3 Retrocargador Terex-Luding-Jhon Deere. 1 Volqueta Sencilla .
Personal disponible de Interventoría: 1 residente técnico. 1 inspector de obra. 1 profesional ambiental. 1 profesional SST. 1 profesional social. 1 conductor

Actividades realizadas
Lunes 11 de agosto de 2025. Clima: seco
K2+940 a K2+920 Perfilacion de subrasante
K0+040 Trasiego de material RCD
Martes 12 de agosto de 2025. Clima: seco
K2+920 a K2+910 Perfilacion de subrasante
K2+940 a K2+910 Extendida de fresado en crudo RAP para renovelacion de subrasante.
K0+040 Trasiego de material RCD
Miércoles 13 de agosto de 2025. Clima: seco
K2+910 a K2+870 Perfilacion de subrasante
K2+910 a K2+870 Extendida de fresado en crudo RAP para renivelacion de subrasante.
K0+040 Trasiego de material RCD
Jueves 14 de agosto de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:00 a 10:00 am
K2+870 a K2+840 Perfilacion de subrasante
K2+870 a K2+840 Extendida de fresado en crudo RAP para renivelacion de subrasante.
K0+040 Trasiego de material RCD
Viernes 15 de agosto de 2025. Clima: seco
K2+840 a K2+820 Perfilacion de subrasante

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO :-Se asigna en apoyo kit de maquinaria del frente San Antonio 1 para el frente Toldo. El corte de subrasante supera los 0,30 m lo cual afecta el avance de la actividad y retira la piedra que estabiliza el área generando puntos de baja densidad.**/** En reiteradas ocasiones se evidencia reparación e intervención mecánica a vibrocompactador Bomag el cual el personal de maquinaria asegura estar operativo, continuamente se observa este tipo de reparaciones en la maquinaria asignada al frente, sin embargo el personal de contrato 936 encubre las novedades asociadas a la maquinaria. Se asigna en apoyo kit de maquinaria del frente San Antonio 1 para el frente Toldo.**/** Se renivela perfilacion de con RAP a altura de diseño de subrasante, aún faltan las capas de base y fresado por instalar. Se requiere que el

TRAMO SAN ANTONIO 1

Personal disponible en tramo: 1 inspector. 1 Oficial. 1 Ayudante. 1 Comisión Topografica. 1 Conductores camioneta. 1 Operador de Motoniveladora. 1 Operador de Minicargador . 1 conductor de volqueta
Maquinaria y equipos de obra: 1 Motoniveladora Komatsu . 1 Retrocargador Luding (Sin operador). 1 Vibrocompactador doble tándem Ammann (esta máquina nunca ha asistido actividades de obra en este frente). 1 Minicargador Bobcat. 1 volqueta sncilla (varada)
Personal disponible de Interventoría: 1 residente técnico. 1 inspector de obra. 1 profesionalambiental.1 profesional SST. 1 profesional social.1 conductor

Actividades realizadas
Lunes 11 de agosto de 2025. Clima:

Martes 12 de agosto de 2025. Clima:

.Miércoles 13 de agosto de 2025. Clima:

Jueves 14 de agosto de 2025. Clima:

Viernes 15 de agosto de 2025. Clima:

Sábado 16 de agosto de 2025. Clima:

Domingo 17 de agosto de 2025. Clima:
Este frente de trabajo no reporta actividades

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 1 **/ **

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1.Actividades desarrolladas por el componente social.

Tramo de Unión Tunales.
¯Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa).
¯Programa de información y participación comunitaria.

•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Tunal Bajo
Y la carpa punto de atención móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento, se realizó actualización.
•Volantes informativos.
Durante la semana la profesional realizó la entrega de los volantes informativos de cierres viales por la instalación de fresado estabilizado y base granular, los cuales están programados de 7 a.m. a 12 medio día y de 1 a 6 p.m. paso intermitente de 40 minutos.
Tramo de San Antonio El Toldo.
¯Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)
¯Programa de información y participación comunitaria.
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los pasacalles, establecidos contractual.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
carpa móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento, se realizó actualización.
•Volantes informativos.
Durante la semana la profesional realizó la entrega de los volantes informativos de cierres viales por la instalación de fresado estabilizado y base granular, los cuales están programados de 7 a.m. a 12 medio día y de 1 a 6 p.m. paso intermitente de 40 minutos.
Tramo de Capitolio.
¯Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa).
¯Programa de información y participación comunitaria.
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual, pero uno de ello presento deterioro, se está a la espera que el Consorcio Gaviones 95, realice la reposición.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
carpa móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento. Se realizó actualización.
•Volantes informativos.
Durante la semana la profesional realizó la entrega de los volantes informativos de cierres viales por la instalación de fresado estabilizado y base granular, los cuales están programados de 7 a.m. a 12 medio día y de 1 a 6 p.m. paso intermitente de 40 minutos.
Tramo de San Antonio I
¯Programa de información y participación comunitaria.
•Actas de vecindad
No se realiza actividad durante la semana del presente informe.
•Volantes informativos.
No se realizan actividades.
2.RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV.
La interventoría realiza recorrido con el fin de realizar seguimiento a cada una de las actividades establecidas en el plan de Gestión Social.

3. COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERMV
La interventoría realiza el comité de seguimiento integral 56, con el fin de realizar seguimiento al desarrollo del contrato. el 15 de agosto del 2025, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social, con el fin de realizar seguimiento al proyecto.
5.INFORMES MENSUALES.
Se encuentra pendiente entrega de informe 11 con observaciones subsanadas. en comité de seguimiento integral la profesional social indica que mediate radicado # 20251120077662, la interventoría verifica la información suministrada no se evidencia información.
Se encuentra pendiente el informe mensual social 12, la profesional social mediate radicado # 20251920081301, la interventoría verifica la información suministrada no se evidencia información
La profesional social hace entrega del informe mensual social N° 13 del mes de junio del año en curso, dando cumplimiento a lo establecido contractualmente, presenta observaciones.
La profesional social hace entrega del informe mensual social N° 14 del mes de julio del año en curso, dando cumplimiento a lo establecido contractualmente, presenta observaciones.

6.INFORMES SEMANALES

El consorcio se encuentra al día en el reporte de informes semanales.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Observaciones Tramo Capitolio:
Personal UMV / 13-08-2025
1 Inspector.1 Oficial. 1 Boal. 2 ayudante. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión de topografía. 1 Operario Vibrocompactador. 1 Operador retrocargador
1 Conductor de volqueta sencilla. 1 operador Motoniveladora
1 operador Minicargador. 1 vigilante
Maquinaria y equipos de obra
1 Motoniveladora Rinho. 1 retrocargador Jhon Deere. 1 Vibrocompactador Dynapac 8tn. 1 vibrocompactador Hamm 4tn. 1 Volqueta sencilla

2 minicargador
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames),
•Trabajadores de Sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Unidades sanitarias en orden y aseo.
•Se observa maquinaria con sticker del contrato y preoperacionales en orden.
•Se evidencia falta de preoperacional en camioneta placa LZM113, el día 12/08/2025
•Se observa etiquetado de sustancias químicas.
•PMT en orden
•Retroexcavadora sin guardas de seguridad en el motor, se solicitó la instalación de las mismas en comité

Observaciones SST Tramo Tunales tramo 5:
Personal UMV / 15-08-2025
1 oficial. 1 inspector. 1 Ayudantes. 2 Auxiliares de tráfico. 1 Boal
1 Tecnóloga SST. 1 comisión topográfico. 1 operario de Vibrocompactador
1 Operador Retro cargador. 1 operario carro tanque. 1 operario minicargador
1 vigilante
Maquinaria y equipos de obra
1 vibrocompactador Dynapac 4tn(varado). 1 Retro cargador. 1 minicargador
1 motoniveladora. 1 carro tanque
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Se observa maquinaria con sticker del contrato.
•Minicargador Bobcat, sin preoperacional 12-08-2025
•PMT en orden
•Señalización SGA en acopio combustible en orden
•Se observan 2 unidades sanitarias en orden.
•Se observa la instalación de gel antibacterial en unidades sanitarias
•Se evidencia retroexcavadora con escape de abundante humo negro, se solicitó la revisión de esta máquina.

Observaciones SST Tramo San Antonio 9:
Personal UMV / 15-08-2025
1 residente técnico. 1 profesional SST. 1 profesional ambiental . 1 profesional social. 1 Inspector. 1 Oficial. 2 Ayudantes (ingresa en apoyo ayudante)
1 BOAL. 2 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topográfica. 1 operador minicargador
1 operador de motoniveladora. 1 Operadores de retrocargador. 1 operadores de vibrocompactador. 1 Conductores camioneta. 1 conductor de volqueta sencilla.
1 Conductor de Volqueta Doble. 1 Vigilante

Maquinaria y equipos de obra
2 Motoniveladora. 2 Vibrocompactador CAT-BOMAG. 1 Vibrocompactador. Ammann. 2 minicargador. 3 Retrocargador Terex-Luding-Jhon Deere
1 Volqueta Sencilla
Maquinaria y equipos del proyecto
2 Volqueta doble
Observaciones SST:
•Personal de Sintrauniobras con EPP y overol en orden
•PMT en orden
•Se observa equipos de emergencia (camilla, Botiquín de primeros auxilios y kit antiderrames).
•Operadores de maquinaria contrato 936 de 2024, Consorcio HyC, con preoperacional a excepción del vibrocompactador Bobmag 12-08-2025
•Se observan acopios de material granular y pétreos con señalización y cubiertos
•Señalización de acopios de sustancias químicas y de seguridad, pero falta orden en este acopio
•Se observan 4 unidades sanitarias en terreno, en orden y aseo, se solicitó el traskado de dos unidades que están sin uso en tramo 1

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por la entidad ejecutora.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión del informe semanal enviado por la entidad ejecutora.
4.Se realizo solicitud de entrega de los informes de mayo y junio de 2025 con ajustes.
5.Revisión del informe No 14 correspondiente al periodo de julio de 2025 del cual salen observaciones que son enviadas a la UMV por oficio
6.Participación del comité de seguimiento No 56; donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente.

Frente Capitolio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
-Evacuación de RCD a acopio temporal ubicado en el K 3+450
-K 3+240 se solicito limpieza de alcantarilla que al momento de realizar la instalación de fresado no fue protegida y fue colmatada con este material, en el periodo se mantiene con un entibado para evitar que se continue cayendo el material y se coloco la polisombra respectiva.
-K 0+835 se evidencia acopio de pétreos en el cual se presenta caída de materiales hacia el cauce y cuerpo de agua, se mantiene contención en polisombra en la parte posterior y posteriormente se realizará la limpieza de la ronda.
-K 3+220 se solicitó retiro de RCD conformado en el área donde se encuentra afectando el cauce del cuerpo de agua, se requiere limpieza, actividad en implementación.
-K 3+450 se evidencia implementación de acopio de RCD donde se ubicó polisombra como contención en la parte posterior del mismo para evitar caída de materiales
-Se verifico que donde realizaron la acción de movilidad k1+030 se requiere que el área de mantenga correctamente señalizada.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Mantener implementado lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere
su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
-Se verifico que la UMV mantiene el punto de acopio de RESPEL y combustibles señalizado y etiquetaron las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA.
-Se mantiene dos unidades sanitarias portátiles, del proveedor Bamocol, estas no poseen lavamanos, en el periodo se realizó mantenimiento respectivo.
-Se evidencia en el km 0+485 arrastre de materiales pétreos al predio privado, la limpieza inicio desde el pasado 06 de junio de 2025 en ejecución.
-Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos, esta actividad se inició con el apoyo de los BOAL. Esta es una actividad continua.
-Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
-Se mantiene punto ecológico activo y señalizado.
-Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
-Se mantiene recomendación al contratista de maquinaria que cuando se proceda a realizar reparaciones puntuales de equipos se tomen las medidas de manejo ambiental respectivas, como aislar el suelo con plástico para evitar posibles contaminaciones del suelo y agua por escorrentía.
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se cuenta con un campamento móvil dotado de elementos necesarios K 3+200

Frente Tunales
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo
-Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, el cual se mantiene ubicado para protegerlo de la acción de la lluvia con el fin de evitar proliferación de vectores y malos olores por descomposición de los residuos.
-Las canecas de almacenamiento de combustible se mantienen rotuladas de acuerdo con el sistema globalmente armonizado se sugiere se realice seguimiento a la permanencia de esta señalización y se mantenga el área ordenada.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Mantener implementado lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). Acopio ubicado en la unión donde se encuentran RCD y pétreos, se mantiene señalizado y cubierto.
-Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
-Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
-Se cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
-Se evidencia realización de jornada de orden y aseo en el campamento y frente de obra.
-Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
-Se cuenta con dos unidades sanitarias en sitio del proveedor Bamocol, las cuales no cuentan con lavamanos, en el periodo se realizó mantenimiento.

El acopio de Pétreos ubicado en el tramo 3 al cual se colocó contención se mantiene con medidas de manejo ambiental, sin embargo, se mantiene la solicitud reiterativa en comités del retiro de los materiales pétreos que se cayeron en el costado posterior actividad que aún no se ha realizado.
Se evidencia que se implementó materiales de excavación RCD en el tramo 5 al costado de via. Se sugirió evacuar en el menor tiempo posible a sitio de disposición final, y mantener delimitado y cubierto.
Se recomendar evacuar RCD acopiado en la Union-Se cuenta con un campamento móvil dotado de elementos necesarios. Tramo 5


Frente San Antonio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:AL126
-K 1+470 se solicita limpieza de alcantarilla que se encuentra colmatada por RCD acopiados al lado de via, se evidencia que el tubo se encuentra tapado, el área del encole y descole fue limpiado. Actividad que continua en ejecución,
-K 3+100 se mantiene solicitud de evacuación del RCD conformado.
-En el Km 3+100 se evidencian arboles afectados por disposición de material pétreo, requiere limpieza, adecuación y evaluar la instalación de contención de materiales. Se solicita dar prioridad a la evacuación de los RCD de este predio y conformar de manera correcta el área. En ejecución, se inicia con esta actividad el día 25 de junio.
-Se evidencia retiro de RCD acopiados al costado de la via en el k 3+120. Aún queda un remanente
-Acopio principal de pétreos y RCD en el K0+040, se mantiene con medidas de manejo ambiental cubrimiento y señalización.
-A lo largo del tramo se evidencia diferentes puntos de acopio de RCD que requieren adecuación y retiro hacia sitio autorizado, se sugiere no conformar estos materiales en sitio.
-La mayoría de acopios están implementados a costado de via, lo cual según ficha de manejo no es permitido ya que obstaculiza el tránsito vehicular, obstruye las cunetas y por ende el drenaje natural de aguas superficiales generando empozamientos, saturación del material, escorrentía por la via lo que conlleva a daños mayores en las vías en ejecución. Es importante que estos acopios permanezcan cubiertos para evitar saturación de los materiales y garantizar que sean recibidos en el sitio de disposición final y su transporte se realice cumpliendo las medidas de manejo ambiental.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). acopio km 2+350, km 1+655 y km 0+730.
En el trascurso de la semana ase evidencio retiro de os acopios de RCD que se encontraban al costado de via, sin embargo, aun se evidencia algunos y se requiere retirar los remanentes para garantizar un retiro completo y generar aseo en el frente de obra.
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera. Se evidencia que de manera semanal se realizan jornadas de señalización y cubrimiento de acopios en general.
-Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo
descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD). Al respecto en el periodo se evidenció retiro de varios acopios y el material fue llevado a sitio de disposición final autorizado.
-En este frente se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo Vibrocompactador ubicado en el k3+100
-El punto de acopio de RESPEL y combustibles se mantiene señalizado y etiquetadas las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA. El punto de acopio de sustancias químicas se mantiene adecuado y cubierto.
-Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, y protegido de la acción de la lluvia.
-Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT (señales 200 y 100 mts inicio de obra, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
-Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.


6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

Componente Técnico

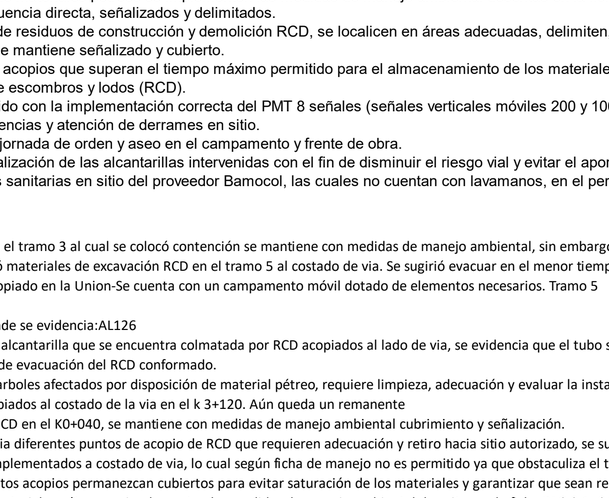

Descripción Foto 1.

Frente San Antonio. K2+940 a K2+920 Perfilacion de subrasante

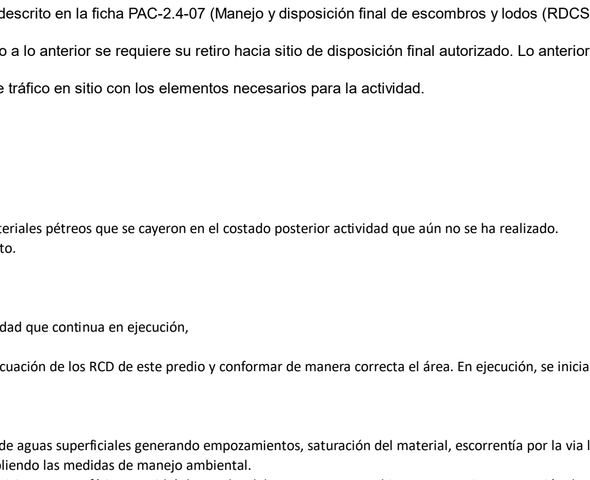

Descripción Foto 2.

Frente San Antonio. K2+940 a K2+920 Perfilacion de subrasante



Descripción Foto 3.

Frente Tunales. Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentias, limpieza de cunetas y barrido general. Esta actividad se reanuda desde tramo 4 k0+000 y hasta k0+230.



Descripción Foto 4.

Frente Tunales. Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentias, limpieza de cunetas y barrido general. Esta actividad se reanuda desde tramo 4 k0+000 y hasta k0+230.



Descripción Foto 5


Frente Tunales. Se realiza riego de liga(riego de adherencia), sobre la pista de base granular existente. Se maneja un tiempo de ruptura de 1 hora. K0+450 a k0+750.



Descripción Foto 6

Frente Unión Tunales.Se realiza extendida de fresado estabilizado aprox a capa de 0.05. Se realiza compactación mecánica con equipo trasladado desde tramo San Antonio (8tn).

Componente Social

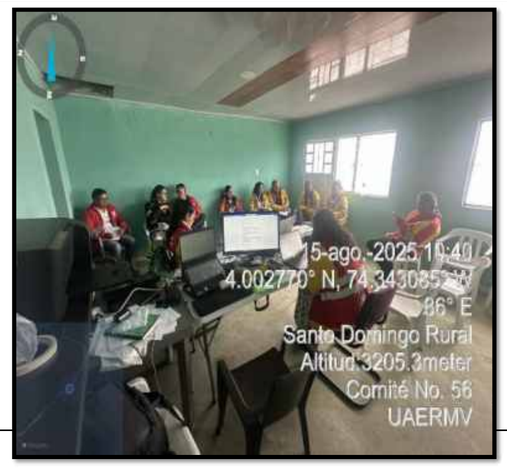

Descripción Foto 7

Comité de seguimiento integral # 56



Descripción Foto 8

Recorrido conjunto

Componente SST



Descripción Foto 9

Frente -tunales. Baños y carpa en orden



Descripción Foto 10

Frente Capitolio. Preoperacionales de maquinaria en orden

Componente Ambiental



Descripción Foto 11

Frente San Antonio. Alcantarilla colmatada k1+450



Descripción Foto 12

Frente Tunales. Acopio de pétreos y RCD con medidas de manejo ambiental

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2025	20/04/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor-Supervisión actividades de Obra	Supervisor Interventoría - Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	111	25
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	7

SEMANA N. 60 **DEL** lunes, 18 de agosto de 2025 **AL** domingo, 24 de agosto de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO 1				
TRAMO SAN ANTONIO 2 EL TOLDO	21,00%	10,81%	-10,19%	K2+930 a K2+830 Manejo de aguas lluvias en borde izquierdo. K0+040 a K3+100 Señalización de acopios K0+040 Trasiego de material RCD **/** K2+820 a K2+810 Perfilacion de subrasante K2+820 a K2+810 Extendida de Rap para renivelacion de subrasante. K0+040 Trasiego de material RCD **/** K2+791,8 a K2+799,3 Izq Acción de movilidad. A:3,00. Excavación de Fallo 0,40m. Mejoramiento con Rajon 0,25m. Sello con Rap 0,15m
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	1. Se realizó la aplicación de material cernido sobre la carpeta de fresado estabilizado, en el tramo comprendido entre las abscisas K3+450 y K3+275. 2. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo de la vía, entre las abscisas K1+425 y K1+260, en los sectores de menores. 3. Se llevó a cabo la hidratación del fresado estabilizado previamente instalado, con el fin de activar los aglutinantes y sellar la capa, en el tramo comprendido entre las abscisas K3+440 y K3+276. **/** 1. Se realiza intervención de fallo sobre vía, se retira material remanente saturado y se agrega retal de concreto para la conformación. K4+090 a k4+095 (5x1x.60) 2. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado derecho de la vía, entre las abscisas K1+040 y K1+250, en los sectores de menores **/**1. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K1+050 y K1+000, en los sectores de menores. 2. Humectación y compactación de fresado estabilizado ya instalado **/** 1. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K0+870 y K1+000, en los sectores de menores. 2. Se realiza imprimación de capas de fresado estabilizado entre k3+276 a k3+255. De igual manera se realiza extendida de fresado estabilizado y cereo a nivel de terminado. 3. Humectación y compactación de fresado estabilizado ya instalado
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	* Se realiza demolición de roca existente con acción mecánica del martillo demoledor del minicargador. K0+900. * Se realiza compactación de carpeta de fresado estabilizado. K0+420 a k0+750. **/** 1. Se realiza intervención de fallo sobre vía, se retira material remanente saturado y se agrega retal de concreto para la conformación. K4+090 a k4+095 (5x1x.60) 2. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado derecho de la vía, entre las abscisas K1+040 y K1+250, en los sectores de menores. **/** * Se realiza demolición de roca existente con acción mecánica del martillo demoledor del minicargador. K0+900. * Se realiza manejo de aguas escorrrentias, excavación y retiro de material remanente saturado por lluvias. Esta actividad se lleva a cabo en el tramo 5 k1+330 a k1+260 **/** * Se realiza demolición de roca existente con acción mecánica del martillo demoledor del minicargador. K0+900. * Se realiza imprimación de material en capas de fresado estabilizado. Esta actividad se lleva a cabo en k0+420 a k0+485. * Se realiza extendida de fresado estabilizado entre k0+420 a k0+435. No se completa toda la pista que se imprimió, debido a que se varó la volqueta asignada al tramo.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL	GLB	35.684.399.806,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNIÓN TUNALES
Personal disponible en tramo 05 1 oficial. 1 inspector . 1 Ayudante. 2 Auxiliares de tráfico. 1 Boal . 1 Tecnologa SST. 1 comisión topografíca. 1 operario de Vibrocompactador. 1 Operador Retro cargador. 1 operario carro tanque. 1 operario minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 vibrocompactador 4 Ton . (varado) 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora. 1 minicargador. 1 carro tanque
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 18 de agosto de 2025. Clima:
FESTIVO
Martes 19 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza demolición de roca existente con acción mecánica del martillo demoledor del minicargador. K0+900.
* Se realiza compactación de carpeta de fresado estabilizado. K0+420 a k0+750.
Miércoles 20 de agosto de 2025. Clima: seco
1. Se realiza intervención de fallo sobre vía, se retira material remanente saturado y se agrega retal de concreto para la conformación. K4+090 a k4+095 (5x1x.60)
2. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado derecho de la vía, entre las abscisas K1+040 y K1+250, en los sectores de menores.
Jueves 21 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza demolición de roca existente con acción mecánica del martillo demoledor del minicargador. K0+900.
* Se realiza manejo de aguas escorrrentias, excavación y retiro de material remanente saturado por lluvias. Esta actividad se lleva a cabo en el tramo 5 k1+330 a k1+260
Viernes 22 de agosto de 2025. Clima: Lluvias moderadas 02:00-03:30
* Se realiza demolición de roca existente con acción mecánica del martillo demoledor del minicargador. K0+900.
* Se realiza imprimación de material en capas de fresado estabilizado. Esta actividad se lleva a cabo en k0+420 a k0+485.
* Se realiza extendida de fresado estabilizado entre k0+420 a k0+435. No se completa toda la pista que se imprimió, debido a que se varó la volqueta asignada al tramo.
Sábado 23 de agosto de 2025. Clima:

Domingo 24 de agosto de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - * * * Se evidencia el cambio del retrocargador. * Se evidencia el cambio del retrocargador. * No se cuenta con material pétreo para realizar actividades de conformación de vía. * No se cuenta con material pétreo para realizar actividades de conformación de vía. **/** * No se evidencia PMT en el lugar de la actividad. * Se evidencia que el manejo de aguas escorrrentias es más una excavación en la cual se está retirando el material b-200 agregado por estabilización vial. Una vez comunicado al residente de obra de acuerdo no profundizar la excavación y reponer el material retirado. * No se cuenta con material pétreo para realizar actividades de conformación de vía. **/** * Se evidencia que la volqueta asignada al tramo de vara k0-690. * No se cuenta con material pétreo para realizar actividades de conformación de vía.

CAPITOLIO
Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 1 Oficial. 1 Boal. 2 Ayudantes. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión topografíca. 1 Operador vibrocompactador. 1 Operador retrocargador. 1 Conductor de volqueta. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Motoniveladora. 1 retrocargador. 1 Vibrocompactador 8tn. 1 Volqueta sencilla. 1 Vibrocompactador 4 Ton. 2 Minicargador
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 18 de agosto de 2025. Clima:
FESTIVO
Martes 19 de agosto de 2025. Clima: seco
1. Se realizó la aplicación de material cernido sobre la carpeta de fresado estabilizado, en el tramo comprendido entre las abscisas K3+450 y K3+275.
2. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo de la vía, entre las abscisas K1+425 y K1+260, en los sectores de menores.
3. Se llevó a cabo la hidratación del fresado estabilizado previamente instalado, con el fin de activar los aglutinantes y sellar la capa, en el tramo comprendido entre las abscisas K3+440 y K3+276.
Miércoles 20 de agosto de 2025. Clima: seco
1. Se realiza intervención de fallo sobre vía, se retira material remanente saturado y se agrega retal de concreto para la conformación. K4+090 a k4+095 (5x1x.60)
2. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado derecho de la vía, entre las abscisas K1+040 y K1+250, en los sectores de menores

Jueves 21 de agosto de 2025. Clima: Iluvias moderadas 02:30 - 05:00
1. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K1+050 y K1+000, en los sectores de menores.
2. Humectación y compactación de fresado estabilizado ya instalado
Viernes 22 de agosto de 2025. Clima: lluvias moderadas 02:00-04:00
1. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K0+870 y K1+000, en los sectores de menores.
2. Se realiza imprimación de capas de fresado estabilizado entre k3+276 a k3+255. De igual manera se realiza extendida de fresado estabilizado y cereo a nivel de terminado.
3. Humectación y compactación de fresado estabilizado ya instalado
Sábado 23 de agosto de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO: - ** * * Las actividades se apoyan con el grupo de trabajo de San Antonio tramo 9.1(1 inspector, 2 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico). * Según información recibida y la inspección realizada, se puede evidenciar que no hay material para conformar carpeta de base granular. **/** Falta 1 ayudante de obra por permiso.

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 09 1 1 residente técnico. 1 profesional SST. 1 profesional ambiental. 1 profesional social. 1 Inspector. 1 oficial. 2 Ayudantes (ingresa en apoyo ayudante). 1 BOAL. 2 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topográfica. 1 operador minicargador. 1 operador de motoniveladora. 1 Operadores de retrocargador. 1 operadores de vibrocompactador. 1 Conductores camioneta. 1 conductor de volqueta sencilla. 1 Conductor de Volqueta Doble.
Maquinaria y equipos de obra 2 Motoniveladora. 2 Vibrocompactador CAT-BOMAG. 1 Vibrocompactador Ammann. 2 minicargador. 3 Retrocargador Terex-Luding-Jhon Deere. 1 Volqueta Sencilla .
Personal disponible de Interventoría: 1 residente técnico. 1 inspector de obra. 1 profesional ambiental. 1 profesional SST. 1 profesional social. 1 conductor

Actividades realizadas
Lunes 18 de agosto de 2025. Clima: seco
FESTIVO
Martes 19 de agosto de 2025. Clima:
K2+930 a K2+830 Manejo de aguas lluvias en borde izquierdo.
K0+040 a K3+100 Señalización de acopios
K0+040 Trasiego de material RCD
Miércoles 20 de agosto de 2025. Clima: seco
K2+820 a K2+810 Perfilacion de subrasante
K2+820 a K2+810 Extendida de Rap para renivelacion de subrasante.
K0+040 Trasiego de material RCD
Jueves 21 de agosto de 2025. Clima: seco
K2+791,8 a K2+799,3 Izq Acción de movilidad. A:3,00. Excavación de Fallo 0,40m. Mejoramiento con Rajon 0,25m. Sello con Rap 0,15m
K2+810 a K2+790 Manejo de aguas lluvias
K0+040 Trasiego de material RCD
Viernes 22 de agosto de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:00 am a 10:00 am
K2+791,8 a K2+799,3 Der Acción de movilidad. A:2,00. Excavación de Fallo 0,40m. Mejoramiento con Rajon 0,25m. Sello con Rap 0,15m
K0+040. Trasiego de material RCD
Sábado 23 de agosto de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO :- Las actividades de perfilacion se ven afectadas por falta de suministro de fresado en crudo RAP. **/** Continua la conformación de vía con RAP aún se requiere el suministro de materiales pétreos para dar celeridad al desarrollo de actividades. **/** **Recorrido UMV, CEV ECOVIAS** Se realiza el recorrido para verificar el cambio de alineamiento entre abscisas K4+440 a K4+470, K3+750 a K3+700 y K3+670 a K3+640 pues la actividad la ejecuto el personal en campo de la UMV sin embargo no se vio representada en los diseños y CEV al ejecutar el replanteo de borde vía evidencio el cambio, se realiza la solicitud de adhesión de la información modificada en campo a los diseños de vía **/** **Nota importante** Se evidencia que la alcantarilla k4+808 no se encuentra integrada a los inventarios, ni aparece en los diseños y alcantarillas proyectadas, la UMV solicita comunicado oficial de interventoría para la integración de la misma a los planos y diseños. **/** Se realiza excavación de fallo a medio carril para dar continuidad a la movilidad. Se evidencia material de perfilacion en alcantarilla se solicita el retiro del mismo **/**

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1.Actividades desarrolladas por el componente social.
Tramo de Unión Tunales.
¯Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa).
¯Programa de información y participación comunitaria.
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Tunal Bajo
Y la carpa punto de atención móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento, se realizó actualización.
•Volantes informativos.

Durante la semana la profesional social no realizó entrega de comunicados.
Tramo de San Antonio El Toldo.
¯Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la
oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa)
¯Programa de información y participación comunitaria.
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los pasacalles, establecidos contractual.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
carpa móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento, se realizó actualización.

•Volantes informativos.

Durante la semana no realizó entrega de comunicados.
¯Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto
La profesional social de la UAERMV realizó la sensibilización con el equipo de obra el tema a tratar estructura organizacional, contratación y ejecución de obras de mantenimiento y rehabilitación vial en la ciudad de la UAERMV
Tramo de Capitolio.
¯Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa).
¯Programa de información y participación comunitaria.
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual, pero uno de ello presento deterioro, se está a la espera que el Consorcio Gaviones 95, realice la reposición.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
carpa móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento. Se realizó actualización.

•Volantes informativos.
Durante la semana la profesional no realizó entrega de comunicados.

¯Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto
La profesional social de la UAERMV realizó la sensibilización con el equipo de obra el tema a tratar estructura organizacional, contratación y ejecución de obras de mantenimiento y rehabilitación vial en la ciudad de la UAERMV
2.RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV.
La interventoría realiza recorrido con el fin de realizar seguimiento a cada una de las actividades establecidas en el plan de Gestión Social.
 COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERMV
La interventoría realiza el comité de seguimiento integral 57, con el fin de realizar seguimiento al desarrollo del contrato. el 22 de agosto del 2025, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social, con el fin de realizar seguimiento al proyecto.
5.INFORMES MENSUALES.
Se encuentra pendiente entrega de informe 11 con observaciones subsanadas. en comité de seguimiento integral la profesional social indica que mediate radicado # 20251120077662, la interventoría verifica la información suministrada no se evidencia información, por tal motivo es entregado por correo electrónico el 21 de agosto del 2025, se encuentra en revisión por parte de interventoría.
Se encuentra pendiente el informe mensual social 12, la profesional social mediate radicado # 20251920081301, la interventoría verifica la información suministrada no se evidencia información. por tal motivo es entregado por correo electrónico el 21 de agosto del 2025, se encuentra en revisión por parte de interventoría.
La profesional social hace entrega del informe mensual social N° 13 del mes de junio del año en curso, dando cumplimiento a lo establecido contractualmente, presenta observaciones. por tal motivo es entregado por correo electrónico el 21 de agosto del 2025, se encuentra en revisión por parte de interventoría.
La profesional social hace entrega del informe mensual social N° 14 del mes de julio del año en curso, dando cumplimiento a lo establecido contractualmente, presenta observaciones. por tal motivo es entregado por correo electrónico el 21 de agosto del 2025, se encuentra en revisión por parte de interventoría.
INFORMES SEMANALES
La entidad ejecutora se encuentra al día en el reporte de informes semanales.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Observaciones Tramo Capitolio:

Personal UMV / 21-08-2025
1 Inspector. 1 Oficial. 1 Boal. 2 ayudante. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión de topografía. 1 Operario Vibrocompactador. 1 Operador retro cargador. 1 Conductor de volqueta sencilla. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador. 1 vigilante
Maquinaria y equipos de obra
1 Motoniveladora Rinho. 1 retro cargador Jhon Deere. 1 Vibrocompactador Dynapac 8tn. 1 vibrocompactador Hamm 4tn. 1 Volqueta sencilla. 2 minicargador
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames),
•Trabajadores de Sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Unidades sanitarias en orden y aseo.
•Se observa maquinaria con sticker del contrato y preoperacionales en orden.
•Se evidencia falta de preoperacional en camioneta placa LZM113, el día 12/08/2025
•Se observa etiquetado de sustancias químicas.
•PMT en orden
•Retroexcavadora sin guardas de seguridad en el motor, se solicitó la instalación de las mismas en comité
•Se observó camión placa No. JRT530, con llantas traseras en avanzado estado de desgaste, se le informa por medio del grupo de WhatsApp al encargado de maquinaria y a la SST de la UMV.

Observaciones SST Tramo Tunales tramo 5:

Personal UMV / 21-08-2025
1 oficial. 1 inspector. 1 Ayudantes. 2 Auxiliares de tráfico. 1 Boal. 1 Tecnóloga SST
1 comisión topográfico. 1 operario de Vibrocompactador. 1 Operador Retro cargador. 1 operario carro tanque. 1 operario minicargador. 1 vigilante
Maquinaria y equipos de obra
1 vibrocompactador Dynapac 4tn(varado). 1 vibrocompactador Dynapac 8tn.
1 Retro cargador. 1 minicargador. 1 motoniveladora. 1 carro tanque
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Se observa maquinaria con sticker del contrato.
•Camioneta placa LZM113, sin preoperacional 21-08-2025
•No hay instalado PMT en zona de trabajo
•Se realiza observación de transporte inseguro en cabina de carrotanque
•Señalización SGA en acopio combustible en orden
•Se observan 2 unidades sanitarias en orden.
•Se observa la instalación de gel antibacterial en unidades sanitarias

Observaciones SST Tramo San Antonio 9:
Personal UMV / 21-08-2025
1 residente técnico. 1 profesional SST. 1 profesional ambiental. 1 profesional social. 1 Inspector. 1 Oficial. 2 Ayudantes (ingresa en apoyo ayudante). 1 BOAL
2 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topográfica. 1 operador minicargador. 1 operador de motoniveladora. 1 Operadores de retrocargador. 1 operadores de vibrocompactador. 1 Conductores camioneta. 1 conductor de volqueta sencilla.
1 Conductor de Volqueta Doble. 1 Vigilante

Maquinaria y equipos de obra
2 Motoniveladora. 1 Vibrocompactador CAT. 1 Vibrocompactador Ammann
1 minicargador. 2 Retrocargador Terex-Luding. 1 Volqueta Sencilla.
Maquinaria y equipos del proyecto
1 Volqueta doble
Observaciones SST:
•Personal de Sintrauniobras con EPP y overol en orden
•PMT en orden
•Se observa equipos de emergencia (camilla, Botiquín de primeros auxilios y kit antiderrames).
•Operadores de maquinaria contrato 936 de 2024, Consorcio HyC, Volqueta Fotón WMB318, no cuenta con preoperacional diligenciado, no cuenta con botiquín y extintor está vencido desde el año 2021
•Se observan acopios de material granular y pétreos con señalización y cubiertos
•Señalización de acopios de sustancias químicas y de seguridad.
•Se observan 4 unidades sanitarias en terreno, en orden y aseo, se solicitó el traslado de dos unidades que están sin uso en tramo 1, pero en comité se argumentó que van a iniciar labores de trabajo de fallos en San Antonio 1

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por la entidad ejecutora.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión del informe semanal enviado por la entidad ejecutora.
4.Se realizo solicitud de entrega de los informes de mayo, junio y Julio de 2025 con ajustes.
5.Participación del comité de seguimiento No 57; donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente.
Frente Capitolio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
-Evacuación de RCD a acopio temporal ubicado en el K 3+450
-K 3+240 se solicito limpieza de alcantarilla que al momento de realizar la instalación de fresado no fue protegida y fue colmatada con este material, en el periodo se mantiene con un entibado para evitar que se continue cayendo el material y se coloco la polisombra respectiva.
-K 0+835 se evidencia acopio de pétreos en el cual se presenta caída de materiales hacia el cauce y cuerpo de agua, se mantiene contención en polisombra en la parte posterior y posteriormente se realizará la limpieza de la ronda.
-K 3+220 se solicitó retiro de RCD conformado en el área donde se encuentra afectando el cauce del cuerpo de agua, se requiere limpieza, actividad en implementación.
-K 3+450 se evidencia implementación de acopio de RCD donde se ubicó polisombra como contención en la parte posterior del mismo para evitar caída de materiales
-Se verifico que donde realizaron la acción de movilidad k0+400 se requiere que el área de mantenga correctamente señalizada.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Mantener implementado lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
-Se verifico que la UMV mantiene el punto de acopio de RESPEL y combustibles señalizado y etiquetaron las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA.
-Se mantiene dos unidades sanitarias portátiles, del proveedor Bamocol, estas no poseen lavamanos, en el periodo no se realizó mantenimiento respectivo.
-Se evidencia en el km 0+485 arrastre de materiales pétreos al predio privado, la limpieza inicio desde el pasado 06 de junio de 2025 en ejecución.
-Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos, esta actividad se inició con el apoyo de los BOAL. Esta es una actividad continua.
-Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
-Se mantiene punto ecológico activo y señalizado.
-Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
-Se mantiene recomendación al contratista de maquinaria que cuando se proceda a realizar reparaciones puntuales de equipos se tomen las medidas de manejo ambiental respectivas, como aislar el suelo con plástico para evitar posibles contaminaciones del suelo y agua por escorrentía.
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se cuenta con un campamento móvil dotado de elementos necesarios K 3+200
Frente Tunales
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo
-Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, el cual se mantiene ubicado para protegerlo de la acción de la lluvia con el fin de evitar proliferación de vectores y malos olores por descomposición de los residuos.
-Las canecas de almacenamiento de combustible se mantienen rotuladas de acuerdo con el sistema globalmente armonizado se sugiere se realice seguimiento a la permanencia de esta señalización y se mantenga el área ordenada.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Mantener implementado lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). Acopio ubicado en la unión donde se encuentran RCD y pétreos, se mantiene señalizado y cubierto.
-Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
-Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
-Se cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
-Se evidencia realización de jornada de orden y aseo en el campamento y frente de obra.
-Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.

*Se cuenta con dos unidades sanitarias en sitio del proveedor Bamocol, las cuales no cuentan con lavamanos, en el periodo no se realizó mantenimiento.
-El acopio de Pétreos ubicado en el tramo 3 al cual se colocó contención se mantiene con medidas de manejo ambiental, sin embargo, se mantiene la solicitud reiterativa en comités del retiro de los materiales pétreos que se cayeron en el costado posterior actividad que aún no se ha realizado.
-Se evidencia que se implementó materiales de excavación RCD en el tramo 5 al costado de via. Se sugirió evacuar en el menor tiempo posible a sitio de disposición final, y mantener delimitado y cubierto.
-Se evidencio evacuación de RCD acopiado en la Unión
-Se cuenta con un campamento móvil dotado de elementos necesarios. Tramo 5
Frente San Antonio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
-K 1+470 se solicita limpieza de alcantarilla que se encuentra colmatada por RCD acopiados al lado de via, se evidencia que el tubo se encuentra tapado, el área del encole y descole fue limpiado. Actividad que continua en ejecución,
-K 3+100 se mantiene solicitud de evacuación del RCD conformado.
-En el Km 3+100 se evidencian arboles afectados por disposición de material pétreo, requiere limpieza, adecuación y evaluar la instalación de contención de materiales. Se solicita dar prioridad a la evacuación de los RCD de este predio y conformar de manera correcta el área. En ejecución, se inicia con esta actividad el día 25 de junio.
-Se evidencia retiro de RCD acopiados al costado de la via donde aún se evidencia que queda un remanente
-Acopio principal de pétreos y RCD en el K0+040, se mantiene con medidas de manejo ambiental cubrimiento y señalización.
-A lo largo del tramo se evidencia diferentes puntos de acopio de RCD que requieren adecuación y retiro hacia sitio autorizado, se sugiere no conformar estos materiales en sitio. En el punto desde el K 3+100 hacia menores se han evacuado varios acopios, sin embargo, de este punto hacia mayores aun se encuentran acopios de RCD activos que requieren adecuación.
-La mayoría de acopios están implementados a costado de via, lo cual según ficha de manejo no es permitido ya que obstaculiza el tránsito vehicular, obstruye las cunetas y por ende el drenaje natural de aguas superficiales generando empozamientos, saturación del material, escorrentía por la via lo que conlleva a daños mayores en las vías en ejecución. Es importante que estos acopios permanezcan cubiertos para evitar saturación de los materiales y garantizar que sean recibidos en el sitio de disposición final y su transporte se realice cumpliendo las medidas de manejo ambiental.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). acopio km 2+350, km 1+655 y km 0+730.
En el trascurso de la semana ase evidencio retiro de los acopios de RCD que se encontraban al costado de via, sin embargo, aun se evidencia algunos y se requiere retirar los remanentes para garantizar un retiro completo y generar aseo en el frente de obra.
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera. Se
evidencia que de manera semanal se realizan jornadas de señalización y cubrimiento de acopios en general.
-Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD). Al respecto en el periodo se evidenció retiro de varios acopios y el material fue llevado a sitio de disposición final autorizado.
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-El punto de acopio de RESPEL y combustibles se mantiene señalizado y etiquetadas las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA. El punto de acopio de sustancias químicas se mantiene adecuado y cubierto.
-Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, y protegido de la acción de la lluvia.
-Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT (señales 200 y 100 mts inicio de obra, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
-Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos. En implementación.
-En comité de obra No 57 se reiteró a la UMV evacuar hacia sitio de disposición final autorizado los materiales RCD almacenados en distintos acopios, lo anterior debido a que superan en tiempo máximo permitido para permanencia en obra.
-Se cuenta con cuatro unidades sanitarias portátiles del proveedor Bamocol, las cuales no poseen lavamanos, pero cuentan con gel antibacterial, con mantenimiento en el periodo.
-Se sugiere realizar un adecuado manejo de aguas de escorrentía para evitar afectaciones en la via.
-Se cuenta con un campamento móvil dotado de elementos necesarios. K 3+100.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

Componente Técnico



Descripción Foto 1.

Frente Tunales. Se realiza compactación de carpeta de fresado estabilizado. K0+420 a k0+750



Descripción Foto 2.

Frente Tunales. Se realiza manejo de aguas escorrrentias, excavación y retiro de material remanente saturado por lluvias. Esta actividad se lleva a cabo en el tramo 5 k1+440 a k1+380



Descripción Foto 3.

Frente Tunales. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado derecho de la vía, entre las abscisas K1+040 y K1+250, en los sectores de menores.



Descripción Foto 4.

Frente San Antonio. K2+820 a K2+810. Perfilacion de subrasante



Descripción Foto 5


Frente San Antonio. Extendida de Rap para renivelacion de subrasante.



Descripción Foto 6


Frente San Antonio. Trasiego de material RCD

Componente Social

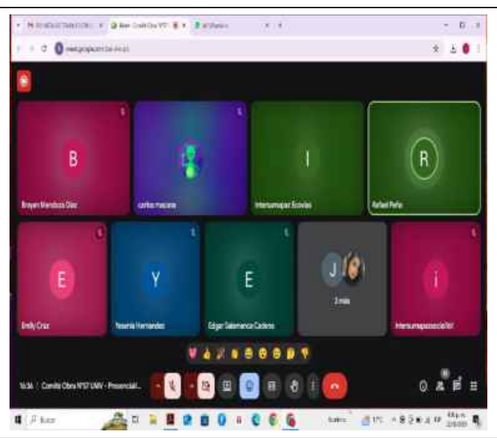

Descripción Foto 7

Comité de seguimiento integral # 57

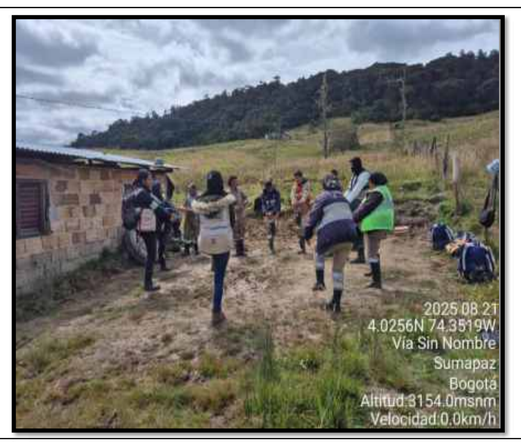

Descripción Foto 8


Sensibilización personal de obra.

Componente SST



Descripción Foto 9

Frente San Antonio. PMT en orden

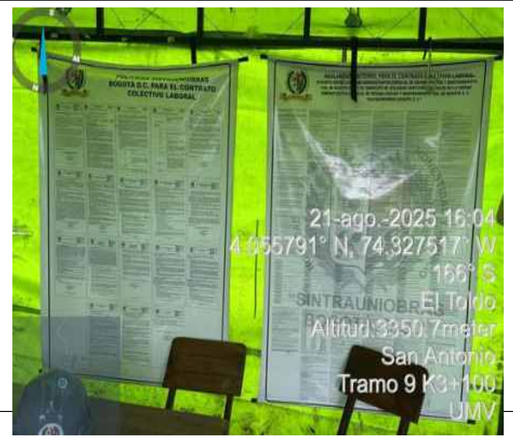

Descripción Foto 10

Frente San Antonio. Se evidencia publicación de politicas SST

Componente Ambiental



Descripción Foto 11

Frente Capitolio. Acopio de Pétreos delimitado y cubierto



Descripción Foto 12

Frente Capitolio. Protección de alcantarillas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO		CIN-161-2022
OBJETO	PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$35.684.399.806,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$0,00	$0,00
PLAZO INICIAL	TREINTA Y NUEVE (39) MESES, VEINTINUEVE (29) DIAS	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2025	20/04/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor-Supervisión actividades de Obra	Supervisor Interventoría - Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	111	25
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	7

SEMANA N. 61 **DEL** lunes, 25 de agosto de 2025 **AL** domingo, 31 de agosto de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO 1				
TRAMO SAN ANTONIO 2 EL TOLDO	21,00%	10,81%	-10,19%	K3+050 a K2+995 Der Manejo de aguas lluvias. K3+120-K2+860 Limpieza de Alcantarillas K0+040 Trasiego y Cargué de material RCD **/** K0+700 Cargue y Retiro de material RCD. Limpiez+B66a y entrega de acopio. K1+463 Limpieza parcial de Alcantarillas K0+040 Trasiego de material RCD **/** K2+810 a K2+821 A:3,00 Excavación de Fallo. e: 0,60. Mejoramiento con Retal . e: 0,40. Sello con Rap. e: 0,20
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	1. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K0+870 y K0+965, en los sectores de menores. 2. Se realiza imprimación de capas de fresado estabilizado entre k3+215 a k3+255. De igual manera se realiza extendida de fresado estabilizado y cereo a nivel de terminado. 2. Humectación y compactación de fresado estabilizado ya instalado **/** 1. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K0+850 y K0+750, en los sectores de menores. 2. Se realiza rectificacion de niveles y remates de carpeta fresado estabilizado entre k3+215 a k3+260(hombros). De igual manera se realiza extendida de fresado estabilizado y cereo a nivel de terminado. 3. Humectación y compactación de fresado estabilizado ya instalado. **/** 1. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K0+680 y K0+750, en los sectores de menores. 2. Se realiza rectificacion de niveles y remates de carpeta fresado estabilizado entre k3+215 a k3+260(hombros). De igual manera se realiza aplicación de material cernido y compactación. 3. Humectación y compactación de fresado estabilizado ya instalado. **/** 1. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K0+680 y K0+500, en los sectores de menores. 2. Se realiza rectificacion de niveles y remates de carpeta fresado estabilizado entre k3+215 a k3+260(hombros). De igual manera se realiza aplicación de material cernido y compactación. K3+300 a k3+330 3. Humectación y compactación de fresado estabilizado ya instalado. K3+215 a k3+290. **/**
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	* Se realiza imprimación de material en capas de fresado estabilizado. Esta actividad se lleva a cabo en k0+540 a k0+490. * Se realiza extendida de fresado estabilizado entre k0+490 a k0+540. Se humecta y se sella con vibro de 4 TN **/** * Se realiza imprimación de material en capas de fresado estabilizado. Esta actividad se lleva a cabo en k0+530 a k0+600. * Se realiza extendida de fresado estabilizado entre k0+530 a k0+600. Se humecta y se sella con vibro de 8 TN. **/** * Se realiza imprimación de material en capas de fresado estabilizado. Esta actividad se lleva a cabo en k0+680 a k0+610. * Se realiza extendida de fresado estabilizado entre k0+680 a k0+610. Se humecta y se sella con vibro de 8 TN. De igual manera se cerea a nivel de terminado. **/** * Se realiza imprimación de material en capas de fresado estabilizado. Esta actividad se lleva a cabo en k0+680 a k0+750. * Se realiza extendida de fresado estabilizado entre k0+680 a k0+750. Se humecta y se sella con vibro de 8 TN. De igual manera se cerea a nivel de terminado. **/** * Se realiza rectificacion de bordes de via y niveles de terminado de carpeta de fresado estabilizado. K0+420 a k0+680. * Se realiza aplicacion de material cernido sobre carpeta de fresado estabilizado entre k0+680 a k0+750. Se humecta y se sella con vibro de 8 TN.

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL	GLB	35.684.399.806,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

UNIÓN TUNALES
Personal disponible en tramo 05 1 oficial. 1 inspector . 1 Ayudante. 2 Auxiliares de tráfico. 1 Boal . 1 Tecnologa SST. 1 comisión topografíca. 1 operario de Vibrocompactador. 1 Operador Retro cargador. 1 operario carro tanque. 1 operario minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 2 vibrocompactador 4 Ton . 1 Retro cargador. 1 Motoniveladora. 1 minicargador. 1 carro tanque
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 25 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza imprimación de material en capas de fresado estabilizado. Esta actividad se lleva a cabo en k0+540 a k0+490.
* Se realiza extendida de fresado estabilizado entre k0+490 a k0+540. Se humecta y se sella con vibro de 4 TN
Martes 26 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza imprimación de material en capas de fresado estabilizado. Esta actividad se lleva a cabo en k0+530 a k0+600.
* Se realiza extendida de fresado estabilizado entre k0+530 a k0+600. Se humecta y se sella con vibro de 8 TN.
Miércoles 27 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza imprimación de material en capas de fresado estabilizado. Esta actividad se lleva a cabo en k0+680 a k0+610.
* Se realiza extendida de fresado estabilizado entre k0+680 a k0+610. Se humecta y se sella con vibro de 8 TN. De igual manera se cerea a nivel de terminado.
Jueves 28 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza imprimación de material en capas de fresado estabilizado. Esta actividad se lleva a cabo en k0+680 a k0+750.
* Se realiza extendida de fresado estabilizado entre k0+680 a k0+750. Se humecta y se sella con vibro de 8 TN. De igual manera se cerea a nivel de terminado.
Viernes 29 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza rectificacion de bordes de via y niveles de terminado de carpeta de fresado estabilizado. K0+420 a k0+680.
* Se realiza aplicacion de material cernido sobre carpeta de fresado estabilizado entre k0+680 a k0+750. Se humecta y se sella con vibro de 8 TN.
Sábado 30 de agosto de 2025. Clima:

Domingo 31 de agosto de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - * * * * Se evidencia que la volqueta asignada al tramo de vara en el punto k0-690. * No se cuenta con material pétreo para realizar actividades de conformación de vía.**/** * Se evidencia el retiro de 2 viajes de RCD acopiados en la vía k1+540. * No se cuenta con material pétreo para realizar actividades de conformación de vía. **/** * Se evidencia que el sello y compactación del fresado lo hacen descendiendo, motivo por el cual se corre el material.
* No se cuenta con material pétreo para realizar actividades de conformación de vía.

CAPITOLIO
Personal disponible en tramo 05
1 inspector. 1 Oficial. 1 Boal. 2 Ayudantes. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión topografíca. 1 Operador vibrocompactador. 1 Operador retrocargador. 1 Conductor de volqueta. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Motoniveladora. 1 retrocargador. 1 Vibrocompactador 8tn. 1 Volqueta sencilla.. 2 Minicargador
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 25 de agosto de 2025. Clima: seco
1. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K0+870 y K0+965, en los sectores de menores.
2. Se realiza imprimación de capas de fresado estabilizado entre k3+215 a k3+255. De igual manera se realiza extendida de fresado estabilizado y cereo a nivel de terminado.
2. Humectación y compactación de fresado estabilizado ya instalado

2. Humectación y compactación de fresado estabilizado ya instalado

Martes 26 de agosto de 2025. Clima: lluvias moderadas 10:00 a 12.00
1. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K0+850 y K0+750, en los sectores de menores.
2. Se realiza rectificacion de niveles y remates de carpeta fresado estabilizado entre k3+215 a k3+260(hombros). De igual manera se realiza extendida de fresado estabilizado y cereo a nivel de terminado.
3. Humectación y compactación de fresado estabilizado ya instalado.
Miércoles 27 de agosto de 2025. Clima: seco
1. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K0+680 y K0+750, en los sectores de menores.
2. Se realiza rectificacion de niveles y remates de carpeta fresado estabilizado entre k3+215 a k3+260(hombros). De igual manera se realiza aplicación de material cernido y compactación.
3. Humectación y compactación de fresado estabilizado ya instalado.
Jueves 28 de agosto de 2025. Clima: seco
1. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K0+680 y K0+500, en los sectores de menores.
2. Se realiza rectificacion de niveles y remates de carpeta fresado estabilizado entre k3+215 a k3+260(hombros). De igual manera se realiza aplicación de material cernido y compactación. K3+300 a k3+330
3. Humectación y compactación de fresado estabilizado ya instalado. K3+215 a k3+290.
Viernes 29 de agosto de 2025. Clima: seco
1. Se efectuó la limpieza del terreno para la construcción de cunetas en el costado izquierdo en abscisas K0+450 y K0+350, en los sectores de menores.
2. Se realiza manejo de aguas escorrentías por ambos costados en el K3+430 a k3+330.
3. Se realiza limpieza de alcantarilla en k3+240, se evidencia retiro de material fresado
Sábado 30 de agosto de 2025. Clima:

Domingo 31 de agosto de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA CAPITOLIO: - ** * ** Se evidencia contaminación con material de fresado en cuerpo de agua del k3+245. Se solicita extracción y retiro de material contaminante. Adicionalmente se evidencia que el ancho de vía en este punto es de 3.9 MTS. * Se evidencian detalles de terminación de carpeta de fresado. Se solicita realizar reparaciones para posterior entrega al área de topografía de la interventoría. * Falta 1 ayudante de obra por permiso. * Se evidencia contaminación cruzada por acopio de material pétreo junto con RCD en k0+835. * Las actividades se apoyan con el grupo de trabajo de San Antonio tramo 9.1(1 inspector, 2 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico). * Según información recibida y la inspección realizada, se puede evidenciar que no hay material para conformar carpeta de base granular.**/** * Se evidencia contaminación con material de

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 09.1 1 residente técnico. 1 profesional SST. 1 profesional ambiental. 1 profesional social. 1 Inspector. 1 oficial. 3 Ayudantes. 1 BOAL. 2 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topográfica. 1 operador minicargador. 1 operador de motoniveladora. 2 Operadores de retrocargador. 1 operadores de vibrocompactador. 1 Conductores camioneta. 1 conductor de volqueta sencilla. 1 Conductor de Volqueta Doble.
Maquinaria y equipos de obra 2 Motoniveladora. 2 Vibrocompactador CAT AHMMAN. 1 Vibrocompactador Ammann. 1 minicargador. 2 Retrocargador Terex-Luding. 1 Volqueta Sencilla . 3 Volquetas doble
Personal disponible de Interventoría: 1 residente técnico. 1 inspector de obra. 1 profesional ambiental. 1 profesional SST. 1 profesional social. 1 conductor

Actividades realizadas
Lunes 25 de agosto de 2025. Clima: seco
K3+050 a K2+995 Der Manejo de aguas lluvias.
K3+120-K2+860 Limpieza de Alcantarillas
K0+040 Trasiego y Cargué de material RCD
Martes 26 de agosto de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:00 a 10:00 am
K0+700 Cargue y Retiro de material RCD. Limpiez+B66a y entrega de acopio.
K1+463 Limpieza parcial de Alcantarillas
K0+040 Trasiego de material RCD
Miércoles 27 de agosto de 2025. Clima: Lluvia moderada 7:00 a 9:00 am
K2+810 a K2+821 A:3,00 Excavación de Fallo. e: 0,60. Mejoramiento con Retal . e: 0,40. Sello con Rap. e: 0,20
Jueves 28 de agosto de 2025. Clima: seco
K2+847 a K2+858 A:3,00 Excavación de Fallo. e: 0,45. Mejoramiento con Retal. e: 0,30. Sello con Rap. e: 0,15
Viernes 29 de agosto de 2025. Clima: seco
K0+700-K1+350-K1+700-K2+600 Adecuación, orden y limpieza de acopios
Sábado 30 de agosto de 2025. Clima:

Domingo 31 de agosto de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO :- El desarrollo de actividades se ve afectado debido a la falta de suministro de materiales pétreos y RAP.**/** Se evidencia personal realizando el retiro del tapón en Alcantarilla K1+463. Se verifica ingreso de retal de concreto para mejoramiento de puntos de baja densidad aún se requiere el suministro de pétreos o RAP para sellar las intervenciones. **/** El retal no se selecciona y se instala con el material de recebo del lugar en el que se carga, se socializa con el encargado de obra la mala práctica. **/** Persisten las malas prácticas en la recuperación de puntos de baja densidad en vía, se pone en conocimiento del director de obra **/** Las actividades se ven afectadas por la falta de suministro de materiales pétreos.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

SEMANAL DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.
1.Actividades desarrolladas por el componente social.
Tramo de Unión Tunales.
⁻Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa).
⁻Programa de información y participación comunitaria.
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Tunal Bajo
Y la carpa punto de atención móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento, se realizó actualización.
•Volantes informativos.

Durante la semana la profesional social no realizó entrega de comunicados.

Tramo de San Antonio El Toldo.
⁻Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa).
La profesional social atiene a la comunidad de la vereda de San Antonio y Toldo Manifiestan su preocupación por el estado actual de la vía. La UMV atiende solicitud comprometiéndose a sacar los fallos que se encuentran en el tramo vial.

⁻Programa de información y participación comunitaria.
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los pasacalles, establecidos contractual.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
carpa móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento, se realizó actualización.

•Volantes informativos.

Durante la semana no realizó entrega de comunicados.

Tramo de Capitolio.
⁻Programa de atención al Usuario
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil a la comunidad, cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
Cuenta con punto den atención móvil (carpa).
⁻Programa de información y participación comunitaria.

•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual, pero uno de ello presento deterioro, se está a la espera que el Consorcio Gaviones 95, realice la reposición.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
carpa móvil establecida para atender a la comunidad.
Se evidencia que cuenta con afiche informativo, volantes informativos. Se evidencia cumplimiento. Se realizó actualización.

•Volantes informativos.

Durante la semana la profesional no realizó entrega de comunicados.

2.RECORRIDO INTERVENTORIA – UAERMV.
La interventoría realiza recorrido con el fin de realizar seguimiento a cada una de las actividades establecidas en el plan de Gestión Social.
3. COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERMV
La interventoría realiza el comité de seguimiento integral 58, con el fin de realizar seguimiento al desarrollo del contrato. el 28 de agosto del 2025, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social, con el fin de realizar seguimiento al proyecto.
5.INFORMES MENSUALES.
La interventoría realizó mesa de trabajo con la profesional social de la entidad ejecutora el 27 de agosto del año en curso, con el fin de revisar y canalizar las inquietudes de los informes mensuales sociales 11, 12, 13, 14, los cuales son enviados por correo electrónico, se encuentran en revisión por parte de interventoría. Además se revisan los soportes del informe 15 mes d agosto del 2025.
6.INFORMES SEMANALES

La entidad ejecutora se encuentra al día en el reporte de informes semanales.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Personal UMV / 29-08-2025
1 Inspector. 1 Oficial. 1 Boal. 2 ayudante. 2 Auxiliar Tráfico. 1 comisión de topografía. 1 Operario Vibrocompactador. 1 Operador retro cargador
1 Conductor de volqueta sencilla. 1 operador Motoniveladora. 1 operador Minicargador. 1 vigilante
Maquinaria y equipos de obra
1 Motoniveladora Rinho. 1 retro cargador Jhon Deere. 1 Vibrocompactador Bomac 8tn. 1 vibrocompactador Hamm 4tn. 1 Volqueta sencilla. 2 minicargador
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames),
•Trabajadores de Sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Unidades sanitarias en orden y aseo.
•Se observa maquinaria con sticker del contrato y preoperacionales en orden.
•Se observa etiquetado de sustancias químicas.
•PMT en orden
•Retroexcavadora sin guardas de seguridad en el motor, se solicitó la instalación de las mismas en comité
•Se observó camión placa No. JRT530, con llantas traseras en avanzado estado de desgaste, se le informa por medio del grupo de WhatsApp al encargado de maquinaria y a la SST de la UMV.
•Extintor de Vibro compactador BOMAG, depesurizado

Observaciones SST Tramo Tunales tramo 5:

Personal UMV / 28-08-2025
1 oficial. 1 inspector. 1 Ayudantes. 2 Auxiliares de tráfico. 1 Boal. 1 Tecnologa SST
1 comisión topográfico. 1 operario de Vibrocompactador. 1 Operador Retro cargador. 1 operario carro tanque. 1 operario minicargador. 1 vigilante
Maquinaria y equipos de obra
1 vibrocompactador Dynapac 4tn(varado). 1 vibrocompactador Dynapac 8tn.
1 Retro cargador. 1 minicargador. 1 motoniveladora. 1 carro tanque
Observaciones SST:
•Se observa equipos de emergencia en orden (camilla, Botiquín de primeros auxilios, extintor y kit antiderrames)
•Trabajadores de sintrauniobras con sus EPP y dotación en orden
•Se observa maquinaria con sticker del contrato
•Señalización SGA en acopio combustible en orden
•Se observan 2 unidades sanitarias en orden.
•Se observa la instalación de gel antibacterial en unidades sanitarias
•Está pendiente la subsanación a observaciones del informe de abril y mayo de 2025, 14 de agosto (oficio) 4-9-2025
•Vibro compactador 8 ton. de Tramo Tunales la alarma de reversa no está funcionando correctamente, en comité se realiza compromiso de reparación para el 4-9-2025
•Se observó volqueta realizando traslado en el volcó de un vibro compactador
Observaciones SST Tramo San Antonio 9:
Personal UMV / 25-08-2025
1 residente técnico. 1 profesional SST. 1 profesional ambiental. 1 profesional social
1 Inspector. 1 Oficial. 3 Ayudantes. 1 BOAL. 2 Auxiliar Tráfico. 1 Comisión Topográfica. 1 operador minicargador. 1 operador de motoniveladora. 2 Operadores de retrocargador. 1 operadores de vibrocompactador. 1 Conductores camioneta. 1 conductor de volqueta sencilla. 3 Conductor de Volqueta Doble..
1 Vigilante

Maquinaria y equipos de obra
2 Motoniveladora. 1 Vibrocompactador CAT. 1 Vibrocompactador Ammann
1 minicargador. 2 Retrocargador Terex-Luding. 1 Volqueta Sencilla
Maquinaria y equipos del proyecto
3 Volqueta doble
Observaciones SST:
•Personal de Sintrauniobras con EPP y overol en orden
•PMT en orden
•Se observa equipos de emergencia (camilla, Botiquín de primeros auxilios y kit antiderrames).
•Se observan acopios de material granular y pétreos con señalización y cubiertos
•Señalización de acopios de sustancias químicas y de seguridad.
•Se observan 4 unidades sanitarias en terreno, en orden y aseo.
•Falta de orden y aseo en tramo

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Informe Semanal: SEMANA 25 al 31 de agosto 2025
Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por la entidad ejecutora.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión del informe semanal enviado por la entidad ejecutora.
4.Se realizo solicitud de entrega de los informes de mayo, junio y Julio de 2025 con ajustes.
5.Participación del comité de seguimiento No 58; donde se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el componente.

Frente Capitolio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
-Evacuación de RCD a acopio temporal ubicado en el K 3+450
-K 3+240 se solicito limpieza de alcantarilla que al momento de realizar la instalación de fresado no fue protegida y fue colmatada con este material, en el periodo se mantiene con un entibado para evitar que se continue cayendo el material y se coloco la polisombra respectiva. Respecto a esta limpieza la debe realizar la UMV y posteriormente el consorcio gaviones95 realizara la intervención.
-K 0+835 se evidencia acopio de pétreos en el cual se presenta caída de materiales hacia el cauce y cuerpo de agua, se mantiene contención en polisombra en la parte posterior y posteriormente se realizará la limpieza de la ronda.
-K 3+220 se solicitó retiro de RCD conformado en el área donde se encuentra afectando el cauce del cuerpo de agua, se requiere limpieza, actividad en implementación.
-K 3+450 se evidencia implementación de acopio de RCD donde se ubicó polisombra como contención en la parte posterior del mismo para evitar caída de materiales
-Se verifico que donde realizaron la acción de movilidad k0+400 se requiere que el área de mantenga correctamente señalizada.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Mantener implementado lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
-Se verifico que la UMV mantiene el punto de acopio de RESPEL y combustibles señalizado y etiquetaron las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA.
-Se mantiene dos unidades sanitarias portátiles, del proveedor Bamocol, estas no poseen lavamanos, en el periodo no se realizó mantenimiento respectivo.
-Se evidencia en el km 0+485 arrastre de materiales pétreos al predio privado, la limpieza inicio desde el pasado 06 de junio de 2025 en ejecución.
-Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos, esta actividad se inició con el apoyo de los BOAL. Esta es una actividad continua.
-Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
-Se mantiene punto ecológico activo y señalizado.
-Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
-Se mantiene recomendación al contratista de maquinaria que cuando se proceda a realizar reparaciones puntuales de equipos se tomen las medidas de manejo ambiental respectivas, como aislar el suelo con plástico para evitar posibles contaminaciones del suelo y agua por escorrentía.
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se cuenta con un campamento móvil dotado de elementos necesarios K 3+200
Frente Tunales
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo
-Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, el cual se mantiene ubicado para protegerlo de la acción de la lluvia con el fin de evitar proliferación de vectores y malos olores por descomposición de los residuos.
-Las canecas de almacenamiento de combustible se mantienen rotuladas de acuerdo con el sistema globalmente armonizado se sugiere se realice seguimiento a la permanencia de esta señalización y se mantenga el área ordenada.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Mantener implementado lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). Acopio ubicado en la unión donde se encuentran RCD y pétreos, se mantiene señalizado y cubierto, al respecto se evidencio retiro de materiales, quedando poca cantidad por evacuar.
-Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD).
-Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT 8 señales (señales verticales móviles 200 y 100 mts via cerrada, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
-Se cuenta con Kit de emergencias y atención de derrames en sitio.
-Se evidencia realización de jornada de orden y aseo en el campamento y frente de obra.
-Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos.
-Se cuenta con dos unidades sanitarias en sitio del proveedor Bamocol, las cuales no cuentan con lavamanos, en el periodo se realizó mantenimiento.
-El acopio de Pétreos ubicado en el tramo 3 al cual se colocó contención se mantiene con medidas de manejo ambiental, sin embargo, se mantiene la solicitud reiterativa en comités del retiro de los materiales pétreos que se cayeron en el costado posterior actividad que aún no se ha realizado.
-Se evidencia que se implementó acopio de materiales de excavación RCD en el tramo 5 al costado de via. Se sugirió evacuar en el menor tiempo posible a sitio de disposición final, y mantener delimitado y cubierto.
-Se evidencio evacuación de RCD acopiado en la Unión
-Se cuenta con un campamento móvil dotado de elementos necesarios. Tramo 5
-Se solicito limpieza de cuneta y sumidero de la unión, donde tiene el acopio principal de pétreos y RCD.
Frente San Antonio
Se realiza recorrido de obra donde se evidencia:
-K 1+470 se solicita limpieza de alcantarilla que se encuentra colmatada por RCD acopiados al lado de via, se evidencia que el tubo se encuentra tapado, el área del encole y descole fue limpiado. Actividad que continua en ejecución,
-K 3+100 se mantiene solicitud de evacuación del RCD conformado.
-En el Km 3+100 se evidencian arboles afectados por disposición de material pétreo, requiere limpieza, adecuación y evaluar la instalación de contención de materiales. Se solicita dar prioridad a la evacuación de los RCD de este predio y conformar de manera correcta el área. En ejecución, se inicia con esta actividad el día 25 de junio.
-Se evidencia retiro de RCD acopiados al costado de la via donde aún se evidencia que queda un remanente
-Acopio principal de pétreos y RCD en el K0+040, se mantiene con medidas de manejo ambiental cubrimiento y señalización.
-A lo largo del tramo se evidencia diferentes puntos de acopio de RCD que requieren adecuación y retiro hacia sitio autorizado, se sugiere no conformar estos materiales en sitio. En el punto desde el K 3+100 hacia menores se han evacuado varios acopios, sin embargo, de este punto hacia mayores aun se encuentran acopios de RCD activos que requieren adecuación.
-La mayoría de acopios están implementados a costado de via, lo cual según ficha de manejo no es permitido ya que obstaculiza el tránsito vehicular, obstruye las cunetas y por ende el drenaje natural de aguas superficiales generando empozamientos, saturación del material, escorrentía por la via lo que conlleva a daños mayores en las vías en ejecución. Es importante que estos acopios permanezcan cubiertos para evitar saturación de los materiales y garantizar que sean recibidos en el sitio de disposición final y su transporte se realice cumpliendo las medidas de manejo ambiental.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). acopio km 1+700, 3+200, 2+350, km 1+655 y km 0+730.
En el trascurso de la semana ase evidencio retiro de los acopios de RCD que se encontraban al costado de via, sin embargo, aun se evidencia algunos y se requiere retirar los remanentes para garantizar un retiro completo y generar aseo en el frente de obra.
Cabe mencionar que algunos acopios de material de construcción y demolición RCD cuentan con cubrimiento y delimitación, al respecto se solicita que todos se implementen de esta manera. Se evidencia que de manera semanal se realizan jornadas de señalización y cubrimiento de acopios en general.
-Se solicita retiro de RCD de acopios que superan el tiempo máximo permitido para el almacenamiento de los materiales sobrantes de excavación y escombros en la obra, de acuerdo a lo anterior se requiere su retiro hacia sitio de disposición final autorizado. Lo anterior según lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RCD). Al respecto en el periodo se evidenció retiro de varios acopios y el material fue llevado a sitio de disposición final autorizado.
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-El punto de acopio de RESPEL y combustibles se mantiene señalizado y etiquetadas las canecas de acuerdo al Sistema globalmente armonizado SGA. El punto de acopio de sustancias químicas se mantiene adecuado y cubierto.
-Se evidencia en sitio punto ecológico con tapa, y protegido de la acción de la lluvia.
-Se evidencia tramo intervenido con la implementación correcta del PMT (señales 200 y 100 mts inicio de obra, banderero, 30, barricada) y dos auxiliares de tráfico en sitio con los elementos necesarios para la actividad.
-Se cuenta con Kit de emergencias y control de derrames en sitio.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se solicito aislamiento, señalización de las alcantarillas intervenidas con el fin de disminuir el riesgo vial y evitar el aporte de materiales pétreos a los cauces intervenidos. En implementación.
-En comité de obra No 58 se reiteró a la UMV evacuar hacia sitio de disposición final autorizado los materiales RCD almacenados en distintos acopios, lo anterior debido a que superan en tiempo máximo permitido para permanencia en obra.
-Se cuenta con cuatro unidades sanitarias portátiles del proveedor Bamocol, las cuales no poseen lavamanos, pero cuentan con gel antibacterial, con mantenimiento en el periodo.
-Se sugiere realizar un adecuado manejo de aguas de escorrentía para evitar afectaciones en la via.
-Se cuenta con un campamento móvil dotado de elementos necesarios. K 3+100.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

Componente Técnico



Descripción Foto 1.

Frente San Antonio. K3+120-K2+860 Limpieza de Alcantarillas



Descripción Foto 2.

Frente San antonio. K3+120-K2+860 Limpieza de Alcantarillas



Descripción Foto 3.

Frente Caapitolio. Se realiza imprimación de capas de fresado estabilizado entre k3+215 a k3+255. De igual manera se realiza extendida de fresado estabilizado y cereo a nivel de terminado.



Descripción Foto 4.

Frente Caapitolio. Se realiza imprimación de capas de fresado estabilizado entre k3+215 a k3+255. De igual manera se realiza extendida de fresado estabilizado y cereo a nivel de terminado.



Descripción Foto 5

Frente Tunales. Se realiza extendida de fresado estabilizado entre k0+490 a k0+540. Se humecta y se sella con vibro de 4 TN.



Descripción Foto 6

Frente Tunales. Se realiza extendida de fresado estabilizado entre k0+490 a k0+540. Se humecta y se sella con vibro de 4 TN.

Componente Social



Descripción Foto 7

Comité de seguimiento integral # 58



Descripción Foto 8

Mesa de trabajo

Componente SST



Descripción Foto 9

Frente San Antonio. Se observa kit de emergencias en orden



Descripción Foto 10

Frente Tunales. Se observan trabajadores con EPPs

Componente Ambiental



Descripción Foto 11

frente San Antonio. Cargue de RCD



Descripción Foto 12

frente San Antonio. Acopio de RCD con contención .

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	COP-478 de 2022	CIN-161-2022
OBJETO	"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". GRUPO 1 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y laguna verde") .	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$11.624.693.181,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$2.324.938.636,20	$0,00
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	25/10/2025	20/06/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor	Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	26	23
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	7	4

SEMANA N. **60** **DEL** lunes, 28 de julio de 2025 **AL** domingo, 3 de agosto de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Trabajo Ejecutado	0,80%	17,91%
Valor del Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 90.100.136,75	$ 2.025.483.192,26

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO SAN ANTONIO	N/A	N/A	N/A	No se reporta actividad en este tramo
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	Se instala material B-200 sobre el filtro francés del K0+213 -K0+285 carril izquierdo, este queda compactado con canguro. En la tarde se retoma la excavación mecánica para el filtro en el K0+595 - K0+580 carril izquierdo en este proceso se retira una roca de la excavación en el K0+590 y se carga un viaje de 7.0 m3 de RCD el cuál es ubicado en el acopio temporal K1+210 . Para mañana se tiene programada la instalación del geotextil NT y el material triturado. **/** Se presentan constantes lluvias durante el día afectando el avance de obra , pese a está dificultad se realiza las siguientes obras; hacia las 9:00 am se presenta la Volqueta doble troque de placa STR -823 con un viaje de recebo B-200 para instalar sobre el filtro este es acopiado en el K0+140 y la instalación de este material se hace en la tarde,en los tramos del K0+284 -290 y en el K0+320 -333 carril izquierdo está actividad se suspende por lluvia. En esta misma volqueta se realiza el cargue y retiro de material RCD del acopio ubicado en el K1+210 (15.00m3) La excavación para el filtro francés se adelantó en la mañana y parte de la tarde del K0+580 -560 carril izquierdo , el material producto de la excavación es transportado al acopio temporal ubicado en el K1+210 ,se construye el filtro francés del K0+595 - 570 carril izquierdo de este elemento se debe nivelar el triturado y encapsular el material cerrando el geotextil NT con la costura longitudinal. **/** En la mañana se realiza la instalación de recebo B-200 sobre el filtro francés del K0+332 - K0+360 carril izquierdo está capa queda compactada con canguro, se suben dos viajes de material triturado para el filtro francés este es ubicado en el K0+440 , se avanza con la excavación mecánica para el filtro del K0+560 - K0+525 carril izquierdo, el material producto de está actividad es transportado al acopio temporal K1+210 , en la tarde se adelanta la construcción del filtro del K0+575 -K0+540 carril izquierdo en esta actividad hace falta nivelar el triturado y cerrar el encapsulado con la costura longitudinal. **/** Se avanza con la excavación mecánica para el filtro francés,esta actividad se dificulta por la presencia de roca , se rompe manualmente una parte rodeando la roca para pasar el filtro y se relacionan cinco metros de excavación en roca del K0+525 -K0+520 y excavación mecánica del K0+520 -K0+500 , también se avanza con la construcción del filtro del K0+540 -K0+520 C. Izq. El material producto de la excavación es transportado al acopio temporal ubicado en el K0+430 **/** Se avanza con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+500-K0+470 carril izquierdo, también se hace la construcción del filtro en el K0+520-K0+490 carril izquierdo en este elemento se nivela el triturado y se encapsula el material cerrando el geotextil NT 2500 con la costura longitudinal. **/**
TRAMO CAPITOLIO	No se programó	56,63%	N/A	No se reporta actividad en este tramo

NOTA:

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020" GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio I (K13+820 - K6+910), Capitolio y Laguna verde	GL	$11.624.693.181,00	No se programó	No se programó	0,797%	17,91%

Tramo Laguna Verde

Personal disponible en tramo
Personal del consorcio disponible: 1 residente de obra. 1 Residente ambiental. 1 Residente social. 5 auxiliares de obra. 1 Profesional SST. 1 Topógrafo. 1 Cadenero. 1 Oficial.
Maquinaria y equipos de obra 1 Retrocargador Oruga CAT . 1 Minicargador . 1 volqueta sencilla.1 Miniexcavadora. 1 canguro. 1 volqueta dobletroque
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 Profesional Ambiental. 1 topógrafo, 1 cadenero.

Acitividades realizadas
Lunes 28 de julio de 2025. Clima: Soleado y lluvia moderada en la tarde
Se instala material B-200 sobre el filtro francés del K0+213 -K0+285 carril izquierdo, este queda compactado con canguro.
En la tarde se retoma la excavación mecánica para el filtro en el K0+595 - K0+580 carril izquierdo en este proceso se retira una roca de la excavación en el K0+590 y se carga un viaje de 7.0 m3 de RCD el cuál es ubicado en el acopio temporal K1+210 .
Para mañana se tiene programada la instalación del geotextil NT y el material triturado.
Martes 29 de julio de 2025. Clima: lluvia intensa y moderna durante el día
Se presentan constantes lluvias durante el día afectando el avance de obra , pese a está dificultad se realiza las siguientes obras; hacia las 9:00 am se presenta la Volqueta doble troque de placa STR -823 con un viaje de recebo B-200 para instalar sobre el filtro este es acopiado en el K0+140 y la instalación de este material se hace en la tarde,en los tramos del K0+284 -290 y en el K0+320 -333 carril izquierdo está actividad se suspende por lluvia.
En esta misma volqueta se realiza el cargue y retiro de material RCD del acopio ubicado en el K1+210 (15.00m3)
La excavación para el filtro francés se adelantó en la mañana y parte de la tarde del K0+580 -560 carril izquierdo , el material producto de la excavación es transportado al acopio temporal ubicado en el K1+210 ,se construye el filtro francés del K0+595 - 570 carril izquierdo de este elemento se debe nivelar el triturado y encapsular el material cerrando el geotextil NT con la costura longitudinal.
Miércoles 30 julio de 2025. Clima: seco
En la mañana se realiza la instalación de recebo B-200 sobre el filtro francés del K0+332 - K0+360 carril izquierdo está capa queda compactada con canguro, se suben dos viajes de material triturado para el filtro francés este es ubicado en el K0+440 , se avanza con la excavación mecánica para el filtro del K0+560 - K0+525 carril izquierdo, el material producto de está actividad es transportado al acopio temporal K1+210 , en la tarde se adelanta la construcción del filtro del K0+575 -K0+540 carril izquierdo en esta actividad hace falta nivelar el triturado y cerrar el encapsulado con la costura longitudinal.
Jueves 31 de julio de 2025. Clima: seco
Se avanza con la excavación mecánica para el filtro francés,esta actividad se dificulta por la presencia de roca , se rompe manualmente una parte rodeando la roca para pasar el filtro y se relacionan cinco metros de excavación en roca del K0+525 -K0+520 y excavación mecánica del K0+520 -K0+500 , también se avanza con la construcción del filtro del
K0+540 -K0+520 C. Izq.
El material producto de la excavación es transportado al acopio temporal ubicado en el K0+430
Viernes 01 de agosto de 2025. Clima: lluvias fuertes en la mañana en la tarde seco
Se avanza con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+500-K0+470 carril izquierdo, también se hace la construcción del filtro en el K0+520-K0+490 carril izquierdo en este elemento se nivela el triturado y se encapsula el material cerrando el geotextil NT 2500 con la costura longitudinal.
Sábado 02 de agosto de 2025. Clima: Lluvia moderada y seco en la tarde
En la mañana se hace el alistamiento del sitio para hacer la excavación mecánica en la instalación de tubería para la alcantarilla en el K0+410 , no se puede iniciar la excavación debido a que se encuentra una gran roca en el encole , siendo necesario correr la ubicación de la alcantarilla al K0+406 , se inicia el proceso de excavación hacia las 11:30 am , se dificulta el avance por las rocas encontradas , terminando hacia las 6:00 pm con el perfilado de la excavación , para mañana se tiene programada la instalación del tubo y realizar los llenos hasta la rasante para habilitar el tránsito vehicular.
Domingo 03 de agosto de 2025. Clima: Lloviznas moderada en la mañana y seco en la tarde.
En la mañana se adelanta la excavación de la poceta y se perfila la sub rasante para la alcantarilla ubicada en el K0+405 , se instala una capa de material triturado para soporte del tubo, no se coloca concreto de limpieza ó solado ya que este debe cumplir con el tiempo de fraguado y con las lluvias que se tienen se lava el material y se pierde , se coloca el atraque a medio tubo en material triturado y luego se hace el lleno por capas en material de recebo B-200 estabilizado con cemento debido a que el material presenta humedad ,esto es sugerido por el contratista ,
Cómo no alcanza el material B-200 para el ancho de vía solo se nivela el carril derecho a nivel de rasante para habilitar el tránsito vehicular y carril izquierdo queda señalizado

OBSERVACIONES TRAMO LAGUNA VERDE: .Es necesario aclararle al contratista que el factor de compactación para el recebo B-200 es de 1.25 para garantizar una capa de veinte cm y no de 1.10 que no aplica para este material y queda una capa real de 0.17 cm lo cual no se ajusta al diseño ,está observación ya se le había hecho al contratista pero no ha sido atendida . En la excavación para el filtro francés se encuentra una piedra de 0.22 cm en el K0+590 está sobre sale del nivel requerido para la instalación de la tubería ,se le solicita al contratista demoler está piedra para dar continuidad a la tubería respetando el nivel ****/**** En la mañana se le solicita al contratista realizar el lavado del material triturado que tiene en el acopio ubicado en el K0+440 este es lavado superficialmente descargando algunos valdés con agua sobre el mismo pero en el momento de la instalación se observa que aún está contaminado , **aún así se instala el material en el filtro y recogiendo lo último que quedaba en el acopio se toma registro de la calidad del material que se está colocando** , el Cadenero que está operando **el minicargador gira el mini para evitar que tome la foto y por poco me atropella** , se molesta el topógrafo por qué no se permitió la instalación de este material contaminando. Es necesario que en el momento de hacer el trasiego de material triturado se limpie muy bien el volcó de la volqueta y el valde de la retro cargador para evitar que llegue contaminando el material, además en el sitio de descargue ó de acopio debe estar limpio y protegido con plástico al nivel del piso. ****/**** El material de triturado que se ubicó en el frente de trabajo es lavado, colocando algunos baldes de agua , pero **aún así se observa material contaminado** ,se le pide nuevamente al ing.Jhon Yate en mejorar el lavado pero finalmente ellos instalan este material en las condiciones ya mencionadas . El material producto de la excavación del filtro es transportado al acopio temporal ubicado en el K1+210 este material queda dentro del lote con ayuda de la mini retro , se espera que este material sea retirado en su totalidad y no forme parte del paisaje. ****/**** Se reitera la solicitud en mejorar el lavado del triturado antes de ser instalado ya que este presenta bastante material contaminado. ****/**** Es necesario mencionar que no se ha mejorado el proceso para la construcción del filtro francés, el material filtrante triturado presenta demasiado material contaminado debido a que el sitio de acopio presenta material organico de la excavación y lodo por el tránsito de vehículos , el lavado que se hace es colocar algunos baldes de agua sobre el material quedando igual.
La disposición de material RCD en "acopios temporales "no es la mejor ya que se está afectando especies arboreas , especies nativas , aves que anidan en estos sitios y fuentes hídricas , generando un daño ambiental grave por qué este material no lo van a poder retirar del sito ya que no es de fácil acceso. ****/**** Al terminar la excavación se replantea el eje ,el punto del descole esta más cargado a un lado , se le solicita al contratista garantizar el atraque de la tubería de ambos lados. Es necesario mencionar que la profesional SST no estuvo para el acompañamiento en la excavación de la tubería , en este proceso el personal tuvo que ingresar a la excavación para nivelación del terreno, perfilado y retiro de material remanente , Se desconoce si tienen firmados los ATS y permiso para el trabajo en alturas , ya que la excavación es de 2.20 metros aproximadamente ****/**** Se solicita el suministro de material recebo B-200 para realizar el lleno faltante en el carril izquierdo dela alcantarilla en el K0+405 y los llenos sobre el filtro francés del K0+470 -K0+610. El material de RCD que se acopio a un lado de la vía producto de los trabajos de excavación de la alcantarilla deben ser dispuestos en botadero autorizado y no ubicado en otro acopio temporal

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 478 –CONSORCIO GAVIONES 95.

Semana del 28 de julio al 3 de agosto del 2025

1.ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Tramo vial Laguna Verde.
Programa de información y participación comunitaria.
Pasacalle.
La interventoría solicita al Consorcio Gaviones 95 realizar instalación en el tramo vial de Laguna Verde en comité de seguimiento integral, se comprometen a realizar instalación antes del próximo comité.
Valla informativa:

La interventoría solicita al Consorcio Gaviones 95 realizar instalación en el tramo vial de Laguna Verde, en comité de seguimiento integral, se comprometen a realizar instalación antes del próximo comité.
Volante informativo:
Durante la semana del presente informe el contratista hace entrega de dos volantes informativos a la comunidad los cuales se enumeran a continuación.

9 volantes de cierre total del tramo vial por excavación e instalación tubo para alcantarilla de 36" ubicado en la abscisa K0+ 410
13 volantes informativos donde se informa los canales de atención al ciudadano en obra

Puntos satélites:

El profesional social realizó mantenimiento a los puntos satélites donde hace entrega e instalación del volante informativo de invitación a reunión del comité de participación ciudadana,
Tienda donde Nancy Ríos Martínez.
Casa de señor Auder Molina tienda.

Actas de vecindad
El profesional social realiza entrega de actas de vecindad se encuentran en revisión por parte de interventoría.
Recorrido

La interventoría realiza recorrido con el fin de realizar seguimiento a cada una de las actividades establecidas en el plan de Gestión Social.

Programa de atención al Usuario.
A la fecha del presente informe se realizó adecuación y apertura al punto de atención a la comunidad, el cual indica el componente social del contratista que se encuentra ubicado en la casa de la señora Clara Martínez con un horario de atención de los miércoles de 8: 30 a.m. a 3: 00 p.m. y los viernes de 8 a 12 del mediodía.
Y punto de atención móvil ubicado en la casa de la señora Marcela Martínez con un horario de atención de lunes de 10: 00 a.m. a 12 del mediodía, martes de 2:00 p.m. a 5: 00 p.m., jueves 2: 00 p.m. a 5: 00 p.m. La interventoría evidencia que se cumplió con el compromiso adquirido.

El 2 de agosto el profesional social realizó atención al ciudadano al señor Ramiro Martínez quien manifiesta que, el vehículo de la obra al realizar el giro para dirigirse al campamento de obra y punto de atención a la comunidad golpeo la señal de tránsito restrictiva también afectando un poste de la cerca, aunque no se ha observado el video, varias versiones de los residentes afirman que fue el vehículo que se utiliza para la movilización del Consorcio Gaviones 95.

Tramo Capitolio.
Pasacalle.
La interventoría solicita realizar reposición del pasacalle de frente de obra de Capitolio. La interventoría realiza entrega de comunicado donde informa que a la fecha el Consorcio no ha cumplido con la entrega de la documentación y realiza un llamado de atención el 1 julio del año en curso, mediante comunicado 186-1-729.
Se encuentra pendiente la instalación, en comité de seguimiento integral, se comprometen a realizar instalación antes del próximo comité.

Actas de compromiso:
La interventoría solicita entrega del consolidado de actas de compromiso de acopias de apertura y cierre a la fecha el consorcio no ha cumplido con la entrega.
Actas de vecindad
El profesional social realiza entrega de actas de vecindad se encuentran en revisión por parte de interventoría.
Vinculación de personal mano de obra.

El Consorcio Gaviones 95 cuenta en total con:

23 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:

Mano de obra calificada (MOC)

11 trabajadores profesionales, operarios y conductores

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

OBSERVACIONES AL CONSORCIO GAVIONES 95
Componente SST 4ta semana de julio 2025 tramo Laguna Verde
Personal Gaviones 95 // 02-08-25
1 Residente de obra. 1 Residente ambiental. 1 Residente social. 1 Topógrafo
1 Cadenero. 1 Oficial. 4 auxiliares de obra. 2 Operadores. 2 auxiliar de tráfico
2 conductores de volqueta

•Maquinaria y equipos de obra: 1 Minicargador. 1 Mini retro. 1 Retroexcavadora
1 Volqueta sencilla. 1 Volqueta doble cabina. 1 Canguro
•Para esta semana el consorcio Gaviones 95, realiza labores de replanteo topográfico
•Se observa señalización en excavación, se solicitó la implementación de la señalización con colombinas reflectivas lo cual se cumplió por partes, se solicitara en todo el tramo de excavación.
•Kit de emergencia en la carpa en orden
•Presencia del profesional SST en obra
•PMT instalado en orden
•Mini Retro excavadora de oruga presenta falla en el sistema hidráulico del brazo.
•Se observa extintor de camión con fecha vencida
•Volqueta sencilla presenta desgaste avanzado en llantas traseras
•Se solicitará certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas al personal que realiza trabajos a más de 2m
•Se solicitará certificado de competencia en operación de minicargador a operador del mismo ya que este ocupa también el cargo de cadenero dentro del proyecto

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

CONTRATO DE OBRA No. 478 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95

Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión de informe semanal remitido por el contratista
4.Se realiza revisión del informe mensual No 15 V2 del cual salen observaciones.
5.Participación del comité de seguimiento No 54.

Frente Laguna Verde

-Se evidencia señalización y delimitación con polimalla del acopio principal de material triturado
-Se mantienen delimitadas las alcantarillas del área de intervención
-Se evidencia señalización de materiales pétreos y RCD en el frente de obra.
-Se evidencia permanencia de señalización, preventiva, informativa y de emergencias ubicada en el tramo en intervención.
-Permanencia de kit de emergencias y kit control de derrames en campamento
-Campamento móvil en sitio
-Se mantiene señalización de zona de intervención con el filtro
-En este frente no se evidencio derrame de combustibles en el periodo
-Se cuenta con PMT implementado en el frente de obra, con dos auxiliares de trafico
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

No se presentan ítems no previstos

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

Componente Técnico



Descripción Foto 1.

Se le solicita al contratista realizar el lavado del material triturado que tiene en el acopio ubicado en el K0+440 este es lavado superficialmente descargando algunos valdés con agua sobre el mismo pero en el momento de la instalación se observa que aún está contaminado ,



Descripción Foto 2.

Se instala el material en el filtro y recogiendo lo último que quedaba en el acopio se toma registro de la calidad del material que se está colocando , el Cadenero que está operando el minicargador gira el mini para evitar que tome la foto y por poco me atropella , se molesta el topógrafo porque no se permitió la instalación de este material contaminado.



Descripción Foto 3.

Recebo B-200 se instala sobre el filtro, este es acopiado en el K0+140 y la instalación de este material se hace en la tarde,en los tramos del K0+284 -290 y en el K0+320 -333 carril izquierdo



Descripción Foto 4.

Recebo B-200 se instala sobre el filtro, este es acopiado en el K0+140 y la instalación de este material se hace en la tarde,en los tramos del K0+284 -290 y en el K0+320 -333 carril izquierdo

Componente Social



Descripción Foto 5

Comité de seguimiento integral # 54



Descripción Foto 6

Acompañamiento a ejercicio de control social

Componente SST

Descripción Foto 7

Se evidencia trabajadores realizando labores a una profundidad mayor a 2m los cuales deben tener curso de alturas

Descripción Foto 8

Se observan trabajadores con EPP en orden

Componente Ambiental



Descripción Foto 5

Punto Ecológico



Descripción Foto 5

Elementos de emergencia

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	COP-478 de 2022	CIN-161-2022
OBJETO	"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". GRUPO 1 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y laguna verde") .	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$11.624.693.181,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$2.324.938.636,20	$0,00
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	25/10/2025	20/06/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor	Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	26	23
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	7	4

SEMANA N. **61** **DEL** lunes, 4 de agosto de 2025 **AL** domingo, 10 de agosto de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			**EJECUTADO**		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Trabajo Ejecutado	0,80%	17,91%
Valor del Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 90.100.136,75	$ 2.025.483.192,26

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO SAN ANTONIO	N/A	N/A	N/A	No se reporta actividad en este tramo
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	Se encuentra sobre la excavación dos rocas que se rodean para dar continuidad al filtro. Se avanza con la excavación mecánica para el filtro francés del K0+470 -445 en este proceso se carga y se retira el material de excavación al acopio temporal ubicado en el K1+750 . Se encuentra sobre la excavación dos rocas que se rodean para dar continuidad al filtro. **/** Se realiza la construcción del filtro francés del K0+490-K0+445 carril izquierdo, se avanza con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+404 - K0+390 carril izquierdo, el material producto de la excavación es transportado al acopio temporal ubicado en el K1+750 carril derecho **/** Se realiza la excavación mecánica para el filtro francés del K0+394-K0+376 carril izquierdo, el material producto de la excavación es llevado al acopio temporal ubicado en el K1+750 carril derecho, también se construye el filtro francés del K0+404-K0+376 carril izquierdo **/** *Se realiza la excavación mecánica para el filtro francés del K0+810-K0+830 carril derecho, en la cual se hizo un avance de 30 metros Cabe resaltar que en la excavación se encontro una roca cuya dimensiones fueron 1.00 X 0.70 X 0.75 Se ejecuta la demolición en roca, el material producto de la excavación es llevado al acopio temporal ubicado en el K1+750 carril derecho, *Se realiza nivelación de filtro en la K 0+376 a la K0+404 **/** *Se realiza la excavación mecánica para el filtro francés del K0+810-K0+790 carril derecho, en la cual se hizo un avance de 20 metros Cabe resaltar que en las excavaciones para instalación de Filtro, han sido tediosas por la aparición de rocas de gran dimensión. *Se ejecuta la demoliciones en varias rocas el material producto de la excavación es llevado al acopio temporal ubicado en el K1+750 carril derecho **/** En la mañana se hace el alistamiento del sitio para hacer la excavación mecánica para instalación de tubería para la alcantarilla en el K0+132 , la cual se lleva a cabo
TRAMO CAPITOLIO	No se programó	56,63%	N/A	No se reporta actividad en este tramo

NOTA:

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN	GL	$11.624.693.181,00	No se programó	No se programó	0,797%	17,91%

Tramo Laguna Verde

Personal disponible en tramo
Personal del consorcio disponible: 1 residente de obra. 1 Residente ambiental. 1 Residente social. 2 auxiliares de obra. 1 Profesional SST. 1 Topógrafo. 1 Cadenero. 1 Oficial. 2 operadores.
Maquinaria y equipos de obra 1 Retrocargador Oruga CAT . 1 Minicargador . 1 volqueta sencilla.1 Miniexcavadora. 1 canguro. 1 camión
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 Profesional Ambiental. 1 topógrafo, 1 cadenero.

Acitividades realizadas
Lunes 04 de agosto de 2025. Clima: Lluvia intensa en la mañana y moderada en la tarde.
Se avanza con la excavación mecánica para el filtro francés del K0+470 -445 en este proceso se carga y se retira el material de excavación al acopio temporal ubicado en el K1+750 .
Se encuentra sobre la excavación dos rocas que se rodean para dar continuidad al filtro.
Se avanza con la excavación mecánica para el filtro francés del K0+470 -445 en este proceso se carga y se retira el material de excavación al acopio temporal ubicado en el K1+750 .
Se encuentra sobre la excavación dos rocas que se rodean para dar continuidad al filtro.
Martes 05 de agosto de 2025. Clima: seco
Se realiza la construcción del filtro francés del K0+490-K0+445 carril izquierdo, se avanza con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+404 - K0+390 carril izquierdo, el material producto de la excavación es transportado al acopio temporal ubicado en el K1+750 carril derecho
Miércoles 06 agosto de 2025. Clima: seco
Se realiza la excavación mecánica para el filtro francés del K0+394-K0+376 carril izquierdo, el material producto de la excavación es llevado al acopio temporal ubicado en el K1+750 carril derecho, también se construye el filtro francés del K0+404-K0+376 carril izquierdo
Jueves 07 de agostode 2025. Clima: lluvioso
*Se realiza la excavación mecánica para el filtro francés del K0+810-K0+830 carril derecho, en la cual se hizo un avance de 30 metros
Cabe resaltar que en la excavación se encontro una roca cuya dimensiones fueron 1.00 X 0.70 X 0.75
Se ejecuta la demolición en roca, el material producto de la excavación es llevado al acopio temporal ubicado en el K1+750 carril derecho,
*Se realiza nivelación de filtro en la K 0+376 a la K0+404
Viernes 08 de agosto de 2025. Clima: lluvioso
*Se realiza la excavación mecánica para el filtro francés del K0+810-K0+790 carril derecho, en la cual se hizo un avance de 20 metros
Cabe resaltar que en las excavaciones para instalación de Filtro, han sido tediosas por la aparición de rocas de gran dimensión.
*Se ejecuta la demoliciones en varias rocas el material producto de la excavación es llevado al acopio temporal ubicado en el K1+750 carril derecho,
Sábado 09 de agosto de 2025. Clima:

OBSERVACIONES TRAMO LAGUNA VERDE: Se le solicita al contratista el suministro de material de recebo B-200 para terminar de hacer los llenos en el cruce de vía de la alcantarilla K0+405 carril izquierdo e iniciar la instalación de recebo B-200 sobre el filtro.
Se requiere el suministro de material triturado para la construcción del filtro. Es necesario que se programe volqueta para el cargue de material RCD de los acopios temporales y disposición a botaderos autorizados. **/** La excavación mecánica que realiza para el filtro del K+445 -K0+437 no es posible continuar ya que se encuentra rocas de gran tamaño, se suspende está actividad y se inicia un nuevo tramo del K0+404-K0+372 carril izquierdo. Es necesario mencionar que el día de ayer el contratista instala un material triturado contaminado con demasiados finos y arcilla en el tramo del K0+490 -K0+455 se le solicita al contratista sacar el material y realizar el lavado pero lo que hacen es lavarlo en el filtro, esto hará que se tape la tubería. Queda en observación este tramo. **/** Se le solicita al contratista el retiro del material triturado contaminado que fue instalado dentro del filtro , este material debe ser lavado fuera del filtro para evitar que se tape la tubería perforada ****/**** *Se le solicito al contratista el retiro del material triturado contaminado que fue instalado dentro del filtro en un tramo de 45 metros. Lo cual se sacó gran cantidad de material triturado contaminado. ****/**** *Se le solicito el día 6/08/2025 al contratista el retiro del material triturado contaminado que fue instalado dentro del filtro en un tramo de 45 metros. En Lo cual se sacó gran cantidad de material triturado contaminado y hasta el día de hoy culminó con la tarea. **/** *Al terminar la excavación se replanteó del eje, el punto de encole y descole. Se le solicita al contratista garantizar el atraque de la tubería de ambos lados. Es necesario mencionar que se hizo ATS para esta actividad, en este proceso el personal tuvo que ingresar a la excavación para nivelación del terreno, perfilado y retiro de material remanente

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1.ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Tramo vial Laguna Verde.
Programa de información y participación comunitaria.

Pasacalle.
La interventoría solicita al Consorcio Gaviones 95 realizar instalación en el tramo vial de Laguna del pasacalle y hace entrega de un llamando de atención mediante comunicado 186-1-793 del 7 de agosto del 2025 y solicita la instalación de manera inmediata

Valla informativa:
La interventoría solicita al Consorcio Gaviones 95 realizar instalación en el tramo vial de Laguna Verde, y hace entrega de un llamando de atención mediante comunicado 186-1-793 del 7 de agosto del 2025 y solicita la instalación de manera inmediata.

Volante informativo:
Durante la semana del presente informe el contratista hace entrega de un volante informativo de cierre total por excavación e instalación de tubo de 36" en la abscisa K0 +132 frente al predio de la señora Felisa Pardo, sábado 9 de agosto desde las 7: 00 a.m. hasta el 11 de agosto del año en cuso hasta las 6 p.m. este es revisado y avalado por la interventoría. Entrega 11 volantes puerta a puerta.
Puntos satélites:

El profesional social realizó mantenimiento a los puntos satélites con el volante informativo de cierre vial programado para el fin de semana.
Tienda donde Nancy Ríos Martínez.
Casa de señor Auder Molina tienda.

Actas de vecindad
El profesional social realiza entrega de actas de vecindad se encuentran en revisión por parte de interventoría. Recorrido

La interventoría realiza recorrido con el fin de realizar seguimiento a cada una de las actividades establecidas en el plan de Gestión Social.
Programa de atención al Usuario.

A la fecha del presente informe se realizó adecuación y apertura al punto de atención a la comunidad, el cual indica el componente social del contratista que se encuentra ubicado en la casa de la señora Clara Martínez con un horario de atención de los miércoles de 8: 30 a.m. a 3: 00 p.m. y los viernes de 8 a 12 del mediodía. Y punto de atención móvil ubicado en la casa de la señora Marcela Martínez con un horario de atención de lunes de 10: 00 a.m. a 12 del mediodía, martes de 2:00 p.m. a 5: 00 p.m., jueves 2: 00 p.m. a 5: 00 p.m. La interventoría evidencia que se cumplió con el compromiso adquirido.

El 8 de agosto del año en curso, el profesional social realizó seguimiento a la queja presentada por el señor Ramiro Martínez quien manifiesta que, el vehículo de la obra al realizar el giro para dirigirse al campamento de obra y punto de atención a la comunidad golpeo la señal de tránsito restrictiva 95.
Tramo Capitolio.
Pasacalle.
La interventoría solicita realizar reposición del pasacalle de frente de obra de Capitolio. La interventoría realiza entrega de comunicado donde informa que a la fecha el Consorcio no ha cumplido con la entrega de la documentación y realiza un llamado de atención el 7 agosto del año en curso, mediante comunicado 186-1-793 del 7 de agosto del 2025 y solicita la instalación de manera inmediata.
Actas de compromiso:
El contratista durante la semana no realiza actas de compromiso.
Actas de vecindad
El profesional social realiza entrega de actas de vecindad se encuentran en revisión por parte de interventoría.

Vinculación de personal mano de obra.

El Consorcio Gaviones 95 cuenta en total con:

22 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:

Mano de obra calificada (MOC)

16 trabajadores profesionales, operarios y conductores.
Total, de porcentaje 72,72 %

Mano de obra no calificada (MONC)

6 trabajadores de la localidad
Porcentaje de cumplimiento un 100 %

Mujeres porcentaje 6 de cumplimiento 27,27%

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Personal Gaviones 95 // 05-08-25
1 Residente de obra. 1 Residente ambiental. 1 Residente social. 1 Profesional SST
1 Topógrafo. 1 Cadenero. 3 Auxiliares de obra. 2 Auxiliares de tráfico. 2 conductores
2 Operadores
•Maquinaria y equipos de obra: 1 Minicargador. 1 Mini retro. 1 Retroexcavadora.
1 Volqueta sencilla. 1 Volqueta doble cabina. 1 Canguro
•Para esta semana el consorcio Gaviones 95, realiza labores de replanteo topográfico
•Kit de emergencia en la carpa en orden
•Presencia del profesional SST en obra
•PMT instalado en orden
•Se solicitará certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas al personal que realiza trabajos a más de 2m
•Se solicitó mediante comunicado No. 186-1-799 sobre: certificado de competencia en operación de minicargador a operador del mismo ya que este ocupa también el cargo de cadenero dentro del proyecto, Volqueta sencilla presenta desgaste avanzado en llantas traseras, Se observa extintor de camión con fecha vencida, Se observa señalización en excavación, se solicitó la implementación de la señalización con colombinas reflectivas lo cual se cumplió por partes, se solicitara en todo el tramo de excavación.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Informe Semanal: SEMANA 04 al 10 agosto 2025.
Componente Ambiental
CONTRATO DE OBRA No. 478 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95
Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión de informe semanal remitido por el contratista
4.Se remite oficio con observaciones del informe mensual No 15 V2
5.Se remite oficio con observaciones de los acopios de residuos de excavación RCD.
6.Participación del comité de seguimiento No 55.
Frente Laguna Verde
-Se evidencia señalización y delimitación con polimalla del acopio principal de material triturado
-Se mantienen delimitadas las alcantarillas del área de intervención
-Se evidencia señalización parcial de materiales pétreos y RCD en el frente de obra.
-Se evidencia permanencia de señalización, preventiva, informativa y de emergencias ubicada en el tramo en intervención.
-Permanencia de kit de emergencias y kit control de derrames en campamento
-Campamento móvil en sitio
-Se mantiene señalización de zona de intervención con el filtro, en el K 0+000 a K 0+400 con doble cinta y delineadores tubulares ubicados de forma intercalada con estacas de madera.
-En este frente no se evidencio derrame de combustibles en el periodo
-Se cuenta con PMT implementado en el frente de obra, con dos auxiliares de trafico
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). Se evidencian acopios de RCD ubicados a los costados de via, los cuales se sugiere se den prioridad para su retiro hacia acopio temporal o sitio de disposición final, de igual manera que se mantengan cubiertos para evitar afectaciones sobre la via por lavado del material. K0+420, K 0+120.
-Se evidencia acopios de RCD K 0+140, donde se encuentra aun un remante de RCD, se requiere su evacuación total.
-K 1+750, 1+440, 1+120, 0+480 acopio de RCD, se solicita que este material de excavación sea señalizado y cubierto mientras se procede con su retiro hacia sitio de disposición final. adecuar estar áreas para evitar afectaciones sobre la via.
-K 1+220 se recomienda que el RCD acopiado se contenga de tal manera que evite su caída hacia la parte posterior del acopio, ya que esta en un lugar con bastante pendiente, lo que hace complicado su retiro posterior, en el periodo se procedió a colocar cercado y el contratista informo que en este acopio no van a acopiar mas RCD y posteriormente iniciaran con su retiro hacia sitio de disposición final.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

No se presentan ítems no previstos

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

Componente Técnico



Descripción Foto 1.

Construccion de filtro



Descripción Foto 2.

Excavación para alcantarilla



Descripción Foto 3.

Es necesario mencionar que el día de ayer el contratista instala un material triturado contaminado con demasiados finos y arcilla en el tramo del K0+490 -K0+455 se le solicita al contratista sacar el material y realizar el lavado pero lo que hacen es lavarlo en el filtro, esto hará que se tape la tubería.



Descripción Foto 4.


Es necesario mencionar que el día de ayer el contratista instala un material triturado contaminado con demasiados finos y arcilla en el tramo del K0+490 -K0+455 se le solicita al contratista sacar el material y realizar el lavado pero lo que hacen es lavarlo en el filtro, esto hará que se tape la tubería.

Componente Social



Descripción Foto 5


Comité de seguimiento integral # 55

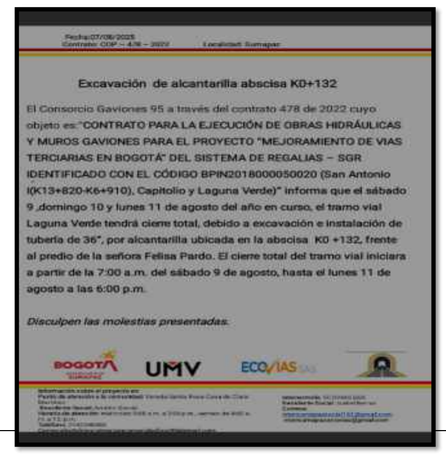

Descripción Foto 6

Volante informativo

Componente SST

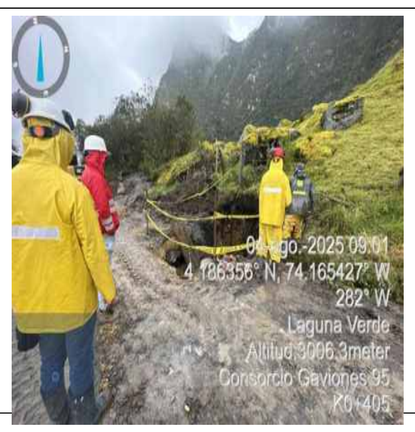

Descripción Foto 7

Se observa señalización y se solicita la señalización con colombinas con bandas reflectivas



Descripción Foto 8

Se evidencia desgaste en llantas traseras en volqueta de obra

Componente Ambiental



Descripción Foto 5

Acopio de RCD que requiere cubrimiento



Descripción Foto 5

Cargue de RCD hacia acopio temporal

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	COP-478 de 2022	CIN-161-2022
OBJETO	"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". GRUPO 1 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y laguna verde") .	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$11.624.693.181,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$2.324.938.636,20	$0,00
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	25/10/2025	20/06/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor	Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	26	23
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	7	4

SEMANA N. **63** **DEL** lunes, 18 de agosto de 2025 **AL** domingo, 24 de agosto de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Trabajo Ejecutado	2,78%	19,89%
Valor del Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 322.731.758,39	$ 2.312.112.001,22

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO SAN ANTONIO	N/A	N/A	N/A	No se reporta actividad en este tramo
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	Nivelación de filtro francés con triturado y se realiza el encapsulado y la costura longitudinal en el K0+830-K0+780 carril derecho, se continúa la excavación mecánica para el filtro francés del K0+780-K0+760 carril derecho,el material producto de la excavación es acopiado en la curva de la vía K0+760 carril izquierdo. . se continúa la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+760-730 carril derecho el material producto de la excavación es transportado al acopio temporal ubicado en el K1+750, también se realiza la instalación de recebo sobre el filtro francés en el K0+363-K0+376, K0+582-K0+600, K0+790-K0+830 y K0+444-K0+455. Se relaciona la instalación de recebo en una excavación perdida por presencia de roca en el K0+444-K0+437. Se continúa con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+730 al K0+720 el material producto de la excavación es transportado y ubicado en el acopio K1+750. Se construye el filtro francés en el K0+790 al K0+760 Se continúa con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+720-710, el material producto de la excavación es transportado y ubicado en el acopio temporal K1+750. Se avanza con la construcción del filtro francés en el K0+760 -720 Carril derecho Se continúa con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+710 -K0+700 carril derecho, el material producto de la excavación es transportado y ubicado en el acopio temporal K1+750 carril izquierdo. Se avanza con la construcción del filtro francés en el K0+720 - K0+710 carril derecho Se avanza con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+700-K0+670 carril derecho en el proceso de excavación se descubren varias rocas de gran tamaño en el K0+686 y en el K0+675 al K0+670 carril derecho
TRAMO CAPITOLIO	No se programó	64,65%	N/A	No se reporta actividad en este tramo

NOTA:

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020" GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio I (K13+820 - K6+910), Capitolio y Laguna verde	GL	$11.624.693.181,00	No se programó	No se programó	2,776%	19,89%

Tramo Laguna Verde
Personal disponible en tramo
Personal del consorcio disponible: 1 residente de obra. 1 residente ambiental. 1 residente social.1 Profesional SST. 1 topógrafo. 1 cadenero.5 auxiliares de obra. 2 auxiliares de tráfico. 2 conductores. 1 oficial. 2 operadores.
Maquinaria y equipos de obra 1 Retrocargador Oruga CAT. 1 Minicargador. 1 volqueta sencilla.1 Miniexcavadora. 1 canguro. 1 camión
Actividades realizadas
Martes 19 de agosto de 2025. Clima: Seco en la mañana y lluvia moderada en la tarde
Nivelación de filtro francés con triturado y se realiza el encapsulado y la costura longitudinal en el K0+830-K0+780 carril derecho, se continúa la excavación mecánica para el filtro francés del K0+780-K0+760 carril derecho, el material producto de la excavación es acopiado en la curva de la vía K0+760 carril izquierdo.
Miércoles 20 de agosto de 2025. Clima Soleado todo el día
Se realiza la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+760-730 carril derecho el material producto de la excavación es transportado al acopio temporal ubicado en el K1+750, también se realiza la instalación de recebo sobre el filtro francés en el K0+363-K0+376, K0+582-K0+600, K0+790-K0+830 y K0+444-K0+455.
Se relaciona la instalación de recebo en una excavación perdida por presencia de roca en el K0+444-K0+437.
Jueves 21 de agosto de 2025 Clima Seco todo el día
Se continúa con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+730 al K0+720 el material producto de la excavación es transportado y ubicado en el acopio K1+750.
Se construye el filtro francés en el K0+790 al K0+760
Viernes 22 de agosto de 2025 Clima Seco todo el día
Se continúa con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+720-710, el material producto de la excavación es transportado y ubicado en el acopio temporal K1+750.
Se avanza con la construcción del filtro francés en el K0+760 -720 Carril derecho
Sábado 23 de agosto de 2025 Clima Seco todo el día
Se continúa con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+710 -K0+700 carril derecho, el material producto de la excavación es transportado y ubicado en el acopio temporal K1+750 carril izquierdo.
Se avanza con la construcción del filtro francés en el K0+720 - K0+710 carril derecho
Domingo 24 de agosto de 2025 Clima Seco todo el día
Se avanza con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+700-K0+670 carril derecho en el proceso de excavación se descubren varias rocas de gran tamaño en el K0+686 y en el K0+675 al K0+670 carril derecho, esto imposibilita continuar con la construcción del filtro, se requiere con urgencia un demoledor ó martillo hidráulico para fracturar la roca encontrada.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

"CONTRATO DE OBRA No. 478 –CONSORCIO GAVIONES 95.
Semana del 18 al 24 de agosto del 2025
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Tramo vial Laguna Verde.
Programa de información y participación comunitaria.
Pasacalle.
La interventoría solicita al Consorcio Gaviones 95 realizar instalación en el tramo vial de Laguna Verde y Capitolio del pasacalle. A la fecha no se ha hecho la instalación.
Valla informativa:
La interventoría solicita al Consorcio Gaviones 95 realizar instalación en el tramo vial de Laguna Verde a la fecha no se ha hecho la instalación.
Volante informativo:
Durante la semana del presente informe el consorcio no ha hecho entrega de volantes informativos a la comunidad.
Puntos satélites:
El profesional social realizó mantenimiento a los puntos satélites con el volante informativo de cierre vial programado para el fin de semana.
Tienda donde Nancy Ríos Martínez.
Casa de señor Auder Molina tienda. Instalado los volantes informativos de cierres viales.
Actas de vecindad
El profesional social realiza entrega de actas de vecindad de apertura, fueron revisadas por interventoría, presentaron observaciones.
Recorrido
La interventoría realiza recorrido con el fin de realizar seguimiento a cada una de las actividades establecidas en el plan de Gestión Social.
Programa de atención al Usuario.
A la fecha del presente informe se realizó adecuación y apertura al punto de atención a la comunidad, el cual indica el componente social del contratista que se encuentra ubicado en la casa de la señora Clara Martínez con un horario de atención de los miércoles de 8: 30 a.m. a 3: 00 p.m. y los viernes de 8 a 12 del mediodía. Y punto de atención móvil ubicado en la casa de la señora Marcela Martínez con un horario de atención de lunes de 10: 00 a.m. a 12 del mediodía, martes de 2:00 p.m. a 5: 00 p.m., jueves 2: 00 p.m. a 5: 00 p.m. la interventoría verifica que se realizó la adecuación del punto de atención y móvil instalando cartelera informativa.
El 8 de agosto del año en curso, el profesional social realizó seguimiento a la queja presentada por el señor Ramiro Martínez quien manifiesta que, el vehículo de la obra al realizar el giro para dirigirse al campamento de obra y punto de atención a la comunidad golpeo la señal de tránsito restrictiva 95 y afecta la cerca del predio, el profesional social realizó Visita, y manifiesta no entrar al propietario, se encuentra pendiente la apertura cierre PQRS con registro fotográfico.
Tramo Capitolio.
Pasacalle.
La interventoría solicita realizar reposición del pasacalle de frente de obra de Capitolio. La interventoría realiza entrega de comunicado donde informa que a la fecha el Consorcio no ha cumplido con la entrega de la documentación y realiza un llamado de atención el 7 agosto del año en curso, mediante comunicado 186-1-793 y solicita la instalación de manera inmediata, al cierre del presente informe la interventoría evidencia que no se ha realizado la instalación, en comité de seguimiento integral solicita su instalación.
Actas de compromiso:
El contratista durante la semana no realiza actas de compromiso.
Actas de vecindad
El profesional social realiza entrega de actas de vecindad se encuentran en revisión por parte de interventoría.
Vinculación de personal mano de obra.
El Consorcio Gaviones 95 cuenta en total con:
24 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:
Mano de obra calificada (MOC)
17 trabajadores profesionales, operarios y conductores.
Total, de porcentaje 70,83 %
Mano de obra no calificada (MONC)
7 trabajadores de la localidad
Porcentaje de cumplimiento un 100 %
Mujeres porcentaje 6 de cumplimiento 25%
Personal en condición de discapacidad 1
2. INFORMES MENSUALES
La interventoría informe que se encuentran revisados los informe 10, 11, 12 los cuales se encuentran sin firma del profesional que elaboro el informe y del profesional que reviso el informe, se encuentran pre- aprobados se solicita subsanar, a la fecha de cierre del presente informe no se ha realizado entrega.
El informe mensual 13 presento observaciones, el consorcio Gaviones 95, el 20 de agosto del año en curso hace entrega del informe V1, Se encuentra en revisión por parte de interventoría.
El informe mensual 14 presento observaciones al cierre del presente informe no ha realizado entrega.
El informe mensual 15, el Consorcio Gaviones 95 realizó entrega del informe el 12 de agosto por correo electrónico, la interventoría emite respuesta mediante comunicado 186-1-821 el 22 de agosto del año curso, con observaciones.
El informe mensual 16, el Consorcio Gaviones 95 realizó entrega del informe el 7 de agosto por correo electrónico, la interventoría emite respuesta mediante comunicado 186-1-821 el 22 de agosto del año curso, con observaciones
4. INFORMES SEMANALES
El profesional social del consorcio Gaviones 95, hace entrega de los informes semanales en su totalidad.
5. COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
La interventoría cita a comité de seguimiento integral # 57, el 22 de agosto del 2025, donde se encuentran los componentes SST, técnico, ambiental y social, de la unidad de mantenimiento vial e interventoría no se presenta el Consorcio Gaviones 95, con el fin de realizar seguimiento al proyecto. "

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Personal Gaviones 95 // 05-08-25
1 Residente de obra. 1 Residente ambiental. 1 Residente social. 1 Profesional SST
1 Topógrafo. 1 Cadenero. 3 Auxiliares de obra. 2 Auxiliares de tráfico. 2 conductores
2 Operadores
- Maquinaria y equipos de obra: 1 Minicargador. 1 Mini retro. 1 Retroexcavadora.

1 Volqueta sencilla. 1 Volqueta doble cabina. 1 Canguro
- Para esta semana el consorcio Gaviones 95, realiza labores de replanteo topográfico
- Kit de emergencia en la carpa en orden
- Presencia del profesional SST en obra
- PMT instalado en orden
- Se solicitará certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas al personal que realiza trabajos a más de 2m
- Se solicitó mediante comunicado No. 186-1-799 sobre: certificado de competencia en operación de minicargador a operador del mismo ya que este ocupa también el cargo de cadenero dentro del proyecto, Volqueta sencilla presenta desgaste avanzado en llantas traseras, Se observa extintor de camión con fecha vencida, Se observa señalización en excavación, se solicitó la implementación de la señalización con colombinas reflectivas lo cual se cumplió por partes, se solicitara en todo el tramo de excavación.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Informe Semanal: SEMANA 18 al 24 agosto 2025.
Componente Ambiental

CONTRATO DE OBRA No. 478 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95

Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión de informe semanal remitido por el contratista
4.Se remite oficio con el aval del informe mensual No 15 V2
5.Participación del comité de seguimiento No 57.

Frente Laguna Verde

-Se evidencia señalización y delimitación con polimalla del acopio principal de material triturado
-Se mantienen delimitadas las alcantarillas del área de intervención, se solicitó mejorar la delimitación de la estructura hidráulica de la abscisa 1+740
-Se evidencia señalización parcial de materiales pétreos y RCD en el frente de obra.
-Se evidencia permanencia de señalización, preventiva, informativa y de emergencias ubicada en el tramo en intervención.
-Permanencia de kit de emergencias y kit control de derrames en campamento
-Campamento móvil en sitio
-Se mantiene señalización de zona de intervención con el filtro, en el K 0+000 a K 0+400 con doble cinta y delineadores tubulares ubicados de forma intercalada con estacas de madera.
-En este frente no se evidencio derrame de combustibles en el periodo
-Se cuenta con PMT implementado en el frente de obra, con dos auxiliares de trafico
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio acopios sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). Se evidencian acopios de RCD ubicados a los costados de via, los cuales se sugiere se den prioridad para su retiro hacia acopio temporal o sitio de disposición final, de igual manera que se mantengan cubiertos para evitar afectaciones sobre la via por lavado del material. K0+420,
-Se evidencia acopio de RCD K 0+420 ubicado al costado de via, sin cubrimiento, obstaculizando la cuneta y por ende el drenaje del agua de escorrentía, lo cual está ocasionando la afectación de via, se solicitó el retiro de estos materiales de manera inmediata. El contratista inicio retiro el día 24 de agosto, si embargo se mantiene gran volumen e TRCD den este punto.
-K 1+750, 1+440, 1+120, 0+420 acopio de RCD, se solicita que este material de excavación sea señalizado y cubierto mientras se procede con su retiro hacia sitio de disposición final. adecuar estar áreas para evitar afectaciones sobre la via.
-K 1+220 se recomienda que el RCD acopiado se contenga de tal manera que evite su caída hacia la parte posterior del acopio, ya que está en un lugar con bastante pendiente, lo que hace complicado su retiro posterior, el contratista informo que en este acopio no van a acopiar más RCD y posteriormente iniciaran con su retiro hacia sitio de disposición final. Se mantiene esta observación hasta que sea evacuado todo el material
-K 1+740 acopio de RCD, se solicitó protección de los individuos arbóreos que se encuentran en el área, así mismo que se inicie la evacuación hacia sitio de disposición final del RCD acopiado en este punto, se recomendó verificar la distancia mínima de 30 mts de este acopio de un cuerpo de agua que pasa por el sector.
-Se solicito al contratista que debe contar con las actas de autorización del uso de acopios temporales.
-Se mantiene solicitud realizada al contratista mediante comité de obra No 55, que previo a la implementación de un acopio de RCD, sea informado el lugar a la interventoría para realizar acompañamiento y verificación de las condiciones del sitio, y garantizar que técnicamente es viable la ubicación de residuos de excavación de manera temporal en esta área.
-Se solicito en el periodo el etiquetado de los recipientes con sustancias químicas, específicamente combustible. Se recomienda al contratista que no se emplee madera de la zona para colocar la cinta de delimitación de la excavación para filtro, debe emplearse los elementos como son los delineadores tubulares respectivos.
-Se realizo recorrido de verificación de los POC en el tramo, de lo cual se levanto acta la cual fue socializada a la UMV y Consorcio. Se identificaron 4 estructuras hidráulicas que van hacer intervenidas pro el consorcio lagunas nuevas y otras existentes.
Frente Capitolio
-No se evidencia desarrollo de actividades por parte del contratista.

Frente San Antonio

-No se evidencia desarrollo de actividades por parte del contratista.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

No se presentan ítems no previstos

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

Componente Técnico



Descripción Foto 1.

Construccion de filtro



Descripción Foto 2.

Excavación para filtro, demolición de roca con martillo nehumatico



Descripción Foto 3.

conformación sobre filtro con B 200



Descripción Foto 4.

Demolición de roca para excavación y posteror construcción de filtro.



Descripción Foto 5

Construcción de filtro



Descripción Foto 6

Excavación y demolición de roca en zanja para construcción fe filtro.



Descripción Foto 7

Instalación de geotextil para construcción de filtro



Descripción Foto 8


Conformación con B200 sobre filtro

Componente Social



Descripción Foto 9

cartelera informativa

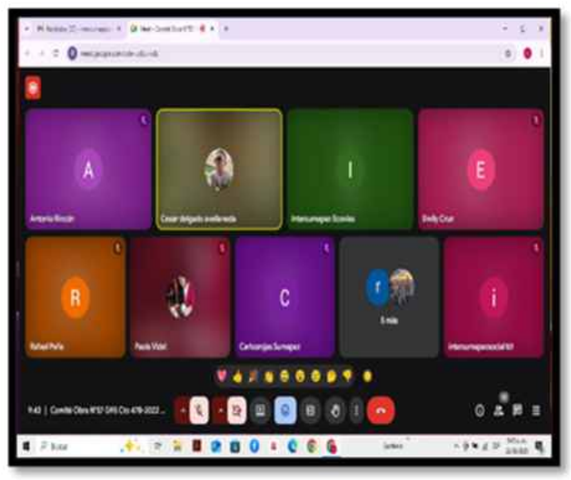

Descripción Foto 10

Comité de obra numero 57

Componente SST



Descripción Foto 11

Campamento en orden



Descripción Foto 12


Carrotanque JTR530 con llantas traseras desgastadas, Kit de emergencias en orden

Componente AMBIENTAL



Descripción Foto 13

Acopio de RCD que requiere cubrimiento

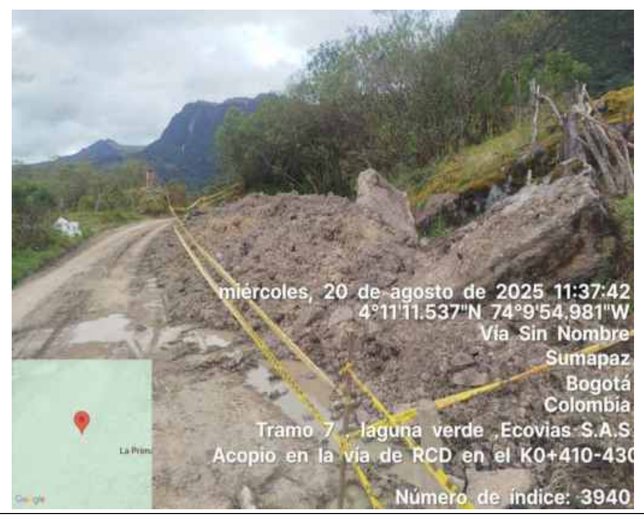

Descripción Foto 14

Se requiere retiro de escombros

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	COP-478 de 2022	CIN-161-2022
OBJETO	"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". GRUPO 1 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio I (K13+820-K6+910), Capitolio y laguna verde") .	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO GAVIONES 95	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$11.624.693.181,00	$3.104.380.144,00
ANTICIPO	$2.324.938.636,20	$0,00
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	25/10/2025	20/06/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S - Interventor	Alcalde Local - Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	26	23
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	7	4

SEMANA N. **64** **DEL** lunes, 25 de agosto de 2025 **AL** lunes, 1 de septiembre de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Trabajo Ejecutado	2,78%	19,89%
Valor del Trabajo Programado	No se programó	No se programó	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 322.731.758,39	$ 2.312.112.001,22

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO SAN ANTONIO	N/A	N/A	N/A	No se reporta actividad en este tramo
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	Nivelación de filtro francés con triturado y se realiza el encapsulado y la costura longitudinal en el K0+830-K0+780 carril derecho, se continúa la excavación mecánica para el filtro francés del K0+780-K0+760 carril derecho,el material producto de la excavación es acopiado en la curva de la vía K0+760 carril izquierdo. . **/** se continúa la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+760-730 carril derecho el material producto de la excavación es transportado al acopio temporal ubicado en el K1+750, también se realiza la instalación de recebo sobre el filtro francés en el K0+363-K0+376, K0+582-K0+600, K0+790-K0+830 y K0+444-K0+455. Se relaciona la instalación de recebo en una excavación perdida por presencia de roca en el K0+444-K0+437. **/** Se continúa con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+730 al K0+720 el material producto de la excavación es transportado y ubicado en el acopio K1+750. Se construye el filtro francés en el K0+790 al K0+760 **/** Se continúa con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+720-710, el material producto de la excavación es transportado y ubicado en el acopio temporal K1+750. Se avanza con la construcción del filtro francés en el K0+760 -720 Carril derecho ++++ Se continúa con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+710 -K0+700 carril derecho, el material producto de la excavación es transportado y ubicado en el acopio temporal K1+750 carril izquierdo. Se avanza con la construcción del filtro francés en el K0+720 - K0+710 carril derecho +++ Se avanza con la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+700-K0+670 carril derecho en el proceso de excavación se descubren varias rocas de gran tamaño en el K0+686 y en el K0+675 al K0+670 carril derecho
TRAMO CAPITOLIO	No se programó	64,65%	N/A	No se reporta actividad en este tramo

NOTA:

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA:

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020" GRUPO 1: CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTA", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio I	GL	$11.624.693.181,00	No se programó	No se programó	2,776%	19,89%

LAGUNA VERDE
Personal disponible en tramo
Personal del consorcio disponible: 1 residente de obra. 1 residente ambiental. 1 residente social.1 Profesional SST. 1 topógrafo. 1 cadenero.5 auxiliares de obra. 2 auxiliares de tráfico. 2 conductores. 1 oficial. 2 operadores.
Maquinaria y equipos de obra 1 Retrocargador Oruga CAT. 1 Minicargador. 1 volqueta sencilla.1 Miniexcavadora. 1 canguro. 1 camión
Actividades realizadas
Lunes 25 de agosto 2025
Clima: Seco todo el día
Se suspenden temporalmente las actividades de obra debido a fallas mecánicas en la retroexcavadora y el minicargador, este último equipo se desvara a las 2:30 pm, se realiza el cargue de la volqueta sencilla con material triturado y se construye un tramo de filtro francés en el K0+700-K0+688 carril derecho.
Martes 26 de agosto de 2025
Clima: Seco en la mañana y lluvia intensa al final de la tarde.
En la mañana se realiza un mejoramiento con rajón en algunos baches de la vía para mejorar la transitabilidad, en la tarde se instala recebo B-200 sobre el filtro francés en el K0+363 al K0+376 carril derecho este material es compactado con compactador mecánico, también se realiza el retiro parcial de material RCD que se encuentra en el acopio K0+420 carril derecho, este material es transportado al acopio temporal ubicado en el K1+750.
Por último, la interventoría recibe el nivel del filtro francés del K0+780 al K0+710 carril derecho.
Miércoles 27 de agosto de 2025
Clima: Seco en la mañana y lluvia intensa al final de la tarde.
No sé registra el avance de obra por fallas mecánicas, en las máquinas retroexcavadora y minicargador.
Jueves 28 de agosto de 2025
Clima: lluvia moderada en la mañana y en la tarde seco
Se retoma la excavación mecánica para el filtro francés en el K0+688 - K0+628 carril derecho al final de la tarde se inicia un nuevo tramo en el K0+920 al K0+900 carril derecho, también se realiza la demolición de rocas con el martillo neumático de la mini retro en el K0+686, 678,677, 673 y 672, el material producto de la excavación mecánica es transportado en la volqueta sencilla y ubicado en el acopio temporal ubicado en el K1+750 carril izquierdo.
Viernes 29 de agosto de 2025
Clima: Seco todo el día
Se realiza la construcción del filtro francés en el K0+688-K0+628 carril derecho, previo a esta actividad se demolieron las rocas con el martillo neumático de la mini retro en el K0+686, 678, 673,672,671 estás rocas son medidas en conjunto con el contratista, también se realiza la instalación de recebo b-200 en el K0+790-K0+760 carril derecho.

OBSERVACIONES TRAMO LAGUNA VERDE: Se le solicita al contratista suministrar un demoledor para fracturar las rocas encontradas en la excavación y dar continuidad al proceso constructivo del filtro francés.
Es necesario mencionar que a la fecha no se avanza con la excavación para el filtro francés debido a fallas mecánicas en la retroexcavadora y por la falta del demoledor para fracturar las rocas en la excavación.
El mecánico hace presencia en la obra hacia las 2:00 pm iniciando labores de mantenimiento en la retroexcavadora y luego en el minicargador, estás máquinas quedan habilitadas a las 4:00 pm para el trabajo de mañana.
Es necesario mencionar que no llego el demoledor para fracturar las rocas en la excavación del filtro en el K0+686, K0+675 al K0+670 carril derecho.
Se le solicita al contratista proteger el material granular para evitar el exceso de humedad garantizando la uniformidad y homogeneidad en el momento de la instalación.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 478 –CONSORCIO GAVIONES 95.

Semana del 25 al 31 de agosto del 2025

1.ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL

Tramo vial Laguna Verde.

Programa de información y participación comunitaria.

Pasacalle.
La interventoría solicita al Consorcio Gaviones 95 realizar instalación en el tramo vial de Laguna Verde y Capitolio del pasacalle. A la fecha no se ha hecho la instalación, la interventoría emite un comunicado con un posible incumplimiento mediante comunicado 186-1-839 el 27 de agosto del año en curso, Presunto incumplimiento por la no instalación de Pasacalles y vallas informativas
móviles informativos.

Valla informativa:

La interventoría solicita al Consorcio Gaviones 95 realizar instalación en el tramo vial de Laguna Verde a la fecha no se ha hecho la instalación. la interventoría emite un comunicado con un posible incumplimiento mediante comunicado 186-1-839 el 27 de agosto del año en curso, Presunto incumplimiento por la no instalación de Pasacalles y vallas informativas
móviles informativos.

Volante informativo:
Durante la semana del presente informe el consorcio no ha hecho entrega de volantes informativos a la comunidad.

Puntos satélites:

El profesional social realizó mantenimiento a los puntos satélites con el volante informativo de cierre vial programado para el fin de semana.
Tienda donde Nancy Ríos Martínez.
Casa de señor Auder Molina tienda. Durante la semana del presente informe el consorcio no realiza actualización por no ser necesario.

Actas de vecindad
El profesional social realiza entrega de actas de vecindad de apertura, fueron revisadas por interventoría y el 27 de agosto del 2025, realiza observaciones mediante el comunicado 186-1-838, se hace devolución de:
San Antonio: 13 actas de vecindad de apertura.
Capitolio: 18 actas de vecindad de apertura.
Laguna Verde: 5 actas de vecindad de apertura
Capitolio: 16 actas de compromiso del frente de obra
5 actas de Control de asistencia externa

Recorrido

La interventoría realiza recorrido con el fin de realizar seguimiento a cada una de las actividades establecidas en el plan de Gestión Social.

Programa de atención al Usuario.

A la fecha del presente informe se realizó adecuación y apertura al punto de atención a la comunidad, el cual indica el componente social del contratista que se encuentra ubicado en la casa de la señora Clara Martínez con un horario de atención de los miércoles de 8: 30 a.m. a 3: 00 p.m. y los viernes de 8 a 12 del mediodía.
Y punto de atención móvil ubicado en la casa de la señora Marcela Martínez con un horario de atención de lunes de 10: 00 a.m. a 12 del mediodía, martes de 2:00 p.m. a 5: 00 p.m., jueves 2: 00 p.m. a 5: 00 p.m. la interventoría verifica que se realizó la adecuación del punto de atención y móvil instalando cartelera informativa.

A la fecha de cierre del presente informe el Contratista da apertura a 3 PQRS, las cuales se relacionan a continuación:

PQRS 1

El 8 de agosto del año en curso, el profesional social realizó seguimiento a la queja presentada por el señor Ramiro Martínez quien manifiesta que, el vehículo de la obra al realizar el giro para dirigirse al campamento de obra y punto de atención a la comunidad golpeo la señal de tránsito restrictiva 95 y afecta la cerca del predio, el profesional social realizó Visita, y manifiesta, el contratista informa que a la fecha no se ha hecho

PQRS 2

El jueves 07 de agosto de 2025, la retroexcavadora de oruga, adecuando la abscisa K0+00, afecto el tubo de 3” que surte de agua predios como el de Felisa Pardo, Diana Marcela Pardo y Virgilio Pardo. La situación fue informada por el Peticionario Roldan Bautista,
a la fecha se han realizado dos reparaciones provisionales los días 12 y 26 de agosto, sin embargo, el daño continuo, continúa.

PQRS 3.

El miércoles 20 de agosto, la Profesional social de la interventoría informa un daño en una manguera en el K1+ 750, ese mismo día el profesional Social del Consorcio, atiende la queja presentada por el ciudadano Bonifacio Martínez, informando el propietario que el daño de la manguera no fue en esta abscisa, al día siguiente (jueves 21 de agosto de 2025) la Profesional Social de la Interventoría, informa al ciudadano no reponer la manguera en un plazo máximo de diez (10) días.

Tramo Capitolio.

Pasacalle.
La interventoría solicita realizar reposición del pasacalle de frente de obra de Capitolio. La interventoría realiza entrega de comunicado donde informa que a la fecha el Consorcio no ha cumplido con la entrega de la documentación y realiza un llamado de atención el 7 agosto del año en curso, mediante comunicado 186-1-793 y solicita la instalación de manera inmediata, al cierre del presente informe la interventoría evidencia que no se ha realizado la instalación, en comité de seguimiento integral solicita su instalación.

Actas de compromiso:
El contratista durante la semana no realiza actas de compromiso.
Actas de vecindad
El profesional social realiza entrega de actas de vecindad se encuentran en revisión por parte de interventoría.

Vinculación de personal mano de obra.

El Consorcio Gaviones 95 cuenta en total con:

24 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:

Mano de obra calificada (MOC)

17 trabajadores profesionales, operarios y conductores.
Total, de porcentaje 70,83 %

Mano de obra no calificada (MONC)

7 trabajadores de la localidad
Porcentaje de cumplimiento un 100 %

Mujeres porcentaje 6 de cumplimiento 25%
Personal en condición de discapacidad 1

2. INFORMES MENSUALES
La interventoría informe que se encuentran revisados los informe 10, 11, 12 los cuales se encuentran sin firma del profesional que elaboro el informe y del profesional que reviso el informe, se encuentran pre- aprobados se solicita subsanar, a la fecha de cierre del presente informe no se ha realizado entrega.
El informe mensual 13 presento observaciones, el consorcio Gaviones 95, el 20 de agosto del año en curso hace entrega del informe V 1, fue revisado por interventoría mediante comunicado 186-1-840 el 27 de agosto del año en curso.
El informe mensual 14 presento observaciones al cierre del presente informe no ha realizado entrega.
El informe mensual 15, el Consorcio Gaviones 95 realizó entrega del informe el 12 de agosto por correo electrónico, la interventoría emite respuesta mediante comunicado 186-1-821 el 22 de agosto del año curso, se encuentra pendiente entrega con las observaciones subsanadas.
El informe mensual 16, el Consorcio Gaviones 95 realizó entrega del informe el 7 de agosto por correo electrónico, la interventoría emite respuesta mediante comunicado 186-1-821 el 22 de agosto del año curso, se encuentra pendiente entrega con las observaciones subsanadas.

4. INFORMES SEMANALES
El profesional social del consorcio Gaviones 95, hace entrega de los informes semanales en su totalidad.

5.COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
La interventoría cita a comité de seguimiento integral # 58, el 29 de agosto del 2025, donde se encuentran los componentes SST, técnico, ambiental y social, de la unidad de mantenimiento vial e interventoría no se presenta el Consorcio Gaviones 95, con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

OBSERVACIONES AL CONSORCIO GAVIONES 95
Componente SST 4ta semana de agosto 2025 tramo Laguna Verde
Personal Gaviones 95 // 23-08-25
1 Residente de obra
1 residente ambiental
1 residente social
1 profesional SST
1 topógrafo
1 cadenero
5 auxiliares de obra
2 auxiliares de tráfico
2 operadores
2 conductores
Equipo y Maquinaria:

1 mini retro
1 minicargador
1 retro cargador
1 camión
1 canguro

Para esta semana el consorcio Gaviones 95, realiza labores de replanteo topográfico
kit de emergencia en la carpa en orden
Presencia del profesional SST en obra a excepción de jueves y viernes por enfermedad.
PMT instalado en orden
Se solicitó certificado de capacitación de trabajo seguro en alturas al personal que realiza trabajos a más de 2m
Se evidencia trabajadores sin curso de alturas
Se solicitó mediante comunicado No. 186-1-799 sobre: certificado de competencia en operación de minicargador a operador del mismo ya que este ocupa también el cargo de cadenero dentro del proyecto, Volqueta sencilla presenta desgaste avanzado en llantas traseras
Se observa señalización en excavación con palos, se solicitó la implementación de la señalización con colombinas reflectivas lo cual se cumplió por partes, se solicitara en todo el tramo de excavación.
Aún no se subsana la entrega de documentación de volqueta sencilla SBA805

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

CONTRATO DE OBRA No. 478 – DEL 10/02/2022 CONSORCIO GAVIONES 95

Actividades Desarrolladas
1. Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2. Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3. Revisión de informe semanal remitido por el contratista
4. Se remite oficio con el aval del informe mensual No 15 V2
5. Participación del comité de seguimiento No 58.
6. Se solicito evacuación de materiales de excavación RCD acopiados en la Via San Juan en un predio privado.

Frente Laguna Verde

Se evidencia señalización y delimitación con polimalla del acopio principal de material triturado
Se mantienen delimitadas las alcantarillas del área de intervención.
Se evidencia señalización parcial de materiales pétreos y RCD en el frente de obra.
Se evidencia permanencia de señalización, preventiva, informativa y de emergencias ubicada en el tramo en intervención.
Permanencia de kit de emergencias y kit control de derrames en campamento
Campamento móvil en sitio
Se mantiene señalización de zona de intervención con el filtro, en el K 0+400 a K 0+625 con doble cinta y delineadores tubulares ubicados de forma intercalada con estacas de madera. De ese punto hacia mayores solo se evidencia señalización con estacas de madera.
En este frente no se evidencio derrame de combustibles en el periodo
Se cuenta con PMT implementado en el frente de obra, con dos auxiliares de trafico
Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio acopios sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). Se evidencian acopios de RCD ubicados a los costados de via, los cuales se sugiere se den prioridad para su retiro hacia acopio temporal o sitio de disposición final, de igual manera que se mantengan cubiertos para evitar afectaciones sobre la via por lavado del material. K0+420,
Se evidencia acopio de RCD K 0+420 ubicado al costado de via, sin cubrimiento, obstaculizando la cuneta y por ende el drenaje del agua de escorrentía, lo cual está ocasionando la afectación de via, se solicitó el retiro de estos materiales de manera inmediata. El contratista inicio retiro el día 24 de agosto, si embargo se mantiene un volumen de RCD en este punto.
K 1+750, 1+440, 1+120, 0+420 acopio de RCD, se solicita que este material de excavación sea señalizado y cubierto mientras se procede con su retiro hacia sitio de disposición final. adecuar estar áreas para evitar afectaciones sobre la via.
K 1+220 se recomienda que el RCD acopiado se contenga de tal manera que evite su caída hacia la parte posterior del acopio, ya que está en un lugar con bastante pendiente, lo que hace complicado su retiro posterior, el contratista informo que en este acopio no van a acopiar más RCD y posteriormente iniciaran con su retiro hacia sitio de disposición final. Se mantiene esta observación hasta que sea evacuado todo el material
K 1+740 acopio de RCD, se solicitó protección de los individuos arbóreos que se encuentran en el área, así mismo que se inicie la evacuación hacia sitio de disposición final del RCD acopiado en este punto, se recomendó verificar la distancia mínima de 30 mts de este acopio de un cuerpo de agua que pasa por el sector.
Se solicito al contratista que debe contar con las actas de autorización del uso de acopios temporales.
Se mantiene solicitud realizada al contratista mediante comité de obra No 55, que previo a la implementación de un acopio de RCD, sea informado el lugar a la interventoría para realizar acompañamiento y verificación de las condiciones del sitio, y garantizar que técnicamente es viable la ubicación de residuos de excavación de manera temporal en esta área.
Se solicito en el periodo el etiquetado de los recipientes con sustancias químicas, específicamente combustible. Se recomienda al contratista que no se emplee madera de la zona para colocar la cinta de delimitación de la excavación para filtro, debe emplearse los elementos como son los delineadores tubulares respectivos.
Se realizo recomendación al residente ambiental con respecto al derrame de aceite que tiene la volqueta sencilla, para que sea corregido.

Frente Capitolio
-No se evidencia desarrollo de actividades por parte del contratista.

Frente San Antonio

-No se evidencia desarrollo de actividades por parte del contratista.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

No se presentan ítems no previstos

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

Componente Técnico



Descripción Foto 1.

Construccion de filtro, instalación de geotextil




Descripción Foto 2.

Excavación para filtro, excavación manual



Descripción Foto 3.

Retiro de material RCDS.

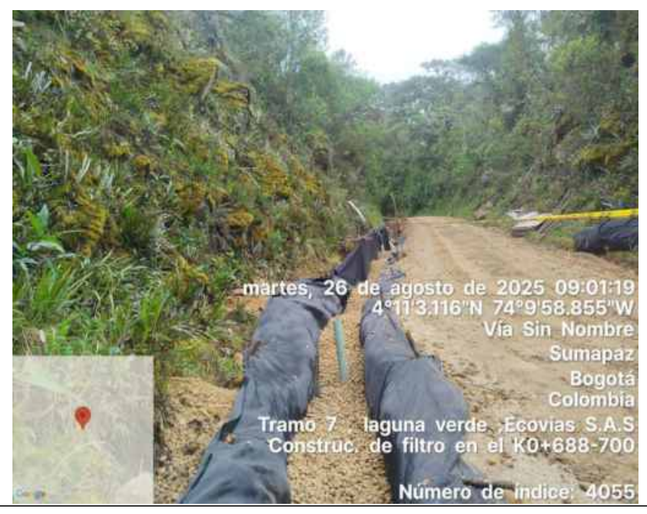

Descripción Foto 4.

Construcción de filtro instalación de geotextil e instalación de material triturado de 1" a 1 1/2"



Descripción Foto 5

Instalación de entivado para construcción de filtro.



Descripción Foto 6

Excavación y demolición de roca en zanja para construcción fe filtro.



Descripción Foto 7

Construcción de filtro, demolición de roca para excavión del filtro.



Descripción Foto 8

Construcción de filtro, demolición de roca.

Componente Social



Descripción Foto 9

cartelera informativa



Descripción Foto 10

Comité de obra numero 57

Componente SST



Descripción Foto 11

Aún no se subsana la entrega de documentación de volqueta sencilla SBA805



Descripción Foto 12

Se ha reiterado el uso de señalización tubular reflectiva

Componente AMBIENTAL



Descripción Foto 13

Acopio de RCD que requiere cubrimiento



Descripción Foto 14

Se requiere retiro de escombros

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	COP-479-2022	CIN-161-2022
OBJETO	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (SAN ANTONIO II (K6+910-K0+000), UNIÓN TUNALES Y ANIMAS BAJAS.").	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$12.494.588.139,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$2.498.917.628,00	N/A
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	9/08/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. **103** **DEL** lunes, 4 de agosto de 2025 **AL** domingo, 10 de agosto de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO TRAMO 2	21,00%	10,81%	-10,19%	K3+977 a K3+922 der Instalación de concreto in situ para 15 módulos de cuneta K4+464 Armado acero de refuerzo para zapata de estructura de descole **/** K3+975 a K3+924 der Instalación de concreto in situ para 14 módulos de cuneta K4+464 Entrega de acero de refuerzo para zapata de estructura de descole. Instalación de concreto in situ para zapata de estructura de descole **/** K5+410 a K3+920 Aseo y limpieza de obra K4+464 Armado de acero de refuerzo para placa contra-erosión. Instalación de concreto in Situ para placa contra erosión.
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	* Se realiza fundida de 7 módulos intermedios para cunetas entre k1+325 a k1+355. Costado derecho. * Se descargan 500 bultos de cemento que llegan al tramo. **/** * Se realiza fundida de 12 módulos intermedios para cunetas entre k1+340 a k1+305. Costado derecho. * Se realiza la fundida de 18 módulos entre k1+355 a k3+425 costado derecho. **/** Se realiza el desencofrado de 18 módulos entre k1+355 a k3+425 costado derecho

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	12.494.588.139,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

TRAMO UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 02: 1 inspector, 2 auxiliares de tráfico, 4 ayudantes, 1 oficial, 1 operador de minicargador.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 minicargador. 1 mezcladora, 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto, 1 generador de energía
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 04 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza fundida de 7 módulos intermedios para cunetas entre k1+325 a k1+355. Costado derecho.
* Se descargan 500 bultos de cemento que llegan al tramo.
Martes 05 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza fundida de 12 módulos intermedios para cunetas entre k1+340 a k1+305. Costado derecho.
* Se realiza la fundida de 18 módulos entre k1+355 a k3+425 costado derecho.
Miércoles 06 de agosto de 2025. Clima: seco
Se realiza el desencofrado de 18 módulos entre k1+355 a k3+425 costado derecho
Jueves 07 de agosto de 2025. Clima:

Viernes 08 de agosto de 2025. Clima:

Sábado 09 de agosto de 2025. Clima:

Domingo 10 de agosto de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - * * * Se evidencian porosidades, esportillamiento , delineación de juntas, juntas frías y aspectos de remates en los módulos. Adicionalmente no se evidencia que se traza hilo para el corte de la carpeta asfáltica. * Se realiza observación a la compactación del material de los módulos, ya que se evidencia material suelto. * No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de realce de alcantarillas. **Nota** No se cuenta con evidencia fotográfica ya que cuando se llegó al tramo los obreros habían salido a bañarse producto del descargue del cemento . **/** No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de realce de alcantarillas**. Nota** No se evidencia inspector de obra**/** * Se evidencia una afectación en un módulo de cuenta debido a la pisada de animales. k1+415. * Se evidencia limpieza y alistamiento de herramienta menor por cambio de subcontratistas. * No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de realce de alcantarillas.

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 05: 1 Topógrafo. 1 Cadenero. 2 Oficiales. 6 ayudantes. 2 Auxiliar de tráfico. 1 conductor camioneta y/o volqueta doble. 1 Operador de Minicargador. 1 Operador de retrocargador.
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Retrocargador. 1 Minicargador. 1 Mezcladora . 1 Cortadora. 1 Apisonador. 1 placa vibratoria. 1 Generador eléctrico. 1 Vibrador de concreto. 1 Volqueta doble
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 04 de agosto de 2025. Clima: seco
K3+977 a K3+922 der Instalación de concreto in situ para 15 módulos de cuneta
K4+464 Armado acero de refuerzo para zapata de estructura de descole
Martes 05 de agosto de 2025. Clima: seco
K3+975 a K3+924 der Instalación de concreto in situ para 14 módulos de cuneta
K4+464 Entrega de acero de refuerzo para zapata de estructura de descole.
Instalación de concreto in situ para zapata de estructura de descole
Miércoles 06 de agosto de 2025. Clima: seco
K5+410 a K3+920 Aseo y limpieza de obra
K4+464 Armado de acero de refuerzo para placa contra-erosión.
Instalación de concreto in Situ para placa contra erosión.
Jueves 07 de agosto de 2025. Clima:

Viernes 08 de agosto de 2025. Clima:

Sábado 09 de agosto de 2025. Clima:

Domingo 10 de agosto de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO : **/ I Aún se evidencia concreto al interior de la tubería 36" en Alcantarilla K4+206 borde derecho. **/** En el armado de acero de refuerzo se identifica que los recubrimientos son de 0,05 m para cumplir con los detalles ganchos y escuadras en las longitudes especificadas y debería disminuir su longitud en el acero o generar un sobre-ancho en el concreto para cumplir con recubrimiento de 0,075m .

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1.ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Tramo de Unión Tunales.
-Programa de atención al Usuario
La profesional social, realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil (carpa) en el tramo vial de Unión Tunales, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra, cuya atención son los lunes de 9: 00 a.m. a 1: 00 p.m.
Cuenta con un punto de atención a la comunidad Fijo, el cual está ubicado en la Unión tiene una línea de atención móvil 3204461693, el correo electrónico socialconsorcioev@gmail.com
A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil, con el fin de atender a la comunidad cercano de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las

obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
⁻Programa de información y participación comunitaria.
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual. La interventoría solicita se realice mantenimiento, para evitar deterioro.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
La interventoría realiza verificación de los puntos satélites y se evidencia que el contratista cumple con la actualización.

•Actas de vecindad

Durante la semana del presente informe no se realizan actas de vecindad por no ser necesario.

Tramo de San Antonio El Toldo.

⁻Programa de información y participación comunitaria.

•Puntos satélites
El contratista realizó la instalación de dos puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa del señor Luis Bustos
Colegio del El Toldo.
Se evidencia que cuanta con afiche informativo, volantes informativos.
•Vallas informativas
El contratista cuenta con la instalación de dos vallas móviles establecidas contractualmente.
•Pasacalles
El contratista realizó la instalación del pasacalle que se encontraba pendiente por su instalación.
Actas de vecindad
Durante la semana del presente informe no se realizan actas de vecindad por no ser necesario.

•Acta de compromiso
Durante la semana no se realizan actas de compromiso.
⁻Programa de atención al Usuario.
La profesional social, realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil (carpa) en el tramo vial de Unión Tunales, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra, cuya atención son los martes y jueves de 9: 00 a.m. a 1: 00 p.m.
Cuenta con un punto de atención a la comunidad Fijo, el cual está ubicado en la Unión tiene una línea de atención móvil 3204461693, el correo electrónico socialconsorcioev@gmail.com
⁻Vinculación de personal mano de obra.

El Consorcio Estabilización vial cuenta en total con:
Con 39 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:
Mano de obra calificada (MOC)

9 trabajadores profesionales.
10 son operarios
Para un total de 19 trabajadores
Total, de porcentaje 53,84 %

Mano de obra no calificada (MONC)

5 trabajadores foráneos
9 trabajadores de la localidad del Sumapaz.
Total, de personal 14 trabajadores.
Porcentaje de cumplimiento un 64,28 %

La interventoría evidencia que no se realiza cumplimiento con el porcentaje indicado en el contrato el cual establece un 75%, de mano de obra no calificada, la interventoría solicita se tomen las medidas necesarias para aumentar el porcentaje y/o justificar la no contratación de mano de obra no calificada local.
Mujeres 7 porcentaje de cumplimiento 17, 94 %
2.COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
El componente social participa del comité de obra interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 77, el 8 de agosto del 2025, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social, con el fin de realizar seguimiento al proyecto.
3.INFORMES MENSUALES
La interventoría realizó aprobación de los informes sociales 14 V4,15 V4,16 V3,17V2, mediante comunicado 186-1-768 el 28 de julio del 2025
La interventoría realizó aprobación al informe social 18 V2, mediante comunicado 186-1-769 el 28 de julio del 2025
La interventoría realizó aprobación al informe social 19 V2, mediante comunicado 186-1-771 el 28 de julio del 2025
La interventoría realizó observaciones al informe social 20 V1, mediante comunicado 186-1-770 el 28 de julio del 2025.
El contratista hace entrega del informe mensual social N° 21 v1 mediante comunicado CEV/22-454 del 5 de agosto del 2025. Se encuentra en revisión por parte de interventoría.

4. INFORMES SEMANALES

El consorcio se encuentra al día en el reporte de informes semanales.
5.RECORRIDOS.
La interventoría realiza recorridos en los tramos viales activos, con el fin de verificar el cumplimiento a las actividades establecidas contractualmente en el Plan de gestión Social

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Componente SST 1ra semana de agosto 2025
Observaciones SST Tramo 2 Tunales:
Personal / 06-08-2025
1 inspector. 2 auxiliares de tráfico. 5 ayudantes. 1 oficial. 1 operador de minicargador
Maquinaria en obra: 1 Minicargador. 1 Mezcladora. 1 placa vibratoria
1 vibrador de concreto. 1 generador de energía. 1 cortadora
Observaciones SST
•Dotación en orden
•Está pendiente la contratación del segundo SST
•Se evidencia Dos carpas de resguardo para el personal en la zona.
•Se realiza observación de PMT el cual está muy alejada una de las auxiliares de tráfico ocasionando velocidades grandes dentro del mismo por los vehículos que les han dado paso
•Se observa kit de emergencias en orden
•Punto de hidratación en orden
•Punto ecológico en orden
•Se solicitó orden en acero utilizado en obra
•Se evidencia entrega de EPPs y uso de los mismos
•Observación de cambio de llantas en minicargador fue subsanada.
•Se evidencias charlas de seguridad y pausas activas en terreno.
Observaciones SST Tramo San Antonio tramo 9:
Personal en obra: 05-08-2025
1 Topógrafo. 1 Cadenero. 2 Oficiales. 6 ayudantes. 2 Auxiliar de tráfico. 1 conductor camioneta y/o volqueta doble. 1 Operador de Minicargador. 1 Operador de retrocargador.
Grupo encoles: 1 Oficiales. 2 Ayudantes
Maquinaria y equipos de obra
1 Retrocargador. 1 Minicargador. 1 Mezcladora. 1 Cortadora. 1 Apisonador
1 placa vibratoria. 1 Generador eléctrico. 1 Vibrador de concreto. 1 Volqueta doble
Observaciones SST
•Se evidencia carpa de campamento, con kit de emergencia (botiquín, camilla, kits antiderrames, extintor)
•No hay unidades sanitarias en terreno, trabajadores manifiestan que los baños permitidos están muy lejos de la zona donde se realiza trabajos
•Señalización de acopios en orden
•Hidratación en orden
•Se solicitó orden y aseo en obra

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión de informe semanal entregado por el contratista
4.Revisión del informe mensual No 21 del periodo de julio de 2025
5.Participación del comité de seguimiento No 76; donde se realiza seguimiento al componente.

Frente Tunales

-Se evidencia acopio de hierro delimitado, sin embargo, se solicita mantener esta área delimitada y organizada.
-En obra se evidencia, kit de emergencias y control de derrames, cartelera.
-En obra se, mantiene campamento temporal, donde se ubicó punto ecológico. Ubicada en tramo 2 K 1+455.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados. Para el periodo en el tramo 2 K 1+550 y 4+50 se encontrados dos acopios de pétreos con medidas que requirieron adecuación.
Cabe mencionar que algunos acopios se encuentran delimitados y cubiertos, medidas que se deben mantener para todos los sitios destinados como acopios.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-En recorrido realizado se evidencia que las bolsas de cemento se mantienen acopiadas en bolsas rojas y señalizado el área donde están almacenadas temporalmente. Se recomienda no dejarlas a la intemperie.
-PMT correctamente implementado con las señales necesarias y dos auxiliares de tráfico en sitio.
-Se solicito que el material producto de la excavación de la cuneta sea empleado en el atraque de la misma, con el fin de limpiar los terrenos donde han sido depositados. En implementación parcial
-Se solicita mantener orden y aseo en el área de campamento móvil.
-En el tramo en intervención se evidencia RCD acumulado en el predio privado.
-Se mantiene acopio de pétreo tramo 2 K 0+860 cubierto y delimitado.
Frente San Antonio

-Se mantiene solicitud que los residuos sobrantes de las fundidas sean dispuestos de manera correcta como RCD y no en zonas verdes o alcantarillas del sector.
-Se recomendó mantener la via cerrada mientras realizan la actividad de cargue de volqueta.
-Se sugirió mantener señalizar materiales acopiados al lado de via K 4+200 y 4+300 arena, grava; K5+250, K 4+920, RCD. Se requiere mantener medidas de manejo de acopios de pétreos y RCD.
-Se solicito realizar limpieza permanente de via a la salida del acopio de RCD K5+250.
-Se sugirió al contratista limpiar la via posterior a las fundidas de concreto ya que el minicargador genera caída de material en el transporte del mismo.
-Se requiere que todos los acopios de hierro y tubería se mantengan delimitados. En el periodo se identificó acopios sin señalizar.
-Se solicito mantener punto ecológico organizado y colocar la tapa blanca a la caneca.
-En obra se evidencia kit control de derrames, kit de emergencias y cartelera implementada
-En lo corrido de la semana se evidencia una carpa con punto ecológico; ubicado en el K 4+200. Se recomienda jornada de orden y aseo diaria
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). Mejorar acopio de RCD K 5+200 y K 4+920, cubrimiento.
-Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas en intervención en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se solicito que el material producto de la excavación de la cuneta sea empleado en el atraque de la misma, con el fin de limpiar los terrenos donde han sido depositados y que estos materiales sean compactados y técnicamente instalados.
-PMT correctamente implementado con las señales verticales móviles necesarias.
-Se evidencia jornada de orden y aseo en K 2+500 y 1+150, se solicito realizar de manera supervisada para garantizar toda la recolección de plásticos, maderas, cintas, etc, que se encuentran en el tramo.
-Se procedió a solicitar adecuación del área donde tiene el punto de almacenamiento temporal de combustible, mejorar estibas, dique, rotular recipientes y mantener bajo techo.
-En el K 6+710 se requiere evacuar el tanque que se encuentra ubicado al costado de via.
-K 5+410 5+340 se evidencian residuos de madera que requieren recolección y disposición final respectiva.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

Componente Técnico



Descripción Foto 1.



Descripción Foto 2.



Descripción Foto 3.

Frente tunales. Se realiza la fundida de 18 módulos entre k1+355 a k3+425 costado derecho



Descripción Foto 4.

Se realiza la fundida de 18 módulos entre k1+355 a k3+425 costado derecho



Descripción Foto 5

Frente Tunales. Se realiza la fundida de 18 módulos entre k1+355 a k3+425 costado derecho



Descripción Foto 6

Frente Tunales. Se realiza la fundida de 18 módulos entre k1+355 a k3+425 costado derecho

Componente Social



Descripción Foto 7

Acompañamiento reunión ejercicio de control social



Descripción Foto 8

Recorrido verificación mantenimiento de Punto satélites Señora Arnidia Runza

Componente SST



Descripción Foto 9

Se solicitó orden y aseo en terreno



Descripción Foto 10

Se evidencia kit de emergencia

Componente Ambiental



Descripción Foto 11

Frente San Antonio. Delimitación de alcantarillas



Descripción Foto 12

frente San Antonio. Residuos peligrosos que requieren medias de manejo

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	COP-479-2022	CIN-161-2022
OBJETO	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (SAN ANTONIO II (K6+910-K0+000), UNIÓN TUNALES Y ANIMAS BAJAS.").	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$12.494.588.139,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$2.498.917.628,00	N/A
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	9/08/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. **104** **DEL** lunes, 11 de agosto de 2025 **AL** domingo, 17 de agosto de 2025

AVANCES DE OBRA

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO TRAMO 2	21,00%	10,81%	-10,19%	K4+464 Armado de acero de refuerzo para Aletas y Cabezal. K4+206 Retiro de concreto en tuberia 36" **/** K4+464 Armado de acero de refuerzo para Aletas y Cabezal. K3+910 a K3+845 Cortes de pavimento. **/** K4+464 Instalación de formaletas para Aletas y cabezal de estructura de descole. K3+920 a K3+845 Alistamiento nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta **/** K4+464 Instalación de concreto In situ para estructura de descole cabezal y aletas. K3+920 a K3+845 Alistamiento de módulos de cuneta **/** K4+464 Aseo y Limpieza de obra K3+918 a K3+850 Instalación de concreto in situ para 17 módulos de cuneta
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentias, limpieza de cunetas y barrido general. Esta actividad se reanuda desde tramo 4 k0+000 y hasta k0+230. **/** * Se realiza alistamiento y encofrado de módulos intermedios. Se recomienda mejorar la pista existente con material granular. Esta actividad se desarrolla desde k1+340 a k1+435(20und). * Se realiza fundía de módulos una vez revisada y aprobada la pista existente. Se evidencia mejoramiento de material. K1+340 a k1+435(20und). **/** * Se realiza desencofrado de módulos intermedios. Esta actividad se desarrolla desde k1+340 a k1+390(12und). * Se realiza fundía de módulos una vez revisada y aprobada la pista existente. Se evidencia mejoramiento del material. K1+395 a k1+435(8und). * Se realiza cimbrado y delineación de carpeta de fresado para corte de los módulos de cunetas. K1+900- k2+050. **/** * Se realiza desencofrado de módulos intermedios. Esta actividad se desarrolla desde k1+395 a k1+430(8und). * Se realiza cimbrado y delineación de carpeta de fresado para corte de los módulos de cunetas. K1+910- k2+020 **/**

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	12.494.588.139,00	0,00%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

TRAMO UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 02: 1 inspector. 2 auxiliares de tráfico. 5 ayudantes. 1 oficial. 1 operador de minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Minicargador. 1 Mezcladora. 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto. 1 generador de energía . 1 cortadora
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 11 de agosto de 2025. Clima: seco
Se realiza jornada de manejo de aguas escorrentias, limpieza de cunetas y barrido general. Esta actividad se reanuda desde tramo 4 k0+000 y hasta k0+230.
Martes 12 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza alistamiento y encofrado de módulos intermedios. Se recomienda mejorar la pista existente con material granular. Esta actividad se desarrolla desde k1+340 a k1+435(20und).
* Se realiza fundía de módulos una vez revisada y aprobada la pista existente. Se evidencia mejoramiento de material. K1+340 a k1+435(20und).
Miércoles 13 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza desencofrado de módulos intermedios. Esta actividad se desarrolla desde k1+340 a k1+390(12und).
* Se realiza fundía de módulos una vez revisada y aprobada la pista existente. Se evidencia mejoramiento del material. K1+395 a k1+435(8und).
* Se realiza cimbrado y delineación de carpeta de fresado para corte de los módulos de cunetas. K1+900- k2+050.
Jueves 14 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza desencofrado de módulos intermedios. Esta actividad se desarrolla desde k1+395 a k1+430(8und).
* Se realiza cimbrado y delineación de carpeta de fresado para corte de los módulos de cunetas. K1+910- k2+020
Viernes 15 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza alistamiento y encofrado de batea de ingreso vehicular. Esta actividad se realiza en el k1+300 a k1+305.
* Se realiza desencofrado de batea para ingreso vehicular. Se retiran del sitio K1+395 a k1+400(1und).
* Se realiza cimbrado, delineación para el alistamiento de módulos de cunetas. K1+990- k2+080.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - * * * * Se evidencia que el vibrocompactador Case (4tn), esta varado. * Se requiere de un vibrocompactador mixto de 8 Ton para asegurar una buena compactación del material granular. * No se cuenta con material pétreo para realizar actividades de conformación de vía. **/** * se evidencia que la formaletas no está quedando alineada ni con las alturas requeridas para los módulos. De solicita mayor revisión y supervisión. * Se realiza observación para que se agregue material mejorado sobre la pista de los módulos intermedios teniendo en cuenta que desde el 06-08-25, de presentaron lluvias y eso llevo a qué se lavaran los finos. * No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de realce de alcantarillas. **/** Se evidencia que el corte de la carpeta de fresado se esta realizando con pulidora.**/** * Se evidencia que los cortes de la carpeta se realizan con disco de pulidora. * No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de realce de alcantarillas. **/**

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 09:1 Topógrafo. 1 Cadenero. 1 Inspector. 2 Auxiliar de tráfico. 1 Operador de Minicargador. 1 Operador de retrocargador. 1 conductor de volqueta doble. 1 Maestro. 1 Oficial. 2 Ayudantes
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Retrocargador. 1 Minicargador. 1 Volqueta doble
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 11 de agosto de 2025. Clima: seco
K4+464 Armado de acero de refuerzo para Aletas y Cabezal.
K4+206 Retiro de concreto en tuberia 36"
Martes 12 de agosto de 2025. Clima: seco
K4+464 Armado de acero de refuerzo para Aletas y Cabezal.
K3+910 a K3+845 Cortes de pavimento.
Miércoles 13 de agosto de 2025. Clima: seco
K4+464 Instalación de formaletas para Aletas y cabezal de estructura de descole.
K3+920 a K3+845 Alistamiento nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta
Jueves 14 de agosto de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:00 a 10:00 am
K4+464 Instalación de concreto In situ para estructura de descole cabezal y aletas.
K3+920 a K3+845 Alistamiento de módulos de cuneta
Viernes 15 de agosto de 2025. Clima: seco
K4+464 Aseo y Limpieza de obra
K3+918 a K3+850 Instalación de concreto in situ para 17 módulos de cuneta
Sábado 16 de agosto de 2025. Clima:

Domingo 17 de agosto de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO : **/ I Se requiere implementar unidad de ejecución que continúe la construcción de módulos de cuneta. **/** Ingresa personal para construcción de cunetas.
En abscisa K3+690 durante actividad de replanteo de evidencia que los puntos materializados no son congruentes con la instalación de fresado. En abscisa K4+206 se evidencia afectación en tubería, se pone en consideración del área técnica el tratamiento adecuado en tal situación. B78Aún se genera tráfico con volqueta "cuatro manos" con 12 m³ de material. **/** En tramo K3+920 a K4+845 se realiza lleno con material B-200 por 0,20 m de espesor, se usa material reutilizado en vía por sobre espesor 0,55m **/** Se solicita al contratista garantizar la capa de B-200 como estrato final, aún cuando se permite realizar el lleno con material reciclado. Aún se evidencian puntos de replanteo que no corresponden con el diseño de vía, se solicita a la UMV gestionar con el personal en campo el reconocimiento de los cambios de alineamiento en vía. **/** Se socializa con el contratista la instalación de material fino que selle el material grueso en Berma-cuneta.**/**

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1.ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Tramo de Unión Tunales.
⁻Programa de atención al Usuario

La profesional social, realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil (carpa) en el tramo vial de Unión Tunales, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra, cuya atención son los lunes de 9: 00 a.m. a 1: 00 p.m.
Cuenta con un punto de atención a la comunidad Fijo, el cual está ubicado en la Unión tiene una línea de atención móvil 3204461693, el correo electrónico socialconsorcioev@gmail.com
A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil, con el fin de atender a la comunidad cercano de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
⁻Programa de información y participación comunitaria.
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual. La interventoría solicita se realice mantenimiento, para evitar deterioro.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
La interventoría realiza verificación de los puntos satélites y se evidencia que el contratista cumple con la actualización.
•Actas de vecindad
Durante la semana del presente informe no se realizan actas de vecindad por no ser necesario.
•Actas de reunión extraordinaria
La profesional social realizó reunión con el rector del colegio Gimnasio Juan de la Cruz Varela, esto actividad se desarrolló con el fin de verificar el conocimiento y visto bueno de la entrada al predio del señor Fernando Molida, dicho espacio según refiere la comunidad es utilizado en los casos que se requería como bahía para los vehículos grandes.
Tramo de San Antonio El Toldo.
⁻Programa de información y participación comunitaria.
•Puntos satélites
El contratista realizó la instalación de dos puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa del señor Luis Bustos
Colegio del El Toldo.
Se evidencia que cuanta con afiche informativo, volantes informativos.
•Vallas informativas
El contratista cuenta con la instalación de dos vallas móviles establecidas contractualmente.
•Pasacalles
El contratista realizó la instalación del pasacalle que se encontraba pendiente por su instalación.
•Actas de vecindad
Durante la semana del presente informe no se realizan actas de vecindad por no ser necesario.
•Acta de compromiso
Durante la semana no se realizan actas de compromiso.
⁻Programa de atención al Usuario.

La profesional social, realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil (carpa) en el tramo vial de Unión Tunales, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra, cuya atención son los martes y jueves de 9: 00 a.m. a 1: 00 p.m.
Cuenta con un punto de atención a la comunidad Fijo, el cual está ubicado en la Unión tiene una línea de atención móvil 3204461693, el correo electrónico socialconsorcioev@gmail.com
⁻Vinculación de personal mano de obra.
El Consorcio Estabilización vial cuenta en total con:
Con 39 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:
Mano de obra calificada (MOC)
8 trabajadores profesionales.
10 son operarios
Para un total de 18 trabajadores
Total, de porcentaje 46,15 %
Mano de obra no calificada (MONC)
5 trabajadores foráneos
9 trabajadores de la localidad del Sumapaz.
Total, de personal 14 trabajadores.
Porcentaje de cumplimiento un 64,28 %
La interventoría evidencia que no se realiza cumplimiento con el porcentaje indicado en el contrato el cual establece un 75%, de mano de obra no calificada, la interventoría solicita se tomen las medidas necesarias para aumentar el porcentaje y/o justificar la no contratación de mano de obra no calificada local.
Mujeres 7 porcentaje de cumplimiento 17, 94 %
2.COMITÉ INTEGRAL INTERVENTORIA – UAERM – CONSORCIO DE ESTABILIZACIÓN VIAL.
El componente social participa del comité de obra interventoría - UMV proyecto de Regalías Sumapaz, # 78, el 15 de agosto del 2025, donde se encuentran los componentes SST, administrativo técnico, ambiental y social, con el fin de realizar seguimiento al proyecto.

3.INFORMES MENSUALES
La interventoría realizó observaciones al informe social 20 V1, mediante comunicado 186-1-770 el 28 de julio del 2025. Se encuentra pendiente entrega del informe con las observaciones subsanadas.
El contratista hace entrega del informe mensual social N° 21 v1 mediante comunicado CEV/22-454 del 5 de agosto del 2025, la interventoría realizo entrega de observaciones mediante comunicado 186-1-811. 13 de agosto del 2025. Se encuentra pendiente entrega.

4. INFORMES SEMANALES

El consorcio se encuentra al día en el reporte de informes semanales.

5.RECORRIDOS.
La interventoría realiza recorridos en los tramos viales activos, con el fin de verificar el cumplimiento a las actividades establecidas contractualmente en el Plan de gestión Social

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Observaciones SST Tramo 2 Tunales:
Personal / 14-08-2025
2 auxiliares de tráfico. 5 ayudantes. 1 oficial. 1 operador de minicargador
Maquinaria en obra:
1 Minicargador. 1 Mezcladora. 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto
1 generador de energía. 1 cortadora
Observaciones SST
•Dotación en orden
•Está pendiente la contratación del segundo SST
•Se evidencia Dos carpas de resguardo para el personal en la zona.
•Se realiza observación de PMT el cual está muy alejada una de las auxiliares de tráfico ocasionando velocidades grandes dentro del mismo por los vehículos que les dan dado paso
•Se reiteró el cambio de paletas de pare y siga las cuales están decoloradas
•Se solicitó en comité no realizar corte de carpeta de fresado con pulidora ya que esta herramienta eléctrica es para usos momentáneos
•Se observa kit de emergencias en orden
•Punto de hidratación no hay agua para los trabajadores 14-08-2025
•Punto ecológico en orden
•Se solicitó orden en acero utilizado en obra
•Se evidencia entrega de EPPs y uso de los mismos
•Se solicitó en comité dotar a los todos los trabajadores con el overol autorizado
•Se reiteró la señalización de formaleta en la vía o ubicarla fuera de ella
Observaciones SST Tramo San Antonio tramo 9:
Personal en obra: 13-08-2025
1 Topógrafo. 1 Cadenero. 1 Inspector. 2 Auxiliar de tráfico. 1 Operador de Minicargador. 1 Operador de retrocargador. 1 conductor de volqueta doble.
Grupo encoles
1 Maestro. 4 Oficiales. 2 Ayudantes
Maquinaria y equipos de obra
1 Retrocargador. 1 Minicargador. 1 Volqueta doble. 1 Placa vibratoria. 1 Generador eléctrico. 1 Cortadora
Observaciones SST
•No hay unidades sanitarias en terreno, trabajadores manifiestan que los baños permitidos están muy lejos de la zona donde se realiza trabajos
•Señalización de acopios en orden
•Hidratación en orden

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión de informe semanal entregado por el contratista
4.Revisión del informe mensual No 21 del periodo de julio de 2025 del cual se remiten observaciones
5.Participación del comité de seguimiento No 78; donde se realiza seguimiento al componente.

Frente Tunales

-Se evidencia acopio de hierro delimitado, sin embargo, se solicita mantener esta área delimitada y organizada.
-En obra se evidencia, kit de emergencias y control de derrames, cartelera.
-En obra se, mantiene campamento temporal, donde se ubicó punto ecológico. Ubicada en tramo 2 K 1+455.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados. Para el periodo en el tramo 2 K 1+550 y 4+50 se encontrados dos acopios de pétreos con medidas que requirieron adecuación.
Cabe mencionar que algunos acopios se encuentran delimitados y cubiertos, medidas que se deben mantener para todos los sitios destinados como acopios.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-En recorrido realizado se evidencia que las bolsas de cemento se mantienen acopiadas en bolsas rojas y señalizado el área donde están almacenadas temporalmente. Se recomienda no dejarlas a la intemperie.
-PMT correctamente implementado con las señales necesarias y dos auxiliares de tráfico en sitio.
-Se solicito que el material producto de la excavación de la cuneta sea empleado en el atraque de la misma, con el fin de limpiar los terrenos donde han sido depositados. En implementación parcial
-Se solicita mantener orden y aseo en el área de campamento móvil.
-En el tramo en intervención se evidencia RCD acumulado en el predio privado.
-Se mantiene acopio de pétreo tramo 2 K 0+860 cubierto y delimitado

Frente San Antonio

-Se mantiene solicitud que los residuos sobrantes de las fundidas sean dispuestos de manera correcta como RCD y no en zonas verdes o alcantarillas del sector.
-Se recomendó mantener la via cerrada mientras realizan la actividad de cargue de volqueta.
-Se sugirió mantener señalizar materiales acopiados al lado de via K 4+200 y 4+300 arena, grava; K5+250, K 4+920, RCD y triturado. Se requiere mantener medidas de manejo de acopios de pétreos y RCD.
-Se solicito realizar limpieza permanente de via a la salida del acopio de RCD K5+250.
-Se sugirió al contratista limpiar la via posterior a las fundidas de concreto ya que el minicargador genera caída de material en el transporte del mismo.
-Se requiere que todos los acopios de hierro y tubería se mantengan delimitados. En el periodo se identificó acopios sin señalizar.
-Se solicito mantener punto ecológico organizado y colocar la tapa blanca a la caneca.
-En obra se evidencia kit control de derrames, kit de emergencias y cartelera implementada
-En lo corrido de la semana se evidencia ausencia de carpa, es necesario implementar una con el fin de ubicar los elementos necesarios de obra; como punto ecológico, kit de derrames, kit de emergencia.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). Mejorar acopio de RCD K 5+200 y K 4+920, cubrimiento.
-Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas en intervención en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se solicito que el material producto de la excavación de la cuneta sea empleado en el atraque de la misma, con el fin de limpiar los terrenos donde han sido depositados y que estos materiales sean compactados y técnicamente instalados.
-PMT correctamente implementado con las señales verticales móviles necesarias.
-Se evidencia jornada de orden y aseo en K 2+500 y 1+150, se solicitó realizar de manera supervisada para garantizar toda la recolección de plásticos, maderas, cintas, etc, que se encuentran en el tramo.
-Se procedió a solicitar adecuación del área donde tiene el punto de almacenamiento temporal de combustible, mejorar estibas, dique, rotular recipientes y mantener bajo techo.
-En el K 6+710 se requiere evacuar el tanque que se encuentra ubicado al costado de via.
-K 2+140 se evidencia acero en predio privado se evidencia delimitación de este material, se recomendó delimitar la tubería acopiada a lo largo del tramo.
-Se mantiene rotulación de recipientes de sustancias químicas.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

Componente Técnico



Descripción Foto 1.

Frente San Antonio. K4+464 Armado de acero de refuerzo para Aletas y Cabezal.



Descripción Foto 2.

Frente San Antonio. K4+464 Armado de acero de refuerzo para Aletas y Cabezal.



Descripción Foto 3.

Frente Tunales. Se realiza alistamiento y encofrado de módulos intermedios. Se recomienda mejorar la pista existente con material granular. Esta actividad se desarrolla desde k1+340 a k1+435(20und).



Descripción Foto 4.

Frente Tunales. Se realiza alistamiento y encofrado de módulos intermedios. Se recomienda mejorar la pista existente con material granular. Esta actividad se desarrolla desde k1+340 a k1+435(20und).



Descripción Foto 5

Frente Tunales. Se realiza fundida de módulos una vez revisada y aprobada la pista existente. Se evidencia mejoramiento del material. K1+395 a k1+435(8und).



Descripción Foto 6

Frente Tunales. Se realiza fundida de módulos una vez revisada y aprobada la pista existente. Se evidencia mejoramiento del material. K1+395 a k1+435(8und).

Componente Social



Descripción Foto 7

Frente San Antonio. Recorrido conjunto verificación de actividades del componente social



Descripción Foto 8

Comité de seguimiento integral # 77

Componente SST



Descripción Foto 9

Frente Tunales. Kit de emergencias en orden



Descripción Foto 10

Frente Tunales. Campamento en orden

Componente Ambiental



Descripción Foto 11

Frente Tunales. PMT Implementado



Descripción Foto 12

Frente Tunales. Punto ecológico

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	COP-479-2022	CIN-161-2022
OBJETO	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (SAN ANTONIO II (K6+910-K0+000), UNIÓN TUNALES Y ANIMAS BAJAS.”).	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” CON CÓDIGO BPIN “2018000050020” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$12.494.588.139,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$2.498.917.628,00	N/A
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	9/08/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. **105** **DEL** lunes, 18 de agosto de 2025 **AL** domingo, 24 de agosto de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			**EJECUTADO**	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,04%	57,00%	1,03%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ 9.326.640,69	$ 14.208.742.003,79	$ 256.754.460,77	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO TRAMO 2	21,00%	10,81%	-10,19%	K3+918 a K3+852 Alistamiento de formaletas para módulos de cuneta. K3+840 a K3+807 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en berma cuneta **/** K3+916 a K3+852 Instalación de concreto In situ para 16 módulos de cuneta. K3+840 a K3+807 Instalación de formaletas. **/** K3+840 a K3+771. Instalación de concreto In situ para 17 módulos de cuneta. K3+222 Inicia excavación de zanja de descole. **/** K3+838 a K3+773. Instalación de concreto In situ para 16 módulos de cuneta. K3+222. Aseo y limpieza de obra
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	Se realiza fundida de módulos para cunetas. K1+910- k1+960. Costado izquierdo. **/** * Se realiza desencofrado y retiro de formaletas de módulos para cunetas. K1+910- k1+960. Costados izquierdo. Adicionalmente se agrega material para el atraque de los hombros. * Se realiza barrido general de vía y cunetas. * Se realiza alistamiento de pista (compactación y extendido de material). K1+980 a K2+050. Costado izquierdo. **/**

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020”. OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	12.494.588.139,00	0,04%	$ 0,57	1,03%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

TRAMO UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 02: 1 inspector. 2 auxiliares de tráfico. 5 ayudantes. 1 oficial. 1 operador de minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Minicargador. 1 Mezcladora. 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto. 1 generador de energía . 1 cortadora
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 18 de agosto de 2025. Clima:
FESTIVO
Martes 19 de agosto de 2025. Clima: seco
Se realiza fundida de módulos para cunetas. K1+910- k1+960. Costado izquierdo.
Miércoles 20 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza desencofrado y retiro de formaletas de módulos para cunetas. K1+910- k1+960. Costados izquierdo. Adicionalmente se agrega material para el atraque de los hombros.
* Se realiza barrido general de vía y cunetas.
* Se realiza alistamiento de pista (compactación y extendido de material). K1+980 a K2+050. Costado izquierdo.
Jueves 21 de agosto de 2025. Clima: lluvias moderadas 01:00-03:45.
* Se realiza alistamiento (compactación y extendida de material), para módulos de cunetas. Se arman 8 modulos K1+970- k2+010. Costados izquierdo.
* Se realiza trasiego de cemento, grava, arena y canecas hasta K2+020.
* Se evidencia el desencofrado de batea de ingreso a predio de k0+850. Se observa que los remates de la misma no son los más estéticos, se solicita poder rematar mejor las obras que se adelantan con el fin de evitar el retroceso. Adicionalmente se solicita hacerlo antes de las 24 horas ya que se fragua el concreto y es más difícil dar el terminado
Viernes 22 de agosto de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - * * No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de realce de alcantarillas. **/** * Se presenta la renuncia de 1 ayudante de obra.
* No se evidencian auxiliares de tráfico ni tampoco 2 ayudantes. * Se evidencia que el minicargador desarrolla actividades sin cierre de PMT.**/**

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 09:1 Topógrafo. 1 Cadenero. 1 Inspector. 2 Auxiliar de tráfico. 1 Operador de Minicargador. 1 Operador de retrocargador. 1 conductor de volqueta doble. 1 Maestro. 1 Oficial. 2 Ayudantes
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Retrocargador. 1 Minicargador. 1 Volqueta doble
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 18 de agosto de 2025. Clima:
FESTIVO
Martes 19 de agosto de 2025. Clima: seco
K3+918 a K3+852 Alistamiento de formaletas para módulos de cuneta.
K3+840 a K3+807 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en berma cuneta
Miércoles 20 de agosto de 2025. Clima: seco
K3+916 a K3+852 Instalación de concreto In situ para 16 módulos de cuneta.
K3+840 a K3+807 Instalación de formaletas.
Jueves 21 de agosto de 2025. Clima: seco
K3+840 a K3+771. Instalación de concreto In situ para 17 módulos de cuneta.
K3+222 Inicia excavación de zanja de descole.
Viernes 22 de agosto de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:00 a 10:00 am
K3+838 a K3+773. Instalación de concreto In situ para 16 módulos de cuneta.
K3+222. Aseo y limpieza de obra
Sábado 23 de agosto de 2025. Clima:

Domingo 24 de agosto de 2025. Clima:

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO : **/ I Se pone en conocimiento del contratista la ruta crítica para construcción de alcantarillas y entrega de obra nueva, sin embargo se programa iniciar la ejecución de la alcantarilla ubicada en el K3+206.Se solicita el atraque y lleno de la alcantarilla ubicada en el k4+464. **/** Se verifican espesores de B-200 entre abscisas K3+840 a K3+771 de 0,07 m. Se solicita al contratista conservar los espesores de diseño en la construcción de cunetas. **/** Se requiere realizar excavación manual en zanja de alcantarilla K4+464 para garantizar el desagüe de la escorrentía. Se solicita el retiro de tubería 36" acopiada en tramo conservando la que se usará para la construcción de alcantarillas. **/** Aun no se da ingreso a las cuadrillas de remates y construcción de alcantarillas. En acopio CEV K4+190 se evidencia afectación en cableado de energía para suministro en vivienda, la vivienda se encuentra sin luz, se requiere esclarecer la responsabilidad de los actores de intervención en vía.**/**

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

1.ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Tramo de Unión Tunales.
⁻Programa de atención al Usuario
La profesional social, realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil (carpa) en el tramo vial de Unión Tunales, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra, cuya atención son los lunes de 9: 00 a.m. a 1: 00 p.m.
Cuenta con un punto de atención a la comunidad Fijo, el cual está ubicado en la Unión tiene una línea de atención móvil 3204461693, el correo electrónico socialconsorcioev@gmail.com
A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil, con el fin de atender a la comunidad cercano de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.
⁻Programa de información y participación comunitaria.
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual. La interventoría solicita se realice mantenimiento, para evitar deterioro.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
La interventoría realiza verificación de los puntos satélites y se evidencia que el contratista cumple con la actualización.
•Actas de vecindad
Durante la semana del presente informe no se realizan actas de vecindad por no ser necesario.

•Actas de compromiso
La profesional social del Consorcio realizó dos actas de compromiso con los señores Ángel Delgado y Luis Rey, residentes del tramo Unión Tunales, dichas relacionadas a las entradas de los predios.

Tramo de San Antonio El Toldo.

⁻Programa de información y participación comunitaria.
•Puntos satélites
El contratista realizó la instalación de dos puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa del señor Luis Bustos
Colegio del El Toldo.
Se evidencia que cuanta con afiche informativo, volantes informativos.
•Vallas informativas
El contratista cuenta con la instalación de dos vallas móviles establecidas contractualmente.
•Pasacalles
El contratista realizó la instalación del pasacalle que se encontraba pendiente por su instalación.
•Actas de vecindad
Durante la semana del presente informe no se realizan actas de vecindad por no ser necesario.
•Acta de compromiso
Durante la semana no se realizan actas de compromiso por no ser necesario.
Programa de atención al Usuario.
La profesional social, realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil (carpa) en el tramo vial de Unión Tunales, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra, cuya atención son los martes y jueves de 9: 00 a.m. a 1: 00 p.m.
Cuenta con un punto de atención a la comunidad Fijo, el cual está ubicado en la Unión tiene una línea de atención móvil 3204461693, el correo electrónico socialconsorcioev@gmail.com
La interventoría social, informa acerca del incidente que se presentó con el cableado de luz del predio ubicado en la abscisa k3+800, propiedad de la señora Nidia Hernández, sin en embargo, la profesional social del consorcio informa que no se ha verificado lo sucedido. La interventoría solicita verificar la información.
⁻Vinculación de personal mano de obra.

El Consorcio Estabilización vial cuenta en total con:
Con 39 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:

Mano de obra calificada (MOC)

8 trabajadores profesionales.
10 son operarios
Para un total de 18 trabajadores

Total, de porcentaje 46,15 %

Mano de obra no calificada (MONC)

5 trabajadores foráneos
9 trabajadores de la localidad del Sumapaz.
Total, de personal 14 trabajadores.

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Observaciones SST Tramo 2 Tunales:
Personal / 21-08-2025
2 auxiliares de tráfico. 4 ayudantes. 1 oficial. 1 operador de minicargador
Maquinaria y equipos de obra
1 Minicargador. 1 Mezcladora. 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto
1 Generador de energía. 1 Cortadora
Observaciones SST
•Dotación en orden
•Se evidencia Dos carpas de resguardo para el personal en la zona.
•No se evidencian auxiliares de tráfico ni tampoco 2 ayudantes.
•Se evidencia que el minicargador desarrolla actividades sin cierre de PMT. Se reiteró el cambio de paletas de pare y siga las cuales están decoloradas
•Se solicitó en comité no realizar corte de carpeta de fresado con pulidora ya que esta herramienta eléctrica es para usos momentáneos
•Se observa kit de emergencias en orden
•Punto ecológico en orden
•Se evidencia entrega de EPPs y uso de los mismos
•Se solicitó en comité dotar a los todos los trabajadores con el overol autorizado

Observaciones SST Tramo San Antonio tramo 9:
Personal en obra: 20-08-2025
1 Topógrafo. 1 Cadenero. 1 Inspector. 1 Auxiliar de tráfico. 1 Operador de Minicargador. 1 Operador de retrocargador. 1 conductor de volqueta doble.
Grupo encoles
1 Maestro. 2 Oficiales. 1 Ayudantes
Observaciones SST
•No hay unidades sanitarias en terreno, trabajadores manifiestan que los baños permitidos están muy lejos de la zona donde se realiza trabajos
•Señalización de acopios en orden
•Hidratación en orden
•Falta un auxiliar de tráfico
•Se solicitó en comité el retiro de pedazos de varilla en terreno
•Algunos trabajadores sin uniforme identitario
•Pendiente por subsanar observación de trabajadores sin uniforme del contrato.

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión de informe semanal entregado por el contratista
4.Revisión del informe mensual No 21 del periodo de julio de 2025 del cual se remite aval
5.Participación del comité de seguimiento No 79; donde se realiza seguimiento al componente.

Frente Tunales

-En obra se evidencia, kit de emergencias y control de derrames, cartelera. K 1+500 tramo 2
-Se evidencia acopio de hierro delimitado, sin embargo, se solicita mantener esta área delimitada y organizada.
-En obra se, mantiene campamento temporal, donde se ubicó punto ecológico. Ubicada en tramo 2 K 1+500.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados. Para el periodo en el tramo 2 K 1+550 y 1+450 se encontrados dos acopios de pétreos con medidas que requirieron adecuación.
Cabe mencionar que algunos acopios se encuentran delimitados y cubiertos, medidas que se deben mantener para todos los sitios destinados como acopios.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-En recorrido realizado se evidencia que las bolsas de cemento se mantienen acopiadas en bolsas rojas, se sugiere señalizar el área donde están almacenadas temporalmente. Se recomienda no dejarlas a la intemperie.
-PMT correctamente implementado con las señales necesarias y dos auxiliares de tráfico en sitio.
-Se solicito que el material producto de la excavación de la cuneta sea empleado en el atraque de la misma, con el fin de limpiar los terrenos donde han sido depositados. En implementación parcial
-Se solicita mantener orden y aseo en el área de campamento móvil.
-Se mantiene acopio de pétreo tramo 2 K 1+450 cubierto y delimitado.

Frente San Antonio

-Se sugirió mantener señalizar materiales acopiados al lado de via K 4+200 y 4+300 arena, grava; K5+250, K 4+200, K 4+920, RCD y triturado. Se requiere mantener medidas de manejo de acopios de pétreos y RCD.
-Se mantiene solicitud que los residuos sobrantes de las fundidas sean dispuestos de manera correcta como RCD y no en zonas verdes o alcantarillas del sector.
-Se recomendó mantener la via cerrada mientras realizan la actividad de cargue de volqueta.
-Se solicito realizar limpieza permanente de via a la salida del acopio de RCD K5+250 y 4+200
-Se sugirió al contratista limpiar la via posterior a las fundidas de concreto ya que el minicargador genera caída de material en el transporte del mismo.
-Se requiere que todos los acopios de hierro y tubería se mantengan delimitados. En el periodo se identificó acopios sin señalizar.
-Se solicito mantener punto ecológico organizado y colocar la tapa blanca a la caneca.
-En obra se evidencia kit control de derrames, kit de emergencias y cartelera implementada
-En lo corrido de la semana se evidencia ausencia de carpa, es necesario implementar una con el fin de ubicar los elementos necesarios de obra; como punto ecológico, kit de derrames, kit de emergencia.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Lo anterior debido a que en el periodo se evidencio implementación de acopio sin las medidas ambientales descritas anteriormente, se requiere que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha situación. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). Mejorar acopio de RCD K 5+200 y K 4+920, cubrimiento.
-Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas en intervención en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se solicito que el material producto de la excavación de la cuneta sea empleado en el atraque de la misma, con el fin de limpiar los terrenos donde han sido depositados y que estos materiales sean compactados y técnicamente instalados.
-PMT correctamente implementado con las señales verticales móviles necesarias.
-Se evidencia solicita realizar jornada de orden y aseo en K 2+500 y 1+150, se solicitó realizar de manera supervisada para garantizar toda la recolección de plásticos, maderas, cintas, etc, que se encuentran en el tramo.
-En el K 6+710 se requiere evacuar el tanque que se encuentra ubicado al costado de via.
-K 2+140 se evidencia acero en predio privado se evidencia delimitación de este material, se recomendó delimitar la tubería acopiada a lo largo del tramo.
-Se mantiene rotulación de recipientes de sustancias químicas

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

	Componente Técnico	



Descripción Foto 1.

Frente Tunales. Se realiza fundida de módulos para cunetas. K1+910- k1+960. Costado izquierdo.



Descripción Foto 2.

Frente Tunales. Se realiza fundida de módulos para cunetas. K1+910- k1+960. Costado izquierdo.



Descripción Foto 3.

Frente San Antonio. Módulos fundidos



Descripción Foto 4.

Frente San Antonio. Módulos fundidos



Descripción Foto 5

Frente Tunales. Se agrega material para el atraque de los hombros.



Descripción Foto 6


Frente Tunales. Se agrega material para el atraque de los hombros.

Componente Social



Descripción Foto 7

Acta de compromiso

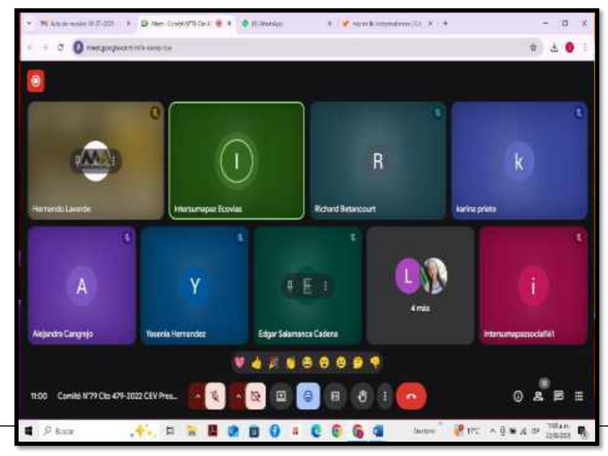

Descripción Foto 8

Comité de seguimiento integral # 78

Componente SST



Descripción Foto 9

Frente San Antonio. PMT solo hay un auxiliar



Descripción Foto 10

Frente San Antonio. Se solicitó en comité el retiro de pedazos de varilla en terreno

Componente Ambiental



Descripción Foto 11

Frente San Antonio. Cargue de RCD



Descripción Foto 12

Frente San Antonio. Material vegetal que requiere recolección

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

	OBRA	INTERVENTORÍA
NO. CONTRATO	COP-479-2022	CIN-161-2022
OBJETO	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 (SAN ANTONIO II (K6+910-K0+000), UNIÓN TUNALES Y ANIMAS BAJAS.").	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR.
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTABILIZACIÓN VÍAL	ECOVIAS S.A.S
VALOR	$12.494.588.139,00	$6.973.710.736,00
ANTICIPO	$2.498.917.628,00	N/A
FECHA DE INICIO	3/03/2022	3/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	9/08/2025	4/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz	DIEGO GARCIA BEJARANO - Alcalde Local de la Alcaldía Local de Sumapaz
NO. EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	98	17
NO. EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	10	2

SEMANA N. **106** **DEL** lunes, 25 de agosto de 2025 **AL** domingo, 31 de agosto de 2025

AVANCES DE OBRA

PROGRAMADO			**EJECUTADO**	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,04%	57,00%	0,05%	16,78%
Valor del Trabajo Programado	$ 9.326.640,69	$ 14.208.742.003,79	$ 11.217.427,90	$ 4.182.854.224,97

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
TRAMO ANIMAS BAJAS	N/A	N/A	N/A	
TRAMO LAGUNA VERDE	N/A	N/A	N/A	
TRAMO SAN ANTONIO TRAMO 2	21,00%	10,81%	-10,19%	K3+770 a K3+705 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta. K4+464 Zanja manual en Alcantarilla. **/** K3+771 a K3+704 Corte de pavimento. Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta. K3+769 a K3+705. Instalación de concreto In Situ para 17 módulos de cuneta. K3+222. Excavación para estructura de descole. K4+464. Atraque de estructura de descole con material de excavación. **/** K3+758 a K3+707. Instalación de concreto In Situ para 13 módulos de cuneta. K3+222. Finaliza Excavación para estructura de descole. **/** K3+840 a K3+771 revestimiento de porosidades en módulos.
TRAMO CAPITOLIO	62,00%	54,00%	-8,00%	
TRAMO UNIÓN-TUNALES	100,00%	42,00%	-58,00%	* Se realiza fundida de modulos intermedios para cunetas. Se armán un total de 7 modulos K1+970- k2+010. Costados izquierdo. * Se realiza fundida de 3 modulos intermedios aprobados por interventoría entre K2+045 a K2+057. * Se realiza excavación para batea de ingreso al predio del señor Fernando Molina en el punto k1+555 a k1+577. Se realiza un barrido general de vía **/** **tramo 2**. * Se realiza alistamiento de pista y armado de modulos intermedios para cunetas. Se armán un total de 11 modulos K2+030- k2+000. Costados izquierdo. * Se realiza excavación para batea de ingreso al predio del señor Fernando Molina en el punto k1+555 a k1+577. Se realiza un barrido general de vía. * Se realiza atraque de cunetas con material proveniente de la excavación y corte del fresado estabilizado. K1+280 a k1+310 **/**

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020". OBRAS DE CALZADA A CARGO DE LA UAERMV	GLB	12.494.588.139,00	0,04%	$ 0,57	0,05%	16,78%

3.1. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN TÉCNICA

TRAMO UNIÓN TUNALES

Personal disponible en tramo 02: 2 auxiliares de tráfico. 4 ayudantes. 1 oficial. 1 operador de minicargador
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Minicargador. 1 Mezcladora. 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto. 1 generador de energía . 1 cortadora
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 25 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza alistamiento de modulos intermedios para cunetas. Se armán un total de 9 modulos K1+940- k1+970. Costados izquierdo.
* Se realiza desencofrado de 2 modulos entre K2+045 a K2+057.
* Se realiza excavación para batea de ingreso al predio del señor Fernando Molina en el punto k1+555 a k1+577. Se realiza un barrido general de vía
Martes 26 de agosto de 2025. Clima: lluvias moderadas 03:30 a 05:30.
* Se realiza fundida de modulos intermedios para cunetas. Se armán un total de 7 modulos K1+970- k2+010. Costados izquierdo.
* Se realiza fundida de 3 modulos intermedios aprobados por interventoría entre K2+045 a K2+057.
* Se realiza excavación para batea de ingreso al predio del señor Fernando Molina en el punto k1+555 a k1+577. Se realiza un barrido general de vía
Miércoles 27 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza alistamiento de pista y armado de modulos intermedios para cunetas. Se armán un total de 11 modulos K2+030- k2+000. Costados izquierdo.
* Se realiza excavación para batea de ingreso al predio del señor Fernando Molina en el punto k1+555 a k1+577. Se realiza un barrido general de vía.
* Se realiza atraque de cunetas con material proveniente de la excavación y corte del fresado estabilizado. K1+280 a k1+310
Jueves 28 de agosto de 2025. Clima: seco
* Se realiza alistamiento de pista y armado de modulos intermedios para cunetas. Se arman un total de 8 módulos K2+010- k2+030. Costados izquierdo.
* Se realiza alistamiento de pista para batea de ingreso al predio del señor Fernando Molina en el punto k1+555 a k1+577. Se realiza un barrido general de vía.
* Se realiza atraque de cunetas con material proveniente de la excavación y corte del fresado estabilizado. K1+910 a k2+030.

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA TUNALES: - * * No se funden la totalidad de módulos proyectados debido a avería en Mezcladora. Se evidencia afectación en módulo para la instalación de refuerzo en módulo intermedio. En abscisa K4+202 se requiere conexión de tubería de desagüe. Se evidencia afectación en filos de obras de arte. **/** * Se evidencian algunas rocas que faltan por demoler para asegurar el ancho del hombro de la cuneta. * No se evidencia la llegada de herramientas ni materiales para perforaciones y anclajes de realce de alcantarillas.**/** Se evidencian acopios de RCD sobre vía k0+045 y K0+090. Tramo 5.

TRAMO SAN ANTONIO 2 - TOLDO

Personal disponible en tramo 09:1 Topógrafo. 1 Cadenero. 1 Inspector. 1 Auxiliar de tráfico. 1 Operador de Minicargador. 1 Operador de retrocargador. 1 conductor de volqueta doble. 1 Maestros. 2 Oficiales. 2 Ayudantes
Maquinaria evidenciada en el tramo: 1 Retrocargador. 1 Minicargador. 1 Volqueta doble
Personal de interventoría disponible: 1 residente técnico, 1 Inspector, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 profesional Ambiental, 1 conductor.

Actividades realizadas
Lunes 25 de agosto de 2025. Clima: seco
K3+770 a K3+705 Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta.
K4+464 Zanja manual en Alcantarilla.
Martes 26 de agosto de 2025. Clima: Lluvia moderada 8:00 a 10:00
K3+771 a K3+704 Corte de pavimento. Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta.
K3+769 a K3+705. Instalación de concreto In Situ para 17 módulos de cuneta.
K3+222. Excavación para estructura de descole.
K4+464. Atraque de estructura de descole con material de excavación.
Miércoles 27 de agosto de 2025. Clima: : Lluvia moderada 7:00 a 9:00 am
K3+758 a K3+707 Instalación de concreto In Situ para 13 módulos de cuneta.
K3+222 Finaliza Excavación para estructura de descole.
Jueves 28 de agosto de 2025. Clima: seco
K3+840 a K3+771 revestimiento de porosidades en módulos.
K3+222 Perfilacion de Excavación para estructura de descole
Viernes 29 de agosto de 2025. Clima: seco
K3+222 Instalación de concreto de baja densidad solado en estructura de descole.
K3+580 a K3+630 Cortes de pavimento.
K3+635 a K3+660 Cortes de pavimento.
K4+450 a K4+302 der Atraque de cunetas

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA SAN ANTONIO 2- TOLDO : **/ I Se realiza zanja en alcantarilla K5+464 para evacuar el agua lluvia, la misma se puede colmatar por sedimento situación en la cual es responsabilidad del contratista habilitarla nuevamente. **/** Se realiza recorrido de obra, se identifican cuellos de botella en la intervención pues los rendimientos han bajado debido a remplazo de contratista, las afectaciones en los tiempos están asociadas a la falta de personal.

3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SOCIAL

SEMANAL DEL 25 al 31 DE AGOSTO DEL 2025.
1.ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMPONENTE SOCIAL
Tramo de Unión Tunales.
⁻Programa de atención al Usuario
La profesional social, realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil (carpa) en el tramo vial de Unión Tunales, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra, cuya atención son los lunes de 9: 00 a.m. a 1: 00 p.m.
Cuenta con un punto de atención a la comunidad Fijo, el cual está ubicado en la Unión tiene una línea de atención móvil 3204461693, el correo electrónico socialconsorcioev@gmail.com
A la fecha de cierre del presente informe no se presentan PQRS.
La interventoría realiza recorrido al frente de obra con el fin de verificar la instalación de punto de atención móvil, con el fin de atender a la comunidad cercano de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras, se evidencia que se realiza la instalación de un afiche informativo, volante y PMT.

⁻Programa de información y participación comunitaria.
•Vallas informativas
La interventoría verifica que se tienen las dos vallas establecidas contractualmente.
•Pasacalles
La interventoría realiza verificación y se evidencia que son instalados los dos pasacalles, establecidos contractual. La interventoría solicita se realice mantenimiento, para evitar deterioro.
•Puntos satélites
El contratista realizó el mantenimiento a los cuatro puntos satélites los cuales se encuentran en:
La interventoría realiza verificación de los puntos satélites y se evidencia que el contratista cumple con la actualización.
•Actas de vecindad
Durante la semana del presente informe no se realizan actas de vecindad por no ser necesario.
•Reunión externa
La profesional social del Consorcio realizó cuatro reuniones las cuales relaciono a continuación:

⁻dificultad en la contratación de personal (presidentes de junta de acción comunal
⁻socialización de la entrada del predio del señor Fernando Molina,
⁻socialización con la Junta de Acción Comunal sobre la construcción de la alcantarilla en el predio del señor Aldemar. a quien no fue posible contactar.

⁻Programa de Educación y capacitación al personal.
La profesional social realizó la sensibilización al personal en cuanto a al personal de obra y conductor de la volqueta, acerca de las precauciones que se deben tener en cuenta al momento de descargar material para evitar incidentes con el volcó.
Tramo de San Antonio El Toldo.
⁻Programa de información y participación comunitaria.
•Puntos satélites

El contratista realizó la instalación de dos puntos satélites los cuales se encuentran en:
Casa del señor Luis Bustos
Colegio del El Toldo.
Se evidencia que cuanta con afiche informativo, volantes informativos.
•Vallas informativas
El contratista cuenta con la instalación de dos vallas móviles establecidas contractualmente.
•Pasacalles
El contratista realizó la instalación del pasacalle que se encontraba pendiente por su instalación.
•Actas de vecindad
Durante la semana del presente informe no se realizan actas de vecindad por no ser necesario.
•Acta de compromiso
Durante la semana la profesional social del Consorcio realizó actas de compromiso.
⁻Con el señor Bernardo Peñaloza por la adecuación del terreno.
⁻Programa de atención al Usuario.
La profesional social, realiza atención a la comunidad, con el fin de establecer un contacto cercano con los residentes y usuarios de la zona, brindando la oportunidad de abordar sus inquietudes, recibir retroalimentación y proporcionar información detallada sobre el progreso de las obras.
La profesional social realiza la instalación de carpa móvil (carpa) en el tramo vial de Unión Tunales, con el fin de realizar atención a la comunidad, en el frente de obra, cuya atención son los martes y jueves de 9: 00 a.m. a 1: 00 p.m.
Cuenta con un punto de atención a la comunidad Fijo, el cual está ubicado en la Unión tiene una línea de atención móvil 3204461693, el correo electrónico socialconsorcioev@gmail.com
La interventoría social, informa acerca del incidente que se presentó con el cableado de luz del predio ubicado en la abscisa k3+800, propiedad de la señora Nidia Hernández, sin en embargo, la profesional social del consorcio informa que no se ha verificado lo sucedido. La interventoría solicita verificar la información.
⁻Programa de Educación y capacitación al personal.
La profesional social realizó la sensibilización al personal en cuanto al personal de obra y conductor de la volqueta, acerca de las precauciones que se deben tener en cuenta al momento de descargar material para evitar incidentes con el volcó.
⁻Vinculación de personal mano de obra.
El Consorcio Estabilización vial cuenta en total con:
Con 46 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:
Mano de obra calificada (MOC)
10 trabajadores profesionales.
14 son operarios
Para un total de 24 trabajadores
Total, de porcentaje 46,15 %

3.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN SST

Observaciones SST Tramo 9 San Antonio:
Personal / 26-08-2025
1 Topógrafo. 1 Cadenero. 1 Inspector. 1 Auxiliar de tráfico. 1 Operador de Minicargador. 1 Operador de retrocargador. 1 conductor de volqueta doble
Grupo encoles
2 Maestro. 3 Oficiales. 1 Ayudantes
Maquinaria y equipos de obra
1 Minicargador. 1 Mezcladora. 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto
1 Generador de energía. 1 Cortadora
Observaciones SST
•Dotación en orden
•Se evidencia Dos carpas de resguardo para el personal en la zona.
•No se evidencian auxiliares de tráfico.
•Se observa kit de emergencias en orden
•Punto ecológico en orden
•Se evidencia entrega de EPPs y uso de los mismos
•Se observa señalización caída y deteriorada en tramo
•No hay unidades sanitarias en terreno, trabajadores manifiestan que los baños

Observaciones SST Tramo 2 Tunales:
Personal en obra: 27-08-2025
2 auxiliares de tráfico. 4 ayudantes. 1 oficial. 1 operador de minicargador
Maquinaria y equipos de obra
1 Minicargador. 1 Mezcladora. 1 placa vibratoria. 1 vibrador de concreto
1 generador de energía. 1 cortadora
Observaciones SST
•No hay unidades sanitarias en terreno, trabajadores manifiestan que los baños permitidos están muy lejos de la zona donde se realiza trabajos
•Señalización de acopios en orden
•Hidratación en orden
•PMT en orden
•Kit de emergencias en orden
•Tramo interno de PMT, muy extenso lo cual provoca que los vehículos que circulan excedan velocidades provocando un riesgo para los trabajadores

3.4 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO - GESTIÓN AMBIENTAL

Informe Semanal: SEMANA 25 al 31 de agosto 2025
Actividades Desarrolladas
1.Recorridos a los frentes de obra con el fin de realizar seguimiento a las actividades de manejo ambiental implementadas por el Contratista.
2.Diligenciamiento diario de la bitácora del componente.
3.Revisión de informe semanal entregado por el contratista
4.Revisión del informe mensual No 21 del periodo de julio de 2025 del cual se remite aval
5.Participación del comité de seguimiento No 80; donde se realiza seguimiento al componente.

Frente Tunales

-En obra se evidencia, kit de emergencias y control de derrames, cartelera. K 1+900 tramo 2
-Se evidencia acopio de hierro delimitado, sin embargo, se solicita mantener esta área delimitada y organizada.
-En obra se, mantiene campamento temporal, donde se ubicó punto ecológico. Ubicada en tramo 2 K 1+900.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados. Para el periodo en el tramo 2 K2+100; 1+550 y 1+450 se encontrados dos acopios de pétreos con medidas que requirieron adecuación.
Cabe mencionar que algunos acopios se encuentran delimitados y cubiertos, medidas que se deben mantener para todos los sitios destinados como acopios.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, se localicen en áreas adecuadas, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS).
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-En recorrido realizado se evidencia que las bolsas de cemento se mantienen acopiadas en bolsas rojas, se sugiere señalizar el área donde están almacenadas temporalmente. Se recomienda no dejarlas a la intemperie.
-PMT correctamente implementado con las señales necesarias y dos auxiliares de tráfico en sitio.
-Se solicito que el material producto de la excavación de la cuneta sea empleado en el atraque de la misma, con el fin de limpiar los terrenos donde han sido depositados. En implementación parcial
-Se solicita mantener orden y aseo en el área de campamento móvil.
-Se mantiene acopio de pétreo tramo 2 K 1+450 cubierto y delimitado.
-Se solicito adecuar la protección de la alcantarilla donde pasa un cuerpo hídrico en la abscisa K 2+100, de igual manera se recuerda que los acopios deben estar lejos de fuentes de agua (30 mts).

Frente San Antonio

-Se sugirió mantener señalizar materiales acopiados al lado de via K 4+200 y 4+300 arena, grava; K5+250, K 4+200, K 4+920, RCD y K 4920 triturado. Se requiere mantener medidas de manejo de acopios de pétreos y RCD.
-Se mantiene solicitud que los residuos sobrantes de las fundidas sean dispuestos de manera correcta como RCD y no en zonas verdes o alcantarillas del sector.
-Se mantiene sugerencia de mantener la via cerrada mientras realizan la actividad de cargue de volqueta.

-Se solicito realizar limpieza permanente de via a la salida del acopio de RCD K5+250 y 4+200
-Se sugirió al contratista limpiar la via posterior a las fundidas de concreto ya que el minicargador genera caída de material en el transporte del mismo.
-Se requiere que todos los acopios de hierro y tubería se mantengan delimitados. En el periodo se identificó acopios sin señalizar.
-Se solicito mantener punto ecológico organizado y colocar la tapa blanca a la caneca.
-En obra se evidencia kit control de derrames, kit de emergencias y cartelera implementada
-Se implemento carpa en elK 3+800 donde se encuentran ubicados los elementos necesarios de obra; como punto ecológico, kit de derrames, kit de emergencia y punto de hidratación.
-Se solicita que los acopios de materiales pétreos se implementen las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha PAC-2.1 -04 (Manejo integral de materiales de construcción) y PAC – 2.7 -10 (Emisiones atmosféricas y ruido), los cuales deben permanecer cubiertos para evitar generación de material particulado en el área de influencia directa, señalizados y delimitados.
-Se solicita que los acopios de residuos de construcción y demolición RCD, permanezcan con las medidas de manejo, delimiten, señalicen y cubra dicho material. Así mismo implementar lo descrito en la ficha PAC-2.4-07 (Manejo y disposición final de escombros y lodos (RDCS). Mejorar acopio de RCD K 5+200 y K 4+920, cubrimiento.
-Se requiere aislamiento de todas las alcantarillas en intervención en las áreas donde aún continúan con actividades con el fin de evitar aporte de sedimentos y materiales pétreos a los cauces y/o rondas de los cuerpos de agua y disminuir el riesgo vial.
-En este frente no se evidenciaron derrames de combustibles en el periodo.
-Se sugiere mantener orden y aseo a lo largo de todo el frente de obra.
-Se solicito que el material producto de la excavación de la cuneta sea empleado en el atraque de la misma, con el fin de limpiar los terrenos donde han sido depositados y que estos materiales sean compactados y técnicamente instalados.
-PMT correctamente implementado con las señales verticales móviles necesarias.
-Se evidencia realización de jornada de orden y aseo en K 5+500 hacia menores, donde se recolectaron plásticos, maderas, cintas, etc, que se encuentran en el tramo.
-En el K 6+710 se requiere señalizar el tanque que se encuentra ubicado al costado de via.
-K 2+140 se evidencia acero en predio privado se evidencia delimitación de este material, se recomendó delimitar la tubería acopiada a lo largo del tramo.
-Se mantiene rotulación de recipientes de sustancias químicas.
-Se recomienda reutilizar los letreros de acopios instalados en los puntos que fueron clausurados.

4. PRECIOS NO PREVISTOS - (deberán ser notificados mediante comunicación a la entidad)

A la fecha no se presentan items no previstos.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO (TODAS LAS ÁREAS)

	Componente Técnico	



Descripción Foto 1.

Frente San Antonio. K3+770 a K3+705. Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta.



Descripción Foto 2.

Frente San Antonio. K3+770 a K3+705. Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta.



Descripción Foto 3.

Frente San Antonio. K3+771 a K3+704. Corte de pavimento. Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta.



Descripción Foto 4.

Frente San Antonio. K3+771 a K3+704. Corte de pavimento. Alistamiento, nivelación y compactación de B-200 en Berma-cuneta.



Descripción Foto 5

Frente Tunales. Se realiza fundida de 3 modulos intermedios aprobados por interventoría entre K2+045 a K2+057



Descripción Foto 6

Frente Tunales. Se realiza fundida de modulos intermedios para cunetas. Se armán un total de 7 modulos K1+970- k2+010. Costados izquierdo.

Componente Social



Descripción Foto 7

Frente San Antonio. Sensibilización al personal de obra.



Descripción Foto 8

Comité de seguimiento integral # 79

Componente SST



Descripción Foto 9

Frente San antonio. Se recomienda crear un limite de seguridad señalizado en zona de trabajo



Descripción Foto 10

Frente San antonio. Se solicitó contratación de auxiliares de tráfico en terreno

Componente Ambiental



Descripción Foto 11

Frente San Antonio. Punto ecológico en carpa implementada



Descripción Foto 12

Frente Tunales. Acopio de RCD que requiere adecuación
