CONTRATO DE OBRA No. CSAMCIH430 DE 2023

INFORME DE OBRA No. 03

MENSUAL [X] FINAL [ ]

Objeto Contrato: "CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,DEPARTAMENTO DEL HUILA"





MUNICIPIO: LA ARGENTINA – SAN AGUSTIN.

DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE OBRA No. CSAMCIH430 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC.


INTERVENTORIA	CONSORCIO INDERHUILA 2023	ENTIDAD	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CSAMCIH430 DE 2023		
OBJETO	"CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA"	PERIODO DEL INFORME	Entre 07 de junio al 06 De julio 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC	NIT:	901.771.793-8
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	C.C:	1.001.276.642
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	21/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	29/11/2023		
OTROSI No. 01 - Modificación Clausula 6	14/12/ 2023		
SUSPENSIÓN 1	28/12/2023		
REINICIO 1	07/05/2024		
OTROSI No. 02 - Modificación Cláusula 4 Ajuste a la vigencia fiscal	07/05/2024		
OTROSI No. 03 - Modificación Cláusula 4 Prorroga de dos (02) meses.	05/07/2024		
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL		
PLAZO ADICIONAL No. 01	DOS (02) MESES.		
PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES		
VALOR INICIAL:	$215.045.630		
VALOR ADICIONAL:	$0		
VALOR TOTAL:	$215.045.630		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INDERHUILA 2023	NIT:	813.005.578-7
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN MANUEL MEDINA	C.C:	12.132.626
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO			

El presente contrato tiene desarrollo en el departamento del Huila, Huila es uno de los treinta y dos departamentos que conforman la República de Colombia. Su capital y ciudad más poblada es Neiva. Está ubicado al suroeste del país, en la región andina.

El proyecto se desarrolla en dos municipios del departamento del Huila:

1. **Resguardo indígena Fil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila:**


Para llegar a sitio de intervención, se debe coger la ruta que dirige desde el centro de San Agustín al Parque Nacional Arqueológico, en ese sitio se desvía a mano derecha llegando hasta llegar al corregimiento de Pradera, continuo se sigue la via hasta llegar al corregimiento villa Fátima, luego se desvía a mano izquierda para llegar hasta el resguardo indígena Fil Vits.

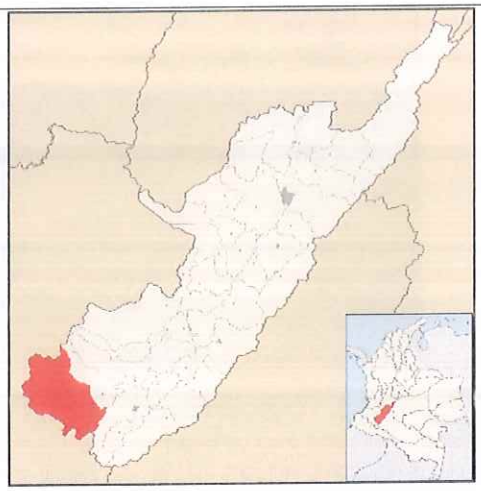



2. **Resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de La Argentina, departamento del Huila:**

Desde el municipio de la Plata-Huila, se transita en dirección al municipio de la Argentina-Huila, en el corregimiento de gallego se desvía a mano derecha dirigiéndose hasta el corregimiento de belén, luego de llegar a belén se continua hasta llegar al rio Loro, por el cual hay solo transito peatonal, luego de cruzar el rio se transita aproximadamente 2 kilómetros caminando hasta llegar al resguardo indígena

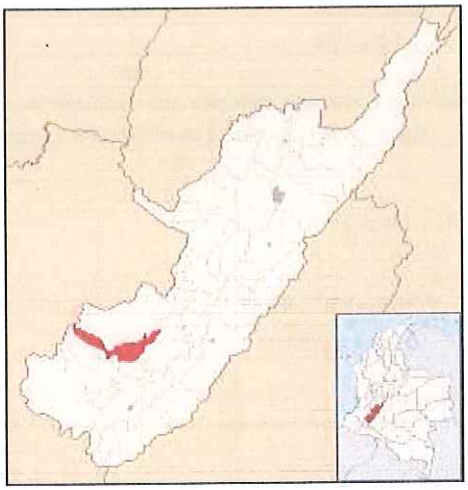



3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en la construcción de dos placas, una placa para polideportivo en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de La Argentina y otra placa en el resguardo indígena Fiil Vits - La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila.

Cada intervención consiste en la construcción de una placa en concreto para polideportivo de 3000 PSI de medidas de 30 x 20 y un espesor de 10 cm para un total de 600 m2 con su correspondiente juego de canchas múltiples y su respectiva demarcación para microfutbol, baloncesto y voleibol.

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

La veeduría realizo visitas al proyecto durante la ejecución de este informe.

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
FIRMA CONTRATO	21/11/2023			
INICIACIÓN	29/11/2023	0		31/12/2023
ACTA DE MODIFICACION No. 1	12/12/2023	14		
OTROSI N°1	13/12/2023	2		
ACTA PARCIAL 1	19/12/2023	5		
SUSPENSIÓN 1	28/12/2023	8		
REINICIO 1 - OTROSI No.2	07/05/2024	1	131	
OTROSI No. 3	05/07/2024	58		07/09/2024
INFORME No. 03	06/07/2024	1		
TOTAL DIAS		**89**	**131**	

6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	1	*29 de noviembre de 2023*
ACTA DE VEEDURIA RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK – MUNICIPIO LA ARGENTINA - HUILA	1	*30 de noviembre de 2023*
ACTA DE VEEDURIA RESGUARDO INDIGENA FIL VITS-LA PERDIZ -MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUILA	1	*1 de diciembre de 2023*
ACTA DE MODIFICACION ANTICIPO No 1	1	*12 de diciembre de 2023*
OTRO SI – Modificación Clausula 6	1	*14 de diciembre de 2023*
ACTA PARCIAL	1	*19 de diciembre 2023*
ACTA JUSTIFICACION	1	*28 de diciembre 2023*
ACTA DE SUSPENSIÓN	1	*28 de diciembre 2023*
ACTA JUSTIFICACION	2	*07 de mayo 2024*

ACTA DE REINICIO	2	*07 de mayo 2024*
OTROSI 2 – Modificación Cláusula 4 Ajuste a la vigencia fiscal	2	*07 de mayo 2024*
ACTA DE JUSTIFICACION	3	*05 de julio de 2024*
OTROSI 3 - Modificación Cláusula 4, Prorroga de Tiempo	3	*05 de julio de 2024*

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). Actividades **administrativas**	➢ **Se realizo el acta de Justificación No. 03:** Se llevo a cabo la realización del acta de Justificación No. 03, donde se justifica jurídica, técnica y financieramente la prórroga al contrato de obra por un término de dos (02) meses. ➢ **Elaboración de acta de comité:** Se llevo a cabo acta de comité con el acompañamiento del apoyo a la supervisión, para coordinar avances, resolver problemas y tomar decisiones ➢ **Se firmo el OTROSI3:** Se suscribe Otrosí modificatorio No. 03 al contrato de obra número CSAMCIH430 de 2023 celebrado entre el instituto departamental del deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre del huila "INDERHUILA" y consorcio escenarios deportivos JC, con el fin de modificar la Clausula 4, y prorrogar el plazo de ejecución en dos (02) meses más, para un total de plazo de ejecución de cinco (05) meses.
b.) **Actividades operativas**	Durante el periodo comprendido desde el 07 de junio del 2024 al 06 de julio del 2024 se realizaron las siguientes actividades: ➢ **Resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de La Argentina, departamento del Huila.** Durante los 30 días calendario transcurridos contados del presente informe de obra, se han presentado precipitaciones en más de 16 de ellos, lo que representa aproximadamente el 58% del período de ejecución. Esta condición climática ha generado restricciones significativas en el desarrollo normal de las actividades. Adicionalmente, el acceso al sitio de intervención debe realizarse exclusivamente mediante el uso de bestias de carga, motocicleta o de forma peatonal, dado que se encuentra ubicado a una distancia superior a 1.25 km desde la vía terciaria principal, punto hasta el cual es posible el ingreso de vehículos. Esta condición ha dificultado considerablemente el transporte de materiales, logrando ingresar únicamente un volumen estimado de 10,91 m³ hasta la fecha. La combinación de las condiciones climáticas adversas y la limitada accesibilidad ha ocasionado un suministro lento de materiales, lo cual ha impactado de manera directa el cumplimiento del cronograma de obra establecido. ➢ **Resguardo indígena Fil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila:** Durante los 31 días calendario contados del presente informe de obra, se han presentado precipitaciones en la zona en 14 de dichos días, lo cual equivale al 46% del período de ejecución hasta la fecha. Esta condición climática ha generado limitaciones significativas en la ejecución de las actividades programadas. Cabe destacar que únicamente en dos oportunidades se han presentado al menos tres días consecutivos sin lluvias, los cuales fueron aprovechados para el transporte de material pétreo hacia el frente de trabajo. Sin embargo, debido al mal estado de la vía de acceso y a la elevada humedad presente en la misma, en seis viajes no fue posible completar el acarreo total del material hasta el sitio de intervención y este toco dejarlos acopiados a borde de carretera. Actualmente, se intentó ingresar al sitio de intervención 3 viajes de material pétreo, siendo imposible por las condiciones climáticas, estos viajes tocó acopiarlos a borde de vía de acceso, en total se cuenta con material acumulado sobre la vía de 6 viajes de volqueta sencilla, a la espera de condiciones climáticas favorables que

	permitan ejecutar el sobreacarreo del material y continuar con el avance de las actividades conforme al cronograma establecido,

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el periodo comprendido desde el 07 de junio del 2024 al 06 de Julio del 2024 se evidencio el siguiente estado del clima:

- **Resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de La Argentina:**

CONTROL DEL CLIMA EN OBRA EN LA ARGENTINA																														
MES	JUNIO																								JULIO						
FECHA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
DIAS	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
LLUVIAS		X		X			X		X	X		X		X	X			X	X		X		X		X	X		X		X

Con relación a la tabla anterior se puede observar que de los 30 días se han presentado precipitaciones 16 días, siendo esto el 53% de los días de ejecución.

- **Resguardo indígena Fil Vits – La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila:**

CONTROL DEL CLIMA EN OBRA EN SAN AGUSTÍN																														
MES	JUNIO																								JULIO					
FECHA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
DIAS	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
LLUVIAS	X		X			X				X		X			X	X				X	X		X	X	X	X				X

Con relación a la tabla anterior se puede observar que de los 31 días de ejecución se han presentado precipitaciones en la zona 14 días, siendo esto el 46% de los días de ejecución.

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
FIL VITS - Diseños de mezcla para los concretos.	3.000 PSI	Cemento – 363,6 kg/m3 Agregado fino – 711 kg/m3 Agregado grueso – 1067 kg/m3
NAM MISAK - Diseños de mezcla para los concretos.	3.000 PSI	Cemento – 366,3 kg/m3 Agregado fino – 716 kg/m3 Agregado grueso – 1066 kg/m3

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

N.A.

10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	09/05/2024	$53.761.407,50		$53.761.407,50
Acta Parcial No. 1	09/05/2024	$51.735.900,00	$12.933.975,00	$38.801.925,00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$215.045.630,00	$0	$215.045.630,00	$51.735.900,00	$163.309.730,00

11. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)

26/06/2024	Virtual	El contratista manifiesta haber agotado las gestiones logísticas necesarias para el acopio y transporte de los materiales requeridos en los frentes de intervención. No obstante, debido a factores exógenos, específicamente condiciones meteorológicas adversas persistentes en la zona de influencia del proyecto, se ha presentado una restricción significativa en la cadena de suministro, impidiendo la entrega oportuna de la totalidad de los insumos. En consecuencia, se formaliza la solicitud de una ampliación del plazo contractual inicial en dos (2) meses, lapso que se corresponde directamente con el tiempo acumulado de afectación en la programación de obra derivado de las contingencias climáticas mencionadas. El equipo de apoyo a la supervisión e interventoría, tras analizar la trazabilidad de las actividades y el registro de las condiciones climáticas adversas, expresa su conformidad con la solicitud de prórroga presentada por el contratista. Por lo anterior, la supervisión solicita formalmente al contratista y a la interventoría la elaboración y presentación de la documentación técnica y legal pertinente para sustentar la adición de tiempo (prórroga) ante la entidad contratante. Se establece como fecha límite para la recepción de dicha documentación, vía correo electrónico, el día viernes 28 de junio. Esto permitirá llevar a cabo la revisión exhaustiva y la validación técnica por parte de la supervisión. Posteriormente, se requiere la radicación física de la documentación original en las oficinas de la entidad contratante a más tardar el día martes 02 de julio

12. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA INTERVENTORIA	No. RADICADO (INTERVENTORIA)	FORMATO (Físico/Digital)
Inconvenientes Con Materiales Frentes De Obra.	21/06/2024		Digital
Radicación Diseño De Mezclas	03/07/2024		Digital

13. RELACION DE PERSONAL (Profesional y Mano de obra)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO
Hernán Darío Rivera Flórez	80.086.564	Director De Obra
Cesar Ricardo Vargas Gutiérrez	80.852.105	Residente de obra – Nam Misak.
María Ximena Vargas Gutiérrez	1.075.286.356	Residente de obra – Fil Vits.
María Katalina Silva Manrique	1.075.275.516	Especialista en gerencia de proyectos.
Mario Andres Ortiz Villareal	1.075.217.262	Maestro de Obra
Carlos Andres Cantillo Gutiérrez	6.802.541	Ayudante de Obra
Nelson Vargas Almario	12.116.869	Ayudante de Obra
William Iván Delgado Rodríguez	1.075.218.779	Ayudante de Obra

14. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	2024000387	09/05/2024
ACTA PARCIAL 1	2024000388	09/05/2024

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
Hernán Darío Rivera Flórez	$208.000	$162.500	$6.800	$0	$0	9469288607
Cesar Ricardo Vargas Gutiérrez	$208.000	$162.500	$8.000	$0	$0	9467274781 9482012132
María Ximena Vargas Gutiérrez	$145.600	$36.400	$31.700	$4.800	$0	9484927064
María Katalina Silva Manrique	$320.000	$250.000	$10.500	$0	$0	29861798
Mario Andres Ortiz	$208,000	$52,000	$6,800	$52,000	$0	9469779542
Carlos Andres Cantillo Gutiérrez	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	30707131
Nelson Vargas Almario	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	30707131

William Iván Delgado Rodríguez	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	30707131
Andres Felipe Paredes Sanabria	$208,000	$52,000	$6,800	$52,000	$0	9469779542
Juan Carlos García Rodríguez	$208,000	$52,000	$90,500	$52,000	$0	30707131

16. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1- OTROSI No.:


POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGUADORA	No	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa
Aseguradora Solidaria	**560-47-994000171378**	**ANEXO 3**	**05/07/2024**	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	20/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	20/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	18/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGÚN PRORROGA No. 1- OTROSI No.3:					
Aseguradora Solidaria	560-74-994000031449	ANEXO 3.	05/07/2024	10/07/2024	10/09/2024

17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

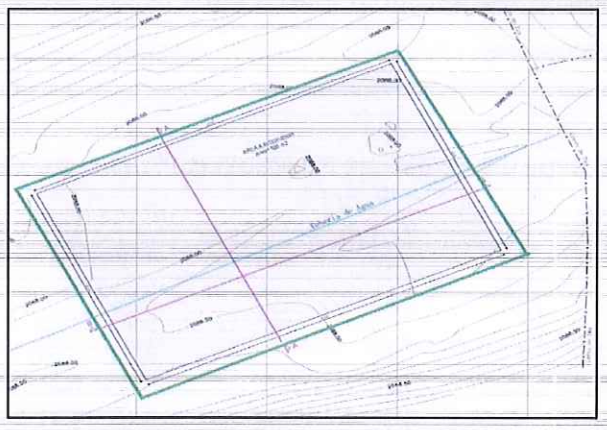

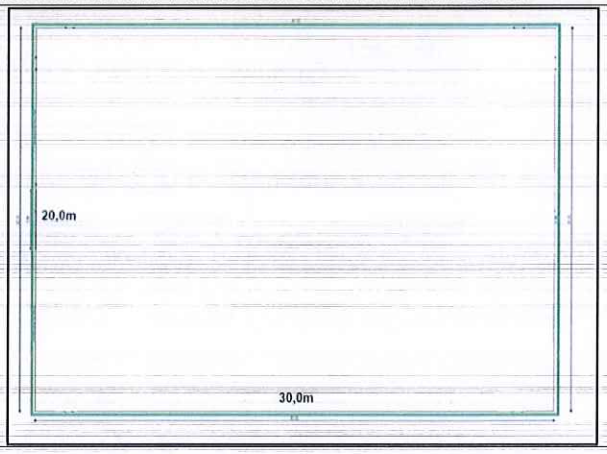

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUTADO CANTIDADES			ACUMULADO CANTIDADES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE
	CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA									
1	PRELIMINARES					PRELIMINARES				
1.01	Localización y replanteo.	M2	600,00	$ 3.596,00	$ 2.157.600,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	600,00	2,5083%
1.02	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material	M2	25,00	$ 26.558,00	$ 663.950,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
		SUB-TOTAL			$ 2.821.550,00		$ 0,00			2,5083%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	180,00	$ 46.490,00	$ 8.368.200,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	180,00	9,7284%
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	120,00	$ 84.738,00	$ 10.168.560,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	120,00	11,8214%
		SUB-TOTAL			$ 18.536.760,00		$ 0,00			21,5498%
3	ACABADOS					ACABADOS				
3.01	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,5mts. incluye: aro.malla, de marcado logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2,00	$ 3.793.495,00	$ 7.586.990,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
3.02	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.955,00	$ 4.752.400,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
		SUB-TOTAL			$ 12.339.390,00		$ 0,00			0,0000%

4	PLACA DE CONTRAPISO					PLACA DE CONTRAPISO				
4.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	600,00	$ 85.633,00	$ 51.379.800,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
	SUB-TOTAL				$ 51.379.800,00		$ 0,00			0,0000%
6	TRANSPORTE					TRANSPORTE				
6.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	846,00	$ 1.112,00	$ 940.752,00	153,83	$ 171.059,00	0,1989%	153,83	0,1989%
	SUB-TOTAL				$ 940.752,00		$ 171.059,00			0,1989%
	Costo Directo - Nam Misak				$ 86.018.252,00		$ 171.059,00			24,2570%

CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA FIIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUTADO CANTIDADES			ACUMULADO CANTIDADES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	PRELIMINARES					PRELIMINARES				
1.01	Localización y replanteo.	M2	600,00	$ 3.596,00	$ 2.157.600,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	600,00	2,5083%
1.02	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material	M2	25,00	$ 26.558,00	$ 663.950,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
	SUB-TOTAL				$ 2.821.550,00		$ 0,00			2,508%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	180,00	$ 46.490,00	$ 8.368.200,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	180,00	9,7284%
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	120,00	$ 84.738,00	$ 10.168.560,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	120,00	11,8214%
	SUB-TOTAL				$ 18.536.760,00		$ 0,00			21,550%
3	ACABADOS					ACABADOS				
3.01	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo	UND	2,00	$ 3.793.495,00	$ 7.586.990,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%

	de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,5mts. incluye: aro.malla, de marcado logos, anticorrosivo y pintura.									
3.02	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto.	ML	317,78	$ 14.955,00	$ 4.752.400,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
		SUB-TOTAL			$ 12.339.390,00		$ 0,00			0,000%
4	PLACA DE CONTRAPISO					PLACA DE CONTRAPISO				
4.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	600,00	$ 85.633,00	$ 51.379.800,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
		SUB-TOTAL			$ 51.379.800,00		$ 0,00			0,000%
6	TRANSPORTE					TRANSPORTE				
6.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	846,00	$ 1.112,00	$ 940.752,00	0,00	$ 0,00	0,0000%	0,00	0,000%
		SUB-TOTAL			$ 940.752,00		$ 0,00			$ 0,00
		Costo Directo - Fil Vits			$ 86.018.252,00		$ 0,00			24,058%
		Costo Directo - Proyecto			$ 172.036.504,00		$ 171.059,00			24,158%

EL PROYECTO TIENE UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO DE 24,158%.


NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. HERNAN RIVERA F.
DIRECTOR DE OBRA

ING. JUAN MANUEL MEDINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

19. REGISTRO FOTOGRAFICO

19.1 RESGUARDO INDIGENA FIL VITS:

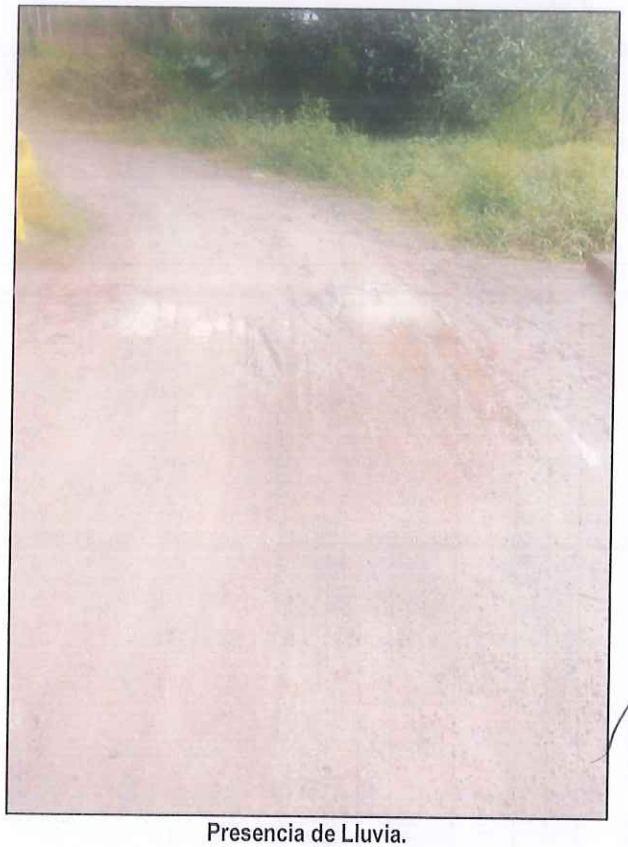

Presencia de Lluvia.



Obstáculos en la vía.





Mal estado de las vías.



Material Acopiado en vias por dificil acceso al proyecto.

19.2 RESGUARDO INDIGENA NAM MISAK:

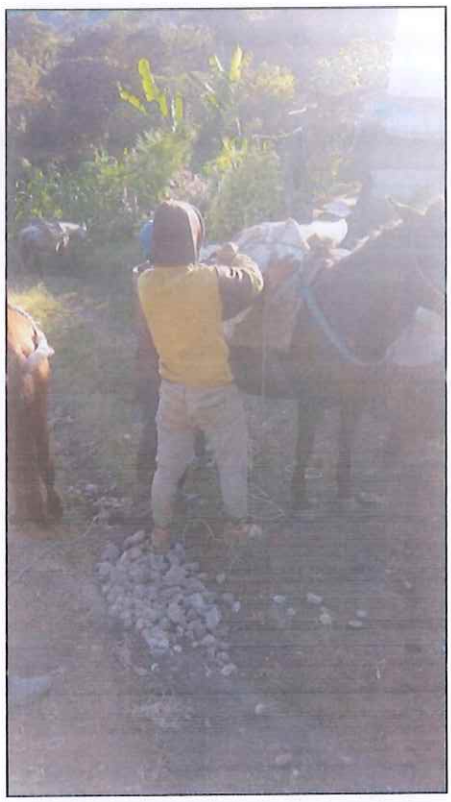

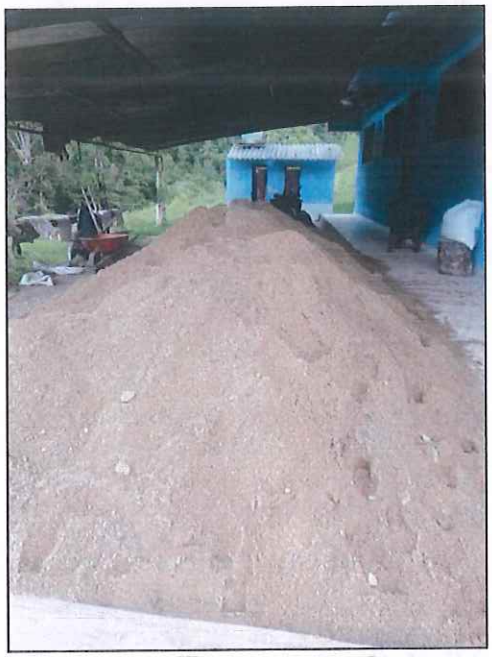

20. ANEXOS

- MEMORIAS DE CALCULO
- GARANTIAS.
- CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL - INTERVENTORIA
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- BITACORA DE OBRA.
- ACTAS DE COMITÉS.
- CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO.
- PLAN DE GERENCIA.


ING. HERNAN RIVERA F	(24/09/2024)	ING. JUAN MANUEL MEDINA
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

MEMORIAS DE CALCULO

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código	DIH-CGID-F95
		Versión:	1
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha de Aprobación:	12/09/2023

OBJETO:	CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CSAMCIH430 DE 2023	
LOCALIZACION:	RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC	Desde:	7/06/2024	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INDERHUILA 2023	Hasta:	6/07/2024	
CAPÍTULO:	5	TRANSPORTE		
ITEM:	5,1	Transporte de materiales petreos	UNIDAD:	KG

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

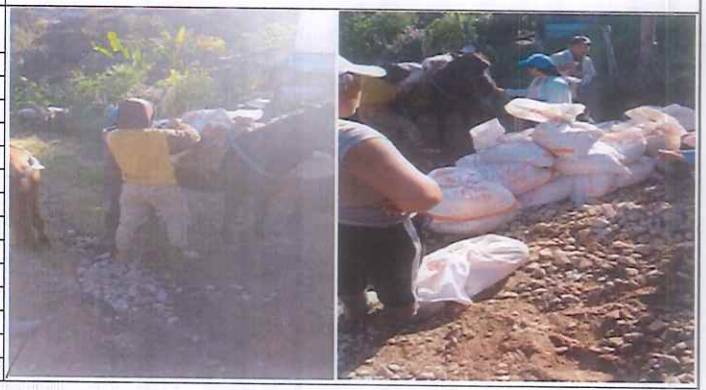DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN	VOL MATERIALES	CANTIDAD EN M3		DISTANCIA	Medida Total	ESQUEMAS:
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI PLACA DE PISO (0,57M3 ARENA - 0,84M3 GRAVA)	1,41	10,91		10,00	153,83	
TOTAL					153,83	

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

CESAR RICARDO VARGAS G.
RESIDENTE DE OBRA

HERNAN DARIO RIVERA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRA

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

GARANTIAS

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5607583423

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000171378 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	05	07	2024

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	05	07	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC IDENTIFICACIÓN: NIT 901.771.793-8

DIRECCIÓN: CALLE 70# 2W -02 CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 3133727612

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: INDERHUILA IDENTIFICACIÓN: NIT 813.005.578-7

BENEFICIARIO: INDERHUILA IDENTIFICACIÓN: NIT 813.005.578-7

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	17/11/2023	20/03/2025	21,504,563.00
ANTICIPO	17/11/2023	20/03/2025	53,761,407.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	17/11/2023	18/09/2027	10,752,281.50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	21,504,563.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901478086 - INGENIERIA OCIMACS S A S - PART: 50.00%
NIT 901557093 - PAREDES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS - PART: 50.00%

BENEFICIARIOS
NIT 813005578 - INDERHUILA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN Y EN VIRTUD AL OTROSI MODIFICATORIO N0.3 SE PRORROGA EL PLAZO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DOS MESES.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SUFREN MODIFICACIÓN ALGUNA Y CONTINUA VIGENTE Y VIGOR.

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***107,522,815.00	$ **********36,528	$*********0.00	$ ********6,940	$ **********43,469

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
ASESORIAS & SEGUROS EL REY LTDA	8897	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560758342

Juan Garcia R.
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBDE207F0708F97F57 CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000171378 ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC IDENTIFICACIÓN: NIT 901.771.793-8

ASEGURADO: INDERHUILA IDENTIFICACIÓN: NIT 813.005.578-7

BENEFICIARIO: INDERHUILA IDENTIFICACIÓN: NIT 813.005.578-7

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA NO. CSAMCIH430 DE 2023, DE FECHA CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Décima Segunda Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2023

Somos la Primera Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMERICA LATINA 2024

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS

5607583464

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000031449 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA — COD. AGE: 560 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS / DIAS)	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
05 / 07 / 2024	10 / 07 / 2024 / 23:59 A LAS	10 / 09 / 2024 / 23:59 A LAS / 62 DIAS	05 / 07 / 2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS / DIAS)
	10 / 07 / 2024 / 23:59 A LAS	10 / 09 / 2024 / 23:59 A LAS / 62 DIAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.771.793-8

DIRECCIÓN: CALLE 70# 2W -02 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELÉFONO: 3133727612

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.771.793-8

DIRECCIÓN: CALLE 70# 2W -02 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELÉFONO: 3133727612

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC NIT : 901771793

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: HUILA CIUDAD: NEIVA

DIRECCION: CARRERA 18 No. 17-6

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: 18-18

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 813005578 - INDERHUILA
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN Y EN VIRTUD AL OTROSI MODIFICATORIO N0.3 SE PRORROGA EL PLAZO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DOS MESES.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SUFREN MODIFICACIÓN ALGUNA Y CONTINUA VIGENTE Y VIGOR.

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO # CSAMCIH430 DE 2023, REFERENTE A "CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********88,329	$*********0.00	$ *******16,782	$ **********105,111

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ASESORIAS & SEGUROS EL REY LTDA	8897	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560758346

Juan Garcia R.

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBDE207F0708F97C5F

CLIENTE

ADCHACONPATRI 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/23 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA — EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000031449 ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC IDENTIFICACIÓN: NIT 901.771.793-8

ASEGURADO: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC IDENTIFICACIÓN: NIT 901.771.793-8

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES. COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS., COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL., COBERTURA EXPRESA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS. CADA AMPARO CON UN VALOR DE 200 SMMLV.

ASEGURADO ADICIONAL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA.

CLIENTE

CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA REALIZADO POR EL INTERVENTOR (Vo.Bo. Interventor).

EL INTERVENTOR

H A C E C O N S T A R:

El Interventor, certifica que el ejecutor del contrato No. ***CSAMCIH430 DE 2023****, cuyo objeto es la "****CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDÍGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDÍGENA FIL VITS - LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA****", cumple con los requisitos de acuerdo con la información suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA, en donde fue revisada, verificada y avalada por la interventoría; así mismo se certifica que la interventoría reviso y verifico los pagos de las planillas de seguridad social del contratista de obra del periodo comprendido entre el 07 de junio del 2024 al 06 de julio del 2024.*

Para constancia se firma a los (16) días del mes de agosto de 2024.

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO
RPL. CONSORCIO INDERHUILA 2023
NIT: 901.768.748-5. - INTERVENTORIA

SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80086564		RIVERA FLOREZ HERNAN DARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 N° 5 - 49	NEIVA-HUILA	8719094	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	9469288607	9469288607	I	2024/07/16	2024/07/17	BANCO DE BOGOTA	1	$377,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80086564	RIVERA HERNAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

2024/08/12 03:35 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80086564		RIVERA FLOREZ HERNAN DARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 N° 5 - 49	NEIVA-HUILA	8719094	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	9469288607	9469288607	I	2024/07/16	2024/07/17	BANCO DE BOGOTA	1	$377,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$200	$0	$208,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$200	$0	$208,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$200	$0	$162,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$200	$0	$162,700
TOTAL				1	$377,300	$500	$0	$377,800

2024/08/12 03:35 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80852105		VARGAS GUTIERREZ CESAR RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 8 52 45 CS 55	NEIVA-HUILA	8754406	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	05547441	9467274781	I	2024/07/03	2024/06/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	80852105	VARGAS GUTIERREZ CESAR RICARDO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$370,500	$0	$0	$370,500

2024/08/12 02:42 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80852105		VARGAS GUTIERREZ CESAR RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 8 52 45 CS 55	NEIVA-HUILA	8754406	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	33333816	9482012132	N	2024/07/03	2025/02/24	BANCO DE OCCIDENTE	233	$8,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	80852105	VARGAS GUTIERREZ CESAR RICARDO	231001	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS005	30	($1,300,000)	($162,500)		0	$0	$0	14-11	0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	80852105	VARGAS GUTIERREZ CESAR RICARDO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$1,200	$0	$8,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$1,200	$0	$8,000
TOTAL				1	$6,800	$1,200	$0	$8,000

2025/03/18 11:18 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901771793	8	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC	CLL 70 2W 02	NEIVA-HUILA	3133727612	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	52074736	9484927064	E	2024/07/22	2025/04/24	BANCO DE OCCIDENTE	276	$265,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1075286356	VARGAS GUTIERREZ MARIA XIMENA	230301	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF32	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$910,000	$145,600			$910,000	$36,400			$910,000	$36,400			$910,000	$4,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,600	$27,500	$0	$173,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,600	$27,500	$0	$173,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$1,000	$0	$5,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,800	$1,000	$0	$5,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,400	$6,900	$0	$43,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$36,400	$6,900	$0	$43,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,400	$6,900	$0	$43,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,400	$6,900	$0	$43,300
TOTAL				1	$223,200	$42,300	$0	$265,500

2025/04/25 01:53 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901557093	4	PAREDES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAREDES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS	CLL 23 51 19	NEIVA-HUILA	3163004752	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	69779542	94697795 42	E	2024/07/22	2024/07/31	BANCO AV VILLAS	9	$675,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	93390763	ANGULO CARDOZO JUAN CARLOS	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$300	1	$0	$0
2	CC	14139310	MUÑOZ BOTELLO VICTOR HUGO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$300	1	$0	$0
3	CC	1075217262	ORTIZ VILLARREAL MARIO ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
4	CC	1075260938	PAREDES SANABRIA ANDRES FELIPE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
5	CC	1110448609	RODRIGUEZ SANCHEZ JOHAN STIVEN	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$300	1	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$2,730,002	$437,000			$2,730,002	$109,400			$2,730,002	$109,400			$2,730,002	$14,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$437,000	$3,000	$0	$440,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$437,000	$3,000	$0	$440,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$14,500	$100	$0	$14,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$14,500	$100	$0	$14,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$109,400	$800	$0	$110,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$109,400	$800	$0	$110,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$109,400	$900	$0	$110,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$55,600	$400	$0	$56,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$1,800	$100	$0	$1,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$400	$0	$52,400
TOTAL				5	$670,300	$4,800	$0	$675,100

2024/08/01 10:24 AM

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901478086	3	INGENIERIA OCIMACS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 70 N 2W 02 TORRE 2 APTO 603		3133767612		OCIMACSSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30707131	E	2024-09-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.690.200	80.200	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
4	30707131	2024-07-19	Pagada

	EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	ISC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 6802541	CANTILLO GUTIERREZ CARLOS ANDRES	1.300.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439001
2	CC 12116869	VARGAS ALMARIO NELSON	1.300.000	F	X														0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
3	CC 1001276642	GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1.300.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439001
4	CC 1075218779	DELGADO RODRIGUEZ WILLIAM IVAN	1.300.000	F	X														0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901478086	3	INGENIERIA OCIMACS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 70 N 2W 02 TORRE 2 APTO 603		3133767612			OCIMACSSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30707131	E	2024-09-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.690.200	80.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	30707131	2024-07-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	832.000	0	41.400	0	873.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	416.000	0	20.700	0	436.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	416.000	0	20.700	0	436.700
EPS(Administradoras: 3)				4	208.000	0	10.400	0	218.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	52.000	0	2.600	0	54.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	2.600	0	54.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	104.000	0	5.200	0	109.200
ARP(Administradoras: 1)				4	362.000	0	18.000	0	380.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	362.000	0	18.000	0	380.000
CCF(Administradoras: 1)				4	208.000	0	10.400	0	218.400
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	4	208.000	0	10.400	0	218.400
Gran Total					1.610.000	0	80.200	0	1.690.200

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29861798
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-06-17

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MARIA KATALINA SILVA MANRIQUE	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075275516	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 10 N 11 55	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	MARIAK2616@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3046157493
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		29861798

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1075275516	59	No	No	No	41	1	3711001	Salario	SILVA MANRIQUE MARIA KATALINA	$2.000.000

NOVEDADES																																		
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1075275516																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1075275516	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1075275516	SANITAS	30	$2.000.000	0.1250000	$250.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	2	0.0052200	$10.500

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1075275516	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$320.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$320.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$250.000	$0	0	$0	0	$0	$250.000	0	$0	$0	$250.000	$0	0	$0	$0	$250.000	$0	$0	$250.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$10.500	0	$0	$0	$10.500	0	$0	$10.500	0	$0	$0	$10.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0


TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$250.000
PENSIONES	1	$320.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$10.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$580.500

BITACORA DE OBRA

06 de Junio del 2024

Continuan las fuertes lluvias, en el municipio de la argentina y la plata, no se logra realizar algun tipo de actividad.




07 de Junio del 2024

Hoy se realiza actividades de sobre acarreo de material petreo desde el borde de Via Hasta el puente y de ahí al resguardo indigena.




08 de Junio del 2024
Se presentan fuertes lluvias en la mañana y en la tarde, no se realizan actividades



09 de Junio del 2024

Se hace actividad de Sobreacarreo de material petreo desde el sitio de acopio hasta el resguardo indigena en bestias.



10 de Junio del 2024
Se presentan fuertes lluvias, durante el dia, no se realizan actividades operativas

11 de Junio del 2024

Se empaca material petreo en lonas y se hace sobreacarreo de este material desde el cruce de la via y el puente hasta el resguardo indigena.

12 de Junio del 2024

Se continua realizando el sobre acarreo de material petreo hasta el resguardo indigena en bestias

13 de Junio del 2024
Se presentan lluvias constantes durante el día no se logra Continuar actividades operativas

14 de Junio del 2024

Se continua realizando el Sobreacarreo de material petreo desde el sitio de acopio hasta el resguardo indigena en bestias.

15 de Junio del 2024
Se presentan lluvias durante todo el día no se logra continuar con actividades operativas

16 de Junio del 2024
Persisten las lluvias Constantes durante el día no se logra realizar actividades operativas

17 de Junio del 2024

Se empaca material en lonas y este es Sobreacarreado desde el acopio hasta el resguardo indigena en mulas.

18 de Junio del 2024

Se presentan lloviznas constantes durante todo el día, lo cual entorpecio las actividades operativas



19 de Junio del 2024

Se continua realizando el sobreacarreo del material petreo hasta el resguardo indigena en bestias.



20 de Junio del 2024

Hoy se presentaron lluvias Constante durante el día lo cual imposibilito las actividades operativas



21 de Junio del 2024

Hoy Continuaron las lluvias, se presentaron durante el día, no se pudo realizar actividades operativas



22 de Junio del 2024

Se continua realizando el sobreacarreo del material petreo hasta el resguardo indigena hasta el sitio de intervencion en bestias.



23 de Junio del 2024

Se empara material petreo y se sobreacarrea desde el sitio de acopio hasta el resguardo indigena en bestias



24 de Junio del 2024

Se presentaron lluvias en el día de hoy, no se realizaron labores



25 de Junio del 2024

Se presentaron lluvias el día de hoy, no se lograron realizar actividades



26 de Junio del 2024

Se realiza sobreacarreo de material en bestias hasta el sitio de intervención



27 de Junio del 2024

Se presentaron lluvias el día de hoy NO se realizaron actividades de obra.

28 de Junio del 2024

Se continua realizando el sobreacarreo de material en bestias hasta el resguardo indígena

29 de Junio del 2024

Se presentaron lluvias constantes el día de hoy, no se puede realizar actividades de obra

30 de Junio del 2024

Se continua empacando material ~~desde~~ petreo y se realiza sobre acarreo desde el sitio de acopio hasta el resguardo indigena

[illegible]

01 de Julio del 2024

Se presentaron lluvias el día de hoy, no se pudo realizar trabajos


[illegible]



02 de Julio del 2024

Continua el día de hoy las lluvias, esto no permite las actividades operativas

[illegible]



03 de Julio del 2024

Se continua empacando material petreo en lonas y esto se sobreacarrea en bestias hasta el resguardo indigena

[illegible]



04 de Julio del 2024

Se presentan lluvias el día de hoy no se puede realizar actividades de obra

[illegible]

05 de Julio del 2024

Se continua realizando sobre acarreo desde el sitio de acopio hasta el resguardo indigena en bestias.

[illegible]

06 de Julio

Se presentan lluvias el día de hoy por lo cual no se pudo realizar actividades operativas.

06 de Junio del 2024

Se presentaron Fuertes lluvias, no se realizaron labores en sitio de intervención

Hernán Rivera V.

maria ximena V.

07 de Junio del 2024

Se presentan lluvias el día de hoy, No se pueden realizar actividades

maria ximena V. Hernán Rivera V

08 de Junio del 2024

Hoy se intento subir 3 vigas de material petreo, por culpa de la humedad del terreno no se logro llegar hasta el resguardo indigena, toco acopiarlo a borde de via

maria ximena V.

09 de Junio del 2024

Se presentan lluvias constantes durante el dia, no se hacen actividades operativas

maria ximena V. Hernán Rivera V

10 de Junio del 2024

La veeduria del Resguardo Indigena de Fil Vits, manifiesta que la junta de Accion comunal de pradera y villa fatima iniciara la construcción de 2 placas huellas, esto perjudica totalmente la ejecución de actividades de la construccion de la placa huella.

Hernán Rivera V
maria ximena V.


11 de Junio del 2024

debido a la Construccion de las placas huellas en pradera y villa fatima no se podra ~~pradera~~ hacer actividades operativas de transporte de material petreo

maria ximena V.

12 de Junio del 2024

Se presentan lluvias el día de hoy no se puede continuar con el Sobreacarreo.




maria ximena V.

13 de Junio del 2024

Se contrato una camioneta para realizar el sobreacarreo del material petreo desde el acopio de la via hasta el reseguardo indigena, no se pudo realizar esta actividad debido a la humedad del suelo la camioneta resbala los llantas


maria ximena V.



14 de Junio del 2024

hoy se hacen actividades de sobreacarreo de material petreo con camioneta hasta el reseguardo indigena.

maria ximena V.



15 de Junio del 2024

Se continuan actividades de sobreacarreo del material acopiado en vía, hasta el reseguardo indigena en camioneta.


maria ximena V.



16 de Junio del 2024

Se presentan lluvias el dia de hoy, no Se pueden hacer actividades de Sobreacarreo.

maria ximena V.



17 de Junio del 2024

Por la humedad q' presenta la vía no se pueden realizar actividades de sobre-acarreo

maria ximena V.

Hernán

18 de Junio del 2024

Se presentan lluvias lo wal no permite realizar actividades de sobreacarreo

maria ximena V.

Hernán V

19 de Junio del 2024

Por la humedad del terreno de la vía no se pueden hacer actividades de Sobreacarreo

maria ximena V. Hernán V

20 de Junio del 2024

Hoy se logró realizar actividades de Sobreacarreo de material petreo hasta el resguardo indigena.

maria ximena V. Hernán V

21 de Junio del 2024

Se presentan lluvias Constantes el día de hoy, no se puede hacer actividades de Sobreacarreo

maria ximena V. Hernán V

22 de Junio del 2024

Continuan presentando lluvias el día de hoy, no se pueden hacer actividades de Sobreacarreo.

Hernán V

23 de Junio del 2024

en conjunto con la interventoria, nos comunicamos con el presidente de la junta de Acción comunal de Arabera y villa Fatima el señor Olman Anzizar Sanchez. quien manifiesta que tiene fecha prevista de terminación es el 23/08/2024 y q se debe esperar 10 a 28 días

Hernán V

24 de Junio del 2024

Hoy se realizan actividades de sobre acarreo del material petreo desde el acopio en via hasta el resguardo indigena en camioneta

Hernán Rivera

25 de Junio del 2024

Se continua realizando actividades de Sobreacarreo en camioneta del material acopiado en via

Hernán Rivera

26 de Junio del 2024


Se presentan lluvias el dia de hoy, no se realizaín actividades de Sobre acarreo

Hernán Rivera

27 de Junio del 2024

El dia de hoy, se presentaron lluvias durante todo el dia, no se logra hacer actividades de sobre acarreo

Hernán Rivera



28 de Junio del 2024

Por la humedad del terreno, no se pueden hacer actividades de sobreacarreo

Hernán Rivera



29 de Junio del 2024

Se presentan lluvias, no se pueden hacer actividades de sobreacarreo

Hernán Rivera



30 de Junio del 2024

el día de hoy, se presentaron lluvias en la mañana y en la tarde, no se pueden hacer actividades de Sobreacarreo.

Hernán Riva V

01 de Julio del 2024

Se presentaron lluvias durante el día no se pueden hacer actividades de obra

Hernán Riva V

02 de Julio del 2024

Continuan las lluvias, fueron persistentes en horas de la mañana y en la tarde, no se hace Sobreacarreo.

Hernán Riva V

03 de Julio de 2024

Por la humedad que presenta el terreno no se puede hacer actividades de sobreacarreo del material acopiado en vía.

Hernán Riva V

04 de Julio de 2024

Se realizan actividades de sobreacarreo con Camioneta del material acopiado en vía hasta el resguardo indigena

Hernán Riva V

05 de Julio de 2024

Se realizan actividades de Sobreacarreo del material petreo acopiado en via hasta el resguardo indigena en camioneta.

Hernán Riva V

06 de Julio del 2024

Se presentaron lluvias el día de hoy, no se hacen actividades de sobreacarreo

Hernán D. R.

07 de Julio del 2024

ACTAS DE COMITÉ

DATOS GENERALES

ASUNTO:	Conocer Avance de Obra	**No. ACTA:**	2
FECHA:	26/06/2024	**HORA INICIO**	9:00 a.m.
RESPONSABLE:	CONSORCIO INDERHUILA 2023	**HORA FINAL**	10:00 p.m.

ORDEN DEL DÍA:

1. Avance de obra.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Juan Manuel Medina Barreto (Director y Representante legal)	Consorcio Inderhuila 2023	
Carlos andres Gorron Avendaño (Representante suplente)	Consorcio Inderhuila 2023	
Andres Paredes (Representante legal)	Consorcio Escenarios Deportivos JC	
Natalia Bustos Botero (Apoyo a la supervisión)	Entidad Contratante	

DESARROLLO:

Se reunió mediante una sesión virtual por la plataforma MEET a las 9:00 am el ingeniero Andres Paredes, representante Legal del CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC, el ingeniero Juan Manuel Medina Barreto, representante legal y director de Interventoria del CONSORCIO INDERHUILA 2023, el Ingeniero Carlos Andres Gorron Avendaño como delegado y representante suplente del CONSORCIO INDERHUILA 2023, la Ingeniera Natalia Bustos Botero, quien ejerce como apoyo a la Supervisión del Contrato.

El representante legal del contratista de obra manifiesta que ha sido imposible llevar el material necesario para culminar la ejecución de la obra en los dos lugares, pero ha sido imposible llevar el 100% del material necesario para culminar las obras por el motivo del mal estado de la lluvia. Que por eso vuelve a solicitar una adición de prórroga de tiempo.

El apoyo de la supervisión le solicita que sea más explícito en el avance de obra y transporte de los materiales en los dos lugares al contratista.

El contratista responde que el NAM MISAK-LA ARGENTINA para acceder al sitio a intervenir se debe realizar por medio de bestias, moto o a pie, ya que este sitio se encuentra a más de 1.25 km de distancia de la vía terciaria principal (Sitio hasta donde llegan los vehiculos) esta situación hace que el suministro los materiales sea de una manera lenta afectando el cronograma de obra propuesto, ya que el material se acopia a borde de carretera y este debe ser empacado en tulas y transportado por los únicos medios descritos anteriormente hasta el sitio de intervención y como es conocimiento por las partes, el sobre acarreo de este material es realizado con la colaboración de la comunidad de este resguardo, al día de hoy ya se encuentra el material pétreo necesario en el sitio de intervención, pero no se ha podido realizar hacer llegar el cemento necesario del proyecto, ya que la comunidad se debe poner de acuerdo para que en conjunto se pueda realizar una minga para el sobre acarreo de este, también este suministro se realizará en cuatro (04) días no seguidos como lo solicito la comunidad por la cantidad de cemento a llevar al sitio, y no se disponen de las bestias suficientes para poder cargar la totalidad de este en un solo día, adicionalmente la gente de la comunidad tienen sus labores y manifestaron que se podrán ponerse de acuerdo para subir el material una vez por semana, siendo así, solo el suministro de el material faltante podrá durar 1 mes, también quiero dejar claro que este sobre acarreo no ha sido contemplado por la entidad contratante y no está siendo pago por esta, y que este costo que la comunidad exige para esta labor es cancelada por el contratista de obra. Y FIL VITS – SAN AGUSTIN La via de acceso al resguardo indigena desde el municipio de san Agustín se encuentra en muy mal estado de conservación, la cual se ha empeorado por las lluvias constantes ocurridas durante el presente mes, estas constantes lluvias no han permitido el tránsito de las volquetas por

esta vía terciaria imposibilitando el suministro del material necesario hasta el desarrollo del proyecto, también como es conocimiento de la interventoría, se encuentra a copiado 6 viajes de material acopiado en la carretera porque la volqueta no pudo subir al sitio de intervención, se espera que el clima mejore para poder realizar el sobre acarreo de este material al sitio de intervención. Adicionalmente, el consorcio contratista realizó la compra de 6 viajes de balastro para que con apoyo de la comunidad éste sea extendido en la vía, para mejorar los pasos más críticos de la vía, material que no está siendo reconocido por la entidad contratante, pero con el fin de solucionar y poder avanzar en el proyecto lo realizamos, con la infortuna de que el clima no nos ha permitido continuar con el acarreo del material que se encuentra acopiado en la vía.

Adicionalmente, como es de conocimiento de ámbito nacional, el país se encuentra en épocas de fuertes lluvias y el municipio de la Argentina y San Agustín no es la excepción, estas fuertes precipitación ha incrementado aún más la lentitud del transporte del material, ya que la zona de acceso se pone lisa, como se puede evidenciar en los reportes del Ideam.

Igualmente, el contratista afirma que ya tiene elaborado las canchas de en el municipio de Neiva solo faltaría transportarla hasta su lugar de destino.

El contratista manifiesta que han realizado todo lo posible para que el material necesario sea llevado a los sitios de intervención, pero que por factores externos como el clima no se ha podido realizar el suministro de materiales en su totalidad y por eso solicitan una ampliación al plazo inicial de 2 meses, los cuales corresponden el plazo que hasta hoy se ha perdido por las razones anteriormente mencionadas

El apoyo a la supervisión le da la palabra al representante de la interventoría el cual manifiesta que "Se tienen conocimiento de los hechos ocurridos por las lluvias ya que el contratista ha presenciado junto con el residente de obra los hechos ocurridos y los avances realizados por ellos, así mismo manifiesta que es viable dar una adición de plazo al tiempo contractual por todos los hechos ocurridos por las lluvia dejando una atraso en el avance de las obras y que han visto que el contratista ah hecho todo lo posible para poder llevar el material a su destino pero el contratiempo de acciones o climáticas han incurrido el cumplimiento del tiempo contractual".

La ing. Natalia Bustos pregunta que si con el tiempo solicitado, es definitivo para ejecutar las actividades faltantes y dar por terminado el contrato.

El contratista responde que si ya que e los llevan la cuenta de que el primer mes solicitado es para poder culminar el transporte del material a su destino con las dependencias solicitadas por la comunidad del resguardo y que después de tener el material

en el destino necesitaran 20 días para poder culminar la ejecución de las obras y el tiempo restante es para perfeccionar o arreglar observaciones suministrada por la interventoría o entidad contratante.

El apoyo a la supervisión y la interventoría expresan total acuerdo con lo solicitado por el contratista de obra, para lo cual el apoyo a la supervisión solicita al contratista de obra y a la interventoría presentar su respectiva documentación a la entidad para solicitar la adición de tiempo (prorroga). Igual mente les solicita a los dos que esta documentación sea suministrada el día viernes 28 de junio por medio de correo para que ellos pueda realizar la respectiva revisión y aprobación de los documentos y que el día martes 02 de julio se radique mediante físico esta documentación en la oficina de la entidad contratante.

No siendo más se cierra la sesión con los siguientes compromisos.

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A
Enviar acta de jsutificacion proyectada a la entidad	CONTRATISTA DE OBRA Y INTERVENTORIA	28	06	24
Efectuar otro si modificatorio	ENTIDAD	02	07	24

Siendo las 10:00 a.m. se dio por finalizada la sesión de esta reunión

CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO

ENVIADOS

Gmail

Paredes Construcciones e Inversiones SAS <paredesconstruccionessas@gmail.com>

INCONVENIENTES CON MATERIALES FRENTES DE OBRA

1 mensaje

Paredes Construcciones e Inversiones SAS <paredesconstruccionessas@gmail.com> 21 de junio de 2024, 9:45 a.m.

Para: GERENCIA COINGECON <gerencia.coingeconintegral@gmail.com>
CC: Inder huila <atencionusuario@inderhuila.gov.co>, inder infraestructura <infraestructura@inderhuila.gov.co>

Neiva, 21 de junio del 2024

Dr.

FELIPE VICTORIA BARRAGÁN

DIRECTOR INDERHUILA

Supervisor

Señores

CONSORCIO INDERHUILA 2023

RPL. JUAN MANUEL MEDINA

INTERVENTOR

Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CSAMCIH430 DE 2023, QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ASUNTO: INCONVENIENTES CON MATERIALES FRENTES DE OBRA.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos comunicamos para manifestar los continuos inconvenientes presentados en los frentes de obra relacionados al contrato en referencia, los cuales no han permitido el normal desarrollo de la ejecución de las actividades de obra en los sitios y afectando directamente la programación de obra presentada por nosotros:

1. NAM MISAK – LA ARGENTINA:

Como es de conocimiento por las partes involucradas, para acceder al sitio a intervenir se debe realizar por medio de bestias, moto o a pie, ya que este sitio se encuentra a mas de 1.25 km de distancia de la vía terciaria principal (Sitio hasta donde llegan los vehículos) esta situación hace que el suministro los materiales sea de una manera lenta afectando el cronograma de obra propuesto, ya que el material se acopia a borde de carretera y este debe ser empacado en tulas y transportado por los únicos medios descritos anteriormente hasta el sitio de intervención.

Como es conocimiento por las partes, el sobre acarreo de este material es realizado con la colaboración de la comunidad de este resguardo, al día de hoy ya se encuentra el material pétreo necesario en el sitio de intervención, pero no se ha podido realizar hacer llegar el cemento necesario del proyecto, ya que la comunidad se debe poner de acuerdo para que en conjunto se pueda realizar una minga para el sobre acarreo de este, también este suministro se realizará en cuatro (04) días no seguidos como lo solicito la comunidad por la cantidad de cemento a llevar al sitio, y no se disponen de las bestias suficientes para poder cargar la totalidad de este en un solo día, adicionalmente la gente de la comunidad tienen sus labores y manifestaron que se podrán ponerse de acuerdo para subir el material una vez por semana, siendo así, solo el suministro de el material faltante podrá durar 1 mes, también quiero dejar claro que este sobre acarreo no ha sido contemplado por la entidad contratante y no esta siendo pago por esta, y que este costo que la comunidad exige para esta labor es cancelada por el contratista de obra.

Adicionalmente, como es de conocimiento de ámbito nacional, el país se encuentra en épocas de fuertes lluvias y el municipio de la argentina no es la excepción, estas fuertes precipitación ha incrementado aún más la lentitud del transporte del material, ya que la zona de acceso se pone lisa, como se puede evidenciar en los reportes del Ideam (http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/new_modelo/CPT/informe/Informe.pdf) (http://www.ideam.gov.co/documents/21021/126539667/03_Bolet%C3%ADn_Predicci%C3%B3n_Clim%C3%A1tica_Marzo_2024.pdf/c5718e8e-857d-4137-bc95-f3ae3b709a76?version=1.1)

2. FIL VITS – SAN AGUSTIN.

La vía de acceso al resguardo indígena desde el municipio de san Agustín se encuentra en muy mal estado de conservación, la cual se ha empeorado por las lluvias constantes ocurridas durante el presente mes, estas constantes lluvias no han permitido el tránsito de las volquetas por esta vía terciaria imposibilitando el suministro del material necesario hasta el desarrollo del proyecto, también como es conocimiento de la interventoría, se encuentra a copiado 6 viajes de material acopiado en la carretera porque la volqueta no pudo subir al sitio de intervención, se espera que el clima mejore para poder realizar el sobre acarreo de este material al sitio de intervención.

Adicionalmente, el consorcio contratista realizó la compra de 6 viajes de balastro para que con apoyo de la comunidad éste sea extendido en la vía, para mejorar los pasos más críticos de la vía, material que no esta siendo reconocido por la entidad contratante, pero con el fin de solucionar y poder avanzar en el proyecto lo realizamos, con la

infortuna de que el clima no nos ha permitido continuar con el acarreo del material que se encuentra acopiado en la vía.

Queremos dejar claridad que este consorcio ha realizado todo lo posible para que el material necesario sea llevado a los sitios de intervención, pero que por factores externos como el clima no se ha podido realizar el suministro de materiales en su totalidad.

Por lo anterior, nos comunicamos para solicitar una ampliación al plazo inicial de 2 meses, los cuales corresponden el plazo que hasta hoy se ha perdido por las razones anteriormente mencionadas.

No siendo más, agradezco la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC

RPLs. ANDRES PAREDES

CONTRATISTA - CSAMCIH430 DE 2023

Modo de Envió: Virtual.

---

15. 21-06-2024 Problemas en los frentes de obra 2.pdf
1317K

CONSORCIO E. DEPORTIVOS JC

Neiva, 21 de junio del 2024

Dr.
FELIPE VICTORIA BARRAGÁN
DIRECTOR INDERHUILA
Supervisor

Señores
CONSORCIO INDERHUILA 2023
RPL. JUAN MANUEL MEDINA
INTERVENTOR
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CSAMCIH430 DE 2023, QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ASUNTO: INCONVENIENTES CON MATERIALES FRENTES DE OBRA.

Cordial Saludo,
Por medio de la presente nos comunicamos para manifestar los continuos inconvenientes presentados en los frentes de obra relacionados al contrato en referencia, los cuales no han permitido el normal desarrollo de la ejecución de las actividades de obra en los sitios y afectando directamente la programación de obra presentada por nosotros:

1. **NAM MISAK – LA ARGENTINA:**


Como es de conocimiento por las partes involucradas, para acceder al sitio a intervenir se debe realizar por medio de bestias, moto o a pie, ya que este sitio se encuentra a mas de 1.25 km de distancia de la vía terciaria principal (Sitio hasta donde llegan los vehículos) esta situación hace que el suministro los materiales sea de una manera lenta afectando el cronograma de obra propuesto, ya que el material se acopia a borde de carretera y este debe ser empacado en tulas y transportado por los únicos medios descritos anteriormente hasta el sitio de intervención.



Ruta de acceso solo en bestia, moto o a pie -1.25 Km de distancia.




Cruce del Rio en puente en madera.

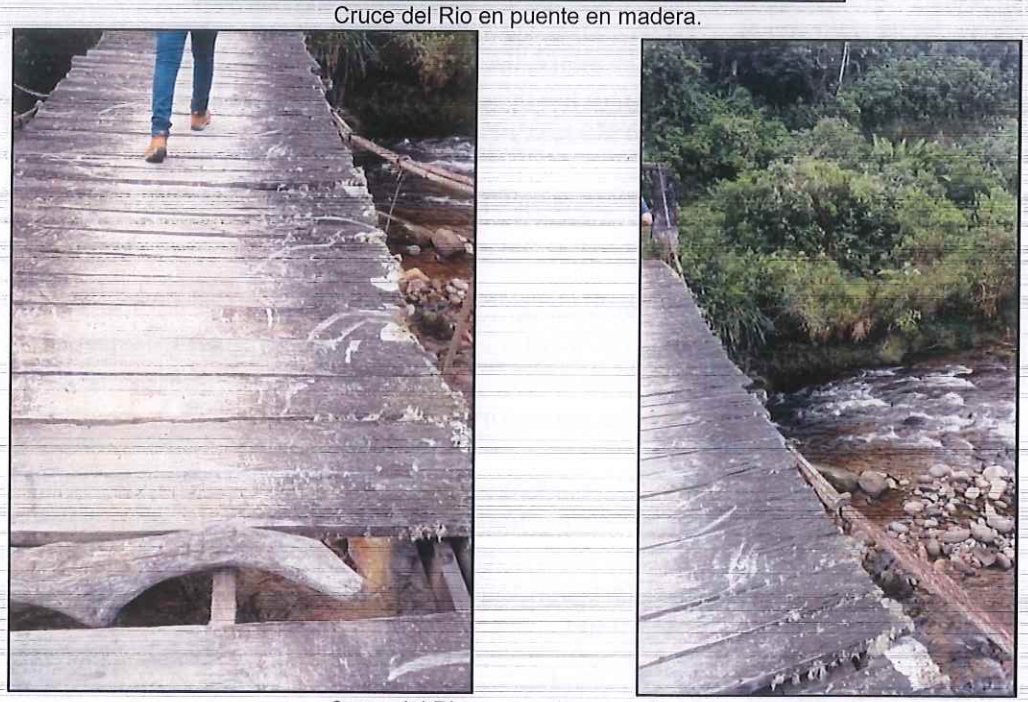


Cruce del Rio en puente en madera.

Como es conocimiento por las partes, el sobre acarreo de este material es realizado con la colaboración de la comunidad de este resguardo, al día de hoy ya se encuentra el material pétreo necesario en el sitio de intervención, pero no se ha podido realizar hacer llegar el cemento necesario del proyecto, ya que la comunidad se debe poner de acuerdo para que en conjunto se pueda realizar una minga para el sobre acarreo de este, también este suministro se realizará en cuatro (04) días no seguidos como lo solicito la comunidad por la cantidad de cemento a llevar al sitio, y no se disponen de las bestias suficientes para poder cargar la totalidad de este en un solo día, adicionalmente la gente de la comunidad tienen sus labores y manifestaron que se podrán ponerse de acuerdo para subir el material una vez por semana, siendo así, solo el suministro de el material faltante podrá durar 1 mes, también quiero dejar claro que este sobre acarreo no ha sido

contemplado por la entidad contratante y no esta siendo pago por esta, y que este costo que la comunidad exige para esta labor es cancelada por el contratista de obra.

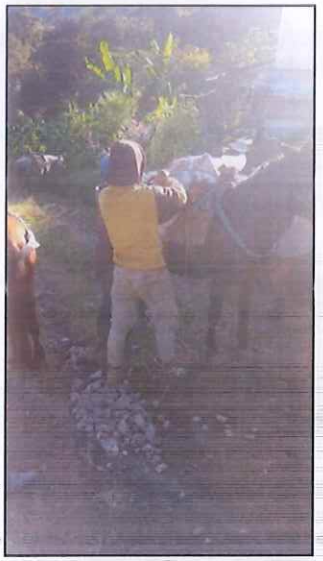

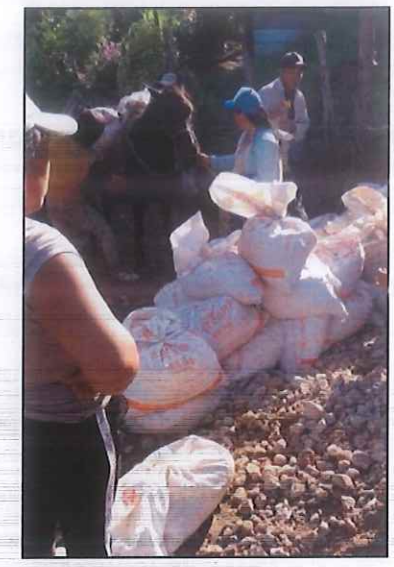




Adicionalmente, como es de conocimiento de ámbito nacional, el país se encuentra en épocas de fuertes lluvias y el municipio de la argentina no es la excepción, estas fuertes precipitación ha incrementado aún más la lentitud del transporte del material, ya que la zona de acceso se pone lisa, como se puede evidenciar en los reportes del Ideam (http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/new_modelo/CPT/informe/Informe.pdf) (http://www.ideam.gov.co/documents/21021/126539667/03_Bolet%C3%ADn_Predicci%C3%B3n_Clim%C3%A1tica_Marzo_2024.pdf/c5718e8e-857d-4137-bc95-f3ae3b709a76?version=1.1)

2. FIL VITS – SAN AGUSTIN.

La vía de acceso al resguardo indígena desde el municipio de san Agustín se encuentra en muy mal estado de conservación, la cual se ha empeorado por las lluvias constantes ocurridas durante el presente mes, estas constantes lluvias no han permitido el tránsito de las volquetas por esta vía terciaria imposibilitando el suministro del material necesario hasta el desarrollo del proyecto, también como es conocimiento de la interventoría, se encuentra a copiado 6 viajes de material acopiado en la carretera porque la volqueta no pudo subir al sitio de intervención, se espera que el clima mejore para poder realizar el sobre acarreo de este material al sitio de intervención.

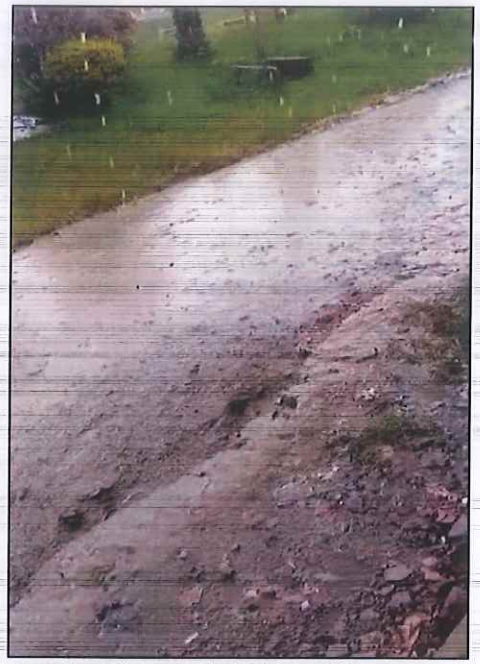

Estado del clima Resguardo Indígena (Constantes Lluvias).



Estado de la vía.



Material Acopiado en sitio por difícil acceso.

Adicionalmente, el consorcio contratista realizó la compra de 6 viajes de balastro para que con apoyo de la comunidad éste sea extendido en la vía, para mejorar los pasos más críticos de la vía, material que no esta siendo reconocido por la entidad contratante, pero con el fin de solucionar y poder avanzar en el proyecto lo realizamos, con la infortuna de que el clima no nos ha permitido continuar con el acarreo del material que se encuentra acopiado en la vía.





Extendida de balastro en sitios críticos de la vía.

CONSORCIO E. DEPORTIVOS JC



Derrumbe en la vía.

Queremos dejar claridad que este consorcio ha realizado todo lo posible para que el material necesario sea llevado a los sitios de intervención, pero que por factores externos como el clima no se ha podido realizar el suministro de materiales en su totalidad.

Por lo anterior, nos comunicamos para solicitar una ampliación al plazo inicial de 2 meses, los cuales corresponden el plazo que hasta hoy se ha perdido por las razones anteriormente mencionadas.

No siendo más, agradezco la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC
RPLs. ANDRES PAREDES
CONTRATISTA - CSAMCIH430 DE 2023

Modo de Envió: Virtual.

Gmail **Paredes Construcciones e Inversiones SAS <paredesconstruccionessas@gmail.com>**

RADICACION DISEÑO DE MEZCLAS

1 mensaje

Paredes Construcciones e Inversiones SAS <paredesconstruccionessas@gmail.com> 3 de julio de 2024, 12:41 p.m.
Para: GERENCIA COINGECON <gerencia.coingeconintegral@gmail.com>

Neiva, 03 de julio del 2024

Señores

CONSORCIO INDERHUILA 2023
RPL. JUAN MANUEL MEDINA
INTERVENTOR
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CSAMCIH430 DE 2023, QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ASUNTO: RADICACION DISEÑO DE MEZCLAS.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos comunicamos para hacer envío del Diseño de Mezclas que se usará en la construcción de la placa de concreto de 3.000 PSI.

No siendo más, agradezco la atención prestada.

Atentamente,

_____

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC

RPLs. ANDRES PAREDES

CONTRATISTA - CSAMCIH430 DE 2023

Modo de Envió: Virtual.

2 archivos adjuntos

16. 03-07-2024 Envio Diseño de Mezclas.pdf
105K

DISEÑO DE MEZCLAS 3000 PSI.pdf
5945K

CONSORCIO E. DEPORTIVOS JC

Neiva, 03 de julio del 2024

Señores
CONSORCIO INDERHUILA 2023
RPL. JUAN MANUEL MEDINA
INTERVENTOR
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CSAMCIH430 DE 2023, QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCION PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ASUNTO: RADICACION DISEÑO DE MEZCLAS.

Cordial Saludo,
Por medio de la presente nos comunicamos para hacer envío del Diseño de Mezclas que se usará en la construcción de la placa de concreto de 3.000 PSI.

No siendo más, agradezco la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC
RPLs. ANDRES PAREDES
CONTRATISTA - CSAMCIH430 DE 2023

Modo de Envió: Virtual.

RECIBIDOS

Gmail Paredes Construcciones e Inversiones SAS <paredesconstruccionessas@gmail.com>

CIH-CMCIH430-23 - SOLICITUD DE INFORMACION TECNICA PLACAS POLIDEPORTIVO

1 mensaje

GERENCIA COINGECON <gerencia.coingeconintegral@gmail.com> 18 de junio de 2024, 4:06 p.m.
Para: Paredes Construcciones e Inversiones SAS <paredesconstruccionessas@gmail.com>
CC: Sebastian Avendaño Andrade <sebastiancoingecon@gmail.com>

Cordial saludo,

Como firma interventora del contrato de obra No. CSAMCIH430 muy respetuosamente me permito solicitar la siguiente información:

1. Informe de las condiciones en campo, en lo que tiene que ver con la distribución y entrega del material de obra a cada uno de los sitios de ejecución.

2. Entrega del informe mensual No. 02.

3. Entrega de los ensayos y/o laboratorios tomados en campo.

Lo anterior es teniendo en cuenta el tiempo contractual transcurrido a la fecha Vs porcentaje de avance fisico de obra.

Atentamente,

JUAN MANUEL MEDINA BARRETO

RPL. CONSORCIO INDERHUILA 2023

INTERVENTORÍA

CONTRATISTA EXTERNO INDERHUILA

Construcción, Consultoría & Seguridad Industrial

PLAN DE GERENCIA

CONSORCIO E. DEPORTIVOS JC

PLAN DE GERENCIA EN PROYECTOS.



CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS – LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC
RPL.ANDRÉS FELIPE PAREDES SANABRIA.
CONTRATISTA.

CONSORCIO INDERHUILA 2023
RPL. JUAN MANUEL MEDINA B.
INTERVENTORIA.

INDERHUILA
CONTRATANTE

NEIVA, JUNIO 2024

CONSORCIO E. DEPORTIVOS JC

Tabla de contenido

1. Introducción 3
2. Justificación 3
3. Objetivos 3
4. Plan de Gestión de alcance 3
4.1. DESCRIPCIÓN DE CONTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS- LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA 4
5. Plan de Gestión de requisitos 4
6. Plan de Gestión del cronograma 4
7. Plan de Gestión de costo 5
7.1. Controlar los recursos 5

CONSORCIO E. DEPORTIVOS JG

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de PLAN DE GERENCIA DEL PROYECTO es la CONTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS- LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA. según el alcance, costos y plazo definidos para el proyecto. Para su realización la Gerencia asigno a ANDRÉS FELIPE PAREDES SANABRIA como director de proyecto con total autoridad en la administración de costos y recursos asociados al proyecto.

2. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto sobre la construcción de placa de concreto para un polideportivo está enfocado en beneficiar a la comunidad de los resguardos indígenas Guambiana de Nam Misak en el municipio de La Argentina y el resguardo indígena Fil Vits- La Perdiz en el municipio de San Agustín, ya que, no contaban con un espacio de integración para la comunidad del sector, a raíz de esta problemática se busca construir la placa para el polideportivo.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General.

Implementar la metodología de gestión de proyectos para el proyecto "CONTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS- LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

3.2. Objetivos Específicos.

- Cumplir con el alcance referido en el presente documento, sin tener la necesidad de exceder su margen.
- Llevar a cabo el proyecto dentro de los tiempos estimador para el mismo.
- Efectuar de manera oportuna el presupuesto destinado para el proyecto mencionado, buscando siempre cumplir con las fechas estipuladas.
- Planear, ejecutar y verificar todas las actividades descritas para el desarrollo del proyecto, con el fin de tener un debido control de los procesos que se implementen para el desarrollo de este.
- Dar cumplimiento a los planes de gestión que se mencionan en el presente documento, con el fin de asegurar una ejecución adecuada del proyecto.
- Enmarcar dentro de los lineamientos de la gerencia de proyectos, todos los procesos y métodos que se utilizaran en el desarrollo del presente proyecto.

4. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

El alcance del proyecto tiene dos partes:

Actividades internas necesarias para su realización.

Durante la primera semana de la ejecución del contrato de obra, el personal técnico por parte del contratista de la obra estará encargado de elaborar un listado de todas las actividades y materiales necesarias para asegurar la realización del objeto del contrato. Con las actividades propias del contrato, se realizó la programación de obra para el proyecto, el cual será mejorado, actualizado o detallado en caso de ser detectadas nuevas actividades necesarias. Para ello se requerirá apoyo del personal de las diferentes áreas como compras, legalización o departamento técnico.

4.1. Descripción de construcción placa para polideportivo en el resguardo indígena Guambiana de Nam Misak en el municipio de La Argentina y el resguardo indígena Fil Vits- La Perdiz en el municipio de San Agustín, departamento del Huila.

Con la firma del acta de inicio, se iniciarán labores de localización y replanteo en la zona a intervenir, con el maestro de obra, oficial y ayudantes, (personal contratado de esta región), de acuerdo con los planos suministrados por la entidad contratante. Una vez localizado se realizarán las siguientes actividades:

- Localización y replanteo.
- Demolición mecánica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material.
- Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
- Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.
- Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8*1,5mts. incluye: aro. malla, de marcado logos, anticorrosivo y pintura.
- Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto.
- Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm.
- Transporte de materiales pétreos.

5. PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS

Los requisitos establecidos en el contrato:

- "CONTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS- LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Los requisitos que se utilizaran para documentar la información son los siguientes: A nivel de recurso humano:

- Director de Obra
- Residente de Obra

A nivel Maquinaria y equipo:

- Mezcladora
- Vibrador de concreto.
- Formaleta metálica.

A nivel de Documentación:

- Contrato
- Recibo de pago legalización
- Pólizas
- Acta de Inicio
- Pagos de seguridad social
- Bitácora

6. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

El cronograma será gestionado por una persona dedicada exclusivamente a dicha actividad, puesto que está disponible en nuestra empresa y es el estándar utilizado para proyectos de elevada complejidad. Este documento será anexado en la parte posterior.

El cronograma inicial será creado juntamente con el equipo del contratista de la obra y aprobado por el interventor del contrato. La programación será supervisada durante la ejecución del contrato, aunque una actualización oficial será preparada en caso de ser requerido, conteniendo información sobre el estado de las actividades, retrasos, camino crítico y plazo actualizado de la finalización del proyecto.

Cada nueva actualización del programa considerará los cambios aprobados durante la ejecución de este, así también como la línea base como en el programa actual. En el plan de gestión del cronograma se describirá la manera en que se va a crear el mismo.

7. PLAN DE GESTIÓN DE COSTO

Los costos son administrados directamente por el director de la Obra para compras y finanzas. El director de Obra prepara un plan de costos realizados para la obra que contenga el estado actual de los gastos y compras realizados en el proyecto y un pronóstico fiable de los gastos futuros para la finalización del proyecto.

7.1. Controlar los recursos.

El proceso de controlar los recursos se ocupa de los recursos físicos como materiales y equipos, herramienta menor e instalaciones.

Las técnicas que se pueden utilizar para controlar los recursos del proyecto "CONTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL RESGUARDO INDIGENA FIL VITS- LA PERDIZ EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA", son los siguientes:

- Monitorear los consumos de los recursos.

CONSORCIO E. DEPORTIVOS JC

- Garantizar que los recursos sean utilizados y liberados de acuerdo con el plan y necesidades del proyecto.
- Informar a los interesados pertinentes si surgen problemas con los recursos relevantes.
- Influir en los factores que puede originar cambios en la utilización de los recursos.
- Gestionar los cambios aprobados conforme se producen.

CONCLUSION

Debido a los inconvenientes de las lluvias presentadas y las demoras por terceros, el proyecto no ha presentado un avance significativo debido a la suma de inconvenientes que se han presentado, asi como el mal estado de la vía de acceso en el resguardo indígena Fil Vits, asi como el sobre acarreo que hay que realizar en el resguardo indígena Nam Misak.

Katalina Silva M.

MARIA KATALINA SILVA M.
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
